UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CODAF – JELOG – DILOS

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: 08 Año: 2025

CONTRATO N°. 246-00-A-COFAC-DILOS-2024

CONTRATISTA: RB TECNOLOGIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: VIGENCIA FISCAL 2024: $ 15.569.000,00
VIGENCIA FISCAL 2025: $ 1.000.000.000,00

FORMA DE PAGO:

Los recursos de la **VIGENCIA FISCAL 2024**, se cancelarán así:

Lo facturado desde la suscripción del acta de inicio del contrato y hasta el 31 de Diciembre de 2024 correspondiente a los servicios de mantenimiento recibidos a satisfacción conforme a lo establecido, sin que el valor llegue a superar la suma de $15.569.620, se cancelará con el PAC cuentas por pagar (CXP) 2024 para ser pagado en el primer trimestre del año 2025, contra recibo a satisfacción parcial de los servicios contratados, facturación de mantenimientos y demás documentos relacionados en las notas del presente acápite.

Los recursos de la **VIGENCIA FISCAL 2025**, se cancelarán así:

OTROS PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales con corte de ejecución los 20 de cada mes por los servicios de mantenimiento recibidos a satisfacción, desde el 1 de enero de 2025 y hasta el 20 de septiembre de 2025, los cuales serán pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios de mantenimiento, contra recibo a satisfacción parcial de los servicios contratados, facturación de mantenimientos y demás documentos relacionados en las notas del presente acápite

PAGO SALDO: El saldo del contrato se cancelará contra entrega total de los servicios de mantenimiento prestados desde el 21 de septiembre de 2025 y hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato con cargo al de PAC DICIEMBRE de 2025, contra recibo a satisfacción total de los servicios contratados, facturación de mantenimientos y demás documentos relacionados en las notas del presente acápite.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 24 Mes 12 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: El servicio de mantenimiento preventivo (Fase 2), predictivo y/o correctivo (Fase 3) para los vehículos de bomberos en su sistema automotriz y de extinción de incendios que prestan el servicio de atención de emergencias, salvamento y extinción de incendios en las unidades militares aéreas, conforme al anexo técnico.

CONTRATO MODIFICATORIO: 001

FECHA DE FIRMA: 31 diciembre de 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Reducción presupuestal de la siguiente manera:

FASE 2: Valor Inicial: $ 5.000.000,00
Valor Final: $ 4.908.100,00

FASE 3: Valor Inicial: $ 10.569.620,00
Valor Final: $ 10.286.199,00

CONTRATO MODIFICATORIO: 002

FECHA DE FIRMA: 23 julio de 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal en la vigencia 2025 de la siguiente manera:

FASE 2: Valor Inicial: $ 300.000.000,00

Adición: $ 100.000.000,00
Valor Final: $ 400.000.000

FASE 3: Valor Inicial: $ 700.000.000,00
Adición: $ 300.000.000,00
Valor Final: $ 1.000.000.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30/12/2024 hasta el 31/10/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 89.86%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 92.85%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 73.16%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 26.84%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A continuación, se relacionan los trabajos ejecutados en el mes de septiembre de 2025 con fecha de corte 30 de septiembre:

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento correctivo (Fase 3) en la Escuela Militar de Aviación, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:

FASE 3 - PANTHER - PLACA DIN 354

- Corrección de fugas de aire. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación motores limpiaparabrisas. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación cuatro luces de emergencia lateral Serie 700. (A todo costo).
- Reparación motor eléctrico solido- disperso torreta Techo. (A todo costo).
- Mantenimiento torreta de techo. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación válvulas circuito torreta de techo. (A todo costo).
- Cambio suministro e instalación manguera de drenaje torreta de techo (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación todas las mangueras de agente extintor sistema P.Q.S. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación válvula liberadora de presión de P.Q.S. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación manómetro de presión botella de agente expulsor (nitrógeno) sistema P.Q.S. (A todo costo).
- Reparación tanque de espuma en polipropileno por fugas. (A todo costo).

FASE 3 – PANTHER – PLACA DIN 341

- Cambio. Suministro e instalación e Instalación nivel de tanque agua en cabina. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación nivel de tanque espuma en cabina. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación tendido total de mangueras tubin teflón de 1/4" sistema extinción y frenos. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación motores limpiaparabrisas. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación cámara de reversa. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación cuatro luces de emergencia lateral Serie 700. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación motor de enrollado de carretel agente húmedo. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación válvula liberadora de presión de P.Q.S. (A todo costo).
- Reparación carretel sistema de extinción de incendios. (A todo costo).

FASE 3 - FORD 350 SUPER DUTY – PLACA CES 841

- Mantenimiento general sistema de frenos. (A todo costo).
- Reparación alternador principal. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación sensores de reversa. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación cámara de reversa. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación líneas de combustible motor bomba UHPS. (A todo costo).

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento correctivo (Fase 3) en el vehículo de investigación de accidentes de la Inspección General, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:

FASE 3 - FORD 250 SUPER DUTY – PLACA MOL 063

- Cambio y Suministro e instalación terminal superior derecha barra trasversal de dirección. (A todo costo).
- Cambio y Suministro e instalación terminales inferiores derecha barra trasversal de dirección. (A todo costo).
- Cambio y Suministro e instalación amortiguador de dirección. (A todo costo).
- Cambio y Suministro e instalación columna dirección. (A todo costo).
- Alineación y balanceo llantas delanteras. (A todo costo).

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento correctivo (Fase 3) en el Comando Aereo de Transporte Militar, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:

FASE 3 - OSHKOSH T6 – PLACA 7-6871

- Cambio. Suministro e instalación baterías. (A todo costo).

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar con la ejecución de mantenimientos a los vehículos de bomberos con base a las necesidades de mantenimiento.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN EDGARDO
FIRMA:	Cristian C.
C.C. No.	1.030.550.961
DEPENDENCIA:	JELOG - DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		Resolución 001 del 07-nov-2024
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**SI**		CRP 2024: 1193224 CRP 2025: 37425 Garantías: Aprobada 27/dic/2024 Garantías modificatorio adición: Aprobada 27/jul/2025
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**SI**		Se hace verificación de las condiciones del contrato electrónico y del anexo aceptación oferta.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**SI**		Las condiciones están acordes a las exigidas en la ficha técnica del proceso
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**SI**		Acta de inicio firmada por las partes el 30/dic/2024
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**SI**		Estos documentos se adjuntan a los tramites de pago. A la fecha se han tramitado 08 paquetes de pago.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**SI**		Se adjuntan las actas de trabajo enviadas por los supervisores técnicos en las unidades
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**SI**		Mediante correo electrónico se informan los trabajos de mantenimiento que debe ejecutar en las UMA´s
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con	**SI**		Hasta la fecha no se han presentado novedades

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			respecto de las condiciones exigidas.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**SI**		Se ha cumplido con el cargue en la plataforma SECOP de los informes de supervisión los 05 primeros días del mes
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**NO**	A la fecha no se han presentado inconvenientes que conlleven a incumplimiento por parte de contratista
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**NO**	De acuerdo a la proyección del contrato esta se realizará una vez se verifique el cumplimiento de la cancelación total del contrato.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-077207-AG	Lugar y Fecha	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR,10-09-2025

Asunto	CAMBIO DE BATERIAS		
Oficina Productora	OFSOP/CATAM		
Hora Inicio	08:00	**Hora Finalización**	08:45
Ausentes	N/A		

Orden del día:
Realizar cambio de baterias del vehículo de bomberos OSKOSH T6 del CATAM

Desarrollo:
De acuerdo a reporte del señor AS13 JAIRO ALBERTO SUAREZ CORREA en donde informa que el vehículo de bomberos OSHKOSH T6 tiene problemas de encendido se realiza el reporte y consecución de las baterias nuevas con apoyo del señor T2 CRISTIAN CONTRERAS dentro del contrato 246-00-A-COFAC-DILOG-2024 y se lleva el cambio de estas realizado por el señor T1 LUZ URIEL Especialista Operacional de Bomberos asi:


J.E. FILTROS LTDA

SALIDAS DE MERCANCIA

FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLAL

DOCUMENTO PENDIENTE

No. DOCUMENTO : 45668 FECHA : 09/09/2025 BODEGA DE SALIDA : 1

ENTREGAR A : RB TECNOLOGIA SAS PEDIDO: 00

CALLE 161A No 7F-21 Bogotá, D.C.

CONCEPTO :


CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
0096	ATEROCTO BATERIA ROCKET N200 8D1600	2.00

OBSERVACIONES : BOGOTA FUERZA AEREA CATAM URIEL RODRIGO LUZ CARDENA
S SOLICITO YESID PINTO

Firma Aprobado

Firma Recibido

Mercancia en transito propiedad de JE FILTROS LTDA Calle 9 Nro. 32-35 telefono 3704489 pendiente de facturar al destinatario.Para cualquier dispocision de esta mercancia la factura sera enviada al destinatario

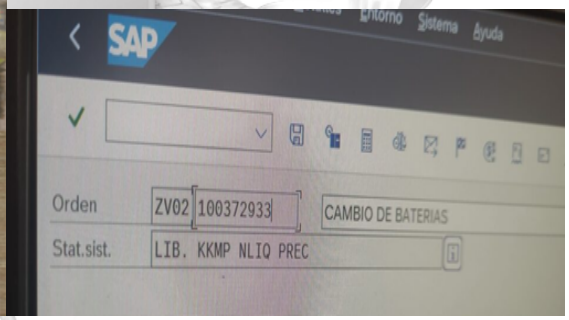

Se realiza bajo orden de mantenimiento # 100372933 del 10/09/2025, en donde se verifica que las baterias que tenia instaladas el camión eran de fecha 27 de julio del 2022, donde se evidencia su desgaste por tiempo y uso.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025







Se realiza aseo y verificación de los bornes, contactos e instalación de baterias.





	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Se hace entrega de destinación final de las baterías viejas a la escuadrilla automotores.





No siendo mas el motivo de la presente se da por finalizada la reunión.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor WINSTON JOSHUA ARANGUREN BONNETT
Especialista Prevención Operacional

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-079247-AG	Lugar y Fecha	Bogotá D.C.,16-09-2025

Asunto	Mantenimiento camioneta MOL063		
Oficina Productora	SUISO		
Hora Inicio	09:00	**Hora Finalización**	09:30
Ausentes	Ninguno		

Orden del día:
1. Informe de actividades de mantenimiento realizado a la camioneta FORD SUPER DUTY placa MOL063 asignada a la subdirección de investigación de seguridad operacional.

Desarrollo:



1. Con el fin de garantizar las capacidades investigativas con que cuenta la Subdirección deInvestigaciónen materia de vehículos, se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo a la camioneta de investigación Ford Super Duty MOL 063, el cual incluyó específicamente las siguientes tareas.


Mantenimiento FASE 3

Vehículo	Placa	ítem	Descripción de la Novedad
FORD 350 SUPER DUTY	MOL 063	5.2.15	Cambio y Suministro e instalación terminal superior derecha barra trasversal de dirección. (A todo costo).
		5.2.16	Cambio y Suministro e instalación terminales inferiores derecha barra trasversal de dirección. (A todo costo).
		5.2.19	Cambio y Suministro e instalación amortiguador de dirección. (A todo costo).
		5.2.20	Cambio y Suministro e instalación columna dirección. (A todo costo).
		6.1.2	Alineación y balanceo llantas delanteras. (A todo costo).

2.Se envía evidencia fotografica del cambió de los elementos que realizó la empresa REB TECNOLOGIA SAS:

FAC-S-2025-079247-AG

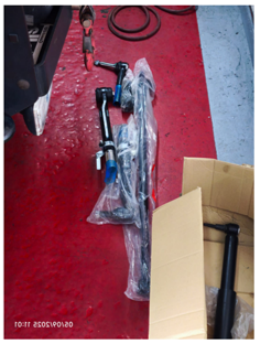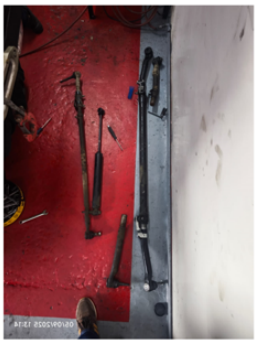


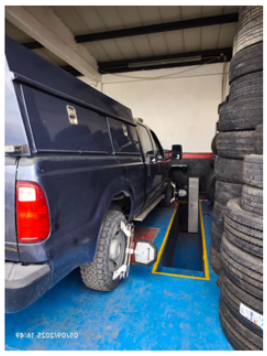

3.No siendo otro el motivo del presente informe, se da por terminada la reunión

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	



Mayor ANGELICA MARIA CASAS BARRIOS
Especialista Estratégico Investigación Accidentes Aéreos



Técnico Subjefe ARBEY GONZALO PINTO AREVALO
Técnico Especialista Investigación Incidentes Aéreos

Elaboró: TS. PINTO / SUISO Revisó: TS. PINTO / SUISO Aprobó:TS. PINTO / SUISO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-079609-AG	Lugar y Fecha	ESTACIÓN BOMBEROS EMAVI,01-09-2025

Asunto	SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE BOMBEROS		
Oficina Productora	OFSOP		
Hora Inicio	14:00 Horas	**Hora Finalización**	16:00 Horas
Ausentes	NO APLICA		

Orden del día:

1. SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE BOMBEROS

Desarrollo:


En las instalaciones de la Estación de Bomberos de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez, se presenta el personal de contratistas de la empresa RB TECNOLOGÍA SAS, a fin de realizar el recibo de los trabajos de mantenimiento a los vehículos de Bomberos dentro de lo establecido en el contrato No 246-00-A-COFAC-DILOS-2024, a continuación, se describen los trabajos realizados y se anexan imágenes de los mismos.

ROSENBAUER PANTHER 4x4 AT placa: DIN-341

FASE 3:


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1.6.6.12	Cambio. Suministro e instalación e Instalación nivel de tanque agua en cabina. (A todo costo).	Se hace el cambio de los indicadores de nivel de agua, se configura y verifica la correcta operación.






ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1.6.6.13	Cambio. Suministro e instalación nivel de tanque espuma en cabina. (A todo costo).	Se hace el cambio de los indicadores de nivel de agua, se configura y verifica la correcta operación.





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
8.2.9	Cambio. Suministro e instalación tendido total de mangueras tubin teflón de 1/4" sistema extinción y frenos. (A todo costo).	Se hace cambio de mangueras tipo tubin al sistema de extinción de incendios, se verifica por fugas, sin novedades.



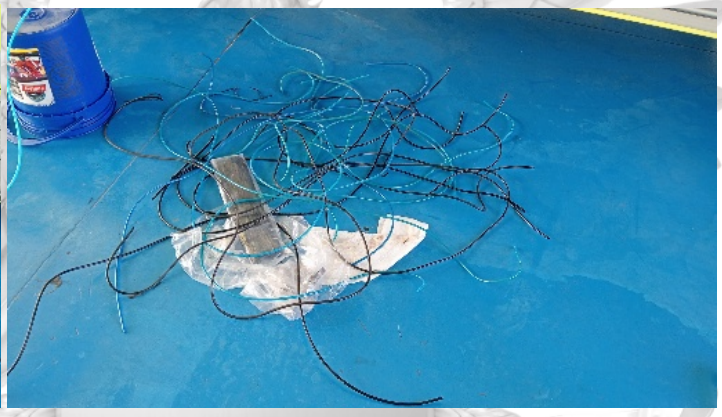

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
8.2.56	Cambio. Suministro e instalación motores limpiaparabrisas. (A todo costo).	Se hace el cambio de motor del sistema de enfriado del panorámico y se verifica la correcta operación.







ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES

FAC-S-2025-079609-AG

9.3.1.123	Cambio. Suministro e instalación cámara de reversa. (A todo costo).	Se hace el cambio de la cámara de reverso y se instala pantalla en cabina, se verifica su correcta operación.





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
9.3.2.7	Cambio. Suministro e instalación cuatro luces de emergencia lateral Serie 700. (A todo costo).	Se hace cambio de las luces ámbar y se verifica su correcta operación.





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
9.3.3.33	Cambio. Suministro e instalación motor de enrollado de carretel agente húmedo. (A todo costo).	Se hace cambio del componente y se verifica su operación.






FAC-S-2025-079609-AG

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
16.2.84	Cambio. Suministro e instalación válvula liberadora de presión de P.Q.S. (A todo costo).	Se hace cambio del componente verificando su operación y ausencia de fugas, sin novedad.



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
16.2.173	Reparación carretel sistema de extinción de incendios. (A todo costo).	Se hace mantenimiento a todo el sistema de enrollado del carretel dual, se cambia relay, se hace control corrosión y engrase de la cadena de tracción.




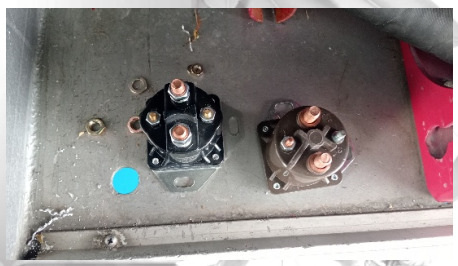


ROSENBAUER PANTHER 4x4 AT placa: DIN-354

FASE 3.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
8.1.2	Corrección de fugas de aire. (A todo costo).	Se corrigen fugas de aire y se verifica estanqueidad del sistema neumático, sin novedad.

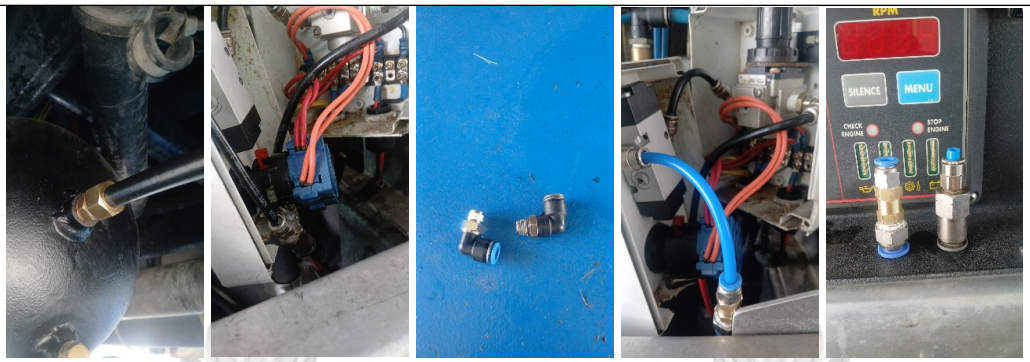

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
8.2.56	Cambio. Suministro e instalación motores limpiaparabrisas. (A todo costo).	Se hace cambo del motor y sus componentes, se verifica operación sin novedad.

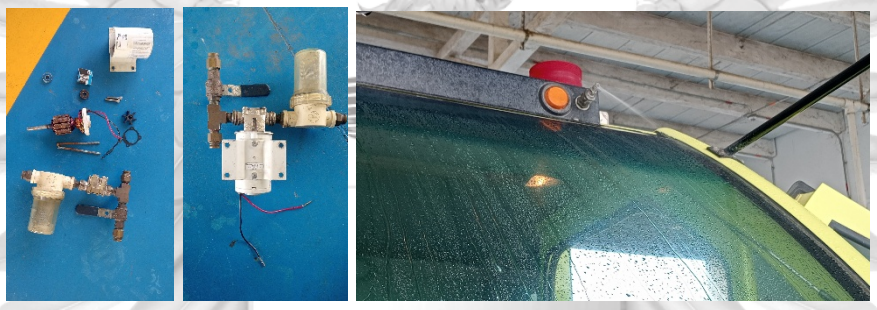

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
9.3.3.55	Reparación motor eléctrico solido- disperso torreta Techo. (A todo costo).	Se hace cambio del motor eléctrico y se lubrica el cilindro de deslizamiento, se verifica su correcta operación sin novedad.



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES

FAC-S-2025-079609-AG

16.1.7	Mantenimiento torreta de techo. (A todo costo).	Se hace mantenimiento a torreta de techo, corrigiendo fugas y verificando operación del sistema de descarga de chorro solido y disperso.




ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
16.2.28	Cambio. Suministro e instalación válvulas circuito torreta de techo. (A todo costo)	Se hace cambio de válvulas de paso de agua de torreta de techo, se verifica que selle correctamente, sin novedad.





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
16.2.32	Cambio suministro e instalación manguera de drenaje torreta de techo (A todo costo).	Se hace cambio de la manguera y se verifica que esta quede por el trazado original sin presencia de fugas.




ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
16.2.79	Cambio. Suministro e instalación todas las mangueras de agente extintor sistema P.Q.S. (A todo costo).	Se hace cambio de manguera rígida de descarga PQS por torreta de techo, se verifica correcto ajuste, sin novedad.





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
16.2.84	Cambio. Suministro e instalación válvula liberadora de presión de P.Q.S. (A todo costo).	Se hace cambio de las válvulas del sistema de PQS las cuales presentaban fugas y movimiento restringido, se verifica correcta operación, sin novedad.






FAC-S-2025-079609-AG

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
16.2.94	Cambio. Suministro e instalación manómetro de presión botella de agente expulsor (nitrógeno) sistema P.Q.S. (A todo costo).	Se cambia manómetro que se encontraba roto, se verifica que no tenga fugas de nitrógeno, sin novedad.





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
16.2.150	Reparación tanque de espuma en polipropileno por fugas. (A todo costo).	Se hace cambio de empaquetadura y se verifica ausencia de fugas







FORD F-350 SUPER DUTY placa: CES-841

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7.3	Mantenimiento general sistema de frenos. (A todo costo).	Se hace verificación del sistema de frenos sin encontrar desgaste de pastillas y discos, se borra testigo de ABS, sin novedad.

FAC-S-2025-079609-AG



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
9.3.1.122	Reparación alternador principal. (A todo costo).	Se hace cambio de alternadores del vehículo y se elimina testigo de fallo de batería, se verifica que genere carga, sin novedad.





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
9.3.1.122	Cambio. Suministro e instalación sensores de reversa. (A todo costo).	Se hace cambio de los 4 sensores de reversa y se instala el sistema de alarma y monitor en la cabina.





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
9.3.1.123	Cambio. Suministro e instalación cámara de reversa. (A todo costo).	Se hace instalación de cámara de reversa y pantalla en cabina, se verifica operación, sin novedad.

FAC-S-2025-079609-AG





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
16.2.78	Cambio. Suministro e instalación líneas de combustible motor bomba UHPS. (A todo costo).	Se hace cambio de todas las mangueras del sistema de inyección de la bomba UHPS, se verifica ausencia de fugas, sin novedad.





Se finalizan los trabajos de mantenimiento, verificando que los vehículos queden operativos y se firma el acta por parte del supervisor del mantenimiento y el Jefe del OFSOP.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Capitán LUIS ALFONSO LEIVA MIRANDA
Especialista Investigación Seguridad Operacional

Técnico Primero HUGO HERNAN MARTINEZ MORALES
Técnico Experto Jefe Estación Bomberos

Elaboró: T1. MARTINEZ / OFSOP Revisó: T1. MARTINEZ / OFSOP Aprobó:T1. MARTINEZ / OFSOP
