ICCU	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**FECHA**	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO	**INSERTAR 03**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N/A

CONSECUTIVO N° N/A

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-141-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	10/04/2025
	ICCU-221-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	10/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024	**NIT**	NIT: 901.903.428 -2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	**NIT**	NIT: 901.915.916 - 7
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución es de OCHO MESES (08) meses y veintiún (21) días según el acta de inicio, va desde el 10 de abril del 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de OCHO MESES (08) meses y veintiún (21) días según el acta de inicio, va desde el 10 de abril del 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO - OBRA	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** a) Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO. b) Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. c) Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. d) El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. **2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:** El sistema de pago del componente de obra de los corredores viales se realizará de la siguiente manera: a. En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. b. El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. c. Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación del informe.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$28.220.954.599,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	**FORMA DE PAGO:** 1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato. El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo 1. La entidad realizará al interventor el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3.865.474.620,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	14/05/2025 al 30/05/2025		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	

Cumplimiento	NB - 100372291 ANEXO 1	10/04/2025	30/06/2026	$	5.644.190.919,80
Buen manejo del anticipo		10/04/2025	30/06/2026	$	8.466.286.379,70
Prestaciones Sociales		10/04/2025	31/12/2028	$	1.411.047.729,95
Calidad del servicio		31/12/2025	31/12/2028	$	626.505.192,10
Estabilidad de la obra		31/12/2025	31/12/2027	$	8.466.286.379,70
RCE	NB - 100096328 ANEXO 1	24/01/2025	31/12/2026	$	1.411.047.729,00

Contrato de interventoría

Póliza:		**Vigencia**			**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**		
Cumplimiento	21-44-101464046 ANEXO 2	10/04/2025	13/06/2026	$	579.821.193,00
Buen manejo del anticipo		10/04/2025	13/06/2026	$	773.094.924,00
Prestaciones Sociales		10/04/2025	12/02/2029	$	386.547.462,00
Calidad del servicio		12/02/2026	12/02/2031	$	773.094.924,00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	
	Fecha diligenciamiento	


4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

El contrato se encuentra en la sexta semana de la etapa de caracterización. Con base en la información presupuestal reportada en los informes semanales 5 y 6, y de acuerdo con el Plan de Trabajo Detallado (PDT) de caracterización aprobado por la interventoría, se registra un avance programado del 20,92% frente a un avance ejecutado del 25,68% para esta etapa.

Cabe señalar que, el porcentaje de ejecución que se reporta es el calculado sobre el total del contrato, lo cual se tiene que para obra es el 2,28% y para interventoría es el 12,08%.

GRAFICAS DE AVANCES DEL CONTRATO SEMANAS 5 Y 6

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	13,57%	14,85%	2,13%
Durante el periodo	3,29%	4,15%	
Acumulado actual	16,86%	19,00%	



Fuente: Informe Semanal 5, página 1, insumo entregado por parte de la Interventoría.

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	16,86%	19,00%	4,76%
Durante el periodo	4,05%	6,68%	
Acumulado actual	20,91%	25,68%	



Fuente: Informe Semanal 6, página 1, insumo entregado por parte de la Interventoría.

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI
Anticipo	$0,00	$0,00
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$0,00	$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$28.220.954.599,00	$3.865.474.620
Porcentaje de ejecución	2,28%	12,08%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	Daniel Felipe Velasquez
	Fecha diligenciamiento	2/06/2025

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**		**Chalecos**	
	Cascos		**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**		**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotografico del contrato de obra e interventoría.



Foto 3	**Actividad:** Levantamiento topográfico en el sector Tramo 3 Alban, se verifica personal en obra.	Fecha: 14/05/2025



Foto 4	**Actividad:** Recorrido de obra (interventoría - Contratista) para verficar estado de la via (T3)	Fecha: 14/05/2025



Foto 5	**Actividad:** Ejecución de apiques en el tramo 2 Puerto salgar - Galapagos	Fecha: 15/05/2025



Foto 6	**Actividad:** Ejecución de apiques en el tramo 2 Puerto salgar - Galapagos	Fecha: 15/05/2025



Foto 7	**Actividad:** Se inicia ejecución de apiques en el Tramo 9, para carcaterización geotécnica de materiales.	Fecha: 15/05/2025



Foto 8	**Actividad:** Se inicia ejecución de apiques en el Tramo 9, para carcaterización geotécnica de materiales.	Fecha: 15/05/2025



Foto 9	**Actividad:** Se inicia ejecución de apiques en el Tramo 9, para carcaterización geotécnica de materiales.	Fecha: 16/05/2025



Foto 10	**Actividad:** Se inicia ejecución de apiques en el Tramo 9, para carcaterización geotécnica de materiales.	Fecha: 16/05/2025



Foto 11	**Actividad:** Ejecución de apiques en el tramo 2 Puerto salgar - Galapagos	Fecha: 16/05/2025



Foto 12	**Actividad:** Ejecución de apiques en el tramo 2 Puerto salgar - Galapagos	Fecha: 16/05/2025

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el periodo del presente informe la supervisión participo en el comité No.5 realizado el 16/05/2025, en el cual se realizó el empalme con el acompañamiento de la ingeniera Maria del Pilar como supervisora anterior, el ingeniero Wilson Garzón como apoyo a la supervisión, la interventoría y el contratista, se mencionaron temas importantes sobretodo para el tramo de Caparrapí, el cual a la fecha no se habría definido ni iniciado la intervención por complicaciones en el acceso a la zona.

El comite No. 6 realizado el 26/05/2025 se presentó un video que evidencia la dificultad de acceso, así como la no consolidación de una vía, adicionalmente se percibe en el video que en el recorrido realizado por el contratista se tiene que pasar por dos broches al parecer de un predio privado, se sugiere la validación de esta información predial previas intervenciones, el ingeniero Wilson Garzón manifiesta que la administración municipal asegura que esta vía es pública, sin embargo se deja la nota en el acta de comité No.6 sobre el requerimiento de esta validación.

La supervisión realiza el acompañamiento a la socilización en el municipio de Sasaima provincia de Gualiva realizada el día 28/05/2025, junto con la profesional social del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, la señorita Alexandra Martinez.


Finalizando la semana se da reporte de los pendientes mediente correo electrónico enviado el 30/05/2025 a la Directora de Caminos para que realice la debida designación temporal de supervisión para Lote 4, por periodo de vacaciones entre el 31/05/2025 hasta el 25/06/2025. Dentro de lo cual se menciona el tema del tramo de Caparrapí, así como la aclaración mediante oficio ICCU-221-062 de la interventoría sobre el tramo que se encuentra priorizado en el Anexo Técnico, el cual no corresponde con el que se encuentran actualmente desarrollando.

Se le reitera al contratista y a la interventoría que la fecha de finalización de la Fase I y Fase II es el 10/07/2025, para lo cual se les recomienda entregar oportunamente los insumos de estas fases de acuerdo con los establecido en el anexo técnico.

10- ANEXOS

ACTA COMITE 5 - 16 MAYO 2025
ACTA COMITE 6 - 26 MAYO 2025
Informe Semanal-5
Informe Semanal-6
Socialización - Gualivá - 28 05 2025

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
LAURA DANIELA ALVARADO NIÑO	FUNCIONARIO / SUPERVISOR	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
	SUBDIRECTORA/SUBDIRECCION CAMNOS VECINALES	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	30 de mayo de 2025	

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	16/05/2025	**ACTA No.**	5
HORA DE INICIO:	09:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al quinto comité de seguimiento para el proyecto lote 4 de caminos vecinales. Reunión 16 mayo del 2025 Consorcio caminos vecinales.
-El ICCU presenta a la ingeniera Laura Alvarado quien será supervisora del lote cuatro y encargada del proyecto de la mano del ingeniero Wilson y la interventoría.
-El ICCU informa que se hacen hitos de revisión del proyecto cada 15 días para tener mejor control del desarrollo del proyecto
-Laura Alvarado se presenta como supervisora del lote cuatro
-La interventoría contextualiza a la ingeniera Laura Alvarado con las especificaciones del contrato Caminos vecinales.
-La interventoría informa que el comienzo de la obra se da con la firma del contrato el 10 de abril del 2025
-La interventoría informa que hay un avance de preliminares de 14,85%
-La interventoría informa que hay un avance de 2,87% del proyecto.

Componente ambiental

-La interventoría informa que el contratista viene realizando la caracterización ambiental la cual esta basada en la especificación de la zona a intervenir.
-La interventoría informa que el contratista entregó el informe ambiental el día 16/05/2025

Componente social

-La interventoría informa que se han venido adelantado el tema de las socializaciones de la etapa de caracterización.
-La interventoría informa que el contratista envió el modelo de las socializaciones
-El ICCU solicito reprogramar las socializaciones ya que cada región requiere una socialización individual.
-El Contratista Informa que el 4 y 6 de junio se pueden programar algunas de las socializaciones.
-La interventoría informa que el contratista remitió el informe social No1
-El contratista envió los formatos de las socializaciones.
-La interventoría informa que se debe cambiar la imagen del formato de Viani
-El diseño de la valla está siendo desarrollado.
-La interventoría solicito al contratista generar soporte de las actualizaciones que se han realizado en los temas anteriores.

Componente SST

-La interventoría informa que se remitió una circular informativa con relación a la prevención del contagio de la fiebre amarilla.
-La interventoría envió un oficio al contratista con unos requerimientos para el tema de PMT y maquinaria.
-La interventoría reviso el informe No 1 e indica que se generaron unas informaciones. Por parte del componente SST del ICCU se realizó una reunión donde se enviaron unos anexos que se deben subsanar en este informe.
-El contratista envió el informe subsanado el día 16 mayo 2025
-El contratista reporta un personal total de 22 personas
-La interventoría solicita la planilla del mes de abril y del mes de mayo
-La interventoría informa que son 14 personas quienes conforman el personal.

Componente técnico

-La interventoría informa la proyección programada del contrato indica que se tiene un acumulado programado ejecutado del 11,05 y va en 11,98
-En el periodo se tenía programado un 2,57 y se lleva ejecutado un 2,87
-La interventoría informa que para junio ya todos los tramos deben tener topografía lista
- El ICCU solicita una entrevista virtual con los alcaldes de los municipios para lograr aclarar los términos del contrato para evitar manejos de terceros en las socializaciones.
- El ICCU solicita ser incluido en las reuniones previas a las socializaciones que se realizaran con los alcaldes de los municipios.
-El contratista informa que se han reprogramado los recorridos de varios municipios ya que se han manifestado de parte de los alcaldes el deseo realizar la socialización en cada uno de los municipios.
-El contratista informa que hay programadas socializaciones en:

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	16/05/2025	**ACTA No.**	5
HORA DE INICIO:	09:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

Piani: 29 mayo
Puli y Gramalotal: 4 junio
Guayabal: 6 junio
-El Contratista informa que, en Bajo magdalena, Caparrapi y Puerto salgar pueden ser realizadas las socializaciones en conjunto.
-Wilson Garzón solicita que el cronograma social sea ajustado para que sea viable y evitar inconvenientes

Caparrapi
El Contratista informa que surgió una diferencia en la localización del tramo a intervenir ya que la entidad entrego unos datos inexactos. Donde se encontró un camino de difícil acceso cuyo único acceso es posible a caballo. Se solicito un sobrevuelo de un dron dado a la dificultad de acceso del tramo.
El contratista proyecta pruebas de la dificultad del camino. Informa que se hizo el recorrido de 5km. Informa que hay gran dificultad para el ingreso de maquinaria y materiales. Ratifica que la comunidad expresa favorabilidad para la intervención del tramo, pero expresa que se deba realizar una intervención previa donde se establezcan mínimos que permitan el desarrollo del proyecto
El contratista informa que envió a la interventoría un informe donde identifica un estimado de alcantarillas, obras de contención en los puntos donde ellos consideran viable una intervención.
Puerto salgar
El Contratista informa que el tramo ya tiene un total de 40 apiques realizados, topografía completada y se está realizando la geolocalización de este.
El Contratista informa que el tramo lleva un avance del 50% de caracterización
Alban
El Contratista informa que el día 16-05-2025 se culminan los trabajos de topografía
Quebradanegra
San Francisco
-El Contratista informa que hay una cuadrilla de topografía lista para comenzar actividades.
Sasaima
-El Contratista informa que hay una cuadrilla de topografía lista para comenzar actividades.
Beltran
-El ICCU informa que se va a realizar la topografía de honduras a sagramotal para lograr definir la abscisa cero para poder comenzar el desarrollar
-El Contratista informa que hace falta la muestra topográfica de 5,2 km e indica que la semana siguiente comenzaran el desarrollo de los apiques.
Bituima
-El Contratista informa que se finalizó la toma de información de topografía se espera remitir el plano definitivo a más tardar el viernes 16 de mayo
Puli
-El Contratista informa que en el tramo se encontraron varios km de placa huella lo que recaería en una expansión de longitud del proyecto.
San Juan de ríoseco
-La interventoría informa que ya se han recibido topografías con abscisado.
-La interventoría informa que en puli se comenzó la actividad de apiques
-La interventoría informa que la semana siguiente iniciara una nueva comisión para e desarrollo de los apiques para recolección de muestras
Guayabal de Siquima
-La interventoría informa que el tramo de 1,8 km de guayabal presenta un tema de inconformidad por parte de la alcaldía ya que la longitud no está conforme a lo que ellos requieren.
Viani
-Se finalizó la toma de información de topografía se espera remitir el plano definitivo a más tardar el viernes 16 de mayo

CONCLUSIONES









COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Mesa de trabajo entre Interventoría, Contratista e ICCU para coordinar disonibilidad de fechas para socializaciones	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / ICCU	**22/05/2025**
Programación de reunión con los alcaldes preva a las socializaciones	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	**22/05/2025**
Reprogramación de las socializaciones y reuniones con alcaldes e ICCU	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	**22/05/2025**
Desarrollo del diseño de las vayas informativas	CONTRATISTA	**22/05/2025**
Envio de datos topográfia zona Alban a la interventoría	CONTRATISTA	**22/05/2025**

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	16/05/2025	**ACTA No.**	5		
HORA DE INICIO:	09:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:00:00 a. m.		
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.				
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES				

Comienzo de actividades topográficas zonas: San Francisco - Sasaima	CONTRATISTA	**22/05/2025**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
MARIA DEL PILAR SUAREZ M - ICCU	pilar.suarez@cundinamarca.gov.co	
WILSON GARZÓN CIFUENTES - ICCU	wilson.garzon@cundinamarca.gov.co	
MARY PAOLA BELTRAN CAGUA	mary.vargas@agenciacundinamarca.gov.co	
JORGE MAURICIO CASAS VERA - GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ - DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MOTAÑEZ - RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	
SARAY DOMINGUEZ - GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
EIFER YESID RUIZ APONTE - RESIDENTE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
LAURA ALVARDO - SUPERVISORA	laura.alvarado@cundinamarca.gov.co	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	26/05/2025	**ACTA No.**	6
HORA DE INICIO:	11:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la presentación por parte de la interventoría con el seguimiento de los compromisos del acta No. 5

Componente ambiental

-La interventoría informa que el contratista enviara un avance del PAGA con la finalidad de ir recortando el avance, también recomienda realizar el inventario de lo que se ha encontrado a nivel ambiental en la totalidad de los tramos.

Componente social

-La interventoría informa que se recibió la programación para las socializaciones por parte del contratista. Se indicaron también las fechas de las siguientes socializaciones: Gualivá 28 de mayo a las 10:00am en la sede de la universidad Lasalle, Bajo magdalena 7 de junio a las 14:00 en la caseta comunal de Puerto Salgar y Magdalena centro el 4 de junio a las 10:00 en el auditorio Augusto Mogollón.

El día 24 de mayo del 2025 el contratista envió las presentaciones ajustadas a la plantilla enviada por la ingeniera Alexandra e indica que se está a la espera de comentarios por parte del ICCU

Componente SST

-La interventoría informa que no se han presentado accidentes de ninguna índole. Sin embargo, recomienda hacer un uso correcto de las protecciones personales y dotación de los trabajadores.

El contratista presenta un reporte de 25 trabajadores inscritos y la interventoría 15 trabajadores. Además, se realizó cambio de personal SST del contratista y la interventoría solicita una reunión para tratar el tema de SST con el nuevo profesional a cargo.

Componente técnico

La interventoría informa que a 22 de mayo se obtiene un ejecutado de 421.899.382,36 millones por parte del contratista de un total de 2.502.924.222,00 millones.

El contratista realiza la toma de datos de topografía en los tramos: Chimbe - Bagazal Municipio de Alban, Pilones Municipio de Q. Negra, La Y - Trinidad – Pie de Cuesta Municipio de Guayabal de Síquima, actividades que mejoran por parte del contratista con la incorporación de nuevas cuadrillas de topografía que muestran avance de obra en campo.

Caracterización - ejecución de apiques en los tramos: Reineres - Galápagos del municipio de Puerto Salgar actividad que se termina al 100%, Vianí - Molinos - Alto del Rosario del municipio de Vianí actividad que se termina al 100%, La Popa Pulí actividad terminada al 100%. y se inicia Bituima con un avance de 16 apiques de 44 en total.

Se realiza recorrido por parte de los especialistas de la interventoría con lo cual se evidencia las características visuales geotécnicas de cada uno de los tramos a intervenir y poder conocer posibles puntos críticos.

Se realizó visitas de campo con la profesional SIG ICCU, ingeniera Natalia Samaniego, con el fin de continuar la caracterización el tramo Bituima - Boquerón de Hilo.

Se presentaron dificultades de acceso en algunos puntos debido a lluvias presentes en los tramos.

La interventoría informa que los tramos más avanzados son: Vianí - Molinos - Alto del Rosario del municipio de Vianí, Reineres - Galápagos del municipio de Puerto Salgar y, La Popa Pulí, donde se lleva el 100% de las actividades de caracterización y recolección de muestras, dicho esto, se espera que en el mes de junio se comiencen a recibir los resultados de los laboratorios. Con dichos resultados la interventoría y el contratista realizaran mesas de trabajo para programar las actividades de construcción en estos tramos.

Caparrapi

El Contratista presenta un video donde se puede observar el estado del tramo TERREROS -TATI -CAPOTE - CAPARRAPÍ - BAJO MAGDALENA donde expresa las dificultades que ha encontrado y, según su consideración se debería replantear la intervención de éste, ya que no cuenta con las características necesarias para poder llevar a cabo las actividades de mejoramiento, lo que conllevaría a un sobrecosto general.

El ICCU solicita se realicen mesas de trabajo con los especialistas para realizar un análisis y una justificación técnica donde se presenten las características del corredor y se expresen específicamente cada uno de los inconvenientes encontrados, los cuales, soporten en dado caso, la modificación que sea necesaria en este tramo.

También solicita revisar el tema de predios ya que en el video se observa que el tramo atraviesa varios ingresos de supuestos predios privados.

La Interventoría indica que es necesario realizar un soporte técnico donde se exprese las necesidades puntuales que necesitaría este tramo al momento de ser construido y de mantenimiento ya que se encuentra en una ubicación con características climáticas inclementes.

CONCLUSIONES






Se presenta un porcentaje semanal programado de un 16,86% vs 19% ejecutado.







COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Entrega del Acta de comité No. 2,3 y 4 con visto bueno del ICCU, firmadas por contratista e interventoría el día 22 de mayo del 2025	ICCU	09/05/2025	

Acta de comité No. 5 se envió para revisión y firma de las partes el día 21 de mayo del 2025	CONTRATISTA	EN TRAMITE	**CUMPLE**
Pendiente enviar oficio de presentación del proyecto a los municipios de Sasaima, San Francisco y Quebrada Negra, el cual se radicará esta semana	ICCU	9/04/2025	
Mesa de trabajo especialistas para definir procedimiento en tramo Terreros Tatí en Caparrapí	CONTRATISTA	EN TRAMITE	
Aprobación y desarrollo del diseño de las vayas informativas	CONTRATISTA	EN TRAMITE	
Radicación de la programación	CONTRATISTA	26/05/2025	
Pendiente envió del PAGA actualizado	CONTRATISTA	EN TRAMITE	
Solicitar al contratista la actualización de los diferentes documentos con respecto a la firma del acta de inicio, como son programación, PAGA, personal obra, flujo de inversión, etc.	CONTRATISTA	EN TRAMITE	
Entrega del PMT para obra	CONTRATISTA	Remitido con radicado2025003780 del 04/04/2025	**CUMPLE**
Entrega solicitud anticipo contrato de obra	CONTRATISTA	Remitido con radicado 2025005104 del 7/05/2025	**CUMPLE**
Entrega solicitud anticipo contrato de interventoría	CONTRATISTA	Remitidos con radicado 2025005105 del 7/05/2025	**CUMPLE**
Contratación del Profesional de apoyo para el ICCU por parte de la interventoría	INTERVENTORIA	Remitidos con radicado ICCU-E-2025-0005386 del 15/05/2025	**CUMPLE**
Entrega de la programación del personal mínimo requerido de interventoría, para emplear en la etapa de caracterización y los documentos de vinculación como es el contrato y el pago de aportes.	INTERVENTORIA - ICCU	Remitidos con radicado 2025005103 del 7/05/2025	**CUMPLE**
Envio de topografía de las zonas ejecutadas	CONTRATISTA	22/05/2025	**CUMPLE**
Comienzo de actividades topográficas zonas: San Francisco - Sasaima	CONTRATISTA	22/05/2025	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
WILSON GARZÓN CIFUENTES - ICCU	wilson.garzon@cundinamarca.gov.co	
MARY PAOLA BELTRAN CAGUA	mary.vargas@agenciacundinamarca.gov.co	
JORGE MAURICIO CASAS VERA - GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ - DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MOTAÑEZ - RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	
SARAY DOMINGUEZ - GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	

EIFER YESID RUIZ APONTE - RESIDENTE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
MIRIAM SANCHEZ - AMBIENTAL INTERVENTORÍA	sanchezmyriam990@gmail.com	
MILENA SANCHEZ - SOCIAL INTERVENTORÍA	dmilenasanchezs@gmail.com	
DANIEL VELASQUEZ - SST INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
GLORIA HERNANDEZ - ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co	
ISAAC VARGAS - GERENTE INTERVENTORÍA	isaacvvargas@gmail.com	
MATEO MORENO - INSPECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
NELSON BORJA - INSPECTOR INTERVENTORÍA	nelsonb33@gmail.com	
LAURA ALVARADO - SUPERVISORA	laura.alvarado@cundinamarca.gov.co	

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI
INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código Formato: Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024**
Contrato No.	141-2025
Valor Inicial:	$ 28.220.954.599
Interventoria	**CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI**
Plazo Inicial:	8 MESES 21 DIAS
Otrosi Prorroga Nº1	
Plazo Final	
Fecha de Iniciación:	10/04/2025
Fecha Programada de finalizacion :	31/12/2025

Objeto

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Semana Número: 5 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 43 días

Supervisor del Contrato ICCU

Nombre del Supervisor Maria del Pilar Suarez Monzon

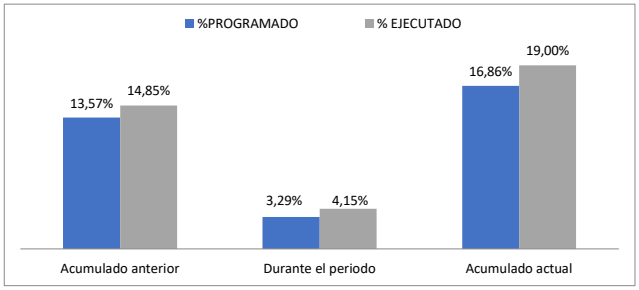
AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,29%	16,86%
Valor de la Obra programada:	$ 82.294.717,24	$ 421.899.382,36

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,15%	19,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 103.759.840,00	$ 475.362.097

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	13,57%	14,85%	2,13%
Durante el periodo	3,29%	4,15%	
Acumulado actual	16,86%	19,00%	



REGISTRO FOTOGRAFICO





ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Componente Ambiental:

- Se realiza seguimiento a las actividades de caracterización ambiental

-El 16 de mayo de 2025, la Interventoría remite oficio ICCU-221-053 dando respuesta al comunicado ICCU-141-057, presentado por el Contratista, al respecto del contenido del informe ambiental No 1 V2 de obra, dando el concepto de aprobación.

-El 19 de mayo de 2025, la Interventoría remite oficio ICCU-221-055 al Contratista de obra, solicitando el avance de la actualización de los PAGAS de acuerco con las actividades avanzadas en la caracterización ambiental.

Componente Social:

'El contratista continúa con la atención a la comunidad los días lunes de 8:00am a 5:00pm en la vereda del Trigo, igualmente se encuentran ubicados dos buzones de sugerencias en Reventones y Corralejas con el fin de que la comunidad presente sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Durante la semana no se recibieron nuevas PQRS.

Componente SST

Se realizan actividades en obra, con la gestión SST en: señalización de los frentes de trabajo, entrega y reposición de elementos de protección personal y capacitación e inducción a los trabajadores.

- Durante la semana se reportan 0 ingresos y 0 retiros de personal por parte del contratista.
- Por parte de la interventoría no se presentaron novedades de ingreso, ni retiros de personal.
- Se reporta por parte del contratista 0 ingresos y 0 retiros de maquinaria del proyecto.
- Se realizan pre operacionales a la maquinaria y equipo, e inspecciones SST de rutina
- Durante la semana no se reportan novedades de ausentismo laboral por parte del contratista, y 0 casos de accidentes e incidentes.
- Por parte de la interventoría no se presentan novedades de ausentismo, ni casos de accidente laboral.

Componente técnico

-El contratista realiza la toma de información de campo para recopilar datos de topográfica en los tramos: Chimbe - Bagazal Municipio de Alban, Pilones Municipio de Q. Negra, La Y - Trinidad - Puede Cuesta Municipio de Guayabal de Síquima actividades que mejoran por parte del contratista debido a la incorporación de nuevas cuadrillas de topografía que evidencian avance de obra en campo.

-Se realiza la toma de información de campo para la caracterización geotécnica mediante la ejecución de apiques en los tramos:Reineres - Galápagos del municipio de Puerto Salgar actividad que se termina al 100% , Viani - Molinos - Alto del Rosario del municipio de Viani actividad que se termina al 100%, La Popa-Pulí actividad temrinada al 100%. y se inicia Bituima con un avance de 16 apiques de 44 en total.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI** **INTERVENTORIA** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** Código Formato: Pagina 1 de 2	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI

-Se realiza recorrido por parte de los especialistas de la interventoría con lo cual se evidencia las características visuales geotécnicas de cada uno de los tramos a intervenir y poder conocer posibles puntos críticos.
-Se realizó visitas de campo con la profesional SIG ingeniera Natalia Samaniego, con el fin de continuar la caracterización el tramo Bituima - Boquerón de Hilo.
- Se presentaron dificultades de acceso en algunos puntos debido a lluvias presentes en los tramos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se tiene programado continuar actividades de topografia, inspección del estado de las vias terciarias y registro fotográfico de los tramos de los municipios de:
CAPARRAPI falta definir puntos de inicio y fin
SASAIMA, SAN FRANCISCO, SAN JUAN DE RIO SECO van al 50 %, BELTRAN faltan los 4Km adicionales.
Los demás tramos ya tienen trabajo de campo al 100%
Continuará la ejecución de apiques en el Tramo Puerto Salgar y Tramo Beltrán y Viani. Toma de muestras y envío a laboratorio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en la quinta semana de la etapa de caracterización, el cual y de acuerdo al PDT de caracterización aprobado por la interventoría, se presenta un avance de obra del 19% vs. un proyectado del 16,86%, presentando un avance general del 2,13%

PERSONAL - MAQUINARIA - EQUIPO EN OBRA

PERSONAL - MAQUINARIA - EQUIPO EN OBRA		MAQUINARIA - EQUIPO	
ANIBAL CASTRO	DIRECTOR DE OBRA	CAMIONETA 4X4	
ROBERTO JOSÉ GUERRERO	TOPOGRAFO	Equipo RTK triple frecuencia	
ANDRES CIFUENTES	OPERADOR RTK	HERRAMIENTA MENOR	
JUAN CARLOS MALDONADO	CADENERO	EQUIPO DE LABORATORIO:	CONO DINAMICO
CUADRILLA EJECUCION APIQUES	LABORATORISTA		MOLDES CBR INALTERADO
	PERFORADOR		HERRAMIENTA MENOR
	2 AYUDANTES		
	CONDUCTOR		

OBSERVACIONES

Anexo Registro Fotográfico

FIRMAS

Director de Interventoría

NOMBRE : JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
CONSORIO CAMINOS VECINALES CCI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

REGISTRO FOTOGÁFICO SEMANAL DE OBRA DEL 16 AL 22 DE MAYO 2025



Foto 7	**Actividad:** La interventroría hace acompañamiento durante la ejecución de apiques y toma de muestras en el Tramo 12 (VIANÍ), para carcaterización geotécnica de materiales por parte del contratista en el K5+200 AP#18.	Fecha: 21/05/2025



Foto 8	**Actividad:** Sector LA YE - TRINIDAD, la intervnetoría relaiza verificación de lecturas de los GPS en el tramo 11.	Fecha: 21/05/2025



Foto 9	**Actividad:** La interventoría realiza verificación de los estados de las obras hidráulicas en el tramo 11, evidenciando que la mayoría estan en mal estado y falta de mantenimiento.	Fecha: 21/05/2025



Foto 10	**Actividad:** La interventoría hace compañamiento durante la ejecución de los apiques en el sector 8 Boqueron	Fecha: 23/05/2025



Foto 11	**Actividad:** La interventoría hace compañamiento durante la ejecución de los apiques en el sector 8 Boqueron	Fecha: 23/05/2025



Foto 12	**Actividad:** Verificación por por parte de la topografía de la interventoría en las actividades realalizadas en el tramo SASAIMA (Tramo 6) el cual inició el 23 de mayo de 2025.	Fecha: 23/05/2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

REGISTRO FOTOGÁFICO SEMANAL DE OBRA DEL 16 AL 22 DE MAYO 2025

					
Foto 1	**Actividad:** La interventroría hace acompañamiento durante la ejecución de apiques y toma de muestras en el Tramo 12 (VIANÍ), para carcaterización geotécnica de materiales por parte del contratista.	Fecha: 21/05/2025	Foto 2	**Actividad:** Ejecución del ensayo de PDC, ensayo que permite determinar CBR in-situ en el Tramo 12(VIANÍ).	Fecha: 21/05/2025
					
Foto 3	**Actividad:** La interventoría realiza toma de muestras de los apiques, para posterior verificación de la carcaterización geotécnica de materiales encontrados en el tramo.	Fecha: 21/05/2025	Foto 4	**Actividad:** Perfil estratígrafico encontrado durante la ejecución de los apiques en el tramo 12.	Fecha:
					
Foto 5	**Actividad:** Interventoría hace acompañamiento a todas las actividades de topografía que se realizan en el tramo 11 (Guayabal de Siquima).	Fecha: 22/05/2025	Foto 6	**Actividad:** Verificación por por parte de la topografía de la interventoría en los puntos de coordenadas durante la ejecución de los trabajos de levantamiento topogáfico en el tramo 11 (La YE)	Fecha: 22/05/2025

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024**
Contrato No.	141-2025
Valor Inicial:	$ 28.220.954.599
Interventoria	**CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI**
Plazo Inicial:	8 MESES 21 DIAS
Otrosi Prorroga Nº1	
Plazo Final	
Fecha de Iniciación:	10/04/2025
Fecha Programada de finalizacion :	31/12/2025

Objeto

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Semana Número: 6 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 50 días

Supervisor del Contrato ICCU

Nombre del Supervisor Maria del Pilar Suarez Monzon

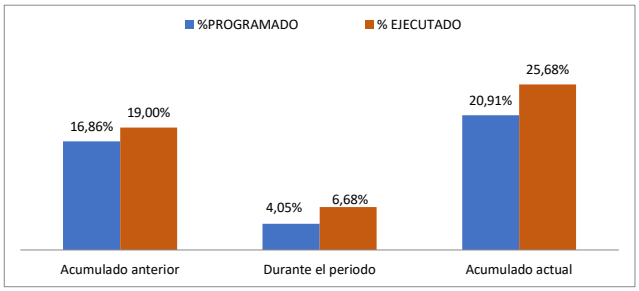
AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,05%	20,91%
Valor de la Obra	$ 101.343.461,42	$ 523.242.843,78

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,68%	25,68%
Valor de la Obra	$ 167.233.472,00	$ 642.595.569

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	16,86%	19,00%	4,76%
Durante el periodo	4,05%	6,68%	
Acumulado actual	20,91%	25,68%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Componente Ambiental: Se asiste a comité quincenal el 26 de mayo de 2025; se remite al Contratista de obra oficio ICCU-221-059 del 27 de mayo de 2025, solicitando el avance de la actualización de los PAGAS de acuerdo con el avance de la caracterización; el Contratista por su parte remite correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2025, presentando el avance del PAGA de la provincia BAJO MAGDALENA, la Interventoría realiza la revisión y con oficio ICCU-221-065 del 29 de mayo de 2025, remite al Contratista la revisión de la información y solicita ajuste y complemento.

Componente Social: El contratista envía para revisión de la interventoría y el ICCU las presentaciones para las socializaciones, las cuales fueron revisadas. Adicionalmente, se realizó acompañando a la reunión informativa realizada el 28 de mayo en la provincia de Gualivá.

Componente SST: El contratista reporta 2 ingresos y un retiro de personal, a la fecha se reportaron un total de 29 trabajadores, no se reportaron casos de accidente de trabajo tanto como del contratista como de la interventoría. por parte del componente mes se cuenta con Una retroexcavadora tipo pajarita de llanta JCB 214E, realizando actividades de apique. se hace seguimiento tanto por parte del contratista como la interventora de uso adecuado de EPPS; Se reciben los informes semanales y se realiza la aprobación por parte de la interventoría del informe 1 correspondiente a la fecha del 10 al 30 de abril del 2025.

Componente técnico: El contratista adelanta actividades de localización y replanteo en los tramos de Sasaima tramo 8, procesamiento de información de los datos recopilados en campo por parte de topografía. Por otra parte en el tramo 3 CHIMBE - BAGAZAL, el contratista realiza actividades de apiques, ensayo de PDC y toma de muestras para caracterización. Por último se realiza procesamiento de muestreo para envío a laboratorios con lo cual se procede con la caracterización geotécnica de los materiales encontrados por tramo y por apique mediante ensayos de laboratorio.
Alban:
Se realizan actividades de apiques y tomas de muestras entre las abscisas K0+000 y K8+700 con un total de 28 apiques.
Se realizó clasificación y rotulado de las muestras tomadas en campo para ser envidadas a laboratorio.
San Francisco:
Se realizó la toma de información topográfica donde se levantaron se levantan 4.65 km.
Se realiza la Reunión de inicio de la provincia de Gualivá con la participación de los Municipios Alban, Q. Negra, Sasaima y San Francisco con el acompañamiento de los Funcionarios del ICCU y la Interventoría.
Sasaima:
Se realizar actividades de apiques y tomas de muestras entre las abscisas K0+000 - K12+250 con un total de 44 apiques.
Se realizó clasificación y rotulado de las muestras tomadas en campo para ser envidadas a laboratorio.
Se realiza recorrido el tramo 06 Municipio de Sasaima, San Antonio - Alto del Oso - Las Mercedes, para verificar varios sectores del tramo, ya que el kmz enviado por el ICCU, son vías que conducen a fincas privadas y no tienen en cuenta la vía principal de las veredas, el recorrido se realiza

en compañía de un concejal del sector y la Presidente de la Junta comunal de la vereda santa teresa.
Beltrán
Se realizó la toma de información topográfica del tramo La Gramalotal - Honduras - Municipio de Beltrán, se levanta 1,8 km de topografía Adicional a lo contractual para un total de 5,3 Km.
Bituima:
Se realizó la toma de información topográfica del tramo con un total realizado de 12.4 km.
Se realiza la clasificación y rotulado de las muestras de suelos tomadas en campo.
San Juan de Río Seco:
Se realizó la toma de información topográfica del tramo La Libertad - Olivos Alto. se levanta 1,8 km de topografía.
Guayabal de Síquimia:
Se realiza el estudio de suelos en el tramo con un total de 8 apiques en este tramo.
Se ejecutó por parte del contratista de obra el levantamiento de todas las obras y posibles obras.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El contratista adelantará trabajos de campo en el sector San Juan de Río Seco, igualmente continua con trabajos de procesamiento de la información y elaboración de planos topográficos
Continuará con el traslado de las muestras al laboratorio para ensayos de clasificación de Puerto Salgar.
Se tiene proyectado finalizar con las actividades de campo el próximo martes y con ello quedará en ejecución sólo los ensayos de laboratorio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en la sexta semana de la etapa de caracterización, el cual , y de acuerdo al PDT de caracterización aprobado por la interventoría, presenta un avance de obra del 20,92% vs. un proyectado del 25.68%, presentando un avance general del 4.78%

PERSONAL - MAQUINARIA - EQUIPO EN OBRA

PERSONAL - MAQUINARIA - EQUIPO EN OBRA		MAQUINARIA - EQUIPO	
ANIBAL CASTRO	DIRECTOR DE OBRA	CAMIONETA 4X4	
ROBERTO JOSE GUERRERO	TOPOGRAFO	Equipo RTK triple frecuencia	
ANDRES CIFUENTES	OPERADOR RTK	HERRAMIENTA MENOR	
JUAN CARLOS MALDONADO	CADENERO	EQUIPO DE LABORATORIO:	CONO DINAMICO
CUADRILLA EJECUCION APIQUES	LABORATORISTA		MOLDES CBR INALTERADO
	PERFORADOR		HERRAMIENTA MENOR
	2 AYUDANTES		
	CONDUCTOR		

OBSERVACIONES

Anexo Registro Fotográfico

FIRMAS

Director de Interventoría

NOMBRE : JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
CONSORIO CAMINOS VECINALES CCI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

REGISTRO FOTOGÁFICO SEMANAL DE OBRA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2025





Foto 1	**Actividad:** La interventoría hace segimiento a los trabajos de levantamiento topográfico realizados en el tramo 6, Sasaima San antonio - alto el oso - las mercedes - - ruta café.	Fecha: 23/05/2025	Foto 2	**Actividad:** La interventoría hace segimiento a los trabajos de levantamiento topográfico realizados en el tramo 6, Sasaima San antonio - alto el oso - las mercedes - - ruta café.	Fecha: 23/05/2025





Foto 3	**Actividad:** La interventoría hace segimiento a los trabajos de levantamiento topográfico realizados en el tramo 6, Sasaima San antonio - alto el oso - las mercedes - - ruta café.	Fecha: 26/05/2028	Foto 4	**Actividad:** Interventoría realiza acompañamiento durante la ejecución de apiques y toma de muestras para caracterización en el tramo 8 Bituima	Fecha: 23/05/2025





Foto 5	**Actividad:** Interventoría realiza acompañamiento durante la ejecución de apiques y toma de muestras para caracterización en el tramo 8 Bituima	Fecha: 23/05/2025	Foto 6	**Actividad:** Verificación por por parte de la topografía de la interventoría en los puntos de coordenadas durante la ejecución de los trabajos de levantamiento topogáfico en el tramo 11 (La YE)	Fecha: 23/05/2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

REGISTRO FOTOGÁFICO SEMANAL DE OBRA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2025



Foto 7	**Actividad:** La interventoría hace segimiento a los trabajos de levantamiento topográfico realizados en el tramo 6, Sasaima San antonio - alto el oso - las mercedes - - ruta café.	Fecha: 27/05/2025



Foto 8	**Actividad:** Recorrido técnico por parte de los especilistas a todos los frentes de obra para conocer estado de las vias a intervenir.	Fecha: 24/05/2025



Foto 9	**Actividad:** Interventoría realiza acompañamiento durante la ejecución de apiques y toma de muestras para caracterización en el tramo 3 Chimbe - Bagazal	Fecha: 28/05/2028



Foto 10	**Actividad:** Interventoría realiza acompañamiento durante la ejecución de apiques y toma de muestras para caracterización en el tramo 3 Chimbe - Bagazal	Fecha: 28/05/2028



Foto 11	**Actividad:** Interventoría realiza acompañamiento durante la ejecución de apiques, ensayo de PDC y toma de muestras para caracterización en el tramo 3 Chimbe - Bagazal	Fecha: 28/05/2028



Foto 12	**Actividad:** Interventoría realiza acompañamiento durante la ejecución de apiques, ensayo de PDC y toma de muestras para caracterización en el tramo 3 Chimbe - Bagazal	Fecha: 28/05/2028

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	28/05/2025	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	10:00AM	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:00PM
LUGAR DE REUNIÓN:	UNIVERSIDAD LA SALLE - LA ISLA, MUNICIPIO DE SASAIMA		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

PROYECTO:INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 4

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el marco del proyecto de intervención de vías que conforman el Programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse en la Provincia de Gualivá, en el Departamento de Cundinamarca, se llevó a cabo la socialización inicial con el objetivo de informar las principales características del contrato y los componentes técnicos, sociales y ambientales del proyecto, con el siguiente orden del día:

1.Apertura y presentación de las características del contrato.
2.Presentación de la entidad contratante.
3.Presentación del contratista.
4.Presentación del interventor.
5.Características técnicas del proyecto.
6.Componente ambiental.
7.Componente social.
8.Componente de seguridad y salud en el trabajo (SST).
9.Espacio para inquietudes y/o comentarios.
10.Cierre.

La socialización contó con la participación de representantes del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), la interventoría Consorcio Caminos Vecinales CCI y el contratista Consorcio Caminos ICCU 2024, quien presidía el encuentro. Como invitados se convocó a los mandatarios de las Alcaldías Municipales de Albán, Sasaima, Quebrada Negra y San Francisco y sus comitivas, así mismo se extendió la invitación a las comunidades de estos municipios, mediante oficios y fichas comunicativas enviadas con antelación vía correo electrónico, difundidas por algunas de las administraciones locales.

De acuerdo con el orden del día señalado, se abordó cada uno de los puntos allí inscritos, realizando la presentación general del proyecto, en el cual se verán intervenidos cerca de 118,69 km de vías en 12 municipios de las provincias de Magdalena Centro, Gualivá y Bajo Magdalena. Las fechas de ejecución están previstas entre el 10 de abril de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, con un presupuesto total de $28.220.954.599 asignado al contrato de obra ICCU-141- de 2025 y $3.865.474.620 asignado al contrato de interventoría ICCU-221 de 2025.

El proyecto incluye la mejora de infraestructura vial utilizando tecnologías innovadoras (Norma INVIAS) para fomentar el desarrollo sostenible y el bienestar social. Como parte del proceso se consideran las fases de diagnóstico y caracterización vial, caracterización de materiales y propuesta de intervención en vías, y finalmente, la intervención vial.

Se socializaron generalidades sobre los programas que conforman el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), el Plan de Gestión Social, el Plan de Manejo del Tráfico (PMT) y el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Como aspectos a resaltar se compartió con la comunidad la Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s) de forma general y el manejo y disposición de residuos. En el componente social se invitó a la comunidad a participar en el Comité de Participación Comunitaria (CPC), así mismo se socializaron los canales de comunicación con el proyecto, quedando como primer punto de contacto la profesional social del contrato de obra. Esta primera parte de la socialización concluyó con información sobre la indumentaria que identifica a los colaboradores de la obra y la interventoría, y, la señalización de la cual se hará uso una vez iniciada la intervención vial.

Posteriormente, se dio paso al espacio de dudas, inquietudes y comentarios. Allí participaron personas de las comunidades invitadas, líderes de las zonas y algunos alcaldes. Este espacio se abrió por cerca de una hora y se realizaron dos bloques de preguntas. En total se contó con la participación aproximada de 15 participantes. Las dudas referidas por la comunidad fueron solventadas por los profesionales del contrato de obra, interventoría e ICCU.

En este proceso se intentó responder con claridad y pertinencia a las dudas enunciadas; se aclararon temas relacionados a las fases del proyecto, los canales de comunicación, el proceso a través del cual se seleccionaron los tramos de intervención, el estudio de suelo a realizar para definir los materiales a usar, la posterior realización de actas de vecindad, la recolección de RCD´s inherentes a la intervención vial, entre otros temas derivados de estos. Así mismo se invitó a las personas a compartir las inquietudes pendientes y venideras a través de los canales de comunicación compartidos y gestionados desde el componente social por la profesional de dicha área. Algunas de estas inquietudes fueron:

1.¿Se puede ampliar la longitud de los tramos seleccionados a fin de favorecer zonas cercanas como escuelas?
2.¿Qué impacto ambiental tienen los químicos que se planean usar en el mejoramiento de la vía?
3.¿Se pueden conformar veedurías ciudadanas para realizar seguimiento de las obras?
4.¿A través de qué números se puede comunicar la comunidad con el contratista, la entidad o la interventoría?
5.¿Qué materiales serán usados para la intervención de las vías?
6.¿Cuándo inicia el contrato de obra?
7.¿En qué estado debe la comunidad entregar la vía?
8.¿Se pueden compartir con la comunidad las diapositivas presentadas?
9.¿Qué sucede con las viviendas que se encuentran cerca de los tramos a intervenir?
10.¿Cómo funciona la intervención en los tramos donde existe placa huella?
11.¿Se puede colocar más cantidad de canecas para disponer adecuadamente de otros residuos?
12.¿Cómo es el proceso de contratación para la mano de obra no calificada?
13.¿Cuál es el peso máximo que puede soportar el tramo intervenido?
14.Una vez intervenidos los tramos ¿Cuánto tiempo se conserva el mejoramiento?

Se contó con la participación del profesional de la interventoria para recalcar aspectos relevantes a la estabilización del suelo, al respecto, se indicó que el mejoramiento de las vías soporta cargas medianas, y que debe controlarse y/o evitarse el tráfico de cargas pesadas con el objetivo de sostener a largo plazo la intervención vial. Igualmente, en esta participación se ratificó el uso de nuevas tecnologías, con el uso de agentes químicos para el mejoramiento del suelo y el proceso de experimentación que se debe realizar para definir de manera concreta el material que será usado. Este último aspecto también fue retomado por la profesional social de la entidad, quien, en términos más familiares resumió estas primeras etapas del proyecto. Se comprendé que, al hacer uso de una metodología innovadora es pertinente aclarar a la comunidad este tipo de aspectos, a fin de situar expectativas reales sobre el proyecto. En paralelo a este espacio se realizaron compromisos, como el envió del archivo de la presentación a las administraciones locales, a fin de que pueda ser compartida con las personas de la comunidad interesadas. Otro compromiso estuvo relacionado con la conformación del Comité de Participación Comunitaria, en donde se establecerá comunicación con líderes, presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y actores interesados en participar; también los asistentes comentaron su iniciativa para conformar veedurías, aspecto que fue motivado, reconociendo que este es un derecho de la ciudadanía.
Una vez concluido el espacio de las inquietudes y preguntas se dio cierre a la socialización, agradeciendo a los participantes por su participación, recalcando la apertura de los canales de comunicación socializados e invitando a la comunidad a tomar un refrigerio.

CONCLUSIONES

En general, la comunidad mostró gran interés en el proyecto, planteando dudas e inquietudes que se respondieron de manera oportuna por los representantes del contrato de obra, la interventoría y la entidad. En este aspecto se refleja una recepción positiva para involucrarse, tener conocimiento del proyecto y estar al tanto de los avances de este, lo que eventualmente retroalimentará el Comité de Participación Comunitaria.
Igualmente se ratificó a la comunidad la apertura de los canales de comunicación oficiales para aclarar inquietudes venideras. Esto a fin de tener una línea de contacto clara a través de la cual se pueda llevar una trazabilidad de las solicitudes elevadas.
Finalmente, la jornada de socialización sentó un diálogo bidireccional entre todos los involucrados, logrando el objetivo puntual de socializar a la comunidad, las administraciones locales y demás involucrados las generalidades del proyecto a ejecutar.
A este documento se anexa:
1. Listas de asistencia.
2. Evidencia fotográfica.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Compartir la presentación con las administracones locales a solicitud de los asistentes	03/06/2025
Contactar a líderes y presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) para la conformación del Comité de Participación Comunitaria (CPC).	03/06/2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA

FORMATO	GPS-S33-04	V.1 Fecha Modific.vigente 02-2024
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	ICCU	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA: 28/05/2025 | TEMA: Primera socialización Gualivá - proyecto caminos vecinales, comino para quedarse

LUGAR: Sasaima - Universidad la salle - la isla.

No.	C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO Cédula	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		15950465	Alberto Lopez.	Sta Tereza.	3118196401	Sta Tereza.	x	Alberto Lopez
2		3296628	Jairo Urrego.	Guanc	320 2139308	Guanc		
3		1070.782.3	Luisa Martinez	Sta teresa	3005723641	Sta teresa		Luisa Fdo Martinez M
4		3166079	Luis Calderon	los Mercedes	3112282851	los Mercedes		
5		3166673	cesar Molina	San Bernardo bajo	3162467523	las Mercedes		cesar Molina
6		74280205	Alderma Bohorquez	limonal	311296 1775	limonal	x	
7		20915297	Maria Gineth Cantillo	San Bernardo Bajo	3163617279	J.A.C. San Bernardo Bajo		Claudia.
8		19478774	Jorge E. Bernardo	Junta D Acción Comunal	3159172018	San Bernardo Bajo		
9		70720030	ALBERTO BOTERO E	SAN BERNARDO BAJO	3214589409	SAN BERNARDO		
10		4274066	San Bernardo Bajo	Victor Pinzon	320 4955380	San Bernardo		Victor Pinzon
11		16251861	Edgar Cadena	San Bernardo bajo	3166937542	San Bernardo bajo	Cadena.edgar@gmail.com	
12		3246658	Hernan Pabon	guanc	3202486059	guanc		Hernan pabon
13		3246014	Sandra Patricia	guayabal	3157641649	guayabal		
14		19317890	Gilberto Martinez	Sta teresa	3114817385	Sta teresa		
15		51802505	Ana Quiroga Cortes	Sta teresa	3176797139.	Sta teresa		

FORMATO	GPS-033-04	V.1. Fecha Modificación 07-2025
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	ICCU	CONTRATO CAMINOS ICCU 2024
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA: 28/05/2025 | TEMA: Primera. Socialización Gestiva - proyecto caminos veredales, caminos para quedarse.

LUGAR: Sasaima - Universidad La Salle - la Isla.

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		20916869	María Guarin.	Presidente JAC	3202042205	Santa Teresa	mbquiman96@gmail.com	María Guarin.
2		1077973128	ANA SUAREZ	REPRESENTANTE LAS MERCEDES	3042085048	LAS MERCEDES	laasistente@ghot.com.	ANA S.
3		19490931	JORGE ANTULIO SIERRA	SANTO TERESO	3057044594	SANTO TERESO	jorgesire@gmail.com	
4		11425900	Tito Bohorquez	Comunidad.	310 237 9459	Guane	titobo@gmail.com	
5	CC	1.030.638.710	Javier Bernal Correño	Santa Teresa	313 428 2045	Santa teresa	Javier bernal 1603@g.	
6		41790430	Flor Alba Correño	Santa Teresa	316 304 6364	Santa Teresa	flor.correno 018@gmail	Flor Alba Correño
7		79467168	Oscar Daniel	JAC. Stateresa	3107736591	Sta teresa	donyboy26@gm	
8		51.563.453	Lucila Ramos	JAC STATeresa	3142456105	STA Teresa		Lucila Ramos
9		20945500	Gloria clemencia Rojas	Santa teresa	3245847462	Sta teresa		Gloria C Rojas
10		79736269	JAIRO ARTURO SANCHEZ	SAUTA TERESA	3152256108	SAUTA TERESA	jairosanchez5@hotmail.com	JAIRO SANCHEZ
11		4283210	Manuel Tibaviza	Santa Teresa	3115482563	Santa Teresa	X	Manuel Tibaviza
12		39688563	yanett Suarez R.	Santa teresa	3178670244	Santa teresa	yanett STA.	yanett Suarez R.
13		20.914720	Ana Sofia Forero R	STA Teresa	3015070841	STA Teresa	X	Ana Sofia Forero R
14		39525.053	Ana Isabel Forero	Sta teresa	3024677799.	STA teresa		Ana Isabel Forero R.
15		1070981334	Wilmer Manrique.	Sta Terezan	3045784561.	Sta Terezan	alexandradiaz@	

FORMATO	GPS-S33-04	V.1. Fecha Modificación 28.02.2025
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	ICCU	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA: 28/05/2025 | TEMA: Primera socialización Guatiguará - proyecto caminos vecinales, caminos para quedarse.

LUGAR: Sasaima - Universidad La Salle - La Isla

No	DOCUMENTO C.C TI C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	4.313.481	JAIME CASTILLO G	FINCA SAN JOSE	3153494631.	GUANE	jaimecastillopalo	
2	CC	20926582	[illegible]	Vereda Santa Rita	3077547450	Santa Teresa		
3		39525340	Gloria Mª Sierra R.	Finca San Miguel	3103399234	santa tereza.	gloriam.sierra18@gmail	
4		24613131	Adryda de Castillo	Finca San José	3165249045	Guane		
5	CC	1.420.502	Yesid Tirat	Finca Salitre	3138028883	Santa Teresa	tonsiye@lasalle.edu	
6	CC	1.070.781.656	Florangel Moreno	Finca San Isidro	3133751745	Alto del oso	florenceno@hotmail	Florangel M.
7		3.243.332	Juan de Dios Cañon	Finca San Isidro		ALTO del oso		
8		20.919.453	Cecilia Cañon	Finca San Isidro	3142362705	Alto del oso	Cecilia Bodegas	
9		3166952	[illegible]	La Cruz	3154411210	ALTO del oso		
10		1070941246	Jenifer Pena	La Cruz	3186100761	ALTO DEL OSO	Jenifertarena0214@	
11		382310	FACUNDO AYALA	SAN BERNARDO BAJO	3133021832	PAQUEMAS		
12		1070781089	GINA AREVALO	EL MILAGRO	3224650272	ALTO DEL OSO	GINAAREVALO2009@gmail.com	GINA AREVALO.
13		1130484153	camilo Monroy	San Isidro	3166281810	ALTO DEL OSO		
14		3166629	carlos Cañon	la cruz	3145482877	ALTO del OSO		Juan Cañon
15		3117010	JOSE [illegible]	SANTA TERESA	3115514114	SANTA TERESA	[illegible]	

FORMATO	GPS-333-04	V. 1. Fecha Modificación 02-2024
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	ICCU	CONVENIO CAMINOS ICCU 2024 ICCU
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA: 28/05/2025 | TEMA: Primera socialización Gualivá - proyecto caminos vecinales, caminos para quedarse.

LUGAR: Sasaima- Universidad La Salle-La Isla

No	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		/	Amparo Camelo S.			Vereda Aguafría	amparoCamelo	
1			Amparo Camelo S	Quebradanegra JAC Aguafría	3124681058	Vereda Aguafría	amparoCamelo28@gmail.com	Amparo Camelo S
2		19281531	Luis Osorio	Vd. Alto Oso	3143434054	Vereda Alto Oso		
3		20945424	Gladys Monro	Vd. Alto Oso	3193207255	Vereda Alto Oso		
4		51644158	Laura Herchán A	JAC Pilones Florestal QN.	3158517493	Pilones QN.	tialauramer@gmail.com	
5		19133914	Jose Ramón Reyes G	JAC Centro y Cabecera Mpal	3106737620	Vda centro y cabecera Mpal Quebradanegra	jrmonreyes@yahoo.com	
6		20915276	Sara Segura.	JAC. Candelaria baja	3114547203	Vereda la candelaria		Sara Segura
7		6769432	Jose Balaguera	JAC Candelaria	3203058480	Vereda la candelaria	J.balaguera7@gmail	
8		5557744	Gabriel Ayala	Sall Bernardo B.	3115019731	Vereda San B.	-	Gabriel Ayala
9		3137368	Orlando Ortiz	JAC. pilones	3105842802	Vda pilones	Carlos.ecarto@gmail.com	Carlos Ortiz
10		1030679719	William Sebastian Hernandez	Quebradanegra Florestal	3138372895	Vda Pilones	Wallos972017@hotmail.com	
11		357703	Carlos H Barragan	QINegra Forestal	3129366458	Vda Stabarbara	carlosHerbeydo Barragan@gmail.com	
12		20914028	Gladys G	San bernardo	3214656256	San bernardo Baja		
13		20914282	Rosa. Guevara	San bernardo Baja	3133836810	San bernardo Baja		Rosa. Guevara.
14		19145187	Carlos Romero	San Bernardo Baja	3215875977	San Bernardo Baja		
15		31656056	Yuraicita Rodriguez	S. Bernardo Baja	3213735092	San Bernardo Baja		

FORMATO	QPS-S33-04	V. 1. Fecha Modificación 28.02.2025
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	ICCU	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA: 28/05/2025. TEMA: Primera socialización Gratuita - proyecto caminos vecinales, caminos para quedarse.
LUGAR: Sasaima. - Universidad la salle. - la isla.

No	DOCUMENTO C.C T.I C.E	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		6496343	Darío Arios Montoya	Urbanización Sta Cruz	3052577083	San Bernardo bajo	Dariodej32@Hotmail.com	
2		79'104128	Diego Vera Mario	Urbanización Sta Cruz	320 - 2470923.	San Bernardo bajo	Diegoveramario@gmail.com	
3		6081423	Hzlo Araujo	Vereda Santa Ana.	310 - 6167655	Vereda Santa Ana.	araujoralo hotmail	
4		6405178	Pablo Emilio Bonilla	" " "	315 3690129	Santa Ana	Pablo5499-yahoo.com	
5		19206244	Antonio Villa R.	Vereda Sta. Teresa	3116609143	Sta. Teresa	antonioVillaRopera@yahoo.com	
6		1911441911	Israel de Jesus	Guaque.	3173625468	Guaque.		
7		41691443	Vicky Sierra	V. Santa Teresa	3003562470	Sta teresa	Vicky Sierra599	
8		3166111	Ricardo Gonzalez	V. Santa teresa	3115080938	V santa teresa	Ricardo.gonzalez.diaz2@gmail.com	
9		39523152	Eléso Amaya	V. Santa teresa	3002040318	V Santa teresa	- -	Eleso
10		1041966	Elicer Amaya	Santa Teresa.	3134058808	Santa Teresa.		
11		19148107	Jorge Rodriguez	Piloney	3102609787	Piloney	medianajinterne.jorgerodriguez@Gmail	
12		39954	Merry Zamora	Asojuntas.	3105546437	Quebrada.	agroesperanza120@gmail.com	
13		20843478	Alicia Ortiz T	JAC santabarbora	3212190294	Quebrada	aliciaortiztia@gmail.com	
14		3458854	Pedro Montero	Aguafria	3505315159	Aguafria	pedropablomontero1954@hotmail.com	
15								

FORMATO	GPS-533-04	V.1. Fecha Modificación:29.02.2025
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	ICCU	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA: 28/05/2025 | TEMA: Primera socialización Gratuita - proyecto caminos vecinales, caminos para quedarse

LUGAR: Sasaima - Universidad La Salle - La Isla.

No	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		28787647	Eliecenia Arevalo e.	Alto del oso	3197220553.	vereda quebrada alto del oso	asol032@hotmail.com	Eliecenia Arevalo.
2		11428960	José Arturo Soto	"	3108145750	"	"	
3	CC	1077089358	Juan David Calderón	Santa Teresa	3132870573	Cuatro caminos Santa Teresa	IDCAST@GMAIL.COM	
4		9846	Dubel Alexis Zabal San Bernardo		3209051790	Bernardo Bajo	98456736	Dubel Alexis Zabal
5		19365090	Golberto Rodríguez	San Bernardo bajo	3107799476	San bernardo bajo	Gilrodriguez5312@	
6		20915952	Luz Dary Siguenza R	Participante de la misa Tecnica de desplazados	3204529448	San bernardo bajo	Luzrobayo53@gmail.	
7		20916460	Sandra Sanchez	San bernardo bajo	3149920582	San bernardo bajo	Sandysanchez32	
8		20914651	Oliva Arboleda	San bernardo bajo	3149920581	San bernardo bajo		Oliva Arboleda
9		moises	Villa	16111805	santa teresa			
10		3114545	Salatiel poveda	Guane	3123585392	Guane		Salatiel poveda
11	CC	1940167	Ivan Ortega	Fca Albacerrada	316 489 1312	ota Teresa	ijortega@outlook.com	
12		19086774	Jairo Vargas	Jardin del Agua	3102179720	sta Teresa	JVR2949@Gmail.com	Jairo Vargas
13								
14								
15								

FORMATO	GPS-S33-04	V.1, Fecha Modificación:28.02.2025
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	ICCU	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA	28/05/2025	TEMA	Primera sociallzación Gualivá - proyecto caminos veredales, caminos para quedarse.
LUGAR	Sasaima - Universidad La Salle - La Isla.		

No.	DOCUMENTO C.C TJ C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	1	1070981575	Jorge Evaristo castro	.	3014939468	vereda Santa Teresa	jorgeevaristo2.07@gmail.com	Jorge castro
2	7	306.418	José Rojas	JAC	3223678105	alto del Oso		José Rojas
3		84566326	Javier Robayo					
4		20915533	MARIA Adelfa Calderon		3138183344	San Bernardo Bajo		MARIA Adelfa Calderon
5		25126086	Rosa Elena Robayo	J AC	3165862787	S bernardo bajo		Rosa Elena Robayo
6		1015995304	HOOBER ARIAS		3142521785	S.bernardobajo	hooberye@gmail.com	
7		38205	[illegible]		3152852690	S bernardo B		[illegible]
8		20914619	carmen luz Calles		3152852690	San bernardo B		Carmen luz Calles
9								
10		20916062	Rosa Morales		3142050995	San Berdo Bajo		Rosa morales
11								
12								
13								
14								
15								

FORMATO

FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

GPS-SSO-04 | V.1 Fecha Modificación 05 02 2025

ICCU | CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024

FECHA: 28/05/2025 | TEMA: Primera socialización Cualiyá-proyecto caminos vecinales, caminos para quedarse

LUGAR: Sasaima – Universidad La Salle – La Isla.

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	VEREDA/CORREGIMIENTO/CENTRO POBLADO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1			HERMES CALA CALA	VEREDA ALTO DEL OSO	321 205 3510	ALTO DEL OSO	hermes.cala@hotmail.com	3246132 Hermes Cala
2			Angel M. Hernandez	Junta Accion C. Sta Teresa	cc 4237578	Vda Sta Teresa -	Diego.3155	
3			Hermencia Pulido	Alto del Oso	20970414	Alto del Oso		Hermencia Pulido
4			Antonio Sanchez	Alto del oso	3127898344	Alto del Oso		Antonio Sanchez
5			Liz Miryam Casallas M	Alto del Oso	3188955339	Alto del oso	miryamcasallasm@gmail.com	Liz Miryam C.M.
6			Laura Garcia	Alto del oso	42.767.988	Alto del oso laurisgarcia@hotmail.		
7			Carlos Mario Sanchez	Alto del oso	3114866516	Alto del oso	mariosanchez0379@gmail.com	Carlos M Sanchez
8			Yolanda Morales	ALTO del oso	3161854038	ALTO del oso	yolandamorales2003@gmail.com	Yolanda M.
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

FORMATO	GPS-533-12	V.1. Fecha Modifificación28.02.2025
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		

FECHA: 28/05/2025

TEMA: SOCIALIZACIÓN INICIAL EN LA PROVINCIA DE GUALIVÁ SOBRE EL ROYECTO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 4







