CONTRATO No. 186-2025 CONTRATISTA CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL TIPO DE CONTRATO: OBRA ☑ CONSULTORÍA ☐

TIPO DE INFORME MENSUAL X No. 03 PARCIAL No. LIQUIDACIÓN ____

VERIFICACIÓN DE ANEXOS DEL INFORME MENSUAL, PARCIAL O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA O CONSULTORÍA(INTERVENTORIA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	INFORME MENSUAL	Requisito parcial 1 (Primer pago)	Requisito (otras parciales)	Requisito FINAL - ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN	Cumple	No cumple	N/A	Observación
1	Acta de Socialización o Listado de asistencia de socialización del Proyecto con la comunidad beneficiada.	Primer mes	X	N/A	N/A			X	Se relacionó en informe mensual 02
2	Soporte de Instalación Valla del proyecto (Cuando se trate de un proyecto de inversión del SGR, (Portada)	Primer mes	X	X	X	x			
3	Cantidades ejecutadas: precisando presupuesto inicial, modificatorias, parciales y cantidades finales ejecutadas firmadas por el interventor y contratista de obra. Incluir medio magnético del informe.	X	X	X	X	X			
4	Informe HSE empresa contratista (informe de SST mensual, Charlas de seguridad, entrega de dotación, revisión de equipos y Herramientas, etc), Formato FT-MAA-SST-94 y Formato FT-MAA-SST-72 cuando aplique.	X	X	X	X	x			
5	Relacion de personal y Nominas mensuales debidamente firmadas.	X	X	X	X	x			
6	Planillas de pagos al sistema integral de seguridad social: salud, pensión, ARL, SENA, ICBF, caja de compensación familiar, FIC.	X	X	X	X	x			
7	Certificado de cumplimiento de pagos al sistema integral de seguridad social: firmado por el representante del interventor o contratista y contador publica o revisor fiscal	X	X	X	X	x			
8	Bitácora de obra	X	X	X	X	x			
9	Registro fotográfico: con referencia de la fecha, lugar y actividad registrada.	X	X	X	X	x			
10	Informe mensual o final de **inversión Anticipo** firmado por el R/L de contratista y la interventoría.	X	X	X	X			x	
11	Soportes de costos directos (consultoría): - Copia Contrato Vehículo, topografía, etc.	X	X	X	X			x	
12	Certificado de productos (materiales instalados)	N/A	X	X	X			x	
13	Certificado de cumplimiento expedido por el interventor y/o supervisor: FT-MAJ-SI-10 o FT-MAJ-SI-11 (según aplique)	N/A	X	X	X			x	
14	Certificado de calidad de los bienes y servicios contratados: En el que el representante del contratista y el interventor dejen constancia del cumplimiento de calidad de los materiales, especificaciones técnicas y método constructivo exigidos por las normas técnicas obligatorias. El cual debe referenciar y adjuntar los certificados de calidad del fabricante o proveedor, ensayos de densidades y certificados de laboratorio según la naturaleza de los ítems contratados.	N/A	X	X	X			x	
15	Plan de pagos para proyectos del SGR - SSF, Programados en el SPGR, Aprobado	N/A	C/Aplique	X	X			x	
16	Correspondencia enviada y recibida.	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X	x			
17	Memorias de cálculo finales: firmadas por el director de interventor y el director del contratista de obra.	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X			x	
18	Protocolos de equipos	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X			x	
19	Garantía de equipos	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X			x	
20	Permisos de paso actualizados y/o por cambios en el trazado Permisos especiales (cuando aplique)	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X			x	
21	Relación de usuarios por vereda (Nombre, cédula, coordenadas (georreferenciación)	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X			x	
22	Planos de lo construido(medio físico y magnético) y/o de ejecución en DWG - GDB (para el área de Planeamiento de Gas)	N/A	X	X	X			x	
23	Planos record (medio físico y magnético) Cartera topográfica, Copia de planos iniciales (Diseño), **Nota**: Los planos de proyectos de redes de distribución de Gas deben entregarse al área de Planeamiento de GAS, quien expedirá certificación del recibo de información.	N/A	N/A	N/A				x	
24	**Distribucion Energia**: Certificación de conexión: al SDL (FT-MDE-OSE-08: Aprobación de Conexión al SDL). **Distribución Gas**: Certificación de Entrega - Formato FT-MDG-OSG-13: Puesta en Operación de Infraestructura de GND.	N/A	N/A	N/A	X			x	
25	**Distribucion Energia**: - FT-MAGA-GAC-10. Acta de entrega de activos eléctricos nuevos - FT-MAGA-GAC-11: Acta de activos eléctricos desmantelados **Distribución Gas**: Certificación de entrega de las Unidades constructivas (Anexo del Formato: FT-MDG-OSG-13: Puesta en Operación de Infraestructura de GND).	N/A	N/A	N/A	X			x	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	INFORME MENSUAL	Requisito parcial 1 (Primer pago)	Requisito (otras parciales)	Requisito FINAL - ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN	Cumple	No cumple	N/A	Observación
26	Distribucion Energia: Soporte de creación de nodos eléctricos. - FT-MDE-CSE-05-Novedades de Digitalización de Redes	N/A	N/A	N/A	X			x	
27	Soporte de ingreso y registro en el sistema de administración de recursos físicos de ENERCA.(cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	X			x	
28	Distribucion Energia: Relación de usuarios por transformador, incluir datos del equipo, serial y potencia.	N/A	N/A	N/A	X			x	
29	Distribucion Energia: Relación de transformadores: coordenadas de transformadores (En los planos indicar el número de serie según instalación)	N/A	N/A	N/A	X			x	
30	Distribucion Energia: Certificado o dictamen RETIE y RETILAP de acuerdo a la condiciones contractuales. Distribucion de gas: Certificados de competencia de los instaladores, Sena - certificados de registro ante la SIC. Carta(s) mamográfica(s) de la prueba de hermeticidad de la red construida por 24 horas firmada por obra e interventoria. Lista de chequeo de cumplimiento NTC GAS firmado por la interventoria	N/A	N/A	N/A	X			x	
31	Paz y salvo de trabajadores. Paz y salvo o certificación del ministerio del trabajo. Nota: Para la consultoría (Paz y salvo con copia de Matrícula o tarjeta Profesional de los profesionales Vinculados a la consultoría.)	N/A	N/A	N/A	X			x	
32	Certificado de paz y salvo del contador o revisor fiscal.	N/A	N/A	C/Aplique	X			x	
33	Certificación del interventor de cumplimiento del producto, metas e indicadores del proyecto según ficha MGA y GESPROY.	N/A	N/A	N/A	X			x	
34	Certificado de cumplimiento ambiental emitido por interventoría. (sí el proyecto cuenta con resolución de aprovechamiento forestal, se debe anexar el informe respectivo concordante con dicha resolución)	N/A	N/A	N/A	X			x	
35	Acta de recibo de la comunidad o acta de cierre de proyecto con participación de la Comunidad	N/A	N/A	N/A	X			x	
36	Certificación de cancelación de la cuenta bancaria del Anticipo, Certificación bancaria de los rendimientos financieros generados y devolución de rendimientos financieros - Comprobante de ingreso expedido por la tesorería de Enerca.	N/A	N/A	N/A	X			x	
37	Acta de recibo del municipio y/o empresas públicas (cuando aplique) FT-MAGA-GAC-06 Acta de Entrega institucional	N/A	N/A	N/A	X			x	
	DOCUMENTOS CONTRACTUALES PREVIOS A LA LIQUIDACIÓN								
A	Acta de Terminación				X			x	FT-MAJ-SI-17 Acta de terminación
B	Acta de recibo final				X			x	FT-MAJ-SI-18 Acta de recibo Final
C	Centro de costos		X	X	X			x	FT-MAF-GF-16 Certificación Centro de Costos
D	Evaluación de proveedores de servicios				X			x	FT-MAJ-GC-03 Evaluación de Proveedores de Servicios
E	Encuesta de satisfacción de proveedores				X			x	FT-MAJ-GC-61 Encuesta de Satisfacción a Proveedores
F	Póliza estabilidad y/o actualización de pólizas según corresponda debidamente aprobadas	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X			x	Ya se encuentra en la carpeta del contrato.

ELECTRICOM INGENIERIA SAS
R/L WILSON GILDARDO NOSSA
INTERVENTOR

Reviso: _____

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ
CONTRATISTA

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 03

CONTRATO DE OBRA 186-2025

OBJETO: AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
NIT. 901.928.930-7

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

INFORME MENSUAL DE OBRA

Yopal, 01 de julio de 2025

CONTRATO DE OBRA: 186 DE 2025

OBJETO: AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ELABORADO POR:

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ

OBJETIVOS

Documentar y reportar de manera clara y precisa los avances físicos, técnicos, administrativos y financieros del proyecto "AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", correspondientes al periodo mensual 03 con el fin de facilitar el seguimiento y la toma de decisiones por parte de los entes responsables.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mostrar en el presente informe mensual un recuento de las actividades realizadas por el contratista de obra hasta la fecha, en desarrollo del contrato No.186 de 2025, periodo comprendido desde el día 01 de junio hasta el día 08 de junio de 2025.

- Registrar y analizar las actividades ejecutadas durante el mes, el cumplimiento de metas parciales, el estado actual de los recursos utilizados y cualquier incidencia o recomendación relevante para el desarrollo eficiente del proyecto

GENERALIDADES

Localización

El proyecto se encuentra localizado en el casco urbano del municipio de Hato Corozal, Departamento de Casanare.



Ilustración 1. Localización del proyecto.

ANTECEDENTES

El contrato de obra 186 de 2025 cuyo objeto es AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. Contempla la ejecución de actividades correspondientes al contrato de obra con código BPIN 2024005850142, el cual fue priorizado y aprobado mediante el decreto 0324 de fecha 01 de noviembre de 2024 expedido por la gobernación de Casanare, el proyecto es financiado por recursos del bienio 2023-2024 del sistema general de regalías – Asignaciones directas -20%. Se designo la como entidad ejecutora a La EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.

La distribución de los recursos para la ejecución del proyecto de inversión código BPIN 2024005850142, está establecida de la siguiente forma:

Con base en la decisión de priorización y aprobación del artículo 1°, el valor aprobado del proyecto es la suma de TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.717.586.335,00), de los cuales el departamento de Casanare cofinancia el valor de TRES MIL DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.017.586.335,00), de la fuente Asignaciones Directas del 20% - Departamentos, valor que debe ser incorporado en el presupuesto general de ingresos y de gastos del Departamento de Casanare en el capítulo del Sistema General de Regalías para el bienio 2023 - 2024.

Los recursos destinados al contrato de obra son la suma de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($3.345.991.820,00); de acuerdo a la MGA, la cadena de valor de los recursos es de la siguiente forma.

DESCRIPCIÓN	VALOR
RED DE BAJA TENSIÓN	$ 46.028.479,52
RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN	$ 182.058.537,21
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.234.269.331,57
PAGO DE IMPUESTOS Y PERMISOS	$ 787.954.031,09
CERTIFICACIÓN RETIE	$ 24.623.563,48
CERTIFICACIÓN RETILAP	$ 44.685.386,63
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 18.490.055,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 7.882.435,50
INTERVENTORIA	$ 348.394.515,00
APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 23.200.000,00
TOTAL, INVERSIÓN	**$ 3.717.586.335,00**

Tabla 1. Distribución de cadena de valor del proyecto

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 186 DE 2025

Numero de contrato:	186 DE 2025
Tipo de Contrato:	DE OBRA
Objeto:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Derivado Del OCAD	BPIN 2024005850142
Contratante:	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE - ENERCA S.A. E.S.P.
Contratista:	CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ
Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES
Prorroga N° 01:	N/A
Valor contratado:	TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 3.345.991.817,00) MCTE
Valor Adicionado:	N/A
Fecha Acta de Inicio:	8 de abril de 2025
Anticipo	$ 1.338.996.726,000
Fecha Terminación inicial:	7 de agosto de 2025
Interventor:	ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Supervisor De Interventoría:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Apoyo a la supervisión:	HUGO ALBERTO FERNANDEZ
Director de obra:	JORGE EDUARDO NOCUA
Residente de obra:	VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
VALOR EJECUTADO MES 03:	$ 22.797.698.91
% EJECUTADO MES 03	0.681%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$82.961.082,79
% EJECUTADO ACUMULADO	2,479%

INFORME TECNICO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La modernización y ampliación del Público, consiste en la sustitución de las luminarias de sodio existente de alumbrado público, así como la ampliación de tramos de red en baja tensión para extender el alcance del alumbrado público. De acuerdo a las actividades y cantidades contractuales, se tiene proyectado ampliar 840m de red en baja tensión, en red trenzada de baja tensión 3ø, en cable aluminio XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2), desmonte de 645 luminarias existentes; instalación de 895 Luminarias de tecnología led de diferentes potencias. Adicionalmente se instalarán 34 postes de baja tensión con estructuras para trenzada y/o percha según sea el caso, así mismo se realizará instalación de sistema de puesta a tierra en baja tensión cada tercer poste, con el fin de poner a tierra todo el sistema de alumbrado público y garantizar el correcto funcionamiento del alumbrado.

ACTIVIADES CONTRATADAS

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**RED DE BAJA TENSION**				
101	REPLANTEO EN BAJA TENSIÓN	Km	0,84	$ 616.569,00	$ 517.917,96
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B.T.	UND	34,00	$ 89.303,00	$ 3.036.302,00
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF.	UND	28,00	$ 1.142.131,47	$ 31.979.681,16
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 1.050 KGF.	UND	6,00	$ 1.674.070,00	$ 10.044.420,00
105	CIMENTACIÓN POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.	UND	4,00	$ 112.539,00	$ 450.156,00
				Subtotal	**$ 46.028.477,12**
2	**RED TRENZADA BAJA TENSION**				
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	11,00	$ 106.160,58	$ 1.167.766,38
202	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 124.699,10	$ 2.244.583,80
203	ESTRUCTURA DE PASO CON DERIVACIÓN LA-322, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 235.586,11	$ 471.172,22
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA 327, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 298.007,70	$ 596.015,40
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2)	m	840,00	$ 23.455,19	$ 19.702.359,60
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA TENSIÓN	UND	274,00	$ 559.694,60	$ 153.356.320,40

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA. SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 140.639,48	$ 2.531.510,64
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y VESTIDA	UND	14,00	$ 142.057,77	$ 1.988.808,78
				Subtotal	**$ 182.058.537,22**
3	**ALUMBRADO PUBLICO**				
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 8412 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	23,00	$ 2.007.810,05	$ 46.179.631,15
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	638,00	$ 1.746.413,46	$ 1.114.211.787,48
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	143,00	$ 1.746.413,46	$ 249.737.124,78
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 30W, FLUJO LUMINOSO 4304 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	91,00	$ 1.623.797,05	$ 147.765.531,55
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	554,00	$ 476.173,35	$ 263.800.035,90
306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	277,00	$ 409.145,61	$ 113.333.333,97
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	64,00	$ 337.287,66	$ 21.586.410,24

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO CONECTORES DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 6 A 4/0 - DERIVACION 8 A 6 ILUM CDP70.	UND	1509,00	$ 62.645,60	$ 94.532.210,40
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND	1176,00	$ 42.830,60	$ 50.368.785,60
310	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIA DE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.	UND	645,00	$ 205.820,90	$ 132.754.480,50
				Subtotal	**$ 2.234.269.331,57**
				SUBTOTAL OBRA	**$ 2.462.356.345,91**
				ADMINISTRACION 25,00%	**$ 615.589.086,48**
				IMPREVISTOS 1,00%	**$ 24.623.563,46**
				UTILIDAD 6,00%	**$ 147.741.380,75**
				CERTIFICACION RETIE	**$ 24.623.563,00**
				CERTIFICACION RETILAP	**$ 44.685.387,00**
				COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**$ 18.490.055,00**
				COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	**$ 7.882.435,50**
				AJUSTE AL PESO	**-$ 0,10**
				VALOR TOTAL OBRA (AJUSTADO AL PESO)	**$ 3.345.991.817,00**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo de ejecución desde el 01 de junio de 2025, hasta el 8 de junio de 2025, fecha de corte del presente informe mensual, el contratista de obra realizó las siguientes actividades.

105. CIMENTACIÓN POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.

La actividad de cimentación consiste en la preparación, construcción y adecuación del soporte subterráneo que garantiza la estabilidad estructural de los postes extrarreforzado de baja tensión.

Procedimiento para la ejecución de la actividad.

- Una vez posicionado el poste el hueco se procede a realizar la mezcla del concreto con una resistencia de 3000 psi
- Vaciar concreto alrededor del poste, asegurando buen compactado (vibrado) para eliminar vacíos.
- Dejar fraguado antes de aplicar cargas o continuar trabajos superiores.
- Asegurar acabado nivelado en la superficie y compactación perimetral.
- Instalar barrera perimetral si se encuentra en zona urbana o tránsito peatonal.

201. ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA.

La actividad comprende el suministro, armado y montaje de una estructura aérea tipo LA-320 de suspensión sobre poste de baja tensión, para redes con tensión de 240/120V, destinada al soporte del tendido de conductores sin punto de derivación (sin caja de distribución de acometidas).
Esta estructura se utiliza en tramos rectos de la red de baja tensión para garantizar la continuidad mecánica y eléctrica del tendido conductor, sin interrupciones, ni ramales a usuarios finales en ese punto.

202. ESTRUCTURA DE RETENCIÓN SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA.

La actividad consiste en el suministro, armado y montaje de una estructura de retención sencilla tipo LA-321, instalada sobre un poste de baja tensión en redes de 120/240 V, diseñada para ejercer función de anclaje o final de tramo de conductores.

La estructura LA-321 es utilizada para absorber las tensiones mecánicas del conductor en los extremos de línea o en cambios de dirección, permitiendo asegurar el sistema ante esfuerzos longitudinales.

204. SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA 327, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA

La actividad comprende el suministro, armado y montaje completo ("vestida") de una estructura de retención doble tipo LA-327 sobre un poste de baja tensión (120/240 V). Esta estructura está diseñada para soportar esfuerzos mecánicos en ambos sentidos del tendido, por lo que se utiliza en tramos intermedios de la red donde se requiere tensión en las dos direcciones, no incluye caja de distribución de acometidas).

205. RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2).

La actividad consiste en el suministro e instalación aérea de una red de baja tensión trenzada empleando conductor de aluminio con aislamiento XLPE, en configuración (2 x 35 mm² + 1 x 35 mm²). Esta red forma parte del sistema de distribución secundaria aérea de energía eléctrica en 120/240 V, instalada sobre postes de concreto, con fijación mediante grapas de suspensión, grapas de retención, el tensionado se realiza garantizando la flecha adecuada y las distancias mínimas de seguridad al terreno, edificaciones, árboles u otras instalaciones

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**RED DE BAJA TENSION**				
101	REPLANTEO EN BAJA TENSIÓN	Km	0,000	$ 616.569,00	$ 0,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B.T.	UND	0,00	$ 89.303,00	$ 0,00
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF.	UND	0,00	$ 1.142.131,47	$ 0,00
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 1.050 KGF.	UND	0,00	$ 1.674.070,00	$ 0,00
105	CIMENTACIÓN POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.	UND	4,00	$ 112.539,00	$ 450.156,00
				Subtotal	**$ 450.156,00**
2	**RED TRENZADA BAJA TENSION**				
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	11,00	$ 106.160,58	$ 1.167.766,38
202	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	3,00	$ 124.699,10	$ 374.097,30
203	ESTRUCTURA DE PASO CON DERIVACIÓN LA-322, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND		$ 235.586,11	$ 0,00
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA 327, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 298.007,70	$ 596.015,40
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2)	m	626,00	$ 23.455,19	$ 14.682.948,94
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA TENSIÓN	UND		$ 559.694,60	$ 0,00
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA. SUMINISTRO Y VESTIDA	UND		$ 140.639,48	$ 0,00
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y VESTIDA	UND		$ 142.057,77	$ 0,00
				Subtotal	**$ 16.820.828,02**
3	**ALUMBRADO PUBLICO**				
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 8412 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND		$ 2.007.810,05	$ 0,00
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND		$ 1.746.413,46	$ 0,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND		$ 1.746.413,46	$ 0,00
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 30W, FLUJO LUMINOSO 4304 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND		$ 1.623.797,05	$ 0,00
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND		$ 476.173,35	$ 0,00
306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND		$ 409.145,61	$ 0,00
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND		$ 337.287,66	$ 0,00
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO CONECTORES DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 6 A 4/0 - DERIVACION 8 A 6 ILUM CDP70.	UND		$ 62.645,60	$ 0,00
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND		$ 42.830,60	$ 0,00
310	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIA DE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.	UND		$ 205.820,90	$ 0,00
				Subtotal	**$ 0,00**
				SUBTOTAL OBRA	**$ 17.270.984,02**
				ADMINISTRACION 25,00%	**$ 4.317.746,01**
				IMPREVISTOS 1,00%	**$ 172.709,84**
				UTILIDAD 6,00%	**$ 1.036.259,04**
				CERTIFICACION RETIE	**$ 0,00**
				CERTIFICACION RETILAP	**$ 0,00**
				COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**$ 0,00**
				COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	**$ 0,00**
				AJUSTE AL PESO	
				VALOR TOTAL OBRA (AJUSTADO AL PESO)	**$ 22.797.698,91**

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

CAUSALES DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Se solicita una suspensión temporal en la ejecución de las actividades del contrato de obra debido a las siguientes razones:

1. **Condiciones climáticas adversas.**

Durante las últimas semanas se han presentado precipitaciones constantes e intensas, lo que ha afectado de manera directa la ejecución de las actividades programadas en obra y realización segura de labores en campo.

En campo se ha podido evidenciar la cantidad de lluvias que se han presentado en la zona de influencia del contrato, los diarios locales se puede evidenciar la magnitud de las lluvias que se han presentado a nivel del Departemento de Casanare.

OLA INVERNAL EN CASANARE: 12 MUNICIPIOS EN ALERTA ROJA Y MÁS DE 3.900 FAMILIAS DAMNIFICADAS

MAYO 19, 2025 9:55 AM SIN COMENTARIOS



Ayúdanos a compartir la noticia

Durante los días 16 al 19 de mayo de 2025, el departamento de Casanare ha enfrentado una situación crítica debido a las intensas lluvias que han provocado múltiples emergencias.

Ilustración 2. Ola Invernal en Casanare. Fuente: https://elnuevooriente.com/ola-invernal-en-casanare-12-municipios-

en-alerta-roja-y-mas-de-3-900-familias-damnificadas/

De igual forma consultando el *Boletín de predicción climática y recomendación sectorial* del IDEAM publicado el 14 de mayo de 2025, (https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Bolet%C3%ADn-de-predicci%C3%B3n-clim%C3%A1tica) dice que las probabilidades de precipitaciones proyectadas para el mes de Junio para la zona de la Orinoquia y la Amazonia oscilan entre el 50% y el 70%.

Por otra parte, consultando paginas oficiales que llevan históricos de las condiciones climáticas en diferentes zonas del país como lo es al día con el clima de Fedearroz, se evidencia que el mes qua más presenta lluvias es el mes de junio.

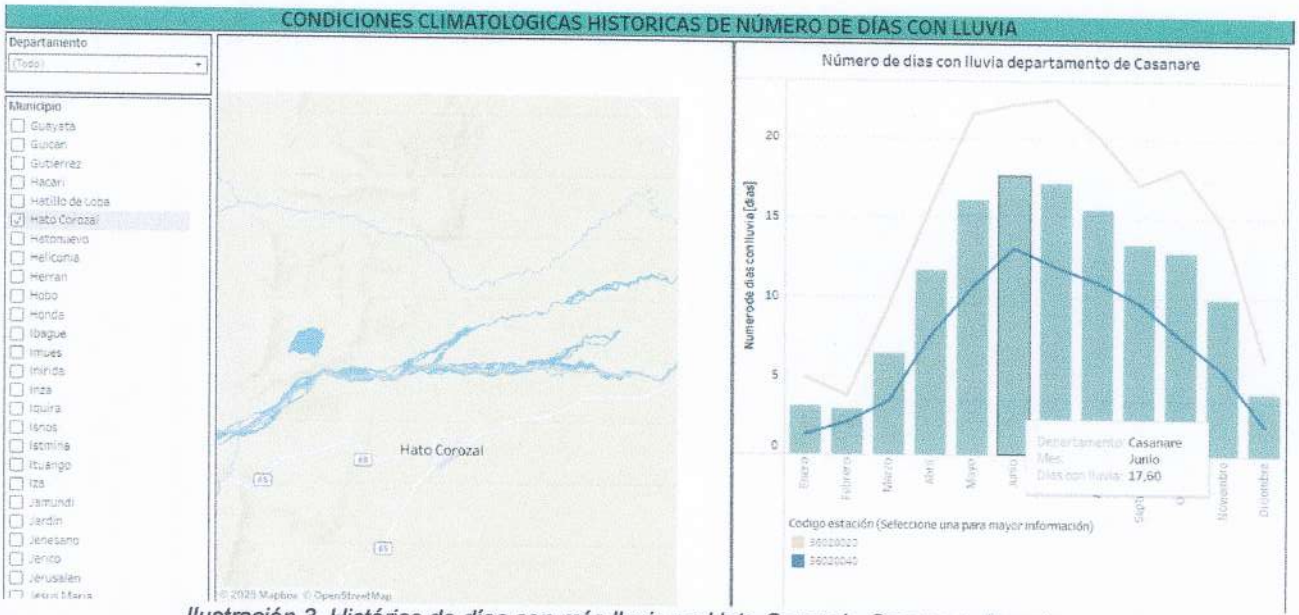


Ilustración 3. Histórico de días con más lluvia en Hato Corozal - Casanare. Fuente: https://clima.fedearroz.com.co/historico-region/

2. Demoras en el suministro de luminarias. Adicionalmente, el proveedor de las luminarias previstas en el contrato ha presentado retrasos en los tiempos de entrega, debido a factores logísticos y de disponibilidad de inventario. Esta situación ha sido debidamente documentada y comunicada por el proveedor, quien ha reprogramado la fecha de entrega para los próximos días, fuera del cronograma inicialmente establecido.
   Así mismo se pudo establecer que otro proveedor de luminarias también tiene tiempo de entregas de hasta 45 días después de recibida la orden de compra.
   Dado que las luminarias son un elemento esencial para la continuidad de las actividades, esta situación genera un impacto directo sobre el desarrollo del proyecto.

Se anexan oficio del proveedor de las luminarias donde manifiesta que el despacho de las luminarias se estará realizando entre el 12 al 15 de junio, y cotización de otro proveedor en

donde se muestra que la entrega de las luminarias tiene un tiempo de 45 días.


Si bien el proveedor manifiesta que la entrega esta proyectada para mediados de junio, se solicita un (01) mes de suspensión del contrato de obra, toda vez que el proveedor no está seguro en un 100% que se esté realizando el despacho de las luminarias para el 15 de junio de 2025, y de acuerdo a las predicciones climáticas para el mes de Julio se espera se normalice las precipitaciones en la zona de ejecución del contrato.

Cabe mencionar que si se superan las causales de suspensión antes de cumplirse el tiempo de suspensión pactado inicialmente se dará reinicio a las actividades de construcción de la obra.

Para la suspensión del contrato se presento informe de suspensión el cual fue avalado por interventoría.

INFORME DE AVANCE FISICO Y PROGRAMADO

El valor programado y ejecutado para el presente periodo mensual, que corresponde al periodo del 01 al 08 de junio de 2025, es que se presenta en la siguiente grafica.

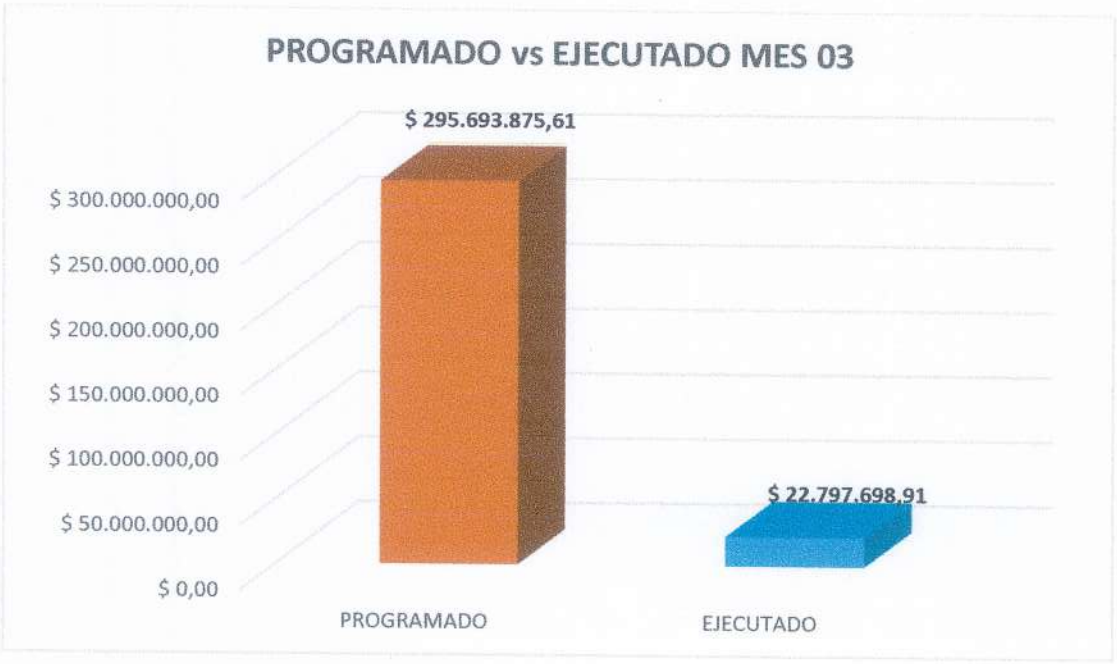


En términos de porcentaje se tiene que para el mes objeto del presente informe el % programado es del 8.837% y el ejecutado es del 0.681%.



AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO ACUMULADO

El acumulado de la ejecución a fecha de corte del presente informe es del 2.479% sin embargo, el programado acumulado es del 30.828%, evidenciando un atraso del 28.349%.

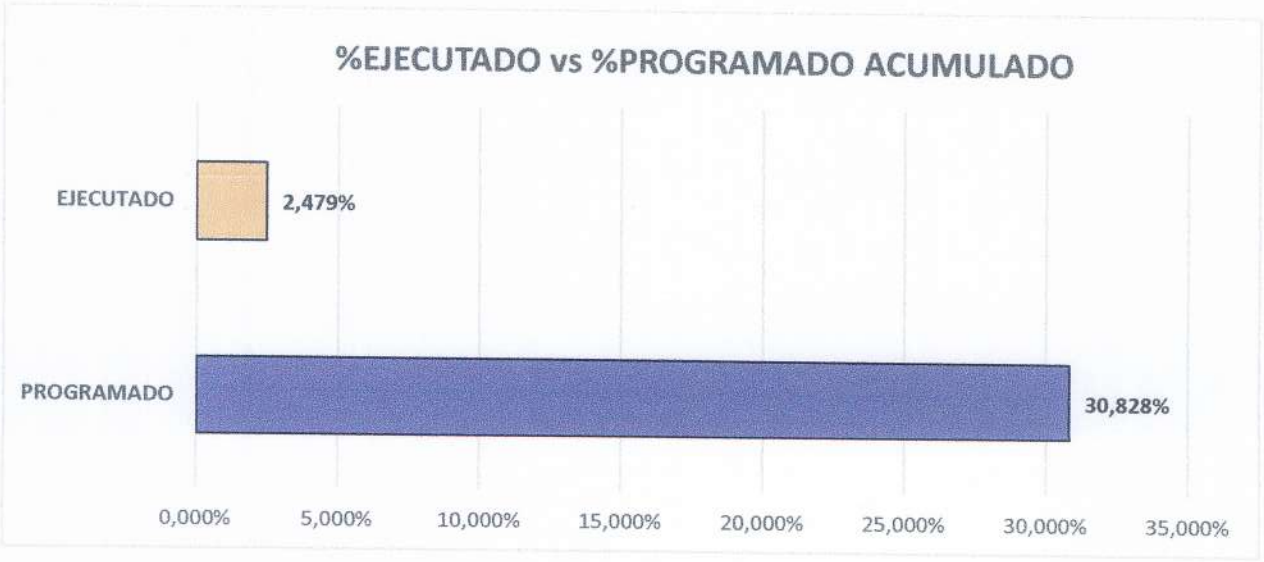



Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

INFORME JURIDICO

Control de Pólizas

- **Pólizas Iniciales**

AMPARO APLICABLE	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
Anticipo	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	1.338.396.726,80	31/03/2025	30/11/2025
Cumplimiento	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	334.599.181,70	31/03/2025	30/11/2025
Prestaciones sociales	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	334.599.181,70	31/03/2025	31/07/2028
Res. civil extracontrac.	65-40-101081242	SEGUROS DEL ESTADO	334.599.182,00	31/03/2025	30/11/2025
Calidad de los Elementos	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	669.198.363,40	31/03/2025	21/07/2030
Estabilidad de la obra	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	669.198.363,40	31/03/2025	31/11/2025

- **Pólizas acta de Inicio**

AMPARO APLICABLE	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
Anticipo	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	1.338.396.726,80	08/04/2025	08/12/2025
Cumplimiento	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	334.599.181,70	08/04/2025	08/12/2025
Prestaciones sociales	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	334.599.181,70	08/04/2025	08/08/2028
Res. civil extracontractual.	65-40-101081242	SEGUROS DEL ESTADO	334.599.182,00	08/04/2025	08/12/2025
Calidad de los Elementos	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	669.198.363,40	31/03/2025	21/07/2030
Estabilidad de la obra	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	669.198.363,40	31/03/2025	31/11/2025

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

N° DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
1	ACTA DE INICIO	8/04/2025	Documento mediante el cual se autorizó el inicio de las actividades contractuales.

INFORME ADMINISTRATIVO

PERSONAL EN EJECUCIÓN DE OBRA

Para el mes objeto del presente informe se realizó

N°	MES	NOMBRE	CARGO
1	JUNIO	GLORIA SOFIA MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL
2		BERNAL LOPEZ VICTOR MANUEL	INGENIERO RESIDENTE
3		FONSECA CAMARGO EDGAR	TECNICO ELECTRISISTA
4		GARCIA MURILLO JOSE ELI	PROFESIONAL HSEQ
5		MONROY MONTAÑEZ LUIS HERNAN	AUXILIAR DE INGENIERIA
6		NOCUA JORGE EDUARDO	DIRECTOR DE OBRA
7		SANDOVAL GONZALEZ CAMILO ESTEBAN	AYUDATE DE OBRA
8		SILVA MORENO MARIANO	TECNICO ELECTRISISTA
9		TOLOZA DUEÑAS GILDARDO	TECNICO - CAPATAZ

Relación de pagos de seguridad Social

PERIODO	N° PLANILLA	PENSIÓN	ARL	CCF	SALUD	ICBF	SENA	FIC
jun-25	9488529098	$ 598.800,00	$ 162.900,00	$ 179.100,00	$ 393.200,00	$ 103.200,00	$ 68.900,00	$142.350
Jun-25	9488580512	$ 227.800,00	$ 99.100,00	$ 57.000,00	$ 57.000,00	-	-	

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Referencia del Rubro presupuestal, CDP y RP

La información contable, suministrada por ENERCA S.A. E.S.P. mediante el cual se respalda el presupuesto requerido para las actividades se relaciona en la siguiente tabla

RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2024-005-0142	7525	10/02/2025	$ 2.645.991.820,00	7525	02/04/2025	$ 2.645.991.817,00
00IL-2102-1900-2024-00585-0142			$ 700.000.000,00			$ 700.000.000,00

PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS

IMPUESTOS Y/O ESTAMPILLAS		
Impuesto aplicable	Valor	N° de recibo
Pro-cultura	$ 33.459.900	22922
Pro-Adulto mayor	$ 100.379.800	5979
Pro-Desarrollo Departamental	$ 33.459.900	6258

IMPUESTOS Y/O ESTAMPILLAS		
Impuesto aplicable	**Valor**	**N° de recibo**
Pro-Deporte	$ 83.649.800	3500
Pro-Unitropico	$ 50.189.900	3480

ASPECTO FINANCIERO

INFORME DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

En el informe mensual de mayo se relacionó el informe de inversión de anticipo de los recursos que se han autorizado retirar de la cuenta conjunta.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR A GIRAR
VALOR INICIAL	$ 3.345.997.817,00			
VALOR ADICIONADO	N/A			
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.345.997.817,00			
ANTICIPO	,			$ 1.338.996.726,00
VALOR PARCIALES		$ 0,00		
VALOR EJECUTADO		$ 82.961.082,79		
VALOR OBRA POR EJECUTAR		$ 3.263.036.734,21		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		-$ 3.345.997.817,00		
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		$ 3.345.997.817,00		

GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO

La gráfica esquematiza el valor del contrato, el valor por concepto de anticipo desembolsado. Así mismo se evidencia que a la fecha de corte del presente informe no se han realizado cobros parciales,



Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

CONCLUSIONES

- Para el mes de junio se laboró desde el 01 al 08 debido a que suspendió el contrato por tema de condiciones climáticas adversas debido a lluvias intensas afectado significativamente el desarrollo normal de las actividades constructivas, generando retrasos, riesgos operacionales. Por otra parte, el proveedor de luminarias ha presentado retrasos comprobados en los tiempos de entrega, lo cual impide continuar con fases críticas del proyecto.

- El avance programado acumulado a fecha de corte del presente informe es de 30.828% y el avance ejecutado acumulado es del 2.479%. se tiene un atraso en la ejecución del 28.349%. Se tiene un retraso considerable, sin embargo, una vez se superen las causales de suspensión el contratista de obra realizara los ajustes necesarios para poder ponerse al día con la ejecución del proyecto.

GLORIA SOFIA MARTINEZ
R/L CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

JORGE EDUARDO NOCUA
ING. DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

JOSE ELI GARCIA MURILLO
PROFESIONAL HSE

ANEXOS

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

CANTIDADES EJECUTADAS

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**RED DE BAJA TENSION**							
101	REPLANTEO EN BAJA TENSIÓN	Km	0,840	$ 616.569,00	$ 517.917,96	0,840	$ 616.569,00	$ 517.917,96
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B.T.	UND	34,00	$ 89.303,00	$ 3.036.302,00	34,000	$ 89.303,00	$ 3.036.302,00
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF.	UND	28,00	$ 1.142.131,47	$ 31.979.681,16	28,000	$ 1.142.131,47	$ 31.979.681,16
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 1.050 KGF.	UND	6,00	$ 1.674.070,00	$ 10.044.420,00	6,000	$ 1.674.070,00	$ 10.044.420,00
105	CIMENTACIÓN POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.	UND	4,00	$ 112.539,00	$ 450.156,00	4,000	$ 112.539,00	$ 450.156,00
				Subtotal	**$ 46.028.477,12**		**Subtotal**	**$ 46.028.477,12**
2	**RED TRENZADA BAJA TENSION**							
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	11,00	$ 106.160,58	$ 1.167.766,38	11,000	$ 106.160,58	$ 1.167.766,38
202	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 124.699,10	$ 2.244.583,80	3,000	$ 124.699,10	$ 374.097,30
203	ESTRUCTURA DE PASO CON DERIVACIÓN LA-322, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 235.586,11	$ 471.172,22	0,000	$ 235.586,11	$ 0,00
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA 327, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 298.007,70	$ 596.015,40	2,000	$ 298.007,70	$ 596.015,40
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2)	m	840,00	$ 23.455,19	$ 19.702.359,60	626,000	$ 23.455,19	$ 14.682.948,94
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA TENSIÓN	UND	274,00	$ 559.694,60	$ 153.356.320,40	0,000	$ 559.694,60	$ 0,00
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA. SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 140.639,48	$ 2.531.510,64	0,000	$ 140.639,48	$ 0,00
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y VESTIDA	UND	14,00	$ 142.057,77	$ 1.988.808,78	0,000	$ 142.057,77	$ 0,00
				Subtotal	**$ 182.058.537,22**		**Subtotal**	**$ 16.820.828,02**
3	**ALUMBRADO PUBLICO**							
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 8412 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	23,00	$ 2.007.810,05	$ 46.179.631,15	0,000	$ 2.007.810,05	$ 0,00
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	638,00	$ 1.746.413,46	$ 1.114.211.787,48	0,000	$ 1.746.413,46	$ 0,00

CANTIDADES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	143,00	$ 1.746.413,46	$ 249.737.124,78	0,000	$ 1.746.413,46	$ 0,00
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 30W, FLUJO LUMINOSO 4304 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	91,00	$ 1.623.797,05	$ 147.765.531,55	0,000	$ 1.623.797,05	$ 0,00
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	554,00	$ 476.173,35	$ 263.800.035,90	0,000	$ 476.173,35	$ 0,00
306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	277,00	$ 409.145,61	$ 113.333.333,97	0,000	$ 409.145,61	$ 0,00
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	64,00	$ 337.287,66	$ 21.586.410,24	0,000	$ 337.287,66	$ 0,00
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO CONECTORES DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 6 A 4/0 - DERIVACION 8 A 6 ILUM CDP70.	UND	1509,00	$ 62.645,60	$ 94.532.210,40	0,000	$ 62.645,60	$ 0,00
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND	1176,00	$ 42.830,60	$ 50.368.785,60	0,000	$ 42.830,60	$ 0,00
310	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIA DE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.	UND	645,00	$ 205.820,90	$ 132.754.480,50	0,000	$ 205.820,90	$ 0,00
				Subtotal	**$ 2.234.269.331,57**		**Subtotal**	**$ 0,00**
				SUBTOTAL OBRA	**$ 2.462.356.345,91**			**$ 62.849.305,14**
				ADMINISTRACION	**25,00% $ 615.589.086,48**			**$ 15.712.326,29**
				IMPREVISTOS	**1,00% $ 24.623.563,46**			**$ 628.493,05**
				UTILIDAD	**6,00% $ 147.741.380,75**			**$ 3.770.958,31**
				CERTIFICACION RETIE	**$ 24.623.563,00**			**$ 0,00**
				CERTIFICACION RETILAP	**$ 44.685.387,00**			**$ 0,00**
				COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**$ 18.490.055,00**			**$ 0,00**
				COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	**$ 7.882.435,50**			**$ 0,00**
				VALOR TOTAL OBRA (AJUSTADO AL PESO)	**$ 3.345.991.817,00**			**$ 82.961.082,79**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ
CONTRATISTA

ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S
R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
INTERVENTORIA

INFORME HSE

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

OBJETO: "AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

INFORME: 003
CÓDIGO: 30 de junio 2025

INFORME DEL SG-HSE

BASADO EN LA RESOLUCIÓN 0312:2019

CONTRATO N° 186 DEL 2025.

CONSORCIO ILUMINACION COROZAL.
1 AL 08 DE JUNIO DEL 2025.
YOPAL – CASANARE

OBJETO: "AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATISTA:
CONSORCIO ILUMINACION COROZAL

SUPERVISIÓN:
ING: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder de Supervisión e interventoría.

CONSORCIO ILUMINACION COROZAL
1 AL 08 DE JUNIO DEL 2025
YOPAL – CASANARE

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN.

OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".	
CONSORCIADOS:	1. INDISCON INGENIERIA S.A.S. 2. JYL CONSTRUCCIONES S.A.S	
INFORME DE AVANCE:	N° 02	
DOCUMENTO N°:	FT-MAA-SST-94	
QUIEN ELABORA:		
ELABORACIÓN:	**Nombre:**	**CONSORCIO LUMINACION COROZAL**
	Firma:	Jose Eli Garcia Profesional HSE
	Fecha:	30/06/2025
QUIEN REVISA:		
REVISA:	**Nombre:**	**CONSORCIO ILUMINACION COROZAL**
	Firma:	Jorge Eduardo Nocua Director Proyecto
	Fecha:	30/06/2025
QUIEN APRUEBA:		
APROBACIÓN:	**Nombre:**	**CONSORCIO ILUMINACION COROZAL**
	Firma:	Gloria Sofia Martinez Representante Legal
	Fecha:	30/06/2025

Yopal, 30 de junio de 2025

Señores:

RUTH MERY ARIAS CRUZ

LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La ciudad.

Asunto: Presentación de informe general HSE de C.P.S 186 DE 2025.

OBJETO:

"AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Se hace entrega del informe general HSE, durante el periodo comprendido del 1 al 08 de junio de 2025.

JOSÉ ELI GARCÍA MURILLO
Profesional HSE
Consorcio Iluminación Corozal.

1. OBJETO DEL CONTRATO

"AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración de 4 meses y 25 días, fecha de inicio el día 08 de abril del 2025 y fecha de finalización según pliegos el 29 de agosto de 2025.

3. GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO


3.1 Planillas de Seguridad Social Integral del personal (ARL, Pensión y Salud)

No	Nombres y Apellidos	Cargo	Novedad
01	Camilo Esteban Sandoval	Ayudante de Obra	20-05-2025
02	Mariano Silva Moreno	Técnico electricista	20-05-2025
03	Edgar Fonseca Camargo	Técnico electricista	27-05-2025
04	Bricelio Fonseca Camargo	Supervisor de obra	28-05-2025
05	Jorge Eduardo Nocua	director de obra	8/04/2025
06	Víctor Manuel Bernal López	residente de obra	8/04/2025
07	José Eli Garcia murillo	profesional hseq	8/04/2025
08	Gildardo Toloza dueñas	técnico-capataz	8/04/2025
09	Luis Hernán Monroy Montañez	auxiliar de ingeniería	29/04/2025

Anexo No.1 Planilla de Seguridad Social y certificados de afiliación (Ingresos)


Frecuencia de los accidentes laborales

Fórmula: (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

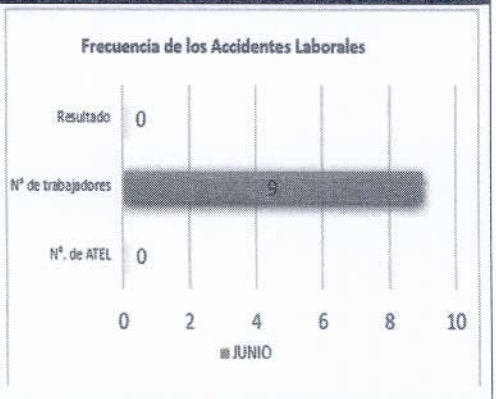Periodo	No. de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	Número de trabajadores en el mes	Resultado	Grafica de Tendencia
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio	0	9	0	
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
ANÁLISIS DE LA GRAFICA:	*Se evidencia en la gráfica que en el mes de junio no se presentó ningún accidente de trabajo reportado a la ARL POSITIVA.*			


Severidad de accidentalidad

Fórmula: (Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

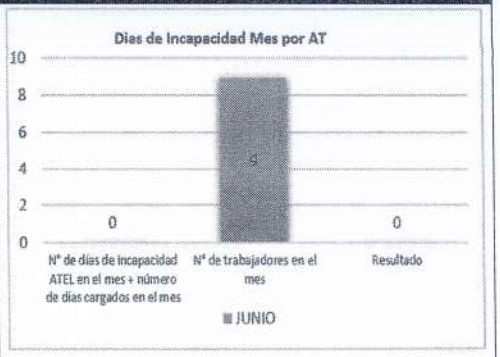Periodo	Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes	Número de trabajadores en el mes	Resultado	Grafica de Tendencia
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio	0	9	0	
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
ANALISIS DE LA GRAFICA:	*En el mes de junio la severidad por accidente de trabajo es cero (0) no se reporta incapacidad por accidente de trabajo.*			

Proporción de accidentes de trabajo mortales

Fórmula: (Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100

Período	No. de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año	Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año	Resultado	Grafica de Tendencia
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio	0	9	0	
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
ANALISIS DE LA GRAFICA:	*El CONSORCIO ILUMINACION COROZAL, no reporta accidentes de trabajo mortales en el mes de junio.*			

Prevalencia de la enfermedad laboral

Fórmula: (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000

Período	No. de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año	Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año	Resultado	Grafica de Tendencia
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio	0	9	0	
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
ANALISIS DE LA GRAFICA:	*El CONSORCIO LUMINACION COROZAL, no reporta el índice de enfermedad laboral correspondiente a cero (0) casos de enfermedad laboral durante el mes de junio del presente año.*			


Incidencia de la enfermedad laboral

Fórmula: (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000

Período	No. de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z»	Promedio de trabajadores en el periodo «Z»	Resultado	Grafica de Tendencia
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio	0	9	0	
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
ANALISIS DE LA GRAFICA:	*El CONSORCIO ILUMINACION COROZAL, reporta el índice de enfermedad laboral en cero (0) nuevos casos de enfermedad laboral durante el mes de junio.*			

Ausentismo por causa médica

Fórmula: (Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100

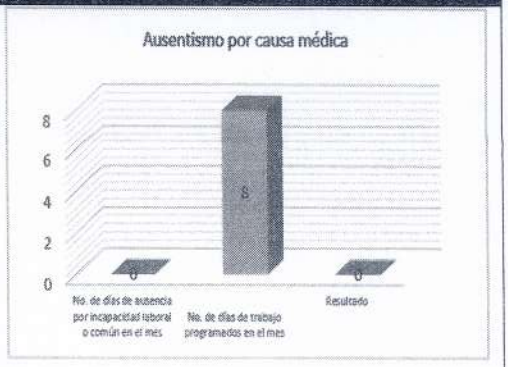
Período	No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	No. de días de trabajo programados en el mes	Resultado	Grafica de Tendencia
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio	0	8	0	
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
ANALISIS DE LA GRAFICA:	*En el mes de junio se presentaron cero (0) días de ausentismo por enfermedad general.*			

Anexo No.2 Certificados de incapacidad por causa laboral o común en el mes


Cumplimiento plan de trabajo anual SST

Periodo	No. de actividades ejecutadas en el mes	No. de actividades programadas en el mes	Resultado	Grafica de Tendencia
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio	4	4	100%	
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
ANALISIS DE LA GRAFICA:	*Para el mes de junio se programaron cinco (4) actividades en el plan anual de trabajo los cuales se contemplan 4 inspecciones (locativa y equipos de emergencias, logrando el 100% de ejecución de las actividades propuestas.*			

Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo

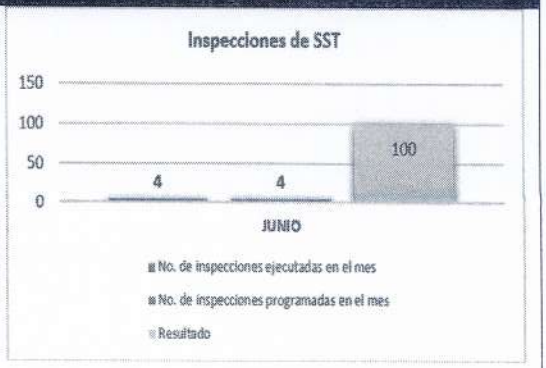Periodo	No. de inspecciones ejecutadas en el mes	No. de inspecciones programadas en el mes	Resultado	Grafica de Tendencia
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio	4	4	100%	
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
ANALISIS DE LA GRAFICA:	*Para el mes de junio se realizaron inspecciones mensuales, lo cual nos arrojaron 4 inspecciones, entre ellas, las locativas, extintores, camilla y botiquín.*			

Capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo

Período	No. de capacitaciones ejecutadas en el mes	No. de capacitaciones programadas en el mes	Resultado	Grafica de Tendencia
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio	0	0	0%	
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
ANALISIS DE LA GRAFICA:	El cronograma del Plan de capacitación anual evidencia la programación de cero (0) capacitación para el mes de junio, dado que se suspendieron actividades, se laboraron solo los primeros 8 día en junio.			

Autogestión PESV

Fórmula: (No. Conductores que asistieron a capacitaciones/No. Total de conductores)*100

Período	No.Conductores que asistieron a capacitaciones	No. Total de conductores	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Fórmula:(Tasa siniestros viales: TSV= (SV*1000.000)/Km)

	NIVEL DE PERDIDA	SIN LESIÓN	LEVES CON INCAPACIDAD <= 30 DIAS	GRAVES CON INCAPACIDAD > 30 DIAS	FATALES	KM
ENERO	Cantidad					
	Tasa					
FEBRERO	Cantidad					
	Tasa					
MARZO	Cantidad					
	Tasa					
ABRIL	Cantidad					
	Tasa					
MAYO	Cantidad					
	Tasa					
JUNIO	Cantidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tasa	N/A	N/A	N/A	N/A	
JULIO	Cantidad					
	Tasa					
AGOSTO	Cantidad					
	Tasa					
SEPTIEMBRE	Cantidad					
	Tasa					
OCTUBRE	Cantidad					
	Tasa					
NOVIEMBRE	Cantidad					
	Tasa					
DICIEMBRE	Cantidad					
	Tasa					

Fórmula:(Vehículos con mantenimiento preventivo realizado en el periodo/Vehículos programados para mantenimiento preventivo en el periodo)*100

Periodo	Vehículos con mantenimiento preventivo realizado en el periodo	Vehículos programados para mantenimiento preventivo en el periodo	Resultado	Análisis	Grafica de Tendencia
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	
Julio					
Agosto					

Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Anexo No.3 Soportes de mantenimientos preventivos y correctivos realizados (Facturas)

3.3 Capacitaciones, Inducciones, Campañas, Charlas Preo Operacionales

	Cantidad	Total Horas Capacitación	Registro fotográfico
Capacitaciones contratista e invitadas por ENERCA	0	0	
Inducciones del contratista y de Ingreso ENERCA	0	0	
Campañas Realizadas	0	0	
Charlas Pre-operacionales	5	5 min	

Anexo No.4 Registros de actividades ejecutadas (Asistencia charlas de seguridad)

- 07 charlas Preoperacionales.

3.4 Entrega de Elementos de Protección personal y Dotación

Para el mes de junio no se realizaron entregas de dotación y elementos de protección personal dado que no hubo ingreso de personal en el mes en mención, los cuales se aplicarían para el personal a fin de garantizar que puedan desarrollar las actividades propias de su cargo con seguridad y mitigando la afectación e integridad de los colaboradores.

	Cantidad de Personas	Total Horas Capacitación	Registro fotográfico
Entrega de Dotación de EPP contratista	0	0	

Anexo No.5 Registros entrega de EPP y Dotación

- No se presentan Registro de entrega de EPP y dotación.

3.5 Pruebas de Alcoholimetría

No se realiza pruebas con bafometro o alcohosensor, que consiste en una caja portátil con una boquilla que el conductor debe soplar, y de esta manera, indicar el nivel de alcohol en la sangre de la persona evaluada.

Anexo No. 6 Registro toma de alcoholemias realizadas.

- No se registran pruebas de alcoholimetría.


3.6 Inspecciones

Elementos a inspeccionar	Frecuencia de inspección establecida	No. de inspecciones realizadas	Registro fotográfico
Vehículos livianos	N/A	N/A	
Motocicletas	N/A	N/A	
Camión Grúa	N/A	N/A	
Camión Canasta	N/A	N/A	
Extintores	01	01	
Herramienta menor	N/A	N/A	
Guadaña	N/A	N/A	
Botiquines y camillas	02	02	
Escaleras dieléctricas	N/A	N/A	
Herramienta	N/A	N/A	
EPCC	0	0	
Motosierra	N/A	N/A	
EPP	0	0	
Locativa	01	01	
Detector de tensión	N/A	N/A	
Tapete dieléctrico	N/A	N/A	
Guantes dieléctricos	N/A	N/A	
Pértiga	N/A	N/A	
Andamios	N/A	N/A	
Otros	N/A	N/A	

Anexo No. 7 Registros de inspección

- Registro inspección botiquín y camilla.
- *Registro Inspección locativa.*
- *Inspección Extintor.*

Inspecciones, Preoperacionales

Elementos inspeccionados	No. de inspecciones realizadas	Registro fotográfico
Pértiga	N/A	
Tapete dieléctrico	N/A	
Guantes carnaza	N/A	
Equipo de rescate	N/A	
Guadaña	N/A	
EPCC (Arnés y Eslinga)	semanal	
Andamios	N/A	
Detectores de tensión	N/A	
Camión Grúa	N/A	
Escalera dieléctrica	semanal	
Herramienta menor	N/A	
Detector de tensión	N/A	
Rotomartillo	Semanal	
Otros?	N/A	

Anexo No. 8 Registros de inspección preoperacionales

3.7 Certificado de calibración de los Equipos de Medida

En el mes de junio no se reporta calibración de equipos de medida.

Análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo

Estos Mecanismos son documentos de control y prevención en seguridad y salud en el trabajo, que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de trabajos de alto riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes.

El CONSORCIO ILUMINACION COROZAL, para el mes de junio se llevó a cabo trabajo en alturas para el tendido y tensionada de cable e instalaciones de percha en poste los días 4 y 7 de junio, no se utilizaron equipos de elevación para estas actividades, se utilizó ascenso con escalera dieléctrica, conforme a requerimientos y estándares de trabajo.

Registros	Cantidad
Permiso de Trabajo Eléctrico	0
Permiso de Trabajo Alturas	2
Total	2

Registros	Cantidad
Análisis de Trabajo Seguro	5
Plan de Izaje con camión Grúa	0
Total	5

Anexo No.9 Registros de Análisis de trabajo, Permisos de Trabajo relacionados y Planes de Izaje.

3.8 Accidentes de Trabajo y/o incidentes durante el mes

Durante el 1 al 8 del mes de junio el CONSORCIO ILUMINACION COROZAL, No se presentaron accidentes de trabajo; tampoco incidentes en el periodo.

Anexo No.10 Registros AT

3.9 Enfermedades Laborales

El CONSORCIO ILUMINACION COROZAL, No reporta ningún caso de enfermedad de tipo laboral.

3.10 Tarjetas y/o reporte mensual de actos y condiciones seguras e inseguras diligenciadas

Reportes	Cantidad
Actos inseguros	0
Condiciones Inseguras	0
Reconocimiento	1
Total	1

Anexo No.11 Tarjetas de Actos y Condiciones Inseguras

3.11 Certificados de actitud de acuerdo a las evaluaciones medico ocupacionales, inicio de contrato y/o personal nuevo.

En el mes de junio no se registran ingresos de personal con el fin de verificar las condiciones y aptitudes de salud para el desarrollo de sus actividades y funciones propias de trabajo.

RELACIÓN DE PERSONAL

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de ingreso
1	BRICELIO FONSECA CAMARGO	SUPERVISOR DE OBRA	28/05/2025
2	EDGAR FONSECA CAMARGO	TECNICO ELECTRICISTA	27/05/2025
3	CAMILO ESTEBAN SANDOVAL GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	20/05/2025
4	MARIANO SILVA MORENO	TECNICO ELECTRICISTA	20/05/2025
05	JORGE EDUARDO NOCUA	DIRECTOR DE OBRA	8/04/2025
06	VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	RESIDENTE DE OBRA	8/04/2025
07	JOSE ELI GARCIA MURILLO	PROFESIONAL HSEQ	8/04/2025
08	GILDARDO TOLOZA DUEÑAS	TECNICO-CAPATAZ	8/04/2025
09	LUIS HERNAN MONROY MONTAÑEZ	AUXILIAR DE INGENIERIA	29/04/2025

Anexo No.12 Certificados exámenes de aptitud

3.11.1 Divulgación y seguimiento a recomendaciones y restricciones médico-laborales.

Para el mes de junio no se realizaron divulgaciones de recomendaciones médicas generales y específicas para colaboradores, dado que no se presentaron a exámenes médicos ocupacionales por ingreso de personal.

Anexo No.13 No se presentan Registro de divulgación

3.12 Certificado de curso de Trabajo en Alturas – Coordinador de Alturas personal nuevo.

Los certificados de constancia de formación vocaciones de la Resolución 4272 de 2021 correspondientes del personal que laborara en alturas fueron enviados en el informe de mayo, para el mes de junio no se registran ningún colaborador nuevo, se continúan con los mismo relacionados en el anexo.

Nombre y Apellidos	Cargo	Curso	Vigencia
EDGAR FONSECA CAMARGO	TECNICO ELECTRICISTA	TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO	19/05/2025
MARIANO SILVA MORENO	TECNICO ELECTRICISTA	TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272	25/05/2025

Anexo No. 14 Certificados de cursos realizadas por Empleador

Anexo No. 15 No se registran Soporte consulta realizada en página Minitrabajo- Centro de entrenamiento de personal nuevo.

3.13 Comités

Cumplimiento reuniones COPASST

Para el mes de junio se realizó verificación por parte del Profesional SST los actos y condiciones inseguras en campo los cuales no se presentaron, pero si se le realiza un reporte en el formato como reconocimiento en el que se resalta el compromiso seguro en sus actividades diarias, así mismo se resaltó la importancia que no se ha presentado eventos de accidentes ni incidentes laborales. De otro lado se verifico que se están realizando las charlas preoperativas al personal a fin de mantener la cultura del autocuidado para la prevención y promoción de los peligros existentes en los puestos de trabajo.

Anexo No.16 Acta reunión – Conformación si aplica.

- *Acta de reunión Mensual Vigía SST.*

Cumplimiento reuniones Comité de Convivencia Laboral

Anexo No.17 Acta reunión – Conformación si aplica

3.14 Implementación medidas Protocolo de Bioseguridad COVID – 19

No.	Nombres y Apellidos	Registro fotográfico
1	Entrega de tapabocas	N/A
2	Suministro de Alcohol	N/A
3	Limpieza y Desinfección	N/A

Anexo No.18 Registro de entrega de elementos y planillas limpieza y desinfección

Reporte de casos positivos /aislamiento por COVID – 19

Nombre y Apellidos	Cargo	Fecha
N/A		
N/A		

Anexo No.19 Soporte casos presentados (certificados de aislamiento – Incapacidad)

4. CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

4.1 Cumplimiento Comité de Seguridad Vial

N/A.

Anexo No. 20 Acta reunión – Conformación si aplica

4.2 Verificación documentos de vehículos contratados

Vehículos

Móvil	Placa	Modelo	Tarjeta de Operación	SOAT	Revisión Técnico mecánica	Póliza Responsabilidad Civil Contractual	Póliza Responsabilidad Civil extracontractual	Zona Asignada
N/A								
N/A								

Motocicletas

Móvil	Placa	Modelo	No. Licencia	Soat	Revisión Técnico mecánica	Zona Asignada
N/A						
N/A						
N/A						

4.3 Reporte de comparendos de vehículos y conductores

Tipo de Vehículo	Placa	Conductor asignado	Comparendos SI/NO	Pantallazo seguimiento a comparendos
N/A				
N/A				
N/A				

Anexo No.21 Reporte de comparendos vehículos - conductores (SIMIT)

4.4 Informe de trazabilidad mensual GPS y acciones de control establecidas

Relacionar *(Frenadas bruscas, topes de velocidad)*

Nombre	Fecha	Velocidad(km/h)	Origen/Destino	Estado	Pantallazo desde plataforma GPS	Observaciones
N/A						
N/A						

Anexo No.22 Informe GPS y acciones implementadas

4.5 Reporte de inspecciones pre-operacionales

Inspecciones	Cantidad
Preoperacionales Vehículos	N/A
Pero operacionales Motos	N/A
Total	**0**

Anexo No.23 No se realizaron actividades con Vehiculos (Camion Grua y/o Camion Canasta) Formatos preo operacionales

4.6 Tarjeta de rutas identificadas durante el periodo

Rutas identificadas

- **N/A**
- **N/A**

Anexo No.24 Tarjetas de rutas

4.7 Planilla de control de movilización de vehículos y motocicletas

N/A.

5. CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE HABILITACIÓN – RIESGO ELECTRICO

No aplica para el mes de mayo no ingreso personal técnico que labore con o sin tensión.

5.1 Habilitación de personal nuevo para trabajar con o sin tensión.

Nombre y Apellidos	Cargo	Tipo de Habilitación
N/A		
N/A		
N/A		

Anexo No.25 Certificados de habilitación

5.2 Reporte Formato TT5. Información de accidentes de origen eléctrico

EL **CONSORCIO ILUMINACION COROZAL,** no reporta accidentes de origen eléctrico en el periodo de mayo.

Evento	Fecha
N/A	

Anexo No.26 Archivo formato TT5 (Excel)

6. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRABAJADORES

DATOS	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA:	AGUA ANDINA
VENDEDOR:	LIDA CASTRO
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N 22-08
TELÉFONO:	320467570
VALOR MENSUAL	33.000

Anexo No.27 Informe de Laboratorio


- *Informe de Laboratorio.*

7. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

No se registran acciones cerradas y/o en seguimiento.

8. ACTIVIDADES RELEVANTES

No se han generado dado que no hay actividades operativas que impacten el SG-SST.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado:
	
Jose Eli Garcia Murillo	
Profesional HSE	**Profesional HSE Interventoría**
No. Licencia SST: 2005 de 27 Nov-2024	**Fecha de revisado:**

NOMINA

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

NÓMINA PERSONAL CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

PERIODO DE PAGO: jun-25

Nº	NOMBRE Y APELLLIDOS	CARGO	C.C.	BASICO	DIAS TRAB.	DEVENGADO			DEDUCCIONES					NETO PAGADO
						SUELDO	AUX. TRANS.	TOTAL	SALUD	PENSION	ANTICIPO	PRESTAMO	TOTAL	
1	BERNAL LOPEZ VICTOR MANUEL	RESIDENTE DE OBRA	9658390	1,800,000	8	480,000	53,333	533,333	19,200	19,200	-	-	38,400	494,933
2	FONSECA CAMARGO EDGAR	TECNICO ELECTRISISTA	4,192,375	1,600,000	8	426,667	53,333	480,000	17,067	17,067	-	-	34,133	445,867
3	GARCIA MURILLO JOSE ELI	PROFESIONAL HSEQ	74859017	1,423,500	8	379,600	53,333	432,933	15,184	15,184	-	-	30,368	402,565
4	MONROY MONTAÑEZ LUIS HERNAN	AUXILIAR DE INGENIERIA	1052390383	1,423,500	8	379,600	53,333	432,933	15,184	15,184	-	-	30,368	402,565
5	NOCUA JORGE EDUARDO	DIRECTOR DE OBRA	71301198	1,500,000	8	400,000	53,333	453,333	16,000	16,000	-	-	32,000	421,333
6	SANDOVAL GONZALEZ CAMILO ESTEBAN	AYUDATE DE OBRA	1,029,644,647	1,423,500	8	379,600	53,333	432,933	15,184	15,184	-	-	30,368	402,565
7	SILVA MORENO MARIANO	TECNICO ELECTRISISTA	74,856,441	1,500,000	8	400,000	53,333	453,333	16,000	16,000	-	-	32,000	421,333
8	TOLOZA DUEÑAS GILDARDO	TECNICO - CAPATAZ	74346706	1,800,000	8	480,000	53,333	533,333	19,200	19,200	-	-	38,400	494,933
TOTALES				**12,470,500**	**64**	**3,325,467**	**426,667**	**3,752,133**	**133,019**	**133,019**	**-**	**-**	**266,037**	**3,486,096**

LUIS DARIO PEREZ VEGA
CONTADOR
Elaboró y Revisó

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y FIC

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	7	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488529098	9488529098	E	2025/07/08	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$1,506,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (8 Afiliados)					$3,741,150	$598,800			$3,741,150	$393,200			$4,470,450	$179,100			$3,741,150	$162,900		$3,430,729	$172,100
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)					**$3,741,150**	**$598,800**			**$3,741,150**	**$393,200**			**$4,470,450**	**$179,100**			**$3,741,150**	**$162,900**		**$3,430,729**	**$172,100**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)					**$3,741,150**	**$598,800**			**$3,741,150**	**$393,200**			**$4,470,450**	**$179,100**			**$3,741,150**	**$162,900**		**$3,430,729**	**$172,100**
1	CC	9658390	BERNAL VICTOR	25-14	9	$540,000	$86,400	EPS005	9	$540,000	$67,500	CCF69	9	$692,500	$27,700	14-23	9	$540,000	$23,500	9	$692,500	$34,700
2	CC	4192375	FONSECA EDGAR	231001	9	$480,000	$76,800	EPS037	9	$480,000	$60,000	CCF69	9	$504,444	$20,200	14-23	9	$480,000	$20,900	9	$504,444	$25,300
3	CC	74859017	GARCIA JOSE	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$53,400	CCF69	9	$547,652	$22,000	14-23	9	$427,050	$18,600	9	$547,652	$27,500
4	CC	1052390383	MONROY LUIS	230301	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$53,400	CCF69	9	$506,133	$20,300	14-23	9	$427,050	$18,600	9	$506,133	$25,400
5	CC	74301198	NOCUA JORGE	230301	9	$450,000	$72,000	EPS005	9	$450,000	$18,000	CCF69	9	$577,083	$23,100	14-23	9	$450,000	$19,600	9	$0	$0
6	CC	1029644647	SANDOVAL CAMILO	230301	9	$427,050	$68,400	EPSC25	9	$427,050	$17,100	CCF69	9	$462,638	$18,600	14-23	9	$427,050	$18,600	9	$0	$0
7	CC	74856441	SILVA MARIANO	230301	9	$450,000	$72,000	EPSC25	9	$450,000	$56,300	CCF69	9	$487,500	$19,500	14-23	9	$450,000	$19,600	9	$487,500	$24,500
8	CC	74346706	TOLOZA GILDARDO	230301	9	$540,000	$86,400	EPS005	9	$540,000	$67,500	CCF69	9	$692,500	$27,700	14-23	9	$540,000	$23,500	9	$692,500	$34,700
Total		**Afiliados(8)**				**$3,741,150**	**$598,800**			**$3,741,150**	**$393,200**			**$4,470,450**	**$179,100**			**$3,741,150**	**$162,900**		**$3,430,729**	**$172,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	7	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488529098	9488529098	E	2025/07/08	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$1,506,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$598,800	$0	$0	$598,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$76,800	$0	$0	$76,800
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	2	$154,800	$0	$0	$154,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$367,200	$0	$0	$367,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$162,900	$0	$0	$162,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$162,900	$0	$0	$162,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$179,100	$0	$0	$179,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$179,100	$0	$0	$179,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$393,200	$0	$0	$393,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$73,400	$0	$0	$73,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$259,800	$0	$0	$259,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$103,200	$0	$0	$103,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$103,200	$0	$0	$103,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$68,900	$0	$0	$68,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$68,900	$0	$0	$68,900
TOTAL				8	$1,506,100	$0	$0	$1,506,100

2025/07/07 09:40 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632010590	9488580512	E	2025/07/16	2025/07/16	NEQUI	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
1	CC	33480386	MARTINEZ GLORIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

2025/07/16 09:53 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632010590	9488580512	E	2025/07/16	2025/07/16	NEQUI	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7735754

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA No. 134976706

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

FECHA DE EXPEDICIÓN		
04	07	2025
FECHA VENCIMIENTO		
09	07	2025

Nombre Pagador Consorcio Iluminación Corozal — **NIT o C.C.** 901928930

Dirección Carrera 29A — **Teléfono** +57,311

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Casanare		
CIENTO CUARENTA Y CINCUENTA PESOS (	SUBTOTAL	$ 142,350.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 142,350.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta
La impresión de este cupón debe r
Si va a cancelar con Cheque, solo
Al cancelar su pago se debe hacer
Se deben presentar todas las copia
Si se presenta algún incidente con
Términos y condiciones podrá encc

odo con cheque de gerencia).
l Bancario.
íbanos al correo certiaportes@sena.edu.co

0 80 230901 EMVCO
Redeban
JUL 07 2025 09:58:04 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS YOPAL
CRA 29 14 47 FRENTE BAN
C.UNICO: 3007023134 TER: GZ006722
RECIBO: 219139 RRN: 240331
RECAUDO APRO: 512344
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7735754
VALOR $ 142.350
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** COMERCIO ***

(415)7707012100010(8020)7735754(3900)000000142350(96)20250709

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 — **REFERENCIA No.** 134976706

Ciudad | D | M | A | NIT 901928930 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: Consorcio Iluminación

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, GLORIA SOFIA MARTINEZ, identificado con C.C.33.480.386 de Yopal, en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL. identificada con Nit.901.928.930-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de Entidades promotoras de salud, riesgos laborales, fondo de pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, legalmente exigibles a la fecha fueron oportunamente pagados por el consorcio durante los últimos tres (3) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, LUIS DARIO PEREZ VEGA, identificado con cedula de ciudadanía No.74.083.561 de Sogamoso y con Tarjeta Profesional No. 154918-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador público del CONSORCIO ILUMINACION COROZAL identificada con Nit.901.928.930-7, certifico el pago de los aportes de Entidades promotoras de salud, riesgos laborales, fondo de pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, legalmente exigibles a la fecha fueron oportunamente pagados por el consorcio durante los últimos tres (3) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma a los 25 días del mes de julio de 2025

GLORIA SOFIA MARTINEZ
R/L CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

LUIS DARIO PEREZ VEGA
T.P. 154918-T
Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74083561

PEREZ VEGA
APELLIDOS

LUIS DARIO
NOMBRES

Luis Dario Perez Vega
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1984
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

04-OCT-2002 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-0727700-34115801-M-0074083561-20030610 0626603160A 01 125377394

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0ZEE70D16A45FA0F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

CONSORCIO ILUMINACION COROZAL

Que el contador público **LUIS DARIO PEREZ VEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74083561 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 154918-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



VALIDO UNICAMENTE PARA CONSORCIO ILUMINACION COROZAL

BITACORA

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: **No 186-2025**

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA	domingo, 1 de junio de 2025

1. CONDICIONES CLIMATICAS PREDOMINANTES

DIA SOLEADO.		NO		DIA LLUVIOSO		NO		DIA TORMENTA ELECTRICA	NO
HORA:	0:00	0:00		HORA:	0:00	0:00		HORA:	0:00 A 0:00

2. RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA

CARGO (Personal contratista de obra)	Número	TOTAL	CARGO (Personal de Interventoría)	Número	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA	1	6	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	4
RESIDENTE OBRA	1		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	
CAPATAZ	1		PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL	1	
TECNICOS	2		PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y GESTION SOCIAL	1	
OBREROS	1		INSPECTORES		
PROFESIONAL HSE	0		CUADRILLA DE TOPOGRAFIA		

4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Domingo, no se laboró.

5. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO	LUGAR

OBSERVACIONES RELACIONADAS AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

6. REQUERIMIENTOS, INQUIETUDES, OBSERVACIONES, SOLUCIONES Y RESPUESTAS ELEVADAS POR LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA DE OBRA Y/O SUPERVISONES

FIRMA:
NOMBRE: **VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ**
CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
NOMBRE: **RICARDO PULIDO**
CARGO: ING RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: **No 186-2025**

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA	lunes, 2 de junio de 2025

1. CONDICIONES CLIMATICAS PREDOMINANTES

DIA SOLEADO.	SI		DIA LLUVIOSO	NO		DIA TORMENTA ELECTRICA	NO
HORA:	7:00	17:00 p.m	HORA:	0:00	0:00	HORA: 0:00 A	0:00

2. RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA

CARGO (Personal contratista de obra)	Número	TOTAL	CARGO (Personal de Interventoría)	Número	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA	1	6	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	4
RESIDENTE OBRA	1		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	
CAPATAZ	1		PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL	1	
TECNICOS	2		PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y GESTION SOCIAL	1	
OBREROS	1		INSPECTORES		
PROFESIONAL HSE	0		CUADRILLA DE TOPOGRAFIA		

4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Día festivo, no se laboró

5. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO	LUGAR

OBSERVACIONES RELACIONADAS AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

6. REQUERIMIENTOS, INQUIETUDES, OBSERVACIONES, SOLUCIONES Y RESPUESTAS ELEVADAS POR LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA DE OBRA Y/O SUPERVISONES

FIRMA:
NOMBRE: **VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ**
CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
NOMBRE: **RICARDO PULIDO**
CARGO: ING RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: **No 186-2025**

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA	miércoles, 4 de junio de 2025

1. CONDICIONES CLIMATICAS PREDOMINANTES

DIA SOLEADO.	SI		DIA LLUVIOSO	NO		DIA TORMENTA ELECTRICA	NO
HORA:	7:00	17:00 p.m	HORA:	0:00	0:00	HORA: 0:00 A	0:00

2. RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA

CARGO (Personal contratista de obra)	Número	TOTAL	CARGO (Personal de Interventoría)	Número	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA	1	6	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	4
RESIDENTE OBRA	1		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	
CAPATAZ	1		PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL	1	
TECNICOS	2		PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y GESTION SOCIAL	1	
OBREROS	1		INSPECTORES		
PROFESIONAL HSE	0		CUADRILLA DE TOPOGRAFIA		

4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

El capataz de la obra previo al inicio de actividades realiza charla tecnica y de seguridad y salud en el trabajo, en donde recalca el uso de elementos de proteccion personal y seguir los lineamientos para el trabajo seguro en alturas. Se realizó la cimentación de 4 postes de baja tensión. Suministro e instalación de 5 estructuras LA-320 para red de baja tensión

5. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO	LUGAR

OBSERVACIONES RELACIONADAS AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

6. REQUERIMIENTOS, INQUIETUDES, OBSERVACIONES, SOLUCIONES Y RESPUESTAS ELEVADAS POR LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA DE OBRA Y/O SUPERVISONES

FIRMA:
NOMBRE: **VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ**
CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
NOMBRE: **RICARDO PULIDO**
CARGO: ING RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: **No 186-2025**

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA	miércoles, 4 de junio de 2025

1. CONDICIONES CLIMATICAS PREDOMINANTES

DIA SOLEADO.	SI		DIA LLUVIOSO	NO		DIA TORMENTA ELECTRICA	NO	
HORA:	7:00	12:00	HORA:	14:00	17:00	HORA:	0:00 A	0:00

2. RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA

CARGO (Personal contratista de obra)	Número	TOTAL	CARGO (Personal de Interventoría)	Número	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA	1	6	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	4
RESIDENTE OBRA	1		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	
CAPATAZ	1		PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL	1	
TECNICOS	2		PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y GESTION SOCIAL	1	
OBREROS	1		INSPECTORES		
PROFESIONAL HSE	0		CUADRILLA DE TOPOGRAFIA		

4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

El día de hoy se realiza la vestida de 6 estructuras de paso LA-320, vestida de 3 estructuras de retención final de circuito LA-321, vestida de 2 estructuras de doble retención LA-327.

5. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO	LUGAR

OBSERVACIONES RELACIONADAS AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

6. REQUERIMIENTOS, INQUIETUDES, OBSERVACIONES, SOLUCIONES Y RESPUESTAS ELEVADAS POR LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA DE OBRA Y/O SUPERVISONES

FIRMA:
NOMBRE: **VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ**
CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
NOMBRE: **RICARDO PULIDO**
CARGO: ING RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: **No 186-2025**

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA	jueves, 5 de junio de 2025

1. CONDICIONES CLIMATICAS PREDOMINANTES

DIA SOLEADO.	SI		DIA LLUVIOSO	SI		DIA TORMENTA ELECTRICA	NO	
HORA:	7:00	12:00	HORA:	14:00	17:00	HORA:	0:00 A	0:00

2. RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA

CARGO (Personal contratista de obra)	Número	TOTAL	CARGO (Personal de Interventoría)	Número	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA	1	6	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	4
RESIDENTE OBRA	1		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	
CAPATAZ	1		PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL	1	
TECNICOS	2		PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y GESTION SOCIAL	1	
OBREROS	1		INSPECTORES		
PROFESIONAL HSE	0		CUADRILLA DE TOPOGRAFIA		

4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Se realiza la tendida tensionada de 300 m red trenzada de baja tensión en cable aluminio XLPE 2X35mm2 +1X35mm2

5. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO	LUGAR

OBSERVACIONES RELACIONADAS AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

6. REQUERIMIENTOS, INQUIETUDES, OBSERVACIONES, SOLUCIONES Y RESPUESTAS ELEVADAS POR LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA DE OBRA Y/O SUPERVISONES

FIRMA:
NOMBRE: **VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ**
CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
NOMBRE: **RICARDO PULIDO**
CARGO: ING RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: **No 186-2025**

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA	viernes, 6 de junio de 2025

1. CONDICIONES CLIMATICAS PREDOMINANTES

DIA SOLEADO.	SI		DIA LLUVIOSO	NO		DIA TORMENTA ELECTRICA	NO
HORA:	7:00	17:00 p.m	HORA:	0:00	0:00	HORA: 0:00 A	0:00

2. RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA

CARGO (Personal contratista de obra)	Número	TOTAL	CARGO (Personal de Interventoría)	Número	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA	1	6	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	4
RESIDENTE OBRA	1		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	
CAPATAZ	1		PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL	1	
TECNICOS	2		PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y GESTION SOCIAL	1	
OBREROS	1		INSPECTORES	0	
PROFESIONAL HSE	0		CUADRILLA DE TOPOGRAFIA	0	

4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Se realiza la tendida tensionada de 320 m red trenzada de baja tensión en cable aluminio XLPE 2X35mm2 +1X35mm2

5. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO	LUGAR

OBSERVACIONES RELACIONADAS AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

La supervisión solicita que para la socialización se lleve impresos los planos del proyecto para sustentarle a la comunidad el alcance del proyecto.

6. REQUERIMIENTOS, INQUIETUDES, OBSERVACIONES, SOLUCIONES Y RESPUESTAS ELEVADAS POR LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA DE OBRA Y/O SUPERVISONES

FIRMA:
NOMBRE: **VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ**
CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
NOMBRE: **RICARDO PULIDO**
CARGO: ING RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: **No 186-2025**

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA	domingo, 8 de junio de 2025

1. CONDICIONES CLIMATICAS PREDOMINANTES

DIA SOLEADO.	SI		DIA LLUVIOSO	NO		DIA TORMENTA ELECTRICA	NO	
HORA:	7:00	17:00 p.m	HORA:	0:00	0:00	HORA:	0:00 A	0:00

2. RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA

CARGO (Personal contratista de obra)	Número	TOTAL	CARGO (Personal de Interventoría)	Número	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA	1	6	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	4
RESIDENTE OBRA	1		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	
CAPATAZ	1		PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL	1	
TECNICOS	2		PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD Y GESTION SOCIAL	1	
OBREROS	1		INSPECTORES		
PROFESIONAL HSE	0		CUADRILLA DE TOPOGRAFIA		

4. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Día festivo. No se laboró en campo, el contrato de obra se suspendio, por el termino de un mes, debido a condiciones climatoicas a

5. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN REALIZADA Y/O DOCUMENTO ENTREGADO	LUGAR

OBSERVACIONES RELACIONADAS AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

6. REQUERIMIENTOS, INQUIETUDES, OBSERVACIONES, SOLUCIONES Y RESPUESTAS ELEVADAS POR LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA DE OBRA Y/O SUPERVISONES

FIRMA:
NOMBRE: **VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ**
CARGO: ING. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:
NOMBRE: **RICARDO PULIDO**
CARGO: ING RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com


REGISTRO FOTOGRAFICO



CIMENTACIÓN POSTE EXTRARREFORZADO




CIMENTACIÓN POSTE EXTRARREFORZADO

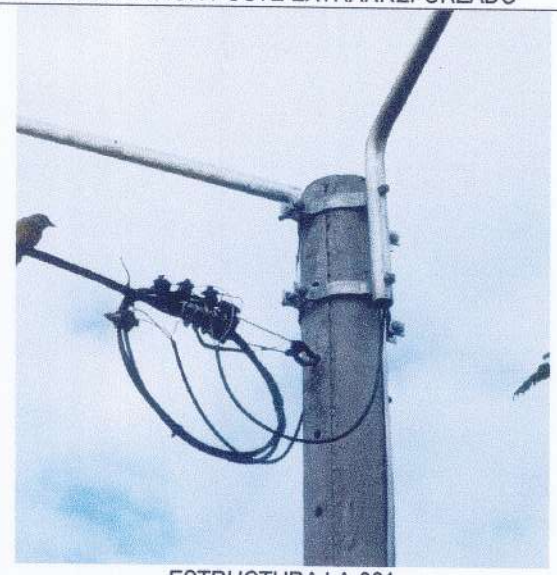

ESTRUCTURA LA-321



ESTRUCTURA LA-327

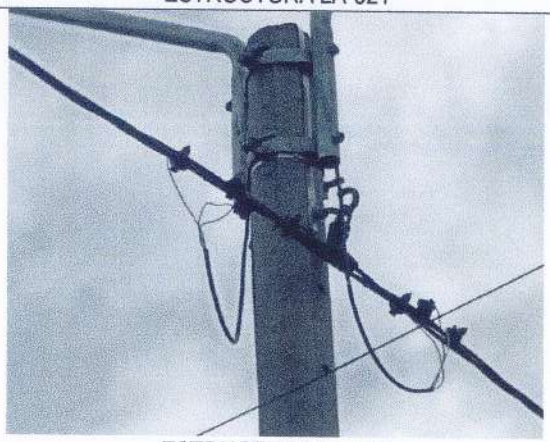

ESTRUCTURA LA-320



RED TRENZADA 2X35mm2 + 1x35mm2


Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com



CIMENTACIÓN POSTE DE BAJA TENSIÓN



RED TRENZADA 2x35mm2 + 1x35mm2

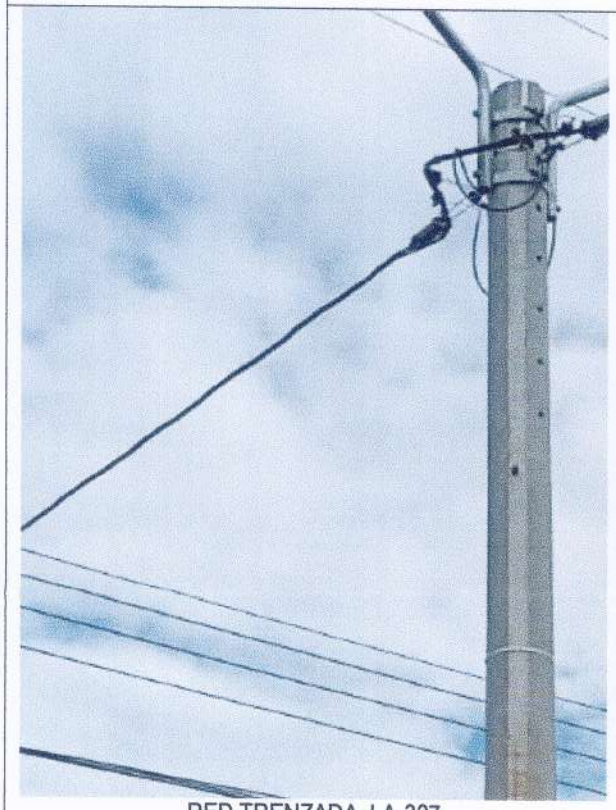

RED TRENZADA, LA-327



ESTRCUTURA FINAL DE CIRCUITO

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

Recibida

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

Outlook

OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.01

Desde Wilson Nossa ELECTRICOM <electricomltda@gmail.com>
Fecha Mié 4/06/2025 9:26 AM
Para GLOSOMAR@hotmail.com <GLOSOMAR@hotmail.com>; victor bernal <vimabelo100@hotmail.com>; ricardo leon pulido aguirre <rilepuag@gmail.com>

1 archivo adjunto (763 KB)
eli 120 observaciones informe mensual 1.pdf;

Cordial Saludo,

Cordial saludo,

Luego de la revisión del informe de obra correspondiente al contrato en referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones y solicitudes de ajuste, con el fin de garantizar la coherencia, veracidad y completitud de la información presentada:

- Solicitamos amablemente anexar cédula de identidad del contador.
- Corregir Informe de seguridad y salud en el trabajo.

Agradecemos de antemano su atención a estas observaciones, y quedamos atentos a la entrega del informe corregido en el menor tiempo posible.

Cordialmente,

Gracias,

ELECTRICOM
INGENIERÍA S.A.S.
ING. WILSON NOSSA GRANADOS
Ing. Electricista U.N. Esp Uniandes.
Yopal - Casanare - Colombia
Tels. 6333936
Cels. 314 4420397 - 310 6258239
Cra. 19 No. 25 - 55 * electricomltda@gmail.com
@electricomsas * www.electricomingenieria.com

Enviada

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

Outlook

Solicitud suspensión contrato de obra

Desde victor bernal <vimabelo100@hotmail.com>
Fecha Mié 4/06/2025 6:25 PM
Para Wilson Nossa ELECTRICOM <electricomltda@gmail.com>
CC Hugo .Fernandez <hufernandez44@gmail.com>

1 archivo adjunto (2 MB)
Solicitud de suspensión.pdf;

Yopal, 04 de junio de 2025

Señores
ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S
R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
INTERVENTORIA
Yopal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 186-2025 AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Solicitud de suspensión de contrato de obra 186-2025

Cordial Saludo,

En nuestra calidad de contratistas del proyecto en referencia, nos permitimos informar y sustentar la necesidad de suspender temporalmente las actividades de obra, por las siguientes razones:

1. Condiciones climáticas adversas. Durante las últimas semanas se han presentado precipitaciones constantes e intensas, lo que ha afectado de manera directa la ejecución de las actividades programadas en obra y realización segura de labores en campo.

2. Adicionalmente, el proveedor de las luminarias previstas en el contrato ha presentado retrasos en los tiempos de entrega, debido a factores logísticos y de disponibilidad de inventario. Esta situación ha sido debidamente documentada y comunicada por el proveedor, quien ha reprogramado la fecha de entrega para los

próximos días, fuera del cronograma inicialmente establecido. Así mismo se pudo establecer que otro proveedor de luminarias también tiene tiempo de entregas de hasta 45 días después de recibida la orden de compra.

Dado que las luminarias son un elemento esencial para la continuidad de las actividades, esta situación genera un impacto directo sobre el desarrollo del proyecto.

Lo anterior se encuentra debidamente sustentado en el informe de solicitud de suspensión anexado a la presente.

Por lo tanto, solicitamos de manera formal la suspensión del contrato de obra por el término de un (01) mes, con el propósito de preservar la calidad técnica del proyecto, la seguridad del personal en campo y la correcta administración de los recursos involucrados.

Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos a la respuesta por parte de la interventoría y de la entidad contratante, así como a cualquier requerimiento adicional que consideren pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ

Outlook

RE: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.01

Desde victor bernal <vimabelo100@hotmail.com>
Fecha Jue 5/06/2025 8:11 AM
Para Wilson Nossa ELECTRICOM <electricomltda@gmail.com>
CC Hugo .Fernandez <hufernandez44@gmail.com>

2 archivos adjuntos (32 MB)
INFORME HSE ABRIL.rar; CEDULA contador.pdf;

Yopal, 05 de junio de 2025

Señores
ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S
R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
INTERVENTORIA
Yopal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 186-2025 AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Respuesta a observaciones informe mensual 01.

Cordial Saludo,

De acuerdo a la solicitud de ajuste del informe mensual de obra, nos permitimos enviar por este medio los archivos ajustados con el fin que sean revisados de forma digital y una vez se corrobore que las correcciones están acorde a lo solicitado se procederá a imprimir y entregar en físico.

Agradezco su colaboración.

Sin otro particular,

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ

Outlook

Informe de Replanteo

Desde victor bernal <vimabelo100@hotmail.com>
Fecha Vie 6/06/2025 4:08 PM
Para Wilson Nossa ELECTRICOM <electricomltda@gmail.com>
CC Hugo .Fernandez <hufernandez44@gmail.com>

1 archivo adjunto (32 MB)
INFORME DE REPLANTEO.rar;

Yopal, 06 de junio de 2025

Señores
ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S
R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
INTERVENTORIA
Yopal

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 186-2025 AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Entrega informe de replanteo

Cordial Saludo,

En nuestra calidad de contratistas del proyecto en referencia, nos permitimos hacer entrega formal del Informe de Replanteo en cumplimiento de las obligaciones contractuales. El presente informe contiene la información técnica que sustentan las actividades de replanteo realizadas, la presente entrega se realiza de forma digital con el fin que sea revisado una vez se tenga visto bueno será realizara la entrega en medio físico.

Atentamente,

Outlook

Informe mensual 02

Desde victor bernal <vimabelo100@hotmail.com>
Fecha Mar 17/06/2025 12:47 PM
Para Wilson Nossa ELECTRICOM <electricomltda@gmail.com>
CC Hugo .Fernandez <hufernandez44@gmail.com>

Yopal, 17 de junio de 2025

Señores
ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S
R/L WISON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Yopal – Casanare.

Ref: CONTRATO DE OBRA 186-2025. AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Entrega de informe mensual 02 de Obra

En nuestra calidad de contratista de la obra en referencia y en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas nos permitimos realizar la entrega del informe mensual N° 02 correspondiente al periodo desde el 01 al 31 de mayo de 2025. el cual incluye el avance físico de obra y soporte de las actividades desarrolladas durante el periodo. De igual forma en el presente informe se anexa el informe de inversión de anticipo solicitado por la interventoría mediante oficio.

INFORME MENSUAL 02.rar

Atentamente,

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ

Outlook

Poste media tensión en mal estado

Desde victor bernal <vimabelo100@hotmail.com>
Fecha Mié 18/06/2025 10:39 AM
Para Wilson Nossa ELECTRICOM <electricomltda@gmail.com>
CC Hugo .Fernandez <hufernandez44@gmail.com>

1 archivo adjunto (385 KB)
Poste Media Tensión mal estado.pdf;

Yopal, 18 de junio de 2025

Señores
ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S
R/L WISON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Yopal – Casanare.

Ref: CONTRATO DE OBRA 186-2025. AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Poste media tensión en mal estado

En el oficio adjunto, nos permitimos informar acerca de un poste de media tensión el cual esta en mal estado, dentro del alcance del proyecto, no se encuentran actividades relacionadas con red de media tensión. Por lo tanto, solicitamos comedidamente a la interventoría informar al operador de red con la finalidad que se hagan los correctivos pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ

INFORME PMT

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES MANEJO DE TRÁNSITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Municipio de Hato Corozal – Departamento de Casanare

Mes de Ejecución: JUNIO/2025

CONTRATISTA: **CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL**

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

1. Resumen General del Avance

Durante el mes de junio, se llevaron a cabo las actividades programadas relacionadas con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), en conformidad con el Manual de Señalización Vial 2015 y la normatividad vigente del Ministerio de Transporte.

2. Actividades Ejecutadas

Las principales actividades desarrolladas fueron:

- Implementación de señalización temporal:
  - Ubicación de conos retrorreflectivos y bandas reflectivas según especificaciones.
  - Delimitación de zonas de obra mediante cintas plásticas.

- Control de tránsito:
  - Ejecución de cierres de media calzada entre las 07:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 horas.
  - Uso de auxiliares de tránsito en puntos críticos para el control del flujo vehicular en zonas de baja visibilidad o intersecciones.

- Seguridad vial:
  - Mantenimiento de áreas despejadas en las zonas de seguridad.
  - Priorización del paso para vehículos de emergencia en caso de requerirse.
  - Iluminación y visibilidad reforzada en zonas de trabajo durante la noche, mediante elementos luminosos en conos.
- Divulgación comunitaria:
  - Socialización del PMT con residentes y comerciantes de las zonas intervenidas.
  - Coordinación con la interventoría para la adaptación del PMT según condiciones reales del terreno.

3. Zonas Intervenidas

Durante este periodo, se ejecutaron trabajos en los siguientes sectores del casco urbano de Hato Corozal:

- Calle 7
- Carrera 16
- Carrera 15
- Carrera 14

- Calle 1
- Calle 10
- Carrera 1

4. Observaciones

- Se mantuvo circulación vehicular en ambos sentidos en todos los sectores intervenidos.
- No se presentaron accidentes de tránsito relacionados con la obra.

VÍCTOR MANUEL BERNAL LÓPEZ
Residente de Obra

ANEXO FOTOGRÁFICO – ACTIVIDADES DE MANEJO DE TRÁNSITO

A continuación, se presentan registros fotográficos de las actividades realizadas durante la implementación del PMT en el mes reportado:




Señalización actividad hincada de postería




Señalización actividad hincada de postería



Señalización actividad hincada de postería

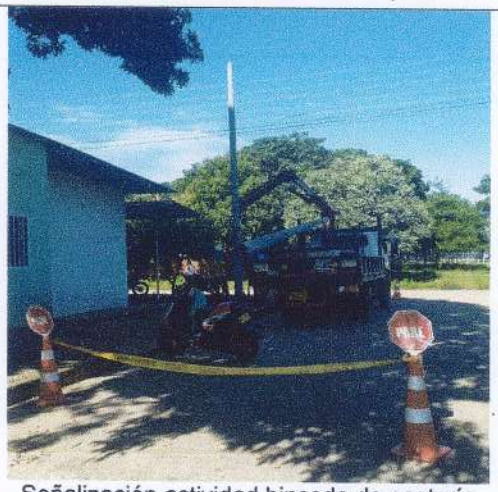

Señalización actividad hincada de postería

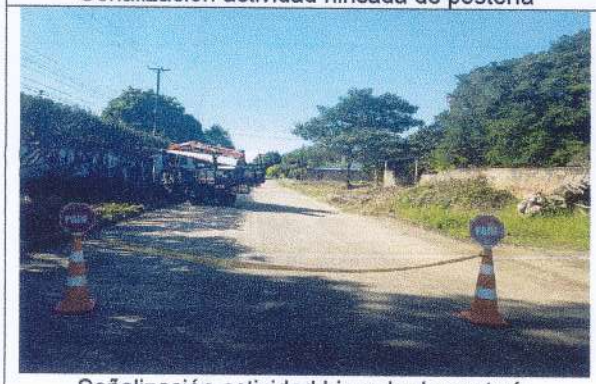

Señalización actividad hincada de postería



Señalización actividad hincada de postería

INFORME PMA

Carrera 29A N 23-04 Yopal – Casanare
vimabelo100@hotmail.com

INFORME DE GESTION DE PROGRAMA AMBIENTAL

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

JUNIO

2025

1. INTRODUCCION

El presente informe se da a conocer el informe ambiental, correspondiente a la ejecución del Contrato de Obra N° 186 "AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

El **CONSORCIO ILUMINACION COROZA**L, dando alcance y cumplimiento a los requisitos ambientales, evaluando así la ejecución del programa de manejo Ambiental dentro del periodo del 1 al 8 del mes de junio de 2025

2. OBJETIVO

Dar cumplimiento a los requisitos ambientales contractuales y a los contemplados dentro la gestión del Programa de Manejo ambiental en el mes de junio de 2025.

3. RESIDUOS SOLIDOS


TOTAL, RESIDUOS GENERADOS Y ENTREGADOS DESDE 01 JUNIO 2025 HASTA 08 DE JUNIO DEL 2025

MES	BIODEGRADABLE	RECICLABLE
JUNIO	5	0,5



TOTAL, DE DESECHOS GENERADOS Y ENTREGADOS EN EL MES DE MAYO DE 2025

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	%
RECICLABLES	0,5	9%
BIODEGRADABLES	5	91%
TOTAL	**5,5**	**100%**

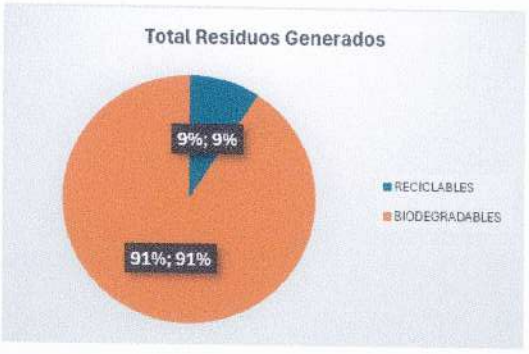

En el **CONSORCIO ILUMINACION COROZAL** en el mes de junio de 2025 se generó:



RESIDUOS BIODEGRADABLES

Un 91% de residuos biodegradables (Ramas) que han sido entregados una (1) vez por mes por el carro recolector de aseo urbano, se genera en promedio 5 kg/ mes. Se puede observar que no hay una considerable generación de residuos orgánicos y biodegradables, durante el mes de junio.

RESIDUOS RECICLABLES

Un 9% son reciclables (Plásticos, papel), los cuales son entregados a los recicladores cada mes, se genera en promedio 0,5 kg/mes, lo cual muestra el cumplimiento en la recolección y clasificación de plásticos por Bolsas de Agua, como en la de reducción de uso de papel.

Es de resaltar que el **CONSORCIO ILUMINACION COROZAL**, busca contribuir y realizar un buen desempeño en el manejo de los residuos sólidos generados,

sensibilizando a su personal con el fin de minimizar su generación y realizar una adecuada clasificación.

- **Indicador de reciclaje (IDR)** :

Residuos reciclados/ Total de Residuos *100

IDR = 0,5 kg / 5,5 kg *100 = 9% de residuos reciclados

- **Indicador para relleno sanitario (IRS)**

Residuos biodegradables / Total de residuos *100

IRRS: 5 kg / 5,5 kg *100 = 91% de residuos recolectados por aseo urbano

4. PROGRAMAS DE USO RACIONAL DE AGUA Y ENERGÍA

Para los programas de gestión uso racional de agua se tienen previsto realizar campañas de concientización y monitoreo de metros cúbicos de agua y consumo en KW de energía.







5.2 DESRAME Y TROZADO CON PEINILLA.

- ✓ Uso de EPP.
- ✓ Sujete la herramienta manual (Peinilla) de manera que realice de forma segura el corte de las ramas del árbol, manteniendo el control en todo momento.
- ✓ Evite trabajar mientras llueve.
- ✓ Inspeccionar el área a intervenir (árbol), advirtiendo el peligro biológico con la presencia de nidos de avispas, abejas, etc.
- ✓ Prestar atención a los obstáculos: raíces – ¡peligro de tropezar!
- ✓ Adoptar siempre una postura estable y segura.
- ✓ No tolerar la presencia de otras personas en un círculo de 1,5 m – los objetos representan un ¡riesgo de lesiones.
- ✓ Se debe señalizar adecuadamente las zonas a intervenir con el fin de prevenir el ingreso de personal a zonas con riesgos de caída.
- ✓ Orden y aseo. (Realizando clasificación de los residuos generados).

Elaboró	Aprobó:
Profesional HSE Contrato de Obra	Residente de Obra

Revisado y Aprobado Interventoría:
Jaeb Yerabin Gayeneche
Profesional Ambiental de Interventoría
Fecha de revisado:

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 1

✓ **Planillas de Seguridad Social Integral del personal (ARL, Pensión y Salud).**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	7	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488529098	9488529098	E	2025/07/08	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$1,506,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (8 Afiliados)						$3,741,150	$598,800			$3,741,150	$393,200			$4,470,450	$179,100			$3,741,150	$162,900		$3,430,729	$172,100
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)						$3,741,150	$598,800			$3,741,150	$393,200			$4,470,450	$179,100			$3,741,150	$162,900		$3,430,729	$172,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)						$3,741,150	$598,800			$3,741,150	$393,200			$4,470,450	$179,100			$3,741,150	$162,900		$3,430,729	$172,100
1	CC	9658390	BERNAL VICTOR	25-14	9	$540,000	$86,400	EPS005	9	$540,000	$67,500	CCF69	9	$692,500	$27,700	14-23	9	$540,000	$23,500	9	$692,500	$34,700
2	CC	4192375	FONSECA EDGAR	231001	9	$480,000	$76,800	EPS037	9	$480,000	$60,000	CCF69	9	$504,444	$20,200	14-23	9	$480,000	$20,900	9	$504,444	$25,300
3	CC	74859017	GARCIA JOSE	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$53,400	CCF69	9	$547,652	$22,000	14-23	9	$427,050	$18,600	9	$547,652	$27,500
4	CC	1052390383	MONROY LUIS	230301	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$53,400	CCF69	9	$506,133	$20,300	14-23	9	$427,050	$18,600	9	$506,133	$25,400
5	CC	74301198	NOCUA JORGE	230301	9	$450,000	$72,000	EPS005	9	$450,000	$18,000	CCF69	9	$577,083	$23,100	14-23	9	$450,000	$19,600	9	$0	$0
6	CC	1029644647	SANDOVAL CAMILO	230301	9	$427,050	$68,400	EPSC25	9	$427,050	$17,100	CCF69	9	$462,638	$18,600	14-23	9	$427,050	$18,600	9	$0	$0
7	CC	74856441	SILVA MARIANO	230301	9	$450,000	$72,000	EPSC25	9	$450,000	$56,300	CCF69	9	$487,500	$19,500	14-23	9	$450,000	$19,600	9	$487,500	$24,500
8	CC	74346706	TOLOZA GILDARDO	230301	9	$540,000	$86,400	EPS005	9	$540,000	$67,500	CCF69	9	$692,500	$27,700	14-23	9	$540,000	$23,500	9	$692,500	$34,700
Total			**Afiliados(8)**			$3,741,150	$598,800			$3,741,150	$393,200			$4,470,450	$179,100			$3,741,150	$162,900		$3,430,729	$172,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	7	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488529098	9488529098	E	2025/07/08	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$1,506,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$598,800	$0	$0	$598,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$76,800	$0	$0	$76,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$154,800	$0	$0	$154,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$367,200	$0	$0	$367,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$162,900	$0	$0	$162,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$162,900	$0	$0	$162,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$179,100	$0	$0	$179,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$179,100	$0	$0	$179,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$393,200	$0	$0	$393,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$73,400	$0	$0	$73,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$259,800	$0	$0	$259,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$103,200	$0	$0	$103,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$103,200	$0	$0	$103,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$68,900	$0	$0	$68,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$68,900	$0	$0	$68,900
TOTAL				8	$1,506,100	$0	$0	$1,506,100

2025/07/07 09:40 AM

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 2

✓ **Certificados de incapacidad por causa laboral o común en el mes**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXOS 3

✓ **Soportes de mantenimientos preventivos y correctivos realizados (Facturas)**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 4

✓ **Registros de actividades ejecutadas (Asistencia Charlas de seguridad).**

CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-027
		FECHA: 01-MAYO-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Hato Corozal	Operativo - H.C. Vibaro	03	06	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	✓	Aguafiestas
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Camilo Sandoval	1029644647	Ayudante	
2	Mariano Silva	74856441	Electrico	
3	Edgar Fonseca	4192375	Tecnico	
4	Gildardo Tolosa	74348706	Capataz	
5	Briselio Fonseca	74.130.616	Supervisor	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Gildardo Tolosa	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-027
		FECHA: 01-MAYO-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Hato Corozal (Casanare	Operativo U.H.C.	04	06	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	✓	Conservemos lo que tenemos
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Mariano Silva	74.856.441	Tecnico electricista	
2	Edgar Fonseca	4.192.375	Tecnico electricista	
3	Camilo Gonzalez	1.024.641.647	Ayudante	
4	Gildardo Toloza	74.316.706	Tecnico electricista	
5	Bricelio Fonseca	79.130.676	Supervisor	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Gildardo Toloza	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-027
		FECHA: 01-MAYO-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Hato (Corozal)	Zona Rural - Vibora H-C.	05	06	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	✓	Hirerros antes de actuar
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Camilo Sandoval	1029699697	Ayudante	
2	Mariano Silva	79856991	Tecnico electricista	
3	Edgar Fonseca	4192375	Tecnico electricista	
4	Gildardo Toloza	79.341.706.	capataz	
5	Briccio Fonseca	79.130.676.	supervisor	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Gildardo Toloza P.	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACION CORAZA	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-027
		FECHA: 01-MAYO-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Plato Cesar	Urbana Plato Cesar	06	05	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		Prevención uso de escalera dieléctrica
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Camilo Sandoval	1129614697	Ayudante	
2	Kariana Silva	1065861991	Tecnico electricista	
3	Edgar Fonseca	91192395	Tecnico electricista	
4	Gildardo Tolosa	91377706	operario 2	
5	Bricelio Fonseca	77130696	Supervisor	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Gildardo Tolosa	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-027
		FECHA: 01-MAYO-2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Norte Corozal	Vibora Norte Corozal	09	06	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	✓	Prohibido escapar
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Edgar Fonseca	4192375	Tecnico electricista	
2	Camilo Gonzalez	1029699697	Ayudante	
3	Mariano Silva	79856491	Tecnico electricista	
4	Gildardo Tobia	79341706	Copatem	
5	Bucalo Fonseca	79130676	Supervisor	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Gildardo Tobia	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 5

✓ **Registros entrega de EPP y Dotación.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 6

✓ **Registro toma de alcoholemias realizadas.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 7

✓ **Registros de inspección.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-060
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Ver. 01
		Fecha. 30/04/2025

LUGAR: TODOS LOS CONTRATOS — **CONTRATO Nº:** N/A

En las casillas de los aspectos a revisar se debe diligenciar unicamente una de las siguientes abreviaturas según corresponda a la inspección o condiciones observadas:
B: Bueno. M: Malo. NT: No tiene. N/A: No Aplica. NR: No se puede revisar o no es visible.

Fecha inspección	Ubicación del extintor	Capacidad	Clase	Aspectos a revisar (Estado)								Fecha de Vencimiento	QUIEN INSPECCIONA			OBSERVACIONES
				Cilindro	Manguera	Boquilla	Manija de transporte	Manija de disparo	Manómetro	Etiqueta	Estado Pintura		Nombre del trabajador	Cargo	Firma	
30-06-25	Oficina	20Lb	PBC	B	B	B	B	B	B	B	B	16-12-25	Jose Garcia	Apl. HSE		

	Firma Inspector		Vo.Bo. Profesional SST	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	CODIGO: FT-SST-050 Version: 01 Fecha: 30-04-2025

Fecha?

Nombre del Inspector: Jose Eli Garcia — Cargo: Profesional HSE

Fecha: 30-junio 2025 — Área: Administrativa

ELEMENTOS BOTIQUÍN TIPO A			INSPECCIÓN		
ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD	C	NC	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS PAQUETE	1	1	SI		
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1	1	SI		
BAJALENGUAS	1	1	SI		
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	1	1 par.	SI		
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1	1	SI		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	1	1	SI		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1	1	SI		
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1	1	SI		
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	1	1	SI		
ISODINE	1	1 Frasco	SI		
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	1	1 Frasco	SI		
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1	1	SI		
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	1	1 Frasco	SI		
ALGODÓN	1	1	SI		
ELEMENTOS DE EMERGENCIA - CAMILLA					
EL SITIO SE ENCUENTRA SEÑALIZADO	SI				
LAS CORREAS DE AMARRE DE SEGURIDAD SE ENCUENTRAN COMPLETAS	SI				
LAS CORREAS DE AMARRE DE SEGURIDAD SE ENCUENTRAN SIN ORIFICIOS Y/O DEFECTUOSOS	SI				
INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA EN ESPUMA	SI				
INMOVILIZADOR DE CUELLO O CERVICAL	SI				
ARNES DE SUJECCION EXTERMIDADES SUPERIORES E INFERIORES TIPO ARAÑA	SI				

Observaciones:

Firma Inspector

Vo.Bo. Profesional SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN CORZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO FT-SST-056
	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Versión 02
		Fecha 01-05-2025
		Pagina 1 de 1

Fecha?

Fecha de Inspección:	30-jun-2025	Hora:	11:00 am	Area / Unidad operativa:	Administrativa	UBICACION:	OFICINA
Inspección realizada por:	Lia Ina H 13-04						
Dirección:				Telefono:			

LISTA DE CHEQUEO

Nro.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	OBSERVACIONES
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural	✓			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	✓			
1.3	Hay buena ventilación en el área.	✓			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 dB).	✓			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador)			✓	
1.6	La temperatura es confortable.	✓			
2	PELIGROS LOCATIVOS				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	✓			
2.2	Escaleras en buen estado (pasa manos, antideslizantes)	✓			
2.3	Pisos en buen estado	✓			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas)	✓			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras)	✓			
2.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacen, etc)	✓			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	✓			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	✓			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones			✓	
3	PELIGROS ELECTRICOS				
3.1	Cables eléctricos debidamente aislados.	✓			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado	✓			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	✓			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga	✓			
3.5	Cables en buen estado	✓			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	✓			
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	✓			
3.8	Existe señalización de peligros.	✓			
4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	✓			
4.2	Extintores de carga vigente	✓			
4.3	Extintores libre de obstáculos	✓			
4.4	Existe señalización de extintores	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP)	✓			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria)	✓			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	✓			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud o hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	PELIGROS BIOLOGICOS				
5.1	El área esta libre de insectos y roedores.	✓			
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	✓			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	✓			
6.3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base	✓			
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena estan dentro de los límites permisibles	✓			
7	ORDEN Y ASEO				
7.1	El área se encuentra organizada	✓			
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	✓			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	✓			
7.4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	✓			
8	SANEAMIENTO BASICO				
8.1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	✓			
8.2	Luminarias de baños en buen estado.	✓			
8.3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	✓			
8.4	Estan los inodoros limpios en buen estado.	✓			
8.5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.	✓			

Powered by CamScanner

37

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO FT-SST-056
	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Versión 02
		Fecha 01-05-2025
		Página 1 de 1

9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)				
9.1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓		✓	
9.2	Archivo rodante en buen estado				
10	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
10.1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad	✓			
10.2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos	✓			
10.3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	✓			
10.4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓			
10.5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP	✓			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Horno microondas (Si aplica)	✓		✓	
	Nevera. (Si aplica)	✓			
	Calefactor. (Si aplica)				
	Aire Acondicionado. (Si aplica)			✓	
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	✓			
	Computador. (Si aplica)	✓			
	Otro				
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia	✓			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad	✓			
	Otro			✓	

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Vo.Bo. Profesional SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 8

✓ **Registros de inspección preoperacionales.**


CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-103
	PREOPERACIONAL ROTOMARTILLO	VERSION: 01
		FECHA: 05/06/2025

MARCA	DEWALT	SERIE	15219	OBRA	PUESTA A TIERRA EN POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF Y DE 8 MTS. X 1.050 KGF.
Inspecciono 1	Edgar Fonseca	CARGO	Tecnico electricista		
Inspecciono 2	Mariano Silva	CARGO	Tecnico electricista		
Descripcion del trabajo		SEMANA DEL	2-jun	AL	7-jun

BUENO= B MALO= M

Casco de Seguridad	X	Tapabocas		Botas de Seguridad	X	Tapaoidos de copa	
Gafas	X	Guantes de Carnaza	X	Tapaoidos-insercion	X	Otros	
ESPECIFICAR OTRO EPP:							

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Se verifico el estado de conexiones electricas (Extenciones, cables, toma)							X		X					
Estado de los accesorios (Puntas, Guardas)							X		X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios							X		X					
Estado de e instalacion del mango							X		X					
Estado del interruptor de encendido y apagado							X		X					
Se utiliza accesorios adecuados para la labor							X		X					
El estado general del rotomartillo (fisuras, ropturas, aseo, etc)							X		X					
Se utiliza adecuadamente los EPP para la labor							X		X					
Se han utilizado barrera o aislamientos apropiados							X		X					
Condiciones de orden y aseo							X		X					

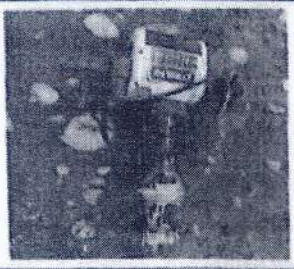

Observaciones:

Firma TRABAJADOR 1								
Firma TRABAJADOR 2								
Firma INSPECTOR SST								

Nota: La Inspeccion Preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extaños debe informarla a su SUPERVISOR o al encargado del MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-099
	INSPECCION PREOPERACIONAL ARNES Y ESLINGA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 30-05-2025

FECHA:	Semana del 2 al 7 del Mes de junio de 2025	Actividad a ejecutar:	Tendido de cable en poste. - Instalación de Deadend.				
REVISION POR PERSONA AUTORIZADA?	SI: X NO:	Numero del equipo:	MARCA	IPSA	MARCA	1004604
Si la respuesta anterior es NO favor abstenerse de utilizar este equipo			Serial del Arnés N°.	41343180	Serial de Eslinga N°.	187024

Diligencie el siguiente formato en la casilla según corresponda. **B:** Bueno **M:** Malo


ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO	LUN.		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Argolla Dorsal (No deben presentar fisuras, corrosion)					✓						✓			
Argolla Pectoral (No deben presentar fisuras, corrosion)					✓						✓			
Argolla Ventral (No deben presentar fisuras, corrosion)					✓						✓			
Argollas laterales (No deben presentar fisuras, corrosion)					✓						✓			
Hebillas (No deben presentar fisuras, corrosion)					✓						✓			
Pasadores (No deben presentar fisuras, corrosion)					✓						✓			
Reatas / correas (No debe presentar desgaste, fibras rotas, costuras rotas)					✓						✓			
Costuras (No debe presentar desgaste, fibras rotas, costuras rotas)					✓						✓			
Aseo General (No debe tener presencia de lodos o tierras)					✓						✓			
Etiqueta de Certificación (Legible, en el sitio correspondiente, Vigente).					✓						✓			
Los mosquetones se encuentra en buen estado?					✓						✓			
El seguro del gancho de la eslinga cierra automáti-camente?					✓						✓			
La eslinga presenta desgaste, fibras deshilacha-das, cortes o rasgadu-ras?					✓						✓			

Observaciones:

Yo, como autoridad ejecutante he verificado la lista anterior y certifico que se puede realizar la actividad.

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Mariano Silva -	LUN.	MAR.	MIER.	JUE	VIER	SAB	DOM.

IMPORTANTE Para la inspección del arnés de seguridad tenga en cuenta lo siguiente:
REATA/CORREAS: Estas no deben presentar desgastes en general, ruptura de fibras, ni presencia de corrosión en las áreas que tiene contacto con las partes metálicas.
ARGOLLAS: Estas no deben presentar fisuras y estar libres de corrosión.
COSTURAS: Estas no deben presentar desgaste, fibras rotas, presentar fisuras.
REVISION VIGENTE: Todo equipo que se vaya a utilizar debe estar revisado por una persona autorizada y debe tener el dado que comprueba dicha revision.

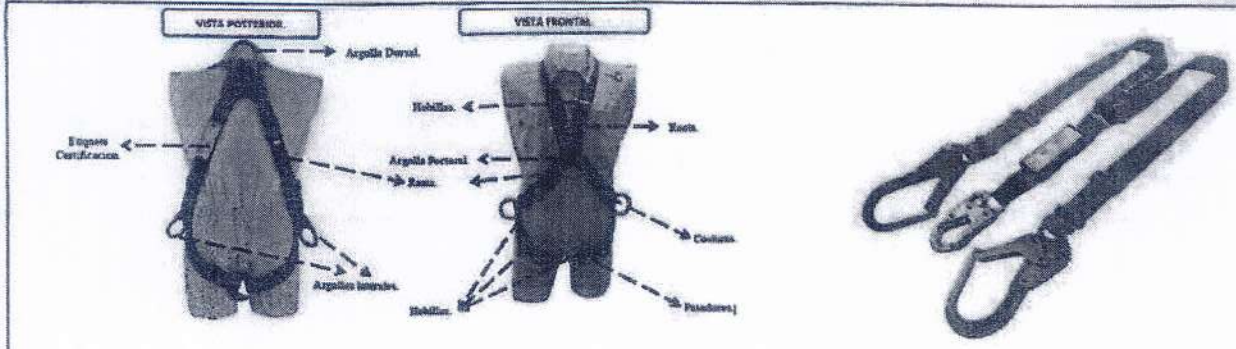

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-100
	PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Version: 01
		Fecha. 30/05/2025

FECHA:	02-07-Junio-2025	**PERMISO DE TRABAJO No.**	
INSPECCIONADO POR:	Gildardo Tolosa		
LOCALIZACION:	HATO COROZAL- ZONA URBANA		

PERIODO DEL : 02 AL 07 DE 06 AÑO 2025

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1. ¿La escalera ha sido inspeccionada y/o certificada para su uso?	X		X		X		X		X		X			
2. ¿Posee la escalera peldaños o parales en mal estado?		X				X		X		X		X		
3. ¿La escalera ha sido pintada en alguna de sus superficies?		X				X		X		X		X		
4. ¿Existe un programa de inspección y/o certificación de escaleras?														
5. ¿El lugar donde se va a instalar la escalera es uniforme, sin grasa o barro?	X					X		X		X		X		
6. ¿La longitud de la escalera es suficiente para acceder al sitio de trabajo?	X				X		X		X		X			
7. ¿La escalera puede soportar el peso a que va ser sometido?	X				X		X		X		X			
8. ¿Conoce Usted la regla de ¼ de la distancia horizontal del pie con respecto a la distancia vertical del punto de apoyo superior?	X				X		X		X		X			
9. ¿La escalera sobresale por lo menos un (1) metro del punto de apoyo?	X				X		X		X		X			
10. ¿Se encuentra la escalera sujeta a la estructura de soporte?	X				X		X		X		X			
11. ¿Si la respuesta al punto anterior es afirmativo, se ha dispuesto a una persona que sostenga la escalera mientras esta ocupada?	X				X		X		X		X			
12. ¿Ha sido señalizado el área alrededor de la escalera?	X				X		X		X		X			
13. ¿Las zapatas de la escalera están en buen estado?	X				X		X		X		X			
14. ¿El personal ha recibido entrenamiento en el uso de escaleras?	X				X		X		X		X			
15. ¿Hay circuitos eléctricos energizados alrededor de donde se va a instalar la escalera?	X				X		X		X		X			
16. ¿El tipo de escalera es el apropiado para trabajar cerca circuitos eléctricos energizados?	X				X		X		X		X			

Vo.Bo. TRABAJADOR

V°. B°. SUPERVISOR

Patricio Fonseca
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 9

- ✓ **Registros de Análisis de trabajo y Permisos de Trabajo relacionados.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-092
	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Fecha: 01-Mayo-2025
		Version: 001
		Pagina 1 de 3

Empresa: CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	Area: OPERATIVA	Fecha: 03-06-2025
Responsable: HSE-Jose eli Garcia M.	Hora de inicio: 7:00 a.m	Hora final: 4:00 a.m
Descripción de la tarea a realizar: **CIMENTACIÓN POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.**		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA:	N/A	ESPACIO CONFINADO.	N/A	CALIENTE:	N/A
ENERGIA PELIGROSAS:	N/A	OTRO, CUAL?	N/A		

Nombres y Apellidos de los trabajadores autorizados	Firma
1°	
2°	
3°	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientos a utilizar.*
Manuales		PALA,
Electricas		N/A
Materiales		AGUA, CEMENTO, CANECA
Hidraulicas		N/A
Mecanicas		N/A
Otras		N/A

ANALISIS DEL TRABAJO

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Al mismo nivel.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Caminando.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Señalizacion, cinta, conos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	camisa, pantalon jean, botas de seguridad, gafas, casco, guantes.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Herramientas manuales, eslinga, soga
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Picadura de insectos, riesgo publico.

EVALUACION DEL RIESGO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	C	P	NR	Controles Requeridos
Inspeccion y Delimitar la zona de trabajo	Terreno con altibajos, desnivel	Golpes en miembros inferiores.	1	1	1	Uso de Epp, Señalizacion.
Inspeccion herramientas manuales.	Herramientas defectuosas, sin inspeccion,	Caidas Golpes.	1	1	1	Uso de Epp, Inspecciones periodica
Cimentacion Base de Poste Extrareforzado de B.T.	Salpicaduras de mezcla en ojos. Caidas por desniveles en piso.	Irritacion, dolor, ardor en vista.	2	2	4	Señalizacion, uso de Epp, socializacion actividad
Orden y Aseo	Caidas, resbalones sobre el mismo ni	Contusiones en miembros inferiores	1	1	1	Señalizacion, uso de Epp.

Powered by CamScanner

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
■ No, continue con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
■ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

TRABAJADORES AUTORIZADOS

Nombre	Cedula	Firma
Mariano Silva	79.836.491	
Edgar Fonseca	4.192.375.	
Gildardo Toloza	79.346.786	
4° Camilo Gonzalez.	1.029.649.697	
5°		
6°		
7°		
8°		
9°		

Persona que autoriza

Nombre	Cedula	Firma
GILDARDO TOLOZA	7434670 G	
BRISEUO FONSECA	———	———

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-092
	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Fecha: 01-Mayo-2025
		Version: 001
		Página 1 de 3

Empresa: CONSORCIO ILUMINACION COROZAL Area: OPERATIVA Fecha: 04-06-2025

Responsable: HSE-Jose eli Garcia M. Hora de Inicio: 7:00 AM Hora final: 4:00 PM

Descripción de la tarea a realizar: **TENDIO Y TENSIONADA DE CABLE EN POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF Y DE 8 MTS. X 1.050 KGF.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	SI	ESPACIO CONFINADO	N/A	CALIENTE	N/A
ENERGIA PELIGROSAS	NO	OTRO, CUAL?		N/A	

Nombres y Apellidos de los trabajadores autorizados	Firma
1: Muñoz Silva	
2: Edgar Fonseca	
3°	
4°	
5°	

EQUIPOS YHERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		ESCALERA
Electricas		N/A
Materiales	1	Carrete de cable
EPCC		ARNES DE SEGURIDAD , PRETALES
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DEL TRABAJO

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Mas de 2 mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Mas de 10 mts
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Posicionamiento seguro en poste. EPCC.
¿Cuales son los elementos de protección requeridos?	camisa, pantalon jean, botas de seguridad, gafas, casco, guantes.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Herramientas manuales, eslinga, soga, arnes
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o trapezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Picadura de insectos. riesgo publico.

EVALUACION DEL RIESGO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	C	P	NR	Controles Requeridos
Inspeccion y Delimitar la zona de trabajo	Terreno con altibajos, desnivel	Golpes en miembros inferiores.	1	1	1	Uso de Epp, Señalizacion.
Inspeccion herramientas manuales, maquinas y/o equipos	Herramientas, equipos, maquinas defectuosas, sin inspeccion arnes	Caidas Golpes.	1	1	1	Uso de Epp, Inspecciones periodicas
Subida a poste mediante escalera vertica	Caidas de persona en el momento subida por escalera en el poste	Fracturas,muerte, contusiones en cuerpo por caida de persona.	2	2	4	Señalizacion, uso de Epp, socializacion actividad
Posicionamiento de persona en la parte superior de poste para acitividades amarre, sujeccion y/o anclaje del cable.	Golpe de calor, bajonazo de azucar, perdida de equilibrio, estabilidad, EPCC defectuosos, sin inspeccion.	Golpes, contusiones, muerte por caida de persona	2	2	4	Señalizacion, uso de Epp, socializacion actividad
Orden y Aseo	Caidas, resbalones sobre el mismo nivel.	Contusiones en miembros inferiores	1	1	1	

Powered by CamScanner

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☐ **Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.**

■ No, continue con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

■ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

TRABAJADORES AUTORIZADOS

Nombre	Cedula	Firma
1. Mariana Silva	79.856.971	
2. Edgar Fonseca	4.192.395	
3. Gildardo Toloza	79.346.706	-
4. Bricelio Fonseca	79.130.676	-
5. Camilo Gonzalez	1.024.699.647	
6.		
7.		
8.		
9.		

Persona que autoriza

Nombre	Cedula	Firma
GILDARDO TOLOZA	79.346.706	-
BRICELIO FONSECA	79.130.676	-

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-092
	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Fecha: 01-Mayo-2025
		Version: 001
		Pagina 1 de 3

Empresa: CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	Area: OPERATIVA	Fecha: 05-06-2025
Responsable: HSE-Jose eli Garcia M.	Hora de Inicio: 7:00 AM	Hora final: 4:00 PM

Descripción de la tarea a realizar: **INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF Y DE 8 MTS. X 1.050 KGF.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA:	NO	ESPACIO CONFINADO	N/A	CALIENTE:	N/A
ENERGIA PELIGROSAS:	NO	OTRO, CUAL?	N/A		

Nombres y Apellidos de los trabajadores autorizados	Firma
1°	
2°	
3°	
4°	
5°	

EQUIPOS YHERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada uno de los herramientas a utilizar.*
Manuales		
Electricas	1	ROTOMARTILLO
Materiales	1	VARILLAS PUESTA A TIERRA
EPCC		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DEL TRABAJO

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	AL MISMO NIVEL DEL PISO
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	CAMINANDO
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	SEÑALIZACION, USO DE EPP
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	camisa, pantalon jean, botas de seguridad, gafas, casco, guantes.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Herramientas manuales, electricas
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Picadura de insectos, riesgo publico.

EVALUACION DEL RIESGO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	C	P	NR	Controles Requeridos
Inspeccion y Delimitar la zona de trabajo	Terreno con altibajos, desnivel	Golpes en miembros inferiores.	1	1	1	Uso de Epp, Señalizacion.
Inspeccion herramientas manuales, maquinas y/o equipos	Herramientas, equipos, maquinas defectuosas, sin inspeccion arnes	Caidas Golpes.	1	1	1	Uso de Epp, Inspecciones periodicas
Subida a poste mediante escalera vertica	Caidas de persona en el momento subida por escalera en el poste	Fracturas,muerte, contusiones en cuerpo por caida de persona.	2	2	4	Señalizacion, uso de Epp, socializacion actividad
Posicionamiento de persona a mismo nivel del piso, para acitividades de instalacion de varillas puesta a tierra.	Golpe de calor, bajonazo de azucar, perdida de equilibrio, estabilidad, equipos electricos sin inspeccion, defectuosos.	Golpes, contusiones, muerte por caida de persona	2	2	4	Señalizacion, uso de Epp, socializacion actividad
Orden y Aseo	Caidas, resbalones sobre el mismo nivel.	Contusiones en miembros inferiores	1	1	1	

Powered by CamScanner

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
■ No, continue con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
■ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

TRABAJADORES AUTORIZADOS		
Nombre	Cedula	Firma
1° Camilo Gonzalez	1029649697	
2° Mariano Silva	74836941	
3° Edgar Fonseca	9192395	
4° Gildardo Toloza	77311706	
5° Bricelo Fonseca	74130676	
6°		
7°		
8°		
9°		

Persona que autoriza		
Nombre	Cedula	Firma
GILDARDO TOLOZA	77311706	
BRICELIO FONSECA	74130676	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-092
	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Fecha: 01-Mayo-2025
		Version: 001
		Pagina 1 de 3

Empresa: CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	Area: OPERATIVA	Fecha: 06-06-2025	
Responsable: HSE-Jose eli Garcia M.		Hora de Inicio: 7:00 AM	Hora final: 4:00 PM

Descripción de la tarea a realizar: **INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF Y DE 8 MTS. X 1.050 KGF.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA:	NO	ESPACIO CONFINADO.	N/A	CALIENTE:	N/A
ENERGIA PELIGROSAS:	NO	OTRO, CUAL?	N/A		

Nombres y Apellidos de los trabajadores autorizados	Firma
1°	
2°	
3°	
4°	
5°	

EQUIPOS YHERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Electricas	1	ROTOMARTILLO
Materiales	1	VARILLAS PUESTA A TIERRA
EPCC		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DEL TRABAJO

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	AL MISMO NIVEL DEL PISO
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	CAMINANDO
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	SEÑALIZACION, USO DE EPP
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	camisa, pantalon jean, botas de seguridad, gafas, casco, guantes.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Herramientas manuales, electricas
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Picadura de insectos, riesgo publico.

EVALUACION DEL RIESGO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	C	P	NR	Controles Requeridos
Inspeccion y Delimitar la zona de trabajo	Terreno con altibajos, desnivel	Golpes en miembros inferiores.	1	1	1	Uso de Epp, Señalizacion.
Inspeccion herramientas manuales, maquinas y/o equipos	Herramientas, equipos, maquinas defectuosas, sin inspeccion arnes	Caidas Golpes.	1	1	1	Uso de Epp, Inspecciones periodicas
Subida a poste mediante escalera vertica	Caidas de persona en el momento subida por escalera en el poste	Fracturas,muerte, contusiones en cuerpo por caida de persona.	2	2	4	Señalizacion, uso de Epp, socializacion actividad
Posicionamiento de persona a mismo nivel del piso, para acitividades de instalacion de varillas puesta a tierra.	Golpe de calor, bajonazo de azucar, perdida de equilibrio, estabilidad, equipos electricos sin inspeccion, defectuosos.	Golpes, contusiones, muerte por caida de persona	2	2	4	Señalizacion, uso de Epp, socializacion actividad
Orden y Aseo	Caidas, resbalones sobre el mismo nivel.	Contusiones en miembros inferiores	1	1	1	

Powered by CamScanner

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
■ No, continue con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
■ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

TRABAJADORES AUTORIZADOS

	Nombre	Cedula	Firma
1°	Camilo Sandoval	1029699697	
2°	Mañana Silva	79856491	
3°	Edgar Fonseca	9192375	
4°	Gildardo Toloza	79391706	
5°	Bricelio Fonseca	79130696	
6°			
7°			
8°			
9°			

Persona que autoriza

Nombre	Cedula	Firma
GILDARDO TOLOZA	79391706	
BRICELIO FONSECA	79130696	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-092
	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Fecha: 01-Mayo-2025
		Version: 001
		Página 1 de 3

Empresa: CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	Area: OPERATIVA	Fecha: 07-06-2025
Responsable: HSE Jose eli Garcia M.	Hora de inicio: 7:00 AM	Hora final: 4:00 PM

Descripción de la tarea a realizar: **INSTALACION DE PERCHA EN POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF Y DE 8 MTS. X 1.050 KGF.**

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA:	SI	ESPACIO CONFINADO:	N/A	CALIENTE:	N/A
ENERGIA PELIGROSAS:	NO	OTRO, CUAL?	N/A		

Nombres y Apellidos de los trabajadores autorizados	Firma
1° Mariano Silva M	
2° Camilo Gonzalez	
3° Edgar Fonseca C.	
4° Gildardo Tolosa	
5°	

EQUIPOS YHERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada uso de las herramientas a utilizar.*
Manuales		ESCALERA
Electricas	1	N/A
Materiales	1	Perchas
EPCC		ARNES DE SEGURIDAD, PRETALES
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DEL TRABAJO

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Mas de 2 mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	Mas de 10 mts
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Posicionamiento seguro en poste. EPCC.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	camisa, pantalon jean, botas de seguridad, gafas. casco, guantes.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Herramientas manuales, eslinga, soga, arnes
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Picadura de insectos, riesgo publico.

EVALUACION DEL RIESGO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	C	P	NR	Controles Requeridos
Inspeccion y Delimitar la zona de trabajo	Terreno con altibajos, desnivel	Golpes en miembros inferiores.	1	1	1	Uso de Epp, Señalizacion.
Inspeccion herramientas manuales, maquinas y/o equipos	Herramientas, equipos, maquinas defectuosas, sin inspeccion arnes	Caidas Golpes.	1	1	1	Uso de Epp, inspecciones periodicas
Subida a poste mediante escalera vertica	Caidas de persona en el momento subida por escalera en el poste	Fracturas,muerte, contusiones en cuerpo por caida de persona.	2	2	4	Señalizacion, uso de Epp, socializacion actividad
Posicionamiento de persona en la parte superior de poste para acitividades amarre, sujeccion de perchas en poste.	Golpe de calor, bajonazo de azucar, perdida de equilibrio, estabilidad, EPCC defectuosos, sin inspeccion.	Golpes, contusiones, muerte por caida de persona	2	2	4	Señalizacion, uso de Epp, socializacion actividad
Orden y Aseo	Caidas, resbalones sobre el mismo nivel.	Contusiones en miembros inferiores	1	1	1	Uso EPP, señalizacion.

52

Powered by CamScanner

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-segura que ocurra un incidente?
☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
■ No, continue con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.
¿Es segure proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
■ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

TRABAJADORES AUTORIZADOS

	Nombre	Cedula	Firma
1°	mariano Silva	79856441	
2°	Camilo Sandoval	1029649617	
3°	Gildardo Toloza	79311706	
4°	Edgar Fonseca	4192375	
5°	Briceño Fonseca	79130676	
6°			
7°			
8°			
9°			

Persona que autoriza

Nombre	Cedula	Firma
GILDARDO TOLOZA	79311706	
BRICELIO FONSECA	79130676	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN CORRIZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-098
	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	VERSIÓN : 01
		FECHA: 30/05/2025

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD

ÁREA	OPERATIVA	UBICACIÓN DONDE SE REALIZA EL TRABAJO	Cld 72 Zona urbana Mpio de H.C
FECHA	4/06/2025	VIGENCIA DEL PERMISO	1 día
HORA DE INICIO	7:00 a. m.	HORA DE FINALIZACIÓN	4:00 p. m

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

TENDIO Y TENDIDO DE CABLE EN POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF Y DE 8 MTS. X 1.050 KGF.

2. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Luriana Silva	1.856.941	Tecnico electricista	
2	Edgar Fonseca	91923795	Tecnico Electricista	
3				
4				
5				
6				

3. RIESGOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Seleccione el recuadro)

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO			
	RIESGO	¿CUAL(ES)?	CAUSA
1	Biológico	Avispas en arboles	Picaduras insectos
1	Físico	Exposicion prolongada al sol	Insolacion, desmayos
	Químico		
	Psicosocial		
1	Biomecanicos	Suspensión en poste	Posturas forzadas
1	Condiciones de Seguridad	Trabajos en alturas	Tiempos prolongados, sin descanso
1	Fenomenos naturales	Rayos	Tormentas electricas
Otro ¿Cuál?			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) REQUERIDOS		
☒ Casco	☒ Calzado de seguridad	
☐ Overol	☐ Protección para soldadura	
☐ Anclajes	☐ Protección auditiva	
☒ Guantes	☐ Respirador / mascarilla	
☐ Mosquetones	☒ Eslinga de seguridad	
☐ Conectores	☒ Gafas de seguridad	
☒ Arnés cuerpo completo		
☐ Careta para soldar		
Otro ¿Cuál? PRETALES		

HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
☒ Herramienta de mano	
☐ Andamio	
☐ Herramientas electricas	
☒ Escaleras	
☐ Mangueras	
Otro ¿Cuál?	

4. COMPROBACIÓN PREVIAS AL INICIO DE TRABAJO
(Solo lo diligencia el Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas y/o delegado para tal actividad)

	REQUERIMIENTO	SI	NO	NO APLICA
1	¿El trabajador ha verificado el sistema de ascenso / descenso a utilizar?	X		
2	¿Se encuentra los equipos mecánicos en buen estado?			X
3	¿Los trabajadores cumplen con los requisitos de aptitud?	X		
4	¿Se ha verificado el punto de anclaje antes de utilizar para garantizar su buen funcionamiento?			X
5	¿Se dispone de arnés y cuerda de seguridad en buen estado?	X		
6	¿La línea de vida se encuentra en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador?			X
7	¿En caso de utilizar escaleras fijas y los andamios, estos cumplen con las normas de seguridad y son certificados?	X		
8	¿En caso de utilizar plataformas elevadoras, éstas cumplen con las normas de seguridad?			X
9	¿Quién va a ejecutar el trabajo, ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
10	¿Las herramientas a utilizar se encuentran revisadas y en buen estado?	X		
11	¿Los trabajadores tienen información específica sobre los riesgos y medidas preventivas?	X		
12	¿Los trabajadores tienen capacitación de trabajo en alturas certificada por una entidad competente ACTUALIZADA?	X		
13	¿Existe supervisión directa de los trabajos a realizar?	X		
14	¿Se ha delimitado el área de trabajo y aislado correctamente?	X		
15	¿Se han previsto PLAN DE EMERGENCIA en caso de ser necesario?	X		
16	¿El trabajador manifiesta estar libre de alicoramiento o efectos de sustancias alucinógenas?	X		
17	¿Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) en alturas?	X		
18	¿Se tienen los elementos y equipos de protección personal apropiados para realizar el trabajo seguro en alturas?	X		
19	¿Se han desenergizado (energía eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica, química y térmica) los equipos del área donde se realiza el trabajo.?			X
20	Otro ¿cuál?		X	

IV. FIRMAS DE PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Responsable de la Ejecución del Trabajo (Supervisor)	Responsable de la emisión del Permiso de Trabajo
NOMBRE: BRICELIO FONSECA	NOMBRE: JOSE ELI GARCIA MURILLO
CARGO: SUPERVISOR	CARGO: PROFESIONAL HSE
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: GILDARDO TOLOZA	
CARGO: CAPATAZ	
FIRMA:	

54

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CODIGO: FT-SST-098
	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	VERSIÓN : 01
		FECHA: 30/05/2025

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD

ÁREA	OPERATIVA	UBICACIÓN DONDE SE REALIZA EL TRABAJO	Zona urbana Mpio de H.C
FECHA	7/06/2025	VIGENCIA DEL PERMISO	1 dia
HORA DE INICIO	7:00 a. m.	HORA DE FINALIZACIÓN	4:00 p. m.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

INSTALACION DE PERCHA EN POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF Y DE 8 MTS. X 1.050 KGF.

2. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	C. Mariana Silva	7985611	Electricista	
2	Edgar Fonseca	4192375	Tecnico	
3				
4				
5				
6				

3. RIESGOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Seleccione el recuadro)

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO			
	RIESGO	¿CUAL(ES)?	CAUSA
1	Biológico	Avispas en arboles	Picaduras insectos
1	Físico	Exposicion prologanda al sol	Insolacion, desmayos
	Químico		
	Psicosocial		
1	Biomecanicos	Suspensión en poste	Posturas forzadas
1	Condiciones de Seguridad	Trabajos en alturas	Tiempos prolongados, sin descanso
1	Fenomenos naturales	Rayos	Tormentas electricas
Otro ¿Cuál?			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) REQUERIDOS		HERRAMIENTAS DE TRABAJO
■ Casco	■ Calzado de seguridad	■ Herramienta de mano
☐ Overol	☐ Protección para soldadura	☐ Andamio
☐ Anclajes	☐ Protección auditiva	☐ Herramientas electricas
■ Guantes	☐ Respirador / mascarilla	■ Escaleras
☐ Mosquetones	■ Eslinga de seguridad	☐ Mangueras
☐ Conectores	■ Gafas de seguridad	Otro ¿Cuál?
■ Arnés cuerpo completo		
☐ Careta para soldar		
Otro ¿Cuál? PRETALES		

4. COMPROBACIÓN PREVIAS AL INICIO DE TRABAJO
(Solo lo diligencia el Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas y/o delegado para tal actividad)

	REQUERIMIENTO	SI	NO	NO APLICA
1	¿El trabajador ha verificado el sistema de ascenso / descenso a utilizar?	X		
2	¿Se encuentra los equipos mecánicos en buen estado?			X
3	¿Los trabajadores cumplen con los requisitos de aptitud?	X		
4	¿Se ha verificado el punto de anclaje antes de utilizar para garantizar su buen funcionamiento?			X
5	¿Se dispone de arnés y cuerda de seguridad en buen estado?	X		
6	¿La línea de vida se encuentra en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador?			X
7	¿En caso de utilizar escaleras fijas y los andamios, estos cumplen con las normas de seguridad y son certificados?	X		
8	¿En caso de utilizar plataformas elevadoras, éstas cumplen con las normas de seguridad?			X
9	¿Quién va a ejecutar el trabajo, ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
10	¿Las herramientas a utilizar se encuentran revisadas y en buen estado?	X		
11	¿Los trabajadores tienen información específica sobre los riesgos y medidas preventivas?	X		
12	¿Los trabajadores tienen capacitación de trabajo en alturas certificada por una entidad competente ACTUALIZADA?	X		
13	¿Existe supervisión directa de los trabajos a realizar?	X		
14	¿Se ha delimitado el área de trabajo y aislado correctamente?	X		
15	¿Se han previsto PLAN DE EMERGENCIA en caso de ser necesario?	X		
16	¿El trabajador manifiesta estar libre de alicoramiento o efectos de sustancias alucinógenas?	X		
17	¿Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) en alturas?	X		
18	¿Se tienen los elementos y equipos de protección personal apropiados para realizar el trabajo seguro en alturas?	X		
19	¿Se han desenergizado (energía eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica, química y térmica) los equipos del área donde se realiza el trabajo.?	X		
20	Otro ¿cuál?			X
			X	

IV. FIRMAS DE PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Responsable de la Ejecución del Trabajo (Supervisor)	Responsable de la emisión del Permiso de Trabajo
NOMBRE: BRICELIO FONSECA	NOMBRE: JOSE ELI GARCIA MURILLO
CARGO: SUPERVISOR	CARGO: PROFESIONAL HSE
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: GILDARDO TOLOZA	
CARGO: CAPATAZ	
FIRMA:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 10

✓ **Registros AT.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 11

✓ Tarjetas de Actos y Condiciones Inseguras y/o Reconocimiento.

CONSORCIO LUMINOSA OPERACIONAL

TARJETA DE GESTIÓN REGULADOR

Nombre Observador:	Profesional HSE
Lugar o proyecto:	Apoiadiwo - Campo.
Fecha:	7 - junio - 2025

Fuente Generadora:

Acto Inseguro ☐ Condición Insegura ☐ Reconocimiento ☑ Eco-Reporte ☐

En caso de reportar un CASI ACCIDENTE por favor seleccione las causas de la ocurrencia del mismo.

CASI ACCIDENTE ☐	Causas Básicas: ☐	Factores Personales ☐	Factores del Trabajo ☐
	Causas Inmediatas: ☐	Acto Inseguro ☐	Condición Insegura ☐
TIPO DE RIESGO	☐ FISICO ☐ QUIMICO ☐ BIOLOGICO ☐ SICOSOCIAL ☐ IOMECANICO ☐ SEGURIDAD ☐ FEN_NATURALES ☐ SALUD PUBLICA		

Trabajo observado y /o desviación:

Se observa que durante visita realizada 07-jun-2025, el personal esta comprometido de forma proactiva con el desarrollo seguro de sus actividades, buen uso de EPP.

Acción para promover desempeño seguro:

Reconocimiento:

"Si piensa o considera que el trabajo es inseguro, usted tiene el derecho y la obligación de detenerlo"

Powered by CamScanner

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 12

✓ **Certificados exámenes de aptitud.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 13

✓ **Registro de divulgación .**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 14

✓ **Certificados de cursos realizadas por Empleador .**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 15

- ✓ **Soporte consulta realizada en página Minitrabajo- Centro de entrenamiento .**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 16

- ✓ **Acta reunión COPASST– Conformación si aplica .**

ACTA DE REUNIÓN DEL VIGIA SST

Fecha: 3O 30 de Junio de 2025	**Lugar: Operativo – Hato Corozal**	
Hora Inicial: 8:00 am	**Hora Final: 9:00 a.m.**	**Acta N° 02**

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Revisión del acta anterior. **2.** Seguimiento acciones pendientes. **3.** Informe de accidentes ocurridos en el mes junio 2025. **4.** Varios y acciones pendientes. **5.** Definición de fecha próxima reunión. **6.** Cierre de la reunión. **7.** Firma del acta	Gildardo Fonseca	Capataz
	Jose Eli Garcia	Profesional HSE

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se realiza entrega de dotación a personal.



2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES.

- Se realiza verificación de actos y condiciones inseguras en las actividades diarias ejecutada en campo.



- Se continua con las Charlas preoperacionales antes de dar inicio de las actividades.



- Se informa por parte del vigía SST que no se han presentado accidentalidad en los días laborados del mes de junio.



3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

No se presentaron Accidentes en el transcurso de las labores realizadas en campo durante los días 8 primeros días del mes de junio de 2025.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

Continuar con rutina de inspecciones y charlas diarias.

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.


Próxima Reunión para el día 31-julio-2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Siendo las 9:00, se da por terminada la reunión sin novedad especial.

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Gildardo Toloza	74.346.706	
Jose Eli Garcia	74.859.017	

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 17

- ✓ **Acta reunión – CCL Conformación si aplica .**

69

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 18

- ✓ **Registro de entrega de elementos y planillas limpieza y desinfección.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 19

- ✓ **Soporte casos presentados (certificados de aislamiento – Incapacidad).**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 20

- ✓ **Acta reunión – Conformación si aplica.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 21

- ✓ **Reporte de comparendos vehículos - conductores (SIMIT)**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 22

- ✓ **Informe GPS y acciones implementadas.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 23

- ✓ **Formatos preo operacionales.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 24

✓Tarjetas de rutas.

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 25

✓ **Certificados de habilitación.**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 26

✓ **Archivo formato TT5 (Excel).**

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

ANEXO 27

✓ **Certificado de compra de agua potable.**

INFORME DE RESULTADOS DE ALIMENTOS
2283-25

Datos del Solicitante

Cliente	Saguma SAS/AguaAndina
NIT/C.C.	901461469-6
Dirección	Calle 15 No. 22 08 Esquina
Municipio	Yopal
Teléfono	3203467570

Datos de la Muestra

Municipio de Recolección	Yopal
Dirección de Toma de Muestra	Calle 15 No. 22 - 08
Lugar de Toma de Muestra	Producción
Tipo de Alimento	Hielo
Cantidad y/o Presentación	3Kg
Marca del Producto	Agua Andina
Registro Sanitario	RSA-0024433-2023
Lote	0407
Fecha de producción	2025-07-04
Fecha de Vencimiento	2025-08-04
Recolectada por	Cliente; Nohemy Díaz (Información suministrada por el cliente)
Plan y Procedimiento de Muestreo	No reporta; No reporta
Fecha y Hora de Recolección	2025-07-04 14:26
Fecha y Hora de Recepción	2025-07-04 14:40
Fecha y hora de Emisión del Resultado	2025-07-11 17:20

Análisis de Laboratorio

Fecha de Análisis	Parámetro	Resultado	Unidades	Método	Técnica	Norma Hielo Res. 1407:2022
2025-07-05	Pseudomonas Aeruginosa	<1	NMP/100mL	SM 9213 F MODIFICADO	Sustrato Enzimático Multiceldа	-
2025-07-05	Escherichia Coli	0	UFC/100 mL	SM 9222 J	Filtración por Membrana	<1
2025-07-05	Coliformes Totales	0	UFC/100 mL	SM 9222 J	Filtración por Membrana	<1

Parámetro no Acreditado, ' Parámetros Acreditados por el IDEAM; • Parámetros Subcontratados; •' Parámetros Subcontratados Acreditados ; (ISC): Corresponden a información suministrada por el cliente; SM: Standard Methods for the Examination of Water And Wastewater.

LCM: Límite de cuantificación del método; NMP: Número Más Probable; UFC: Unidades Formadoras de Colonias

OBSERVACIONES:

Cotización 146-25V1; Item 1

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización escrita por AQUALIM, Los resultados son válidos únicamente para las muestras analizadas en el laboratorio AQUALIM. El laboratorio no es responsable del origen o la fuente de donde han sido extraídas las muestras y de la información que sea suministrada por el cliente (ISC) que pueda afectar la validez de los resultados.
AQUALIM se encuentra autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 0229 de 19 de febrero de 2024 para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano.

SEBASTIAN FLECHAS FIGUEROA
DIRECTOR DEL LABORATORIO
Revisó y Aprobó

Fin del Resultado

Carrera 23 No. 19 - 15 Yopal - Casanare
Cel.: 310 349 0629 - 320 301 7075
gerencia@aqualim.com - cotizaciones@aqualim.com
www. aqualim.com

Alcaldía Municipal de Yopal

COMUNICACIÓN OFICIAL

310-220-165

2025235762
2025-06-20 10:17:37

Yopal, 20 de junio de 2025

Señora:
DIANA PATRICIA MARIÑO
Propietaria
SAGUMA S.A.S - AGUA ANDINA
CALLE 15 No. 22 - 08
0
Código Postal 850001
YOPAL

ASUNTO NOTIFICACION RESULTADOS MICROBIOLOGICOS

Cordial saludo,

La Secretaria de Salud Municipal de Yopal, como autoridad sanitaria vigilando la calidad e inocuidad de los alimentos, con el procedimiento de muestreo de alimentos, fundamental como apoyo en inspección sanitaria para determinar si los productos de consumo humano cumplen o no, con la normatividad sanitaria vigente, mediante la determinación de la presencia, la ausencia o la cuantificación de los peligros microbiológicos, químicos o físicos que puedan alterar su composición y en consecuencia puedan provocar un riesgo en la salud de las personas; se permite notificar el informe de resultado de laboratorio de la muestra LAL85250076-1 , tomada el día 26-05-2025 al alimento: Agua potable tratada envasada.

Atentamente,

ROTULO RECIPIENTES FO-GF-155 20-03-2018 V.1 Casanare	Acta Nº: 2596 Código LAB:
Municipio	Yopal
Establecimiento	Punto verde. Saguma. SAS.
Tipo de Muestra	Agua andina
Fecha y Hora de Muestreo	A2025 M05 D26 Hora
Responsable	Diana Monroy 9:30

NICASIO MARINO ORTIZ - SEC. DE SALUD
SECRETARIO DESPACHO - SECRETARIO(A) DE SALUD

Casanare

INFORME DE RESULTADO
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
FO-GS-112
21-03-2018

Codigo muestra	**LAL85250076-1**		
Entidad:	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD	**Municipio**	YOPAL
Dirección:	Carrera 21 No. 8-32	**Telefono**	6357777 ext. 117
Fecha de toma:	26/05/2025	**Hora:**	07:30
Fecha recepción LSP:	26/05/2025	**Hora:**	9:30
Establecimiento:	Tiendas y supermercados - Punto de venta saguma SAS		
Municipio:	Yopal	**Dirección:**	Calle 15 # 22 -08
Tipo muestra:	Agua envasada	**Clase:**	Agua potable tratada envasada
Nombre del Fabricante	Diana Patricia Mariño		
Registro Sanitario:	RSA-0024433-2023	**Marca:**	Agua Andina
Lote:	1905	**Vencimiento:**	19/06/2025
Responsable toma:	Diana Monrroy Arevalo	**Cargo**	Técnico de área de salud
Evento que genera la solicitud:	Monitoreo		
Normatividad relacionada:	Resolución 1407 de 2022 Ministerio de Salud Y Protección Social-Microbiológico. Resolución 12186 de 1991 Ministerio de Salud-Fisicoquímico		

Ensayo	Valor	Unidades	Metodo	Valor permisible	Interpretación
Color aparente	0,50	UPC	Espectrofotométrico	15	CONFORME
Determinación de coliformes en agua envasada	Menor a 1	NMP /100 ml	Sustrato Definido	Menor a 1	CONFORME
Determinación de Escherichia coli	Menor a 1	NMP /100 ml	Sustrato Definido	Menor a 1	CONFORME
Determinación de Pseudomona aeruginosa en agua envasada	Menor a 1	NMP /100 ml	Sustrato Definido	Menor a 1	CONFORME
Hierro	0,02	mg/lt Fe	Espectrofotométrico	0.3	CONFORME
pH	7,10	Unidades de pH	Electrométrico	6.5-9.0	CONFORME
Sulfatos	13	mg/lt SO4	Espectrofotométrico	250	CONFORME
Turbiedad	0,110	UNT	Nefelométrico	2	CONFORME

Observación:

Según los parametros analizados, la muestra de alimento es aceptable desde el punto de vista microbiologico y fisicoquimico.

Concepto del análisis:	Aceptado
Fecha de informe:	6/06/2025
Fecha de procesamiento:	27/04/2025
Código de analista:	9887

Joel Almanza Jaimes

Coordinador de laboratorio

Los resultados reportados en el presente informe, corresponden única y exclusivamente a las muestras recibidas, identificadas con los códigos referenciados y la solicitud de servicio respectiva. Cuando la toma de muestras no sea realizada por personal del Laboratorio de Salud Pública, el laboratorio no se hace responsable del cumplimiento de las condiciones pre-analíticas de pertinencia en toma de muestras según aplique, identificación, almacenamiento y transporte. La información generada por las instituciones que realizan análisis de laboratorio es de carácter confidencial y será utilizada únicamente para el cumplimiento de los fines correspondientes por las autoridades sanitarias cuando sea requerida por autoridades del poder judicial. Decreto 2323/2006/Artículo 22. Este informe no puede ser reproducido parcial ni totalmente sin autorización del Laboratorio de Salud Pública.
