ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IC-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)




LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. CERRAMIENTO LADO VIVIENDAS	32.56				32.56		
2. CERRAMIENTO LADO CALLE 13D (cerramiento bandalizado en su totalidad)	61.55				61.55		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FA.-29
Versión:	0%
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DI 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

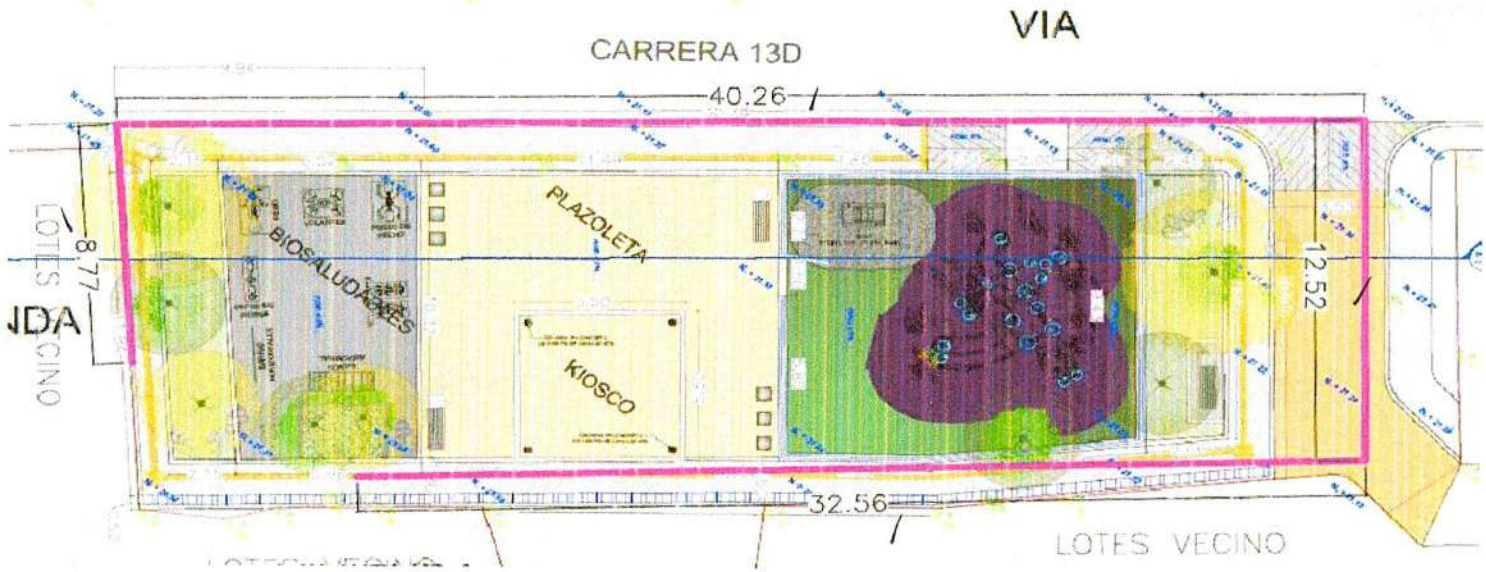

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
ZONA CANCHA DE FUTBOL							
1. LADO CARRERA 1 (cerramiento afectado por las fuertes lluvias)	44.81		44.81		44.81		
2. LADO CARRERA 1A (reparación)	28.55				28.55		
3. PARTE TRASERA DEL PARQUE	10.40				10.40		
ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES							
1. LADO CARRERA 1 (cerramiento bandalizado)	28.30				28.30		
2. LADO CALLE 50E (movimiento de cerramiento por construcción de anden perimetral)	29.40				29.40		
3. LADO VIVIENDAS (propietaria predio aledaño al parque desmantó cerramiento)	36.24				36.24		
TOTAL PRESENTE ACTA							177.70

Vo. Bo RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo. Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IC-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	3 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

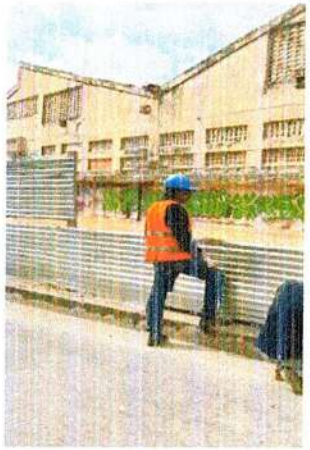



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. CERRAMIENTO LADO CARRERA 51	39.50				39.50		
2. CERRAMIENTO LADO CALLE 43 ENTRE CARRERAS 50B Y 51	44.00				44.00		
3. CERRAMIENTO LADO CARRERA 50B	45.15				45.15		
4. CERRAMIENTO LADO CALLE 42	44.65				44.65		

Cantidad contractual según modificatoria N°2	3.015.00	
Acumulado anterior	999.57	
Acumulado a presente acta	1.444.68	
Obra por ejecutar	1.570.32	

TOTAL PRESENTE ACTA	173.30


OBSERVACIONES: El cerramiento de Plaza aguila, fue retirado en su totalidad, ya que, las fuertes brisas de la zona lo afectaron, y fué reforzado con listones de mas calibre.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código: IC-FM-29 Versión: 02 Fecha: 06/09/2021 Páginas: 1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

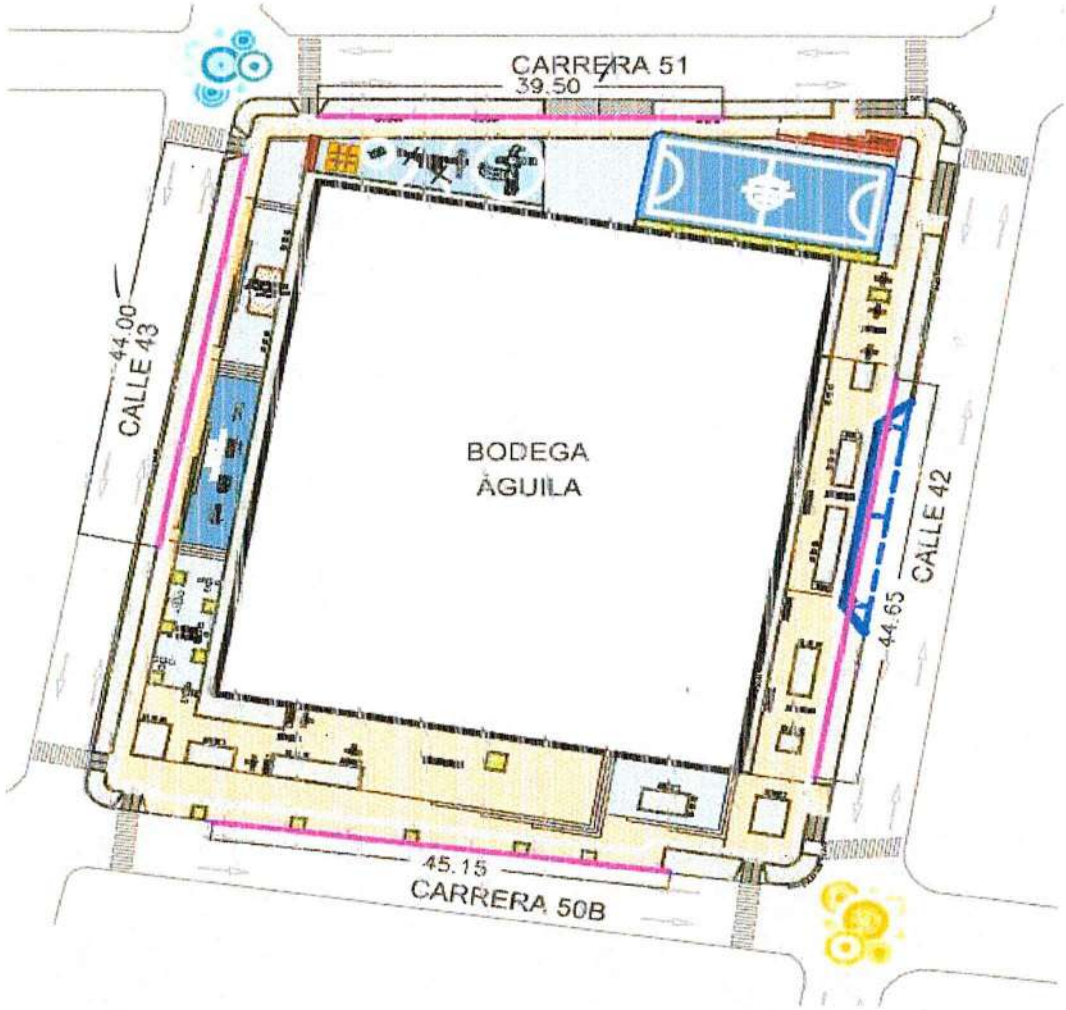

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025			
CAPITULO:	PRELIMIANRES	CÓDIGO DEL ITEM: 1.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL DEL PARQUE						1411.13	

TOTAL PRESENTE ACTA:	1,411.13

OBSERVACIONES: se realizó nivelación y replanteo del parque, por ajuste a los diseños iniciales.


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

ÁREA DE NIVELACIÓN =
1.411.13 M2

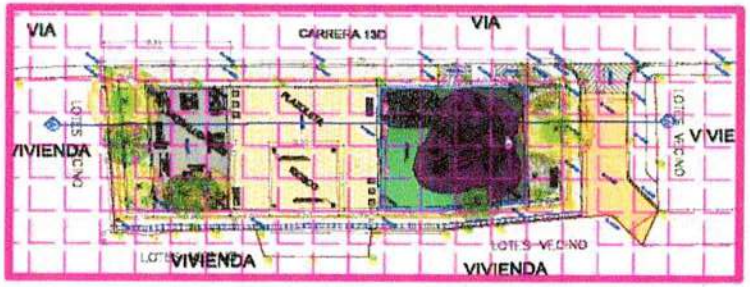

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL DEL PARQUE						3597.99	


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	TOTAL PRESENTE ACTA:	3,597.99
		OBSERVACIONES:	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 3 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

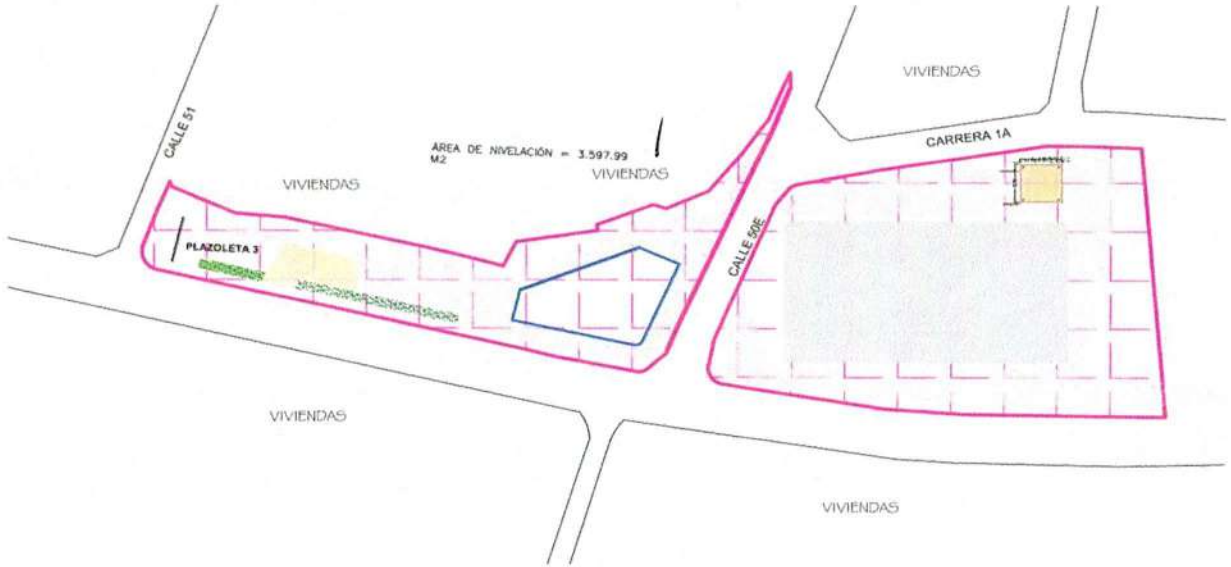

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	3 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (AJUSTES A DISEÑOS)						6221.18	
TOTAL PRESENTE ACTA:							6,221.18


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

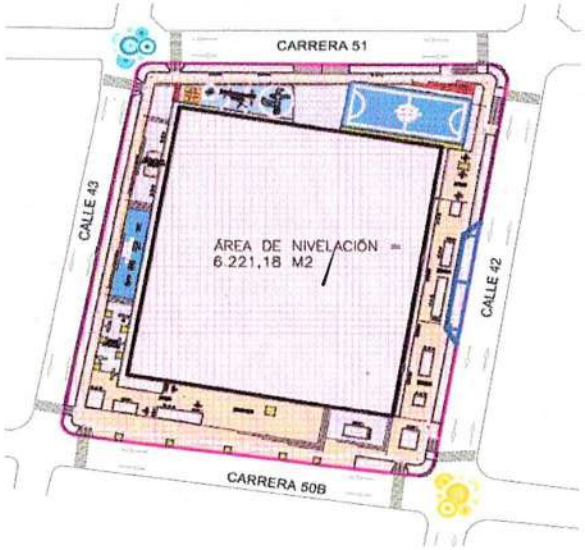

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE LA NORIA MALECON

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (SEGÚN AJUSTE A DISEÑOS)						5323.58	
TOTAL PRESENTE ACTA:							5,323.58


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORYA MALECON
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

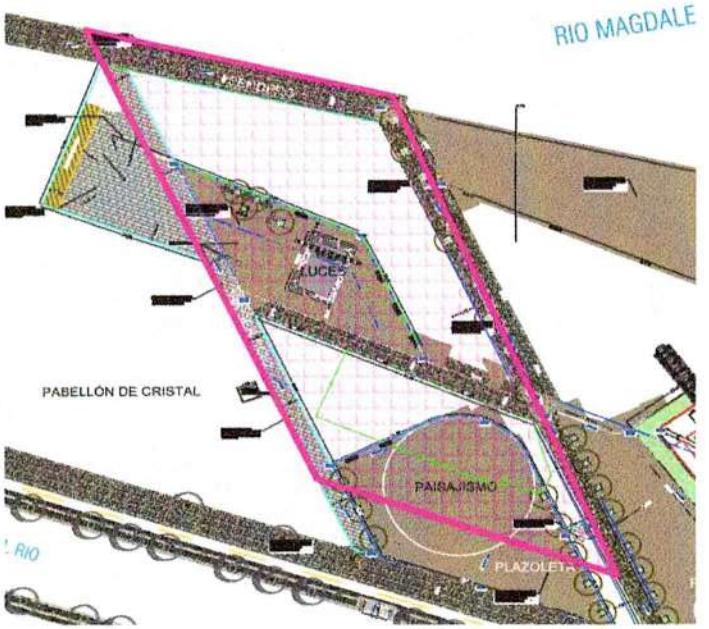

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO.

PARQUE BARLOVENTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYE ARROYO Y VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						7157.60	
TOTAL PRESENTE ACTA:							7,157.60

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:


AREA DE
LEVANTAMIENTO
7157,6 M2

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE LA PIÑUELA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						1246.95	
TOTAL PRESENTE ACTA:							1,246.95

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA PINUELA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE SAN SALVADOR

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

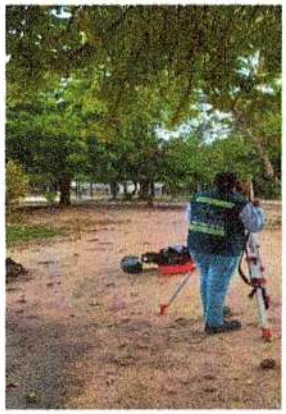

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						3152.70	
TOTAL PRESENTE ACTA:							3,152.70

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE SAN SALVADPR
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE SIAPE

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						3245.31	
TOTAL PRESENTE ACTA:							**3,245.31**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE SIAPE
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE PUENTE CARRERA 38

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						22307.04	
TOTAL PRESENTE ACTA:							22,307.04

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PUENTE CARRERA 38
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4		**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025			
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE LOS ENAMORADOS

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						14508.31	

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. INTERVENTORIA:**	**TOTAL PRESENTE ACTA:** 14,508.31

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 2 1 0 2 0 1 8 - 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LOS ENAMORADOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4	**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025		
CAPITULO:	PRELIMIANRES — **CÓDIGO DEL ITEM:** 1,03	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE LOS MUSICOS

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						28264.16	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	150,000.00						
Acumulado anterior	52,411.78						
Acumulado a presente acta	148,847.73						
Obra por ejecutar	1,152.27						

TOTAL PRESENTE ACTA:	28,264.16

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LOS MUSICOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



AREA DE LEVANTAMIENTO= 28.264,16 M2

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.04	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. DEMOLICION JARDINERAS EXISTENTES	42.00				42.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	312.00						
Acumulado anterior	73.00						
Acumulado a presente acta	115.00						
Obra por ejecutar	197.00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							42.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código: IO-FM-29 Versión: 02 Fecha: 06/09/2021 Páginas: 1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.09	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGAS ENCONTRADAS DEBAJO DEL TERRENO NATURAL (ZONA PLAZOLETA)	84.00				84.00		
2. VIGAS ENCONTRADAS DEBAJO DEL TERRENO NATURAL (ZONA ANDEN ALEDAÑO A PREDIOS)	36.80				36.80		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

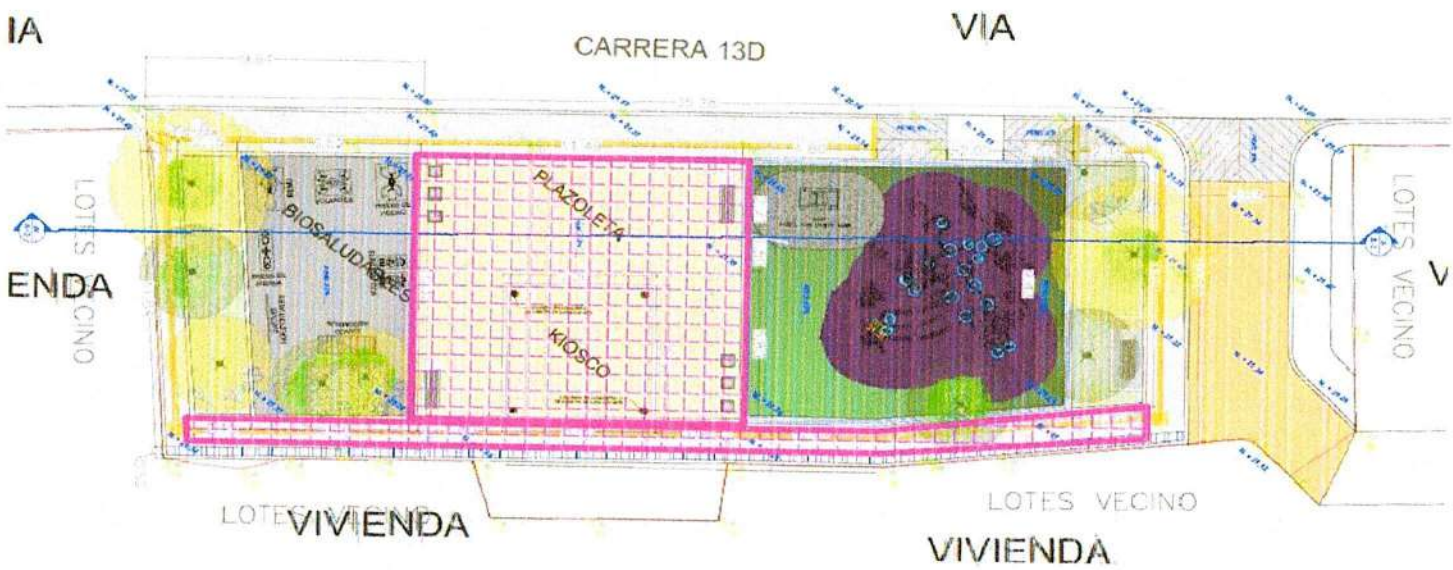

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.09	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. VIGAS ENCONTRADAS DEBAJO DEL TERRENO NATURAL (ZONA DONDE ESTÁ UBICADO EL KIOSKO LADO DE LA 1A)	35.50				35.50		
2. DEMOLICIÓN DE VIGAS EXISTENTES EN ZONA DE BIOSALUDABLE SOBRE CALLE 50E Y ZONA VERDE SOBRE CARRERA 1	175.00				175.00		
3, DEMOLICIÓN DE VIGAS ZONA CANCHA	84.00				84.00		
TOTAL PRESENTE ACTA:							294.50


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

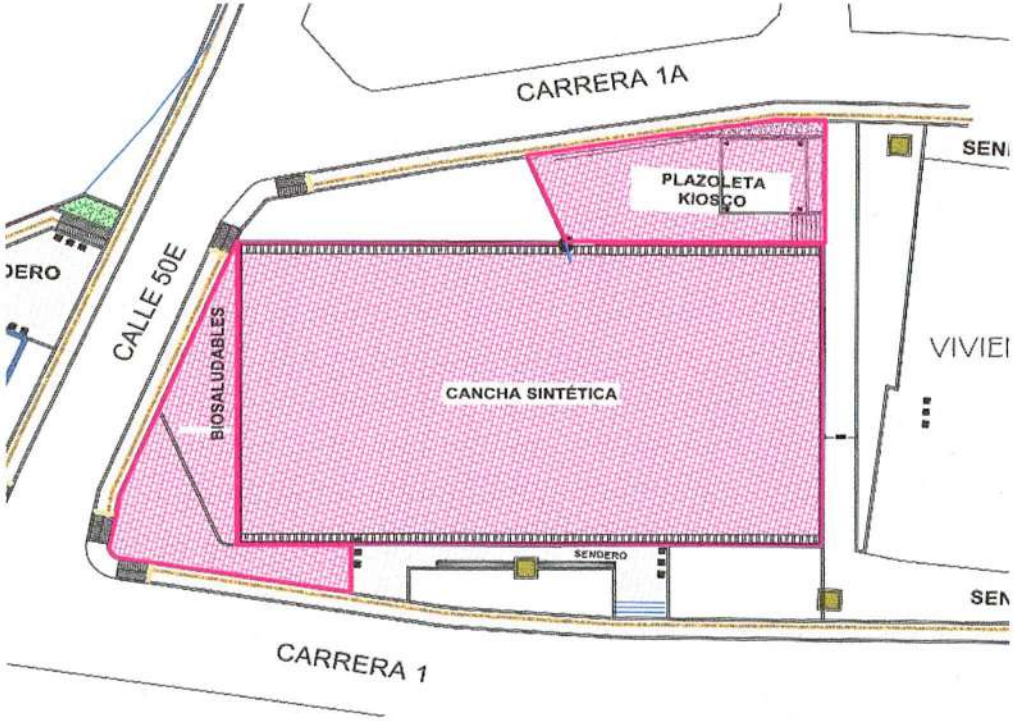

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1


CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.09	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)








LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. DEMOLICIÓN VIGAS ENCONTRADAS DEBAJO DE LOSA EXISTENTE (PERIMETRO BODEGA)	218.78				218.78		
2. DEMOLICIÓN VIGA ACCESO VEHICULAR ENTRADA A BODEGA SOBRE CARRERA 51B	36.76				36.76		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	1,584.00						
Acumulado anterior	155.00						
Acumulado a presente acta	825.84						
Obra por ejecutar	758.16						

TOTAL PRESENTE ACTA:	255.54


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8901020184-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

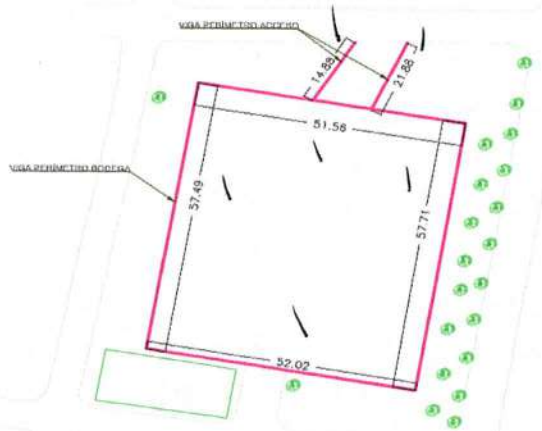

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/05/2021
Páginas:	1 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO	17/01/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM	1.12	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

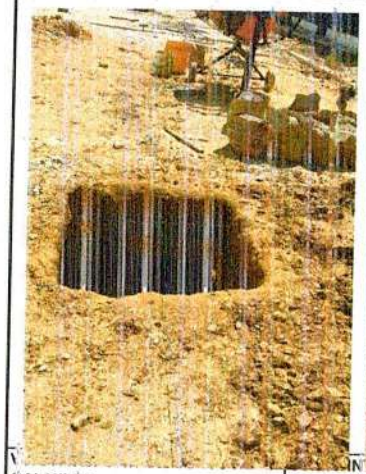


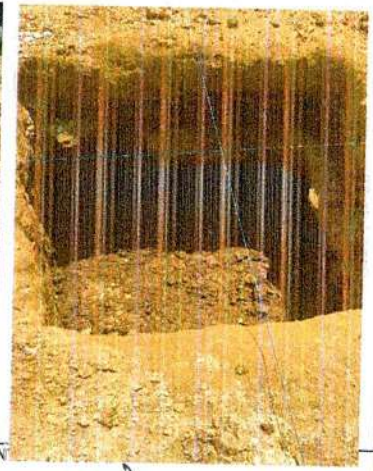

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES MI	M2	M3
1. DEMOLCION DE PLACA ENCONTRADA EN ZONA DE KIOSKO	14.50	9.60				139.20	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

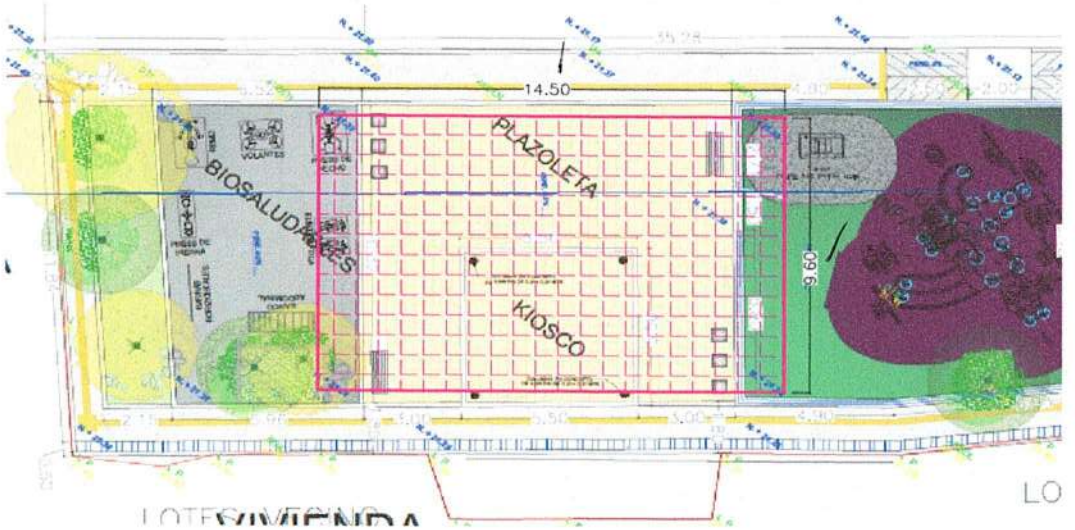

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.12	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
2. DEMOLICIÓN DE PLACA EN ZONA JUEGOS INFANTILES Y PLAZOLETA 3 (PLACA FRENTE A PREDIOS)	58.80	2.87				168.76	
TOTAL PRESENTE ACTA:							168.76


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

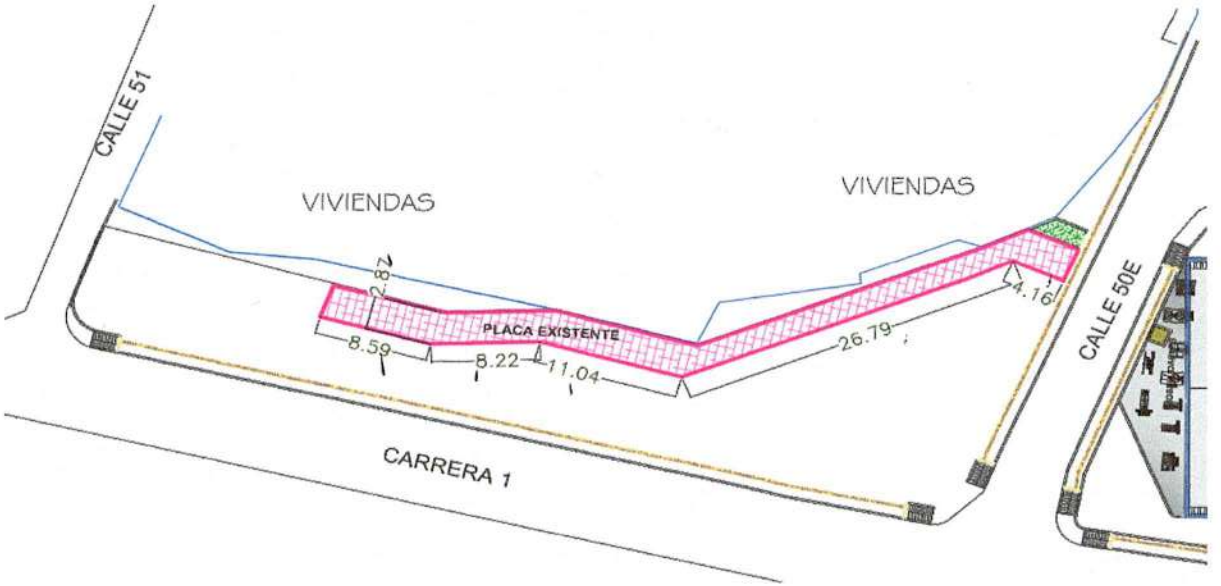

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.12	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

PARQUE LA NORIA MALECON

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

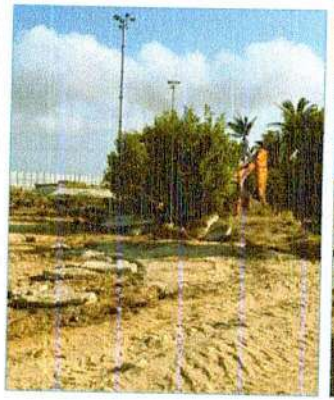



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. DEMOLICION DE PLACA 0,10 - 0,30, PLACA EN CONCRETO UBICADA EN LA INTERSECCION DEL SENDERO CON LA VIA DE ACCESO VEHICULAR						165.35	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	5,800.00						
Acumulado anterior	4,214.90						
Acumulado a presente acta	4,688.21						
Obra por ejecutar	1,111.79						

TOTAL PRESENTE ACTA: 165.35


OBSERVACIONES: EN EL ACTA 1 SE HIZO UN COBRO PARCIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA EN LA NORIA, EN ESTA SE ESTÁ COBRANDO EL EXCEDENTE.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA MALECON
DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

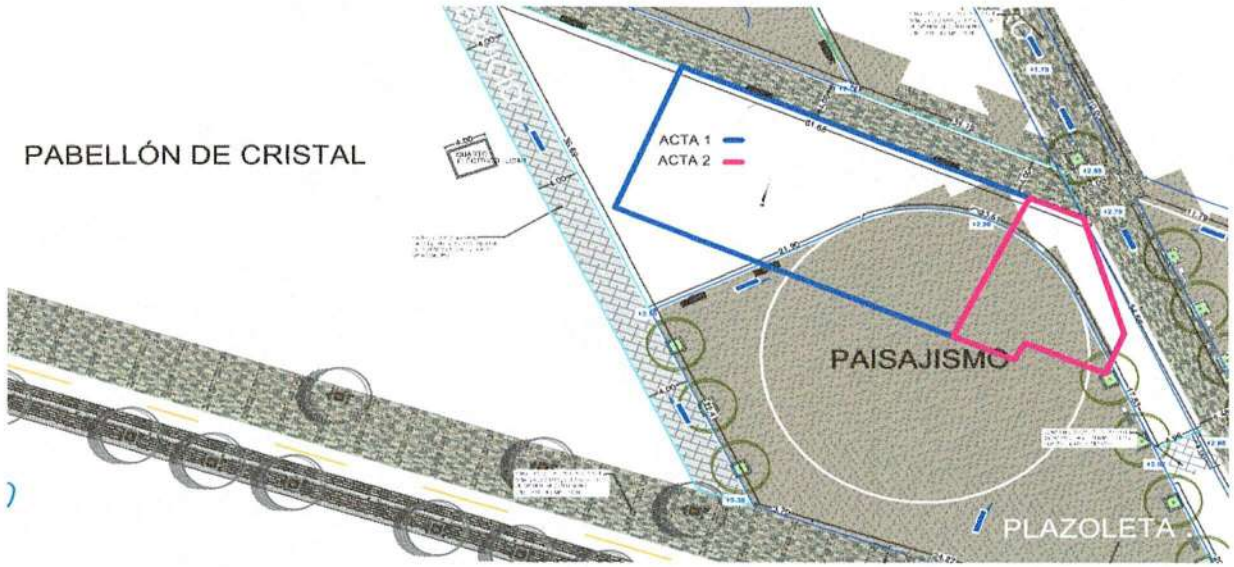

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1


CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 16/06/2026				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.15	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





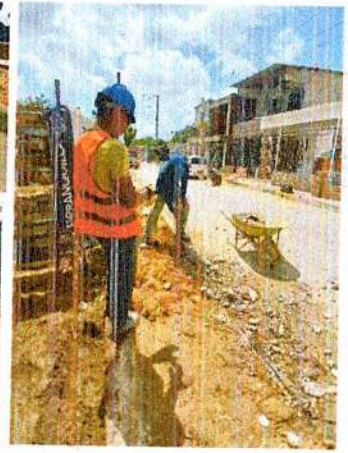

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. DEMOLICION BORDILLO DEL ANDEN DE LA VÍA PRINCIPAL	57.67				57.67		
2. DEMOLICION BORDILLO (LADO DE POMPEYANO)	16.14				16.14		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	3,431.00						
Acumulado anterior	195.12						
Acumulado el presente acta	268.93						
Obra por ejecutar	3,162.07						
TOTAL PRESENTE ACTA:							73.81

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	3 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.39	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25

PARQUE LA NORIA MALECON

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. DESCAPOTE SOBRE ÁREA DE SENDERO						592.30	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	26,982.00						
Acumulado anterior	6,473.85						
Acumulado a presente acta	7,066.15						
Obra por ejecutar	19,915.85						
TOTAL PRESENTE ACTA:							592.30

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA MALECON

DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25

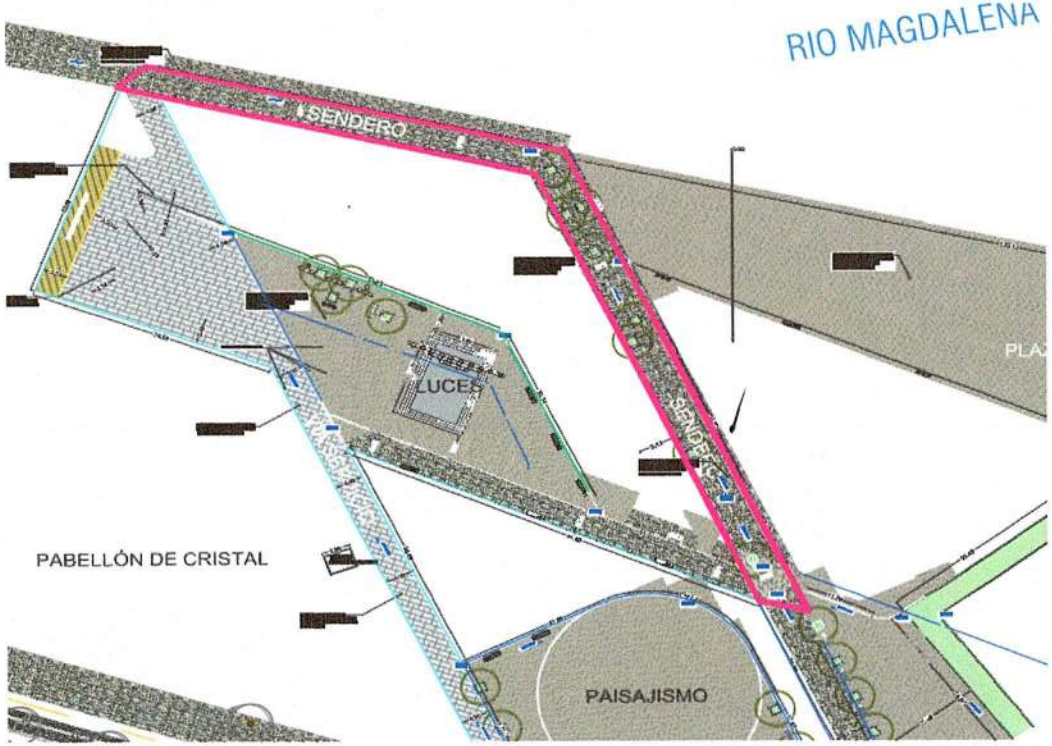

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

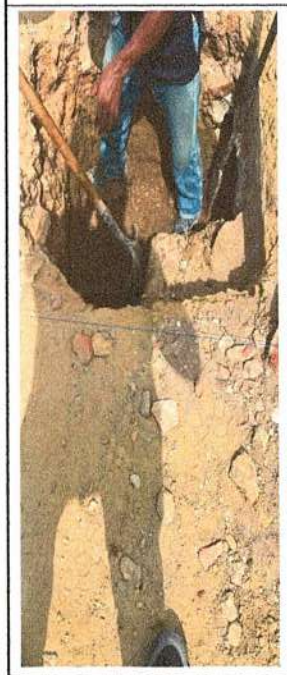



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
1 EXCAVACION ACCESO CASA 2	9.40	2.95	0.40				11.09
2. EXCAVACION RAMPA DE ACCESO A CASA 5	3.00	3.00	0.40				3.60
3. EXCAVACION DE ZAPATAS PARA KIOSKO	1.20	1.20	1.20	4.00			6.91
4. EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATAS	4.00	0.50	1.20	4.00			9.60
5. EXCAVACIONES PARA ALCORQUE 1	16.10	0.50	1.20				9.66
6. EXCAVACIONES PARA ALCORQUE 2	11.40	0.50	1.20				6.84
7. EXCAVACIONES PARA ALCORQUE 3	16.10	0.50	1.20				9.66
TOTAL PRESENTE ACTA:							57.36

OBSERVACIONES: LA LONGITUD DE LOS ALCORQUES ES POR PERIMETRO.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

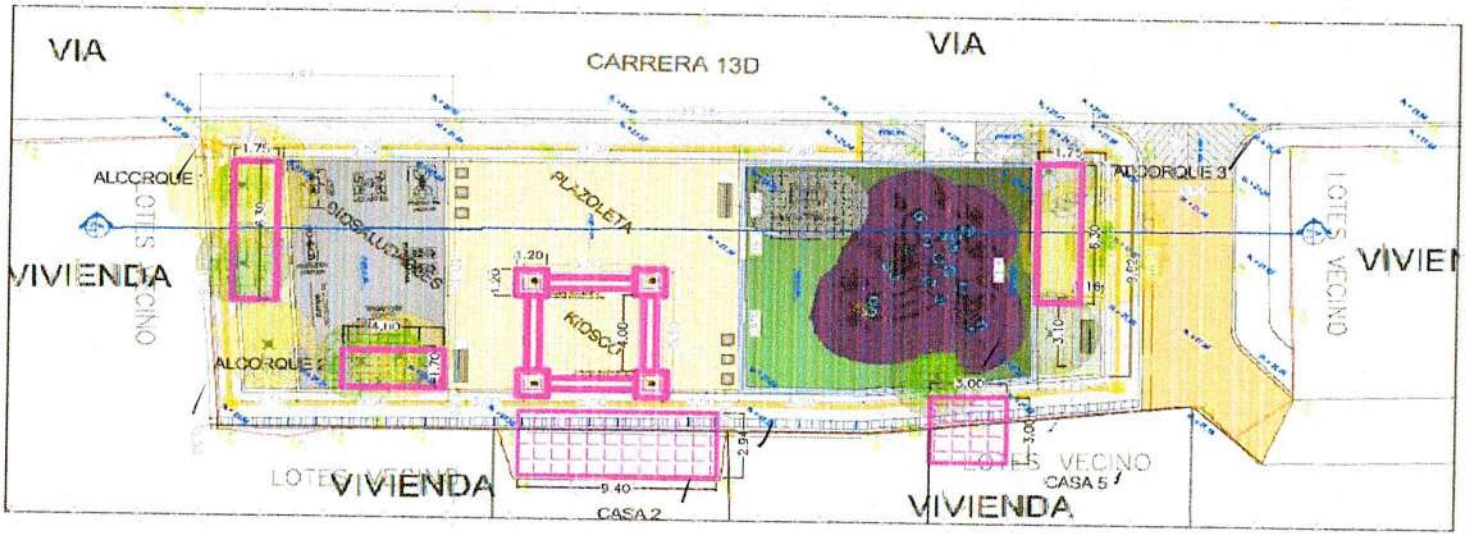

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)








LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE PLAZOLETA ZONA KIOSKO			0.30			139.61	41.88
2. EXCAVACION ALCORQUE PLAZOLETA ZONA KIOSKO	1.50	1.50	1.20				2.70
3. EXCAVACION CARCAMO CANCHA DE FUTBOL	37.20	0.70	0.70	2.00			36.46
4. ESCALERAS DE ACCESO SENDERO 1	1.10	3.50	0.40				1.54
5. EXCAVACION A MANO SENDERO PARALELO A LA CARRERA 1, AREA POR AUTOCAD			0.30			45.83	13.75
6. ZONA DE JUEGO INFANTILES AREA POR AUTOCAD			0.30			370.15	111.05
7. ZONA PLAZOLETAS AL LADO DE JUEGOS INFANTILES			0.30			429.28	128.78
					TOTAL PRESENTE ACTA:		336.16

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

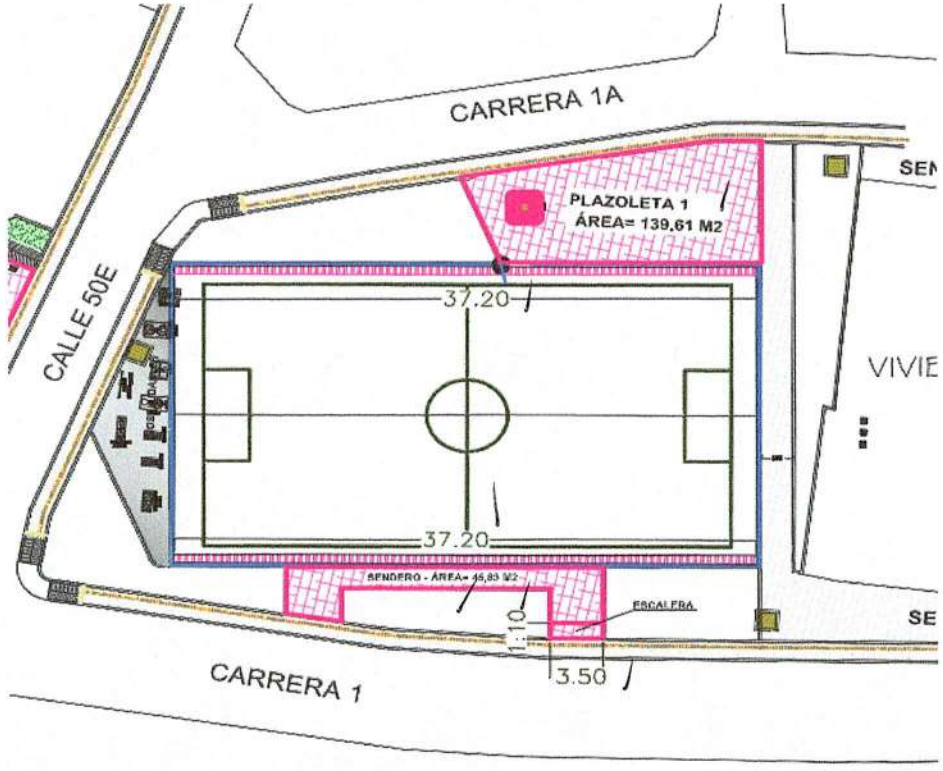

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código: IO-FM-29 Versión: 02 Fecha: 06/09/2021 Páginas: 1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	3 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

PARQUE LA NORIA MALECON

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)




LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. EXCAVACION A MANO SENDERO ADYACENTE AL CERRAMIENTO PERIMIETRAL			0.36			592.40	213.26
TOTAL PRESENTE ACTA:							**213.26**

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE NORIA MALECON
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

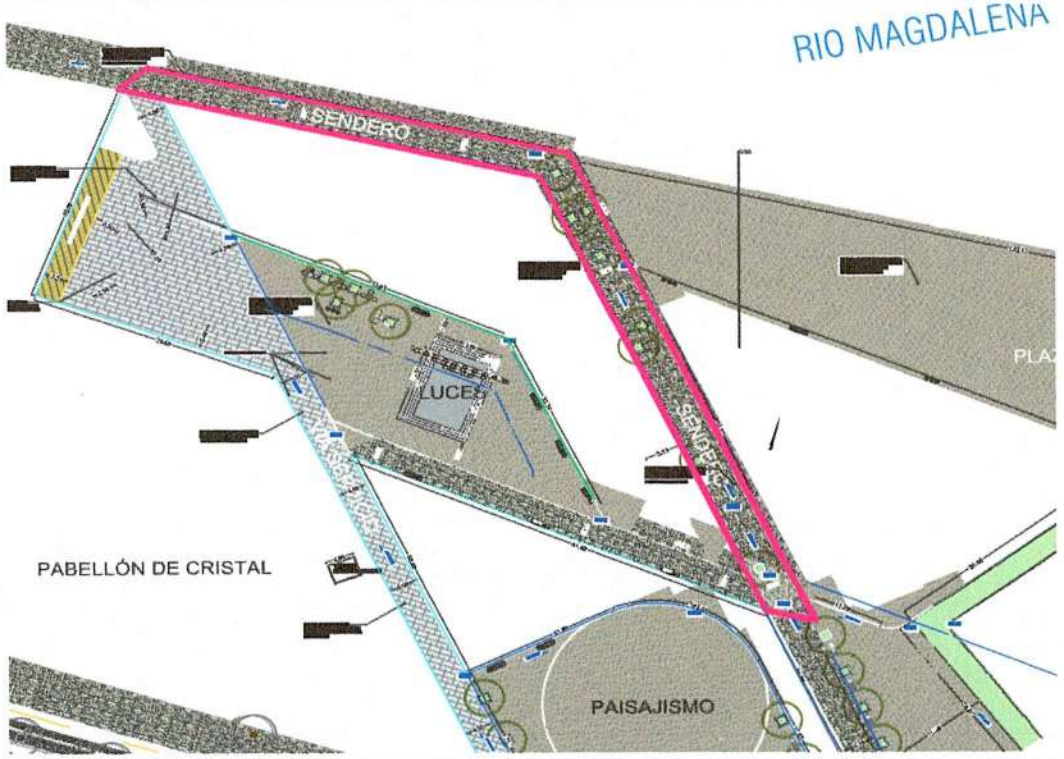

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102015-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	3 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE ZAPATA MURO TIPO 1 ENTRE CALLE 42 Y CARRERA 51	50.00	1.10	0.30				16.50
Cantidad contractual según modificatoria N°2	8,177.96						
Acumulado anterior	424.47						
Acumulado a presente acta	1,047.75						
Obra por ejecutar	7,130.21						

TOTAL PRESENTE ACTA:	16.50

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

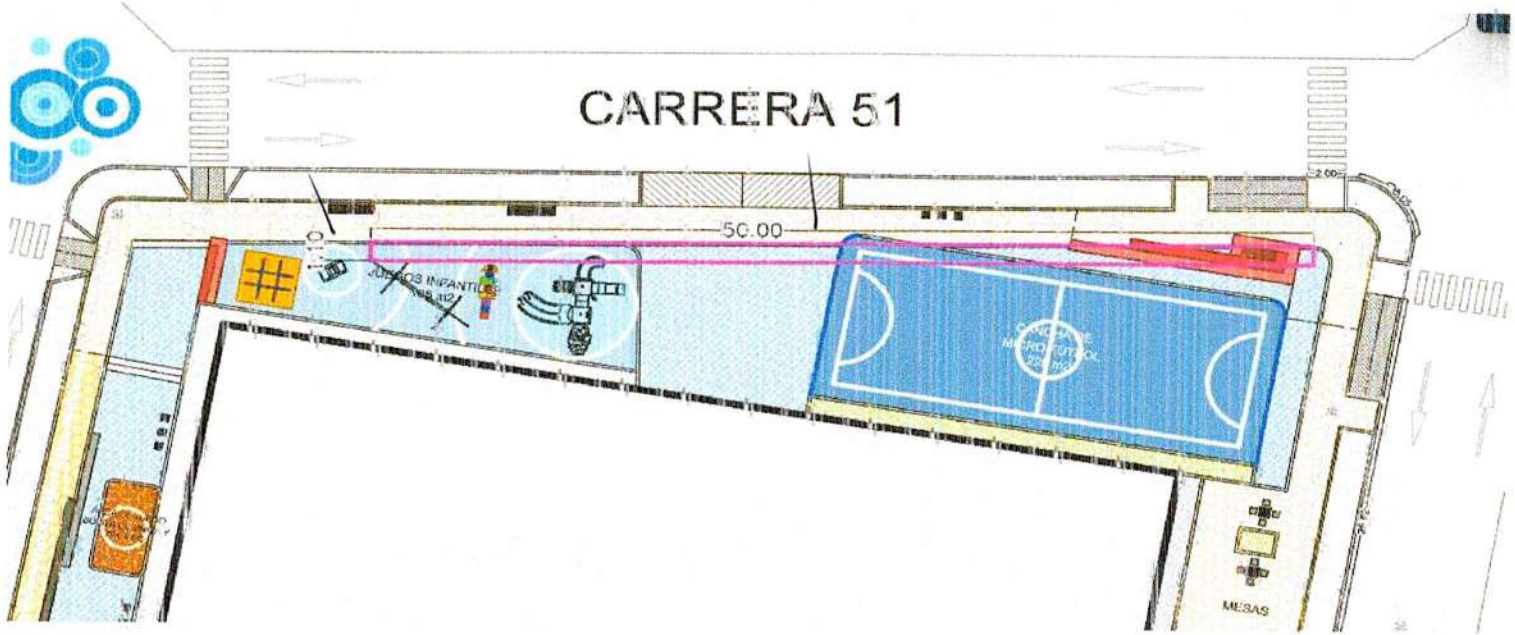

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. EXCAVACION VIGA PERIMETRAL JUEGO INFANTILES	44.84				44.84		
2. EXCAVACION VIGA PERIMETRAL PLAZOLETA DEL KIOSKO	44.54				44.54		
3 EXCAVACION VIGA PERIMETRAL BIOSALUDABLE	24.32				24.32		
4. EXCAVACION VIGA PARALELA A PREDIOS	37.80				37.80		
5. EXCAVACION VIGA PARALELA A PREDIO CONTIGUO AL PARQUE (ZONA VERDE)	28.40				28.40		
6. EXCAVACION DE VIGA PERIMETRAL DE PLAZOLETA ENTRE JUEGO DE NIÑOS Y VIA DE ACCESO	15.72				15.72		
7. EXCAVACIÓN DE VIGA ENTRE JARDINE Y JUEGOS INFANTILES	11.84				11.84		
TOTAL PRESENTE ACTA:							207.46


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

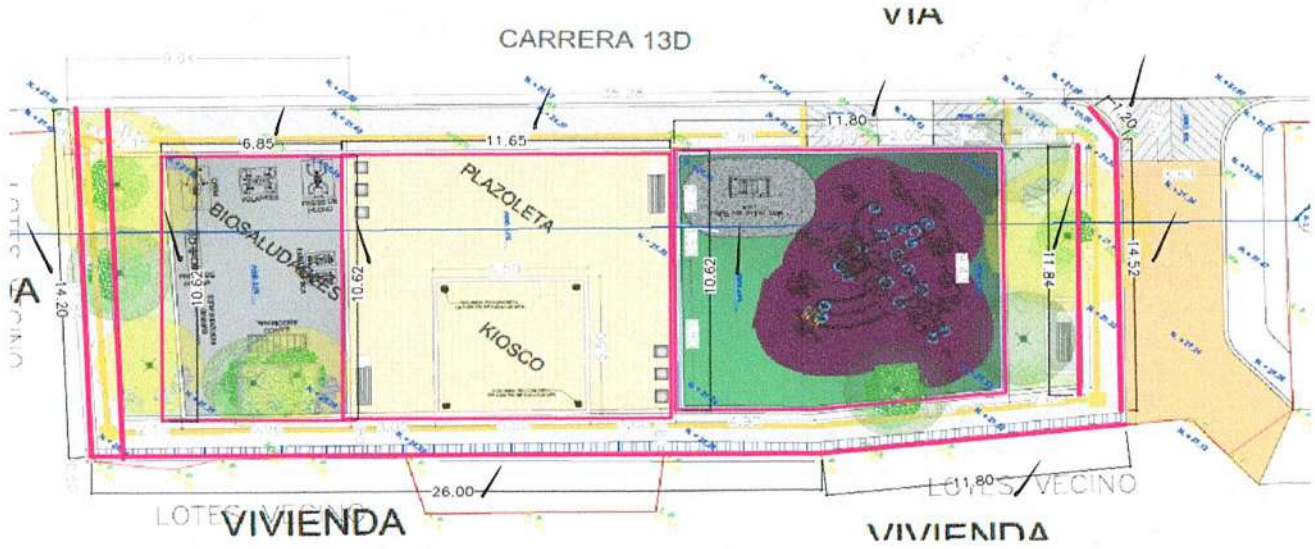

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	TO-FM-29
Versión:	02
Fecha	06/09/2021
Página:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)"
PERIODO:	17/06/2023 - 15/08/2023				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

PARQUE LA NORIA MALECON

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA M)	CANT	TOTALES ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE VIGA ADYACENTE AL AREA DE LUCES					67.80		

TOTAL PRESENTE ACTA:	67.80


OBSERVACIONES: EL COBRO DE ESTA CANTIDAD ES PARCIAL, AÚN LE FALTA UN TRAMO POR CONSTRUIR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 131.25 NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

LA NORIA MALECON
EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

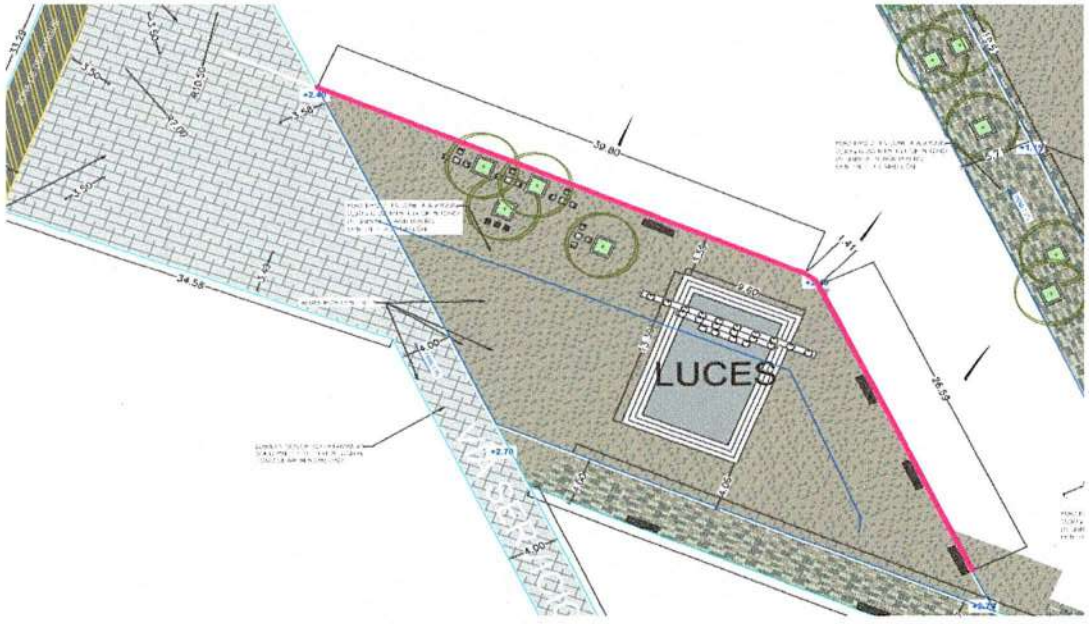

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE VIGA 30 X 30 PERIMETRO JUEGOS INFANTILES					57.53		
TOTAL PRESENTE ACTA:							57.53

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 131.25
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE VIGA 30X30 CANCHA DE FUTBOL					36.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	1,783.00						
Acumulado anterior	477.84						
Acumulado a presente acta	846.63						
Obra por ejecutar	936.37						

TOTAL PRESENTE ACTA:	36.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 191.25 NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código: IO-FM-29 Versión: 02 Fecha: 06/09/2021 Páginas: 1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. EXCAVACIÓN A MAQUINA AREA POR CARTERAS TOPOGRÁFICAS (LADO 51)			0.50			763.10	381.55
2. EXCAVACIÓN A MAQUINA AREA POR CARTERAS TOPOGRÁFICAS (LADO 50B)			0.50			920.77	460.39
Cantidad contractual según modificatoria N°2	8,747.00						
Acumulado anterior	547.67						
Acumulado a presente acta	1,389.61						
Obra por ejecutar	7,357.40						
TOTAL PRESENTE ACTA:							841.94


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO

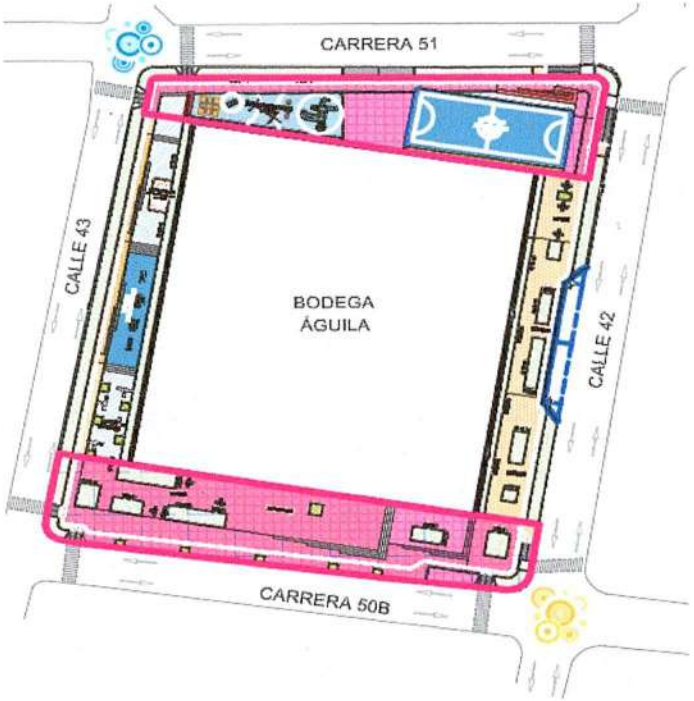

MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE PLAZA AGUILA CORTE CARRERA 50B								
ESTACION	AREAS (M2)		DISTANCIA		VOLUMENES (M3)		RELLENO	
	RELLENO	CORTE	RELLENO	CORTE	CORTE	CORTE ACUMULADO	RELLENO	RELLENO ACUMULADO
0+000,00	36,02		0,00		0	0		
0+03,00	36,02		3,00		108,06	108,06		
0+06,00	36,02		3,00		108,06	216,12		
0+009,00	36,02		3,00		108,06	324,18		
0+012,00	28,64		3,00		85,91	410,09		
0+017,37	9,37		5,37		50,30	460,39		

TOTAL VOLUMEN CORTE	**460,39**	**M3**
COEFICIENTE DE EXPANSION	**1,20**	

MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE PLAZA AGUILA RELLENO CARRERA 50B								
ESTACION	AREAS (M2)		DISTANCIA		VOLUMENES (M3)		RELLENO	
	RELLENO	CORTE	RELLENO	CORTE	CORTE	CORTE ACUMULADO	RELLENO	RELLENO ACUMULADO
0+000,00	36,02		0,00				0	0
0+03,00	36,02		3,00				108,06	108,06
0+06,00	36,02		3,00				108,06	216,12
0+009,00	36,02		3,00				108,06	324,18
0+012,00	28,64		3,00				85,91	410,09
0+017,37	9,37		5,37				50,30	460,39

TOTAL VOLUMEN CORTE	**460,39**	**M3**
COEFICIENTE DE EXPANSION	**1,20**	

EDGAR JAVIER BLANCO LINERO.
T.P. 01-17145 del **C.P.N.T**
TOPOGRAFO PROFESIONAL

Fabio Ruiz Bolivar
N° = 08202-3373326 ATL
COPNIA

MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE PLAZA AGUILA CORTE CARRERA 51								
ESTACION	AREAS (M2)		DISTANCIA		VOLUMENES (M3)		RELLENO	
	RELLENO	CORTE	RELLENO	CORTE	CORTE	CORTE ACUMULADO	RELLENO	RELLENO ACUMULADO
0+000,00		33,36		0,00	0	0		
0+03,00		33,36		3,00	100	100,08		
0+06,00		33,36		3,00	100	200,16		
0+009,00		24,36		3,00	73	273,24		
0+012,00		15,04		3,00	45	318,35		
0+016,43		14,27		4,43	63	381,55		

TOTAL VOLUMEN CORTE	**381,55**	**M3**
COEFICIENTE DE EXPANSION	**1,20**	

MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE PLAZA AGUILA RELLENO CARRERA 51								
ESTACION	AREAS (M2)		DISTANCIA		VOLUMENES (M3)		RELLENO	
	RELLENO	CORTE	RELLENO	CORTE	CORTE	CORTE ACUMULADO	RELLENO	RELLENO ACUMULADO
0+000,00	33,36		0,00				0	0
0+03,00	33,36		3,00				100,08	100,08
0+06,00	33,36		3,00				100,08	200,16
0+009,00	24,36		3,00				73,08	273,24
0+012,00	15,04		3,00				45,11	318,35
0+016,43	14,27		4,43				63,21	381,55

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN	**381,55**	**M3**
COEFICIENTE DE EXPANSION	**1,20**	

EDGAR JAVIER BLANCO LINERO.
T.P. 01-17145 del **C.P.N.T**
TOPOGRAFO PROFESIONAL

Fabio Ruiz Bolivar
N° = 08202-3373326 ATL
COPNIA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TERRAZA CASA 2	9.40	2.94	0.20	1.00			5.53
2. RELLENO CON MATERIAL SELLECCIONADO DE CANTERA RAMPA DE ACCESO A CASA 5	3.00	3.00	0.20	1.00			1.80
3. RELLENO DE ZAPATAS PARA ESTRUCTURA METALICA	1.20	1.20	0.90	4.00			5.18
4. RELLENO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES	11.80	10.62	0.20	1.00			25.06
5. RELLENO DE ZONA BIOSALUDABLE	6.85	10.62	0.20	1.00			14.55
6. RELLENO DE ZONA PLAZOLETA KIOSKO	11.65	10.62	0.20	1.00			24.74
TOTAL PRESENTE ACTA:							76.87


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 8901C2018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)

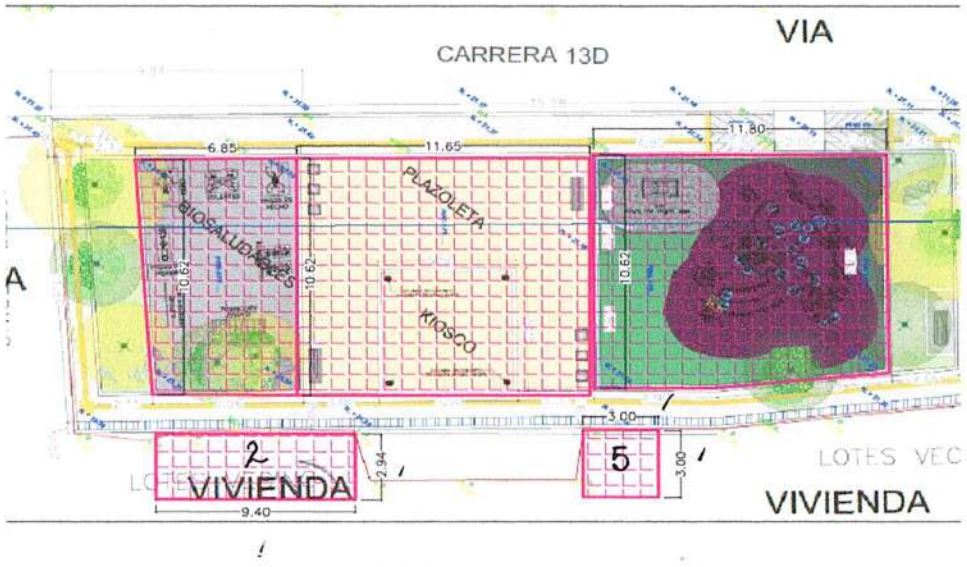

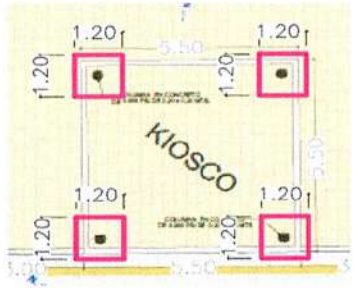

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102015-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)








LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. RELLENO ZONA DE JARDINERA Y PLAZOLETA KIOSKO			1.10			224.61	247.07
2. SENDERO PARALELO A LA CARRERA 1, AREA POR AUTOCAD SENDERO 1			1.10			45.83	50.41
3. RELLENO DE SENDERO PEATONAL LADO VIVIENDAS	30.76	2.00	1.45				89.20
4. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO ZONA DE JUEGO INFANTILES			0.65			370.15	240.60
5. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO ZONA PLAZOLETAS AL LADO DE JUEGOS INFANTILES			0.55			429.28	236.10
6. RELLENO CANCHA FUTBOL (ALTURA FINAL)	37.80	21.70	0.20				164.05
TOTAL PRESENTE ACTA:							1,027.44

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
PIH: RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO(CAMICHE)

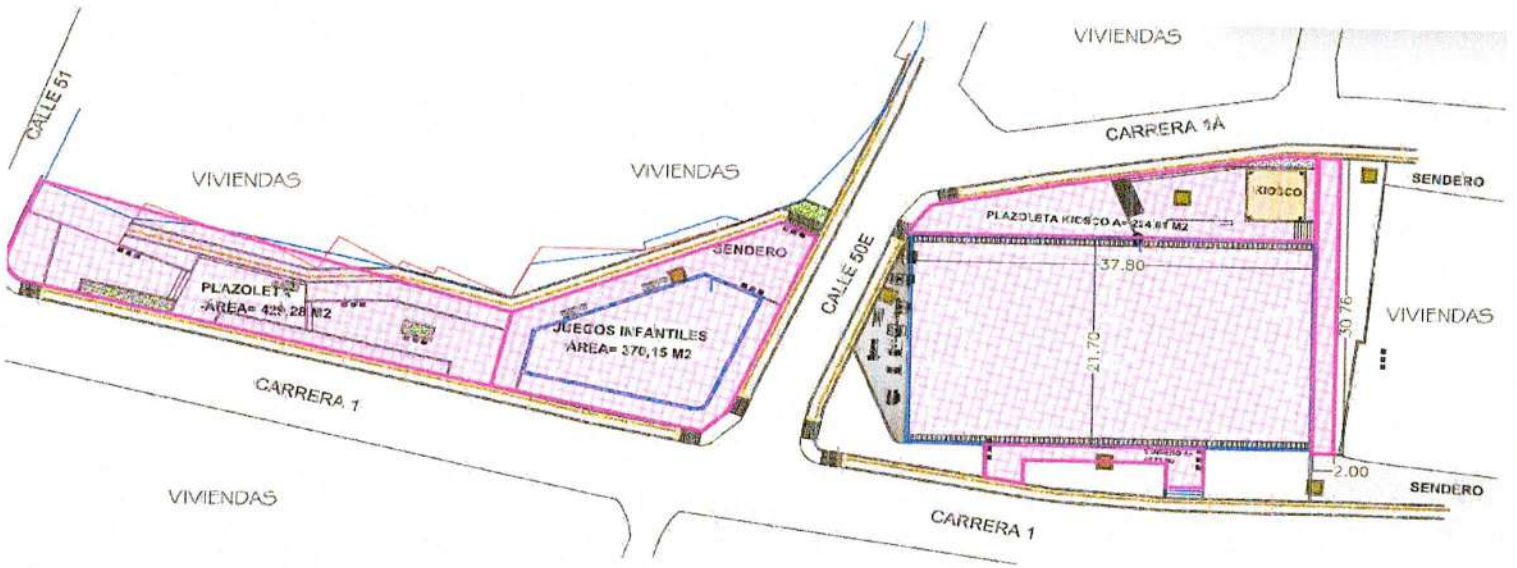


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PIH. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO(CALICHE)

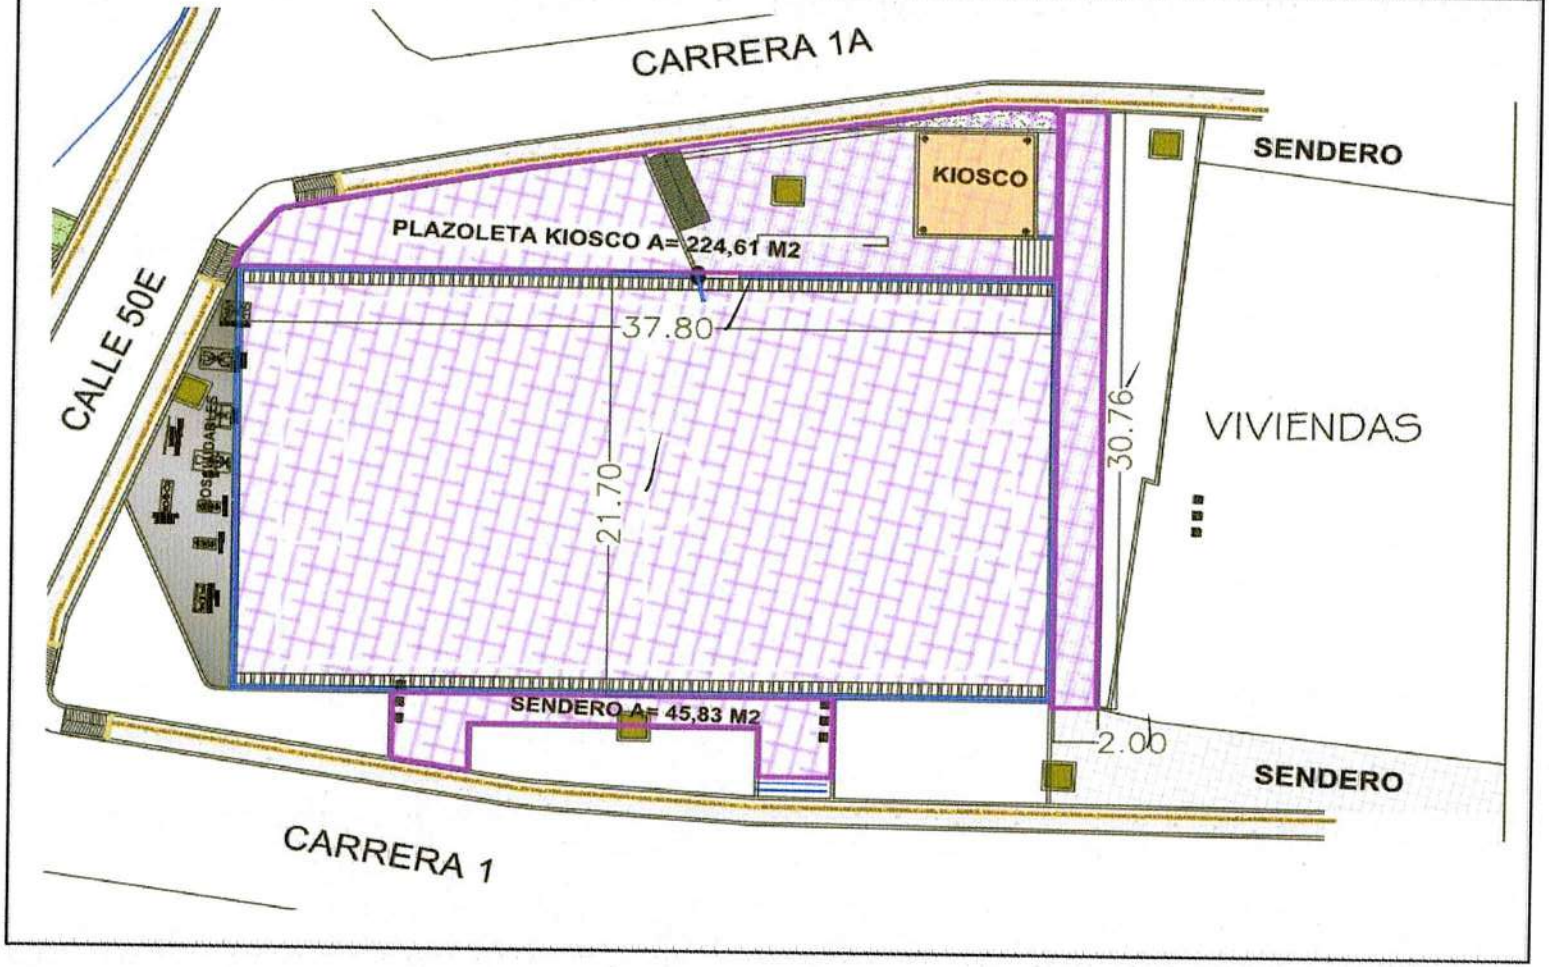


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PIH. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO(CALICHE)

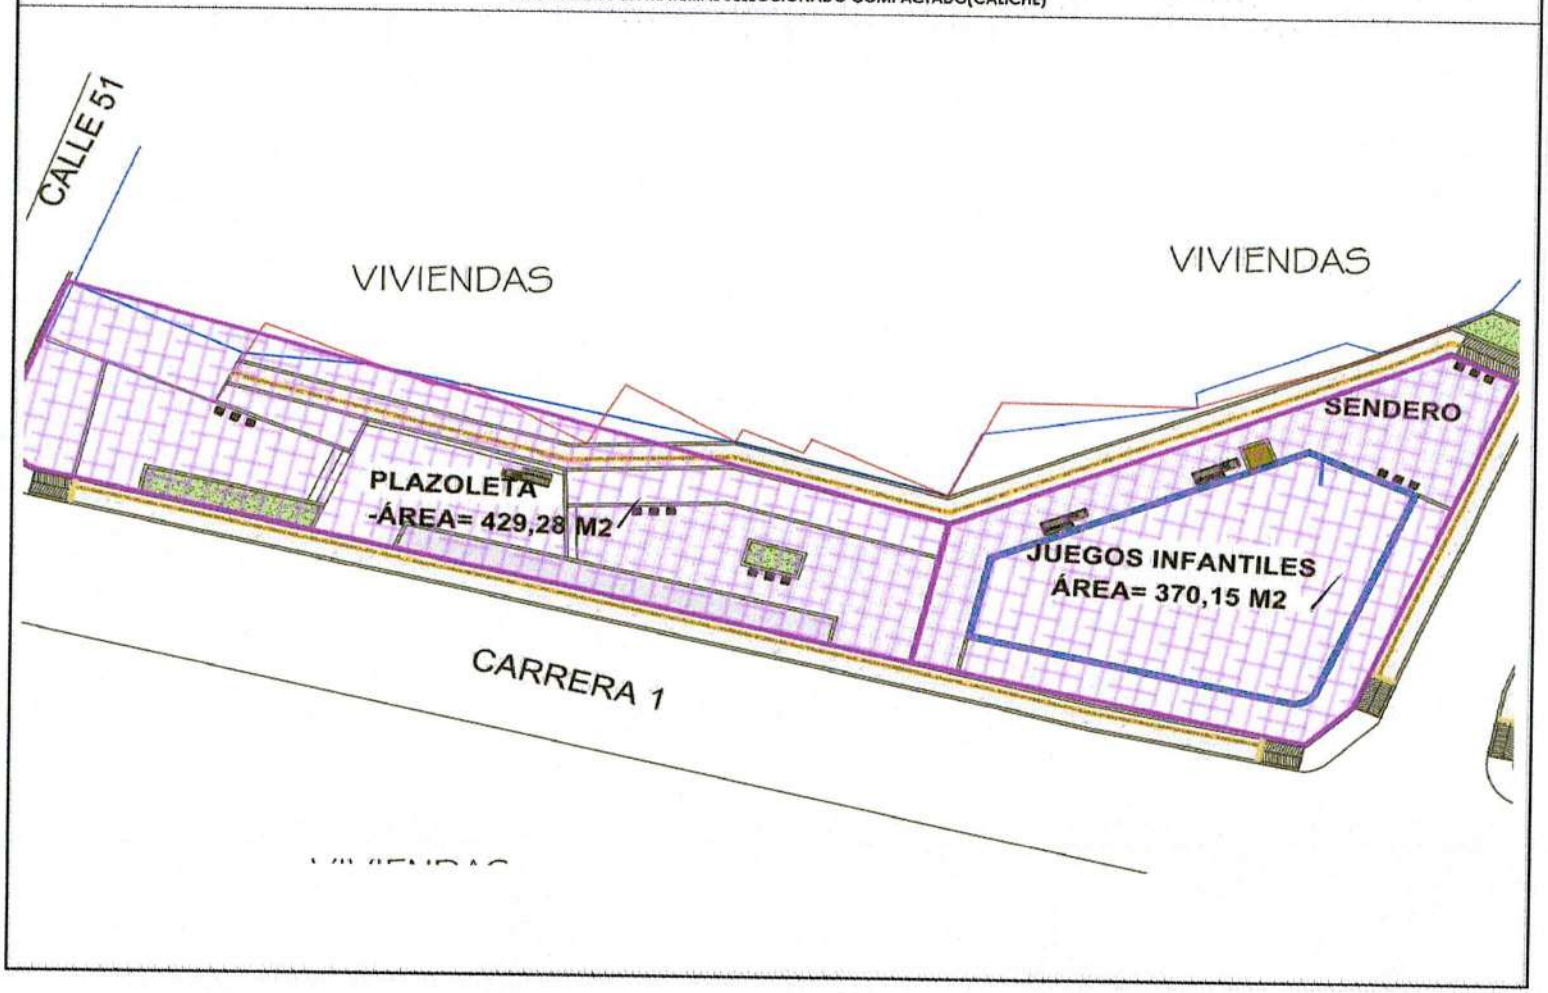

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO CARTERA TOPOGRAFICA (LADO 51)			0.50			763.10	381.55
2. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO CARTERA TOPOGRAFICA (LADO 50B)			0.50			920.77	460.39
				TOTAL PRESENTE ACTA:			841.94


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
PIH. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO(CALICHE)

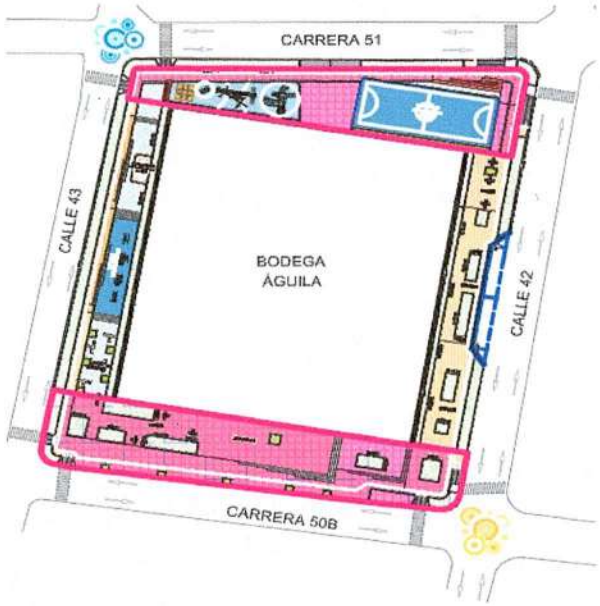

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 5 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.06	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)

PARQUE LA NORIA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SENDERO			0.20			866.00	173.20
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**14,205.20**						
Acumulado anterior	**1,386.87**						
Acumulado a presente acta	**3,506.32**						
Obra por ejecutar	**10,698.89**						

TOTAL PRESENTE ACTA: 173.20

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PIH. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO(CALICHE)

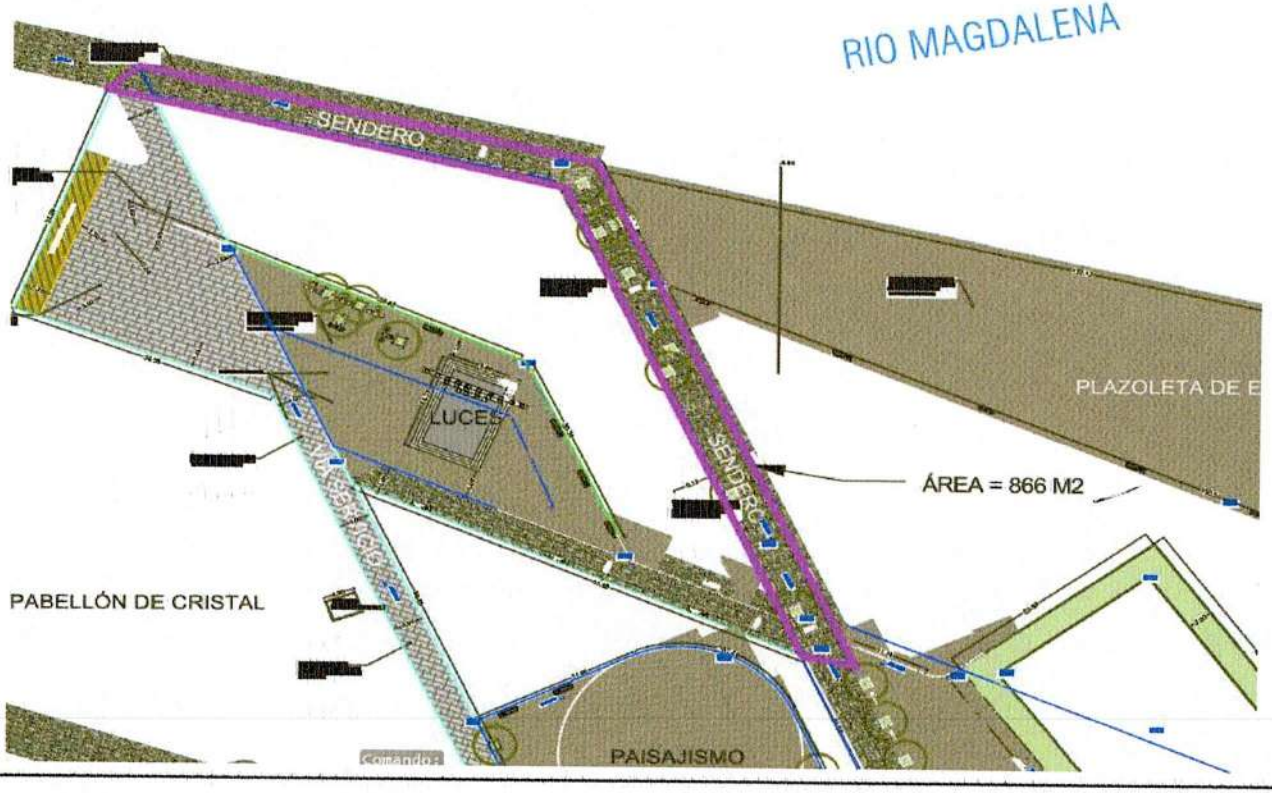

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.08	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ESTABILIZACION CANCHA SINTETICA

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
Estabilizacion de cancha sintetica lado de viviendas	5.80	1.38	0.80				6.40
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**190.00**						
Acumulado anterior	**173.94**						
Acumulado a presente acta	**180.34**						
Obra por ejecutar	**9.66**						

TOTAL PRESENTE ACTA: 6.40


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA

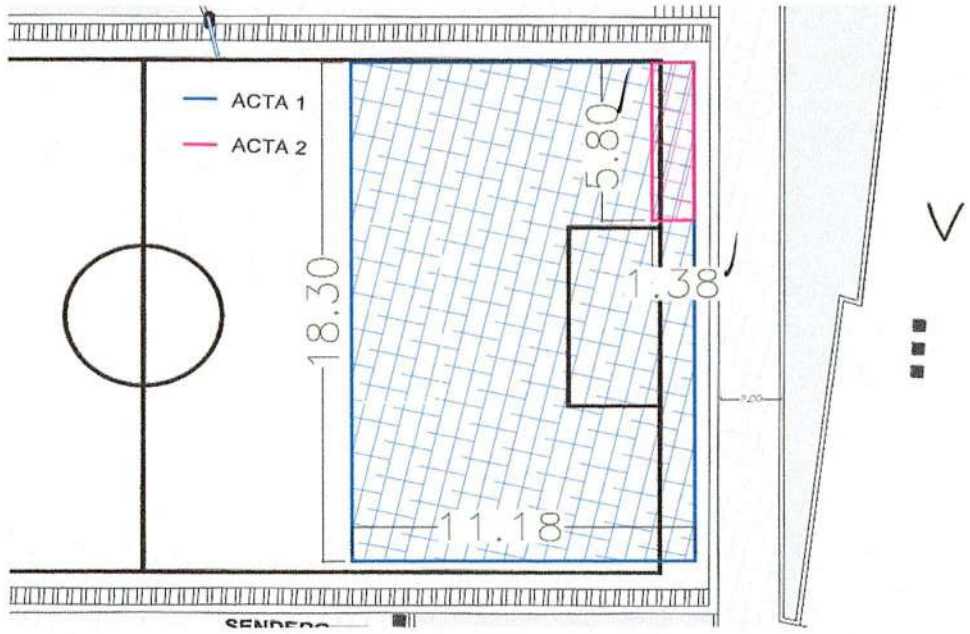

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. ZONA DE ESTAMPADO PLAZOLETA DEL KIOSKO	11.65	10.62	0.15				18.56
2. ZONA DE JUEGO DE NIÑOS	11.80	10.62	0.15				18.80
3. ZONA DE BIOSALUDABLES	6.85	10.62	0.15				10.91
5. PLACA DE ANDEN PARALELO A LA VIA 13D	36.45	1.50	0.15				8.20
6. PLACA DE ANDEN PARALLEO A LAS VIVIENDAS	34.47	1.50	0.15				7.76
7. PLACA DE ANDEN ENTRE BIOSALUDABLES Y JARDINERA 1	10.59	1.20	0.15				1.91
8. PLACA DE ANDEN ENTRE JUEGO DE NIÑOS Y JARDINERA 3	9.75	1.50	0.15				2.19
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**1,287.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**68.32**						
Obra por ejecutar	**1,218.68**						

TOTAL PRESENTE ACTA:	**68.32**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 6 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM.-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025		
CAPITULO:	ESTRUCTURA / CODIGO DE DEV: 3.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

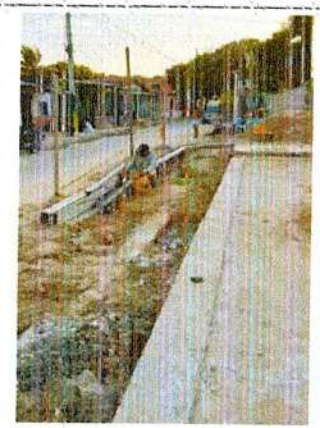



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGA PERIMETRAL JUEGO DE LOS NIÑOS	44.84				44.84		
2. VIGA PARA ALCORQUE 1	16.10				16.10		
3. VIGA PARA ALCORQUE 2	11.40				11.40		
4. VIGA PARA ALCORQUE 3	16.10				16.10		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGA 30 X 30 PERIMETRO JUEGO DE NINOS					57.53		
2. VIGA 30X30 DE ALCORQUE PLAZOLETA 1					6.00		
TOTAL PRESENTE ACTA:							63.53

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO


VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

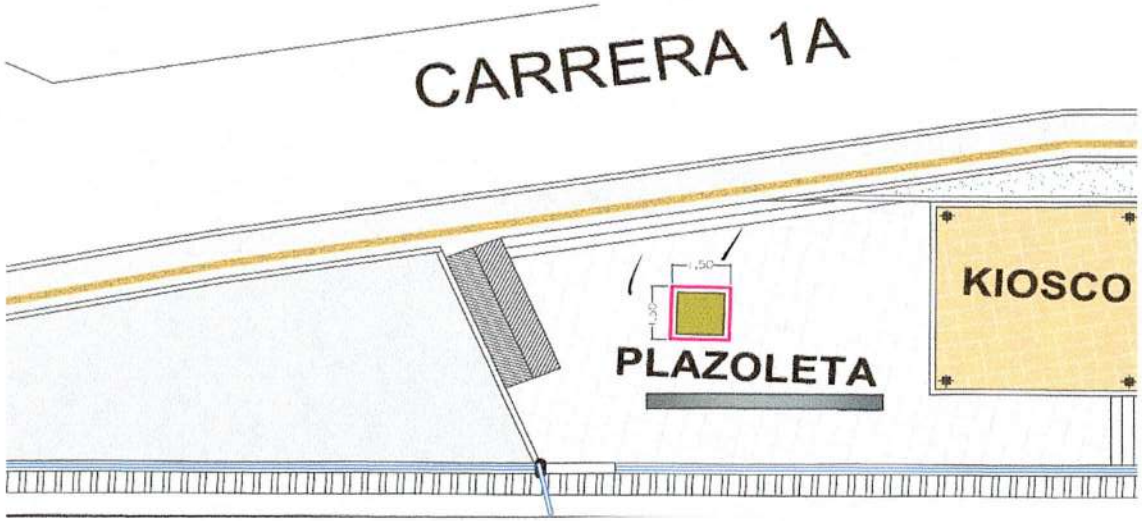

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGA 30 X 30 CANCHA DE FUTBOL					10.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	1,783.00						
Acumulado anterior	166.00						
Acumulado a presente acta	327.97						
Obra por ejecutar	1,455.03						

TOTAL PRESENTE ACTA:	10.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

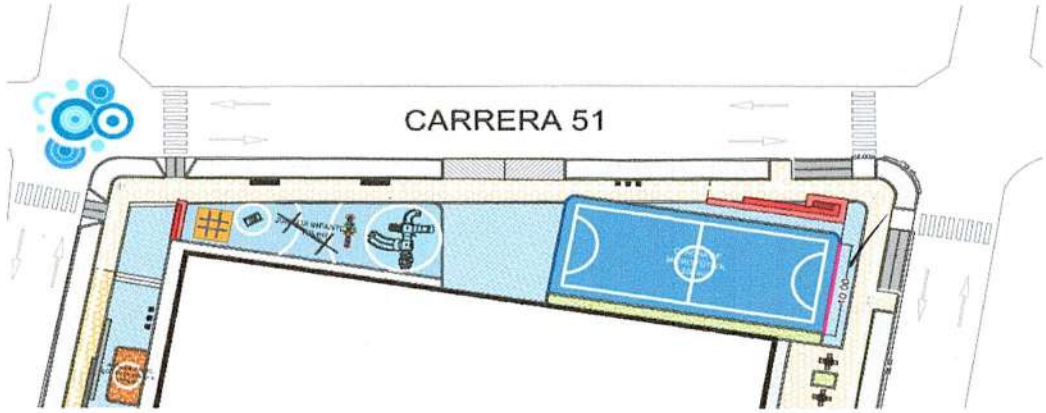

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURAL	CÓDIGO DEL ITEM:	3.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLÜYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
2. VIGA CORONA PARA ALCORQUE 1	16.10				16.10		
3. VIGA CORONA PARA ALCORQUE 2	11.40				11.40		
4. VIGA CORONA PARA ALCORQUE 3	16.10				16.10		
4. VIGA DE CONFINAMIENTO ANDEN VIA PRINCIPAL	57.57				57.57		
4. VIGA DE CONFINAMIENTO ANDEN AL LADO DE LAS VIVIENDAS	11.42				11.42		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.

PARQUE LA NORIA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGA DE 15 X 20 LADO DERECHO DE SENDERO (AZUL)	126.00				126.00		
2. VIGA DE 15 X 20 LADO IZQUIERDO DE SENDERO (MAGENTA)	127.00				127.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	4,891.00						
Acumulado anterior	0.00						
Acumulado a presente acta	365.59						
Obra por ejecutar	4,525.41						

TOTAL PRESENTE ACTA:	253.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.

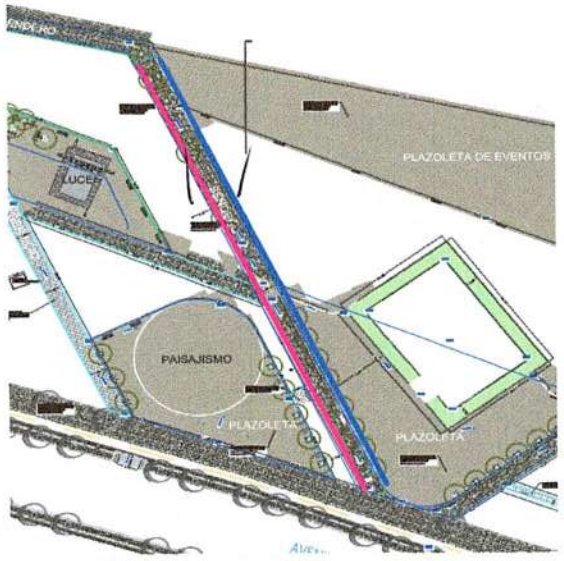

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.06	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



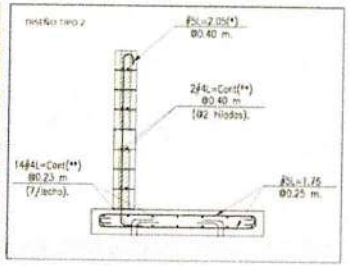





LOCALIZACION	DIMENSIONES KG/ML (m)	Long (ml)	Diametro (Ø)		UND	CAN	TOTALES ML	M2	KG
1. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) - TIPO 2 ACERO LONGITUDINAL	1.00	29.35	#4	1/2"	KG	14.00			410.90
2. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) - TIPO 2 ACERO TRANSVERSAL	1.56	1.76	#5	5/8"	KG	214.00			587.56
3. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2- (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) TIPO 2 ACERO PARA DOBELAS DE BLOQUES	1.56	2.05	#5	5/8"	KG	67.00			214.27
4. ACERO PARA MURO DE CONTENCION (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) 2-TIPO 2 TRANSVERSAL	1.00	29.35	#4	1/2"	KG	8.00			234.80
5. ACERO PARA MURO DE CONTENCION 1-TIPO 2, TRANSCERSAL	1.00	36.00	#4	1/2"	KG	8.00			288.00
6 ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA) - TIPO 2 ACERO LONGITUDINAL	1.00	21.91	#4	1/2"	KG	14.00			306.74
7. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA)-TIPO 2 ACERO TRANSVERSAL	1.56	1.76	#5	5/8"	KG	162.00			444.79
8. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA)-TIPO 2, ACERO PARA DOBELAS DE BLOQUES	1.56	2.05	#5	5/8"	KG	51.00			163.10
9. ACERO PARA MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA)-TIPO 2, TRANSVERSAL	1.00	21.91	#4	1/2"	KG	8.00			175.28
6. ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DE PLACA PARA ESCALERA DE ACCESO SENDERO ZONA CANCHA	1.00	1.10	#4	1/2"	KG	36.00			39.60
7. ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL DE PLACA ESCALERA DE ACCESO SENDERO ZONA ESCALERA	1.00	1.10	#4	1/2"	KG	12.00			13.20
8. MURO INICIO ESCALERA DE ACCESO SENDERO 1	1.56	3.80	#5	1/2"	KG	6.00			35.57
9. MURO FINAL ESCALERA DE ACCESO SENDERO 1	1.56	3.80	#5	1/2"	KG	6.00			35.57
10. ESTRIBOS MURO INICIAL Y FINAL	0.56	2.30	#3	3/8"	KG	36.00			46.37
DESCUENTO ACERO DE ZAPATA LONGITUDINAL ACTA 1									-417.60
TOTAL PRESENTE ACTA:									**2,578.13**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



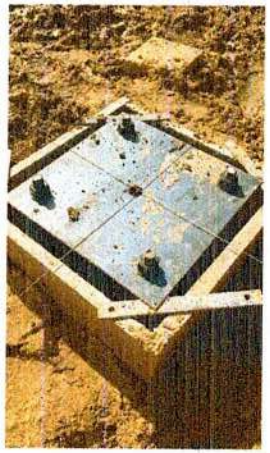

LOCALIZACION	DIMENSIONES				UND	CAN	TOTALES		
	KG/ML (m)	Long (ml)	Diametro (Ø)				ML	M2	KG
1. ACERO PARA LA ZAPATA DEL KIOSKO	1.56	1.60	#5	5/8"	KG	60.00			149.76
2. ACERO PARA PEDESTAL DE KIOSKO	1.56	1.40	#5	5/8"	KG	16.00			34.94
3. ACERO ESTIBOS PARA PEDESTALES	0.56	1.80	#3	3/8"	KG	32.00			32.26
4. ACERO PERNOS DE 3/4" PARA DE KIOSKO INCLUYE TIERCA	2.25	1.20	#6	1/2"	KG	16.00			43.20
5. ACERO PARA FLANCHES DE NIVELACION DE PEDESTALES DE KIOSKO	4.00	1.00	#6	1/2"	KG	16.00			64.00
6. ACERO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATAS DE KIOSKO	1.00	5.60	#4	1/2"	KG	16.00			89.60
7. ACERO ESTRIBOS DE VIGAS DE AMARRE DE ZAPATAS DE KIOSKO	0.56	1.80	#3	3/8"	KG	136.00			137.09
TOTAL PRESENTE ACTA:									550.85

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES KG/ML (m)	Long (ml)	Diametro (Ø)		UND	CAN	TOTALES ML	M2	KG
1. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) - TIPO 2 ACERO LONGITUDINAL	0.56	55.81	#3	3/8"	KG	10.00			312.54
2. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) - TIPO 2 ACERO TRANSVERSAL	1.00	1.21	#4	1/2"	KG	400.00			484.00
3. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2- (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) TIPO 2 ACERO PARA DOBELAS DE BLOQUES	1.00	1.45	#4	1/2"	KG	125.00			181.25
4. ACERO PARA MURO DE CONTENCION (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) 2-TIPO 2 TRANSVERSAL	1.00	29.35	#4	1/2"	KG	4.00			117.40

Cantidad contractual según	28,970.00
Acumulado anterior	2,360.25
Acumulado a presente acta	6,584.42
Obra por ejecutar	22,385.58
TOTAL PRESENTE ACTA:	1,095.19

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.07	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. ZAPATA DE MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA)	26.63	1.60	0.25				10.65
2. ZAPATA DE MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA)	19.96	1.60	0.25				7.98
3. ESCALERAS DE ACCESO SENDERO 1	1.10	3.50	0.30				1.16
4. MURO INICIO ESCALERA DE ACCESO SENDERO 1	0.60	3.50	0.40				0.84
5. MURO FINAL ESCALERA DE ACCESO SENDERO 1	0.60	3.50	0.40				0.84
						TOTAL PRESENTE ACTA:	21.47


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

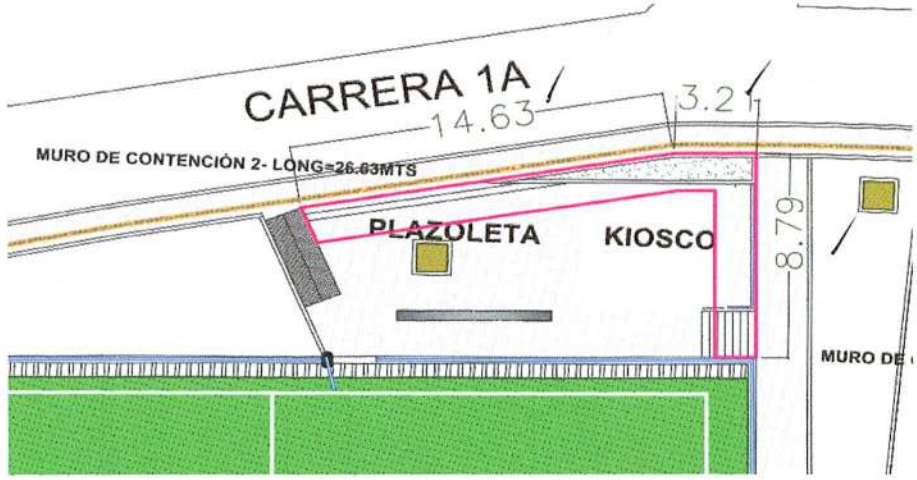

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1


PARQUE JHON JAIRO HURTADO
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

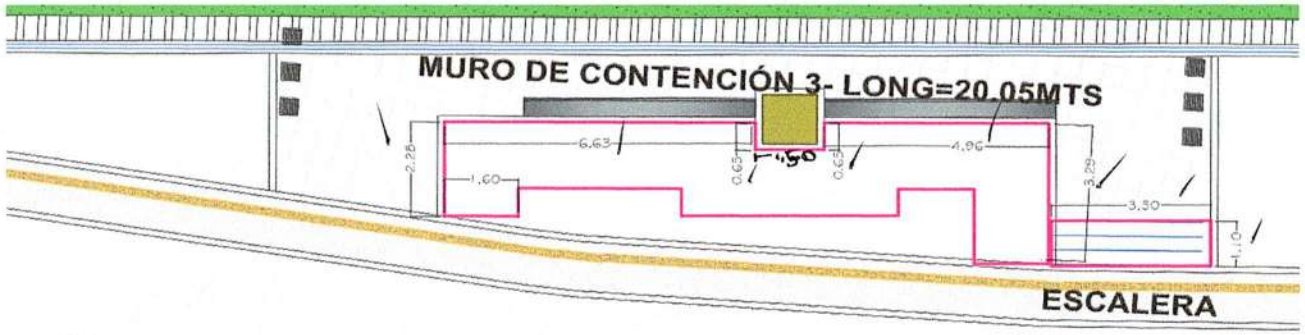

CARRERA 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	06/09/2021
		Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.



CARRERA 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025		
CAPITULO:	ESTRUCTURA / CÓDIGO DEL ITEM: 3.07	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. CONCRETO PARA ZAPATA DE KIOSKO	1.00	1.00	0.40	4.00			1.60
2. CONCRETO PARA PEDESTAL DE KIOSKO	0.50	0.50	0.80	4.00			0.80
TOTAL PRESENTE ACTA:							2.40


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

PARQUE CIUDAD MODESTO
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

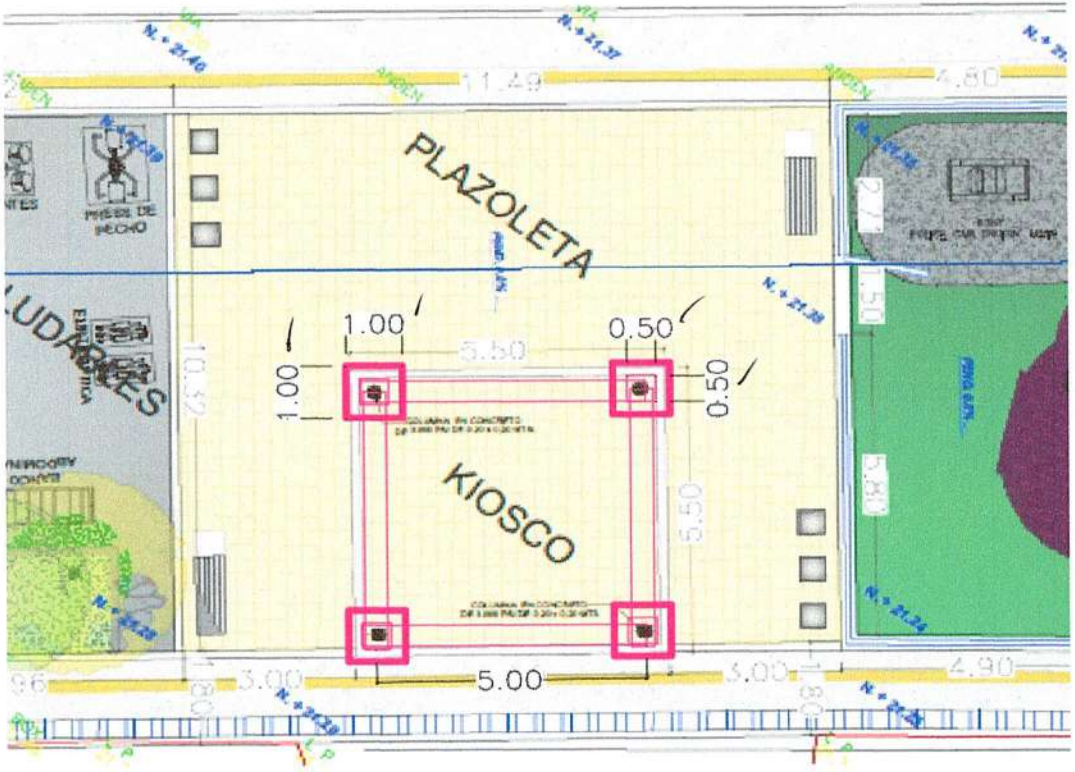

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025		
CAPITULO:	ESTRUCTURA / CÓDIGO DEL ITEM: 3.07	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. CONCRETO PARA ZAPATA MURO TIPO 1 ENTRE CALLE 42 Y CARRERA 51	50.00	1.10	0.30				16.50
Cantidad contractual según modificatoria N°2	60.00						
Acumulado anterior	15.00						
Acumulado a presente acta	55.37						
Obra por ejecutar	4.63						
TOTAL PRESENTE ACTA:							16.50


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

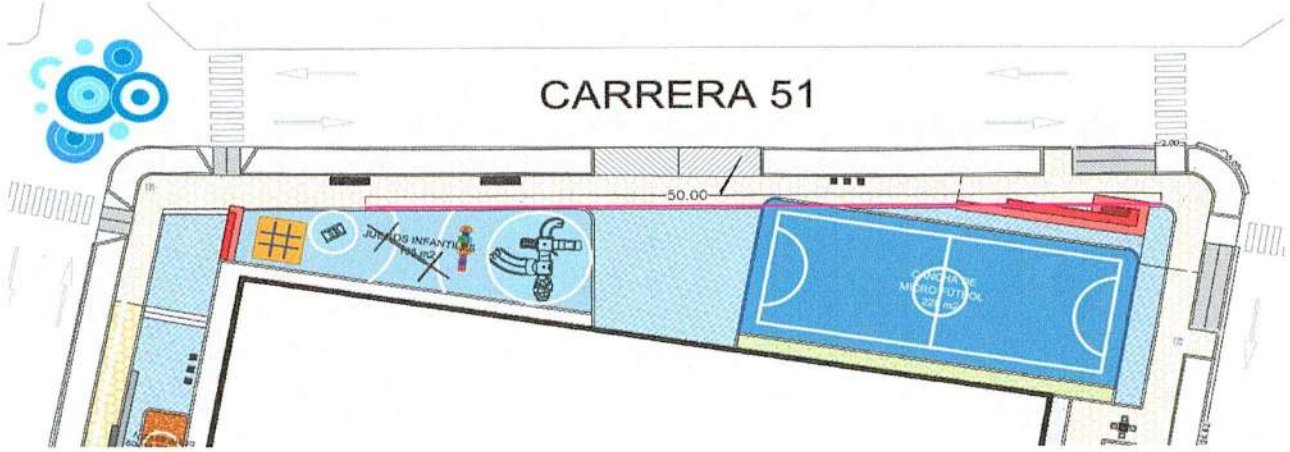

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8" , INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES UND	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES UND	M2	M3
1. VIGA DE CONFINAMIENTO ANDEN VIA PRINCIPAL	288.00			2.00	576.00		
2. VIGA DE CONFINAMIENTO ANDEN LADO DE VIVIENDAS	58.00			2.00	116.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**750.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**692.00**						
Obra por ejecutar	**58.00**						

TOTAL PRESENTE ACTA:	**692.00**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8" , INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.12	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. ZONA DE JUEGO DE NIÑOS	200.51				200.51		
2. ZONA DE BIOSALUDABLE	116.40				116.40		
5. PLAZOLETA KIOSKO	197.11				197.11		
TOTAL PRESENTE ACTA:							514.02

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4	**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025		
CAPITULO:	ESTRUCTURA — **CÓDIGO DEL ITEM:** 3.12	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. ANDEN ESTAMPADO PARTE TRASERA DE LA CANCHA SOBRE EL MURO DE CONTENCION 1	80.96				80.96		
2. PISO ESTAMPADO SENDERO 1	73.33				73.33		
3. PLACA DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	1267.78				1267.78		
4. PLACA DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES	288.61				288.61		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	13,827.00						
Acumulado anterior	0.00						
Acumulado a presente acta	2,224.69						
Obra por ejecutar	11,602.31						
TOTAL PRESENTE ACTA:							1,710.67

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	06/09/2021
		Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.

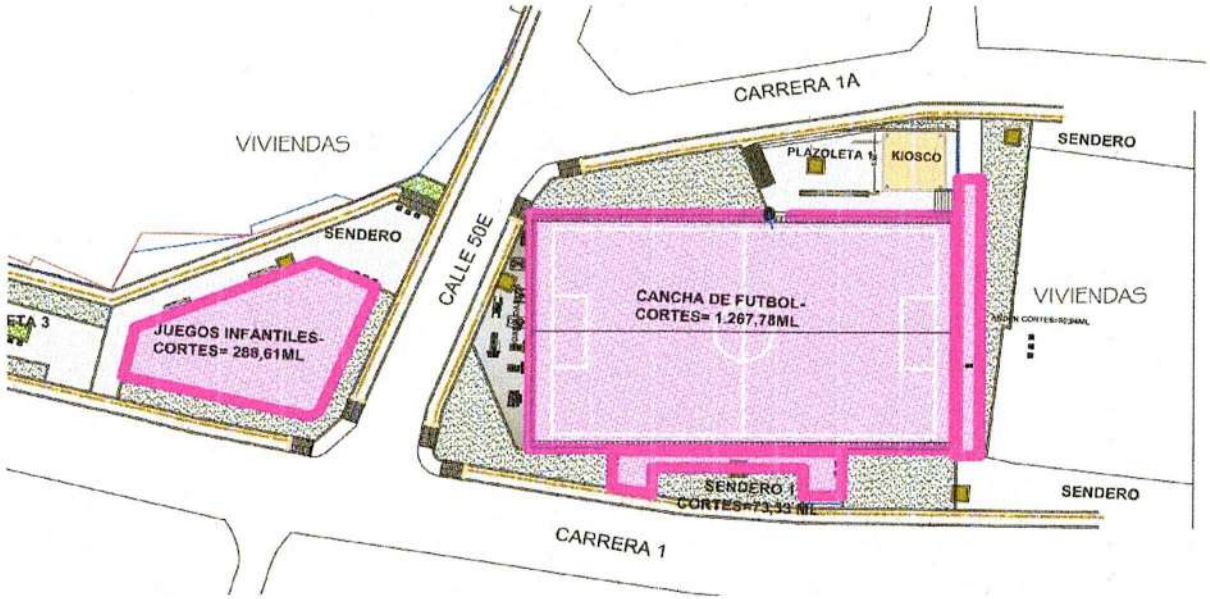

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.16	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
4. ZAPATA DE MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA)	26.63	1.60				42.61	
5. ZAPATA DE MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA)	19.96	1.60				31.94	
TOTAL PRESENTE ACTA:							74.54


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	06/09/2021
		Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

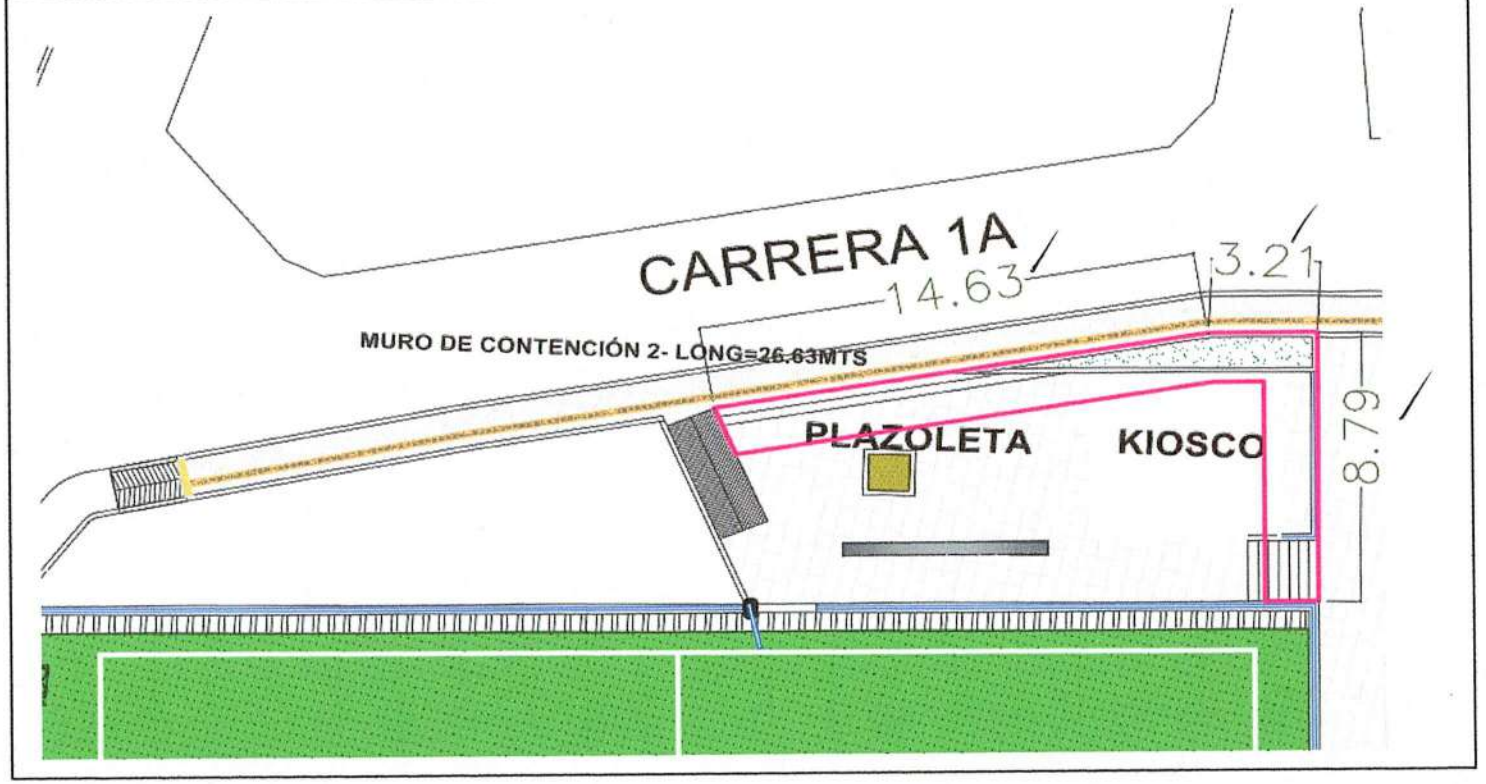

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

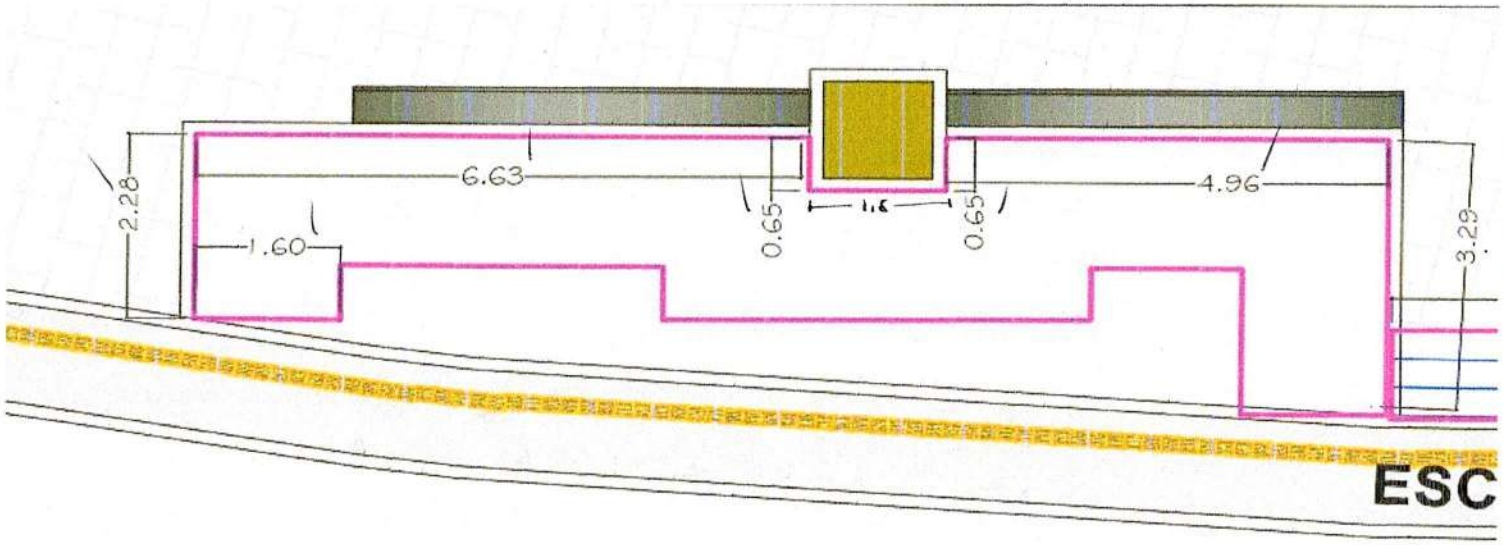

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.16	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

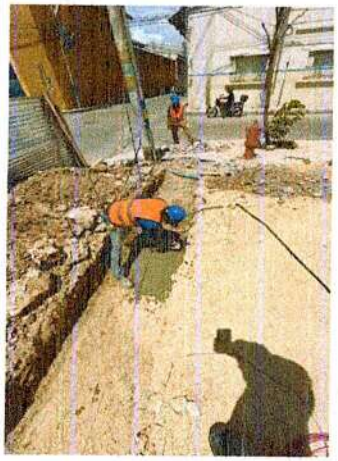



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. SOLADO PARA ZAPATA MURO TIPO 1 ENTRE CALLE 42 Y CARRERA 51	50.00	1.10				55.00	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	195.00						
Acumulado anterior	64.00						
Acumulado a presente acta	193.54						
Obra por ejecutar	1.46						
TOTAL PRESENTE ACTA:							55.00


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	06/09/2021
		Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

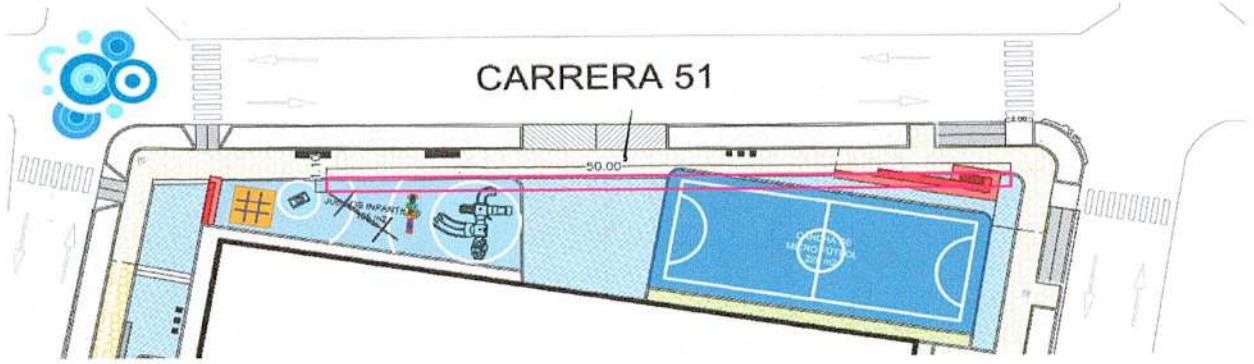

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

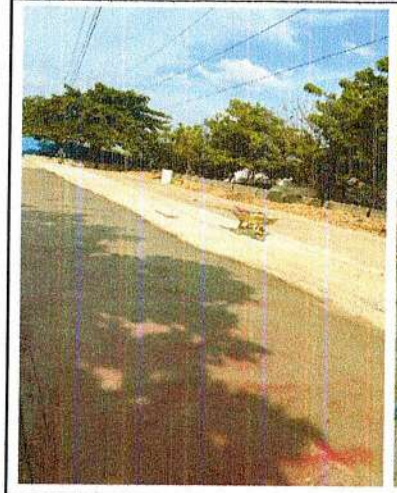

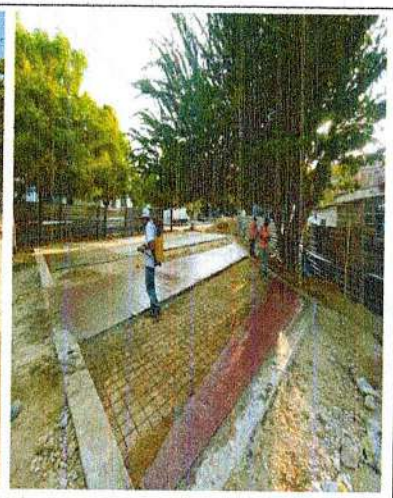


LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. PLACA DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	37.20	20.04				745.49	
2. PLACA DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES						191.74	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

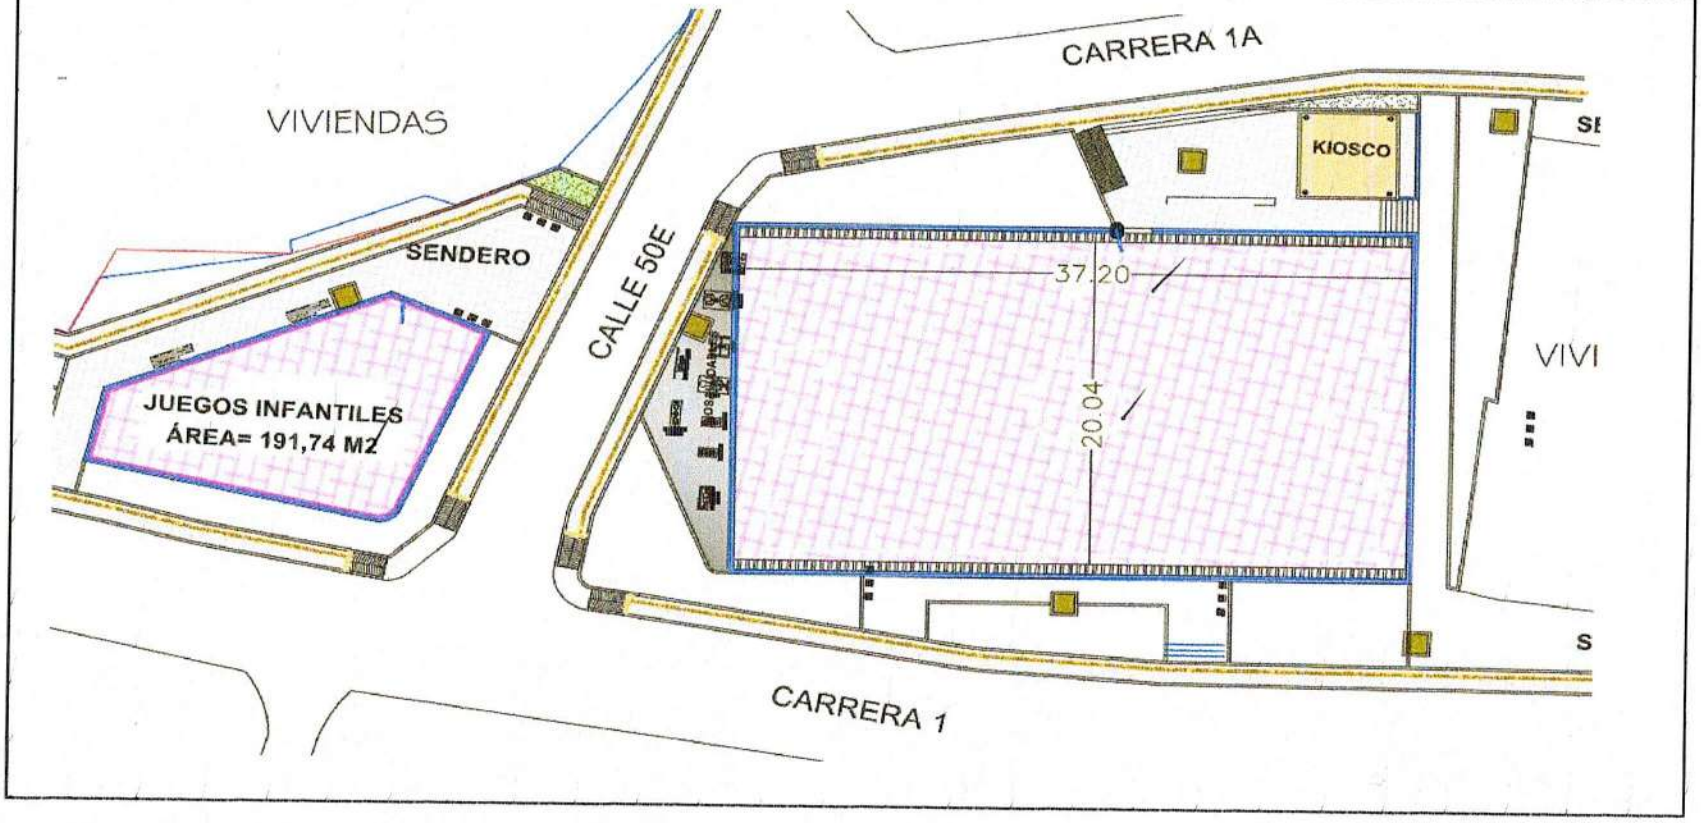

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. PLACA DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES	11.80	10.62				125.32	
2. PLACA DE BIOSALUDABLE	6.85	10.62				72.75	
3. PLACA TERRAZA DE CASA 2	9.40	2.94				27.64	
4. PLACA RAMPA ACCESO CADA 5	3.00	3.00				9.00	
5. PLACA DE ANDEN PARALELO A LA VIA 13D	36.45	1.50				54.68	
6. PLACA DE ANDEN PARALLEO A LAS VIVIENDAS	34.47	1.50				51.71	
7. PLACA DE ANDEN ENTRE BIOSALUDABLES Y JARDINERA 1	10.59	1.20				12.71	
8. PLACA DE ANDEN ENTRE JUEGO DE NIÑOS Y JARDINERA 3	9.75	1.50				14.63	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**7,743.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**1,305.64**						
Obra por ejecutar	**6,437.36**						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		**368.41**


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

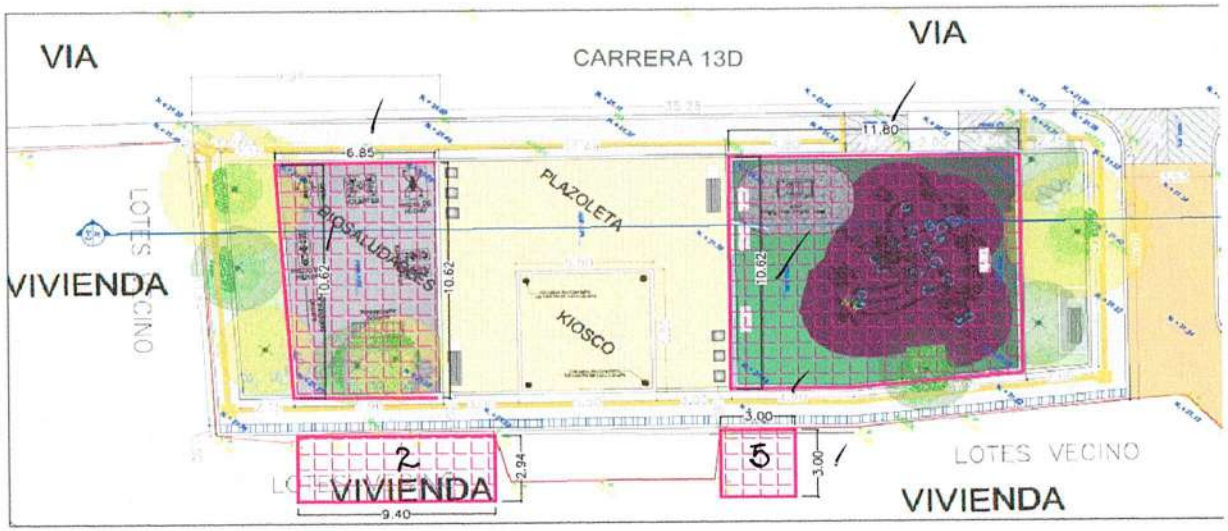

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. ANDEN ESTAMPADO PARTE TRASERA DE LA CANCHA LADO VIVIENDAS	25.30	2.00				50.60	
2. PISO ESTAMPADO SENDERO LADO CANCHA						45.83	
3. PISO ESTAMPADO PLAZOLETA Y KIOSKO, LADO CARRERA 1A						139.61	
TOTAL PRESENTE ACTA:							236.04

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD DEL ESTAMPADO DE LOS NUMERALES 2 Y 3, FUERON TOMADAS DE AUTOCAD


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

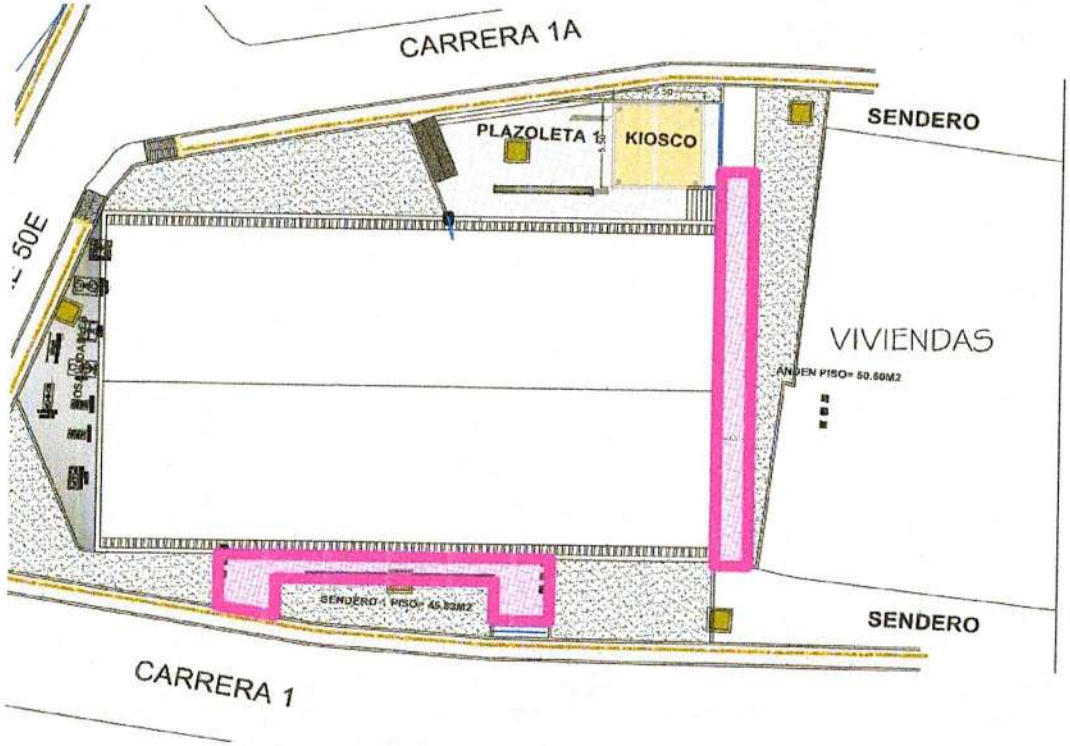

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. ANDEN ESTAMPADO PLAZOLETA DEL KIOSKO	11.65	10.62				123.72	
2, ANDEN ESTAMPADO ENTRE VÍA Y PARQUE INFANTIL	6.60	2.10				13.86	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**7,551.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**373.62**						
Obra por ejecutar	**7,177.38**						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**137.58**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

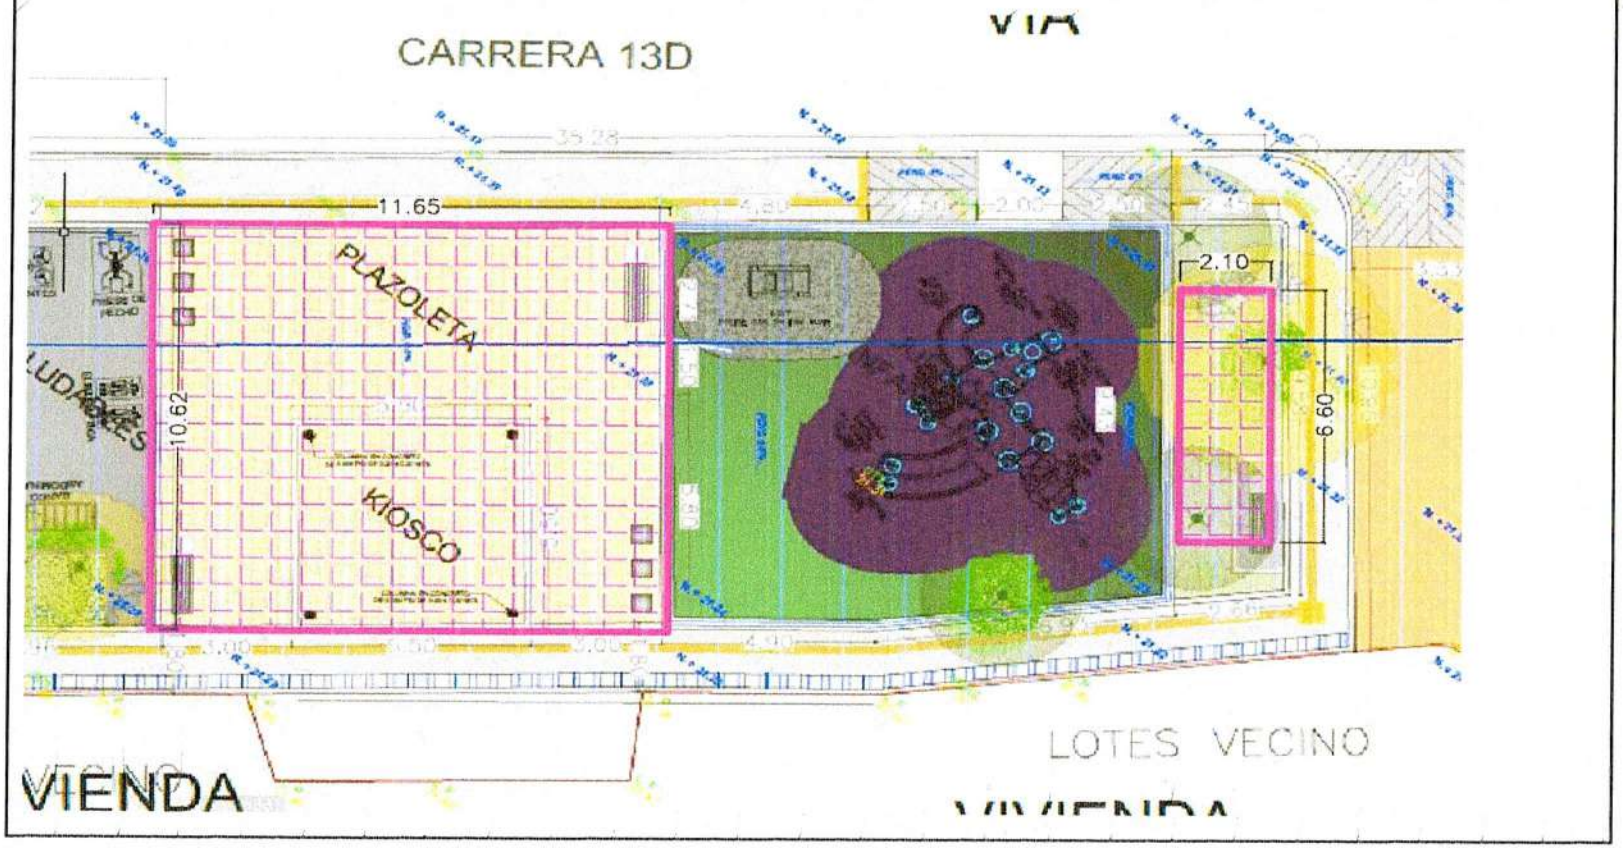

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025		
CAPITULO:	MAMPOSTERIA / CÓDIGO DEL ITEM: 4.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
2. MURO PARA ALCORQUE 1	16.10		0.80			12.88	
3. MURO PARA ALCORQUE 2	11.40		0.80			9.12	
4. MURO PARA ALCORQUE 3	16.10		0.80			12.88	
TOTAL PRESENTE ACTA:							34.88

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	4.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. LEVANTE DE MURO PARA ALCORQUE ZONA PLAZOLETA	1.50		0.80	4.00		4.80	

Cantidad contractual según modificatoria N°2	1,307.00
Acumulado anterior	88.90
Acumulado a presente acta	128.58
Obra por ejecutar	1,178.42

TOTAL PRESENTE ACTA:	4.80

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.05	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

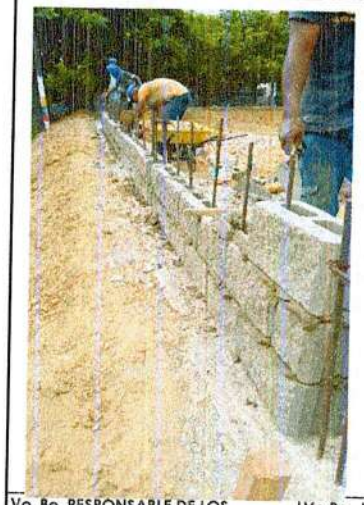

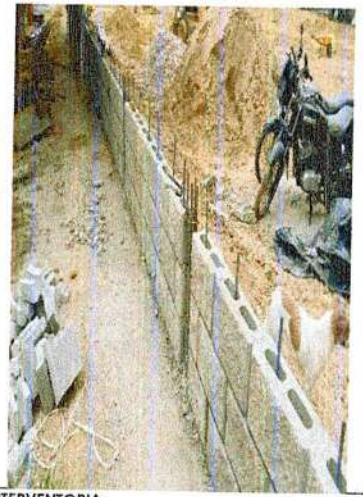

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
PAÑETE PARA APLICACIÓN DE IGOL DENSO (IMPERMEABILIZACIÓN, PARTE INTERNA)							
1. MURO DE CONTENCION 1	30.00		1.40			42.00	
2. MURO DE CONTENCION 2	26.63		1.20			31.96	
3. MURO DE CONTENCION 3	19.96		1.20			23.95	
4. LEVANTE DE ALCORQUE ZONA PLAZOLETA LADO CARRERA 1A	6.00		0.80			4.80	
TOTAL PRESENTE ACTA:							102.71


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

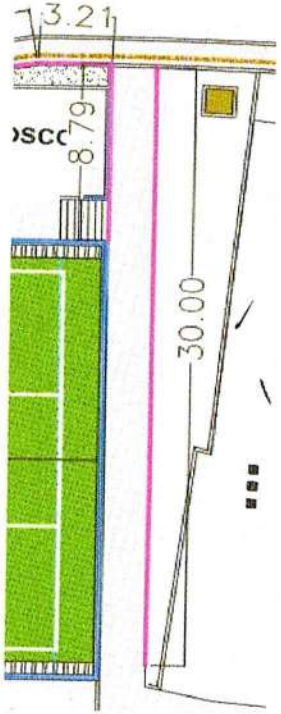

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
	Versión:	02
	Fecha:	06/09/2021
	Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4




ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

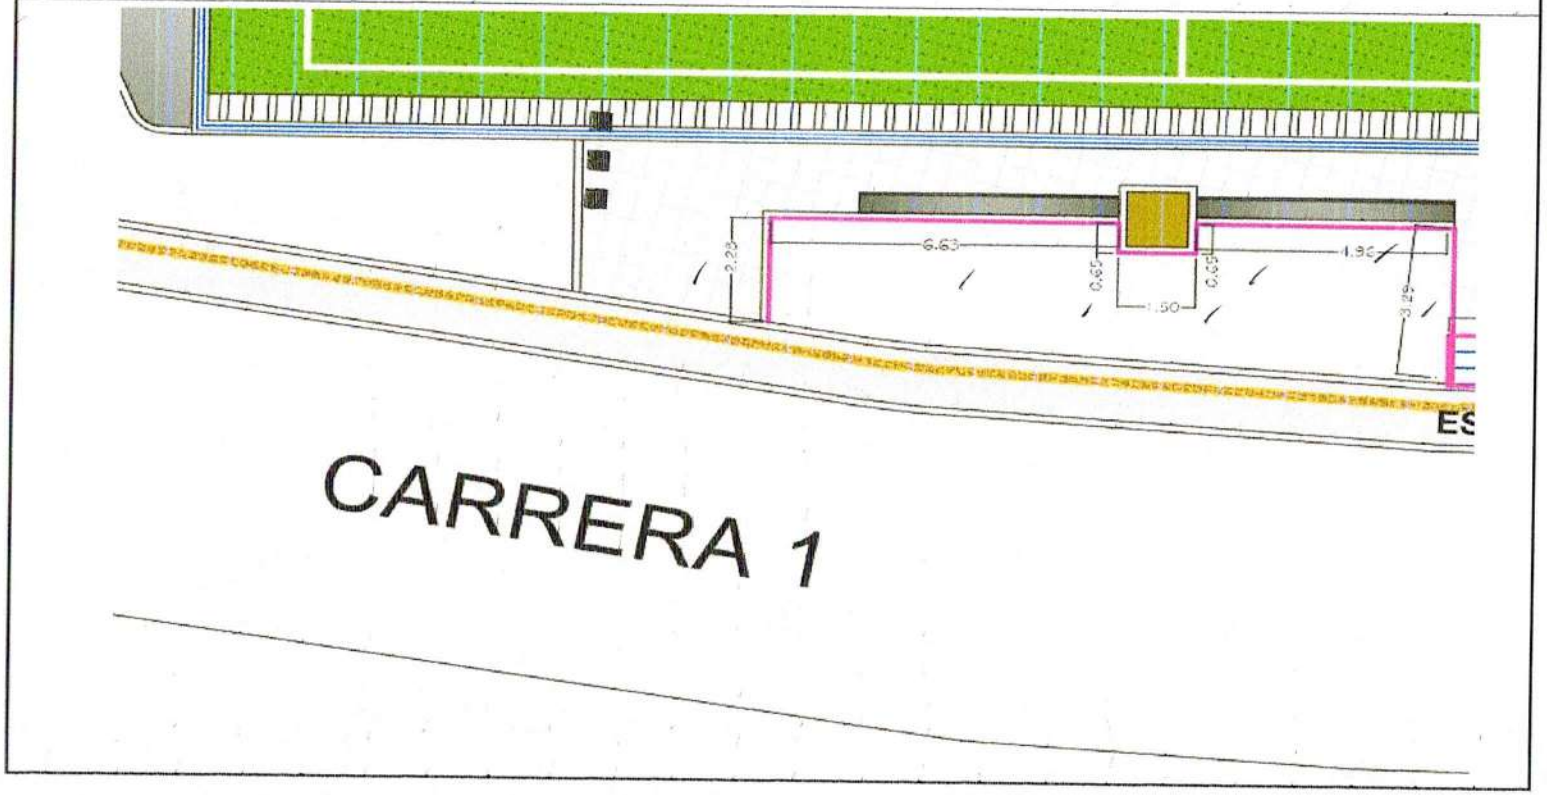

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	4.05	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
PAÑETE PARA APLICACIÓN DE IGOL DENSO (IMPERMEABILIZACIÓN, PARTE INTERNA)							
2. MURO PARA ALCORQUE 1	16.10		0.80			12.88	
3. MURO PARA ALCORQUE 2	11.40		0.80			9.12	
4. MURO PARA ALCORQUE 3	16.10		0.80			12.88	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	1,307.00						
Acumulado anterior	0.00						
Acumulado a presente acta	137.59						
Obra por ejecutar	1,169.41						
TOTAL PRESENTE ACTA:							34.88

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

PARQUE CIUDAD MODESTO
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8901025185-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERÍODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.11	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. TABLETA GUIA EN ANDEN PARALELO A LA VIA 13D	23.95				23.95		
2. TABLETA GUIA EN ANDEN PARALLEO A LAS VIVIENDAS	32.58				32.58		
3. TABLETA GUIA EN ANDEN ENTRE BIOSALUDABLES Y JARDINERA	10.9				10.90		
4. TABLETA GUIA EN ANDEN ENTRE JUEGO DE NIÑOS Y ALCORQUE 3	13.11				13.11		
5. TABLETA GUIA DE RECUADROS INTERSECCIONES TOPEROL 1	0.80			1.00	0.80		
6. TABLETA GUIA DE RECUADROS INTERSECCIONES TOPEROL 2	1.20			2.00	2.40		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**2,837.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**83.74**						
Obra por ejecutar	**2,753.26**						

TOTAL PRESENTE ACTA:	**83.74**

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. MURO DE CONTENCION 1	30.00		1.40			42.00	
2. MURO DE CONTENCION 2	26.63		1.20			31.96	
3. MURO DE CONTENCION 3	19.96		1.20			23.95	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	100.00						
Acumulado anterior	0.00						
Acumulado a presente acta	97.91						
Obra por ejecutar	2.09						

TOTAL PRESENTE ACTA:	97.91


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

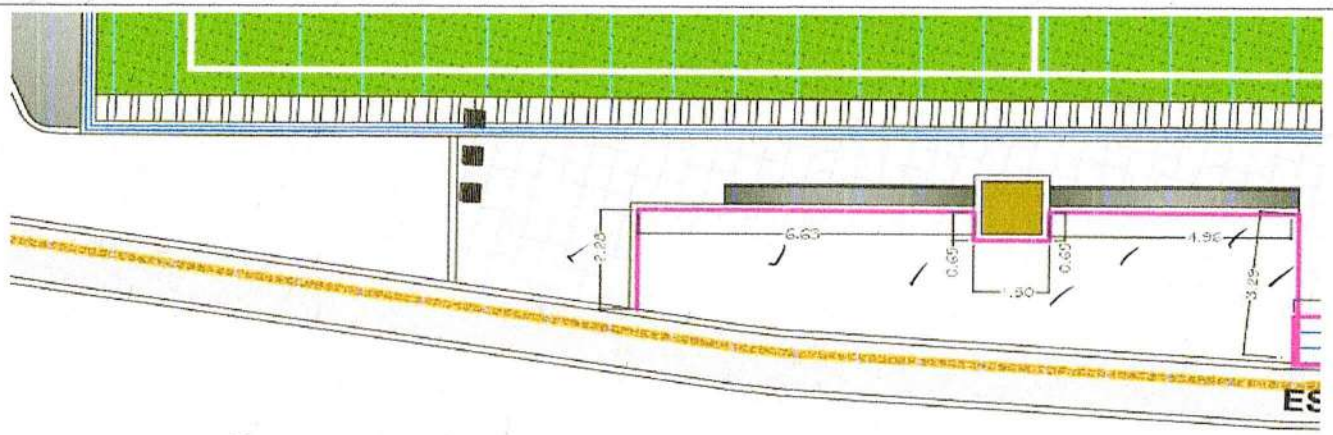

CARRERA 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO

LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON PERFIL DE 100MM X 50MM CALIBRE 14 GALVANIZADO, LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILES A CADA 1,2 METROS

PARQUE LA NORIA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO EN SUPERBOARD					211.00		

Cantidad contractual según modificatoria N°2	300.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	211.00
Obra por ejecutar	89.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	211.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON PERFIL DE 100MM X 50MM CALIBRE 14 GALVANIZADO, LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILES A CADA 1,2 METROS

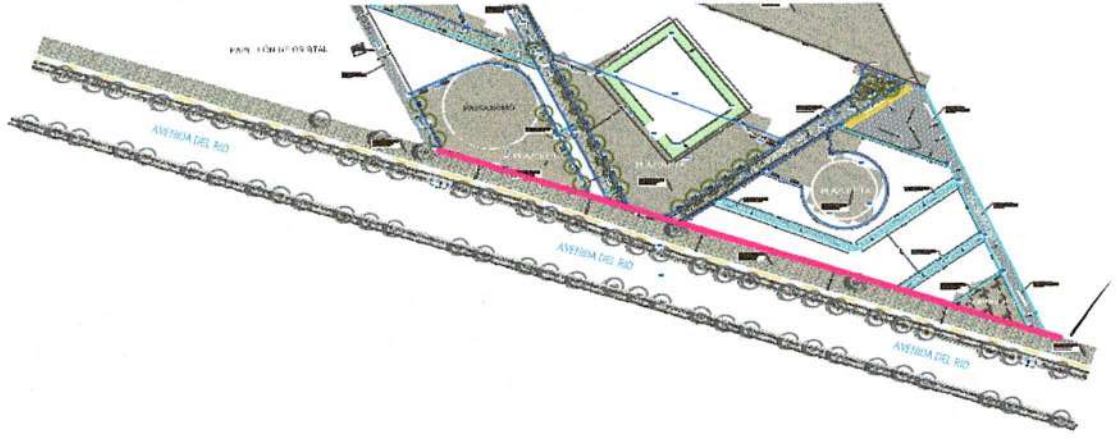

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102918-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CERRAMIENTO CON PERFIL DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE ZINC DE ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION , PERFILES A CADA 1,2 METROS

PARQUE LA NORIA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC					130.00		

Cantidad contractual según modificatoria N°2	170.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	130.00
Obra por ejecutar	40.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	130.00

100MMX50MM ZINC


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CERRAMIENTO CON PERFIL DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE ZINC DE ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION , PERFILES A CADA 1,2 METROS

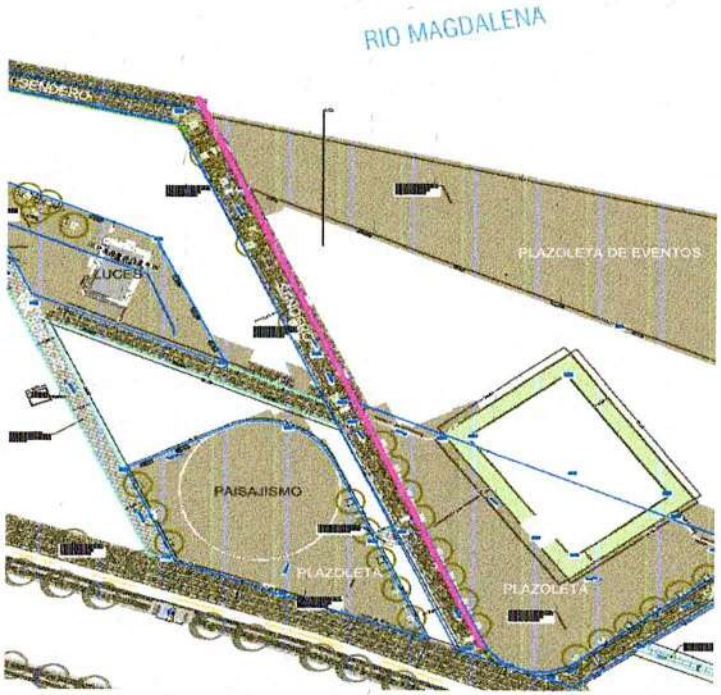

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP-6	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE LOSETAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

PARQUE LA NORIA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. DESMONTE DE LOSETAS EN SENDERO VÍA DE SERVICIO				385.20		385.20	
2. DESMONTE DE LOSETAS EN ZONA DE LUCES				364.40		364.40	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**1,484.34**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**749.60**						
Obra por ejecutar	**734.74**						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**749.60**


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA
DESMONTE DE LOSETAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

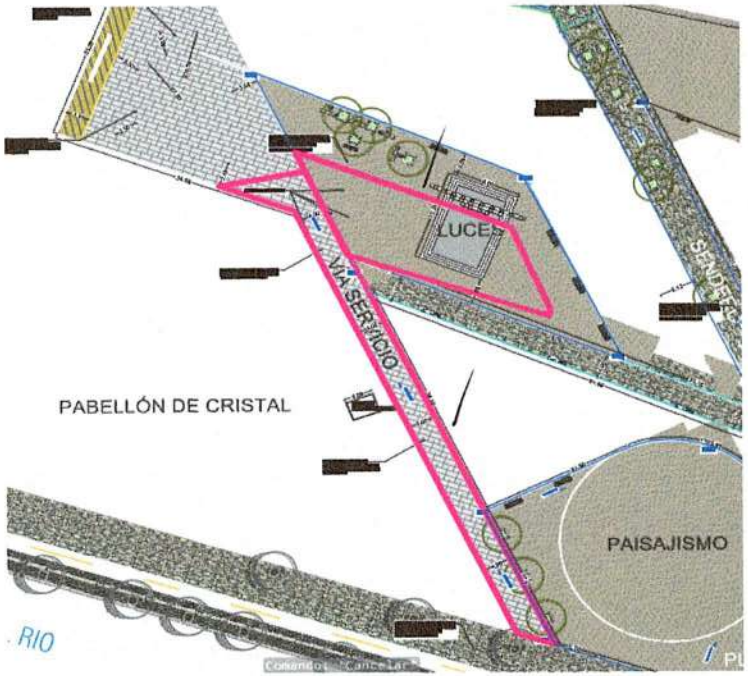

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 07/	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACION CON IGASOL

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
PAÑETE PARA APLICACIÓN DE IGOL DENSO (IMPERMEABILIZACIÓN, PARTE INTERNA)							
1. MURO DE CONTENCION 1	30.00		1.40			42.00	
2. MURO DE CONTENCION 2	26.63		1.20			31.96	
3. MURO DE CONTENCION 3	19.96		1.20			23.95	
4. ALCORQUE ZONA PLAZOLETA LADO CARRERA 1A	6.00		0.80			4.80	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
IMPERMEABILIZACION CON IGASOL




ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1


PARQUE JHON JAIRO HURTADO
IMPERMEABILIZACION CON IGASOL

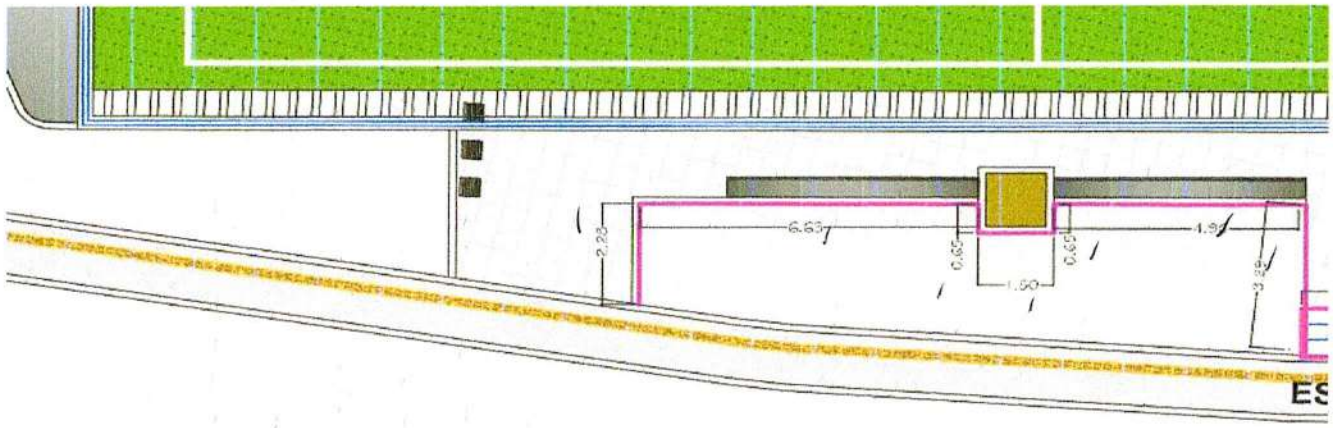

CARRERA 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
IMPERMEABILIZACION CON IGASOL

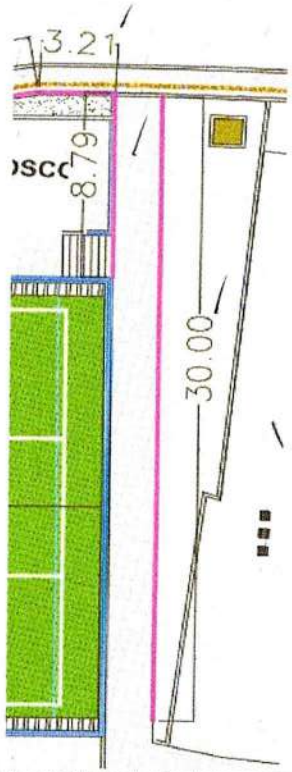

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 07	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACION CON IGASOL

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
PAÑETE PARA APLICACIÓN DE IGOL DENSO (IMPERMEABILIZACIÓN, PARTE INTERNA)							
2. MURO PARA ALCORQUE 1	16.10		0.80			12.88	
3. MURO PARA ALCORQUE 2	11.40		0.80			9.12	
4. MURO PARA ALCORQUE 3	16.10		0.80			12.88	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	220.00						
Acumulado anterior	0.00						
Acumulado a presente acta	137.59						
Obra por ejecutar	82.41						

TOTAL PRESENTE ACTA:	34.88


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
IMPERMEABILIZACION CON IGASOL

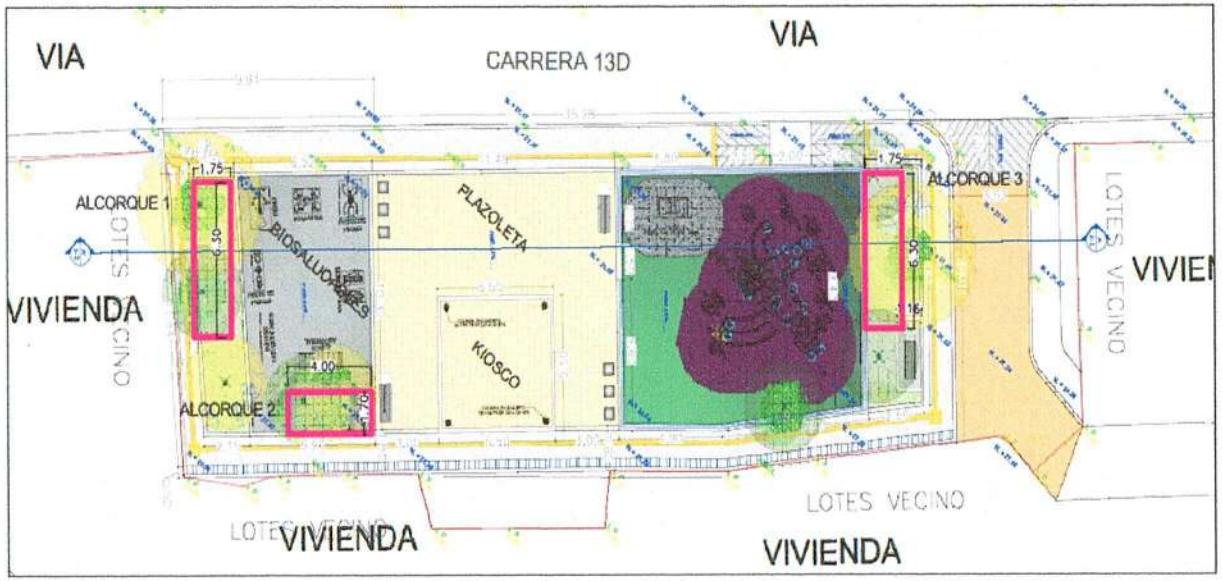

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP-08	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,2X0,2 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 METROS

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGAS CORONA MURO DE CONTENCIÓN 2 (PLAZOLETA KIOSKO)	26.63				26.63		
2. VIGAS CORONA MURO DE CONTENCIÓN 3 (LADO CANCHA)	19.96				19.96		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**170.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**46.59**						
Obra por ejecutar	**123.41**						

TOTAL PRESENTE ACTA:	**46.59**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código: IO-FM-29 Versión: 02 Fecha: 06/09/2021 Páginas: 1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO

VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,2X0,2 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 METROS




ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

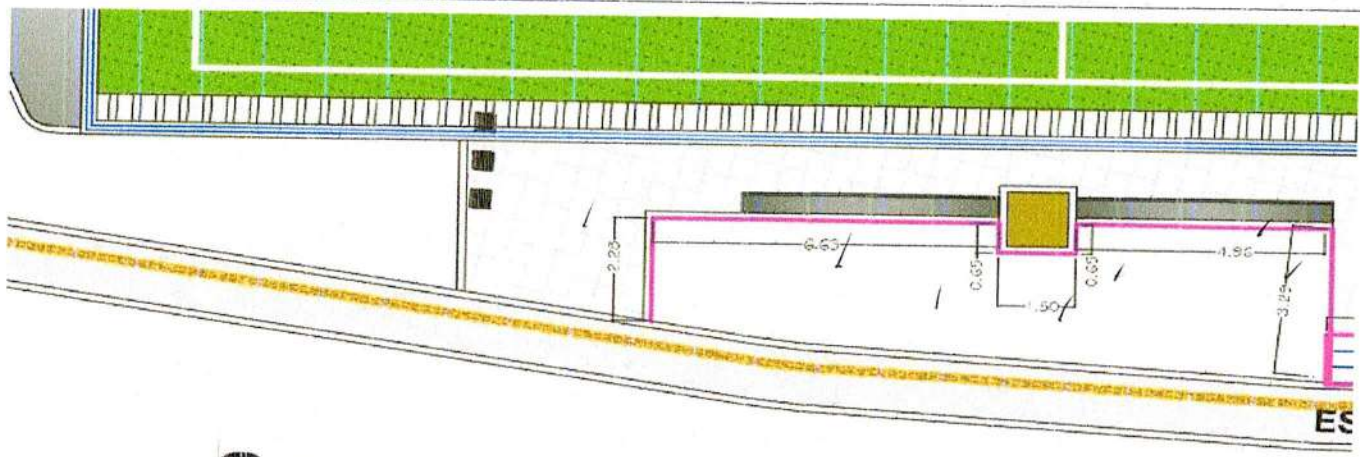

CARRERA 1

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/05/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-09	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



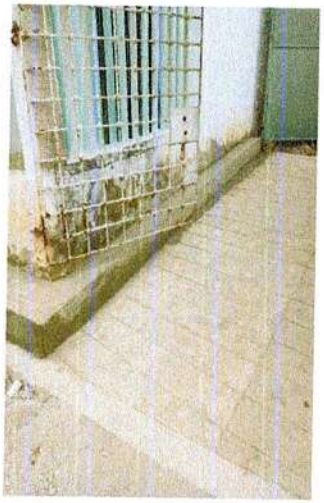


LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
2. VIGA PERIMETRAL PLAZOLETA DEL KIOSKO	44.54				44.54		
3 EXCAVACION VIGA PERIMETRAL BIOSALUDABLE	24.32				24.32		
4. VIGA PARALELA A PREDIOS	37.80				37.80		
5. VIGA PARALELA A PREDIO CONTIGUO AL PARQUE (ZONA VERDE)	28.40				28.40		
6. VIGA PERIMETRAL DE PLAZOLETA ENTRE JUEGO DE NIÑOS Y VIA DE ACCESO	15.72				15.72		
7. VIGA ENTRE JARDINE Y JUEGOS INFANTILES	11.84				11.84		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20

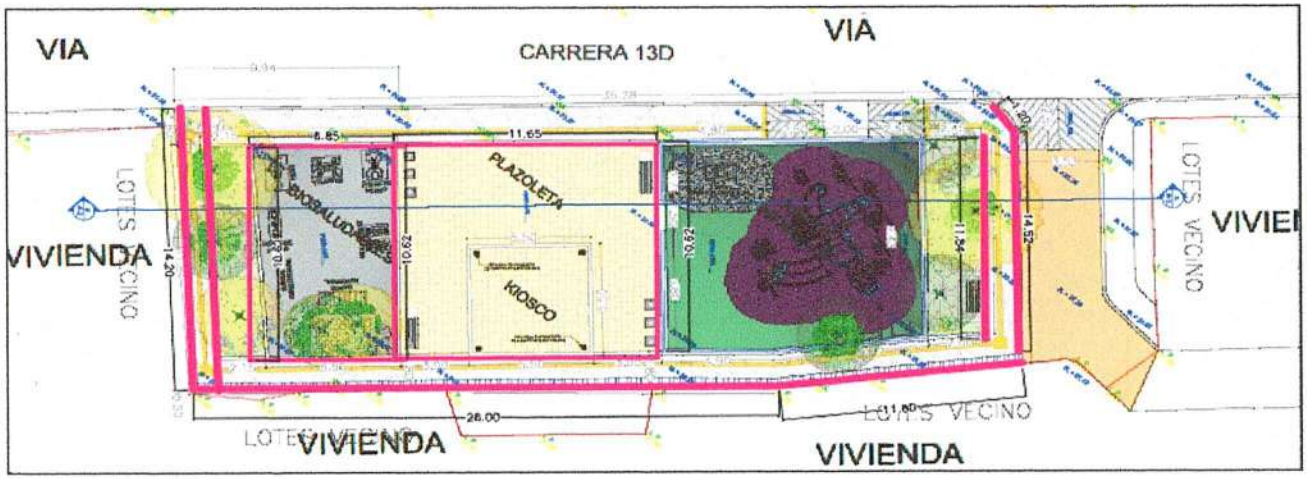

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 7 0 1 6 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP-09	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE VIGA VARIABE CANCHA DE FUTBOL	26.00				26.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**350.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**188.62**						
Obra por ejecutar	**161.38**						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**26.00**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20

