

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**CONTRATO NO.049-2025**	**109 días**	**sáb 14/06/25**	**vie 31/10/25**	**$ 500.119.900,51**
2		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12 días	sáb 14/06/25	lun 30/06/25	$ 0,00
3		**ÁREA COMEDOR**	**88 días**	**lun 30/06/25**	**lun 20/10/25**	**$ 330.091.414,52**
4		DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERUPTORES, CAJAS DE PASO,TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS,ETC)	0,5 días	lun 30/06/25	mar 1/07/25	$ 1.491.606,95
5		DEMOLICIÓN ZOCALOS Y/O MEDIAS CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE:LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA	4 días	lun 7/07/25	vie 11/07/25	$ 2.099.949,40
6		MANTENIMIENTO DE MESON + 02 BANCAS EN GRANITO NATURAL CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE ESQUINEROS LINEALES Y ZONAS AFECTADAS SOBRE EL ACABADO. RETIRO DE SELLADOR, LIMPIEZA ABRASIVA, LIMPIEZA QUÍMICA, ELEMENTO DE PULIDO/ BRILLO Y	10 días	lun 8/09/25	vie 19/09/25	$ 8.146.739,52
7		CORTE, SEPARACIÓN Y DESMONTE DE BANCA EXISTENTE EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASE DE BANCA, EQUIPO PARA DESMONTE (ANDAMIOS DE CARGA, POLEAS ETC), DIMENSIONES BANCA (3,41X0,30,0,1M)	10 días	vie 15/08/25	jue 28/08/25	$ 12.220.109,28
8		MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 6, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.)	5 días	mié 16/07/25	mar 22/07/25	$ 1.267.008,93
9		PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX.(INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	5 días	jue 24/07/25	jue 31/07/25	$ 1.413.459,31
10		SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE DINTEL EN CONCRETO DE 4000 PSI 15X20 INCLUYE ACERO	2 días	mar 22/07/25	jue 24/07/25	$ 1.460.112,12
11		VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO A LA VISTA DE F´C=4.000 PSI=28MPA, (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACERO DE REFUERZO, PREPARACIÓN, FORMALETAS, FORMAPLAC O SUPER T, ACARREO, VACIADO, ENCOFRADO,	2 días	vie 11/07/25	mar 15/07/25	$ 365.712,23
12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO (INCLUYE: SOPORTERÍA LAMINAS CIELORASO, SOPORTERIA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CIELORASO, LINEALES,DILATACIONES-VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, ACABADOS Y TODO LO	5 días	lun 4/08/25	lun 11/08/25	$ 37.066.857,88
13		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA TRES MANOS PARA MUROS FACHADAS (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES,LINEALES, EXCARIFICACION Y RESANE EN CASO DE SER NECESARIO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA	5 días	lun 11/08/25	sáb 16/08/25	$ 21.655.322,71
14		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS. Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	5 días	jue 31/07/25	mié 6/08/25	$ 7.716.776,87
15		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SIKA IMPERMUR SOBRE MORTERO Y/O SIMILAR BARRERA HUMEDAD (INCLUYE: LINEALES, FILOS, DILATACIONES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	5 días	mié 6/08/25	mié 13/08/25	$ 11.743.365,90
16		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES. Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIONDE LA	5 días	sáb 16/08/25	vie 22/08/25	$ 35.076.996,29
17		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST EN FACHADA (INCLUYE: RELLENO MARMOLINA O SIMILAR-LINEALES	3 días	mié 6/08/25	lun 11/08/25	$ 279.344,06
18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO REF. 8025 CON VIDRIO 5MM PELÍCULA REFLECTIVA U OPALIZADA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. (INCLUYE: DESMONTE DE LAS VENTANAS	20 días	mié 24/09/25	lun 20/10/25	$ 15.711.252,57
19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO PESADO TUBOLITE, COLOR (ESTIPULADO POR EL USUARIO) Y VIDRIO 5MM (INCLUYE: DESMONTE PUERTA, RESANE VANO, ACABADO VANO, ANCLAJES, FIJACIONES, CUERPO INFERIOR TABLERO EN ALUMINIO TIPO MEDIA CAÑA, CUERPO SUPERIOR EN	20 días	mié 24/09/25	lun 20/10/25	$ 12.422.352,09
20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA DE PARED ACERO INOX 304, CALIBRE 18 DE 2.30 X0.35M EMPOTRADA A PARED, INCLUYE DESMONTE DE REPISA EXISTENTE, ACCESORIOS, PIEDEAMIGOS INTEGRADOS A PARED , SALPICADERO, TORNILLERÍA DE ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE	20 días	mié 24/09/25	lun 20/10/25	$ 9.546.960,38
21		SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO (INCLUYE: DILATADORES CONTRA MUROS Y PISO,DESTRONQUE, PULIDA Y	15 días	mié 16/07/25	lun 4/08/25	$ 8.948.264,61
22		DESTRONQUE,REEMBOQUILLADO, PULIDO,DIAMANTADO Y BRILLADO DE BALDOSA EN GRANITO, INCLUYE SELLANTE HIDROFUGO REPELENTE A ATAQUES QUÍMICOS Y ORGÁNICOS.	5 días	mié 24/09/25	mié 1/10/25	$ 25.175.656,81
23		REINSTALACION DE LAMPARAS DESMONTADAS (INCLUYE: SOPORTERIA LUMINARIA,FIJACION, CABLE, CONEXIONES, ALINECION Y TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PERFECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	2 días	vie 22/08/25	mar 26/08/25	$ 2.564.950,02
24		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA ELÉCTRICA INDIVIDUAL DESDE EL TABLERO HASTA EL PUNTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE 220V, INCLUYENDO CABLEADO 2#8 AWG (FASES) + 1#10 AWG (TIERRA) EN COBRE CON AISLAMIENTO THHN/THWN-2 90°C, TERMINALES	2 días	mar 22/07/25	jue 24/07/25	$ 515.025,81
25		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO SUSPENDIDO EN PARED / TECHO, INCLUYENDO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR CON SOPORTES DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE EN COBRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO (LONGITUD ESTÁNDAR DE FÁBRICA	10 días	jue 7/08/25	mié 20/08/25	$ 6.401.889,35
26		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 90°C COBRE, INCLUYE TUBERÍA IMC CONDUIT DE 1/2 PULGADA, , CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS EMT DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS PARA	2 días	jue 24/07/25	lun 28/07/25	$ 8.382.174,89
27		DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAÑETES, LINEALES, DINTELES, VIGA,CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL	3 días	mié 16/07/25	sáb 19/07/25	$ 244.758,61
28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O SIMILAR EN MUROS (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS,	4 días	mié 6/08/25	mar 12/08/25	$ 4.725.058,00
29		MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 6, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.)	2 días	mié 13/08/25	vie 15/08/25	$ 1.072.301,94

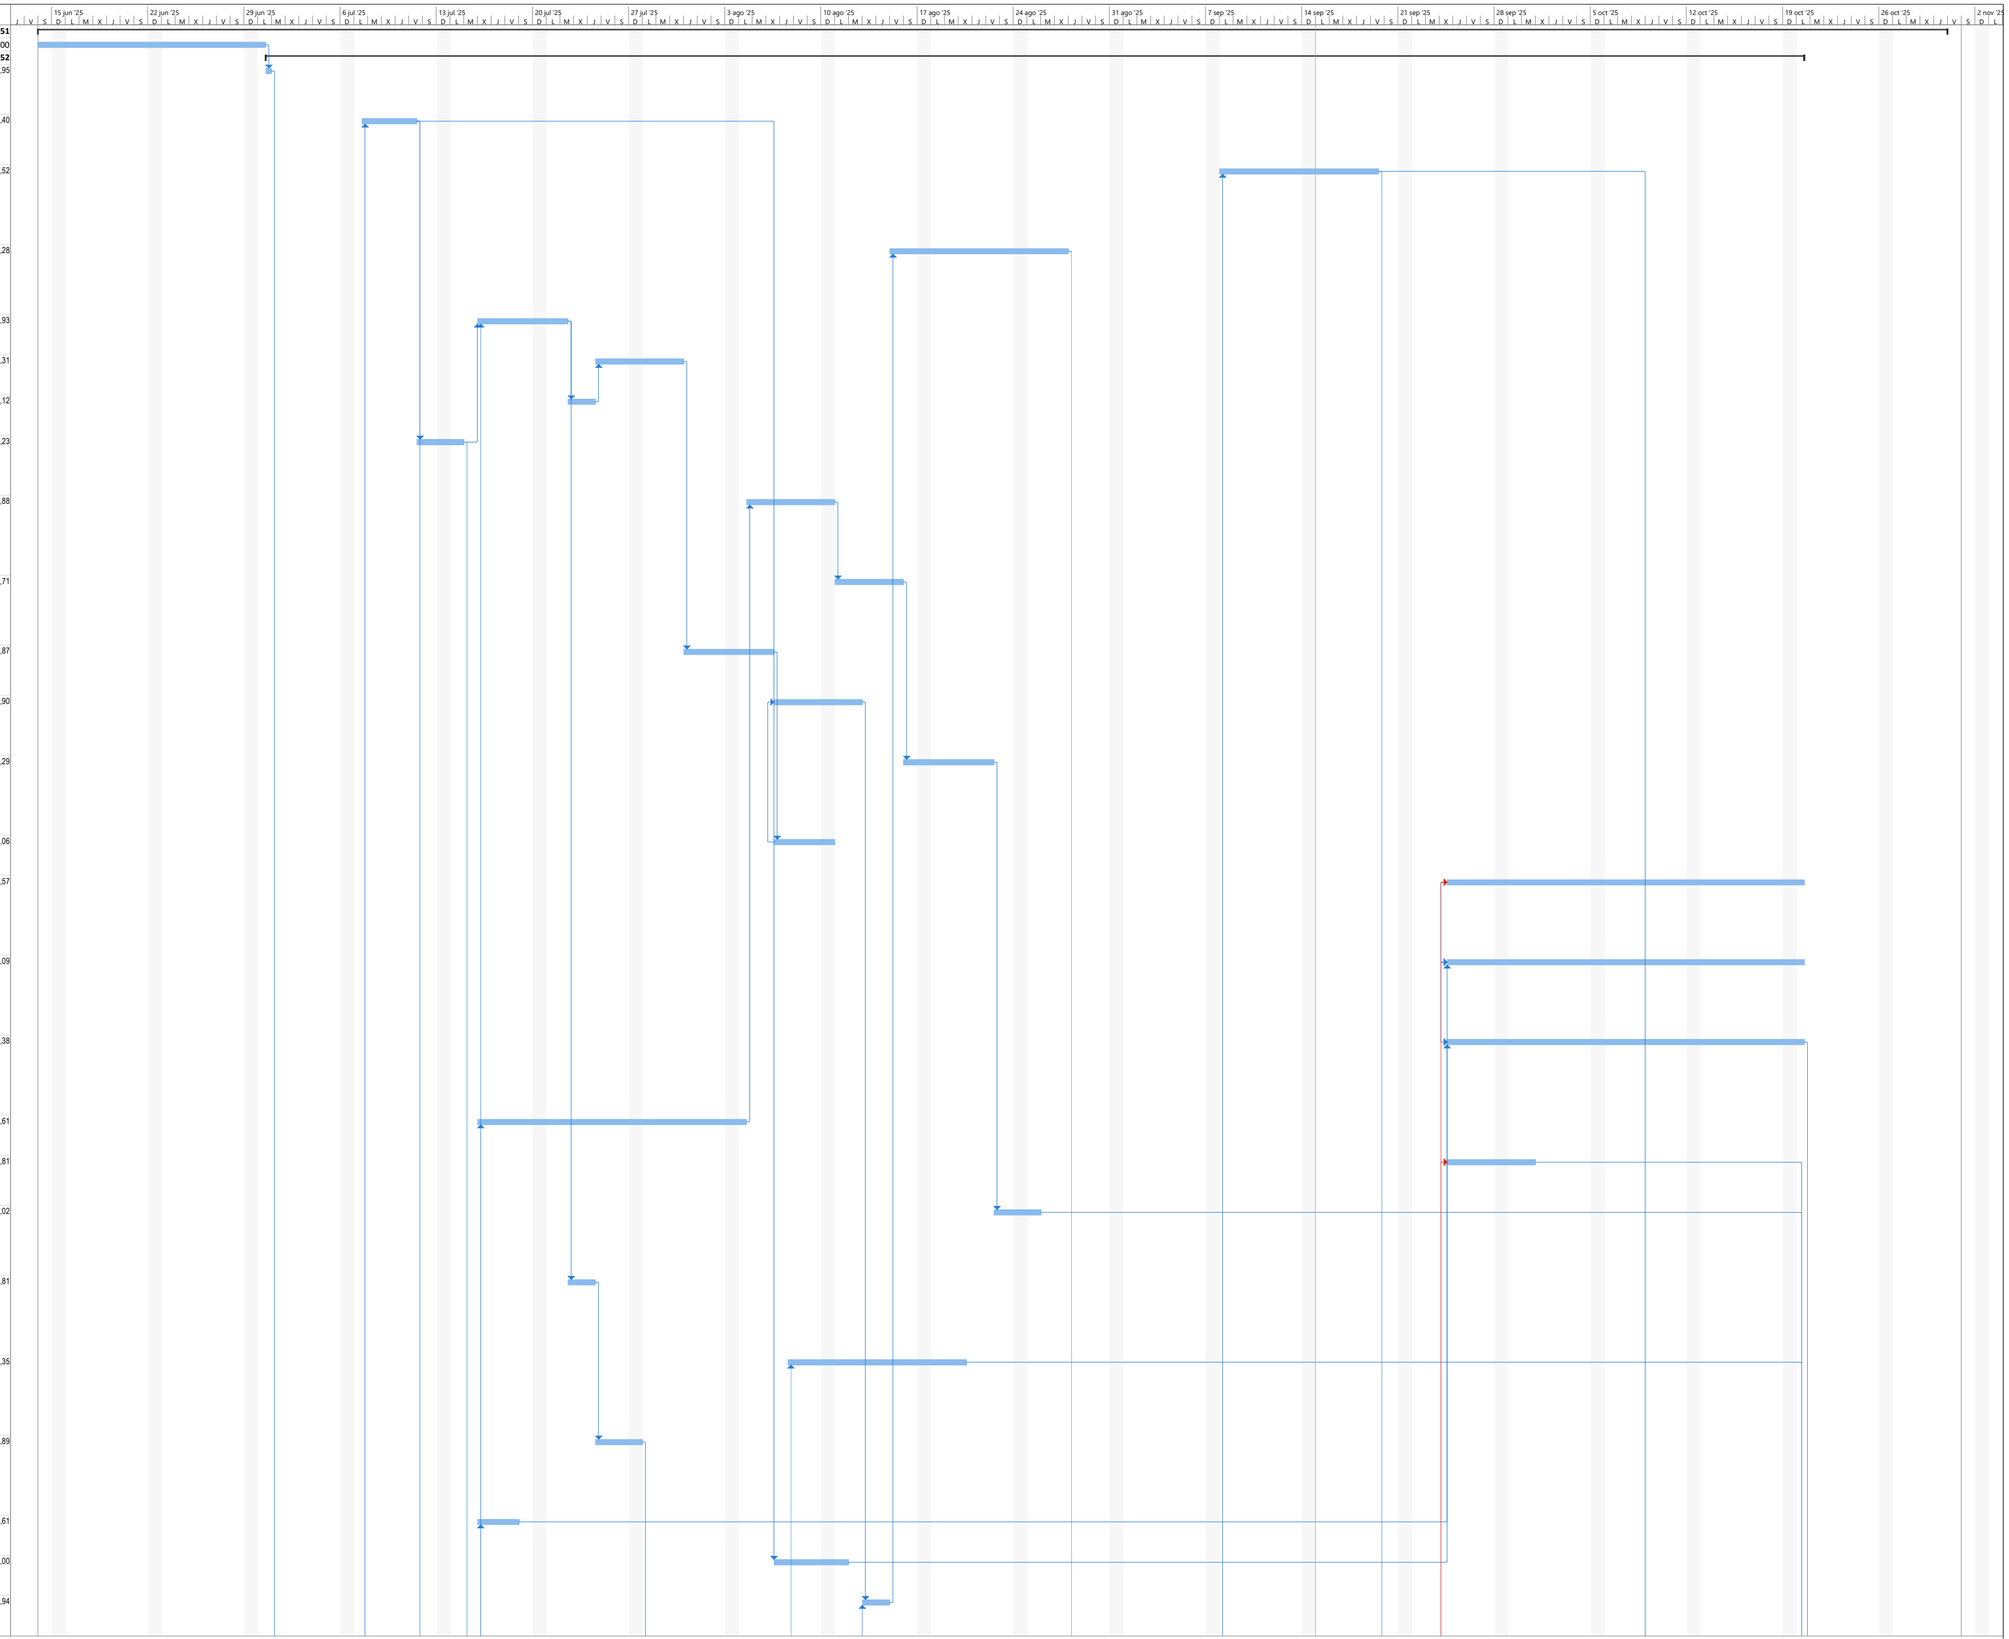

Proyecto: PROGRAMACIÓN JUL
Fecha: lun 15/09/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
30		RELLENO DE ZANJAS (ZOCALOS) CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 H: 0,1 MTS APROX.(INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	3 días	vie 11/07/25	mié 16/07/25	$ 2.834.227,95
31		CORTE DE MURO. INCLUYE:TODO LO REQUERIDO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	$ 362.710,14
32		BANCA EN CONCRETO, REFUERZO DE LA ESTRUCTURA, ACABADO, ASEO Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	15 días	vie 19/09/25	jue 9/10/25	$ 10.463.959,72
33		RESANE DE PISO CON GRANITO (DEMOLICION Y CORTE DE BASE BANCAS). INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA	5 días	jue 9/10/25	mié 15/10/25	$ 2.073.135,53
34		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN CERCHAS EN MADERA (11 UND) CONSISTENTE EN LA FUMIGACIÓN E INMUNIZACIÓN LIQUIDA CORRECTIVA Y PREVENTIVA, CON EFECTO RESIDUAL POR MEDIO DE BOMBA ASPERSORA MANUAL PARA FUMIGACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	$ 10.874.026,05
35		COSTRUCCION DE DADOS DE SOPORTE PARA BANCAS EN CONCRETO DE 0.30 de ancho x 0.40 de largo x 0.35 altura (INCLUYE, ACERO DE REFUERZO, ANCLAJE Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	8 días	jue 28/08/25	lun 8/09/25	$ 5.656.481,71
36		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON DIMENSIONES DE 1000 X 800 X 400 MM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD). FABRICADO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP54, ACABADO EN	2 días	mar 5/08/25	jue 7/08/25	$ 16.242.330,36
37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SCH 40 DE 1½" PARA ALIMENTACIÓN DE COMPRESORES DE AIRES ACONDICIONADOS	2 días	lun 28/07/25	mié 30/07/25	$ 3.392.559,78
38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30 X 30 CM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO	2 días	mié 30/07/25	vie 1/08/25	$ 379.849,49
39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON UNA VARILLA CU - CU 5/8"X8', INCLUYE CABLEADO CU N. 2 AWG, CONECTOR EN COBRE, TUBERÍA PVC Y CONEXIÓN.	1 día	vie 1/08/25	sáb 2/08/25	$ 602.655,71
40		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTAS EN SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA HASTA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN CABLE TRENZADO CALIBRE	2 días	sáb 2/08/25	mar 5/08/25	$ 39.495.471,55
41		**FIN ÁREA COMEDOR**	**0 días**	**lun 20/10/25**	**lun 20/10/25**	**$ 0,00**
42		**ZONA LAVADO DE MENAJE**	**59 días**	**sáb 14/06/25**	**jue 28/08/25**	**$ 38.129.690,14**
43		ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES,VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS , RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDOPARA LA CORECTA EJECUCION DE LA	8 días	sáb 14/06/25	mié 25/06/25	$ 1.295.261,51
44		ANULACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERÍA, HERRAJES, PEGANTE, LIMPIADOR, CORTES, REGATAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SUEJECUCION Y	2 días	sáb 14/06/25	mar 17/06/25	$ 190.939,21
45		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE LAVADO DE MENAJE (INCLUYE POYOS O SOBRENIVELES RELLENOS EXISTENTES, RELLENO, LINEALES, ZOCALOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ENCHAPE DEPARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE, ASEO	2 días	sáb 14/06/25	mar 17/06/25	$ 318.232,01
46		DEMOLICION PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	1 día	mar 17/06/25	mié 18/06/25	$ 392.061,84
47		DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE,ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	3 días	mié 18/06/25	lun 23/06/25	$ 641.555,74
48		CORTE DE PLANTILLA DE PISO (EN DOS ARISTAS) PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA. INCLUYE:TODO LO REQUERIDO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	2 días	lun 23/06/25	mié 25/06/25	$ 496.441,94
49		EXCAVACIÓN MANUAL.INCLUYE:RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEESCOMBROS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA	1 día	mié 25/06/25	jue 26/06/25	$ 366.603,28
50		SUMINISTRO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO DE CANTERA COMPACTADO AL 90% (RECEBO) (INCLUYE: COLOCACION MATERIAL EN OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y COMPACTACION)	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 916.508,20
51		SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 3/4" PVC DE 21 (INCLUYE: REGATAS, RESANE, PASANTES, ACCESORIOS, EMPATES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	2 días	mar 8/07/25	jue 10/07/25	$ 410.896,67
52		SUMINISTRO E INSTALACION RED TUBERÍA HIDRAÚLICA 1/2" PVC RDE 21 (INCLUYE: REGATAS, RESANE, PASNTES,ACCESORIOS, EMPATES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU PUESTA	2 días	jue 10/07/25	sáb 12/07/25	$ 205.448,33
53		SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA SANITARIA (03" PVC (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	2 días	jue 10/07/25	sáb 12/07/25	$ 1.457.499,49
54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" EN PVC PRESION RDE 21. INCLUYE: TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PRESION,PEGANTES Y LIMPIADOR, REGATAS EN MUROS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	2 días	sáb 12/07/25	mar 15/07/25	$ 274.952,46
55		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON ANTICUCARACHA 5 PULG X 4 PULG ALUMINIO, PARA TUBERIA DE 4 PULG, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	2 días	mar 29/07/25	jue 31/07/25	$ 328.415,44
56		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" METALICO TIPOTOYO O SIMILAR. INLCUYE: ACCESORIOS, TAPAS EN PVC Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA	2 días	jue 31/07/25	lun 4/08/25	$ 82.740,32
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE JARDIN EXTENSIÓN SATINADAGRIVAL PESADA REF.380430001 O SIMILAR	1 día	lun 4/08/25	mar 5/08/25	$ 222.762,41
58		PUNTO SANITARIO/ VENTILACIÓN 2" (INCLUYE: PASANTE, TUBERÍAY ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	$ 477.348,02
59		SONDEO Y LIMPIEZA EN REDES SANITARIAS EMPLEANDO SONDA ACERADA (INCLUYE EL RETIRO DE RESIDUOS EN LA RED ASI COMO EL	3 días	lun 23/06/25	jue 26/06/25	$ 636.464,03
60		PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES,JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARALA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	3 días	mar 8/07/25	vie 11/07/25	$ 1.407.992,08

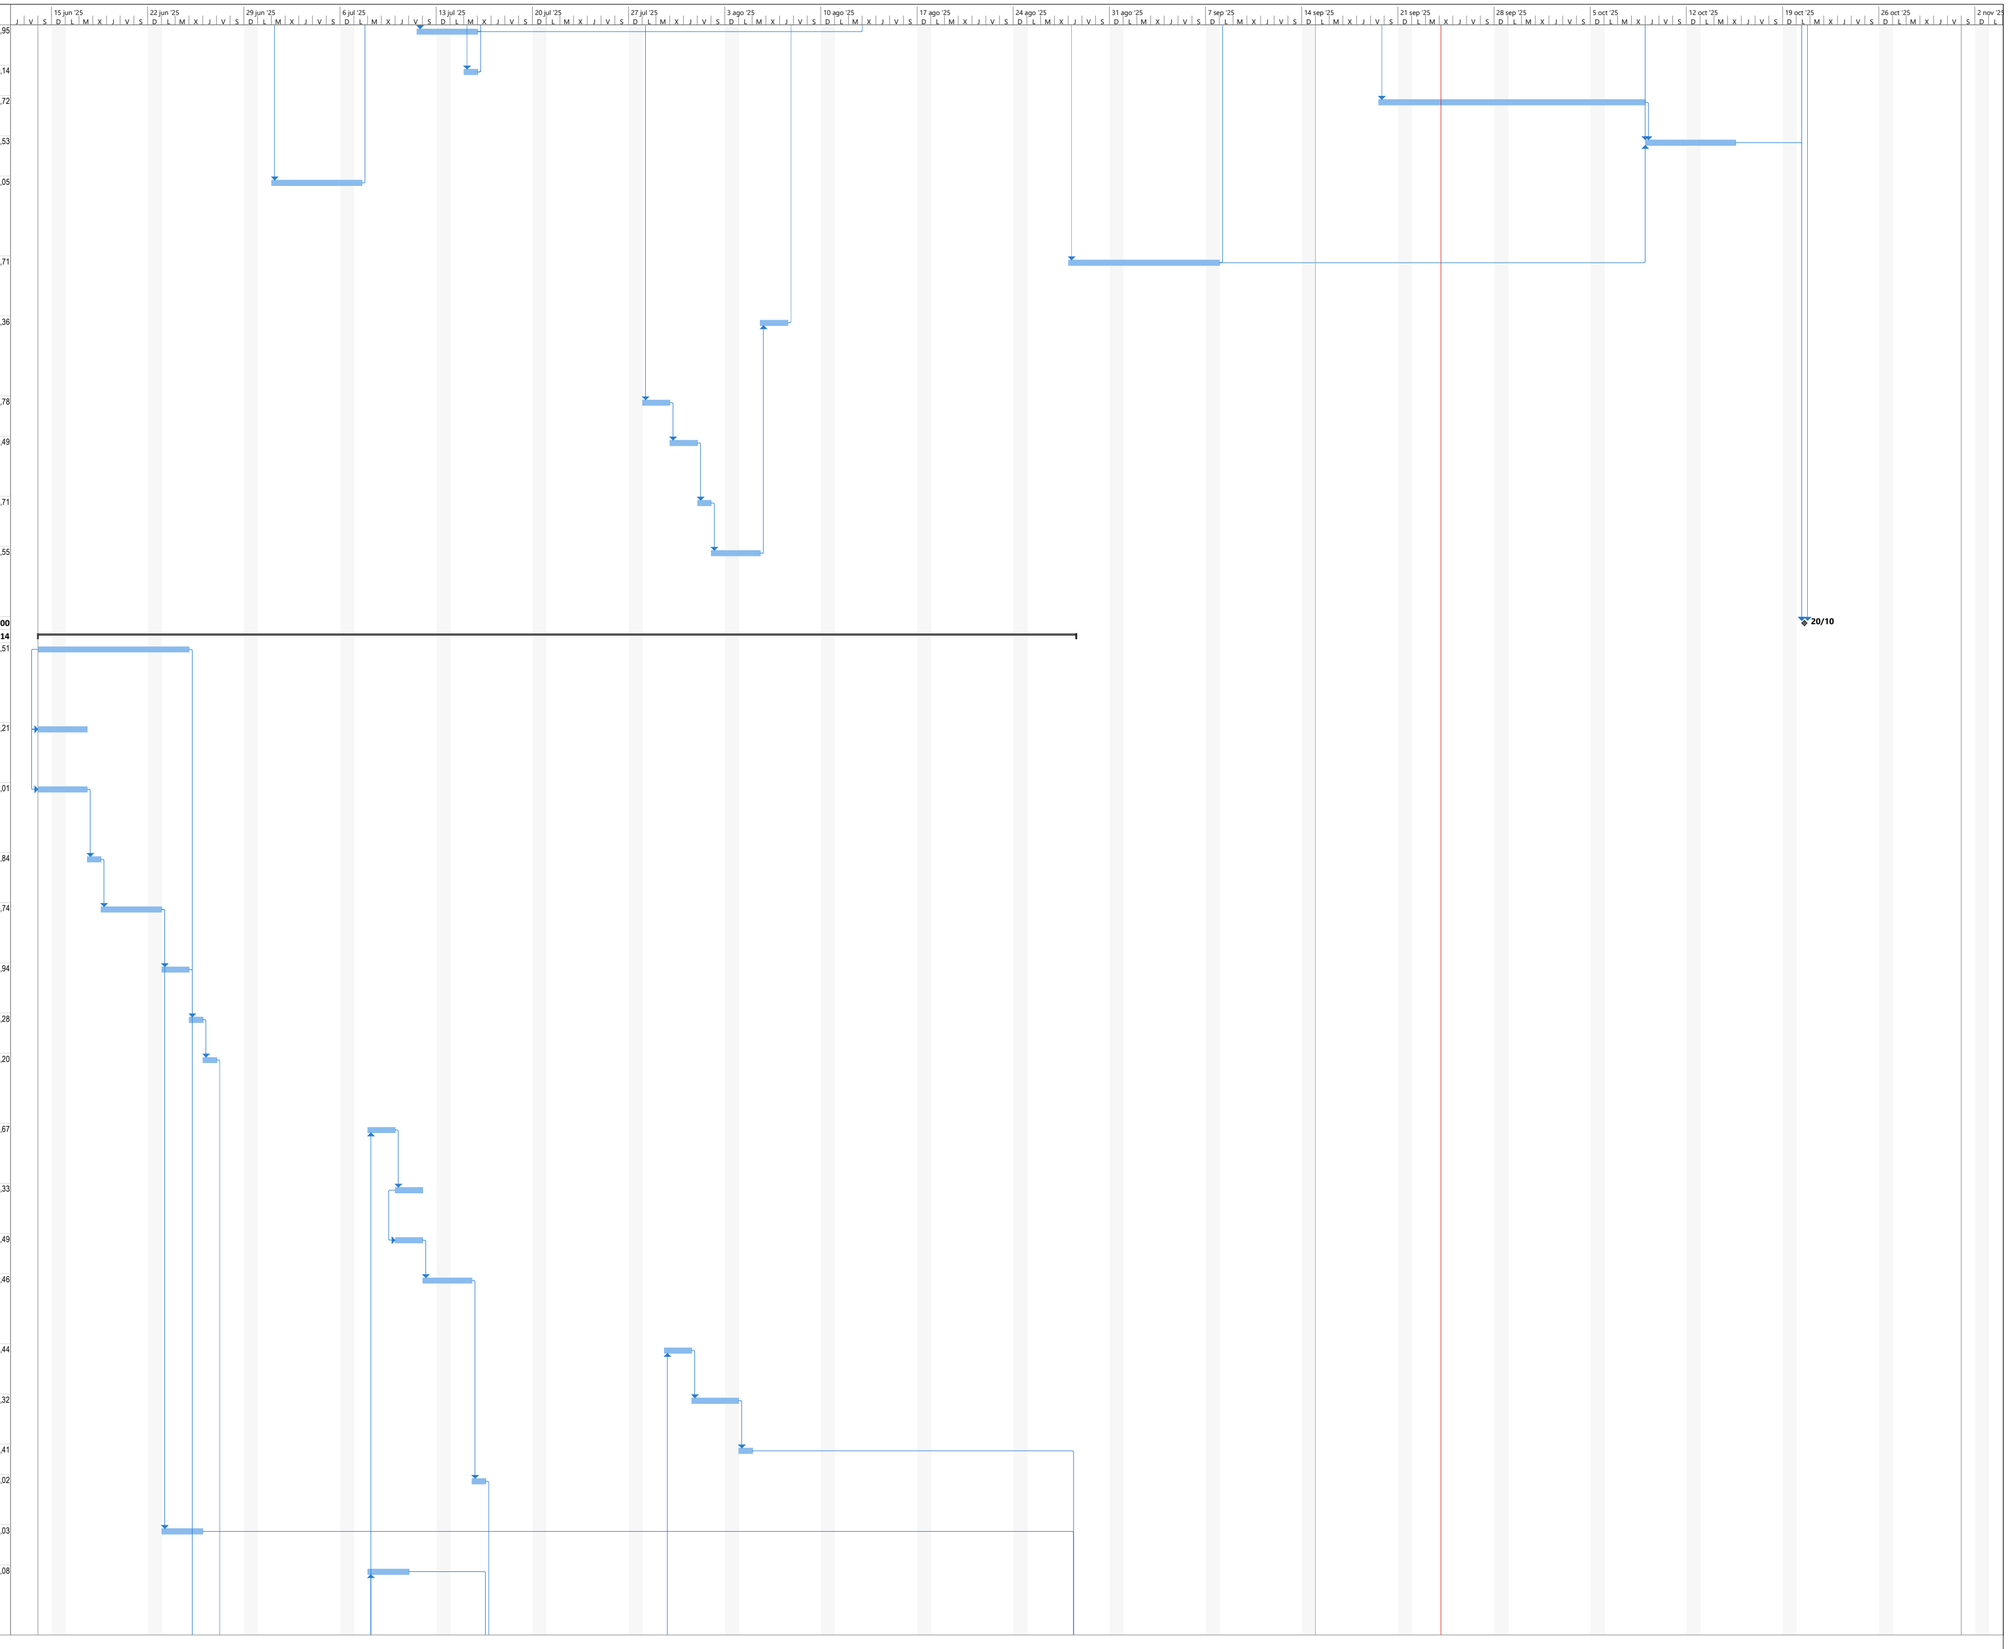


Proyecto: PROGRAMACIÓN AJU
Fecha: lun 15/09/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
61		MANTENIMIENTO Y RECUPERACION PISO TABLÓN DE GRES Y CHINALAVADA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (INCLUYE:APLICACION EN LA SUPERFICIE CON PRODUCTO ALFA O SIMILAR EN UNA DILUCION 1:5 EN AGUA CON TRAPERO O MOPA Y/O BARRIDO CON ACPM, ACERRIN Y MOPA.	15 días	mar 8/07/25	sáb 26/07/25	$ 13.910.875,96
62		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO GRES INDUSTRIAL SISTEMA INTEGRAL-LOSETA SAHARA COD. 225008701 O SIMILAR, (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS DE CHINA LAVADA, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA	10 días	sáb 26/07/25	vie 8/08/25	$ 1.654.806,47
63		POCETA EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN LADRILLO TOLETE COMÚN COLOCADO DE CANTO 0,60M DE ALTURA, CON MORTERO 1:3 DIMESIÓN (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTAS,PAÑETE,ESTUCO PLÁSTICO, IMPERMIBEALIZACIÓN Y OTDO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA	8 días	vie 27/06/25	mar 8/07/25	$ 1.265.538,31
64		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O SIMILAR EN MUROS (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS,	8 días	mié 16/07/25	sáb 26/07/25	$ 1.729.794,66
65		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILOS CON WIN O VENA DE ALUMINIO	2 días	sáb 26/07/25	mar 29/07/25	$ 161.458,19
66		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST EN FACHADA (INCLUYE: RELLENO MARMOLINA O SIMILAR-LINEALES	10 días	vie 8/08/25	jue 21/08/25	$ 4.031.140,35
67		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA TRES MANOS PARA MUROS FACHADAS (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES,LINEALES, EXCARIFICACION Y RESANE EN CASO DE SER NECESARIO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA	6 días	jue 21/08/25	jue 28/08/25	$ 1.937.822,90
68		PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX.(INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	10 días	mié 25/06/25	mar 8/07/25	$ 3.316.130,32
69		**FIN ZONA LAVADO DE MENAJE**	**0 días**	**jue 28/08/25**	**jue 28/08/25**	**$ 0,00**
70		**ALOJAMIENTOS PERSONAL DE COCINA BIM12**	**105 días**	**sáb 14/06/25**	**lun 27/10/25**	**$ 71.530.197,91**
71		ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES,VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDOPARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	3 días	lun 23/06/25	jue 26/06/25	$ 1.442.125,65
72		DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAÑETES, LINEALES, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL	2 días	sáb 14/06/25	mar 17/06/25	$ 279.891,42
73		DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE,ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	4 días	mar 17/06/25	lun 23/06/25	$ 2.446.160,38
74		DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA	4 días	mar 17/06/25	lun 23/06/25	$ 1.494.875,78
75		DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS,ETC)	0,5 días	lun 23/06/25	lun 23/06/25	$ 159.116,01
76		MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 6, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.)	1,5 días	vie 27/06/25	lun 30/06/25	$ 1.274.582,86
77		PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX.(INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	4 días	lun 30/06/25	vie 4/07/25	$ 4.420.420,86
78		SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE DINTEL EN CONCRETO DE 4000 PSI 15X20 INCLUYE ACERO	1 día	vie 27/06/25	lun 30/06/25	$ 155.806,39
79		VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO A LA VISTA DE F´C=4.000 PSI=28MPA, (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACERO DE REFUERZO, PREPARACIÓN, FORMALETAS, FORMAPLAC O SUPER T, ACARREO, VACIADO, ENCOFRADO.	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 118.318,66
80		POYO EN CONCRETO DE 4.000 PSI 0,01 M3/ML PARA LAVATRAPERO (INCLUYE REFUERZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN, FORMALETAS, ACARREO, VACIADO,	0,5 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	$ 66.192,26
81		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO REF. 8025 CON VIDRIO 5MM PELÍCULA REFLECTIVA U OPALIZADA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. (INCLUYE: DESMONTE DE LAS VENTANAS	25 días	mié 24/09/25	lun 27/10/25	$ 1.218.405,65
82		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO PESADO TUBOLITE, COLOR (ESTIPULADO POR EL USUARIO) Y VIDRIO 5MM (INCLUYE: DESMONTE PUERTA, RESANE VANO, ACABADO VANO, ANCLAJES, FIJACIONES, CUERPO INFERIOR TABLERO EN ALUMINIO TIPO MEDIA CAÑA, CUERPO SUPERIOR EN	25 días	mié 24/09/25	lun 27/10/25	$ 2.415.457,35
83		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA TRES MANOS PARA MUROS FACHADAS (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES,LINEALES, EXCARIFICACION Y RESANE EN CASO DE SER NECESARIO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA	3 días	mar 23/09/25	vie 26/09/25	$ 1.038.325,23
84		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	5 días	lun 15/09/25	sáb 20/09/25	$ 1.932.686,66
85		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SIKA IMPERMUR SOBRE MORTERO Y/O SIMILAR BARRERA HUMEDAD (INCLUYE: LINEALES, FILOS, DILATACIONES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	5 días	lun 30/06/25	lun 7/07/25	$ 9.387.335,20
86		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIONDE LA	3 días	vie 4/07/25	mié 9/07/25	$ 1.822.247,42
87		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO (INCLUYE: SOPORTERÍA LAMINAS CIELORASO, SOPORTERIA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CIELORASO, LINEALES,DILATACIONES-VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, ACABADOS Y TODO LO	3 días	lun 15/09/25	jue 18/09/25	$ 5.123.326,96
88		PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES,JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	2 días	lun 30/06/25	mié 2/07/25	$ 4.416.678,46
89		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO)	5 días	mié 2/07/25	mié 9/07/25	$ 6.286.462,44

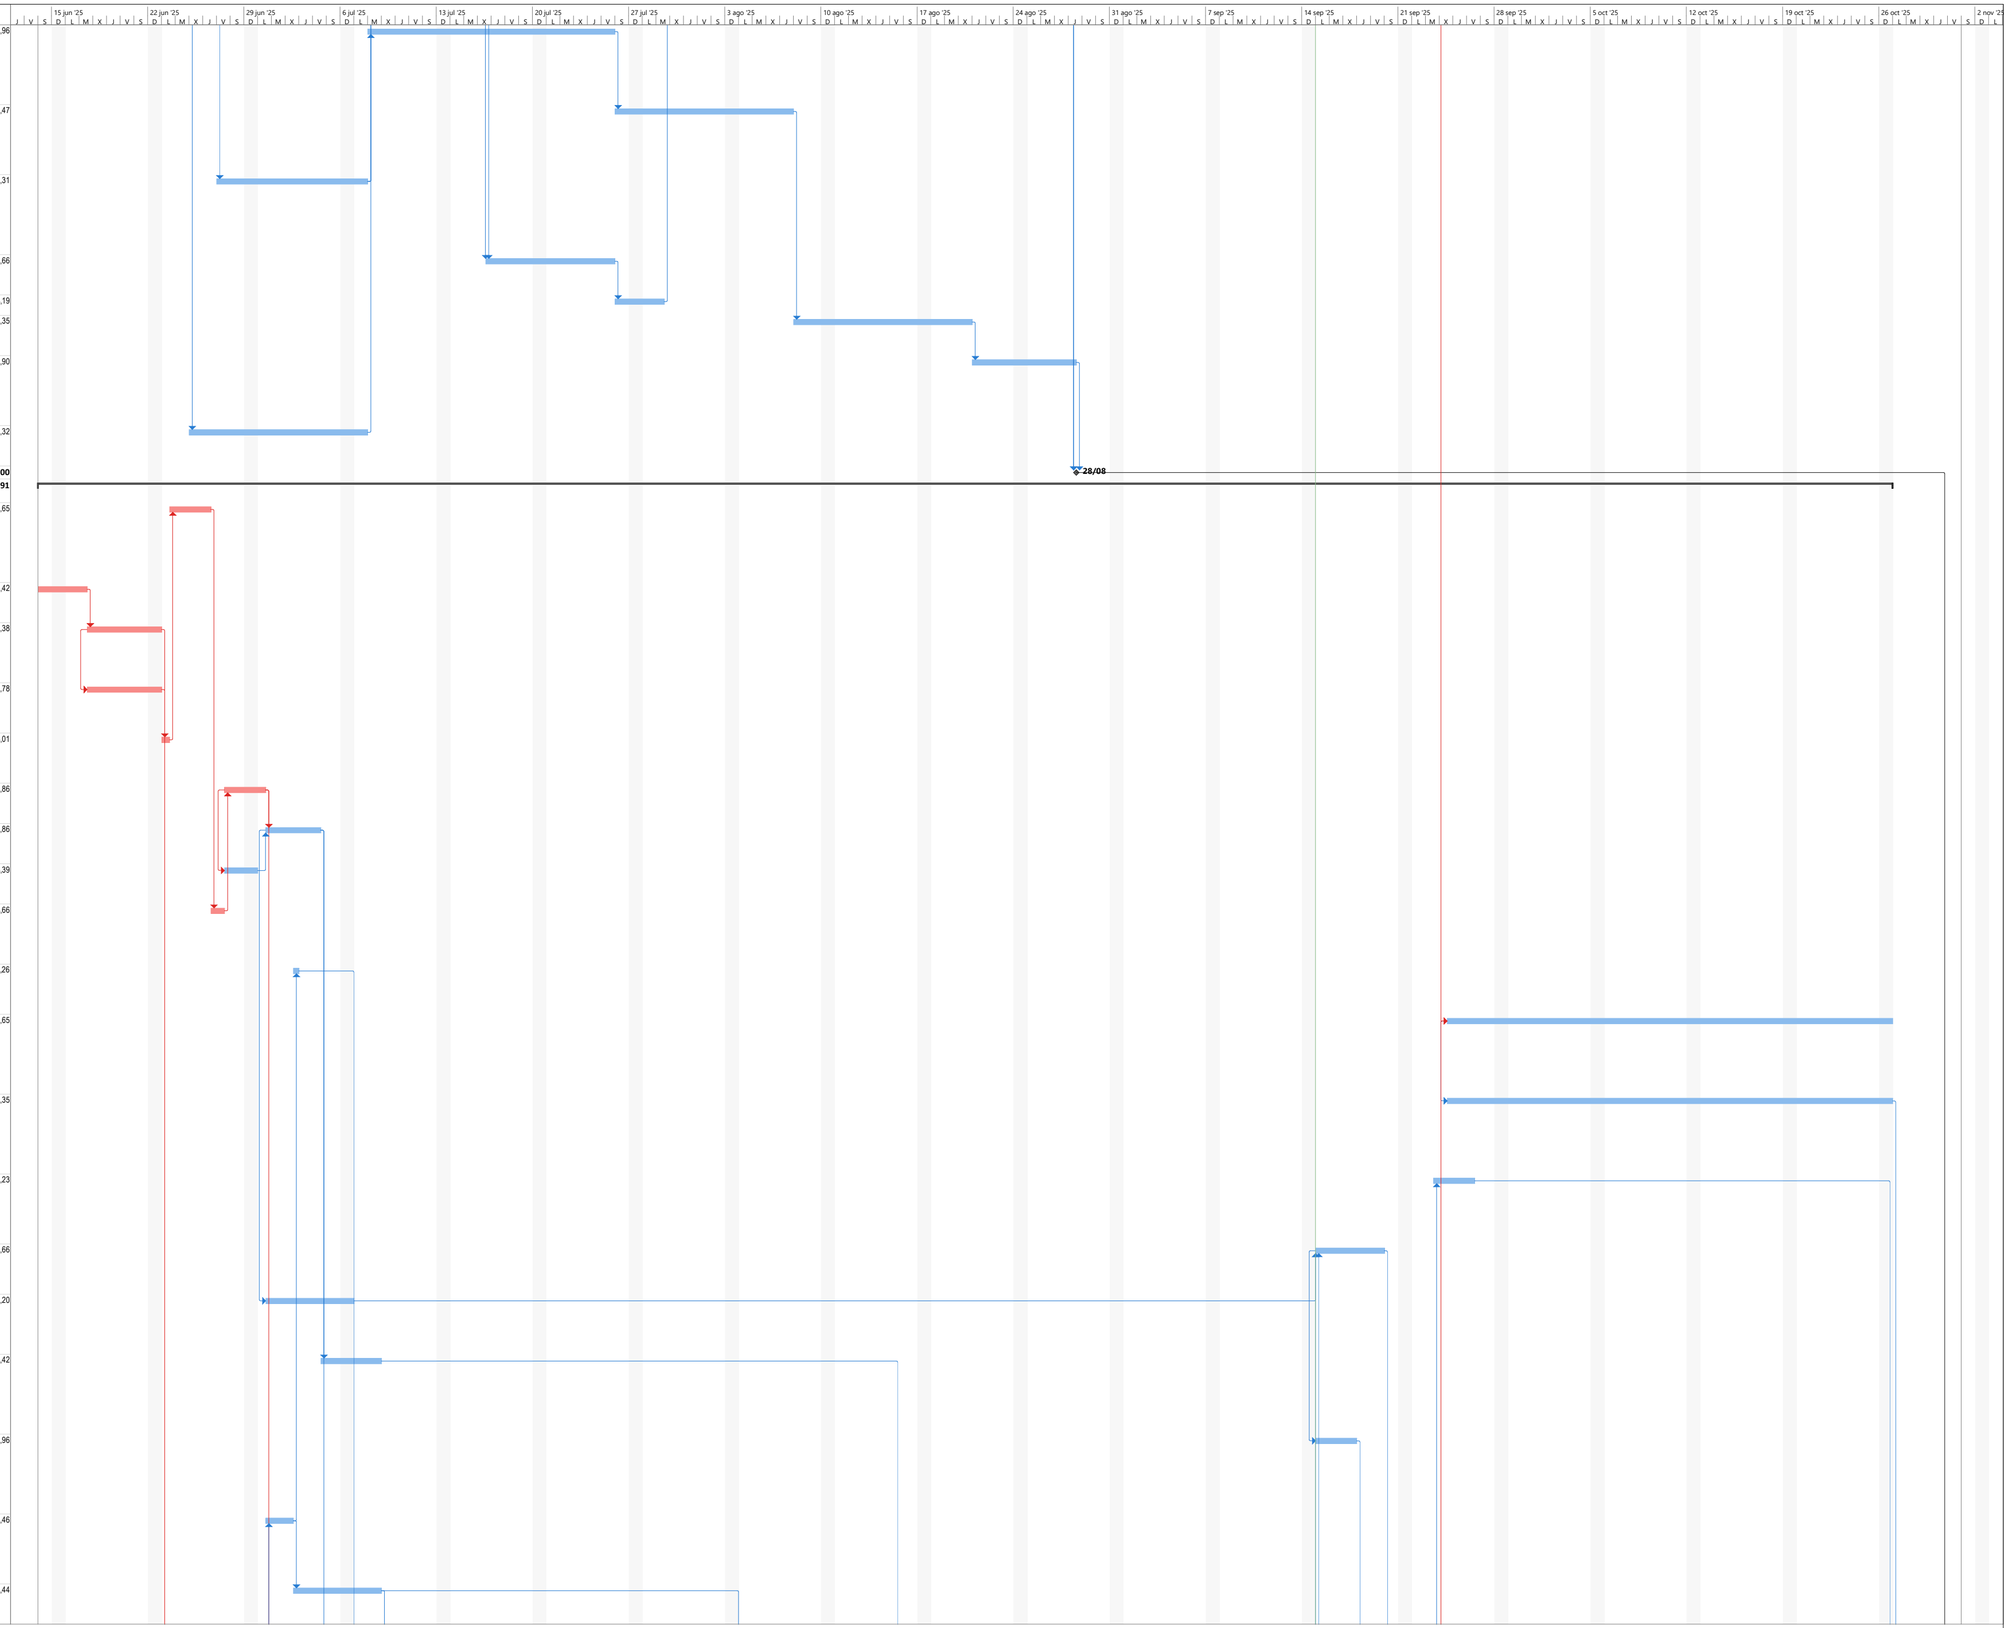


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
90		PUNTO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 9000BTU A 24000 BTU, INCLUYE DUCTERIA (2 LINEAS SEGUN NECESIDADJEN COBRE Y ACCESORIOS NO MAYOR A 20M (ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y SEÑAL, ACCESORIOS DE CONEXIÓN SEGÚN NORMA), SOPORTE EN PIE DE AMIGOS PARA UNIDAD C	1 día	lun 18/08/25	mar 19/08/25	$ 901.233,06
91		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO ACONDICIONADO MINI SPLIT DE	1 día	vie 15/08/25	lun 18/08/25	$ 2.272.620,91
92		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE TABLERO HASTA AIRE ACONDICIONADO CABLE 2X10F+X12T. THHN/THWN-2 90°C COBRE . DUCTO EMT CONDUIT 1/2 " CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET. INCLUYE TERMINALES DE FIJACIÓN A	1 día	vie 4/07/25	lun 7/07/25	$ 1.489.322,69
93		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED CIRCULAR PLANA TIPO PANEL RD DL DIAMETRO 295X295 MM, DELGADA DE INCRUSTAR DE 24 WATIOS (100-240)V, EFICACIA 65 LMW TEMPERATURA DEL COLOR 4000K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1600 LUMENES,	1 día	jue 18/09/25	vie 19/09/25	$ 656.830,87
94		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, CAJA, EMT CONDUIT 1/2", TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET.	1 día	jue 21/08/25	vie 22/08/25	$ 1.374.762,29
95		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA INDIVIDUAL PARA TOMACORRIENTE O LUMINARIA EN 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 90°C COBRE, DUCTO EMT CONDUIT 1/2 " (INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, CONEXIONES PARA FIJACIÓN O	2 días	mar 19/08/25	jue 21/08/25	$ 1.374.762,29
96		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO	2 días	jue 21/08/25	sáb 23/08/25	$ 137.476,23
97		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR	2 días	sáb 23/08/25	mar 26/08/25	$ 193.485,06
98		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 90°C COBRE, INCLUYE TUBERÍA EMT CONDUIT DE 1/2 PULGADA, FLEXIBLE Y RÍGIDA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS EMT DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS	2 días	mar 26/08/25	jue 28/08/25	$ 5.588.116,59
99		SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEBREAKER BIPOLAR BIFÁSICO 2X40AMP ENCHUFABLES. CERTIFICADO POR RETIE-CIDET, POR NINGÚN MOTIVO DEBE TRABAJAR CALIENTE AL	1 día	jue 28/08/25	vie 29/08/25	$ 165.480,65
100		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION HASTA TABLERO NUEVO THHN/THWN-2 90°C COBRE 3X(1X6F)+1X6N+1X10T, CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET, DE REFERENCIA SIMILAR O SUPERIOR A CENTELSA,	3 días	vie 29/08/25	mié 3/09/25	$ 10.644.224,35
101		SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEBREAKER MONOPOLAR 1X20AMP ENCHUFABLES. CERTIFICADO POR RETIE-CIDET, POR NINGÚN MOTIVO DEBE TRABAJAR CALIENTE AL TACTO.	1 día	mié 3/09/25	jue 4/09/25	$ 229.127,05
102		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO, CON BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, ICLUYE TOTALIZADOR DE 50A	8 días	jue 4/09/25	lun 15/09/25	$ 1.004.340,23
103		**FIN ALOJAMIENTOS PERSONAL DE COCINA BIM12**	**0 días**	**lun 27/10/25**	**lun 27/10/25**	**$ 0,00**
104		**BAÑOS**	**103 días**	**lun 23/06/25**	**vie 31/10/25**	**$ 60.368.597,94**
105		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE Y LAMINA ACRILICA (INCLUYE SECCIONES FIJAS Y PUERTAS, ACCESORIOS DE GIRO Y	29 días	mié 24/09/25	vie 31/10/25	$ 31.823.201,25
106		SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION Y/O PUERTA DE BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO , INCLUYE: PUERTAS CORREDIZAS O BATIENTES. DESMONTE DE EXISTENTES EN CASO DE REQUERIRSE, MARCOS, HERRAJES, EMPAQUES,FIJACION, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU	29 días	mié 24/09/25	vie 31/10/25	$ 1.655.213,80
107		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN CRISTAL BISELADO DE PRIMERA CALIDAD. FLOTANTE , DE SUPERFICIE PLANA, ESPESOR MÍNIMO DE 4MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. Y TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA	29 días	mié 24/09/25	vie 31/10/25	$ 364.057,42
108		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC Ø4", (INCLUYE:REGATAS, RESANE, PASNTES,ACCESORIOS, EMPATES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU PUESTA	1 día	sáb 28/06/25	lun 30/06/25	$ 759.275,95
109		SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO 4"X 3" EN ALUMINIO	1 día	jue 4/09/25	vie 5/09/25	$ 228.488,71
110		EMPALME CONEXION SANITARIA A CAJA PRINCIPAL (INCLUYE: EXCAVACION, ACCESORIOS. CONEXIONES, TUBERIA Y TODO LONECESARIO PARA SU FUNCINAMIENTO)	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 611.005,46
111		CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 Hprom=0,8m, INCLUYE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y RELLENO. INSTALACIÓN TAPA EN CONCRETO CONÁNGULO METÁLICO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	2 días	vie 27/06/25	lun 30/06/25	$ 611.005,46
112		SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ARRECIFE REF 61014A001 SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD. INCLUYE: KIT DE INSTALACION, TIPO INSTITUCIONAL, VALVULA TIPO PUSH Y SIFON. ACCESORIOS Y TODO REQUERIDO PARA SU CORRECTA	5 días	jue 31/07/25	jue 7/08/25	$ 4.697.104,50
113		SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO NATURAL. ESPESOR 0.07M, ANCHO 0.70, ALTURA 1.10 M (INCLUYE : SALPICADERO, BABERO, ORIFICIOS LAVAMANOS, SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	5 días	lun 30/06/25	lun 7/07/25	$ 868.788,23
114		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA HAPPY O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA DE CONTROL Y KIT DE INSTALACIÓN,SE DEBE TENER EN CUANTA TODOS LO NECESARIO PARA	5 días	vie 25/07/25	jue 31/07/25	$ 1.183.823,09
115		SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Y LLAVE PARA DUCHA GRIVALCOMPLETA Y JUEGO DE INCRUSTACIONES CERAMICA CALIDAD 1 COLOR (INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y	5 días	vie 18/07/25	vie 25/07/25	$ 1.336.574,45
116		JUEGO DE INCRUSTACIONES CERAMICA CALIDAD 1 COLOR (INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE – CEPILLERO-JABONERAS- TOALLEROS-PAPELERA Y ACCESORIOS	2 días	jue 7/08/25	sáb 9/08/25	$ 534.629,78

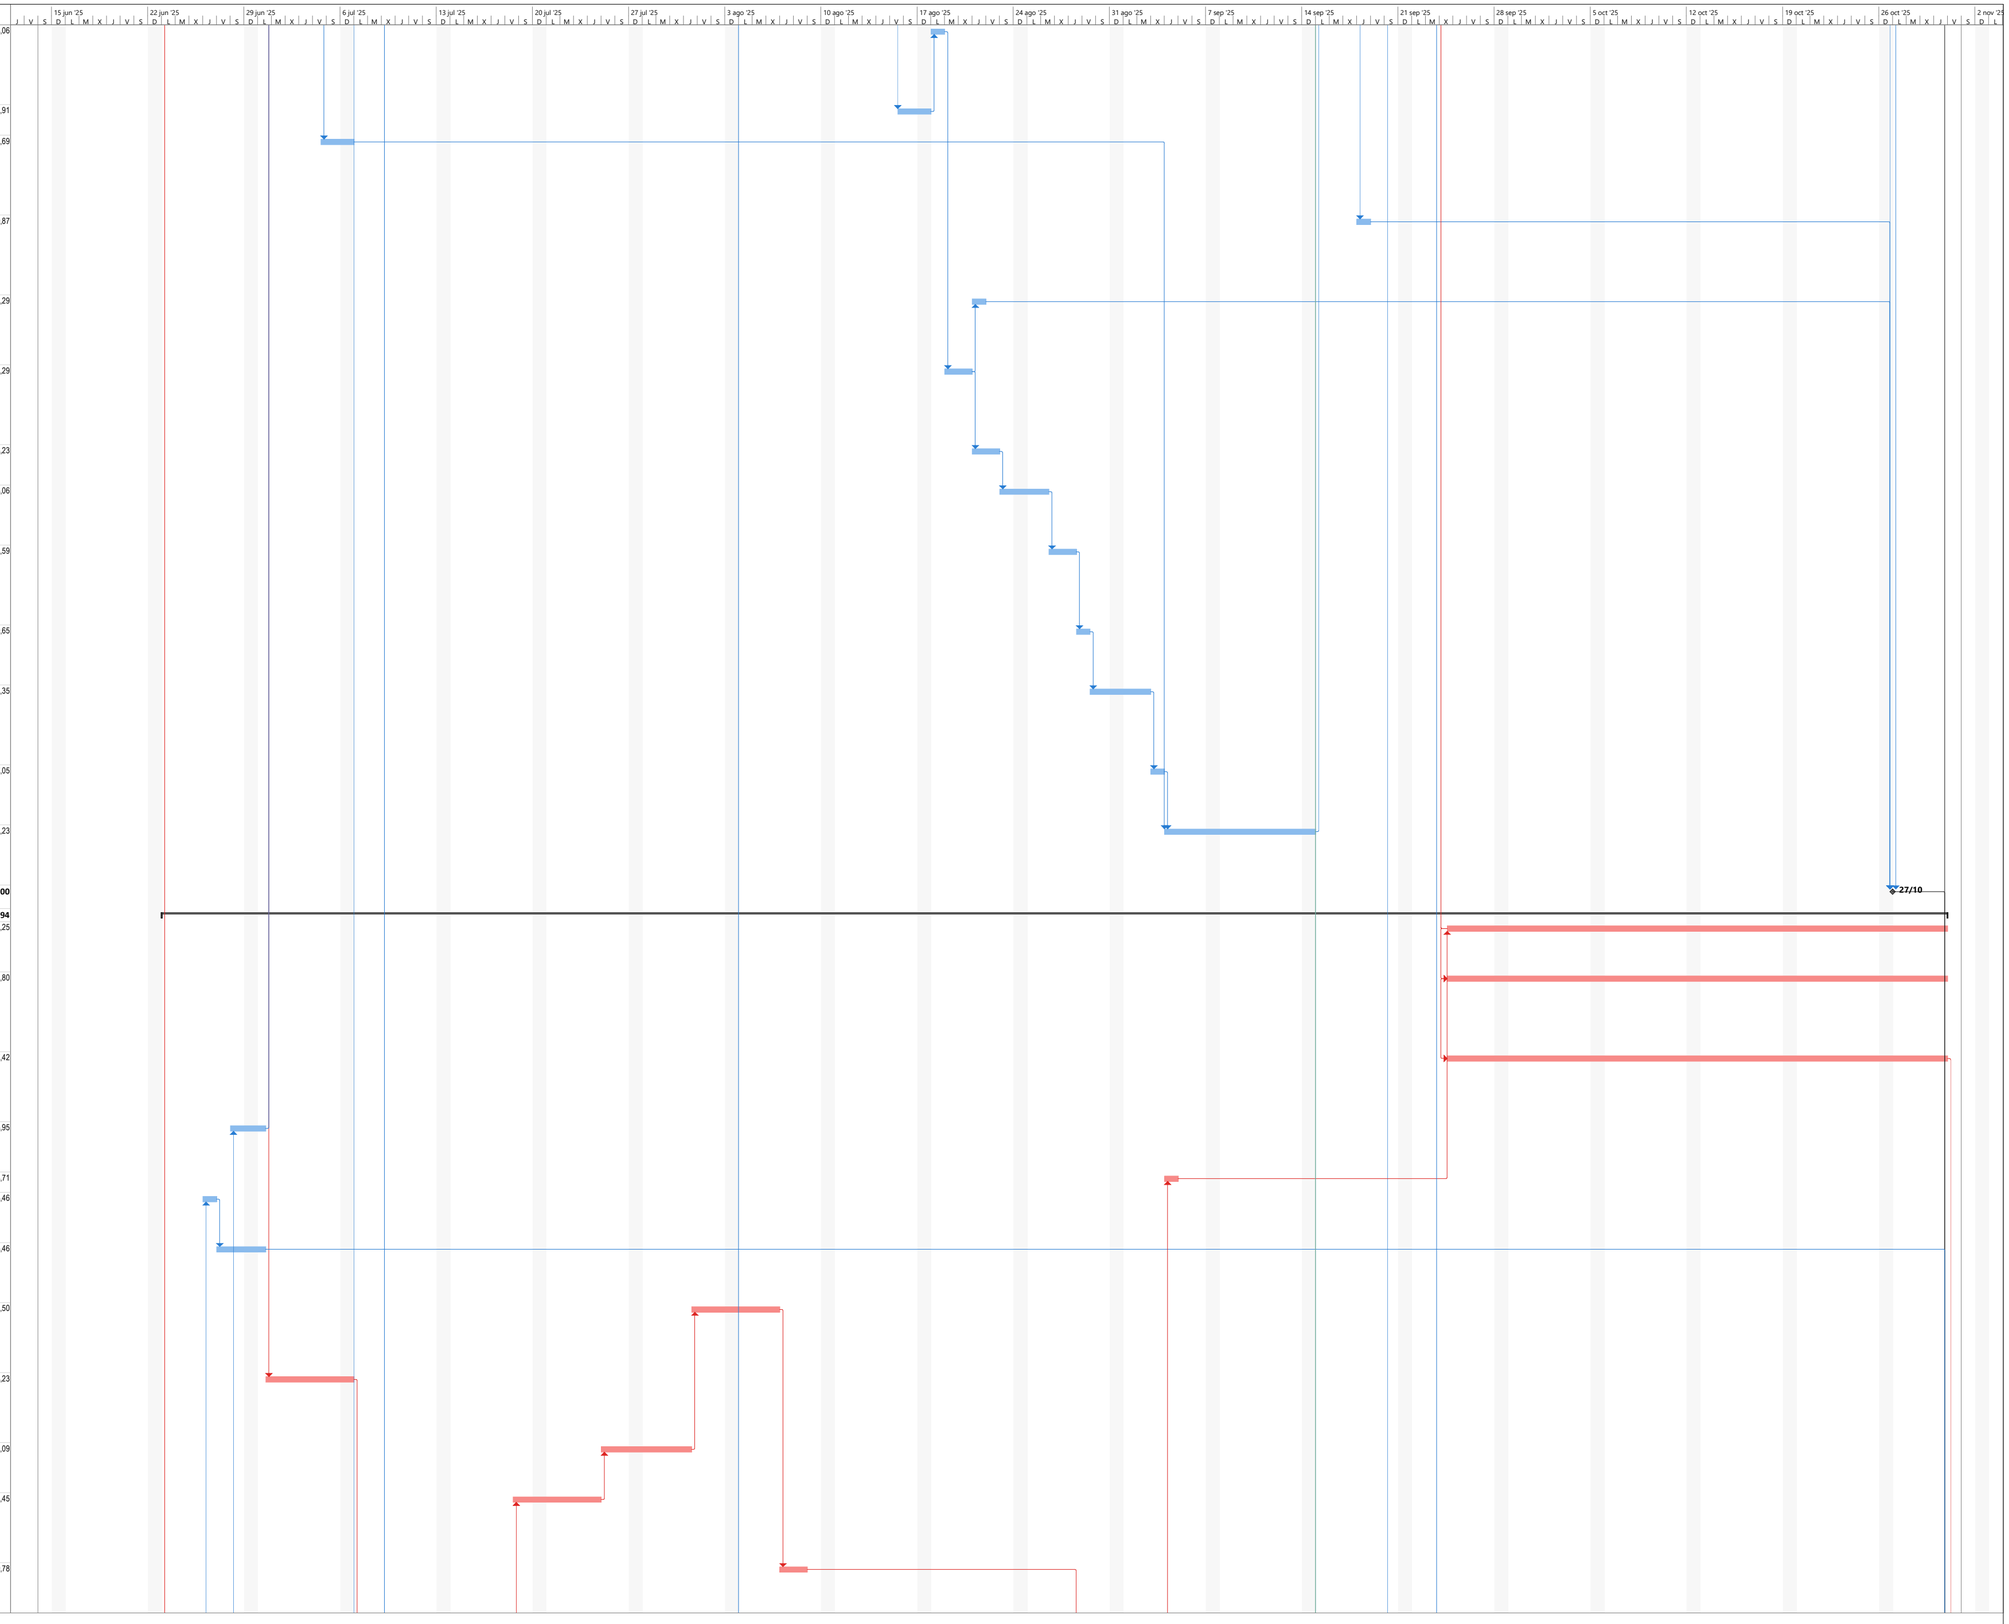

Proyecto: PROGRAMACIÓN AJU
Fecha: lun 15/09/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
117		SUMINNISTRO E INSTALACION DE PISO CANTERA DUROPISO BLANCO O GRIS CD REF 515184501 EN CERAMICA 0.51 X 0.51 MTS TRÁFICO COMERCIAL GENERAL SOBRE PLANTILLA (INCLUYE:	4 días	lun 14/07/25	vie 18/07/25	$ 1.550.731,87
118		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0,15 X0.15 M O SIMILAR EN MUROS (INCLUYE:LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	6 días	lun 7/07/25	lun 14/07/25	$ 3.330.980,29
119		CORTE DE PLANTILLA DE PISO (EN DOS ARISTAS) PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA. INCLUYE:TODO LO REQUERIDO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	1 día	lun 23/06/25	mar 24/06/25	$ 162.171,03
120		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" EN PVC PRESION RDE 21. INCLUYE: TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PRESION,PEGANTES Y LIMPIADOR, REGATAS EN MUROS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	$ 756.119,26
121		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" METALICO TIPOTOYO O SIMILAR. INLCUYE: ACCESORIOS, TAPAS EN PVC Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	$ 165.480,65
122		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST EN FACHADA (INCLUYE: RELLENO MARMOLINA O SIMILAR-LINEALES	2 días	sáb 20/09/25	mar 23/09/25	$ 2.228.243,65
123		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER DE 50 CM (INCLUYE: GRIFERÍA, SIFON, ACCESORIOS, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E	5 días	jue 28/08/25	jue 4/09/25	$ 1.715.199,84
124		PUNTO SANITARIO/ VENTILACIÓN 3" (INCLUYE: PASANTE, TUBERÍAY ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	1 día	mar 24/06/25	mié 25/06/25	$ 983.590,38
125		PUNTO SANITARIO/ VENTILACIÓN 4" (INCLUYE: PASANTE, TUBERÍAY ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	1 día	mié 25/06/25	jue 26/06/25	$ 239.002,57
126		SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN PORCELNATO FORMATO 60X60 H:10 CM (INCLUYE: REMATES SUPERIORES, JUNTAS, DILATACIONES, ACOLILLADOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	3 días	mié 9/07/25	sáb 12/07/25	$ 2.101.990,85
127		REDOBLÓN EN MORTERO E IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO. CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS E INSTALACION DE MANTO EN FRIO SOBRE SUPERFICIE.	2 días	mar 5/08/25	jue 7/08/25	$ 2.006.868,51
128		DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN DE REDOBLÓN EN MORTERO E IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO.	1 día	lun 4/08/25	mar 5/08/25	$ 455.050,94
129		**FIN BAÑOS**	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$ 0,00
130		**FIN CONTRATO NO.049-2025**	0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$ 0,00

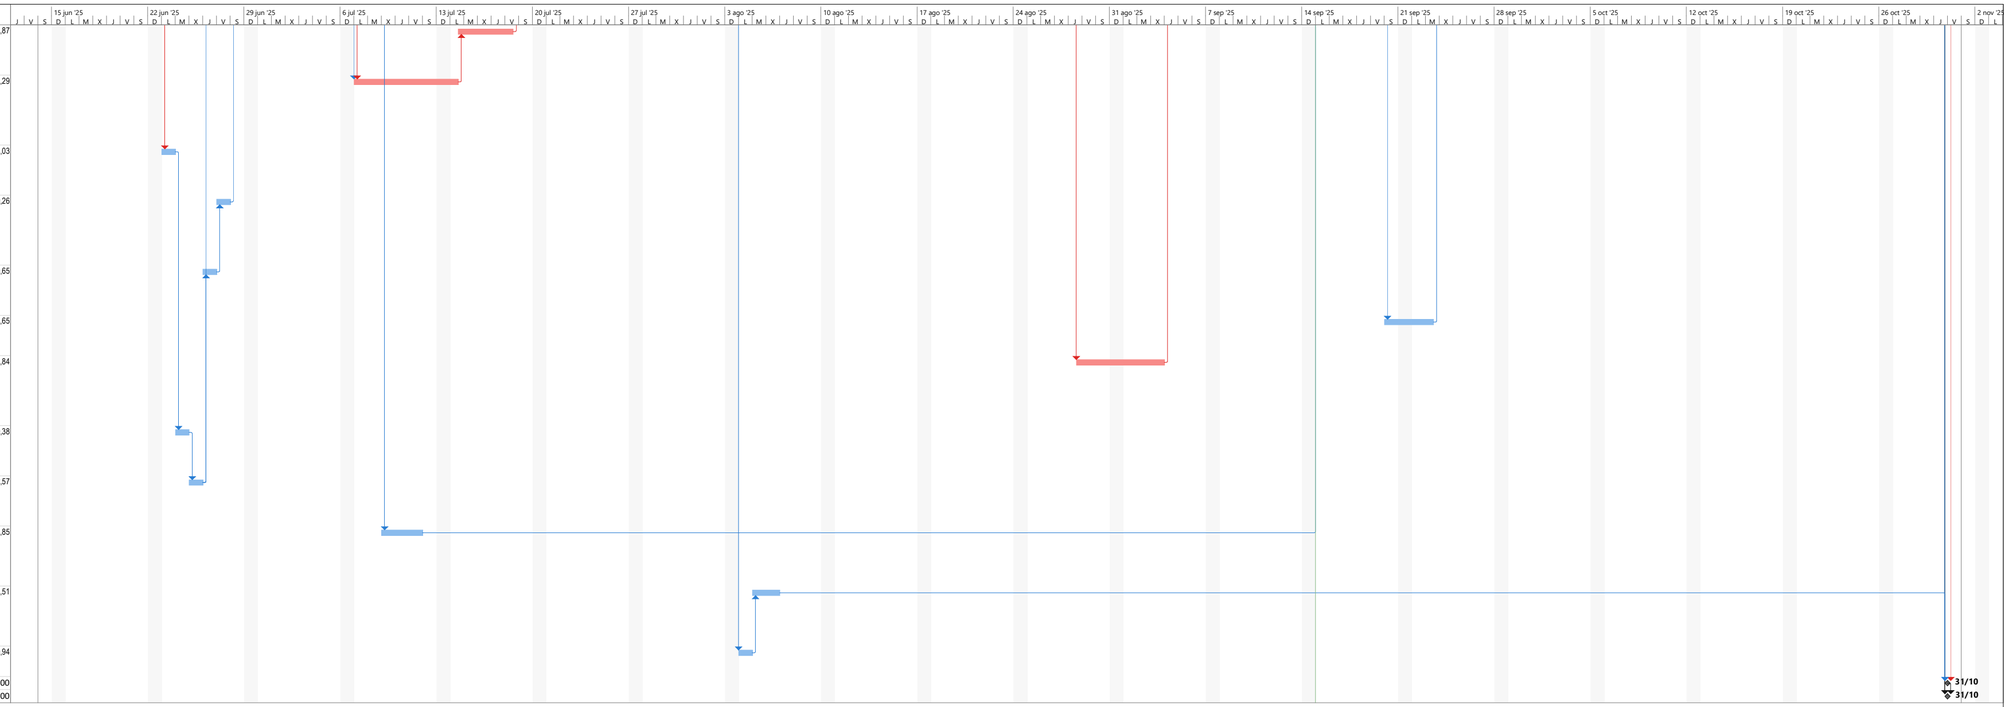

WILFRAN DIAZ LARA
C.C.: 73.108.971 de Cartagena
Director de Obra Contrato de obra
No. 0052-ARC-CBNL01-2025
