	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/09/2025 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3763 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: GAMA INGENIERIA S.A.S
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2630 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ARCONS INGENIEROS

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: TRES (3) MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
Prórroga No. 1	13/05/2025	20/05/2025	20/07/2025
Prórroga No. 2	8/08/2025	10/08/2025	30/09/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		20/12/2024	20/12/2024	19/01/2025	20/01/2025
	1	20/01/2025	20/01/2025	19/02/2025	20/02/2025
	2	19/02/2025	19/02/2025	4/03/2025	5/03/2025
2		23/04/2025	23/04/2025	4/05/2025	5/05/2025
3		14/05/2025	14/05/2025	2/06/2025	3/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2025
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.140.793.883,00 **50% EN SMMLV:** $ 438,77
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.140.793.883,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. OF – INT – 078 – 2025 de fecha 13 de Septiembre de 2025 y mediante alcance OF – INT – 079 – 2025 del 17 de septiembre de 2025, el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Prórroga No. 3 por treinta y un dias (31) días, hasta el 31 de octubre de 2025.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/09/2025 (Día / Mes / Año)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Fundición de placas en concreto rigido, en tres tramos de vía ubicados sobre el corredor vial Gaitania - Marquetalia con código INVÍAS 30100. Ademas de la construcción de alcantarillas de 36" en concreto reforzado.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN		$ -	$ -	**$ -**
Excavaciones varias en Material Comun en	$ 4.820.640	$ -	$ -	**$ 4.820.640**
Relleno para estructuras con material de	$ 4.428.800	$ -	$ -	**$ 4.428.800**
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 68.752.258	$ -	$ -	**$ 68.752.258**
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 6.116.832	$ -	$ -	**$ 6.116.832**
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 38.605.683	$ -	$ -	**$ 38.605.683**
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de	$ 44.521.200	$ -	$ -	**$ 44.521.200**
Transporte de Materiales Provenientes de la	$ 151.300		$ -	**$ 151.300**
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO	$ 6.888.485		$ -	**$ 6.888.485**
Excavaciones Varias en Material Comun en			$ -	**$ -**
Afirmado	$ 184.328.689		$ -	**$ 184.328.689**
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 366.965.175		$ -	**$ 366.965.175**
Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclopeo)	$ 148.725.036		$ -	**$ 148.725.036**
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 132.295.654		$ -	**$ 132.295.654**
Relleno para estructuras con material de	$ 2.176.312		$ -	**$ 2.176.312**
Sello Asfáltico para Juntas.	$ 27.451.409		$ -	**$ 27.451.409**
Transporte de Materiales Provenientes de la	$ 151.300		$ -	**$ 151.300**
Conformación de calzada	$ 80.549.500		$ -	**$ 80.549.500**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS	$ 1.413.115		$ -	**$ 1.413.115**
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS	$ 1.118.341.388		$ -	**$ 1.118.341.388**
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE	$ 8.172.495		$ -	**$ 8.172.495**
TOTAL ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O	$ 14.280.000		$ -	**$ 14.280.000**
Valor Total	$ 1.140.793.883			$ 1.140.793.883,00

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de agosto (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 7,12% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 26,20%.

(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 292.646.789,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 81.266.152,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 95.546.152,00

(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: 81,266,152.00 (mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado: Marzo 2025 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.045.247.731,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto multas o sanciones a la fecha. Sin embargo mediante memorando 2025I-VTOL-067067 la Dirección Territorial Tolima envío a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos el día 03/09/2025 la solicitud de inicio del proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista GAMA INGENIERÍA S.A.S.

Por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos mediante memorando 2025I-VBOG-068275 del día 08/09/2025 manifiestan que no es posible acoger la solicitud de inicio de procedimiento sancionatorio, teniendo en cuenta que el contrato está próximo a terminar (30/09/2025).

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Durante las últimas semanas se ha presentado un deterioro considerable en el estado de la vía de acceso al frente de trabajo, lo cual ha generado serias dificultades para el tránsito de maquinaria pesada, equipos y volquetas necesarios para la ejecución de las diferentes actividades constructivas. Esto ha generado, retrasos en el suministro oportuno de materiales de construcción, Interrupciones frecuentes en el transporte y movilización de maquinaria, imposibilidad de acceso durante varios días, lo que ha reducido de manera significativa el ritmo y el avance físico de la obra. Cabe resaltar que estas circunstancias son ajenas a la responsabilidad del contratista, quien ha mantenido personal y equipos dispuestos para la ejecución continua de las actividades, sin embargo, las condiciones actuales de la vía han imposibilitado el normal desarrollo de las mismas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	17/09/2025 (Día / Mes / Año)

JURÍDICA:

• la Ley 80 de 1993, art. 3 y 5: "Los contratistas colaboran con el Estado en la consecución de fines estatales, pero deben contar con condiciones mínimas de seguridad y viabilidad técnica para cumplir"
• Ley 80 de 1993, art. 50: "El contrato estatal debe revisarse en caso de circunstancias imprevistas que alteren la ecuación económica."
• Ley 1150 de 2007, art. 16: autoriza la modificación del plazo contractual cuando existan hechos sobrevinientes no imputables a las partes.

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

Financieramente es posible la incorporación de esta prórroga, toda vez que no afecta el valor total del contrato, y por lo tanto no se requiere de la incorporación de recursos adicionales, sin afectar economicamente a la entidad.

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

El presupuesto de obra no se ve afectado en ninguna forma, por lo que no se requiere de asignación presupuestal para la presente solicitud.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**

NO APLICA

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**

NO APLICA

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

OFICIO SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 3
REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADA

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma Oscar Montiel
Nombre: OSCAR ELIAS MONTIEL HERAZO
Representante Legal
Contratista
C.C. No. 15.726.333 CHINU - CORDOBA

Firma
Nombre: YHON ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA
Representante Legal
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-282864 TLM

Vo.Bo.Firma
Nombre: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-282864 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Director Territorial Tolima
Matrícula Profesional No. 17202112793 CLD

Vo.Bo.Firma
Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: ADELA MAYERLY DEVIA DAZA
Abogada de la Dirección Territorial Tolima

Firma:
Nombre: ANGELA ROZO MUÑOZ
Abogado Unidad Ejecutora

Firma
Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Nombre: William Molano Rodriguez
Jefe Unidad Ejecutora SVR (E)
Matrícula Profesional No.: A-25072000-79463217

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.



CONSORCIO ARCONS INGENIEROS

Nit 901.530.556-5

Oficio **A69**

Ibagué, Tolima, septiembre 15 de 2025

Ingeniero
LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ
Supervisor
Instituto Nacional de Vías Territorial Tolima

Referencia: CONTRATO NÚMERO 2630 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Asunto: Visto bueno y solicitud de trámite de prórroga No. 3 contrato de obra.

Respetado Ingeniero Rodríguez:

En atención al oficio remitido por el contratista Gama Ingeniería S.A.S. el pasado 13 de septiembre de 2025, mediante el cual solicita la prórroga del plazo contractual hasta el 31 de octubre de 2025, aduciendo que el avanzado grado de deterioro de las vías de acceso ha imposibilitado el transporte de materiales, equipos y personal hacia el lugar de ejecución de la obra, esta interventoría se permite manifestar lo siguiente:

1. Recepción y traslado: La solicitud fue recibida y radicada ante esta interventoría, y conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría del INVÍAS, se procede a trasladarla a la Supervisión para el trámite correspondiente.

2. Concepto técnico: Revisadas las condiciones actuales del corredor vial de acceso a la zona de obra, se evidencia un avanzado grado de deterioro que ha generado pérdida de la transitabilidad, afectando la movilidad de vehículos de carga, maquinaria amarilla y transporte de personal. Esta situación constituye una limitante técnico que impide el normal aprovisionamiento de materiales y equipos, lo cual repercute de manera directa en el cronograma de ejecución. En este sentido, la interventoría considera procedente la aprobación de la prórroga solicitada hasta el 31

de octubre de 2025, en atención a que las condiciones descritas exceden la capacidad operativa del contratista y comprometen el desarrollo de las actividades constructivas.

En mérito de lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la Supervisión dar el trámite respectivo a la prórroga No. 3, elevando el caso ante el INVÍAS para la expedición del acta correspondiente.

YHON ALEXANDER GUTIÉRREZ GARCÍA
Representante Legal
CONSORCIO ARCONS INGENIEROS

GAMA INGENIERIA SAS

Sincelejo, septiembre 17 de 2025 **OF – INV – 079– 2025**

Ingeniero.
YHON ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA
Representante Legal CONSORCIO ARCONS INGENIEROS.
Interventoría.

Referencia: Contrato de Obra Pública No. 3763 de 2024

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO. DEL TOLIMA.

Asunto: ENNTREGA MEPI solicitud de prorroga No.3

De acuerdo a las solicitudes realizadas por la supervisión de interventoría por parte de INVIAS sobre la corrección del formato MEPI para solicitud de prorroga No. 3 y en aras entregar las subsanaciones a tiempo GAMA INGENIERIA SAS hace entrega a través de este oficio el formato en mención corregido.

Atentamente,

Oscar Montiel

OSCAR MONTIEL HERAZO
C.C No. 15.726.333
Representante Legal GAMA INGENIERÍA SAS
Cel. 3015028507
Direccionteconica.gamaingenieria@gmail.com

GAMA INGENIERIA SAS

Sincelejo, septiembre 13 de 2025 **OF – INT – 078– 2025**

Ingeniero.
YHON ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA
Representante Legal CONSORCIO ARCONS INGENIEROS.
Interventoría.

Referencia: Contrato de Obra Pública No. 3763 de 2024

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO. DEL TOLIMA.

Asunto: Solicitud de Prórroga N.º 3 del Contrato de Obra No. 3763 de 2024

Respetado Ingeniero Gutiérrez,

Por medio de la presente, **GAMA INGENIERIA S.A.S,** en calidad de Contratista del proyecto de la referencia, mediante el presente escrito realizamos una descripción detallada de las motivaciones para solicitar una prórroga para finalizar todas las actividades del contrato de la referencia.

1. Antecedentes contractuales

El Contrato de Obra No. 3763 de 2024, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y GAMA INGENIERÍA S.A.S., tiene por objeto el “Mejoramiento de la vía terciaria Gaitania – Marquetalia, código INVÍAS 30100 en el municipio de Planadas, Tolima”.
Cronología contractual relevante:

- Fecha de inicio: 25 de noviembre de 2024.
- Plazo inicial: 23 de febrero de 2025.
- Suspensiones y reinicios:
    - Suspensión 1: 20/12/2024 – 19/01/2025.
    - Ampliación 1: 20/01/2025 – 19/02/2025.
    - Ampliación 2: 19/02/2025 – 04/03/2025.
    - Reinicio 1: 05/03/2025.
    - Suspensión 2: 23/04/2025 – 04/05/2025.

  - Reinicio 2: 05/05/2025.
  - Suspensión 3: 14/05/2025 – 03/06/2025.
  - Reinicio 3: 04/06/2025.
- Prórrogas otorgadas:
  - Prórroga 1: hasta 20/07/2025.
  - Prórroga 2: hasta 30/09/2025 (Memorando 2025I-VBOG-058592).

- Solicitud:

Por medio de la presente, y en calidad de contratista del proyecto en referencia me permito solicitar de manera formal una prórroga No.3 en el plazo de ejecución del contrato, debido a circunstancias externas y no imputables a esta empresa que han afectado significativamente el normal desarrollo de las actividades programadas en la obra.

Durante las últimas semanas se ha presentado un deterioro considerable en el estado de la vía de acceso al frente de trabajo, lo cual ha generado serias dificultades para el tránsito de maquinaria pesada, equipos y volquetas necesarios para la ejecución de las diferentes actividades constructivas.

Esto ha generado, retrasos en el suministro oportuno de materiales de construcción, Interrupciones frecuentes en el transporte y movilización de maquinaria, imposibilidad de acceso durante varios días, lo que ha reducido de manera significativa el ritmo y el avance físico de la obra.

Cabe resaltar que estas circunstancias son ajenas a la responsabilidad del contratista, quien ha mantenido personal y equipos dispuestos para la ejecución continua de las actividades, sin embargo, las condiciones actuales de la vía han imposibilitado el normal desarrollo de las mismas.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la adecuada culminación del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad establecidos, solicito se conceda una prórroga en el plazo de ejecución contractual hasta el 31 de octubre del presente año.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a la respuesta formal a la presente solicitud.

- Fundamentación Jurídica

- la Ley 80 de 1993, art. 3 y 5: *“Los contratistas colaboran con el Estado en la consecución de fines estatales, pero deben contar con condiciones mínimas de seguridad y viabilidad técnica para cumplir”*
- Ley 80 de 1993, art. 50: “*El contrato estatal debe revisarse en caso de circunstancias imprevistas que alteren la ecuación económica.”*
- Ley 1150 de 2007, art. 16: autoriza la modificación del plazo contractual cuando existan hechos sobrevinientes no imputables a las partes.

- Jurisprudencia y doctrina

- Consejo de Estado, Rad. 11001-03-26-000-2013-00052-00 (2016): la entidad no puede desconocer los efectos de circunstancias irresistibles sobre la ejecución contractual.
- Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, Boletín 2021: la entidad y la interventoría deben adoptar medidas de ajuste contractual cuando la ejecución se ve impedida por causas de fuerza mayor, en aras de garantizar la transparencia y la finalidad de la contratación.

2. Solicitud concreta

Con base en los hechos descritos, GAMA INGENIERÍA S.A.S. solicita a INVÍAS la aprobación de la Prórroga N.º 3 del Contrato de Obra No. 3763 de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025, con fundamento en:

- Retrasos en el suministro oportuno de materiales de construcción.
- Interrupciones frecuentes en el transporte y movilización de maquinaria.
- Imposibilidad de acceso durante varios días, lo que ha reducido de manera significativa el ritmo y el avance físico de la obra.

3. Conclusión

El contratista no se niega a ejecutar la obra, sino que busca garantizar que esta se realice con calidad, seguridad y bajo parámetros técnicos que preserven el patrimonio público.
La prórroga solicitada se ajusta plenamente a la ley, la jurisprudencia, la doctrina administrativa y los manuales de contratación e interventoría de INVÍAS, y constituye la única medida proporcional para asegurar el cumplimiento del objeto contractual y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y de la comunidad beneficiaria.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional,

Atentamente;

Oscar Montiel

OSCAR MONTIEL HERAZO
C.C No. 15.726.333
Representante Legal GAMA INGENIERÍA SAS
Cel. 3015028507
Direcciontecnica.gamaingenieria@gmail.com
Proyectado por: Abogado Dairo
Diaz VoBo: Ing. Camilo Montes.

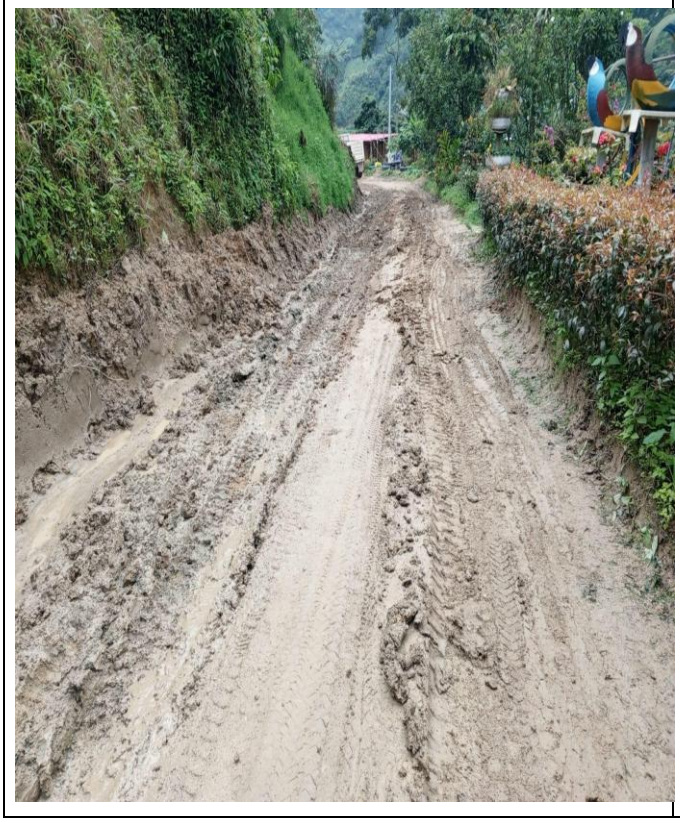
GAMA INGENIERIA SAS

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA

GAMA INGENIERIA SAS









CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 3763 DE 2024

Objeto: ***"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO. DEL TOLIMA "***

Se marca con una (X)

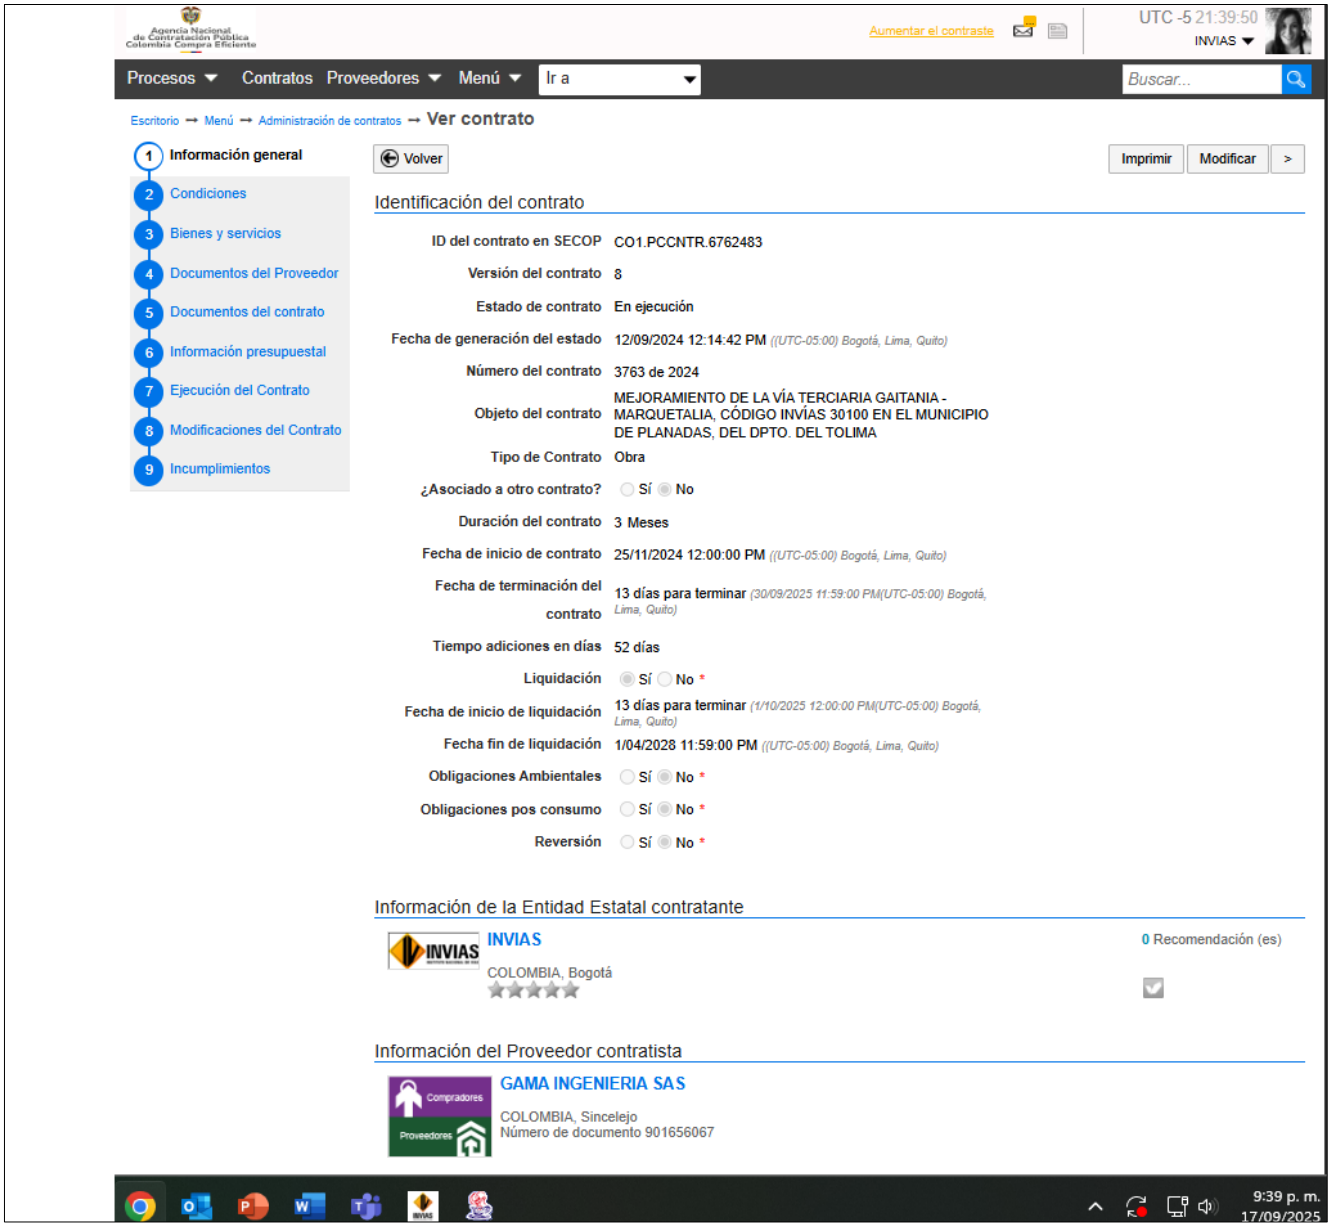
	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:		
CIFRA:		
GESPROY:		X

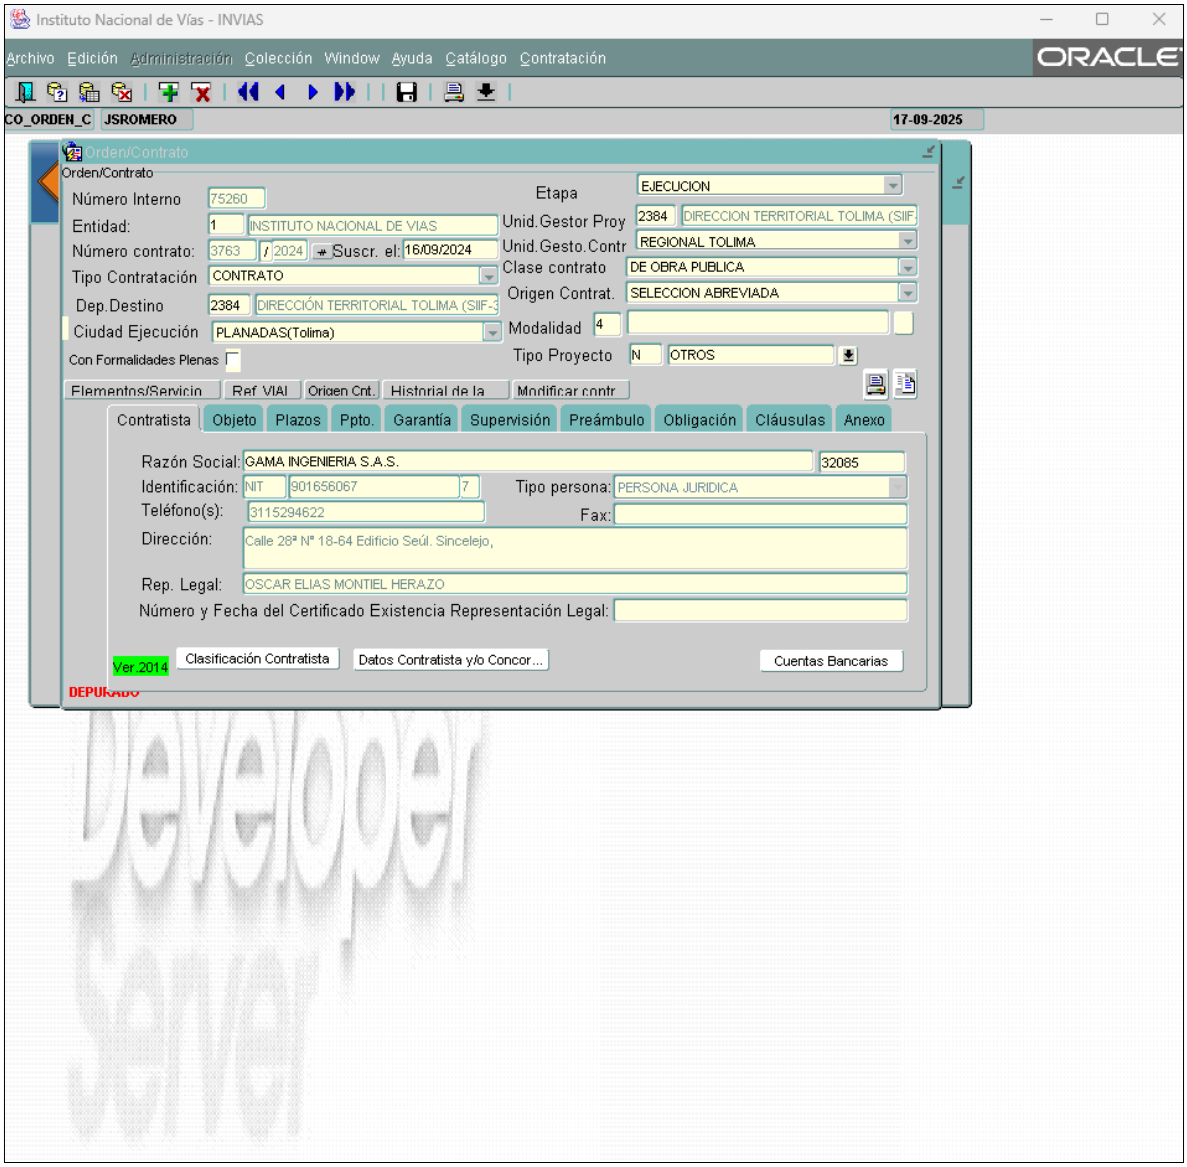
Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Ibagué, a los 18 días del mes de septiembre del 2025.

Nombre: Juan David Torres Sanabria
Director Territorial Tolima
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Luis Alberto Rodriguez Rodriguez
Supervisor del Contrato de interventoría
Instituto Nacional de Vías – INVIAS


Aumentar el contraste
UTC -5 21:39:50
INVIAS
Procesos
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Imprimir
Modificar
Identificación del contrato
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6762483
Versión del contrato 8
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 12/09/2024 12:14:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato 3763 de 2024
Objeto del contrato MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO. DEL TOLIMA
Tipo de Contrato Obra
¿Asociado a otro contrato? Sí No
Duración del contrato 3 Meses
Fecha de inicio de contrato 25/11/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato 13 días para terminar (30/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días 52 días
Liquidación Sí No *
Fecha de inicio de liquidación 13 días para terminar (1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación 1/04/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales Sí No *
Obligaciones pos consumo Sí No *
Reversión Sí No *
Información de la Entidad Estatal contratante
INVIAS
COLOMBIA, Bogotá
0 Recomendación (es)
Información del Proveedor contratista
GAMA INGENIERIA SAS
COLOMBIA, Sincelejo
Número de documento 901656067
9:39 p. m.
17/09/2025


Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Archivo Edición Administración Colección Window Ayuda Catálogo Contratación
ORACLE
CO_ORDEN_C JSROMERO
17-09-2025
Orden/Contrato
Orden/Contrato
Número Interno 75260
Entidad: 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Número contrato: 3763 / 2024 Suscr. el: 16/09/2024
Tipo Contratación CONTRATO
Dep.Destino 2384 DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA (SIIF-3
Ciudad Ejecución PLANADAS(Tolima)
Con Formalidades Plenas
Etapa EJECUCION
Unid.Gestor Proy 2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA (SIIF
Unid.Gesto.Contr REGIONAL TOLIMA
Clase contrato DE OBRA PUBLICA
Origen Contrat. SELECCION ABREVIADA
Modalidad 4
Tipo Proyecto N OTROS
Elementos/Servicio
Ref. VIAI
Origen Cnt.
Historial de la
Modificar contr
Contratista
Objeto
Plazos
Ppto.
Garantía
Supervisión
Preámbulo
Obligación
Cláusulas
Anexo
Razón Social: GAMA INGENIERIA S.A.S. 32085
Identificación: NIT 901656067 7
Tipo persona: PERSONA JURIDICA
Teléfono(s): 3115294622
Fax:
Dirección: Calle 28ª Nº 18-64 Edificio Seúl. Sincelejo,
Rep. Legal: OSCAR ELIAS MONTIEL HERAZO
Número y Fecha del Certificado Existencia Representación Legal:
Ver.2014
Clasificación Contratista
Datos Contratista y/o Concor...
Cuentas Bancarias
DEPURADO
Developer
Server

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	1 de 3MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PROGRAMA DE INVERSIONES** I

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3763 DE 2024

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CÓDIGO INVÍAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO. DEL TOLIMA

CONTRATISTA: GAMA INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2630 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ARCONS INGENIEROS S.A.S.

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 23/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 14/04/2025
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.140.793.883,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.140.793.883,00

PLAZO ACUMULADO: 6,67 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN 1: 5/03/2025
FECHA DE REANUDACIÓN 2: 5/05/2025
FECHA DE REANUDACIÓN 3: 3/06/2025
(Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM	$167.397	14,99%	N.A.	% P	0,79%	7,04%	6,98%	0,18%	0,00%	9,93%	5,00%			12,94%	1,03%	0,00%	13,66%
				$ P	$8.807	$78.643	$77.972	$1.975	$0	$110.860	$55.799			$144.479	$11.459	$0	$152.559
				$ E													
				% E													
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$949.532	85,01%	N.A.	% P	0,05%	33,79%	41,81%	9,36%	26,40%	52,47%	6,21%	16,82%	33,13%	24,62%		79,16%	7,18%
				$ P	$603	$377.440	$466.993	$104.495	$294.821	$586.059	$69.390	$187.905	$370.064	$275.548		$881.104	$83.267
				$ E													
				% E													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.116.928,00**																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																	

SUSPENSIÓN No. 1 — REINICIO No. 1 — SUSPENSIÓN No. 2 — REINICIO No. 2 — SUSPENSIÓN No.3 — REINICIO No. 3
Reprogramación No.1 — Reprogramación No.2 — Reprogramación No.3

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,84%**	**40,83%**	**48,79%**	**9,53%**	**26,40%**	**62,40%**	**11,21%**	**16,82%**	**33,13%**	**37,61%**	**1,03%**	**79,16%**	**20,84%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$9.410**	**$456.082**	**$544.965**	**$106.471**	**$294.821**	**$696.918**	**$125.189**	**$187.905**	**$370.064**	**$420.028**	**$11.459**	**$881.104**	**$235.824**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,84%**	**41,68%**	**90,47%**	**100,00%**	**26,40%**	**88,79%**	**100,00%**	**16,82%**	**49,96%**	**87,56%**	**88,59%**	**79,16%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$9.410**	**$465.492**	**$1.010.458**	**$1.116.928**	**$294.821**	**$991.739**	**$1.116.928**	**$187.905**	**$557.969**	**$977.997**	**$989.455**	**$881.104**	**$1.116.928**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**7,21%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$80.550**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**7,21%**	**7,21%**	**7,21%**	**7,21%**	**7,21%**	**7,21%**	**7,21%**	**7,21%**	**7,21%**	**7,21%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$80.550**	**$80.550**	**$80.550**	**$80.550**	**$80.550**	**$80.550**	**$80.550**	**$80.550**	**$80.550**	**$80.550**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 1.413,12 / $ -	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 8.172,50 / $ -	$ -	%
ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA	$ 12.000,00 / $ -	$ -	%
TOTAL IVA DE ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	$ 2.280,00 / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 23.865,61	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.140.794**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Oscar Montiel
Nombre: OSCAR ELIAS MONTIEL HERAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
C.C. No. 15.726.333 CHINU - CORDOBA

Aprueba Firma:
Nombre: YHON ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 70202-282864 TLM

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-282864 CAU

Revisó Firma:
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 17202112793 CLD

Revisó Firma:
Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PRESUPUESTO GENERAL									
Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEP	SEMANA 29		
							5-sep	6-sep	7-sep
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM								
1	Excavaciones varias en Material Comun en Seco	m3	352,00	$ 13.695,00	$ 4.820.640,00	P			
						E			
2	Relleno para estructuras con material de excavación	m3	200,00	$ 22.144,00	$ 4.428.800,00	P			
						E			
3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	62,40	$ 1.101.799,00	$ 68.752.257,60	P			
						E			
4	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	6,40	$ 955.755,00	$ 6.116.832,00	P			
						E			
5	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	4631,20	$ 8.336,00	$ 38.605.683,20	P			
						E			
6	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	32,00	$ 927.525,00	$ 29.680.800,00	P			
						E			
7	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación para Distancias Mayores a mil metro (1.000 m)	m3-km	100,00	$ 1.513,00	$ 151.300,00	P			
						E			
	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								
8	Excavaciones Varias en Material Comun en Seco	m3	1309,50	$ 13.695,00	$ 17.933.602,50	P	$ 4.483.400,63	$ 4.483.400,63	$ 4.483.400,63
						E			
11	Concreto MR-38	m3	523,22	$ 1.101.799,00	$ 576.481.069,18	P			
						E			
13	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	Kg	10536,91	$ 8.336,00	$ 87.835.641,34	P			
						E			
15	Sello Asfaltico para Juntas	ml	2641,38	$ 6.856,00	$ 18.109.332,92	P			
						E			
16	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación para Distancias Mayores a mil metro (1.000 m)	m3-km	884,30	$ 1.513,00	$ 1.337.947,41	P	$ 334.486,85	$ 334.486,85	$ 334.486,85
						E			
17	Conformacion de la calzada	m2	35500,00	$ 2.269,00	$ 80.549.500,00	P			
						E			
	ITEM NO PREVISTOS								
18	SUB-BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, clase B)	m3	392,85	$ 463.599,00	$ 182.124.867,15	P			
						E			
SUBTOTAL OBRAS					**$ 1.116.928.273,00**		$ 4.817.887,48	$ 4.817.887,48	$ 4.817.887,48
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)					$ 1.413.115,00		$ 5.967,97	$ 5.967,97	$ 5.967,97
VALOR TOTAL BASICO DE OBRAS					$ 1.118.341.388,00		$ 4.823.855,45	$ 4.823.855,45	$ 4.823.855,45
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE LA UTILIDAD)					$ 8.172.495,00		$ 35.251,25	$ 35.251,25	$ 35.251,25
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					**$ 1.126.513.883,00**		**$ 4.859.106,70**	**$ 4.859.106,70**	**$ 4.859.106,70**
ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS					$ 12.000.000,00		$ 52.996,76	$ 52.996,76	$ 52.996,76
TOTAL IVA DE ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS					$ 2.280.000,00		$ 10.069,38	$ 10.069,38	$ 10.069,38
TOTAL ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS Y/O DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS					**$ 14.280.000,00**		**$ 63.066,15**	**$ 63.066,15**	**$ 63.066,15**
VALOR TOTAL					**$ 1.140.793.883,00**		**$ 4.922.172,85**	**$ 4.922.172,85**	**$ 4.922.172,85**
					VALOR PROGRAMADO		$ 4.922.172,85	$ 4.922.172,85	$ 4.922.172,85
					VALOR PROGRAMADO ACUMULADO		$ 4.922.172,85	$ 9.844.345,70	$ 14.766.518,55
					% AVANCE PROGRAMADO		0,43%	0,43%	0,43%
					% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO		0,43%	0,86%	1,29%
					VALOR PROGRAMADO ACUMULADO SEMANAL				**$99.431.709,84**
					% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO SEMANAL				**8,72%**

				SEMANA 30							
8-sep	9-sep	10-sep	11-sep	12-sp	13-sp	14-sep	15-sep	16-sep	17-sep	18-sep	19-sp
$ 4.483.400,63											
								$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13
								$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43
								$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88
$ 334.486,85											
	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16				
$ 4.817.887,48	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 26.017.838,16	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44
$ 5.967,97	$ 32.228,61	$ 32.228,61	$ 32.228,61	$ 32.228,61	$ 32.228,61	$ 32.228,61	$ 32.228,61	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25
$ 4.823.855,45	$ 26.050.066,77	$ 26.050.066,77	$ 26.050.066,77	$ 26.050.066,77	$ 26.050.066,77	$ 26.050.066,77	$ 26.050.066,77	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69
$ 35.251,25	$ 190.365,87	$ 190.365,87	$ 190.365,87	$ 190.365,87	$ 190.365,87	$ 190.365,87	$ 190.365,87	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94
$ 4.859.106,70	**$ 26.240.432,64**	**$ 26.240.432,64**	**$ 26.240.432,64**	**$ 26.240.432,64**	**$ 26.240.432,64**	**$ 26.240.432,64**	**$ 26.240.432,64**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**
$ 52.996,76	$ 286.196,22	$ 286.196,22	$ 286.196,22	$ 286.196,22	$ 286.196,22	$ 286.196,22	$ 312.214,06	$ 481.712,50	$ 481.712,50	$ 481.712,50	$ 441.569,79
$ 10.069,38	$ 54.377,28	$ 54.377,28	$ 54.377,28	$ 54.377,28	$ 54.377,28	$ 54.377,28	$ 59.320,67	$ 91.525,38	$ 91.525,38	$ 91.525,38	$ 83.898,26
$ 63.066,15	**$ 340.573,50**	**$ 340.573,50**	**$ 340.573,50**	**$ 340.573,50**	**$ 340.573,50**	**$ 340.573,50**	**$ 371.534,73**	**$ 573.237,88**	**$ 573.237,88**	**$ 573.237,88**	**$ 525.468,05**
$ 4.922.172,85	**$ 26.581.006,15**	**$ 26.581.006,15**	**$ 26.581.006,15**	**$ 26.581.006,15**	**$ 26.581.006,15**	**$ 26.581.006,15**	**$ 26.611.967,37**	**$ 41.059.385,50**	**$ 41.059.385,50**	**$ 41.059.385,50**	**$ 41.011.615,68**
$ 4.922.172,85	$ 26.581.006,15	$ 26.581.006,15	$ 26.581.006,15	$ 26.581.006,15	$ 26.581.006,15	$ 26.581.006,15	$ 26.611.967,37	$ 41.059.385,50	$ 41.059.385,50	$ 41.059.385,50	$ 41.011.615,68
$ 19.688.691,40	$ 46.269.697,55	$ 72.850.703,69	$ 99.431.709,84	$ 126.012.715,98	$ 152.593.722,13	$ 179.174.728,27	$ 205.786.695,65	$ 246.846.081,15	$ 287.905.466,66	$ 328.964.852,16	$ 369.976.467,84
0,43%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
1,73%	4,06%	6,39%	8,72%	11,05%	13,38%	15,71%	18,04%	21,64%	25,24%	28,84%	32,43%
							$328.964.852,16				
							28,84%				

SEMANA 31						SEMANA 32						
20-sp	21-sep	22-sep	23-sep	24-sep	25-sep	26-sp	27-sp	28-sep	29-sep	30-sep	1-oct	2-oct
$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13	$ 33.910.651,13
$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43	$ 5.166.802,43
$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88	$ 1.065.254,88
$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44	$ 40.142.708,44
$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25	$ 49.725,25
$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69	$ 40.192.433,69
$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94	$ 293.713,94
$ 40.486.147,63	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**	**$ 40.486.147,63**
$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79	$ 441.569,79
$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26	$ 83.898,26
$ 525.468,05	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**	**$ 525.468,05**
$ 41.011.615,68	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**	**$ 41.011.615,68**
$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68	$ 41.011.615,68
$ 410.988.083,52	$ 451.999.699,21	$ 493.011.314,89	$ 534.022.930,57	$ 575.034.546,25	$ 616.046.161,93	$ 657.057.777,61	$ 698.069.393,30	$ 739.081.008,98	$ 780.092.624,66	$ 821.104.240,34	$ 862.115.856,02	$ 903.127.471,70
3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
36,03%	39,62%	43,22%	46,81%	50,41%	54,00%	57,60%	61,19%	64,79%	68,38%	71,98%	75,57%	79,17%
$616.046.161,93						**$903.127.471,70**						
54,00%						**79,17%**						

SEMANA 33									
3-oct	4-oct	5-oct	6-oct	7-oct	9-oct	10-oct	11-oct	12-oct	13-oct
$ 688.662,86	$ 688.662,86	$ 688.662,86	$ 688.662,86	$ 688.662,86	$ 688.662,86	$ 688.662,86			
$ 632.685,71	$ 632.685,71	$ 632.685,71	$ 632.685,71	$ 632.685,71	$ 632.685,71	$ 632.685,71			
							$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03
							$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71
							$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87
$ 4.240.114,29	$ 4.240.114,29	$ 4.240.114,29	$ 4.240.114,29	$ 4.240.114,29	$ 4.240.114,29	$ 4.240.114,29			
$ 21.614,29	$ 21.614,29	$ 21.614,29	$ 21.614,29	$ 21.614,29	$ 21.614,29	$ 21.614,29			
$ 5.561.462,86	$ 5.561.462,86	$ 5.561.462,86	$ 5.561.462,86	$ 5.561.462,86	$ 5.561.462,86	$ 5.561.462,86	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61
$ 7.063,06	$ 7.063,06	$ 7.063,06	$ 7.063,06	$ 7.063,06	$ 7.063,06	$ 7.063,06	$ 6.862,52	$ 6.862,52	$ 6.862,52
$ 5.568.525,91	$ 5.568.525,91	$ 5.568.525,91	$ 5.568.525,91	$ 5.568.525,91	$ 5.568.525,91	$ 5.568.525,91	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13
$ 40.693,07	$ 40.693,07	$ 40.693,07	$ 40.693,07	$ 40.693,07	$ 40.693,07	$ 40.693,07	$ 39.537,71	$ 39.537,71	$ 39.537,71
$ 5.609.218,99	**$ 5.609.218,99**	**$ 5.609.218,99**	**$ 5.609.218,99**	**$ 5.609.218,99**	**$ 5.609.218,99**	**$ 5.609.218,99**	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**
$ 61.176,09	$ 61.176,09	$ 61.176,09	$ 66.737,55	$ 66.737,55	$ 66.737,55	$ 66.737,55	$ 59.439,17	$ 59.439,17	$ 59.439,17
$ 11.623,46	$ 11.623,46	$ 11.623,46	$ 12.680,14	$ 12.680,14	$ 12.680,14	$ 12.680,14	$ 11.293,44	$ 11.293,44	$ 11.293,44
$ 72.799,55	**$ 72.799,55**	**$ 72.799,55**	**$ 79.417,69**	**$ 79.417,69**	**$ 79.417,69**	**$ 79.417,69**	**$ 70.732,61**	**$ 70.732,61**	**$ 70.732,61**
$ 5.682.018,54	**$ 5.682.018,54**	**$ 5.682.018,54**	**$ 5.688.636,68**	**$ 5.688.636,68**	**$ 5.688.636,68**	**$ 5.688.636,68**	**$ 5.520.693,45**	**$ 5.520.693,45**	**$ 5.520.693,45**
$ 5.682.018,54	$ 5.682.018,54	$ 5.682.018,54	$ 5.688.636,68	$ 5.688.636,68	$ 5.688.636,68	$ 5.688.636,68	$ 5.520.693,45	$ 5.520.693,45	$ 5.520.693,45
$ 908.809.490,24	$ 914.491.508,78	$ 920.173.527,32	$ 925.862.164,00	$ 931.550.800,67	$ 937.239.437,35	$ 942.928.074,03	$ 948.448.767,48	$ 953.969.460,93	$ 959.490.154,37
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,48%	0,48%	0,48%
79,66%	80,16%	80,66%	81,16%	81,66%	82,16%	82,66%	83,14%	83,62%	84,11%
			$942.928.074,03						
			82,66%						

SEMANA 34				SEMANA 35						
14-oct	15-oct	16-oct	17-oct	18-oct	19-oct	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct
$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03
$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71
$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87
$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61	$ 5.403.560,61
$ 6.862,52	$ 6.862,52	$ 6.862,52	$ 6.862,52	$ 6.862,52	$ 6.862,52	$ 6.862,52	$ 6.862,52	$ 6.862,52	$ 6.862,52	$ 6.862,52
$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13	$ 5.410.423,13
$ 39.537,71	$ 39.537,71	$ 39.537,71	$ 39.537,71	$ 39.537,71	$ 39.537,71	$ 39.537,71	$ 39.537,71	$ 39.537,71	$ 39.537,71	$ 39.537,71
$ 5.449.960,84	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**	**$ 5.449.960,84**
$ 64.842,73	$ 64.842,73	$ 64.842,73	$ 64.842,73	$ 59.439,17	$ 59.439,17	$ 59.439,17	$ 64.842,73	$ 64.842,73	$ 64.842,73	$ 64.842,73
$ 12.320,12	$ 12.320,12	$ 12.320,12	$ 12.320,12	$ 11.293,44	$ 11.293,44	$ 11.293,44	$ 12.320,12	$ 12.320,12	$ 12.320,12	$ 12.320,12
$ 77.162,85	**$ 77.162,85**	**$ 77.162,85**	**$ 77.162,85**	**$ 70.732,61**	**$ 70.732,61**	**$ 70.732,61**	**$ 77.162,85**	**$ 77.162,85**	**$ 77.162,85**	**$ 77.162,85**
$ 5.527.123,68	**$ 5.527.123,68**	**$ 5.527.123,68**	**$ 5.527.123,68**	**$ 5.520.693,45**	**$ 5.520.693,45**	**$ 5.520.693,45**	**$ 5.527.123,68**	**$ 5.527.123,68**	**$ 5.527.123,68**	**$ 5.527.123,68**
$ 5.527.123,68	$ 5.527.123,68	$ 5.527.123,68	$ 5.527.123,68	$ 5.520.693,45	$ 5.520.693,45	$ 5.520.693,45	$ 5.527.123,68	$ 5.527.123,68	$ 5.527.123,68	$ 5.527.123,68
$ 965.017.278,06	$ 970.544.401,74	$ 976.071.525,43	$ 981.598.649,11	$ 987.119.342,56	$ 992.640.036,01	$ 998.160.729,45	$ 1.003.687.853,14	$ 1.009.214.976,82	$ 1.014.742.100,51	$ 1.020.269.224,19
0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
84,59%	85,08%	85,56%	86,05%	86,53%	87,01%	87,50%	87,98%	88,47%	88,95%	89,44%
$981.598.649,11							**$1.020.269.224,19**			
86,05%							**89,44%**			

SEMANA 36						
25-oct	26-oct	27-oct	28-oct	29-oct	30-oct	31-oct
$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03	$ 3.273.917,03
$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71	$ 291.277,71
$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87	$ 1.838.365,87

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3763 DE 2024 **CONTRATISTA:** GAMA INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA GAITANIA - MARQUETALIA, CODIGO INVIAS 30100 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEL DPTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO: 25/11/2025

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/08/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.140.793.883,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.140.793.883,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14.280.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 14.280.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2633 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ARCONS INGENIEROS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114.079.388,00	16	9	2024	16	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228.158.777,00	16	9	2024	16	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342.238.165,00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00	16	9	2024	16	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 1/10/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	17 (Día)	9 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114.079.388,00	16	9	2024	25	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228.158.777,00	16	9	2024	25	4	2028
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342.238.165,00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00	16	9	2024	25	4	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114.079.388,00	16	9	2024	27	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228.158.777,00	16	9	2024	27	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342.238.165,00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00	16	9	2024	22	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17 (Día) 9 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114.079.388,00	16	9	2024	25	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228.158.777,00	16	9	2024	25	6	2028
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342.238.165,00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00	16	9	2024	10	7	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17 (Día) 9 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114.079.388,00	16	9	2024	27	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228.158.777,00	16	9	2024	27	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342.238.165,00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00	16	9	2024	22	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/08/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17 (Día) 9 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 114.079.388,00	16	9	2024	9	2	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 228.158.777,00	16	9	2024	9	8	2028
Calidad de Estudios y Diseños	0		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 342.238.165,00	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101139833

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 260.000.000,00	16	9	2024	30	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101052642 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: YHON ALEXANDER GUTIERREZ GARCIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-282864

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
