
OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA /U	$ 1.664.996.493	Plazo Inicial	2 Meses	Suspensión 1	6-jun-25
Fecha Corte	22-sep-25	Fecha Inicio	9-abr-25	Reinicio 1	19-jun-25
		Fecha Fin	30-sep-25	Prorroga 1	1 mes
				Prorroga 2	15 dias
				Prorroga 3	8 dias

	ACUM. ANTERIOR		PRESENTE SEMANA		ACUM. TOTAL	
	$	%	$	%	$	%
PROGRAMADO	$ 1.441.437.776	86,57%	$ 83.347.973	5,01%	$ 1.524.785.748	91,58%
AVANCE REAL	$ 1.561.666.102	93,79%	$ 20.000.475	1,20%	$ 1.581.666.577	95,00%
VARIACION	$ 120.228.326	7,22%	-$ 63.347.498	-3,80%	$ 56.880.829	3,42%

PROG. PROXIMA SEMANA	$ 55.356.306

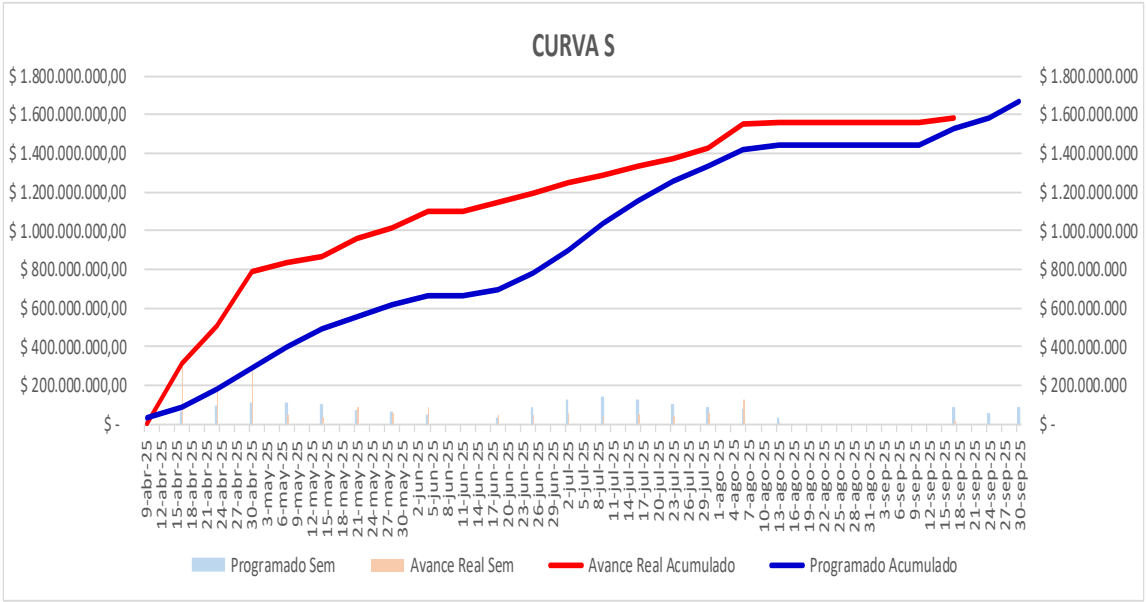

BALANCE SEGÚN AVANCE REAL				
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.188.748.997			Incidencia (%)
VALOR ADICION 1	$ 417.945.303			
VALOR ADICION 2	$ 58.302.193			
VALOR AVANCE CONTRACTUAL		$	1.524.785.748	91,58%
VALOR AVANCE		$	1.581.666.577	95,00%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$	1.581.666.577	95,00%
SALDO POR EJECUTAR		$	83.329.916	5,00%
SUMAS IGUALES	$ 1.664.996.493	$	1.664.996.493	100,00%
