ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	2-sep-25	**ACTA No.**	**43**
HORA DE INICIO:	10:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Contarto de obra 139-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos acta anterior

1.Se informa los compromisos del acta anterior Nº40.
-Informe Alcantarillas seleccionadas para intervencíon o construcción
Alcantarillas - La Palma - Se presentó informe por parte del contratista el 26 de agosto 2025, donde informan construcción de 13 alcantarillas.

En cuanto a los demas tramos no se ha recibido información, se informa por el contratista que estaría entregando en las fechas que se mencionan a continuación. Se informa por parte del ICCU preocupación por el tema de que las fechas se están extendiendo.

Topaipi - Villagomez 9 septiembre 2025. Yacopi - 19 sep 2025.

Provincia Ubate - Ubate y Susa entrega informa - 4 sep 2025.

Provincia Almeidas - manta 4 asep 2025 y Choconta sesquile - 8 sep 2025.

Se informa por el contratista que ya culminó con los recorridos de selecciòn de alcantarillas para ejecución, la Interventoría indica que no se informó para el acompañamiento de los demas tramos, solo se informó para la provincia de Río Negro.

-Limpieza de alcantarillas

Se informa por parte de Interventoría que no se ha dado inicio nuevamente a las actividades de mantenimiento y limpieza de alcantarillas. se informa por parte del contratista que hoy remitirá solicitud para pasar al ingeniero inspector a ingeniero residente y remitirán otra HV para inspector. Se informan las siguientes fechas:

	Cronograma Ejecución YVY-173-25		Fechas actuales propuestas
PROGRAMACION	LIMPIEZA ALCANTARILLAS	ESTADO ACTUAL	
UBATÉ	15-jul-25	Inició el 14 de julio	
SUSA	15-jul-25	Inició 16 jul 2025 - no se ha registrado actividad desde 1 ago 2025. - Informan que terminan las 2 alcantarillas que faltan.	Semana del 2 al 5 de 2025
TAUSA	17-sep-25		
SIMIJACA	29-oct-25		Se informa que las 2 estructuras hidraulicas que aparecen son 2 compuertas por lo que no se intervienen para limpieza y mantenimiento.
CHOCONTA	30-jul-25	No ha iniciado	8-sep-25
SESQUILE	30-sep-25		8-sep-25
MANTA	15-jul-25	Inició 22 jul 2025 - En ejecución-	
VILLAGOMEZ	14-ago-25	No ha iniciado	15-sep-25
LA PALMA	5-ago-25	No ha iniciado	8-sep-25
TOPAIPI	4-ago-25	No ha iniciado	15-sep-25
YACOPI	27-ago-25	No ha iniciado	22-sep-25

*PMT

Al respecto no se ha recibido información, se informa por parte del contratista informa que se estarían entregando en las fechas que se mencionan a continuaciòn. Se solicita por parte de Interventoría dar prioridad a las vías que estan proyectadas para dar inicio.

PMT Mantenimiento rutinario - 3 y 6 de septiembre 2025.
PMT Ejecución Intervención Rasante - Susa 9 de septiembre 2025.

-Sitios criticos -Diagnóstico-

Se informa por parte de Interventoría que se recibió el informe de visitas a los tramos, sin embargo no como tal un diagnóstico de los sectores críticos o de exclusión.Se informa por el contratista que se remitirá un informe consolidado.

*Diseños

Se informa por la Interventoría que el día de hoy Se remitió comunicado ICCU-S-215-2025 con las anotaciones por parte de los especialistas en relación al informe de diseño recibido y la grabación de la reunión donde se informó las observaciones por parte del área de pavimentos y adicional las observaciones del área de Geotecnía sobre los informes de visitas.

Respuesta por parte del contartista a las observaciones socializadas en mesa de trabajo 1 sep 2025 y en comunicado del 2 de septiembre 2025. El contratista realizará la verificaciòn con sus especialistas y dará fecha de respuesta el día 3 de septiembre 2025.

Contratista informa que los municipios que estrían cumpliendo con la resistencia de 1Mpa son :

Susa
Simijaca
Manta
La Palma

Tramos que no estarían cumpliendo:

Yacopi está en 0,96
Choconta 0,42
Sesquile 0,33
Villagomez 0,45
Tausa
Topaipi

Se informa por el contratista que Sesquile es por el momento el caso mas critico con 0,33 de resistencia con Proroad

*Ensayos de tramos que no estarían cumpliendo con la resistencia

Se informa por parte del contratista que se estarán realizando pruebas para los tramos que no están cumpliendo. Se consulta por el ICCU si por las caracteristicas del tramo donde visulmente se evidencia material granular si se ha pensado en adicionar material fino, se informa por el contratista que teniendo en cuenta la dificultad de acceso se trabajaría por ejemplo en Yacopi con un cambio en la formula de trabajo del estabilisante ya que se encuentra cercano al 1MPa.
Se espera ejecución de ensayos de compresón el miercoles 10 septiembre 2025 y el informe respectivo viernes 12 septiembre 2025 para estos tramos.

*Actividades para inicio de Intervención

Se solicita por parte del ICCU dar celeridad a la información requerida para inicio de ejecución en los tramos seleccionados para inicio. Como el caso de Susa.

* Fuentes de material

Sector Ubate
Sutatausa y Cucunuba se informa por el contratista que el dia 1 sep 2025 se llevo la muestra a laboratorio. Fecha entrega informe 5 sep 2025.

Sector Río negro
Se informa que debido al factor climatico la muestra se encuentra contaminada a la fecha por lo que no se ha podido realizar el muestreo en la fuente El Castillo. Tan pronto se encuentre en estado optimo la muestra para recolecciòn serà enviada a laboratorio.

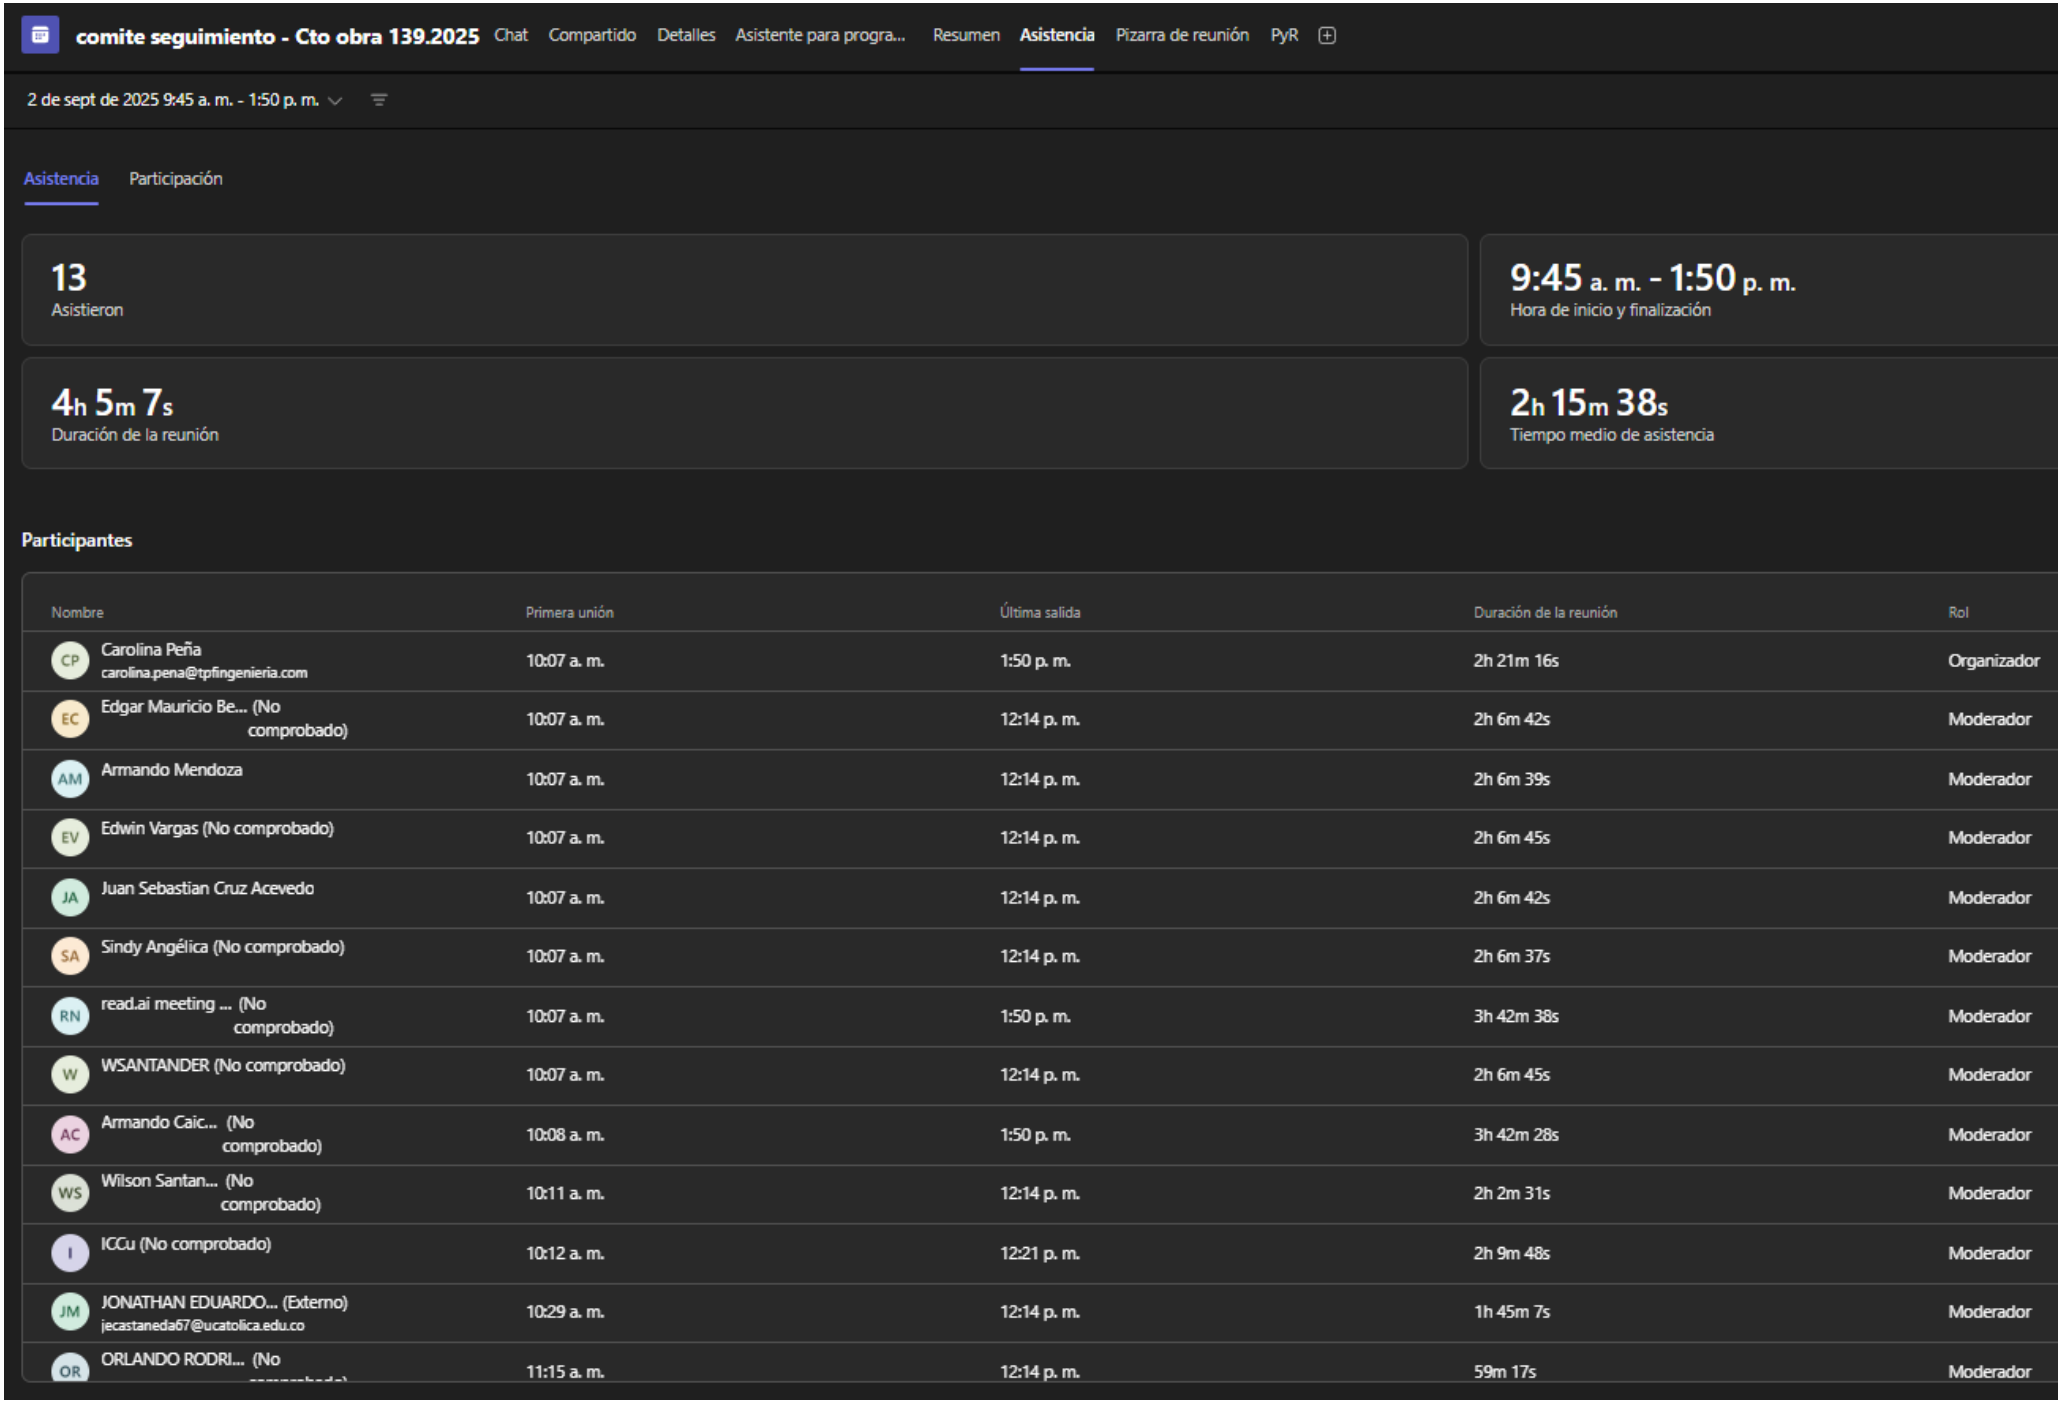
* Solicitud fichas excel - inventarios -
Se solicita por interventoria al contratista favor remitir excel de las fichas excel de Inventarios para poder ser subidas a la nube del proyecto.

*Ejecución caracterización Simijaca - sector con pavimento en mal estado.
3 sep 2025 entregan respuesta a las observaciones.

*Cuentas de caracterización presentadas por el contratista
Se informa por parte de Interventoría que la cuenta 3 corresponde a un 50% de ejecución de caracterización y a la fecha el porcentaje es de 46%

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**23/02/2025**

CONCLUSIONES	
Las mencionadas en el acta.	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:	
COMPROMISOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Los consignados en el acta.	
ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.	


comite seguimiento - Cto obra 139.2025
Chat
Compartido
Detalles
Asistente para progra...
Resumen
Asistencia
Pizarra de reunión
PyR
2 de sept de 2025 9:45 a. m. - 1:50 p. m.
Asistencia
Participación
13
Asistieron
9:45 a. m. - 1:50 p. m.
Hora de inicio y finalización
4h 5m 7s
Duración de la reunión
2h 15m 38s
Tiempo medio de asistencia
Participantes
Nombre
Primera unión
Última salida
Duración de la reunión
Rol
CP Carolina Peña carolina.pena@tpfingenieria.com 10:07 a. m. 1:50 p. m. 2h 21m 16s Organizador
EC Edgar Mauricio Be... (No comprobado) 10:07 a. m. 12:14 p. m. 2h 6m 42s Moderador
AM Armando Mendoza 10:07 a. m. 12:14 p. m. 2h 6m 39s Moderador
EV Edwin Vargas (No comprobado) 10:07 a. m. 12:14 p. m. 2h 6m 45s Moderador
JA Juan Sebastian Cruz Acevedo 10:07 a. m. 12:14 p. m. 2h 6m 42s Moderador
SA Sindy Angélica (No comprobado) 10:07 a. m. 12:14 p. m. 2h 6m 37s Moderador
RN read.ai meeting ... (No comprobado) 10:07 a. m. 1:50 p. m. 3h 42m 38s Moderador
W WSANTANDER (No comprobado) 10:07 a. m. 12:14 p. m. 2h 6m 45s Moderador
AC Armando Caic... (No comprobado) 10:08 a. m. 1:50 p. m. 3h 42m 28s Moderador
WS Wilson Santan... (No comprobado) 10:11 a. m. 12:14 p. m. 2h 2m 31s Moderador
I ICCu (No comprobado) 10:12 a. m. 12:21 p. m. 2h 9m 48s Moderador
JM JONATHAN EDUARDO... (Externo) jecastaneda67@ucatolica.edu.co 10:29 a. m. 12:14 p. m. 1h 45m 7s Moderador
OR ORLANDO RODRI... (No 11:15 a. m. 12:14 p. m. 59m 17s Moderador
