INFORME ACTA 1

INVAMA

Manizales septiembre 30 de 2025

CONTRATO 250828098

OBJETO:

“ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA LAS INTERVENCIONES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CONTINUIDAD, MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN”

Calle 72ª Nro. 27ª 60
Manizales, Colombia
Telefono: + 57 606 885 62 22
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	"ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA LAS INTERVENCIONES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CONTINUIDAD, MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN"
Contrato de Obra Nro.	250828098
Contratista:	INGELECOM S.A.S. Nit 900489515-5
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2025 a partir del Acta de inicio
Fecha de Inicio:	1 de septiembre de 2025
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2025
Valor contrato Inicial:	$ 232.912.150.oo
Valor Adiciones:	$ -0-
Valor Actualizado:	$ 232.912.150.oo
Valor Actas Anteriores:	$ -0-
Valor Presente Acta:	$ 52.237.430.oo
Valor por ejecutar:	$ 180.674.720.oo
Porcentaje ejecución:	22.43%
ACTIVIDADES EJECUTADAS:	1. Instalación y desmonte de luminarias en los siguientes barrios: • Puerta del Sol • El Nevado • Bajo Andes • Andes • Las Águilas

Calle 72ª Nro. 27ª 60
Manizales, Colombia
Telefono: + 57 606 885 62 22
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co

	• El Galán • San Ignacio • Sinai • Porvenir • Comuneros 2. En la pista de BMX se realizó el montaje de: • Estructuras para montaje de reflectores. • Instalación de red trenzada. • Montaje de reflectores. 3. En EXPOFERIAS se realizaron las siguientes actividades: • Ahoyado para postes. • Hincado de postes. • Estructuras para montaje de reflectores. • Instalación de red trenzada. • Montaje de reflectores. • Montaje de luminarias. 4. En el taller de INVAMA se han ejecutado las siguientes actividades: • Dimerización de luminarias. • Chatarrización de lámparas.

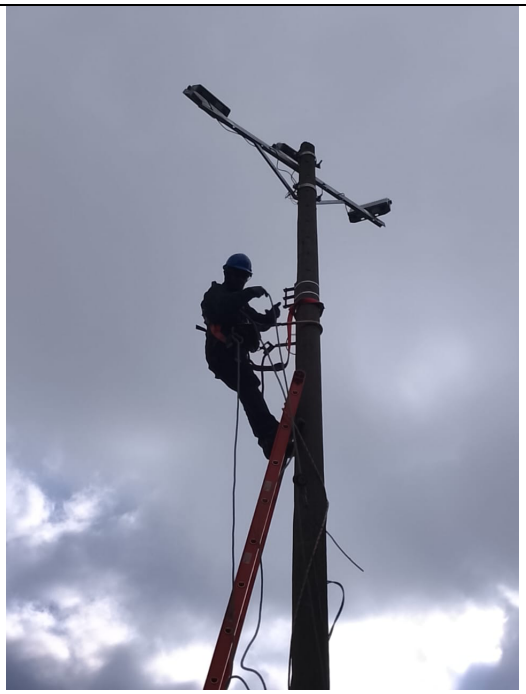
Calle 72ª Nro. 27ª 60
Manizales, Colombia
Telefono: + 57 606 885 62 22
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co

REGISTRO FOTOGRAFICO

MONTAJE DE LUMINARIAS	MONTAJE DE LUMINARIAS
	

DESMONTE DE LUMINARIAS	DESMONTE DE LUMINARIAS
	

Calle 72ª Nro. 27ª 60
Manizales, Colombia
Telefono: + 57 606 885 62 22
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co

MONTAJE RED ALUMBRADO PUBLICO	MONTAJE REFLECTORES
	

CONCLUSIONES

1. Las labores se han ejecutado de acuerdo con la programación de INVAMA.
2. Todas las actividades ejecutadas se han realizado bajo la norma RETIE y RETILAP.
3. Todo el personal empleado cuenta con sus respectivas afiliaciones, cursos en altura y herramientas necesarias para la ejecución del objeto contractual.

JORGE HERNAN LONDOÑO
Ingeniero Electricista

Calle 72ª Nro. 27ª 60
Manizales, Colombia
Telefono: + 57 606 885 62 22
Movil : 320 692 69 61
gerencia@ingelecom.co / comercial@ingelecom.co
