PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, LEY 1150 DE 2007, 1607 DE 2012 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1828 Y 3048 DE 2013.

CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ, identificado con cedula de ciudadanía No 86.075.316 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal de PROINGENIARQ S.A.S. identificada con Nit 901.388.628-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, y JUAN CARLOS FERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 74.181.703 de Sogamoso T.P. 121958-T, en mi condición de Contador Público, certificamos el pago de los aportes realizados por PROINGENIARQ S.A.S., durante el periodo de ejecución del **No CO1.PCCNTR.7755228 DE 2025** – El cual tiene como objeto **OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.** celebrado entre Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Proingeniarq S.A.S, del 28 de abril, del año 2025 al 30 de junio del año 2025, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Anexo cuadro relación personal parafiscales.

Se firma en la ciudad de Yopal el día catorce (14) del mes de julio del año 2025.

Firma
Cristhian Javier Guerra Diaz
C.C.86.075.316 de Villavicencio
R/L: Proingeniarq S.A.S

Firma
Juan Carlos Fernández
C.C. 74.181.703 de Sogamoso
T.P. 121958-T
Contador

PROINGENIARQ S.A.S. NIT 901388628-9

No CO1.PCCNTR.7755228 DEL 2005

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

PERIODO	IBC	PENSION		SALUD		ARL	CCF	PLANILLA No	NOMBRE EMPLEADO
		VR LIQUIDADO	AFP	VR LIQUIDADO	EPS	POSITIVA	VR LIQUIDADO		
ABRIL 2025	142.350	22.800	Porvenir	5.700	Nueva EPS	10.000	5.700	7970636506	DAYANA FERNANDA TORRES SANABRIA
	142.350	22.800	Porvenir	5.700	Sanitas	10.000	5.700		LEONARD DAVID ACEVEDO CIFUENTES
	142.350	22.800	Porvenir	5.700	Nueva EPS	10.000	5.700		JAINOBER ALBERTO DIAZ MERIZALDE
	142.350	22.800	Porvenir	5.700	Nueva EPS	10.000	5.700		WILFRAN GUTIERREZ TORRES
	569.400	91.200		22.800		40.000	22.800		
MAYO 2025	1.423.500	227.800	Porvenir	57.000	Nueva EPS	99.100	57.000	1748165060	DAYANA FERNANDA TORRES SANABRIA
	2.900.000	464.000	Porvenir	116.000	Sanitas	201.900	116.000		LEONARD DAVID ACEVEDO CIFUENTES
	1.423.500	227.800	Colpensiones	57.000	Nueva EPS	99.100	57.000		JAINOBER ALBERTO DIAZ MERIZALDE
	1.423.500	227.800	Porvenir	57.000	Nueva EPS	99.100	57.000		WILFRAN GUTIERREZ TORRES
	7.170.500	1.147.400		287.000		499.200	287.000		
JUNIO 2025	1.423.500	227.800	Porvenir	57.000	Nueva EPS	99.100	57.000	1748427669	DAYANA FERNANDA TORRES SANABRIA
	1.423.500	227.800	Porvenir	57.000	Sanitas	99.100	57.000		LEONARD DAVID ACEVEDO CIFUENTES
	1.423.500	227.800	Porvenir	57.000	Sanitas	99.100	57.000	7977662619	ERIKA JOHANA ESPITIA PERILLA
	1.423.500	227.800	Porvenir	57.000	Nueva EPS	99.100	57.000		WILFRAN GUTIERREZ TORRES
	5.694.000	911.200		228.000		396.400	228.000		

Firma
Cristhian Javier Guerra Díaz
C.C.86.075.316 de Villavicencio
R/L: Proingeniarq S.A.S

Firma
Juan Carlos Fernández
C.C. 74.181.703 de Sogamoso
T.P. 121958-T
Contador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F1086DEA96D6C7E499

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74181703 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 121958-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

121958-T



JUAN CARLOS
FERNANDEZ
C.C. 74181703
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.

PRESIDENTE

HECTOR JAIME CORREA PINZON 131849

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:		CARRERA 20 N 27 - 18 TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1748427669**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		519062

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 684.700
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 228.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 2.289.900
		SUBTOTAL:	15	**$ 3.202.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 628.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 287.500
		SUBTOTAL:	17	**$ 915.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	17	$ 923.700
		SUBTOTAL:	17	**$ 923.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 1.592.000
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.592.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.621.600**
VALOR MORA:	**$ 12.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.634.300**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELEFONO:	6334176
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1748427669	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			519062

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 683.400	$ 1.300	$ 2.289.900
230301	230301-PORVENIR	11	$ 2.285.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 2.285.600	$ 4.300	$ 228.300
230301	230301-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 227.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.900	$ 500	$ 3.202.900
SUBTOTALES:										$ 3.196.800	$ 6.100	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 286.900	$ 0	$ 600	$ 0	$ 286.900	$ 600	$ 0	$ 287.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 627.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 627.000	$ 1.200	$ 0	$ 628.200
SUBTOTALES:													$ 913.900	$ 1.800	$ 0	$ 915.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.589.000	$ 1.589.000	$ 3.000	$ 0	$ 1.592.000
SUBTOTALES:									$ 1.589.000	$ 3.000	$ 0	$ 1.592.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	17	$ 921.900	$ 1.800	$ 923.700
SUBTOTALES:			$ 921.900	$ 1.800	$ 923.700

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD							ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1116548250	TORRES SANABRIA DAYANA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1118543254	OVALLE ALVAREZ JORGE LUIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1118545552	ACEVEDO CIFUENTES LEONARD DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1122653067	TAPIERO VALENCIA BSHARON LEONELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 17348699	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 19174142	RAMIREZ OCAMPO JAIME	DEPEND	NO OBLIG COT PENSIOAD	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARO S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1748427669	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	519062

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:		CARRERA 20 N 27 - 18 TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7977682619 TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025 SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1621634357

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 7.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 685.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 228.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	16	$ 1.857.500
		SUBTOTAL:	21	**$ 2.778.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 285.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 122.000
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	6	$ 287.700
		SUBTOTAL:	21	**$ 695.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	21	$ 699.700
		SUBTOTAL:	21	**$ 699.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 1.209.700
		SUBTOTAL:	21	**$ 1.209.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.369.600**
VALOR MORA:	**$ 14.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.383.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7977682619	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			4		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1621634357

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 7.600	$ 100	$ 7.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 683.400	$ 1.800	$ 685.200
230301	230301-PORVENIR	16	$ 1.852.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 1.852.800	$ 4.700	$ 1.857.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 227.800	$ 600	$ 228.400
SUBTOTALES:										$ 2.771.600	$ 7.200	$ 2.778.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 285.000	$ 800	$ 0	$ 285.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 121.600	$ 0	$ 400	$ 0	$ 121.600	$ 400	$ 0	$ 122.000
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 286.900	$ 0	$ 800	$ 0	$ 286.900	$ 800	$ 0	$ 287.700
SUBTOTALES:													$ 693.500	$ 2.000	$ 0	$ 695.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.206.600	$ 1.206.600	$ 3.100	$ 0	$ 1.209.700
SUBTOTALES:									$ 1.206.600	$ 3.100	$ 0	$ 1.209.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	21	$ 697.900	$ 1.800	$ 699.700
SUBTOTALES:			$ 697.900	$ 1.800	$ 699.700

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES										
																											PENSIÓN								SALUD								ARP																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARO S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELEFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7977682619	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1621634357		

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1116801585	CONTRERAS SAENZ DANILO ORLANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 57.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1118121777	ESPITIA PERILLA ERIKA JOHANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1118552421	ARDILA ACHAGUA TUKSON WILFRED	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 57.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1118570714	FAN BONILLA GLORIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1120870210	BRAVO ROLDAN ROBINSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	05	05															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF69-COMFACASANARE	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 71994634	PEREZ CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 57.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 7228537	SOCADAGUA PEREZ JORGE ERNESTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 7231995	BARRERA MUNOZ DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	19	10															230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 57.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 7408289	CARO BENAVIDES PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 87.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 74814916	RINCON RINCON JUAN GABRIEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 74858538	CRISTANCHO CARVAJAL JOSE NEMEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 80090925	GUTIERREZ TORRES WILFRAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 86074707	DELGADO DIAZ CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7977682619
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:			4
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/11
TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025	
NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1621634357

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 93377461	TRIANA ALVAREZ PEDRO EXEHOMO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	05																	230301-PORVENIR	28	$ 1.233.700	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.233.700		$ 85.900	28	$ 1.233.700	55CCF69-COMFACASANARE	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 9430653	RINCON RINCON FREDY NARDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	55CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.383.700

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

CERTIFICADO DE EXONERACION DE APORTE PERSONA JURIDICA

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, LEY 1150 DE 2007, 1607 DE 2012 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1828 Y 3048 DE 2013

Yopal Casanare, junio 13 del año 2025

Yo, JUAN CARLOS FERNÁNDEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 74.181.703 de Sogamoso T.P. 121958-T, en mi condición de Contador Público, de PROINGENIARQ S.A.S. Nit 901.388.628-9 representante legal CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ identificado con cedula de ciudadanía No 86.075.316 de Villavicencio.

CERTIFICO

PROINGENIARQ S.A.S Nit 901.388.628-9, se encuentra exonerado de la cotización a salud y pagos de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) conforme a lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley 1819 de 29 de diciembre del 2016 – Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Firma: _____
Cristhian Javier Guerra Diaz
C.C.86.075.316 de Villavicencio
R/L: Proingeniarq S.A.S

Firma _____
Juan Carlos Fernández
C.C. 74.181.703 de Sogamoso
T.P. 121958-T
Contador

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, LEY 1150 DE 2007, 1607 DE 2012 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1828 Y 3048 DE 2013.

CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ, identificado con cedula de ciudadanía No 86.075.316 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal de PROINGENIARQ S.A.S. identificada con Nit 901.388.628-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, y JUAN CARLOS FERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 74.181.703 de Sogamoso T.P. 121958-T, en mi condición de Contador Público, certificamos el pago de los aportes realizados por PROINGENIARQ S.A.S., durante el periodo de ejecución del **No CO1.PCCNTR.7755228 DE 2025** – El cual tiene como objeto **OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.** celebrado entre Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Proingeniarq S.A.S, del 28 de abril, del año 2025 al 31 de mayo del año 2025, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Anexo cuadro relación personal parafiscales.

Se firma en la ciudad de Yopal el día trece (13) del mes de junio del año 2025.

Firma_____
Cristhian Javier Guerra Díaz
C.C.86.075.316 de Villavicencio
R/L: Proingeniarq S.A.S

Firma_____
Juan Carlos Fernández
C.C. 74.181.703 de Sogamoso
T.P. 121958-T
Contador

PROINGENIARQ S.A.S. NIT 901388628-9

No CO1.PCCNTR.7755228 DEL 2005

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

PERIODO	IBC	PENSION		SALUD		ARL	CCF	PLANILLA No	NOMBRE EMPLEADO
		VR LIQUIDADO	AFP	VR LIQUIDADO	EPS	POSITIVA	VR LIQUIDADO		
ABRIL 2025	142.350	22.800	Porvenir	5.700	Nueva EPS	10.000	5.700	7970636506	DAYANA FERNANDA TORRES SANABRIA
	142.350	22.800	Porvenir	5.700	Sanitas	10.000	5.700		LEONARD DAVID ACEVEDO CIFUENTES
	142.350	22.800	Porvenir	5.700	Nueva EPS	10.000	5.700		JAINOBER ALBERTO DIAZ MERIZALDE
	142.350	22.800	Porvenir	5.700	Nueva EPS	10.000	5.700		WILFRAN GUTIERREZ TORRES
	569.400	91.200		22.800		40.000	22.800		
MAYO 2025	1.423.500	227.800	Porvenir	57.000	Nueva EPS	99.100	57.000	1748165060	DAYANA FERNANDA TORRES SANABRIA
	2.900.000	464.000	Porvenir	116.000	Sanitas	201.900	116.000		LEONARD DAVID ACEVEDO CIFUENTES
	1.423.500	22.800	Colpensiones	57.000	Nueva EPS	99.100	57.000		JAINOBER ALBERTO DIAZ MERIZALDE
	1.423.500	227.800	Porvenir	57.000	Nueva EPS	99.100	57.000		WILFRAN GUTIERREZ TORRES
	7.170.500	942.400		287.000		499.200	287.000		

Firma
Cristhian Javier Guerra Díaz
C.C.86.075.316 de Villavicencio
R/L: Proingeniarq S.A.S

Firma
Juan Carlos Fernández
C.C. 74.181.703 de Sogamoso
T.P. 121958-T
Contador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F10860EA9D60C7E49

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74181703 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 121958-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
121958-T

JUAN CARLOS
FERNANDEZ
C.C. 74181703
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZON 131849

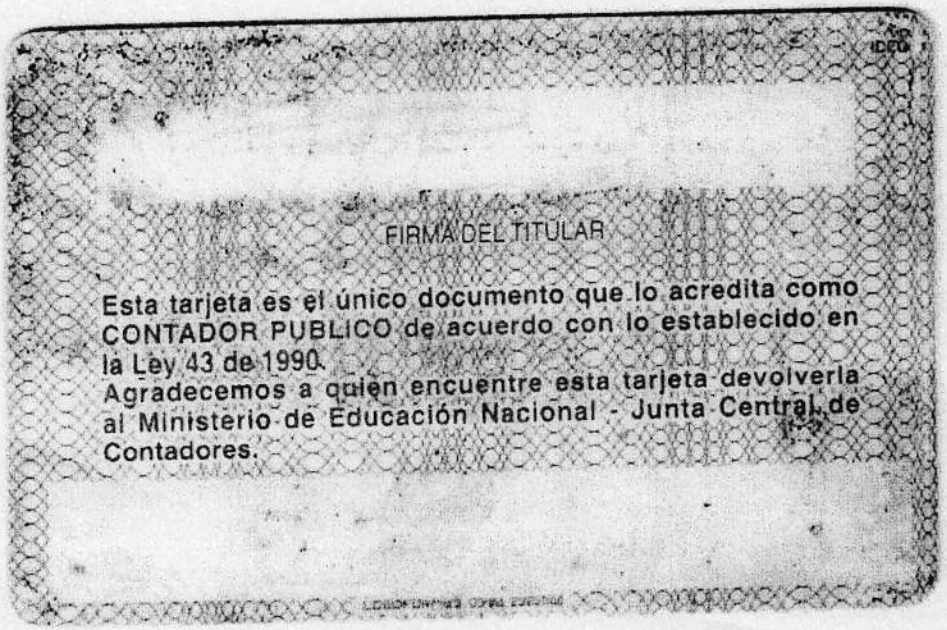

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1748165060	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	513888

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.290.400
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 228.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.347.100
		SUBTOTAL:	19	**$ 4.865.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	13	$ 852.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 479.400
		SUBTOTAL:	21	**$ 1.331.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	21	$ 1.525.000
		SUBTOTAL:	21	**$ 1.525.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 2.315.700
		SUBTOTAL:	21	**$ 2.315.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 10.018.400**
VALOR MORA:	**$ 19.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 10.038.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARO S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELEFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1748165060	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	513888

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	14	$ 3,340,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,500	$ 0	$ 3,340,600	$ 6,500	$ 3,347,100
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227,800	$ 500	$ 228,300
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1,287,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,500	$ 0	$ 1,287,900	$ 2,500	$ 1,290,400
SUBTOTALES:										$ 4,856,300	$ 9,500	$ 4,865,800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	13		$ 0		$ 0		$ 0	$ 850,500	$ 0	$ 1,700	$ 0	$ 850,500	$ 1,700	$ 0	$ 852,200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 478,400	$ 0	$ 1,000	$ 0	$ 478,400	$ 1,000	$ 0	$ 479,400
SUBTOTALES:													$ 1,328,900	$ 2,700	$ 0	$ 1,331,600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2,311,200	$ 2,311,200	$ 4,500	$ 0	$ 2,315,700
SUBTOTALES:									$ 2,311,200	$ 4,500	$ 0	$ 2,315,700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	21	$ 1,522,000	$ 3,000	$ 1,525,000
SUBTOTALES:			$ 1,522,000	$ 3,000	$ 1,525,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1020712827	PADILLA PLATA FREDY MAURICIO	DEPEND		$ 4,626,375	FIJO		SI	08																	230301-PORVENIR	8	$ 1,233,700	$ 197,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197,400	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 1,233,700	$ 49,400	$ 0	$ 49,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 1,233,700		$ 85,900	8	$ 1,522,900	SCCF69-COMFACASANARE	$ 61,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1116548250	TORRES SANABRIA CAYANA FERNANDA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500		$ 99,100	30	$ 1,423,500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1118542254	OVALLE ALVAREZ JORGE LUIS	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		SI	02																	230301-PORVENIR	2	$ 94,900	$ 15,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15,200	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 94,900	$ 3,800	$ 0	$ 3,800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 94,900		$ 6,700	2	$ 348,000	CCF69-COMFACASANARE	$ 14,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1118542254	OVALLE ALVAREZ JORGE LUIS	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		SI	22																	230301-PORVENIR	9	$ 427,050	$ 68,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68,400	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 427,050	$ 17,100	$ 0	$ 17,100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 427,050		$ 29,800	9	$ 427,050	CCF69-COMFACASANARE	$ 17,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1118545552	ACEVEDO CIFUENTES LEONARD DAVID	DEPEND		$ 2,900,000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2,900,000	$ 464,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,900,000	$ 116,000	$ 0	$ 116,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,900,000		$ 201,900	30	$ 2,900,000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 116,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1122853067	TAPIERO VALENCIA BISHARON LEONELA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		SI	01																	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500		$ 99,100	30	$ 1,423,500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1748165060		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		513888

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1748165060	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	513888

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:		CARRERA 20 N 27 - 18 TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7970636506**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1474880625

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.226.800
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 228.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	15	$ 3.666.800
		SUBTOTAL:	21	**$ 6.122.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	13	$ 1.094.900
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 57.200
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 2.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 491.600
		SUBTOTAL:	23	**$ 1.645.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	23	$ 1.694.200
		SUBTOTAL:	23	**$ 1.694.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 2.852.600
		SUBTOTAL:	23	**$ 2.852.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.281.900**
VALOR MORA:	**$ 32.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.314.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7970636506	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			4		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1474880625

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	15	$ 3,657,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,600	$ 0	$ 3,657,200	$ 9,600	$ 3,666,800
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 227,800	$ 600	$ 228,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2,220,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,900	$ 0	$ 2,220,900	$ 5,900	$ 2,226,800
SUBTOTALES:										$ 6,105,900	$ 16,100	$ 6,122,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 490,300	$ 0	$ 1,300	$ 0	$ 490,300	$ 1,300	$ 0	$ 491,600
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57,000	$ 200	$ 0	$ 57,200
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1,900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1,900	$ 100	$ 0	$ 2,000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	13		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1,092,000	$ 0	$ 2,900	$ 0	$ 1,092,000	$ 2,900	$ 0	$ 1,094,900
SUBTOTALES:													$ 1,641,200	$ 4,500	$ 0	$ 1,645,700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2,845,100	$ 2,845,100	$ 7,500	$ 0	$ 2,852,600
SUBTOTALES:									$ 2,845,100	$ 7,500	$ 0	$ 2,852,600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	23	$ 1,689,700	$ 4,500	$ 1,694,200
SUBTOTALES:			$ 1,689,700	$ 4,500	$ 1,694,200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARQ S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7970636506	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1474880825

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 19174142	RAMIREZ OCAMPO JAIME	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.423.500	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 24228402	CASTELLANOS PINTO YAIRO MILENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	MIN001-ADRES	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 760.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 23366230	SUAREZ REYES DIANA MERCEDES	DEPEND		$ 2.175.000	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 362.500	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 58.000	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 362.500	$ 14.500	$ 0	$ 14.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 362.500		$ 15.800	5	$ 454.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 38284179	MUNGO MARIO ESTHER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.423.500	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 46378135	ANGEL RODRIGUEZ MERY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 7173666	ALVARADO NUÑEZ ABEL HELIT	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 7226537	SOCADAGUA PEREZ JORGE ERNESTO	DEPEND		$ 4.626.375	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.626.375	$ 740.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 740.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.626.375	$ 185.100	$ 0	$ 185.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.626.375		$ 322.000	30	$ 4.626.375	CCF69-COMFACASANARE	$ 185.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 74181703	FERNANDEZ JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 74189653	ACEVEDO GUTIERREZ FERNANDO ALFONSO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 74814471	DIAZ MERIZALDE JANIOBER ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 74860012	ALFONSO BECERRA BORIS GABRIEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 76324117	CORDOBA SARRIA JORGE EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.771.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 79543197	BARRERA ROA CARLOS GERARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388628
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROINGENIARO S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N 27 - 18	TELÉFONO:	6334476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7970636506	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1474880625

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																													PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 79686216	DIAZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 80090925	GUTIERREZ TORRES WILFRAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	29																	230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 142.350		$ 10.000	3	$ 142.350	SCCF69-COMFACASANARE	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 88075316	GUERRA DIAZ CRISTHIAN JAVIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 9431291	VENEGAS RIVERA DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.626.375	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 4.626.375	$ 740.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 740.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.626.375	$ 185.100	$ 0	$ 185.102	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.626.375		$ 322.000	30	$ 4.626.375	SCCF69-COMFACASANARE	$ 185.102	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 12.314.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

ANEXOS

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

REGISTRO DE MINERIA RUCOM

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

LISTA DE TITULARES MINEROS EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES MINEROS-RUCOM

HACE CONSTAR

En cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería hace constar que AGREGADOS TRANSCOLOMBIA LIMITADA con NIT número No. 9000544318, acredita(n) la calidad de beneficiario(s) del título minero No. GLN-101 ubicado en el(los) municipio(s) MONTERREY-CASANARE, para la exploración y explotación de un yacimiento de GRAVA DE RIO.

El título minero cuenta con UN (1) planta(s) de beneficio asociada al proyecto minero, aprobada en el PTI/PTO y solo está autorizada a beneficiar mineral del título GLN-101.

El título minero se encuentra anotado y vigente en el Registro Minero Nacional, y cuenta con Plan Minero e instrumento ambiental aprobados o se encuentra en régimen de transición ambiental que le permite realizar actividades de explotación.

Por tanto, cumple con los requisitos para estar dentro de la lista del RUCOM que trata el artículo 2.2.5.6.1.1.6 del Decreto No. 1073 de 2015, modificado por el Decreto 1102 de 2017.

La presente se expide por la Agencia Nacional de Minería a los 8 días del mes de abril del año 2025.

294

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

LICENCIA DE LA CANTERA EXPEDIDA POR CORPONINOQUIA

Corporinoquia
Por una Región Viva

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia "CORPORINOQUIA", en uso de sus facultades estatutarias, legales y en especial las conferidas mediante Resolución de la Dirección General No. 400.41.14-0837 de fecha 11 de junio de 2014,

HACE CONSTAR:

Que el acto administrativo No. 500.41.12-0166 del 22 de febrero de 2012, *"Por Medio De La Cual Se Modifica La Licencia Ambiental Otorgada Mediante La Resolución N° 200. 15.07-0237 Del 21 De Marzo De 2007, Para Explotación Beneficio Y Transporte Interno De Materiales De· Construcción (Tipo Arrastre) Del Caño Grande. En La Vereda Buena Vista. Jurisdicción Del Municipio De Monterrey. Cuyo Titular Es La Sociedad AGREGADOS TRANSCOLOMBIA LTDA"."*

Fue notificada personalmente el 28 de febrero de 2012 a la señora LIDA PATRICIA ORDUZ AMARILLO, decisión contra la cual no se interpuso recurso de ley, cobrando EJECUTORIA Y FIRMEZA el día 13 de marzo de 2012, a las 5:00 pm.

Se expide la presente constancia a los (15) días del mes de junio de 2024

Conste,

DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGON
Secretaria General.

Proyecto: Juliana Gir
Revisó: Gustavo Vargas\.I(..,-

Sede Principal Yopal: Cra 23 No 18-31. Tel; (8) 635 85 88 Telefax (8) 632 26 23
Subsede Arauca: Cra 25 No 15 - 69. Ter: (7) 885 20 26 Telefax (7) 8853939
Subsede La Primavera: Cll 4 No 9 - 72. Cel: 3132838233-3105816858
Unidad Ambiental Caqueza: Cll SA No 1- 73. (1) 848 0929
e-mail: direccion@corporinoquia.gov.co / controlinterno@corporinoquia.gov.co
www.corporinoquia.gov.co

296

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

297

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131442587

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
AURA ENID RINCON MORALES	9007552725/50	PEDIDO SR. ALVARO P.	10934587/000050	NTC 2289	8.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000457	BAR COR NTC 2289 1'' 12m DIST	1726343401	GR 60	0,27	1,09	0,014	0,021	0,16	0,25	0,09	0,13	0,03	0,004	0,027	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
110000457	BAR COR NTC 2289 1'' 12m DIST	1726343401	8	484	655	1,35	19,0	3,922	OK	17,00	1,70	5,85	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 3,735 kg/m		máx 17,80 mm	mín 1,27 mm	máx 9,70 mm	mín 45,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 25.07.2024

PAOLA KATHERIN MATEUS

282

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131457368

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
AURA ENID RINCON MORALES	9007565830/10	PEDIDO 15082024	10944081/000010	NTC 2289	10.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1726452401	GR 60	0,27	1,03	0,009	0,022	0,13	0,20	0,07	0,08	0,02	0,003	0,002	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo
110000145	BAR COR NTC 2289 7/8'' 14m	1726452401	7	464	603	1,30	19,7	2,961	OK	15,30	1,58	5,37	61
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA. 27.08.2024

PAOLA KATHERIN MATEUS

294

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

N°: 10008131442587

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
AURA ENID RINCON MORALES	9007552725/30	PEDIDO SR. ALVARO P.	10934587/000030	NTC 2289	6.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14m	0240265902	GR 60	0,27	1,29	0,014	0,016	0,20	0,01	0,01	0,02	0,00	0,008	0,010	0,49
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4'' 14m	0240265902	6	459	608	1,32	20,2	2,173	OK	12,90	1,06	4,12	64	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm	mín 45,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 25.07.2024

PAOLA KATHERIN MATEUS

380

REPORTE DE CALIDAD

PazdelRío
ES COLOMBIA

FECHA: Belencito, 25.01.2024
HORA: 13:01:03
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098046 - BARRA CORR N.5X12m NTC 2289 G60
CLIENTE: RINCON MORALES AURA ENID

REPORTE: *82694
PLACA: TAU693

ORDEN DE ENTREGA: 8091159842

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES			
	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F	AL(%)	DOBLADO	P/metro	Esp.Res.	Alt. Res	Anc.Vena
												%	MPa	MPa	Pieza	%		Kg	mm	mm	mm
Especifca / Req.Norma:													550,00	420,00	1,25	14,00		1,459		0,71	
Mínimo:												0,550		540,00					11,10		6,10
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50																

Lote	Peso KG	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa) MPa	Fl (MPa) MPa	R/F Pieza	AL(%) %	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res mm	Anc.Vena mm
E27732-24	9.846,00	0,28	1,29	0,022	0,026	0,17	0,000	0,412	0,139	0,089	0,012	0,018	0,516	616,61	467,63	1,32	18,48	B	1,539	10,20	0,89	3,69
E27585-24	2.030,00	0,28	1,30	0,016	0,020	0,19	0,000	0,294	0,127	0,083	0,012	0,021	0,518	652,77	463,75	1,41	17,19	B	1,511	10,24	1,12	3,95
E27728-24	21.552,00	0,29	1,26	0,018	0,028	0,18	0,000	0,359	0,170	0,075	0,010	0,019	0,528	650,16	467,50	1,39	16,60	B	1,478	10,15	0,92	3,88

Características: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad.

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia.
C.P - 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131356048

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
AURA ENID RINCON MORALES	9007476579/10	PEDIDO SR. ALVRO PER	10855870/000010	NTC 2289	1.070

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000082	ALB COR NTC 2289 1/2'' MP PLQ IMP	6125512302	GR 60	0,26	0,96	0,014	0,036	0,25	0,26	0,13	0,12	0,03	0,000	0,036	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,55(

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa
108000082	ALB COR NTC 2289 1/2'' MP PLQ IMP	6125512302	4	476	682	1,43	15,4	0,982	OK	8,31	0,71	3,38
Rangos de referencia según norma				420.0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 25.01.2024

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

302

PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 18.03.2024
HORA: 23:00:07
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORR N.3 NTC 2289 G60
CLIENTE: 5035624 / RINCON MORALES AURA ENID
DIRECCIÓN: CL 46 6 07

REPORTE: 53.566
ORDEN DE ENTREGA: 8091171359
PLACA: WLB745

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES			
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res. mm	Anc.Vena mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550,00	420,00	1,25	14,00		0,527		0,38	
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540,00					6,70		3,60

Lote/Colada	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res mm	Alt. Res. mm	Anc.Vena mm
C56897-24	0,27	1,07	0,017	0,024	0,17	0,000	0,074	0,015	0,017	0,001	0,017	0,451	602,03	437,49	1,38	17,88	B	0,548	6,20	0,58	2,40
E28254-24	0,26	1,05	0,015	0,024	0,20	0,000	0,151	0,067	0,039	0,005	0,019	0,445	618,10	453,38	1,36	17,23	B	0,551	6,20	0,57	2,40

Características: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F- - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad,

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Superresistente

Fecha de Emisión: 21-may-25
Número de Reporte: STR-UG-18-2025
Km 14 Vía Bogotá -La Calera, Cundinamarca, Colombia
Planta Santa Rosa

Cemento Hidráulico Tipo UG

Fecha inicial* **28-abr-25** ····· **Fecha final*** **4-may-25**

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**8.4 MPa**	No especificado
3 días	NTC 220	**16.0 MPa**	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	**19.1 MPa**	Mínimo 15.0
28 días	NTC 220	**26.7 MPa**	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	0.5 %
Superficie Especifica Blaine	NTC 33	668 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	286 min

Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)




Resultado: 195 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 4.9%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.003%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO"**. Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC**, el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Diana Sandoval

Diana Carolina Sandoval Carreño
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

304

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia

Cubierta

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA:
8000476170

CLIENTE:
SOLUCIONES
EN TECHOS
Y

FECHA 08/26/2025

MATERIAL: 417507 - ROLLOPTGL blanco9002/grisfondoral7035 0.90X914.00 AE40 95 C
NORMA DE CALIDAD: ASTM A755/A755M GRADO 40

LOTE No	0011404360	0011404363	0011404370		
COLADA No	D1E251231676D1	D1E251231672D1	D1E251231672D1		
PESO	4,196 kg	3.278 kg	3.224 kg		
PORCENTAJE DE CARBONO	0.060 %	0.060 %	0.060 %		
PORCENTAJE DE MANGANESO	0.190 %	0.210 %	0.210 %		
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0.020 %	0.019 %	0.019 %		
PORCENTAJE DE AZUFRE	0.015 %	0.016 %	0.016 %		
PORCENTAJE DE BORO	%	%	%		
RECUBRIMIENTO AZ95	97.0 g/m2	98.0 g/m2	98.0 g/m2		
LÍMITE ELÁSTICO	403 MPa	402 MPa	402 MPa		
RESISTENCIA MÁXIMA	391 MPa	403 MPa	403 MPa		
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN	30 %	27 %	27 %		
ESPESOR TOP ACABADO	28.0 µ	28.3 µ	28.3 µ		

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA:
8000476170

CLIENTE:
SOLUCIONES
EN TECHOS
Y

FECHA 08/26/2025

MATERIAL: 417507 - ROLLOPTGL blanco9002/grisfondoral7035 0.90X914.00 AE40 95 C
NORMA DE CALIDAD: ASTM A755/A755M GRADO 40

LOTE No COLADA No PESO	0011404360 D1E251231676D1 4,196 kg	0011404363 D1E251231672D1 3.278 kg	0011404370 D1E251231672D1 3.224 kg		
ESPESOR BOTTOM ACABADO	13.9 µ	14.0 µ	14.0 µ		
DUREZA LÁPIZ TOP	3 H	3 H	3 H		
MEC TOP	100 FD	100 FD	100 FD		
DOBLEZ T TOP	1T	1T	1T		
IMPACTO INDIRECTO TOP	92 Kg.m	92 Kg.m	92 Kg.m		

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

Techos y Cubiertas

cubierta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CUBIERTA SOLTECH

1.0 MATERIAL

Las láminas de acero (Galvanizada) utilizadas para la fabricación de la Cubierta Autosoportada son de acero recubierta mediante una aleación compuesta por aluminio (55%), zinc (43.5%) y silicio (1.5%), mediante un proceso continuo de inmersión en caliente. La aleación de aluminio-zinc que forma el recubrimiento combina las propiedades de ambos metales: el aluminio proporciona la resistencia a la corrosión tanto atmosférica como por altas temperaturas, y una muy buena reflectividad térmica; el zinc aporta la formabilidad y la protección galvánica (catódica) que protege las áreas perforadas o cortadas de la lámina.

El acero es de calidad estructural Grado 37 de acuerdo a la Norma Internacional ASTM A792, Capa AZ-50.

Espesor de la lámina de acero: Véase tabla anexa.


Densidad del Acero: 7,850 kg/m^3

Modulo de elasticidad del acero: 2'100,000 kg/cm^2

2.0 CARGAS ADMISIBLES

Cubierta: TIPO MEMBRANA Arco al 20%.

TABLAS DE PESOS Y ESPESORES				
CALIBRE	PULG	MM	KG/ML	KG/M2
24	0.024	0.60	4.76	7.18
22	0.03	0.80	5.96	9.57
20	0.036	0.95	7.15	11.96
18	0.048	1.22	9.52	14.36

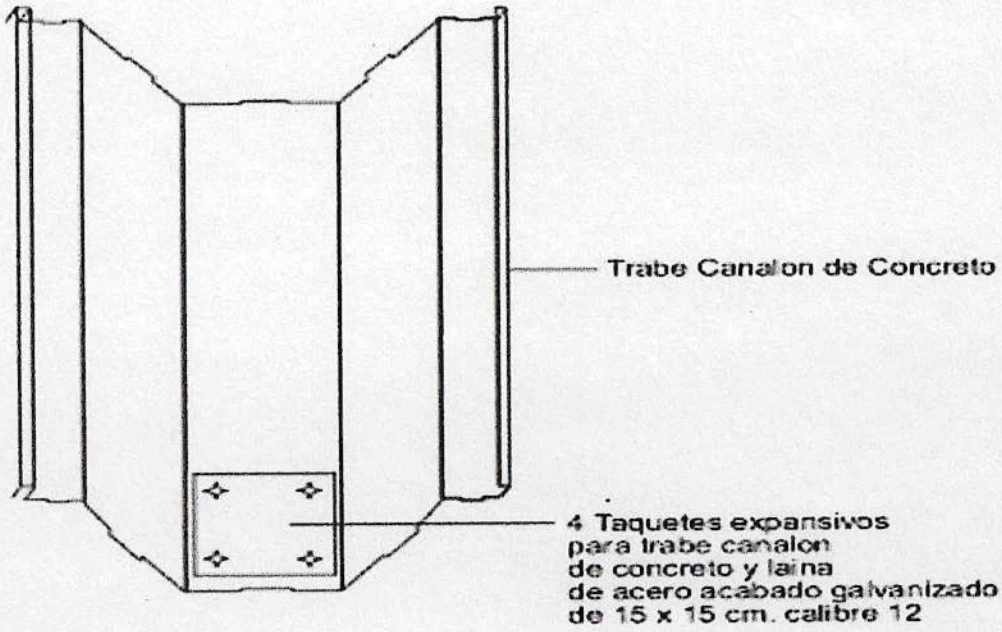


Datos Técnicos de diseño

REACCIONES EN KG/M				
LUZ (mts)	CARGA DE VIENTO km / m	PESO PROPIO DE LAMINA + 40 km / m Rxx, Ryy	VIENTO TRASVERSAL .- Rxx ,- Ryy	VIENTO LONGITUDINAL .- Rxx ,- Ryy
20	100	501	100	105
20	120	588	-169	-298
20	140	620	-263	-436
20	160	617	-378	-605
25	100	608	-133	-247
25	120	810	-178	-340
25	140	810	-306	-525
25	160	812	-450	-737
30	100	980	-87	-224
30	120	979	-214	-410
30	140	1040	-303	-566
30	160	1040	-478	-821
35	100	1218	-26	-186
35	120	1292	-103	-332
35	140	1292	-303	-566
35	160	1292	-487	-892

Nota:todos los valores son considerando un 20% de flecha los valores negativos(-) indican succión de lamina y viga, el sistema de apoyo es considerado articulado.

Carrera 14 119 80 Of 101 Bogotá D.C: Colombia
Teléfonos: 3123658933 / 3105525326 info@techosycubiertas.com
www.techosycubiertas.com

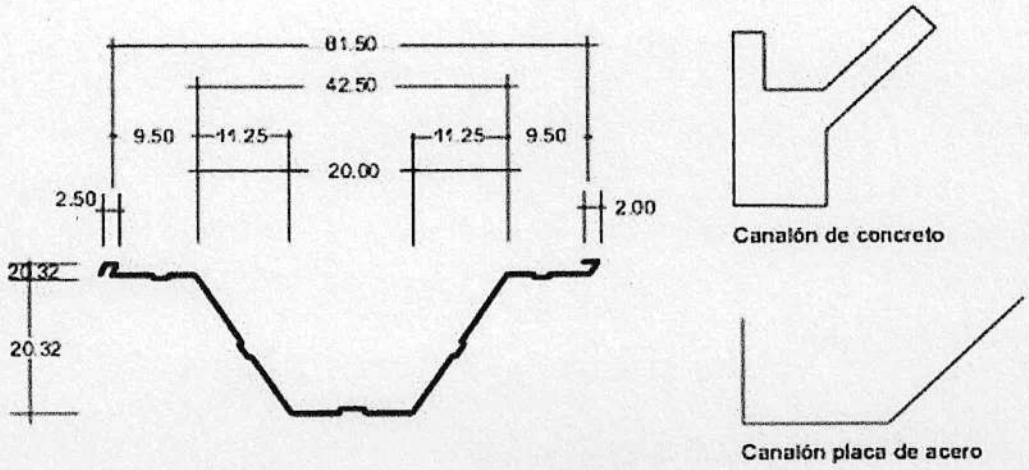


Sección típica de cobertura Autosoportante

3.0 FIJADO DE LA CUBIERTA EN VIGA CANALÓN DE CONCRETO.

Componentes

- Placas de fijación de acero galvanizado de 1/8" de espesor (3 mm) las dimensiones de esta deberán ser de 150x150mm.
- Pernos de expansión de 3/8"x3 ¾" (galvanizados.)

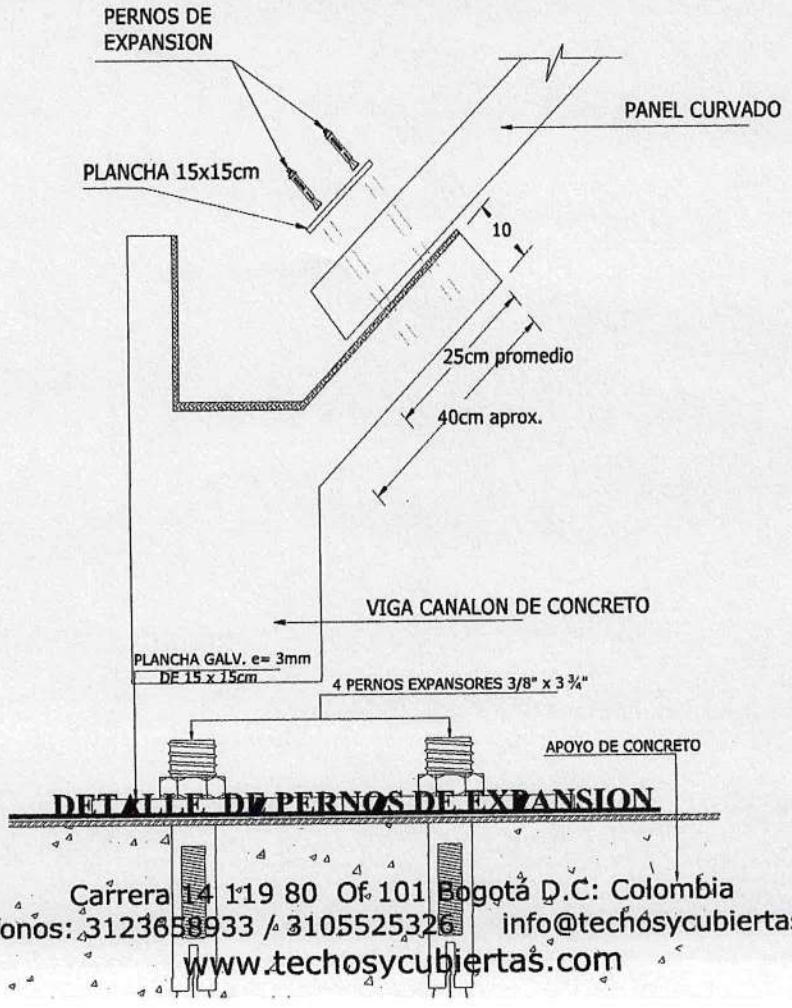


DETALLE DE PERNOS DE EXPANSION

Carrera 14 119 80 Of 101 Bogotá D.C: Colombia
Teléfonos: 3123658933 / 3105525326 info@techosycubiertas.com
www.techosycubiertas.com

VISTA EN CORTE

LAINA PARA FIJACION
Medidas aproximadas

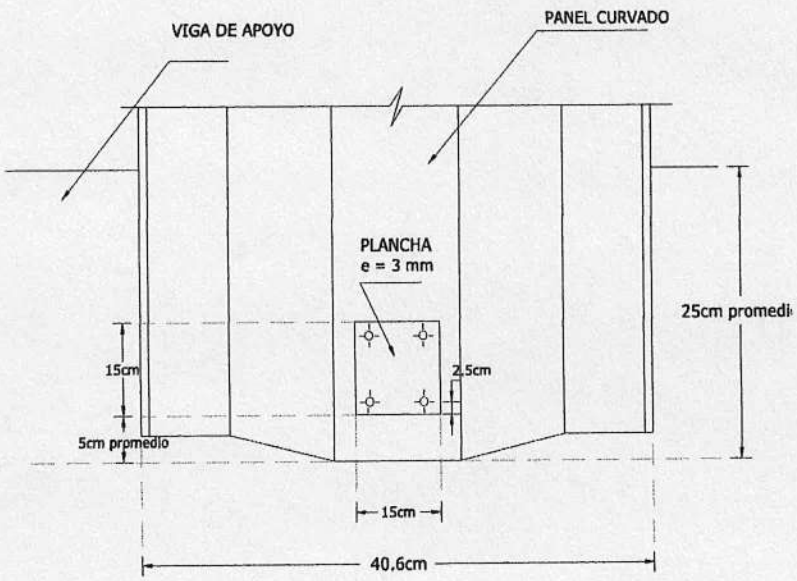


VISTA EN PLANTA

4.0 SELLADO DE LOS ARCOS EN TERCETAS O TRIOS

Para realizar esta labor, unir las pestañas de los arcos de manera que todos queden a nivel, para que no dificulte la tarea de montaje.
Con ayuda de las prensas "C" realizar la operación de sellado.
Con ayuda de la prensa de palanca, ir marcando el camino que va a recorrer la selladora, al inicio del sellado de los paneles curveados.
Terminar de agrupar todos los arcos en tercetas antes de proceder al izado de las tercetas, para un proceso de montaje del techo más rápido y ordenado.


DETALLE DE SELLADO DE PANELES



PRENSA

4.0 IZAJE DE LAS CUBIERTAS


Una vez selladas las coberturas en tercetas se procederá al izado de estas. Para lo que se deberán marcar en 3 partes iguales la longitud del arco de las tercetas, en donde se colocaran las uñas de izaje. Luego se procederá al levantamiento con la grúa.

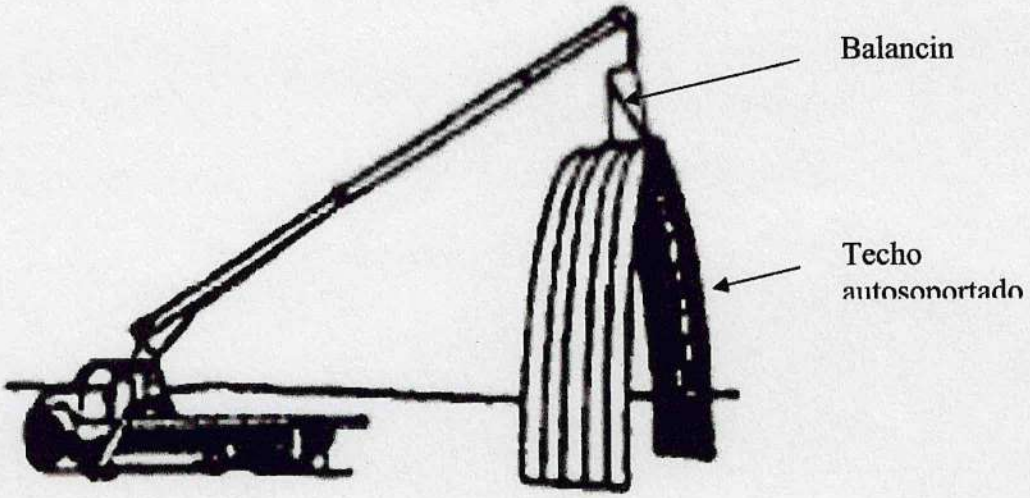

Una vez colocado la cobertura en su posición esta deberá ser fijada a la viga de apoyos antes indicada.

Sellado vertical de cubierta.
Una vez colocado y fijado las tercetas estas deben ser selladas entre si. Tal como se indica en la figura.

Unión y sellado de tercetas
ya montadas.

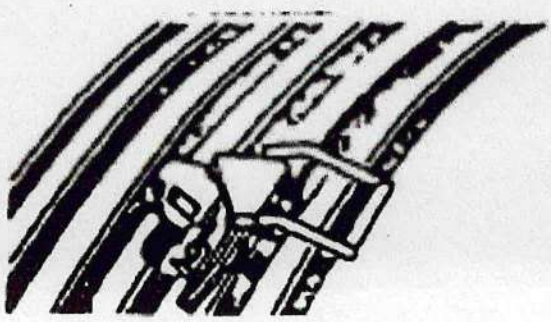

5.0 COLOCACIÓN DE FRANJAS DE ACRILICO

La cantidad de cobertura traslúcida que se recomienda es aproximadamente el 10% del área techada.

Componentes

Teja de Fibra de vidrio. La teja de fibra de vidrio utilizada deberá ser de 1.3 mm de espesor y tendrá un ancho estándar de 0.60, 0.80 o 0.90.

Ángulos de Acero galvanizados. Se usara ángulos de acero galvanizados de 1"x1"x1/8" la longitud de esta depende de ancho de la abertura de iluminación.

Tornillos galvanizados. Se usaran tornillos galvanizados de 1"x 1/4".


VENTAJAS DE LAMINA ACRILICA

Peso específico	: 2.15 gr/m2
Espesor mínimo	: 1.3 mm
Película Protectora	: Absorvedor de rayos UV
Resistencia al Granizo	: ALTA
Perdida de Transmisión de Luz	: 15% en 10 años
Acabado	: Escarcha Liso
Color	: Cristal - Opal

Estabilidad a la luz

En las cubiertas autoportantes, se ha incorporado un absorbedor de radiaciones ultravioleta, el CYASORB – UV 5411 (2 – (2 – hidroxi – 5 – t – octofenil) – benzotriazol). El que protege al sustrato de la degradación de la luz ultravioleta retardando el amarillamiento y el deterioro de las propiedades mecánicas de las mismas.

Esquema de colocación

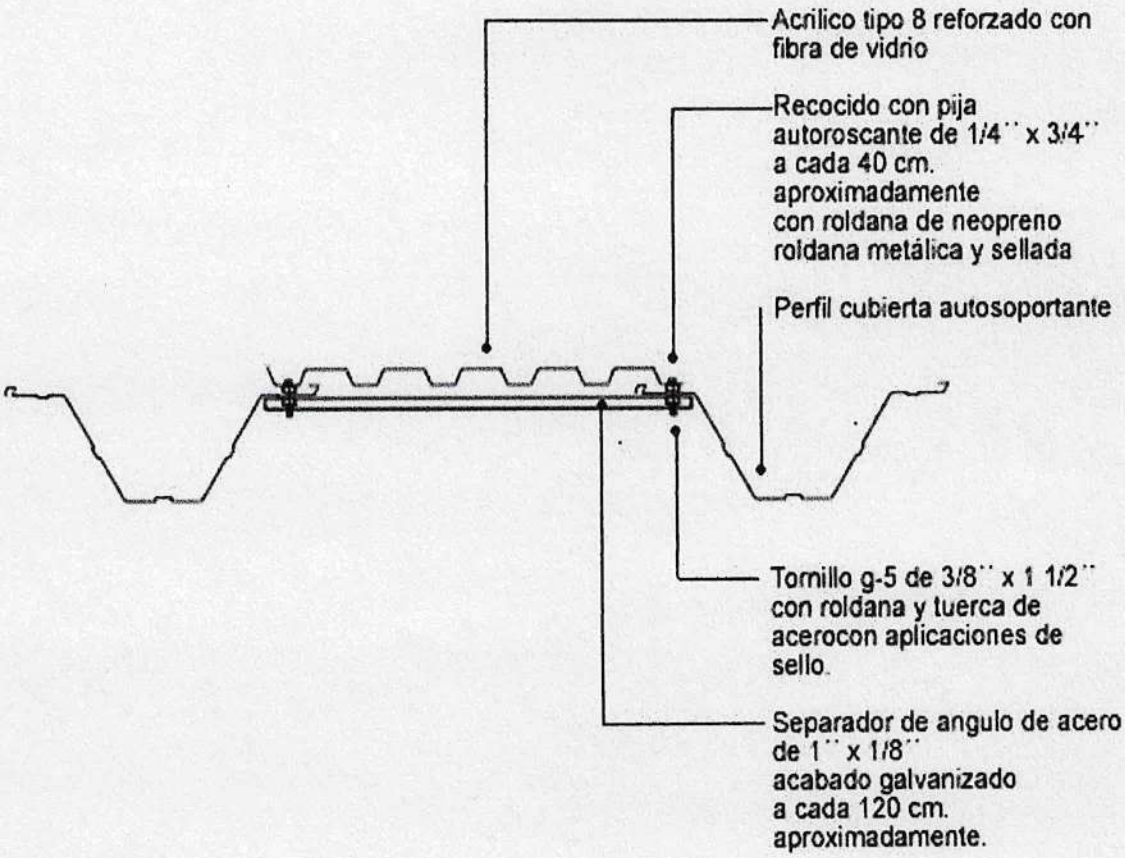

Se deberán colocar los traslúcidos apoyados en los ángulos de 1"x 1/8" luego son fijados por medio de tornillos auto perforantes de ¼"x 1" estando estas separadas cada 20 cm tal como indica la figura siguiente.

Los traslapes laterales de la fibra de vidrio será de 5cm como mínimo y los traslapes longitudinales (entre fibras de vidrio) serán de 15 cm.


6.0 INSTALACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL

Tubería PVC SAL para desagüe 2"

La partida comprende el suministro e instalación de las tuberías de desagüe en PVC-SEL de 2", como parte de las redes de desagüe.
Las tuberías de PVC para desagüe serán de PVC rígido, para fluidos sin presión
Los accesorios de PVC para desagüe serán de PVC rígido, unión a simple presión.


DETALLE DE DRENAJE PLUVIAL

Esta figura muestra la ubicación de los tubos de drenaje pluvial

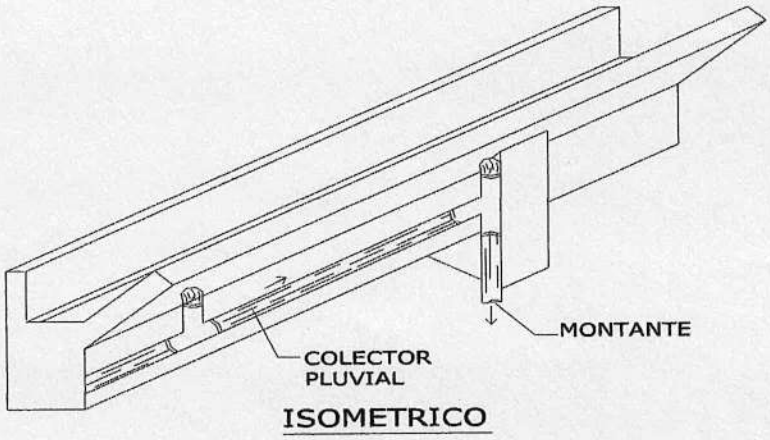

ISOMETRICO

La ubicación del tubo de drenaje será colocado en lo posible al lado de las columnas, tal como indica la figura.

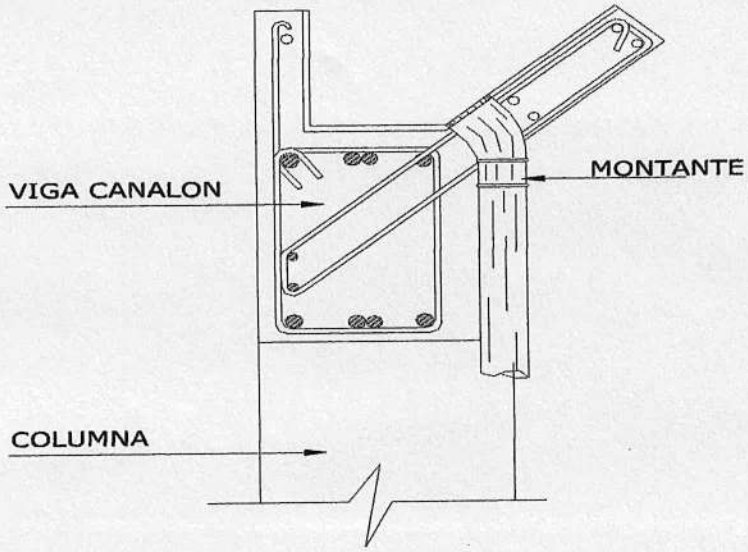

CORTE

Carrera 14 119 80 Of 101 Bogotá D.C: Colombia
Teléfonos: 3123658933 / 3105525326 info@techosycubiertas.com
www.techosycubiertas.com


7.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Componentes

El Tubo PVC dependerá de los metros cuadrados techados

Laminas de acero. Las láminas son de acero galvanizado de 0.60mm de espesor, las dimensiones son indicadas en el grafico adjunto.

La colocación de las láminas se realizará en el momento del engargolado de las coberturas.

DETALLE DE FIJADO DE LUMINARIAS

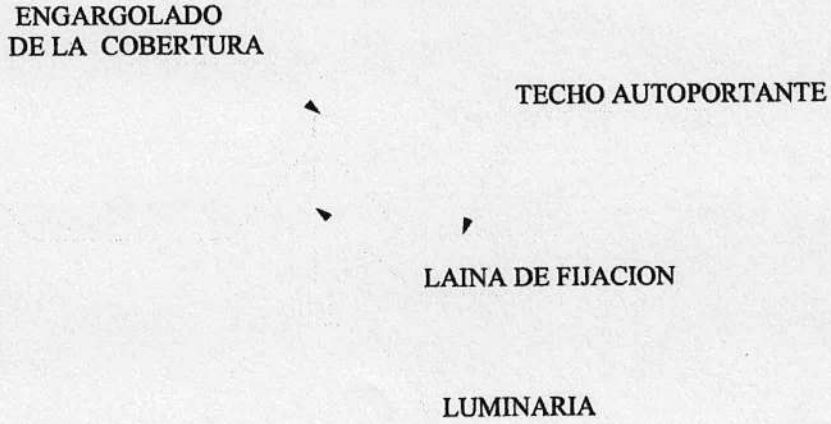

RECOMENDACIONES GENERALES

Con base a las especificaciones y procedimientos técnicos anteriormente mencionados y buscando otorgar un soporte adicional a nuestro producto, nos permitimos dar a conocer las siguientes recomendaciones posteriores a la instalación de la cobertura, las cuales conllevan a una prolongación de la vida útil del mismo.

1. Realizar limpieza de su viga canal y sus bajantes para evitar que se acumulen residuos ajenos al flujo normal de las aguas lluvias cada seis meses.

2. No dejar elementos que generen oxido o líquidos corrosivos que pudieran afectar la capa de recubrimiento de la cubierta.

3. No permitir el acceso a personas no calificadas, las personas que accedan a la cubierta deben contar con todos los elementos de protección personal y seguridad.

4. No se debe acceder a la cubierta cuando exista precipitación pluvial.

5. Para construcciones en las que se haya instalado cubierta en interacción directa con estructuras metálicas en toda su magnitud, es recomendable que estas últimas sean aterrizadas, así como la instalación de para rayos que puedan proteger tanto a la cubierta como a la propia estructura.

6. Los materiales flexibles utilizados para sellar la tornillería y demás elementos de fijación, cuentan con un periodo de vida aproximado de un año por lo cual es preciso revisarlos y cambiarlos de ser necesario para evitar posibles filtraciones desde las propias vigas canal o en las fijaciones de las tejas acrílicas.

7. Nuestras cubiertas han sido diseñadas bajo condiciones de carga (reacciones de arco) obteniendo un resultado geométrico y de calidad del acero, que debe tenerse en cuenta dentro del periodo de la vida útil de la misma. Se recomienda no sobrepasar las condiciones de carga inicialmente contempladas sometiendo la cubierta a sobrecargas que el sistema estructural no pueda soportar. En caso de tener alguna duda, puede contactar a nuestro personal técnico que con gusto atenderá todas sus inquietudes.

8. En caso de ser requerida la instalación de elementos no estructurales que descuelguen directamente desde la cubierta, su carga debe ser tenida en cuenta en el momento del diseño, directamente supervisada por alguno de nuestros Ingenieros para la instalación de la cantidad requerida de soportes. Así mismo, no sobra recordar que nuestras cubiertas pertenecen al grupo de sistemas estructurales flexibles, por lo que es de completa normalidad su movimiento por interacción con cargas gravitacionales y de viento. Se recomienda que todos aquellos elementos que necesiten ser instalados y descolgados de la cubierta, cuenten con dilataciones que puedan absorber los posibles movimientos que la cubierta genere y así conservar las

características estéticas inicialmente contempladas.

9. Cada cinco años se recomienda revisar el estado de la pintura de la cubierta, para determinar si se debe hacer un mantenimiento de la misma.

PROINGENIARQ S.A.S

Proyectos de Ingenieria y Arquitectura

Nit. 901.388.628-9

BITACORA DE OBRA

305

Contrato No : CO1.PCCNTR.7755228 de 2025

Objeto: Contratar la adecuación de la cubierta para cancha multifuncional para la subsede TUA del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial del Casanare.

Contratante: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Contratista: Proingeniarq S.A.S

Lugar de Ejecución: Subsede TÚA del centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial del Casanare

2

Jueves 28 de Abril:

El día de hoy se reunieron Cristhian Javier Gutiérrez Díaz, identificado con cedula de Ciudadanía No. 860753 16 en calidad de R/L de la empresa Proingeniarq S.A.S y Hiram Ramírez Rincón identificado con C.C. No. 40.392.992 en calidad de supervisora, para realizar la firma del acta de inicio del contrato No. 001. PCCNTR. 7755228 de 2025, oficializando con esto el inicio del tiempo de ejecución contractual pactado.

Residente de Obra.

Martes 29 de Abril del 2025

Una vez firmada el acta de inicio el contratista de obra procede con el alistamiento de los implementos y tramites necesarios para cumplir con todos los requerimientos tecnicos, Administrativos, logisticos y de seguridad exigidos por el SENA Para dar inicio e ingreso a los colaboradores, la jornada laboral termina sin contratiempos, todas las actividades que se estan realizando el estado del tiempo No incide en el desarrollo de los mismos.

Residente de Obra

Miercoles 30 de Abril del 2025.
La jornada laboral inica a las 7:00 Am, se continuan realizando actividades administrativas, las cuales permiten dar cumplimiento a todos los requerimientos exigidos por el sena, en los diferentes componentes. Se realiza visita de Obra donde se identifican 4 puntos de iluminacion con sus respectivas cajas electricas y tuberia de Alimentacion, los cuales deben ser ajustados en Altura y recorrido de tuberia de Alimentacion. Se realiza replanteo a la concha

y la cubierta Para explicar y dimensionar cargas a los Profesionales ERIKA y RAQUEL que acompañan la visita por parte del SENA la jornada termina sin contratiempos a las 5:00 P.M.

Residente de Obra.

Jueves 01 de Mayo del 2025.
La jornada laboral inicio con normalidad a las 7:00 AM., las actividades que se realizan son administrativas, se realizan las matrices de seguridad y salud en el trabajo necesarias, para dar inicio a las actividades de Obra, se solicita información personal a los posibles trabajadores que estarán involucrados al Proyecto, la jornada termina sin contratiempos a las 5:00 P.M.


Residente de Obra.

Viernes 02 de Mayo del 2025
La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM, se continuan realizando labores administrativas, se realiza revisión de los Planos estructurales, se continua con la implementacion de fichas de SST, se continua con el recaudo de la información de los posibles colaboradores la jornada laboral termina sin contratiempos a las 5:00 P.M.

Residente de Obra

Lunes 05 de Mayo del 2025.
La jornada inicia con la asistencia de los posibles trabajadores a la I.P.S. para la toma de los examenes medicos de ingreso, se realiza comercialización de materiales a utilizar en la obra se continua con la elaboracion de las fichas y riesgos de seguridad a ser implementadas durante la ejecución de las Obras, la jornada laboral termina sin contratiempos

Residente de Obra

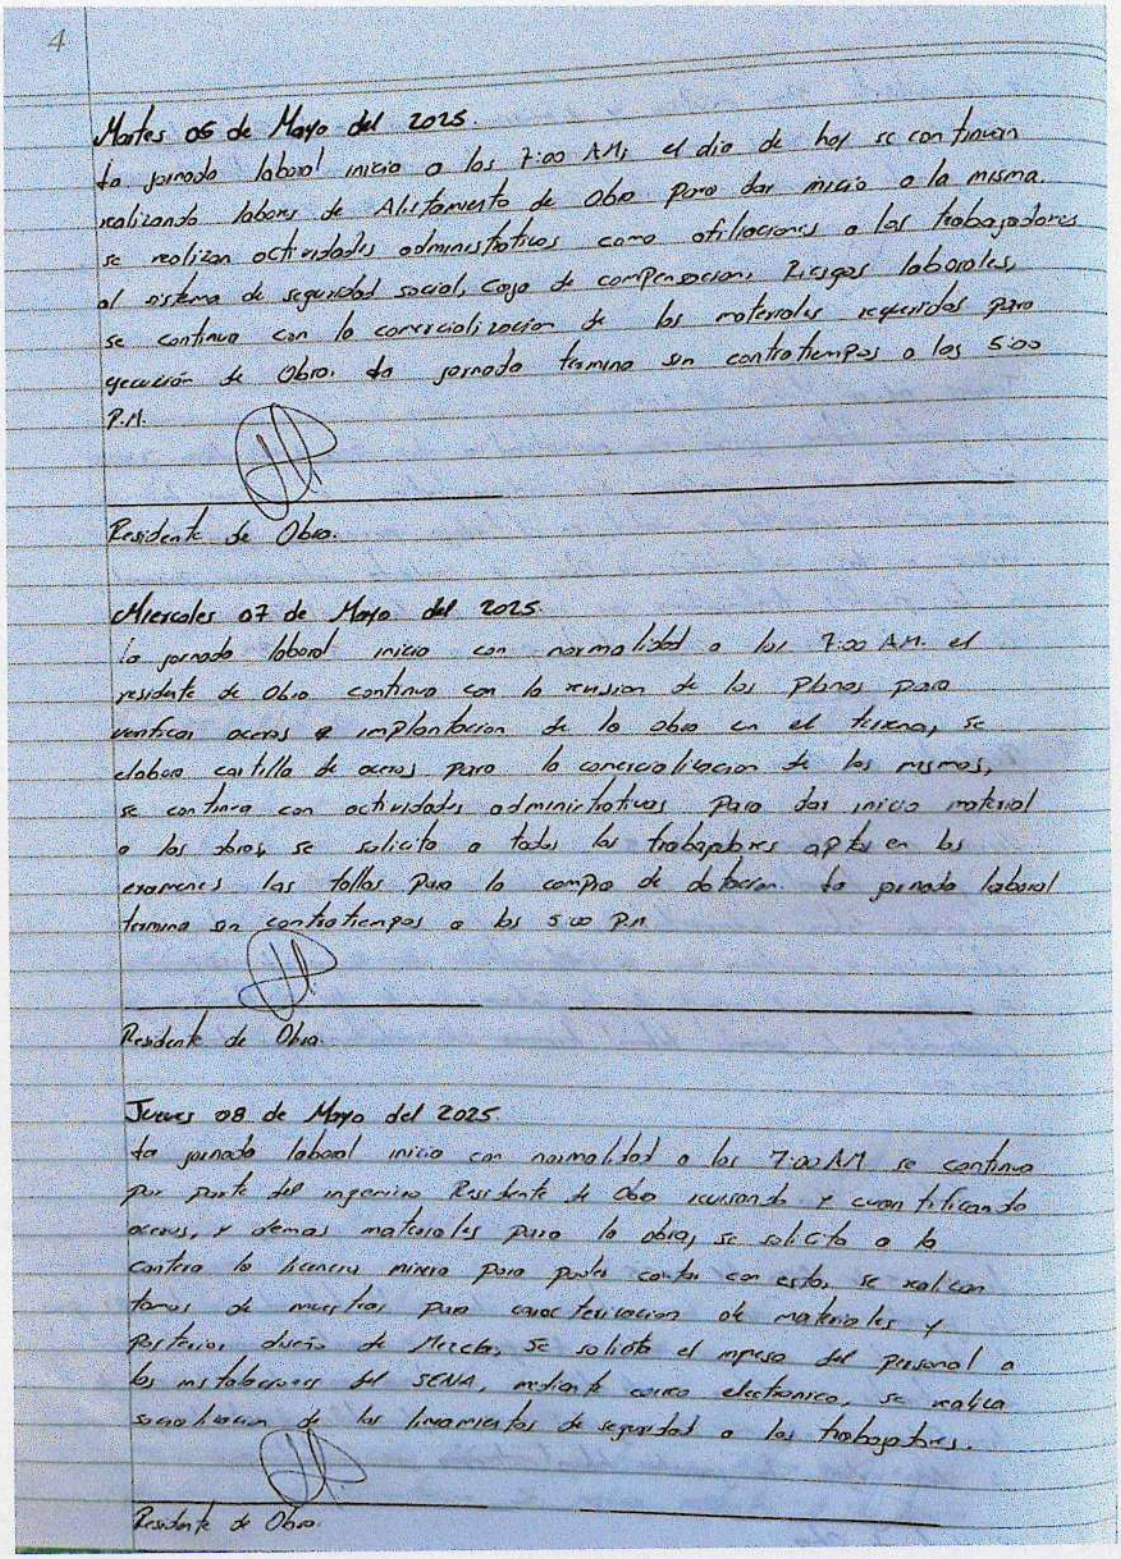

4

Martes 06 de Mayo del 2025.
la jornada laboral inicio a las 7:00 AM, el dia de hoy se continuan realizando labores de Alistamiento de Obra para dar inicio a la misma. se realizan actividades administrativas como afiliaciones a los trabajadores al sistema de seguridad social, Caja de compensacion, Riesgos laborales, se continua con la comercializacion de los materiales requeridos para ejecución de Obra. la jornada termina sin contratiempos a las 5:00 P.M.

Residente de Obra.

Miercoles 07 de Mayo del 2025.
la jornada laboral inicio con normalidad a las 7:00 A.M. el residente de Obra continua con la revision de los Planos para verificar ejes e implantacion de la obra en el terreno, se elabora cartilla de ejes para la comercializacion de los mismos, se continua con actividades administrativas para dar inicio material a las obras se solicita a todos los trabajadores aptos en los examenes las tallas para la compra de dotacion. la jornada laboral termina sin contratiempos a las 5:00 P.M.

Residente de Obra.

Jueves 08 de Mayo del 2025.
la jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM se continua por parte del ingeniero Residente de Obra recorriendo y cuantificando ejes, y demas materiales para la obra, se solicita a la cantera la hormigonera minima para poder contar con esto, se realizan tomas de muestras para caracterizacion de materiales y posterior ruptura de Muestras, se solicita el ingreso del personal a las instalaciones del SENA, mediante correo electronico, se realiza socializacion de los lineamientos de seguridad a los trabajadores.

Residente de Obra.

5

Viernes 09 de Mayo del 2025
La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM, el día de hoy se realiza entrega de dotacion al Personal operativo que estara en obra, se continua con la socializacion del Proyecto, su objeto, sus Alcances, los parametros importantes a tener en cuenta para la ejecucion, se solicita a los trabajadores alistarse para dar inicio de actividades lo proximo semana, se manda figurar el acero para la obra, se continua con muestreo de materiales de rio para el diseño de mezcla, estas son las actividades que se realizan el día de hoy. La jornada termina con normalidad

Residente de Obra.

Lunes 12 de Mayo del 2025.
La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM el día de hoy se realiza el traslado de todos los trabajadores desde Yopal a Monterrey y el acondicionamiento de la vivienda y todo lo necesario para su estadia, se hace alistamiento para ingresar a trabajar el día martes en las instalaciones, estas son las actividades que se realizan.

Residente de Obra.

Martes 13 de Mayo del 2025.
Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
El día de hoy se dan inicio a las actividades de obra en las instalaciones del SENA Regional Monterrey sede TÚA, el día de hoy el Personal ingreso a las 7:00AM, el Personal que ingreso fueron 1 Residente de Obra, 1 inspector de Obra, 1 Profesional SST, 3 maestros de Obra y 2 ayudantes, las actividades que se inician a ejecutar son alistamiento de campamentos para trabajadores y materiales, Encerramiento del area del sitio a intervenir, descargue y ubicacion de Herramientas menores, se recuerdo a todos los trabajadores todos los Protocolos de seguridad, se dan recomendaciones para el uso de las instalaciones entre otros. La jornada laboral termina a las 6:00 P.M.

Residente de Obra

6

Miercoles 14 de Mayo del 2025.
Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Lluvias

La jornada laboral inicio con normalidad a las 7:00 AM. se realizo la charla de seguridad, y la coalisteria con los trabajadores. Para dar inicio a las actividades, el dia de hoy se hace replanteo de Obra, se procede a retirar el adoquin de un sendero peatonal existente para no dañar estos materiales, así como el bordillo de confinamiento, se continua con las actividades de cerramiento y, aislamiento de la obra. El personal en obra es de 3 maestros, 2 Ayudantes, 1 Residente, 1 inspector 1 Profesional SST. en horas de la tarde se presentaron lluvias que impidieron la ejecucion de Obra, la jornada laboral termina a las 6:00 PM. sin contratiempos.

Residente de Obra.

Jueves 15 de Mayo del 2025.
La jornada laboral inicio con normalidad, El estado del clima en la mañana es nublado pero apto para trabajar, se realiza la charla de seguridad y la coalisteria con todos los trabajadores, el dia de hoy asiste el mismo personal que el dia de ayer, el dia de hoy ingresa a obra una mula con 600 bultos de cemento, tambien el dia de hoy llegan volquetas con agregados Petreos de la cantera (subbase, triturado de 3/4" y arena) son acopiados en la obra, se continua con el retiro del adoquin y los sardineles, se continua con el replanteo de las estructuras de zapatas y vigas de cimientos, en horas de la tarde ingresa una retroexcavadora a realizar las excavaciones de las zapatas las cuales tienen una Profundidad y una seccion definido en diseño. La jornada laboral termina a las 6:00 PM. sin contratiempos.

Residente de Obra.

Viernes 16 de Mayo del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Lluvias leves

La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM. se continuan realizando actividades de excavacion con maquina Para las zapatas, mientras esto actividad se realizo se daño una tuberia electrica de 2" que se encontraba enterrada, abrentando sistema electrico y la cual no tenia cinta de señalizacion. Se procede a hacer reparacion de lo mismo y conservacion de los materiales, se hacen ajustes en el recorrido para que no interfiera con las estructuras a construir, se descarga y organiza el cemento en la bodega, la jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 P.M.

Residente de Obra

Sabado 17 de Mayo del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado

La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM. el dia de hoy llega el acero de refuerzo figurado para las estructuras de concreto, se da inicio con las actividades realizando la charla de seguridad y calistenia a todos los trabajadores, se continua con la reparacion de la tuberia electrica de 2" por parte del electrico, Se Procede a la instalacion de sub base Para el mejoramiento de la capacidad Portante segun diseño, se aplica en dos capas de 15 cm compactadas cada una se Procede con la clasificacion del acero para las estructuras y las columnas, segun tipo 1 o tipo 2. La jornada termino a las 4:00 P.M. sin contratiempos.

Residente de Obra.

Lunes 19 de Mayo del 2025.
Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Lluvias

La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM, se da inicio con la charla de seguridad, Calistenia y la socializacion de las actividades que se Pretenden realizar en la obra. Se continua realizando amarrado y armado de Parrillas de refuerzo Para las zapatas y los pedestales

8

los elementos utilizados se siguen segun diseño estructural aportados por la entidad contratante, se continua con la aplicacion de sub base para mejoramiento, se aplico por capas y se compacta con rana. el grupo de trabajo se conforma por 3 maestros, 2 ayudantes, 1 Ing Residente, 1 inspector de Obra y 1 Profesional en SST la jornada laboral termina a las 6:00 PM sin contratiempos.

Residente de Obra.

Martes 20 de Mayo del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
la jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM. se realiza charla de seguridad matutina y calistenia correspondiente el personal en obra el dia de hoy esta en 3 maestros, 2 ayudantes, 1 Profesional SST, un inspector de Obra y un ingeniero Residente de Obra, se continuan con las actividades del dia anterior, armado de acero para refuerzo de canastas para zapatas, se arman 13 elementos en X y 13 elementos en Y. por las lluvias del dia anterior se presentan inundaciones en las excavaciones por lo tanto se requiere electrobomba para sacar el agua, se ~~proteje~~ Retira material que se desprende de las paredes de la ~~fisura~~ Excavacion, se solicita el ingreso de dos ayudantes nuevos. la jornada laboral termina a las 6:00 PM. sin contratiempos.

Residente de Obra,

Miercoles 21 de Mayo del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Soleado
la jornada laboral inicia a las 7:00 AM se realiza charla de seguridad con todos los trabajadores, se Permite el ingreso a los dos ayudantes nuevos de la obra, el dia de hoy se realiza visita de Obra por Parte de la Profesional Tatiana Burgos de la R

la cual realice recorrido de Obra, evidenciando todas las actividades realizadas revisar la bitacora de Obra y los aceros de las estructuras, se continua amarando acero de refuerzo, se continua con la aplicacion de sub base en las excavaciones para mejorar la capacidad portante del suelo, se realiza visita del ingeniero Wilfan Gutierrez estructural del proyecto, el cual visualiza las actividades a realizar, se espera El diseño de mezcla para iniciar con los concretos, la jornada laboral termina a las 6:00 PM, sin contratiempos.

Erika Amaya

Supervisión

Residente de Obra.

Jueves 22 de Mayo del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado

la jornada laboral inicia a las 7:00 AM, se dan charlas de seguridad para todos los trabajadores y se realiza la calistenia, para el día de hoy se obtiene el diseño de mezcla y se procede a fundir las solados de las primeras 4 zapatas, se continua con el armado del acero para refuerzo estructural, se fabrican "Parales" soportes con concreto pobre y un gancho para la separacion de los aceros con el terreno natural. el personal en obra es 3 oficiales, 4 ayudantes Ing. Erika sup. SENA, 1 Residente de Obra y 1 Profesional ARQ, estos son las actividades realizadas el dia de hoy la jornada termina sin contratiempos a las 6:00 PM.

Erika Amaya.

Supervisión

Residente de Obra.

Viernes 23 de Mayo del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado

la jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM. se procede con la calistenia diaria y con la charla de seguridad para todos los trabajadores, las actividades que se desarrolla el dia de hoy son, [illegible] de zapata, y fundido de una de ellas, dado que el

10

Nivel freatico esta muy alto se procede de la instalacion de un plastico negro que permita como aislante de agua para el concreto, se realiza la dosificacion de los agregados petreos segun diseño de mezcla se continua con armado de acero para refuerzo de las estructuras. Se continua con el mismo personal 3 oficiales, 4 ayudantes, Practicos, 1 ARQ 1 residente de Obra, la jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 PM

Residente de Obra. Supervisión Erika Amaya.

Sabado 24 de Mayo del 2025

Estado del Clima: Mañana: Soleada.

La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM se realiza calistenia para los trabajadores y la charla de seguridad, para el dia de hoy la actividad a realizar es fundir las zapatas 2 y 3 del costado izquierdo de la cancha, se realiza la instalacion del plastico negro para aislar la estructura del agua por nivel freatico alto, todos los trabajadores se concentran en esta actividad. Se realiza aseo general de la obra. se realizan separadores en concreto para los refuerzos, se verifica y sigue la dosificacion de los agregados petreos y el agua para los concretos, garantizando con esto la resistencia de 3500 PSI requeridos en el diseño. La jornada laboral termina sin contratiempos a las 4:00 P.M.


Residente de Obra Supervisión Erika Amaya.

Lunes 26 de Mayo del 2025

Estado del Clima: Mañana: Nublado

Tarde: Soleada

La jornada laboral inicia a las 7:00 AM se realiza la correspondiente charla de seguridad y la calistenia con los trabajadores, en la mañana se presentan lluvias, se procede a retirar material desprendido de las paredes laterales de las excavaciones, debido al desprendimiento de las mismas, se instala subbase en la base de las excavaciones

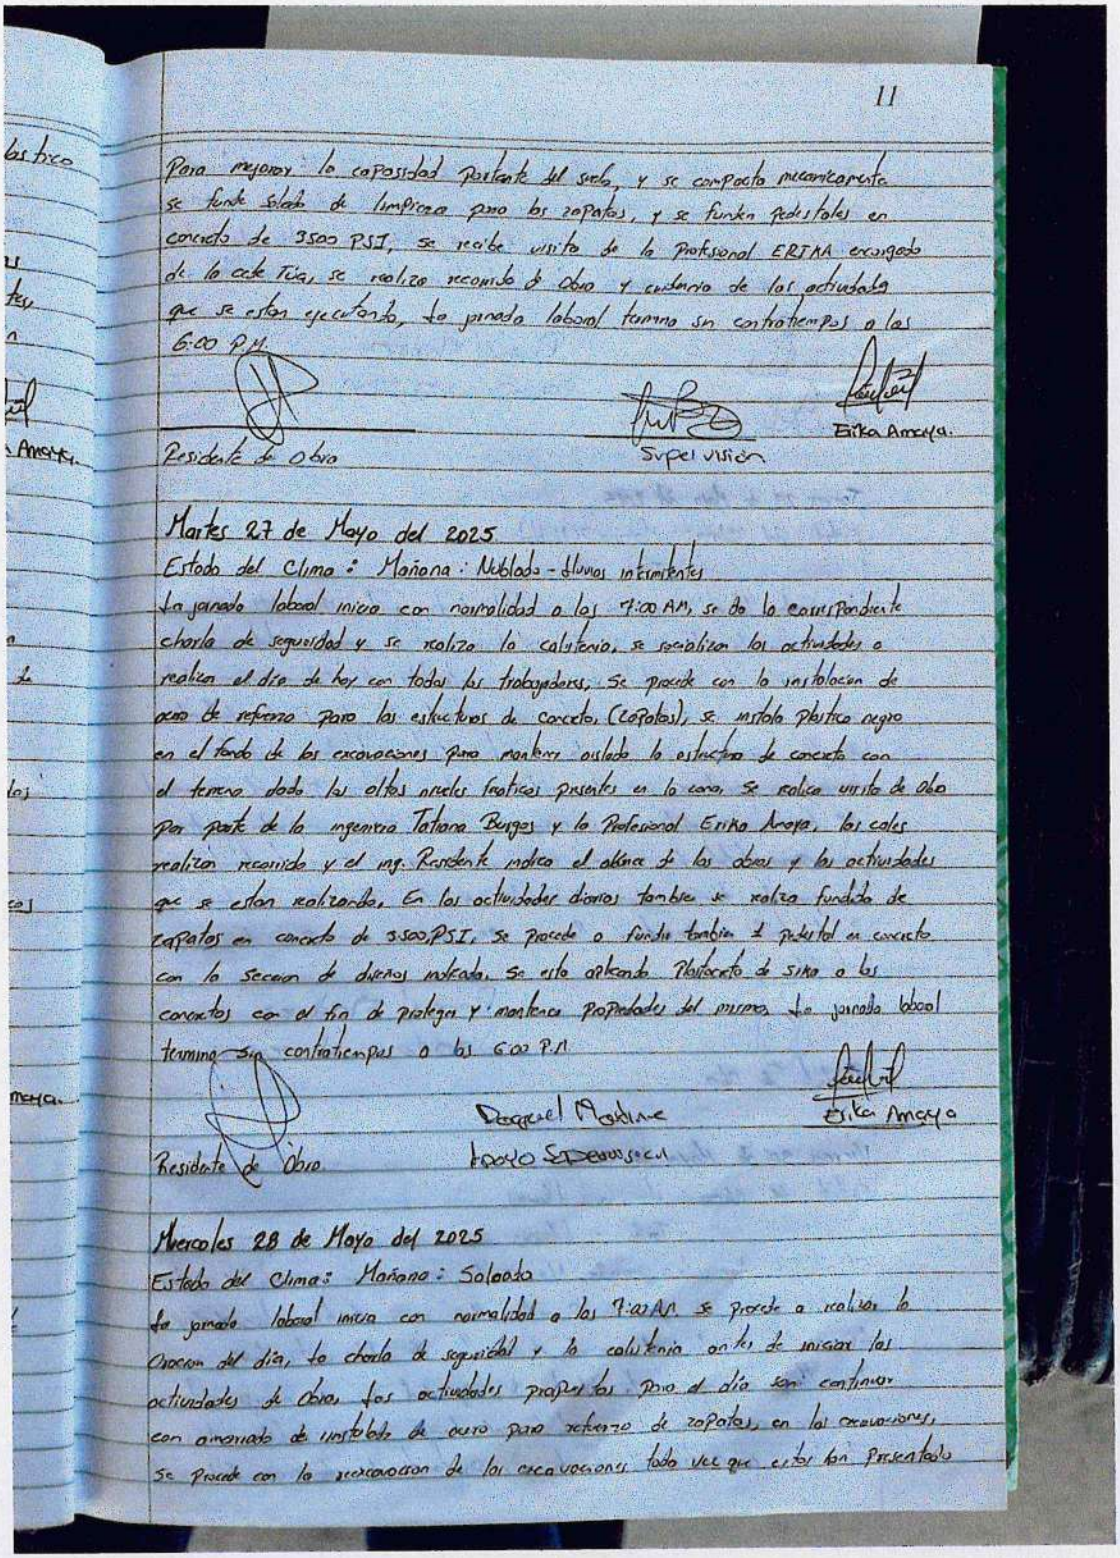

11

Para mejorar la capacidad portante del suelo, y se compacto mecanicamente se funde solado de limpieza para los zapatas, y se funden pedestales en concreto de 3500 PSI, se recibe visita de la profesional ERIKA encargada de la calidad, se realiza recorrido de obra y contexto de las actividades que se estan ejecutando, la jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 P.M.

Residente de Obra — Supervisión — Erika Arroyo

Martes 27 de Mayo del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado - lluvias intermitentes
La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM, se da la correspondiente charla de seguridad y se realiza la calistenia, se socializan las actividades a realizar el dia de hoy con todos los trabajadores, Se procede con la instalacion de acero de refuerzo para las estructuras de concreto, (zapatas), se instala plastico negro en el fondo de las excavaciones para mantener aislado la estructura de concreto con el terreno dado los altos niveles freaticos presentes en la zona, se realiza visita de obra por parte de la ingeniera Tatiana Burgos y la Profesional Erika Arroyo, las cuales realizan recorrido y el ing. Residente indica el abance de las obras y las actividades que se estan realizando. En las actividades diarias tambien se realiza fundida de zapatas en concreto de 3500PSI, se procede a fundir tambien el pedestal en concreto con la seccion de diseño indicada, se esta aplicando Plastocreto de SIKA a los concretos con el fin de proteger y mantener propiedades del mismo, la jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 P.M.

Residente de Obra — Apoyo SST Social — Erika Arroyo

Miercoles 28 de Mayo del 2025
Estado del Clima: Mañana: Soleado
La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM. se procede a realizar la oracion del dia, la charla de seguridad y la calistenia antes de iniciar las actividades de obra, las actividades propias del dia son continuar con armanado de instalacion de acero para refuerzo de zapatas, en las excavaciones se procede con la excavacion de las excavaciones todo vez que estan fue presentado

12

desprendimientos laterales de material, lo cual ha generado lo pedido de secció- de los mismos, tambien se continua con la fabricacion de separadores para el acero y concreto (Panelas) se fundio se pasto, se realizo la fundida de una zapata y un pedestal la jornada laboal termino con normalidad a las 6:00 P.M.

Raquel Martinez
Apoyo Supervision

Residente de Obra.

Jueves 29 de Mayo del 2025.
Estado del Clima: Mañana : Nublado
Tarde : Lluvias.
la jornada laboal inicio con normalidad el dia a las 7:00 AM se procede con la relizacion de la calistenia para la jornada matutina, y se da la charla de seguridad, se realizan actividades de sobreexcavacion todo que se Presenta desprendimiento de material de los Parches laterales de las excavaciones de las zapatas, Esta actividad se realiza manual, se continua con la aplicacion de sub base para el mejoramiento del terreno, se aplica en 2 capas de 15cm para compactar y tener un espesor total de 30 cm, segun indica el diseño estructural, la jornada termina con normalidad a las 6:00 PM en horas de la tarde se presentaron lluvias que pausaron un poco las actividades.

Raquel Martinez.
Apoyo o Supervision

Residente de Obra.

Viernes 30 de Mayo del 2025.
Estado del Clima: Mañana : Lluvias
Tarde : Lluvias
El dia de hoy la jornada No puede iniciar con normalidad a las 7:00 AM. Todo vez que se presentan lluvias con fuertes intensidades las cuales Impiden el normal desarrollo de las actividades a desarrollar, se realiza la charla de seguridad en el campamento y se hace calistenia, se aprovecha el tiempo y se realizan otras actividades concentrando de lo importante de la seguridad.

en horas de la tarde se continua con llenias. No se realizaron actividades de obra, la jornada termino a las 6:00 P.M.

Erika Amaya

Residente de Obra

Sabado 31 de Mayo del 2025.
Estado del Clima : Mañana . Nublado
Tarde : Soleado

La jornada laboral inicio con normalidad a las 7:00 AM, se procede a dar la charla de seguridad por parte de la HSE y realizar la calistenia, el tiempo es apto para trabajar, se procede con la compactacion de subbase para zapatas, se procede con la fundida de una zapata en concreto de 3500 PSI siguiendo dosificacion del diseño de mezcla, para el proyecto, el personal en obra es de 1 Ing. Residente, 1 Profesional HSE, 3 maestros de obra 3 ayudantes de obra, se realizo tambien la fundida de las columnas con la formaleteada de las mismas, se toman muestras de concretos para llevarlo a laboratorio y fallarlas garantizando con esto la calidad de los concretos fabricados en obra, se para en agua para su mejor hidratacion, se realizan apreciaciones del Profesional SST para tener en cuenta, la jornada laboral termino a las 4:00 P.M. sin contratiempos.


Erika Amaya

Residente de Obra

Domingo 01 de Junio del 2025.
Estado del Clima: Mañana . Lluvias
El dia de hoy inicia con normalidad a las 7:00 AM se procedio trabajar para adelantar obra, se realiza calistenia y charla de seguridad, se socializaron las actividades para el dia pero a inicio a llover muy fuerte impidiendo las actividades de fundida de zapata la jornada se suspendio a las 12:00 del dia sin el desarrollo de ninguna actividad.

Erika Amaya

Residente de Obra

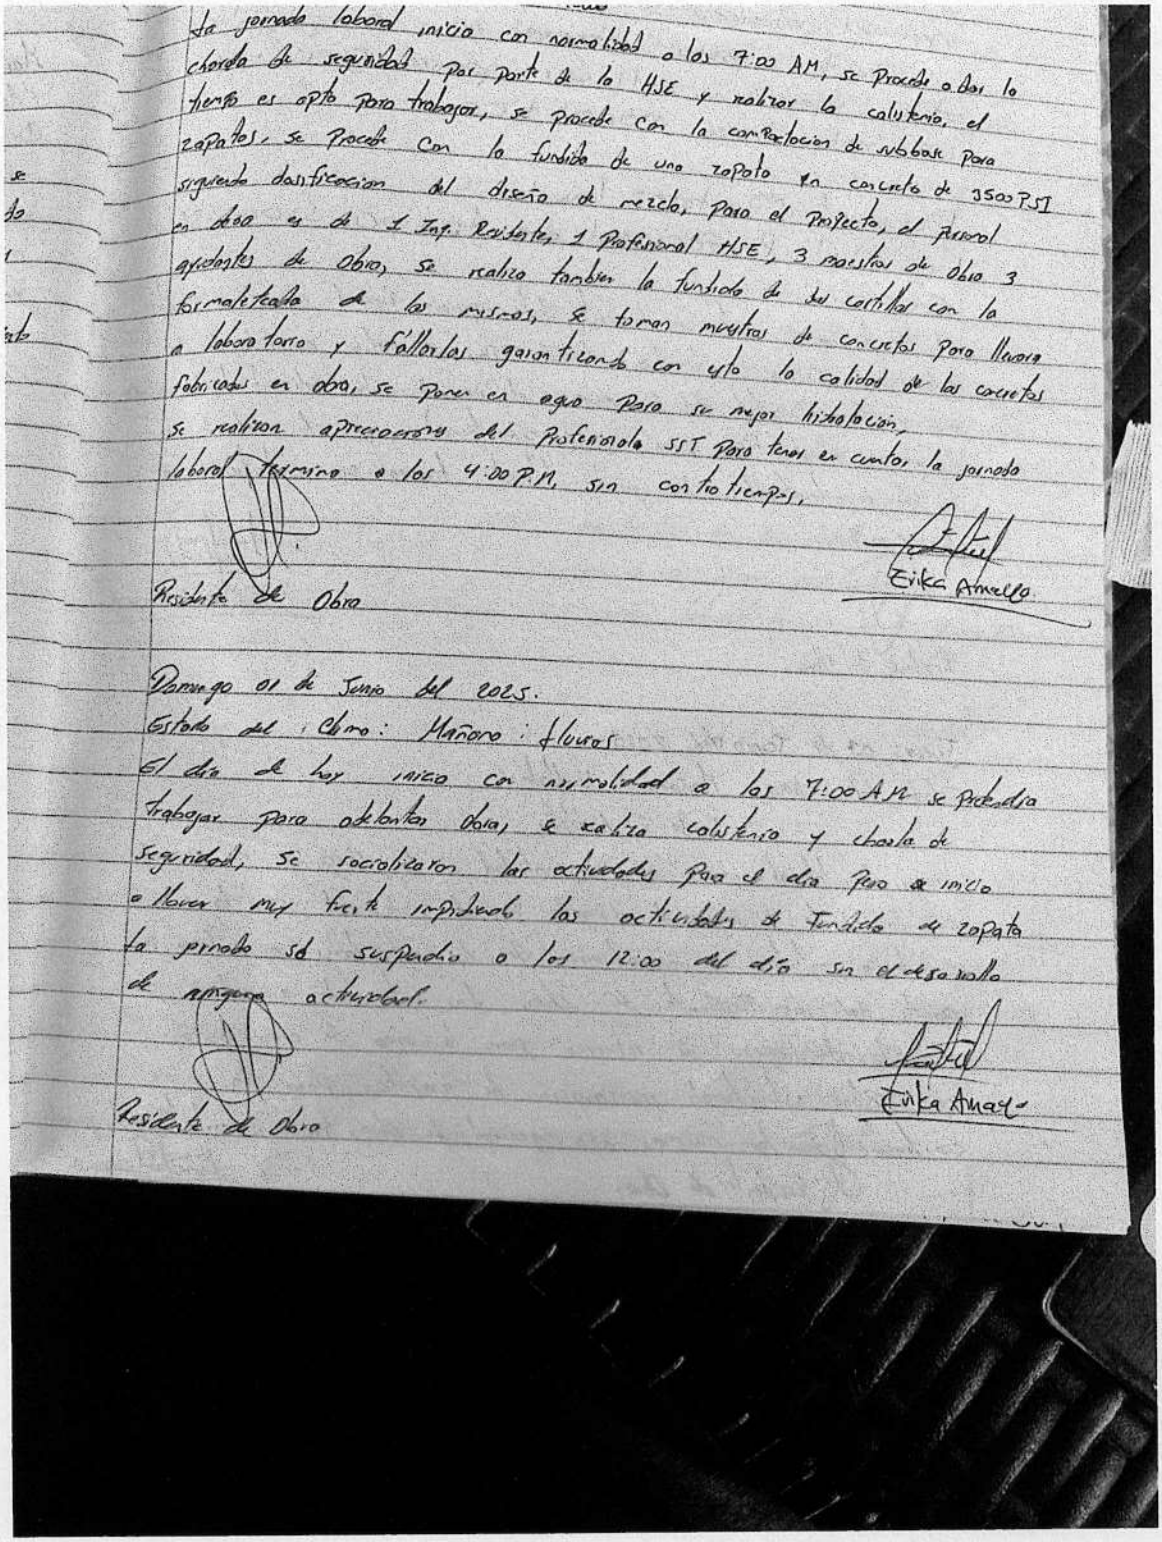

La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM, se Procede a dar la charla de seguridad por parte de la HSE y realizar la calistenia, el tiempo es apto para trabajar, se procede con la compactacion de subbase para zapatas, se Procede con la fundida de una zapata en concreto de 3500 PSI siguiendo dosificacion del diseño de mezcla, Para el Proyecto, el Personal en obra es de 1 Ing. Residente, 1 Profesional HSE, 3 maestros de Obra 3 ayudantes de Obra, se realiza tambien la fundida de las columnas con la formaleteada de las mismas, se toman muestras de concretos para llevarlo a laboratorio y fallarlas garantizando con esto la calidad de los concretos fabricados en obra, se Pone en agua Para su mejor hidratacion, se realizan aprendizajes del Profesional SST Para tener en cuenta, la jornada laboral termina a las 4:00 P.M, sin contratiempos.


Erika Arnello

Residente de Obra

Domingo 01 de Junio del 2025.
Estado del Clima: Mañana: Nubes
El dia de hoy inicia con normalidad a las 7:00 AM se procedia trabajar para adelantar obra, se realiza calistenia y charla de seguridad, se socializaron las actividades para el dia Para el inicio a hacer muy fuerte supervisado las actividades de Fundida de zapata la jornada sd suspendio a las 12:00 del dia sin el desarrollo de ninguna actividad.

Erika Arnello

Residente de Obra

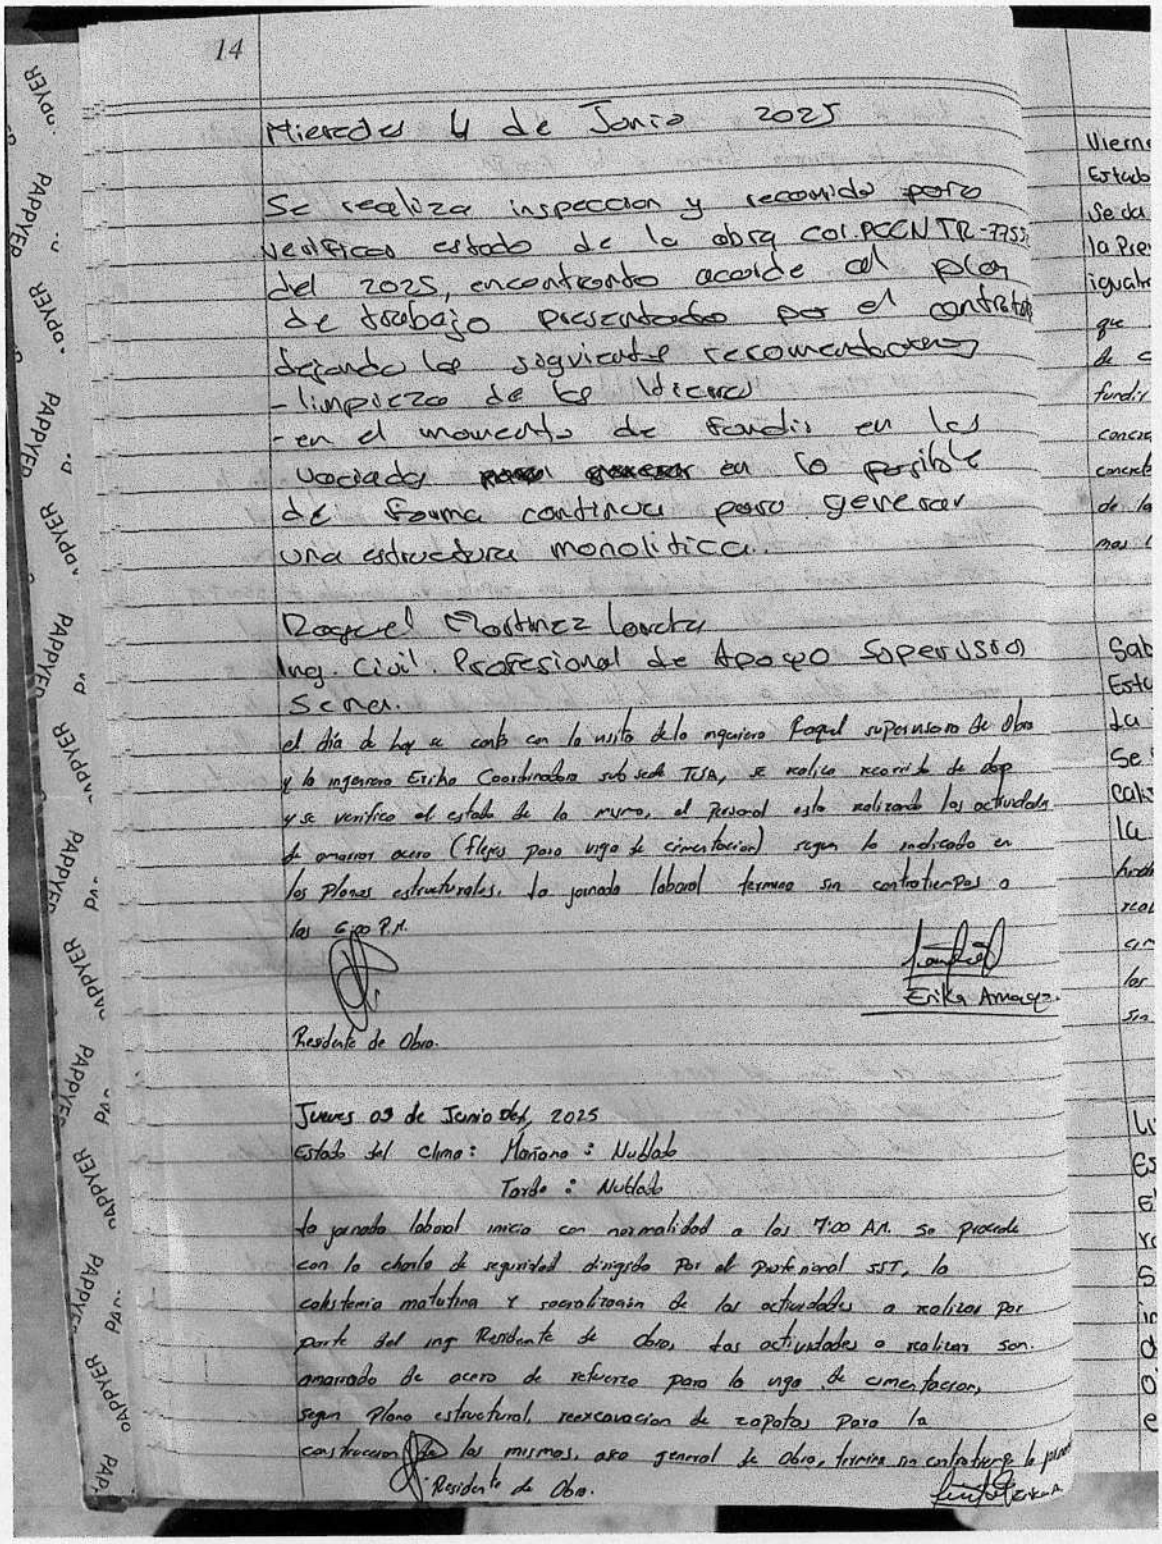

14

Miercoles 4 de Junio 2025

Se realiza inspeccion y recorrido para verificar estado de la obra con PCONTR-775 del 2025, encontrando acorde al plan de trabajo presentado por el contratista dejando las siguientes recomendaciones
- limpieza de los hierros
- en el momento de fundir en los vaciados ~~[illegible]~~ en lo posible de forma continua para generar una estructura monolitica.


Raquel Martinez Londoño
Ing. Civil. Profesional de Apoyo Supervisor Senes.

el dia de hoy se contó con la visita del ingeniero Raquel supervisora de obra y la ingeniera Erika Coordinadora sub secretaria TESA, se realiza recorrido de obra y se verifica el estado de la misma, el personal esta realizando las actividades de amarres acero (flejes para viga de cimentacion) segun lo indicado en los planos estructurales. la jornada laboral termina sin contratiempos o las 6:00 P.M.

Erika Arango.
Residente de Obra.

Jueves 05 de Junio del 2025
Estado del clima: Mañana : Nublado
Tarde : Nublado
la jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 A.M. se procede con la charla de seguridad dirigida por el profesional SST, la cohsteria matutina y recolitracion de las actividades a realizar por parte del ing Residente de Obra, las actividades a realizar son. amarrado de acero de refuerzo para la viga de cimentacion, segun Plano estructural. reexcavacion de zapatas para la construccion de los mismos, aseo general de obra, finiria sin contratiempo la jornada

Residente de Obra.

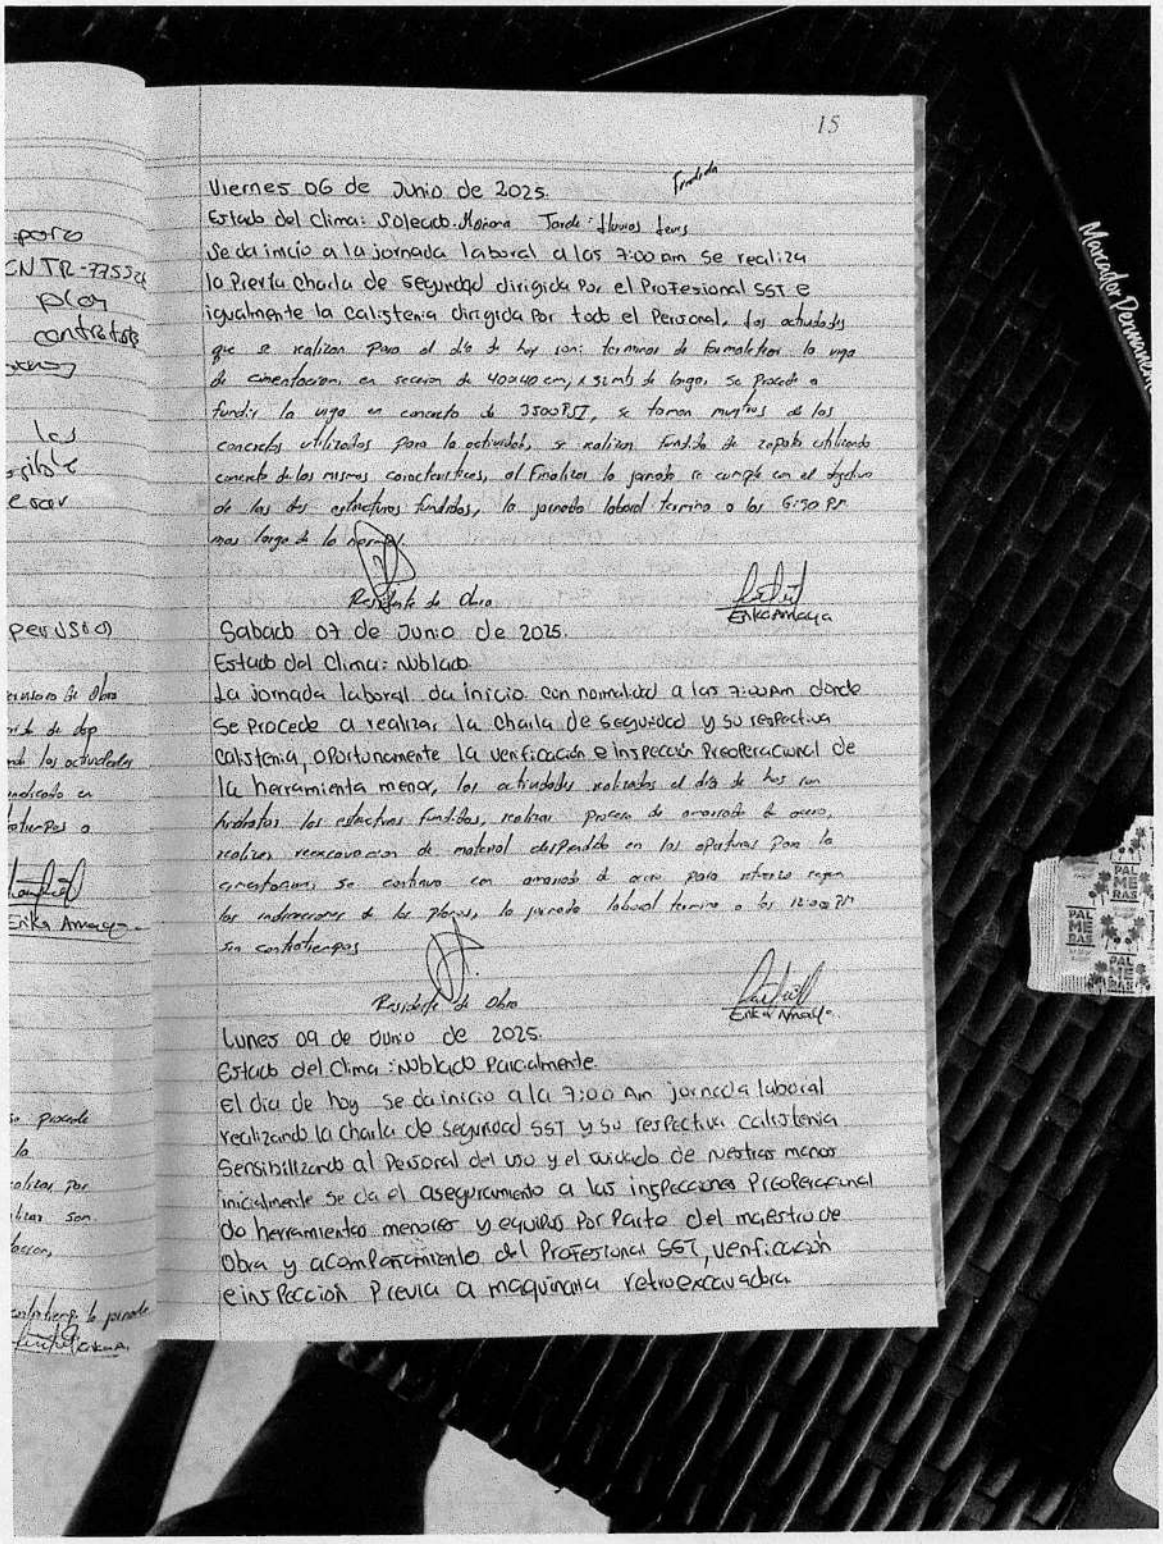

15


Viernes 06 de Junio de 2025. Fundida
Estado del clima: Soleado. Mañana Tarde: Horas tem
Se da inicio a la jornada laboral a las 7:00 am se realiza la Pierta charla de seguridad dirigida por el Profesional SST e igualmente la calistenia dirigida por todo el Personal, las actividades que se realizan para el día de hoy son: terminar de formaletear la viga de cimentacion, en seccion de 40x40 cm, x 31 mts de largo, se Procede a fundir la viga en concreto de 3500PSI, se toman muestras de los concretos utilizados para la actividad, se realizan fundida de zapata utilizando concreto de las mismas caracteristicas, al Finalizar la jornada se cumple con el objetivo de las dos estructuras fundidas, la jornada laboral termina a las 6:30 PM mas larga de la jornada

Residente de obra — Erika Arriaga

Sabado 07 de Junio de 2025.
Estado del clima: Nublado
La jornada laboral da inicio con normalidad a las 7:00AM donde se Procede a realizar la charla de seguridad y su respectiva Calistenia, oportunamente la verificación e inspección Precalentacional de la herramienta menor, las actividades realizadas el día de hoy son hidratar las estructuras fundidas, realizar proceso de amarrado de acero, realizar recargacion de material depositado en las aperturas para la cimentacion, se continua con amarrado de acero para retiro rapido los indirectos de las placas, la jornada laboral termina a las 12:00 PM sin contratiempos

Residente de Obra — Erika Arriaga

Lunes 09 de Junio de 2025.
Estado del Clima: Nublado Parcialmente
El dia de hoy se da inicio a la 7:00 Am jornada laboral realizando la charla de seguridad SST y su respectiva calistenia Sensibilizando al Personal del uso y el cuidado de nuestras manos inicialmente se da el aseguramiento a las inspecciones Precalentacional de herramientas menores y equipos por parte del maestro de Obra y acompañamiento del Profesional SST, verificación e inspección Previa a maquinaria retroexcavadora

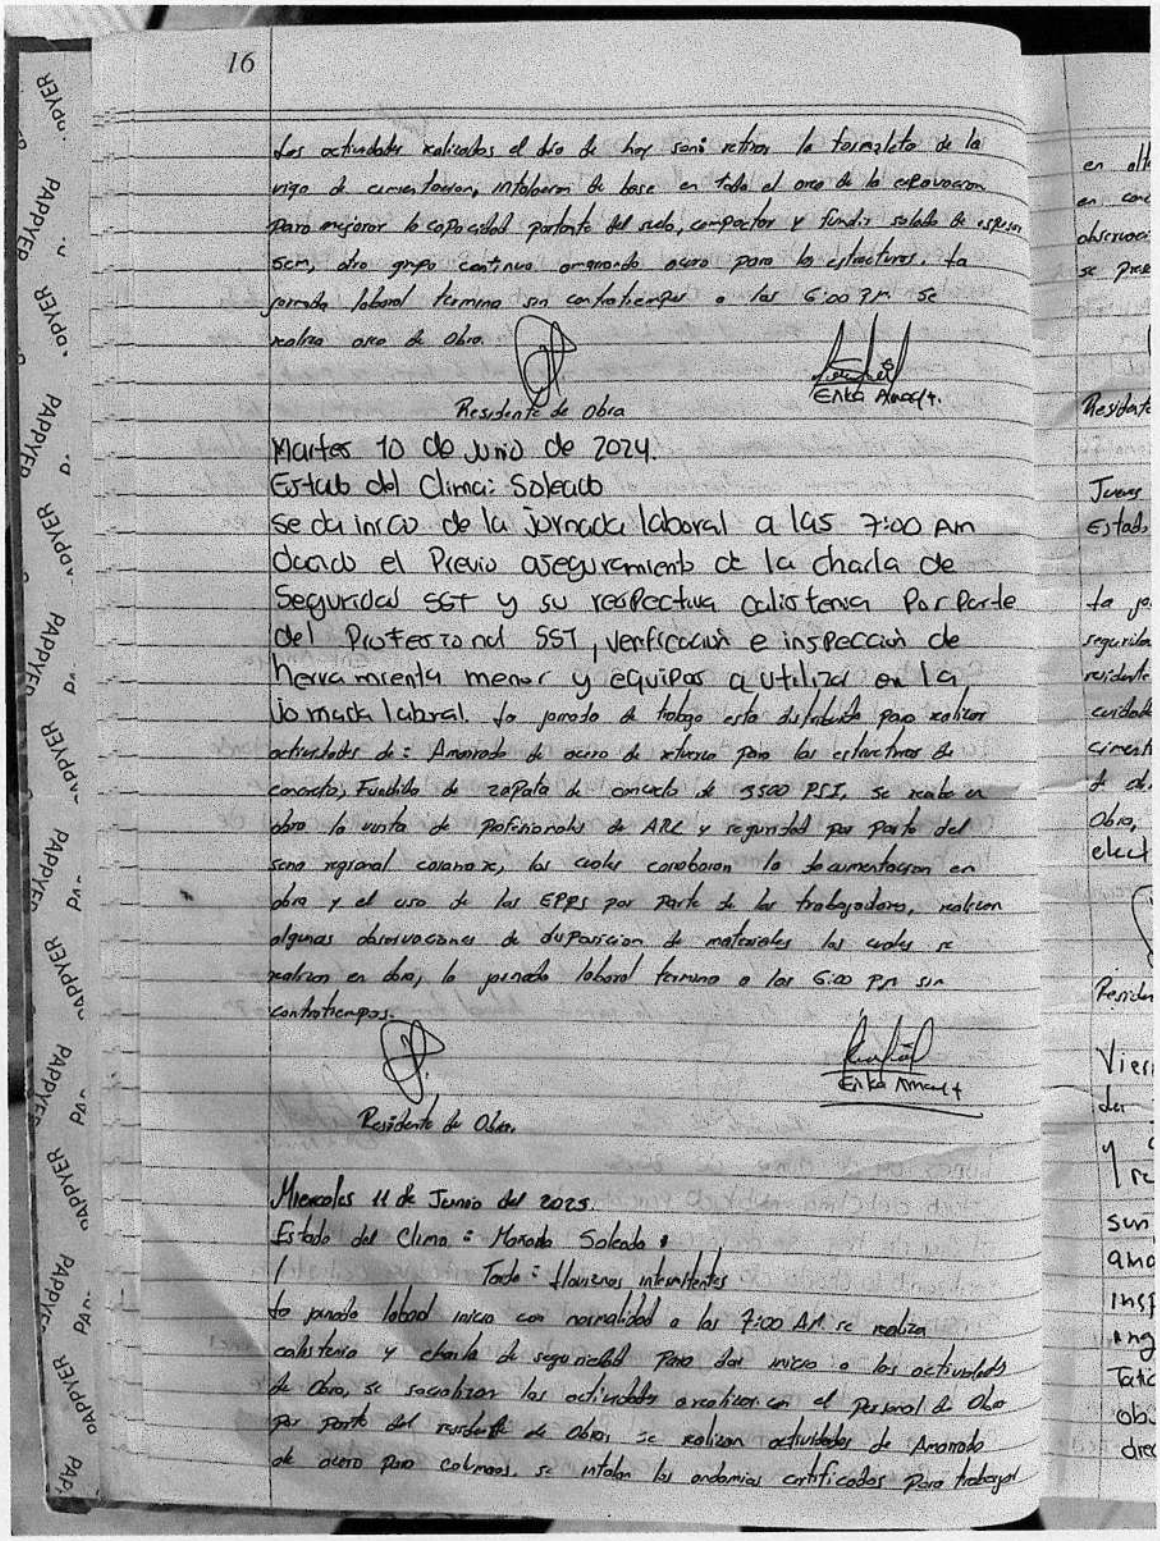

16

las actividades realizadas el día de hoy son: retiro de formaleta de la viga de cimentación, instalación de base en todo el area de la excavación para mejorar la capacidad portante del suelo, compactar y fundir solado de espesor 5cm, otro grupo continua armando acero para las estructuras. La jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 PM se realiza aseo de obra.

Residente de obra


Erika Amaya

Martes 10 de Junio de 2024.
Estado del Clima: Soleado
se da inicio de la jornada laboral a las 7:00 AM dando el Previo aseguramiento de la charla de Seguridad SST y su respectiva calistenia Por Parte del Profesional SST, Verificación e inspección de herramienta menor y equipos a utilizar en la jornada laboral. La jornada de trabajo esta distribuida para realizar actividades de: Amarrado de acero de refuerzo para las estructuras de concreto, Fundida de zapata de concreto de 3500 PSI, se realiza en obra la visita de profesionales de ARL y seguridad por parte del sena regional cesar, los cuales corroboran la documentacion en obra y el uso de los EPPS por parte de los trabajadores, realizan algunas observaciones de disposicion de materiales los cuales se realizan en obra, la jornada laboral termina a las 6:00 PM sin contratiempos.

Residente de Obra.

Erika Amaya

Miercoles 11 de Junio del 2025.
Estado del Clima: Nublado Soleado
/ Turno: Horarios intermitentes
la jornada labral inicia con normalidad a las 7:00 AM se realiza calistenia y charla de seguridad Para dar inicio a las actividades de Obra, se socializan las actividades a realizar con el Personal de Obra por parte del residente de Obra, se realizan actividades de Amarrado de acero para columnas, se instalan los andamios certificados para trabajo

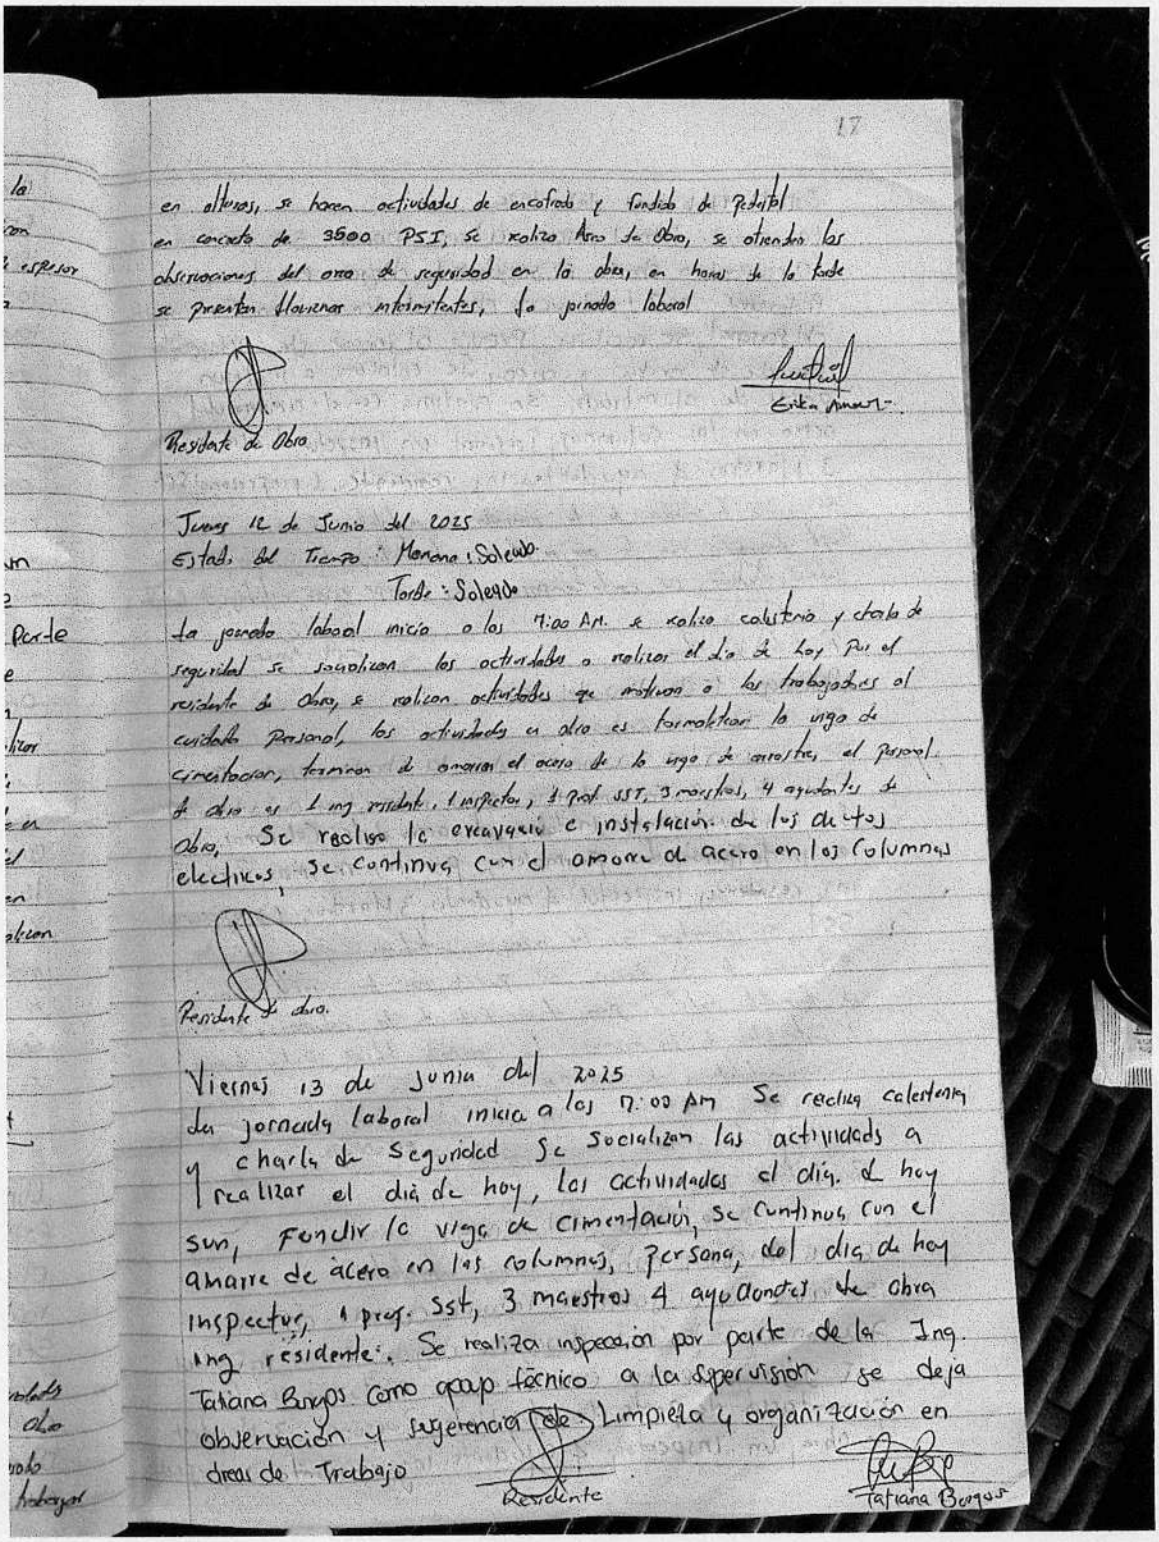

17

en alturas, se hacen actividades de encofrado y fundido de pedestal en concreto de 3500 PSI, se realizo Arreglo de Obra, se atienden las observaciones del area de seguridad en la obra, en horas de la tarde se presentan lluvias intermitentes, fin jornada laboral

Residente de Obra

Erika Amaya

Jueves 12 de Junio del 2025
Estado del Tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado


La jornada laboral inicia a las 7:00 AM. se realiza calistenia y charla de seguridad se socializan las actividades a realizar el dia de hoy por el residente de Obra, se realizan actividades que motiven a los trabajadores al cuidado personal, las actividades en obra es formaleteo la viga de cimentacion, terminar de amarrar el acero de la viga de arriostre, el personal de obra es 1 ing residente, 1 inspector, 1 prof SST, 3 maestros, 4 ayudantes de obra, Se realiza la excavacion e instalacion de los ductos electricos, se continua con el amarre de acero en las columnas

Residente de obra.

Viernes 13 de junio del 2025
La jornada laboral inicia a las 7:00 AM Se realiza calestenia y charla de seguridad Se socializan las actividades a realizar el dia de hoy, las actividades el dia de hoy son, Fundir la viga de cimentacion, se continua con el amarre de acero en las columnas, Personal del dia de hoy inspector, 1 prof. SST, 3 maestros 4 ayudantes de obra ing residente. Se realiza inspeccion por parte de la Ing. Tatiana Burgos como apoyo técnico a la supervision se deja observacion y sugerencia de Limpieza y organizacion en areas de Trabajo

Residente

Tatiana Burgos

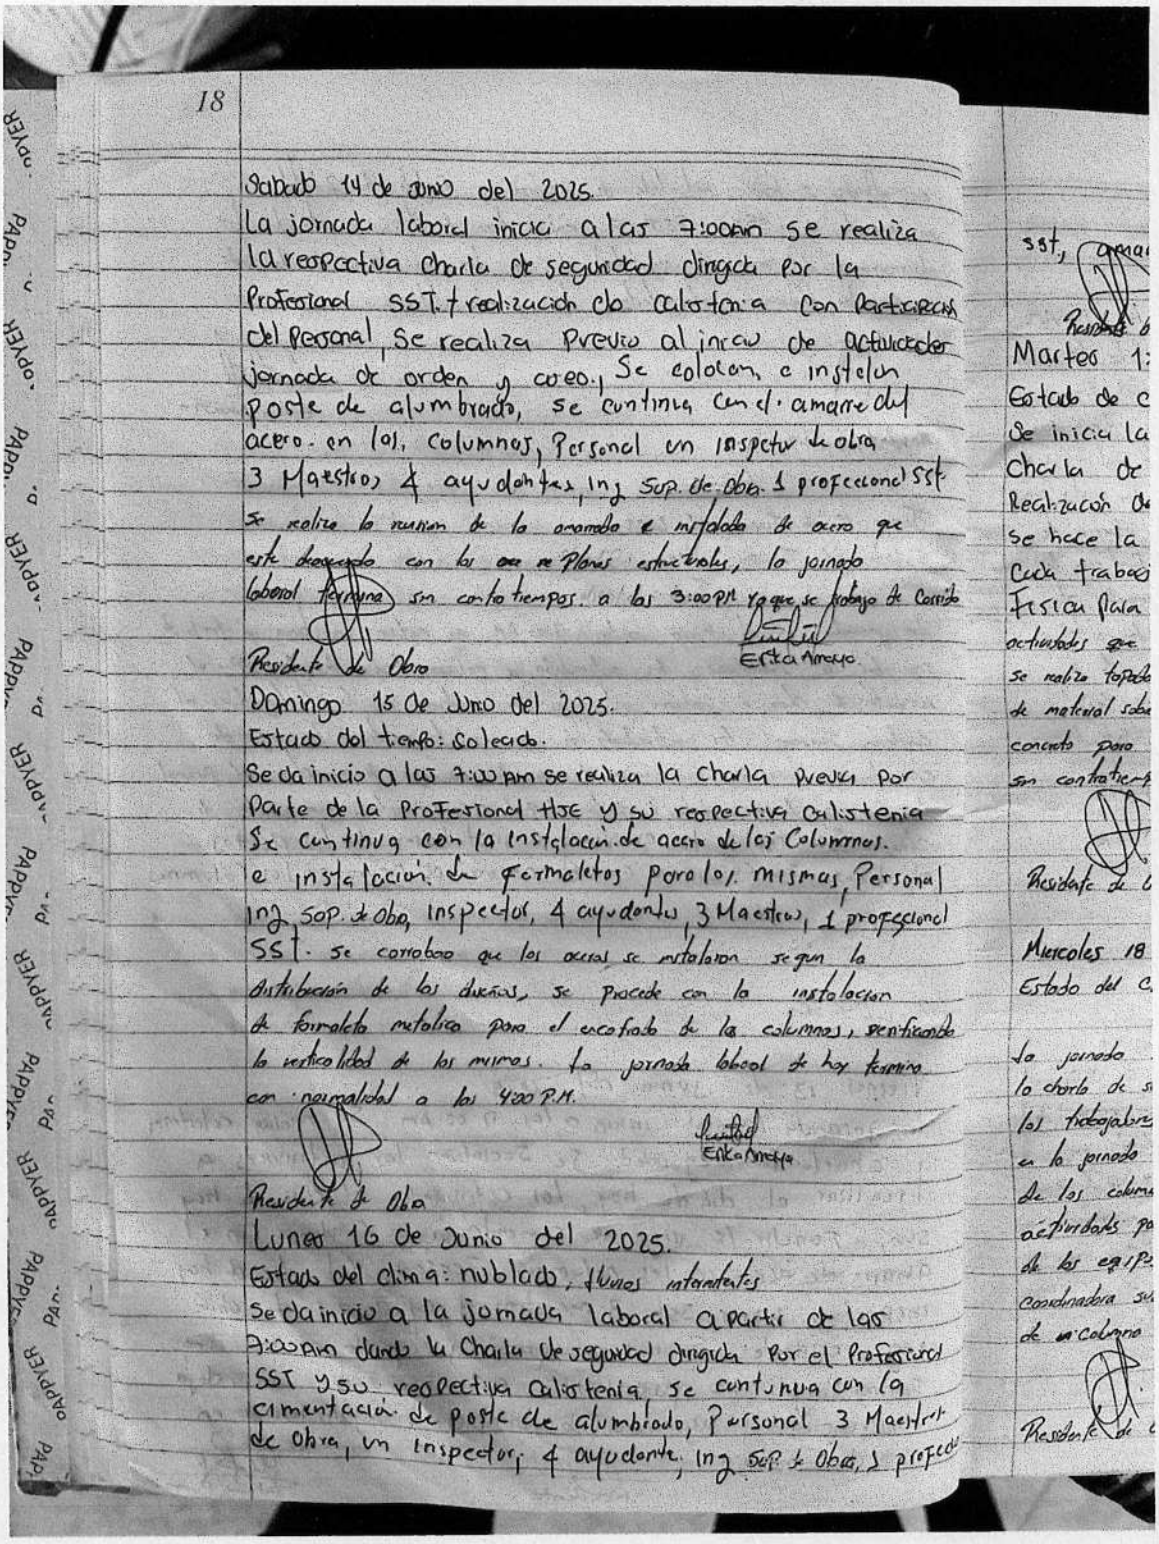

18

Sabado 14 de Junio del 2025.
La jornada laboral inicia a las 7:00am se realiza la respectiva charla de seguridad dirigida por la Profesional SST. y realizacion de calistenia con participacion del personal, Se realiza previo al inicio de actividades jornada de orden y aseo., Se colocan e instalan poste de alumbrado, se continua con el amarre del acero en los columnas, Personal un inspector de obra 3 Maestros 4 ayudantes, Ing Sup. de Obra. 1 profesional SST. Se realiza la revision de lo armado e instalado de acero que este de acuerdo con los de Planos estructurales, la jornada laboral termina sin contratiempos. a las 3:00 P.M. ya que se trabajo de corrido

Residente de Obra — Erika Arroyo

Domingo 15 de Junio del 2025.
Estado del tiempo: Soleado.
Se da inicio a las 7:00 am se realiza la charla previa por parte de la Profesional HSE y su respectiva Calistenia Se continua con la instalacion de acero de las Columnas. e instalacion de formaletas para los mismas, Personal Ing. Sup. de Obra, Inspector, 4 ayudantes, 3 Maestros, 1 profesional SST. Se corrobora que los aceros se instalaron segun la distribucion de los diseños, se procede con la instalacion de formaleta metalica para el encofrado de la columnas, verificando la verticalidad de los mismos. la jornada laboral de hoy termina con normalidad a las 4:00 P.M.

Residente de Obra — Erika Arroyo

Lunes 16 de Junio del 2025.
Estado del clima: nublado, algunas intermitentes
Se da inicio a la jornada laboral a partir de las 7:00am dando la Charla de seguridad dirigida por el Profesional SST y su respectiva calistenia se continua con la cimentacion de poste de alumbrado, Personal 3 Maestros de Obra, un inspector, 4 ayudantes, Ing Sup. de Obra, 1 profes

sst, arma

Residente de

Martes 1

Estado de c

Se inicia la

Charla de

Realizacion de

se hace la

Cada trabaj

Fisica para

actividades que

Se realiza topado

de material sob

concreto para

sin contratiem

Residente de

Miercoles 18

Estado del C

la jornada

la charla de s

los trabajadore

en la jornada

de las colum


actividades p

de los equipo

coordinadora su

de un Colomo

Residente de

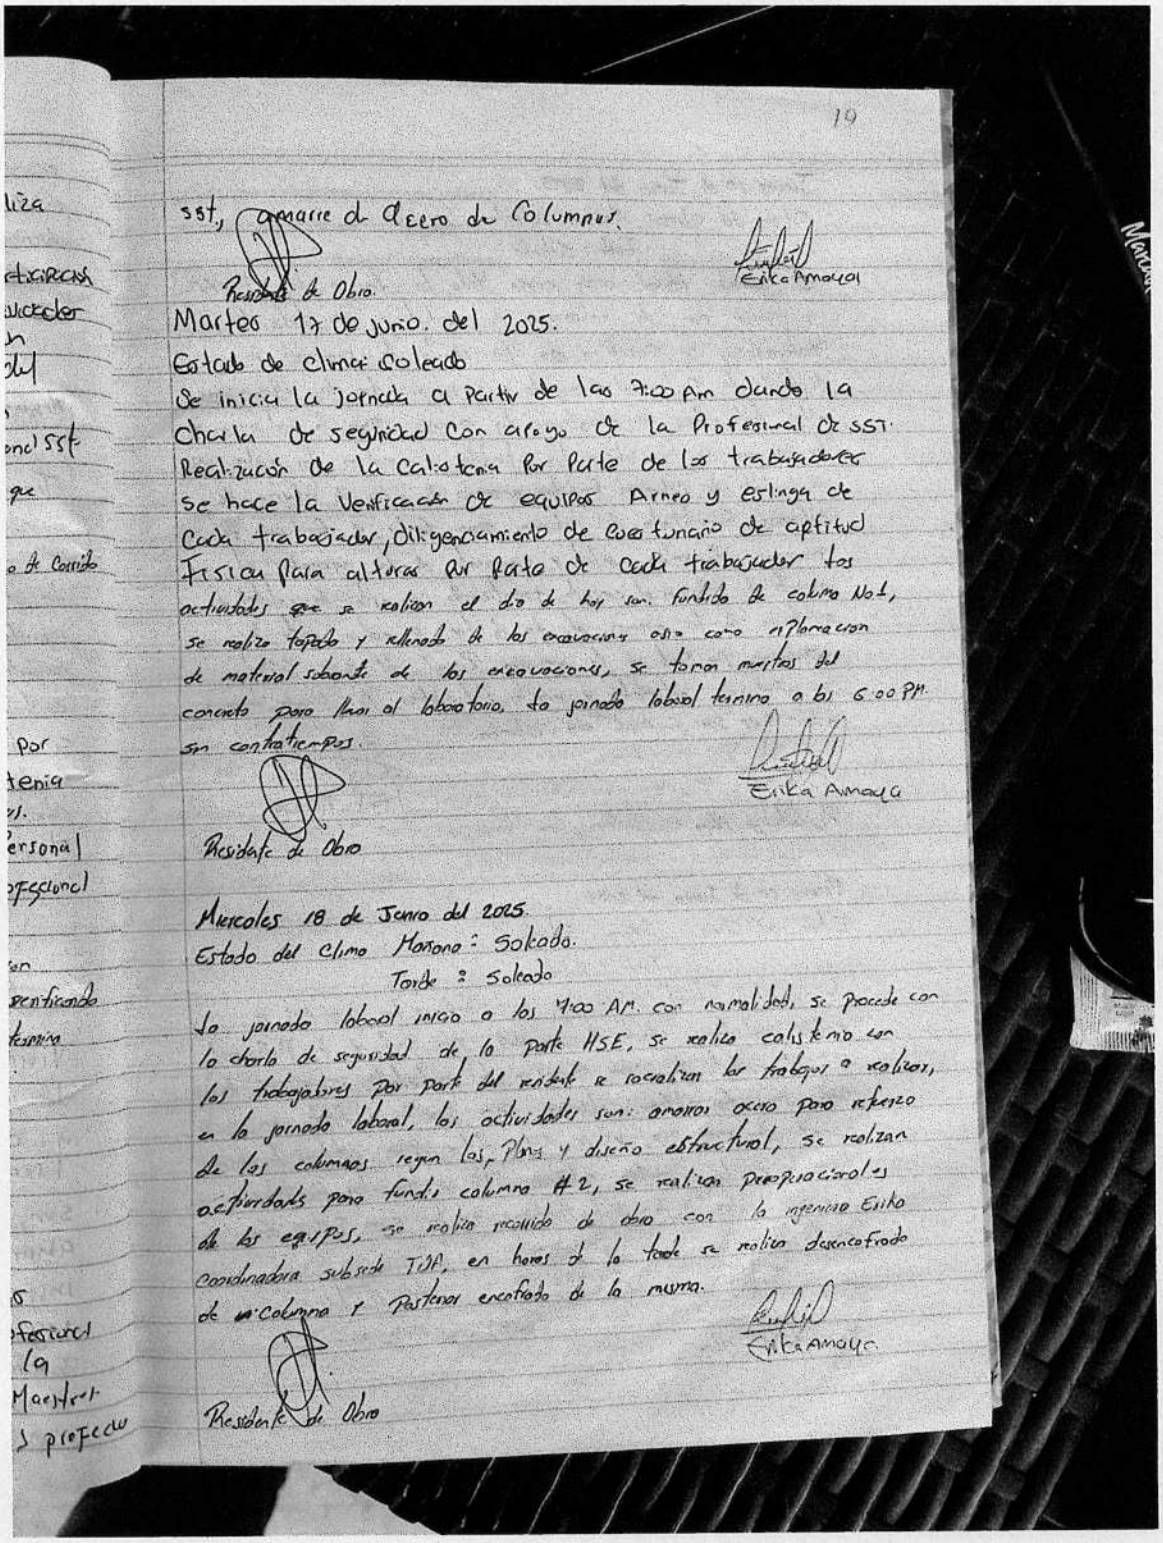

19

sst, armarre de acero de columnas.

Residente de Obra.

Erika Amaya

Martes 17 de junio. del 2025.
Estado de clima: Soleado
Se inicia la jornada a partir de las 7:00 Am dando la charla de seguridad con apoyo de la Profesional de SST. Realizacion de la Calistenia por parte de los trabajadores se hace la Verificacion de equipos Arnes y eslinga de cada trabajador, Diligenciamiento de cuestionario de aptitud Fisica para alturas por parte de cada trabajador las actividades que se realizan el dia de hoy son: fundido de columna No1, se realiza topado y rellenado de las excavaciones con su nivelacion de material sobrante de las excavaciones, se toman muestras del concreto para llevar al laboratorio. la jornada laboral termino a las 6:00 PM sin contratiempos.


Erika Amaya

Residente de Obra

Miercoles 18 de Junio del 2025.
Estado del clima Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado
La jornada laboral inicio a las 7:00 AM. con normalidad, se procede con la charla de seguridad de la parte HSE, se realiza calistenia con los trabajadores por parte del residente se realizan los trabajos a realizar en la jornada laboral, las actividades son: amarres acero para refuerzo de las columnas segun los, Planos y diseño estructural, se realizan actividades para fundir columna #2, se realizan preoperacionales de los equipos, se realiza reunion de obra con la ingeniera Erika coordinadora subsede TDF, en horas de la tarde se realiza desencofrado de una columna y Posterior encofrado de la misma.

Erika Amaya

Residente de Obra

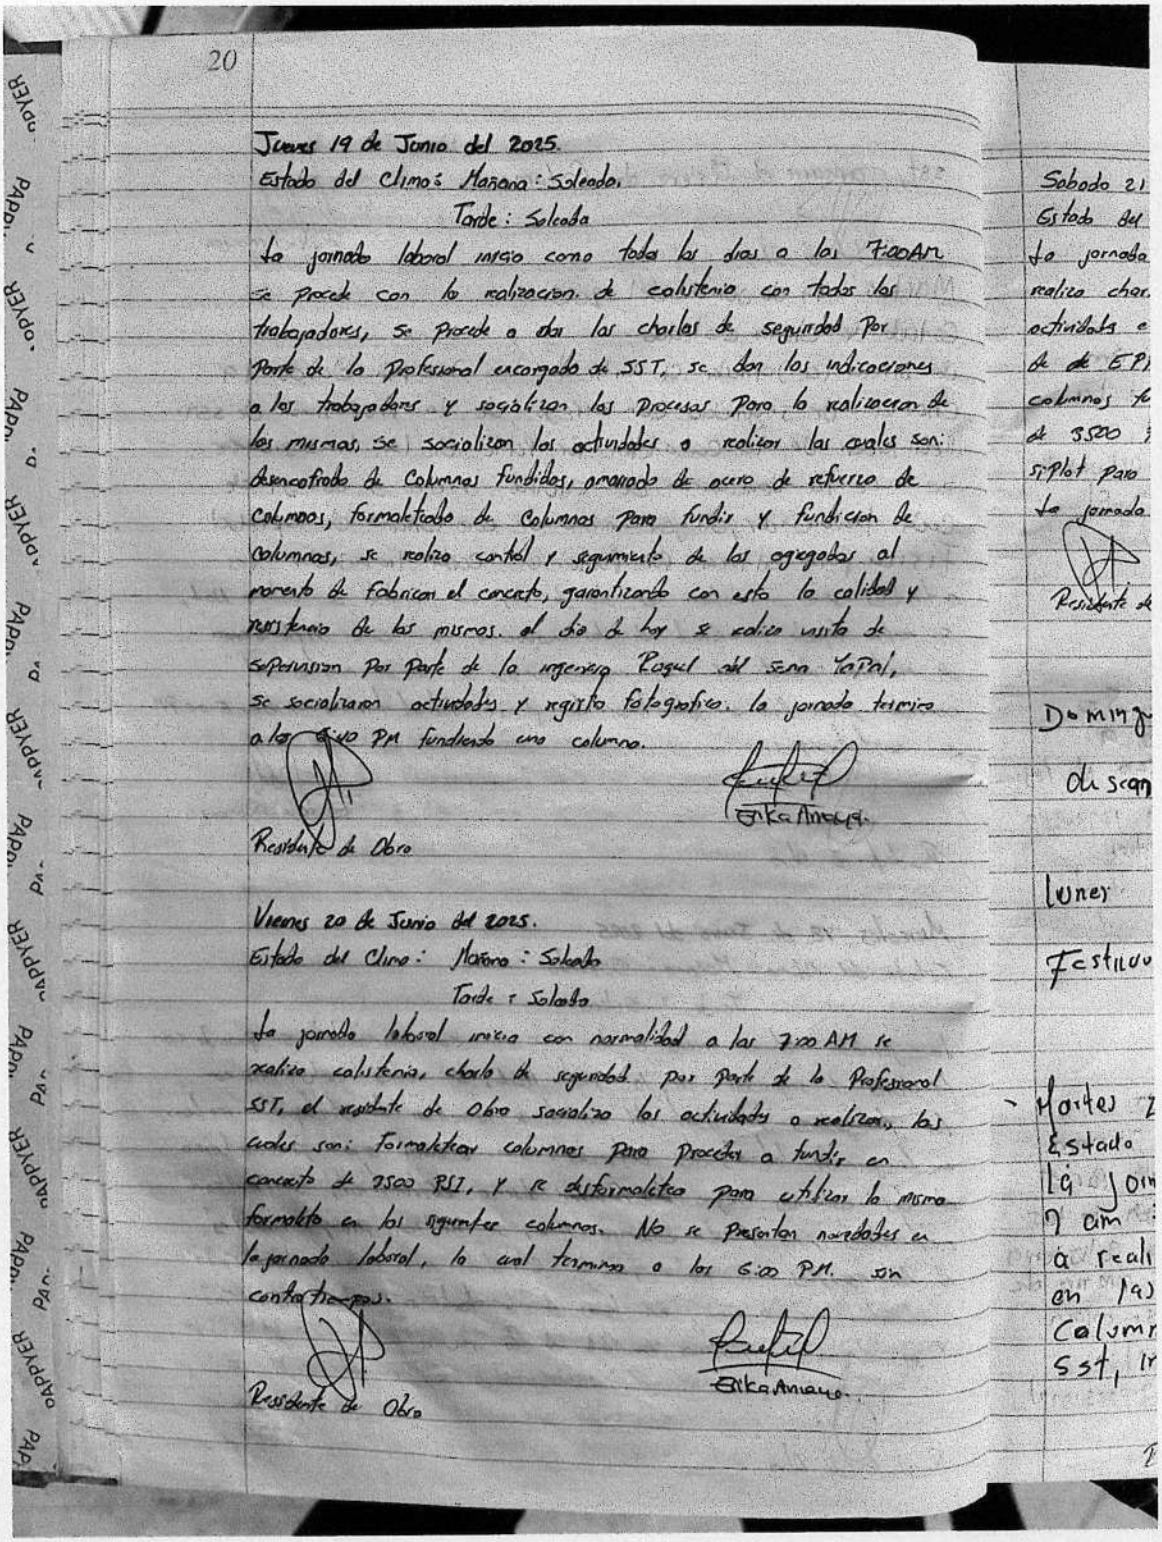

20

Jueves 19 de Junio del 2025.
Estado del Clima: Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado
La jornada laboral inicio como todos los dias a las 7:00AM se procede con la realizacion de calistenia con todos los trabajadores, se procede a dar las charlas de seguridad por parte de la Profesional encargada de SST, se dan las indicaciones a los trabajadores y socializan los procesos para la realizacion de las mismas, se socializan las actividades a realizar las cuales son: desencofrado de Columnas fundidas, armado de acero de refuerzo de columnas, formaleteado de Columnas para fundir y fundicion de columnas, se realiza control y seguimiento de los agregados al momento de fabricar el concreto, garantizando con esto la calidad y resistencia de los mismos. al dia de hoy se edlica visita de supervision por parte de la ingeniera Raquel del Sena Total, se socializaron actividades y registro fotografico. la jornada termina a las 6:00 PM fundiendo una columna.

Erika Amaya.

Residente de Obra

Viernes 20 de Junio del 2025.
Estado del Clima: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM se realiza calistenia, charla de seguridad por parte de la Profesional SST, el residente de Obra socializa las actividades a realizar, las cuales son: Formaletear columnas para proceder a fundir en concreto de 3500 PSI, y se desformaletea para utilizar la misma formaleta en las siguientes columnas. No se presentan novedades en la jornada laboral, la cual termina a las 6:00 PM. sin contratiempos.

Erika Amaya.

Residente de Obra

21

Sabado 21 de Junio del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado
La jornada laboral inicio con normalidad a las 7:00 AM, se realizo charlado de seguridad, y socializacion de aseguramiento para de actividades e identificacion de Peligros y riesgos, asi como uso adecuado de de EPPS. las actividades a realizar son: gestar formaleta de las columnas fundidas y formaletear otras, se funden columnas en concreto de 3500 PSI, se envuelven las columnas fundidas con papel siplot para mantener humedad y dar un mejor curado a las actividades, la jornada laboral termino a las 12:25 PM sin contratiempos

Residente de obra

Erika Arenas

Domingo 22 de junio del 2025


descanso

lunes 23 de junio del 2025

Festivo

- Martes 24 de junio del 2025
Estado del clima lluvioso en las horas de la mañana la jornada laboral se inicio con normalidad a las 7 am se realiza charla de seguridad las actividades a realizar se procede a amarar acero de las columnas en las horas de la tarde, se quita formaleta de las columnas, personal 3 Maestros 4 ayudante un profesional sst, Ing [redacted], inspector de obra.

Residente de Obra

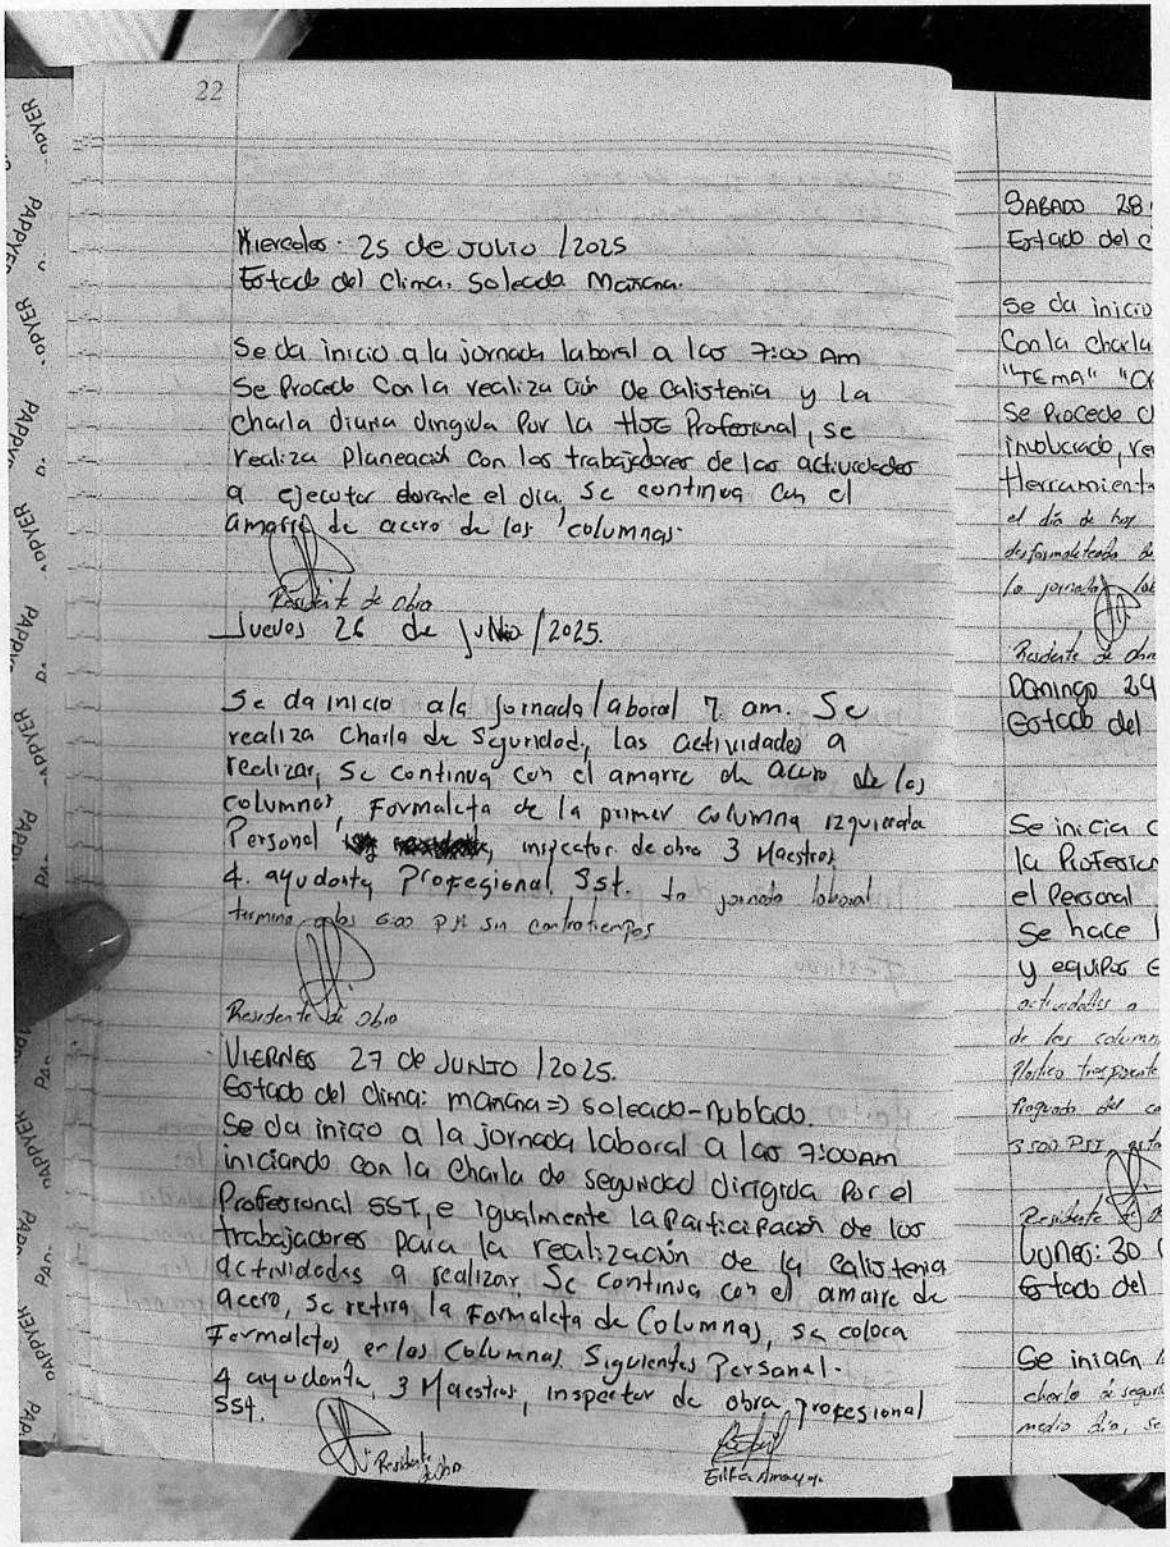

22

Miercoles 25 de JULIO /2025
Estado del Clima: Soleada Mañana

Se da inicio a la jornada laboral a las 7:00 Am
Se Procede con la realiza ción de Calistenia y la charla diaria dirigida por la HSE Profesional, se realiza Planeación con los trabajadores de las actividades a ejecutar durante el dia, Se continua con el Amarre de acero de las columnas.

Residente de obra

Jueves 26 de JUNIO /2025.

Se da inicio a la jornada laboral 7. am. Se realiza Charla de Seguridad, las actividades a realizar, Se continua con el amarre de acero de las columnas, Formaleta de la primer Columna izquierda Personal [redacted], inspector de obra 3 Maestros, 4. ayudantes Profesional SST. la jornada laboral termina a las 6:00 PM sin contratiempos

Residente de Obra

VIERNES 27 de JUNIO /2025.
Estado del Clima: mañana => soleado-nublado.
Se da inicio a la jornada laboral a las 7:00AM iniciando con la charla de seguridad dirigida por el Profesional SST, e igualmente la Participación de los trabajadores para la realización de la calistenia actividades a realizar. Se continua con el amarre de acero, se retira la Formaleta de Columnas, se coloca Formaletas en las Columnas Siguientes Personal. 4 ayudantes, 3 Maestros, inspector de obra, Profesional SST.

Residente de obra

Edificadora y.

SABADO 28
Estado del C

Se da inicio
Con la charla
"TEMA" "C
Se Procede C
inducción, re
Herramienta
el día de hoy
de formaleteria
la jornada lab

Residente de Obra


Domingo 29
Estado del

Se inicia c
la Profesio
el Personal
Se hace l
y equipos e
actividades a
de las columna
Plastico transparente
Progreso del co
3.500 PSI apro

Residente de O

Lunes: 30
Estado del

Se iniaca
charla de seguri
medio dia, se

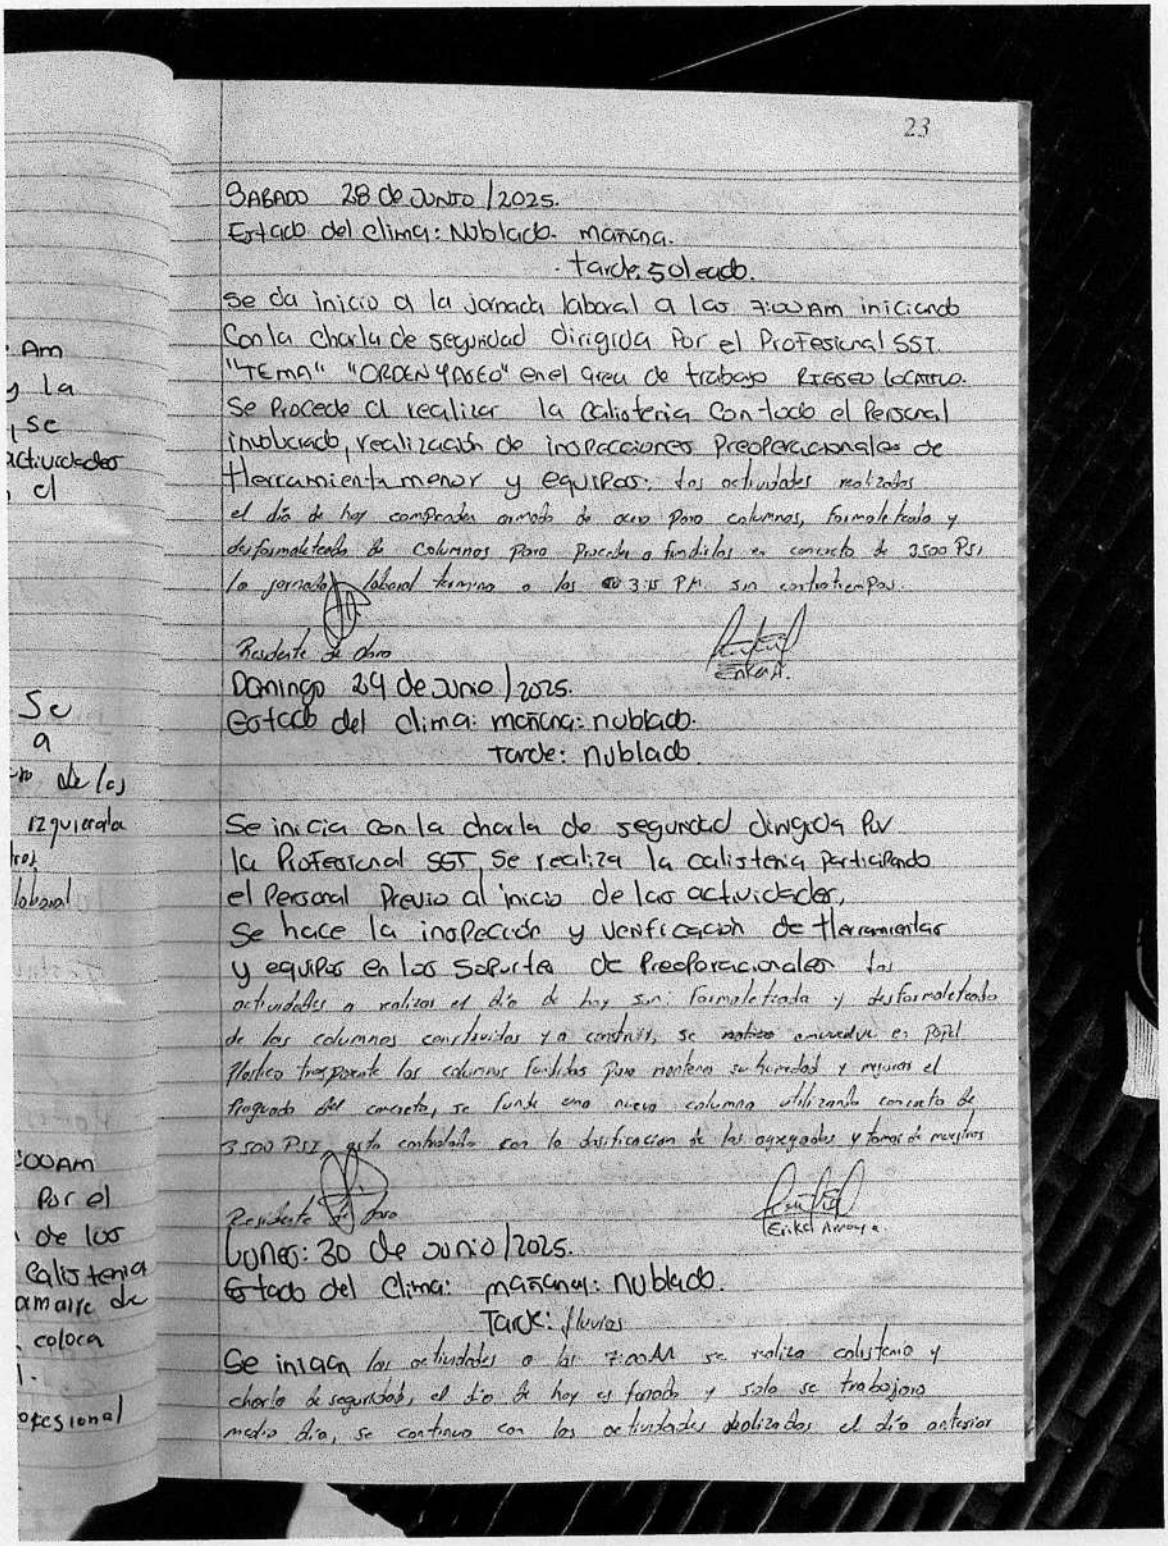

23

SABADO 28 de JUNIO / 2025.
Estado del clima: Nublado. mañana.
tarde. Soleado.
se da inicio a la jornada laboral a las 7:00 AM iniciando con la charla de seguridad dirigida por el Profesional SST. "TEMA" "ORDEN Y ASEO" en el area de trabajo RIESGO LOCATIVO. Se Procede a realizar la calistenia con todo el Personal involucrado, realizacion de inspecciones Preoperacionales de Herramienta menor y equipos. las actividades realizadas el día de hoy comprenden armado de acero para columnas, Formaleteado y desformaleteado de columnas para proceder a fundirlas en concreto de 3500 PSI la jornada laboral termina a las 3:15 P.M. sin contratiempos.

Residente de obra

Erika A.


Domingo 29 de Junio / 2025.
Estado del clima: mañana: nublado.
Tarde: nublado.

Se inicia con la charla de seguridad dirigida por la Profesional SST, se realiza la calistenia participando el Personal Previo al inicio de las actividades, Se hace la inspeccion y verificacion de herramientas y equipos en los Sitios de Preoperacionales las actividades a realizar el día de hoy son: Formaleteado y desformaleteado de las columnas construidas y a construir, se instala empradizado en Polietileno transparente las columnas fundidas para mantener su humedad y mejorar el fraguado del concreto, se funde una nueva columna utilizando concreto de 3500 PSI, esta controlado con la dosificacion de los agregados y toma de muestras

Residente de obra

Erika Arroyave

Lunes: 30 de junio / 2025.
Estado del Clima: mañana: nublado.
Tarde: lluvias
Se inicia las actividades a las 7:00 AM se realiza calistenia y charla de seguridad, el dia de hoy es festivo y solo se trabajara medio dia, se continua con las actividades realizadas el día anterior

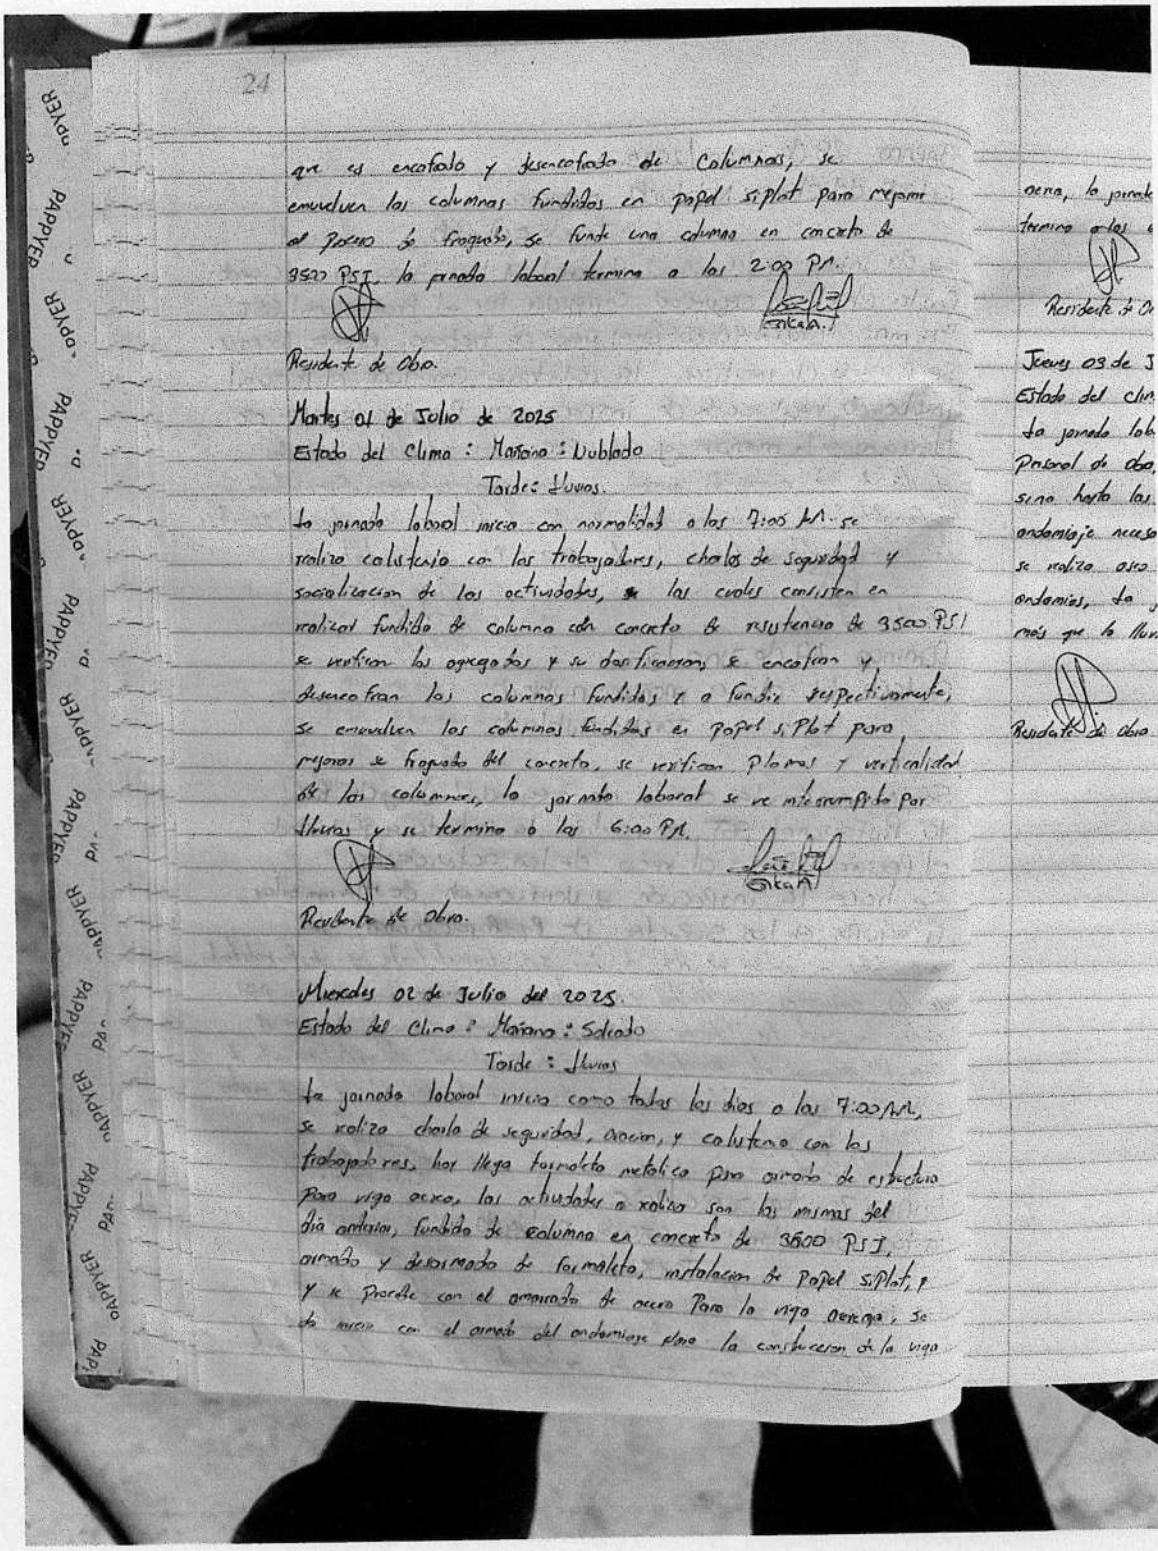

24

que es encofrado y desencofrado de columnas, se envuelven las columnas fundidas en papel siplat para mejorar el proceso de fraguado, se funde una columna en concreto de 3500 PSI, la jornada laboral termina a las 2:00 PM.

Residente de Obra.

Martes 01 de Julio de 2025
Estado del Clima : Mañana : Nublado
Tarde: Lluvias.

la jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM. se realiza calistenia con los trabajadores, charla de seguridad y socializacion de las actividades, a las cuales consisten en realizar fundido de columna con concreto de resistencia de 3500 PSI se verifican los agregados y su dosificaciones se encofran y desencofran las columnas fundidas y a fundir respectivamente, se envuelven las columnas fundidas en papel siplat para mejorar el fraguado del concreto, se verifican Plomos y verticalidad de las columnas, la jornada laboral se ve interrumpida por lluvias y se termina a las 6:00 PM.

Residente de obra.

Miercoles 02 de Julio del 2025.
Estado del Clima : Mañana : Soleado
Tarde : Lluvias


la jornada laboral inicia como todos los dias a las 7:00 AM, se realiza charla de seguridad, oracion, y calistenia con los trabajadores, hoy llega formaleta metalica para armado de estructura para viga aerea, las actividades a realizar son las mismas del dia anterior, fundido de columna en concreto de 3500 PSI, armado y desarmado de formaleta, instalacion de papel siplat, y se procede con el armando de acero para la viga aerea, se da inicio con el armado del andamiaje para la construccion de la viga

aerea, la jornada termina a las

Residente de Obra

Jueves 03 de J
Estado del Cli
la jornada lab
Personal de obra
sino hasta las
andamiaje nece
se realiza ase
andamios, la j
mas que la llu


Residente de obra

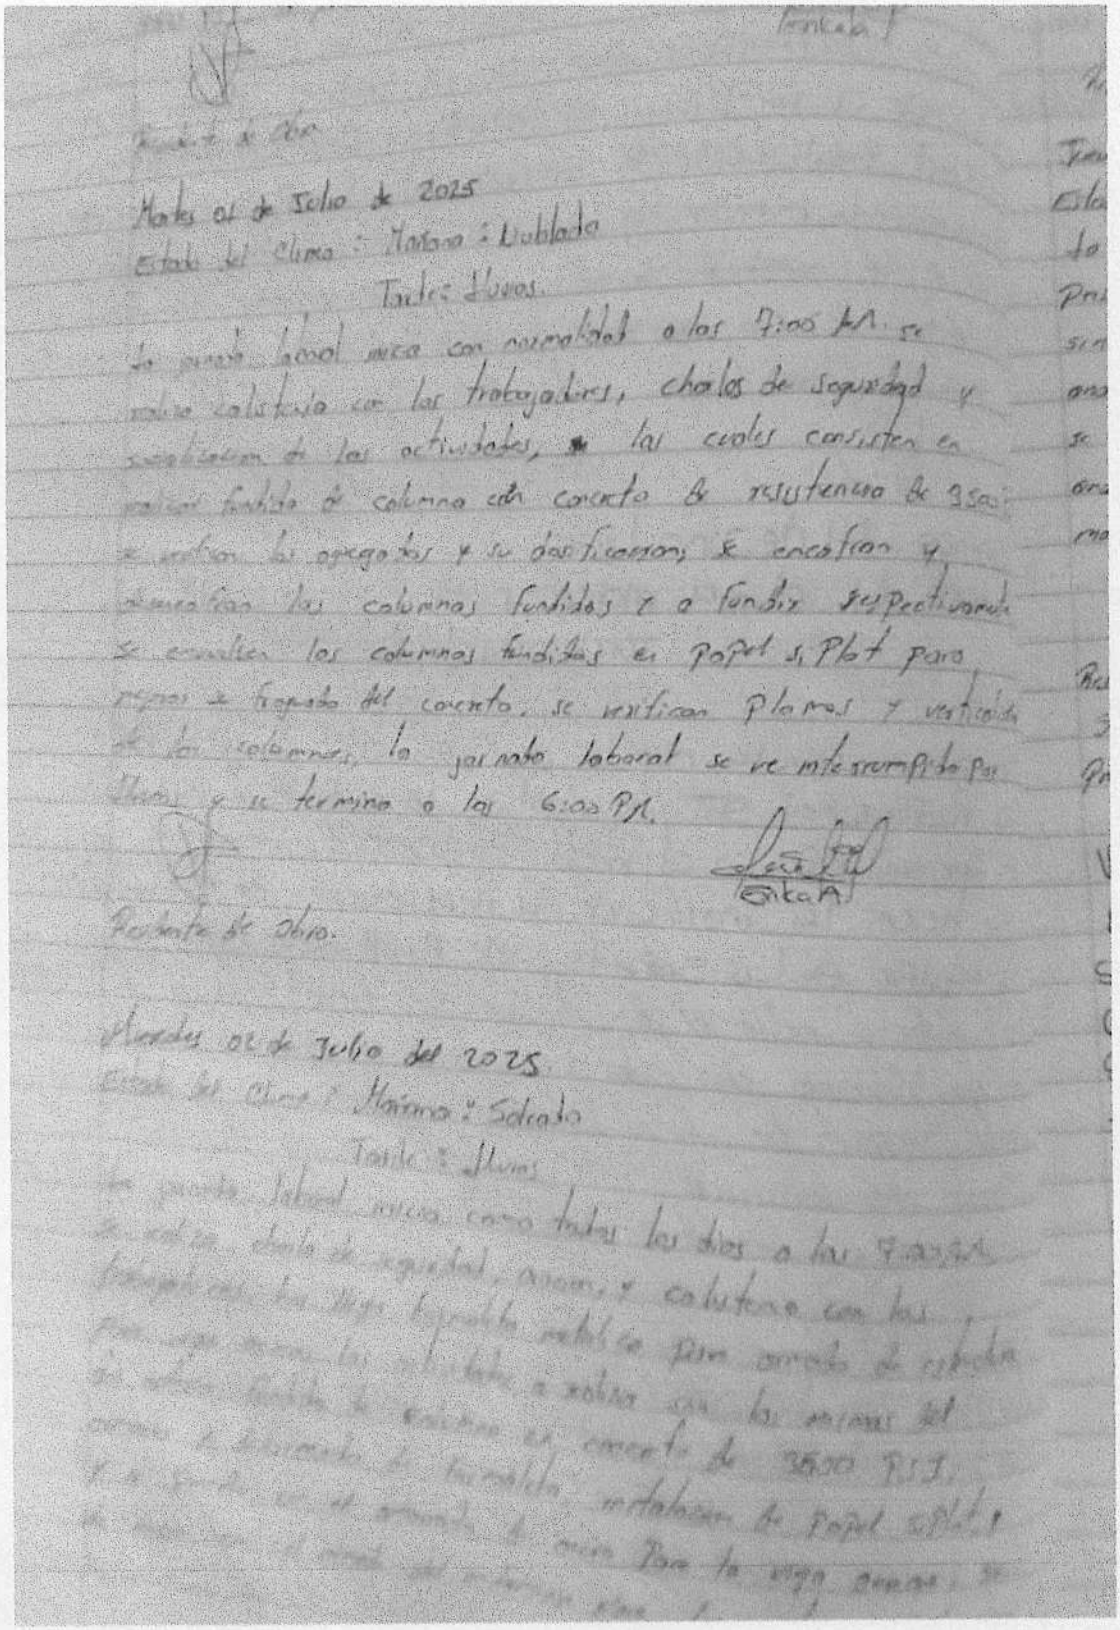

Martes 01 de Julio de 2025
Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Lluvias
La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM. se realiza calistenia con los trabajadores, charlas de seguridad y socialización de las actividades, a las cuales consisten en realizar fundida de columna con concreto de resistencia de 3500 psi; se realizan los agregados y se dosifican; se encofran y desencofran las columnas fundidas y a fundir respectivamente se enumeran las columnas fundidas en papel y Plot para reporte y fraguado del concreto. se realizan planos y verticalidad de las columnas, la jornada laboral se ve interrumpida por lluvias y se termina a las 6:00 PM.

Residente de Obra.

Martes 01 de Julio del 2025.
Estado del Clima: Mañana: Soleado
Tarde: Lluvias
La jornada laboral inicia como todos los dias a las 7:00 AM se realiza charla de seguridad, charla y calistenia con los trabajadores, se hace reporte medico para cada uno de ellos, luego se realiza el vaciado de columnas de concreto de 3500 PSI. Se realizan los ensayos de asentamiento de cono para la viga [illegible]

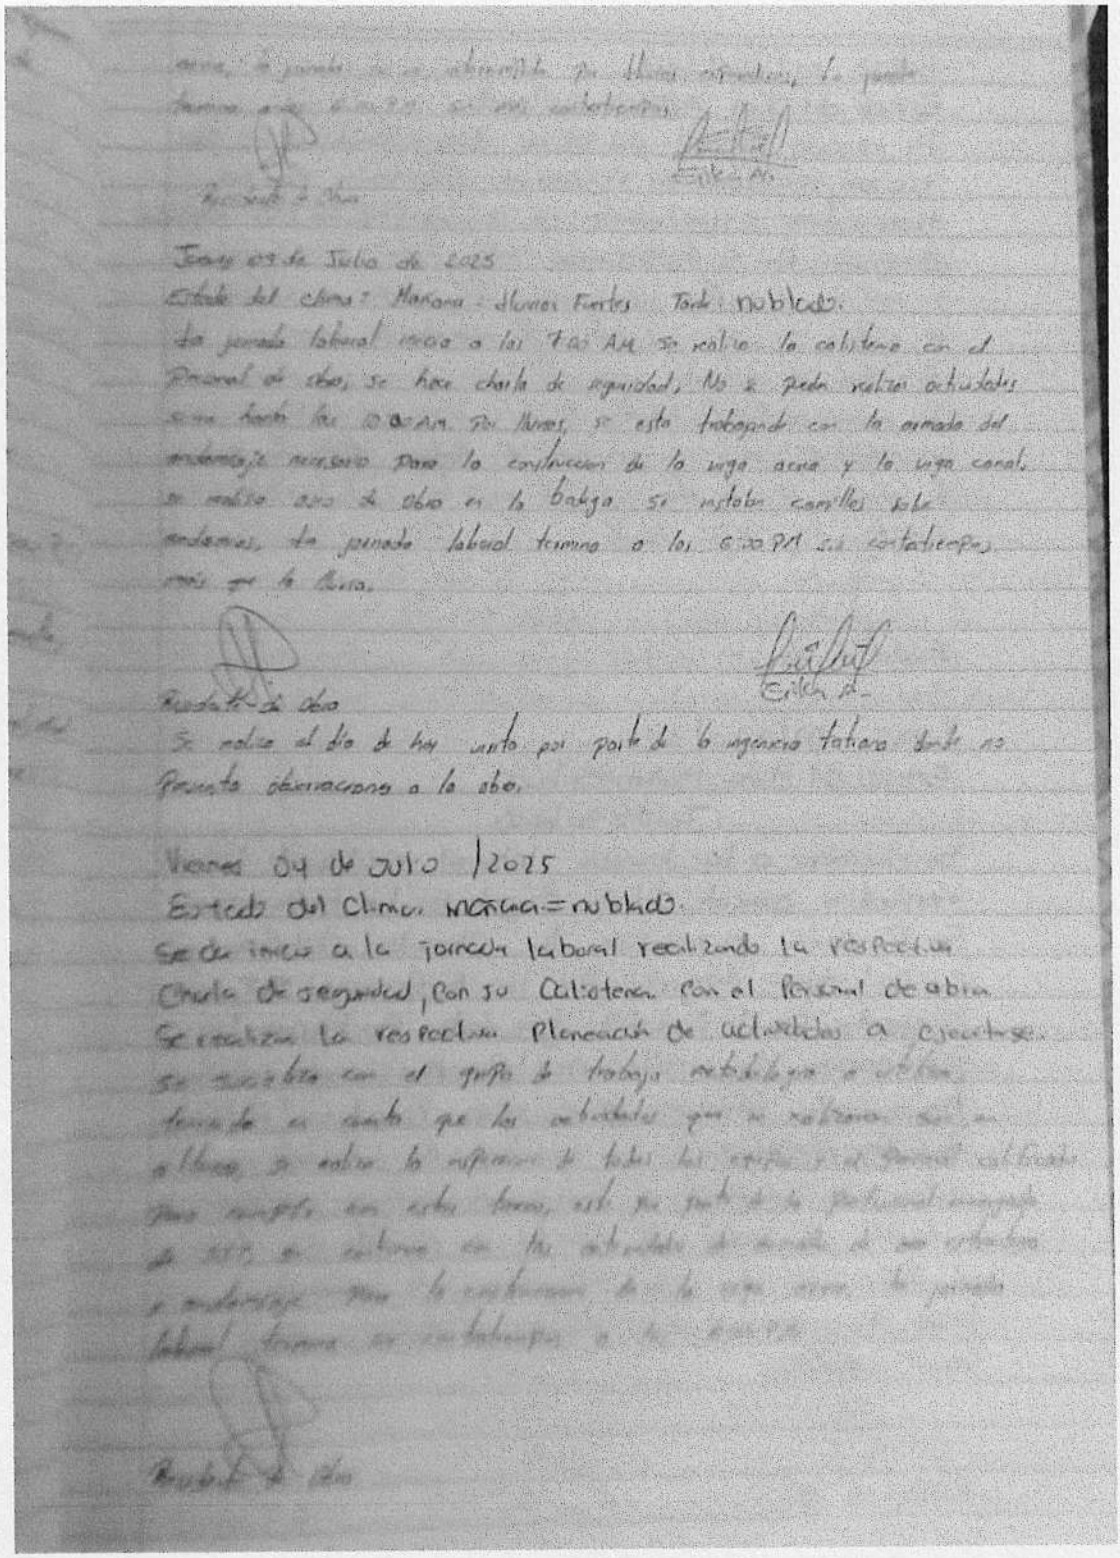


Jueves 03 de Julio de 2025
Estado del clima: Mañana - Horas Fuertes Tarde: nublado.
La jornada laboral inicio a las 7:00 AM se realizo la calistenia con el personal de obra, se hace charla de seguridad, No se pudo realizar actividades hasta las 10 a.m. Por lluvias, se esta trabajando con la armada del andamiaje necesario para la construccion de la viga cerca y la viga canal. se realizo aseo de obra en la tarde se instalan canillas sobre andamios, la jornada laboral termino a las 6:00 PM se contabilizan 10hrs por la tarde.

Residente de obra

Se realiza el dia de hoy visita por parte de la ingeniera tatiana donde se presenta observaciones a la obra.

Viernes 04 de JULIO /2025
Estado del Clima: mañana=nublado.
Se da inicio a la jornada laboral realizando la respectiva Charla de seguridad, con su Calistenia con el Personal de obra. Se realiza la respectiva Planeacion de actividades a ejecutarse. Se trabaja con el grupo de trabajo establecido en obra, teniendo en cuenta que las actividades que se realizan son en alturas se realiza la respectiva toma de todos los controles y el personal calificado para cumplir con estas tareas, esta por parte de la profesional encargada de SST se entrega los elementos de acuerdo a cada actividad a realizar. Para la culminacion de la jornada laboral termina en contabilizan 8 horas.

Residente de obra

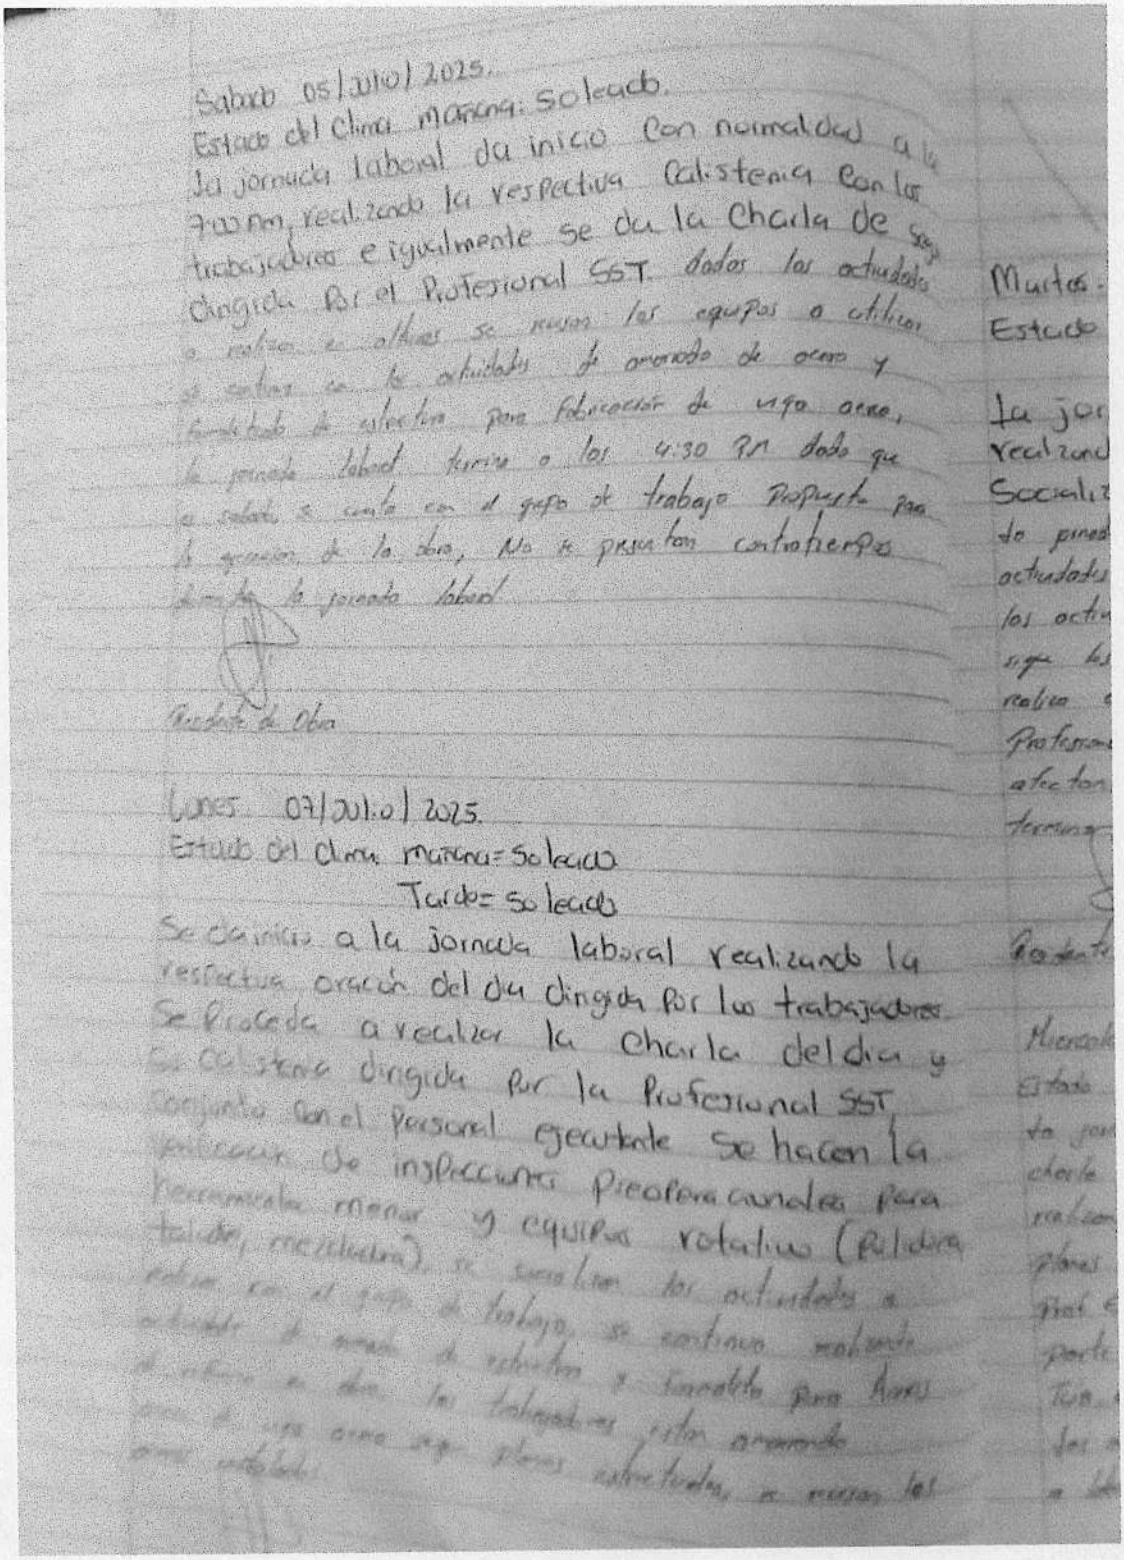

Sabado 05/10/2025.
Estado del Clima mañana: Soleado.
La jornada laboral da inicio con normalidad a las 7:00 Am, realizando la respectiva Calistenia con los trabajadores e igualmente se da la Charla de seg. dirigida por el Profesional SST. Dados los actividades a realizar se alistan los equipos a utilizar se cortan los actividades de amarado de acero y formaleta de columnas para fabricación de viga acero, la jornada laboral termina a las 4:30 PM dado que el sabado se cuenta con el grupo de trabajo Dispuesto para la ejecución de la obra, No se presentan contratiempos durante la jornada laboral

Residente de Obra

Lunes 07/10/2025.
Estado del Clima mañana= Soleado
Tarde= Soleado
Se da inicio a la jornada laboral realizando la respectiva oración del dia dirigida por los trabajadores Se Procede a realizar la charla del dia y la Calistenia dirigida por la Profesional SST conjunto con el personal ejecutante se hacen la inspeccion de inspecciones Preoperacionales para herramienta menor y equipo rotativo (Pulidora taladro, mezcladora) se socializan las actividades a realizar en el grupo de trabajo, se continua realizando el armado de columnas y formaleta para losa de la obra los trabajadores estan armando una columna

Martes.
Estado

la jor
realizand
Socializ
de pinch
actividades
las activ
sigue la
realiza
Profesiona
afectan
termina

Residente

Miercole
Estado
la jor
charla
realiza
plano
para
parte
Tuv
los
a la

Martes. 08/07/2025.
Estado del clima: Mañana = soleado.
Tarde: lluvias
La jornada laboral da inicio a las 7:00am realizando la respectiva calistenia y charla de seguridad. Socialización y Planeación de actividades para el dia de jornada laboral inicio socializando con los colaboradores las actividades a ejecutar, se indica el especial cuidado a tener dadas las actividades en altura que se estan realizando, el avance de acero sigue los lineamientos de los planos estructurales del proyecto, se realiza aseo de lugar de trabajo y bodega coordinado por la Profesional SST en horas de la tarde se presentan lluvias que afectan el buen desarrollo de las actividades, la jornada laboral termina a las 6:00 pm.

Residente de Obra

Miercoles 09/07/2025
Estado del clima: Mañana: Nublado
La jornada laboral inicia a las 7:00 AM se realiza calistenia y charla de seguridad por parte de la Profesional SST, se continua realizando avance de acero para la viga acero siguiendo los planos estructurales, se realiza visita de obra por parte del Director y Prof estructural el Ing Wilmar Cardona, de ingeniera Tehano Bajos por parte de la supervisora, la ing Erika Arroyo coordinadora del area social Tvo, el ing David Acosta Residente de Obra se realiza recorrido y revisión de actividades realizadas y a realizar, se sostiene reunión de cierre por parte de Directores.

Jueves 10 de Julio 12025
Estado del Clima: Mañana: soleado.
Se da inicio a la jornada laboral 7:00am Con todo el Personal ejecutante, realizando la respectiva Charla de seguridad dirigida por la Profesional SST capacitando el personal en el Cuidado de las manos de igual Forma se realiza Calistenia haciendo enfasis en Ejercicios para el estiramiento de nuestras manos, con el Personal ejecutante se Planean actividad a realizar durante el dia, se socializa con los trabajadores las actividades a realizar el dia de hoy las cuales consisten en: hacer amarrado d acero para refuerzo Estructural de la viga aerea. Continuar con las instalacion del andamiaje necesario para Formaletear la Viga aerea

Residente de Obra

Viernes 11 de Julio 12025.
Estado del Clima: Mañana: nublado.
Se inica la jornada laboral a las 7:00am realizando la respectiva Charla de seguridad con su calistenia dirigida por la Profesional SST, Se socializan las actividades a realizar con todo el Personal ejecutante. Se realiza el respectivo amarrado de acero. Para continuar con el refuerzo Estructural de la Viga Area, se Continua con las instalaciones y ubicación de andamios.

Residente de Obra

SABADO 12 de Julio 12025.
Estado del clima: Nublado.
Se inica la Jornada laboral a las 7:00 am realizando la respectiva calistenia y charla de seguridad dirigida Por el Profesional SST, el horario se trabaja de 7:00

a 12:00 del dia y se continua con el respectivo amarrado de acero.

Erika Amaya

Residente de Obra

LUNES 14 de JULIO /2025.

Estado del clima: Mañana: nublado

Tarde: LLUVIA.

Se da inicio a la jornada laboral a las 7:00 Am. realizando la oracion de la mañana, e igualmente se realiza la calistenia y charla de seguridad con todo el Personal ejecutante, Planeando las actividades a ejecutarse y realizando inspeccion Preoperacional de herramienta menor y equipos a laborar, no se pudieron realizar actividades de obra teniendo en cuenta las Fuertes Lluvias Presentadas en obra.

Erika Amaya.

Residente de obra

Martes 15 de Julio /2025.

Estado del clima: Mañana: nublado

Tarde: Soleado

La jornada laboral da inicio con normalidad se hace la charla de la mañana con su respectiva calistenia Planeacion de actividades con las trabajadoras que ejecutan las actividades, el dia de hoy llega a la obra Formaleta metalica Para el encofrado de la viga aerea numero 2 Se continua con el Amarrado de acero para la viga aerea numero 2 y se procede a formaletear la viga aerea y la viga canal la jornada laboral termina a la 5:00 de la tarde

Erika Mora.

Residente de Obra

Miercoles 16 de JULIO de 2025
Estado del clima: Mañana: nublado.
Tarde: Soleado
Se da a inicio a la jornada laboral 7:00am con todo el Personal ejecutante realizando la respectiva Charla de seguridad y su calistenia se Procede a la Planeacion de actividades Se Continua con el amarrado de acero para las Vigas aereas, se Verifico que este acero Corresponda con el diseño estructural Planteado Para la ejecución de la actividad.

Residente de Obra — Erika Arroyo.

JUEVES 17 de JULIO de 2025.
Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Se realiza el ingreso del Personal a las 7:00am Con el Personal ejecutante se realiza la respectiva calistenia y charla de seguridad dirigida por el Profesional SST, las actividades de hoy Consistieron en formaleteo Viga aerea y Viga Canal y se Continua haciendo amarrado de acero. la jornada laboral Termino a las 6:00 sin contratiempos

Residente de Obra — Erika Arroyo.

Viernes 18 de Julio de 2025
Estado del clima: Mañana: Nublado Tarde: Nublado
la jornada laboral inicia con normalidad el dia de hoy a las 7:a AM, se realizan actividades de calistenia, con los trabajadores, se indican las actividades a realizar el dia de hoy con los trabajadores, se indica el especial cuidado con las actividades en alturas, se continua con el amarrado de acero para la

Viga eje 42 de cubierta, se continua con apuntalamiento de andamios para encofrado y alistamiento para la realizacion de la viga.
En horas de la tarde se presentan lluvias en horas de la tarde que impiden realizar actividades desde las 4:00 P.M.

Residente de Obra

Erika Amaya.

Lunes 21 de Julio del 2025
Estado del Clima: Lluvias Tarde Nublado
La jornada laboral inicia con la calistenia y charla de seguridad con el Personal desde las 7:00 AM, se continua realizando las actividades que se estaban haciendo el día anterior, las cuales son armado de acero para refuerzo de viga eje No. 02, segun diseño estructural.
se continua armando estructura para encofrado de la viga, y posterior fundido de la misma, en la mañana se presentan lluvias y en la tarde nublado la jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 P.M.

Residente de Obra

Erika Amaya

Martes 22 de Julio del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado Tarde Lluvias
La jornada laboral inicia a las 7:00 AM, se realiza calistenia y charla con los trabajadores de seguridad y socializacion de las actividades a realizar al dia de hoy, se realiza el ingreso de una mixer y una bomba de concreto para proceder a fundir, se recibe visita de obra por parte de la supervisión, apoyo técnico Ing. Tatiana Burgos en la cual se verifica la correcta ejecución de la actividad y el avance del contrato. se Presentaron algunos inconvenientes con el apuntalamiento de un tramo de formaleta que al recibir el peso del concreto cedio haciendo Perder momentaneamente lo fundido, se presentaron lluvias que pararon la fundida, se utilizo plastico para Proteger el concreto ya aplicado, la jornada laboral termino a las 8:30 P.M.

Residente de Obra

Erika Amaya.

Miercoles 23 de julio:
Estado del clima: mañana: Soleado.
Tarde: soleado.
Se inica la jornada laboral a las 7:00 AM
Con todo el Personal realizando la charla de Seguridad
Dirigida por la Profesional SST, entre todos los
Colaboradores se hace la Calistenia, las Personas
ejecutantes, se realiza trabajo de recuperacion muscular por
la actividad fisica realizado el dia anterior, tambien se realizo
retroalimentacion de la actividad del dia anterior, se continua con
todo lo necesario para armado de acero de la viga 2. se hace
osco y armado en Obra

Residente de Obra

Jueves 24 de julio.
Estado del clima: mañana: Soleado
Tarde: Lluvias
La jornada laboral inica las 7:00 AM iniciado con
calistenia por parte del Personal se da la Charla
de seguridad por Parte de la Profesional SST, se
realiza la planeacion delas actividades a ejecutarse
la jornada laboral continua realizando armado y apuntalado de
anclamiento para viga oeste, y armado de acero para viga
en horas de la tarde se presentan lluvias que impiden el
normal desarrollo de las actividades. la jornada laboral termina
a las 5:30 PM.

Residente de Obra

Viernes 25 de Julio del 2025
Estado del Clima: Mañana Lluvias
Tarde Nublado
La jornada laboral inicio a las 7:00 AM como todos los
dias se realizo calistenia con los trabajadores, se realizo charlas
de seguridad por Parte de la Profesional SST, se realizan socializacion

de la importancia y el cuidado de los trabajos realizados en alturas los actividades que se realizan son formaletado, instalado de andamiaje para la viga acera #02, así como continuan amarrando acero de refuerzo para la viga canal, en horas de la mañana se Presentan lluvias en horas de la tarde Nublado.

Residente de Obra.

Ing Erika Arroyo.

Sabado 26 de Julio del 2025
Estado del Clima : Nublado
La jornada laboral inicio con normalidad se continuan realizando actividades de las días anteriores como lo es el amarrado de acero, la instalacion de andamiaje para la viga #2, orden y aseo de obra se realiza la calistenia y charla de seguridad, la jornada laboral termina sin contratiempos a las 12:00.

Residente de Obra

Ing Erika Amaya.

Lunes 28 de Julio del 2025
Estado del Clima : Mañana: Soleado
Tarde : Lluvioso
La jornada laboral el día de hoy inicio en poco mas tarde de lo normal a las 8:00 AM, se realizo calistenia con los trabajadores y se concientizo la importancia de los cuidados dadas los trabajos en alturas, se realizo charla de seguridad por parte de la Profesional SST, se continua con el amarrado de acero para la viga, y para la viga canal, se realiza revision por parte del residente de Obra de la distribucion de los mismos siguiendo planos estructurales del Proyecto, se realizo aseo y orden por los trabajadores. La jornada laboral se termino a las 5:00 por lluvias fuertes, No se presentan contratiempos en la jornada laboral.

Residente de Obra

Ing Erika Amaya.

Martes 29 de Julio del 2025.
Estado del Clima: Mañana: Nublado
la jornada laboral inicio a las 7:00 AM se realizo calistenia con los trabajadores, se hace charlas de seguridad teniendo: enfasis en el cuidado personal en los manos y con nuestros compañeros, las actividades a realizar el día de hoy son armado y amarrado de acero para viga canal y viga acera, en horas de la tarde se presentaron fuertes lluvias en la zona por lo tanto No se realizaron actividades de Obra, se retiro el personal de Obra a las 5:20 PM.

Residente de Obra

Ing Erika Amaya.

Miercoles 30 de Julio del 2025.
Estado del Clima: Mañana: Nublado - Tarde: Nublado
la jornada laboral inicio a las 7:00 AM, con normalidad, se Procede con la charla de seguridad enfocada al trabajo seguro en alturas, se realizo calistenia con los trabajadores, se continua realizando formaleteado de viga acera #2, amarrado de acero de refuerzo, se alista tambien acero para viga canal, estas son las actividades que se realizan durante la jornada laboral, la cual termina a las 6:00 PM sin ningun contratiempo. Se cuenta con el grupo de trabajo Propuesto.

Ing Erika Amaya.

Residente de Obra

Jueves 31 de Julio del 2025.
la jornada laboral inicio con normalidad a las 7:00 sin contratiempos se realizo calistenia con los trabajadores, se continua con actividades de alistamiento de formaleta y aceros para toda la cosa Pendiente de la fundida en concreto de la viga acera, para proceder a fundir el dia de mañana. la jornada laboral termina a las 5:00 PM sin contratiempos

Ing Erika Amaya.

Viernes 01 Agosto del 2025.
Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
La jornada laboral inicia el día de hoy a las 6:00 AM, se realiza calistenia, y charla de seguridad, se socializo con el residente de Obra las actividades de fundida de viga acera y viga canal en concreto de 3500 PSI, se organizan frentes de trabajo para trabajo coordinado, el día de hoy se cuenta con el apoyo de 3 trabajadores mas de lo normal. se verifica la dosificación de los agregados Petreos segun ~~dosificación~~ diseño de mezcla. Se funde la viga acera programada Para dar cumplimiento al cronograma y objeto del contrato. Se termino la jornada laboral a la 4:30 PM se realiza compartir con los colaboradores..

Residente de Obra

Ing. Erika Arroyo.

Lunes 04 de Agosto del 2025
Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
La jornada laboral inicia con charla de seguridad y calistenia por parte de la Profesional SST, se agradece que se realizara la actividad de fundido a los trabajadores, se charla con ellos para mejorar parte de seguridad en una retroalimentacion las actividades a realizar son aseo de obra recolección de materiales sobrantes, se procede a hidratar el concreto de la viga, estas son las actividades realizadas en la jornada laboral la cual termino sin contratiempos a las 6:00 P.M.

Residente de Obra

Ing Erika Arroyo.

Martes 05 de Agosto del 2025
Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Lluvias
La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM. Se realiza charla de seguridad por parte del Profesional SST. Se realiza calistenia con todo el grupo de trabajo. las actividades a realizar son:

encofrar aleta de viga acera que falta por fundir con sección de 0.40 x 0.10 x 32 mts, en concreto de 3500 PSI, se verifica que este concreto se fabrique con la dosificación indicada en el diseño de mezcla, la jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 P.M.

Residente de obra

Ing Erika Arroyo

Miercoles 06 de Agosto del 2025
Estado del Tiempo: Mañana: Nublado
Tarde: Lluvias

La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM, se realiza cobstacio y charla de seguridad con el equipo de trabajo para el día de hoy se iban realizar actividades de encofrado y desencofrado de aleta para viga acera respectivamente, en horas de la tarde se presentan lluvias que impiden la realizacion de trabajo seguro en alturas por lo que se pararon las actividades programadas para el día de hoy. la jornada laboral termina anticipadamente a las 5:00 p.m.

Residente de Obra.

Ing Erika Arroyo.

Jueves 07 de Agosto del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado

La jornada inicia con normalidad a las 7:00 AM. Se realiza charla de Seguridad por parte de la Profesional SST se realiza cobstacio con los trabajadores, se continua con el encofrado para la aleta faltante por fundir, se utilizo Sika Rod 32 Pure para mejorar la adherencia de los concretos de diferentes edades se realizo orden y aseo en obra la jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 P.M.

Residente de Obra

Ing Erika Arroyo

Viernes 08 de Agosto del 2025
Estado del Clima : Mañana: Soleada
Tarde : Nublado.
La jornada laboral inicio con normalidad a las 7:00 AM se procede a realizar la calistenia con los trabajadores se realiza charla de seguridad Por Parte de la Profesional SST, el día de hoy se da continuidad con las actividades realizadas desde el día anterior para el armado de la formaleta Para fundir olulo de viga arma y viga canal en concreto de 3500 PSI, la jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 PM.

Residente de Obra

Ing Erika Amaya.

Lunes 11 de Agosto del 2025
Estado del clima : Mañana : Lluvias
Tarde : Lluvias
La jornada laboral inicio a las 7:00 AM se Procede con la calistenia Para todo el grupo de trabajo y con la charla de seguridad y Propuesta de actividades a ejecutar el día de hoy, en horas de la mañana se realiza visita de supervisión de Obra por parte de la ing. Raquel, luego se realiza recorrido de Obra el día de hoy no se pueden realizar actividades porque no Para de llover en la obra, la jornada laboral termina a las 4:30 PM sin contratiempos

Residente de Obra.

Ing Erika Amaya.

Martes 12 de Agosto del 2025.
Estado del Clima: Mañana. Soleado
Tarde : Nublado.
La jornada inicia con normalidad a las 7:00 AM. el estado del clima es apto para trabajar. Se realiza charla de seguridad con los trabajadores y todo el grupo interdisciplinario, las actividades a realizar el día de hoy es hidratar la Viga de concreto realizado días antes, se Procede con lo desencofrado de la viga anterior

q con todo lo estructura que fue necesario armar para fundir lo misma. No se realizaron mas actividades el día de hoy la jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 P.M.

Residente de Obra

Ing. Erika Amaya.

Miercoles 13 de Agosto del 2025:

La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM se procede a realizar la charla de seguridad con los trabajadores y la calistenia, el estado del clima para hoy es soleado y apto para trabajos, las actividades a realizar el día de hoy son de aseo y orden en obra, asi como continuar descapotando y recogiendo estructura metalica. La jornada laboral termina a las 5:00 P.M. sin contratiempos.

Ing. Erika Amaya

Residente de Obra.

Jueves 14 de Agosto del 2025

Estado del tiempo : Mañana Nublado

Tarde : Lluvias

La jornada laboral inicia a las 7:00 AM como es normal, se realizan charlas de seguridad con los trabajadores y calistenia en horas de la mañana se continua con actividades de orden y aseo de Obra y en la tarde No fue Posible realizar actividades por fuertes lluvias que se Presentaron en la obra, la jornada laboral termina a las 5:00 P.M.

Ing Erika Amaya.

Residente de Obra

Viernes 15 de Agosto del 2025

Estado del Clima : Lluvias

Tarde : Nublado

La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 A.M

se alistan actividades de orden de Obra, y se inicia con el desencofrado de la viga #2, así como también se procede con la instalación de el adoquín en el sendero peatonal que fue desmontado inicialmente, la jornada laboral termina sin contratiempos a las 6:00 PM.

Ing. Erika Amaya

Residente de Obra.

Sábado 16 de Agosto del 2025.
Estado del clima: Mañana Soleado
La jornada laboral inicia con normalidad a las 7:00 AM se procede a realizar calistenia y charla de seguridad con los trabajadores, las actividades realizadas son: continuar con la instalación del adoquinado para sendero peatonal, desmonte de andamios de estructura de viga, paisajismo de las zonas aledañas a la obra, la jornada laboral termina a las 1:15 PM sin contratiempos.

Ing. Erika Amaya.

Residente de Obra.

Martes 19 de Agosto del 2025.
La jornada laboral inicia a las 8:00 AM. se realiza calistenia y charlas de seguridad con los trabajadores, las actividades de hoy consisten en retirar los parales y andamios de la obra, hacer resanes en las vigas para corregir imperfecciones, se procede a ir retirando materiales sobrantes y Herramientas de la obra, el estado del clima es optimo para trabajar la jornada termina sin contratiempos a las 6:00 PM.

Ing. Erika Amaya.

Residente de Obra.

Miercoles 20 de Agosto del 2025.
Estado del Clima: Mañana.: Soleado
Tarde.: Soleado
La jornada laboral inicia a las 7:00 AM se realiza la calistenia con los trabajadores, el grupo de trabajo se reduce a solo 3 personas dadas

Sabado 23 de Agosto del 2025
Estado del Clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
El dia de hoy se da inicio con la fabricacion y doblado de las tejas en lamina Galvanizada calibre 20 para la cubierta, la jornada laboral inicio con normalidad a las 7:00 AM, se realiza calistenia y socializacion con los trabajadores todas las actividades ejecutadas en el dia, con la utilizacion de equipos, el personal es capacitado para el desarrollo de la cubierta, y sigues ser los establecidos se recalca el correcto uso de los EPP. se continua tambien con el retiro de las viga canales y vigas aereas, se Procede con la instalacion de los Pernos en las viga canales, Para anclaje de cubierta. la jornada laboral termina sin contratiempos a las 5:00 P.M.

Residente de Obra

Pedregal 24 de Agosto del 2025.
Estado del Clima: Mañana Soleada
Tarde: Soleada.
El dia de hoy se realizan actividades dado que el tiempo para la terminacion es poco, se da inicio la jornada laboral a las 7:00 AM. se realiza calistenia y charla de seguridad con los trabajadores se Procede con la doblado y fabricado de teja en lamina Galvanizada de calibre 20, se hacen los arcos y se grapan a las tejas dando firmeza entre ellas, se procede y continua con la instalacion de Pernos de anclaje en la viga canal, la jornada laboral termina sin contratiempos a las 5:00 P.M.

Residente de Obra

Lunes 25 de Agosto del 2025
Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Soleada.
La jornada laboral inicio con normalidad a las 7:00 AM, se realiza calistenia con los trabajadores y charla de seguridad cuidando Pendientes a las actividades realizadas con altura, equipos, y cargas pesadas, se continua con la instalacion

de Panes en la viga canal para anclaje de cubierta metalica, se procede con el izaje de las tejas en pacas de 3 para su instalacion y panado donde faltara a la cubierta en autoportante en lamina Galvanizada de Calibre 20. la jornada laboral termino sin contratiempos, se procede tambien con la instalacion de los bajantes hidraulicas y sus correspondiente fijacion a las columnas.

Residente de Obra

Martes 26 de Agosto del 2025

Estado del Clima: Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

La jornada laboral inicio con normalidad a las 7:00 AM, se realiza calistenia y charlas de seguridad con los trabajadores para dar inicio a las actividades de izaje de cubierta e instalacion de la misma en lamina galvanizada Calibre #20, se utiliza camion grua para hacer este trabajo, se procede a la instalacion y panado de las Pacas de 3 tejas groqueadas, se continua con la instalacion de los bajantes segun diseño, se utiliza tuberia de 4" y codos de 90° para los mismos, la jornada laboral termino a las 7:00 PM sin contratiempos el dia de mañana la jornada iniciara a las 6:00 AM.

Residente de Obra

Miercoles 27 de Agosto del 2025

Estado del Clima: Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

El dia de hoy se termino el Plazo contractual del Proyecto por esto la jornada laboral inicia a las 6:00 AM Para terminar todas las actividades contractuales faltantes, se procede a realizar Calistenia con los trabajadores y charlas de seguridad de las actividades, se continua con la instalacion de bajantes de aguas lluvias en tuberia de 4" y se fijan con 3 abrazaderas a las columnas, correspondientemente

Se radica y continua la instalacion de la cubierta autoportante en lamina Galvanizada calibre 20, hasta finalizar la actividad, la jornada laboral termina a las 6:45 PM, dando por terminadas todas las actividades contratadas para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.7755228 del 2025.

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

Monterrey Casanare, mayo 2 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
SUBSEDE TUA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 7755228 DE 2025.

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EPP

Cordial saludo, en marco del inicio de las actividades contractuales y contratadas para la *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE*, me permito remitir la siguiente información.

A continuación, se los anexan documentos

- Matriz de peligros cubiertas
- Matriz EPP
- Plan de capacitación cubiertas
- Programa de gestión de residuos

de acuerdo a esto quedaremos altamente agradecidos por la atención prestada a esta.

Firma
Proingeniarq S.A.S.
R/L: Cristhian Javier Guerra Díaz

DOMICILIO: Municipio de Monterrey Departamento Casanare. DIRECCIÓN: Calle 7 No.17-43
Barrio Centro - Correo electrónico: proingeniarqsas@gmail.com
Numero de contacto: 3202253679 – 3104845995

PROINGENIARQ S.A.S

Proyectos de Ingenieria y Arquitectura

Nit. 901.388.628-9

Monterrey Casanare, mayo 8 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
SUBSEDE TUA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 7755228 DE 2025.

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

ASUNTO: "Solicitud ingreso personal obrero", listado de personal profesional, vehículos y anexo documentación referente a las afiliaciones.

Cordial saludo, en marco del inicio de las actividades contractuales y contratadas para la *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE*, me permito respetuosamente solicitar el ingreso del siguiente personal obrero y profesional, así como vehículos a las instalaciones de la SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

1. Dado lo anterior el permiso de ingreso se solicita para el siguiente personal.

EQUIPO PROFESIONAL DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA			
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**NUMERO IDENTIDAD**
1	WILFRAN GUTIERREZ TORRES	DIRECTOR DE OBRA	80.090.925 exp Bogota
2	LEONARD DAVID ACEVEDO CIFUENTES	RESIDENTE DE OBRA	1.118.545.552 exp Yopal
3	DAYANA FERNANDA TORRES SANABRIA	INSPECTOR DE OBRA	1.116.548.250 exp Aguazul
4	JAINOBER ALBERTO DIAZ MERIZALDE	PROFESIONAL HSQ	74.814.471 exp en Yopal

EQUIPO TECNICO ADICIONAL APORTADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA			
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**NUMERO IDENTIDAD**
1	WIILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ	PROFESIONAL ARQ APOYO OBRA CIVIL	17.348.699 exp en V/cencio
2	MARY FERNANDA GONZALEZ ARANGUREN	PROFESIONAL APOYO TECNICO HSQ-SST	1.118.543.940 exp en Yopal

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA "PROINGENIARQ S.A.S"			
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**NUMERO IDENTIDAD**
1	CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ	REPRESENTANTE LEGAL PROINGENIARQ	86.075.316 exp en V/cencio

Del personal profesional y técnico se anexa:

- Copia de planilla de seguridad donde se evidencia la vinculación con la empresa contratista Proingeniarq S.A.S, el pago de ARL. PENSION, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
- Certificación ARL
- Registro de inducción

1.1 Así mismo se solicita el ingreso del siguiente personal obrero el cual ya se encuentra afiliado al sistema de seguridad social.

EQUIPO OBRERO			
ITEM	NOMBRE	CARGO	NUMERO IDENTIDAD
1	JUAN GABRIEL RINCON RINCON	MAESTRO DE OBRA	74.814.916
2	FREDY HARDY RINCON RINCON	MAESTRO DE OBRA	9.430.853
3	JOSE REINEL CRISTANCHO CARVAJAL	OFICIAL DE OBRA	74.858.538
4	CESAR AUGUSTO DELGADO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	86.074.707
5	FREDY ALEXANDER RINCON	AYUDANTE DE OBRA	1.029.644.154

De este personal obrero se anexa:

- Copia documento de identidad
- Certificación de afiliación al sistema de salud
- Copia de afiliación a la ARL
- Copia de afiliación a caja de compensación familiar
- Copia afiliación al sistema pensional
- Exámenes de ingreso
- Registro de inducción
- Registro entrega EPP (elementos de protección personal)

2. Así mismo se solicita el ingreso para los siguientes vehículos.

LISTADO DE VEHICULOS				
ITEM	MARCA	LINEA	SERVICIO	PLACA
1	TOYOTA (camioneta)	HILUX	PARTICULAR	DSP-153
2	JAC (CAMION-furgon)	HFC1042KND	PUBLICO	WDT-599
3	NISSAN (Camioneta)	NP300 FRONTIER	PARTICULAR	FXL-337

- Se anexan los siguientes documentos de cada vehículo:

. Copia licencia de transito
. Copia SOAT
. Copia RUNT

. Para el vehículo de servicio público se anexan los documentos del conductor

PROINGENIARQ S.A.S

Proyectos de Ingenieria y Arquitectura

Nit. 901.388.628-9

La solicitud de ingreso se solicita a partir del día 8 de mayo de 2025 hasta el día de culminación del proyecto de ejecución de la obra.

Así mismo se informa que en actividades especiales se nos facilite el ingreso en horas nocturnas, dias dominicales y festivos, dado el caso de la situación particular de ejecución y maniobra de la actividad contratada específica, así mismo se informa que en el trascurso de la ejecución del contrato serán transportadas al sitio de obra maquinaria herramienta y material que son uso exclusivo de nosotros como contratistas de obra y por lo cual solicitamos se nos facilite un área o sitio cubierto y encerrado para el bodegaje de material herramientas y otros.

De acuerdo a lo anterior quedamos altamente agradecidos por la atención prestada a esta.

Firma

PROINGENIARQ S.A.S.
R/L: CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

Monterrey Casanare, mayo 13 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
SUBSEDE TUA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 7755228 DE 2025.

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

ASUNTO: *"ENTREGA DE DOCUMENTOS A SUBSANAR"* del **PERSONAL EQUIPO OBRERO** del cual se solicitó ingreso previamente

Cordial saludo, en marco del inicio de las actividades contractuales y contratadas para la *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE*, me permito respetuosamente ANEXAR, documentos del PERSONAL EQUIPO OBRERO que hacían falta y del cual se solicitó subsanación de los mismos.

Es de aclarar que se envía por el momento los documentos de los maestros de obra y ayudante que hacían falta, lo anterior para permitir el ingreso a las instalaciones de la SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

Así mismo es de aclarar que por trámite de afiliación y documentación pendiente, por el momento NO SE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE LOS SEÑORES:

- ALIRIO URBANO GÓMEZ c/c 74.812.650
- JAIME QUINTILIANO PULIDO c/c. 7.230.965

Es así que por el momento no es necesario por el momento proseguir con los permisos de ingreso de las anteriores personas.

Por otro lado, es de aclarar que los empleados afiliados por la empresa Proingeniarq s.a.s en relación a la EPS, se afilian al régimen contributivo, y una vez termina labores al momento de ser retirados de la planilla, automáticamente el sistema los ubica en régimen subsidiado, por lo que de parte de la empresa Proingeniarq s.a.s no tenemos injerencia en los regímenes de los trabajadores una vez sean retirados de la empresa, o previo a afiliación por parte de Proingeniarq s.a.s. Así mismo al momento de la afiliación el sistema no arroja automáticamente el traslado del

régimen, y es así que se anexan los certificados de afiliación donde se evidencia el traslado o afiliación y donde se describe el régimen al cual fue afiliado.

Dado así los documentos anexos son de las siguientes personas

EQUIPO OBRERO			
ITEM	NOMBRE	CARGO	NUMERO IDENTIDAD
1	JUAN GABRIEL RINCON RINCON	MAESTRO DE OBRA	74.814.916
2	FREDY HARDY RINCON RINCON	MAESTRO DE OBRA	9.430.853
3	JOSE REINEL CRISTANCHO CARVAJAL	OFICIAL DE OBRA	74.858.538

Dado lo anterior en el transcurso del día, se enviarán los documentos subsanados del resto de personal profesional y técnico.

Lo anterior es pro de agilizar tramite documental y que el día de hoy ingresen los maestros de obra y ayudantes al área de trabajo.

De acuerdo a lo anterior quedamos altamente agradecidos por la atención prestada a esta.

Firma

PROINGENIARQ S.A.S.
R/L: CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

Monterrey Casanare, mayo 13 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
SUBSEDE TUA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 7755228 DE 2025.

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

ASUNTO: *"ENTREGA DE DOCUMENTOS A SUBSANAR"* del **PERSONAL PROFESIONAL** del cual se solicitó ingreso previamente.

Cordial saludo, en marco del inicio de las actividades contractuales y contratadas para la *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE*, me permito ANEXAR, documentos del PERSONAL PROFESIONAL que hacían falta y del cual se solicitó subsanación de los mismos por parte del Sena.

Es de aclarar que se envía por el momento los documentos de los maestros de obra y ayudante que hacían falta, lo anterior para permitir el ingreso a las instalaciones de la SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

Dado así los documentos anexos, son del siguiente personal profesional.

PROFESIONALES Y DOCUMENTOS PARA SUBSANAR			
ITEM	NOMBRE	CARGO	NUMERO IDENTIDAD
1	WILFRAN GUTIERREZ TORRES	DIRECTOR DE OBRA	80.090.925 exp Bogota
2	DAYANA FERNANDA TORRES SANABRIA	INSPECTOR DE OBRA	1.116.548.250 exp Aguazul
3	JAINOBER ALBERTO DIAZ MERIZALDE	PROFESIONAL HSQ	74.814.471 exp en Yopal

PERSONAL APORTADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA - DOCUMENTOS PARA SUBSANAR			
ITEM	NOMBRE	CARGO	NUMERO IDENTIDAD
1	WIILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ	PROFESIONAL ARQ APOYO OBRA CIVIL	17.348.699 exp en V/cencio

Dado lo anterior en el transcurso de la presente semana se enviarán los documentos subsanados del resto de personal profesional y del cual hay una documentación que no se ha podido descargar.

DOMICILIO: Municipio de Monterrey Departamento Casanare DIRECCIÓN: Calle 7 No 17-43
Barrio Centro - Correo electrónico: proingeniarqsas@gmail.com
Numero de contacto: 3202253679 – 3104845998

345

lo anterior es pro de agilizar tramite documental y que el día de hoy se pueda dar viabilidad al ingreso de los profesionales mencionados anteriormente.

De acuerdo a lo anterior quedamos altamente agradecidos por la atención prestada a esta.

Firma_____
PROINGENIARQ S.A.S.
R/L: CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

Monterrey Casanare, mayo 14 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
SUBSEDE TUA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 7755228 DE 2025.

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

ASUNTO: AUTORIZACION ENTRADA DE TRACTOCAMION/TRACTOMULA

Cordial saludo, en marco del inicio de las actividades contractuales y contratadas para la *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE*, me permito solicitar el ingreso de un vehículo tipo tracto mula o tracto camión, el cual transporta material para ejecución de actividades según objeto del contrato.

Esta autorización se solicita a partir del día 14 de mayo de 2025.

Datos del vehículo

TIPO VEHICULO	PLACA	MARCA
Tractocamión o tractomula	SVD-032	Kenworth

Datos del conductor


NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION
Héctor Heli Moreno Apolinar	11.409.926

A continuación, se los anexan documentos

- Copia SOAT
- Copia licencia de transito del vehículo
- Copia certificada de gases
- Copia licencia de conducción del operador del vehículo

- Copia de cedula del conductor
- Copia de planilla EPS (plantilladlo en el número 22 EN EL COMPROBANTE)

De acuerdo a esto quedaremos altamente agradecidos por la atención prestada a esta.

Firma
Proingeniarq S.A.S.
R/L: Cristhian Javier Guerra Díaz

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

Monterrey Casanare, mayo 14 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
SUBSEDE TUA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 7755228 DE 2025.

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

ASUNTO: AUTORIZACION ENTRADA DE MAQUINARIA (***RETROEXCAVADORA***)

Cordial saludo, en marco del inicio de las actividades contractuales y contratadas para la *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE*, me permito solicitar el ingreso de maquinaria pesada (**RETROEXCABADORA**), lo anterior en pro del desarrollo de actividades concerniente a excavaciones para la ejecución de actividades contratadas.

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	# DE REGISTRO
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA (LLANTA)	MC051063

Dado lo anterior se solicita el permiso a partir del día 14 de mayo de 2025.

A continuación, se los anexan documentos

- Copia de cedula del conductor
- Copia licencia de conducción del operador del vehículo
- Copia licencia de transito del vehículo
- Seguridad social
- Documento (categorías licencia de construcción)

de acuerdo a esto quedaremos altamente agradecidos por la atención prestada a esta.

Firma_____
Proingeniarq S.A.S.
R/L: Cristhian Javier Guerra Díaz

DOMICILIO: Municipio de Monterrey Departamento Casanare. DIRECCIÓN: Calle 7 No 17-43 Barrio Centro - Correo electrónico: proingeniarqsas@gmail.com
Numero de contacto: 3202253679 – 3104045998

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

Monterrey Casanare, mayo 14 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
SUBSEDE TUA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 7755228 DE 2025.

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

ASUNTO: AUTORIZACION ENTRADA DE VOLQUETAS

Cordial saludo, en marco del inicio de las actividades contractuales y contratadas para la *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE*, me permito solicitar el ingreso de los siguientes vehículos y de lo cual se anexa a continuación toda la documentación que se relaciona en este

A continuación, se los anexan documentos

- Hoja de vida de cada vehículo
- Copia licencia de transito del vehiculo
- Copia SOAT
- Copia certificada de gases
- Póliza del vehículo
- Cronograma de mantenimiento del vehículo
- Evaluación de inducción del operador del vehículo
- Copia de cedula del conductor
- Copia licencia de conducción del operador del vehículo
- Copia carne de vacunación del operario
- Certificado de vacunación digital
- Copia seguridad social
- Consulta digital RUNT

De acuerdo a lo anterior se solicita el ingreso de los vehículos a las instalaciones de la SUBSEDE *TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE*

CASANARE, en el municipio de monterrey a partir de la fecha del presente comunicado 14-05-2025 y durante el trascurso del plazo de las actividades contractuales en desarrollo del contrato de obra.

Los horarios para este ingreso se harán de acuerdo a la disponibilidad de material, y en dias hábiles, sabáticos, dominicales, así como dias feriados.

de acuerdo a esto quedaremos altamente agradecidos por la atención prestada a esta.

Firma_____
Proingeniarq S.A.S.
R/L: Cristhian Javier Guerra Díaz

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

Monterrey Casanare, mayo 15 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
SUBSEDE TUA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 7755228 DE 2025.

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

ASUNTO: AUTORIZACION ENTRADA DE CAMION CON MATERIAL

Cordial saludo, en marco del inicio de las actividades contractuales y contratadas para la *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE*, me permito solicitar el ingreso de un vehículo tipo camión, el cual transporta material (ferretería) para ejecución de actividades según objeto del contrato.

esta autorización se solicita a partir del día 17 de mayo de 2025, y el cual puede llegar en cualquier día a partir de esta fecha.

Datos del vehículo

TIPO VEHICULO	PLACA	MARCA
Camión Estacas	NHP-795	HINO

Datos del conductor


NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION
Andres Gomez Trujillo	c.c: 1.121.879.151 Exp V/vcio

A continuación, se los anexan documentos

- Copia de cedula del conductor
- Copia licencia de conducción del operador
- Carne manejo defensivo

- Copia SOAT
- Copia LICENCIA DE TRANSITO del vehículo
- Copia de planilla de seguridad social donde está el nombre del operador en la casilla No.5.

De acuerdo a esto quedaremos altamente agradecidos por la atención prestada a esta.



Firma_____
Proingeniarq S.A.S.
R/L: Cristhian Javier Guerra Díaz

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

Monterrey Casanare, mayo 19 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
SUBSEDE TUA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 7755228 DE 2025.

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

ASUNTO: Solicitud de cambio de PROFESIONAL HSEQ

Cordial saludo, en marco del inicio de las actividades contractuales y contratadas para la *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE*; me permito informar y solicitar el cambio de profesional en salud ocupacional HSQ.

Lo anterior teniendo en cuenta que el profesional que actualmente ocupa el cargo es el ingeniero JAINOBER ALBERTO DIAZ MERIZALDE identificado con C.C.74.814.471, no puede seguir ocupando el cargo por el cual fue contratado, por motivos académicos; y que dicho cargo será ocupado por la profesional en salud ocupacional ERIKA JOHANA ESPITIA PERILLA identificada con c.c 1.118.121.777 exp en Monterrey.

En el siguiente cuadro se enuncia el profesional que sale y el profesional que entraría a ocupar el cargo.

PERSONA QUE OCULA EL CARGO ACTUALMENTE			
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**NUMERO IDENTIDAD**
1	JAINOBER ALBERTO DIAZ MERIZALDE	PROFESIONAL HSQ	74.814.471 exp en Yopal

PERSONA QUE ENTRA A OCUPAR EL CARGO HSQ			
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**NUMERO IDENTIDAD**
1	ERIKA JOHANA ESPITIA PERILLA	PROFESIONAL HSQ	1.118.121.777 exp en Monterrey

De acuerdo a lo anterior, solicitamos al ente contratante y a la supervisión del contrato el evaluar la anterior petición para que dicha persona pueda proseguir a etapa de contratación y afiliación, siendo este el proceso precio al ingreso de obra.

Dado lo anterior se adjunta la hoja de vida, con los anexos documentales como cuadro de experiencia, certificaciones laborales y académicos; y cuyo ingreso se daría a partir de la aprobación por parte de ustedes de la documentación de afiliación y demás.

Firma_____
Proingeniarq S.A.S.
R/L: Cristhian Javier Guerra Díaz
anexo 24 folios

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

Monterrey Casanare, mayo 30 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
SUBSEDE TUA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
La Ciudad

REF: CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 7809067 DE 2025.

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA ILUMINACION PERIMETRAL Y ADECUACION DE LA MALLA PERIMETRAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.

ASUNTO: "Solicitud ingreso de vehículo tipo GRUA y anexo documentación referente al vehículo"

Cordial saludo, en marco del inicio de las actividades contractuales y contratadas para la *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE*, me permito respetuosamente solicitar el ingreso del siguiente vehículo CAMION TIPO GRUA el cual hará labores a hincado de postes para luminarias, cargue y descargue de posterío y elementos de gran tamaño y tonelaje.

Esta maquinaria hará su ingreso a partir del día martes 3 de junio de 2025, hasta la culminación del plazo del contrato e ingresará los dias que sea necesario para ejecutar actividades de cargue y descargue.

LISTADO DE VEHICULO				
ITEM	MARCA	CLASE	SERVICIO	PLACA
1	JAC	CAMIONM GRUA	PUBLICO	UVM-615

- Se anexan los siguientes documentos de cada vehículo:


- Copia consulta ADRES
- Copia certificado de PENSIONES
- Copia CAJA DE COMPENSACION
- Copia certificado TECNICOMECANICA

356

proingeniarqsas@gmail.com

- Copia SOAT
- Copia examen e información sicomotora conductor
- Copia examen audiometría
- Copia examen osteomuscular
- Copia curso manejo defensivo, manejo de extintores, primeros auxilios, normas de tránsito, mecánica básica, prueba técnico conducción diploma y carne curso investigación incidentes.
- Hoja de vida del vehículo
- Hoja de vida del operador
- Cuadro novedades EPS
- planilla de lago del empleador SERVICIOS TRANSPORTES Y LEVANTAMIENTO

De acuerdo a lo anterior quedamos altamente agradecidos por la atención prestada a esta.



Firma_____
PROINGENIARQ S.A.S.
R/L: CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ
Anexo 83 folios

PROINGENIARQ S.A.S

Proyectos de Ingenieria y Arquitectura

Nit. 901.388.628-9

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

358

851040 85-2-2025-001705

Yopal 03 junio 2025

Señor
Cristhian Javier Guerra Diaz
R/L PROINGENIARQ S.A.S
proingeniarqsas@gmail.com
Monterrey

Asunto: Respuesta a solicitud cambio de residente de obra contrato CO1.PCCNTR.7755228

Cordial saludo, señor Guerra:

En respuesta a su solicitud con radicado No. 1-2025-001217 del 30 de mayo de 2025, relacionada con el cambio de INSPECTOR DE OBRA del contrato No. **CO1.PCCNTR.7755228** DE 2025 cuyo objeto es: **CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE,** le informamos que se ha revisado la documentación recibida y el profesional cumple con el perfil y la experiencia requerida en el estudio previo del contrato, por lo anterior su solicitud es aprobada satisfactoriamente. Se solicita allegar documentos de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP, ARL, caja de compensación, entrega de EPP y examen ocupacional.

A continuación, se realiza el cuadro comparativo de experiencia.

	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN PRESENCIAL MINIMA	FORMACIÓN PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
PERFIL PROFESIONAL SOLICITADO EN ESTUDIO PREVIO	INSPECTOR DE OBRA	1	100%	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	Deberá demostrar experiencia general de cinco (05) años, a partir de la matricula profesional.	Deberá demostrar experiencia especifica no menor a dos (02) años como INSPECTOR DE OBRA en proyectos de escenarios deportivos.
Profesional presentado en la propuesta	DAYANA FERNANDA TORRES SANABRIA	1	100%	Ingeniera civil, especialista en gerencia de proyectos.	CUMPLE	CUMPLE
Profesional nuevo	PEDRO EXEHOMO TRIANA ALVAREZ	1	100%	Tecnologo en obras civiles, Ingeniero civil, especialista en geotecnia vial y pavimentos.	CUMPLE	CUMPLE

Espero que la respuesta brindada haya atendido lo solicitado por usted.

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la mejora continua de nuestros procesos.

Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G



Cordialmente;

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto

NIS: 2025-05-014976

Proyectó: Ingrid Tatiana Burgos Diaz - Cargo: Ing. Civil Apoyo Técnico de Infraestructura

851040 85-2-2025-001550

Yopal 22 mayo 2025

Señor
Cristhian Javier Guerra Diaz
R/L PROINGENIARQ S.A.S
proingeniarqsas@gmail.com
Monterrey

Asunto: Respuesta a petición con radicado No. 1-2025-001107 de fecha 19 de mayo de 2025

Cordial saludo, señor Guerra:

Para dar respuesta a su petición con radicado No. 1-2025-001107 y NIS 2025-05-013308 de fecha 19 de mayo de 2025, relacionada con solicitud de cambio de PROFESIONAL HSEQ. Le informamos que se ha revisado la documentación recibida y el profesional cumple el perfil y la experiencia para ocupar el cargo, por lo anterior su solicitud es aprobada satisfactoriamente. Se solicita allegar documentos de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP, ARL, caja de compensación, entrega de EPP y examen ocupacional.

Espero que la respuesta brindada haya atendido lo solicitado por usted.

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la mejora continua de nuestros procesos.

Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G



Cordialmente;

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto

NIS: 2025-05-013308

Proyectó: Ingrid Tatiana Burgos Diaz - Cargo: Ing. Civil Apoyo Técnico de Infraestructura

851040 85-2-2025-001539

Yopal 22 mayo 2025

Señor
Cristian Javier Guerra Diaz
R/L PROINGENIARQ S.A.S
proingeniarqsas@gmail.com
Monterrey

Asunto: Respuesta a petición con radicado No. 1-2025-001118 de fecha 20 de mayo de 2025

Cordial saludo, señor Guerra:

En atención a su petición con radicado No. 1-2025-001118 y NIS 2025-01-229593, de fecha 20 de mayo de 2025, relacionada con la solicitud de la mesa técnica, me permito informarle que se acepta la realización de la misma el día 23 de mayo de 2025, modificando la hora para las 2:30 p.m., en las instalaciones del SENA.

Agradecemos su compresión y esperamos que la respuesta brindada haya atendido lo solicitado por usted.

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la mejora continua de nuestros procesos.

Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G



Cordialmente;

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto

NIS: 2025-01-229593

Proyectó: Raquel Martínez Larrota RaquelMartinezLarrota.
Ingeniero Civil, Profesional de Apoyo de Infraestructura

851040 85-2-2025-001548

Yopal 22 mayo 2025

Señor
Cristhian Javier Guerra Diaz
R/L PROINGENIARQ S.A.S
proingeniarqsas@gmail.com
Monterrey

Asunto: Respuesta a petición con radicado No. 1-2025-001109 de fecha 19 de mayo de 2025

Cordial saludo, señor Guerra:

Para dar respuesta a su petición con radicado No. 1-2025-001109 y NIS 2025-05-013309 de fecha 19 de mayo de 2025, relacionada con solicitud ingreso personal obra civil. Le informamos que al revisar el oficio de solicitud el personal no coincide con el objeto, ni el número de contrato del cual harán parte, por lo anterior su solicitud no es aprobada. Se solicita allegar el oficio y documentación correctamente para proceder con el respectivo trámite.

Espero que la respuesta brindada haya atendido lo solicitado por usted.

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la mejora continua de nuestros procesos.

Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G



Cordialmente;

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto

NIS: 2025-05-013309

Proyectó: Ingrid Tatiana Burgos Díaz - Cargo: Ing. Civil Apoyo Técnico de Infraestructura

851040 85-2-2025-001549

Yopal 22 mayo 2025

Señor
Cristhian Javier Guerra Diaz
R/L PROINGENIARQ S.A.S
proingeniarqsas@gmail.com
Monterrey

Asunto: Respuesta a petición con radicado No. 1-2025-001119 de fecha 20 de mayo de 2025

Cordial saludo, señor Guerra:

Para dar respuesta a su petición con radicado No. 1-2025-001119 y NIS 2025-01-229594 de fecha 20 de mayo de 2025, relacionada con solicitud ingreso personal obrero. Le informamos que se ha revisado la documentación recibida y el personal cumple y está al día con los documentos de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP, ARL, caja de compensación, entrega de EPP y examen ocupacional, por lo anterior se dio la autorización de ingreso a partir del 22 de mayo de 2025.

Espero que la respuesta brindada haya atendido lo solicitado por usted.

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la mejora continua de nuestros procesos.

Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G



Cordialmente;

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto

NIS: 2025-01-229594

Proyectó: Ingrid Tatiana Burgos Díaz - Cargo: Ing. Civil Apoyo Técnico de Infraestructura

Gmail **PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>**

Fw: AUTORIZACIÓN INGRESO PROFESIONAL HSEQ Monterrey

1 mensaje

Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co> 29 de mayo de 2025, 3:58 p.m.
Para: PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>, Erika Fabiola Amaya Martinez <eamayam@sena4.onmicrosoft.com>, "segporteriasena@gmail.com" <segporteriasena@gmail.com>

Obtener Outlook para Android

From: jenny jimenez fonseca <jeinymildred@hotmail.com>
Sent: Thursday, May 29, 2025 3:17:54 PM
To: Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>
Cc: Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>; Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co>; Laura Maria Acevedo Galvis <lmacevedog@sena.edu.co>
Subject: AUTORIZACIÓN INGRESO PROFESIONAL HSEQ

Buenas tardes respetada Doc. Miriam.

Realizada la respectiva verificación de la documentación de la profesional HSEQ para el contrato No. ***CO1.PCCNTR.7755228*** DE 2025 cuyo objeto es: ***CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TUA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE***, encontramos que está al día con su respectiva seguridad social, certificados de afiliaciones a EPS, ARL, AFP, entrega de EPP y examen ocupacional.

Los datos de la persona a ingresar a la subsede Túa en el municipio de Monterrey son:

Nombre: Erika Johana Espitia Perilla
Cédula: 1.118.121.777
Cargo: Profesional HSEQ

Cordialmente,

JENNY MILDRED JIMENEZ FONSECA
Profesional de Apoyo SST

365

Gmail

PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>

AUTORIZACIONENTRADA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA)

jenny jimenez fonseca <jeinymildred@hotmail.com> 15 de mayo de 2025, 4:25 p.m.
Para: Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>, Laura Maria Acevedo Galvis <lmacevedog@sena.edu.co>
CC: "proingeniarqsas@gmail.com" <proingeniarqsas@gmail.com>, "mramirezr@sena.edu.co" <mramirezr@sena.edu.co>, Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co>

Buen día
cordial saludo
Anexar documentación faltante para el ingreso de la maquinaria y personal encargado para desempeñar la labor.

trabajador

- *hoja de vida*
- *certificado de competencias(examen medico ocupacional) certificado medico ocupacional*
- *certificado de entrega de EPP*

Maquinaria

- *Soat vigente*
- *Runt*
- *Manual de instrucciones del fabricante en castellano*
- *Contrato de alquiler en caso de la maquina sea arrendada*
- *Copia de la ultima hoja de revisión*
- *Registro de maquinaria (como las fechas de mantenimiento y calibrado)*
- *Presentar ruta de transporte desde el sitio de partida al sitio de llegada.*
- *Anexar ruta de inicio de partida del recorrido hasta donde va a realizar la labor.*

***señalización exigible** (anexar evidencia fotográfica)*

- *Placa de identificación*
- *Señales de peligro señales de advertencia*
- *Botiquín*
- *Extintor multipropósito*

Profesional de apoyo SST
Jenny Mildred Jiménez Fonseca
cordialmente

De: Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 15 de mayo de 2025 9:03 a. m.
Para: Laura Maria Acevedo Galvis <lmacevedog@sena.edu.co>
Cc: jenny jimenez fonseca <jeinymildred@hotmail.com>
Asunto: RV: AUTORIZACIONENTRADA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA)

366

Raquel Martinez Larrota
Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare - Contratista
rmartinezl@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 19 No. 36-68

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2025 4:46 p. m.
Para: Laura Maria Acevedo Galvis <lmacevedog@sena.edu.co>; Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>; Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>
Asunto: AUTORIZACIONENTRADA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA)

[Texto citado oculto]

Raquel Martinez Larrota
Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare - Contratista
rmartinezl@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 19 No. 36-68

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para mas información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

REVISION MAQUINARIA.xlsx
11K

367

Gmail

PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>

AUTORIZACION INGRESO SUBSEDE TUA-MONTERREY: CONTRATO ADECUACIÓN CUBIERTA

1 mensaje

Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co> 14 de mayo de 2025, 4:56 p.m.
Para: "segporteriasena@gmail.com" <segporteriasena@gmail.com>
CC: Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>, Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co>, PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>

Buenas tardes.

Se autoriza el ingreso del arquitecto WILLIAM CORTES para ejecutar el contrato de adecuación de la cancha en la subsede Tua-Monterrey:

- Vigencia de la autorización: hasta el 27 de agosto de 2025

Gracias

Miriam Ramirez Rincon
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare - Profesional G02
mramirezr@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500 Ext:84762
Carrera 19 No. 36-68
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

368

Gmail **PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>**

AUTORIZACION INGRESO DEL PERSONAL CONTRATO N CO1.PCCNTR.7755228_MONTERREY

Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co> 14 de mayo de 2025, 4:25 p.m.
Para: "segporteriasena@gmail.com" <segporteriasena@gmail.com>
CC: Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>, PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>, Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co>

Buenas tardes.

Se autoriza el ingreso del siguiente personal para ejecutar el contrato de adecuación de la cancha en la subsede Tua-Monterrey:

Wilfran Gutiérrez torres con cedula 80090925 Director de obra
Leonard David Acevedo Cifuentes cedula 1118545552 Residente de Obra
Dayana Fernanda Torres Sanabria cedula 1116548250 inspector de Obra
Jainober Alberto Diaz Merizalde cedula 74814471 Profesional HSQ

Vigencia de la autorización: hasta el 27 de agosto de 2025

Gracias

Cordialmente,

Miriam Ramirez Rincon
Profesional Grado 02
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Regional Casanare
mramirezr@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:84762
Carrera 19 No. 36-66, Yopal

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: jenny jimenez fonseca <jenymildred@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2025 11:38
Para: Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>
Cc: Laura Maria Acevedo Galvis <lmacevedog@sena.edu.co>; Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co>; Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>
Asunto: AUTORIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO N CO1.PCCNTR.7755228 DE 2025

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de jenymildred@hotmail.com. Por qué es esto importante

BUEN DIA

369

Se autoriza el ingreso al personal

Wilfran Gutiérrez torres con cedula 80090925 Director de obra
Leonard David Acevedo Cifuentes cedula 1118545552 Residente de Obra
Dayana Fernanda Torres Sanabria cedula 1116548250 inspector de Obra
Jainober Alberto Diaz Merizalde cedula 74814471 Profesional HSQ

cordialmente
Profesional Apoyo SST
Jenny Mildred Jiménez F

Miriam Ramirez Rincon
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare - Profesional G02
mramirezr@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext.84762
Carrera 19 No. 36-68

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicionalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

370

Gmail **PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>**

RV: Revisión Documentos Vehicular CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.7755228 de 2025 "CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIE

Laura Maria Acevedo Galvis <lmacevedog@sena.edu.co> 13 de mayo de 2025, 3:36 p.m.
Para: Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>, Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co>
CC: Orfy Stella Perez Holguin <osperez@sena.edu.co>, PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>, "jeinymildred@hotmail.com" <jeinymildred@hotmail.com>

Cordial saludo.

De acuerdo al contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 7755228 de 2025, con fecha de inicio 28/04/2025, en ejercicio de las funciones propias de la supervisión del contrato relacionado y en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y requisitos legales, técnicos, ambientales y de SST indicadas en el estudio previo, se solicita los siguientes soportes previo al inicio de actividades:

- Desarrollo de la inspección planeada para las condiciones de la obra
- Registro fotográfico de la señalización a instalar en la obra, al iniciar labores en obra tener en cuenta los siguientes elementos de emergencias; botiquín, camilla de emergencias y extintor
- Anexar el listado de sustancias químicas a utilizar en la obra con sus hoja de seguridad.
- Anexar plan de emergencias.

La profesional de apoyo reviso la documentación de los vehículos, manifiesta estar al día.

Laura Maria Acevedo Galvis
Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare - Contratista
lmacevedog@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500
Carrera 19 No. 36-68
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

371

De: jenny jimenez fonseca <jeinymildred@hotmail.com>
Enviado: martes, 13 de mayo de 2025 13:01

Para: Laura Maria Acevedo Galvis <lmacevedog@sena.edu.co>
Asunto: Revisión Documentos Vehicular CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.7755228 de 2025 "CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIE

Buenos días

Se adjunta verificación vehicular CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.7755228 de 2025 "CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE"

Cordialmente
JENNY MILDRED JIMENEZ
CD 33481954
PERSONAL APOYO DE SST SENA

Laura Maria Acevedo Galvis
Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare - Contratista
lmacevedog@sena.edu.co
PBX: (57) 601 5461500
Carrera 19 No. 36-68
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

2 archivos adjuntos

REVISION VEHICULAR.xlsx
10K

SOLICITUD PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (1).pdf
179K

372

Gmail **PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>**

Autorización ingreso Personal_CONTRATO ADECUACION DE CUBIERTA CANCHA MONTERREY

Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co> 13 de mayo de 2025, 10:33 a.m.
Para: Porteria Sena <segporteriasena@gmail.com>
CC: Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co>, Erika Fabiola Amaya Martinez <eamayam@sena4.onmicrosoft.com>, PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>

Buenos días.

Se autoriza el ingreso del siguiente personal para ejecutar trabajos de adecuación en la subsede Monterrey, del 13 de mayo al 27 de agosto:

Juan Gabriel Rincon Rincon CC 7414916 Cargo Maestro de obra.
Fredy Hardy Rincon Rincon con CC 9430853 Cargo Maestro de obra.
José Reinel Cristancho Carvajal CC 74858538 Cargo maestro de obra.
Cesar Augusto Delgado Diaz con CC 86074707 Cargo ayudante de obra.
Fredy Alexander Rincon CC 1029644154 Ayudante de obra.

Cordialmente,

Miriam Ramirez Rincon
Profesional Grado 02
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Regional Casanare
mramirezr@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:84762
Carrera 19 No. 36-68, Yopal
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Laura Maria Acevedo Galvis <lmacevedog@sena.edu.co>
Enviado: martes, 13 de mayo de 2025 10:03
Para: Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>
Cc: Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>; Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co>; PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>; Orfy Stella Perez Holguin <osperez@sena.edu.co>; Erika Fabiola Amaya Martinez <eamayam@sena4.onmicrosoft.com>
Asunto: Personal para ingreso a Subsede TUA !

Buen día.

373

Se adjuntan el listado del personal que se encuentra apto para laborar en las instalaciones del subsede de Tua Monterrey.

Juan Gabriel Rincon Rincon CC 7414916 Cargo Maestro de obra.
Fredy Hardy Rincon Rincon con CC 9430853 Cargo Maestro de obra.
José Reinel Cristancho Carvajal CC 74858538 Cargo maestro de obra.
Cesar Augusto Delgado Diaz con CC 86074707 Cargo ayudante de obra.
Fredy Alexander Rincon CC 1029644154 Ayudante de obra.

Laura Maria Acevedo Galvis
Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare - Contratista
lmacevedog@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500
Carrera 19 No. 36-68

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Miriam Ramirez Rincon
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare - Profesional G02
mramirezr@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500 Ext:84762
Carrera 19 No. 36-68

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

374

Gmail

PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>

Personal para ingreso a Subsede TUA !

Laura Maria Acevedo Galvis <lmacevedog@sena.edu.co> 13 de mayo de 2025, 10:03 a.m.
Para: Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>
CC: Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>, Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co>, PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>, Orfy Stella Perez Holguin <osperez@sena.edu.co>, Erika Fabiola Amaya Martinez <eamayam@sena4.onmicrosoft.com>

Buen día.

Se adjuntan el listado del personal que se encuentra apto para laborar en las instalaciones del subsede de Tua Monterrey.

Juan Gabriel Rincon Rincon CC 7414916 Cargo Maestro de obra.
Fredy Hardy Rincon Rincon con CC 9430853 Cargo Maestro de obra.
José Reinel Cristancho Carvajal CC 74858538 Cargo maestro de obra.
Cesar Augusto Delgado Diaz con CC 86074707 Cargo ayudante de obra.
Fredy Alexander Rincon CC 1029644154 Ayudante de obra.

SENA
Laura Maria Acevedo Galvis
Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare - Contratista
lmacevedog@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500
Carrera 19 No. 36-68
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

SENA
Laura Maria Acevedo Galvis
Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare - Contratista
lmacevedog@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500
Carrera 19 No. 36-68
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con

325

la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

376

Gmail

PROINGENIARQ SAS <proingeniarqsas@gmail.com>

OBSERVACIÓNES DOCUMENTACIÓN PERSONAL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7755228 DE 2025

Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co> 12 de mayo de 2025, 5:25 p.m.
Para: "proingeniarqsas@gmail.com" <proingeniarqsas@gmail.com>
CC: Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>, Laura Maria Acevedo Galvis <lmacevedog@sena.edu.co>, "jeinymildred@hotmail.com" <jeinymildred@hotmail.com>

Buenas tardes,

Se adjuntan las observaciones suministradas por el área de Seguridad y Salud en el trabajo.

El personal que se encuentra resaltado en verde se encuentra al día con la documentación para ingresar.

De igual manera quedamos atentos a recibir la información solicitada tan pronto sea posible y así proceder exitosamente a las actividades constructivas.

Cordialmente,

Ingrid Tatiana Burgos Diaz
Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare - Contratista
itburgosd@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 19 No. 36-68

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

REVISIÓN PERSONAL CUBIERTA.xlsx
17K

377

PERSONAL EQUIPO OBRERO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EPS (Información consultada en ADRE...	FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN A EPS	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	PENSIÓN	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INDUCCIÓN	ENTREGA DE EPP	OBSERVACIÓN
JUAN GABRIEL RINCON RINCON	74814918	Maestro de obra	Sanitas activo Subsidiado (ADRES)	falta	Positiva activo	OK	OK	OK	OK	OK	1. Anexar formulario de afiliación a EPS
FREDY HARDY RINCON RINCON	9630651	Maestro de obra	Nueva EPS activo Subsidiado (ADRES)	Solicitud de ingreso por parte de PROINGENIARQ SAS	Positiva activo	OK	OK	OK	OK	OK	1. Anexar certificado de afiliación a EPS
JOSE RENEL CRISTANCHO CARVAJAL	74859038	Oficial de obra	Capresoca retirado (ADRES)	OK	Positiva activo	OK	OK	OK	OK	OK	1. La cédula no es visible
CESAR AUGUSTO DELGADO DIAZ	88074707	Ayudante de obra	Capresoca retirado (ADRES)	OK	Positiva activo	OK	OK	OK	OK	OK	
FREDY ALEXANDER RINCON	1023564154	Ayudante de obra	Sanitas activo Subsidiado (ADRES)	OK	Positiva activo	OK	OK	OK	OK	OK	

NO SE RELACIONAN EN EL CUADRO "EQUIPO OBRERO"

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EPS (Información consultada en ADRES	FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN A EPS	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	PENSIÓN	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INDUCCIÓN	ENTREGA DE EPP	OBSERVACIÓN
AURO URBANO GOMEZ	74812550	?	Capresoca activo Contributivo (ADRES)	OK	Positiva activo	OK	OK				1. Cédula no legible 2. Falta examen médico ocupacional 3. Falta inducción 4. Entrega de EPP
JAIME QUINTILIANO PULIDO MORALES	7230965	?	Capresoca activo Subsidiado (ADRES)	OK	Positiva activo	OK	OK				1. Cédula no legible 2. Falta examen médico ocupacional 3. Falta inducción 4. Entrega de EPP

PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EPS	FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN A EPS	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	PENSIÓN	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INDUCCIÓN	ENTREGA DE EPP	PAGO PLANILLA	OBSERVACIÓN
WILFRAN GUTIERREZ TORRES	80090925	Director de obra	nueva eps	Anexa certificado solicitud de reintegro nueva eps por parte del empleador PROINGENIARQ SAS	OK	OK	OK	falta	OK	Falta	OK	1. Anexar último examen médico realizado (periodico o de seguimiento) 2. Entrega de EPP
LEONARD DAVID ACEVEDO CIFUENTES	1118545562	Residente de obra	sanitas	Anexar certificado afiliación eps	OK	OK	OK	falta	OK	Falta	OK	1. Falta anexar certificado de afiliación a EPS 2. Anexar último examen médico realizado (periodico o de seguimiento) 3. Entrega de EPP
DAYANA FERNANDA TORRES SANABRIA	1116548250	Inspector de obra	nueva eps	Anexar certificado afiliación eps	OK	OK	OK	falta	OK	Falta	OK	1. Falta anexar certificado de afiliación a EPS 2. Anexar último examen médico realizado (periodico o de seguimiento) 3. Entrega de EPP
JAINOBER ALBERTO DIAZ MERIZALDE	74814471	Profesional HSQ	nueva eps	Anexar certificado afiliación eps	OK	OK	OK	falta	OK	Falta	OK	1. Falta anexar certificado de afiliación a EPS 2. Anexar último examen médico realizado (periodico o de seguimiento) 3. Entrega de EPP

EQUIPO APOYO TECNICO ADICIONAL

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EPS	FORMULARIO UNICO DE AFILIACIÓN A EPS	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	PENSIÓN	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INDUCCIÓN	ENTREGA DE EPP	PAGO PLANILLA	OBSERVACIÓN
MARY FERNANDA GONZALEZ ARANGUREN	1116543940	Profesional Arqu. Apoyo HSQ SST	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta		1. Anexar todos los soportes
WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ	17348899	Profesional Arq Apoyo obra civil	Sanitas	Anexar certificado afiliación eps	OK	OK	OK	Falta	Falta	Falta	OK	1. Falta anexar certificado de afiliación a EPS 2. Anexar último examen médico realizado (periodico o de seguimiento) 3. Entrega de EPP

851040- 85-2-2025-001473

Yopal 19 mayo 2025

Señor
Cristian Javier Guerra Diaz
proingeniarqsas@gmail.com
R/L Proingenarq S.A.S
Calle 17 No 7 – 43
Monterrey, Casanare

Asunto: Seguimiento a la ejecución del Contrato de obra No.CO1.PCCNTR.7755228 de 2025 "CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE"

Cordial saludo, Señor Guerra:

Me permito solicitar formalmente el cumplimiento de los siguientes aspectos técnicos, contemplados dentro de las obligaciones del contrato del asunto:

Numeral 2.8.2 Obligaciones específicas del contratista

- ✓ Bitácora de obra física aprobada diariamente por el supervisor del contrato.
- ✓ El contratista deberá cumplir con el cuadro de profesionales exigido, de igual forma la disponibilidad y dedicación de acuerdo con lo ofertado. De realizarse algún cambio o modificación al profesional deberá informar a la entidad contratante para su aval entendiendo que debe cumplir con la misma experiencia del profesional ofertado.

Con respecto al equipo de profesionales ofertado, los ingenieros Leonard David Acevedo y Dayana Fernanda Torres, residente de obra e inspector de obra respectivamente, deben tener una dedicación 100% presencial en el lugar de la obra.

Quedo atenta al suministro de la información para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones descritas.

Cordialmente,

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo administrativo
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.7755228

Proyectó: Raquel Martínez Larrota,
Ingeniero Civil, Profesional de Apoyo de Infraestructura

851040-

Yopal

Ingeniero
Cristian Javier Guerra Diaz
proingeniarqsas@gmail.com
R/L Proingenarq S.A.S
Calle 17 No 7 – 43
Monterrey, Casanare

Asunto: Asunto: Ejecución del CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.7755228 de 2025 "CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE"

Cordial Saludo, ingeniero Guerra:

En el marco del contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 7755228 de 2025, con fecha de inicio 28/04/2025, en ejercicio de las funciones propias de la supervisión del contrato relacionado y en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y requisitos legales, técnicos, ambientales y de SST indicadas en el estudio previo, documento que hace parte integral del contrato, solicito el envío de la siguiente información previo al inicio de actividades:

NUMELAL-2.8.3 OBLIGACIONES DE SST

- ✓ Matriz de peligros actualizada y acorde a los riesgos generados.
- ✓ Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las actividades a desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de elemento, normas técnicas.
- ✓ Plan de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción.
- ✓ Plan de Emergencias.
- ✓ Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate
- ✓ Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.
- ✓ Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.
- ✓ Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente.

- ✓ Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación.
- ✓ Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.
- ✓ Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización.
- ✓ Cuando se haga uso o entrega de productos químicos Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
- ✓ Cuando se haga uso o entrega de productos químicos Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).
- ✓ Presentar Certificación con membrete de la empresa emitida por el oferente y firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas y procedimiento de rescate de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente.
- ✓ Antes de iniciar las actividades de trabajo seguro en alturas presentar, permiso de trabajo y ATS firmado por el coordinador de alturas e interventor. Estos permisos se firmarán diarios y en campo.
- ✓ Acta de entrega de elementos de protección personal
- ✓ Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra.
- ✓ Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo.
- ✓ Presentar Certificado de afiliación de la ARL de la empresa oferente con el tipo de riesgo. (IV, V según la actividad).

NUMERAL 2.8.4 AMBIENTAL

- ✓ Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. NOTA: El proveedor deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique.

NUMERAL 2.8.2 TECNICO

- ✓ Relación del personal profesional, técnico y operativo
- ✓ Cronograma de obra previo al inicio de las obras, para aprobación de la supervisión.
- ✓ Mantener el orden y organización en las áreas de trabajo y señalización de las mismas.

De otra parte, se recuerda el cumplimiento de las siguientes actividades y entrega de soportes para el expediente contractual:

- ✓ Diligenciamiento de la bitácora de obra física diaria y firmada por el supervisor del contrato y/o apoyo técnico de supervisión y el manejo adecuado de la misma, así como la elaboración del informe de avance de obra mensual durante los cuatro (4) meses, el cual deberá radicarse los 5 primeros días de cada mes de ejecución del contrato que debe contener como mínimo:

- ✓ Descripción de los trabajos ejecutados.
- ✓ Aspectos legales.
- ✓ Aspectos ambientales.
- ✓ Registro de maquinaria y equipos.
- ✓ Registro de personal.
- ✓ Materiales.
- ✓ Programa de trabajo y avance del proyecto.
- ✓ Cantidad de trabajos realizados y control de calidad.
- ✓ Problemas presentados y soluciones planteadas y adoptadas.
- ✓ Registro fotográfico.

- ✓ Toda modificación al contrato deberá hacerse dentro del término de ejecución de éste y se hará constar en actas de modificación firmadas por el contratista, director de obra y el supervisor y/o Interventor del SENA.
- ✓ Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.
- ✓ Efectuar la ejecución del contrato conforme a los diseños y a las especificaciones técnicas requeridas.
- ✓ Mantener y garantizar el óptimo estado, la calidad del servicio ofrecido. En caso de cambio en las características o identificación de algún ítem, el mismo deberá aprobarse por parte del SENA, sin que de manera alguna procedan los cambios unilaterales por parte del contratista.
- ✓ El contratista deberá cumplir con el cuadro de profesionales exigido, de igual forma la disponibilidad y dedicación de acuerdo con lo ofertado, de realizarse algún cambio o modificación al profesional deberá informar a la entidad contratante para su aval entendiendo que debe cumplir con la misma experiencia del profesional ofertado.
- ✓ En el informe final deberá entregar documentación técnica: como planos récord (físico y digital), diseños, memorias de cálculo, licencias, manuales de mantenimiento, certificaciones que apliquen (RETIE, RETILAP, etc.), bitácoras de obra físicas y aprobadas diariamente por la supervisión del contrato , planes de manejo ambiental, planes de seguridad y salud en el trabajo, certificados de calidad, fichas técnicas, certificados de pruebas de laboratorios, paz y salvo por todo concepto de los proveedores y personal empleado de obra, registro fotográfico del avance de la ejecución de los trabajos.

- ✓ Se insta a cumplir con cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, a fin de garantizar su correcta ejecución.
- ✓ Estar atento a los requerimientos que solicite la entidad contratante.

Se cita a comité de obra de inicio de actividades el día lunes 28 de abril a las 10:00 am en la sala de juntas del Sena sede Yopal.

Cordialmente,

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo administrativo
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.7755228

Proyectó: Raquel Martínez Larrota,
Ingeniero Civil, Profesional de Apoyo de Infraestructura

20. Realización de comités de obra, definiendo su periodicidad y alcance, previamente acordados por la supervisión.

20. Realización de comités de obra, definiendo su periodicidad y alcance, previamente acordados por la supervisión.

Se realizo comité para la firma del acta del inicio donde se indicó que los comités se realizarían en obra con una periodicidad de 8 días, donde la supervisión revisa y hace control de las actividades ejecutadas en obra.
Se han realizado los comités en obra programados con la supervisión.

ACTA No. 001			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité inicio de obra contrato de obra No. CO1.PCCNTR.7755228 de 2025 OBJETO "CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MUL TI FUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE"			
CIUDAD Y FECHA:	28 DE ABRIL DEL 2025	**HORA INICIO:** 08:00 am	**HORA FIN:** 3:30 PM
LUGAR Y/O ENLACE:	-Sala de juntas área administrativa -Sitio ejecución de las actividades de obra (Monterrey, Casanare).	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Casanare	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Presentación de Asistentes
2. Objetivo de la reunión
4. Presentación cumplimiento de las obligaciones pactadas y requisitos legales, técnicos, ambientales y SST.
5. Localización y replanteo en campo área intervenir
6. Finalización de la reunión

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

El presente comité de obra tiene como objetivo principal informar al contratista del cumplimiento de las actividades en materia de obra, informes, componente ambiental y SST, de igual forma realizar la localización y replanteo en campo para inicio de las actividades.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Toma la palabra la supervisora del contrato
2. Socialización de los requisitos y pautas para dar inicio y desarrollo del contrato
3. Localización y replanteo del área a intervenir
4. Agradecimiento a todos los participantes por su colaboración y compromiso
5. Cierre

CONCLUSIONES

Se deja informado al contratista del cumplimento de las actividades y queda comprometido al cumplimiento y ejecución de todas ellas.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Hace parte del presente comité oficio de radicado 851040-85-2-2025-001168 de 28 abril del 2025 entregado al contratista donde se le solicita y socializa el cumplimiento las actividades del contrato CO1.PCCNTR.7755228 de 2025

21. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor del mismo.

21. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor del mismo.

La empresa PROINGENIERARQ SAS, siguió todas y casa una de las recomendaciones e instrucciones dadas por las profesionales colaboradoras del SENA en todas las áreas inherentes a la Adecuación De La Cubierta Para Cancha Multifuncional Para La Subsede Túa Del Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare.

22. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo

22. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo.

La empresa PROINGENIERARQ SAS es responsable de todas las actuaciones y omisiones derivadas de la ejecución del centrado de Adecuación De La Cubierta Para Cancha Multifuncional Para La Subsede Túa Del Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare.

23. Proporcionar al supervisor de contrato y cuando estos lo requieran, informes detallados y generales sobre cualquier aspecto de la obra de acuerdo con la solicitud

23. Proporcionar al supervisor de contrato y cuando estos lo requieran, informes detallados y generales sobre cualquier aspecto de la obra de acuerdo con la solicitud.

La empresa PROINGENIERARQ SAS, suministro toda la información solicitada por parte de la supervisión del SENA, la información, documentación, y características inherentes de la obra.

24. El proveedor deberá presentar las certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier instalación eléctrica el proveedor deberá presentar los certificados de conformidad de producto (Cuando aplique)

24. El proveedor deberá presentar las certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier instalación eléctrica el proveedor deberá presentar los certificados de conformidad de producto (Cuando aplique)

Durante la ejecución para la Adecuación De La Cubierta Para Cancha Multifuncional Para La Subsede Túa Del Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare. NO se contempla componente eléctrico, por lo que este certificado no es aplicable ni entregable por parte del contratista de obra.

PROINGENIARQ S.A.S
Proyectos de Ingenieria y Arquitectura
Nit. 901.388.628-9

25. El contratista deberá cumplir con el cuadro de profesionales exigido, de igual forma la disponibilidad y dedicación de acuerdo con lo ofertado, de realizarse algún cambio o modificación al profesional deberá informar a la entidad contratante para su aval entendiendo que debe cumplir con la misma experiencia del profesional ofertado.

25. **El contratista deberá cumplir con el cuadro de profesionales exigido, de igual forma la disponibilidad y dedicación de acuerdo con lo ofertado, de realizarse algún cambio o modificación al profesional deberá informar a la entidad contratante para su aval entendiendo que debe cumplir con la misma *experiencia del profesional ofertado.***

    El contratista de obra PROINGENIARQ SAS, cumpliendo con sus obligaciones contractuales para la ejecuion de la obra Adecuación De La Cubierta Para Cancha Multifuncional Para La Subsede Túa Del Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare, mantuvo todo el equipo de trabajo ofertado en el seguimiento, ejecución y control del proyecto en sus diferentes áreas,
    Prueba de esto en el informe técnico se describen nombres, roles y dedicación de cada uno de ellos, y se anexan los pagos de seguridad, nóminas y demás.

26. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.

26. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.

Durante el periodo ejecutado la empresa PROINGENIARQ SAS, dio cumplimiento a las obligaciones según lo establecido en la minuta y amparado con las garantías de las pólizas.
A la fecha de terminación no se generaron nuevas obligaciones toda vez que no fue necesario modificar al contrato.
