CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 7-feb-25

Capitulo:	PRELIMINARES	Sub-capitulo:	Localización - replanteo vías urbanas.	Und	M	Ubicación	SINCE - SUCRE
ítem:	1.1						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	AREA		
TRAMO VIAL A INTERVENIR	ML	220,00			1,00	220,00
TRAMO 2 VIAL A INTERVENIR	ML	173,00			1,00	173,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	393,00
	Vienen	306
	TOTAL	87,00

Obra: Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capitulo:	PRELIMINARES	Sub-capitulo:	Demolición de estructuras de concreto box culvert.	Und	M3	Ubicación	SINCE - SUCRE
ítem:	1.4						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
DEMOLICION BOX EXISTENTE	M3	3,00	1,00	2,00	1,00	6,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:	Subtotal	6,00
	Viernes	5,41
	TOTAL	0,59

Obra: Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 7-feb-25

Capitulo:	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Sub-capitulo:	Excavación de material común para conformación de estructura de pavimento.	Und	M3	Ubicación	SINCE - SUCRE
Ítem:	1,6						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
TRAMO VIAL A INTERVENIR	M3	220,00	5,00	0,80		880,00
TRAMO 2 VIAL A INTERVENIR	M3	168,25	4,50	0,80		605,70
REPOSICION TRAMO 1 REIN ABS K0+000 - K0+070	M3	70,00	3,00	0,60		126,00
BOX COULVERT	M3	5,50	8,70	1,52		72,73
REPOSICION TRAMO 1 REIN ABS K0+130 - K0+220	M3	80,00	5,00	0,10		40,00
MANEJO DE AGUAS	M3	16,80	1,00	0,70	2	23,52
BORDILLOS	M3	220,00	0,20	0,50	2	44,00
REPOSICION TRAMO 2 ABS K0+230 - K0+275	M3	46,85	3,50	0,40		65,59

REGISTRO FOTOGRAFICO






Subtotal	1857,54
Vienen	918
TOTAL	939,54

OBSERVACIONES:

Obra: Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capitulo:	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Sub-capitulo:	Conformación de subbase granular, incluye suministro, colocación, extendido y compactación.	Und	M3	Ubicación	#REF!
Ítem:							

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	AREA		
TRAMO VIAL A INTERVENIR	M3	220,00	5,00	0,20		220,00
TRAMO 2 VIAL A INTERVENIR	M3	168,25	4,50	0,20		151,43
REPOSICION TRAMO 1 REIN ABS K0+000 - K0+070	M3	70,00	3,00	0,20		42,00
REPOSICION TRAMO 1 REIN ABS K0+130 - K0+220	M3	80,00	4,39	0,10		35,09

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	448,52
	Vienen	220,00
	TOTAL	228,52

Obra:	Interventoria:	

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capitulo:	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Sub-capitulo:	Conformación de subrasante con material seleccionado CBR = 95%. Espesor 20cm.	Und	M3	Ubicación	#REF!
ítem:	2,1						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
TRAMO 1 VIAL A INTERVENIR	M3	220,00	5,00	0,30		330,00
TRAMO 2 VIAL A INTERVENIR	M3	168,25	4,50	0,20		151,43
REPOSICION TRAMO 1 REIN ABS K0+000 - K0+070	M3	70,00	3,00	0,40		84,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	565,43
	Vienen	306
	TOTAL	259,43

Obra:

Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 7-feb-25

Capitulo:	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Sub-capitulo:	Retiro de material y escombro procedente de las excavaciones a una distancia de 39,8km.	Und	M3*KM	Ubicación	SINCE - SUCRE
Item:	2.2						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		VOLUMEN	VOL	% EXP		
TRAMO VIAL A INTERVENIR	M3*KM		880,00	1,30	39,80	45531,20
TRAMO 2 VIAL A INTERVENIR	M3*KM		605,70	1,30	39,80	31338,92
REPOSICION TRAMO 1 REIN ABS K0+000 - K0+070	M3*KM		126,00	1,30	39,80	6519,24
BOX COULVERT	M3*KM		72,73	1,30	39,80	3763,15
REPOSICION TRAMO 1 REIN ABS K0+130 - K0+220	M3*KM		40,00	1,30	39,80	2069,60
MANEJO DE AGUAS	M3*KM		23,52	1,30	39,80	1216,92
BORDILLOS	M3*KM		44,00	1,30	39,80	2276,56
EXCAVACION MECANICA EN ZANJA	M3*KM		701,25	1,30	39,80	36282,68
REPOSICION TRAMO 2 ABS K0+230 - K0+275	M3*KM		65,58	1,30	39,80	3392,93

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	132391,20
	Vienen	71293,04
	TOTAL	61098,16

Obra:

Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capitulo:	ESTRUCUTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES	Sub-capitulo:	Bordillo prefabricado en concreto de 3000psi Tipo A80 (15x35x80cm).	Und	M	Ubicación	0
ítem:	2.6						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		VOLUMEN	LONG.	AREA			
TRAMO 1 VIAL A INTERVENIR	ML	200,00			2,00	400,00	

OBSERVACIONES:	Subtotal	400,00
	Vienen	
	TOTAL	400,00

Obra: Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 7-feb-25

Capitulo:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Sub-capitulo:	Filtro en material granular e=40cm.	Und	M3	Ubicación	0
item:	2.12						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
BOX COULVERT	M3	8,70	4,11	0,50	1,00	17,86

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	17,86
	Vienen	
	TOTAL	17,86

Obra:

Interventoria:


CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capitulo:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Sub-capitulo:	Solado de limpieza en concreto 1:3:4, e=10cm.	Und	M3	Ubicación	0
Ítem:	2.13						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
BOX COULVERT	M3	4,68	8,70	0,11	1,00	4,47

REGISTRO FOTOGRAFICO

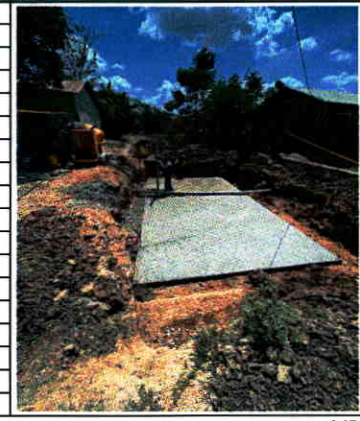



OBSERVACIONES:	Subtotal	4,47
	Vienen	
	TOTAL	4,47

Obra:

Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capitulo:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Sub-capitulo:	Concreto de 3500psi para muros, losa superior e inferior y aletas de box culvert. Incluye formaleteria.	Und	M3	Ubicación	0
item:	2.14						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	VOLUMEN		
box	m3			18,00	1,00	18,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	18,00
	Vienen	
	TOTAL	18,00

Obra:	Interventoria:	

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 7-feb-25

Capitulo:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Sub-capitulo:	Acero de refuerzo de 60000psi para muros, losa superior e inferior y aletas.	Und	KG	Ubicación	0
ítem:	2.15						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO			
acero de refuerzo box	kg			2593,90	1,00	2593,90	

CUADRO DE HIERROS BOX CULVERT

REF	No. VAR.	FIGURA	LONGITUD	CANTIDAD	PESO
401	4	4.00	4.00	88	1408.0
402	4	1.60 .20 .20	2.00	110	880.0
403	1	1.90 1.90	4.79	19	363.8
404	4	6.80	6.80	28	380.8
405	4	.20 .20 7.60	1.00	160	1600.0
406	4	.35 2.45 .35	3.00	112	896.0
451	4	0.75*	0.75	37	296.0
452	4	.20 3.42* .20	3.85	20	77.0
470	4	.12 1.20 1.85 .20	2.70	28	77.0
480	4	.20 1.85 .20	2.25	28	63.0
454	4	.60 1.60	2.2	36	79.2
498	4	.70 1.35	2.75	36	99.0
322	4	.10 0.45 .12	1.45	24	34.8
323	4	2.40	2.40	12	28.8
321	3	4.15	4.15	16	66.4
420	4	.10 0.80 .15	1.8	20	36.0
490	4	4.9	4.9	10	196.0
CANT.	1	HIERRO BOX (Kg)			3885.9
		VOL CONCRETO BOX CULVERT (M3)			24.30
		PESO TOTAL PROMANIOL (kg)			160





OBSERVACIONES:	Subtotal	2593,90
	Vienen	
	TOTAL	2593,90

Obra: Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	


CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capitulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Excavacion mecanica en zanja	Und	M3	Ubicación	SINCE - SUCRE
Ítem:	NP1						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	AREA		
RED PRINCIPAL TRAMO 1 ALCAN	ML	238,00	0,50	1,20	1	142,80
CONEX DOM TRAMO 1 ALCAN	ML	6,00	0,50	1,00	30	90,00
RED PRINCIPAL TRAMO 2 ALCAN	ML	168,25	0,50	1,20	1	100,95
CONEX DOM TRAMO 2 ALCAN	ML	6,00	0,50	1,00	28	84,00
RED PRINCIPAL ACUE	ML	325,40	0,50	1,00	1	162,70
CONEX DOM ACUE	ML	6,00	0,50	0,50	58	87,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



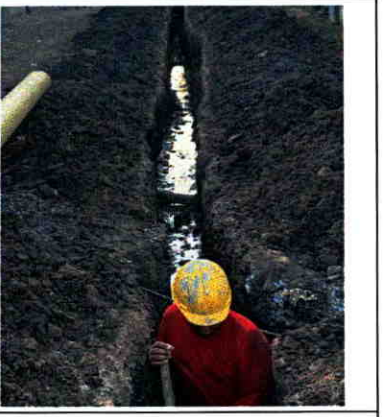

OBSERVACIONES:	Subtotal	667,45
	Viemon	454,5
	TOTAL	212,95

Obra:


Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capitulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Retiro tuberia existente 0" a 12" (incluye retiro)	Und	M	Ubicación	SINCE - SUCRE
ítem:	NP2						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	AREA			
Red principal de alcantarillado sanitario	ML	406,25			1	406,25	
Redes conexiones domiciliarias	ML	6,00			58	348,00	
Red principal de acueducto	ML	332,75			1	332,75	
Redes conexiones domiciliarias acueducto	ML	6,00			58	348,00	

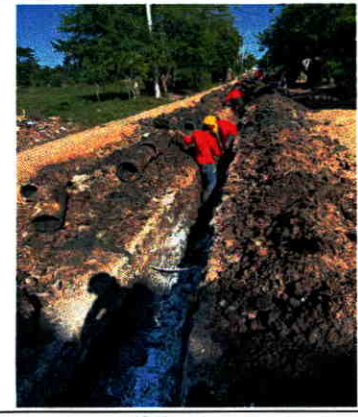

OBSERVACIONES:	Subtotal	1435,00
	Vienen	1191
	TOTAL	244,00

Obra: Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capítulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 6"	Und	M	Ubicación	SINCE - SUCRE
Ítem:	NP3						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	AREA		
Redes conexiones domiciliarias	ML	6,00			58	348,00
Manejo de aguas	ML	6,00			6	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	348,00
	Vienen	276
	TOTAL	72,00

Obra:

Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capitulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 8"	Und	M	Ubicación	SINCE - SUCRE
ítem:	NP4						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	AREA			
Red principal de alcantarillado sanitario	ML	406,25			1	406,25	
conexiones	ML	23,25			1	23,25	

OBSERVACIONES:	Subtotal	429,50
	Vienen	319,5
	TOTAL	110,00

Obra: Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	7-feb-25

Capitulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Suministro, transporte e instalacion empalme de domiciliaria de alcantarillado	Und	UND	Ubicación	SINCE - SUCRE
ítem:	NP5						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	AREA			
conexiones domiciliarias	UND				58	58,00	

OBSERVACIONES:	Subtotal	58,00
	Vienen	46
	TOTAL	12,00

Obra:	Interventoria:	

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 7-feb-25

Capítulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Construccion Pozo de inspeccion D=1,2	Und	UND	Ubicación	SINCE - SUCRE
ítem:	NP6						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	AREA		
pozos de inspeccio red principal	UND				8	8,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	8,00
	Vienen	
	TOTAL	8,00

Obra:	Interventoria:	

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 7-feb-25

Capítulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Entibado tipo 2 (1/7 utilizaciones) hasta 1.2m de profundidad	Und	M2	Ubicación	SINCE - SUCRE
ítem:	NP7						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			UTILIZACIONES	TOTAL
		LARGO	ALTO	CANT		
Red principal de alcantarillado sanitario	M2	369,50	1,00	2,00	7	105,57
Redes conexiones domiciliarias	M2	6,00	1,00	88,00	7	75,43

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	181,00
	Vienen	166,7142857
	TOTAL	14,29

Obra:

Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 7-feb-25

Capitulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Domiciliaria en pf+uad 4" * 1/2" (manguera)	Und	UND	Ubicación	SINCE - SUCRE
item:	NP8						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	AREA		
Redes conexiones domiciliarias	ML				58	58,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	58,00
	Vienen	46
	TOTAL	12,00

Obra: Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 7-feb-25

Capitulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Suministro e instalacion tuberia PVC union mecanica 4" rde 21	Und	M	Ubicación	SINCE - SUCRE
item:	NP9						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	AREA		
Red principal de acueducto	ML	369,50			1	369,50

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:	Subtotal	369,50
	Vienen	319,5
	TOTAL	50,00

Obra: Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 7-feb-25

Capitulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Comision de topografia construccion sistema de redes sanitarias	Und	DIA	Ubicación	SINCE - SUCRE
item:	NP10						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	AREA			
REDES ALCALTARILLADO PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS	DIA				90	90,00	


OBSERVACIONES:	Subtotal	90,00
	Vienen	60
	TOTAL	30,00

Obra: Interventoria:

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022		Periodo: 31 DIC 24 - 07 DE FEB 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE		Corte No. 2
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL		Fecha: 7-feb-25

Capitulo:	ITEMS NO PREVISTOS	Sub-capitulo:	Construccion caja de inspeccion 60 x 60	Und	UND	Ubicación	SINCE - SUCRE
ítem:	NP11						

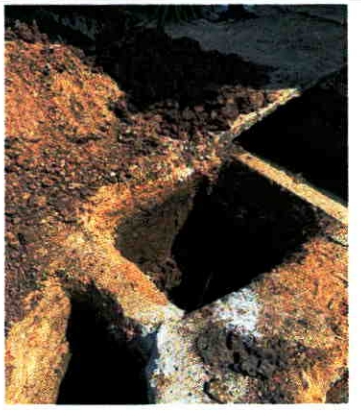Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	AREA			
conexiones domiciliarias a red principal	UND				58	58,00	 

OBSERVACIONES:	Subtotal	58,00
	Vienen	
	TOTAL	58,00

Obra: Interventoria:
