CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 08 FEB 25 - 28 DE MAY 25	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 3	
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha:	28-may-25

Capitulo:	ESTRUCUTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES	Sub-capitulo:	Pavimento en concreto hidráulico MR=40kg/cm2, con formaletas, texturizado, vibrado y curado. Incluye cortes mecanicos para juntas, córdon polietileno, material sellante siliconado, acero liso para dovelas de transferencia. Espesor 20cm.	Und	M3	Ubicación	SINCE - SUCRE
Item:	2.4						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
TRAMO 1 VIAL A INTERVENIR	M3*KM	226,00	5,00	0,20	1,00	226,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Subtotal	,00
Vienen	0,00
TOTAL	226,00

OBSERVACIONES:

Obra:

Interventoria:

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	MEMORIAS DE CÁLCULO	
CONTRATO DE OBRA No.	LP-SID-016-2022	Periodo: 08 FEB 25 - 28 DE MAY 25
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	Corte No. 3
ELABORÓ:	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL	Fecha: 28-may-25


Capitulo:	ESTRUCUTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES	Sub-capitulo:	Bordillo prefabricado en concreto de 3000psi Tipo A80 (15x35x80cm).	Und	M	Ubicación	SINCE - SUCRE
Item:	2.6						

Ubicación	UND	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	LONG.	AREA		
TRAMO 1 VIAL A INTERVENIR	ML	200,00			2,00	400,00
TRAMO 1 VIAL A INTERVENIR	ML	26,00			2,00	52,00
TRAMO 2 VIAL A INTERVENIR	ML	50,00			2,00	100,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





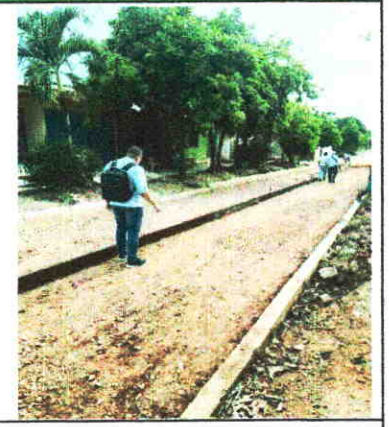

OBSERVACIONES:	Subtotal	552,00
	Vienen	400,00
	TOTAL	152,00

Obra:

Interventoria:
