Aguazul, 02 de octubre de 2025

Ingeniero:
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor contrato de prestación de servicios No. 0647-2025
Aguazul

Ref.: Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión No 0647-2025

Asunto: Informe de ejecución de actividades - ACTA No. 4 PARCIAL 3-

Por medio de la presente me permito presentar informe -acta 04 parcial 3 de ejecución de actividades, las cuales se desarrollaron durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/09/2025 al 30/09/2025, de acuerdo al contrato de la referencia, cuyo objeto contractual es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGUE DE INFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, REPROGRAMACIÓN, GENERACIÓN DE REPORTES Y LAS ALERTAS EN LA PLATAFORMA GESPROY 3.0 DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR QUE SE ENMARQUEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Sin otro particular,

GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
C.C. No. 47.442.426 de Yopal
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 3

Aguazul, 02 de octubre del 2025.

Doctor(a)
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0647 - MA-CD-SI-636-2025 de 2025-07-17.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO	:	0647
TIPO CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLATAFORMA GESPROY.
VALOR	:	$25.500.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 MCTE.
VALOR FINAL	:	$25.500.000,00 MCTE.
PLAZO	:	CINCO (5) MESES
PRORROGA	:	
FECHA INICIO	:	2025-07-21
FECHA TERMINACIÓN	:	2025-12-20

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/09/2025 hasta el 30/09/2025.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Realizar la actualización de la información técnica y financiera de los proyectos de inversión del SGR en la plataforma GESPROY, desde la etapa de aprobación hasta el cierre del proyecto, garantizando la veracidad, oportunidad e idoneidad del reporte mensual, incluyendo la revisión de cronogramas, metas físicas y financieras, estados contractuales, de los proyectos generados en marco del PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor para el periodo: 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2025. BPIN 2019850100004 Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul Según la plantilla enviada por la Interventoría, para el mes de agosto se reporto ejecución física quedando asi 93,44% y una ejecución financiera del 96,96% BPIN 2020850100007 Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del

	municipio de Aguazul Casanar El proyecto presenta un avance de ejecución física del 77,44% y una ejecución financiera del 72,51%. Actualmente se encuentra en estado "En ejecución", pero es necesario cambiar su estado a "Terminado". BPIN 2022850100009 Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de aguazul Casanare El proyecto presenta programación vencida, con una ejecución física del 59,59% a febrero de 2025 y una ejecución financiera del 45,35% a abril de 2024, Por lo tanto, es necesario proceder con la reprogramación del proyecto. BPIN 2022005850010 Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare Se registró correspondiente al mes de agosto de 2025, con una ejecución física del 96,54% a agosto de 2025 y una ejecución financiera del 87,88% a julio de 2024. Además, se envió un oficio al DNP solicitando el levantamiento de giros del proyecto, y la entidad se encuentra a la espera de la respuesta. Evidencia:Actividad 1 Medio: Medio físico: 3 folios Medio digital: Anexo 1
Efectuar el seguimiento a la trazabilidad de la información registrada en la plataforma GESPROY, con base en los datos suministrados por las áreas técnicas, financieras y jurídicas de los proyectos que se ejecutan en el marco de los procedimientos del Proceso de Gestión de la Infraestructura. Esta actividad comprende la verificación de la coherencia y consistencia de los reportes cargados, así como la revisión y análisis de las alertas generadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El profesional deberá elaborar y presentar un (1) informe mensual con el estado actualizado de dichas alertas, detallando las acciones correctivas adoptadas, los avances en su resolución y el impacto en la calificación del IGPR	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor del 01 al 30 de septiembre de 2025 se elaboro un informe con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la secretaria de infraestructura financiados con recursos del sistema general de regalías SGR Evidencia:Actividad 2 Informe de alertas Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 2
Elaborar documental y digitalmente según corresponda las respuestas a los requerimientos que realice el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), los entes de control y el representante legal para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades legales del municipio como entidad ejecutora.	En atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación otorgada por el supervisor para el período del 01 al 30 de septiembre de 2025, se revisó y se contesto la información solicitada por el Ministerio de Minas y Energía respecto al proyecto "Implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales en Zonas Rurales No Interconectadas del Municipio de Aguazul, Casanare", con código BPIN 2020850100007. Evidencia: Actividad 3 Medio: Medio físico: 1 folios Medio digital: Anexo 3
Elaborar un (1) informe mensual del estado de cada uno de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalias SGR, en el marco del PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor del 01 al 31 de agosto de 2025, se realizó una actualización del estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 4 del Contrato CPS No.0224-2025 de " Elaborar un (1) informe mensual del estado de cada uno de los proyectos

	financiados con recursos del sistema general de regalias SGR, en el marco del PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA. Evidencia: Informe estado de proyectos Medio: Medio físico: 8 folios Medio digital: Anexo 4
Realizar asistencia profesional a los profesionales de los proyectos de inversión relacionadas con el uso de la plataforma, reprogramaciones y/o la carga de información.	En al atención cumplimiento de la actividad asistencia profesional, se realiza el registro de las pólizas correspondientes al proyecto BPIN 2019850100004, denominado "Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado Plaza de Toros" en el municipio de Aguazul, con prórroga N.° 8. Se incluyen los siguientes documentos: Registro de póliza anexo 20, referente a la póliza de cumplimiento del contrato de obra. Registro de póliza anexo 18, referencia a la póliza de responsabilidad civil. Registro acta de suspension del 24 de septiembre de 2025 al contrato de obra Se realizo el registro del acta de suspensión al contrato de interventoría 685-2019 de fecha 24 de septiembre de 2025, fecha prevista de reinicio 24 de octubre de 2025 Evidencia: Otras actividades Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 5
Las demás designadas por el supervisor que sean inherentes al objeto contractual	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor del 01 al 30 de septiembre 2025, asistí a la capacitación dirigida por el DNP sobre el módulo de gestión de GESPROY, la generación de tickets y la revisión de las alertas presentes en los proyectos del Sistema General de Regalías (SGR). Estas capacitaciones son de gran importancia, ya que el DNP orienta a la entidad en la subsanación de alertas, lo que contribuye a mantener el IGPR de la entidad. Evidencia: Otras actividades Medio: Medio físico: 1 folio Medio digital: Anexo 6

Para una ejecución acumulada del contrato 0647 - MA-CD-SI-636-2025 de 2025-07-17 es **46.67%**

OBSERVACIONES:
.ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N. 7985754408 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Atentamente,


GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
Contratista

ACTIVIDAD 1.


Realizar la actualización de la información técnica y financiera de los proyectos de inversión del SGR en la plataforma GESPROY, desde la etapa de aprobación hasta el cierre del proyecto, garantizando la veracidad, oportunidad e idoneidad del reporte mensual, incluyendo la revisión de cronogramas, metas físicas y financieras, estados contractuales, de los proyectos generados en marco del PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA."

En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor para el PERIODO: 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2025.


ITEM	BPIN	PROYECTO	OBSERVACIÒN
1	2019850100004	Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul	Según la plantilla enviada por la Interventoría, para el mes de agosto se reporto ejecución física quedando asi 93,44% y una ejecución financiera del 96,96%

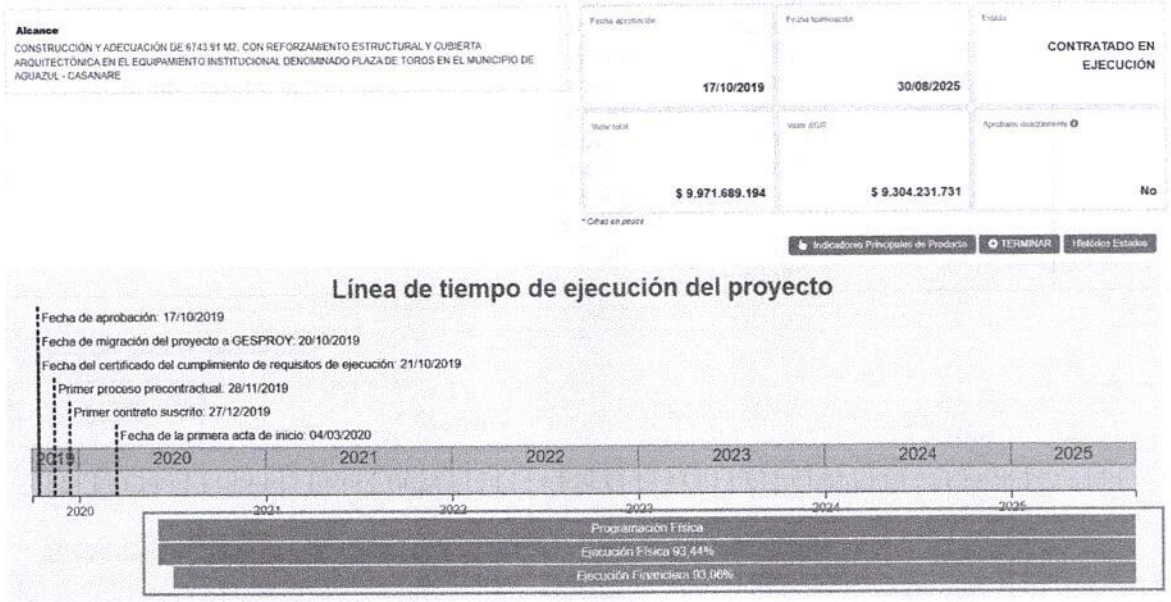


ITEM	BPIN	PROYECTO	OBSERVACIÒN
2	2020850100007	Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanar	El proyecto presenta un avance de ejecución física del 77,44% y una ejecución financiera del 72,51%. Actualmente se encuentra en estado "En ejecución", pero es necesario cambiar su estado a "Terminado".

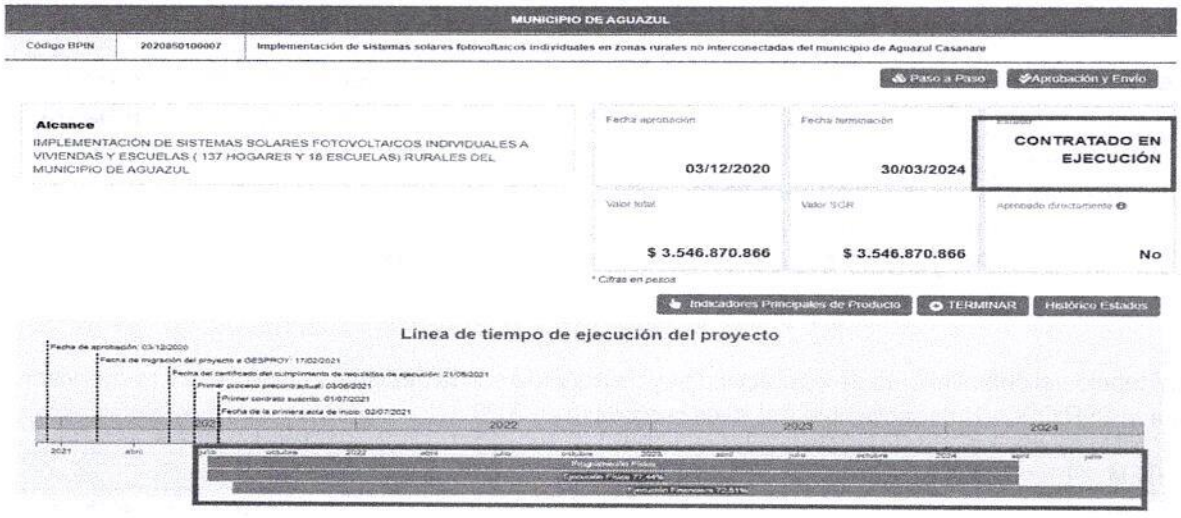

ITEM	BPIN	PROYECTO	OBSERVACIÒN
3	2022850100009	Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de aguazul Casanare	El proyecto presenta programación vencida, con una ejecución física del 59,59% a febrero de 2025 y una ejecución financiera del 45,35% a abril de 2024, Por lo tanto, es necesario proceder con la reprogramación del proyecto.

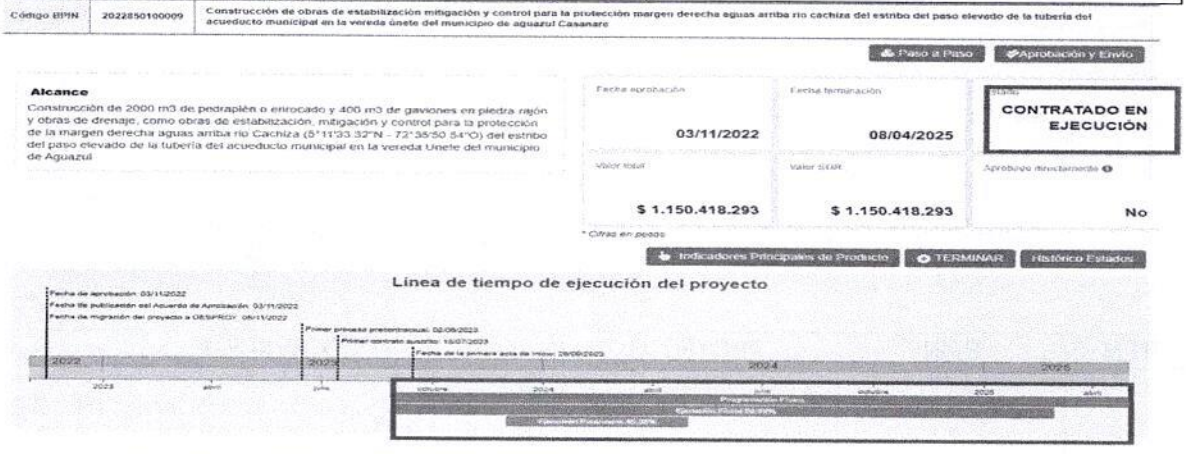

ITEM	BPIN	PROYECTO	OBSERVACIÒN
4	**2022005850010**	Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare	Se registró correspondiente al mes de agosto de 2025, con una ejecución física del 96,54% a agosto de 2025 y una ejecución financiera del 87,88% a julio de 2024. Además, se envió un oficio al DNP solicitando el levantamiento de giros del proyecto, y la entidad se encuentra a la espera de la respuesta.

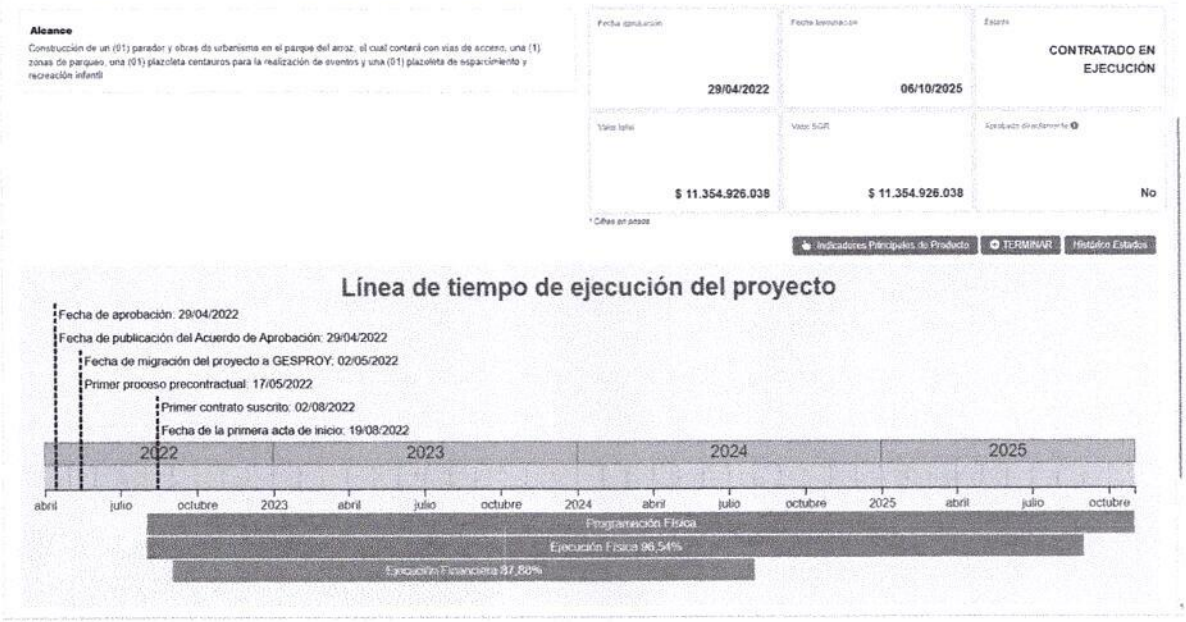

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0647 del 17 de julio de 2025

ACTIVIDAD 2. -INFORME DE ALERTAS

Efectuar el seguimiento a la trazabilidad de la información registrada en la plataforma GESPROY, con base en los datos suministrados por las áreas técnicas, financieras y jurídicas de los proyectos que se ejecutan en el marco de los procedimientos del Proceso de Gestión de la Infraestructura. Esta actividad comprende la verificación de la coherencia y consistencia de los reportes cargados, así como la revisión y análisis de las alertas generadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El profesional deberá elaborar y presentar un (1) informe mensual con el estado actualizado de dichas alertas, detallando las acciones correctivas adoptadas, los avances en su resolución y el impacto en la calificación del IGPR.

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor del 01 al 30 de septiembre de 2025 se elaboro un informe con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la secretaria de infraestructura financiados con recursos del sistema general de regalías SGR, las alertas están en los proyectos en estado TERMINADO


ASUNTO: INFORME MENSUAL DE ESTADO DE ALERTAS.

PERIODO: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025

CÓDIGO ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
EJ-1-24	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 532	2019850100002	CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
EJ-1-24	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 115	2021005850074	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
EJ-1-24	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 507	2022850100011	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL URBANO DENOMINADO CONCHA ACÚSTICA ALBERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ALERTAS SIN SUBSANAR

NOTA: Las alertas se visualizan en el aplicativo GESPROY, en el menú izquierdo, en la sección de *"Reportes" -Alertas SMSCE*

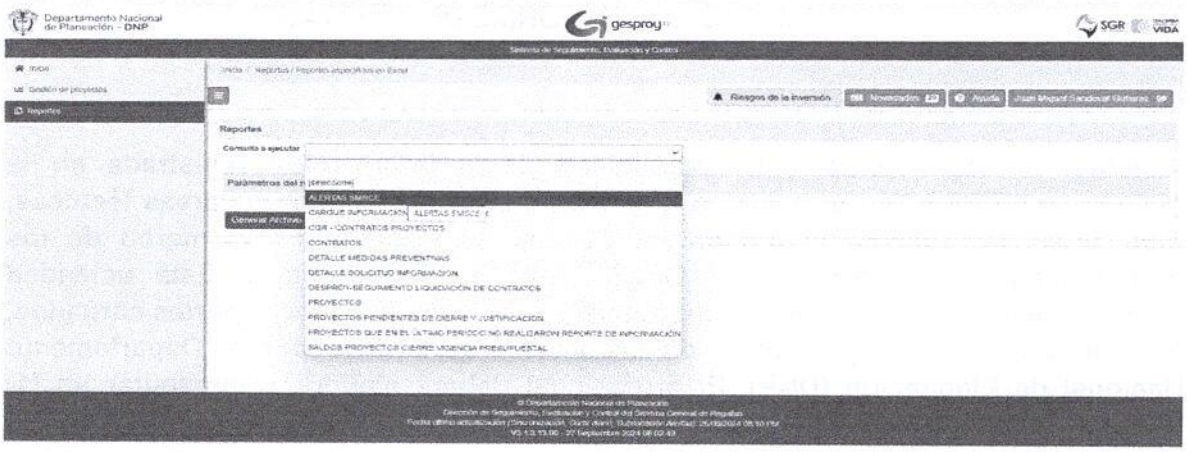

ELABORÓ:


ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO


CONTRATO 0647 DEL 17 JULIO DE 2025

ACTIVIDAD 3.

Elaborar documental y digitalmente según corresponda las respuestas a los requerimientos que realice el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), los entes de control y el representante legal para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades legales del municipio como entidad ejecutora.

En atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación otorgada por el supervisor para el período del 01 al 30 de septiembre de 2025, se revisó y se dio respuesta a la información solicitada por el Ministerio de Minas y Energía respecto al proyecto "Implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales en Zonas Rurales No Interconectadas del Municipio de Aguazul, Casanare", con código BPIN 2020850100007.

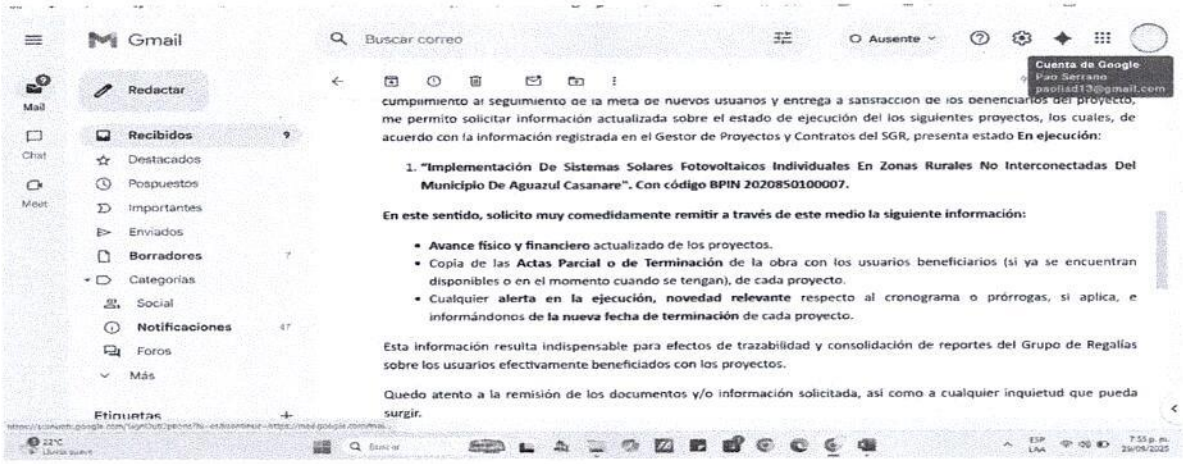

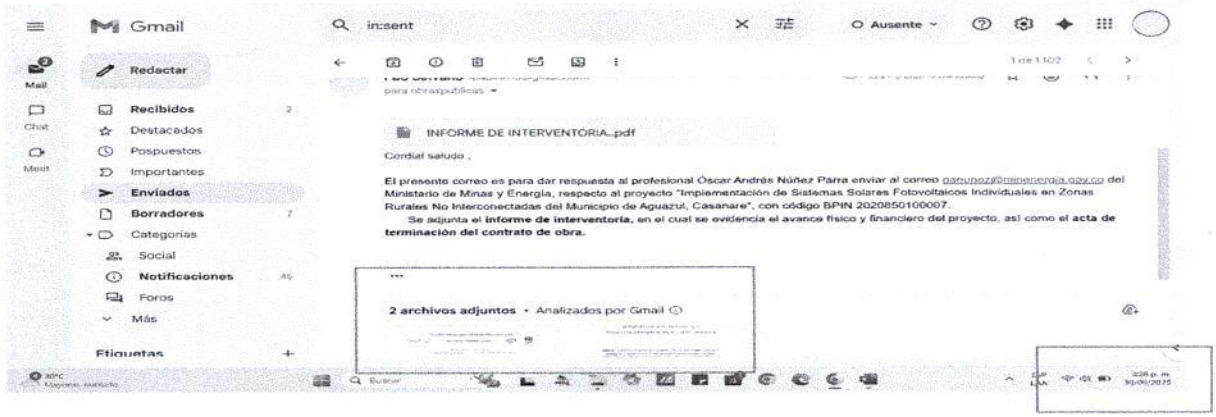

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0647 del 17 de julio de 2025

Yopal, 01 de octubre de 2025

Ingeniero
Juan Miguel Sandoval Gutierrez
Secretario de Infraestructura
Municipio de Aguazul

ASUNTO: INFORME ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA -ACTIVIDAD 4

PERIODO: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025

Este informe presenta una actualización del estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en la **actividad No. 4** del Contrato CPS No.0224-2025 de " Elaborar un (1) informe mensual del estado de cada uno de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalias SGR, en el marco del PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA.

Actualmente el sistema GESPROY registra un total de OCHO (proyectos que se relacionan a continuación, en sus diferentes estados: en ejecución y terminado.

Proyectos en Estado en Ejecución:

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2019850100004	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL
2	2020850100007	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
3	2022005850010	CONSTRUCCIÓN PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
4	2022850100009	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Proyectos en Estado Terminado

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2019850100002	CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
2	2022850100011	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL URBANO DENOMINADO CONCHA ACÚSTICA ALBERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
3	2021005850074	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PARA CIERRE

1	2018850100001	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

PROYECTOS EN EJECUCION

Proyecto 1.

BPIN: 2019850100004
PROYECTO: Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 93.44% a agosto de 2025
AVANCE FINANCIERO: 93,96% a agosto de 2025
ALERTA: Proyecto suspendido de fecha 24 de sep de 2025, fecha prevista de reinicio 24 de octubre de 2025
SDO TRIMESTRE 2025: 90



Proyecto 2.

BPIN: 2020850100007
PROYECTO: Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanare
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 77,24% a marzo 2024
AVANCE FINANCIERO: 72,51% a agosto de 2024
OBSERVACIÓN: La programación registrada esta de julio de 2021 a marzo de 2024, Presenta dos Planes administrativos de control por parte del Departamento nacional de planeación:
PAC 2581-24: "c) No ejecutar el proyecto de inversión en los términos de su aprobación sin justificación técnica o jurídica."

- ✓ "En la visita se observó que, aunque el contrato de obra tiene acta de terminación en octubre de 2023, están pendientes por desarrollar actividades para la funcionalidad del proyecto, tales como la sincronización del software para el cobro del servicio, instalación del sistema de cobro prepago y la creación de la entidad encargada de atender el servicio eléctrico prestado por los paneles instalados en cada beneficiario, careciendo así de la debida sostenibilidad del proyecto.
- ✓ Las actividades pendientes por desarrollar impiden que los beneficiarios tengan el debido soporte técnico del sistema, que garantice el correcto funcionamiento en el momento en que se presenten fallas en el servicio eléctrico.


- ✓ El proyecto no cuenta con acciones que permiten la continuidad y operación, situación que puede llegar a comprometer el uso eficiente de los sistemas fotovoltaicos instalado en los 137 beneficiarios los cuales pueden presentar posibles fallas irreparables que comprometen la estabilidad del proyecto.

PAC 1142-24: se registra programación vencida, siendo necesario que la entidad ejecutora rinda explicaciones al respecto, toda vez, que lo anterior configura una presunta situación irregular, que se enmarca en la causal c) del Artículo 174 de la Ley 2056 de 2020
Teniendo en cuenta que la actividad de interventoría no se ejecutó al 100 %, se va a realizar la solicitud ante el DNP para ajustar el porcentaje de ejecución de la interventora, la cuál va de acuerdo al avance de la obra.
ALERTA: No presenta alertas
SDO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO




Proyecto 3.

BPIN: 2022005850010
PROYECTO: Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 96.54 a agosto de 2025
AVANCE FINANCIERO: 87,88 a julio de 2024
OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con una programación oficial que abarca desde agosto de 2022 hasta octubre de 2025. Se levanto la medida de suspensión de giros con la Resolución No. 3087 de 25 de agosto de 2025. Expediente PAC-1163-24.
El valor actual del proyecto es de $11.354.926.038
ALERTA: No presenta alertas
SDO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO

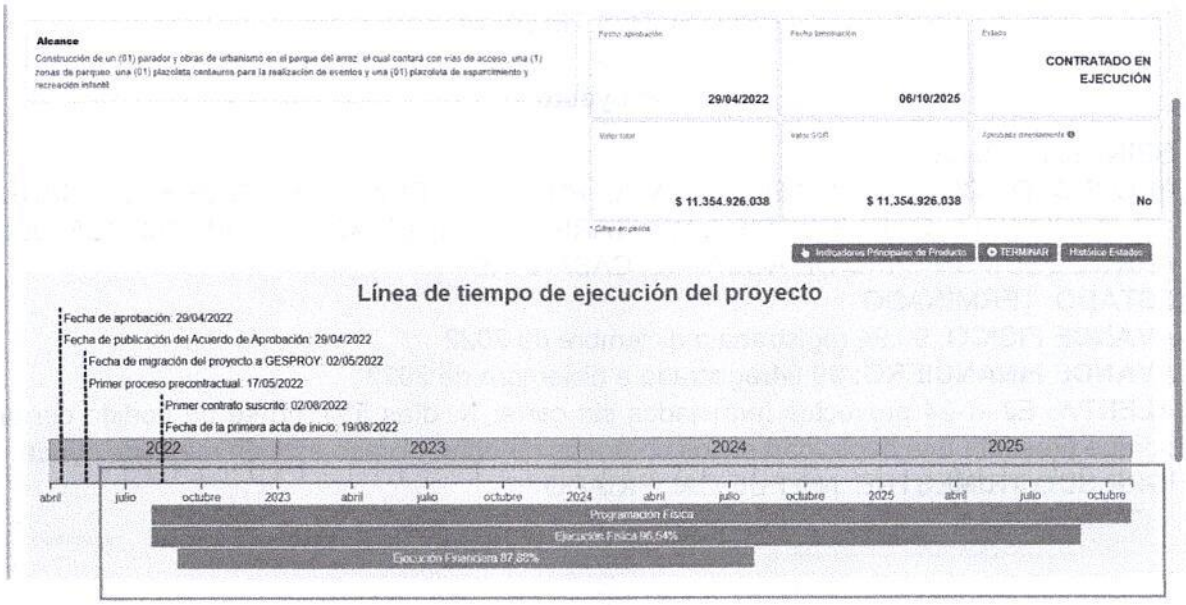

Proyecto 4.


BPIN: 2022850100009
PROYECTO: Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de Aguazul-Casanare.
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 59,59 a febrero de 2025
AVANCE FINANCIERO: 45,35 a abril de 2024
OBSERVACIÓN: El proyecto tiene una programación oficial que se extiende desde septiembre de 2023 hasta abril de 2025.
El valor actual del proyecto es de **$ 1.150.418.293**
Presenta un PAC-1144-24 (Programación vencida) – tiene suspensión de giros
ALERTA: No presenta alertas
SDO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO

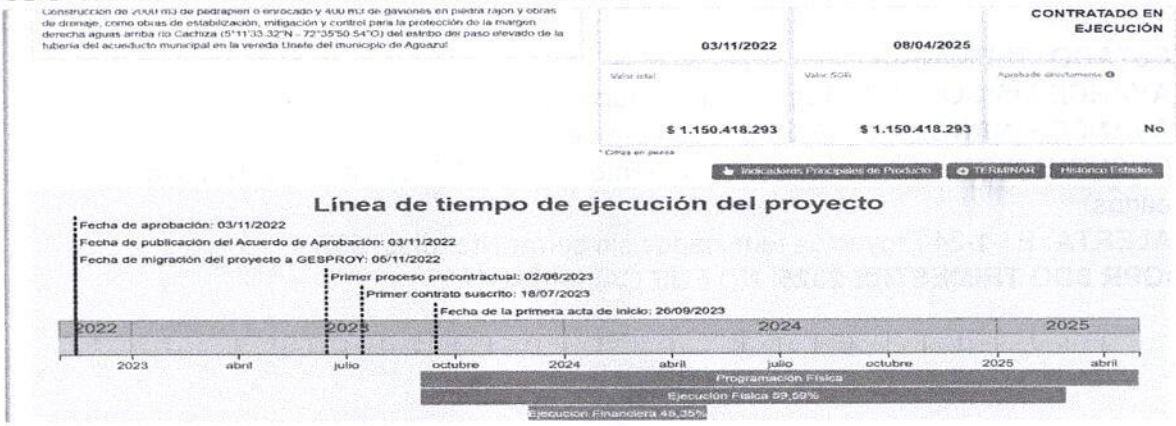

PROYECTOS TERMINADOS

Proyecto 1

BPIN: 2019850100002
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,94 registrada a diciembre de 2022
AVANCE FINANCIERO: 99,94registrada a diciembre de 2022
ALERTA: EJ -1-24 proyectos terminados sin cerrar N. días 533, no se ha podido cerrar porque presenta una duplicidad en los contratos de obra, el caso esta en mesa de ayuda
IGPR SDO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

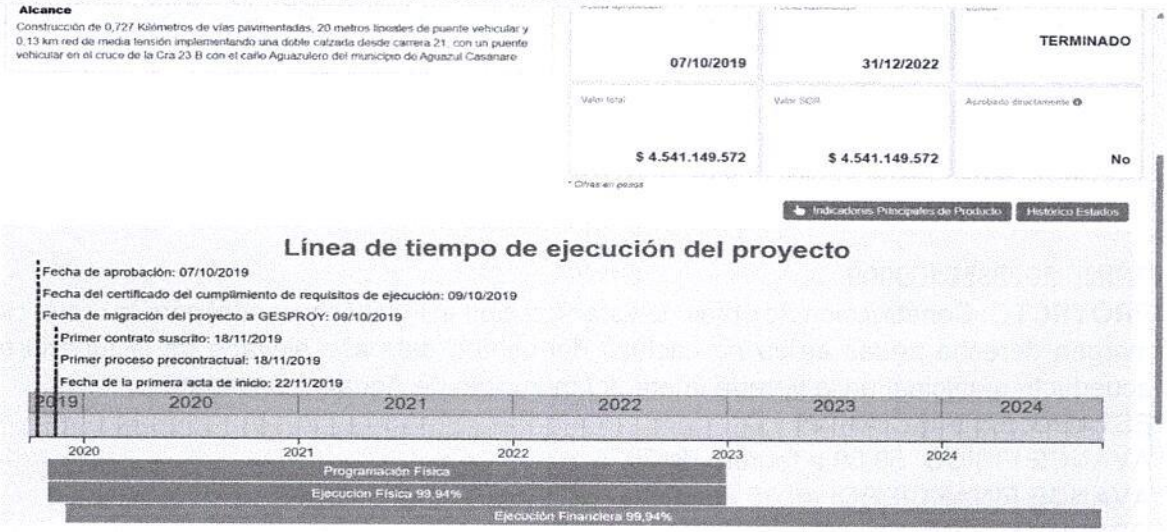


Proyecto 2.

BPIN: 2022850100011
PROYECTO: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 100% Registrada a octubre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 98,81 a diciembre de 2024
OBSERVACIÓN: El contrato de Interventoría N. 321-2022, no está liquidado. (le faltan pagos)
ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 537
IGPR SDO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO




Proyecto 3

BPIN: 2021005850074
PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,09% Registrada a diciembre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 89,58 a agosto 2025
OBSERVACIÓN:
ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 116, esta pendiente de liquidar el contrato de interventoria
SDOTRIMESTRE 2025:: 90

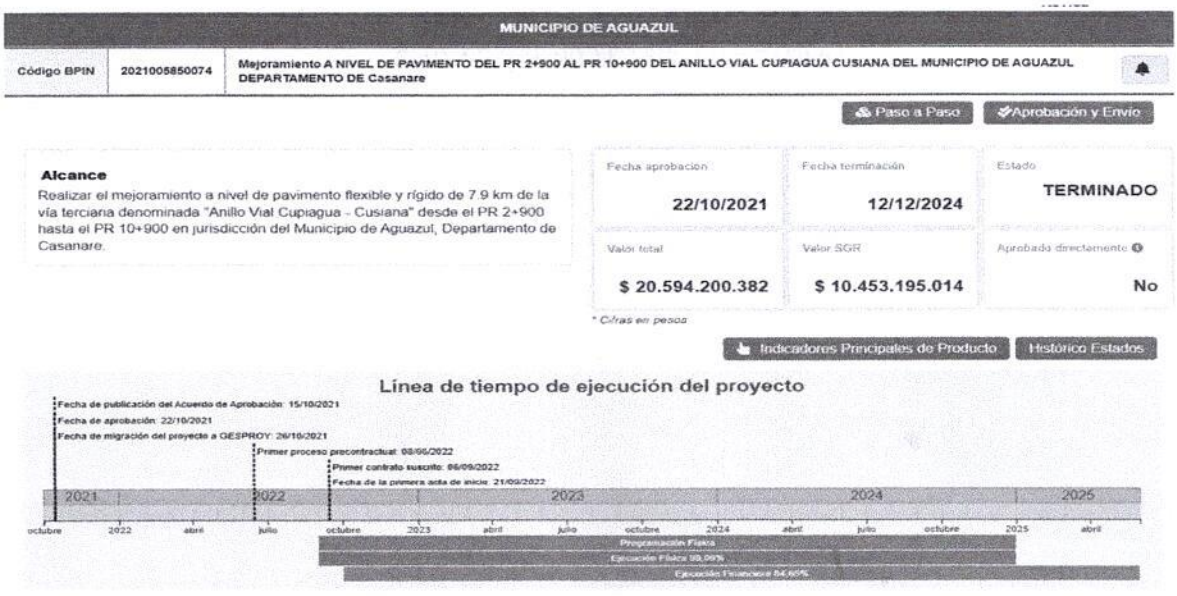

PARA CIERRE

BPIN: 2018850100001
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,30 reporte a febrero de 2022
AVANCE FINANCIERO: 99,90 Reporte a diciembre de 2024
OBSERVACIÓN: se proyectó resolución de cierre, y se encuentra cargada en gesproy
SDOTRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

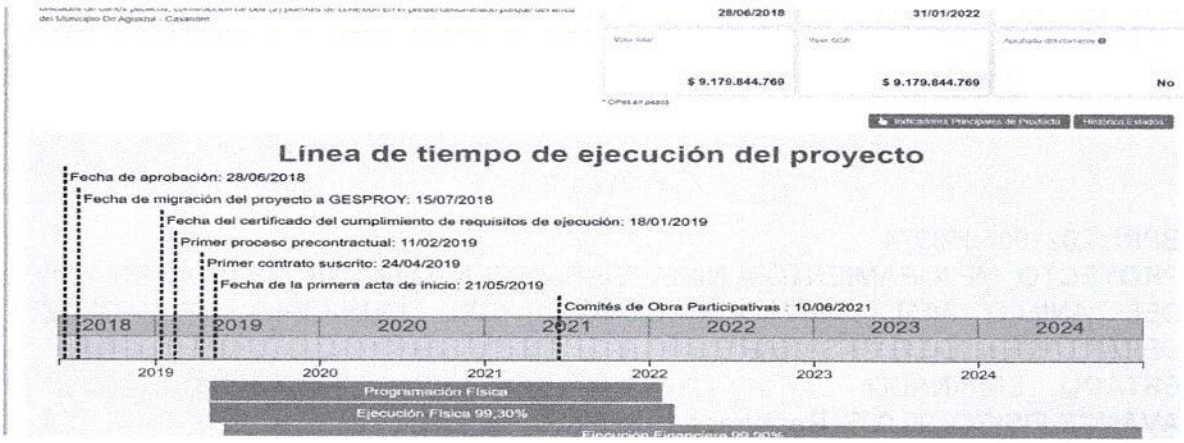

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0647 17 de julio de 2025

ACTIVIDAD 5.


Realizar asistencia profesional a los profesionales de los proyectos de inversión relacionadas con el uso de la plataforma, reprogramaciones y/o la carga de información.

D/A: En al atención cumplimiento de la actividad asistencia profesional, se realiza el registro de las pólizas correspondientes al proyecto BPIN 2019850100004, denominado "Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado Plaza de Toros" en el municipio de Aguazul, con prórroga N.° 8.
Se incluyen los siguientes documentos:
Registro de póliza anexo 20, referente a la póliza de cumplimiento del contrato de obra.
Registro de póliza anexo 18, referencia a la póliza de responsabilidad civil.



Detalle Información Contratos

Contrato No	684-2019	Tipo de Contrato	Obra pública	Modalidad de Contratación	Licitación pública
Identificación del Contratista	901366227-CONSORCIO PLAZA DE TOROS AGUAZUL	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901366227	Tipo Contratista	Consorcio
Objeto	ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL			Valor Contrato Para Proyecto	5.173.791.916,00
Fecha de Inicio	31/05/2020	Fecha Final Contractual	26/06/2025	Fecha Final Real	24/09/2025
Fecha Suscripción del Contrato	27/12/2019	Plazo Contractual	1.858,00 Días	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	MA-LP-SI-013-2019	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	5.173.791.916,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

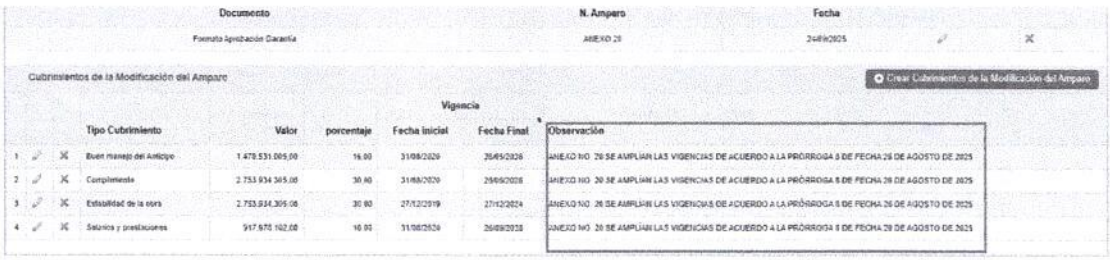


Documento	N. Amparo	Fecha
Formato Aprobación Garantía	ANEXO 20	24/09/2025

Cubrimientos de la Modificación del Amparo — Crear Cubrimientos de la Modificación del Amparo

Vigencia

	Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Fecha inicial	Fecha Final	Observación
1	Buen manejo del Anticipo	1.478.531.005,00	10.00	31/08/2020	26/06/2026	ANEXO NO 20 SE AMPLÍAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA 8 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2025
2	Cumplimiento	2.753.934.305,00	30.00	31/08/2020	26/06/2026	ANEXO NO 20 SE AMPLÍAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA 8 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2025
3	Estabilidad de la obra	2.753.934.305,00	30.00	27/12/2019	27/12/2024	ANEXO NO 20 SE AMPLÍAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA 8 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2025
4	Salarios y prestaciones	517.670.102,00	10.00	31/08/2020	26/06/2026	ANEXO NO 20 SE AMPLÍAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA 8 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2025




Documento	N. Amparo	Fecha
Formato Aprobación Garantía	ANEXO 18	24/09/2025

Cubrimientos de la Modificación del Amparo — Crear Cubrimientos de la Modificación del Amparo

Vigencia

	Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Fecha inicial	Fecha Final	Observación
1	Predios, Labores y Operaciones	852.000.000,00	7.00	27/12/2019	26/06/2025	CON EL PRESENTE ANEXO NO 18 SE AMPLÍAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA 8 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2025

Registro acta de suspension del 24 de septiembre de 2025 al contrato de obra:

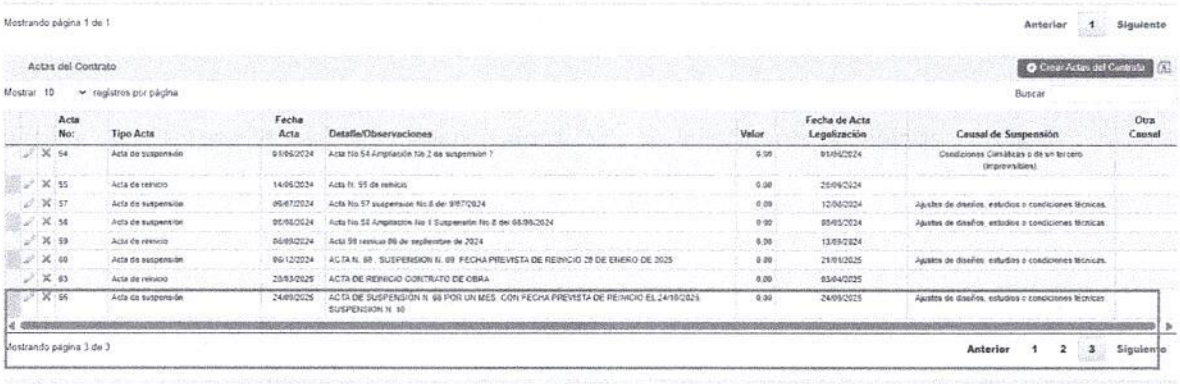

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente


Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
54	Acta de suspensión	01/06/2024	Acta No 54 Ampliación No 2 de suspension 7	0.00	01/06/2024	Condiciones Climáticas o de un tercero (Imprevisibles).	
55	Acta de reinicio	14/06/2024	Acta N. 55 de reinicio	0.00	25/06/2024		
57	Acta de suspensión	06/07/2024	Acta No.57 suspension No.8 del 9/07/2024	0.00	12/08/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
58	Acta de suspensión	05/08/2024	Acta No.58 Ampliacion No 1 Suspensión No 8 del 05/08/2024	0.00	05/08/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
59	Acta de reinicio	04/09/2024	Acta 59 reinicio 06 de septiembre de 2024	0.00	13/09/2024		
60	Acta de suspensión	06/12/2024	ACTA N. 60 . SUSPENSION N. 09 FECHA PREVISTA DE REINICIO 20 DE ENERO DE 2025	0.00	21/01/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
63	Acta de reinicio	20/03/2025	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA	0.00	03/04/2025		
66	Acta de suspensión	24/09/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN N. 66 POR UN MES. CON FECHA PREVISTA DE REINICIO EL 24/10/2025. SUSPENSION N. 10	0.00	24/09/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	

Mostrando página 3 de 3 — Anterior 1 2 3 Siguiente

Se realizo el registro del acta de suspensión al contrato de interventoría 685-2019 de fecha 24 de septiembre de 2025, fecha prevista de reinicio 24 de octubre de 2025

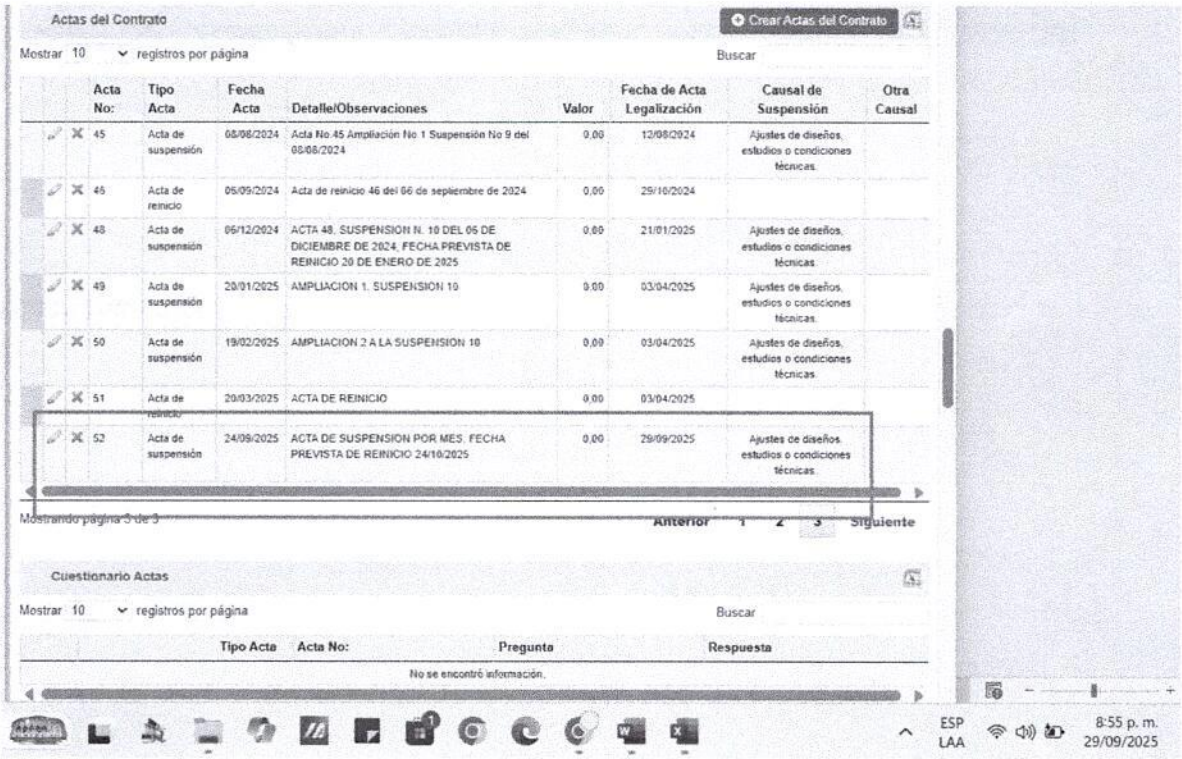

Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
45	Acta de suspensión	08/08/2024	Acta No 45 Ampliación No 1 Suspensión No 9 del 08/08/2024	0,00	12/08/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
46	Acta de reinicio	05/09/2024	Acta de reinicio 46 del 06 de septiembre de 2024	0,00	25/10/2024		
48	Acta de suspensión	06/12/2024	ACTA 48. SUSPENSION N. 10 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024. FECHA PREVISTA DE REINICIO 20 DE ENERO DE 2025	0,00	21/01/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
49	Acta de suspensión	20/01/2025	AMPLIACION 1. SUSPENSION 10	0,00	03/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
50	Acta de suspensión	19/02/2025	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 10	0,00	03/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
51	Acta de reinicio	20/03/2025	ACTA DE REINICIO	0,00	03/04/2025		
52	Acta de suspensión	24/09/2025	ACTA DE SUSPENSION POR MES. FECHA PREVISTA DE REINICIO 24/10/2025	0,00	29/09/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	

Mostrando página 3 de 3 — Anterior 1 2 3 Siguiente

Cuestionario Actas

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Tipo Acta	Acta No:	Pregunta	Respuesta
No se encontró información.			

ESP LAA 8:55 p. m. 29/09/2025

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO


CONTRATO 0647 del 17 de julio de 2025

ACTIVIDAD 6

6.Las demás designadas por el supervisor que sean inherentes al objeto contractual

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor del 01 al 30 de septiembre 2025, asistí a la capacitación dirigida por el DNP sobre el módulo de gestión de GESPROY, la generación de tickets y la revisión de las alertas presentes en los proyectos del Sistema General de Regalías (SGR). Estas capacitaciones son de gran importancia, ya que el DNP orienta a la entidad en la subsanación de alertas, lo que contribuye a mantener el IGPR de la entidad.

Anexo pantallazo asistencia:

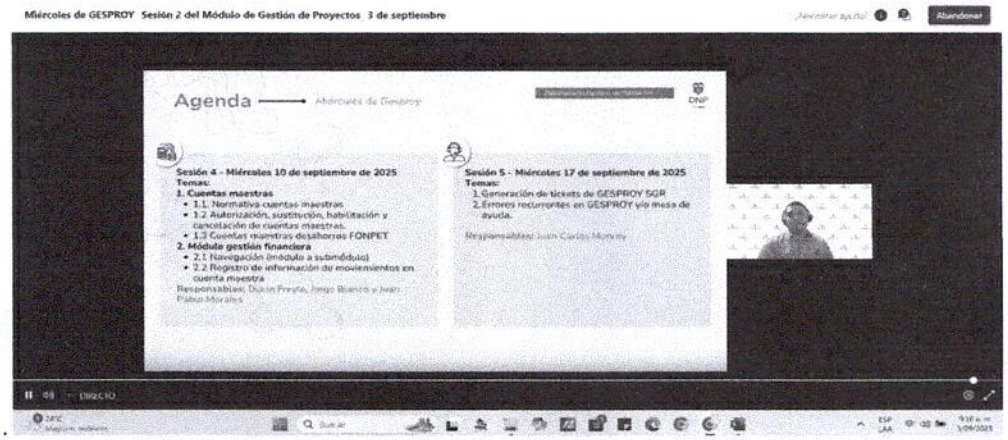

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0647 del 17 de julio de 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	47442426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 31B 43 21	TELÉFONO:	3212900
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de sistemas informático
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79867544O8		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1751432016

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.400	$ 0	$ 326.400
SUBTOTALES:										**$ 326.400**	**$ 0**	**$ 326.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 255.000
SUBTOTALES:													**$ 255.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 255.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.700	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 10.700
SUBTOTALES:									**$ 10.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN			FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 47442426	SERRANO DELGADO GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.040.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.040.000	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.040.000	$ 255.000	$ 0	$ 255.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.040.000	47442426	$ 10.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 592.100

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada
