CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

INFORME DE OBRA No. 04

PERIODO
FINAL

1 DE MAYO DE 2025 HASTA 30 DE MAYO DE 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:

N°. LP-SID-016-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Contratante: GOBERNACION DE SUCRE

NIT: 892280021-1

Contratista: CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

NIT: 901.709.312-6

Interventor: CONSTRUCCIONES BETANIA SAS

NIT: 901.349.507-1

Sincé - Sucre

2025

INTRODUCCIÒN

El presente informe resume el avance físico y financiero del Contrato de obra LP-SID-016-2022, durante el periodo final, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, contratada por la gobernación de Sucre con el **CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL**, representado legalmente por **LEIDY PAOLA SANTIZ PALACIO**.

Para el presente informe se dispone de información visual del avance físico de la ejecución. En estas actividades contamos con: excavaciones varias en material, instalación de tuberías, retiro de material sobrante, aplicación de base y sub-base granular. Construcción de cajas de inspección sanitarias, entre otras.


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE", en el municipio de Sincé consiste en la intervención en el casco urbano de las calles mencionadas en el objeto del contrato mediante la reposición de redes de alcantarillado y la reubicación de redes de acueducto, instalación de domiciliarias y la construcción de pavimento en concreto hidráulico, andenes que contribuyan a delimitar y organizar lo relacionado con la movilidad peatonal. El proyecto en el Municipio de Sincé tiene una longitud de 393 ml.

La obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE", en el municipio de Sincé consiste en la reposición de redes de alcantarillado y acueducto, pavimentación de la vía en concreto hidráulico, andenes y la construcción de box coulvert.

1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en Colombia, en el departamento de sucre, municipio de San Luis de Sincé. Municipio ubicado en el centro de la sabana sucreña.

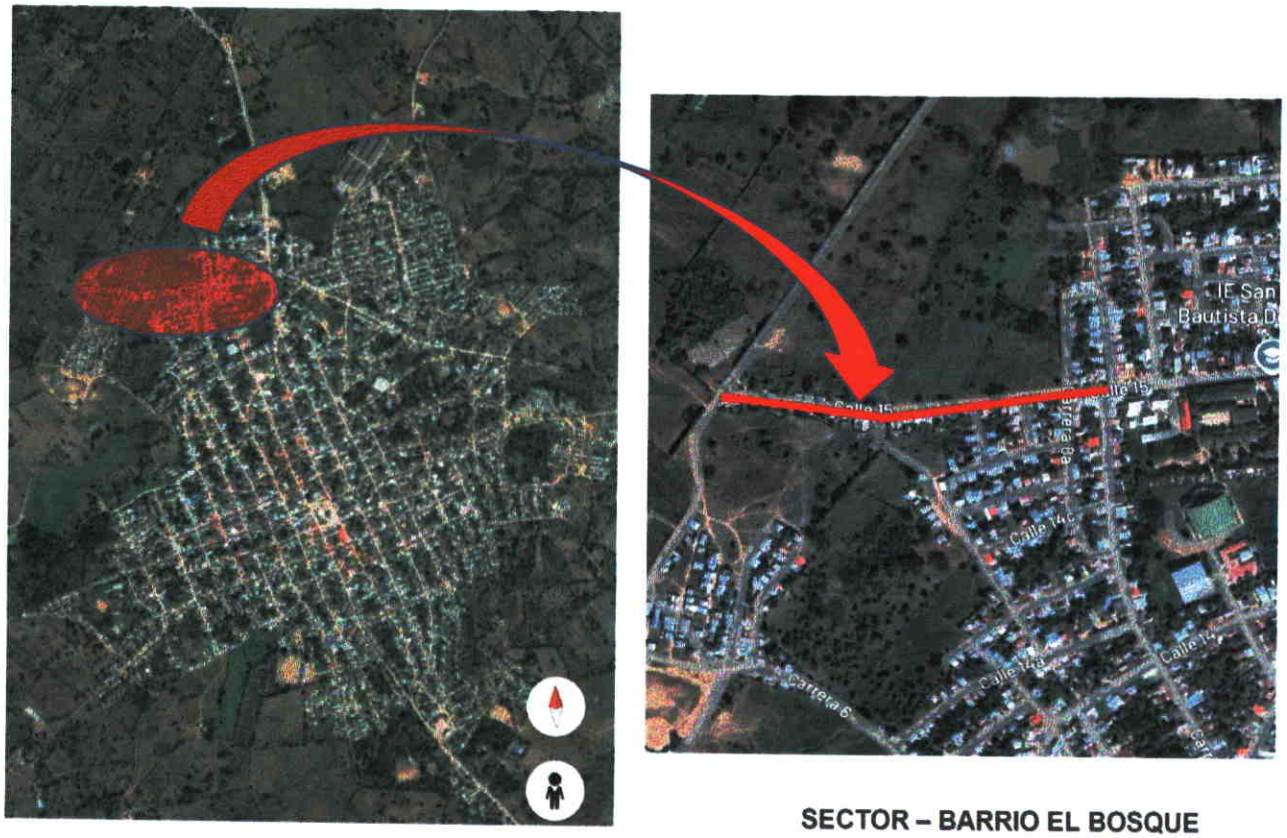

SECTOR – BARRIO EL BOSQUE

MUNICIPIO DE SINCE

Imagen 1. Ubicación

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

2. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO OBRA

CONTRATO N°	LP-SID-016-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
CONTRATANTE	GOBERNACION DE SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL
VALOR INICIAL:	MIL SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS ($1.060.871.108)
VALOR ADICONAL :	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS. $466.078.386
VALOR TOTAL :	$1.526.949.494
INTERVENTORIA	CONSTRUCCIONES BETANIA SAS
CONTRATO N°	CM-002-2023
FECHA DE CONTRATACIÓN:	JULIO 2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO ADICIONAL	5 MESES
SUSPENSION No. 1	15 DE ENERO DE 2024
REINICIO No. 1	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 01	31 DE DICIEMBRE DE 2024 (2 MESES)
PRORROGA No. 02	27 DE FEBRERO DE 2025 (1 MES)
PRORROGA No. 03	31 DE MARZO DE 2025 (1 MES)
PRORROGA No. 04	28 DE ABRIL DE 2025 (1 MES)
FECHA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES	30 DE MAYO DE 2025

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

2.1 NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Posterior al reinicio efectivo del contrato de obra, durante el plazo de ejecución, se generaron las prórrogas No. 01, No. 02, No. 03 y No. 04, en tiempo para el contrato de obra, motivadas por las apreciaciones especificadas en las solicitudes realizadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoría.

Anexo: Otrosí modificatorio No. 04

2.2 ESTADO DE PÓLIZAS

A la fecha para el contrato de obra, las garantías se encuentran avaladas por la contratante, de acuerdo con actualización realizada con la suscripción del contrato de obra.

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 430-74-994000061025 ANEXO 7			
EMPRESA ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$ 152.694.949,40	2/9/2025	1/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 152.694.949,40	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE: 30/05/2025 HASTA 30/05/2030.	
PAGO DE SALARIOS, Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 152.694.949,40	2/3/2028	1/06/2028

Tabla 1.Control de pólizas contrato de obra.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 430-74-994000022378			
EMPRESA ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$284.700.000.00	8/8/2023	2/06/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000.00	8/8/2023	2/06/2025
RCE PATRONAL	$284.700.000.00	8/8/2023	2/06/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$284.700.000.00	8/8/2023	2/06/2025

Tabla 2.Control de pólizas actualizadas contrato de obra

2.3 ACTIVIDADES CONTRATADAS

El alcance del contrato se encuentra definido por las condiciones contratadas establecidas en el contrato, así como la adición presupuestal del contrato, el cual contempla la ejecución de las siguientes actividades:

2.3.1 Presupuesto contractual.

1. ITEMS	2. CONDICIONES ORIGINALES				
	DESCRIPCIÓN	**UNID.**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
	PRELIMINARES				
1.1	Localización - replanteo vías urbanas.	M	444	$ 6,232.00	$ 2,767,008.00
1.4	Demolición de estructuras de concreto box culvert.	M3	6.0	$ 119,805.00	$ 718,830.00
1.5	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
1.6	Excavación de material común para conformación de estructura de pavimento.	M3	1318.0	$ 18,311.00	$ 24,133,898.00
	Conformación de subbase granular, incluye suministro, colocación, extendido y compactación.	M3	475.0	$ 198,816.00	$ 94,437,600.00
2.1	Conformación de subrasante con material seleccionado CBR = 95%. Espesor 20cm.	M3	441.0	$ 137,007.00	$ 60,420,087.00
2.2	Retiro de material y escombro procedente de las excavaciones a una distancia de 39,8km.	M3*KM	71567.0	$ 1,935.00	$ 138,482,145.00
2.3	**ESTRUCUTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES**				

2.4	Pavimento en concreto hidráulico MR = 40kg/cm2, con formaletas, texturizado, vibrado y curado. Incluye cortes mecanicos para juntas, córdon polietileno, material sellante siliconado, acero liso para dovelas de transferencia. Espesor 20cm.	M3	440.00	$ 1,108,861.00	$ 487,898,840.00
2.5	Andén en concreto de 3000psi e = 10cm escobillado, dilatado y reforzado con malla electrosoldada.	M2	438.00	$ 111,167.00	$ 48,691,146.00
2.6	Bordillo prefabricado en concreto de 3000psi Tipo A80 (15x35x80cm).	M	877.00	$ 104,435.00	$ 91,589,495.00
2.7	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**				
2.9	Instalación de resalto en plastico de alta resistencia para tráfico pesado.	M	10.0	$ 364,475.00	$ 3,644,750.00
2.10	Baranda de protección en tubería galvanizada de 2", incluye instalación y pintura Sobre box culvert.	M	6.0	$ 409,970.00	$ 2,459,820.00
2.11	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
2.12	Filtro en material granular e=40cm.	M3	17.86	$ 366,861.00	$ 6,552,137.00
2.13	Solado de limpieza en concreto 1:3:4, e=10cm.	M3	4.470	$ 642,763.00	$ 2,873,151.00
2.14	Concreto de 3500psi para muros, losa superior e inferior y aletas de box culvert. Incluye formaleteria.	M3	18.00	$ 1,162,756.00	$ 20,929,608.00
2.15	Acero de refuerzo de 60000psi para muros, losa superior e inferior y aletas.	KG	1844.00	$ 7,127.00	$ 13,142,188.00
COSTO DIRECTO					$ 1,017,691,873.00
ADMINISTRACIÓN				25.29%	$ -

IMPREVISTO	1.71%	$ -
UTILIDAD	3%	$ -
TOTAL A. I. U. 30%	30%	$ -
IMPLEMENTACION DEL PAGA		$ 23,280,995.00
PGIO		$ 19,898,240.00
TOTAL COSTO DE LA OBRA		$ 1,060,871,108.00

2.3.2 Presupuesto actualizado condiciones adicionales.

1. ITEMS	2. CONDICIONES ORIGINALES			3. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT.**	**V. TOTAL**
	PRELIMINARES				
1.1	Localización - replanteo vías urbanas.	M	$ 6,232.00	440.00	$ 2,742,080.00
1.4	Demolición de estructuras de concreto box culvert.	M3	$ 119,805.00	6.00	$ 718,830.00
1.5	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
1.6	Excavación de material común para conformación de estructura de pavimento.	M3	$ 18,311.00	1982.93	$ 36,309,431.00
	Conformación de subbase granular, incluye suministro, colocación, extendido y compactación.	M3	$ 198,816.00	466.24	$ 92,694,978.00
2.1	Conformación de subrasante con material seleccionado CBR = 95%. Espesor 20cm.	M3	$ 137,007.00	496.24	$ 67,987,669.00

2.2	Retiro de material y escombro procedente de las excavaciones a una distancia de 39,8km.	M3*KM	$ 1,935.00	138318.09	$ 267,645,512.00
2.3	**ESTRUCUTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES**				
2.4	Pavimento en concreto hidráulico MR = 40kg/cm2, con formaletas, texturizado, vibrado y curado. Incluye cortes mecanicos para juntas, córdon polietileno, material sellante siliconado, acero liso para dovelas de transferencia. Espesor 20cm.	M3	$ 1,108,861.00	422.24	$ 468,199,924.00
2.5	Andén en concreto de 3000psi e = 10cm escobillado, dilatado y reforzado con malla electrosoldada.	M2	$ 111,167.00	176.00	$ 19,565,392.00
2.6	Bordillo prefabricado en concreto de 3000psi Tipo A80 (15x35x80cm).	M	$ 104,435.00	880.00	$ 91,902,800.00
2.7	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**				
2.9	Instalación de resalto en plastico de alta resistencia para tráfico pesado.	M	$ 364,475.00	10.00	$ 3,644,750.00
2.10	Baranda de protección en tubería galvanizada de 2", incluye instalación y pintura Sobre box culvert.	M	$ 409,970.00	6.00	$ 2,459,820.00
2.11	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
2.12	Filtro en material granular e=40cm.	M3	$ 366,861.00	20.00	$ 7,337,220.00
2.13	Solado de limpieza en concreto 1:3:4, e=10cm.	M3	$ 642,763.00	4.47	$ 2,873,151.00
2.14	Concreto de 3500psi para muros, losa superior e inferior y aletas de box culvert. Incluye formaleteria.	M3	$ 1,162,756.00	18.00	$ 20,929,608.00

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

2.15	Acero de refuerzo de 60000psi para muros, losa superior e inferior y aletas.	KG	$ 7,127.00	3737.46	$ 26,636,843.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 1	Excavacion mecanica en zanja	M3	$ 16,951.10	667.45	$ 11,314,010.00
NP 2	Retiro tuberia existente 0" a 12" (incluye retiro)	M	$ 13,619.92	1435.00	$ 19,544,586.00
NP 3	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 6"	M	$ 169,257.46	348.00	$ 58,901,595.00
NP 4	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 8"	M	$ 203,567.30	429.50	$ 87,432,154.00
NP 5	Suministro, transporte e instalacion empalme de domiciliaria de alcantarillado	UND	$ 322,959.89	58.00	$ 18,731,673.00
NP 6	Construccion Pozo de inspeccion D=1,2	UND	$ 3,062,171.94	8.00	$ 24,497,376.00
NP 7	Entibado tipo 2 (1/7 utilizaciones) hasta 1.2m de profundidad	M2	$ 97,615.82	181.00	$ 17,668,463.00
NP 8	Domiciliaria en pf+uad 4" * 1/2" (manguera)	UND	$ 368,309.19	58.00	$ 21,361,933.00
NP 9	Suministro e instalacion tuberia PVC union mecanica 4" rde 21	M	$ 140,951.14	369.50	$ 52,081,445.00
NP 10	Comision de topografia construccion sistema de redes sanitarias	DIA	$ 524,632.48	60.00	$ 31,477,949.00
NP 11	Construccion caja de inspeccion 60 x 60	UND	$ 501,911.80	58.00	$ 29,110,884.00
COSTO DIRECTO					$ 1,483,770,259.00
ADMINISTRACIÓN			25.29%		
IMPREVISTO			1.71%		

UTILIDAD	3%		
TOTAL A. I. U. 30%	30%		
IMPLEMENTACION DEL PAGA			$ 23,280,995.00
PGIO			$ 19,898,240.00
TOTAL COSTO DE LA OBRA			$ 1,526,949,494.00

2.4 SEGUIMIENTO AL CRONORAMA DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALORTOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la reprogramación vigente.	$ 1.526.949.494	100,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.526.949.494	100,00%	

La ejecución de actividades para dar cumplimiento al objeto contractual, se dieron dentro del plazo establecido en el cronograma de ejecución de actividades dispuesto para la programación de la obra.

2.5 ACTIVIDADES DEL PERIODO

2.5.1 Actividades ejecutadas: durante el periodo final comprendido entre 1 de mayo de 2025 hasta 30 de mayo de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades de obra, se especifica que en el tramo desde el k0+ 300 hasta el k0+393 se requirió realizaron las labores de movimiento de tierra faltantes para el tramo, dado que las alturas variantes de los niveles de las tuberías existentes de agua potable estaban muy expuestas, por tanto se requirió realizar unas excavaciones y rellenos aledaños para cumplir con las especificaciones técnicas de obra, dado lo anterior se tiene que:

1. ITEMS	**2. CONDICIONES ORIGINALES**			**EJECUTADO DESDE 1 DE MAYO DE 2025 HASTA 30 DE MAYO DE 2025**	
	DESCRIPCIÓN	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT.**	**V. TOTAL**
	PRELIMINARES				

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

1.1	Localización - replanteo vías urbanas.	M	$ 6,232.00		
1.4	Demolición de estructuras de concreto box culvert.	M3	$ 119,805.00		
1.5	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
1.6	Excavación de material común para conformación de estructura de pavimento.	M3	$ 18,311.00	437.25	$ 8,006,485.00
	Conformación de subbase granular, incluye suministro, colocación, extendido y compactación.	M3	$ 198,816.00	203.00	$ 40,359,648.00
2.1	Conformación de subrasante con material seleccionado CBR = 95%. Espesor 20cm.	M3	$ 137,007.00	190.08	$ 26,042,581.00
2.2	Retiro de material y escombro procedente de las excavaciones a una distancia de 39,8km.	M3*KM	$ 1,935.00	12.06	$ 23,327.00
2.3	**ESTRUCUTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES**				
2.4	Pavimento en concreto hidráulico MR = 40kg/cm2, con formaletas, texturizado, vibrado y curado. Incluye cortes mecanicos para juntas, córdon polietileno, material sellante siliconado, acero liso para dovelas de transferencia. Espesor 20cm.	M3	$ 1,108,861.00	156.66	$ 173,709,729.00
2.5	Andén en concreto de 3000psi e = 10cm escobillado, dilatado y reforzado con malla electrosoldada.	M2	$ 111,167.00	172.00	$ 19,120,724.00
2.6	Bordillo prefabricado en concreto de 3000psi Tipo A80 (15x35x80cm).	M	$ 104,435.00	255.50	$ 23,911,444.00
2.7	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**				

2.9	Instalación de resalto en plastico de alta resistencia para tráfico pesado.	M	$ 364,475.00	9.50	$ 3,462,513.00
2.10	Baranda de protección en tubería galvanizada de 2", incluye instalación y pintura Sobre box culvert.	M	$ 409,970.00	6.00	$ 2,459,820.00
2.11	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
2.12	Filtro en material granular e=40cm.	M3	$ 366,861.00	10.30	$ 3,778,668.00
2.13	Solado de limpieza en concreto 1:3:4, e=10cm.	M3	$ 642,763.00		$ -
2.14	Concreto de 3500psi para muros, losa superior e inferior y aletas de box culvert. Incluye formaleteria.	M3	$ 1,162,756.00		$ -
2.15	Acero de refuerzo de 60000psi para muros, losa superior e inferior y aletas.	KG	$ 7,127.00	1143.56	$ 3,161,353.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1	Excavacion mecanica en zanja	M3	$ 16,951.10		$ -
NP2	Retiro tuberia existente 0" a 12" (incluye retiro)	M	$ 13,619.92		$ -
NP3	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 6"	M	$ 169,257.46		$ -
NP4	Suministro e instalacion tuberia PVC novafort 8"	M	$ 203,567.30		$ -
NP5	Suministro, transporte e instalacion empalme de domiciliaria de alcantarillado	UND	$ 322,959.89		$ -
NP6	Construccion Pozo de inspeccion D=1,2	UND	$ 3,062,171.94		$ -
NP7	Entibado tipo 2 (1/7 utilizaciones) hasta 1.2m de profundidad	M2	$ 97,615.82		$ -
NP8	Domiciliaria en pf+uad 4" * 1/2" (manguera)	UND	$ 368,309.19		$ -


CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

NP9	Suministro e instalacion tuberia PVC union mecanica 4" rde 21	M	$ 140,951.14		$ -
NP10	Comision de topografia construccion sistema de redes sanitarias	DIA	$ 524,632.48		
NP11	Construccion caja de inspeccion 60 x 60	UND	$ 501,911.80		
COSTO DIRECTO					$ 304,036,191.00
ADMINISTRACIÓN			25.29%		
IMPREVISTO			1.71%		
UTILIDAD			3%		
TOTAL A. I. U. 30%			30%		
IMPLEMENTACION DEL PAGA					
PGIO					
TOTAL COSTO DEL PRESENTE PERIODO					$ 304,036,190.00


2.5.2 Registro fotográfico


1. **INSTALACION DE BORDILLO**

Se ejecuta en su totalidad la instalación de bordillo, de acuerdo a la especificación contractual en el tramo No. 02

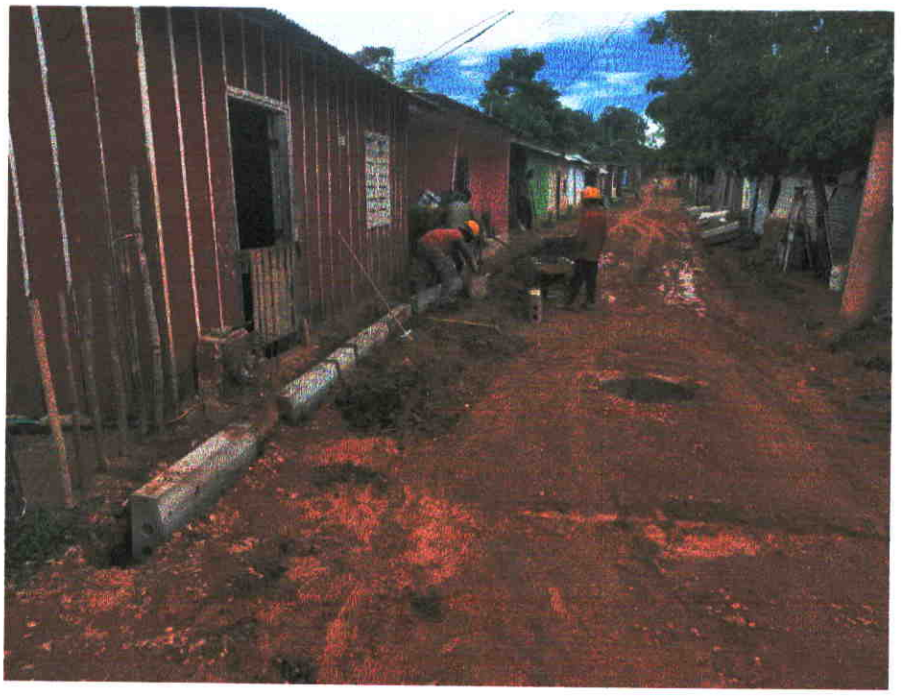



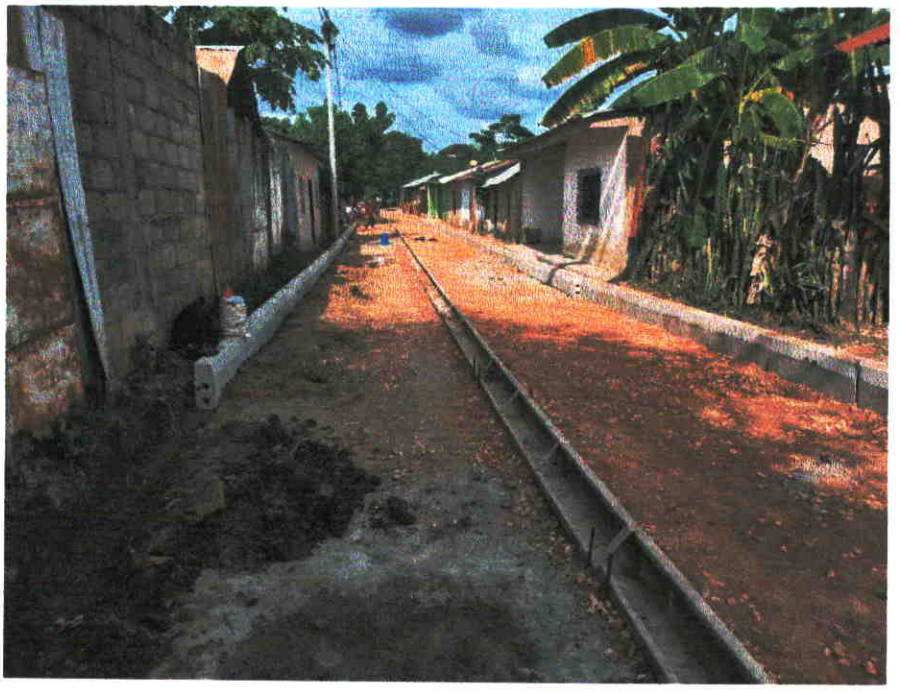

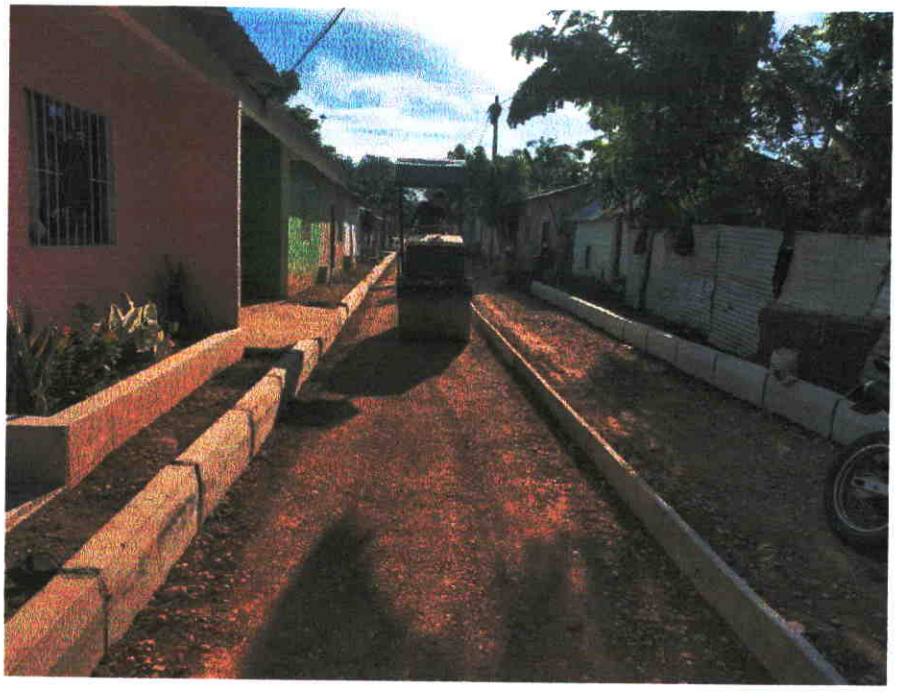

2. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO

Se continua con la ejecución de actividades concernientes a la pavimentación e concreto rígido en el tramo comprendido entre las abscisas k0+220 y k0+393, teniendo en cuentas las especificaciones técnicas y detalles de diseño.


Se realiza seguimiento oportuno al cumplimiento del diseño en concreto establecido para la elaboración del concreto en obra.












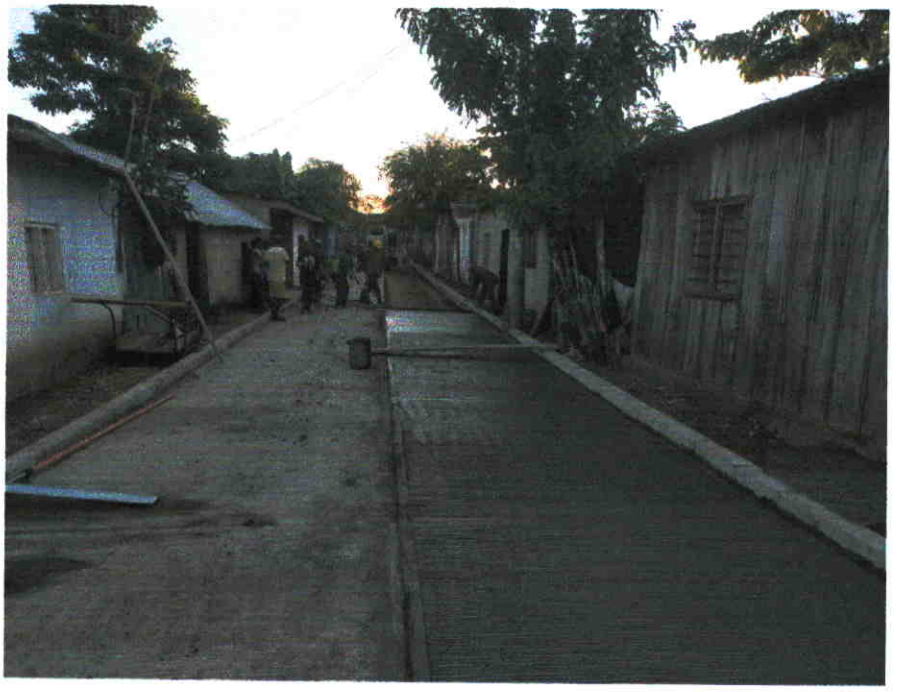

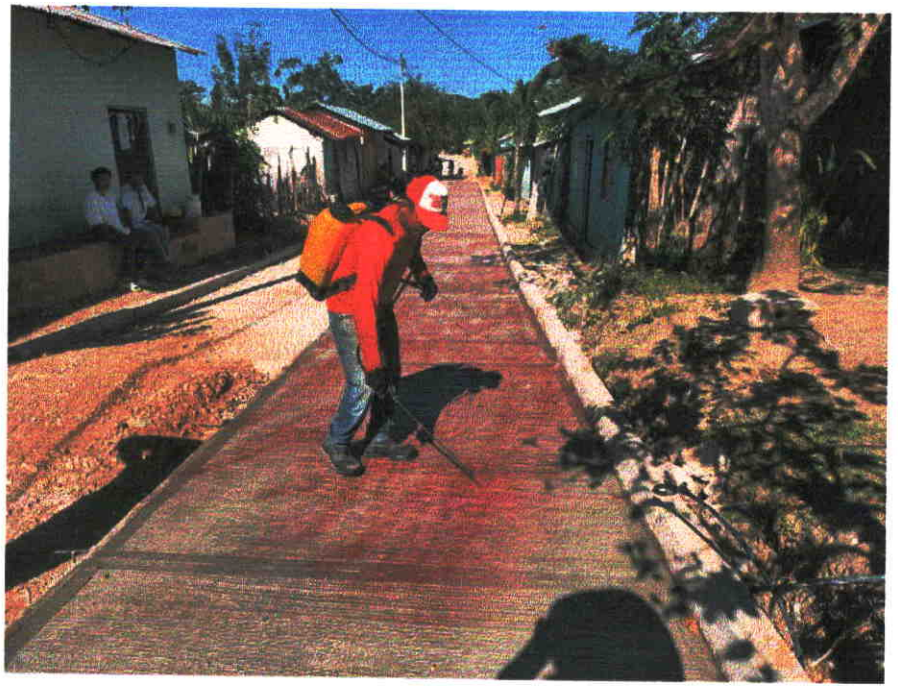

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

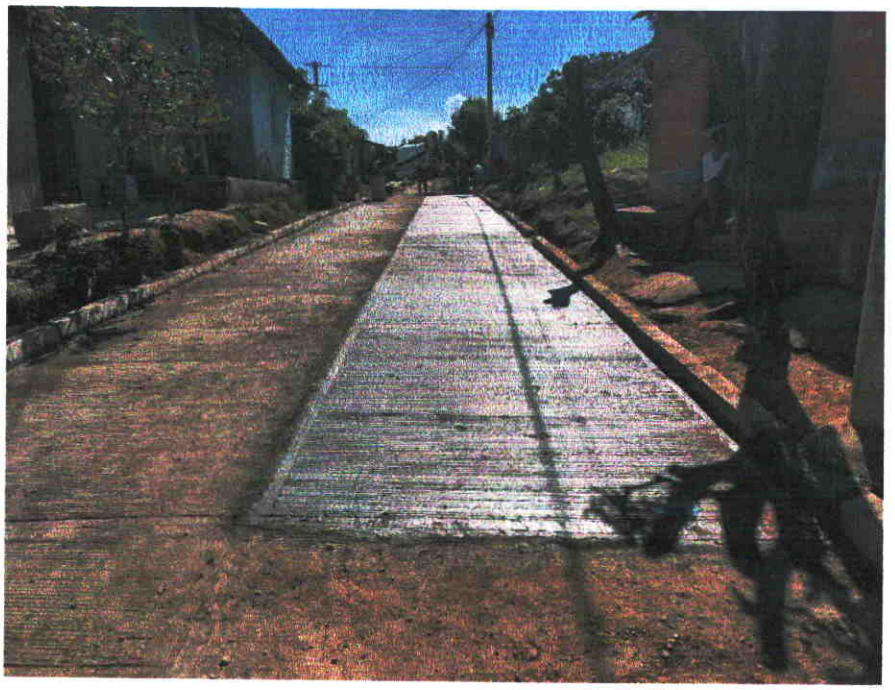

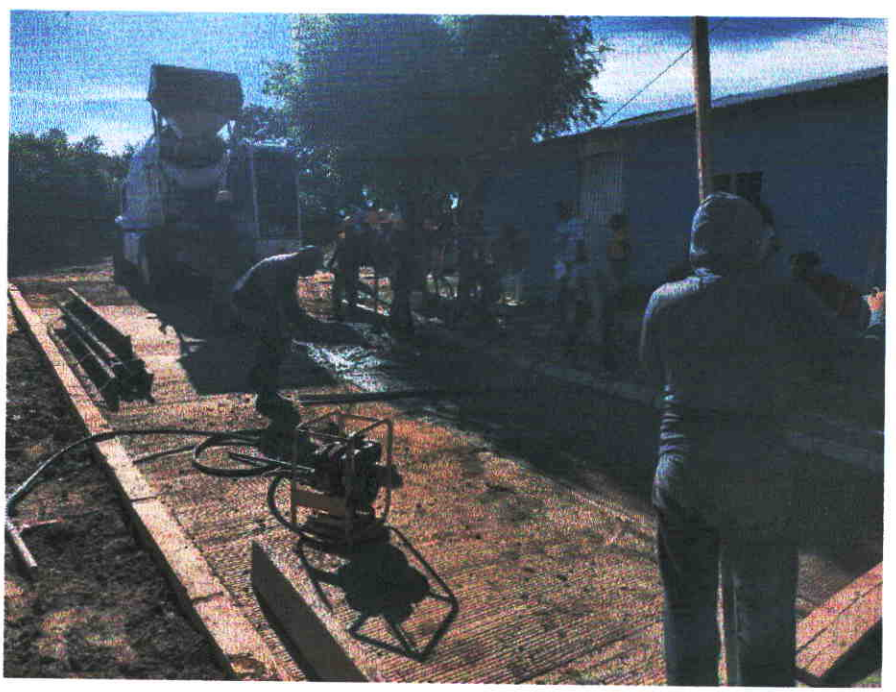







3. ANDEN EN CONCRETO

Se ejecuta durante el periodo en su totalidad la construcción de andenes en concreto de 3000 PSI, en las áreas definidas en conjunto con la interventoría del proyecto.



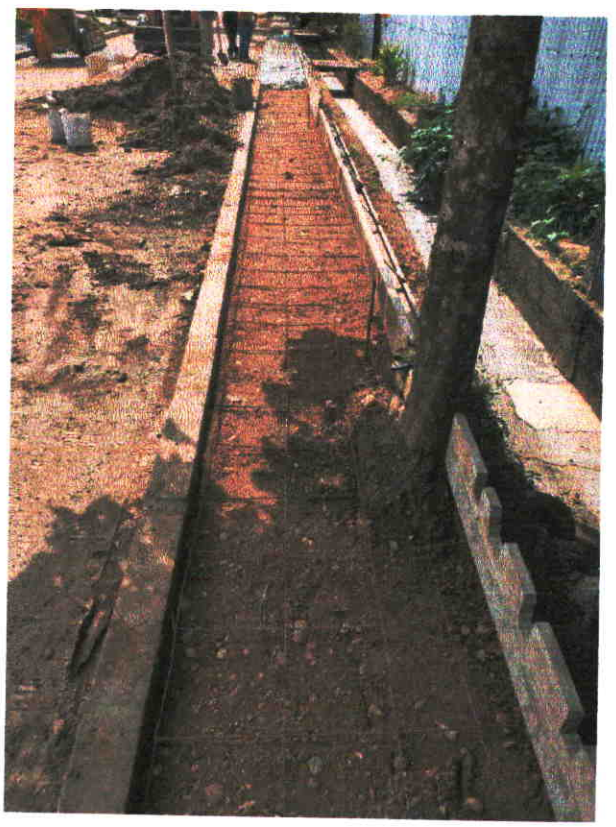

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

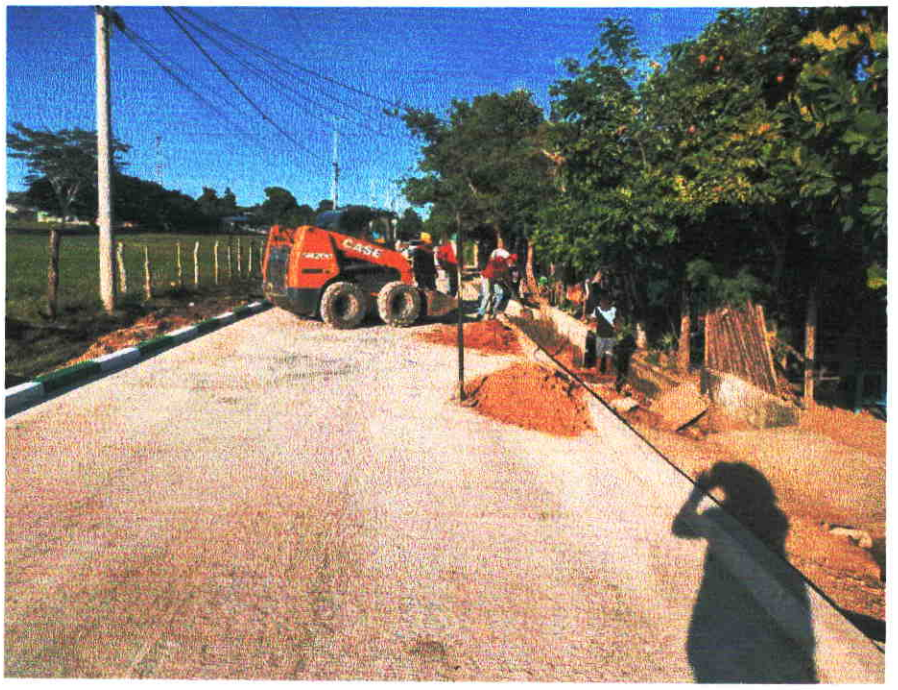





4. RESALTO PLASTICO

Se lleva a cabo la instalación de los resaltos plásticos, uno en cada uno de los tramos de vía intervenidos, a través del ancho correspondiente de cada una de las calzadas.







5. SEÑALIZACION VERTICAL

Se instalan señales verticales informativas las cuales no estan incluidas en el presupuesto pero se realiza la instalación con el fin de garantizar la seguridad de los transeúntes, se aclara que esto no tendrá ningún costo para la entidad.




6. BARANDA METALICA DE SEGURIDAD

Se instala de acuerdo a los diseños de la estructura en concreto, la baranda de protección en el box culvert.



7. ACERO DE REFUERZO

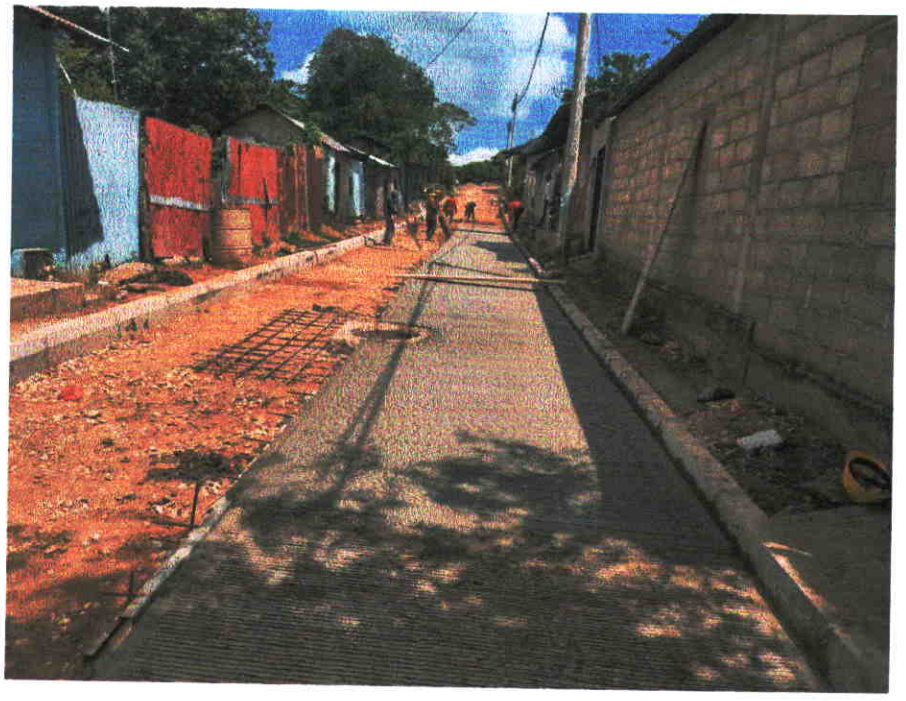






Se instalan aceros de refuerzo en estructuras de concreto adicionales, así como en estructuras de pavimento.

8. CONCLUSIONES

- La obra se desarrolla de manera satisfactoria a lo largo de la ejecución y actualmente nos encontramos en un avance del 100,00%.
- En el periodo ejecutado hemos realizado actividades tendientes a garantizar condiciones de trabajo seguro para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE, se realizaron labores de capacitación y socialización de protocolos, así como también se dieron instrucciones a los trabajadores sobre las normas en obra y estricto cumplimiento de estas, dotación de tapabocas entre otros.
- Se cuenta en el sitio de obra con un stock de materiales que permiten la ejecución continua de actividades. Anexo certificado de calidad de los materiales
- Se verifican por parte de la interventoría los resultados de los ensayos practicados a los materiales fabricados en obra, tal y como los concretos para pavimentos rígidos y andenes. Anexo al informe
- Adicional a esto se realizan ensayos para determinar la capacidad de la estructura del pavimento rígido. Anexo al informe

CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL

- Durante el periodo, se lleva a cabo la intervención de la estructura del pavimento ejecutada dentro del alcance contractual, por parte de un privado, basado en la autorización efectuada por la empresa de servicios públicos municipales. De esta manera nos permitimos dejar salvedad sobre las afectaciones que se puedan presentar a futuro en el área intervenida por el privado, las cuales no serán de nuestra competencia, ya que no se garantizan los procesos constructivos y los materiales utilizados en dicha intervención. Anexo comunicaciones cruzadas entre privado y empresa de servicios públicos.

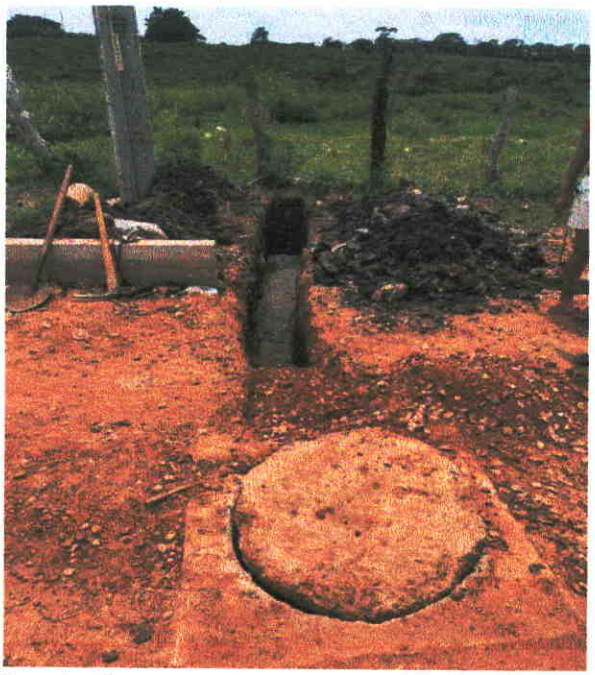

Instalación de tubería por parte de un particular avalada por alcaldía de Sincé.

LEIDY PAOLA SANTIZ PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO EDIFICACIONAL.
