Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
VALOR INCIAL	$ 11.732.637.295	
PLAZO INICIAL:	5 MESES	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF	
INTERVENTORÍA	SITELSA SAS	
FECHA ACTA:	**PERIODO**	
	4-ago.-25	**31-ago.-25**

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTA N°10		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			CANTIDAD	VALOR TOTAL
1				**PRELIMINARES**								
	1.1			LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye elaboración de planos.	día	34,00	$ 986.161	$ 33.529.474	4,00	$ 3.944.644,00	28,00	$ 27.612.508
	1.2			ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0,50 m, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	m2	4.099,00	$ 1.268	$ 5.197.532	33,80	$ 42.858,40	2077,38	$ 2.634.118
Subtotal								**$ 38.727.006**		**$ 3.987.502**	0,00	**$ 30.246.626**
2				**RETIROS Y DEMOLICIONES**						$ -	0,00	
	2.1			Demolición de piso o andén en concreto. e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	m2	17.757,49	$ 33.222	$ 589.939.439	1.367,81	$ 45.441.417,04	15725,30	$ 522.426.056
	2.2			Desmonte de piso en adoquín . Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	m2	1.039,75	$ 17.291	$ 17.978.317	409,45	$ 7.079.799,95	553,61	$ 9.572.471
	2.3			Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	m2	2.834,44	$ 65.474	$ 185.582.235	256,28	$ 16.779.676,72	2910,72	$ 190.576.593
	2.4			Retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos.	un	1.807,00	$ 19.024	$ 34.376.368	28,00	$ 532.672,00	1526,00	$ 29.030.624
Subtotal								**$ 827.876.359**		**$ 69.833.566**	0,00	**$ 751.605.743**
3				**MOVIMIENTOS DE TIERRA**						$ -	0,00	
3.1				Excavaciones						$ -	0,00	$ -
	3.1.1			EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	2.667,97	$ 63.568,00	$ 169.597.394	317,36	$ 20.173.916,01	2385,33	$ 151.630.510
3.2				Llenos		0,00				$ -	0,00	$ -
	3.2.1			LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	1.020,52	$ 172.066	$ 175.597.545	184,32	$ 31.715.264,48	904,84	$ 155.693.010
	3.2.2			Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	3.897,30	$ 337.253	$ 1.314.377.421	380,92	$ 128.467.559,42	3641,23	$ 1.228.014.820
3.3						0,00				$ -	0,00	
	3.3.1			Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km	159.601,69	$ 3.357	$ 535.782.879	17.561,87	$ 58.955.206,40	151645,18	$ 509.072.867
	3.3.2			Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	7.075,26	$ 7.486	$ 52.965.387	796,88	$ 5.965.462,06	6851,41	$ 51.289.624
Subtotal								**$ 2.248.320.626**		**$ 245.277.408**	0,00	**$ 2.095.700.831**
4				**CONCRETOS**						$ -	0,00	
4.1				Concretos para Andenes, rampas y Escalas						$ -	0,00	$ -

	4.1.1			Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m (8 centímetros) Vaciado alternado (Junta fría). Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y llaneado 0.10 m en los bordes TIPO METRO, los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, malla y material de soporte (base, sub base, entresuelo o arenilla) así como las llaves en caso de requerirse, se pagarán en su ítem respectivo.	m2	577,99	$ 120.530	$ 69.665.062	203,63	$ 24.543.282,84	266,92	$ 32.171.614
	4.1.2			Construcción de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., según diseño y condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm. o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	31,92	$ 1.337.482	$ 42.693.161		$ -	9,92	$ 13.268.557
	4.1.3			Construccion de contenedor de raices U350, incluye viga de fundacion en concreto de 17.5 mpa (20x20m), muro en bloque de concreto (15x20x40m). No incluye marco para alcorque, refuerzo, excavación. Según detalle de MEP	m	5,00	$ 210.925	$ 1.054.625		$ -	0,00	$ -
	4.1.4			Construcción de cárcamo en concreto de 17.5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de 40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La excavación y acero se pagara en su ítem respectivo.	m	45,00	$ 359.151	$ 16.161.795		$ -	30,00	$ 10.774.530
	4.1.5			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	m2	18.397,01	$ 136.000	$ 2.501.993.640	1.255,33	$ 170.724.970,67	16218,34	$ 2.205.694.610
4.2				Concreto para solado, cunetas y cordones		0,00				$ -	0,00	$ -
	4.2.1			Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	m	13.590,55	$ 120.703,00	$ 1.640.420.157	1.640,45	$ 198.007.236,35	13606,00	$ 1.642.285.018
	4.2.2			Construcción de CUNETA AUXILIAR EN "V" en concreto de 21 Mpa. 0,30 x 0,25 x 0,20 m. según ficha U180 del MEP. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos lo demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	5,00	$ 139.398,00	$ 696.990		$ -	0,00	$ -
	4.2.3			Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle S.I.F. No incluye refuerzo.	m	369,08	$ 201.501,00	$ 74.369.989		$ -	282,08	$ 56.839.402
	4.2.4			Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	2.924,16	$ 42.090,00	$ 123.078.071	552,21	$ 23.242.455,77	2814,20	$ 118.449.590
Subtotal								**$ 4.470.133.490**		**$ 416.517.946**	0,00	**$ 4.079.483.322**
5				**ACERO DE REFUERZO**						$ -	0,00	
	5.1			Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	1369,78	$ 9.326	$ 12.774.568	65,63	$ 612.065,38	835,41	$ 7.791.034
	5.2			Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	2913,80	$ 15.704	$ 45.758.384	205,40	$ 3.225.601,60	2535,41	$ 39.816.069
	5.3			Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia mayor a 100 m.	kg	6581,97	$ 663	$ 4.363.845	158,60	$ 105.151,80	158,60	$ 105.152
Subtotal								**$ 62.896.797**		**$ 3.942.819**	0,00	**$ 47.712.255**
6				**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**						$ -	0,00	$ -
	6.1			Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	un	1719,00	$ 83.564	$ 143.646.516	22,00	$ 1.838.408,00	1487,00	$ 124.259.668
	6.2			Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.40x 0.40 m, incluye marco.	un	19,00	$ 172.204	$ 3.271.876		$ -	7,00	$ 1.205.428
	6.3			Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín.	un	319,00	$ 907.292	$ 289.426.148	14,00	$ 12.702.088,00	183,00	$ 166.034.436
Subtotal								**$ 436.344.540**		**$ 14.540.496**	0,00	**$ 291.499.532**
7				**COMPLEMENTARIOS EN ADOQUIN PARA PISOS**						$ -	0,00	
	7.1			Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guia o alerta discapacitados visuales de 20X20X6 cm LOST-AL . Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena,cortes a maquina . Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color AMARILLO.	m2	324,48	$ 214.709	$ 69.669.592	39,49	$ 8.479.287,83	310,98	$ 66.769.303
	7.2			Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	3802,12	$ 45.895	$ 174.498.297	263,53	$ 12.094.709,35	3165,65	$ 145.287.507
	7.3			Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquin ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	m	3534,18	$ 36.909	$ 130.443.050	496,07	$ 18.309.447,63	3230,25	$ 119.225.297
Subtotal								**$ 374.610.939**		**$ 38.883.445**	0,00	**$ 331.282.107**
8				**BARANDAS Y PASAMANOS**						$ -	0,00	
	8.1			Suministro, transporte e instalacion de baranda con pasamanos con una altura de 1,00 m, en tubería galvanizada tipo acueducto en diametros de 2" calibre 10, 1 1/2" calibre 14 y 3/4" calibre 14, segun diseño. Incluye soldadura en todas las uniones, pulida y masillada, anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a definir, con los espesores especificados en el diseño. Los barrotes verticales de 3/4" deben ir cada 0,10 m centro a centro; los tubos verticales estructurales de soporte de 2" van cada 1,50 m, el anclaje al piso se hará con platinas de 0.15x0.15x1/4" de acero galvanizado y 4 pernos de expansión de diámetro de 1/2" y longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 MPa en caso de ser necesario. Los pasamanos irán fijados a la baranda mediante platinas de acero galvanizado de acuerdo a la figura que se plantea en el diseño; incluye todo lo necesario para su correcto anclaje, fijación y funcionamiento.	m	96,00	$ 687.922	$ 66.040.512		$ -	0,00	$ -

Subtotal								$ 66.040.512		$ -	0,00	$ -
9				ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO						$ -	0,00	
	9.1			Suministro, transporte e instalación de grama tipo San Agustín, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , adición de tierra abonada con un espesor de 5 cm, anclaje inicial y final con ganchos de sujeción, regado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, capote mínimo 5 cm.	m2	2.476,80	$ 38.160,00	$ 94.514.864	1.227,98	$ 46.859.899,97	2804,79	$ 107.030.764
Subtotal								$ 94.514.864		$ 46.859.900	0,00	$ 107.030.764
							SUBTOTAL OBRAS	$ 8.619.465.133	1482629911	$ 839.843.082		$ 7.734.561.179

OBRAS EXTRA												
	OE-01			Corte de losa existente para demolición	ml	5.457,84	$ 14.661	$ 80.017.392	105,00	$ 1.539.405,00	4708,84	$ 69.036.303
	OE-02			Demolición y excavación de bordillos.	ml	9.691,89	$ 39.730	$ 385.058.790	1.391,66	$ 55.290.651,80	9373,55	$ 372.411.142
	OE-03			Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en lámina galvanizada.	un	42,00	$ 547.850	$ 23.009.700	10,00	$ 5.478.500,00	20,00	$ 10.957.000
	OE-04			Demolición y excavación de jardineras con alturas entre 30 y 50 cm, incluye demolicion de viga de amarre y excavacion para la cimentacion del bordillo	ml	5.070,42	$ 27.804	$ 140.977.958	523,16	$ 14.545.940,64	5393,58	$ 149.963.098
	OE-05			Suministro, transporte e instalación de andén en concreto permeable de espesor 15 cm y los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	179,60	$ 278.542	$ 50.026.143	81,73	$ 22.765.794,74	178,33	$ 49.672.952
	OE-06			Suministro, transporte e instalación de caja de contadores prefabricados de acueducto.	un	318,00	$ 129.096	$ 41.052.528	17,00	$ 2.194.632,00	282,00	$ 36.405.072
	OE-07			EXCAVACIÓN MANUAL de material rocoso en volúmenes de roca superio al 40%, incluye cargue (mecánico y manual) y transporte del material proveniente de excavación	m3	932,62	$ 196.668	$ 183.417.169	107,42	$ 21.125.997,89	1010,04	$ 198.643.127
	OE-08			Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa de tres caras y juntas ranuradas para instalación en curvas de rebajes. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 40 cm.	ml	1.537,89	$ 145.462	$ 223.704.555	293,23	$ 42.653.822,26	1582,12	$ 230.138.339
	OE-09			Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D-335 (8mm). Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. En accesos a parqueaderos con espesores de 15 cm y 20 cm que la requieran	m2	5,00	$ 54.115	$ 270.575		$ -	0,00	$ -
	OE-10			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.20 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	m2	583,64	$ 305.936	$ 178.555.722		$ -	473,64	$ 144.902.762
	OE-11			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.15 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	m2	71,72	$ 235.316	$ 16.876.864		$ -	57,72	$ 13.582.440
	OE-12			Suministro, transporte y aplicación manual de pintura plástico en frío sobre superficie de concreto.	m2	560,07	$ 111.191	$ 62.274.966	16,26	$ 1.807.965,66	247,33	$ 27.501.092
	OE-13			Suministro e instalación de anden Deck elevado en madera plástica color a definir, incluye largueros para la estructura, estacones de apoyo embebidos en pilotes, incluye excavación y vaciado de pilotes y todos los elementos para su correcta instalación.	m2	318,44	$ 1.547.022	$ 492.626.724	37,25	$ 57.618.834,39	156,68	$ 242.388.180
	OE-14			Reubicación de redes hidráulicas. Comprende el suministro, transporte e instalación de tubería PVC, accesorios (codos, uniones, etc.), empalmes, pruebas hidráulicas, limpieza y verificación del correcto funcionamiento del sistema.	un	770,00	$ 138.740	$ 106.829.800	600	$ 83.244.000,00	600,00	$ 83.244.000
	OE-15			Construcción de canales con altura libre hasta 60cm y espesor de 15cm, ancho de losa libre de 30cm y rejilla prefabricada de uso peatonal de 40x40x8cm.	ml	110,48	$ 535.347	$ 59.145.137		$ -	105,48	$ 56.468.402
							SUBTOTAL OBRAS EXTRAS	$ 2.043.844.022		$ 308.265.544		$ 1.685.313.909

SUBTOTAL OBRAS				$ 10.663.309.155,11	COSTO DIRECTO SIN AIU	$ 865.321.545,00
Destinación pago de Reajustes			NO MODIFICAR	$ 428.702.068,00	26,68%	$ 230.867.788,00
Inversión Socio-Ambiental-Implementación PMT- Gasto Reembolsable-			NO MODIFICAR	$ 428.958.108,00	1,00%	$ 8.653.215,00
Pólizas - Gasto Reembolsable-			NO MODIFICAR	$ 44.717.244,00	5,00%	$ 43.266.077,00
Personal PMT - Reembolsable				$ 166.950.720,00	32,68%	$ 1.148.108.625,00
VALOR TOTAL DE ACUERDO A MODIFICACIÓN 03 DEL CONTRATO				$ 11.732.637.295	31,68%	$ 1.139.455.410,00
					PERSONAL PMT	$ 31.990.558,00
					VALOR TOTAL ACTA SIN I Y CON PERSONAL PMT	$ 1.171.445.968,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto reembolsable comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantías.

NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT" reflejado en sus respectivos anexos, es un valor estimado que será un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos.

NOTA 6: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinación pago de Reajustes" es un valor estimado, con el cual se realizara el pago de los reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecución del contrato en atención a la forma de pago definida en los documentos del proceso.

NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulación de la oferta, es responsabilidad del proponente verificar las mismas y efectuar sus propios cálculos para la formulación de su oferta.

NOTA 8: Los valores Definidos para los ítems Destinación pago de Reajustes, Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT y Pólizas NO PODRÁN ALTERARSE O MODIFICARSE.

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	26,68%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32,68%

Consorcio Vial VG-VNF - Representante Legal

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	1.1	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye elaboración de planos.	UNID.	día	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
AURES II	2,00	2,00
BOMBONÁ II (topografía para muros)	2,00	2,00
Subtotal		4,00
TOTAL		4,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	2
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	1.2	DESCRIPCIÓN	ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0,50 m, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
Del 4 al 10 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		30,00	0,50	15,00	**15,00**
Del 18 al 24 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		37,60	0,50	18,80	**18,80**
Subtotal					**33,80**
TOTAL					**33,80**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	3
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	2.1	DESCRIPCIÓN	Demolición de piso o andén en concreto. e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	














LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		29,00	1,00	29,00	**29,00**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		5,40	0,95	5,13	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		2,40	1,65	3,96	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		11,00	1,05	11,55	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		1,30	1,20	1,56	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		1,60	1,50	2,40	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		3,00	0,45	1,35	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		2,90	0,95	2,76	**28,71**
BOMBONÁ I					
Calle 49A - Carrera 37 y 38		16,51	1,50	24,77	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		2,54	4,90	12,45	**37,21**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		4,00	2,20	8,80	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		55,00	1,30	71,50	**80,30**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		1,53	3,80	5,81	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		7,90	1,53	12,09	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		33,50	2,15	72,03	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		26,50	2,50	66,25	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		26,50	1,90	50,35	**206,53**
Del 11 al 17 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		9,80	2,26	22,15	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		18,25	1,30	23,73	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		2,50	2,00	5,00	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		3,10	0,80	2,48	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		5,80	1,20	6,96	**60,31**
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		30,00	1,50	45,00	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		8,00	1,60	12,80	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		3,20	5,60	17,92	**75,72**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		23,50	1,57	36,90	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		35,00	1,00	35,00	**71,90**
AURES II					
Calle 85 - Carrera 90 y 90B		12,00	3,00	36,00	**36,00**
BOSTON - ENCISO					
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,90	1,40	2,66	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		3,80	1,50	5,70	**8,36**
Del 18 al 24 de agosto					
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		58,00	1,80	104,40	**104,40**
BELÉN GRANADA					
Carrera 74 entre calles 27 y 28		40,06	1,50	60,09	
Carrera 75 con calle 30		16,30	2,40	39,12	**99,21**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		11,00	1,60	17,60	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		17,00	1,10	18,70	**36,30**
PEDREGAL					
Calle 101C - Carrera 76 y 72		14,00	1,40	19,60	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		4,00	1,80	7,20	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		40,00	1,90	76,00	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		36,00	1,80	64,80	**167,60**
Del 25 al 31 de agosto					
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		12,70	1,00	12,70	









Carrera 50A - Calle 120 y 114		31,00	1,15	35,65	**48,35**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		14,40	2,40	34,56	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		4,60	1,88	8,65	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		7,60	2,10	15,96	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,24	1,70	5,51	**64,68**
AURES II					
Calle 85 - Carrera 90 y 90B		13,00	3,00	39,00	**39,00**
BELÉN GRANADA					
Carrera 74 entre calles 27 y 28		3,00	4,22	12,65	
Carrera 74 entre calles 27 y 28		2,00	1,85	3,70	**16,35**
Carrera 75 con calle 30		-0,20	2,40	-0,48	
Carrera 75 con calle 30		1,50	2,20	3,30	**2,82**
BOMBONÁ II					
Carrera 9A - Calle 44AA y 45		16,00	2,00	32,00	**32,00**
DEMOLICIÓN DE PLACA PARA INSTALACIÓN DE MADERA PLÁSTICA					
Del 11 al 17 de agosto					
LAURELES - ACACIAS		16,50	1,35	22,28	**22,28**
DEMOLICIÓN PARA VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA					
Del 25 al 31 de agosto					
LAURELES - LORENA		37,00	1,60	59,20	**59,20**
LAURELES - LORENA		26,00	1,60	41,60	**41,60**
				Subtotal	**1.367,81**
				TOTAL	**1.367,81**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	4
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	2.2	DESCRIPCIÓN	Desmonte de piso en adoquín . Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 18 al 24 de agosto					
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		4,00	6,30	25,20	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		19,00	1,47	27,93	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		17,00	1,60	27,20	**80,33**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		37,60	2,00	75,20	**75,20**
Del 25 al 31 de agosto					
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		73,58	1,50	110,37	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		35,35	1,50	53,03	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		60,35	1,50	90,53	**253,92**
	Subtotal				**409,45**
TOTAL					**409,45**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						**CONSORCIO VIAL VG - VNF**					**HOJA Nº**	5
FECHA	**DD**	31	**MM**	8	**AA**	2025	**PERÍODO**	4/08/2025 - 31/08/2025	**ELABORÓ**		**ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA**	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — **FECHA DE INICIO**

ÍTEM	2.3	**DESCRIPCIÓN**	Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	**UNID.**	m2	**PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 11 al 17 de agosto					
BOSTON - ENCISO					
Carrera 36A - Calle 54 y 58		3,80	0,30	1,14	**1,14**
Del 18 al 24 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		48,90	1,30	63,57	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		32,60	1,00	32,60	**96,17**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,90	3,90	15,21	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		15,50	2,80	43,40	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		12,80	1,80	23,04	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		13,60	2,50	34,00	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		6,90	1,70	11,73	**127,38**
Del 25 al 31 de agosto					
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		7,60	1,95	14,82	
		3,90	4,30	16,77	**31,59**
Subtotal					**256,28**
TOTAL					**256,28**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF								HOJA N°	6
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	2.4	DESCRIPCIÓN	Retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
Del 4 al 10 de agosto		
LA CANDELARIA - BOSTON		
Carrera 40 - Calle 54 y 56	4,00	**4,00**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	5,00	**5,00**
Del 11 al 17 de agosto		
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	1,00	**1,00**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	2,00	**2,00**
Del 18 al 24 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	1,00	**1,00**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	7,00	**7,00**
Del 25 al 31 de agosto		
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	7,00	**7,00**
PEDREGAL		
Calle 101C - Carrera 76 y 72	1,00	**1,00**
Subtotal		**28,00**
TOTAL		**28,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	7
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.1.1	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.













LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 4 al 10 de agosto						
LA CANDELARIA - SAN DIEGO						
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		29,00	1,00	0,10	2,90	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		5,50	1,30	2,50	17,88	**20,78**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		5,40	0,95	0,15	0,77	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		2,40	1,65	0,15	0,59	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		11,00	1,05	0,15	1,73	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		1,30	1,20	0,15	0,23	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		1,60	1,50	0,15	0,36	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		3,00	0,45	0,15	0,20	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		2,90	0,95	0,15	0,41	**4,31**
BOMBONÁ I						
Calle 49A - Carrera 37 y 38		16,51	1,50	0,15	3,71	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		2,54	4,90	0,15	1,87	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		56,51	0,50	0,35	9,89	**15,47**
LA CANDELARIA - BOSTON						
Carrera 40 - Calle 54 y 56		20,50	0,46	0,15	1,41	
Carrera 40 - Calle 54 y 56		27,00	0,90	0,15	3,65	**5,06**
JESÚS NAZARENO						
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,80	1,53	0,25	1,45	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		26,50	2,50	0,25	16,56	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		26,50	1,90	0,25	12,59	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		7,90	1,53	0,25	3,02	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		33,50	2,15	0,25	18,01	**51,63**
Del 18 al 24 de agosto						
VILLA DE ABURRÁ						
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		30,00	1,50	0,15	6,75	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		8,00	1,60	0,15	1,92	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		3,20	5,60	0,15	2,69	**11,36**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO						
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		48,90	1,30	0,10	6,36	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		32,60	1,00	0,10	3,26	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		34,00	1,50	0,10	5,10	**14,72**
JESÚS NAZARENO						
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,90	1,90	0,20	1,48	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,90	2,00	0,15	1,17	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		1,75	0,25	0,25	0,11	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		15,50	2,80	0,15	6,51	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		15,50	0,40	0,10	0,62	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		12,80	1,80	0,15	3,46	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,70	1,52	0,20	0,21	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,09	1,65	0,20	1,02	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		1,64	4,01	0,20	1,32	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		6,00	1,56	0,15	1,40	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		5,05	1,56	0,15	1,18	**18,48**
BELÉN GRANADA						
Carrera 75 con calles 29 y 30		13,80	0,30	0,35	1,45	
Carrera 75 con calles 29 y 30		2,50	0,30	0,50	0,38	
Carrera 75 con calles 29 y 30		16,30	2,40	0,15	5,87	**7,69**
PEDREGAL						
Calle 101C - Carrera 76 y 72		14,00	1,25	0,18	3,15	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		4,00	1,65	0,18	1,19	







Calle 101C - Carrera 76 y 72		40,00	1,75	0,18	12,60	**16,94**
AURES II						
Calle 85 - Carrera 90 y 90B		12,00	3,00	0,17	6,12	**6,12**
Del 25 al 31 de agosto						
LA CANDELARIA - SAN DIEGO						
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		6,43	2,22	0,10	1,43	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		35,00	1,10	0,10	3,85	**5,28**
VILLA DE ABURRÁ						
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		73,58	1,50	0,15	16,56	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		35,35	1,50	0,15	7,95	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		58,00	1,80	0,15	15,66	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		19,00	1,47	0,15	4,19	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		17,00	1,60	0,15	4,08	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		60,35	1,50	0,15	13,58	**62,02**
PEDREGAL						
Calle 101C - Carrera 76 y 72		18,30	1,63	0,15	4,47	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		1,80	0,80	0,15	0,22	**4,69**
JESÚS NAZARENO						
Carrera 51D - Calle 61 y 62		14,40	2,40	0,15	5,18	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		4,60	1,88	0,15	1,30	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		7,60	2,10	0,15	2,39	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,24	1,70	0,15	0,83	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,90	4,30	0,20	3,35	**13,06**
AURES II						
Calle 85 - Carrera 90 y 90B		13,00	1,50	0,15	2,93	**2,93**
BELÉN GRANADA						
Carrera 74 entre calles 27 y 28		3,00	4,22	0,30	3,80	
Carrera 74 entre calles 27 y 28		2,00	1,85	0,20	0,74	**4,54**
Carrera 75 con calle 30		2,23	0,30	0,35	0,23	
Carrera 75 con calle 30		-0,03	0,30	0,50	0,00	
Carrera 75 con calle 30		-0,20	2,40	0,15	-0,07	
Carrera 75 con calle 30		1,50	2,20	0,15	0,50	**0,65**
BOMBONÁ II						
Carrera 9A - Calle 44AA y 45		16,00	2,00	1,17	37,44	**37,44**
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE MADERA PLÁSTICA						
Del 11 al 17 de agosto						
LAURELES - ACACIAS		16,50	1,35	0,05	1,11	**1,11**
EXCAVACIÓN PARA VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA						
Del 25 al 31 de agosto						
LAURELES - LORENA		37,00	1,60	0,13	7,70	**7,70**
LAURELES - LORENA		26,00	1,60	0,13	5,41	**5,41**
				Subtotal		**317,36**
				TOTAL		**317,36**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	8
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.2.1	DESCRIPCIÓN	LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

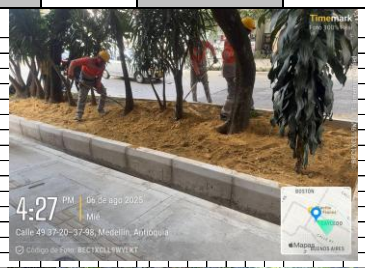







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 4 al 10 de agosto						
POBLADO - LOMAS						
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		42,40	1,00	0,45	19,08	**19,08**
BOMBONÁ I						
Calle 49A - Carrera 37 y 38		15,00	2,50	0,15	5,63	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		20,00	2,50	0,15	7,50	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		13,00	3,00	0,15	5,85	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		12,00	3,00	0,15	5,40	**24,38**
BOSTON - ENCISO						
Carrera 36A - Calle 54 y 58		6,27	1,24	0,30	2,33	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,20	3,10	0,30	1,12	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		2,30	1,23	0,30	0,85	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,20	8,40	0,30	3,02	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,17	1,45	0,30	0,51	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		4,90	1,20	0,30	1,76	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		10,74	1,25	0,30	4,03	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		4,00	1,20	0,30	1,44	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		7,20	1,17	0,30	2,53	**17,59**
Del 18 al 24 de agosto						
LA CANDELARIA - SAN DIEGO						
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		48,00	1,22	0,30	17,57	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		60,00	1,20	0,30	21,60	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		22,53	1,20	0,28	7,57	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		51,27	1,70	0,25	21,79	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		47,85	1,15	0,39	21,46	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		83,22	1,00	0,40	33,29	**123,28**
Subtotal						**184,32**
TOTAL						**184,32**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	9

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.














LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto						
LA CANDELARIA - SAN DIEGO						
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		5,50	1,30	0,25	1,79	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		29,00	1,00	0,15	4,35	**6,14**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		5,40	0,95	0,15	0,77	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		2,40	1,65	0,15	0,59	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		11,00	1,05	0,15	1,73	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		1,30	1,20	0,15	0,23	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		1,60	1,50	0,15	0,36	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		3,00	0,45	0,15	0,20	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		2,90	0,95	0,15	0,41	**4,31**
BOMBONÁ I						
Calle 49A - Carrera 37 y 38		40,00	1,40	0,15	8,40	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		16,51	1,50	0,15	3,71	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		2,54	4,90	0,15	1,87	**13,98**
LA CANDELARIA - BOSTON						
Carrera 40 - Calle 54 y 56		20,50	0,46	0,15	1,41	
Carrera 40 - Calle 54 y 56		27,00	0,90	0,15	3,65	**5,06**
Del 11 al 17 de agosto						
LA CANDELARIA - SAN DIEGO						
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		9,80	2,26	0,15	3,32	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		18,25	1,30	0,15	3,56	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		2,50	2,00	0,15	0,75	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		3,10	0,80	0,15	0,37	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		5,80	1,20	0,15	1,04	**9,05**
JESÚS NAZARENO						
Carrera 51D - Calle 61 y 62		33,50	2,00	0,15	10,05	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		28,50	2,50	0,15	10,69	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,80	0,60	0,15	-0,07	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,80	0,60	0,15	-0,07	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,80	0,60	0,15	-0,07	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,80	0,60	0,15	-0,07	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,80	0,60	0,15	-0,07	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,60	0,60	0,15	-0,05	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,25	0,40	0,15	-0,02	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,25	0,40	0,15	-0,02	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,25	0,40	0,15	-0,02	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,25	0,40	0,15	-0,02	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		4,10	1,60	0,15	0,98	**21,25**
PABLO VI						
Carrera 50A - Calle 120 y 114		4,00	2,05	0,25	2,05	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		55,00	1,15	0,25	15,81	**17,86**
BOSTON - ENCISO						
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,60	1,20	0,15	0,29	**0,29**
Del 18 al 24 de agosto						
VILLA DE ABURRÁ						
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		30,00	1,50	0,15	6,75	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		8,00	1,60	0,15	1,92	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		3,20	5,60	0,15	2,69	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		4,00	6,30	0,15	3,78	**15,14**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO						
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		48,90	1,30	0,25	15,89	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		32,60	1,00	0,25	8,15	**24,04**
JESÚS NAZARENO						
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,90	1,90	0,20	1,48	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,90	2,00	0,15	1,17	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		15,50	2,80	0,15	6,51	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		15,50	0,40	0,07	0,43	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		6,00	1,56	0,15	1,40	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		5,05	1,56	0,15	1,18	**12,18**
AURES II						
Calle 85 - Carrera 90 y 90B		12,00	3,00	0,15	5,40	**5,40**
BELÉN GRANADA						
Carrera 74 entre calles 27 y 28		40,06	1,50	0,20	12,02	
Carrera 74 entre calles 27 y 28		93,60	0,15	0,20	2,81	
Carrera 74 entre calles 27 y 28		2,50	7,80	0,15	2,93	
Carrera 75 con calles 29 y 30		16,30	2,40	0,15	5,87	
Carrera 75 con calles 29 y 30		16,30	0,15	0,20	0,49	
Menos cajas					-3,30	**20,81**





PABLO VI						
Carrera 50A - Calle 120 y 114		35,00	0,85	0,18	5,36	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		11,00	1,45	0,20	3,19	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		17,00	0,95	0,20	3,23	**11,78**
Del 25 al 31 de agosto						
VILLA DE ABURRÁ						
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		73,58	1,50	0,15	16,56	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		35,35	1,50	0,15	7,95	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		58,00	1,80	0,15	15,66	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		19,00	1,47	0,15	4,19	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		17,00	1,60	0,15	4,08	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		60,35	1,50	0,15	13,58	**62,02**
PABLO VI						
Carrera 50A - Calle 120 y 114		12,70	0,85	0,20	2,16	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		31,00	1,00	0,17	5,27	**7,43**
PEDREGAL						
Calle 101C - Carrera 76 y 72		11,30	1,33	0,15	2,25	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		8,75	1,68	0,15	2,21	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		1,30	1,20	0,15	0,23	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		24,50	1,81	0,15	6,65	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		18,30	1,63	0,15	4,47	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		1,80	0,80	0,15	0,22	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		22,60	1,69	0,15	5,73	**21,76**
JESÚS NAZARENO						
Carrera 51D - Calle 61 y 62		13,60	2,50	0,15	5,10	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		6,90	1,70	0,15	1,76	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,24	1,70	0,15	0,83	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		14,40	2,40	0,15	5,18	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		4,60	1,88	0,15	1,30	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		7,60	2,10	0,15	2,39	**16,56**
AURES II						
Calle 85 - Carrera 90 y 90B		13,00	1,50	0,15	2,93	**2,93**
BELÉN GRANADA						
Carrera 74 entre calles 27 y 28		2,50	1,50	0,15	0,56	**0,56**
Carrera 75 con calle 30		21,30	1,50	0,15	4,79	**4,79**
BOMBONÁ II						
Carrera 9A - Calle 44AA y 45		16,00	2,00	0,15	4,80	**4,80**
SUBBASE PARA VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA						
Del 25 al 31 de agosto						
LAURELES - LORENA		28,80	1,60	0,13	5,99	**5,99**
LAURELES - LORENA		23,00	1,60	0,13	4,78	**4,78**
SUBBASE PARA CONFINAR BORDILLOS INSTALADOS		1640,45	0,20	0,25	82,02	**82,02**
Subtotal						**380,92**
TOTAL						**380,92**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA

MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF					10
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.3.1	DESCRIPCIÓN	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	UNID.		PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.








LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	DISTANCIA	CANTIDAD (M3KM)	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto							
LA CANDELARIA - SAN DIEGO							
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	29,00	1,00	0,10	2,90	25,00	72,50	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	29,00	1,00	0,10	2,90	25,00	72,50	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	5,50	1,30	2,50	17,88	25,00	446,88	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	106,55	0,30	0,50	15,98	25,00	399,56	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	107,57	0,30	0,35	11,29	25,00	282,37	**1273,81**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	5,40	0,95	0,10	0,51	25,00	12,83	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	2,40	1,65	0,10	0,40	25,00	9,90	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	11,00	1,05	0,10	1,16	25,00	28,88	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	1,30	1,20	0,10	0,16	25,00	3,90	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	1,60	1,50	0,10	0,24	25,00	6,00	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	3,00	0,45	0,10	0,14	25,00	3,38	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	2,90	0,95	0,10	0,28	25,00	6,89	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	5,40	0,95	0,15	0,77	25,00	19,24	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	2,40	1,65	0,15	0,59	25,00	14,85	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	11,00	1,05	0,15	1,73	25,00	43,31	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	1,30	1,20	0,15	0,23	25,00	5,85	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	1,60	1,50	0,15	0,36	25,00	9,00	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	3,00	0,45	0,15	0,20	25,00	5,06	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	2,90	0,95	0,15	0,41	25,00	10,33	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	61,30	0,30	0,50	9,20	25,00	229,88	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	30,70	0,30	0,35	3,22	25,00	80,59	**489,87**
BOMBONÁ I							
Calle 49A - Carrera 37 y 38	40,00	1,40	0,15	8,40	25,00	210,00	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	40,00	1,40	0,10	5,60	25,00	140,00	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	56,51	0,50	0,35	9,89	25,00	247,23	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	16,51	1,50	0,15	3,71	25,00	92,87	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	2,54	4,90	0,15	1,87	25,00	46,67	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	16,51	1,50	0,10	2,48	25,00	61,91	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	2,54	4,90	0,10	1,24	25,00	31,12	**829,80**
PABLO VI						0,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	4,00	2,20	0,10	0,88	25,00	22,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	55,00	1,30	0,10	7,15	25,00	178,75	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	61,50	0,35	0,30	6,46	25,00	161,44	**362,19**
LA CANDELARIA - BOSTON							
Carrera 40 - Calle 54 y 56	20,50	0,46	0,15	1,41	25,00	35,36	
Carrera 40 - Calle 54 y 56	27,00	0,90	0,15	3,65	25,00	91,13	**126,49**
JESÚS NAZARENO							
Carrera 51D - Calle 61 y 62	1,53	3,80	0,10	0,58	25,00	14,54	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	7,90	1,53	0,10	1,21	25,00	30,22	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	33,50	2,15	0,10	7,20	25,00	180,06	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	26,50	2,50	0,10	6,63	25,00	165,63	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	26,50	1,90	0,10	5,04	25,00	125,88	**516,32**
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,80	1,53	0,25	1,45	25,00	36,34	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	26,50	2,50	0,25	16,56	25,00	414,06	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	26,50	1,90	0,25	12,59	25,00	314,69	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	7,90	1,53	0,25	3,02	25,00	75,54	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	33,50	2,15	0,25	18,01	25,00	450,16	**1290,79**
Del 11 al 17 de agosto							
LA CANDELARIA - SAN DIEGO							
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	9,80	2,26	0,10	2,21	25,00	55,37	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	18,25	1,30	0,10	2,37	25,00	59,31	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	2,50	2,00	0,10	0,50	25,00	12,50	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	3,10	0,80	0,10	0,25	25,00	6,20	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	5,80	1,20	0,10	0,70	25,00	17,40	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	58,90	0,30	0,50	8,84	25,00	220,88	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	21,50	0,30	0,35	2,26	25,00	56,44	**428,10**
VILLA DE ABURRÁ							
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	49,00	0,30	0,50	7,35	25,00	183,75	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	35,89	0,30	0,35	3,77	25,00	94,21	**277,96**
PABLO VI							





















Carrera 50A - Calle 120 y 114	23,50	1,32	0,14	4,34	25,00	108,57	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	35,00	1,00	0,14	4,90	25,00	122,50	**231,07**
AURES II							
Calle 85 - Carrera 90 y 90B	12,00	3,00	0,10	3,60	25,00	90,00	
Calle 85 - Carrera 90 y 90B	12,00	3,00	0,17	6,12	25,00	153,00	**243,00**
BOSTON - ENCISO							
Carrera 36A - Calle 54 y 58	1,90	1,40	0,10	0,27	25,00	6,65	
Carrera 36A - Calle 54 y 58	7,30	0,35	0,30	0,77	25,00	19,16	
Carrera 36A - Calle 54 y 58	3,80	1,50	0,10	0,57	25,00	14,25	
Carrera 36A - Calle 54 y 58	3,80	0,30	0,30	0,34	25,00	8,55	**48,61**
Del 18 al 24 de agosto							
VILLA DE ABURRÁ							
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	58	1,8	0,1	10,44	25,00	261,00	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	4	6,3	0,1	2,52	25,00	63,00	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	19	1,47	0,1	2,79	25,00	69,83	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	17	1,6	0,1	2,72	25,00	68,00	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	30	1,5	0,15	6,75	25,00	168,75	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	8	1,6	0,15	1,92	25,00	48,00	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	3,2	5,6	0,15	2,69	25,00	67,20	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	121	0,3	0,5	18,15	25,00	453,75	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	79,49	0,3	0,35	8,35	25,00	208,66	**1.408,19**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO							
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	37,6	2	0,1	7,52	25,00	188,00	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	48,9	1,3	0,25	15,89	25,00	397,31	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	32,6	1	0,25	8,15	25,00	203,75	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	48,9	1,3	0,1	6,36	25,00	158,93	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	32,6	1	0,1	3,26	25,00	81,50	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	34	1,5	0,1	5,10	25,00	127,50	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	85	0,3	0,5	12,75	25,00	318,75	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	60	0,3	0,35	6,30	25,00	157,50	**1.633,24**
JESÚS NAZARENO							
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,90	3,90	0,12	1,83	25,00	45,63	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,90	1,90	0,20	1,48	25,00	37,05	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,90	2,00	0,15	1,17	25,00	29,25	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	1,75	0,25	0,25	0,11	25,00	2,73	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	12,80	1,80	0,15	3,46	25,00	86,40	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	12,80	1,80	0,12	2,76	25,00	69,12	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	13,60	2,50	0,10	3,40	25,00	85,00	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	6,90	1,70	0,12	1,41	25,00	35,19	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	15,50	2,80	0,10	4,34	25,00	108,50	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	15,50	2,80	0,15	6,51	25,00	162,75	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	15,50	0,40	0,10	0,62	25,00	15,50	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	0,70	1,52	0,20	0,21	25,00	5,32	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,09	1,65	0,20	1,02	25,00	25,49	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	1,64	4,01	0,20	1,32	25,00	32,88	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	6,00	1,56	0,15	1,40	25,00	35,10	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	5,05	1,56	0,15	1,18	25,00	29,54	**805,46**
BELÉN GRANADA							
Carrera 74 con calles 27 y 28	40,06	1,50	0,10	6,01	25,00	150,23	
Carrera 75 con calles 30 y 29	16,30	2,40	0,06	2,35	25,00	58,68	
Carrera 75 con calles 30 y 29	13,80	0,30	0,35	1,45	25,00	36,23	
Carrera 75 con calles 30 y 29	2,50	0,30	0,50	0,38	25,00	9,38	
Carrera 75 con calles 30 y 29	16,30	2,40	0,15	5,87	25,00	146,70	**401,21**
PABLO VI							
Carrera 50A - Calle 120 y 114	11,00	1,60	0,15	2,64	25,00	66,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	17,00	1,10	0,15	2,81	25,00	70,13	**136,13**
PEDREGAL							
Calle 101C - Carrera 76 y 72	14,00	1,40	0,12	2,35	25,00	58,80	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	4,00	1,80	0,12	0,86	25,00	21,60	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	40,00	1,90	0,12	9,12	25,00	228,00	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	36,00	1,80	0,12	7,78	25,00	194,40	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	14,00	1,25	0,18	3,15	25,00	78,75	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	4,00	1,65	0,18	1,19	25,00	29,70	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	40,00	1,75	0,18	12,60	25,00	315,00	**926,25**
Del 25 al 31 de agosto							
VILLA DE ABURRÁ							
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	73,58	1,5	0,1	11,037	25,00	275,93	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	35,35	1,5	0,1	5,3025	25,00	132,56	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	73,58	1,5	0,15	16,5555	25,00	413,89	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	35,35	1,5	0,15	7,95375	25,00	198,84	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	108,93	0,3	0,5	16,3395	25,00	408,49	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	69,51	0,3	0,35	7,29855	25,00	182,46	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	58	1,8	0,15	15,66	25,00	391,50	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	19	1,47	0,15	4,1895	25,00	104,74	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	17	1,6	0,15	4,08	25,00	102,00	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	100	0,5	0,3	15	25,00	375,00	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	18,15	0,3	0,35	1,90575	25,00	47,64	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	60,35	1,5	0,1	9,0525	25,00	226,31	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	60,35	1,5	0,15	13,57875	25,00	339,47	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	60,35	0,3	0,5	9,0525	25,00	226,31	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	57,95	0,3	0,35	6,08475	25,00	152,12	**3.577,26**
PABLO VI							
Carrera 50A - Calle 120 y 114	25,60	1,00	0,14	3,58	25,00	89,60	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	12,70	2,00	0,14	3,56	25,00	88,90	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	31,00	1,15	0,14	4,99	25,00	124,78	**303,28**
PEDREGAL							
Calle 101C - Carrera 76 y 72	8,75	1,68	0,15	2,21	25,00	55,13	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	69,15	0,35	0,50	12,10	25,00	302,53	**357,66**
JESÚS NAZARENO							
Carrera 51D - Calle 61 y 62	14,40	2,40	0,10	3,46	25,00	86,40	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	4,60	1,88	0,10	0,86	25,00	21,62	





Carrera 51D - Calle 61 y 62	7,60	2,10	0,10	1,60	25,00	39,90	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,24	1,70	0,10	0,55	25,00	13,77	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	7,60	1,95	0,20	2,96	25,00	74,10	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,90	4,30	0,18	3,02	25,00	75,47	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	14,40	2,40	0,15	5,18	25,00	129,60	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	4,60	1,88	0,15	1,30	25,00	32,43	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	7,60	2,10	0,15	2,39	25,00	59,85	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,24	1,70	0,15	0,83	25,00	20,66	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,90	4,30	0,20	3,35	25,00	83,85	**637,64**
BELÉN GRANADA							
Carrera 74 entre calles 27 y 28	3,00	4,22	0,15	1,90	25,00	47,44	
Carrera 74 entre calles 27 y 28	2,00	1,85	0,15	0,56	25,00	13,88	
Carrera 75 con calle 30	- 0,20	2,40	0,15	- 0,07	25,00	- 1,80	
Carrera 75 con calle 30	1,50	2,20	0,15	0,50	25,00	12,38	
Carrera 74 entre calles 27 y 28	3,00	4,22	0,30	3,80	25,00	94,88	
Carrera 74 entre calles 27 y 28	2,00	1,85	0,20	0,74	25,00	18,50	
Carrera 75 con calle 30	2,23	0,30	0,35	0,23	25,00	5,85	
Carrera 75 con calle 30	- 0,03	0,30	0,50	- 0,00	25,00	- 0,11	
Carrera 75 con calle 30	- 0,20	2,40	0,15	- 0,07	25,00	- 1,80	
Carrera 75 con calle 30	1,50	2,20	0,15	0,50	25,00	12,38	**201,58**
BOMBONÁ II							
Carrera 9A - Calle 44AA y 45	16,00	2,00	0,15	4,80	25,00	120,00	
Carrera 9A - Calle 44AA y 45	16,00	2,00	1,17	37,44	25,00	936,00	**1.056,00**
Subtotal							**17.561,87**
TOTAL							**17.561,87**

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF					11
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO

ÍTEM	3.3.2	DESCRIPCIÓN	Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	UNID.		PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.













LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	29,00	1,00	0,10	2,90	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	29,00	1,00	0,10	2,90	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	5,50	1,30	2,50	17,88	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	106,55	0,30	0,50	15,98	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	107,57	0,30	0,35	11,29	**50,95**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	5,40	0,95	0,10	0,51	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	2,40	1,65	0,10	0,40	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	11,00	1,05	0,10	1,16	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	1,30	1,20	0,10	0,16	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	1,60	1,50	0,10	0,24	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	3,00	0,45	0,10	0,14	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	2,90	0,95	0,10	0,28	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	5,40	0,95	0,15	0,77	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	2,40	1,65	0,15	0,59	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	11,00	1,05	0,15	1,73	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	1,30	1,20	0,15	0,23	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	1,60	1,50	0,15	0,36	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	3,00	0,45	0,15	0,20	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	2,90	0,95	0,15	0,41	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	61,30	0,30	0,50	9,20	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	30,70	0,30	0,35	3,22	**19,59**
POBLADO - LOMAS					
Carrera 31A - Calle 11 y 11A	30,50	0,30	0,50	4,58	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A	42,40	0,30	0,35	4,45	**9,03**
BOMBONÁ I					
Calle 49A - Carrera 37 y 38	40,00	1,40	0,15	8,40	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	40,00	1,40	0,10	5,60	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	56,51	0,50	0,35	9,89	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	16,51	1,50	0,15	3,71	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	2,54	4,90	0,15	1,87	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	16,51	1,50	0,10	2,48	
Calle 49A - Carrera 37 y 38	2,54	4,90	0,10	1,24	**33,19**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114	4,00	2,20	0,10	0,88	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	55,00	1,30	0,10	7,15	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	61,50	0,35	0,30	6,46	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	4,00	2,05	0,25	2,05	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	55,00	1,15	0,25	15,81	**32,35**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62	1,53	3,80	0,10	0,58	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	7,90	1,53	0,10	1,21	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	33,50	2,15	0,10	7,20	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	26,50	2,50	0,10	6,63	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	26,50	1,90	0,10	5,04	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,80	1,53	0,25	1,45	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	26,50	2,50	0,25	16,56	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	26,50	1,90	0,25	12,59	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	7,90	1,53	0,25	3,02	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	33,50	2,15	0,25	18,01	**72,28**
Del 11 al 17 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	9,80	2,26	0,10	2,21	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	18,25	1,30	0,10	2,37	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	2,50	2,00	0,10	0,50	

















Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	3,10	0,80	0,10	0,25	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	5,80	1,20	0,10	0,70	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	58,90	0,30	0,50	8,84	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	21,50	0,30	0,35	2,26	**17,12**
POBLADO - LOMAS					
Carrera 31A - Calle 11 y 11A	44,93	0,30	0,50	6,74	**6,74**
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	30,00	1,50	0,15	6,75	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	8,00	1,60	0,15	1,92	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	3,20	5,60	0,15	2,69	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	49,00	0,30	0,50	7,35	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	35,89	0,30	0,35	3,77	**22,48**
AURES II					
Calle 85 - Carrera 90 y 90B	12,00	3,00	0,10	3,60	
Calle 85 - Carrera 90 y 90B	12,00	3,00	0,17	6,12	**9,72**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114	23,50	1,57	0,25	9,22	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	25,50	0,35	0,40	3,57	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	1,20	0,35	0,50	0,21	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	35,00	1,00	0,18	6,30	**19,30**
BOSTON - ENCISO					
Carrera 36A - Calle 54 y 58	1,90	1,40	0,10	0,27	
Carrera 36A - Calle 54 y 58	7,30	0,35	0,30	0,77	
Carrera 36A - Calle 54 y 58	3,80	1,50	0,10	0,57	
Carrera 36A - Calle 54 y 58	3,80	0,30	0,30	0,34	**1,94**
Del 18 al 24 de agosto					
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	58,00	1,80	0,10	10,44	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	4,00	6,30	0,10	2,52	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	19,00	1,47	0,10	2,79	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	17,00	1,60	0,10	2,72	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	30,00	1,50	0,15	6,75	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	8,00	1,60	0,15	1,92	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	3,20	5,60	0,15	2,69	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	121,00	0,30	0,50	18,15	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	79,49	0,30	0,35	8,35	**56,33**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	37,60	2,00	0,10	7,52	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	48,90	1,30	0,25	15,89	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	32,60	1,00	0,25	8,15	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	48,90	1,30	0,10	6,36	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	32,60	1,00	0,10	3,26	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	34,00	1,50	0,10	5,10	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	85,00	0,30	0,50	12,75	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	60,00	0,30	0,35	6,30	**65,33**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,90	3,90	0,12	1,83	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,90	1,90	0,20	1,48	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,90	2,00	0,15	1,17	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	1,75	0,25	0,25	0,11	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	12,80	1,80	0,15	3,46	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	12,80	1,80	0,12	2,76	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	13,60	2,50	0,10	3,40	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	6,90	1,70	0,12	1,41	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	15,50	2,80	0,10	4,34	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	15,50	2,80	0,15	6,51	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	15,50	0,40	0,10	0,62	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	0,70	1,52	0,20	0,21	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,09	1,65	0,20	1,02	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	1,64	4,01	0,20	1,32	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	6,00	1,56	0,15	1,40	
Carrera 51D - Calle 61 y 62	5,05	1,56	0,15	1,18	**32,22**
BELÉN GRANADA					
Carrera 74 con calles 27 y 28	40,06	1,50	0,10	6,01	
Carrera 75 con calles 30 y 29	16,30	2,40	0,06	2,35	
Carrera 75 con calles 30 y 29	13,80	0,30	0,35	1,45	
Carrera 75 con calles 30 y 29	2,50	0,30	0,50	0,38	
Carrera 75 con calles 30 y 29	16,30	2,40	0,15	5,87	
Carrera 75 con calles 30 y 29	87,90	0,30	0,20	5,27	
Carrera 74 con calles 27 y 28	40,60	1,50	0,20	12,18	
Carrera 74 con calles 27 y 28	5,70	0,30	0,35	0,60	**34,10**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114	11,00	1,45	0,20	3,19	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	17,00	0,95	0,20	3,23	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	33,80	0,35	0,30	3,55	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	1,20	0,35	0,50	0,21	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	26,80	0,35	0,30	2,81	
Carrera 50A - Calle 120 y 114	1,20	0,35	0,50	0,21	**13,20**
PEDREGAL					
Calle 101C - Carrera 76 y 72	14,00	1,40	0,12	2,35	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	4,00	1,80	0,12	0,86	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	40,00	1,90	0,12	9,12	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	36,00	1,80	0,12	7,78	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	14,00	1,25	0,18	3,15	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	4,00	1,65	0,18	1,19	
Calle 101C - Carrera 76 y 72	40,00	1,75	0,18	12,60	**37,05**





Del 25 al 31 de agosto						
VILLA DE ABURRÁ						
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	73,58	1,50	0,10	11,04		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	35,35	1,50	0,10	5,30		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	73,58	1,50	0,15	16,56		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	35,35	1,50	0,15	7,95		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	108,93	0,30	0,50	16,34		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	69,51	0,30	0,35	7,30		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	58,00	1,80	0,15	15,66		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	19,00	1,47	0,15	4,19		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	17,00	1,60	0,15	4,08		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	100,00	0,50	0,30	15,00		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	18,15	0,30	0,35	1,91		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	60,35	1,50	0,10	9,05		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	60,35	1,50	0,15	13,58		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	60,35	0,30	0,50	9,05		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	57,95	0,30	0,35	6,08		**143,09**
PABLO VI						
Carrera 50A - Calle 120 y 114	9,30	0,35	0,30	0,98		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	13,20	0,85	0,20	2,24		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	31,00	1,00	0,17	5,27		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	31,00	0,35	0,50	5,43		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	25,60	1,00	0,14	3,58		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	12,70	2,00	0,14	3,56		**21,06**
PEDREGAL						
Calle 101C - Carrera 76 y 72	8,75	1,68	0,15	2,21		
Calle 101C - Carrera 76 y 72	69,15	0,35	0,50	12,10		
Calle 101C - Carrera 76 y 72	22,60	1,69	0,15	5,73		
Calle 101C - Carrera 76 y 72	22,60	0,35	0,50	3,96		**23,99**
JESÚS NAZARENO						
Carrera 51D - Calle 61 y 62	14,40	2,40	0,10	3,46		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	4,60	1,88	0,10	0,86		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	7,60	2,10	0,10	1,60		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,24	1,70	0,10	0,55		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	7,60	1,95	0,20	2,96		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,90	4,30	0,18	3,02		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	14,40	2,40	0,15	5,18		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	4,60	1,88	0,15	1,30		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	7,60	2,10	0,15	2,39		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,24	1,70	0,15	0,83		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	3,90	4,30	0,20	3,35		**25,51**
BELÉN GRANADA						
Carrera 74 entre calles 27 y 28	3,00	4,22	0,15	1,90		
Carrera 74 entre calles 27 y 28	2,00	1,85	0,15	0,56		
Carrera 75 con calle 30	-0,20	2,40	0,15	-0,07		
Carrera 75 con calle 30	1,50	2,20	0,15	0,50		
Carrera 74 entre calles 27 y 28	3,00	4,22	0,30	3,80		
Carrera 74 entre calles 27 y 28	2,00	1,85	0,20	0,74		
Carrera 75 con calle 30	2,23	0,30	0,35	0,23		
Carrera 75 con calle 30	-0,03	0,30	0,50	0,00		
Carrera 75 con calle 30	-0,20	2,40	0,15	-0,07		
Carrera 75 con calle 30	1,50	2,20	0,15	0,50		**8,06**
BOMBONÁ II						
Carrera 9A - Calle 44AA y 45	16,00	2,00	0,15	4,80		
Carrera 9A - Calle 44AA y 45	16,00	2,00	1,17	37,44		**42,24**
	Subtotal					**796,88**
	TOTAL					**796,88**

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA Nº	12

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.1.1	DESCRIPCIÓN	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m (8 centímetros) Vaciado alternado (Junta fría). Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y llaneado 0.10 m en los bordes TIPO METRO, los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, malla y material de soporte (base, sub base, entresuelo o arenilla) así como las llaves en caso de requerirse, se pagarán en su ítem respectivo.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 18 al 24 de agosto					
AURES II					
Calle 85 - Carrera 90 y 90B		12,00	3,00	36,00	**36,00**
Del 25 al 31 de agosto					
AURES II					
Calle 85 - Carrera 90 y 90B		13,00	1,50	19,50	**19,50**
BOMBONÁ II					
Carrera 9A - Calle 44AA y 45		16,00	2,24	35,90	**35,90**
CONCRETO DE 21MPA					
Del 25 al 31 de agosto					
LAURELES - LORENA		43,20	1,32	57,02	**57,02**
LAURELES - LORENA		34,50	1,60	55,20	**55,20**
Subtotal					**203,63**
TOTAL					**203,63**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	13
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.1.5	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoriia y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

















LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
Del 4 al 10 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		29,00	1,30	37,70	**37,70**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		5,40	0,95	5,13	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		2,40	1,65	3,96	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		11,00	1,05	11,55	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		1,30	1,20	1,56	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		1,60	1,50	2,40	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		3,00	0,45	1,35	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		2,90	0,95	2,76	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		4,30	1,15	4,95	**33,65**
BOMBONÁ I					
Calle 49A - Carrera 37 y 38		40,00	1,40	56,00	**56,00**
LA CANDELARIA - BOSTON					
Carrera 40 - Calle 54 y 56		10,00	1,00	10,00	
Carrera 40 - Calle 54 y 56		3,70	3,25	12,03	
Carrera 40 - Calle 54 y 56		1,15	1,30	1,50	**23,52**
Del 11 al 17 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		6,20	0,60	3,72	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		46,90	1,00	46,90	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		10,00	1,00	10,00	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		9,80	2,26	22,15	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		18,25	1,30	23,73	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		2,50	2,00	5,00	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		3,10	0,80	2,48	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		5,80	1,20	6,96	**120,93**
POBLADO - LOMAS					
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		4,00	8,00	32,00	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		2,00	2,00	4,00	**36,00**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		33,50	2,15	72,03	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		26,50	2,50	66,25	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,80	0,60	-0,48	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,80	0,60	-0,48	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,80	0,60	-0,48	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,80	0,60	-0,48	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,80	0,60	-0,48	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-0,60	0,60	-0,36	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,25	0,40	0,10	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,25	0,40	0,10	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,25	0,40	0,10	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,25	0,40	0,10	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		4,10	1,70	6,97	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		-46,48	0,20	-9,30	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		10,85	0,10	1,09	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		4,65	0,10	0,47	**135,14**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		4,00	2,05	8,20	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		55,00	1,05	57,75	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,20	1,20	-1,44	**64,51**
BOSTON - ENCISO					
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,90	1,40	2,66	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		3,80	1,50	5,70	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,00	1,20	-1,20	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,20	1,20	-1,44	**5,72**
BOMBONÁ I					
Calle 49A - Carrera 37 y 38		16,51	1,50	24,77	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		2,54	4,90	12,45	**37,21**
Del 18 al 24 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		29,30	1,11	32,52	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		10,80	1,00	10,80	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		31,50	1,43	45,05	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		16,00	1,47	23,52	**111,89**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,90	1,90	7,41	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,90	2,00	7,80	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		15,50	2,80	43,40	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		6,00	1,56	9,36	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		5,05	1,56	7,88	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		2,30	0,20	0,46	**76,31**









BELÉN GRANADA					
Carrera 74 con calles 27 y 28		40,06	1,50	60,09	**60,09**
Del 25 al 31 de agosto					
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		30,00	1,50	45,00	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		8,00	1,60	12,80	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		3,20	5,60	17,92	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		4,00	6,30	25,20	**100,92**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		23,50	1,32	31,02	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		35,00	0,75	26,25	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		25,60	0,75	19,20	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		11,70	1,75	20,48	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		31,00	0,90	27,90	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,24	1,00	-12,24	**112,61**
PEDREGAL					
Calle 101C - Carrera 76 y 72		11,30	1,23	13,90	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		8,75	1,58	13,83	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		1,30	1,10	1,43	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		24,50	1,71	41,90	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		18,30	1,53	28,00	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		1,80	0,70	1,26	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		22,60	1,59	35,93	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		0,81	1,20	-0,97	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		0,35	0,50	-0,18	**135,10**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		6,01	1,30	7,81	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,93	1,30	5,11	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,24	3,70	11,99	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		3,50	2,67	9,36	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		6,90	4,04	27,88	**62,14**
BELÉN GRANADA					
Carrera 74 entre calles 27 y 28		5,32	2,00	10,64	**10,64**
Carrera 75 con calle 30		16,10	2,19	35,26	**35,26**
	Subtotal				**1.255,33**
	TOTAL				**1.255,33**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	14

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.2.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.













LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto		
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	152,22	**152,22**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	80,20	**80,20**
POBLADO - LOMAS		
Carrera 31A - Calle 11 y 11A	30,50	**30,50**
BOMBONÁ I		
Calle 49A - Carrera 37 y 38	44,90	**44,90**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	55,00	**55,00**
Del 11 al 17 de agosto		
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	80,40	**80,40**
POBLADO - LOMAS		
Carrera 31A - Calle 11 y 11A	44,93	**44,93**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	89,85	**89,85**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	25,60	**25,60**
BOSTON - ENCISO		
Carrera 36A - Calle 54 y 58	11,56	**11,56**
BOMBONÁ I		
Calle 49A - Carrera 37 y 38	16,51	**16,51**
Del 18 al 24 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	127,38	**127,38**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	100,00	**100,00**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	19,50	**19,50**
BELÉN GRANADA		
Carrera 74 con calles 27 y 28	81,09	**81,09**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	54,00	**54,00**
Del 25 al 31 de agosto		
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	30,90	**30,90**
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	345,85	**345,85**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	38,20	**38,20**
PEDREGAL		
Calle 101C - Carrera 76 y 72	91,75	**91,75**
BOMBONÁ I		
Calle 49A - Carrera 37 y 38	36,72	**36,72**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	66,08	**66,08**
BELÉN GRANADA		
Carrera 74 entre calles 27 y 28	15,11	**15,11**
Carrera 75 con calle 30	2,20	**2,20**
Subtotal		**1.640,45**
TOTAL		**1.640,45**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	16
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.2.4	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		95,10	0,25	23,78	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		74,50	0,20	14,90	**38,68**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		75,05	0,35	26,27	**26,27**
POBLADO - LOMAS					
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		44,93	0,30	13,48	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		20,00	0,50	10,00	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		48,00	0,25	12,00	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		16,00	0,20	3,20	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		30,00	0,35	10,50	**49,18**
LA CANDELARIA - BOSTON					
Carrera 40 - Calle 54 y 56		1,20	1,20	1,44	
Carrera 40 - Calle 54 y 56		1,00	0,80	0,80	**2,24**
Del 11 al 17 de agosto					
LA CANDELARIA - BOSTON					
Carrera 40 - calle 54 y 56		6,00	2,00	12,00	
Carrera 40 - calle 54 y 56		4,00	0,15	0,60	
Carrera 40 - calle 54 y 56		1,00	0,10	0,10	
Carrera 40 - calle 54 y 56		1,00	2,00	2,00	**14,70**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,20	1,20	1,44	**1,44**
BOSTON - ENCISO					
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,20	1,20	1,44	
		1,20	1,00	1,20	**2,64**
Del 18 al 24 de agosto					
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		72,00	0,30	21,60	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		1,20	1,20	1,44	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		1,20	1,20	1,44	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		1,20	1,20	1,44	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		0,60	0,60	0,36	**26,28**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		4,80	0,15	0,72	**0,72**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,24	1,00	1,24	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,00	0,60	0,60	**1,84**
Del 25 al 31 de agosto					
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		100,00	0,35	35,00	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		55,35	0,30	16,61	**51,61**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,00	0,60	0,60	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,60	1,00	1,60	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		0,80	1,20	0,96	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,00	1,00	1,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,00	1,00	1,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,20	2,00	2,40	**7,56**
PEDREGAL					
Calle 101C - Carrera 76 y 72		0,81	1,20	0,97	**0,97**
SOLADO PARA EVITAR EROSIÓN DE BORDILLOS INSTALADOS		1640,45	0,20	328,09	**328,09**
				Subtotal	**552,21**
				TOTAL	**552,21**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	17
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	5.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	UNID.	kg	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN	KG	MEDIDA TOTAL
Del 11 al 17 de agosto		
BOSTON - ENCISO		
Carrera 36A - Calle 54 y 58	4,03	**4,03**
Del 25 al 31 de agosto		
BOMBONÁ II		
Carrera 9A - Calle 44AA y 45	61,60	**61,60**
	Subtotal	**65,63**
	TOTAL	**65,63**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	18
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	5.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		6,50	1,30	8,45	**8,45**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		0,60	0,60	0,36	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		1,20	0,80	0,96	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		2,00	2,50	5,00	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		2,00	2,86	5,72	**12,04**
LA CANDELARIA - BOSTON					
Carrera 40 - Calle 54 y 56		4,00	1,00	4,00	
Carrera 40 - Calle 54 y 56		2,00	1,00	2,00	**6,00**
Del 11 al 17 de agosto					
POBLADO - LOMAS					
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		2,00	2,00	4,00	**4,00**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		2,00	2,00	4,00	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		2,00	2,00	4,00	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		2,00	2,00	4,00	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		2,00	2,00	4,00	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		2,00	2,00	4,00	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		2,00	2,00	4,00	**24,00**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		5,50	5,50	30,25	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		2,00	1,00	2,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		2,00	1,00	2,00	**34,25**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		2,00	0,85	1,70	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,20	0,85	1,02	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,00	0,85	0,85	**3,57**
Del 25 al 31 de agosto					
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		2,00	1,00	2,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		2,00	1,00	2,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		2,00	1,00	2,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		2,00	1,00	2,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		0,80	0,80	0,64	**8,64**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,83	0,90	0,75	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		1,47	0,90	1,32	**2,07**
AURES II					
Calle 85 - Carrera 90 y 90B		13,00	1,50	19,50	**19,50**
MALLA PARA VACIADO DE CONCRETO DE 21MPA					
Del 25 al 31 de agosto					
LAURELES - LORENA		28,80	1,60	46,08	**46,08**
LAURELES - LORENA		23,00	1,60	36,80	**36,80**
				SUBTOTAL	**205,40**
				TOTAL	**205,40**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	19

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	5.3	DESCRIPCIÓN	Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia mayor a 100 m.	UNID.	kg	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	KG	MEDIDA TOTAL
Del 25 al 31 de agosto		
BOMBONÁ II		
Carrera 9A - Calle 44AA y 45	158,60	**158,60**
Subtotal		**158,60**
TOTAL		**158,60**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF			HOJA N°	20
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	6.1	DESCRIPCIÓN	Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

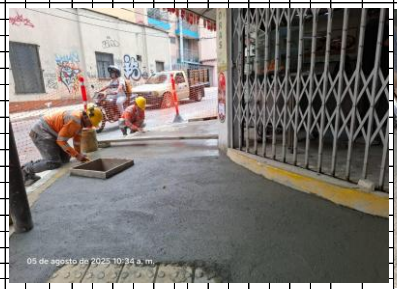



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
Del 4 al 10 de agosto		
LA CANDELARIA - BOSTON		
Carrera 40 - Calle 54 y 56	4,00	**4,00**
Del 11 al 17 de agosto		
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	5,00	**5,00**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	2,00	**2,00**
Del 18 al 24 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	1,00	**1,00**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	4,00	**4,00**
Del 25 al 31 de agosto		
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	3,00	**3,00**
PEDREGAL		
Calle 101C - Carrera 76 y 72	1,00	**1,00**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	2,00	**2,00**
Subtotal		**22,00**
TOTAL		**22,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	21
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	6.3	DESCRIPCIÓN	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
Del 4 al 10 de agosto		
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	1,00	**1,00**
POBLADO - LOMAS		
Carrera 31A - Calle 11 y 11A	2,00	**2,00**
BOSTON - ENCISO		
Carrera 36A - Calle 54 y 58	3,00	**3,00**
Del 11 al 17 de agosto		
BOSTON - ENCISO		
Carrera 36A - Calle 54 y 58	5,00	**5,00**
Del 18 al 24 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	1,00	**1,00**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	1,00	**1,00**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	1,00	**1,00**
Subtotal		**14,00**
TOTAL		**14,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	22

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guia o alerta discapacitados visuales de 20X20X6 cm LOST-AL . Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena,cortes a maquina . Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color AMARILLO.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto					
LA CANDELARIA - SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		1,20	1,20	1,44	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		1,20	1,20	1,44	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		1,20	1,20	1,44	**4,32**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		0,60	0,60	0,36	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		1,20	1,20	1,44	
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		0,60	0,60	0,36	**2,16**
BOMBONÁ I					
Calle 49A - Carrera 37 y 38		1,20	1,20	1,44	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		1,20	1,20	1,44	**2,88**
Del 11 al 17 de agosto					
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,60	0,60	0,36	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,60	0,60	0,36	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,60	0,60	0,36	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,60	0,60	0,36	**1,44**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,20	1,20	1,44	**1,44**
BOSTON - ENCISO					
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,20	1,20	1,44	
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,20	1,00	1,20	**2,64**
BOMBONÁ I					
Calle 49A - Carrera 37 y 38		1,20	1,20	1,44	
Calle 49A - Carrera 37 y 38		1,20	1,20	1,44	**2,88**
Del 18 al 24 de agosto					
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		1,20	1,20	1,44	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		1,20	1,20	1,44	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		1,20	1,20	1,44	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		0,60	0,60	0,36	**4,68**
JESÚS NAZARENO					
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,60	0,60	0,36	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,60	0,60	0,36	
Carrera 51D - Calle 61 y 62		0,60	0,60	0,36	**1,08**
BELÉN GRANADA					
Carrera 74 con calles 27 y 28		1,00	1,00	1,00	
Carrera 74 con calles 27 y 28		1,00	1,00	1,00	**2,00**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,24	1,00	1,24	
		1,00	0,60	0,60	**1,84**
Del 25 al 31 de agosto					
VILLA DE ABURRÁ					
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		1,20	1,20	1,44	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		1,20	1,20	1,44	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		0,60	0,60	0,36	
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		0,60	0,60	0,36	**3,60**
PABLO VI					
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,00	0,60	0,60	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,60	1,00	1,60	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		0,80	1,20	0,96	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,00	1,00	1,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,00	1,00	1,00	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,20	2,00	2,40	**7,56**
PEDREGAL					
Calle 101C - Carrera 76 y 72		0,81	1,20	0,97	**0,97**
	Subtotal				**39,49**
TOTAL					**39,49**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF									HOJA N°	23
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.2	DESCRIPCIÓN	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.






LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 11 al 17 de agosto		
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	46,48	**46,48**
Del 18 al 24 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	70,00	**70,00**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	17,60	**17,60**
Del 25 al 31 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	100,00	**100,00**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	13,35	**13,35**
BELÉN GRANADA		
Carrera 75 con calle 30	16,10	**16,10**
Subtotal		**263,53**
TOTAL		**263,53**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	24
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.3	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquin ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









LOCALIZACIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto			
LA CANDELARIA - SAN DIEGO			
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		1,12	**1,12**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		32,30	**32,30**
BOMBONÁ I			
Calle 49A - Carrera 37 y 38		46,10	**46,10**
Del 11 al 17 de agosto			
JESÚS NAZARENO			
Carrera 51D - Calle 61 y 62		24,40	**24,40**
PABLO VI			
Carrera 50A - Calle 120 y 114		61,50	**61,50**
BOSTON - ENCISO			
Carrera 36A - Calle 54 y 58		2,95	**2,95**
Del 18 al 24 de agosto			
VILLA DE ABURRÁ			
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		21,00	**21,00**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO			
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		37,60	**37,60**
JESÚS NAZARENO			
Carrera 51D - Calle 61 y 62		16,70	**16,70**
BELÉN GRANADA			
Carrera 74 con calles 27 y 28		20,70	**20,70**
PABLO VI			
Carrera 50A - Calle 120 y 114		60,60	**60,60**
Del 25 al 31 de agosto			
VILLA DE ABURRÁ			
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		8,00	**8,00**
PABLO VI			
Carrera 50A - Calle 120 y 114		66,20	**66,20**
PEDREGAL			
Calle 101C - Carrera 76 y 72		91,75	**91,75**
BELÉN GRANADA			
Carrera 74 entre calles 27 y 28		2,95	**2,95**
Carrera 75 con calle 30		2,20	**2,20**
Subtotal			**496,07**
TOTAL			**496,07**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF			HOJA N°	25
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	9.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de grama tipo San Agustín, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , adición de tierra abonada con un espesor de 5 cm, anclaje inicial y final con ganchos de sujeción, regado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, capote mínimo 5 cm.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

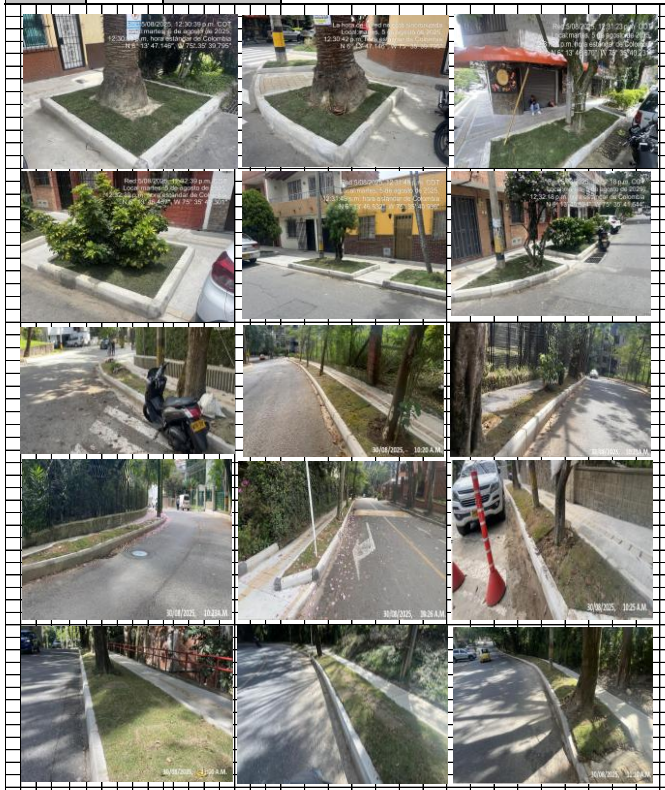

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
BELÉN GRANADA					
CL 28- CR 75 Y 74		2,28	2,22	5,06	
CL 28- CR 75 Y 74		1,64	1,05	1,72	
CL 28- CR 75 Y 74		5,10	1,64	8,36	
CL 28- CR 75 Y 74		10,60	3,06	32,44	
CL 28- CR 75 Y 74		6,17	1,69	10,43	
CL 28- CR 75 Y 74		11,22	2,30	25,81	
CL 28- CR 75 Y 74		3,30	2,20	7,26	
CL 28- CR 75 Y 74		1,14	2,16	2,46	
CL 28- CR 75 Y 74		2,46	1,66	4,08	
CL 28- CR 75 Y 74		3,70	1,45	5,37	
CL 28- CR 75 Y 74		4,50	1,68	7,56	
CL 28- CR 75 Y 74		2,01	1,66	3,34	
CL 28- CR 75 Y 74		1,80	2,17	3,91	
CL 28- CR 75 Y 74		2,50	1,40	3,50	
CL 28- CR 75 Y 74		2,50	1,40	3,50	
CL 28- CR 75 Y 74		2,10	1,30	2,73	**127,52**
POBLADO - LOMAS					
CL 11-CR 31A Y 30		85,00	1,25	106,25	
CL 11-CR 31A Y 30		10,60	0,97	10,28	
CL 11-CR 31A Y 30		25,10	1,00	25,10	
CL 11-CR 31A Y 30		2,36	1,10	2,60	
CL 11-CR 31A Y 30		0,87	0,74	0,64	
CL 11-CR 31A Y 30		2,16	1,08	2,35	
CL 11-CR 31A Y 30		25,00	1,05	26,25	
CL 11-CR 31A Y 30		12,00	1,03	12,36	
CL 11-CR 31A Y 30		34,85	1,10	38,34	
CL 11-CR 31A Y 30		13,00	1,00	13,00	
CL 11-CR 31A Y 30		50,20	1,25	62,75	
CL 11-CR 31A Y 30		22,00	1,04	22,88	
CL 11-CR 31A Y 30		1,50	1,00	1,50	
CL 11-CR 31A Y 30		0,85	0,90	0,77	
CL 11-CR 31A Y 30		0,85	1,08	0,92	
CL 11-CR 31A Y 30		1,96	1,10	2,16	
CL 11-CR 31A Y 30		1,70	0,95	1,62	
CL 11-CR 31A Y 30		18,70	1,00	18,70	
CL 11-CR 31A Y 30		20,40	0,95	19,38	**367,84**
CR 31A - 11 Y 11A		31,45	0,94	29,56	
CR 31A - 11 Y 11A		38,25	0,94	35,96	
CR 31A - 11 Y 11A		22,95	0,84	19,28	
CR 31A - 11 Y 11A		16,13	1,10	17,74	**102,54**
CL 11B		37,40	1,00	37,40	
CL 11B		11,90	0,80	9,52	
CL 11B		9,35	0,81	7,57	
CL 11B		8,00	0,88	7,04	
CL 11B		3,40	0,86	2,92	
CL 11B		62,90	0,87	54,72	
CL 11B		9,35	0,90	8,42	
CL 11B		2,30	1,65	3,80	
CL 11B		12,75	1,82	23,21	
CL 11B		5,10	1,02	5,20	
CL 11B		7,65	1,00	7,65	
CL 11B		7,65	0,95	7,27	
CL 11B		39,10	0,95	37,15	
CL 11B		6,80	0,95	6,46	**218,32**
SAN DIEGO					
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		52,70	2,00	105,40	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		47,60	1,20	57,12	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		34,00	1,22	41,48	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		50,15	1,10	55,17	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		4,53	3,80	17,21	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		3,95	1,30	5,14	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		41,65	1,17	48,73	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		3,84	1,84	7,07	
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		62,05	1,20	74,46	**411,77**
			Subtotal		**1.227,98**
			TOTAL		**1.227,98**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	26
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-1	DESCRIPCIÓN	Corte de losa existente para demolición	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto		
BOMBONÁ I		
Calle 49A - Carrera 37 y 38	68,44	**68,44**
Del 11 al 17 de agosto		
LA CANDELARIA - BOSTON		
Carrera 40 - calle 54 y 56	10,00	**10,00**
Del 18 al 24 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	5,00	**5,00**
Del 25 al 31 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	10,00	**10,00**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	11,56	**11,56**
Subtotal		**105,00**
TOTAL		**105,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	27
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-2	DESCRIPCIÓN	Demolición y excavación de bordillos.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



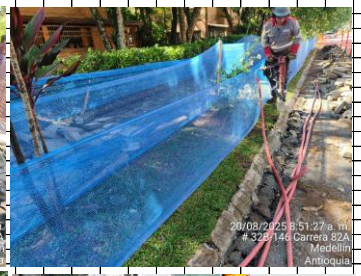





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto		
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	106,55	**106,55**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	61,73	**61,73**
POBLADO - LOMAS		
Carrera 31A - Calle 11 y 11A	30,50	**30,50**
BOMBONÁ I		
Calle 49A - Carrera 37 y 38	61,44	**61,44**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	61,50	**61,50**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	60,00	**60,00**
Del 11 al 17 de agosto		
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	58,90	**58,90**
POBLADO - LOMAS		
Carrera 31A - Calle 11 y 11A	44,93	44,93
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	49,00	**49,00**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	25,60	**25,60**
BOSTON - ENCISO		
Carrera 36A - Calle 54 y 58	11,56	**11,56**
Del 18 al 24 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	121,00	**121,00**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	85,00	**85,00**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	54,40	**54,40**
BELÉN GRANADA		
Carrera 74 con calles 27 y 28	109,90	**109,90**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	63,00	**63,00**
Del 25 al 31 de agosto		
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	30,90	**30,90**
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	169,28	**169,28**
PABLO VI		
Carrera 50A - Calle 120 y 114	41,40	**41,40**
PEDREGAL		
Calle 101C - Carrera 76 y 72	91,75	**91,75**
BOMBONÁ I		
Calle 49A - Carrera 37 y 38	36,72	**36,72**
JESÚS NAZARENO		
Carrera 51D - Calle 61 y 62	14,40	**14,40**
BELÉN GRANADA		
Carrera 75 con calle 30	2,20	**2,20**
Subtotal		**1.391,66**
TOTAL		**1.391,66**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF									HOJA N°	28
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-3	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en lámina galvanizada.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

LA AMÉRICA - FERRINI





LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR














BELÉN GRANADA





LOCALIZACIÓN	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
BELÉN GRANADA	2,00	2,00
SIMÓN BOLÍVAR	6,00	6,00
LA AMÉRICA - FERRINI	2,00	2,00
Subtotal		10,00
TOTAL		10,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	29
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-4	DESCRIPCIÓN	Demolición y excavación de jardineras con alturas entre 30 y 50 cm, incluye demolicion de viga de amarre y excavacion para la cimentacion del bordillo	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto		
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	107,57	**107,57**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A	30,70	**30,70**
POBLADO - LOMAS		
Carrera 31A - Calle 11 y 11A	42,40	**42,40**
Del 11 al 17 de agosto		
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	21,50	**21,50**
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	35,89	**35,89**
Del 18 al 24 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	79,49	**79,49**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO		
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas	60,00	**60,00**
Del 25 al 31 de agosto		
VILLA DE ABURRÁ		
Carrera 82A - Calle 32 y 32E	145,61	**145,61**
Subtotal		**523,16**
		523,16

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	30

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE 5	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de andén en concreto permeable de espesor 15 cm y los elementos necesarios para su correcta instalación.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
Del 11 al 17 de agosto					
POBLADO - LOMAS					
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		1,64	1,30	2,13	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		32,00	1,30	41,60	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		14,17	1,30	18,42	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		1,20	0,64	0,77	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		10,27	1,30	13,35	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		2,69	1,30	3,50	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		1,51	1,30	1,96	**81,73**
Subtotal					**81,73**
TOTAL					**81,73**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	31
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-6	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de caja de contadores prefabricados de acueducto.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto		
LA CANDELARIA - BOSTON		
Carrera 40 - Calle 54 y 56	8,00	**8,00**
BOSTON - ENCISO		
Carrera 36A - Calle 54 y 58	9,00	**9,00**
Subtotal		**17,00**
TOTAL		**17,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	32
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-7	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL de material rocoso en volúmenes de roca superio al 40%, incluye cargue (mecánico y manual) y transporte del material proveniente de excavación	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 4 al 10 de agosto						
POBLADO - LOMAS						
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		30,50	0,30	0,50	4,58	
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		42,40	0,30	0,35	4,45	**9,03**
PABLO VI						
Carrera 50A - Calle 120 y 114		4,00	2,05	0,25	2,05	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		55,00	1,15	0,25	15,81	**17,86**
Del 11 al 17 de agosto						
POBLADO - LOMAS						
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		44,93	0,30	0,50	6,74	**6,74**
PABLO VI						
Carrera 50A - Calle 120 y 114		23,50	1,42	0,25	8,34	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		25,50	0,35	0,40	3,57	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,20	0,35	0,50	0,21	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		35,00	1,00	0,18	6,30	**18,42**
BOSTON - ENCISO						
Carrera 36A - Calle 54 y 58		1,90	1,35	0,20	0,51	**0,51**
Del 18 al 24 de agosto						
BELÉN GRANADA						
Cra 74 con calles 27-28		87,90	0,30	0,20	5,27	
Cra 74 con calles 27-28		40,60	1,50	0,20	12,18	
Cra 74 con calles 27-28		5,70	0,30	0,35	0,60	**18,05**
PABLO VI						
Carrera 50A - Calle 120 y 114		11,00	1,45	0,20	3,19	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		17,00	0,95	0,20	3,23	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		33,80	0,35	0,30	3,55	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,20	0,35	0,50	0,21	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		26,80	0,35	0,30	2,81	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,20	0,35	0,50	0,21	**13,20**
Del 25 al 31 de agosto						
PABLO VI						
Carrera 50A - Calle 120 y 114		9,30	0,35	0,30	0,98	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		13,20	0,85	0,20	2,24	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		31,00	1,00	0,17	5,27	
Carrera 50A - Calle 120 y 114		31,00	0,35	0,50	5,43	**13,92**
PEDREGAL						
Calle 101C - Carrera 76 y 72		22,60	1,69	0,15	5,73	
Calle 101C - Carrera 76 y 72		22,60	0,35	0,50	3,96	**9,68**
				Subtotal		**107,42**
				TOTAL		**107,42**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF								HOJA N°	33
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-8	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de concreto de 21 Mpa de tres caras y juntas ranuradas para instalación en curvas de rebajes. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 40 cm.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







LOCALIZACIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Del 4 al 10 de agosto			
LA CANDELARIA - SAN DIEGO			
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		61,90	**61,90**
Calle 31 - Carrera 42B y 42A		12,23	**12,23**
POBLADO - LOMAS			
Carrera 31A - Calle 11 y 11A		42,40	**42,40**
PABLO VI			
Carrera 50A - Calle 120 y 114		6,50	**6,50**
Del 18 al 24 de agosto			
VILLA DE ABURRÁ			
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		13,00	**13,00**
LA CANDELARIA - SAN DIEGO			
Carrera 42A - Calle 31 Av Las Palmas		45,00	**45,00**
BELÉN GRANADA			
Cra 74 con calles 27-28		8,10	**8,10**
PABLO VI			
Carrera 50A - Calle 120 y 114		9,00	**9,00**
Del 25 al 31 de agosto			
VILLA DE ABURRÁ			
Carrera 82A - Calle 32 y 32E		93,50	**93,50**
PABLO VI			
Carrera 50A - Calle 120 y 114		1,60	**1,60**
Subtotal			**293,23**
TOTAL			**293,23**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	34
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE 12	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y aplicación manual de pintura plástico en frío sobre superficie de concreto.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
BELÉN GRANADA	7	3,36	0,40	9,41	
BELÉN GRANADA	1	2,36	0,40	0,94	
BELÉN GRANADA	1	2,49	0,40	1,00	
BELÉN GRANADA	1	7,60	0,40	3,04	
BELÉN GRANADA COBRADO EN ACTA 9				-7,20	
BELÉN GRANADA	9	2,52	0,40	9,07	**16,26**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	35
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE 13	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de anden Deck elevado en madera plástica color a definir, incluye largueros para la estructura, estacones de apoyo embebidos en pilotes, incluye excavación y vaciado de pilotes y todos los elementos para su correcta instalación.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
Del 11 al 17 de agosto					
LAURELES - ACACIAS		16,50	1,35	22,28	**22,28**
Del 25 al 31 de agosto					
LAURELES - LORENA		4,10	1,35	5,54	
LAURELES - LORENA		4,10	1,35	5,54	
LAURELES - LORENA		3,00	1,30	3,90	**14,97**
Subtotal					**37,25**
TOTAL					**37,25**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	36
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	4/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	OE-14	DESCRIPCIÓN	Reubicación de redes hidráulicas. Comprende el suministro, transporte e instalación de tubería PVC, accesorios (codos, uniones, etc.), empalmes, pruebas hidráulicas, limpieza y verificación del correcto funcionamiento del sistema.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
REPARACIÓN DE DAÑOS REALIZADOS	600,00	600,00
