CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2019-1783

"REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA 4 ORIENTAL"

INFORME No.01 – COMPONENTE DE OBRA

PERIODO DEL 24 OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2.019



BOGOTÁ D.C. - NOVIEMBRE 2019

GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S.

INFORME No.01 – COMPONENTE DE OBRA

Versión 0

PERIODO DEL 24 OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2.019

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2019-1783, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. ZONA 4 ORIENTAL.

"REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA ORIENTAL"

BOGOTA D.C. - NOVIEMBRE DE 2019

TABLA DE CONTROL

ELABORÓ **JANINA MALAVER** **Residente de proyecto** _____	**FECHA** **24 octubre– 23 de noviembre de 2019**	**VERSIÓN** **V.0**
ELABORÓ **OMAR LEAL** **Residente de proyecto** _____	**FECHA** **24 octubre– 23 de noviembre de 2019**	**VERSIÓN** **V.0**
REVISÓ **VIRGINIA URBINA RESTREPO** **Directora de proyecto** _____	**FECHA** **24 octubre– 23 de noviembre de 2019**	**VERSIÓN** **V.0**

CONTENIDO

INTRODUCCION 5

DATOS CONTRACTUALES 6

DOCUMENTOS LEGALES DEL CONTRATO 7

1.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 7
1.2. PÓLIZAS 7

LOCALIZACION 8

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8

PERSONAL Y MATERIALES 9

3.1. PERSONAL DE OBRA QUE LABORO DURANTE EL PERIODO 9
3.2. TRABAJOS POBLACIÓN VULNERABLE 10
3.3. FABRICANTES Y MATERIALES 11
3.4. AMBIENTE DE TRABAJO 11
3.5. TELÉFONO DE CONTACTOS 12
3.6. ENSAYOS DE INSPECCIÓN DE GARANTÍAS 12

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 13

4.1. GENERALIDADES 13
4.2. INFORMES MENSUALES EJECUTIVO 13
4.3. AVANCE DE OBRA 13
4.4. IDS RECIBIDOS PARA INSPECCIÓN 15
4.5. CANTIDADES FACTURADAS DE OBRA 16
4.6. AVANCE DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS 16
4.7. CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 16
4.8. CONTROL FINANCIERO COMPONENTE DE OBRA 17
4.9. CONTROL FINANCIERO COMPONENTE DE CONSULTORÍA 18
4.10. ESTADO DE PAGOS DEL CONTRATO (OBRA Y CONSULTORÍA): 18
4.11. CANTIDADES PORCENTUALES POR CADA ID 19
4.12. REPORTE DE SEÑALES RETIRADAS DE LA VÍA Y ENTREGADAS AL ALMACÉN-SDM 19
4.13. REPORTE DE SEÑALES IMPLEMENTADAS AL ALMACÉN DE LA SDM 19

REPORTE DE GEORREFERENCIACION 19

5.1. REPORTE GEORREFERENCIACIÓN 19

DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO 20

6.1. ACTA DE COMITÉ 20
6.2. BITÁCORA DE OBRA 20
6.3. CORRESPONDENCIA 20

INFORME SOCIAL 20

7.1. INTRODUCCIÓN 20
7.2. OBJETIVO GENERAL 21
7.3. PERSONAL VULNERABLES. 22
7.4. POBLACIÓN BENEFICIADA. 33
7.5. INFORME DE VINCULACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE. 34

INFORME SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 34

8.1. INTRODUCCIÓN 34
8.2. ACTIVIDADES SG SST 35
8.3. ACTIVIDADES SG SST 36
8.4. CONCLUSIONES 38

REGISTRO FOTOGRAFICOS 39

9.1. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 39

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 53

10.1. CONCLUSIONES 53
10.2. COMENTARIOS 53

INTRODUCCION

La Secretaría Distrital de Movilidad, bajo el proceso de selección SDM-LP-026-2018, adjudicó a GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S, el contrato 2019-1783, con el objeto "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"; para la zona cuarta – oriental,

El contrato suscrito a través del contrato 2019-1783, se está implementado principalmente en las siguientes localidades de la Ciudad de Bogotá D.C.:

NUMERO DE ZONA	NOMBRE DE ZONA	LOCALIDADES
CUARTA	ORIENTAL	2 Chapinero 3 Santa fe 14 Los Mártires 15 Antonio Nariño 16 Puente Aranda 17 La Candelaria

A continuación, presentaremos el informe pertinente, y correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 24 de octubre al 23 de noviembre del 2.019, del componente de obra, y correspondiente a lo enunciado en el numeral 4.3.13, del anexo técnico.

DATOS CONTRACTUALES

	CONTRATO N.º 1783 de 2019
OBJETO CONTRACTUAL	*REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.- ZONA 4 ORIENTE"*
CONSULTORÍA Y OBRA	GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S NIT: 900.515.890-4 REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO QUIROGA SALINAS TELÉFONO: (1) 7552783 - 3138911755 EMAIL: rplegal.cmv@gmail.com CRA 19 N° 166 - 52 BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA	INTERSA S.A. CONTRATO: 1708-019 REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL VICTORIA LEON TELÉFONO: 2852683 (315)-3384341 EMAIL: senalizacionsdm@intersaingenieria.com CLL 24 A N° 25 - 20 BOGOTÁ D.C.

DOCUMENTOS LEGALES DEL CONTRATO

1.1. Documentos contractuales:

PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES INICIO DEL CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2019 FINALIZACION DEL CONTRATO 23 DE AGOSTO DE 2020	**VALOR INICIAL**	CUATRO MIL SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA, A.I.U. Y DEMÁS IMPUESTOS Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS $ 5.305.000.000 DONDE $ 422.104.019 CORRESPONDE AL COMPONENTE DE CONSULTORÍA, $ 210.656.800 PARA SUMINISTRO Y $ 4.672.239.181 PARA EL COMPONENTE DE OBRA.

(En el anexo 1, adjuntamos copia del anexo complementario del contrato).

1.2. Pólizas


AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA DESDE – HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 265.250.000.00	03/09/2019 AL 03/07/2020
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 265.250.000.00	03/09/2019 AL 03/07/2020
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 265.250.000.00	03/09/2019 AL 03/07/2020
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 265.250.000.00	03/09/2019 AL 03/07/2020
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 265.250.000.00	03/09/2019 AL 03/07/2020
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 265.250.000.00	03/09/2019 AL 03/07/2020
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 1.591.500.000.00	03/09/2019 AL 03/01/2021
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.591.500.000.00	03/07/2019 AL 03/01/2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 1.591.500.000.00	6 MESES Y DOS DIAS
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 1.061.000.000.00	03/09/2019 AL 03/07/2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$ 1.591.500.000.00	SI AMPARA 5 AÑOS, HASTA O MESES, Y O DIAS

(En el anexo 2, relacionamos copia de las pólizas del contrato)

LOCALIZACION

2.1. Localización general del proyecto

El presente contrato será desarrollado en la ciudad de Bogotá D.C., en la Zona Oriental (Zona 4), en las localidades de chapinero, Santa fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y La Candelaria. La intervención se realizará sobre el espacio público o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclo rutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros).

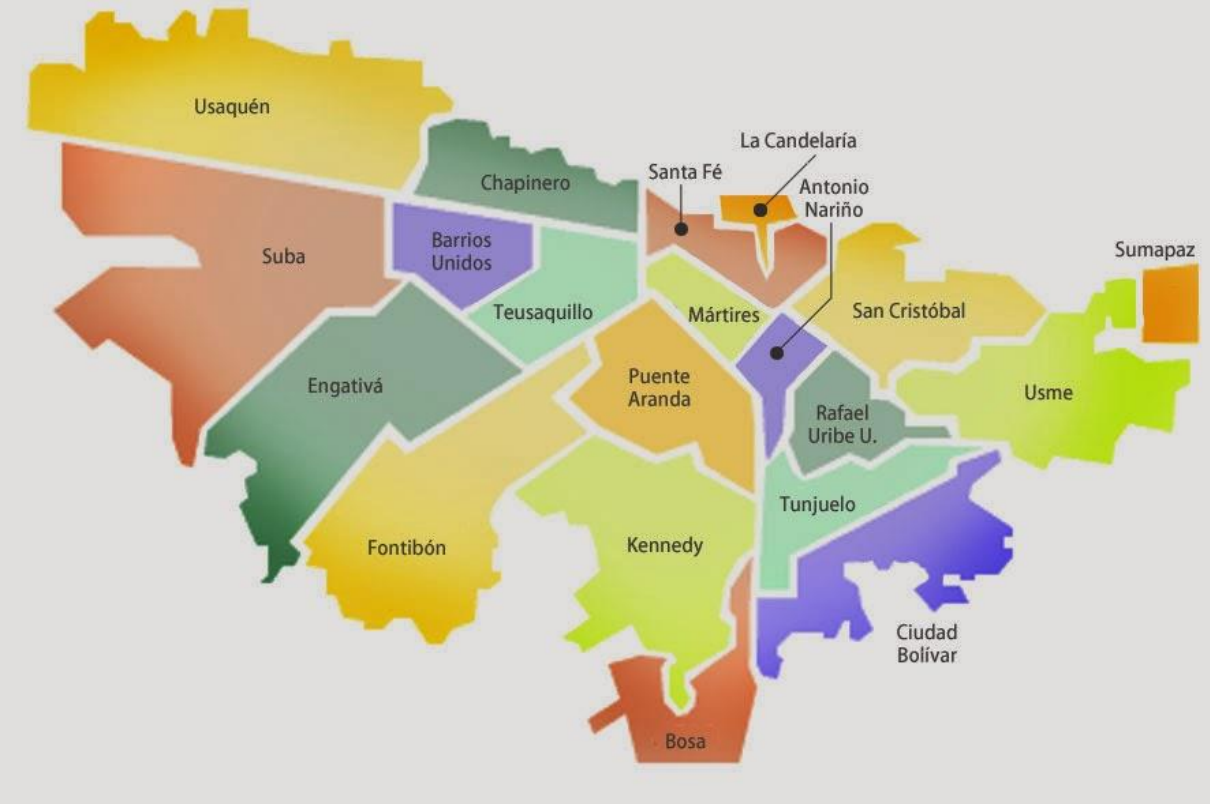

Fuente: (F. Google – Imágenes) Elaboración propia

Las Localidades correspondientes a la zona oriental (Zona 4) de la Ciudad de Bogotá son:

N.º	DESCRIPCION DE LA ZONA	N.º LOCALIDAD
1	Chapinero	2
2	Santa Fe	3
3	Los Mártires	14
4	Antonio Nariño	15
5	Puente Aranda	16
6	La Candelaria	17

PERSONAL Y MATERIALES

El personal y los materiales suministrados para el proyecto se realizaron de acuerdo con los requerimientos contractuales:

3.1. Personal de obra que laboro durante el periodo

A continuación, presentaremos el personal propuesto para la ejecución del contrato:

COMITÉ EJECUTIVO	
Gerente de proyecto	Ing. Pedro Quiroga
PERSONAL CLAVE ASIGNADO	
Director de proyecto	Ing. Virginia Restrepo Urbina
Especialista de transito	Ing. Jenny Patricia Morales
Residente de obra 1	Ing. Janina Malaver
Residente de obra 2	Ing. Omar Leal
Residente de obra 3	Ing. Sergio Torres
Trabajador Social	Jennifer Calderón Ángel
SST	Kemi Lank

Georreferenciación 1	Arq. Jessica Lamk Juerzony
Conductor 1	Andrés Casas
Conductor 2	Daniel Alberto Castro Moreno
Conductor 3	José David González Ortiz
Secretaria	Arlem Adriana Rico Ruiz
PERSONAL OPERATIVO	
Cuadrilla 1	Fernando Ortiz (horizontal)
Cuadrilla 2	Ángel Pompeyo (horizontal)
Cuadrilla 3	Jorge Alberto Monroy (horizontal)
Cuadrilla 4	VRC (verticales)
Cuadrilla 5	EB (Dispositivos)
Cuadrilla 6	VRC (horizontal)
Cuadrilla 7	VRC (Dispositivos)
Cuadrilla 8	Noé Quiroga (Dispositivos-Horizontal)

En el anexo 3: relacionamos documentos de seguridad social del personal que laboro durante el desarrollo del contrato.

3.2. Trabajos población vulnerable

A continuación, relacionamos el personal inscripto como parte de la población vulnerable:

ARLEM ADRIANA RICO RUIZ	52989153
CARLOS ENRIQUE CUELLAR QUIÑONEZ	1022434324
FABIAN STEVEN TELLEZ GARZON	1072717502
JESSICA MARIA LAMK GUERZONI	1090496980
JHOJAN STIVEN OSORIO HURTADO	1020474578
MILTON BAUTISTA RINCON	79329956
SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA	1098744265

3.3. Fabricantes y materiales

A continuación, relacionamos los fabricantes y/o distribuidores de los materiales más representativos que se utilizaran en el contrato:

DESCRIPCIÓN	MARCA Y PROOVEDOR
Pintura plástica en frio	Pintuco
Pintura base solvente negra	Novaflex
Microesferas	Novaflex / Echostar 5
Delineado vial integral amarillo	E&M
Tachón reflectivo bidireccional	PROGEN productos generales S.A.
Estoperoles con Espigo	Total Manufacturing S.A.S.
Marcadores reflectivos	Hersan Hi-tech in Plastics
Estoperoles Metálicos con espigo	Industrias ASTRO S.A.S.
Tachas reflectivas	Seguridad Vial T&G
Tachones	Reflex
Maletines	Efex Port S.A.S.
Conos	Pasten Pac

3.4. Ambiente de trabajo

Ambiente de oficina-principal y Bodegas de producción de señalización.	Oficina y Bodega principal ubicada en la Carrera 19 No. 166-52 Barrio Toberín – Bogotá -Colombia. Teléfono de contacto: (057)+1+7552782

3.5. Teléfono de contactos

A continuación, relacionamos los teléfonos de contactos del personal propuesto:

Representante legal	Pedro Quiroga	(313) 891-1755
Director de obra	Virginia Urbina Restrepo	(310) 466-2810
Especialista de transito	Jenny Patricia Morales	(321) 312-7884
Residente de obra	Janina Malaver	(313) 368-4981
Residente de día	Omar Leal	(310) 3133054
Georreferenciador	Jessica Lamk Juerzoni	(321) 897-9588
SST	Kemi Lank	(313) 8914274
Social	Jennifer Calderón	(323) 2346573

3.6. Certificados de calidad

En el anexo 4, adjuntamos certificados de calidad de los productos utilizados.

.

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

4.1. Generalidades

Los recursos asignados para el desarrollo del contrato 2019-1783 asciende a la suma de $ 5.305.000.000, discriminados de la siguiente manera:

Valor componente de obra	$ 4.672.239.181
Valor suministros	$ 210.656.800
Valor componente de diseño	$ 422.104.019
Total, de recursos contrato 2019-1783	$ 5.305.000.000

4.2. Informes mensuales ejecutivo

Durante el periodo de desarrollo se presentaron cuatro informes ejecutivos, los cuales los relacionamos en el anexo 5.


4.3. Avance de obra

A continuación, relacionamos los avances de obra porcentuales presentados en el periodo:


SEMANA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	fecha inicio	fecha final
SEMANA 01	$ 47.253.832	$ -	24/10/2019	29/10/2019
SEMANA 02	$ 102.383.303	$ 46.538.200	30/10/2019	5/11/2019
SEMANA 03	$ 149.637.135	$ 56.732.748	6/11/2019	12/11/2019

SEMANA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	fecha inicio	fecha final
SEMANA 04	$ 204.766.606	$ 56.732.748	13/11/2019	19/11/2019
SEMANA 05	$ 244.144.799	$ 56.906.046	20/11/2019	26/11/209

diferencia	% programado	% avance
-1,03%	1,03%	0,00%
-1,28%	2,23%	0,95%
-2,04%	3,06%	1,03%

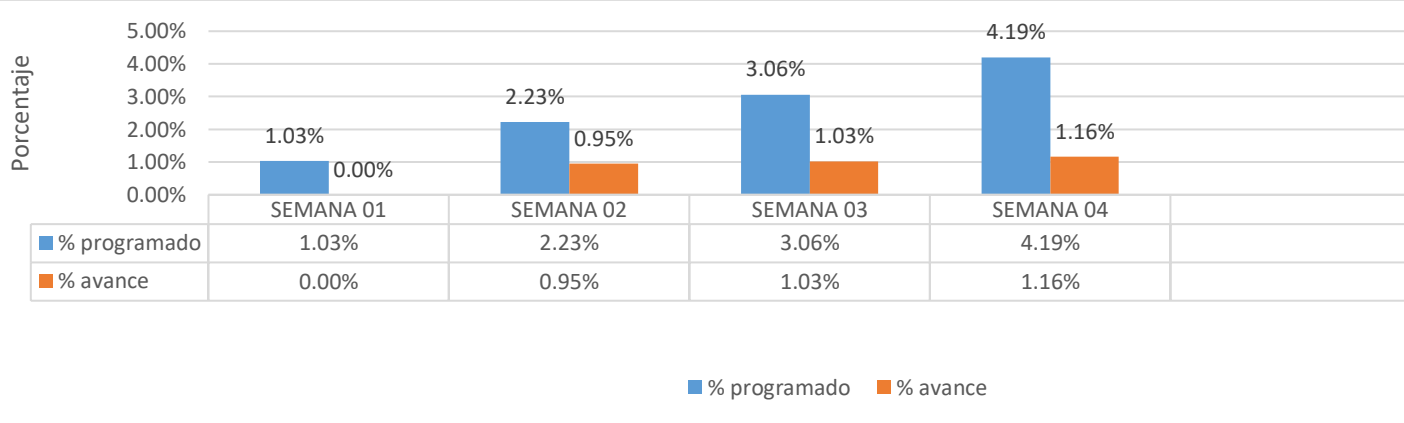

diferencia	% programado	% avance
-3,03%	4,19%	1,16%
-3,83%	5,00%	1,17%

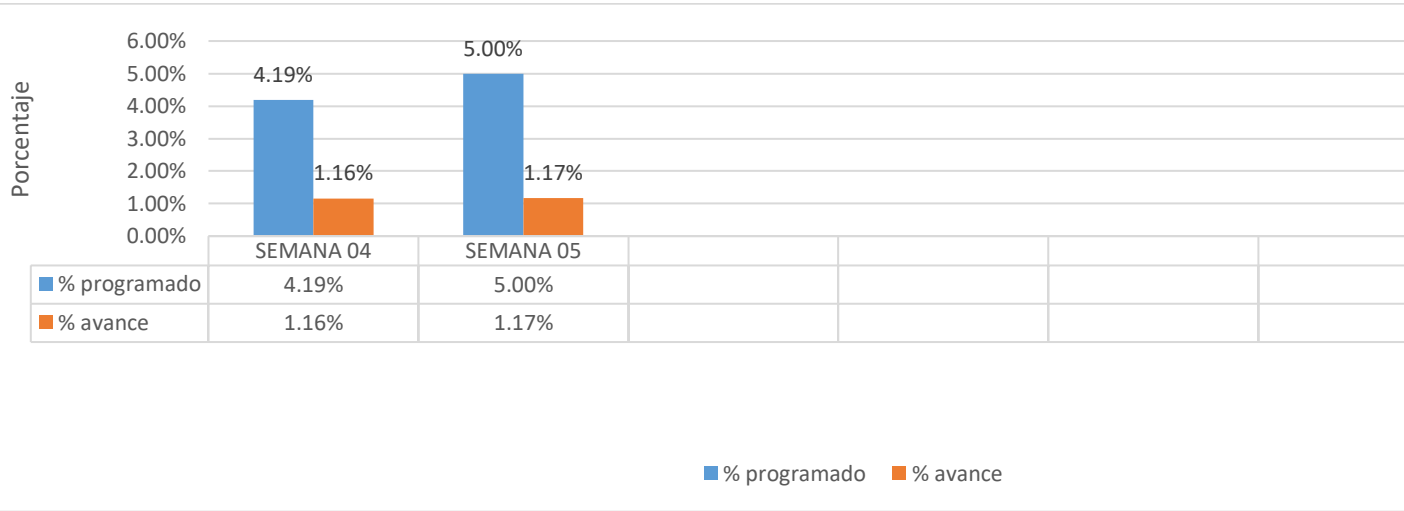

4.4. IDS Recibidos para inspección

La SDM suministró la localización de la señalización a implementar a través del repositorio de información, la cual se actualizó una vez se realizó la verificación e inspección en campo.

En las actividades de inspección, ubicación y validación se ha contado con el acompañamiento permanente de los residentes por parte de la Interventoría, atendiendo las observaciones particulares para cada punto en cuanto a su localización y replanteo, sin que en ningún ID se objetara su localización.

Paralelamente a esta inspección, se desarrolló las fichas de garantías de cada uno de los Ids, los cuales quedan registros en forma física.

Los siguientes fueron los Ids prioritarios recibidos durante el periodo, y relacionamos en la hoja de vida del contrato (ver anexo 6):

EX_01_354_1842_12
EX_02_158_10_V0
EX_02_033_1556_10
EX_01_168_1794_10
CPS_676_MV_01_04
EX_01_351_1842_12
SUMINISTRO MALETINES
PASACALLES+SEÑAL
MV_02_185_1556_10_v12
MV_16_169_1249_11_V7
MV_16_116_1747_10_V15
EX_03_080_1881_12_V3
EX_14_111_670_11_V3
EX_02_192_1881_12_V7
EX_16_188_1881_12_V1

EX_02_240_575_11_V6
CIRCUNVLAR CLL59

De igual manera, se recibieron el siguiente Id normales:

MV_11_221_988_09

4.5. Cantidades facturadas de obra

Adjuntamos en el anexo 7 las cantidades facturadas durante el periodo, y correspondiente al formato MI-FA-14-ACTA DE CANTIDADES, y correspondiente al corte No. 1 de obra, debidamente aprobadas por la interventoría del contrato.

A la fecha no se ha suscrito con la entidad ningún Acta de Modificación de Cantidades, manteniendo así las condiciones contractuales del inicio.

4.6. Avance de Actividades implementadas

A continuación, relacionamos cada uno de los Ids implementados durante el periodo del informe:

No.	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	EX_02_033_1556_10	Vertical y Horizontal	Chapinero	(1) Y CL 99 ENTRE KR 14 Y EL VOLTEADERO ; (2) CLL 95 KR 15 Y16 ; (3) KR 16 ENTRE CLL 94 Y 94 A ; (4) Cll 95 ENTRE 11-11 A
2	EX_01_168_1794_10	Vertical y Horizontal	Usaquen	(1) CLL 121 DESDE K 7 HASTA 7 A
3	EX_01_351_1842_12	Vertical y Horizontal	Usaquen	(1) KR 13 DESDE CALLE 122 HASTA CALLE 123
4	CPS_676_MV_01_04	Vertical y Horizontal	Usaquen	(1) CL 119A ENTRE AK 7 Y AK 9

4.7. Cantidades ejecutadas en el periodo

A continuación, relacionamos las cantidades ejecutadas durante el periodo de ejecución (Nota: Los unitarios, tiene incluido el AIU):

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	Descripción	COSTO UNITARIO (INCLUYE COSTO DIRECTO MÁS AIU)	CANTIDAD	Valor [$]
0	UND	SUMINISTRO			
1S	UND	Suministro de cono vial construido en matarial sintetico flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	$ 53.743	200,00	$ 10.748.600
2S	UND	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	$ 357.896	100,00	$ 35.789.600
				TOTAL	$ 46.538.200

4.8. Control financiero componente de obra

A continuación, relacionamos el control financiero del componente de obra:

CONTROL FINANCIERO DE OBRA CONTRATO 2019-1783- ZONA ORIENTAL

VALOR INICIAL		$ 4.672.239.181
SUMINISTROS		$ 210.656.800

PAGOS EFECTUADOS	PERIODO	COSTO DIRECTO	AIU	COSTO BÁSICO (Redondeado al peso)	RETEGARANTÍA (5%)	SUMINISTROS	TOTAL A GIRAR	TOTAL
Pago No. 1	24/10/2019 al 23/11/2019	$ 46.538.200	$ -	$ 0	$ 2.326.910	$ 46.538.200	$ 44.211.290	$ 46.538.200
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 46.538.200	$ 0	$ 0	$ 2.326.910	$ 46.538.200	$ 44.211.290	$ 46.538.200

SALDO POR FACTURAR	$ 4.838.684.691	99,09%

4.9. Control financiero componente de consultoría

Durante este periodo no se presentó ningún cobro del componente de consultoría:

CONTROL FINANCIERO DE OBRA CONTRATO 2019-1783- ZONA ORIENTAL

Valor de Consultoria		$ 422.104.019			
PAGOS	PERIODO	COSTO BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00
Total		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SALDO POR FACTURAR	$ 422.104.019	100,00%

4.10. Estado de pagos del contrato (Obra y Consultoría):

A continuación, relacionamos el control financiero y consultoría del contrato:

ANEXO 2 ACTA DE PAGO No.01

CONTROL FINANCIERO OBRA Y CONSULTORIA CONTRATO No. 2019-1783

VR INICIAL CONTRATO	$	5.305.000.000
VR. OBRA	$	4.672.239.181
VR. SUMINISTRO	$	210.656.800
VR. DISEÑO	$	422.104.019
VR TOTAL	$	5.305.000.000

ACTA No.	PERIODO	% OBRA	% CONSULTORIA	VALOR ACORDADO A DESCONTAR PARA TRAMITE DE ACTAS	VR. FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	OBSERVACIONES
1	24/10/2019 al 23/11/2019	0,88%	0,00%	$ 2.326.910	$ 46.538.200	$ 5.258.461.800	cuenta No.01
2		0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ 5.258.461.800	
3		0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ 5.258.461.800	
4		0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ 5.258.461.800	
5		0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ 5.258.461.800	
6		0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ 5.258.461.800	
7		0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ 5.258.461.800	
8		0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ 5.258.461.800	
9		0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ 5.258.461.800	
10		0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ 5.258.461.800	
TOTALES		0,88%	0,00%	$ 2.326.910	$ 46.538.200	$ 5.258.461.800	

4.11. Avance porcentual por cada ID

En el anexo 8 relacionamos avance porcentual ejecutadas durante el periodo por cada uno de los IDS.

4.12. Reporte de señales retiradas de la vía y entregadas al almacén-SDM

Durante el periodo del presente informe, no se entregó a la SDM señales provenientes de la vía.

4.13. Reporte de señales implementadas al Almacén de la SDM

En el anexo 9, relacionamos el formato P01-PR12-F02 FORMATO DE REQUERIMIENTO DE ALMACEN, correspondiente al periodo del desarrollo.

REPORTE DE GEORREFERENCIACION

A continuación, presentamos la gestión realizada como parte del componente de georreferenciación:

5.1. Reporte georreferenciación

Durante el periodo del 24 de octubre al 23 de noviembre del 2.019, no se presentó ningún reporte de georreferenciación.

DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO

A continuación, presentamos los documentos de seguimiento desarrollados durante el periodo:

6.1. Acta De comité

En el anexo 10, se relacionan las actas de comités celebradas durante el periodo. de desarrollo.

6.2. Bitácora de obra

En el anexo 11, se relacionan copia de la bitácora diligenciada durante el periodo. de desarrollo.

6.3. Correspondencia

En el anexo 12, se relacionan copia de la correspondencia recibida y enviada durante el periodo. de desarrollo.

INFORME SOCIAL

A continuación, presentamos la gestión realizada como parte del componte social, y sujeto a periodo correspondiente:

7.1. Introducción

El área Social del consorcio de Movilidad Gestión Vial SAS realizó en el siguiente informe una trazabilidad de las actividades ejecutadas en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2019-1783, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE

MOVILIDAD CELEBRADO Y GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. ZONA 4 ORIENTAL., cuyo objeto se describe a continuación: "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA ORIENTAL", que permitió gestar la trazabilidad pertinente y las socializaciones con las comunidades en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización aprobados donde se requirió señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad.

En el presente informe se relaciona las acciones ejecutadas desde el área Social durante el proceso.

En el anexo 13, relacionamos las reuniones sociales correspondiente al formato PA01-PR01FF02.

7.2. Objetivo general

A continuación, relacionamos los nombres de las instituciones educativas, dirección, y número de alumnos beneficiados:

Desarrollar y ejecutar un plan secuencial de socialización / divulgación de las acciones de señalización materializadas en desarrollo de la obra, con especial énfasis en señalización vial, medidas de pacificación, pintura vial, parqueadero para patinetas; y la mitigación de puntos de accidentalidad, zonas escolares, medidas de gestión y lo que ello conlleve.

Objetivos Específicos

- Realizar acercamiento con la comunidad con el fin de divulgar los diseños de señalización a implementar y plasmar en las actas lo socializado.
- Adelantar en forma conjunta con la Interventoría o con el ingeniero de la zona de la SDM, las JAL, las juntas de Acción Comunal o representantes de la comunidad de los diferentes barrios reuniones de trabajo, con el objetivo de identificar puntos de alta accidentalidad en la zona o necesidades en materia

de señalización y remitirlos al especialista de tránsito o al ingeniero de diseño con el objetivo de determinar su viabilidad para su posterior implementación.

- Llevar registros y actas de las acciones adelantadas y entregar informes periódicos a la Interventoría y SDM.
- En coordinación con los Ingenieros Residentes presentaran informe periódico de las actividades desarrolladas para el cumplimiento y desarrollo del objeto del contrato.

7.3. Personal Vulnerables.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el numeral anterior, se presenta la trazabilidad realizada durante la ejecución del proyecto:

Fecha	Localidad	ID	Descripción
21 octubre de 2019	**CHAPINERO**	**Kr 14 #99-33**	Reunión con el funcionario encargado del Ministerio de Trabajo, el señor Oswaldo Duran con quien se concerta el desplazamiento de la señalización de bomberos dos metros, para señalizar la cebra en la esquina. El acta fue remitida a la Interventoría para revisión y seguimiento.
22 de octubre de 2019	**CHAPINERO**	**EX_02_033_1556_10 Kr 14 entre Cll 97 y 97 a Cll 94 y 94 a con Kr 16 Cll 96 entre Kr 17 AV NQS**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad acerca de las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico Y el objetivo de la obra que es mejorar la seguridad vial del sector, se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Se realiza la reunión con el señor Mario Cortes edificio1497, Alejandro Betancourt, José Bonilla Conjunto parque 98, Luisa Sandoval edificio 14x97 , Juan Delgado conjunto parque 94, Omar Escocia

			Conjunto Alcalá 94, German Álvarez Edificio Regency, Ever Ducuara conjunto Planeco, José Gómez Conjunto Proinve y Trocadero y el señor Alfonso Zuluaga Edificio Orión. En el ID de la Cll 96 entre Kra 17 Av NQS el administrador del edificio Orion solicita la señalización o un semáforo en el cruce de la AV 9con Cll 95, ya que transitan muchos peatones que no se acercan al peatonal y se presentan diariamente accidentes. Se realiza contacto telefónico o envió de notificación de correo electrónico a los administradores de los edificios donde no fue posible socializar la obra. Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento.
23 de octubre de 2019	**CHAPINERO**	**EX_02_033_1556_10 Cll 94 A desde Kr 13 hasta Kr 11**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad acerca de las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. La reunión se realiza con la señora Keydis Orozco administradora del restaurante Brunoise, Diana Mateus Parilla Farándula, Sonia Delgado Edificio E94, Patricia Álvarez Edificio VOV, Paola Méndez Edificio Ágora. Se realiza contacto telefónico o envió de notificación de correo electrónico a los administradores de los edificios donde no fue posible socializar la obra. Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento
31 de octubre de 2019	**CHAPINERO**	**EX_02_033_1556_10 Kr 14 entre Cll 93B y Cll 94** **Kr 18 entre Cll 91 y Cll 90** **Kr 17 entre Cll 90-91-92**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad acerca de las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Se realiza entrega de volantes para difundir la información con los residentes.

		Cll 93 entre Kr 16 y Kr 17	Se realiza contacto telefónico o envió de notificación de correo electrónico a los administradores de los edificios donde no fue posible socializar la obra. Se realiza reunión en Medplus, Leidy Moreno Memorial Busines Center, Nataly Arias Edificio Oficina 93b, Martha Ochoa OIM, Julio Becerra Conjunto Plaza 94, Oscar Caro Edificio 94-44, Ángela Martínez Restaurante secretos de la tía. En otro punto de los ID señalados se socializa con Narces Montes Conjunto Alcalá, Luis Pérez conjunto ciudad de Pereira, Alejandro Parra Paseo Chico, Carla Gómez Ikaria, Jeimy Lagos Bodytech, Miguel Martínez Conjunto área 91. La señora de la OIM manifiesta que por ser un organismo internacional tiene un espacio privado de parqueo solicitando q sea respetada. También un miembro de la comunidad solicita el espacio para parqueadero de bicicletas. Se realiza contacto telefónico o envió de notificación de correo electrónico a los administradores de los edificios donde no fue posible socializar la obra o responsables interesados en la información Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento
31 octubre 2019	**CHAPINERO**	**EX_02_033_1 556_10 Cll 93 kra 16 y kr 17 Kra 17 entre Cll 91 Cll 92**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad acerca de las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Se realiza entrega de volantes para difundir la información con los residentes. Se realiza la reunión con Andrés Gómez Asociación egresados de los Andes, Luis Ormaza conjunto La Encenada chico, Jaime Henao conjunto Urapan, Aurora González edificio Zenoflice, Karen Delgado edificio Indra, Mauricio Caro Asociación Colombiana de Universidades.

			En otro ID se realiza el encuentro con Marínela Almanza edificio Infinity, Carlos Uribe Hotel Blue suite, Erika Tafur edificio Ecotower 93 y Viviana García edificio Grunental. Un miembro de la comunidad solicita tener en cuenta el espacio de ubicación del parqueadero de patinetas ya que manifiesta que la vía es muy estrecha. Se realiza contacto telefónico o envió de notificación de correo electrónico a los administradores de los edificios donde no fue posible socializar la obra o responsables interesados en la información. Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento
1 Noviembre de 2019	**USAQUEN**	**EX_01_354_1842_12** **Kr 13 entre Cll 101 y Cll 103** **Kr 14 entre Cll 101- Cll 102**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad el objeto de la obra y las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Se realiza entrega de volantes para difundir la información con los residentes. La reunión se hace con el edificio Santa Ana, Roberth Jerez edificio Tabasco, Jhon Callejas Edificio Portal 103, Andrés Piñeros edificio San Lucar, Alejandro Salas Edificio Encantos Toscana. En el ID Kra 14 cll 101-102 se hace el encuentro con Vanesa Contreras Sociedad Colombiana de psicólogos, Jesica Martínez Zoovida, Alejandra Fonteche PEt, Soraya Naranjo Edificio fioere Homes, Francy Sachica ASCOFAME y edificio Morvan. Se realiza contacto telefónico o envió de notificación de correo electrónico a los administradores de los edificios donde no fue posible socializar la obra o responsables interesados en la información.

			Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento.
1 noviembre de 2019	**USAQUEN**	**CPS_676_MV_01_04 Cll 119 a entre Kr 7 y Kr 9**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad y comerciantes acerca del objeto de la obra y las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. La reunión participa Gonzalo Wilches cigarrería laches, Toyo Amado restaurante Tizón, Patrick Franco Restaurante Casa Nostra, Patricia Taborda Sopas y Sopitas, Oscar Iván Guarín Fundación Santa Fe y Jeison Moreno Cityparking. Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento.
1 noviembre de 2019	**USAQUEN**	**EX_01_168_1794_10 Cll 121 desde Kr 7 hasta Kr 7a**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad y comerciantes acerca del objeto de la obra y las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. La reunión se realiza con Vilma Sáenz Restaurante Sopas y carnes, María Jiménez Edificio Cll 121, Daniel Terraza, Karen Roa Giga Palmar SAS, Jorge Acevedo Cll 121 7ª-14 , Carlos Páez Cll 121 7ª -39, Damaris Mendoza Cll121 7ª -89 y Javier Villalobos Cll 121 7ª-93. Se realiza contacto telefónico o envió de notificación de correo electrónico a los administradores de los edificios donde no fue posible socializar la obra o responsables interesados en la información.
6 noviembre de 2019	**USAQUEN**	**EX_01_351_142_12**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad

		Kr 13 Cll 122 hasta 1Cll 23 -	acerca del objeto de la obra y las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Se realiza entrega de volantes para difundir la información con los residentes. En la reunión participa Martha Gómez administradora del edificio Santa Bárbara Nte Manzana D, Duqueiro Cortes edificio Santa Bárbara y la administradora Ana Cecilia Hermosa conjunto residencial Santa Bárbara manzana E, Quien manifiesta la importancia de implementar un semáforo en la Kr13 con Cll 122 debido al alto índice de accidentalidad, ya que hay mucho cruce vehicular, específicamente salida 6 Unicentro. Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento.
7 de noviembre de 2019	**CHAPINERO**	**EX_02_158_10_V0**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad acerca del objeto de la obra y las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Se realiza entrega de volantes para difundir la información con los residentes. Se informa a Néstor Vera Edificio la Estación, constructora Valor, José Rodríguez Torre Alcalá, Pedro Jiménez edificio el Coliseo, Angie Aguilar Edificio Torre 97, Cristian Reyes centro médico AK 98, Elizabeth Navas embajada China. Se realiza entrega de volantes para difundir la información con los residentes.

			Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento.
7 de noviembre de 2019	**SUBA**	**MV_11_221_988_09** **CLL 139 entre Av Suba y TV 127**	Se realiza reunión con los representantes de las Juntas de Acción Comunal JAC de los Barrios San Juan, Las Flores, Isla Puerta del Sol I y II, Tibabuyes sector 1, y Java, a quienes se le socializa el objeto y el alcance de la obra , se indica la importancia de adelantar acciones que permitan mejorar la movilidad de los ciclistas. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Los participantes del encuentro Sol Tovar, Carlos Rodríguez, Saúl Barreto, Osvaldo Sánchez, Luis Eduardo Beltrán, Consuelo Vaquero, Miguel Puentes y Mery Joya.
8 de noviembre de 2019	**CHAPINERO**	**EX_02_033_1556_10** **Cll 95 entre kr 11- 11 a** **Kra 11ª entre Cll 98 y 99**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad y comerciantes acerca de las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Se realiza entrega de volantes para difundir la información con los residentes La socialización se hace con Fanny espinel edificio Makiroll, Pedro Aguja Panny express, Rafael Garcia Edificio Los Alpes, Pedro Peña edificio Go Green, Martin Ramírez Martinika, Jaime Carvajal edifico Península, Julieta Portilla Ecomedic y Cityparking. En el ID de la Cra 11 se socializa con Isabel Moreno Biologa SAS, Julio Martínez Edificio ruta Chico, Madeleine Taborda Centro de especialistas, Carolina Salamanca Club de bienestar good, Sebastián Ortiz UOZO, José Meneses Edificio punto 99 y Maira Triana edificio Green Office Pijao.

			Se realiza contacto telefónico o envió de notificación de correo electrónico a los administradores de los edificios donde no fue posible socializar la obra o responsables interesados en la información. Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento.
13 de noviembre de 2019	**PUENTE ARANDA**	**MV 16_116_ 1747 _10_v15** **Tv 53 entre Cll 1 y Cll 3**	Se socializa a la comunidad, a los residentes y comerciantes acerca de las medida de pacificación vial que se implementaran en la zona como cebras, pasos peatonales, reductores de velocidad y medidas de señalización vial, que buscan reducir los niveles de accidentalidad para mejorar la seguridad vial. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. En la reunión participa Hernán Urbano Asadero los tronquitos, Daniel Romero asadero Alcaraván, Eduardo Mejía Tranv 53 # 2-19, Luz Dary Toro, Miryam Toro, Jorge Figueroa, Agustín Balcero y Wilson Bello WB Ferretería. La comunidad manifiesta que en la Tv 53 con 1 c no hay habilitado paso peatonal a las personas en condición de discapacidad y la señalización vial nos e visibiliza porque está detrás de árboles y una mejor señalización o un semáforo en el cruce en la segunda con TV 53 ya que se presentan accidentes diariamente. Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento.
13 de noviembre de 2019	**PUENTE ARANDA**	**MV_16_169_1 249_11_V7**	Se socializa a la comunidad, a los residentes y comerciantes acerca de las medida de pacificación vial que se implementaran en la zona como cebras, pasos peatonales, reductores de velocidad

		CLL 3 DESDE LA KR 53 D HASTA LA KR 50 costado sur	estoperoles y medidas de señalización vial, que buscan reducir los niveles de accidentalidad para mejorar la seguridad vial. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. El encuentro están el señor Jhon Giraldo Croma, Julio Vanegas Industrial Metálica, Mariela Ruiz Deposito de madera Av. 3ra, Herlinda Rincón, Marly Suarez expocristales, José Naranjo Ferretería, Elsa Olmos Cll 3ª 53-57. Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento.
15 noviembre de 2019	**USAQUEN**	**EX_02_240_575_11_V6 CLL 90 CON KR8**	Se realiza socialización a los administradores y encargados de los conjuntos residenciales acerca del alcance de la obra y las acciones de señalización vial vertical y horizontal las cuales buscan mejorar la seguridad vial y peatonal. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Se realiza entrega de volantes para difundir la información con los residentes Se socializa con Eliana García sports Gym, Walter Márquez edificio Soleri y Liliana Rozo edificio plaza de arcos Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento.
15 de noviembre 2019	**CHAPINERO**	**MV_02_185_1556_10_V2 K11 entre Cll 82 y Cll 100 costado occidental**	Se realiza socialización a los administradores de los edificios, a los encargados, a los comerciantes acerca del alcance de la obra y las acciones de señalización vial vertical y horizontal como

			pictogramas , paso peatonal, entre otros, los cuales buscan mejorar la seguridad vial y peatonal. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Se realiza entrega de volantes para difundir la información con los residentes de los edificios. El encuentro se realiza con Brayan López edificio Torre Amadeus, Loren Aranda Creeps y wafles, Martha Gómez edificio Once, Rosa Jiménez edificio Porvenir, Meyer Peña edificio Urban Plaza, Ricardo Ochoa Estelar parque de la 93, Miguel Garcia Edificio Breton Hill, Diego Díaz Louis Apt suite, María Torres edificio Bello Horizonte y Esteban Narváez edificio Surche. Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento
15 de noviembre de 2019	**CHAPINERO**	**EX_02_192_1881_12_V7 Cll 70 a entre kr 7 y kr 5**	Se realiza visita y socialización a los residentes, propietarios, administradores, guardas de seguridad acerca del objeto de la obra y las acciones de señalización vial, parqueadero de patinetas, acciones de pintura vial, borrado mecánico. Se informa que los trabajos serán realizados en un horario entre las 10:00 pm y 5:00 am. Se realiza entrega de volantes para difundir la información con los residentes. Los participante son Gustavo Peñaloza edificio Minerva, José Castro Edificio Ostelares, Luis Guevara edificio Portal Emaus II, Nohemí López Liberario, Humberto Santofimio edificio Cll 70ª 5 -66, Jon Álvarez edifico Emaus I, Franciso Jara Edificio Camino Emaus y Luis Machacon edificio Saturno. Se remite acta de reunión a la Interventoría para revisión y seguimiento
19 de noviembre 2019	**Usaquén**	**Consorcio de movilidad 053**	Teniendo en cuenta reunión y requerimiento del consorcio sobre informes y la contratación de población vulnerable, se informa lo siguiente:

			1. Informes sociales cronológicos: • Informe de 14 de octubre – 14 noviembre Sobre la ccontratación población vulnerable, identificar trazabilidad realizada a la fecha. Se identifica lo siguiente frente a la trazabilidad realizada a la contratación personal población vulnerable: • Se realiza revisión a algunos informes de la Profesional social anterior para identificar la trazabilidad realizada ante la situación, teniendo en cuenta que en los informes indica que se ha realizado la vinculación de la población vulnerable. • Solicitud del formulario ante la Secretaria de Desarrollo Económico para la inscripción del Consorcio Movilidad 053. • Diligenciamiento del formulario para inscripción del Gestión Vial Integral SAS ante la Secretaria de Desarrollo Económico. • Llamadas telefónicas, conversaciones por WhatsApp con la persona encargada para seguimiento de la información respecto a la base de datos. • Se establece comunicación con la secretaria de Desarrollo Económico a donde informan un No. de (WhatsApp) para efectuar dialogo con Laura Junca (funcionaria) Proceso a seguir contratación población vulnerable: • Dialogar con Laura, funcionaria de la SDDE para identificar proceso a seguir sobre personal población vulnerable.
			Se

22 de noviembre de 2019	**Trabajo administrativo**	**Gestión Vial Integral**	Informe

7.4. Población beneficiada.

Durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2019-1783, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD CELEBRADO Y GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S. ZONA 4 ORIENTAL., cuyo objeto se describe a continuación: "REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA ORIENTAL4 ORIENTAL", se logró identificar algunas instituciones beneficiadas, las cuales son:

La población beneficiada son los niños, niñas y adolescentes, que asisten a las instituciones educativas, por ende, sus familias y la comunidad que hace parte del sector que se intervino con la ejecución de la obra.

ID	Nombre del colegio	Localidad	Número de estudiantes
MV_11_221_988_09	Instituto Integrado de suba	Suba	240
MV_11_221_988_09	Colegio Winchester	Suba	280
MV_11_221_988_09	Instituto Gerwill	Suba	667
MV_11_221_988_09	Colegio Alberto Lleras Camargo	Suba	3009
MV_11_221_988_09	Gimnasio Académico Regional	Suba	2460
MV_11_221_988_09	Centro Alexander Fleming	Suba	1900
MV_11_221_988_09	Colegio San Adrián	Suba	90
MV_11_221_988_09	Colegio Antonio Granados	Suba	105
MV_11_221_988_09	Liceo Británico Superior	Suba	110
MV_11_221_988_09	Jardín infantil creando historias	Suba	30

7.5. Informe de vinculación población vulnerable.

Se está realizando el proceso de inscripción del consorcio ante la Secretaría de Desarrollo Económico, respondiendo al "cumplimiento del capítulo 3°, artículo 12, numeral 2.2." Certificación de la adopción de las acciones del Decreto 380 del 28 de septiembre de 2015, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. la cual permite la inclusión de personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con edad para trabajar, beneficiarios de procesos de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano –FTDH o mujeres con nivel de educación menor a universitario, jóvenes, mayores de 45 años y población en condición de discapacidad, adelantados por las entidades y organismos del Distrito Capital, ya sea de manera directa y/o a través de contratos o convenios suscritos para el efecto y, que estén domiciliados en Bogotá D.C"; anexos complementarios, aspectos generales en su numeral 2.6 que trata sobre la democratización de oportunidades económicas en el distrito capital; en la directiva 001 de 2011 y el anexo técnico numeral 4.5 vinculación de personal proveniente de la población vulnerable residente en la Ciudad de Bogotá, por tanto se anexa certificado de contratación la población beneficiaria expedido por Secretaría de Desarrollo Económico.

INFORME SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

A continuación, presentamos la gestión realizada como parte la seguridad industrial y salud ocupacional:

8.1. Introducción

El **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2019-1783,** tiene por objeto el *"REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.",* celebrado entre la Secretaria Distrital de Movilidad y gestión vial integral.

Dentro del contrato en mención cabe resaltar lo que es la Seguridad Industrial y la Salud ocupacional y la función que conlleva hoy en día en el desarrollo de las actividades que se realizan.

La Seguridad Industrial y la Salud ocupacional hoy conocida dentro del marco legislativo nacional como Seguridad y salud en el trabajo; es un campo necesario y obligatorio en todas las empresas y su principal objetivo es el de minimizar los riesgos en operación o en las actividades que se desarrollen ya sean de índole de producción o de servicios.

En el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2019-1783,** tiene por objeto el *"REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.",* celebrado entre la Secretaria Distrital de Movilidad y Gestión Vial integral, la Seguridad Salud en el Trabajo (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) cumple un papel muy importante en el desarrollo de las actividades puesto que se trabaja de forma segura, minimizando los riesgos y generando espacios de capacitación y formación al personal que participa en el mismo.

De igual manera se garantiza una ejecución de actividades de forma segura para personas ajenas a la operación (comunidad en general, transeúnte, ciclista y vehículos ajenos al mismo).

8.2. Actividades SG SST

Capacitaciones

Dentro del desarrollo de las actividades del El **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2019-1783,** tiene por objeto el *"REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.",* celebrado entre la Secretaria Distrital de Movilidad y Gestión Vial integral, se tiene enmarcado las capacitaciones al personar ya sea de índole operativo o administrativo.

Las capacitaciones que se realizaron fueron:

TITULO	TEMAS TRATADOS
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO	• Relaciones Personales • Carga y ritmo de trabajo • Cultura organizacional • Contenido del trabajo
RESBALOS, TROPEZONES Y CAÍDAS	• Características • Prevención de accidentes • Notificar e identificar riesgos
RIESGO PÚBLICO	• Vandalismo • Accidentes de tránsito • Atropellamientos • Trabajos Nocturnos
LOS EPP NO EVITAN ACCIDENTES	• Casco protector de la cabeza • Guantes de seguridad • Protección de la vista • Protección aparato respiratorio
ROMBO NFPA 704	• Riesgos a la salud • Riesgo de inflamabilidad • Riesgo de reactividad • Riesgos especiales

8.3. Actividades SG SST

Capacitaciones


Dentro del desarrollo de las actividades del El **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2019-1783,** se realizaron capacitaciones al personal del trabajo

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO GRUPO DE TRABAJO EN CAPACITACIÓN**

GRUPO DE TRABAJO EN CAPACITACION





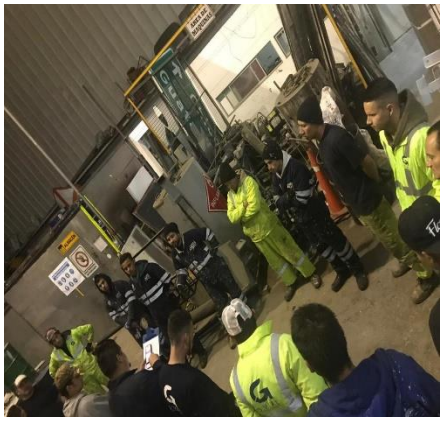



Como se evidencia en las imágenes dentro del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2019-1783,** tiene por objeto el *"REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.",* celebrado entre la Secretaria Distrital de Movilidad y Gestión Vial Integral, se viene desarrollando con las normas de seguridad vigentes dentro del contrato y el cual en manda la legislación laboral colombiana;

Uso obligatorio de:

- Dotación (según imagen del contrato) y cumpliendo con los visores de reflexión en las mismas prendas.

- Uso de Elementos de Protección Personal (Guantes, protector naso bucal, protector visual, protección para los pies) cumpliendo con las normas internacionales ANSI y de acuerdo a la Matriz de Elementos de Protección que maneja la compañía.

- Uso y manejo de los elementos canalizadores de transito PMT`S.

Actividades Realizadas:

- Se realizó charla de reforzamiento sobre Riesgo Público (riesgos de tránsito), en la cual se abordaron temas de vandalismo, robos, accidentes de tránsito.
- También se realizaron las siguientes capacitaciones: factores de riesgo psicosociales en el trabajo, los EPP no evitan accidentes, Rombo NFPA 704 (riesgos a la salud, riesgo de inflamabilidad, riesgo de reactividad, riesgos especiales)
- Se realizaron inspecciones epp de las cuadrillas y personal de contratistas, realizando diferentes charlas de seguridad y tomando registro de asistencia, así como el respectivo registro fotográfico.

8.4. Conclusiones

- Se cuenta con áreas totalmente señalizadas acorde a la actividad que se está ejecutando.
- Se evidencia orden y aseo en los frentes de trabajo.
- Se evidencia por parte del personal el buen uso de la Dotación y EPP suministrados para las actividades de la obra

- Se evidencia compromiso por parte del área operativa en el debido manejo de PMT y apoyo al auxiliar de tráfico.
- Se evidencia compromiso por parte del área operativa en el debido manejo de del punto ecológico, organizando, clasificando y disponiendo de manera adecuada todos los residuos y desechos generados.
- Se evidencia compromiso por parte del área operativo de mantener el punto ecológico de la Empresa en condiciones adecuadas de orden y aseo, así como de buenas disposición de los residuos generados en obra.

Se abordan temas de autocuidado y eliminar el exceso de confianza en las tareas y labores diarias en obra, ya que pueden ser factores de riesgo para la materialización de un accidente si no se aplica en las actividades operativas

REGISTRO FOTOGRAFICOS

A continuación, presentamos los registros fotográficos de las diferentes intervenciones

9.1. Registros fotográficos

Durante el periodo del 24/10/1029 al 23/11/2019, se tomaron los siguientes registros fotográficos:

Id: ex-01-168-1794-10/ direccion: Calle121 con kr7 entre 7ª

Antes



Antes



Antes



Durante



Despues



Despues



Despues



Despues



Despues



Despues



Despues



Despues



Id: id ex-02-033-1556- Cll 95 entre kr 15 y 16
Antes



Durante



Despues



Despues



Despues



Id: id. Ex-02-033-1556- Cll 95 kr11 y 11ª
Antes



Durante



Durante




Despues



id ex-02-033-1556-Cll 99 entre kr14 y volteadero
Antes



Durante

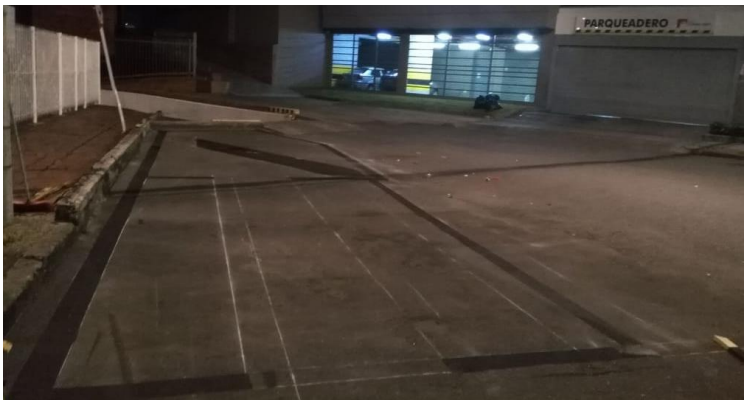

Id: ex-02-033-1556- cr15y16 calle 95
Durante:



Despues:



Despues:



Id: EX_01_351_1842_12- KR 13 DESDE CALLE 122 HASTA CALLE 123
Durante:



Durante:



Durante:




Despues:



Id: CPS -676-MV_01_04 –CLL 119 CR 7 A CR 9
Antes:



Antes:

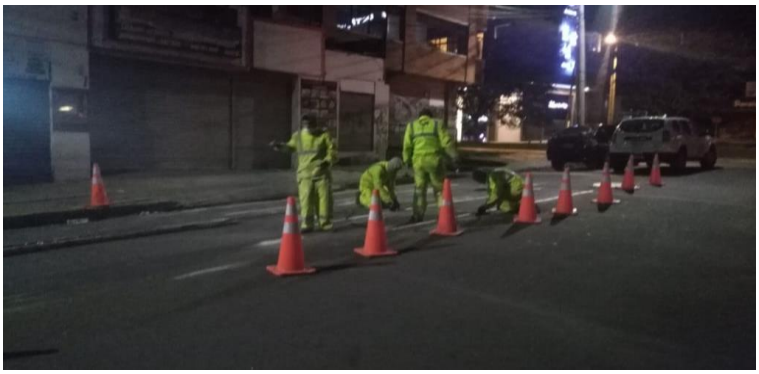

Durante:



Despues:



Despues



Despues



Despues



Id:id 01_354_1842_12- kr 11 b hasta ak 9
Antes:



Antes



Durante



CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

A continuación, presentamos las conclusiones y comentarios presentados durante el periodo de desarrollo.

10.1. Conclusiones

- A la fecha se han recibido en su mayor parte ID por emergencias (prioritarias), de acuerdo a las necesidades de la SDM., que no representan rendimientos importantes de desarrollo del contrato.
- Los Ids entregados para ejecución, no representaba económicamente la meta contractual del 5 %.
- La época invernal afecto considerablemente las metas de terminación de prioritarios, afectando sensiblemente el valor total de la cuenta de obra 1.
- El contratista presenta para revisión de interventoría presupuestos estimados en unos seiscientos millones, que serán parte de la ejecución del mes siguiente.

10.2. Comentarios

- Esperamos que la época invernal se supere para poder dar por finalizado los compromisos prioritarios de patinetas.
- De igual, manera al punto anterior, tener ritmo en la ejecución de los IDs entregados a la fecha, que ascienden a un valor aproximado de seiscientos millones de pesos.
