INTERSA S.A.

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2020
SDM-20191798-SEÑAL-136

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Atn.: Ing. Daniel Becerra
Supervisor – Zona Oriente
Carrera 28A No. 18 -20
Bogotá D.C.

REFERENCIA: **CONTRATO 20191798** "Interventoría técnica, administrativa, contable, técnica y jurídica a los contratos derivados del proceso de licitación pública SDM-LP-026-2019 cuyo objeto es Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y Seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá"**. Zona 4 Oriente.**

ASUNTO: Informe del estado de avance del Contrato de Obra 2019-1783, suscrito por la Secretaría Distrital de Movilidad, con la firma GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S

Cordial Saludo Ingeniero Becerra,

En el desarrollo del contrato No. 2019-1783 cuyo objeto es realizar en forma integral las actividades –inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C. zona 4.oriente, y con base en lo solicitado por la SDM por medio de correo electrónico del 13 de octubre de 2020 (justificación de modificación y/o aclaración no. 1 al contrato no. 2019-1783), esta Interventoría hace un breve resumen del estado actual del Contrato:

DATOS GENERALES

CONTRATO	2019-1783 del 05 de septiembre de 2019
CONTRATISTA	GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."(ZONA ORIENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.305.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.305.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato es de Diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de


INTERSA S. A.
NIT. 860.450.644-3 –PBX (57-1) 214 96 45
Tel. Local 285 26 83
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com

	suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal.
FECHA DE INICIO	24 de octubre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de agosto de 2020
SUSPENSIÓN 1	31 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020
FECHA DE REINICIO	13 de abril de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de septiembre de 2020
Prórroga No. 1	5 meses
Fecha de terminación Final	Cinco (05) de febrero de 2021
ADICIÓN 1	$ 2.652.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.957.500.000

COMPONENTE TÉCNICO

Componente de Consultoría A la fecha de corte del 08 de octubre de 2020 (semana 48), el componente de consultoría presenta un avance del 66.57% de hectáreas diseñadas (678.17 Ha) con respecto al total de hectáreas del componente de diseño (1018.8 Ha).

En la siguiente gráfica No. 01 se muestra el estado de avance y comportamiento del componente de diseño, a partir de la cual se establece que el componente de consultoría cuenta con una diferencia negativa de hectáreas diseñadas respecto a las hectáreas programadas de un -1.39%.

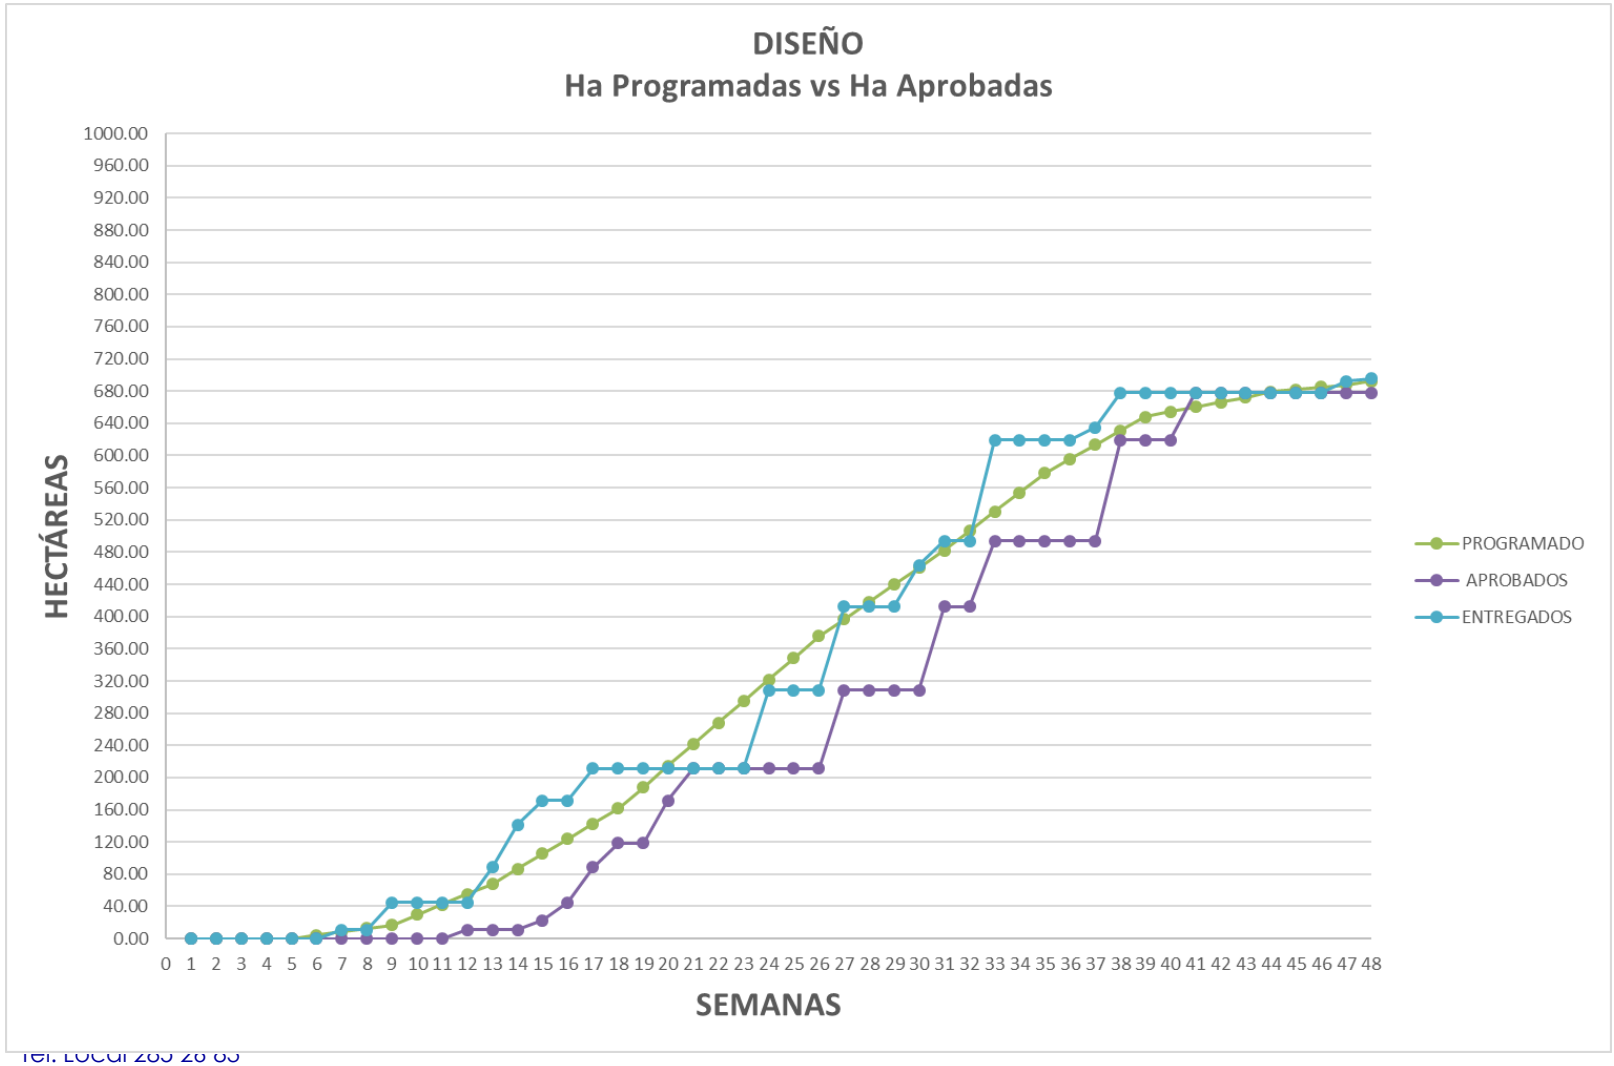

Tel. Local 285 26 85
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com

Georreferenciación Componente de Diseño:
En la siguiente tabla se relaciona el cuadro control de la georreferenciación de diseños con corte a la fecha:

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	APROBADO INTER	EN REVISIÓN INTER	EN ATENCION OBSERVACIONES INTERVENTORIA	APROBADOS INTV ENVIADOS SDM.	APROBADOS SDM	EN REVISION SDM	EN ATENCION OBSERVACIONES SDM	HA RECIBIDAS	HA (hectáreas) APROBADAS INTERVENTORÍA	HA APROBADAS SDM	HA EN REVISIÓN SDM
3	2	2	2	0	0	2	2	0	0	22.70	22.70	22.70	0.00
4	3	3	3	0	0	3	3	0	0	95.74	95.74	95.74	0.00
5	3	3	3	0	0	3	2	1	0	93.17	93.17	53.00	40.17
6	2	2	2	0	0	2	1	0	1	96.77	43.60	43.60	0.00
7	3	3	3	0	0	3	2	1	0	185.58	134.00	81.58	104.00
8	1	1	0	0	1	0	0	0	0	125.11	0.00	0.00	0.00
9	2	2	1	0	1	0	0	0	1	59.20	15.90	0.00	0.00
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

Componente de Obra. De acuerdo con las actividades desarrolladas se determina que el componente de Obra, tiene un acumulado de ejecución de 78.15% que corresponde a un valor de $5.723.003.239 y teniendo en cuenta que el porcentaje programado a la fecha para el componente de obra es de 73.34% que corresponde a un valor de $5.370.955.981, lo cual representa una diferencia positiva de 4.81% de ejecución

En la siguiente tabla se evidencia el desarrollo del contrato en relación del avance del valor ejecutado y programado:

INTERSA S. A.
NIT. 860.450.644-3 –PBX (57-1) 214 96 45
Tel. Local 285 26 83
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com

N°	SEMANA		PROGRAMADO		EJECUTADO		ATRASO	
	DESDE	HASTA	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO
1	24/10/2019	29/10/2019	0.65%	$ 47,253,832.07	0.00%	$ -	-0.65%	$ 47,253,832.07
2	30/10/2019	05/11/2019	1.40%	$ 102,383,302.83	0.64%	$ 46,538,200.00	-0.76%	$ 55,845,102.83
3	06/11/2019	11/11/2019	2.04%	$ 149,637,134.90	0.71%	$ 52,200,021.00	-1.33%	$ 97,437,113.90
4	12/11/2019	18/11/2019	2.80%	$ 204,766,605.65	0.77%	$ 56,732,747.00	-2.02%	$ 148,033,858.65
5	19/11/2019	25/11/2019	3.69%	$ 270,186,910.95	0.91%	$ 66,517,678.00	-2.78%	$ 203,669,232.95
6	26/11/2019	02/12/2019	4.93%	$ 361,334,302.59	1.40%	$ 102,513,920.00	-3.53%	$ 258,820,382.59
7	03/12/2019	09/12/2019	6.18%	$ 452,481,694.24	2.51%	$ 183,992,886.00	-3.67%	$ 268,488,808.24
8	10/12/2019	16/12/2019	7.42%	$ 543,629,085.88	3.22%	$ 235,852,935.00	-4.20%	$ 307,776,150.88
9	17/12/2019	23/12/2019	9.31%	$ 682,030,309.60	5.64%	$ 412,925,580.00	-3.67%	$ 269,104,729.60
10	24/12/2019	30/12/2019	10.39%	$ 760,786,696.39	6.91%	$ 505,694,358.00	-3.48%	$ 255,092,338.39
11	31/12/2019	06/01/2020	11.68%	$ 855,294,360.54	9.11%	$ 667,456,132.00	-2.56%	$ 187,838,228.54
12	07/01/2020	13/01/2020	13.18%	$ 965,553,302.05	11.14%	$ 815,817,191.00	-2.04%	$ 149,736,111.05
13	14/01/2020	20/01/2020	14.69%	$ 1,075,812,243.56	13.04%	$ 954,647,290.00	-1.65%	$ 121,164,953.56
14	21/01/2020	27/01/2020	16.28%	$ 1,192,371,696.01	15.26%	$ 1,117,226,543.00	-1.03%	$ 75,145,153.01
15	28/01/2020	03/02/2020	17.94%	$ 1,313,656,531.66	16.55%	$ 1,212,016,067.00	-1.39%	$ 101,640,464.66
16	04/02/2020	10/02/2020	19.59%	$ 1,434,941,367.32	18.11%	$ 1,325,910,833.70	-1.49%	$ 109,030,533.62
17	11/02/2020	17/02/2020	21.25%	$ 1,556,226,202.98	19.85%	$ 1,453,955,126.38	-1.40%	$ 102,271,076.60
18	18/02/2020	24/02/2020	22.92%	$ 1,678,705,963.12	20.86%	$ 1,527,443,414.75	-2.07%	$ 151,262,548.37
19	25/02/2020	02/03/2020	24.69%	$ 1,808,355,270.20	21.57%	$ 1,579,883,592.00	-3.12%	$ 228,471,678.20
20	03/03/2020	09/03/2020	26.46%	$ 1,938,004,577.29	23.75%	$ 1,739,490,456.00	-2.71%	$ 198,514,121.29

INTERSA S. A.
NIT. 860.450.644-3 –PBX (57-1) 214 96 45
Tel. Local 285 26 83
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com


N°	SEMANA		PROGRAMADO		EJECUTADO		ATRASO	
	DESDE	HASTA	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO
21	10/03/2020	16/03/2020	28.23%	$ 2,067,653,884.37	24.56%	$ 1,798,362,687.37	-3.68%	$ 269,291,197.00
22	17/03/2020	23/03/2020	30.00%	$ 2,197,303,191.45	26.07%	$ 1,909,443,200.00	-3.93%	$ 287,859,991.45
23	24/03/2020	30/03/2020	31.66%	$ 2,318,588,027.11	26.07%	$ 1,909,443,200.00	-5.59%	$ 409,144,827.11
24	14/04/2020	20/04/2020	33.55%	$ 2,457,199,267.86	26.07%	$ 1,909,443,200.00	-7.48%	$ 547,756,067.86
25	21/04/2020	27/04/2020	35.24%	$ 2,580,794,290.86	29.92%	$ 2,191,439,069.00	-5.32%	$ 389,355,221.86
26	28/04/2020	04/05/2020	36.95%	$ 2,706,121,954.37	33.16%	$ 2,428,552,295.00	-3.79%	$ 277,569,659.37
27	05/05/2020	11/05/2020	38.66%	$ 2,831,449,617.89	35.38%	$ 2,591,155,867.00	-3.28%	$ 240,293,750.89
28	12/05/2020	18/05/2020	40.38%	$ 2,956,777,281.40	38.34%	$ 2,807,852,861.00	-2.03%	$ 148,924,420.40
29	19/05/2020	25/05/2020	42.07%	$ 3,080,949,851.24	40.44%	$ 2,961,208,973.00	-1.64%	$ 119,740,878.24
30	26/05/2020	01/06/2020	43.73%	$ 3,202,234,686.89	41.46%	$ 3,035,866,530.00	-2.27%	$ 166,368,156.89
31	02/06/2020	08/06/2020	45.38%	$ 3,323,519,522.55	44.01%	$ 3,223,030,424.00	-1.37%	$ 100,489,098.55
32	09/06/2020	15/06/2020	47.04%	$ 3,444,804,358.21	46.49%	$ 3,404,475,170.00	-0.55%	$ 40,329,188.21
33	16/06/2020	22/06/2020	48.70%	$ 3,566,089,193.87	47.39%	$ 3,470,617,397.00	-1.30%	$ 95,471,796.87
34	23/06/2020	29/06/2020	50.40%	$ 3,690,839,310.54	49.47%	$ 3,622,670,584.00	-0.93%	$ 68,168,726.54
35	30/06/2020	06/07/2020	52.11%	$ 3,816,166,974.05	50.34%	$ 3,686,606,427.00	-1.77%	$ 129,560,547.05
36	07/07/2020	13/07/2020	53.82%	$ 3,941,494,637.57	52.83%	$ 3,868,870,511.00	-0.99%	$ 72,624,126.57
37	14/07/2020	20/07/2020	55.53%	$ 4,066,822,301.08	55.26%	$ 4,046,525,559.00	-0.28%	$ 20,296,742.08
38	21/07/2020	27/07/2020	57.21%	$ 4,189,839,777.25	57.20%	$ 4,188,516,772.00	-0.02%	$ 1,323,005.25
39	28/07/2020	03/08/2020	58.87%	$ 4,311,124,612.90	59.91%	$ 4,387,416,148.00	1.04%	$ (76,291,535.10)
40	04/08/2020	10/08/2020	60.53%	$ 4,432,409,448.56	62.18%	$ 4,553,372,942.00	1.65%	$ (120,963,493.44)
41	11/08/2020	17/08/2020	62.42%	$ 4,571,020,689.31	64.61%	$ 4,731,323,177.00	2.19%	$ (145,698,183.88)

INTERSA S. A.
NIT. 860.450.644-3 –PBX (57-1) 214 96 45
Tel. Local 285 26 83
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com

N°	SEMANA		PROGRAMADO		EJECUTADO		ATRASO	
	DESDE	HASTA	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO
42	18/08/2020	24/08/2020	63.84%	$ 4,674,979,119.87	64.88%	$ 4,751,198,085.00	1.04%	$ (76,218,965.13)
43	25/08/2020	31/08/2020	65.49%	$ 4,796,263,955.53	66.78%	$ 4,890,265,288.00	1.28%	$ (94,001,332.47)
44	01/09/2020	08/09/2020	67.34%	$ 4,931,701,981.00	70.02%	$ 5,127,394,728.00	2.67%	$ (195,692,747.00)
45	09/09/2020	15/09/2020	68.90%	$ 5,045,582,647.67	72.20%	$ 5,287,032,272.00	3.30%	$ (241,449,624.33)
46	16/09/2020	22/09/2020	70.45%	$ 5,159,463,314.33	72.73%	$ 5,326,364,571.00	2.28%	$ (166,901,256.67)
47	23/09/2020	29/09/2020	71.79%	$ 5,257,075,314.33	75.92%	$ 5,559,848,799.00	4.13%	$ (286,504,818.00)
48	30/09/2020	06/10/2020	73.34%	$ 5,370,955,981.00	78.15%	$ 5,723,003,239.00	4.81%	$ (352,047,258.00)

En la siguiente gráfica se muestra el estado de avance y comportamiento del componente de obra, a partir de la cual se establece que el componente de Obra cuenta con una diferencia positiva con respecto a lo programado.

INTERSA S. A.
NIT. 860.450.644-3 –PBX (57-1) 214 96 45
Tel. Local 285 26 83
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com

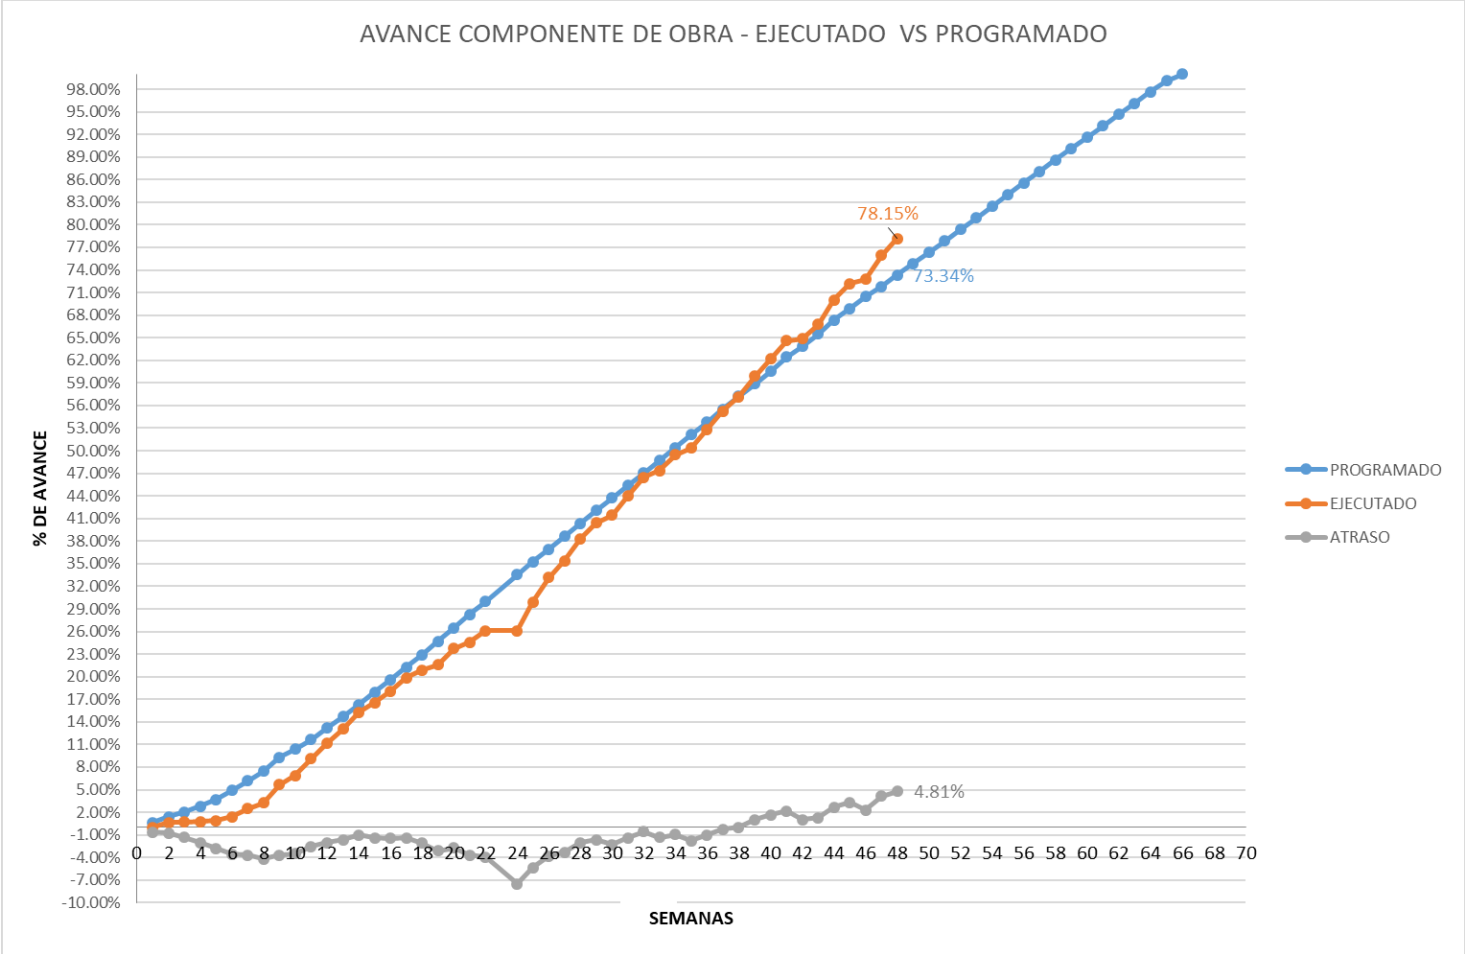

INTERSA S. A.
NIT. 860.450.644-3 –PBX (57-1) 214 96 45
Tel. Local 285 26 83
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com

Georreferenciación Componente de Obra:
En la siguiente tabla se relaciona el cuadro control de la georreferenciación de obra con corte a la fecha:

CUENTA	ID CUENTA (total)	RECIBIDOS	APROBADOS INTERVENTORÍA	EN REVISIÓN INTERVENTORÍA	EN ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	APROBADOS INTV ENVIADOS SDM.	APROBADOS SDM	EN REVISIÓN SDM	EN ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM
2	7	7	7	0	0	7	7	0	0
3	8	8	8	0	0	8	8	0	0
4	13	13	13	0	0	13	13	0	0
5	16	16	16	0	0	16	16	0	0
6	4	4	4	0	0	4	4	0	0
7	22	22	22	0	0	22	22	0	0
8	10	10	10	3	0	10	9	1	0
9	4	4	4	0	0	4	0	4	0

INTERSA S. A.
NIT. 860.450.644-3 –PBX (57-1) 214 96 45
Tel. Local 285 26 83
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- En el marco del seguimiento del Contrato de Obra N°. 2019-1783 se han realizado 45 comités técnicos.
- Durante la ejecución del Contrato de Obra N°. 2019-1783, el contratista ha presentado nueve (9) informes de obra, como se representa en la siguiente tabla:

INFORME	DESDE	HASTA	FECHA DE APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA	ESTADO
1	24-octubre-19	23-noviembre-19	30-noviembre-19	APROBADO
2	24-noviembre-19	23-diciembre-19	03-enero-20	APROBADO
3	24-diciembre-19	23-enero-20	31-enero-20	APROBADO
4	24-enero-20	23-febrero-20	23-febrero-20	APROBADO
5	24-febrero-20	23-marzo-20	30-marzo-20	APROBADO
6	24-marzo-20 al 30-marzo-20 13-Abril-20 al 05-Mayo-20		09-Mayo-20	APROBADO
7	06-Mayo-20	23-mayo-20	27-mayo-20	APROBADO
8	24-mayo-20	23-junio-20	30-junio-20	APROBADO
9	24-junio-20	23-julio-20	31-julio-20	APROBADO
10	24-julio-20	23-agosto-20	27-agosto-20	APROBADO
11	24-agosto-20	23-septiembre-20	REVISIÓN	

COMPONENTE FINANCIERO

A continuación, se presenta el balance financiero del Contrato de Obra 1783 de 2019:

	INICIAL	ADICIÓN	TOTAL
CONSULTORÍA	$ 422,104,019.00	$ 212,200,000.00	$ 634,304,019.00
OBRA	$ 4,882,895,981.00	$ 2,440,300,000.00	$ 7,323,195,981.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5,305,000,000.00	$ 2,652,500,000.00	$ 7,957,500,000.00

En la siguiente tabla se relacionan los pagos efectuados por concepto de obra y de Consultoría. Es de resaltar que el valor facturado de Consultoría es el valor pagado, y el valor facturado de obra es el valor pagado junto con la Retegarantías correspondiente (5% de la cuenta de obra)

ACTA No. - PERIODO	CONTRATISTA GESTION VIAL FACTURA OBRA			
	VALOR FACTURADO	RETE GRANTIAS (5%)	VALOR PAGADO	SALDO POR FACTURAR
Acta No.1 Del 24 de octubre de 2019 al 23 de noviembre de 2019	$ 46,538,200.00	$ 2,326,910.00	$ 44,211,290.00	$ 7,276,657,781.00
Acta No.2 Del 24 de noviembre de 2019 al 23 de diciembre de 2019	$ 58,399,982.00	$ 2,919,999.10	$ 55,479,982.90	$ 7,218,257,799.00
Acta No.3 Del 24 de Diciembre de 2019 al 23 de enero de 2020	$ 459,628,830.00	$ 22,981,441.50	$ 436,647,388.50	$ 6,758,628,969.00
Acta No.4 Del 24 de Enero de 2020 al 23 de Febrero de 2020	$ 790,239,254.00	$ 39,511,962.70	$ 750,727,291.30	$ 5,968,389,715.00
Acta No.5 Del 24 de Febrero de 2020 al 23 de Marzo de 2020	$ 448,608,562.00	$ 22,430,428.10	$ 426,178,133.90	$ 5,519,781,153.00
Acta No.6 Del 24 de Marzo de 2020 al 31 de Marzo de 2020 Del 13 de Abril de 2020 al 05 de mayo de 2020	$ 559,226,404.00	$ 27,961,320.20	$ 531,265,083.80	$ 4,960,554,749.00
Acta No.7 Del 06 de Mayo de 2020 al 23 de mayo de 2020	$ -	$ -	$ -	$ 4,960,554,749.00
Acta No.8 Del 24 de Mayo de 2020 al 23 de junio de 2020	$ 694,928,675.00	$ 34,746,433.75	$ 660,182,241.25	$ 4,265,626,074.00
Acta No.9 Del 24 de junio de 2020 al 23 de julio de 2020	$ 697,045,171.00	$ 34,852,258.55	$ 662,192,912.45	$ 3,568,580,903.00
Acta No.10 Del 24 de julio de 2020 al 23 de agosto de 2020	$ 763,910,626.00	$ 38,195,531.30	$ 725,715,094.70	$ 2,804,670,277.00

INTERSA S. A.
NIT. 860.450.644-3 –PBX (57-1) 214 96 45
Tel. Local 285 26 83
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com

ACTA No. - PERIODO	DISEÑO	
	VALOR FACTURADO	SALDO POR FACTURAR
Acta No.1 Del 24 de octubre de 2019 al 23 de noviembre de 2019	$ -	$ 634,304,019.00
Acta No.2 Del 24 de noviembre de 2019 al 23 de diciembre de 2019	$ -	$ 634,304,019.00
Acta No.3 Del 24 de Diciembre de 2019 al 23 de enero de 2020	$ 14,132,391.00	$ 620,171,628.00
Acta No.4 Del 24 de Enero de 2020 al 23 de Febrero de 2020	$ 59,605,072.00	$ 560,566,556.00
Acta No.5 Del 24 de Febrero de 2020 al 23 de Marzo de 2020	$ 58,005,061.00	$ 502,561,495.00
Acta No.6 Del 24 de Marzo de 2020 al 31 de Marzo de 2020 Del 13 de Abril de 2020 al 05 de mayo de 2020	$ 60,246,322.00	$ 442,315,173.00
Acta No.7 Del 06 de Mayo de 2020 al 23 de mayo de 2020	$ 115,536,968.00	$ 326,778,205.00
Acta No.8 Del 24 de Mayo de 2020 al 23 de junio de 2020	$ -	$ 326,778,205.00
Acta No.9 Del 24 de junio de 2020 al 23 de julio de 2020	$ 77,890,021.00	$ 248,888,184.00
Acta No.10 Del 24 de julio de 2020 al 23 de agosto de 2020	$ 36,688,184.00	$ 212,200,000.00

INTERSA S. A.
NIT. 860.450.644-3 –PBX (57-1) 214 96 45
Tel. Local 285 26 83
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com

	VALOR FACTURADO REALMENTE PAGADO	SALDO TOTAL POR PAGAR	VALOR RETEGARANTIAS (5%)	VALOR TOTAL FACTURADO	SALDO POR FACTURAR
OBRA	$ 4,292,599,418.80	$ 3,030,596,562.20	$ 225,926,285.20	$ 4,518,525,704.00	$ 2,804,670,277.00
DISEÑOS	$ 422,104,019.00	$ 212,200,000.00	$ -	$ 422,104,019.00	$ 212,200,000.00
TOTAL	$ 4,714,703,437.80	$ 3,242,796,562.20	$ 225,926,285.20	$ 4,940,629,723.00	$ 3,016,870,277.00

Es de resaltar que los valores de obra que se relacionan en la anterior tabla no tienen el descuento de la Retegarantías del 5%, por lo cual se ilustra en la siguiente tabla la relaciones de la rete garantías realizadas al Contratista:

ACTA No. - PERIODO	CONTRATISTA GESTIÓN VIAL FACTURA OBRA	
	VALOR FACTURADO	RETE GARANTÍAS (5%)
Acta No.1 Del 24 de octubre de 2019 al 23 de noviembre de 2019	$ 46,538,200.00	$ 2,326,910.00
Acta No.2 Del 24 de noviembre de 2019 al 23 de diciembre de 2019	$ 58,399,982.00	$ 2,919,999.10
Acta No.3 Del 24 de Diciembre de 2019 al 23 de enero de 2020	$ 459,628,830.00	$ 22,981,441.50
Acta No.4 Del 24 de Enero de 2020 al 23 de Febrero de 2020	$ 790,239,254.00	$ 39,511,962.70
Acta No.5 Del 24 de Febrero de 2020 al 23 de Marzo de 2020	$ 448,608,562.00	$ 22,430,428.10
Acta No.6 Del 24 de Marzo de 2020 al 31 de Marzo de 2020 Del 13 de Abril de 2020 al 05 de mayo de 2020	$ 559,226,404.00	$ 27,961,320.20
Acta No.7 Del 06 de Mayo de 2020 al 23 de mayo de 2020	$ 0.00	$ 0.00
Acta No.8 Del 24 de Mayo de 2020 al 23 de junio de 2020	$ 694,928,675.00	$ 34,746,433.75
Acta No.9 Del 24 de junio de 2020 al 23 de julio de 2020	$ 697,045,171.00	$ 34,852,258.55
Acta No.10 Del 24 de julio de 2020 al 23 de agosto de 2020	$ 763,910,626.00	$ 38,195,531.30
TOTAL ACUMULADO	$ 4.518.525.704.00	$ 225.926.285

INTERSA S. A.
NIT. 860.450.644-3 –PBX (57-1) 214 96 45
Tel. Local 285 26 83
Calle 24A No. 25 - 20
E-mail: senalizacionsdm@intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia
Web:www.intersaingenieria.com

BALANCE

A continuación se relaciona brevemente el balance financiero a la fecha del Contrato 1783 de 2019:

TOTAL PAGADO DISEÑO	$ 422,104,019
TOTAL PAGADO OBRA	$ 4,292,599,419
VALOR TOTAL PAGADO	$ 4,714,703,438
VALOR DE RETENCIÓN EN GARANTIAS	$ 225,926,285
SALDO PREDIS	$ 3,242,796,562

COMPONENTE JURÍDICO

- El Contrato de Obra N° 2019-1783, no ha sido objeto de multas o sanciones generadas por algún tipo de incumplimiento relacionado con el desarrollo del objeto y alcance contractualmente previsto.

Cordialmente,

Isabel Victoria León Reyes
Representante Legal
INTERSA S.A.

ANEXO: N/A
C.C Archivo.
