"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

CONTRATISTA: CONSORCIO MTTO COLOSO

REP. LEGAL. ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO

INTERVENTORIA: FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.

REP. LEGAL. JOSE PASTOR MAESTRE SABALZA

SUPERVISOR DE CONTRATO:

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

SINCELEJO - SUCRE

INFORME DE INTERVENTORIA No.2


20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025

INFORME DE INTERVENTORIA No.2

20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025


REGISTRO DE APROBACIÓN

PRESENTADO POR:



ING. JOSE PASTOR MAESTRE SABALA
Representante Legal
Interventoría

APROBO:



ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisión

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO 6

INFORMACIÓN GENERAL 6

CUADRO DE RESPONSABILIDADES 6

CUADRO LISTA DE DISTRIBUCIÓN 6

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8

CONTRATOS SUSCRITOS 9

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y AMPAROS 11

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 11

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 13

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO 13

CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES 14

DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DE OBRA 14

DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 14

CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS 14

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA 14

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 15

ASPECTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 15

CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 16

CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 16

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA DE OBRA 16

FORMA DE PAGO A LA INTERVENTORIA 16

ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA 16

ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA 16

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 17

ESTADO INICIAL DE LA OBRA 19

ANEXO FOTOGRAFICO 20

.....20
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.....27
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE GESTION SST 31
ACTIVIDADES VERIFICADAS EN OBRA 32
HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 32
CONCLUSIONES.....32
RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA.....32
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33
ANEXOS.....34
POLIZAS CONTRATO DE OBRA.....35
POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 36
EXAMENES DE INGRESO OBRA.....37
EXAMENES DE INGRESO INTERVENTORÍA 38
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA 39
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA 40
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).....41
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (AST) 42
CAPACITACIONES.....43
BITACORA DE OBRA.....44
CANTIDADES DE OBRA 45
CORRESPONDENCIA ENVIADA 46
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 47
IMPLEMENTACION AMBIENTAL.....48

INTRODUCCIÓN

Con el fin de adecuar y mejorar la infraestructura del palacio de justicia del municipio de Coloso, en el departamento de Sucre, se desarrolla el proyecto denominado "**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE".** En el marco del **Contrato de Obra No. SAMC 02 de 2025** suscrito el 29 de mayo de 2025 entre la **Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo** y el **Consorcio MTTO COLOSO (NIT: 901.950.642-2),** con acta de inicio 20 de junio de 2025.

Para ejercer las actividades de seguimiento, verificación y control técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y legal de la ejecución del mencionado contrato, se celebró el **Contrato de Interventoría No. MC 06 de 2025** suscrito **el 09 de junio de 2025** entre la **Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo y FORMULACION Y CONSTRUCION S.A.S. (NIT: 901.825.725-0), cuyo objeto es "INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE".** El cual tuvo acta de inicio el 20 de junio de 2025

En desarrollo de las obligaciones contractuales de interventoría, se presenta el **Informe de Interventoría No.2,** correspondiente al periodo comprendido entre el **20 de julio de 2025 al 19 de agosto de 2025.** En este informe reporta el estado actual de la obra, abordando aspectos generales y específicos del proyecto en los componentes técnico, administrativo, operativo, financiero y socioambiental. Se describe el seguimiento efectuado a la ejecución de las actividades contractuales por parte del contratista de obra, incorporando el registro fotográfico, la medición de cantidades, el cálculo del avance porcentual de ejecución y demás aspectos relacionados con el desarrollo y ejecución del proyecto durante dicho periodo mencionado.

Asimismo, se presentan conclusiones y recomendacione**s** relacionadas con el avance del proyecto, los imprevistos, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y otros aspectos inherentes al desarrollo del contrato de obra pública objeto de esta interventoría.

Es importante resaltar que, a partir de las conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe, se sugiere al ente contratante adoptar las acciones pertinentes que contribuyan al adecuado desarrollo de la obra, considerando que las labores de ejecución, seguimiento y control deben enmarcarse dentro de principios de integridad moral y ética profesional**.**

GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA	**"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"**			
INFORME No.1	**INFORME DE INGTERVENTORIA A LAS OBRAS CIVILES DE "INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"**			
PERIODO	ENTRE	20 de julio de 2025	Y	19 de agosto de 2025
LOCALIZACION DE PROYECTO	COLOSO, SUCRE – PALACIO DE JUSTICIA			

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

ELABORÓ	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS Residente de interventoría
REVISÓ	ING. JOSE PASTOR MAESTRE SABALA Representante Legal de Interventoría
APROBÓ	ING. JOSE PASTOR MAESTRE SABALA Representante Legal de Interventoría

CUADRO LISTA DE DISTRIBUCIÓN

SUPERVISORA	No. COPIAS	FECHA DE ENVIO	OBERVACIONES
ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	1	28 de agosto de 2025	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad ejecutar un conjunto de intervenciones estructurales y arquitectónicas orientadas a mejorar las condiciones físicas, funcionales y de seguridad del Palacio de Justicia del municipio de Colosó, Sucre**.** Las obras comprenden actividades de reforzamiento estructural, adecuaciones funcionales y reparaciones tanto arquitectónicas como estructurales, sobre una edificación existente que presenta deterioro y condiciones técnicas que requieren intervención inmediata para garantizar su estabilidad, operatividad y servicio adecuado a la comunidad.

Estas intervenciones buscan prolongar la vida útil de la infraestructura, mejorar su comportamiento ante cargas sísmicas y optimizar los espacios físicos, con el propósito de ofrecer un entorno seguro y digno para el desarrollo de la función judicial. Las actividades contempladas abarcan: revisión y adecuación de elementos estructurales (vigas, columnas, losas y cimentación), mejoras en cubiertas, fachadas, redes internas (eléctrica, hidráulica y sanitaria), así como obras de urbanismo y accesibilidad.

El desarrollo del proyecto se enmarca en los lineamientos técnicos, normativos y legales vigentes, y su ejecución está a cargo del CONSORCIO MTTO COLOSO, bajo la supervisión y control de la firma interventora Formulación y Construcción S.A.S**.**, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las especificaciones del contrato de obra y garantizar la calidad de los trabajos realizados.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La intervención se desarrolla en la edificación del **Palacio de Justicia de Colosó**, ubicada en el casco urbano del municipio de **Colosó**, departamento de **Sucre**, cuya localización corresponde a una infraestructura pública destinada al funcionamiento de las instituciones judiciales de la región.



Imagen 1. Palacio de Justicia Coloso – Sucre

CONTRATOS SUSCRITOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	SAMC 02 DE 2025.
Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA
Proceso de contratación No.	SAMC 02 DE 2025.
Objeto	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE."
Contratista	CONSORCIO MTTO COLOSO.
Representante legal	ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO
NIT	901.950.642-2
Valor total inicial del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($435.881.695 COP).
Valor adicional	N/A.
Valor total acumulado del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($435.881.695 COP).
Fecha de suscripción del contrato	29 DE MAYO DE 2025.
Plazo inicial	CUATRO (04) MESES.
Fecha de inicio	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025.
Prórroga	N/A
Fecha de terminación actual	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2025.
Supervisor del contrato	ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA.
Entidad contratante	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	MC 06 DE 2025
Modalidad de selección	MÍNIMA CUANTÍA
Proceso de contratación No.	MC 06 DE 2025
Objeto	**“**INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE”
Contratista	FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.
Representante legal	JOSE PASTOR MAESTRE SABALA
NIT	901.825.725-0
Valor inicial del contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($48.748.369 COP)
Valor adicional	N/A
Valor total acumulado del contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($48.748.369 COP)
Fecha de suscripción	09 DE JUNIO DE 2025
Plazo inicial	CUATRO MESES Y/O HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMRE DE 2025
Fecha de inicio	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025.
Prórroga	N/A
Fecha de terminación actual	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2025.
Supervisor del contrato	ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA.
Entidad contratante	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO.

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y AMPAROS

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 0

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$87.176.339,00	29/05/2025	03/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$65.382.254,25	29/05/2025	03/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$130.764.508,50	04/10/2025	04/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 0

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 1

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$87.176.339,00	29/05/2025	03/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$65.382.254,25	29/05/2025	03/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$130.764.508,50	04/10/2025	04/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 1

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 2

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$87.176.339,00	20/06/2025	25/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$65.382.254,25	20/06/2025	25/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$130.764.508,50	26/10/2025	26/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 2

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. M-100267228. Anexo 0

Amparo	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$9.749.674,00	09/06/2025	09/05/2026	SEGUROS MUNDIAL
Calidad del servicio	20%	$9.749.674,00	09/10/2025	09/10/2028	SEGUROS MUNDIAL
Pago de salarios y prestaciones sociales	10 %	$4.874.837,00	09/06/2025	09/11/2028	SEGUROS MUNDIAL

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Pólizas vigentes	**X**		Se anexan pólizas
Presenta reclamaciones		**X**	
Certificación de parafiscales	**X**		Se anexan planillas de pago
Exámenes ocupacionales de ingreso	**X**		Se anexan exámenes ocupacionales

CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES

DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral del contratista de obra, cuya presencia fue verificada de manera permanente en el frente de trabajo durante el periodo reportado.

No.	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	Magier Aldair Dupperley Medina	Director de obra	30 %
2	1	María Claudia Hernández Leclerc	Residente de obra	100 %
3	1	Mauricio Junior Agustín Hernández	Profesional siso	100%

DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral de la interventoría, el cual hizo presencia en el frente de obra durante el periodo reportado, dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

No.	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	Carlos Acosta Medina	Director de interventoría	32 %
2	1	Juan Diego Pérez Cabarcas	Residente de interventoría	100 %

CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA

El **contrato de obra** fue suscrito el día **29 de mayo de 2025**. Posteriormente, se suscribió el **acta de inicio** con fecha **20 de junio de 2025**, a partir de la cual se dio inicio formal a la ejecución del contrato.

El contrato cuenta con un **plazo de ejecución de cuatro (4) meses**, estableciéndose como fecha estimada de finalización el **20 de octubre de 2025**.

Hasta la fecha, no se han registrado modificaciones contractuales en cuanto al plazo o valor del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
4 MESES	1 MES	3 MESES

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El **contrato de interventoría** fue suscrito el día **09 de junio de 2025**. Posteriormente, se suscribió el **acta de inicio** con fecha **20 de junio de 2025**, a partir de la cual se dio inicio formal a la ejecución del contrato de interventoría.

El contrato de interventoría cuenta con un **plazo de ejecución de cuatro (4) meses**, estableciéndose como fecha estimada de finalización el **20 de octubre de 2025**.

Hasta la fecha, no se han registrado modificaciones contractuales en cuanto al plazo o valor del contrato de interventoría.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
4 MESES	1 MES	3 MESES

ASPECTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Durante el período evaluado, la Interventoría adelantó el seguimiento y control a los aspectos financieros del contrato de obra, mediante las siguientes acciones:

- **Control de la inversión contractual:** Revisión y análisis de la ejecución presupuestal del contrato de obra, verificando la adecuada aplicación de los recursos conforme al avance físico reportado y a los ítems establecidos en el presupuesto oficial.
- **Seguimiento financiero:** Evaluación del comportamiento financiero del contrato, mediante la verificación de los pagos efectuados, su correspondencia con las actas de obra, y el cumplimiento del flujo de caja proyectado.

CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO	VALOR INICIAL	FECHA	VALOR ACTUAL
325	$ 500.351.334,80	04-02-2025	$ 500.351.334,80

CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO	VALOR INICIAL	FECHA	VALOR ACTUAL
1325	$ 88.274.676	16-05-2025	$ 88.274.676

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA DE OBRA

ACTAS PARCIALES	El contratante efectuará pagos al contratista mediante actas parciales, las cuales estarán sujetas al avance real y comprobado de las obras, previa verificación y aprobación por parte de la Interventoría.

FORMA DE PAGO A LA INTERVENTORIA

ACTAS PARCIALES	El contratante efectuará pagos al interventor mediante actas parciales de avance de obra.

ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA

Durante este periodo, no se presentaron Actas Parciales de obra por parte del contratista.


ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA

Durante este periodo, no se emitieron Actas Parciales de interventoría.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de SELECCIÓN ABREVIADA No. SAMC 02 DE 2025 tiene un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($435.881.695 COP) y tiene como objeto: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE."


Para el periodo que ocupa este informe, se alcanzó un **avance de obra correspondiente al 14.03%,** lo que equivale en monto presupuestal a **SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($61.141.141,59).** Representado gráficamente se tiene lo siguiente:

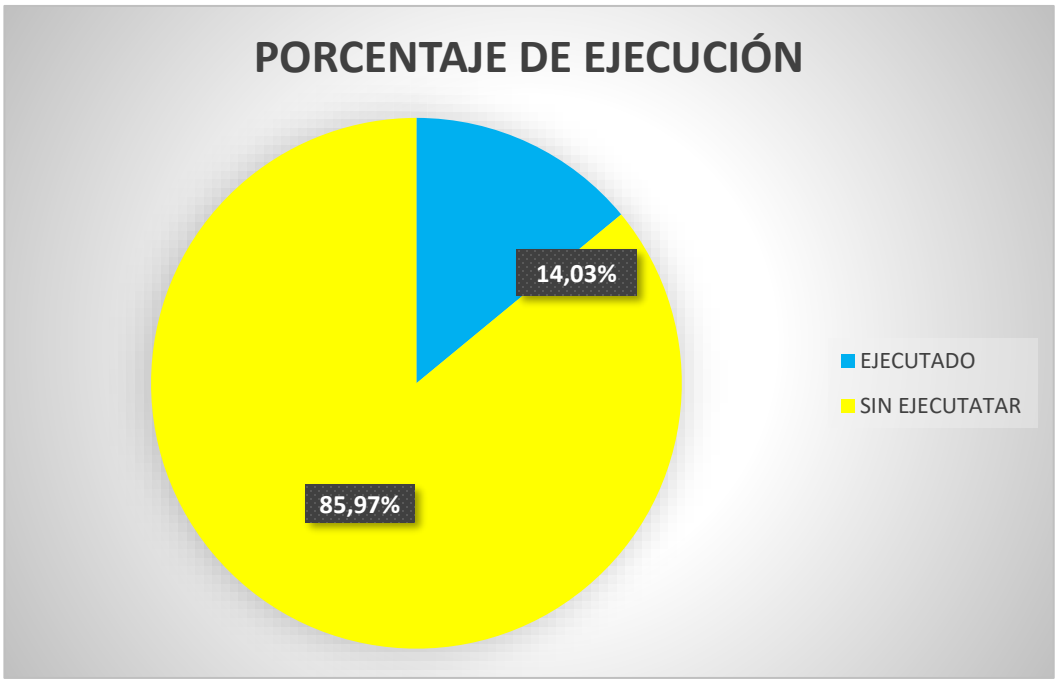

Grafica 1. Porcentaje de ejecución

El porcentaje y monto de avance real de la obra presentado anteriormente obedece al avance físico real ejecutado en obra, quedando un 85.97% sin ejecutar del proyecto.

De manera gráfica se tiene lo siguiente para el estado general del avance del proyecto respecto a lo programado en el cronograma:

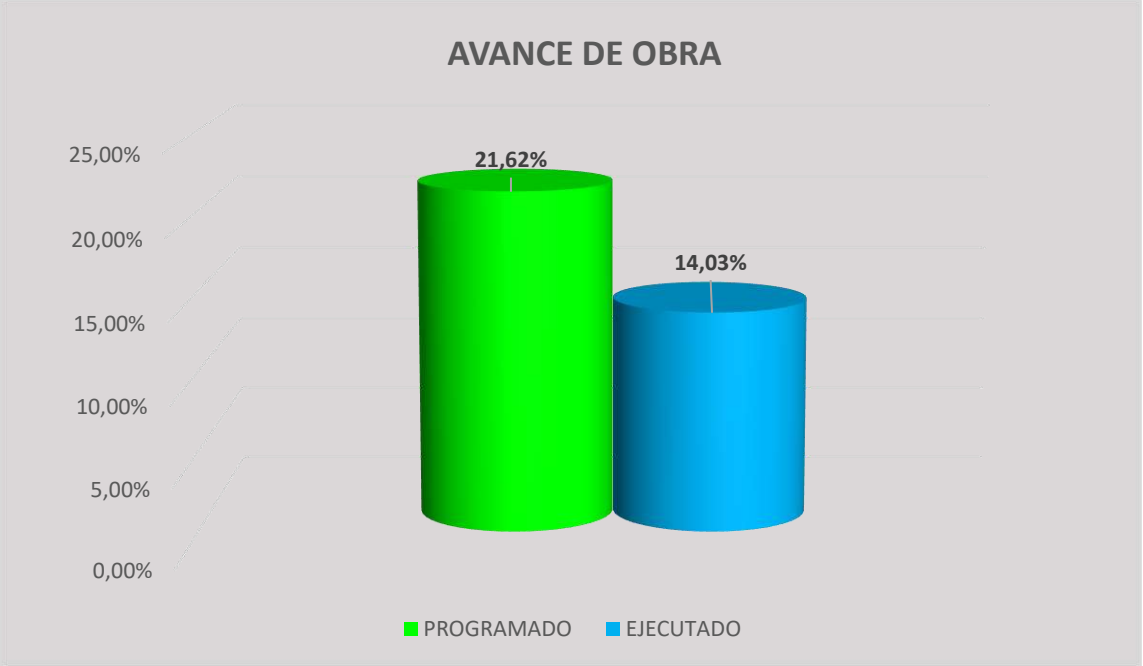


Grafica 2.1 Programación de obra vs obra ejecutada.

De la gráfica anterior, evidenciamos que el avance programado para la obra era de 21,62%, sin embargo, **el avance ejecutado fue del 14.03%**, evidenciando que en la actualidad **el contrato de obra muestra un atraso de 7.59% en su ejecución**. En la tabla a continuación se muestra el monto presupuestal que corresponde a estos porcentajes:

	MONTO PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
PROGRAMADO	$ 94.227.765,00	21.62 %
EJECUTADO	$ 61.141.141,59	14.03 %
ATRASO	$33.086.623,41	7.59 %

La siguiente gráfica corresponde al total programado vs total ejecutado del presente proyecto, en el periodo actual, teniendo un **7.59% de atraso** en general:

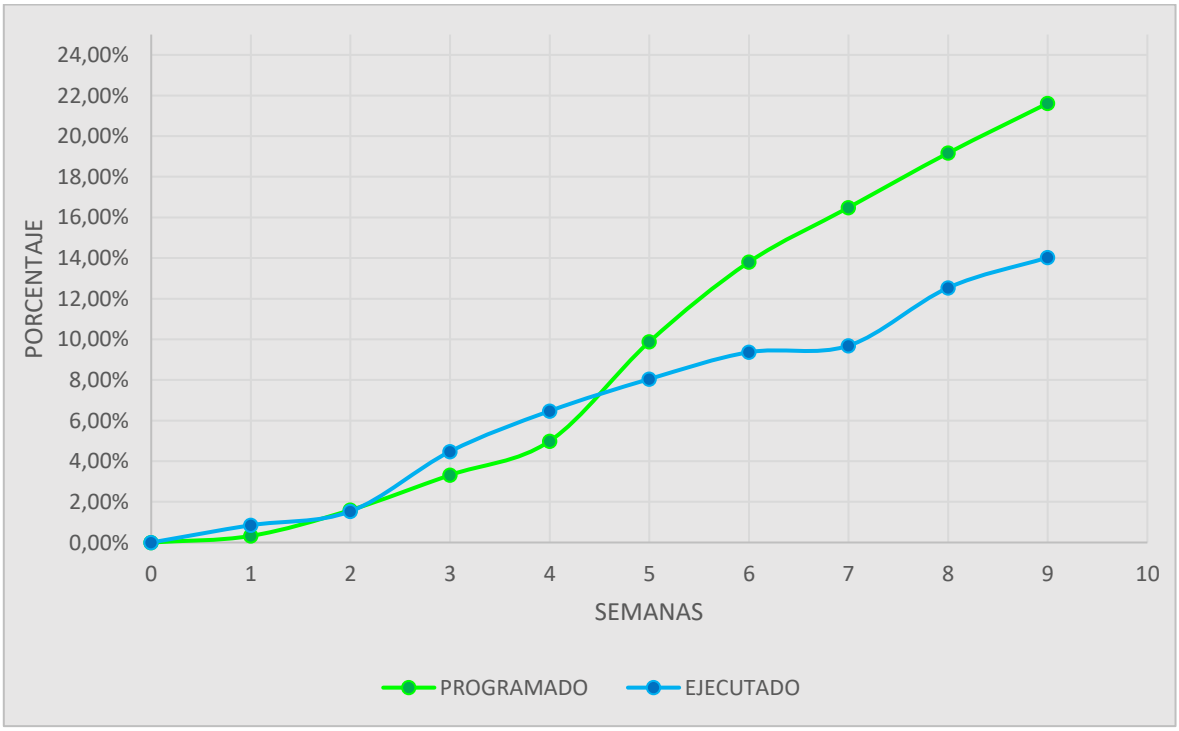

Grafica 2.2 Curva "S" del proyecto

ESTADO INICIAL DE LA OBRA

En cumplimiento de las actividades preliminares del contrato de obra, se realizó una visita técnica al Palacio de Justicia de Colosó – Sucre, con el fin de documentar el estado actual de la infraestructura previo al inicio de las intervenciones.

Durante el recorrido por las instalaciones, se evidenciaron fisuras y grietas en los muros y pisos del inmueble**,** las cuales afectan tanto elementos estructurales como no estructurales del edificio. Estas patologías constructivas fueron debidamente registradas mediante registro fotográfico, el cual se adjunta al presente documento como soporte del diagnóstico inicial.

Las condiciones observadas reflejan el deterioro progresivo de la edificación y justifican la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales**.**

Este registro tiene como propósito establecer un punto de referencia técnico del estado inicial de la obra, sobre el cual se medirá el avance y la efectividad de las intervenciones proyectadas.

ANEXO FOTOGRAFICO



Imagen 1. Fachada Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 2. Fachada Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 3. Ventana exterior Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 3 y 4. Ventana exterior y enchape de piso en área de secretaria - Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 5 y 6. Fisura esquina muro de ventana exterior Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 7 y 8. Ventana interior y Fisura muro ventana interior – recepción - Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 9 y 10. Fisura muro y cielo raso – Sala de estar - Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 11. Sala de audiencia - Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 12 y 13. Fisura muro – Pasillo Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 14 y 15. Fisuras muros – Oficina Juez Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 16 y 17. Fisuras muros – Oficina Juez Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 18 y 19. Fisuras muros – Oficina Juez Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 20. Cámara de aire Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 21 y 21. Fisuras muros – Baño principal Palacio de Justicia Coloso – Sucre,

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 20 de julio del 2022 al 19 de agosto del 2025:



ITEM 2.01 DEMOLICION DE ENCHAPE PISO. Se realiza la demolición manual del enchape existente en el piso, utilizando herramientas menores y equipos eléctricos como el rotomartillo demoledor y taladro percutor liviano. Esta labor se realiza de manera controlada, con el fin de retirar el revestimiento cerámico.





ITEM 2.02 DEMOLICION LOSA DE CONTRAPISO. Se lleva a cabo la demolición controlada de la losa de contrapiso existente, mediante el uso de herramientas manuales y equipos mecánicos livianos como rotomartillos y demoledores eléctricos. Esta actividad se realiza con el objetivo de permitir la adecuación y reconstrucción de la estructura.



ITEM 2.03 DEMOLICION DE CIELORRASO. Se ejecuta la demolición manual del cielorraso existente, compuesto por placas de Drywall soportadas sobre una estructura metálica liviana (perfil galvanizado).



ITEM 2.06 DEMOLICION DE OBRAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES). Se realiza la demolición manual de estructuras en concreto utilizando herramientas menores y se realizó el retiro, cargue, transporte y disposición final de los sobrantes, dejando las áreas intervenidas limpias y listas para la siguiente etapa constructiva.



ITEM 2.07 DEMOLICION DE ZÓCALO (INCLUYE RETIRO). Se procede con la demolición manual de los zócalos existentes, utilizando herramientas como cinceles y su adherencia al paramento vertical. La actividad se ejecuta de manera controlada, evitando daños en los muros y superficies adyacentes.





ITEM 3.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)). Se efectúa la excavación manual en material común, con profundidad entre 0,0 y 2,0 m, empleando herramientas menores. La actividad comprendió el cargue, transporte y disposición final de los sobrantes en un sitio autorizado a una distancia menor de 5 km, dejando las áreas excavadas en condiciones adecuadas para la continuación de las actividades constructivas.





ITEM 5.01 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI (420Mpa). Se ejecutó el suministro, corte, doblado, armado y colocación de acero de refuerzo grado 60 (fy = 60.000 psi / 420 MPa), conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE GESTION SST

Durante el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 19 de agosto de 2025, esta interventoría realizó seguimiento y acompañamiento a la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) implementada por el contratista en el frente de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas en la materia.

ACTIVIDADES VERIFICADAS EN OBRA

- Demolición de enchape de piso.
- Demolición de losa de contrapiso.
- Demolición de cielo raso.
- Demolición de obras en concreto (incluye retiro de sobrantes).
- Demolición de zócalo (incluye retiro).
- Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes).
- Corte y figuración de acero de refuerzo de 60000 PSI (420 Mpa).

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

- El contratista cuenta con un **Plan de SST** implementado y socializado con el personal.
- Se verificó la **entrega y uso de EPP** básicos, con cumplimiento satisfactorio por parte de la mayoría de los trabajadores.
- La **señalización preventiva** en áreas de demolición y excavación fue instalada oportunamente.
- La **gestión de residuos y escombros** se realizó conforme a lo establecido, con disposición en sitios autorizados.
- No se reportaron incidentes ni accidentes en el periodo.
- Se identificó la necesidad de **reforzar supervisión en excavaciones manuales**, para prevenir riesgos por deslizamientos y atrapamientos.

CONCLUSIONES

- La gestión SST del contratista en el periodo evaluado fue adecuada y contribuyó al desarrollo seguro de las actividades.
- La interventoría continuará realizando seguimiento para garantizar la mejora continua en la implementación de medidas de seguridad en obra.

RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA

1. Reforzar capacitaciones e inducciones en actividades críticas (demoliciones, excavaciones y corte de acero).
2. Fortalecer el control sobre el uso permanente de EPP.
3. Garantizar supervisión constante en excavaciones manuales.
4. Mantener actualizado el registro de capacitaciones y reportes en SST.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 19 de agosto de 2025, en el frente de obra se desarrollaron actividades correspondientes a desmontes y demoliciones, excavaciones y rellenos, así como trabajos de estructuras en acero, en concordancia con el cronograma establecido.

Finalizado el primer mes dentro del plazo contractual, y con base en las actividades ejecutadas, se registra un avance físico acumulado del **14,03%**, lo cual representa un **desfase del 7,59%** respecto al avance programado para este mismo periodo. Cabe resaltar que el contrato se ha venido ejecutando conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y bajo los estándares de calidad exigidos.

El atraso evidenciado obedece a la necesidad de atender nuevas condiciones y requerimientos surgidos en el desarrollo de la obra, que han hecho necesaria la modificación de los planos previamente aprobados. Estos ajustes responden a situaciones no previstas en la etapa de diseño y buscan garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura proyectada.

Como consecuencia de estas modificaciones, ha sido necesario ajustar la ejecución de algunas actividades constructivas, con el fin de evitar reprocesos y asegurar la adecuada incorporación de los cambios en los diseños. En este sentido, el contratista se encuentra actualmente en proceso de **elaboración de un nuevo presupuesto oficial de obra**, ajustando cantidades y actividades de acuerdo con las especificaciones actualizadas.

Una vez finalice este proceso y el documento sea remitido para revisión de la interventoría, se procederá con el análisis técnico y financiero correspondiente, lo que permitirá contar con una base sólida para continuar la ejecución de la obra de manera ordenada y eficiente, mitigando el impacto en el cronograma global.

En este contexto, si bien el avance físico presenta un desfase con relación al cronograma inicial, este corresponde a un procedimiento técnico y administrativo indispensable para garantizar la correcta ejecución del contrato y la adaptación del proyecto a las nuevas necesidades identificadas en obra. Se prevé que, con la finalización de la elaboración, revisión y aprobación del presupuesto ajustado, se normalice el ritmo de ejecución en los próximos meses, asegurando así la continuidad y cumplimiento de los objetivos contractuales.

ANEXOS

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**29/05/2025**	**03/02/2026**	**$87,176,339.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**29/05/2025**	**03/10/2028**	**$65,382,254.25**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**04/10/2025**	**04/10/2030**	**$130,764,508.50**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107247600(3900)000002688350(96)20260529

REFERENCIA PAGO:

1101310724760-0

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	05	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	05	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	NIT: 901.950.642-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	NIT: 800.165.944-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107247553(3900)000000300594(96)20260529

REFERENCIA PAGO:

1101310724755-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(2,239,118.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(429,232.00)	$ *******(2,688,350.00)	$ ****(283,323,101.75)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO: 3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO 2754780

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(2,239,118.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(429,232.00)	$ *******(2,688,350.00)	$ ****(283,323,101.75)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101145873	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR


ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(249,600.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(47,994.00)	$ *********(300,594.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	NIT: 901.950.642-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	NIT: 800.165.944-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(249,600.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(47,994.00)	$ *********(300,594.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

TEXTO ACLARATORIO


PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/06/2025**	**25/02/2026**	**$87,176,339.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/06/2025**	**25/10/2028**	**$65,382,254.25**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**26/10/2025**	**26/10/2030**	**$130,764,508.50**	

ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107284098(3900)000002688350(96)20260620

REFERENCIA PAGO:

1101310728409-8

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101145873	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	

ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	NIT: 901.950.642-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	NIT: 800.165.944-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107284113(3900)000000300594(96)20260620

REFERENCIA PAGO:

1101310728411-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.12 17:35:04 -05:00

Código de Seguridad: YXSFmsvN51QkGCunAMxr8g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100267228	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14984078	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	09/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.825.725-0
DIRECCIÓN	CR 24 F 2 C 70	**TELÉFONO**	3004103610
ASEGURADO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 40	**TELÉFONO**	2754780
BENEFICIARIO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 40	**TELÉFONO**	2754780

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.06 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE CON
NIT.: 800.165.944-8

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/06/2025	24:00 Horas Del 09/05/2026	9.749.674,00	26.765,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/06/2025	24:00 Horas Del 09/11/2028	4.874.837,00	50.044,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 09/10/2025	24:00 Horas Del 09/10/2028	9.749.674,00	87.827,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 24.374.185,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
H&A SEGUROS Y FIANZAS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	164.636,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	164.636,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	32.231,00
TOTAL A PAGAR	$	201.867,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100267228	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14984078	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	12/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	09/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

EXAMENES DE INGRESO OBRA

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: MAGIER ALDAIR DUPPERLY MEDINA Cedula: 1.102.837.708

Cargo u Ocupación: DIRECTOR DE OBRA Edad: 34 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.q. 9251954

Arnoldo J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA 1102837708

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC Cedula: 1.102.858.517

Cargo u Ocupación: RESIDENTE DE OBRA Edad: 31 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Reg. 925195

Arnoldo J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA 1102858517

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: MAURICIO JUNIOR AGUSTIN HERNANDEZ Cedula: 1.140.852.655

Cargo u Ocupación: SISO Edad: 33 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐ Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐ Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐ Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐ _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Reg. 925EU

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Barreto

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA 1140852655

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: JHON HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ Cedula: 1.005.665.254

Cargo u Ocupación: AUX. RESIDENTE Edad: 24 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentación estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Reg. 925197

Arnoldo J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA 1005665254

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: SKARLETH DIAZ PEREZ Cedula: 1.103.121.026

Cargo u Ocupación: AUXILIAR SISO Edad: 27 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐ Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐ Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐ Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐ _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.G. 925851

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Barreto

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR Skarleth Díaz Pérez

CEDULA 1103121026

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: EDUT ANTONIO BELTRAN MARTINEZ Cedula: 92.530.749

Cargo u Ocupación: OFICIAL DE OBRA CIVIL Edad: 48 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Reg. 9759514

Arnoldo J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Medico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR Edut Antonio B

CEDULA 92530749

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: AUGUSTO RAFAEL HERNANDEZ BARRIOS Cedula: 92.498.128

Cargo u Ocupación: HERRERO Edad: 66 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐ Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐ Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐ Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐ _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: X	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisicc

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Reg. 9759154

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Barreto

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA 92498128

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: MIGUEL EMIRO TAMARA TOSCANO Cedula: 92.542.624

Cargo u Ocupación: AYUDANTE Edad: 46 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: X	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de _____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Arnoldo J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR miguel Tamara

CEDULA 92542624

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: JAIRO ANDRES TAMARA HERNANDEZ Cedula: 1.005.605.323

Cargo u Ocupación: AYUDANTE Edad: 23 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐ Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐ Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐ Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐ _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE

Arnoldo J Cerra Barreto
FIRMA ELECTRONICA

FIRMA DEL TRABAJADOR Jairo Tamara

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

CEDULA 1005605323

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: JAVIER ENRIQUE PEREZ LUNA Cedula: 1.101.783.281

Cargo u Ocupación: AYUDANTE Edad: 34 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐ Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐ Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐ Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐ _____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico.

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.G. 925851

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Barreto

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR Javier Perez

CEDULA 1101783281

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

CONCEPTO MEDICO LABORAL

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/06/2025 Elaborado: Coloso Sucre

TIPO DE EXAMEN: Ingreso: X Post Incapacidad: ☐ Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: CONSORCIO MTTO COLOSO

Nombres: GERMAN ANDRES PEREZ LUNA Cedula: 1.101.785.097

Cargo u Ocupación: AYUDANTE Edad: 28 Años

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS PARA LABORAR: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: X Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ NO Aplica: X Retiro No satisfactorio: ☐

Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS: ☐	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: X	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador, recomendaciones generales, lavado de manos, reportar novedades de salud respiratoria, dieta y ejercicios alimentacion estilo de vida saludable, realizar las labores propias ganaderas, evitando realizar sobre esfuerzo fisico

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE

FIRMA DEL TRABAJADOR German Perez

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Barreto

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

CEDULA 1101785097

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com; arnoldo.cerra@gmail.com; 3145401155

EXAMENES DE INGRESO INTERVENTORÍA

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 92519513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/ 06/2025

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: SAICO INGENIERIA S.A.S. Edad: 34 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
CARLOS CARLOS ACOSTA MEDINA	1.124.025.939	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS ☐:	Control periódico ocupacional: ☐	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: ☐	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: ☐	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: ☐
Continuar tratamiento médico: ☐	Utilización de ayudas ergonómicas: ☐	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: ☐	Charlas Manejo de cargas: ☐	Reducir consumo de alcohol: ☐
Seguimiento caso ARL: ☐	Calificación de origen de patología: ☐	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9701

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 92519513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 20/ 06/2025

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: SAICO INGENIERIA S.A.S. Edad: 28 Años

Nombres:	Cedula:	Cargo u Ocupación:
JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS	1.102.877.974	RESIDENTE DE OBRA

APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ]

Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ]

Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ]

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ]

_____

CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

RECOMENDACIÓN MEDICA	RECOMENDACION OCUPACIONAL	RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL
Control periodico PYP por EPS [ ]:	Control periódico ocupacional: [ ]	Alimentación saludable: X
Remisión EPS por patología: [ ]	Higiene Postural: X	Ejercicios 3 veces/ semana: X
Remisión a ARL para manejo de caso: [ ]	Utilización de EPP: X	Dejar de fumar: [ ]
Continuar tratamiento médico: [ ]	Utilización de ayudas ergonómicas: [ ]	Pausas activas: X
Control médico Prioritarios EPS: [ ]	Charlas Manejo de cargas: [ ]	Reducir consumo de alcohol: [ ]
Seguimiento caso ARL: [ ]	Calificación de origen de patología: [ ]	Evitar cargas de más de ____ KL

INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
Reg. 9701

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1687145332	9489109692	I	2025/08/05	2025/08/08	BANCOLOMBIA	3	$528,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102837708	DUPPERLEY MAGIER																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000	CCF41	30	$1,600,000	$32,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0	No	$527,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0		$527,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1687145332	9489109692	I	2025/08/05	2025/08/08	BANCOLOMBIA	3	$528,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$500	$0	$256,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000	$500	$0	$256,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$100	$0	$39,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$100	$0	$39,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$100	$0	$32,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$32,000	$100	$0	$32,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$400	$0	$200,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$400	$0	$200,400
TOTAL				**1**	**$527,000**	**$1,100**	**$0**	**$528,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102858517		HERNANDEZ LECLERC MARIA CLAUDIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25b #12a 92	SINCELEJO-SUCRE	2810000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1702731480	9489217510	I	2025/08/06	2025/08/15	BANCOLOMBIA	9	$703,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102858517	HERNANDEZ MARIA																		230301	30	$1,972,000	$315,600	EPS005	30	$1,972,000	$246,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,972,000	$137,300	0	$0	$0	No	$699,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$137,300		$0	$0		$699,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102858517		HERNANDEZ LECLERC MARIA CLAUDIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25b #12a 92	SINCELEJO-SUCRE	2810000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1702731480	9489217510	I	2025/08/06	2025/08/15	BANCOLOMBIA	9	$703,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$315,600	$1,800	$0	$317,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$315,600	$1,800	$0	$317,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$137,300	$800	$0	$138,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$137,300	$800	$0	$138,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,500	$1,500	$0	$248,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$246,500	$1,500	$0	$248,000
TOTAL				**1**	**$699,400**	**$4,100**	**$0**	**$703,500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901950642
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO MTTO COLOSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CL 7A 24E 11	TELÉFONO:	3024565
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7983867477**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1717633979

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 227.800	$ 1.300	$ 229.100
230301	230301-PORVENIR	3	$ 448.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 448.100	$ 2.600	$ 450.700
SUBTOTALES:										**$ 675.900**	**$ 3.900**	**$ 679.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 17.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 17.100	$ 100	$ 0	$ 17.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 17.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 17.100	$ 100	$ 0	$ 17.200
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 38.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 38.300	$ 300	$ 0	$ 38.300
SUBTOTALES:													**$ 186.200**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 187.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 323.900	$ 323.900	$ 1.900	$ 0	$ 325.800
SUBTOTALES:									**$ 323.900**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 325.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	5	$ 186.200	$ 1.100	$ 187.300
SUBTOTALES:			**$ 186.200**	**$ 1.100**	**$ 187.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES													
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																		
1	CC 1005605323	TAMARA HERNANDEZ JAIRO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	0000001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71726866
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE DAVID RODRIGUEZ CASTRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CRA 28 23A 28	TELÉFONO:	2749690
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7976520062**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1662391609

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 71726866	RODRIGUEZ CASTRO JOSE DAVID	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	71726866	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

Medellín, 09 de August de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO MTTO COLOSO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1101783281	PEREZ LUNA JAVIER ENRIQUE	10/08/2025		gt632473	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2025 14:38:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.89.116, 198.143.41.45, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 09 de August de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO MTTO COLOSO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1101785097	PEREZ LUNA GERMAN ANDRES	10/08/2025		200ub208	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2025 14:34:12 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.89.116, 198.143.41.45, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124025939		CARLOS CARLOS ACOSTA MEDINA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 120 No42b-112	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7264412	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1758835696	9490783395	I	2025/09/09	2025/09/08	BANCOLOMBIA	0	$667,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																													
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																													
1	CC	1124025939	ACOSTA CARLOS																	25-14	30	EPS005	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124025939		CARLOS CARLOS ACOSTA MEDINA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 120 No42b-112	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7264412	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1758835696	9490783395	I	2025/09/09	2025/09/08	BANCOLOMBIA	0	$667,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$301,200	$0	$0	$301,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$301,200	$0	$0	$301,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$131,100	$0	$0	$131,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$131,100	$0	$0	$131,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,300	$0	$0	$235,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$235,300	$0	$0	$235,300
TOTAL				1	$667,600	$0	$0	$667,600

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Licita Civil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION CONSORCIO MTTO COLOSO	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jhon Hector de la Rosa Martinez	CEDULA	1005665254
CARGO	Residente Auxiliar	CIUDAD	Coloso.
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco con Barbuquejo	1	04-07-25	X		
Mascarilla	1	04-07-25	X		
Bol. Auditivo	1	04-07-25	X		
Gafas	1	04-07-25	X		
Camisas	2	07-07-25	X		
Botas de Seguridad	1	07-07-25	X		
Mascarilla	2	09-08-25		X	
Pantalon	2	13-08-25	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernandez	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SISO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1005665254

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION CONSORCIO MITO COLOSO	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Skarleth Díaz Perez			CEDULA	1103121026
CARGO	SSO			CIUDAD	Colón
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco de Seguridad	1	04-07-25	X		
Gafas	1	04-07-25	X		
Mascarilla	1	04-07-25	X		
Protector Auditivo	1	04-07-25	X		
Mascarilla	1	23-07-25		X	
Mascarilla	1	09-08-25		X	
Pantalon	2	12-08-25	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernández	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SSO.	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1103121026.

Powered by CamScanner

LlctaCivil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION CONSORCIO MTTO COLOSO	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Augusto Rafael Hernandez Perez	CEDULA	92498128
CARGO	Herrero	CIUDAD	Coloso
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco de Seguridad	1	21/07/25	X		
Guantes	1	21/07/25	X		
Gafas	1	23/07/25	X		
Mascarilla	1	23/07/25	X		
Protector Auditivo	1	23/07/25	X		
Guantes	1	25/07/25		X	
Mascarilla	2	09/08/25		X	
Guantes	1	11/08/25		X	
Pantalon	2	13/08/25	X		
Suter	2	13/08/25	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernández	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SISO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88, DECRETO 1295 DE 1994. Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 92.498128

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION CONSORCIO MITO COLSO	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Miguel Emiro Tamara Toscano			CEDULA	92542624
CARGO	Ayudante			CIUDAD	Celoso
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	04-07-25	X		Miguel Tamara
Gafas	1	04-07-25	X		Miguel Tamara
Guante Nitrilo	1	04-07-25	X		Miguel Tamara
Buso	2	04-07-25	X		Miguel Tamara
Mascarilla	1	04-07-25	X		Miguel Tamara
Protector Aud.	1	04-07-25	X		Miguel Tamara
Mascarilla	2	07-07-25		X	Miguel Tamara
Mascarilla	1	21-07-25		X	Miguel Tamara

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernández	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SISO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Miguel Tamara Toscano

CEDULA No: 92.542624

Powered by CamScanner

LicitaCivil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION Consorcio Mtto Coloso	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jairo Andrés Támara			CEDULA	1005605323
CARGO	Ayudante			CIUDAD	Colosó
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	04-07-25	X		Jairo
Gafas	1	04-07-25	X		Jairo
Guantes Nitrilo	1	04-07-25	X		Jairo
Buso	2	04-07-25	X		Jairo
Mascarilla	1	04-07-25	X		Jairo
Prot. Auditivo	1	04-07-25	X		Jairo
Mascarilla	2	07-07-25		X	Jairo
Gafas	1	12-07-25		X	Jairo.
Guantes	1	09-08-25		X	Jairo
Mascarilla	2	09-08-25		X	Jairo

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustín Hernández	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SSO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Jairo

CEDULA No: 1005.605.323

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Javier Enrique Pérez Lora			CEDULA	1101783281
CARGO	Ayudante			CIUDAD	Colosó
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Guantes	1	11-08-25	X		Javier Perez
Mascarilla	1	11-08-25	X		Javier Perez
Gafas	1	11-08-25	X		Javier Perez
Protector Auditivo	1	11-08-25	X		Javier Perez
Casco	1	11-08-25	X		Javier Perez
Botas	1	13-08-25	X		Javier Perez
Sueter	2	13-08-25	X		Javier Perez
Guantes	1	11-08-25		X	Javier Perez

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernandez	CEDULA No.	1140
CARGO	SISO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Javier Perez

CEDULA No: 1101783281

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Germán Andrés Perén Luna			CEDULA	1101785097
CARGO	Ayudante			CIUDAD	Coloso
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Gafas	1	11-08-25	X		German Perez
Mascarilla	1	11-08-25	X		German Perez
Guantes	1	11-08-25	X		German Perez
Protector Aud.	1	11-08-25	X		German Perez
Botas	1	13-08-25	X		German Perez
Sueter	2	13-08-25	X		German Perez
Casco	1	13-08-25	X		German Perez
Guantes	1	15-08-25		X	German Perez

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernandez	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SSO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

German Perez

CEDULA No: 1101785097

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (AST)

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLLEO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colsó		FECHA 21 - 07 - 2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Figuración de Aros		Desde 07:00 am
		Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas y traslado de hierro	1 Trozadora
2 Corte de hierro con Trozadora	2 Flexómetro
3 Presentación en platina figuradora	3 Marcador
4 Armado de aro con platina.	4 Machilo
5	5 Platina figuradora
6	6 Tubo.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	X 9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	X 10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
1-10	Uso de elementos de protección personal	Trabajadores

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jairo Tamara H.	Jairo	9		
2	Augusto Rafael Hernández		10		
3	Miguel Tamara	LUDIGUELTAMARA	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecterc.	Nombre:	Mauricio Agustin, Hernández
Cargo:	Residente.	Cargo:	SSGT
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLISO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR:	Juzgado Promiscuo Municipal Colosó	FECHA 22-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	Figuración de Aros. - Armado de Acero Para pilas	Desde 07:00 am Hasta 05:00 PM

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



CASCO	☒
BOTAS	☑
LENTES	☒
GUANTES	☒
PROT AUDIT	☒
RESPIRADOR	☐
PROT FACIAL	☐
ARNÉS	☐
CARETA DE SOLDAR	☐
PROT. CUERPO	☐

Otros:

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Toma de Medida y doblado de hierro	1	Dobladora
2	Corte de hierro con dobladora	2	Flexómetro
3	Presentación en platina figuradora	3	Marcador
4	Armado de aro con platina	4	Martillo
5	Medida y corte de Acero.	5	Platina figuradora
6	Armado de Acero con Aro.	6	Tubos.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	X 9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frío	18	
5	Caída de objetos	X 10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
9-10	Uso de Elementos de protección Personal	Trabajadores

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jairo Tamara H.		9		
2	Augusto Rafael Hernandez		10		
3	Miguel Enrique Tamara		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc.	Nombre:	Mauricio Agustin Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	SST
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLOSO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Izcuchaca Polideportivo Municipal Colosó.		FECHA 23-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Figurado de Acero para armado de pilotes.		Desde 07:00 am Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Posicionar Varillas en "Burro"	1	Birlo rueda
2	Inserción de aros	2	
3	Fijación de aros en varillas a medida	3	
4		4	
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	Movimientos repetitivos		
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
9-10	Uso de elementos de protección personal	
16	Pausas Activas	

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel Tamara	9		
2	Augusto Rafael Hernández	[illegible]	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leclerc.	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO
Firma:	[signature]	Firma:	[signature]

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MTTO COLOSO	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Integrado Promiscuo Municipal coloso — FECHA 23-02-2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Creación de Pilotes — Desde 07:00 am — Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Demolición de enchape de piso	1	Pulidora
2	Trazado y corte de losa	2	Taladro Metabo y Makita
3	Demolición de losa.	3	Pala
4	Remoción de escombros	4	Carretilla
5	Retiro de Pudentrena	5	Flexómetro.
6	Inicio de Perforación con Barrena.	6	Barreno

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	X	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores		12	Contacto de sustancias peligrosas	16
X	3 Caída a un mismo nivel	X	8 Exposición a partículas extrañas	X	13	Esfuerzo Excesivo	17
4	Caída a diferente nivel	X	9 Exposición a ruidos		14	Exposición a calor o frio	18
5	Caída de objetos	X	10 Golpes, cortes o contusiones		15	Incendio y/o explosiones	19

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
3	Despejar área de trabajo - Señaliz.	Operador - SST
8-9-10	Uso de elementos de protección personal	Operador
11	Desenredar Cuento	Electrico
13	Pausas Activas - Hidratación	SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Edet Beltran Martinez	Edet B	9		
2	Jairo Támara.	Jairo	10		
3	Miguel Támara	Miguel Tamara	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leclerc.	Nombre:	Mauricio Agustin Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	SST
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLOSO	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal - Coloso | FECHA 24-07-2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Figurado de Acero para armado de pilotes. y parrillas para dados | Desde 07:00 am | Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Posicionar Varillas en estructura "burro"	1	Bichiraque.
2	Inserción de aros	2	Tratadores
3	Fijación de aros en Varilla a medida	3	Flexometro
4	Corte de Acero	4	Platina figuradora
5	Figuración	5	Tubo.
6	Armado de parrilla	6	

1	Aplastamiento		6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)		
2	Choque y/o Atropello		7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	Movimientos Repetitivos	
3	Caida a un mismo nivel		8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17		
4	Caida a diferente nivel	X	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18		
5	Caida de objetos	X	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19		

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
9-10	Uso de elementos de protección personal	Trabajador
16	Pausas Activas	SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernández		9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leclerc.	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SSO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MTTO CCUSD	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Interior Promisión Municipal Calaví		FECHA 24-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Creación de pilotes - Perforación de suelo con Barreno.		Desde 07:00 am
		Hasta 01:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Armado de Barreno con los tubos necesarios	1 Barreno
2 Puesta en marcha del equipo	2 Martillo
3 Retiro del material de las aspas	3 Palustre
4 Instalación de tubos para mas profundidad	4 Llave Inglesa
5 Retiro de material - medición de profundidad	5
6 Se continua si es necesario.	6

1	Aplastamiento		6	Atrapamiento / Aprisionamiento		11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	X	7	Exposición a gases y/o Vapores		12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	X	8	Exposición a partículas extrañas	X	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	X	9	Exposición a ruidos		14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos		10	Golpes, cortes o contusiones		15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7 8 9	Uso de elementos de protección personal - Ventilación	Operador
13	Pausas Activas - Hidratación, Se realiza de igual forma prueba para retomar fuerzas de los trabajadores, y para que el equipo descanse.	Operador SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel Tamara	9		
2	Jairo Tamara	Jairo	10		
3	Edut Beltrán.	Edut B	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones: Los pasos del 2 al 5 en la secuencia de actividades se repite a necesidad hasta acanzar la medida necesario.

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leiter	Nombre:	Mauricio Agustin Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SSO.
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLUSO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó		FECHA 25-04-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Figuración de acero para armado de Pamilla Pra dados		Desde 07:00 am
		Hasta

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



CASCO	☒
BOTAS	☒
LENTES	☒
GUANTES	☒
PROT AUDIT	☐
RESPIRADOR	☐
PROT FACIAL	☐
ARNÉS	☐
CARETA DE SOLDAR	☐
PROT CUERPO	☐

Otros:

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Toma de medidas	1	Trozadora
2	Corte a necesidad del Acero	2	Flexometro
3	Inicio de figurado en platina	3	Platina figuradora
4	Armado de pamilla	4	Tubo
5		5	Bichropa
6		6	

1	Aplastamiento		6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)		
2	Choque y/o Atropello		7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	Movimientos Repetitivos	
3	Caida a un mismo nivel		8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17		
4	Caida a diferente nivel	X	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18		
5	Caida de objetos	X	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19		

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
9-10	Uso de Elementos de protección personal	Trabajadores
16	Pausas Activas	SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Agudo Rafael Hernandez		9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Mario Hernandez Leclerc.	Nombre:	Mauricio Agudo Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	SUO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MTTO COLISEO	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó — FECHA 25-07-2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo con Barreno para creación de Pilote. — Desde 07:00 am — Hasta

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Armado de Barreno	1 Barrero
2 Ruta en Marcha del equipo	2 Martillo
3 Retiro de equipo para limpieza	3 Palustre
4 Toma de medidas (si aún falta)	4 Llave Inglesa
5 Aumento de tubos para más profundidad	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de Elementos de Protección Personal – Ventilación	Operador
13	Pausas Activas – Hidratación	Operador – SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernández		9		
2	Edul Beltran		10		
3	Miguel Emiro Tamara		11		
4	Jairo Tamara		12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones: Se realizan Pausas cada cierto tiempo para que descansen los operadores y evitar Sobrecalentar el equipo.

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Lecters	Nombre:	Mauricio Agustin Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024
	Consorcio Mito Colón	
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó.		FECHA 26-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Creación de Pilotes.		Desde 07:00 am
		Hasta

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Demolición de mezón	1	Mona
2	Demolición de losa	2	Flexómetro
3	Retiro de material	3	Barreno
4	Inicio de excavación (Barreno)	4	Palas - Palin - Paladraga
5		5	Carretilla
6		6	

1	Aplastamiento		6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello		7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	X	8	Exposición a partículas extrañas	X 13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	X	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	X	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
8-9-10	Uso de elementos de protección personal	Oficial
13	Pausas Activas - Hidratación	Oficial - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Agustin Rafael Hernández		9		
2	Miguel Tamara	Miguel Tamara	10		
3	Edit Beltrán	Edit B	11		
4	Jairo Tamara	Jairo	12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leclerc.	Nombre:	Magnaes Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SST
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLOSO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 28-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Creación de pilotes - Perforación de suelo		Desde 07:00 am
		Hasta 06.00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



CASCO	X
BOTAS	X
LENTES	X
GUANTES	X
PROT AUDIT	X
RESPIRADOR	
PROT FACIAL	
ARNÉS	
CARETA DE SOLDAR	
PROT CUERPO	

Otros:

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Armado de Barreno	1	Holladora - Barreno
2	Puesta en marcha de equipo	2	Palustre
3	Retiro de equipo para limpieza	3	Martillo
4		4	Llave inglesa
5		5	Flexometro.
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de Elementos de Protección personal	Trabajador
13	Pausa Activa - Hidratación	Trabajador - Jefe

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Talmera	Miguel Tamara	9		
2	Jairo Talmera	Jairo T. H	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Lefferc.	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SSO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MTTO COLUSO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Vegetacional Municipal - colusú		FECHA 29-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo para creación de pilote.		Desde 07:00 am Hasta 04:30 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas - Trazado	1 Hoyadora Perforo
2 Armado de equipo	2 Pehuenche
3 Inicio de excavación	3 Martillo
4 Retiro de equipo para limpieza	4 Llaves Inglesas
5	5 Flexómetro.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección Personal	Trabajador
13	Pausa Activa - Hidratación	Trabajador - SSO.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel Tamara	9		
2	Jairo Tamara	Jairo T. H	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Lecterc	Nombre:	Mauricio Agustin Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SSO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLOSO	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal - Colosó

FECHA 30-07-2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
Perforación de suelo con Barreno para creación de pilotes.

Desde 07:00 am

Hasta 05:30 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Tratado y Armado de Barreno	1 Herramientas - Barreno
2 Puesta en marcha de equipo	2 Machete
3 Retiro de equipo para limpieza	3 Palustre
4	4 Llave inglesa.
5	5 Flexómetro.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de Elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausa Activas - Hidratación	Trabajadores - SISO.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel Tamara	9		
2	Jairo Tamara	Jairo	10		
3	Augusto Rafael Hernández		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez (CIERC	Nombre:	Hernan Agustin Hernández
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 31-07-2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo y hincado de Pilotes — Desde 01:00 am — Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNES	CARETA DE SOLDAR	PROT. P. CUERPO
X	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐

Otros: Mascarilla

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Armado y Puesta en marcha equipo	1	Hincadora
2	Retiro de material de las excavaciones	2	Vibrador
3	Preparación de Concreto y transporte	3	Barreno - Holladora
4	Deposito de base de concreto	4	Pala
5	Instalación de acero	5	Carretilla - Baldes
6	Deposito de concreto restante - Vibrar.	6	Cilindro

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8 9	Uso de elementos de Protección personal	Trabajador
13	Pausas Activas - Hidratación.	Trabajador - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jairo Tamara	Jairo	9		
2	Augusto Rafael Hernandez	Rafael	10		
3	Miguel Emiro Tamara	Miguel Tamara	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc.	Nombre:	Mauricio Agudo Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SST
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 01-08-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo para creación de pilotes		Desde 07:00 am Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros: Reflectivo

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas	1 Paladragra
2 Puesta en marcha de equipo	2 Halladora - Barreno
3 Retiro de equipo para limpieza	3 Palaustre
4	4 Llave Inglesa
5	5 Flexometro
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajador - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Miguel Tomas Tamara		10		
3	Jairo Tamara		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Claudia Hernández Ardila	Nombre:	Mauricio Agustin Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024
LUGAR:	Juzgado Promiscuo Municipal Colosó.	FECHA 02-08-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	Perforacion de Suelo y bacheado de pista	Desde 07:00 am Hasta 05:30pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Armado y puesta en marcha de equipo	1 Maquinadora
2 Retiro de material de las cachillas	2 Vibrador
3 Preparación y transporte de concreto	3 Barreno - Holladera
4 Depósito de base del concreto	4 Palas
5 Inyección de acero.	5 Carretillas - Baldes.
6 Depósito de Concreto y Vibrado	6 Alindes

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajador
13	Pausa Activa - Hidratación	Trabajador - SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez		9		
2	Jairo Tamara	Jairo	10		
3	Miguel Támara	Miguel Tamara	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustin Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO
Firma:	Leclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 03-08-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo para creación de Aloes — Desde 04:00 am — Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas	1 Paladraga - Barra
2 Puesta en marcha de equipo	2 Holladora - Barreno
3 Retiro de equipo para limpieza.	3 Palustre
4	4 Llave inglesa
5	5 Flexómetro
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque electrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajador - SIGO

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernández	Rafael	9		
2	Jairo Támara	Jairo	10		
3	Miguel Támara	MIGUEL	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Claudia Hernández	Nombre:	Mauricio Agustin Henriquez
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgados Promiscuo Municipal Colosó		FECHA 04-08-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de Suelo Para creación de Pilots		Desde 07:00 am Hasta 01:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT AUDIT	RESPIRADOR	PROT FACIAL	ARNES	CARETA DE SOLDAR	PROT P CUERPO	Otros:
X	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas	1 Paladraga - Barra
2 Puesta en marcha del equipo	2 Halladera - Barreno
3 Retiro de equipo para limpieza	3 Palawtro
4	4 Clave Inglesa
5	5 Flexometro.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausas Activas - Hidratacion	Trabajadores - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernandez	Rafael	9		
2	Jairo Tamara	Jairo	10		
3	Miguel Tamara	Miguel	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Claudia Hernandez	Nombre:	Mauricio Agudelo Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	SST
Firma:	Hecler	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 05-08-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo para creación de Pilotes		Desde 07.00 am Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Toma de medidas	1	Palahraga - Barra
2	Puesta en marcha de equipo	2	Halladora - Barreno
3	Retiro de equpo para limpieza	3	Palaustre
4		4	Llave inglesa
5		5	Flexometro
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajadores - SISO

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernández		9		
2	Jairo Támara	OCAIVO	10		
3	Miguel Támara	Miguel	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Claudia Hernández	Nombre:	Mauricio Agustin Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:	MHeclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLASO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Hospital Promsino Municipal Celendín		FECHA 06-08-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo y vaciado de Pilote		Desde 07:00 am
		Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros: Mascarilla.

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Armado y puesta en marcha de equipo	1 Mezcladora
2 Retiro de material de las cuchillas - Bimeno	2 Vibradar
3 Preparación de concreto y transporte	3 Bimeno - Holladora
4 Depósito de base de concreto	4 Pala
5 Inserción de acero y ajuste	5 Carretilla - Baldes
6 Depósito de concreto y Vibrado	6 Cilindro

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección Personal	Trabajador
13	Pasos Activos - Advertencia	Trabajador - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernández	Rafael	9		
2	Jairo Támara	Jairo	10		
3	Miguel Támara	Miguel	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Claudia Hernández	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SSOMA
Firma:	Hecler	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024
LUGAR:	Juzgado Promiscuo Municipal Coloso	FECHA 07-08-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	Perforación de Sala para Creación de pilote	Desde 09:00 am Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



CASCO	☒
BOTAS	☒
LENTES	☒
GUANTES	☒
PROT AUDIT	☒
RESPIRADOR	☐
PROT FACIAL	☐
ARNÉS	☐
CARETA DE SOLDAR	☐
PROT PIERNAS	☐

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas	1 Paladraga
2 Puesta en marcha de equipo	2 Halladura - Barreno
3 Retiro de equipo para limpieza	3 Palanta
4	4 Llave inglesa
5	5 Flexometro
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de Elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajadores - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernández		9		
2	Jairo Andrés Tarazona		10		
3	Miguel Ernesto Tarazona		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Pedro Claudio Hernandez	Nombre:	Mauricio Agudelo Hurtados
Cargo:	Residente	Cargo:	SST
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó		FECHA 08 - 08 - 2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo y haceado de pilote.		Desde 07:00 am Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros: Manguito

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Armado y Puesta en marcha de equipo	1 Haceadora
2 Retiro de material de barreno	2 Vibrador
3 Preparación de concreto y transporte	3 Barreno - Holladera
4 Depósito de base de concreto	4 Palas
5 Inserción de acero y agua	5 Carretilla - Baldes
6 Depósito de concreto y Vibrado	6 Cilindros

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-11	Uso de elementos de protección personal	Trabajador
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajador - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jairo Tamara	Jairo	9		
2	Augusto Rafael Hernández	Rafael A	10		
3	Miguel Emiro Tamara	Miguel	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Hecmira Hernandez Leclerc	Nombre:	Mancia Agusta Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:	Leclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal colosó — FECHA 09-08-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo para creación de pilotes. — Desde 07:00 am — Hasta 03:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT AUDIT	RESPIRADOR	PROT FACIAL	ARNES	CARETA DE SOLDAR	PROT. PIES/CUERPO	Otros:
X	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas	1 Pala draga
2 Puesta en marcha de equipo	2 Holladora - Barreno
3 Retiro de equipo para limpieza	3 Palustre
4	4 Vara, nivel
5	5 Flexometro
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausas Activas Hidratación	Trabajador - SISO

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Agusto Rafael Hernández		9		
2	Juro Andrés Tamara		10		
3	Miguel Enrique Tamara		11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Claudia Hernández	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SSST
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 11-08-2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Ampliación de zapata. - Duro — Desde 07:00 am — Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas	1 Barra
2 Inicio de excavación y Retiro	2 Palas
3 Limpieza de area	3 Balde
4	4 Carretilla
5	5 Flexometro.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajador
13	Pausa Activa - Hidratación	Trabajador - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernández		9		
2	Jairo André Tárraga		10		
3	Germán Pérez Luna	Germanperez	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustin Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SST
Firma:	Leclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Caloví		FECHA 11-08-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de Suelo y vaciado de Pilotes.		Desde 01:30 pm Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Armado y Puesta en marcha de equipo	1	Mezcladora
2	Retiro de material de barreno	2	Vibrador
3	Preparación de concreto y transporte	3	Barreno - Halladora
4	Depósito de base de concreto	4	Pala
5	Inserción de acero y ajuste	5	Cornetilla - Balde
6	Depositar de concreto y vibrado.	6	Cilindros

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajador
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajador - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Javier Pérez Lund	Javier Perez	9		
2	Miguel Emiro Támara	Miguel	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustín Hincapie
Cargo:	Residente	Cargo:	SST
Firma:	Leclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 12 - 08 - 2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Ampliación de zapata - Pado		Desde 07:00 am Hasta 05:00 PM

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas	1 Barra - Palas
2 Inicio de excavacion y limpieza	2 Balde - carretilla
3 Preparacion de mezcla y transporte	3 Trompo - Mezcladora
4 Vaciado de Solado	4 Flexometro
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajador
13	Pausas Activas - Hidratacion	Trabajador - SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Amiro Tamara	Miguel	9		
2	Jairo Andrés Tamara	Jairo	10		
3	Augusto Rafael Hernandez	Augusto	11		
4	Javier Perez Luna	Javier Perez	12		
5	Germán Pérez Luna	Germán Perez	13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustín Hernandez
Cargo:	Residente	Cargo:	SSO
Firma:	MHeclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Integrado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 13-08-2024

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Ampliación de Zapata - Poda — Desde 07:00 am — Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Retiro de material - excavación	1	Palas - Picadoras
2	Toma de medidas	2	Carretilla - Baldes
3	Preparación de mezcla	3	Herradura
4	Vaciado de solado	4	Herrametro.
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajador
	Pausas Activas - Hidratación	Trabajador - SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Germán Pérez Cruz	Germán Pérez	9		
2	Javier Pérez Cruz	Javier Pérez	10		
3	Jaime Támara	Jaime	11		
4	Miguel Támara	Miguel	12		
5	Agosto Hernández	Agosto	13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SSO
Firma:	Leclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Ampliación de la tapata - Dado

FECHA 14-08-2025

Desde 07:00 am

Hasta 01:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Retiro de material acopiado	1 Palas - Palodiaga - Palustre
2 Toma de medida en dados	2 Carretilla - Baldes
3 Perforación de dados para anclaje	3 Taladro - Pulidora
4 Figuración y armado de acero	4 Mezcladora
5 Vaciado de Solado	5 Flexómetro.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajador
13	Pausa Activas - Hidratación.	Trabajador - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Germán Pérez Luna	Germán Perez	9		
2	Rafael Hernández	Rafael H	10		
3	Miguel Tamara	Miguel	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernández Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustin Hernández
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO
Firma:	Leclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal coloso

FECHA 14-08-2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
Perforación de Suelo Para Creación de pilotes.

Desde 07:00 am
Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Toma de medidas	1	Palustraga - Palas
2	Puesta en marcha de equipo	2	Hallcadora - Barreno
3	Retiro de equipo para Limpieza	3	Pautre
4		4	Llave inglesa
5		5	Flexómetro
6		6	Baldes - Carretilla.

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajadores - SISO

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Javier Pérez Luna	Javier Perez	9		
2	Jairo Támara Hernández	Jairo	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leclerc	Nombre:	Mauricio Agudo Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:	MHeclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso — FECHA 15 - 08 - 2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Ampliación de zapata. - Rudo — Desde 07:00 am — Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT AUDIT	RESPIRADOR	PROT FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. PIES/CUERPO	Otros:
☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Corte de Acero y Figuración	1	Figurador de Acero
2	Aplicación de epóxico - Anclaje	2	Tratadores
3	Inserción de Acero en dado.	3	Pistola de Anclaje.
4		4	
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
10 - 12	Uso de elementos de protección personal	Trabajador.
13	Pausas Activas - Hidratación.	

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Emiro Támara	mi9001	9		
2	Augusto Rafael Hurtado	~~Rafael~~	10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones: Se recomienda al trabajador el cuidado con el material de anclaje a utilizar para evitar contacto con la piel directo.

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Claudia Hurtado	Nombre:	Mauricio Agustí Hurtado
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

FECHA 15 - 08 - 2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo para creación de pilotes y baccada

Desde 07:00 am

Hasta 05:00 pm.

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Toma de medidas	1	Taladrage - Palas
2	Puesta en marcha de equipo	2	Halladora - Barreno
3	Retiro de equipos para limpieza.	3	Palustre
4	Preparación de concreto	4	Llave inglesa
5	Deposito de concreto y Acero.	5	Flexometro
6	Relleno.	6	Mezcladora - Vibrador

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajador
13	Pausa Activa - Hidratación	SST - Trabajador

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Javier Pérez Luna	Javier Pérez	9		
2	Germán Pérez Luna	Germán Pérez	10		
3	Jairo Támara	Jairo	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Fernanda Leclerc.	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SST
Firma:	Leclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo para creación de Pilotes.

FECHA 16-08-2025

Desde 0700 am

Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas	1 Paladragas - Pala
2 Puesta en marcha de equipo.	2 Herradura - Barreno
3 Retiro de equipo para limpieza.	3 Palustre
4	4 Llave inglesa
5	5 Cametilla.
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7,8,9	Uso de elementos de protección Personal	Trabajadores
13	Pausas Activas - Hidratacion	Trabajadores - SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Germán Pérez Luna	Germán Perez	9		
2	Javier Pérez Luna	Javier Perez	10		
3	Jairo Tamara	Jairo	11		
4	Miguel Tamara	Miguel	12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:	Leclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal coloso

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Ampliación de zapata. - Dado

FECHA 16 - 08 - 2025

Desde 01:00 am

Hasta 04:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



CASCO ☒ BOTAS ☒ LENTES ☒ GUANTES ☒ PROT AUDIT ☒ RESPIRADOR ☐ PROT FACIAL ☐ ARNÉS ☐ CARETA DE SOLDAR ☐ PROT. P/CUERPO ☐

Otros:

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Corte de Acero y Figuración	1	Figurador de Acero
2	Limpieza de área.	2	Tronzadora
3	Aplicación de andaje.	3	Pistola de andaje
4	Instalación de Acero	4	
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)		
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a particulas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
10-12	Uso de elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausa Activa - Hidratación	Trabajador - SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Augusto Rafael Hernández	Rafael	9		
2	Miguel Emiro Tamara	Miguel	10		
3	Jairo Andrés Tamara	Jairo	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SST
Firma:	Leclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Interior Promisoria Municipal Colorí — FECHA 17 - 09 - 2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo y vaciado de pilotes — Desde 07:00 am — Hasta 02:30 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Armado y puesta en marcha de equipo	1	Motolodora.
2	Retiro de material de berreno	2	Vibrador
3	Preparación de concreto y transporte	3	Berreno - Motladora
4	Vaciado de base de concreto	4	Pala
5	Instalación de acero y ayuda.	5	Carretilla - Baldes
6	Depósito de concreto y Vibrado	6	Cilindros

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección Personal	Trabajadors
13	Pausas Activas - Hidratación.	Trabajadors - SSO

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Germán Páez Luna	Germán Páez	9		
2	Javier Páez Luna	Javier Páez	10		
3	Jairo Tamara	Jairo	11		
4	Miguel Tamara.	Miguel	12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SSyA
Firma:	MHecler	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó

FECHA 17-09-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Ampliación de tapacta. - Dado

Desde 07:00 am

Hasta 02:30 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. P. CUERPO	Otros:
X	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Cork y Figuración de Acero	1	Bichiroques
2	Armado de Parrillas.	2	tratadora
3	Aplicación de epoxico	3	Figurado de Acero
4	Amarre de acero troslapado	4	Pistola de anclaje
5		5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)			
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16			
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17			
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18			
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19			

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
10-12	Uso de elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajador -SST
1	Retiro de materiales - Señalización.	Trabajador -SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Emiro Tamara		9		
2	Jairo Tamara	Jairo	10		
3	Rafael Hernández.	Rafael	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Nini Claudia Hinojosa	Nombre:	Mauricio Agudo Hinojosa
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:		Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal coloso. FECHA 13-08-2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Ampliación de tapita - Dado Desde 07:00 am Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Preparacion y Aplicación de Sikadur 32	1	Mezcladora
2	Reparación y transporte de concreto	2	Brocha
3	Vaciado de concreto	3	Baldes - carretillas
4	Vibrado	4	Palas
5	Relleno con concreto fortank	5	Vibro
6	Pulida	6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8-9	Uso de elementos de protección personal	Trabajadores
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajadores - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Emiro Tamara	miguel	9		
2	Jairo Tamara Hernandez	Jairo	10		
3	Javier Parra Luna	Javier Perez	11		
4	Germán Parra Luna.	German Perez	12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustin Hernandez
Cargo:	Residente.	Cargo:	SST
Firma:	Leclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Interior Remixeo Municipal Coloso

FECHA 18-08-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Ampliación de zapata

Desde 07:00 am

Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Corte y figuración de Acero	1	Figurador de acero
2	Presentación en area	2	Bichero que
3	Colocación de Panela?	3	Flexómetro
4	Ajuste, toma de medidas y amarre	4	
5	Amarre de parrilla en pilotes y pedestal	5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
9-10	Uso de elementos de protección personal	Trabajador
13	Pausas Activas - Hidratación.	Trabajador - SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Agosto Rafael Hernández		9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Leclerc	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente	Cargo:	SSTT
Firma:	MLeclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgados Promiscuo Municipal cobró — FECHA 19-08-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Ampliación de zapata - Dado. — Desde 07:00 am — Hasta 01:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Instalación de formaletas	1	Mezcladora
2	Preparación y aplicación Sikadur 32	2	Zaranda
3	Preparación y transporte de concreto	3	Brocha
4	Fundida de concreto	4	Baldes - Carretilla
5	Vibrado y Relleno.	5	Palas
6	Curado.	6	Vibrador

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7,8,9	Uso de elementos de Protección personal	Trabajador
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajador - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jairo Andres Tramona	Jairo	9		
2	Miguel Jaimes Toscano	Miguel	10		
3	Javier Pérez Luna	Javier Perez	11		
4	Germán Pérez Luna	German perez	12		
5	Augusto Rafael Hernández	~~Rafael~~	13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maicol Hernandez Leclerc.	Nombre:	Mauricio Agustín Hernández
Cargo:	Residente.	Cargo:	SISO.
Firma:	MLeclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO MTO COLOSO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Cobrí — FECHA 19-08-25

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Perforación de suelo para creación de pilotes — Desde 01:00 pm — Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medida,	1 Perforadora
2 Puesta en marcha de equipo	2 Holladora - Barreno
3 Retiro de equipo para limpieza	3 Palustre
4	4 Llave inglesa
5	5 Flexómetro
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caida a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caida a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
7-8 a	Uso de elementos de Protección personal	Trabajadores
13	Pausas Activas - Hidratación	Trabajador - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Germán Peña Luna	Germán Perez	9		
2	Javier Perez Luna	Javier Perez	10		
3	Jairo Andrés Tamara	Jairo	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Heminta Leclerc	Nombre:	Marcio Agustín Hurtado
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:	MLeclerc	Firma:	

Powered by CamScanner

CAPACITACIONES

CONSORCIO MTTO COLOSO	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, REUNIONES E INDUCCION	REGISTRO VERSION: 001 17/01/2024

FECHA: 08/08/2025

FACILITADOR: Yaileth Díaz Pérez

LUGAR: Juzgado promiscuo Municipal Colosó

INDUCCION [X] CAPACITACION [ ] REUNION [ ] REINDUCCION [ ]

TEMA: Accidentes de trabajo

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL SGSST, EL TEMA ESPECIFICO Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Augusto Rafael Hernandez B.	Herrero	
Javier Enrique Perez Luna	Ayudante	Javier Perez
Germán Andres Perez Luna	Ayudante	Germán Perez
Miguel Emiro Tamara Toscano.	Ayudante	Miguel Tamara
Jairo Tamara Hernandez	Ayudante	Jairo Tamara

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

Licita Civil Especializada


Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO. SAMC 02 DE 2025

"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

CONSORCIO MTTO COLOSO
NIT: 901.950.642-2

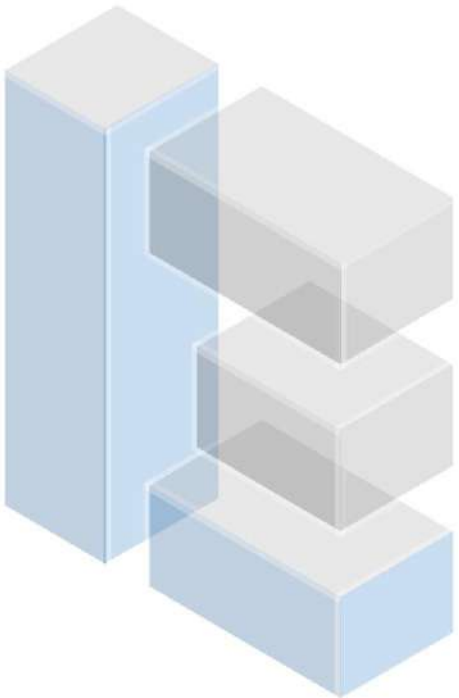

2025

Enciviles
Empresa Nacional de Obras Civiles
Estudios, Diseño, Suministro, Aseo, Construcción e Interventoría
Edificaciones, Vías, Urbanismo, Agua Potable y Saneamiento Básico

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 20 de junio de 2025

Se lleva a cabo la firma del Acta de Inicio del contrato de obra, con la participación del contratista, la interventoría y la supervisión técnica del proyecto.

Se realiza un recorrido de reconocimiento a las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó – Sucre, con el propósito de identificar las condiciones físicas iniciales del inmueble.

Durante la inspección visual, se evidenciaron diversas patologías constructivas, entre ellas fisuras y grietas en muros y pisos. Estos hallazgos fueron debidamente documentados mediante registro fotográfico, el cual será anexado como soporte del estado inicial de la infraestructura.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 21 de junio de 2025

Se adelanta la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 22 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 23 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 24 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 25 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 26 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 27 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 28 de junio de 2025

En la fecha se realiza visita a las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó**,** con el fin de iniciar las actividades correspondientes al contrato de obra. Sin embargo, no fue posible dar apertura a las labores programadas, debido a que no se contaba con las llaves de acceso al inmueble**,** situación que impidió el ingreso del personal técnico y operativo a las áreas de intervención.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 29 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes, 30 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra

Se envía oficio de solicitud a la entidad para acceder a las instalaciones el día martes 31 de junio de 2025 con su respectiva afiliación a ARL.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 01 de julio de 2025

Se continúa a la espera de la aceptación formal por parte de la Entidad para el ingreso del personal técnico y operativo a las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó, así como de la entrega de las llaves de acceso por parte del personal de vigilancia.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 02 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se realiza el ingreso de herramientas al área de trabajo dentro del Palacio de Justicia de Colosó.
- Se efectúa la des energización del circuito eléctrico principal, con el fin de garantizar condiciones seguras para la intervención.
- Se implementa una alimentación eléctrica provisional al tablero, permitiendo la continuidad de las labores programadas.
- Se procede con el desmonte de luminarias existentes.
- Se inicia el desmonte del cielo raso existente y su respectiva estructura de soporte.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 03 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Actividades desarrolladas:

- Se realiza el desmonte de puertas internas del inmueble.
- Se da inicio a la demolición del enchape de piso existente
- Se continua el desmonte del cielo raso existente y su respectiva estructura de soporte.
- Se acopia el material en las instalaciones del palacio de justicia que se encontraba obstruyendo el paso de los peatones.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 04 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores – Taladro demoledor makita – Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se realiza trazado y replanteo.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Se hace corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se lleva a cabo corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

Esta exploración se realiza con el objetivo de verificar la existencia y ubicación de las vigas de cimentación, teniendo en cuenta que se ha detectado una discrepancia entre los planos entregados por la consultoría y las condiciones reales encontradas en obra a nivel de cimentación.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 05 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se inicia demolición de obras en concreto.
- Se realiza acopio y organización de los materiales sobrantes productos de las demoliciones.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 06 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 07 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra
- 2 Instaladores de puertas y ventanas

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se hace el desmonte de la puerta principal, ventanas de fachada, ventas de interiores y ventana lateral.

- Se inicia con una nueva exploración en cimentación con el objetivo de verificar la existencia y ubicación de vigas de cimentación, debido a inconsistencias previamente detectadas entre los planos entregados y las condiciones reales observadas en obra.

- Se realiza corte y demolición de plantilla de concreto existente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 08 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades desarrolladas:

- Se hace la instalación del cerramiento y señalización en el área a intervenir.

- Se realiza corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 09 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se inicia exploración de cimentación en una nueva área
- Se realiza corte y demolición de plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 10 de julio de 2025

Eventualidad: Se presentaron fuertes lluvias en la zona de intervención, lo cual ocasionó la suspensión del fluido eléctrico en las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó**.**

El servicio fue restablecido hacia las 11:30 a.m**.**, una vez solucionada la falla, lo que generó retrasos en el inicio de las actividades programadas para la mañana, específicamente aquellas que requerían el uso de herramientas eléctricas.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se retira moldura de madera en el área de recepción.
- Se realiza corte de plantilla de concreto existente para nueva exploración.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 11 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra

- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se realiza demolición de plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.
- Acopio de material en las instalaciones del palacio de justicia que se encontraba obstruyendo el paso de los peatones.

De acuerdo a lo encontrado en obra se realiza comité en conjunto con la interventoría para exponer las novedades e informar a la entidad sobre las discrepancias de los estudios y diseños presentados por la consultoría, las cuales imposibilitan la continuidad de las actividades

Se envía solicitud de suspensión de obra hasta tanto no se definan las actividades a ejecutar conforme los ajustes técnicos que sean aprobados por la interventoría.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 12 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra

- 2 Ayudante de obra
- Ingenieras de supervisión

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.

Durante la jornada se contó con la **visita de la supervisión técnica** al área de trabajo, con el fin de verificar el avance de las actividades y revisar en sitio las condiciones encontradas en obra.

Observaciones:
No fue posible avanzar con actividades relacionadas con elementos estructurales, en tanto se está a la espera de que la Entidad contratante remita los planos y diseños actualizados, ajustados a las condiciones reales identificadas en obra. Esta documentación es necesaria para garantizar la correcta ejecución de las intervenciones y evitar reprocesos o afectaciones técnicas futuras.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 13 de julio de 2025

Clima: soleado.

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 14 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se inicia con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 15 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 16 de julio de 2025

Se recibe planos estructurales actualizados y especificaciones técnicas correspondientes al nuevo frente de trabajo, remitidos por la Entidad contratante. Con base en esta información, se iniciaron las acciones necesarias para la organización logística y técnica del área, incluyendo la planificación de recursos, personal y equipos requeridos para el desarrollo de las nuevas actividades constructivas.

Se inicia con el calculo de cantidades de obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 17 de julio de 2025

Se continua con el cálculo de cantidades de obra, con base en los planos estructurales actualizados y las especificaciones técnicas recibidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 18 de julio de 2025

Se continua con el cálculo de cantidades de obra, con base en los planes estructurales actualizados y las especificaciones técnicas recibidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 19 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Acopio de material estructural (acero) en las instalaciones del palacio de justicia.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 20 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 21 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se inicia con el corte de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 22 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.
- Se continua con excavación manual de material común, verificando que el área establecida en planos permita trabajar en ella.
- Se realiza demolición de cabina de motobomba ubicada en el área a intervenir para ampliación

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 23 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común, verificando que el área establecida en planos permita trabajar en ella

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 24 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 25 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 26 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 27 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 28 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 29 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.
- Se continua con excavación manual de material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 30 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 31 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 01 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 02 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 03 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 04 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Martes, 05 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 06 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 07 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 08 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores - Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.
- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 09 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Actividades:

- Se inicia corte de plantilla de contrapiso.
- Se inicia demolición de plantilla de losa de contra piso.

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 10 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 11 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se hace corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 12 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se continua con el corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.
- Se continua con el corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 14 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

- Se continua con el figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 15 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores - Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.
- Se continua con excavación manual en material común.
- Se continua con el figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sábado, 16 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Actividades:

- Se inicia corte de plantilla de contrapiso.
- Se inicia demolición de plantilla de losa de contra piso.
- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 17 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes, 18 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 19 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores


Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

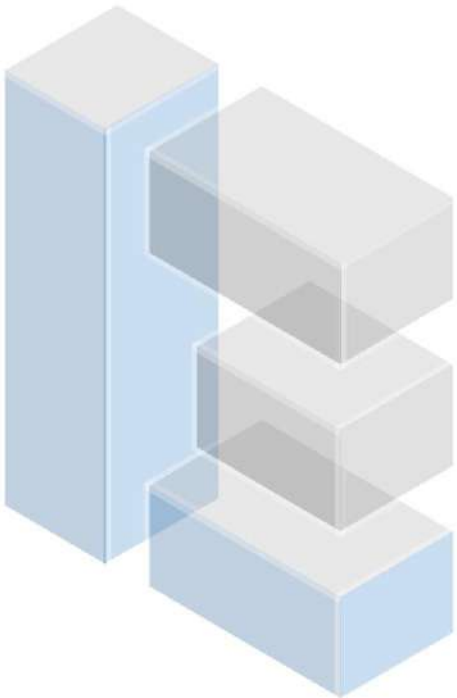

CANTIDADES DE OBRA

Licita Civil Especializada


Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO. SAMC 02 DE 2025

"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

CONSORCIO MTTO COLOSO
NIT: 901.950.642-2

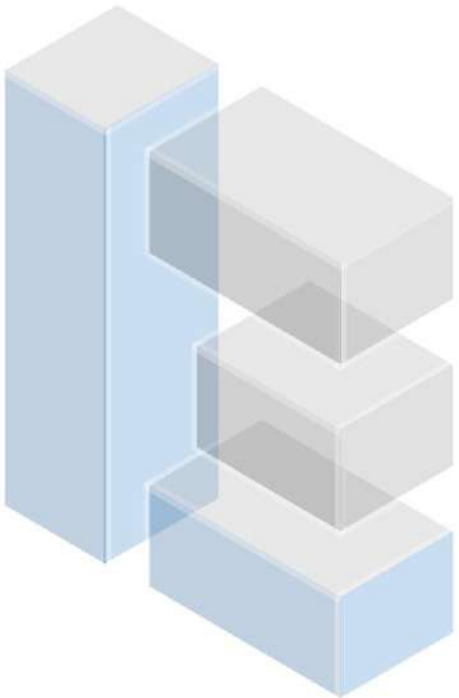

2025

Enciviles
Empresa Nacional de Obras Civiles
Estudios, Diseño, Suministro, Aseo, Construcción e Interventoría
Edificaciones, Vías, Urbanismo, Agua Potable y Saneamiento Básico

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 20 de junio de 2025

Se lleva a cabo la firma del Acta de Inicio del contrato de obra, con la participación del contratista, la interventoría y la supervisión técnica del proyecto.

Se realiza un recorrido de reconocimiento a las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó – Sucre, con el propósito de identificar las condiciones físicas iniciales del inmueble.

Durante la inspección visual, se evidenciaron diversas patologías constructivas, entre ellas fisuras y grietas en muros y pisos. Estos hallazgos fueron debidamente documentados mediante registro fotográfico, el cual será anexado como soporte del estado inicial de la infraestructura.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 21 de junio de 2025

Se adelanta la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 22 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 23 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 24 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 25 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 26 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 27 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 28 de junio de 2025

En la fecha se realiza visita a las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó**,** con el fin de iniciar las actividades correspondientes al contrato de obra. Sin embargo, no fue posible dar apertura a las labores programadas, debido a que no se contaba con las llaves de acceso al inmueble**,** situación que impidió el ingreso del personal técnico y operativo a las áreas de intervención.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 29 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes, 30 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra

Se envía oficio de solicitud a la entidad para acceder a las instalaciones el día martes 31 de junio de 2025 con su respectiva afiliación a ARL.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 01 de julio de 2025

Se continúa a la espera de la aceptación formal por parte de la Entidad para el ingreso del personal técnico y operativo a las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó, así como de la entrega de las llaves de acceso por parte del personal de vigilancia.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 02 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se realiza el ingreso de herramientas al área de trabajo dentro del Palacio de Justicia de Colosó.
- Se efectúa la des energización del circuito eléctrico principal, con el fin de garantizar condiciones seguras para la intervención.
- Se implementa una alimentación eléctrica provisional al tablero, permitiendo la continuidad de las labores programadas.
- Se procede con el desmonte de luminarias existentes.
- Se inicia el desmonte del cielo raso existente y su respectiva estructura de soporte.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 03 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Actividades desarrolladas:

- Se realiza el desmonte de puertas internas del inmueble.
- Se da inicio a la demolición del enchape de piso existente
- Se continua el desmonte del cielo raso existente y su respectiva estructura de soporte.
- Se acopia el material en las instalaciones del palacio de justicia que se encontraba obstruyendo el paso de los peatones.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 04 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores – Taladro demoledor makita – Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se realiza trazado y replanteo.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- Se hace corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se lleva a cabo corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

Esta exploración se realiza con el objetivo de verificar la existencia y ubicación de las vigas de cimentación, teniendo en cuenta que se ha detectado una discrepancia entre los planos entregados por la consultoría y las condiciones reales encontradas en obra a nivel de cimentación.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 05 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se inicia demolición de obras en concreto.
- Se realiza acopio y organización de los materiales sobrantes productos de las demoliciones.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 06 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 07 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra
- 2 Instaladores de puertas y ventanas

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se hace el desmonte de la puerta principal, ventanas de fachada, ventas de interiores y ventana lateral.

- Se inicia con una nueva exploración en cimentación con el objetivo de verificar la existencia y ubicación de vigas de cimentación, debido a inconsistencias previamente detectadas entre los planos entregados y las condiciones reales observadas en obra.

- Se realiza corte y demolición de plantilla de concreto existente.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 08 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades desarrolladas:

- Se hace la instalación del cerramiento y señalización en el área a intervenir.

- Se realiza corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 09 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se inicia exploración de cimentación en una nueva área
- Se realiza corte y demolición de plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 10 de julio de 2025

Eventualidad: Se presentaron fuertes lluvias en la zona de intervención, lo cual ocasionó la suspensión del fluido eléctrico en las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó**.**

El servicio fue restablecido hacia las 11:30 a.m**.**, una vez solucionada la falla, lo que generó retrasos en el inicio de las actividades programadas para la mañana, específicamente aquellas que requerían el uso de herramientas eléctricas.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se retira moldura de madera en el área de recepción.
- Se realiza corte de plantilla de concreto existente para nueva exploración.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 11 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra

- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se realiza demolición de plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.
- Acopio de material en las instalaciones del palacio de justicia que se encontraba obstruyendo el paso de los peatones.

De acuerdo a lo encontrado en obra se realiza comité en conjunto con la interventoría para exponer las novedades e informar a la entidad sobre las discrepancias de los estudios y diseños presentados por la consultoría, las cuales imposibilitan la continuidad de las actividades

Se envía solicitud de suspensión de obra hasta tanto no se definan las actividades a ejecutar conforme los ajustes técnicos que sean aprobados por la interventoría.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 12 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra

- 2 Ayudante de obra
- Ingenieras de supervisión

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.

Durante la jornada se contó con la **visita de la supervisión técnica** al área de trabajo, con el fin de verificar el avance de las actividades y revisar en sitio las condiciones encontradas en obra.

Observaciones:
No fue posible avanzar con actividades relacionadas con elementos estructurales, en tanto se está a la espera de que la Entidad contratante remita los planos y diseños actualizados, ajustados a las condiciones reales identificadas en obra. Esta documentación es necesaria para garantizar la correcta ejecución de las intervenciones y evitar reprocesos o afectaciones técnicas futuras.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 13 de julio de 2025

Clima: soleado.

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 14 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se inicia con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 15 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 16 de julio de 2025

Se recibe planos estructurales actualizados y especificaciones técnicas correspondientes al nuevo frente de trabajo, remitidos por la Entidad contratante. Con base en esta información, se iniciaron las acciones necesarias para la organización logística y técnica del área, incluyendo la planificación de recursos, personal y equipos requeridos para el desarrollo de las nuevas actividades constructivas.

Se inicia con el calculo de cantidades de obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Jueves, 17 de julio de 2025

Se continua con el cálculo de cantidades de obra, con base en los planos estructurales actualizados y las especificaciones técnicas recibidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 18 de julio de 2025

Se continua con el cálculo de cantidades de obra, con base en los planes estructurales actualizados y las especificaciones técnicas recibidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 19 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Acopio de material estructural (acero) en las instalaciones del palacio de justicia.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 20 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 21 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se inicia con el corte de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 22 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.
- Se continua con excavación manual de material común, verificando que el área establecida en planos permita trabajar en ella.
- Se realiza demolición de cabina de motobomba ubicada en el área a intervenir para ampliación

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 23 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común, verificando que el área establecida en planos permita trabajar en ella

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 24 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 25 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 26 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 27 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 28 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 29 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte de acero de refuerzo.
- Se continua con excavación manual de material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 30 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 31 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 01 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 02 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 03 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 04 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Martes, 05 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 06 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 07 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 08 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría

- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores - Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.
- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 09 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Actividades:

- Se inicia corte de plantilla de contrapiso.
- Se inicia demolición de plantilla de losa de contra piso.

- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 10 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 11 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se hace corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 12 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.
- Se continua con el corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.
- Se continua con el corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 14 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades:

- Se continua con excavación manual en material común.

- Se continua con el figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 15 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores - Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.
- Se continua con excavación manual en material común.
- Se continua con el figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sábado, 16 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 2 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Actividades:

- Se inicia corte de plantilla de contrapiso.
- Se inicia demolición de plantilla de losa de contra piso.
- Se continua con excavación manual en material común.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 17 de agosto de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes, 18 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Trozadora industrial

Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 19 de agosto de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Herrero
- 4 Ayudantes de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores


Actividades:

- Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

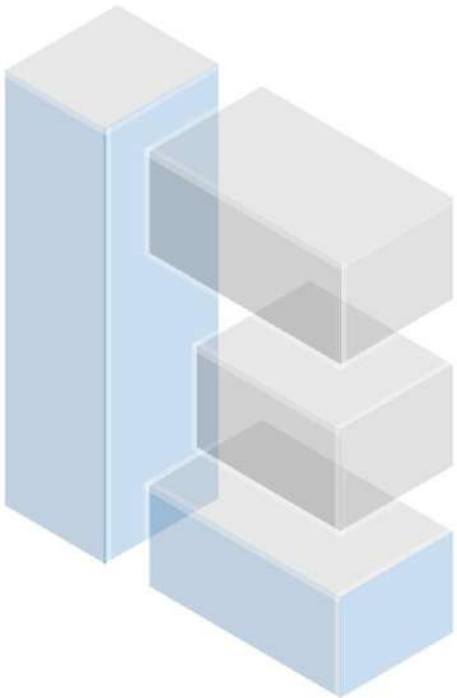

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Sincelejo – Sucre, 22 de julio de 2025

OF-004-MC06-2025

Señores

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora de contratos SAMAC 02 de 2025 y MC 06 de 2025
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

Coloso - Sucre

Referencia: Invitación Pública Nº MC 06 de 2025, "*Interventoría al contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de coloso sucre"*

Asunto: Respuesta a OFICIO No. 001 – SUPERVISIÓN. Solicitud de informe detallado sobre ausencia de actividades por parte del contratista de obra.

Cordial saludo

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual se solicita informe detallado sobre ausencia de actividades del contrato de obra SAMC 02 de 2025, cuyo objeto es el "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO - SUCRE", nos permitimos, en el ejercicio de nuestras funciones como interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental del contrato en mención, dar respuesta a los puntos requeridos:

1. **Informe detallado de las razones por las cuales el contratista no esta desarrollando actividades en el sitio de ejecución de obra:**

   De acuerdo con los expresado por el contratista en el oficio No. 004 MTTO COLOSO del 16 de julio de 2025, e indicado en el comité de obra No. 002, llevado a cabo el día 11 de julio de 2025, la suspensión temporal de actividades obedece a las siguientes razones:

- **Situaciones técnicas identificadas en sitio:** El contratista manifestó que, tras iniciar actividades de reconocimiento en sitio, se identificaron inconsistencias entre los estudios, diseños y planos entregados por la entidad contratante y las condiciones reales encontradas en campo. Esta situación fue documentada en el acta de comité

y fue reconocida por esta interventoría como un hecho relevante que afecta la planificación, ejecución y presupuestación del proyecto.

- **Entrega tardía de información técnica ajustada:** El contratista indicó que, para la fecha del informe de inactividad (16 de julio de 2025), apenas se había recibido un plano estructural aprobado por parte de la entidad el mismo miércoles 16 de julio de 2025, documento que resulta esencial para definir nuevos frentes de trabajo y su logistica. En ausencia de esta información, no era posible continuar con la ejecución conforme a lo establecido contractualmente y a los lineamientos técnicos y normativos aplicables.

- **Organización logística posterior a la recepción del plano:** Finalmente, el contratista señaló que, tras la recepción del plano estructural, se requirió un proceso de organización operativa que incluyó adquisición y transporte de materiales, movilización de personal técnico y operativo, y adecuación de condiciones mínimas de seguridad y acopio. Este proceso, según fue indicado, implica un tiempo razonable de coordinación, especialmente considerando las condiciones logísticas del municipio de Colosó – Sucre.

  Con base en lo anterior, el contratista atribuye la inactividad registrada al 16 de julio de 2025 a causas externas a su voluntad, relacionadas con la espera de insumos técnicos por parte de la entidad y la logística previa requerida para el reinicio de obra.

  En nuestro trabajo como interventores hemos estado presto a toda solución, realizamos nuestras supervisión pertinente y en cada comité se ha expresado las dificultades provenientes de una consultoría que no refleja la realidad encontrada en obra, donde se reitera la discrepancia de planos y presupuesto a ejecutar.

  No obstante, se informa que, a la fecha de emisión de este oficio, el contratista ha reiniciado labores en campo con base en los planos suministrados por la entidad el día 16 de julio del 2025.

  Se adjunta evidencia:



Actividad: Excavación manual en material común.



Actividad: Excavación manual en material común y retiro de material sobrante.



Actividad: Corte y figuración de acero para pilotes.



Actividad: Figuración de acero para pilotes.

2. **Medidas que propone la interventoría para superar las problemáticas identificadas durante el proceso de ejecución de obra:**

R/ Durante el comité técnico previamente mencionado, se definieron compromisos puntuales por cada una de las partes, los cuales buscan mitigar los inconvenientes identificados y garantizar el avance continuo del contrato. Estos compromisos son:

- Entidad contratante: Entrega de los planos definitivos del proyecto.
- Contratista de obra: Ajuste del presupuesto con base en los planos definitivos incluyendo ítems adicionales y modificaciones de cantidades; así como la presentación de una reprogramación al cronograma de actividades de obra.
- Interventoría: Evaluación y emisión del concepto técnico sobre los planos definitivos entregados por la entidad, análisis del presupuesto ajustado por el contratista para su posterior aprobación y revisión y validación de la nueva programación de actividades conforme el ajuste realizado.

Atentamente,



_____ _____

ING. RAMON LOPEZ CAMARGO
Representante Legal (e)
FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S

ANEXAMOS OFICIO ENVIADO DEL CONTRATISTA EN JUSTIFICANDO EL DIA NO LABORADO.

Sincelejo – Sucre, 22 de julio de 2025

OF-005-MC06-2025

Señores

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora de contratos SAMAC 02 de 2025 y MC 06 de 2025
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

Coloso - Sucre

Referencia: Invitación Pública No. MC 06 de 2025, "*Interventoría al contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de coloso sucre"*


Asunto: Respuesta a OFICIO No. 002 – SUPERVISIÓN. Aporte de información.

Cordial saludo

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual se solicita información relacionada con la solicitud formal de suspensión del contrato de obra SAMC 02 de 2025, cuyo objeto es el "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO - SUCRE", presentada por parte del contratista mediante **Oficio No. 003-MTTO-COLOSO**, con fecha de 15 de julio de 2025, esta interventoría en el ejercicio de sus funciones, se permite informar que el contratista ha manifestado que no dará continuidad a dicha solicitud, en razón a que actualmente se desarrollan actividades en obra con base en el plano suministrado recientemente por la entidad contratante.

Interventoría continúa a la espera de la totalidad de los planos y diseños definitivos por parte de la entidad, los cuales constituyen insumos técnicos esenciales para adelantar el análisis técnico-financiero requerido para el nuevo ajuste presupuestal y en consecuencia, la validación de la nueva programación de obra.

Atentamente,



ING. RAMON LOPEZ CAMARGO
Representante Legal (e)
FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

OFICIO No. 001 – SUPERVISIÓN
Sincelejo, Sucre 21 de julio de 2025

JOSE PASTOR MAESTRE SABALZA
FORMULACIÓN Y CONSTRUCCION S.A.S.
Contrato de interventoría MC 06 DE 2025

Asunto: Solicitud de informe detallado sobre ausencia de actividades por parte del contratista de obra.

Cordial saludo,

En atención al oficio remitido por ustedes, mediante el cual se informa que el contratista de obra SAMC 02 DE 2025 el cual tiene como objeto: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE", no se encuentra ejecutando labores en el frente de obra, y considerando la responsabilidad que le asiste a la interventoría en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato, me permito solicitar lo siguiente:

1. Informe detallado de las razones por las cuales el contratista no está desarrollando actividades en el sitio de ejecución de obra.
2. Medidas que propone la interventoría para superar las problemáticas identificadas durante el proceso de ejecución del contrato.
3. Propuesta de acciones concretas, cronograma ajustado y recomendaciones que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos contractuales.

Lo anterior con el fin de adoptar decisiones oportunas desde la supervisión para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y dejar constancia para los fines pertinentes, entre los cuales se encuentran:

- La trazabilidad del seguimiento contractual.
- El soporte ante posibles requerimientos de la entidad contratante.

Agradezco su atención y quedo atento al envío de la información solicitada en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles.

Cordialmente,

Francy Lorena Hernandez Arrieta
Supervisora de contratos SAMC 02 DE 2025 Y MC 06 DE 2025
Profesional universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

OFICIO No. 002 – SUPERVISIÓN
Sincelejo, Sucre 21 de julio de 2025

JOSE PASTOR MAESTRE SABALZA
FORMULACIÓN Y CONSTRUCCION S.A.S.
Contrato de interventoría MC 06 DE 2025

Asunto: Aporte de información.

Cordial saludo,

En calidad de supervisora designada del contrato de interventoría número MC 06 DE 2025, cuyo objeto contractual corresponde a: "INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE" del contrato de obra No. SAMC 02 DE 2025, me permito manifestar que, a través del **Oficio No. 003-MTTO-COLOSO** con fecha de 15 de julio de 2025, el contratista de obra presentó una solicitud formal de suspensión de actividades, exponiendo una serie de situaciones que afectan la normal ejecución del proyecto. Actualmente y con lo acontecido, la entidad requiere tener conocimiento si la solicitud proporcionada sigue vigente o con la información suministrada por la entidad el proyecto sigue en curso. De la misma manera, se solicita respetuosamente presentar un cronograma de acciones específicas encaminadas a gestionar y resolver los aspectos identificados por el contratista, con el fin de procurar la continuidad y buen desarrollo del objeto contractual.

Es importante señalar que el curso de la ejecución debe mantenerse dentro de los márgenes de cumplimiento, considerando siempre las herramientas contractuales y técnicas disponibles para la superación de contingencias sin que ello implique necesariamente la suspensión del contrato. La información solicitada será de utilidad para orientar decisiones desde la supervisión y generadora del gasto para mantener la trazabilidad del proceso contractual.

Agradezco de antemano su atención y gestión, quedando atento a la entrega del cronograma en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles.

Cordialmente,

Francy Lorena Hernandez Arrieta
Supervisora de contratos SAMC 02 DE 2025 Y MC 06 DE 2025
Profesional universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Colosó, Sucre
30 de Julio de 2025

Señores
CONSORCIO INTERVENTORÍA MC 06 DE 2025
Att: Ing. Ramón Andrés López Camargo
Representante de Interventoría
Colosó – Sucre

Asunto: Solicitud de comité de obra urgente

Cordial saludo,

Nos permitimos solicitar de manera atenta la realización de un comité de obra con presencia de la interventoría para el día de hoy a las 3:00 p.m. en las instalaciones del proyecto.


Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien la semana pasada la entidad aportó planos estructurales actualizados con el fin de abrir frentes de trabajo, durante el desarrollo de las actividades en obra se han evidenciado ciertas situaciones que han generado la necesidad de realizar modificaciones sobre dichos planos.

Por lo tanto, se requiere con urgencia la revisión técnica conjunta para definir acciones y ajustes pertinentes.

Agradecemos de antemano su atención y disposición.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO
Representante Legal
Consorcio MTTO COLOSO
Contrato SAMC 02 DE 2025

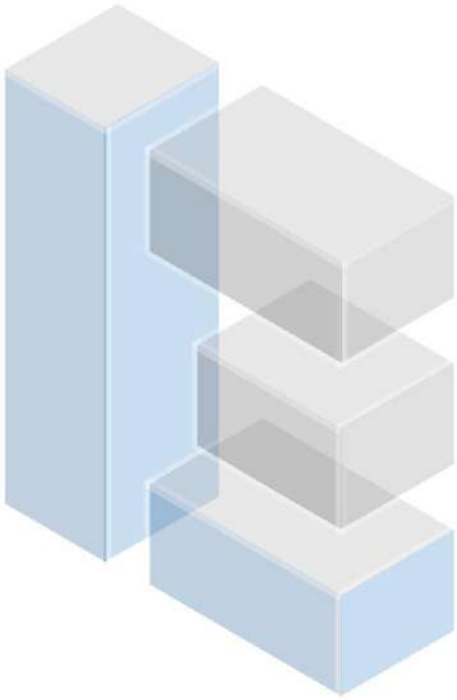

Enciviles
Empresa Nacional de Obras Civiles
Estudios, Diseño, Suministro, Aseo, Construcción e Interventoría
Edificaciones, Vías, Urbanismo, Agua Potable y Saneamiento Básico

IMPLEMENTACION AMBIENTAL

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SINCELEJO

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL

INTERVENTORÍA: FORMULACIÓN Y CONTRUCCIÓN S.A.S

NIT: 901.825.725-0

CONTRATO No. MC 06 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO:

"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

PERIODO:

20 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE AGOSTO DE 2025

COLOSO - SUCRE

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto **"Reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del Palacio de Justicia de Colosó, Sucre"** comprende la ejecución de actividades orientadas a garantizar la estabilidad, funcionalidad y seguridad de la edificación del complejo de la Rama Judicial en dicho municipio.

En desarrollo de este contrato, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo adelantó la gestión del proyecto, en cumplimiento de su misión y de los objetivos institucionales. Por su parte, esta interventoría realiza el seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, normativos, ambientales y contractuales establecidos.

De igual forma, y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160 del 12 de junio de 2014**,** proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se adopta el Plan de Gestión Ambiental para la Rama Judicial**.** Dicho instrumento define los lineamientos, objetivos y estrategias que orientan la gestión ambiental de los proyectos, en concordancia con la política del Sistema Integrado de Gestión, Control y Mejora Ambiental (SIGCMA), los objetivos ambientales de la Rama Judicial y la normatividad vigente.

En este marco, la interventoría presenta el siguiente informe de implementación ambiental, mediante el cual se evidencian las actividades realizadas, el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como el compromiso con la sostenibilidad, la prevención de impactos negativos y la mejora continua en el desarrollo de las obras.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de Colosó, departamento de Sucre, ubicado en la subregión de los Montes de María, caracterizado por una riqueza ambiental en flora, fauna y recursos hídricos.

La ubicación geográfica del complejo judicial, en un entorno sensible desde el punto de vista ecológico, hace necesario fortalecer las estrategias de gestión ambiental que permitan minimizar impactos negativos en la operación y mantenimiento de las instalaciones.

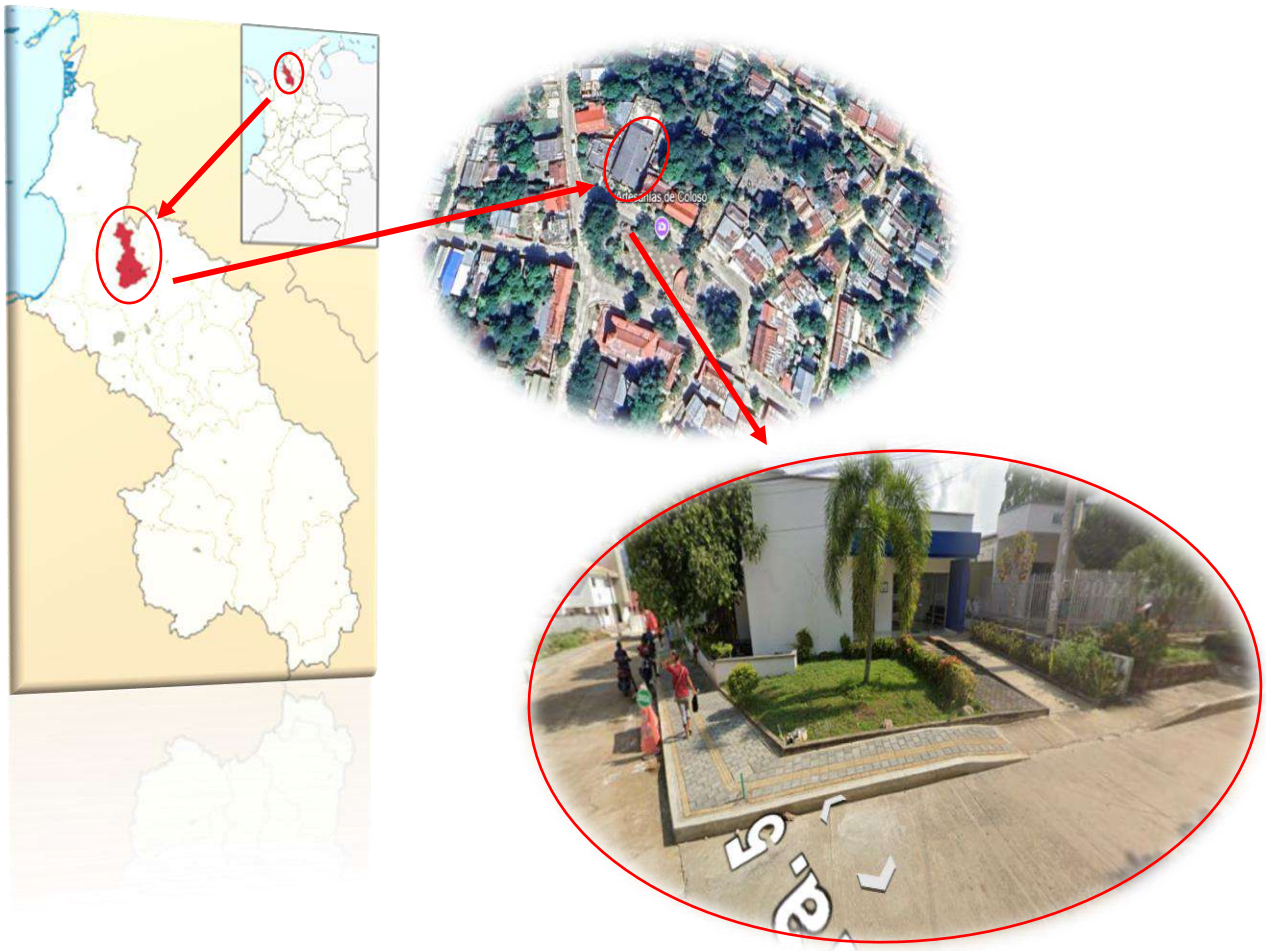


Ilustración 1: Localización Palacio de Justicia Coloso, Sucre

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

- Optimizar el uso de los recursos naturales mediante la implementación de medidas orientadas a garantizar el aprovechamiento eficiente y racional del agua, la energía y los insumos requeridos en la ejecución de las obras, promoviendo a su vez la reducción en el consumo de materiales de oficina como el papel.

- Minimizar la generación de residuos sólidos y líquidos, asegurando su segregación en la fuente, almacenamiento temporal y disposición final adecuada, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente y en los planes de gestión integral de residuos.

- Asegurar el estricto cumplimiento de la normativa ambiental aplicable en los ámbitos nacional, regional y local, garantizando que las actividades constructivas se desarrollen bajo el marco legal que regula la prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos ambientales.

- Fortalecer la cultura ambiental institucional mediante procesos de sensibilización, formación y capacitación dirigidos a trabajadores, contratistas y demás actores vinculados al proyecto, con el fin de fomentar prácticas responsables y sostenibles en el marco de la ejecución de las actividades.

4. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Uso eficiente de recursos:

- Agua: Campañas de sensibilización sobre el cierre adecuado de grifos y reporte de fugas.

- Energía: Implementación de rutinas de apagado de equipos y luminarias al finalizar la jornada laboral.

- Papel: Digitalización de informes, memorandos y oficios internos; impresión a doble cara en los documentos que requieren soporte físico.

Gestión de residuos:

- Instalación de puntos ecológicos con los colores normativos (verde, blanco y negro).
- Separación en la fuente de residuos reciclables, ordinarios y peligrosos.

- Entrega de residuos aprovechables a gestor autorizado con acta de entrega firmada.

Sensibilización y capacitación:

- Charlas dirigidas al personal de servicios generales y contratistas de obra sobre buenas prácticas ambientales.

- Divulgación de piezas gráficas con mensajes de ahorro de energía y agua en zonas comunes.

Control ambiental en obra:

- Minimización de generación de escombros y adecuada disposición de residuos de demolición.

- Uso de herramientas manuales para reducir niveles de ruido en zonas sensibles.

- Almacenamiento temporal de materiales en áreas definidas para evitar afectaciones al entorno.

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO

- **Reducción del consumo de papel:** 25% respecto a informes anteriores gracias a la digitalización.

- **Ahorro energético:** 15% de reducción en consumo por implementación de prácticas de apagado.

- **Gestión de escombros:** 80% del material producto de demoliciones (enchapes, pisos y concreto) clasificados y dispuesto de manera adecuada en escombrera autorizada.

- **Aprovechamiento de residuos de obra:** 65% de los casetones de icopor recuperados y retirados de las losas entregados a gestor autorizado para su reciclaje.

- **Control de generación de polvo:** Aplicación de riego y humectación en un 90% de las actividades de demolición y corte para minimizar la emisión de partículas.

- **Manejo de residuos ordinarios:** 100% de los residuos no aprovechables generados en el frente de obra entregados al servicio de aseo municipal para su disposición final.

- **Capacitación ambiental:** 2 jornadas de sensibilización en manejo de residuos y buenas prácticas ambientales realizadas con asistencia del 85% del personal operativo.

6. RESULTADOS Y HALLAZGOS

- La implementación del PGA en el Complejo Judicial de Colosó ha permitido disminuir el uso de recursos naturales, optimizando las actividades administrativas y de obra.

- Se fortaleció la cultura de separación en la fuente, logrando la correcta disposición de residuos aprovechables.

- Se identificó la necesidad de mejorar la disposición final de residuos peligrosos, dado que en la sede aún no se cuenta con un sistema formal de almacenamiento temporal para estos elementos.

7. CONCLUSIONES

El cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial en el marco del proyecto ha sido fundamental para garantizar la sostenibilidad de las operaciones constructivas, evidenciándose la aplicación de medidas orientadas a la protección del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad vigente.

La interventoría verificó que los residuos de construcción y demolición (RCD)**,** tales como enchapes de piso, escombros, concreto y casetones de icopor, fueron clasificados, acopiados de manera temporal en áreas designadas y dispuestos a través de gestores autorizados o en escombreras reglamentadas, asegurando un manejo responsable y conforme a la normativa ambiental aplicable.

Se constató la implementación de medidas de control de emisiones de polvo y material particulado**,** principalmente mediante la humectación de superficies en las actividades de demolición y corte, lo cual contribuyó a la mitigación de impactos en la salud ocupacional y en el entorno inmediato de la obra.

En cuanto al manejo de residuos ordinarios y peligrosos, se verificó que los residuos no aprovechables fueron entregados al servicio público de aseo municipal y que los residuos con características peligrosas recibieron un manejo diferenciado, evitando afectaciones ambientales y cumpliendo los protocolos establecidos.

La interventoría acompañó y verificó la realización de jornadas de capacitación y sensibilización ambiental, dirigidas al personal operativo y contratistas, orientadas a fomentar el adecuado manejo de residuos, el orden y la limpieza en el frente de obra, así como el cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental.

En términos generales, se concluye que las medidas implementadas han contribuido a la minimización de los impactos negativos generados por la obra, fortaleciendo una cultura ambiental en el personal vinculado y asegurando que la ejecución del proyecto se lleve a cabo bajo parámetros de sostenibilidad, control y mejora continua.

8. RECOMENDACIONES

Fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización ambiental dirigidos al personal operativo y contratista, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados, reforzando aspectos como el manejo de escombros, segregación de residuos aprovechables, control de emisiones de polvo y orden en el frente de obra.

Implementar mecanismos de incentivo y reconocimiento para promover la participación activa del personal en la aplicación de buenas prácticas ambientales, de manera que se genere un mayor compromiso en la correcta gestión de los residuos y el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Profundizar en la gestión de residuos peligrosos (RESPEL), tales como empaques de pinturas, solventes o elementos contaminados, garantizando su almacenamiento temporal en recipientes adecuados, su registro en los planes de manejo y su disposición final a través de gestores autorizados conforme a la normatividad ambiental vigente.

Revisar y actualizar periódicamente el Plan de Manejo Ambiental con el fin de ajustarlo a los cambios normativos, las mejores prácticas disponibles en el sector de la construcción y las condiciones particulares que puedan surgir durante la ejecución de la obra.

Consolidar registros y reportes ambientales periódicos, que permitan documentar de manera sistemática el manejo de residuos de construcción y demolición, el control de impactos y las medidas implementadas, facilitando la trazabilidad y el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos ambientales.

Mantener y reforzar las medidas de control de material particulado (polvo) en actividades de demolición, mediante humectación o técnicas equivalentes, para reducir las afectaciones tanto al personal como a la comunidad vecina.

9. ANEXOS

- Formato 1: Control de consumo de papel.
- Formato 2: Control de consumo de energía.
- Formato 3: Registro de residuos generados y disposición.

Para constancia se firma a los 19 días del mes de agosto de 2025



JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Aprobación del informe ambiental:

PRESENTÓ:	**APROBÓ:**
 **FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S** **R/L JOSE PASTOR MAESTRE SABALA** **NIT: 901.825.725-0**	**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA** **DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO 1
CONTROL DE CONSUMO DE PAPEL

ENTIDAD: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

CARGO: INTERVENTOR

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	JUNIO DE 2025			JUIIO DE 2025		
		No. de Resma	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total
CONTRATO No. MC 06 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO:"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"	CORRESPONDENCIA ENVIADA	0	20000	0	0	20000	0
	INFORME TECNICO MENSUAL CON SUS ANEXOS	0	20000	0	0	20000	0
	INFORME IMPLEMENTACION AMBIENTAL	0	20000	0	0	20000	0
	ACTAS DE COMITÉ	0,05	20000	1000	0,03	20000	600
TOTAL				$ 1.000,00			$ 600,00

Como interventoría, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se adoptó el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, considerando las políticas e instrucciones orientadas a fomentar el uso eficiente y racional del papel, de los recursos naturales como el agua y la energía, así como de los demás servicios públicos, y a promover la adecuada gestión de residuos en las instalaciones de la Entidad durante la prestación del servicio.

En concordancia con lo anterior, toda la información administrativa ha sido radicada en su totalidad a la supervisión por medio de correo electrónico, con excepción de las actas de comité, las cuales, con el fin de optimizar el recurso papel, fueron impresas a doble cara.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO 2
CONTROL CONSUMO DE ENERGIA

ENTIDAD: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

CARGO: INTERVENTOR

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	JUNIO DE 2025			JUIIO DE 2025		
		kwh	Valor	Costo total	No. de Resma	Valor	Costo total
CONTRATO No. MC 06 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO:"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"	CORRESPONDENCIA ENVIADA	0	0	0	0	0	0
	INFORME TECNICO MENSUAL CON SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0
	INFORME IMPLEMENTACION AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0
	ACTAS DE COMITÉ	0	0	0	0	0	0
TOTAL				$ -			$ -

En el marco de nuestras funciones, no se ha hecho uso de la energía eléctrica de las instalaciones del Complejo Judicial, dado que las actividades administrativas se han desarrollado en oficina externa. En nuestras instalaciones privadas se han implementado acciones de control orientadas al uso eficiente de la energía, tales como el encendido intercalado de luminarias y la desconexión de equipos una vez finalizadas las labores, con el fin de optimizar el consumo y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE ENTREGA DE RESIDUOS

SIGCMA

Acta de Entrega de Residuos
(Aprovechables, Peligrosos, RCD o Especiales)

ENTIDAD: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO	**FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2025**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: FORMULACIÓN Y CONTRUCCIÓN S.A.S NIT: 901.825.725-0	**REP. LEGAL:** INGENIERO JOSÉ PASTOR MAESTRE SABALZA

ITEM	NOMBRE DEL RESIDUO	CANTIDAD			PELIGROSIDAD		ITEM	TIPO DE DISPOSICIÓN		ITEM
		Und	Presentación	Kg						
1	**PAPEL**	**10**			Corrosivo	☐		RE: Reciclaje	☐	**1**
2					Reactivo	☐		IN: Incineración	☐	
3					Explosivo	☐		CO: Cogeneración	☐	
4					Tóxico	☐		RSE: Relleno Seguridad	☐	
5					Inflamable	☐		ENC. Encapsulamiento	☐	
6					Biológico	☐		RU: Reuso	☐	
7					Ecotóxico	☐		CVN: Comercialización o Venta Directa	☐	
8					Radioactivo	☐		CP: Compostaje	☐	
9					Precaución	☐			☐	
10					Ninguna	☐			☐	

OBSERVACIONES	Como interventoría, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se adoptó el **Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial**, considerando las políticas e instrucciones institucionales orientadas a incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales (agua, energía y demás servicios públicos), así como la reducción en la generación de residuos en las instalaciones de la Entidad durante la prestación del servicio. En este sentido, toda la información administrativa ha sido radicada en su totalidad a la supervisión mediante correo electrónico, con el propósito de disminuir el consumo de papel. Únicamente las **actas de comité** fueron impresas, realizándose en formato a doble cara como medida de optimización de recursos, conservándose los originales en las oficinas de la supervisión para efectos de control y archivo físico.

RESPONSABLE CSJ:	Firma:	
GESTOR DE RESIDUOS (Nombre, firma y teléfono de contacto del gestor)	Nombre empresa gestora:	
	Nombre empleado gestor:	Firma:
	Teléfono contacto:	Placa del vehículo:
