	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 219 de 2022 **Contratista:** UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

INFORME MENSUAL No. TRES (3) **MES O PERIODO:** OCTUBRE DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	001
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	003
1	**INTRODUCCIÓN**		005
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		006
2.1	Localización		006
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		008
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		008
2.4	Características técnicas del proyecto		009
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		011
3.1	Información general del contrato		011
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		001
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		013
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		013
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		014
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	015
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	026
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	028
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	032
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	036
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	041
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	043
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	053
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		055
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	058
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	060
	• Seguimiento Programa de Obra		061
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	065
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	067
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	069
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	072
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		735
5.1	Información general del contrato		735
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		735
5.3	Informes especialistas y profesionales		739
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		922
5.5	Informe matriz de riesgos.		923
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		924
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		927
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	928
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	931
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	940
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	942
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	949
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		951
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	953
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	955
7	**Conclusiones y recomendaciones**		073
8	**Anexos**		074
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		075
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		078
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		079
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		081

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** octubre-2022

CONTRATO DE OBRA No.: 219 de 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2022
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.599.803.205,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.599.803.205,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	1.172,30
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.559.293.225,00		$ 1.559.293.225,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ 12.272.959,49	$ 2.331.862,31	$ 14.604.821,80
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 21.769.040,00	$ 4.136.118,00	$ 25.905.158,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.593.335.224,49	$ 6.467.980,31	$ 1.599.803.205,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 4.192.128,00		$ 4.192.128,00	$ 4.192.128,00
AJUSTES				$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				$ -
VALOR EJECUTADO	4.192.128,00	0,00	4.192.128,00	4.192.128,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 282.817.683,87
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.192.128,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,27%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **14**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Explanacion - 31/10/2022



Armado y figurado de acero - 28/20/2022

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de Santa Cruz de Lorica, Sahagún, convenio interadministrativo No. 1741 de 2021. Es por ello que mediante el proceso de licitación pública **Proceso L.P-002-2022**, se celebra el contrato de obra No. 219 de 2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". El cual fue adjudicado a la UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022, cuyo plazo inicial es de cuatro (4) meses a partir del 23 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 1.599.803.205,00.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 30 de octubre de 2022; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

EL proyecto de localiza en el municipio de Santa Cruz de Lorica Córdoba, extramente la vía que comunica el casco urbano del municipio de Lorica con el corregimiento de Tierraltica, en la zona rural del municipio.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, Ubicación del Municipio de Santa Cruz de Lorica.

El municipio de Santa Cruz de Lorica se encuentra ubicada al norte del departamento de Córdoba, en la zona baja del río Sinú y próxima al litoral del mar Caribe, a una distancia de 29 km Coveñas, 50 kilómetros de Tolú, 60 kilómetros de Montería y su cabecera municipal se encuentra localizada sobre la margen derecha del río Sinú, en las coordenadas latitud Norte 9° 13' 59" longitud Oeste 75° 49' 1", con respecto al meridiano de Greenwich. El municipio presenta un área de 1033 Km2, de las cuales 7,3 Km2 pertenece al casco urbano y 1025,7 Km2 al área rural, este limita al Norte con los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento, Purísima y Momil, por el este con los municipios de Momil y Chimá, por el oeste con los municipios de San Bernardo del Viento, Puerto Escondido y Moñitos y por el sur con los municipios de San Pelayo y Cotorra, posee una altura de 7 m.s.n.m. y una temperatura media de 32ºC.

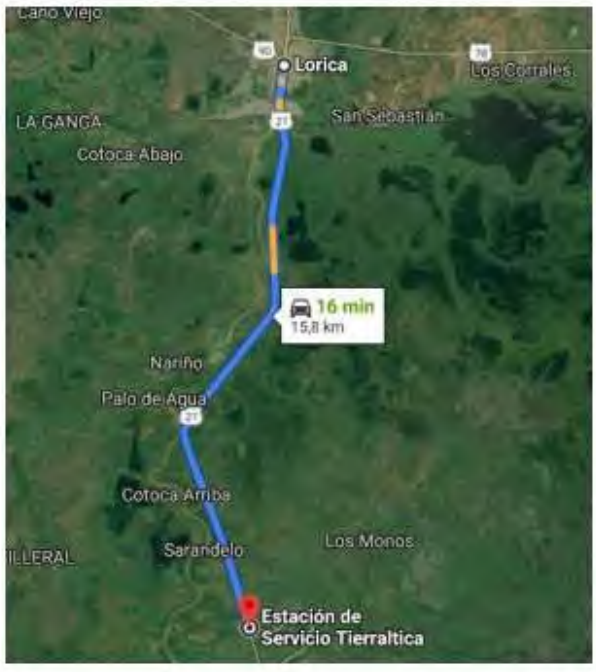


Ilustración 3. Localización Vía Tierraltica.

2.1.1. LOCALIZACIÓN FUENTE DE MATERIALES

La fuente de materiales empleada por el contratista es la ubicada en el corregimiento de Berasategui, entrando a la Balsa, en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. La cual cuenta con permiso minero y licencia ambiental.

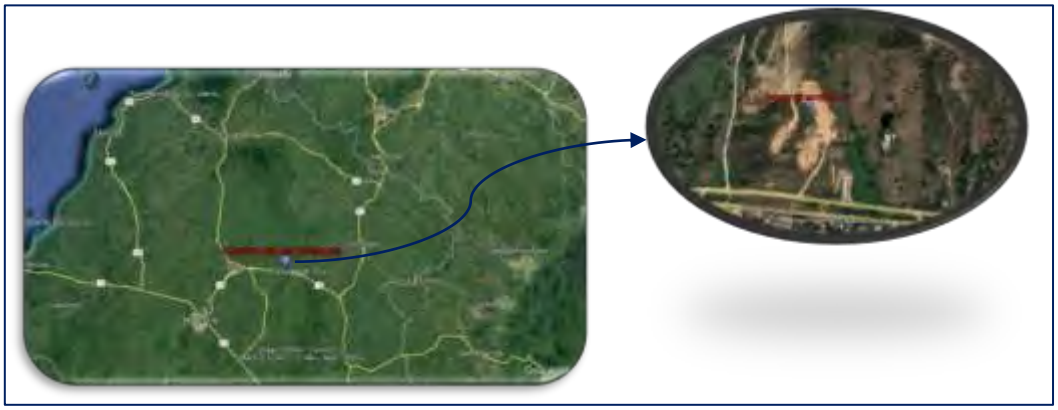


Ilustración 4. Localización Fuente de Materiales

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

El municipio de Lorica (Córdoba), se beneficia principalmente en la zona rural, exactamente la vía que comunica con el corregimiento de Tierraltica.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En general la Vía del presente proyecto están en condiciones regulares con grado de severidad alto, con puntos críticos debido a la falta de mantenimiento. Se presenta perdida de material afirmado, hundimiento y cárcavas de producto del efecto erosivo del agua a causa del mal estado o no existencia de cunetas o imperfecciones en su geometría como los bombeo y peraltes inadecuados. Es por eso que el objeto del proyecto tiene como alcance la rehabilitación de los puntos críticos con 1.172,30 metros con sistema Placa Huella.

	
Estado dela Via Tierraltica – 15/09/2022	Labores de explanación – 31/10/2020
	
Estado dela Via Tierraltica – 15/09/2022	Labores de explanación – 28/10/2022

Ilustración 4. Estado inicial de la Vía. Cto. 219 de 2022

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La estructura base correspondiente al tramo a intervenir en el proyecto es la siguiente: dos huellas o placas de concreto reforzado en Módulos de 3.0 Metros con una ancho de 0,90 metro cada una y un espesor de 0,15 centímetros, dos sobre anchos en concreto ciclópeo de 0,80 metros cada uno, una placa de concreto ciclópeo de 0,90 centímetros de ancho, dos cunetas de 0,70 metros de ancho, un bordillo de 0,10 metros de ancho y un espesor de 0,45 metros, una longitud entre Viguetas transversales de 5,90 metros, que se encontraran arriostradas por unas viguetas reforzadas de 0,20 metros de ancho por 0,25 metros de espesor localizadas en cada módulo de 3,00 metros e Irán en todo el ancho hasta la cuneta fundida in situ siendo este el diseño base porque en el trascurso de cada tramo y dentro de la misma vía varia el ancho de la calzada por lo cual varia el ancho de las losas tanto de concreto hidráulico como el del ciclópeo en los sobre ancho ver diseños en plata.

Contrato 219 de 2022	
Sistema	Placa Huella
Longitud	1.172,3 metros
Ancho Calzada	5,9 metros
Losa concreta	0,15 metros
Subbase	0,15 metros

Tabla 1. Características técnicas de los proyectos.

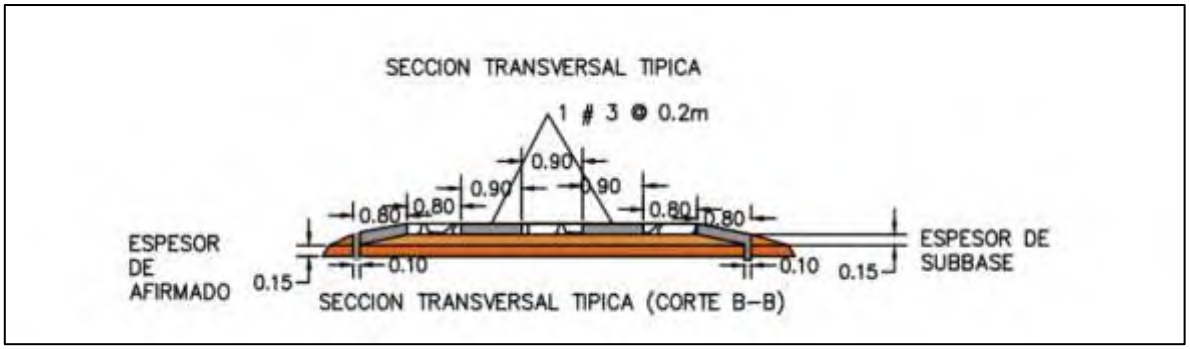


Ilustración 5. Sección transversal de la Placa Huella, ancho 5,9 metros.

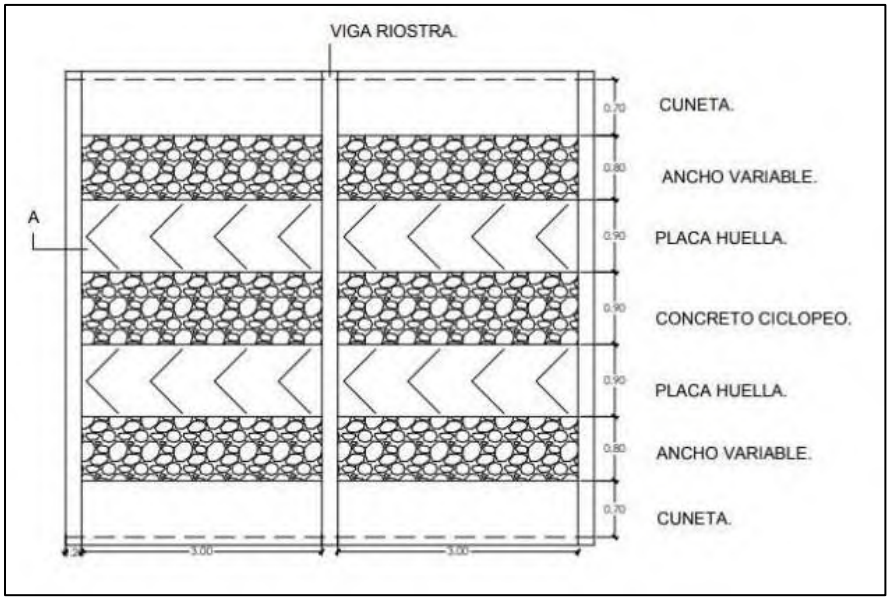


Ilustración 6. Vista en Planta Placa Huella.

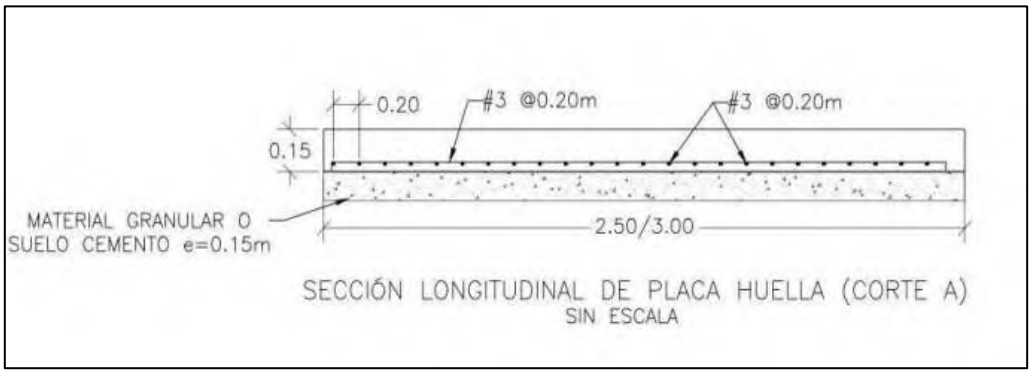


Ilustración 7. Corte Longitudinal.



Ilustración 8. Corte Longitudinal Viga Riostra.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	L.P-002-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de junio de 2022
CONTRATO No.	219 de 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022
NIT	901601787-5
INTEGRANTES	• CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ • NIT. 900.793.402-4 • Participación: 80%
	• CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ • NIT. 901.418.309-4 • Participación: 20%
DIRECCIÓN CONTRATISTA	Calle 18 No: 1J – 33, Sahagún - Córdoba, Córdoba
NUMERO DE TELEFONO	(+57) 301 760 7304
CORREO	lucho276@hotmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.599.803.205,00
PLAZO INICIAL	4 MESES
FECHA INICIO	23/08/2022
FECHA TERMINACIÓN	23/12/2022
MODIFICACIÓNES	Modificatorio No.1 del 07 de septiembre de 2022

Tabla 2. Información Cto. 219 de 2022.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

ii. Esta interventoría avala el iniciado las actividades constructivas, debido a que se cuenta con una probación parcial de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseño

iii. Se realiza replanteo topográfico en conjunto entre la interventoría y contratista

iv. Se adelanta la excavación en material común de la explanación y canales

v. Se adelanta el figurado y armado del acero de refuerzo de la estructura de placa huella.

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. Mediante comunicado CVRIMG-125-2022, del 24 de octubre de 2022, se aclara al contratista que el proyecto **NO** es de complejidad baja, y por sus características estaría en la clasificación de proyectos con complejidad media – baja. Por tanto, aplica la elaboración del Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA.

ii. A la fecha el contratista se encuentra en la elaboración del Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA.

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. El día 12 de octubre de 2022 se realizó la socialización del proyecto, donde participaron representantes del Contratista de obra, del Municipio, de la Interventoría y del Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios

.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos para ninguno de los contratos de obra a cargo de esta interventoría.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

I. A fecha del 31 de octubre de 2022, se tiene una inversión de obra programada acumulada de 282.817.683,87 correspondiente al 18,14% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $4.192.128,00 correspondiente al 0,27%; lo que representa un atraso del 17,44%
II. A la fecha del presente informe, se encuentran aprobados el diseño de pavimentos y los estudios de suelos realizados y entregados por el contratista. Esta Interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
III. Hacer seguimiento a los compromisos pactados en los comités de obra realizados durante el periodo.
IV. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
V. Hacer seguimiento a los compromisos.
VI. Revisar información entregada por el contratista
VII. Gestionar la bitácora de obra
VIII. Realizar seguimiento y control a las actividades de obra

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

I. Informe semanal No.07, del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2022
II. Informe semanal No.08, del 07 al 13 de octubre de 2022
III. Informe semanal No.09, del 14 al 20 de octubre de 2022
IV. Informe semanal No.10, del 21 al 27 de octubre de 2022
V. Informe semanal No. 11, del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 7 del 30/09/2022 al 06/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizará la construcción de 1.172,30 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, tiene como alcance la rehabilitación de 1.172,30 Metros de vías terciarias con sistema de placa huella distribuidas en diferentes tramos de vía y afirmado. Que tiene como objetivo de mejorar la superficie de tránsito vehicular que presenta mal estado de transpirabilidad y requieren un mejoramiento.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022, NIT. 901601787-5

INTEGRANTES:
1. CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ, Participación: 80%
2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, Participación: 20%

CONTRATO No. 219 de 2022
FECHA DE INICIO: 8/23/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/23/2022
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/23/2022

VALOR INICIAL: $ 1,599,803,205.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1,599,803,205.00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 8/22/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/31/2024

VALOR INICIAL: $ 4,564,284,660.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4,564,284,660.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1,599,803,205.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,599,803,205.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ___2022__	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100.0	100.0		Prog					
					Ejec					
Explanación	Km	1.1723	1.1723		Prog					
					Ejec					
Afirmado	Km	1.1723	1.1723		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	Km	1.1723	1.1723		Prog					
					Ejec					
Placa Huella	Km	1.1723	1.1723		Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA TIERRALTICA
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio de Lorica-Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El contratista presentó la fuente de material para afirmado y sub-base granular

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado. .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En comité de obra No. 1 de fecha 14 de septiembre de 2022, se le recuerdó al contratista, que debe contar con una oficina para la atención al usuario, debidamente identificada en la cual se especifique el horario de atención y se acordó que la socialización del proyecto se realizará una vez se apruebe la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, con la finalidad de comunicarles el alcance real a la comunidad

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión de oficio emitido por el contratista, de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Se encuentra en proceso la aprobación de la programación de obra. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
1. Hacer seguimiento a los compromisos. 2. Revisar información entregada por el contratista 3. Gestionar la bitácora de obra 4. Realizar comité de seguimiento de obra	FIRMA NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 8 del 7/10/2022 al 13/10/2022 **Último Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizará la construcción de 1.172,30 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, tiene como alcance la rehabilitación de 1.172,30 Metros de vías terciarias con sistema de placa huella distribuidas en diferentes tramos de vía y afirmado. Que tiene como objetivo de mejorar la superficie de tránsito vehicular que presenta mal estado de transpirabilidad y requieren un mejoramiento.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022, NIT. 901601787-5

INTEGRANTES:
1. CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ, Participación: 80%
2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, Participación: 20%

CONTRATO No.	219 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/12/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 1.599.803.205,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/12/2022		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.599.803.205,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.599.803.205,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100,0	100,0		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	1.172,3	1,1723		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	1.172,3	1,1723		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	1.172,3	1,1723		Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	1.172,3	1,1723		Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA TIERRALTICA
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Lorica-Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: El contratista presentó la fuente de material para afirmado y sub -base granular

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos to dos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado. .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: El día 12 de octubre de 2022 se realizó la socialización del proyecto, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías -INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión de oficio emitido por el contratista, de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización del proyecto, con la comunidad



Socialización del proyecto, con la comunidad



Socialización del proyecto, con la comunidad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar comité de seguimiento de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 9 del 14/10/2022 al 20/10/2022 **Último Informe Semanal SI** ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizará la construcción de 1.172,30 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, tiene como alcance la rehabilitación de 1.172,30 Metros de vías terciarias con sistema de placa huella distribuidas en diferentes tramos de vía y afirmado. Que tiene como objetivo de mejorar la superficie de tránsito vehicular que presenta mal estado de transpirabilidad y requieren un mejoramiento.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022, NIT. 901601787-5

INTEGRANTES:
1. CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ, Participación: 80%
2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, Participación: 20%

CONTRATO No. 219 de 2022 — VALOR INICIAL: $ 1.599.803.205,00
FECHA DE INICIO: 23/08/2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 23/12/2022 — VALOR ACUMULADO: $ 1.599.803.205,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/12/2022 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022 — **VALOR INICIAL:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO: 22/08/2022 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — **VALOR ACUMULADO:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.599.803.205,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

$ -

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.559.293.225,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 94.040.161,06 — 6,03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - — %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ (94.040.161,06) — -6,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 94.040.161,06 — 6,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ (94.040.161,06) — -6,03%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 74.723.143,15 — 4,79%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: — %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - — %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100,0			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	1172,3			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	1172,3			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	1172,3			Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	1172,3			Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA TIERRALTICA
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Corregimiento de Berastegui entrando a la Balsa, Municipio de Ciénaga de Oro	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El contratista cambio de fuente de materiales para afirmado y subbase granular

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado. .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El día 12 de octubre de 2022 se realizó la socialización del proyecto, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías -INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión de oficio emitido por el contratista, de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Se realiza la logistica para dar inicio a la construcción de obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Concluir la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Dar inicio a las actividades de construcción de obras

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Suministro de acero



Campamento de obra



Suministro de señalización

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. realizar comité de seguimiento de obra
5. Realizar seguimiento y control a las actividades de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 10 del 21/10/2022 al 27/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizará la construcción de 1.172,30 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, tiene como alcance la rehabilitación de 1.172,30 Metros de vías terciarias con sistema de placa huella distribuidas en diferentes tramos de vía y afirmado. Que tiene como objetivo de mejorar la superficie de tránsito vehicular que presenta mal estado de transpirabilidad y requieren un mejoramiento.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022, NIT. 901601787-5	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7
INTEGRANTES:	1. CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ, Participación: 80% 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, Participación: 20%	INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)
CONTRATO No.	219 de 2022	CONTRATO No.	971 de 2022
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	FECHA DE INICIO:	22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/12/2022	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/12/2022	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.599.803.205,00	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.599.803.205,00	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.599.803.205,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

$ -

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.559.293.225,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 180.506.469,28	11,58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 858.804,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (179.647.665,28)	-11,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 180.506.469,28	11,58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 858.804,00	0,06%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (179.647.665,28)	-11,52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 86.466.308,22	5,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 858.804,00	0,06%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100,0	100,0		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	1172,3	1172,3		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	1172,3	1172,3		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	1172,3	1172,3		Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	1172,3	1172,3		Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA TIERRALTICA
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Corregimiento de Berastegui entrando a la Balsa, Municipio de Ciénaga de Oro	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El contratista cambio de fuente de materiales para afirmado y subbase granular

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos to dos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado. .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El día 12 de octubre de 2022 se realizó la socialización del proyecto, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías -INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión de oficio emitido por el contratista, de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Figurado y armado de acero

Obseravación: se ha dado inicio a las actividades constructivas, debido a que se cuenta con una probación parcial de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Concluir en su totalidad la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2.Excavación en material común de la explanación y canales
3. figurado y armado de acero

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

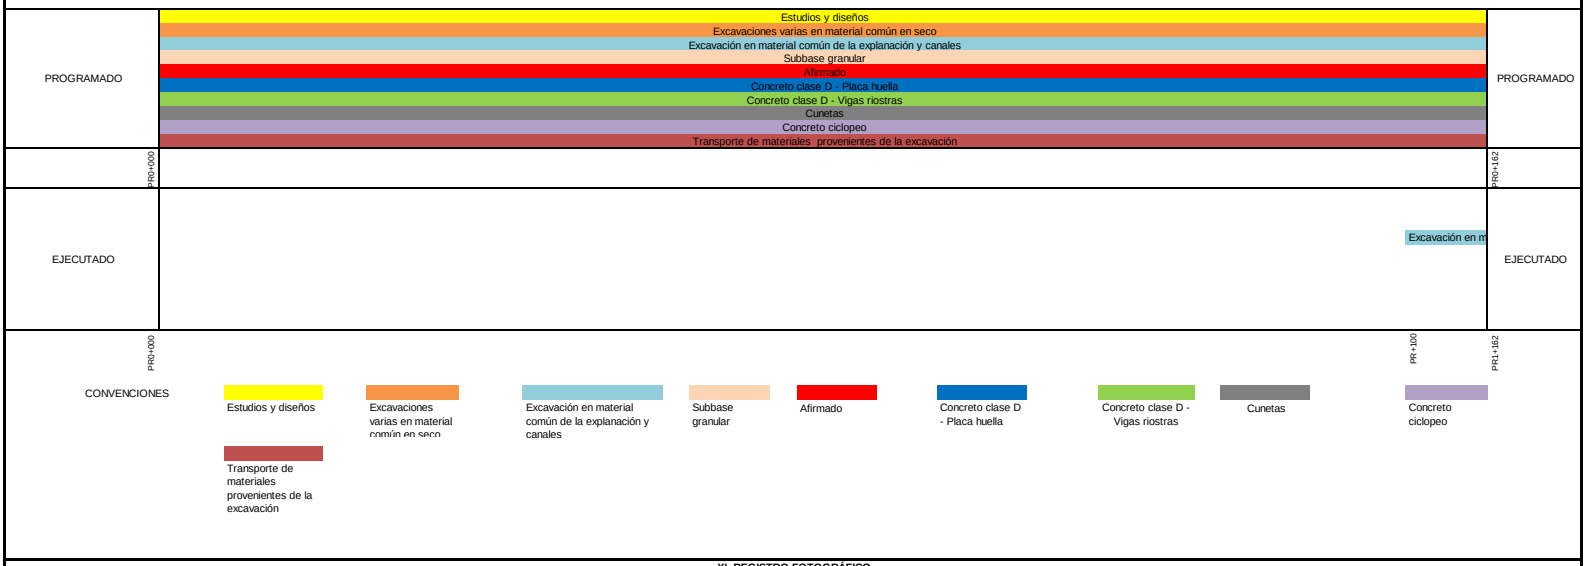

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Replanteo de obra



Figurado y armado de acero



Excación en material común de la explanación y canales

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 11 del 28/10/2022 al 3/11/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizará la construcción de 1.172,30 metros de Placa Huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, tiene como alcance la rehabilitación de 1.172,30 Metros de vías terciarias con sistema de placa huella distribuidas en diferentes tramos de vía y afirmado. Que tiene como objetivo de mejorar la superficie de tránsito vehicular que presenta mal estado de transpirabilidad y requieren un mejoramiento.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022, NIT. 901601787-5		**INTERVENTOR:**	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7	
INTEGRANTES:	1. CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ, Participación: 80% 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, Participación: 20%		**INTEGRANTES:**	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)	
CONTRATO No.	219 de 2022	VALOR INICIAL: $ 1.599.803.205,00	**CONTRATO No.**	971 de 2022	**VALOR INICIAL:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -	**FECHA DE INICIO:**	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/12/2022	VALOR ACUMULADO: $ 1.599.803.205,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/12/2022	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:** $ -
		$ -			**VALOR AMORTIZADO:** $ -
		$			**SALDO POR AMORTIZAR:** $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.599.803.205,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

$ -

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.559.293.225,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 282.817.683,87	18,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.192.128,00	0,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (278.625.555,87)	-17,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 282.817.683,87	18,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.192.128,00	0,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (278.625.555,87)	-17,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 102.311.214,59	6,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.333.324,00	0,21%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 18,14%
Meta Física Ejecutada %: 0,27%
Avance o Atraso Físico %: -17,87%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100,0	100,0		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	1172,3	1172,3		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	1172,3	1172,3		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	1172,3	1172,3		Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	1172,3	1172,3		Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora de orugas	1	1
Bulldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	1
vibrocompactador	1	1
Retroexcavadora A25C	1	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA TIERRALTICA
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Corregimiento de Berastegui entrando a la Balsa, Municipio de Ciénaga de Oro	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO X	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista cambio de fuente de materiales para afirmado y subbase granular

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos to dos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado. .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El día 12 de octubre de 2022 se realizó la socialización del proyecto, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías -INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Elaboración del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Figurado y armado de acero
4. Afirmado

Obseravación: se ha dado inicio a las actividades constructivas, debido a que se cuenta con una probación parcial de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Concluir en su totalidad la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2.Excavación en material común de la explanación y canales
3. Figurado y armado de acero

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

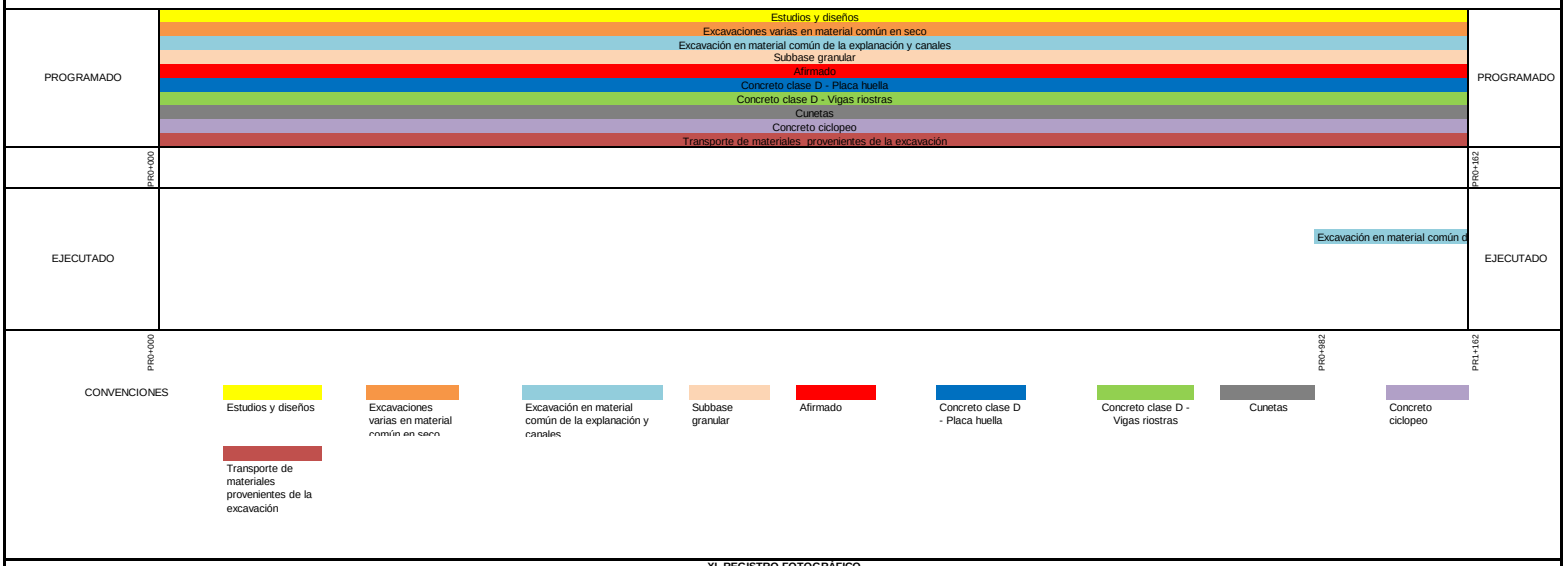

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavación en material común de la explanación y canales



Figurado y armado de acero



Imprevistos generados por la fuertes lluvias presentadas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATO No. 219 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL-RAND	160 HP											I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	125 HP											A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BULDOZER	CATERPILLAR	140 HP											I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RETROEXVADORA DE ORUGA	CATERPILLAR	138 HP											I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO													4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL ACTIVO													1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2	0	2
TOTAL EN REPARACIÓN													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO													3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	4	2

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	88	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	19	21,59
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	69	78,41

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):El formato no se encuentra diligenciado, teniendo en cuenta que el contratista no ha presentado la información requerida para dicho formato.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Los días 16, 23 y 30 de octubre, la maquinaria permanece inactiva por el domingo dia en el cual no se realizan labores en campo. El resto de días en los cuales la maquinaria se ecuentra inactiva es debido a que no se realizan actividades en obra donde se requiera dicha maquina o equipo.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:LUIS ALBERTO PACHECO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202143957 CND

Firma
Nombre: ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/11/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 219 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Karen Lobo	1.066.188.843	Ing. Auxiliar	$ 1.000.000			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UTRL-CE 2022	$ 933.333,00	$ 65.000,00	V	MUTUAL SER	7855862923	$ 37.400,00	PORVENIR	7855862923	$149.400,00	$ 37.400,00	$ -	$ -	
2	Jesus Morales Hoyos	1.003.503.407	Cadenero	$ 1.000.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UTRL-CE 2022	$ 333.334,00	$ 23.300,00	V	NUEVA EPS	7858603521	$ 13.400,00	PORVENIR	7858603521	$ 53.400,00	$ 13.400,00	$ -	$ -	
3	Erwin Polo Osorio	1.007.801.333	Ing. Residente	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UTRL-CE 2022	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	V	NUEVA EPS	7858603521	$ 40.000,00	PORVENIR	7858603521	$160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	
4	Keila Marcela Altamirande	1.062.680.415	Paletera	$ 1.000.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UTRL-CE 2022	$ 333.334,00	$ 23.300,00	V	MUTUAL SER	7858603521	$ 13.400,00	PROTECCION	7858603521	$ 53.400,00	$ 13.400,00	$ -	$ -	
5	Yesica Genes Escobar	1.063.174.584	Paletera	$ 1.000.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UTRL-CE 2022	$ 333.334,00	$ 23.300,00	V	MUTUAL SER	7858603521	$ 13.400,00	PORVENIR	7858603521	$ 53.400,00	$ 13.400,00	$ -	$ -	
6	Miguel Humberto Morales	10.820.170	Topógrafo	$ 1.000.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UTRL-CE 2022	$ 333.334,00	$ 23.300,00	V	NUEVA EPS	7858603521	$ 13.400,00	PORVENIR	7858603521	$ 53.400,00	$ 13.400,00	$ -	$ -	
7	Wilson salgado Gonzales	11.051.098	Celador	$ 1.000.000																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UTRL-CE 2022	$ 333.334,00	$ 23.300,00	V	NUEVA EPS	7858603521	$ 13.400,00	COLPENSIONES	7858603521	$ 53.400,00	$ 13.400,00	$ -	$ -	
8	Jorge Romero Contreras	78.759.852	Oficial Herrero	$ 1.000.000																											x	x	x	x	x	UTRL-CE 2022	$ 166.667,00	$ 11.700,00	V	MUTUAL SER	7858603521	$ 6.700,00	PORVENIR	7858603521	$ 26.700,00	$ 6.700,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202143957 CND

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901601787
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAHAGUN	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 18 N1 J 33	TELÉFONO:	7776574
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7858603521**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1748696817	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400	$ 0	$ 53.400
230301	230301-PORVENIR	5	$ 346.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.900	$ 0	$ 346.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400	$ 0	$ 53.400
SUBTOTALES:										**$ 453.700**	**$ 0**	**$ 453.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.500	$ 0	$ 0	$ 33.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 80.200
SUBTOTALES:													**$ 113.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 113.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 197.800	$ 197.800	$ 0	$ 0	$ 197.800
SUBTOTALES:									**$ 197.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 197.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 113.700	$ 0	$ 113.700
SUBTOTALES:			**$ 113.700**	**$ 0**	**$ 113.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES												
																										PENSIÓN												SALUD							ARP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901601787
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAHAGUN	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 18 N1 J 33	TELÉFONO:	7776574
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7855862923**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1701246132

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400	$ 0	$ 149.400
SUBTOTALES:										**$ 149.400**	**$ 0**	**$ 149.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 37.400
SUBTOTALES:													**$ 37.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 37.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 65.000	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 65.000
SUBTOTALES:									**$ 65.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 65.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 37.400	$ 0	$ 37.400
SUBTOTALES:			**$ 37.400**	**$ 0**	**$ 37.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1066188843	LOBO ALVIS KAREN TATIANA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	03																	230301-PORVENIR	28	$ 933.334	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	28	$ 933.334	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 933.334		$ 65.000	28	$ 933.334	CCF16-COMFACOR	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 289.200**

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NA

CONTRATO DE OBRA No: 219 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

MES INFORME MENSUAL: octubre - 2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	462	Via Rural Mejorada	2022234170066	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	219 de 2022	$ 1.599.803.205,00	
			TOTAL			$ 1.599.803.205,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.599.803.205,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	05/11/2022 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES			
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 25202-143957 CND

Firma

Nombre: FREDY ROMERO GIRALDO
Director de Interventoría V
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE LORICA
Nit: 800.096.758

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 0000000462

Fecha de Expedición: 10/06/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00363	08/04/2022

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2022, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	901.601.787
Beneficiario:	UNION TEMPORAL RURAL LORICA 2022

C63A2DF00AFB04DC0D62ADCDEB92BEBE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**1.599.803.205,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	1.599.803.205,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.599.803.205,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	68.0	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	1.599.803.205,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402041	Vía terciaria mejorada	1.599.803.205,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	1.599.803.205,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.599.803.205,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022234170066	Via Rural Mejorada	1.599.803.205,00

Valor en Letras:

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA TIERRATICA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Alfa Feris Gonzalez
P.U Area Presupuesto y Contabilidad

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_crp_lorica_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 219 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	7	6	11	18	16	16	20	24	19	20	13	12	12	22	18	20	14	10	13	8	563
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	16	10	3	7	6	4	0	3	4	9	7	8	1	5	4	8	12	9	15	142
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	3	3	1	2	0	0	2	0	2	5	4	1	1	0	2	2	2	1	39
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Durante el mes de Octubre los primeros 10 días del mes no se tuvieron en cuenta debido a que o había personal en obra

Firma
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 25202143957 CND

Firma
Nombre: ARMANDO ALDANA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI

AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION

Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/10/2022 0:00	2.2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/10/2022 0:00	1.4	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/10/2022 0:00	2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/10/2022 0:00	1	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/10/2022 0:00	15.6	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/10/2022 0:00	51	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/10/2022 0:00	12.5	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/10/2022 0:00	1.2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/10/2022 0:00	8.4	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/10/2022 0:00	16.5	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/10/2022 0:00	40	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/10/2022 0:00	5.2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/10/2022 0:00	55	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/10/2022 0:00	3.4	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/10/2022 0:00	0	50		900

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 219 de 2022 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Durante el mes de octubre no se hcieron tomas de muestras por parte del laboratorio, por ende dentro del fomrato no se especifica consecutivos de ensayos.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 25202-143957 CND

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05 (Día) | 11 (Mes) | 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 219 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

FECHA DE INICIO: 23/08/2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/12/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.599.803.205,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.599.803.205,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 25.905.158,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 25.905.158,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 159.980.320,50	23	8	2022	23	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 639.921.282,00	23	8	2022	23	12	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 319.960.641,00	23	8	2022	23	12	2025
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30 %	$ 479.940.961,50	23	12	2022	23	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101227465

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	18,75 % (3 SMMLV)	$ 300.000.000,00	23	08	2022	23	12	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 33-44-101227467 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las tablas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ CORTES

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101227465**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**09**	**2022**	**23**	**08**	**2022**	**00:00**	**23**	**12**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	**NIT: 901.601.787-5**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 18 NRO. 1 J - 33	SAHAGUN, CORDOBA	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LORICA	**NIT: 800.096.758-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 NO. 18 - 17 PALACIO MUNICIPAL	LORICA, CORDOBA	7735092

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, EL BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, LA ESTABILIDAD DE LA OBRA Y EL PAGO DE SLARIOS Y PRESTACIONE SOCIALES DEL CONTRATO No. 219-2022 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO EN LA PLACA HUELLA DE LA VIA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**23/08/2022**	**23/12/2022**	**$159,980,320.50**	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**23/08/2022**	**23/12/2022**	**$639,921,282.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**23/08/2022**	**23/12/2025**	**$319,960,641.00**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**23/12/2022**	**23/12/2027**	**$479,940,961.50**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022 AL CONTRATO No. 219-2022.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUEN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***8,006,028.00	$ ******20,000.00	$ ***1,524,945.00	$ *********9,550,974.00	$ ****1,599,803,205.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUVE SEGUROS CIA. LTDA.	215223	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101227465

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101227465**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**09**	**2022**	**23**	**08**	**2022**	**00:00**	**23**	**12**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	**NIT: 901.601.787-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 18 NRO. 1 J - 33	SAHAGUN, CORDOBA	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LORICA	**NIT: 800.096.758-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 4 NO. 18 - 17 PALACIO MUNICIPAL	LORICA, CORDOBA	7735092

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***8,006,028.00	$ ******20,000.00	$ ***1,524,945.00	$ *********9,550,974.00	$ ****1,599,803,205.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUVE SEGUROS CIA. LTDA.	215223	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006616990924(3900)000009550974(96)20230823

REFERENCIA PAGO:

1100661699092-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101227465	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	09	2022	23	08	2022	00:00	23	12	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022		**NIT: 901.601.787-5**
DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 1 J - 33	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LORICA		**NIT: 800.096.758-8**
DIRECCIÓN: CL 4 NO. 18 - 17 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** LORICA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7735092

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUAPOYO L.P. S.A.S.	900793402-4	80.00
CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S	901418309-4	20.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

33-44-101227465

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

YENYCAMACHO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101227465, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

33-44-101227465

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-40-101069367**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**09**	**2022**	**23**	**08**	**2022**	**00:00**	**23**	**12**	**2022**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	**NIT: 901.601.787-5**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 18 NRO. 1 J - 33	SAHAGUN, CORDOBA	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LORICA	**NIT: 800.096.758-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 NO. 18 - 17 PALACIO MUNICIPAL	LORICA, CORDOBA	7735092

BENEFICIARIO: 800096758 - MUNICIPIO DE LORICA ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO No. 219-2022 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO EN LA PLACA HUELLA DE LA VIA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

.

BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**23/08/2022**	**23/12/2022**	**$300,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022 AL CONTRATO No. 219-2022.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUEN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****250,684.00	$ *******3,000.00	$ ******48,200.00	$ **********301,885.00	$ ******300,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUVE SEGUROS CIA. LTDA.	215223	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-40-101069367

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-40-101069367**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**09**	**2022**	**23**	**08**	**2022**	**00:00**	**23**	**12**	**2022**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	**NIT: 901.601.787-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 18 NRO. 1 J - 33	SAHAGUN, CORDOBA	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LORICA	**NIT: 800.096.758-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 4 NO. 18 - 17 PALACIO MUNICIPAL	LORICA, CORDOBA	7735092

BENEFICIARIO: 800096758 - MUNICIPIO DE LORICA ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****250,684.00	$ *******3,000.00	$ ******48,200.00	$ **********301,885.00	$ ******300,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUVE SEGUROS CIA. LTDA.	215223	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006616991021(3900)000000301885(96)20230823

REFERENCIA PAGO:

1100661699102-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-40-101069367	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	09	2022	23	08	2022	00:00	23	12	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.601.787-5**

DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 1 J - 33 — **CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA — **TELÉFONO:** 3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE LORICA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.096.758-8**

DIRECCIÓN: CL 4 NO. 18 - 17 PALACIO MUNICIPAL — **CIUDAD:** LORICA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7735092

BENEFICIARIO: 800096758 - MUNICIPIO DE LORICA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUAPOYO L.P. S.A.S.	900793402-4	80.00
CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S	901418309-4	20.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

33-40-101069367

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

YENYCAMACHO

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/11/2022
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 219 de 2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 23/12/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/11/2022
(Día) (Mes) (Año)

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ..... **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

El formato no se encuentra diligenciado, teniendo en cuenta que el contratista no ha presentado la información requerida para dicho formato.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 25202-143957 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

República de Colombia

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

ALCALDIA MUNICIPAL

VERSIÓN	1			
PÁGINA	1	DE	1	

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA 27 9 22

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA-COLOMBIA RURAL

DATOS GENERALES

CONTRATO N°219 **DE** 2022 **PLAN INICIAL** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA DE LA VIA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA"

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG
SUPERVISOR DE CONTRATO:	CARLOS DAVID PEINADO CALAO
PLAZO:	4 MESES
PRESUPUESTO:	$1.599.803.205,00
ANTICIPO 40%	$639.921.282,00

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe invertir en forma directa y de manera de inequívoca en el objeto contractual con sujeción a este plan de manejo e inversión.

No.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR TOTAL	%
1	Transporte de Materiales	$ 79.019.009,6	$ 19.754.752,4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.773.762	15,44%
2	Subbase Granular	$ 200.000.000,0	$ 50.000.000,0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000.000	39,07%
3	Material de Mejoramiento	$ 128.000.000,0	$ 32.000.000,0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000.000	25,00%
4	Acero	$ 131.147.520,0	$ 0,0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.147.520	20,49%
TOTAL		**$ 538.166.529,6**	**$ 101.754.752,4**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 639.921.282**	**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.
b) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15 %) del anticipo para compra de equipo y respuestos

Contratista: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022
Representante Legal

Interventoria : FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Director de Interventoria /Rep Legal

MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** OCTUBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 219 - 2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15626 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 105-00000-781 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 40 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 639.921.282,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 - 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Transporte de Materiales	$ 98.773.762,00	$ -		$ -	$ 98.773.762,00
2	Sub base Granular	$ 250.000.000,00	$ -			$ 250.000.000,00
3	Material de Mejoramiento	$ 160.000.000,00	$ -			$ 160.000.000,00
4	Acero	$ 131.147.520,00	$ -			$ 131.147.520,00
	TOTALES	$ 639.921.282,00	$ -	$ -	$ -	$ 639.921.282,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - .
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
A la fecha no se han aprobado ordenes de desembolso del anticipo a terceros

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.


Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-143957 CND

Firma:
Nombre: FREDY ROMARIO [illegible] GIRALDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


• Seguimiento Programa de Obra

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
1		**Mejoramiento Placa Huella de la vía Tierraltica, zona rural del Municipio de Santa Cruz de Lorica**	**115 días**	**$ 1,599,803,205.00**	**mar 23/08/22**	**sáb 24/12/22**
2		Inicio	0 días	$ 0.00	mar 23/08/22	mar 23/08/22
3		**OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS PAGA**	**45 días**	**$ 14,604,822.00**	**mar 4/10/22**	**mié 23/11/22**
4		**REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)**	**40 días**	**$ 25,905,158.00**	**mar 23/08/22**	**lun 3/10/22**
5		**I. EXPLANACIONES**	**32 días**	**$ 43,376,690.00**	**lun 3/10/22**	**sáb 5/11/22**
6		Excavaciones varias en material común en seco.	19 días	$ 4,403,000.00	lun 3/10/22	lun 24/10/22
7		Excavación en material común de la explanación y canales	27 días	$ 38,973,690.00	lun 3/10/22	mar 1/11/22
8		**III. PLACA HUELLA, ANCHO 5,90m - INCLUYE CUNETAS DE 0,70m Y SOBRE ANCHO DE 0,80m**	**68 días**	**$ 1,454,420,695.00**	**lun 10/10/22**	**vie 23/12/22**
9		Subbase Granular Clase C	31 días	$ 221,589,900.00	lun 10/10/22	sáb 12/11/22
10		Afirmado 15cm (Material para Mejoramiento, utilizar CBR de acuerdo a la guia. CBR ≤ 3%)	34 días	$ 132,172,110.00	mar 8/11/22	jue 15/12/22
11		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	35 días	$ 229,653,765.00	sáb 12/11/22	mié 21/12/22
12		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	27 días	$ 100,381,260.00	jue 24/11/22	vie 23/12/22
13		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	31 días	$ 238,300,050.00	sáb 19/11/22	jue 22/12/22
14		Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	28 días	$ 246,853,586.00	jue 24/11/22	sáb 24/12/22
15		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	55 días	$ 285,470,024.00	vie 14/10/22	jue 15/12/22
16		**IV. TRANSPORTE**	**45 días**	**$ 60,375,840.00**	**lun 3/10/22**	**lun 21/11/22**
17		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	45 días	$ 60,375,840.00	lun 3/10/22	lun 21/11/22
18		**V. CARACTERIZACIÓN VIAL**	**114 días**	**$ 1,120,000.00**	**mar 23/08/22**	**vie 23/12/22**
19		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).n	68 días	$ 1,120,000.00	lun 10/10/22	vie 23/12/22
20		Fin	0 días	$ 0.00	vie 23/12/22	vie 23/12/22

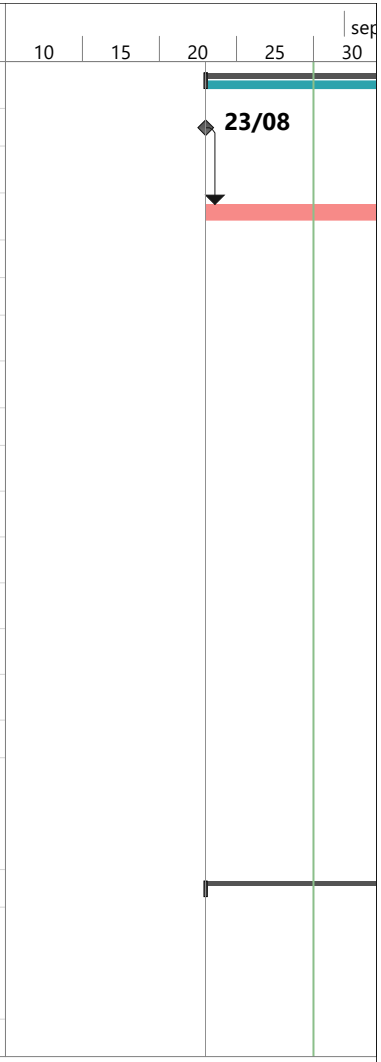

Proyecto: 05 Programación de
Fecha: mar 30/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

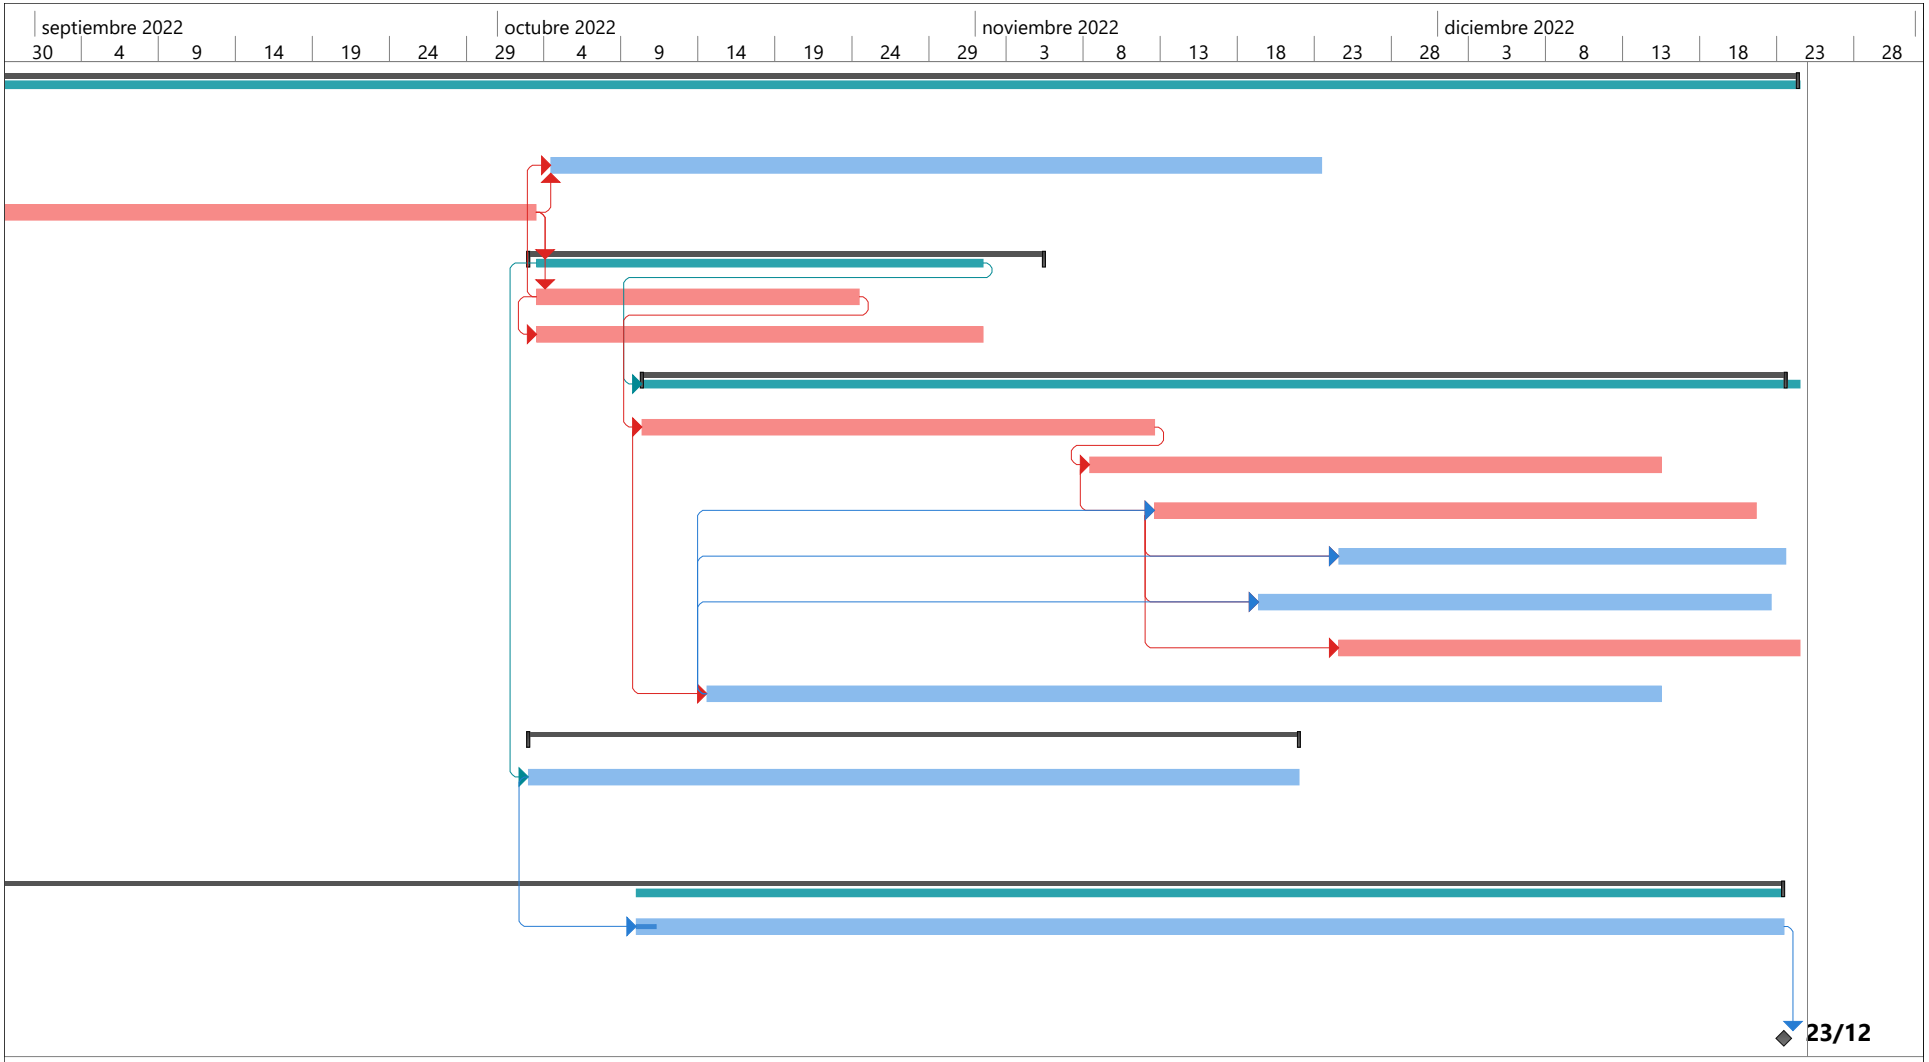

Proyecto: 05 Programación de
Fecha: mar 30/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES,

MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 219 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRA LTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato original)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2022 (Incluyas día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Incluyas la suspensión que corresponda con el acápite del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.599.803.205,00 (Según contrato original)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.599.803.205,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/12/2022 (Incluyas las suspensiones, incluya día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Incluyas día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 AGOSTO DE 2022	2 SEPTIEMBRE DE 2022	3 OCTUBRE DE 2022	4 NOVIEMBRE DE 2022	5 DICIEMBRE DE 2022					
GPP1 - EXPLANACIONES	$ 43.376,69	2,78%	0%	% P	0,00%	0,00%	2,62%	0,16%	0,00%					
				$ P			$40.830,62	$2.526,07						
				$ E										
				% E										
GPP2- PLACA HUELLA, ANCHO 5,90m - INCLUYE CUNETAS DE 0,70m Y SOBRE ANCHO DE 0,80m	$ 1.454.420,70	93,27%	0%	% P	0,00%	0,00%	13,27%	29,37%	50,63%					
				$ P			$206.935,96	$458.002,78	$789.481,96					
				$ E										
				% E										
GPP3- TRANSPORTE	$ 60.375,84	3,87%	0%	% P	0,00%	0,00%	2,23%	1,65%	0,00%					
				$ P			$34.716,11	$25.659,73	$0,00					
				$ E										
				% E										
GPP4 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 1.120,00	0,07%	0%	% P	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,03%					
				$ P			$315,00	$407,65	$397,35					
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.559.293,23**	**100%**	**0%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**18,14%**	**31,21%**	**50,66%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 282.817,68**	**$ 486.596,23**	**$ 789.879,31**					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**18,14%**	**49,34%**	**100,00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 282.817,68**	**$ 769.413,91**	**$ 1.559.293,23**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,00**	**$ 0,00**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 21.769.040,00 / $ -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.136.118,00 / $ -	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGa e IVA)	$ 14.604.822,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	**$ 40.509.980,00**	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.599.803.205,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No : 25202-143957 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** _____

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 219 DE 2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.599.803.205,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.599.803.205,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 AGOSTO DE 2022	2 SEPTIEMBRE DE 2022	3 OCTUBRE DE 2022	4 NOVIEMBRE DE 2022	5 DICIEMBRE DE 2022
GPP1 - EXPLANACIONES	$43.377	2,78%	0,27%	% P	0,00%	0,00%	2,62%	0,16%	0,00%
				$ P			$40.850,62	$2.526,07	
			$4.192	$ E			$4.192		
				% E			0,27%		
ANCHO 5,90m - INCLUYE CUNETAS DE 0,70m Y S	$1.454.421	93,27%	0%	% P	0,00%	0,00%	13,27%	29,37%	50,63%
				$ P			$206.935,96	$458.002,78	$789.481,96
			$0	$ E					
				% E					
GPP3- TRANSPORTE	$60.376	3,87%	0%	% P	0,00%	0,00%	2,23%	1,65%	0,00%
				$ P			$34.716,11	$25.659,73	$0,00
			$0	$ E					
				% E					
GPP4 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$1.120	0,07%	0%	% P	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,03%
				$ P			$315,00	$407,65	$397,35
			$0	$ E					
				% E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.559.293,23	100%							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')									

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	18,14%	31,21%	50,66%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$282.818	$486.596	$789.879
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	18,14%	49,34%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$282.818	$769.414	$1.559.293
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,27%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$4.192		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,27%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$4.192		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -	%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 21.769.040,00	$ -	%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.136.118,00	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 14.604.822,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 40.509.980,00	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.599.803.205,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No : 25202-143957 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **ACTAS DE COMITÉ**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4
		FECHA	21/10/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 219-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022, NIT. 901601787-50

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Subsanar las observaciones sobre el personal profesional propuesto y presentar la nueva hoja de vida del profesional para el cargo de residente de obra: cumplió
Presentación de avance parcial de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños: cumplió
Entrega del documento PAGA: incumplió

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Valla informativa
3.Actas de vecindad
4. Pólizas actializadas seún acta de inicio:
5. Seguridad social del personal vinculado a la ejecución del proyecto
6. Fuentes de materiales
7. Sitio de disposición de materiales proveniente de las excavaciones y demoliciones:
8. Fiducia para el giro del anticipo

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños: se indica que la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños contemplaba un plazo de un (1) mes y ya se está próximo a cumplir dos (2) meses de haber iniciado. Hasta la fecha se han presentado la mayoría de los tomos entregables producto de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, quedando pendiente el componente del diseño geométrico, el cual el contratista se hace el compromiso de entregarlo el día de mañana 22 de octubre de 2022. El contratista informa que en el día de mañana se realizará el replanteo topográfico en campo conjuntamente entre interventoría y contratista. Los componentes entregados hacen referencia al componente geotécnico, de pavimento, hidrológico e hidráulico, al cual se le realizó unas observaciones y se está pendiente que el contratista les de respuesta, mientras tanto en el componente de geotecnia ya hay aval formalmente y en una mesa de trabajo que se realizó entre especialistas esta semana, se concertó la estructura del pavimentos, entonces la interventoría estaría conceptuando a mas tardar el lunes para dar el visto bueno al de pavimentos . Se informa que la interventoría ha dado el aval para dar inicio a las obras y a la fecha el contratista se encuentra en la logística de dar inicio a las actividades, en donde se ha organizado el campamento de obra, se ha suministrado acero, se ha hecho traslado de la motoniveladora y se ha suministrado la señalización. Se solicita el ingreso inmediato al vibro compactador.

2. Valla informativa: el contratista manifiesta que se encuentra en la gestión de la organización de la estructura. Por su parte, la interventoría informa que está a la espera a que el Instituto Nacional de Vías-INVÍAS entregue el arte definitivo que se va a implementar en los contratos, para hacérselos llegar.

3. Actas de vecindad: el contratista informa que prácticamente han culminado la elaboración de las actas de vecindad y próximamente se estarían remitiendo ante la interventoría.

4. Pólizas actualizadas según acta de inicio: el contratista manifiesta haber remitido con anterioridad la aprobación de pólizas ante el Municipio

5. Seguridad social del personal vinculado a la ejecución del proyecto: por parte de la interventoría se le recuerda al contratista que a la fecha no ha presentado soportes de afiliación y pagos al sistema general de seguridad social, por tanto no podrá dar inicio a la ejecución de obra hasta tanto no esté al día con este asunto.

6. Fuentes de materiales: se indica que se ha radicado ante interventoría, el cambio de canteras con su respectiva documentación legal y la información técnica de los materiales que ellas van a proveer. Se deja claro que no se van a reconocer mayores costos generados por sobreacarreo, los cuales son asumidos por el contratista de obra., esto dado por la emergencia presentada en el Municipio de lorica por la caída del puente que ha obligado a suministrar materiales de otras canteras con distancias mayores a la inicialmente contempladas.

7. Sitio de disposición de materiales proveniente de las excavaciones y demoliciones: el contratista manifiesta que ya radicó ante el Municipio, el oficio de solicitud del sitio de disposición de materiales provenientes de las excavaciones y demoliciones, a lo cual no se ha tenido respuesta a la fecha.

8. Fiducia para el giro del anticipo: se indica que se cuenta con el plan de inversiones aprobado y que se necesita que se presenten las ordenes de servicio de la fiducia y falta que el Municipio le haga el traslado de los recursos a la fiducia y para ello se necesita hacer el cambio de firmas.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Instalar la estructura de la valla informativa	02/11/2022	Contratista
Emitir la aprobación de las pólizas según acta de inicio	25/10/2022	Municipio
Indicar el sitio de disposición de materiales provenientes de las excavaciones y demoliciones	25/10/2022	Municipio
Hacer el cambio de firmas	24/10/2022	Municipio

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 22/11/2022 (Día / Mes / Año)






NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUÍS ALBERTO PACHRCO DÍAZ	Representante Legal	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
JESÚS SALGADO	Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	
CARLOS PEINADO CALAO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Secretario de infraestructura municipal - Supervisor del contrato de obra	MUNICIPIO DE LORICA	
ANA MILENA	Apoyo a la secretaria de infraestructura municipal	MUNICIPIO DE LORICA	

- **ACTAS DE REUNIÓN**

No se realizan durante el periodo

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al corte de la semana No. 11, se tiene una inversión de obra programada del 282.817.683,87 correspondiente al 18,14% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $4.192.128,00 correspondiente al 0,27%; lo que representa un atraso del 17,87%

Se realizó el comité de obra No. 2, en el cual se le hizo seguimiento a la ejecución del contrato de obra

A la fecha del presente informe, se encuentran aprobados el diseño de pavimentos y los estudios de suelos realizados y entregados por el contratista. Esta Interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas. Así mismos Se recomienda atender las observaciones pendientes por subsanar para culminar rápidamente la etapa de revisión y/o ajustes definitivos a los estudios y diseños

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
2/10/2022	UT-RLCE-017	Remisión de Plan de Inversión del Anticipo de obra Actualizado	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
2/10/2022	UT-RLCE-018	Remisión Informe Final de Etapa de Revisión de Estudios y Diseños	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE

8.1.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
3/10/2022	CVRIMG- 072 -2022	Respuesta oficio UT-RLCE-017 – Plan de Inversión del Anticipo	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
4/10/2022	CVRIMG- 074 -2022	Reiteración complementación de la documentación del personal profesional propuesto	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
7/10/2022	CVRIMG- 082 -2022	Aprobación de personal propuesto	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
7/10/2022	CVRIMG- 090 -2022	Solicitud de soportes de afiliación al SGSS y pagos al día del personal vinculado a la ejecución del proyecto.	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
10/10/2022	CVRIMG- 094 -2022	Aprobación ajustes del estudio geotécnico	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
13/10/2022	CVRIMG- 102 -2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO DE PAVIMENTOS	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
15/10/2022	CVRIMG- 108 -2022	informe de observaciones al tomo de estudio hidráulico	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
24/10/2022	CVRIMG- 125 -2022	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE

24/10/2022	CVRIMG- 126 -2022	Aprobación de cambio de profesional residente de obra y concepto sobre maquinaría presentada.	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
26/10/2022	CVRIMG- 130 -2022	Respuesta comunicada No UT-RLCE-024 – Remisión de documentación legal y técnica para solicitud de autorización de cambio de fuente de materiales para afirmado y sub base granular.	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
26/10/2022	CVRIMG- 132 -2022	Atraso del contrato de obra.	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
28/10/2022	CVRIMG- 145 -2022	Aprobación revisión y/o ajuste del estudio de pavimentos.	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE
28/10/2022	CVRIMG- 148 -2022	Solicitud de caracterización de materiales seleccionados.	UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO – Contrato No. 219 de 2022	
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Replanteo topográfico en conjunto	Figurado de acero
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Excavación de la explanación	Trabajos en la vía

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO – Contrato No. 219 de 2022	
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Socialización del proyecto, con la comunidad	Socialización del proyecto, con la comunidad
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Suministro de acero	Suministro de señales

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría

Octubre 01 de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa.

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría

Octubre 02 de 2022
Actividades realizadas
No se laboró por ser domingo.

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría

Octubre 03 de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría

Octubre 04 de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Elaboración de actas de vecindad.

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría

Octubre 05 de 2022

Actividades realizadas

1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Elaboración de actas de vecindad.

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 06 de 2022

Actividades realizadas:

1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Elaboración de actas de vecindad

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 07 de 2022.

Actividades realizadas:

1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Elaboración de actas de vecindad.

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 08 de 2022

Actividades realizadas:

1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa
3. Elaboración de actas de vecindad

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría

Octubre 09 de 2022

No se laboró por ser domingo

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 10 de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Elaboración de actas de vecindad

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 11 de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
4. Elaboración de actas de vecindad.

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 12 de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Se realizó la Socialización del proyecto a la comunidad, por parte del contratista, interventoría, municipio e Instituto Nacional de Vías - INVIAS
4. Elaboración de actas de vecindad

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 13 de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Suministro de acero para la construcción de las obras.
4. Elaboración de actas de vecindad

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 14 de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Elaboración de actas de vecindad

Ing. Residente.
Ing. Res. Interventoria.

Octubre 15 de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Elaboración de actas de vecindad.

Ing. Residente
Ing. Res. Interventoria

Octubre 16 de 2022.
No se laboró por ser domingo.

Ing. Residente.
Ing. Res. Interventoria

Octubre 17 de 2022
No se laboró por ser festivo.

Ing. Residente.
Ing. Res. Interventoria.

Octubre 18 de 2022
Estado del tiempo
Mañana: Seco
Tarde: Seco y lluvias leves 10:30 p.m hasta las 12:00 p.m

Equipos y Maquinarias.
Equipos topograficos y 1 motoniveladora.
Personal en obra.
1 Ingeniero residente.
1 comisión topografica
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Abscisado de la via.
4. Construcción y adecuación de campamento.

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoria

Octubre 19 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: lluvias leves desde la 12:01 am hasta la 03:00 a.m
Tarde: Seco.
Equipos y maquinarias
1 equipos topograficos, 1 motoniveladora y 1 minicargador.
Personal en obra.
1 Ingeniero residente de obra
1 Ingeniera auxiliar de obra
1 comisión topografica
1 Director de interventoria
1 Ingeniero Residente de interventoria
1 Ingeniero auxiliar de interventoria
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Elaboración de actas de vecindad
4. Transporte de y suministro de piedra rajón
5. Suministro de señales.

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoria

Octubre 20 de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Seco
Tarde: Seco.
Personal en obra.
1 Ing. Residente de obra.
1 Ingeniero auxiliar de obra.
1 Ingeniero auxiliar de interventoría.
1 Ingeniero residente de Interventoría.
Equipos y Maquinarias
Equipos topográficos, 1 Motoniveladora y 1 minicargador.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Elaboración de actas de vecindad.
4. levantamiento topográfico (traslado de puntos de cambios y cotas topográficas).

Ing. Residente

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 21 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: Seco
Tarde: Seco
Equipos y Maquinarias:
Equipos topográfico, 1 Motoniveladora y 1 minicargador.
Personal en obra:
1 Ingeniero residente de obra
1 Ingeniero auxiliar de obra
1 Ingeniero residente de interventoría.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa.

3. Elaboración de actas de vecindad
4. Replanteo topográfico.

Ing. residente

Sabado, 22 octubre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: seco
Personal en obra.

Contratista	Interventoría
1. Ing. residente de obra	Director de interventoria.
1 Ing. auxiliar de obra	Comisión topográfica.
1 Comisión topografica	
1 operador de maquinaria	

Equipos y maquinarias:
Equipos topograficos → A
1 Motoniveladora → I
1 Minicargador → I.
Herramientas menores → A.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa.
3. Replanteo topográfico en conjunto, por parte de la interventoría y contratista.

Ing. residente

Domingo, 23 de octubre de 2022
No se laboró por ser domingo

Ing. residente

Lunes, 24 de octubre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: seco. Noche: Lluvias fuertes desde las 10:30 p.m hasta las 12:00 m
Herramientas, equipos y Maquinarias
Herramientas menores → A
Equipos topograficos → A
Motoniveladora → A
Personal en obra.

Contratista
1 Ingeniero residente de obra
1 Ingeniera auxiliar de obra
1 operador de maquinaria
1 Comisión topografica

Interventoria
1 Comisión topografica.

Actividades realitadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Verificación topográfica en conjunto, por parte de la interventoria y contratista.
4. Perfilación y nivelación sobre los costados de la vía

Martes, 25 de octubre de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: seco.
Herramientas, equipos y maquinarias:
Herramientas menores → A.
1 Motoniveladora → A
1 Minicargador → A
Equipos topograficos → A
Personal en obra:

Contratista
1 Ing. Residente de obra
1 Ing. auxiliar de obra.
2 operadores de maquinaria.
1 Comisión topografica.
2 auxiliares de transito

Interventoria.
Ing. Residente
Ing. Auxiliar
Comisión topografica.

Actividades realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseño.
2. Gestión administrativa.
3. Replanteo topográfico del eje de la vía, en conjunto por parte del contratista y la interventoria.
4. Perfilación y nivelación de la vía.

Ing. Residente

Miercoles, 26 de octubre de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: Lluvias intensas desde las 12:00 a.m hasta las 2:00 a.m Tarde: seco.
Observación: Las lluvias intensas presentadas saturaron el terreno en el sitio de las obras a desarrollar.
Herramientas, equipos y maquinarias:
Herramientas menores → A.
Equipos topograficos → A.
1 Motoniveladora → I
1 Miniargador → I

Personal en obra
Contratista
1 Ing. Residente de obra
1 Ing. auxiliar de obra.
1 comisión topografica
2 operadores de maquinarias
2 auxiliares de transito.
1 Oficial de obra

Interventoria.
1 Comisión topografica.

Actividades realizadas:
1. Figurado y armado de acero.
2. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
3. Gestión administrativa.
4. Replanteo topográfico.

Ing. residente

Fernando

Jueves, 27 de octubre de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: seco.
Herramientas, equipos y maquinarias.
Herramientas menores → A.
Equipos topográficos → A.
1 Minicargador → A
1 Motoniveladora → A
Personal en obra

Contratista.	Interventoría.
1 Ing. Residente de obra	1 Ing. Residente de interventoría
1 Ing. Auxiliar de obra.	1 Comisión topográfica.
2 Operadores de maquinaria	
1 Comisión topográfica	
2 Auxiliares de transito	
1 Oficial	

Actividades realizadas:
1. Figurado y armado de acero
2. Excavación en material común de la explanación y canales.
3. Gestión administrativa
4. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños

Ing. residente

Fernando

Viernes, 28 de octubre de 2022

Estado del tiempo:

Mañana: seco

Tarde: seco.

Herramientas, equipos y maquinarias:

Equipos topograficos → A

1 Minicargador → A

1 Motoniveladora → A

Herramientas menores → A

Personal en obra:

Contratista:

1 Ing. Residente de obra

1 Ing. Auxiliar de obra.

2 Operadores de maquinaria.

2 Auxiliares de transito

1 Oficial

Interventoría.

1 Ing. Residente

1 Comisión topográfica

Actividades realizadas:

1. Figurado y armado de acero

2. Excavación en material común de la explanación y canales

3. Gestión administrativa.

4. Revisión y ajustes a los estudios y diseños.

Ing. residente

Sabado, 29 de octubre de 2022

Estado del tiempo:

Mañana: seco.

Tarde: seco

Herramientas, equipos y Maquinarias:

Herramientas menores → A

1 Motoniveladora → I

Equipos topograficos → A

Personal en obra
Contratista.
1 Ing. Residente de obra.
1 Ingeniera auxiliar de obra
1 operador de maquinaria
2 auxiliares de transito.
1 Comisión topografica
1 oficial

Interventoria
1 Comisión topografica.

Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Figurado y armado de acero

Ing. residente

Domingo, 30 de octubre de 2022
No se laboró por ser domingo.

Ing. residente

Lunes, 31 de octubre de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana:
Tarde:
Herramientas, equipos y maquinarias
Herramientas menores → A
1 Motoniveladora →
Equipos topograficos → A
1 Retroexcavadora → A
1 Vibrocompactador → A.
Personal en obra:
Contratista

1 Ing. Residente de obra
1 Ing. auxiliar de obra
3 Operadores
2 auxiliares de transito
1 oficial de obra
1 Comisión topografica
1 almacenista
2 auxiliares de transito.

Actividades realizadas:

1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Excavación en material comun de la explanación y cunales: desde la k2+112 hasta la k1+162.
4. Perfilado y nivelación de la vía: desde la k0+000 hasta la k0+062.
5. Figurado y armado de acero.

Ing. Residente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 225 de 2022 **Contratista:** MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

INFORME MENSUAL No. TRES (3) **MES O PERIODO:** OCTUBRE DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	095
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	097
1	**INTRODUCCIÓN**		099
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		100
2.1	Localización		100
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		102
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		102
2.4	Características técnicas del proyecto		103
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		105
3.1	Información general del contrato		105
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		105
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		106
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		106
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		107
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	108
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	119
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	121
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	123
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	127
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	132
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	134
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	143
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		145
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Obra		146
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	160
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	162
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	164
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	167
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		735
5.1	Información general del contrato		735
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		735
5.3	Informes especialistas y profesionales		739
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		922
5.5	Informe matriz de riesgos.		923
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		924
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		927
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	928
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	931
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	940
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	942
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	949
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		951
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	953
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	955
7	**Conclusiones y recomendaciones**		168
8	**Anexos**		169
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		170
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		172
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		173
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		175

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** octubre - 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 225 de 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATISTA: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/02/2023
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 5.399.871.682,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 5.399.871.682,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	2300
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones	Und	1
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Acantarillas 36"	Und	14

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 5.285.828.462,00		$ 5.285.828.462,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ 47.656.638,65	$ 9.054.761,35	$ 56.711.400,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.178.000,00	$ 9.153.820,00	$ 57.331.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.381.663.100,65	$ 18.208.581,35	$ 5.399.871.682,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 361.716.710,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía Candelaria - El Rodeo, estado de la Vía



Vía Candelaria - El Rodeo, estado de la Vía

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

$ 57.331.820,00 $ 11.466.364,00

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de Santa Cruz de Lorica mediante el convenio interadministrativo No. 1960 de 2021. Es por ello que mediante el proceso de licitación pública, **Proceso L.P-004-2022,** se celebra el Contrato de Obra No. 225 de 2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA", El cual fue adjudicado a MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER2022, cuyo plazo inicial es de seis (6) meses a partir del 23 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 5.399.871.682,00.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de octubre de 2022; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en la zona rural del municipio de Santa Cruz de Lorica, exactamente en la vía alterna que comunica a los corregimientos de Candelaria, Corea, El Brillante y El Rodeo, El proyecto consiste en el mejoramiento de 2300 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, Ubicación del Municipio de Santa Cruz de Lorica.

El municipio de Santa Cruz de Lorica se encuentra ubicada al norte del departamento de Córdoba, en la zona baja del río Sinú y próxima al litoral del mar Caribe, a una distancia de 29 km Coveñas, 50 kilómetros de Tolú, 60 kilómetros de Montería y su cabecera municipal se encuentra localizada sobre la margen derecha del río Sinú, en las coordenadas latitud Norte 9° 13' 59" longitud Oeste 75° 49' 1", con respecto al meridiano de Greenwich. El municipio presenta un área de 1033 Km2, de las cuales 7,3 Km2 pertenece al casco urbano y 1025,7 Km2 al área rural, este limita al Norte con los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento, Purísima y Momil, por el este con los municipios de Momil y Chimá, por el oeste con los municipios de San Bernardo del Viento, Puerto Escondido y Moñitos y por el sur con los municipios de San Pelayo y Cotorra, posee una altura de 7 m.s.n.m. y una temperatura media de 32ºC.



Ilustración 3. Localización Vía Candelaria - Rodeo

Referencia	Latitud	Longitud
P1	9°11'20.62" N	76° 0'55.50" O
P2	9° 9'26.86" N	76° 3'1.05" O

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

El contratista presenta la fuente de materiales ubicada en el corregimiento Loma Grande, perteneciente al municipio de Montería y una segunda fuente de materiales ubicada en el corregimiento Agua Viva, perteneciente al municipio de Montería.

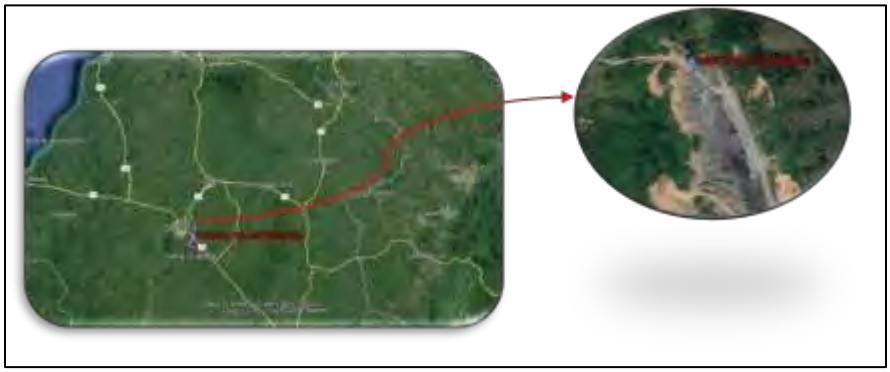


Ilustración 4. Fuente de materiales - Loma Grande.



Ilustración 5. Fuente de materiales - Agua Viva.

2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Se beneficia con la ejecución del contrato de obra No. 225 de 2022, principalmente la zona rural conformada por los corregimientos de Candelaria y el Rodeo.

2.1.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, contribuye en el crecimiento económico de la población rural, ya que los niveles de servicios de la vía serán óptimos, mejorando la calidad del servicio a los usuarios, disminuyendo los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En el estado inicial de la vía alterna que comunica a los corregimientos de Candelaria, Corea, El Brillante y El Rodeo, es evidente el deterioro de la capa de rodadura por su uso rutinario, por el ineficiente drenaje de la escorrentía y la baja frecuencia en la ejecución de trabajos de mantenimiento. Se puede verificar también, que las estructuras de drenaje (Box Coulvert) presentan un grado de deterioro considerable, así como falta de limpieza y/o mantenimiento, lo que dificulta el paso de las aguas y así su represamiento, afectando la estructura de la vía**.** Es por ello que se realiza el mejoramiento de 2300 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de catorce (14) obras de drenaje tipo alcantarilla, un (1) ponto de concreto reforzado de longitud 9 metros, y demarcación horizontal y vertical de los tramos discontinuos.

	
Estado de la Vía Candelaria El Rodeo – 13/09/2022	Estado de la Vía Candelaria El Rodeo – 13/09/2022

A la fecha, aun no se inicia con las actividades en obra, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra la etapa de revisión y /o ajustes a los estudios y diseños.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de 2300 metros de vía con pavimento de concreto hidráulico módulo de rotura 40 MPa. Construcción de cuneta bordillos a ambos lados de los tramos intervenidos. Construcción de catorce (14) obras de drenaje tipo alcantarilla, un (1) pontón de longitud 9 metros y la demarcación Horizontal y vertical de los tramos intervenidos.

Contrato 219 de 2022	
Sistema	Pavimento Rígido
Longitud	2300 metros
Ancho Calzada	5 metros
Espesor	0,2 metros



Ilustración 6. Vista en planta estructura de pavimento.



Ilustración 7. Vista en perfil estructura de pavimento

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	L.P-004-2022
CONTRATO No.	225 de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/06/2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"
CONTRATISTA	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
NIT	1067287484
INTEGRANTES	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484, Participación: 100%
DIRECCIÓN CONTRATISTA	Cra 14A. No. 55 – 49 Barrio La Castellana Montería – Córdoba
NUMERO DE TELEFONO	(+57) 3217752430
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.399.871.682,00
CORREO	mariosinesterra@hotmail.com
PLAZO INICIAL	6 MESES
FECHA INICIO	23/08/2022
FECHA TERMINACIÓN	23/02/2023
MODIFICACIONES	Modificatorio No.1 del 08 de septiembre de 2022

Tabla 1. Información Cto. 225 de 2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
ii. Se inicia la elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA.

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El contratista entregó el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA y está en revisión por parte de esta interventoría.

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. No se realizan actividades correspondientes a la gestión social, durante el periodo. Una vez se tenga el balance y la meta física aterrizada, de acuerdo a los estudios y diseños, se realizará la socialización del proyecto a la comunidad.

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos para ninguno de los contratos de obra a cargo de esta interventoría.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. Al corte del presente informe, se tiene una inversión de obra programada del $ 361.716.710,00 correspondiente al 6,84 % y una inversión de obra ejecutada acumulada de $0,00 correspondiente al 0,0%; lo que representa un atraso del 6,84%
ii. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
iii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados en los comités y actas de reunión realizadas.
iv. Realizar la revisión de la documentación entregada por el contratista
v. Coordinar mesas de trabajo entre los especialistas tanto del contratista de obra como de la Interventoría para agilizar la aprobación de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

I. Informe semanal No.07, del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2022
II. Informe semanal No.08, del 07 al 13 de octubre de 2022
III. Informe semanal No.09, del 14 al 20 de octubre de 2022
IV. Informe semanal No.10, del 21 al 27 de octubre de 2022
V. Informe semanal No. 11, del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 7 del 30/09/2022 al 06/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 2300 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros, la construcción catorce (14) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de longitud 5 metros y diámetro de 36", la construcción un (1) pontón en concreto reforzado y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de 2300 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de catorce (14) obras de drenaje tipo alcantarilla, un (1) punto de concreto reforzado de longitud 9 metros, y demarcación horizontal y vertical de los tramos discontinuos en la vía alterna que comunica a los corregimientos de CANDELARIA, COREA, EL BRILLANTE y EL RODEO, en la zona rural del municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484, Participación: 100%			**INTEGRANTES:**	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	225 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 5,399,871,682.00	**CONTRATO No.**	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4,564,284,660.00
FECHA DE INICIO:	8/23/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	8/22/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/23/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 5,399,871,682.00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	12/31/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 4,564,284,660.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	2/23/2023		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	12/31/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 5,399,871,682		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5,285,828,462.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia __2022___	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	Km	2.3			Prog					
					Ejec					
Afirmado	Km	2.3			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	Km	2.3			Prog					
					Ejec					
Pavimento RÍgido	Km	2.3			Prog					
					Ejec					
Alcantarillas 36"	Und	14			Prog					
Ponton	Und	1								
					Ejec					
Señalización Vertical	Und	28			Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	Km	2.3			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: Loma Grande, Corregimiento del Municipio de Montería	PERMISO MINERO: SI NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN: Aguas Vivas, Vereda del Municipio del Montería	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado - En revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El contratista entregó el documento PAGA y está en revisión por parte de la interventoría

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El punto de atención al usuario se ubicará en Candelaria Arriba.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se contina con la elaboración del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Se encuentra en proceso la aprobación de la programación de obra. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. realizar comité de seguimiento de obra
4. Gestionar la bitácora de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO

Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 8 del 7/10/2022 al 13/10/2022 **Último Informe Semanal SI** (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 2300 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros, la construcción catorce (14) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de longitud 5 metros y diámetro de 36", la construcción un (1) pontón en concreto reforzado y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de 2300 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de catorce (14) obras de drenaje tipo alcantarilla, un (1) ponto de concreto reforzado de longitud 9 metros, y demarcación horizontal y vertical de los tramos discontinuos en la vía alterna que comunica a los corregimientos de CANDELARIA, COREA, EL BRILLANTE y EL RODEO, en la zona rural del municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484

MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484, Participación: 100%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	225 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 5.399.871.682,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/02/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 5.399.871.682,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/02/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 5.399.871.682		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.285.828.462,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	2.300			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	2.300			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	2.300			Prog					
					Ejec					
Pavimento Rígido	m	2.300			Prog					
					Ejec					
Alcantarillas 36"	Und	14			Prog					
Ponton	Und	1			Ejec					
					Prog					
Señalización Vertical	Und	28			Ejec					
					Prog					
Señalización Horizontal	m	2.300			Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Loma Grande, Corregimiento del Municipio de Montería	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Aguas Vivas, Vereda del Municipio del Montería	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado - En revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El contratista entregó el documento PAGA y está en revisión por parte de la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: El contratista manifestó que el punto de atención al usuario se ubicará en la vereda de Corea, en la casa del señor Robert Dimas, al igual que el campamento de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. El documento PAGA se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. realizar comité de seguimiento de obra
4. Gestionar la bitácora de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 9 del 14/10/2022 al 20/10/2022 **Último Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 2300 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros, la construcción catorce (14) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de longitud 5 metros y diámetro de 36", la construcción un (1) pontón en concreto reforzado y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El proyecto consiste en el mejoramiento de 2300 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de catorce (14) obras de drenaje tipo alcantarilla, un (1) ponto de concreto reforzado de longitud 9 metros, y demarcación horizontal y vertical de los tramos discontinuos en la vía alterna que comunica a los corregimientos de CANDELARIA, COREA, EL BRILLANTE y EL RODEO, en la zona rural del municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484

INTEGRANTES: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484, Participación: 100%

CONTRATO No.	225 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 5.399.871.682,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/02/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 5.399.871.682,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/02/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 5.399.871.682		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.285.828.462,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 227.472.276,00	4,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (227.472.276,00)	-4,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 227.472.276,00	4,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (227.472.276,00)	-4,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 109.620.317,00	2,07%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	2300			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	2300			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	2300			Prog					
					Ejec					
Pavimento Rígido	m	2300			Prog					
					Ejec					
Alcantarillas 36"	Und	14			Prog					
Ponton	Und	1			Ejec					
Señalización Vertical	Und	28			Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	2300			Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: Loma Grande, Corregimiento del Municipio de Montería	PERMISO MINERO:	SI	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN: Aguas Vivas, Vereda del Municipio del Montería	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado - En revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El contratista entregó el documento PAGA y está en revisión por parte de la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El contratista manifestó que el punto de atención al usuario se ubicará en la vereda de Corea, en vivienda del señor Robert Dimas, al igual que el campamento de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. El documento PAGA se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Realizar comité de seguimiento de obra
4. Gestionar la bitácora de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 10 del 21/10/2022 al 27/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA".

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 2300 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros, la construcción catorce (14) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de longitud 5 metros y diámetro de 36", la construcción un (1) pontón en concreto reforzado y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de 2300 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de catorce (14) obras de drenaje tipo alcantarilla, un (1) ponto de concreto reforzado de longitud 9 metros, y demarcación horizontal y vertical de los tramos discontinuos en la vía alterna que comunica a los corregimientos de CANDELARIA, COREA, EL BRILLANTE y EL RODEO, en la zona rural del municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484, Participación: 100%			**INTEGRANTES:**	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	225 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 5.399.871.682,00	**CONTRATO No.**	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/02/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 5.399.871.682,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/02/2023		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 5.399.871.682		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.285.828.462,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 361.716.710,00	6,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (361.716.710,00)	-6,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 361.716.710,00	6,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (361.716.710,00)	-6,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 134.244.434,00	2,54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	2300			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	2300			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	2300			Prog					
					Ejec					
Pavimento Rígido	m	2300			Prog					
					Ejec					
Alcantarillas 36"	Und	14			Prog					
Ponton	Und	1			Ejec					
Señalización Vertical	Und	28			Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	2300			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Loma Grande, Corregimiento del Municipio de Montería	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Aguas Vivas, Vereda del Municipio del Montería	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado - En revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El contratista entregó el documento PAGA y está en revisión por parte de la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El contratista manifestó que el punto de atención al usuario se ubicará en la vereda de Corea, en vivienda del señor Robert Dimas, al igual que el campamento de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. El documento PAGA se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 11 del 28/10/2022 al 3/11/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 2300 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros, la construcción catorce (14) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de longitud 5 metros y diámetro de 36", la construcción un (1) pontón en concreto reforzado y de la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de 2300 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de catorce (14) obras de drenaje tipo alcantarilla, un (1) ponto de concreto reforzado de longitud 9 metros, y demarcación horizontal y vertical de los tramos discontinuos en la vía alterna que comunica a los corregimientos de CANDELARIA, COREA, EL BRILLANTE y EL RODEO, en la zona rural del municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484

MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484, Participación: 100%

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 225 de 2022 — VALOR INICIAL: $ 5.399.871.682,00

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 23/02/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 5.399.871.682,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/02/2023 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 971 de 2022 — **VALOR INICIAL:** $ 4.564.284.660,00

FECHA DE INICIO: 22/08/2022 — **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — **VALOR ACUMULADO:** $ 4.564.284.660,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — **VALOR ANTICIPO:** $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 5.399.871.682		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.285.828.462,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 490.538.755,00	9,28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (490.538.755,00)	-9,28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 490.538.755,00	9,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (490.538.755,00)	-9,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 128.822.045,00	2,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 9,28% — Avance o Atraso Físico %: -9,28%

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	2300			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	2300			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	2300			Prog					
					Ejec					
Pavimento Rígido	m	2300			Prog					
					Ejec					
Alcantarillas 36"	Und	14			Prog					
Pontón	Und	1			Ejec					
Señalización Vertical	Und	28			Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	2300			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Loma Grande, Corregimiento del Municipio de Montería	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Aguas Vivas, Vereda del Municipio del Montería	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado - En revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El contratista entregó el documento PAGA y está en revisión por parte de la interventoría

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: El contratista manifestó que el punto de atención al usuario se ubicará en la vereda de Corea, en vivienda del señor Robert Dimas, al igual que el campamento de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. El documento PAGA se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra física

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Hacer seguimiento a los compromisos. 2. Revisar información entregada por el contratista 3. Gestionar la bitácora de obra	FIRMA NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-22 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO No. 225 de 2022 **CONTRATISTA:** MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													
			TOTAL ACTIVO																													
			TOTAL EN REPARACIÓN																													
			TOTAL INACTIVO																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El formato no se encuentra diligenciado dado que el contrato se encuentra en la etapa de estudios y diseños y por tanto la maquinaria no ha sido trasladada a campo.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: MARIO SINISTERRA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202091747 COR

Firma
Nombre: ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/11/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 225 de 2022

CONTRATISTA: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
El formato no se encuentra diligenciado, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista no ha presentado la información requerida.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (1) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MIGUEL FERNANDO ACOSTA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ CORALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 225 de 2022 **CONTRATISTA:** MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

MES INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	498	Via Rural Mejorada	2022234170067	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	225 de 2022	$ 5.399.871.682,00	
TOTAL						$ 5.399.871.682,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 5.399.871.682,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/11/2022
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES			
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MIGUEL FERNANDO ACOSTA MERCADO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202091747 COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE LORICA
Nit: 800.096.758

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 0000000498

Fecha de Expedición: 28/06/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00378	19/04/2022

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2022, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	1.067.287.484
Beneficiario:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

9E5F758136D04B73438D067776E9328A

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**5.399.871.682,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	5.399.871.682,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.399.871.682,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	68.0	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	5.399.871.682,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402114	Vía urbana mejorada	5.399.871.682,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	5.399.871.682,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	5.399.871.682,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022234170067	Via Rural Mejorada.	5.399.871.682,00

Valor en Letras:

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VIA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL DEL MUNCIIPIO DE SANTA CRUZ DE LORIOCA, CORDOBA

Alfa Feris Gonzalez
P.U Area Presupuesto y Contabilidad

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_crp_lorica_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: ALFA DEL CARMEN FERIS GONZALEZ, el día: jueves, 30 de junio de 2022 siendo las: 12:01:21

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 225 de 2022 **CONTRATISTA:** MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	21	20	20	20	24	24	18	24	22	24	24	24	24	24	24	24	22	24	20	24	24	24	20	20	24	24	24	24	707
Lluvias moderadas				3	4							2								2												11
Lluvias intensas						4	4			6			0		0							4	0			4	4					26
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202300149 COR

Firma
Nombre: ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI

AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION

Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/10/2022 0:00	2.2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/10/2022 0:00	1.4	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/10/2022 0:00	2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/10/2022 0:00	1	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/10/2022 0:00	15.6	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/10/2022 0:00	51	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/10/2022 0:00	12.5	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/10/2022 0:00	1.2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/10/2022 0:00	8.4	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/10/2022 0:00	16.5	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/10/2022 0:00	40	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/10/2022 0:00	5.2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/10/2022 0:00	55	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/10/2022 0:00	3.4	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/10/2022 0:00	0	50		900

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 225 de 2022 **CONTRATISTA:** MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre - 2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES

A la fecha el contratista no realiza entrega de resultados de ensayos de laboratorio

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: MIGUEL FERNANDO ACOSTA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202091747 COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 225 de 2022 **CONTRATISTA:** MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

FECHA DE INICIO: 23/08/2022

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/02/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.399.871.682,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.399.871.682,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 57.331.820,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 57.331.820,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 539.987.168,20	23	8	2022	23	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 2.159.948.673,00	23	8	2022	23	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1.079.974.336,40	23	8	2022	22	2	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 1.619.961.504,60	**5 años 0 meses y 1 día**					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101386652

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5	$ 300.000.000,00	23	8	2022	22	2	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101190832 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101190832	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	23	08	2022	00:00	22	02	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SINISTERRA JALLER, MARIO POMPILIO	CC: 1067.287.484

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 14 C 44 69 BRR MONTE VERDE	MONTERIA, CORDOBA	3217752430

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.096.758-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 NRO. 18 - 07	LORICA, CORDOBA	7735092

BENEFICIARIO: 800096758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.225 - 2022
MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VIA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA

BENEFICIAARIO: TERCEROS AFECTADOS / MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA IDENTIFICADO CON NIT 800.096.758-8 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS CON NIT. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	22/02/2023	$300,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	22/02/2023	$300,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	22/02/2023	$300,000,000.00	

ACLARACIONES

CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE CONTRATO, SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS INICIO EL 22/08/2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****300,821.00	$ *******3,000.00	$ ******57,726.00	$ **********361,548.00	$ ******300,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101190832
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101190832	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	23	08	2022	00:00	22	02	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SINISTERRA JALLER, MARIO POMPILIO		CC: 1067.287.484
DIRECCIÓN: CR 14 C 44 69 BRR MONTE VERDE	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:**	3217752430

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.096.758-8
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 18 - 07	**CIUDAD:** LORICA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7735092

BENEFICIARIO: 800096758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	22/02/2023	$300,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	22/02/2023	$300,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	22/02/2023	$300,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101190832

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NYDIALADINO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101190832	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	23	08	2022	00:00	22	02	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SINISTERRA JALLER, MARIO POMPILIO		CC: 1067.287.484	
DIRECCIÓN: CR 14 C 44 69 BRR MONTE VERDE	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:** 3217752430	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.096.758-8	
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 18 - 07	**CIUDAD:** LORICA, CORDOBA	**TELEFONO:** 7735092	
BENEFICIARIO: 800096758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101190832

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NYDIALADINO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101386652	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	23	08	2022	00:00	22	02	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SINISTERRA JALLER, MARIO POMPILIO	CC: 1067.287.484

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 14 C 44 69 BRR MONTE VERDE	MONTERIA, CORDOBA	3217752430

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.096.758-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 NRO. 18 - 07	LORICA, CORDOBA	7735092

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.225 - 2022 CUYO OBJETO ES:
MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VIA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/08/2022	23/08/2023	$539,987,168.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	23/08/2022	23/08/2023	$2,159,948,673.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DÍAS *		$1,619,961,504.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/08/2022	22/02/2026	$1,079,974,336.40	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO SE ACLARA LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA TAL COMO SE MUESTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **29,177,060.00	$ ******25,000.00	$ ***5,548,391.00	$ ********34,750,451.00	$ ****5,399,871,682.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ ZAPATA	220424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101386652

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101386652	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	23	08	2022	00:00	22	02	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SINISTERRA JALLER, MARIO POMPILIO		CC: 1067.287.484
DIRECCIÓN: CR 14 C 44 69 BRR MONTE VERDE	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:**	3217752430

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.096.758-8
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 18 - 07	**CIUDAD:** LORICA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7735092

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101386652

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101386652, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 08 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

21-44-101386652

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/11/2022
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 225 de 2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATISTA: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 23/02/2023
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MIGUEL FERNANDO ACOSTA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 22202091747 COR

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND


Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

• Seguimiento Programa de Obra

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		INICIO	0 días	vie 23/09/22	vie 23/09/22
2		**I. EXPLANACIONES**	**75,75 días**	**vie 23/09/22**	**sáb 24/12/22**
3		Excavación en material común de la explanación y canales	74,75 días	vie 23/09/22	vie 23/12/22
4		Terraplenes (Material de corona para mejoramiento)	75,75 días	vie 23/09/22	sáb 24/12/22
5		**II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=7m**	**38,75 días**	**mié 16/11/22**	**sáb 31/12/22**
6		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	21,75 días	mié 16/11/22	lun 12/12/22
7		Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	30,75 días	mar 22/11/22	mié 28/12/22
8		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	27,75 días	vie 18/11/22	mié 21/12/22
9		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	31,75 días	jue 24/11/22	sáb 31/12/22
10		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	30,75 días	mié 23/11/22	jue 29/12/22
11		Relleno para Estructuras con recebo	20,75 días	vie 18/11/22	mar 13/12/22
12		**III. PONTON EN COCRETO REFORZADO L=9 M**	**43,75 días**	**mié 28/12/22**	**vie 17/02/23**
13		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	28 días	mié 28/12/22	mar 31/01/23
14		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	1 día	jue 12/01/23	jue 12/01/23
15		Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI)- TABLERO,ESTRIBOS, BASE Y ALETAS	19 días	mar 17/01/23	mar 7/02/23
16		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	16 días	sáb 14/01/23	mié 1/02/23
17		Relleno para Estructuras con recebo	10,75 días	jue 29/12/22	mié 11/01/23

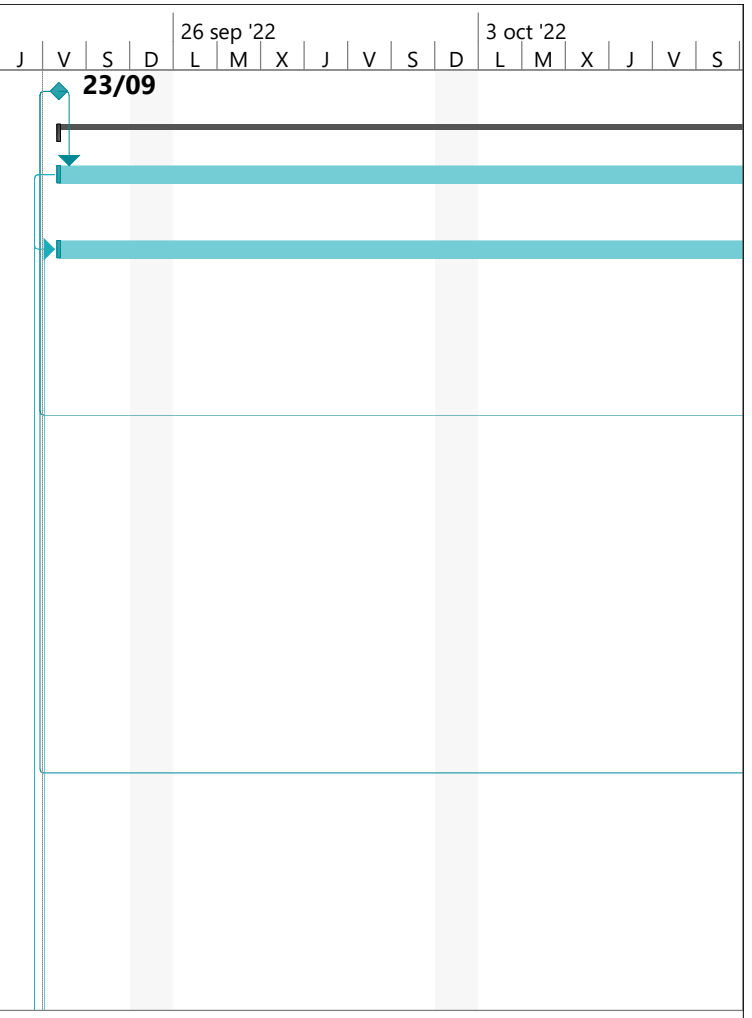


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22




Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
18		Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	6 días	mié 8/02/23	mar 14/02/23
19		Baranda metalica para trafico vehicular	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23
20		**IV. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO PLACAS 2,5x3**	**115,75 días**	**mié 5/10/22**	**mié 22/02/23**
21		Subbase Granular Clase C.	109,75 días	mié 5/10/22	mié 15/02/23
22		Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 40 MPa	100,75 días	mié 19/10/22	vie 17/02/23
23		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	100,75 días	mié 19/10/22	vie 17/02/23
24		Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI), CUNETAS	70,75 días	mié 30/11/22	mié 22/02/23
25		Afirmado 10cm (Material para Mejoramiento, utilizar CBR de acuerdo a la	109,75 días	mié 5/10/22	mié 15/02/23
26		**V. TRANSPORTE**	**87,75 días**	**vie 23/09/22**	**sáb 7/01/23**
27		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	87,75 días	vie 23/09/22	sáb 7/01/23
28		**VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**8 días**	**mié 15/02/23**	**jue 23/02/23**
29		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75)	5 días	sáb 18/02/23	jue 23/02/23
30		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	8 días	mié 15/02/23	jue 23/02/23

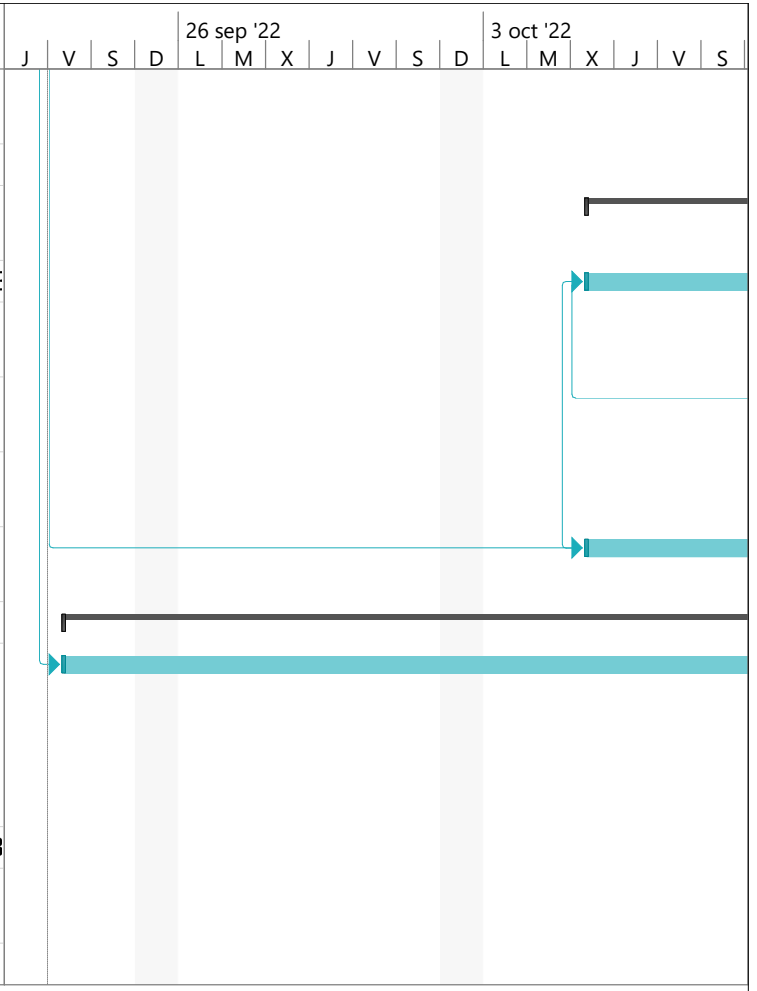

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22




Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
31		**VII. CARACTERIZACIÓN VIAL**	**8 días**	**mié 15/02/2**	**jue 23/02/23**
32		Caracaterización del corredor	8 días	mié 15/02/23	jue 23/02/23
33		FIN	0 días	jue 23/02/23	jue 23/02/23
34					
35					



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22




Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

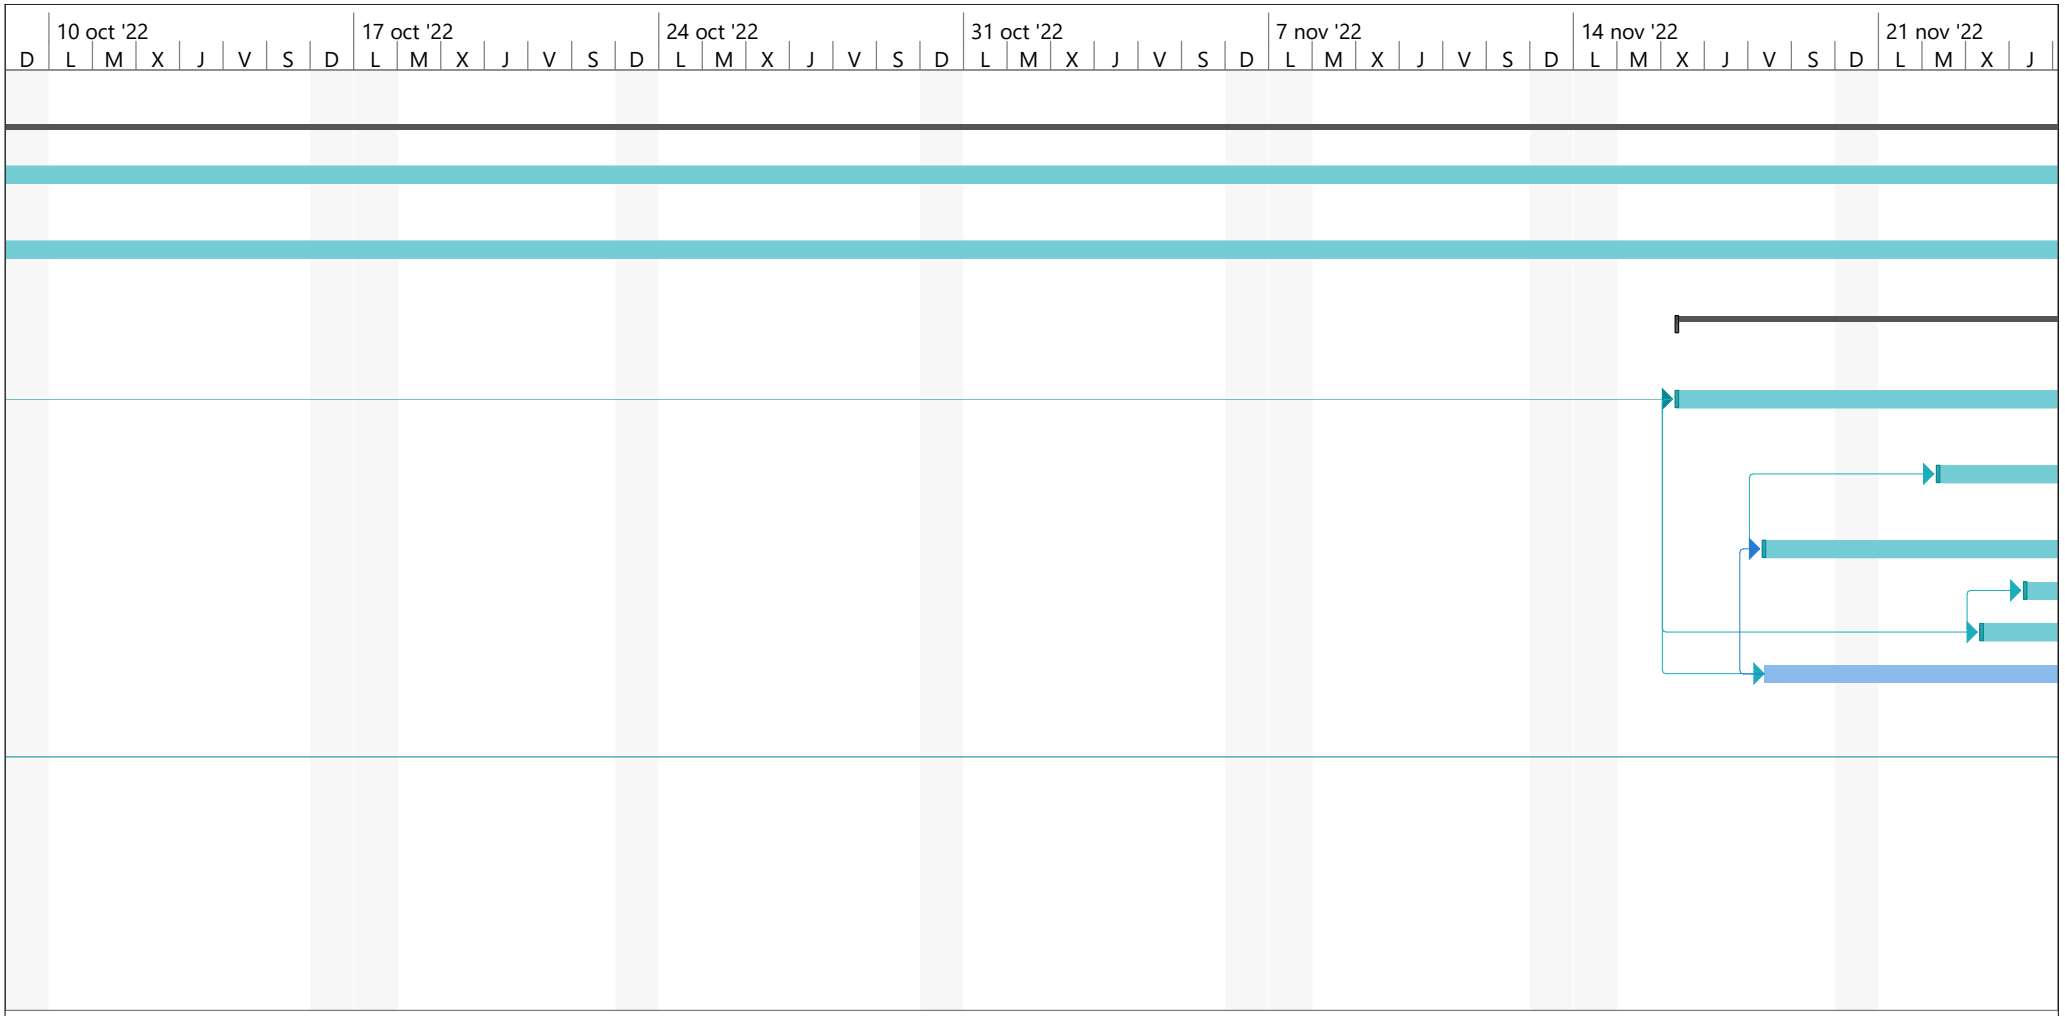


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22




Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

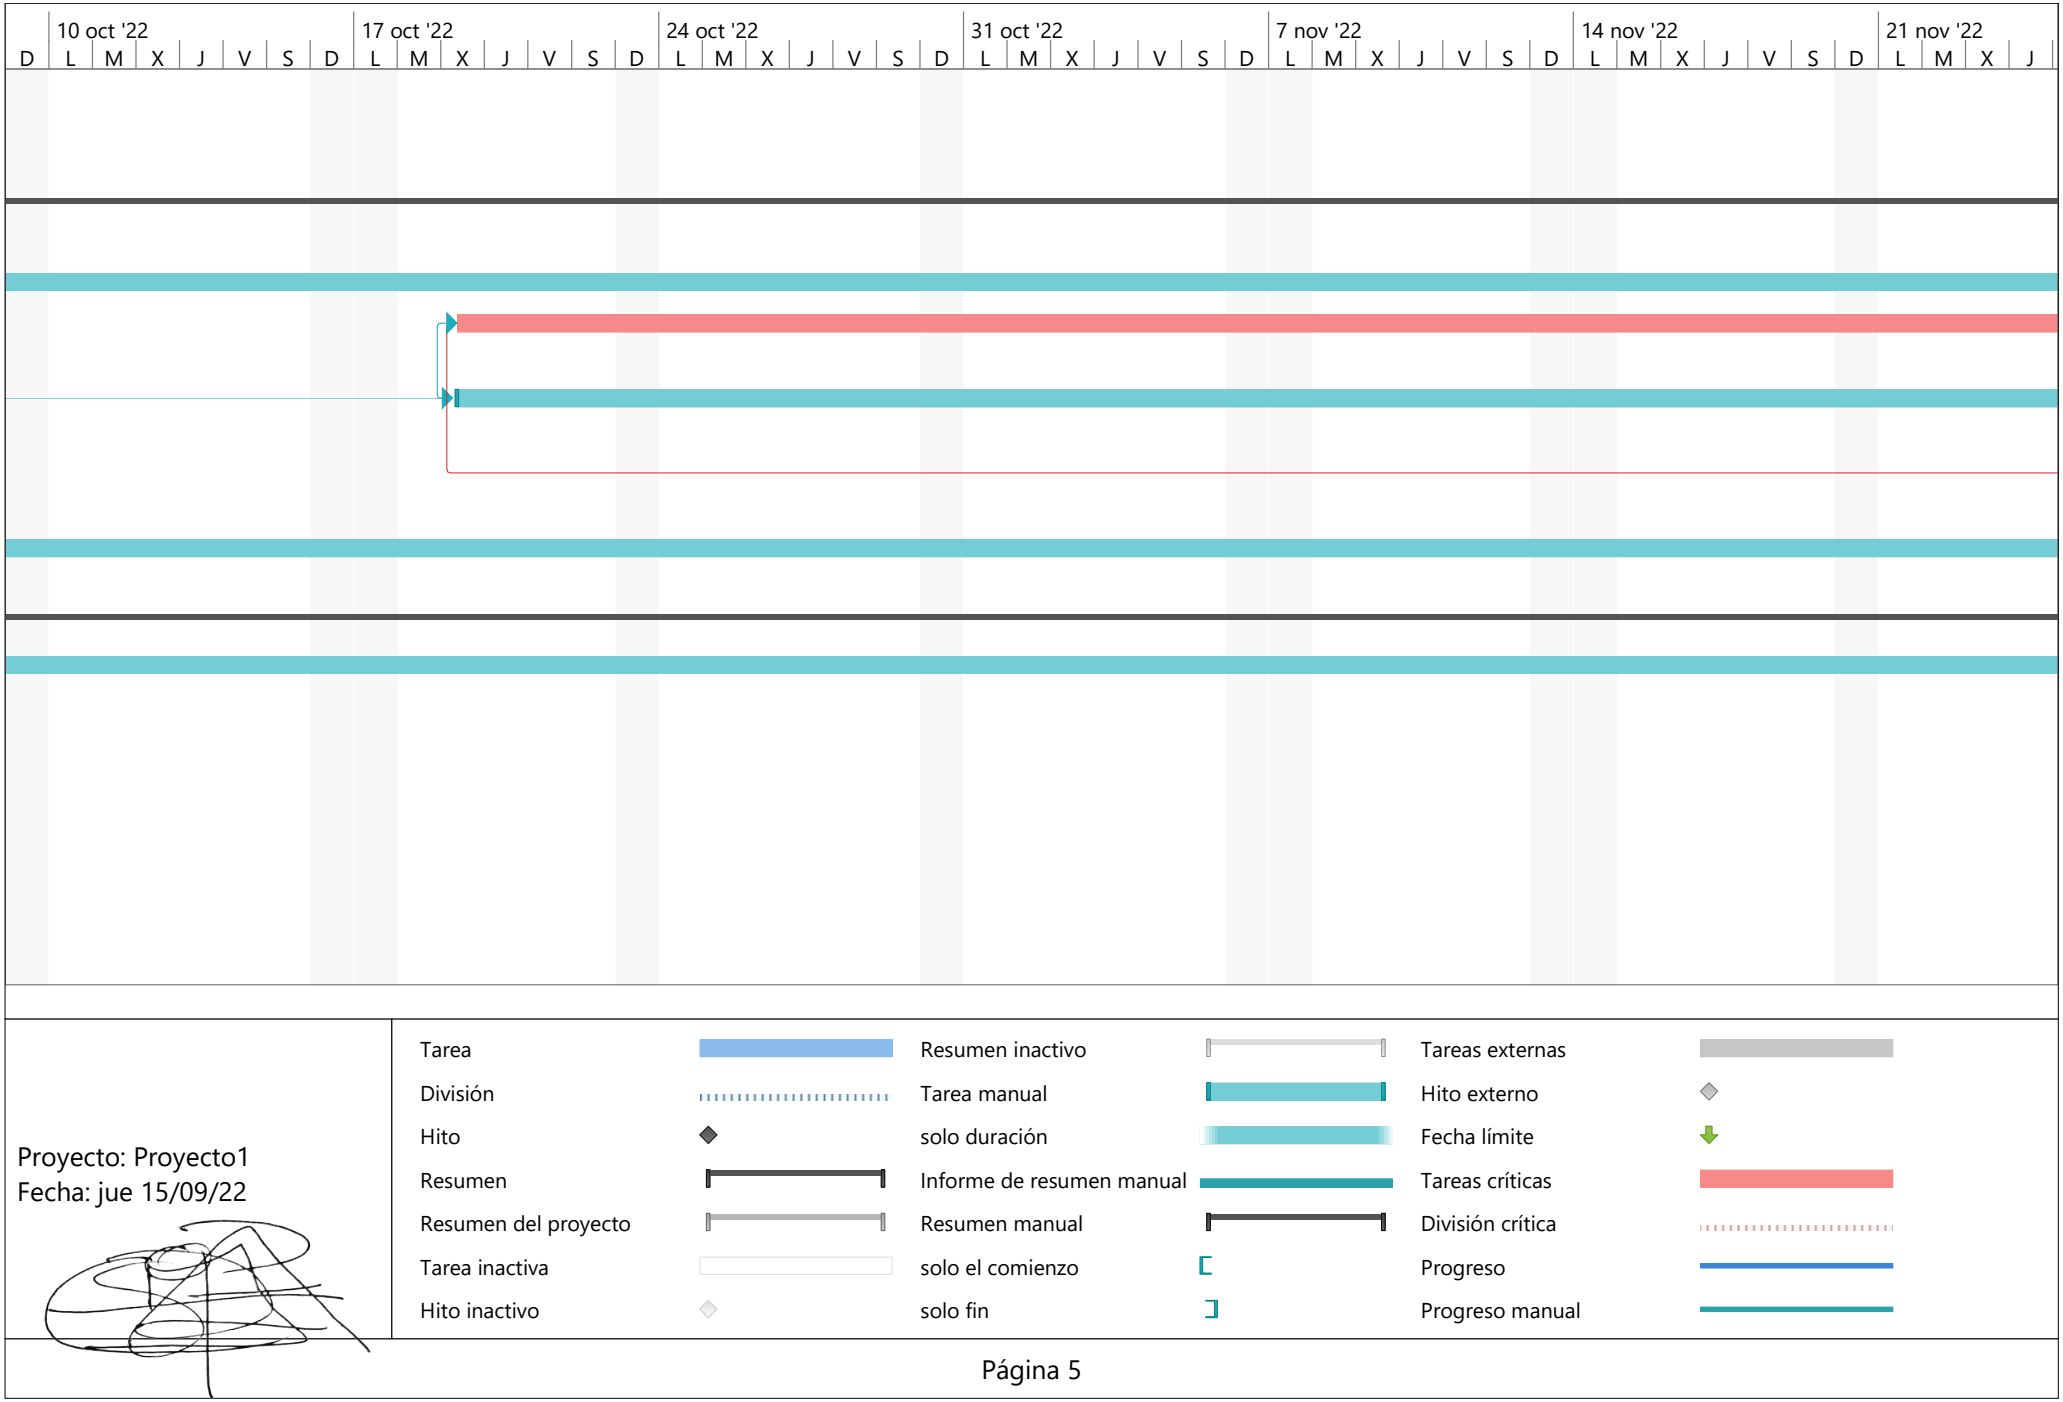

10 oct '22
17 oct '22
24 oct '22
31 oct '22
7 nov '22
14 nov '22
21 nov '22
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual




Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22




Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

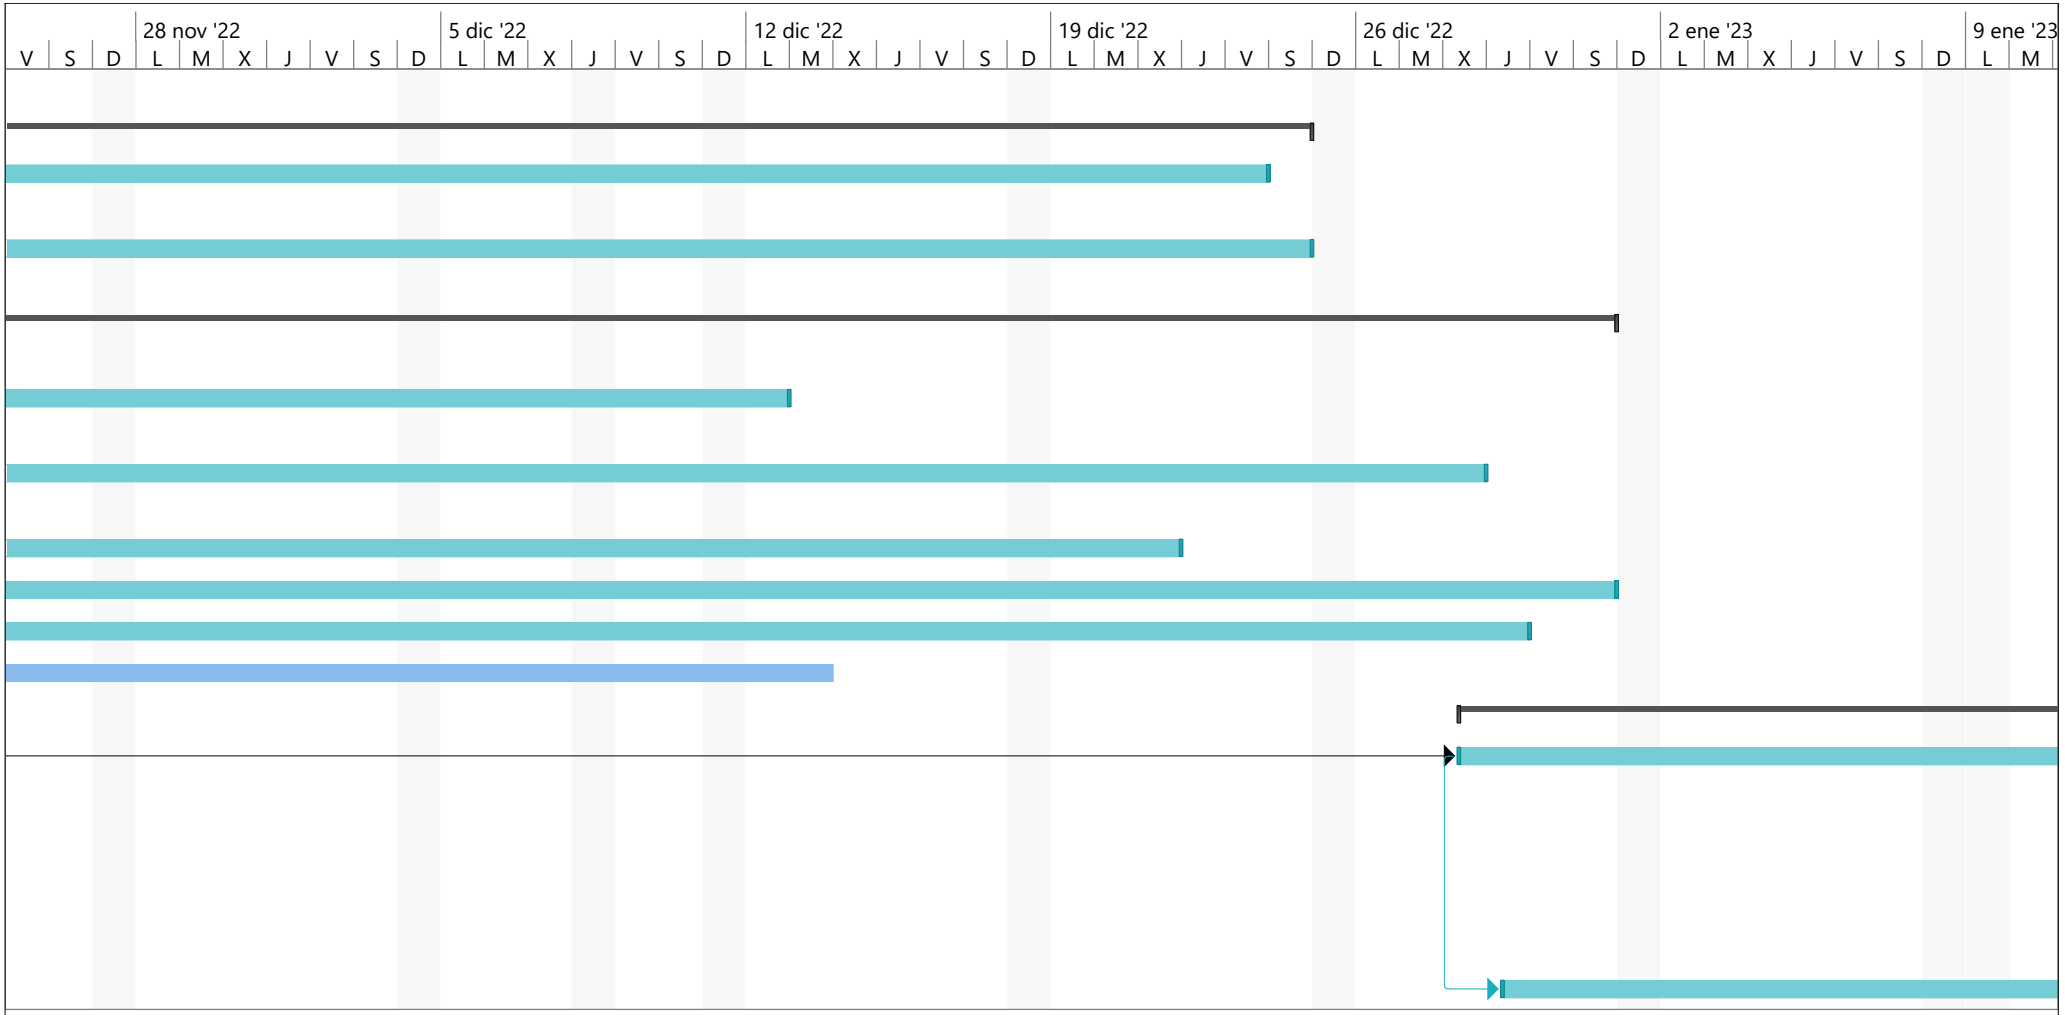


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22




Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

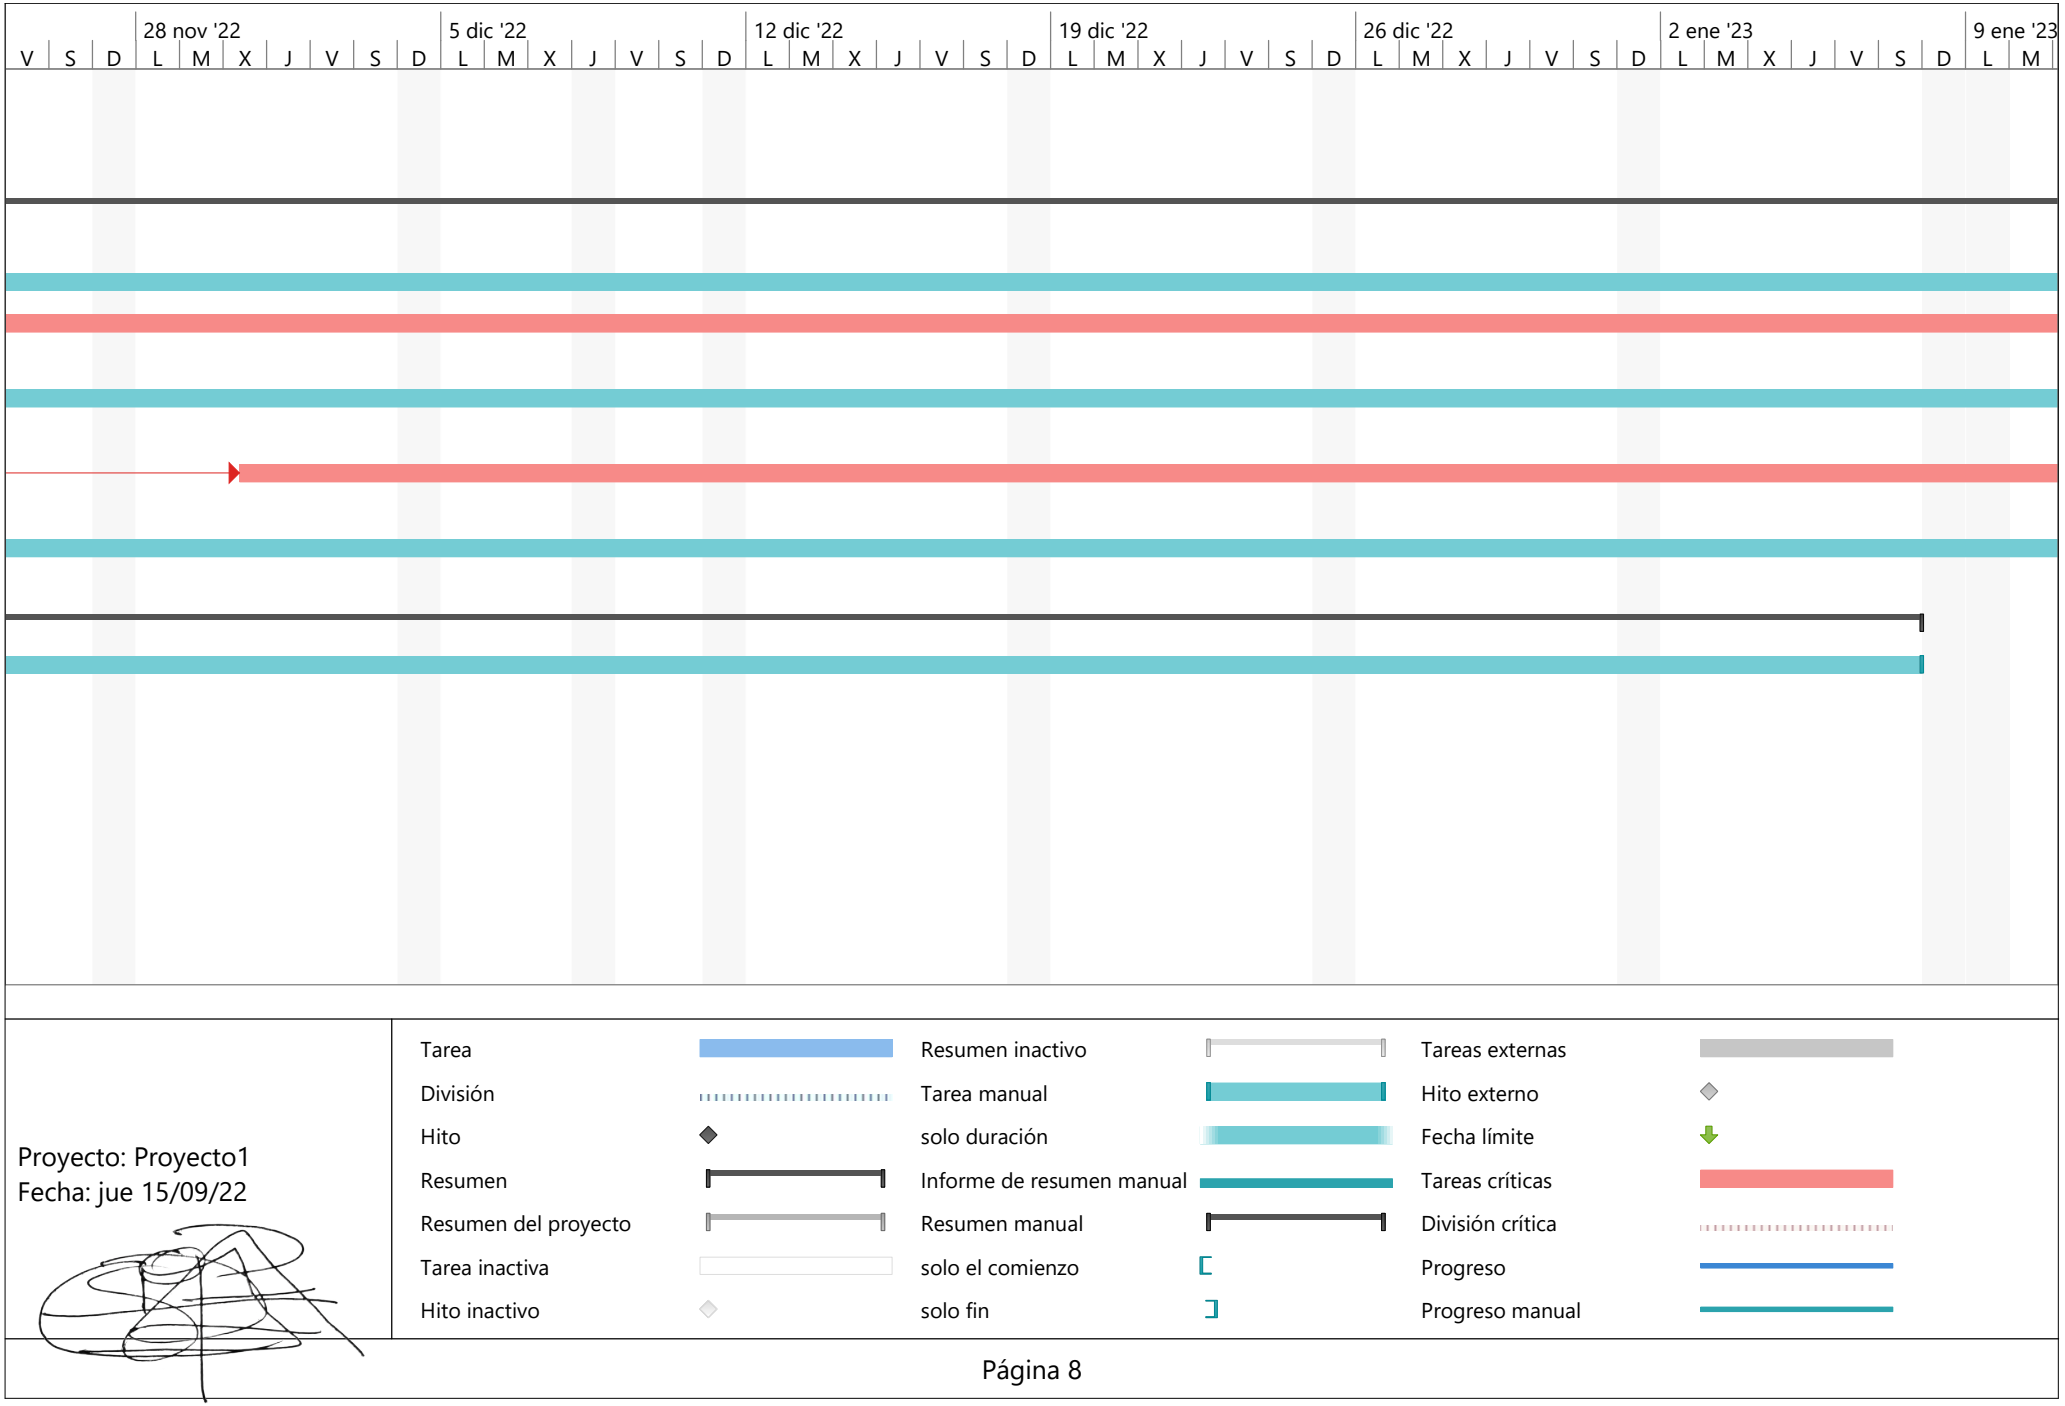


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22





Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

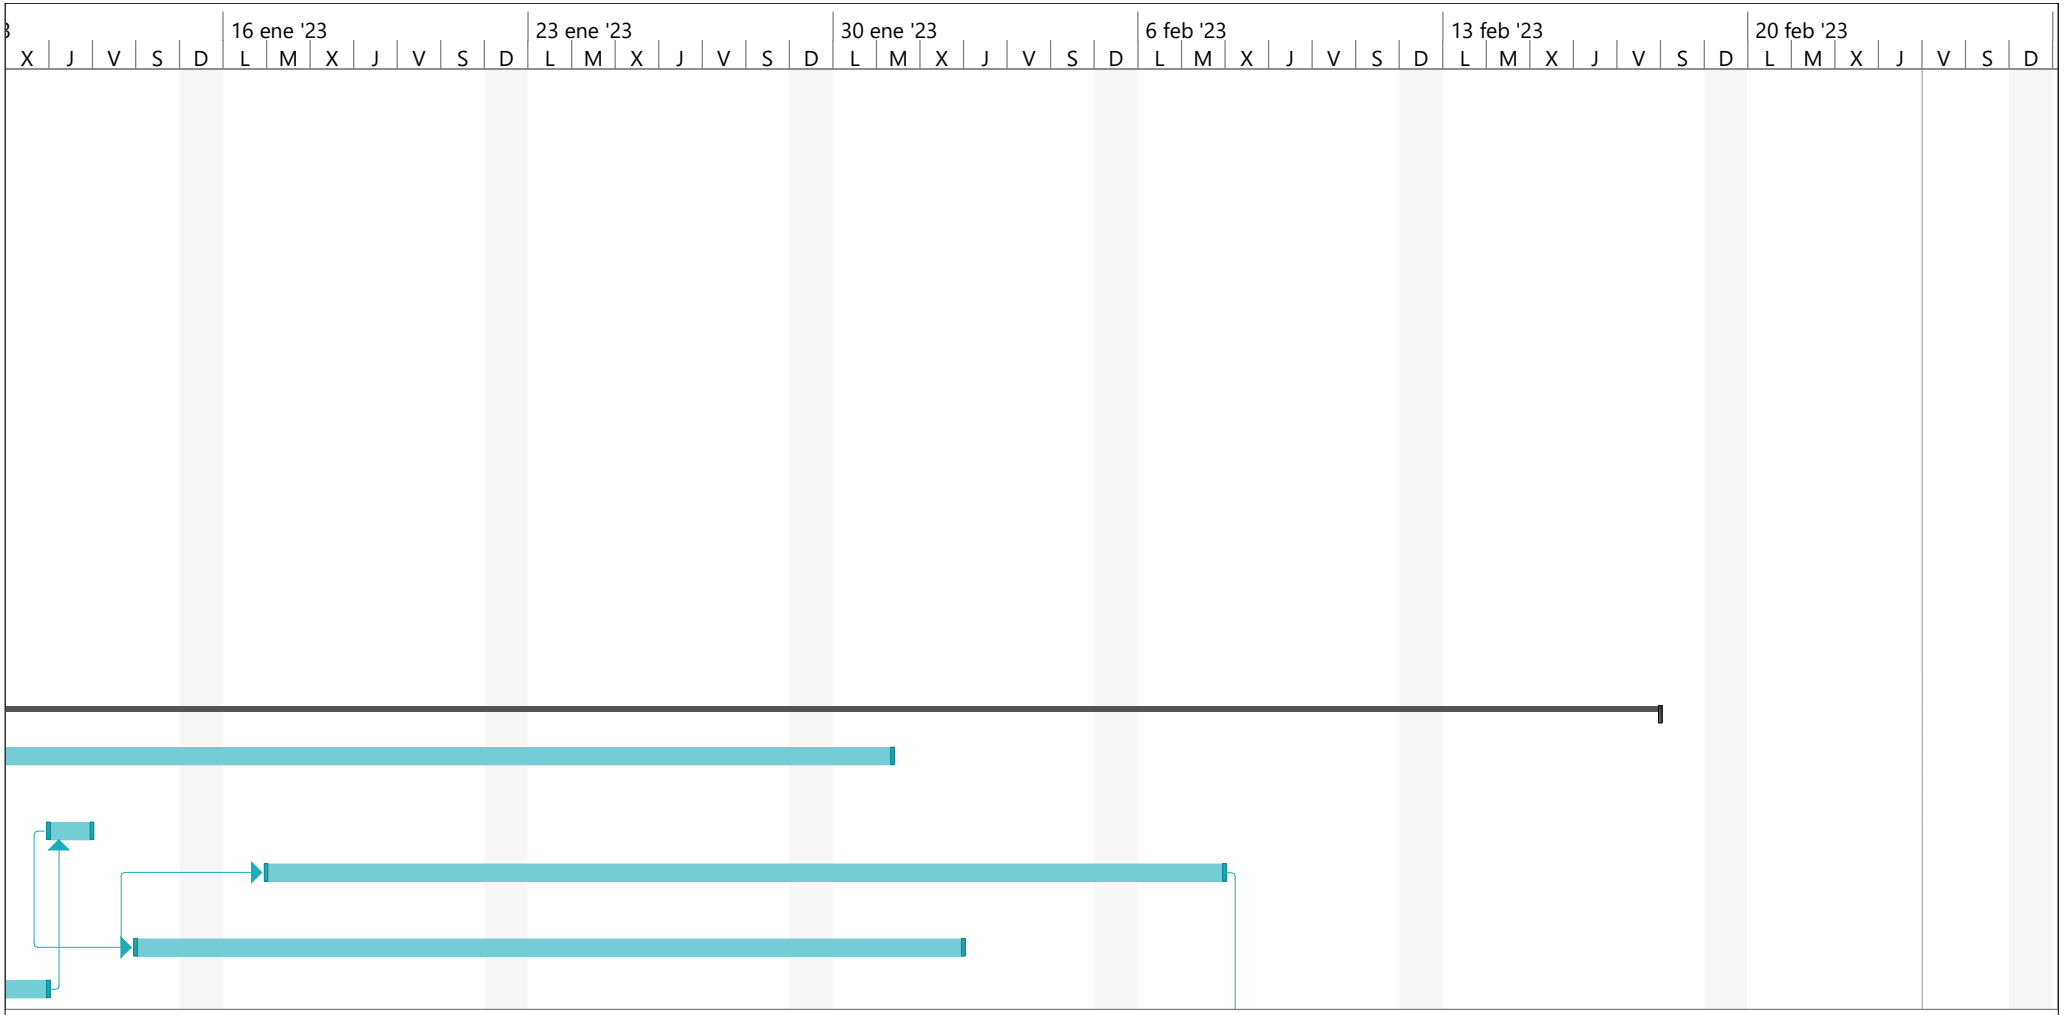


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

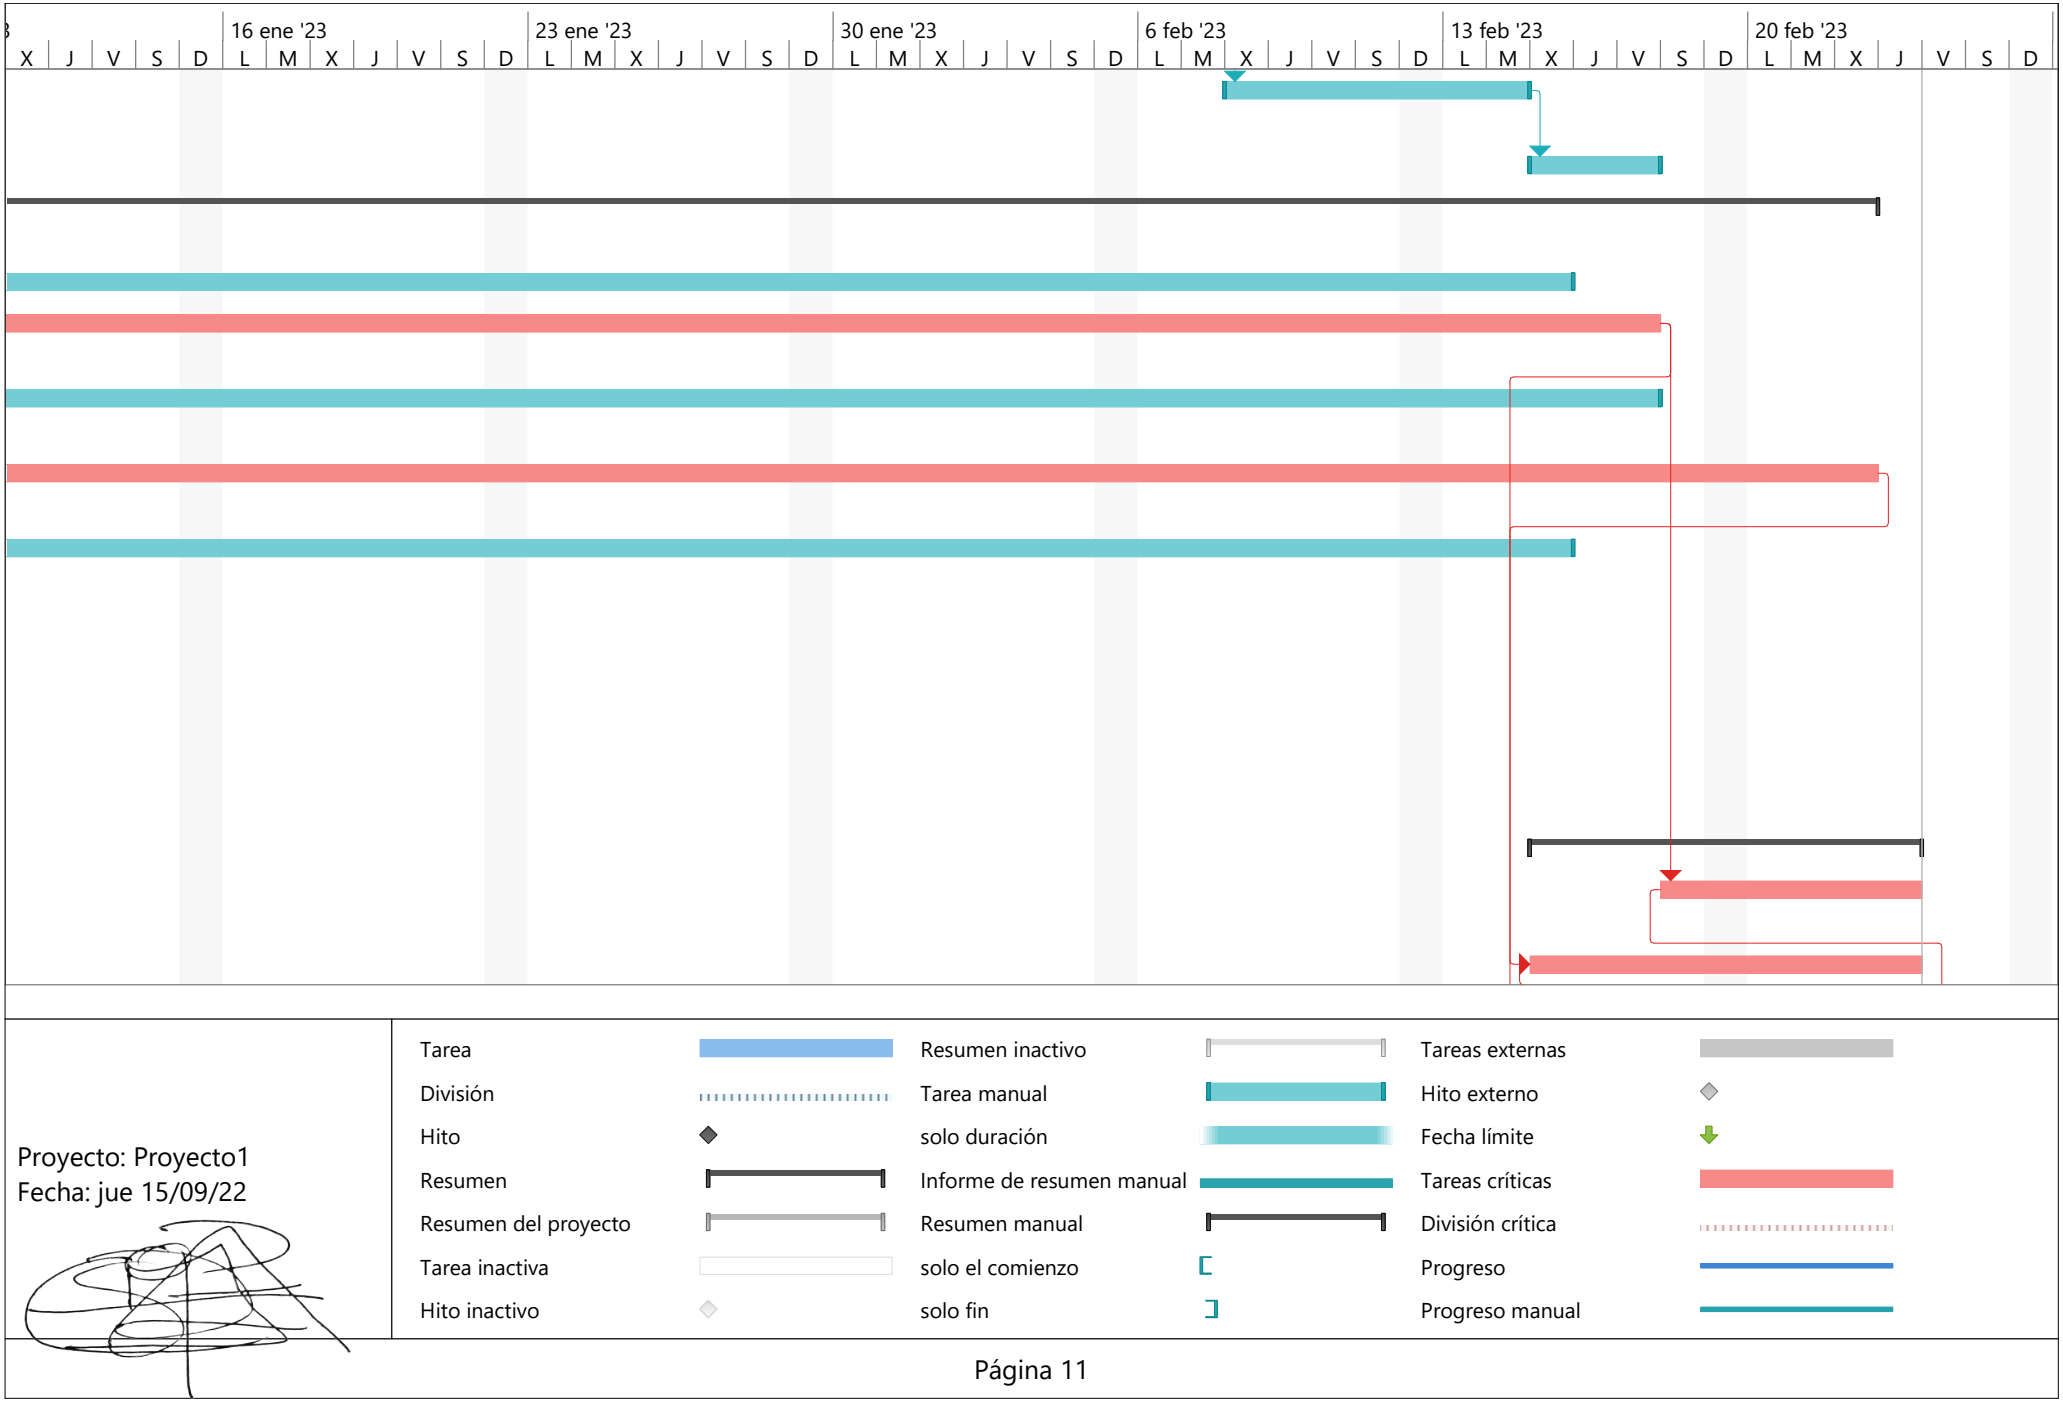
16 ene '23
23 ene '23
30 ene '23
6 feb '23
13 feb '23
20 feb '23
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

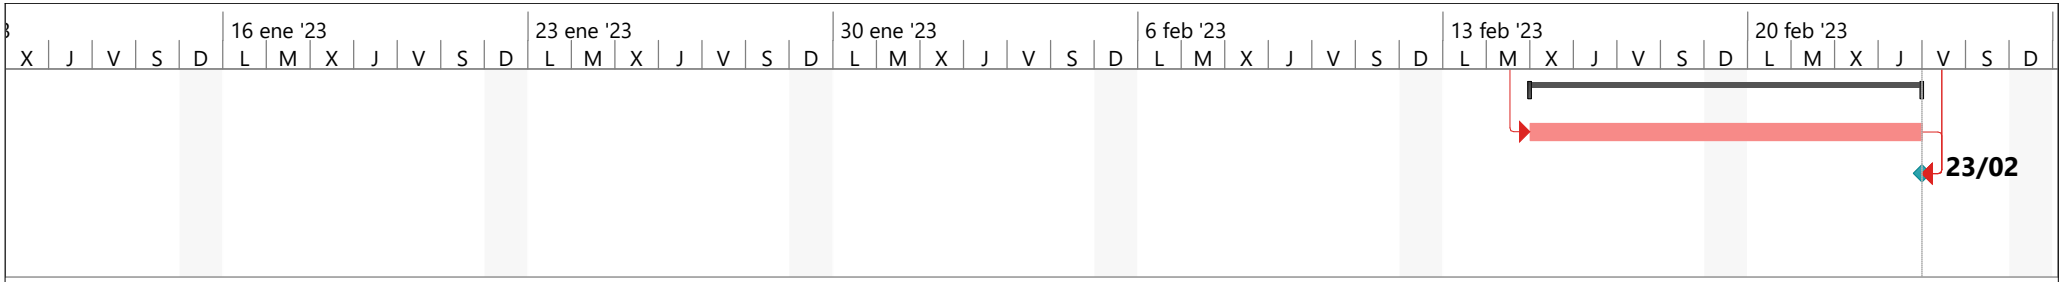

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 15/09/22



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES,

MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES** -I

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 225 de 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATISTA: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/02/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: $ 5.399.871.682,00 (Segun contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.399.871.682,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 agosto/2022	2 septiembre/2022	3 octubre/2022	4 noviembre/2022	5 diciembre/2022	6 enero/2023	7 febrero/2023			
GPP1 - EXPLANACIONES	$ 129.381,21	2,45%		% P	0,00%	0,13%	0,43%	0,67%	1,22%	0,00%	0,00%			
				$ P	$ 0,00	$ 6.842,30	$ 22.482,75	$ 35.547,23	$ 64.508,94	$ 0,00	$ 0,00			
				$ E										
				% E										
GPP2 - EXTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L =7 m	$ 264.097,03	5,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	3,39%	0,51%	0,00%			
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.977,73	$ 179.237,63	$ 26.881,68	$ 0,00			
				$ E										
				% E										
GPP3 - PONTON EN CONCRETO REFORZADO L=9MT	$ 329.574,33	6,24%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,96%	1,28%			
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262.114,20	$ 67.460,13			
				$ E										
				% E										
GPP3 - PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PLACAS 2,5X3	$ 4.133.062,60	78,19%		% P	0,00%	0,00%	4,90%	15,75%	22,84%	27,14%	7,56%			
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.259,26	$ 832.412,19	$ 1.207.029,15	$ 1.434.817,61	$ 399.547,38			
				$ E										
				% E										
GPP4 - TRANSPORTE	$ 394.838,42	7,47%		% P	0,00%	0,35%	1,03%	2,66%	2,33%	1,10%	0,00%			
				$ P	$ 0,00	$ 18.429,20	$ 54.703,20	$ 140.366,36	$ 123.339,96	$ 57.995,71	$ 0,00			
				$ E										
				% E										
GPP5 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 30.191,86	0,57%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%			
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.191,86			
				$ E										
				% E										
GPP6 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 4.683,00	0,09%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%			
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.683,00			
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS	$ -			% P				-						
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 5.285.828,46**	**100,00%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,000%**	**0,478%**	**6,365%**	**20,173%**	**29,780%**	**33,709%**	**9,495%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,00**	**$ 25.271,50**	**$ 336.445,22**	**$ 1.066.303,51**	**$ 1.574.112,67**	**$ 1.781.813,20**	**$ 501.882,37**		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,000%**	**0,478%**	**6,843%**	**27,016%**	**56,796%**	**90,505%**	**100,000%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 0,00**	**$ 25.271,50**	**$ 361.716,71**	**$ 1.428.020,22**	**$ 3.002.132,89**	**$ 4.783.946,09**	**$ 5.285.828,46**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,000%**	**0,000%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,000%**	**0,000%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 56.711.400,00	$ -	%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.178.000,00 / $ -	$ -	%
* IVA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.153.820,00 / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 114.043.220,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5.399.871.682,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202091747

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ [illegible]
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 2520215472 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** ____

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 225 de 2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VIA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATISTA: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato orincipal)
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las orórroqas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/02/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 5.399.871.682,00 (Según contrato orincipal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.399.871.682,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 ago-22	2 sep-22	3 oct-22	4 nov-22	5 dic-22	6 ene-23	7 feb-23			
GPP1 - EXPLANACIONES	$129.381	2,45%		% P	0,00%	0,13%	0,43%	0,67%	1,22%	0,00%	0,00%			
				$ P	$ 0,00	$ 6.842,30	$ 22.482,75	$ 35.547,23	$ 64.508,94	$ 0,00	$ 0,00			
				$ E										
				% E										
EXTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA	$264.097	5,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	3,39%	0,51%	0,00%			
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.977,73	$ 179.237,63	$ 26.981,68	$ 0,00			
				$ E										
				% E										
P3 - PONTON EN CONCRETO REFORZADO L=5	$329.574	6,24%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,96%	1,28%			
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262.114,20	$ 67.460,13			
				$ E										
				% E										
- PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PLACAS	$4.133.063	78,19%		% P	0,00%	0,00%	4,90%	15,75%	22,84%	27,14%	7,56%			
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.259,26	$ 832.412,19	$ 1.207.026,15	$ 1.434.817,61	$ 399.547,38			
				$ E										
				% E										
GPP4 - TRANSPORTE	$394.838	7,47%		% P	0,00%	0,35%	1,03%	2,66%	2,33%	1,10%	0,00%			
				$ P	$ 0,00	$ 18.429,20	$ 54.703,20	$ 140.366,36	$ 123.339,98	$ 57.999,71	$ 0,00			
				$ E										
				% E										
GPP5 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$30.192	0,57%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%			
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.191,86			
				$ E										
				% E										
GPP6 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$4.683	0,09%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%			
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.683,00			
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 5.285.828,46	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,48%	6,37%	20,17%	29,78%	33,71%	9,49%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$25.271	$336.445	$1.066.304	$1.574.113	$1.781.813	$501.882	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,48%	6,84%	27,02%	56,80%	90,51%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$25.271	$361.717	$1.428.020	$3.002.133	$4.783.946	$5.285.828	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,000%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,000%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 56.711.400,00 / $ -	$ -	%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.178.000,00	$ -	%
* IVA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.153.820,00	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 114.043.220,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5.399.871.682,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202091747

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **ACTAS DE COMITÉ**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 21/10/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 225-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, C.C. 1.067.287.484

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VÍA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Presentar la documentación inicial: cumplió
Presentar avance parcial de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños: cumplió

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Actualización de pólizas.
3. Seguridad social del personal vinculado al proyecto
4. Fuentes de materiales
5. Sitio de disposición de materiales proveniente de las excavaciones y demoliciones
6. Actas de vecindad.
7. Socialización
8. Valla informativa
9. Plan de inversión del anticipo

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños: se indica que este contrato tiene un plazo de un (1) mes para la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños y se está ya próximo a completar los dos (2) y a la fecha nos se han definido la totalidad de los tomos. El contratista ha presentado la mayoría de los tomos entregables producto de la etapa de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, tales como el estudio geotecnico,el estudio de suelos, el PAGA, la topografía y el estudio hidrológico remiten el mismo de la alcaldía, quedando por presentar el diseño geométrico para obtener la totalidad de los estudios. Referente a los estudios de geotecnia y pavimento, que son los pilares para dar inicio a las obras y que definen el tipo de estructura y mejoramiento de la vía, el contratista ya los presentó a los cuales la interventoría le remitió dos (2) observaciones al componente geotécnico y una (1) al componente de pavimentos y se está pendiente la respuesta por parte del contratista. En aras de darle celeridad a la revisión y probación de los dos componentes antes mencionados, se realizó una mesa de trabajo conjunta entre los paraes de especialistas por parte de interventoría y contratista, en donde el contratista punto a punto expuso las respuestas que van a presentar referente al componente de geotecnia y pavimentos; además, no se pudo definir una estructura que sea de beneficio para el proyecto, teniendo en cuenta que se está proponiendo una estructura de mejoramiento de 50 centímetros de espeso y un pavimento de 42 centímetros de espesor, para un total de 92 centímetros, que para los especialistas de la interventoría es una estructura sobre diseñada.

Por su parte el contratista manifiesta que a la fecha además ha presentado el diseño estructural del puente y se compromete a realizar y presentar un balance preliminar de obra para determinar la meta física con la alternativa que está presentando actualmente. El contratista indica que se encuentra haciendo una revisión de las estructura hidráulicas existentes y de los sitios donde están contempladas la construcción de las mismas.

2. Actualización de pólizas: la interventoría le manifiesta al contratista que a la fecha no le ha presentado las pólizas actualizadas según acta de inicio, a lo que responde que las remitirá de forma inmediata y por parte del municipio se acuerda entregar el día martes 25 de octubre de 2022, la aprobación de las mismas.

3. Seguridad socia del personal vinculado al proyecto: la interventoría le recuerda al contratista que a la fecha no ha presentado los soportes de afiliación y pagos al sistema de seguridad social del personal vinculado al proyecto.

Se toca el tema el tema de los profesionales por aprobar, a falta de aclaración de los requisitos mínimos exigidos, a lo que el municipio responde que para la próxima semana estaría emitiendo respuesta al respecto.

4. Fuentes de materiales: la interventoría pregunta al contratista que si tiene definido el tema de las canteras para el suministro de materiales granulares, a lo que indica que si y que ya ha presentado documentación al respecto y se encuentra pendiente de completarla de acuerdo a las solicitudes realizadas por el ingeniero residente de interventoría.

5. Sitio de disposición de materiales proveniente de las excavaciones y demoliciones: la interventoría indica que el contratista deberá radicar ante el Municipio, una solicitud de que si el Municipio cuenta con un sitio autorizado para la disposición de material de excavación y demolición. Por parte de los representantes del Municipio, se informa que si se cuenta con un sitio para tal fin.

6. Actas de vecindad: la interventoría le solicita al contratista dar inicio a la elaboración de las actas de vecindad, a lo que se compromete iniciarlas el día 24 de octubre de 2022.

7. Socialización: se acuerda que una vez se tenga definido la estapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños y por consiguiente, determinada la meta física del proyecto, se deberá comunicar al Municipio para agendar la socialización ante la comunidad.

8. Valla informativa: se le recuerda al contratista que en el comité anterior se le solicitó adelantar la gestión de la instalación de la estructura de la valla informativa. El contratista manifiesta que la próxima semana procederá a la instalación de la estructura y quedaría a la espera que le definan el arte para terminar con su instalación.

9. Plan de inversión del anticipo: se indica que ya se cuenta con la conformación de la fiducia. El contratista informa que ya remitió a la interventoría, el plan de inversión del anticipo y los subcontratos para su revisión, y se está a la espera de aprobación del plan de inversión del anticipo por parte de la interventoría, con la finalidad de realizar los tramites respectivos ante el Municipio.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentar balance de obra y meta física con el diseño de pavimento actual propuesto	25/10/2022	Contratista
Remitir la aprobación de pólizas según acta de inicio	25/10/2022	Municipio
Presentar los soportes de afiliación y pagos al sistema general de seguridad social del personal vinculado al proyecto	24/10/2022	Contratista
Emitir respuesta sobre requisitos exigidos para el cargo de especialista en pavimentos y profesional SISO	25/10/2022	Municipio
Completar la documentación de las canteras	26/10/2022	Contratista
Solicitar ante el Municipio, el sitio de disposición de materiales provenientes de las excavaciones y demoliciones	24/10/2022	Contratista
Iniciar la elaboración de las actas de vecindad	24/10/2022	Contratista
Seguimiento a rendimientos financieros	25/10/2022	Municipio

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 22/11/2022 (Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	Representante Legal - Residente de obra	CONTRATISTA	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
CARLOS PEINADO CALAO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Secretario de infraestructura municipal - Supervisor del contrato de obra	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA	
ANA MILENA TORDECILLA CORRALES	Apoyo a la secretaria de infraestructura municipal	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA	
JESÚS SALGADO	Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	

- **ACTAS DE REUNIÓN**

No se realizan actas d reunión durante el mes de octubre de 2022

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al corte del presente informe, se tiene una inversión de obra programada del $ 361.716.710,00 correspondiente al 6,84 % y una inversión de obra ejecutada acumulada de $0,00 correspondiente al 0,0%; lo que representa un atraso del 6,84%

Se realizó el comité de obra No. 2, en el cual se le hizo seguimiento a la ejecución del contrato de obra.

Se recomienda atender las observaciones pendientes por subsanar para culminar rápidamente la etapa de revisión y/o ajustes definitivos a los estudios y diseños

Se recomienda iniciar las actividades de construcción y darles celeridad, con la finalidad de mitigar los atrasos presentados con respecto a la programación de obra

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
7/10/2022	LP-004-2022-CON-225 LOR-008	entrega de documentación para el inicio de actividades Para el Contrato de obra No. LP-004-2022-CON-225-LOR, Celebrado entre mi persona y El MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA – CÓRDOBA" CONVENIO No. 1960-2021.	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
25/10/2022	LP-004-2022-CON-225 LOR-002	Presentación De Documentación PREVIA ACTA DE INICIO AL Contrato de obra No. LP-004-2022, Celebrado entre mi persona y El MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA – CÓRDOBA" CONVENIO No. 1960- 2021.	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
25/10/2022	LP-004-2022-CON-225 LOR-010	SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACERCA DE BOTADERO DE ESCOMBROS.	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
25/10/2022	LP-004-2022-CON-225 LOR-011	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA MANEJO DE ANTICIPO.	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

8.1.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
4/10/2022	CVRIMG- 075 -2022	SOLICITUD DE COMPLETAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INICIO DE ACTIVIDADES	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
4/10/2022	CVRIMG- 076 -2022	APROBACIÓN MINUTA FIDUCIA MERCANTIL DAVIVIENDA	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
6/10/2022	CVRIMG- 078 -2022	INFORME REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

7/10/2022	CVRIMG- 085 -2022	Solicitud de soportes de afiliación al SGSS y pagos al día del personal vinculado a la ejecución del proyecto.	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
13/10/2022	CVRIMG- 100 -2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO DE PAVIMENTOS	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
18/10/2022	CVRIMG- 113 -2022	INFORME REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS V2	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
26/10/2022	CVRIMG- 133 -2022	Atraso del contrato de obra.	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
28/10/2022	CVRIMG- 149 -2022	Recomendaciones para el diseño de pavimentos	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER
29/10/2022	CVRIMG- 155 -2022	Seguimiento a compromisos pactados en el comité de obra No. 2 de fecha 21 de	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

No se realizan actividades de obra durante el periodo de septiembre de 2022 debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de estudios y diseños.


8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

No se realizan actividades ambientales, sociales, prediales o de sostenibilidad durante el periodo de septiembre de 2022

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Septiembre 26 de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Ing. Res. Interventoria.

Septiembre 28 de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Ing. Res. Interventoria.

Septiembre 29 de 2022.
Actividades realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Ing. Res. Interventoria.

Septiembre 30 de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Ing. Res. Interventoria.

Octubre 01 de 2022
Actividades realizadas:

1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa






Ing. Res. Interventoria.

Octubre 02 de 2022.
Actividades realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Ing. Res. Interventoria.


Octubre 03 de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.





Martes 04 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Miercoles, 05 de octubre de 2022
Actividades realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa






Jueves, 06 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Viernes, 07 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa





Sabado, 08 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa






Domingo, 09 de octubre de 2022
No se laboró por ser domingo.





Lunes, 10 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Martes, 11 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Miercoles, 12 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Jueves, 13 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa






Viernes, 14 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa






Sabado, 15 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.





Domingo, 16 de octubre de 2022
No se laboró por ser domingo.






Lunes, 17 de octubre de 2022
No se laboró por ser festivo.






Martes, 18 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa






Miercoles, 19 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa






Jueves, 20 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa







Viernes, 21 de octubre de 2022.
Actividades realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Comité de seguimiento al contrato de obra






Sabado, 22 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa






Domingo, 23 ole octubre de 2022
No se laboró por ser domingo.







Lunes, 24 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa






Martes, 25 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Miercoles, 26 de octubre de 2022
Actividades realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.






Jueves, 27 de octubre de 2022
Actividades:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa







Viernes, 28 de octubre de 2022
Actividades realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa






Sabado, 29 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa






Domingo, 30 de octubre de 2022.
No se laboró por ser domingo.





Lunes, 31 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 232 de 2022 **Contratista:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

INFORME MENSUAL No. TRES (3) **MES O PERIODO:** OCTUBRE DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	183
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	185
1	**INTRODUCCIÓN**		187
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		188
2.1	Localización		188
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		189
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		190
2.4	Características técnicas del proyecto		191
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		192
3.1	Información general del contrato		192
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		193
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		193
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		193
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		195
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	196
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	207
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	209
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	212
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	215
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	220
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	222
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	232
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		234
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Obra		235
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	251
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	253
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	255
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	258
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		735
5.1	Información general del contrato		735
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		735
5.3	Informes especialistas y profesionales		739
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		922
5.5	Informe matriz de riesgos.		923
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		924
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		927
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	928
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	931
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	940
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	942
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	949
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		951
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	953
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	955
7	**Conclusiones y recomendaciones**		259
8	**Anexos**		260
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		261
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		263
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		266
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		268

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** OCTUBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 232 de 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDORA"

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

PLAZO INICIAL: 10 MESES
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/06/2023
PLAZO ACUMULADO: 10 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 17.086.056.743,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 17.086.056.743,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	9770
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	5

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 16.814.491.922,00		$ 16.814.491.922,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ 180.027.732,00	$ 34.205.269,00	$ 214.233.001,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.178.000,00	$ 9.153.820,00	$ 57.331.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.042.697.654,00	$ 43.359.089,00	$ 17.086.056.743,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 104.544.920,92
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Suministro de piedra rajón para la conformación de pedraplén - 27/10/2022



Construcción de pedraplén 27/10/2022

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de Santa Cruz de Lorica, mediante convenio interadministrativo No. 1960 de 2021. Es por ello que mediante el proceso de licitación pública **L.P-005-2022,** se celebra el Contrato de Obra No. 232 de 2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA", El cual fue adjudicado al CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022, cuyo plazo inicial es de diez (10) meses a partir del 23 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 17.086.056.743,00.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de octubre de 2022; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el municipio de Santa Cruz de Lorica, entre el PR0+000 y el PR18+100 perteneciente al denominado Corredor 1 de la zona rural, que comunica los corregimientos de Santa Lucia, Las Garitas, San Juan y Los Higales



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, Ubicación del Municipio de Santa Cruz de Lorica.

El municipio de Santa Cruz de Lorica se encuentra ubicada al norte del departamento de Córdoba, en la zona baja del río Sinú y próxima al litoral del mar Caribe, a una distancia de 29 km Coveñas, 50 kilómetros de Tolú, 60 kilómetros de Montería y su cabecera municipal se encuentra localizada sobre la margen derecha del río Sinú, en las coordenadas latitud Norte 9° 13' 59" longitud Oeste 75° 49' 1", con respecto al meridiano de Greenwich. El municipio presenta un área de 1033 Km2, de las cuales 7,3 Km2 pertenece al casco urbano y 1025,7 Km2 al área rural, este limita al Norte con los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento, Purísima y Momil, por el este con los municipios de Momil y Chimá, por el oeste con los municipios de San Bernardo del Viento, Puerto Escondido y Moñitos y por el sur con los municipios de San Pelayo y Cotorra, posee una altura de 7 m.s.n.m. y una temperatura media de 32ºC.



Ilustración 3. Vía Santa Lucia - Los Higales.

Referencia	Latitud	Longitud
P1	9°17'6,21" N	75°53'47,93" O
P2	9°12'38,71" N	76°0'16,30" O

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

i. La fuente de materiales ubicada en la vereda El Esfuerzo en el municipio de Santa Cruz de Lorica Córdoba; la cual cuenta con licencia ambiental y permiso minero.



Ilustración 4. Fuente de materiales - El Esfuerzo.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Se beneficia con la ejecución del contrato de obra No. 232 de 2022, principalmente la zona rural conformada por los corregimientos de Santa Lucia, Las Garitas, San Juan, Los Higales.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio

la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En el estado inicial de la vía Santa Lucía – San Juan – Los Higales, se evidencia el deterioro de la capa de rodadura por su uso rutinario, por el ineficiente drenaje de la escorrentía y la baja frecuencia en la ejecución de trabajos de mantenimiento. Se puede verificar también, que las estructuras de drenaje (alcantarillas) presentan un grado de deterioro considerable, así como falta de limpieza y/o mantenimiento, lo que dificulta el paso de las aguas y así su represamiento, afectando la estructura de la vía. Es por ello que se realiza el mejoramiento de 9770 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de cinco (5) obras de drenaje tipo alcantarilla, y demarcación horizontal y vertical de los tramos.



Estado inicial de la Vía - Santa Lucia - Los Hágales 25/08/2022



Levantamiento topográfico en conjunto interventoría - Contratista 28/10/2022



Estado inicial de la Vía - Santa Lucia - Los Hágales 15/09/2022



Pedraplén construido – 28/10/2022


Ilustración 5. Estado inicial de la Vía Cto 232 de 2019

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de 9770 metros de vía con pavimento de concreto hidráulico módulo de rotura 40 MPa. Construcción de cuneta bordillos a ambos lados de los tramos intervenidos. Construcción de cinco (5) obras de drenaje tipo alcantarilla. Demarcación Horizontal y vertical de los tramos intervenidos.

A la fecha se continua con la etapa estudios y diseños, y aun no se define el diseño de las obras de drenaje a construir.

Contrato 232 de 2022	
Sistema	Pavimento Rígido
Longitud	9770 metros
Ancho Calzada	5 metros
Espesor	0,2 metros

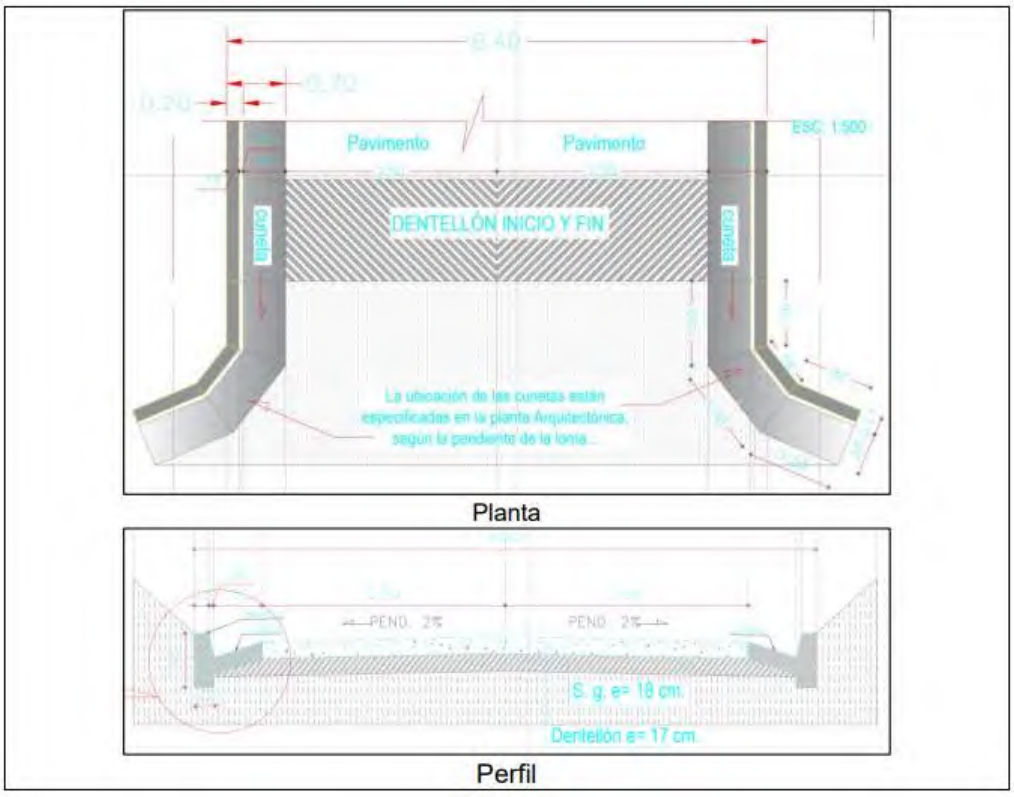

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO NO.	L.P-005-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/07/2022
CONTRATO No.	232 de 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
NIT	901.613.126-9
INTEGRANTES	• BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA • NIT. 901.499.915-4 • Participación: 50%
	• INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA • NIT. 901.167.911-0 • Participación: 50%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.086.056.743,00
DIRECCIÓN	CARRERA 45 #27-28 BARRIO CARIBE
TELEFONO	(+57) 3017544174
CORREO	consormejoramientosantalucia@gmail.com
PLAZO INICIAL	10 MESES
FECHA INICIO	23/08/2022
FECHA TERMINACIÓN	23/06/2023

Tabla 1. Información Cto. 232 de 2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

ii. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

iii. Construcción de pedraplén compacto, para atender la emergencia. El avance referente a esta actividad, no se muestra en el presente informe dado a que actualmente está en trámite la aprobación del acta modificatoria No. 1, en donde se incluye dichos ítems no previsto

iv. Sé realiza Levantamiento topográfico inicial del tramo a intervenir.

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El contratista se encuentra trabajando en la elaboración del Plan de adaptación de la guía ambiental - PAGA.

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. No se realizan actividades correspondientes a la gestión social, durante el periodo. Una vez se tenga el balance y la meta física aterrizada, de acuerdo a los estudios y diseños, se realizará la socialización del proyecto a la comunidad

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Actualmente está en trámite la aprobación del acta modificatoria No. 1, en donde se incluye dichos ítems no previsto

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. Al corte del presente informe, se tiene una inversión de obra programada del $ 104.544.920,92 correspondiente al 0,62 % y una inversión de obra ejecutada acumulada de $0,00 correspondiente al 0,0%; lo que representa un atraso del 0,62 %
ii. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
iii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados en los comités y actas de reunión realizadas.
iv. Realizar la revisión de la documentación entregada por el contratista
v. Coordinar mesas de trabajo entre los especialistas tanto del contratista de obra como de la Interventoría para agilizar la aprobación de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

I. Informe semanal No.07, del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2022
II. Informe semanal No.08, del 07 al 13 de octubre de 2022
III. Informe semanal No.09, del 14 al 20 de octubre de 2022
IV. Informe semanal No.10, del 21 al 27 de octubre de 2022
V. Informe semanal No. 11, del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 06/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 7 del 30/09/2022 al 06/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 9770 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros, la construcción cinco (5) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de longitud 5 metros y diámetro de 36" y la demarcación horizontal y vertical de

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de 9770 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de cinco (5) obras de drenaje tipo alcantarilla, y demarcación horizontal y vertical de los tramos, los cuales se localizan entre el PR0+000 y el PR18+100 perteneciente al denominado Corredor 1 de la zona rural de Santa Cruz de Lorica, que comunica los corregimientos de SANTA LUCIA, LAS GARITAS, SAN JUAN y LOS HIGALES.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022, NIT. 901.613.126-9

INTEGRANTES: 1. BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA, Participación: 50%; 2. INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA, Participación: 50%

CONTRATO No. 232 de 2022 — VALOR INICIAL: $ 17,086,056,743.00

FECHA DE INICIO: 8/23/2022 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 6/23/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 17,086,056,743.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 6/23/2023 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%); 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%); 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022 — **VALOR INICIAL:** $ 4,564,284,660.00

FECHA DE INICIO: 8/22/2022 — **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2024 — **VALOR ACUMULADO:** $ 4,564,284,660.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/31/2024 — **VALOR ANTICIPO:** $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 17,086,056,743		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 17,086,056,743		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16,814,491,922.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	Km	9.77			Prog					
					Ejec					
Afirmado (Km)	Km	9.77			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular (Km)	Km	9.77			Prog					
					Ejec					
Pavimento Rígido (Km)	Km	9.77			Prog					
					Ejec					
Alcantarillas 36"	Und	5			Prog					
					Ejec					
Señalización Vertical	Und	50			Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	Km	9.77			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre oruga	1	1
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora A25C	1	
Volquetas		4
Total	6	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El contratista presentó certificación de licencia ambiental y RUCOM de vigencia hasta 31-07-2022, de la fuente de material de piedra rajón. Se le solicitará la licencia ambiental y el permiso minero.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican. Actualmente, el contratista se encuentra gestionando el permiso de ocupación de cauce para la construcción del box culvert.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Elaboración del documento PAGA

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra trabajando en la elaboración del documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El contratista manifiesta que está en gestión para la ubicación de la sede de servicio de atención al asuario.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la elaboración del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Construcción de pedraplén compacto, para atender la emergencia desde la abscisa K3+000 hasta la K3+230, K3+260 hasta la K3+300, K3+340 hasta la K3+360 y desde la K3+390 hasta la K3+480 (parcial)
3. Levantamiento topgrafico por parte del contratista

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

2. Continuar con la construcción de predraplén entre el K3+000 al K5+300.
3. Levantamiento topografico.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Se encuentra en proceso la aprobación de la programación de obra. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, y la actividad de pedraplén compacto se ha iniciado para atender la emergencia actual generada por el desbordamiento de rio Sinú y a la fecha no se ha incluido en el presupuesto.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Suministro de piedra rajón para la conformación de pedraplén



Construcción de pedraplén



Pedraplén construido

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
1. Hacer seguimiento a los compromisos. 2. Revisar información entregada por el contratista 3. Gestionar la bitácora de obra 4. Realizar comité de seguimiento de obra	FIRMA NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 8 del 7/10/2022 al 13/10/2022 **Último Informe Semanal SI** (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 9770 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros, la construcción cinco (5) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de longitud 5 metros y diámetro de 36" y la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de 9770 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de cinco (5) obras de drenaje tipo alcantarilla, y demarcación horizontal y vertical de los tramos, los cuales se localizan entre el PR0+000 y el PR18+100 perteneciente al denominado Corredor 1 de la zona rural de Santa Cruz de Lorica, que comunica los corregimientos de SANTA LUCIA, LAS GARITAS, SAN JUAN y LOS HIGALES.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022, NIT. 901.613.126-9			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA, Participación: 50% 2. INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA, Participación: 50%			INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	232 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 17.086.056.743,00	**CONTRATO No.**	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/06/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 17.086.056.743,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/06/2023		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 17.086.056.743		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 17.086.056.743		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.814.491.922,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	9770			Prog					
					Ejec					
Afirmado (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Pavimento Rígido (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Alcantarillas 36"	Und	5			Prog					
					Ejec					
Señalización Vertical	Und	50			Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	9770			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre oruga	1	1
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora A25C	1	
Volquetas		4
Total	6	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El contratista presentó certificación de licencia ambiental y RUCOM de vigencia hasta 31-07-2022, de la fuente de material de piedra rajón. Se le solicitará la licencia ambiental y el permiso minero.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican. Actualmente, el contratista se encuentra gestionando el permiso de ocupación de cauce para la construcción del box culvert.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Elaboración del documento PAGA

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra trabajando en la elaboración del documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: El contratista manifiesta que está en gestión para la ubicación de la sede de servicio de atención al asuario.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la elaboración del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Construcción de pedraplén compacto, para atender la emergencia desde la abscisa K3+000 hasta la K3+580
3. Se realizó la reunión No. 2.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Continuar con la construcción de predraplén entre el K3+000 al K5+300.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, y la actividad de pedraplén compacto se ha iniciado para atender la emergencia actual generada por el desbordamiento de rio Sinú y a la fecha no se ha incluido en el presupuesto.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Suministro de piedra rajón para la conformación de pedraplén



Construcción de pedraplén



Pedraplén construido

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Hacer seguimiento a los compromisos. 2. Revisar información entregada por el contratista 3. Gestionar la bitácora de obra 4. Realizar comité de seguimiento de obra	FIRMA NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 9 del 14/10/2022 al 20/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 9770 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros, la construcción cinco (5) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de longitud 5 metros y diámetro de 36" y la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de 9770 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de cinco (5) obras de drenaje tipo alcantarilla, y demarcación horizontal y vertical de los tramos, los cuales se localizan entre el PR0+000 y el PR18+100 perteneciente al denominado Corredor 1 de la zona rural de Santa Cruz de Lorica, que comunica los corregimientos de SANTA LUCIA, LAS GARITAS, SAN JUAN y LOS HIGALES.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022, NIT. 901.613.126-9			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA, Participación: 50% 2. INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA, Participación: 50%			**INTEGRANTES:**	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	232 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 17.086.056.743,00	**CONTRATO No.**	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/06/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 17.086.056.743,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/06/2023		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 17.086.056.743		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 17.086.056.743		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.814.491.922,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	9770			Prog					
					Ejec					
Afirmado (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Pavimento Rígido (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Alcantarillas 36"	Und	5			Prog					
					Ejec					
Señalización Vertical	Und	50			Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	9770			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre oruga	1	1
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora A25C	1	
Volquetas		4
Total	6	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Municipio de Tolu Viejo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: El contratista ha presentado la documentación de las fuentes de materiales para material de pedraplén.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican. Actualmente, el contratista se encuentra gestionando el permiso de ocupación de cauce para la construcción del box culvert.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Elaboración del documento PAGA

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra trabajando en la elaboración del documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____.

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: El contratista manifiesta que está en gestión para la ubicación de la sede de servicio de atención al asuario.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la elaboración del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Construcción de pedraplén compacto, para atender la emergencia desde la abscisa K3+000 hasta la K3+780

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Continuar con la construcción de predraplén entre el K3+000 al K5+300.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, y la actividad de pedraplén compacto se ha iniciado para atender la emergencia actual generada por el desbordamiento de rio Sinú y a la fecha no se ha incluido en el presupuesto.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Suministro de piedra rajón para la conformación de pedraplén



Construcción de pedraplén



Pedraplén construido

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Hacer seguimiento a los compromisos. 2. Revisar información entregada por el contratista 3. Gestionar la bitácora de obra 4. Realizar comité de seguimiento de obra	FIRMA NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 10 del 21/10/2022 al 27/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 9770 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros, la construcción cinco (5) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de longitud 5 metros y diámetro de 36" y la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de 9770 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de cinco (5) obras de drenaje tipo alcantarilla, y demarcación horizontal y vertical de los tramos, los cuales se localizan entre el PR0+000 y el PR18+100 perteneciente al denominado Corredor 1 de la zona rural de Santa Cruz de Lorica, que comunica los corregimientos de SANTA LUCIA, LAS GARITAS, SAN JUAN y LOS HIGALES.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022, NIT. 901.613.126-9		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7	
INTEGRANTES:	1. BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA, Participación: 50% 2. INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA, Participación: 50%		INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)	
CONTRATO No.	232 de 2022	VALOR INICIAL: $ 17.086.056.743,00	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/06/2023	VALOR ACUMULADO: $ 17.086.056.743,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/06/2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 17.086.056.743		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 17.086.056.743		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.814.491.922,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 104.544.920,92	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (104.544.920,92)	-0,62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 104.544.920,92	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (104.544.920,92)	-0,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	9770			Prog					
					Ejec					
Afirmado (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Pavimento Rígido (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Alcantarillas 36"	Und	5			Prog					
					Ejec					
Señalización Vertical	Und	50			Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	9770			Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre oruga	1	1
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora A25C	1	
Volquetas		4
Total	6	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Municipio de Tolu Viejo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES: El contratista ha presentado la documentación de las fuentes de materiales para material de pedraplén.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican. Actualmente, el contratista se encuentra gestionando el permiso de ocupación de cauce para la construcción del box culvert.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Elaboración del documento PAGA

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra trabajando en la elaboración del documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: El contratista manifiesta que está en gestión para la ubicación de la sede de servicio de atención al asuario.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la elaboración del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Construcción de pedraplén compacto, para atender la emergencia desde la abscisa K3+000 hasta la K3+780

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Continuar con la construcción de predraplén entre el K3+000 al K5+300.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, y la actividad de pedraplén compacto se ha iniciado para atender la emergencia actual generada por el desbordamiento de rio Sinú y a la fecha no se ha incluido en el presupuesto.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Suministro de piedra rajón para la conformación de pedraplén



Construcción de pedraplén



Pedraplén construido

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 11 del 28/10/2022 al 3/11/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 9770 metros de pavimento rígido con un ancho de calzada de 5 metros, la construcción cinco (5) alcantarillas en tubería de concreto reforzado de longitud 5 metros y diámetro de 36" y la demarcación horizontal y vertical de la vía.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de 9770 metros de vía con la construcción pavimento de concreto hidráulico de módulo de rotura de 40 Mpa, la construcción de bordillos a ambos lados, la construcción de cinco (5) obras de drenaje tipo alcantarilla, y demarcación horizontal y vertical de los tramos, los cuales se localizan entre el PR0+000 y el PR18+100 perteneciente al denominado Corredor 1 de la zona rural de Santa Cruz de Lorica, que comunica los corregimientos de SANTA LUCIA, LAS GARITAS, SAN JUAN y LOS HIGALES.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022, NIT. 901.613.126-9			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S, R/L SANDRA MARCELA MARRIAGA MEJIA, Participación: 50% 2. INGENIERÍA RYD S.A.S, R/L YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA, Participación: 50%			**INTEGRANTES:**	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	232 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 17.086.056.743,00	**CONTRATO No.**	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	23/06/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 17.086.056.743,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/06/2023		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 17.086.056.743		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 17.086.056.743		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 16.814.491.922,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 185.118.043,92	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (185.118.043,92)	-1,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 185.118.043,92	1,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (185.118.043,92)	-1,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 80.573.123,00	0,48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	9770			Prog					
					Ejec					
Afirmado (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Pavimento Rígido (Km)	m	9770			Prog					
					Ejec					
Alcantarillas 36"	Und	5			Prog					
					Ejec					
Señalización Vertical	Und	50			Prog					
					Ejec					
Señalización Horizontal	m	9770			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre oruga	1	1
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora A25C	1	
Volquetas		4
Total	6	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica - Córdoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Municipio de Tolu Viejo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES: El contratista ha presentado la documentación de las fuentes de materiales para material de pedraplén.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican. Actualmente, el contratista se encuentra gestionando el permiso de ocupación de cauce para la construcción del box culvert.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Elaboración del documento PAGA

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra trabajando en la elaboración del documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: El contratista manifiesta que está en gestión para la ubicación de la sede de servicio de atención al asuario.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la elaboración del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Construcción de pedraplén compacto, para atender la emergencia. El avance referente a esta actividad, no se muestra en el presente informe dado a que actualmente está en trámite la aprobación del acta modificatoria No. 1, en donde se incluye dicho items no previsto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Continuar con la construcción de predraplén

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, y la actividad de pedraplén compacto se ha iniciado para atender la emergencia actual generada por el desbordamiento de rio Sinú y a la fecha no se ha incluido en el presupuesto.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pedraplén construido



Pedraplén construido



Levantamiento topográfico en conjunto interventoría - Contratísta

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-22 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO No. 232 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VOLCO DOBLE TROQUE PLACA USE 225	INTERNACIONAL/ 2009	14M3	Santa Lucia - Las Garita, Lorica	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	A
VOLCO DOBLE TROQUE PLACA SJK 463	INTERNACIONAL/ 2009	17M3	Santa Lucia - Las Garita, Lorica	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A
VOLCO DOBLE TROQUE PLACA TBB 387	MACK/ 1972	16M3	Santa Lucia - Las Garita, Lorica	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A
VOLCO DOBLE TROQUE PLACA WPQ 563	INTERNACIONAL/ 2015	16M3	Santa Lucia - Las Garita, Lorica	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	A	A	I	A	A	R	I	A
RETRO EXCAVADORA	LINK BELT 220		Santa Lucia - Las Garita, Lorica	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A
VOLCO DOBLE TROQUE PLACA STB 442	INTERNACIONAL/ 2015	16M3	Santa Lucia - Las Garita, Lorica	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO				5	0	6	6	6	6	6	6	0	4	4	6	6	6	3	0	0	4	5	4	5	5	0	4	4	1	4	4	3	0	5
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL INACTIVO				1	6	0	0	0	0	0	0	6	2	2	0	0	0	3	6	6	2	1	2	1	1	6	2	2	5	2	2	2	6	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	186	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	118	63,44
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	0,54
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	67	36,02

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los Dias inactivos de las volquetas corrsponden a dias Domigos y Festivos, la Volqueta SBT 442, se retiro de la obra el día 14 de Octubre de 2022, La volqueta USE 225 se retiro de la obra entre el 23 al 30 de octubre de 2022, La volqueta WPQ 563, el día 29 de Octubre de 2022 se programo para mantenimiento(cambio de aceite y ajustes en general)

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Los días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre la totalidad de la maquinaria permaneció inactiva debido a que esos días no se realizan actividades por ser domingo.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACION= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligació
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ALIRIA ESPERANZA AGUILLON GERENAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520257798 CND

Firma
Nombre: ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 232 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: ASA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 9)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALIRIA AGUILLON	51848534	Residente de Obra	$ 6.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
2	JAMILTON ECHEVERRY	9738398	Topográfo	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
3	CLAUDIA IBAÑEZ	1102828523	Representante Legal	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
4	BEATRIZ PADILLA	23178952	SISO	$ 2.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
5	JEISON RODRIGUEZ	1067402165	Residente de Obra	$ 1.250.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
6	CRISTIAN VILLALBA	1102863958	Director de Obra	$ 1.200.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
7	OMAR OLIVA	15612051	Operador Reto	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
8	DOMINGO POLO	11153126	Conductor	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
9	LEOMAR ARCIA	15610039	Conductor	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
10	JOVANIS ANAYA	72072336	Conductor	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
11	ADANIES OQUENDO	1073970444	Conductor	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

A la fecha, el contratista no ha presentado las planillas de pago de aportes y seguridad social, las cuales fueron solicitadas mediante comunicado CVRIMG-083-2022, del 07 de octubre de 2022 y que en el comité de obra No.2 realizado el día 21 de octubre de 2022 el contratista se compromete a entregar dichos soportes.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: CRISTIAN ALBERTO VILLALBA MERCADO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-351882 COR

Firma

Nombre: RANDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Bogotá D.C., siete (07) de octubre de 2022 **CVRIMG-083-2022**

Señores
CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
Atn. Ing. Cristian Villalba Mercado
Director de obra
Email: consormejoramientosantalucia@gmail.com
Montería- Córdoba

REFERENCIA: **Contrato de Interventoría No. 971 de 2022:** "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA LOTE 2

Contrato de Obra No. 232-2022: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA – LAS GARITAS – SAN JUAN – LOS HIGALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA – CORDOBA.

ASUNTO: Solicitud de soportes de afiliación al SGSS y pagos al día del personal vinculado a la ejecución del proyecto

Cordial saludo,

Mediante la presente, me dirijo a ustedes con el propósito de solicitarles los soportes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social – SGSS (salud, pensión y ARL) y los soportes de pagos al día, del personal que se encuentra vinculado a la ejecución del contrato de la referencia.

Agradezco su pronta y positiva respuesta en el término de dos (02) días hábiles a partir de la emisión de la presente solicitud.

No siendo otro el motivo de la presente, agradecemos la atención suministrada.

Cordialmente,



FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Consorcio Vial Rural IMG

C.C. Ing. Laura Isabel Peña García – Supervisora del proyecto
Anexo: N/A

Proyectó: FRG

Carrera 62 103 44 Of 304 Edificio Torre Del Reloj JMG Tel: (1) 6216395 - 3001564 – 3001565
E-mail: c.vialruralimg@gmail.com
Bogotá D.C.

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 232 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

MES INFORME MENSUAL: **OCTUBRE DE 2022** **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	529	Via Rural Mejorada	2022234170065	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	232 de 2020	$ 17.086.056.743,00	
TOTAL						$ 17.086.056.743,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 17.086.056.743,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES			
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: CRISTIÁN ALBERTO VILLALBA MERCADO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-351882 COR

Firma

Nombre: FREDY RODRÍGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 232 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	21	20	20	20	24	24	18	24	22	24	24	24	24	24	24	24	22	24	20	24	24	24	20	20	24	24	24	24	707
Lluvias moderadas				3	4							2								2												11
Lluvias intensas						4	4			6			0		0							4	0			4	4					26
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ALIRIA ESPERANZA AGUILLON GERENAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520257798 CND

Firma
Nombre: ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	mÃ¡tica Princi	METEOROLOGI

AreaOperativa	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION
Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION

Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/10/2022 0:00	2.2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/10/2022 0:00	1.4	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/10/2022 0:00	2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/10/2022 0:00	1	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/10/2022 0:00	15.6	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/10/2022 0:00	51	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/10/2022 0:00	12.5	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/10/2022 0:00	1.2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/10/2022 0:00	8.4	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/10/2022 0:00	16.5	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/10/2022 0:00	40	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/10/2022 0:00	5.2	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/10/2022 0:00	55	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/10/2022 0:00	3.4	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/10/2022 0:00	0	50		900
PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/10/2022 0:00	0	50		900

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 232 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CRISTIÁN ALBERTO VILLALBA MERCADO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-351882 COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 232 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

FECHA DE INICIO: 23/08/2022

PLAZO INICIAL: 10 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/06/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 17.086.056.743,00

VALOR ACUMULADO: $ 17.086.056.743,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 57.331.820,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 57.331.820,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.708.605.674,30	23	8	2022	23	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.366.884.539,44	23	8	2022	24	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.417.211.348,60	23	8	2022	23	6	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 5.125.817.022,90	5 años 0 meses y 0 días					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101173893

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 854.302.387,15	23	8	2022	23	6	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 96-40-101061505 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.708.605.674,30	23	8	2022	24	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.366.884.539,44	23	8	2022	24	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.417.211.348,60	23	8	2022	23	6	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 17.199.546,00	23	6	2023	23	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 5.125.817.022,90	5 años 0 meses 0 días					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101173893

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se actualiza las pólizas de seguro de cumplimiento según modificatoria al contrato No.1
El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061505	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	23	08	2022	00:00	23	06	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT: 901.613.126-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 B 19 E 40 BRR GARUPAL	VALLEDUPAR, CESAR	3052594456

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.096.758-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 NRO. 18 - 07	LORICA, CORDOBA	7735092

BENEFICIARIO: 800096758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA EJECUCION DE CONTRATO 232-2022 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS
SE EXCLUYE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	23/06/2023	$854,302,837.15	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	23/06/2023	$854,302,837.15	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	23/06/2023	$854,302,837.15	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23/08/2022.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,921,128.00	$ ******20,000.00	$ *****368,814.00	$ *********2,309,942.00	$ ******854,302,837.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	83018	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061505

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061505	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	23	08	2022	00:00	23	06	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT: 901.613.126-9

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 12 B 19 E 40 BRR GARUPAL	VALLEDUPAR, CESAR	3052594456

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.096.758-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 4 NRO. 18 - 07	LORICA, CORDOBA	7735092

BENEFICIARIO: 800096758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	23/06/2023	$854,302,837.15	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	23/06/2023	$854,302,837.15	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/08/2022	23/06/2023	$854,302,837.15	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061505

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MARTHATARAZONA 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101061505	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	23	08	2022	00:00	23	06	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022		**NIT: 901.613.126-9**
DIRECCION: CL 12 B 19 E 40 BRR GARUPAL	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELEFONO:**	3052594456

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 800.096.758-8**
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 18 - 07	**CIUDAD:** LORICA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7735092

BENEFICIARIO: 800096758 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	901167911-0	50.00
INGENIERIA RYD SAS	901499915-4	50.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101061505

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MARTHATARAZONA 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101173893	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	23	08	2022	00:00	23	06	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	NIT: 901.613.126-9	3052594456

DIRECCIÓN: CL 12 B 19 E 40 BRR GARUPAL — CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.096.758-8	7735092

DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 18 - 07 — CIUDAD: LORICA, CORDOBA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONTRATO 232-2022 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/08/2022	24/12/2023	$1,366,884,539.44	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/08/2022	24/12/2022	$1,708,605,674.30	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/08/2022	23/06/2026	$3,417,211,348.60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$5,125,817,022.90	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23/08/2022.

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **78,218,376.00	$ ******25,000.00	$ **14,866,241.00	$ ********93,109,617.00	$ ***11,618,518,585.24	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	83018	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101173893

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101173893	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	23	08	2022	00:00	23	06	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022			NIT: 901.613.126-9
DIRECCION: CL 12 B 19 E 40 BRR GARUPAL	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELEFONO:**	3052594456

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			NIT: 800.096.758-8
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 18 - 07	**CIUDAD:** LORICA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7735092

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	901167911-0	50.00
INGENIERIA RYD SAS	901499915-4	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101173893

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MARTHATARAZONA 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101173893**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	**10**	**2022**	**23**	**08**	**2022**	**00:00**	**23**	**06**	**2028**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	**NIT: 901.613.126-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 12 B 19 E 40 BRR GARUPAL	VALLEDUPAR, CESAR	3052594456

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.096.758-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 4 NRO. 18 - 07	LORICA, CORDOBA	7735092

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUCIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONTRATO 232-2022 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	**23/08/2022**	**24/12/2023**	**$1,366,884,539.44**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**23/08/2022**	**24/12/2022**	**$1,708,605,674.30**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**23/08/2022**	**23/06/2026**	**$3,417,211,348.60**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$5,125,817,022.90**	**$5,125,817,022.90**
CALIDAD DEL SERVICIO	**23/06/2023**	**23/06/2028**	**$17,199,546.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE INCLUYE EL AMPARO CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN MODIFICATORIO No. 1 DE FECHA 17/09/2022.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****163,574.00	$ *******8,000.00	$ ******32,599.00	$ **********204,173.00	$ ***11,635,718,131.24	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	83018	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101173893

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101173893	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	10	2022	23	08	2022	00:00	23	06	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022		**NIT: 901.613.126-9**
DIRECCIÓN: CL 12 B 19 E 40 BRR GARUPAL	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	3052594456

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA YO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.096.758-8**
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 18 - 07	**CIUDAD:** LORICA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7735092

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	901167911-0	50.00
INGENIERIA RYD SAS	901499915-4	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101173893

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/11/2022
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 232 de 2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 10 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 23/06/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	.....	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	.....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	.....	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	.....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	.....	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	.....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.


Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: CRISTIÁN ALBERTO VILLALBA MERCADO	Nombre:	Nombre: FREDY RODRÍGUEZ GIRALDO	Nombre:
Director de Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-351882 COR	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL


• Seguimiento Programa de Obra


Id	Modo de tarea	Nombre	Retraso por redist.	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
0		**Programa Mejorar**	**0 días**	**t 207 días**	**ar 23/08/22**	**ie 23/06/23**	
1		INICIO	0 días	0 días	nar 23/08/22	nar 23/08/22	2
2		AJUSTES A LOS ES	0 días	43 días	nar 23/08/22	vie 21/10/22	4;8;22;5FC+5
3		**I. EXPLANACIONE**	**0 días**	**t 62 días**	**un 24/10/22**	**un 23/01/23**	
4		Excavación en r	0 días	62 días	lun 24/10/22	lun 23/01/23	
5		Terraplenes (M	0 días	57 días	lun 31/10/22	lun 23/01/23	16;20
6		**II. ESTRUCTURAS**	**0 días**	**t 129 días**	**un 24/10/22**	**mar 2/05/23**	
7		**CONSTRUCCIÓI**	**0 días**	**t 129 días**	**un 24/10/22**	**mar 2/05/23**	
8		Excavaciones	0 días	62 días	lun 24/10/22	lun 23/01/23	9;10
9		Tubería de co	0 días	35 días	nar 24/01/23	lun 13/03/23	11;12
10		Concreto clas	0 días	35 días	nar 24/01/23	lun 13/03/23	11;12
11		Concreto clas	0 días	15 días	nar 14/03/23	mar 4/04/23	13
12		Acero de Ref	0 días	15 días	nar 14/03/23	mar 4/04/23	13
13		Relleno para	0 días	17 días	mié 5/04/23	mar 2/05/23	29
14		**III. PAVIMENTO C**	**0 días**	**t 67 días**	**ıar 24/01/23**	**mar 2/05/23**	
15		**CONSTRUCCIÓI**	**0 días**	**t 67 días**	**ıar 24/01/23**	**mar 2/05/23**	
16		Subbase Grar	0 días	30 días	nar 24/01/23	lun 6/03/23	17;18
17		Pavimento de	0 días	22 días	mar 7/03/23	lun 10/04/23	19
18		Acero de refu	0 días	22 días	mar 7/03/23	lun 10/04/23	19
19		CONCRETO C	0 días	15 días	nar 11/04/23	mar 2/05/23	25;26
20		Afirmado 10	0 días	30 días	nar 24/01/23	lun 6/03/23	17
21		**IV. TRANSPORTE**	**0 días**	**t 72 días**	**un 24/10/22**	**lun 6/02/23**	
22		Transporte de r	0 días	72 días	lun 24/10/22	lun 6/02/23	29

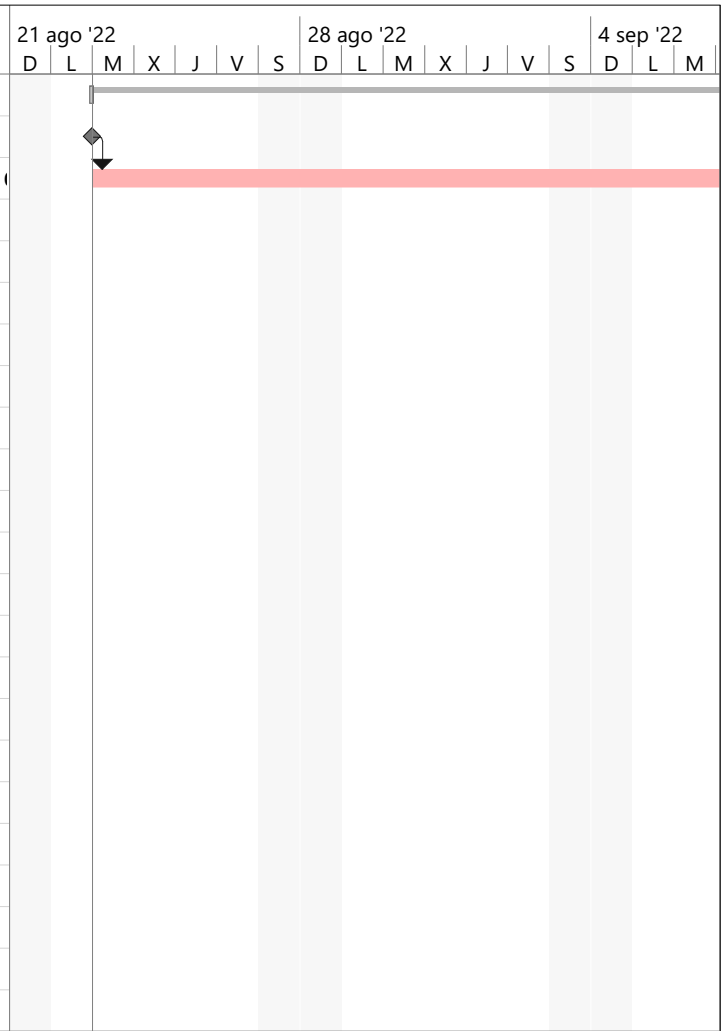


Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre	Retraso por redist.	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras
23		**V. SEÑALIZACIÓN**	**0 días**	**20 días**	**mié 3/05/23**	**nié 31/05/23**	
24		**SEÑALIZACIÓN**	**0 días**	**20 días**	**mié 3/05/23**	**nié 31/05/23**	
25		Señal Vertica	0 días	20 días	mié 3/05/23	nié 31/05/23	28
26		Línea de Den	0 días	20 días	mié 3/05/23	nié 31/05/23	28
27		**VI. CARACTERIZA**	**0 días**	**15 días**	**jue 1/06/23**	**vie 23/06/23**	
28		Caracterización	0 días	15 días	jue 1/06/23	vie 23/06/23	29
29		FIN	0 días	0 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	

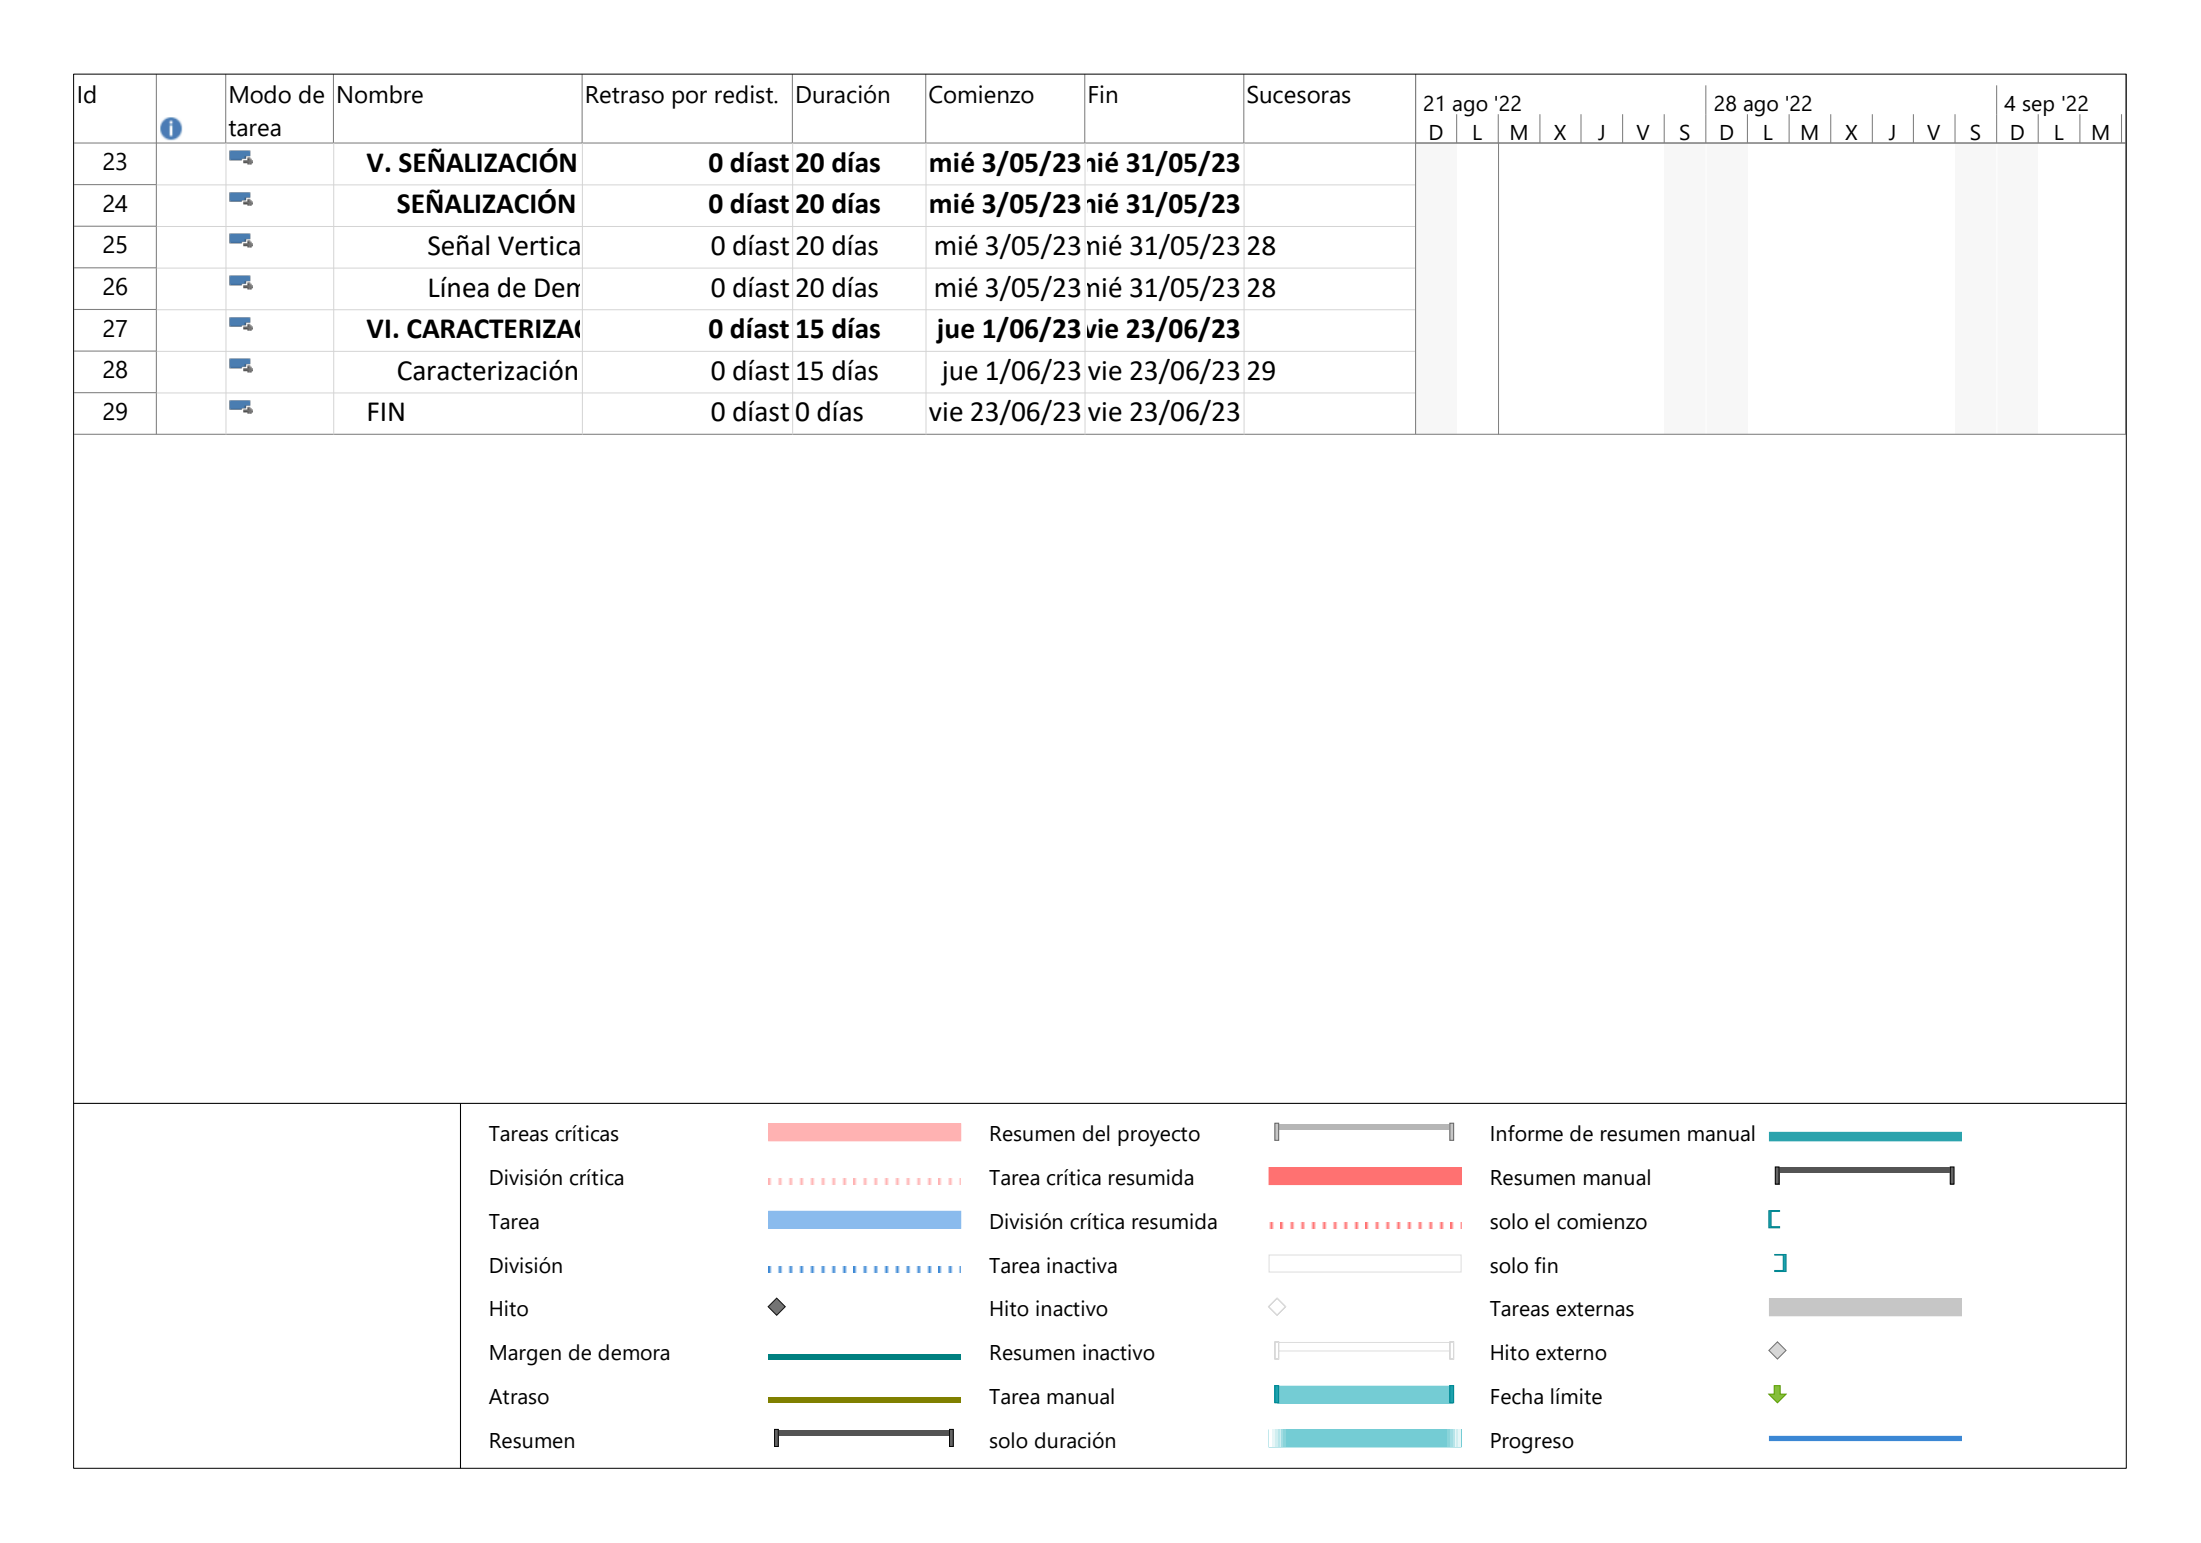

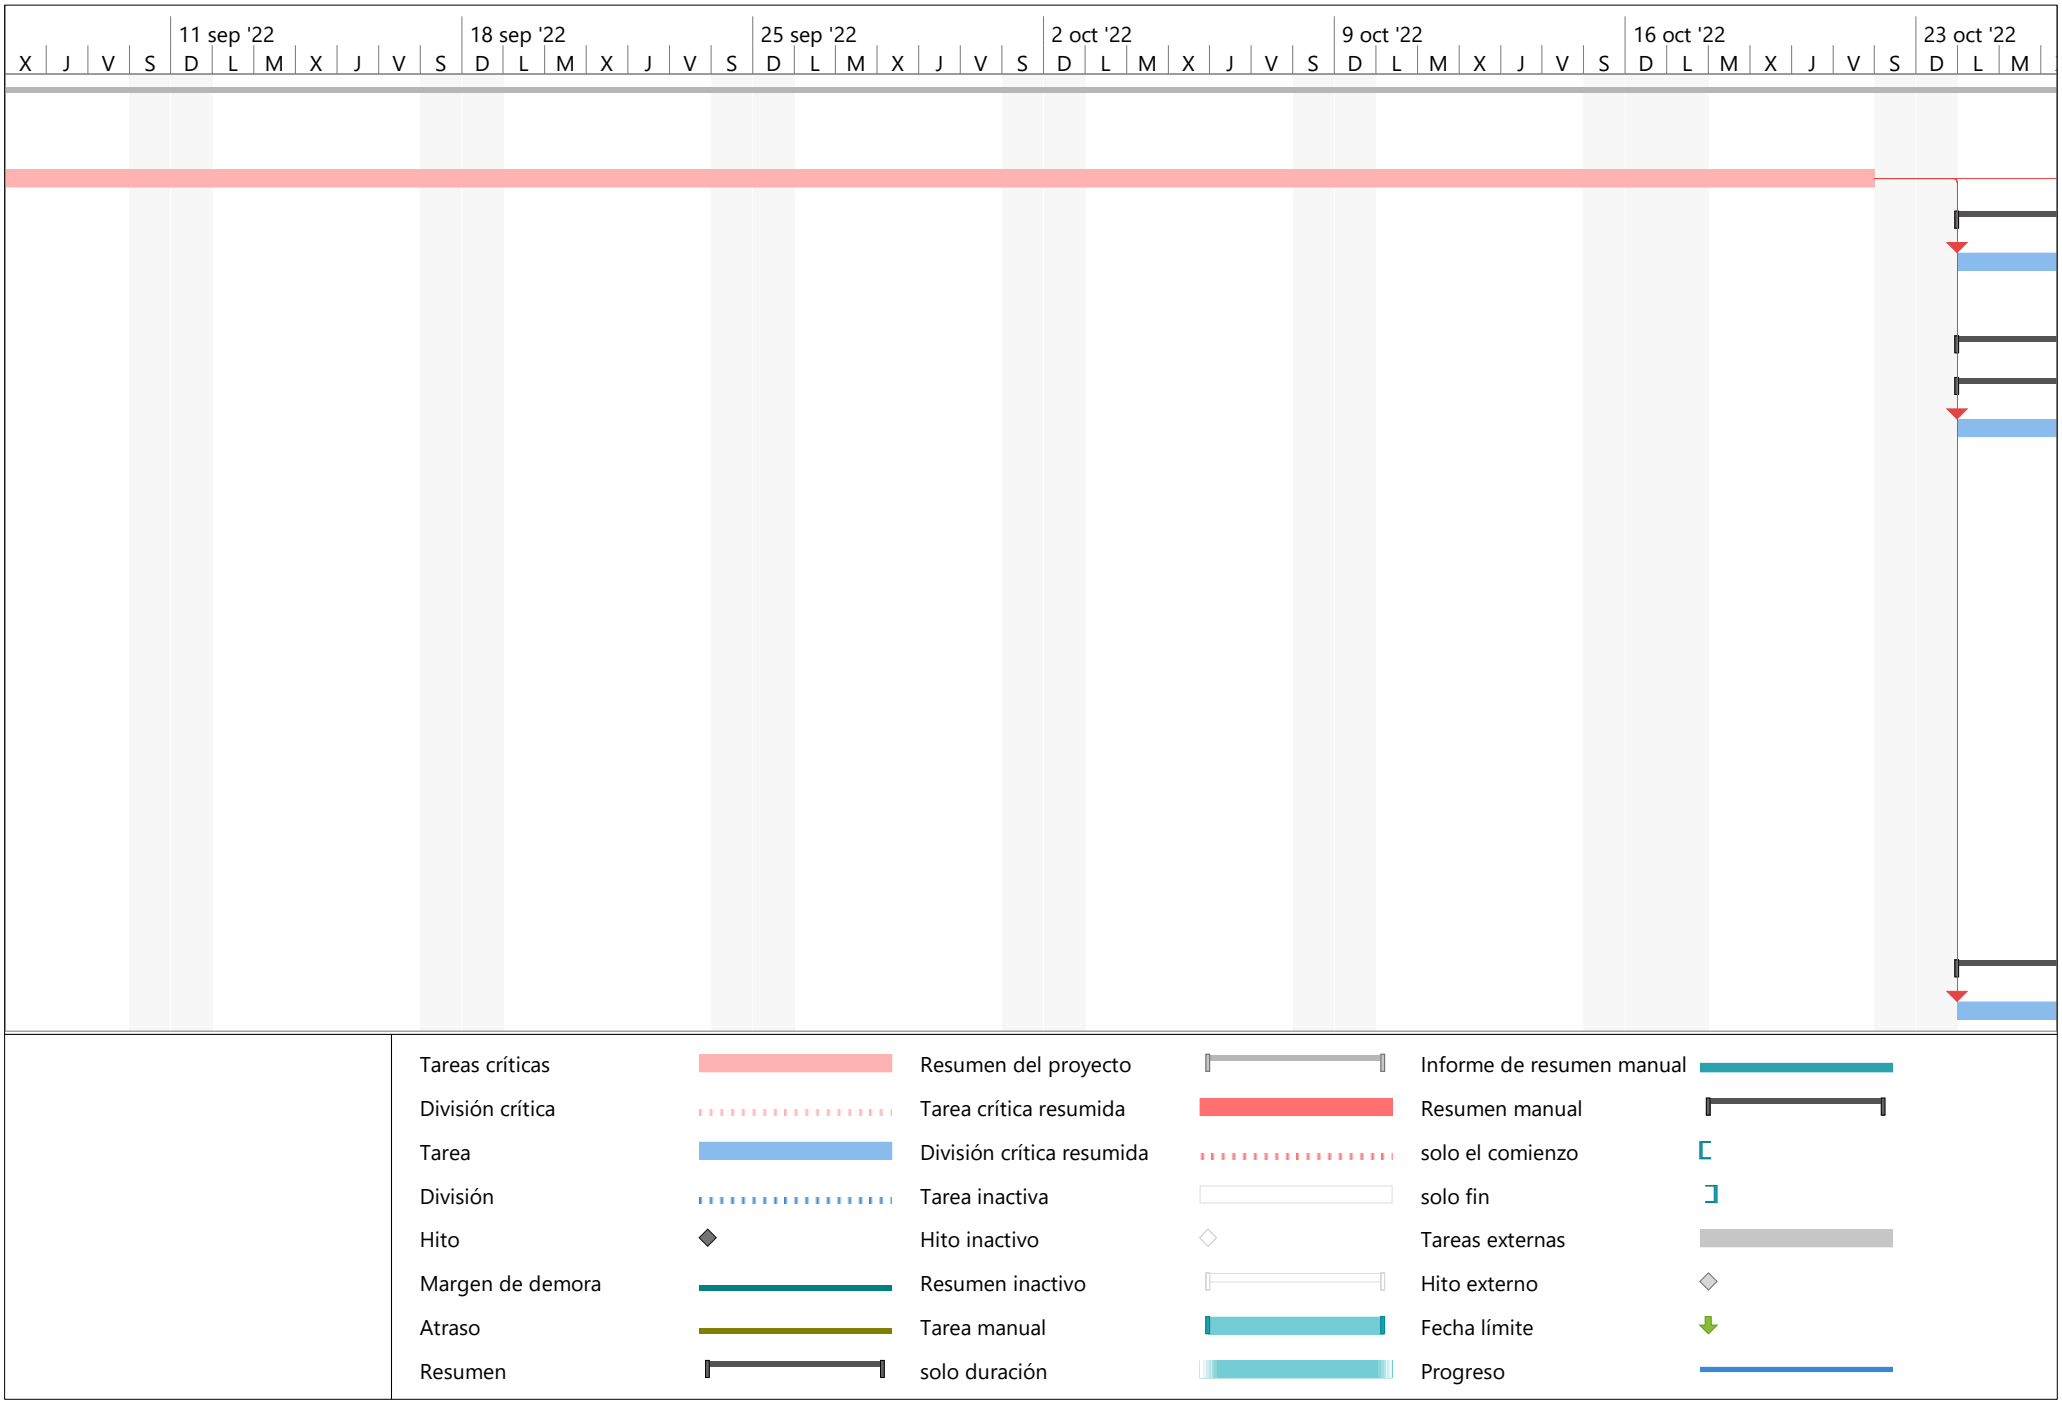

11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
9 oct '22
16 oct '22
23 oct '22
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso



11 sep '22
18 sep '22
25 sep '22
2 oct '22
9 oct '22
16 oct '22
23 oct '22
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso

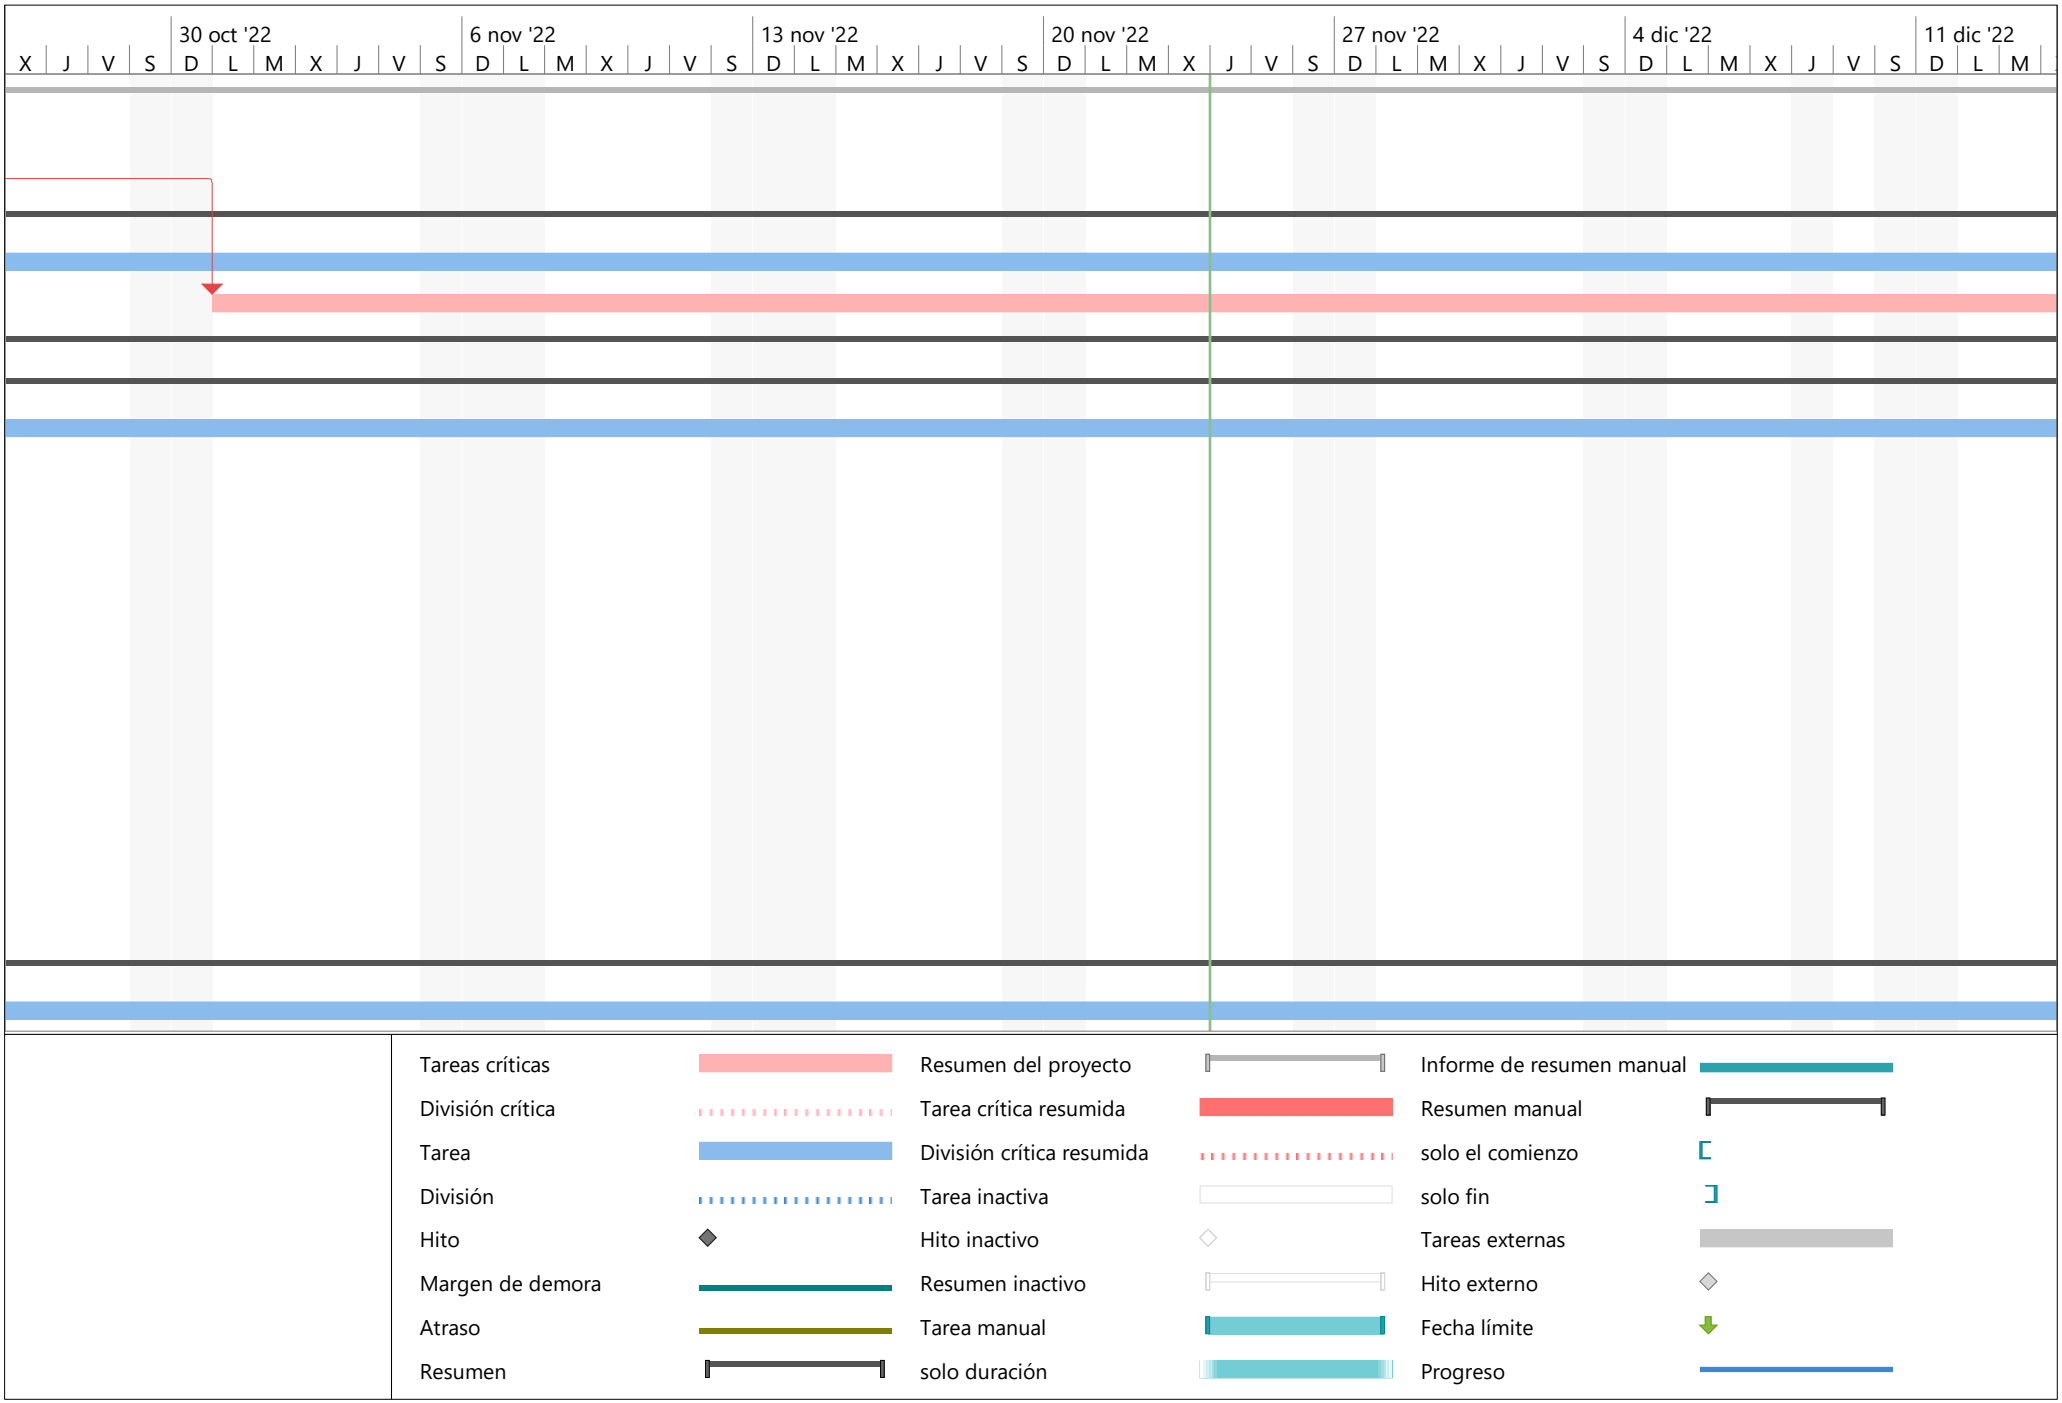

30 oct '22
6 nov '22
13 nov '22
20 nov '22
27 nov '22
4 dic '22
11 dic '22
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso




Tareas críticas		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
División crítica		Tarea crítica resumida		Resumen manual	
Tarea		División crítica resumida		solo el comienzo	
División		Tarea inactiva		solo fin	
Hito		Hito inactivo		Tareas externas	
Margen de demora		Resumen inactivo		Hito externo	
Atraso		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		solo duración		Progreso	

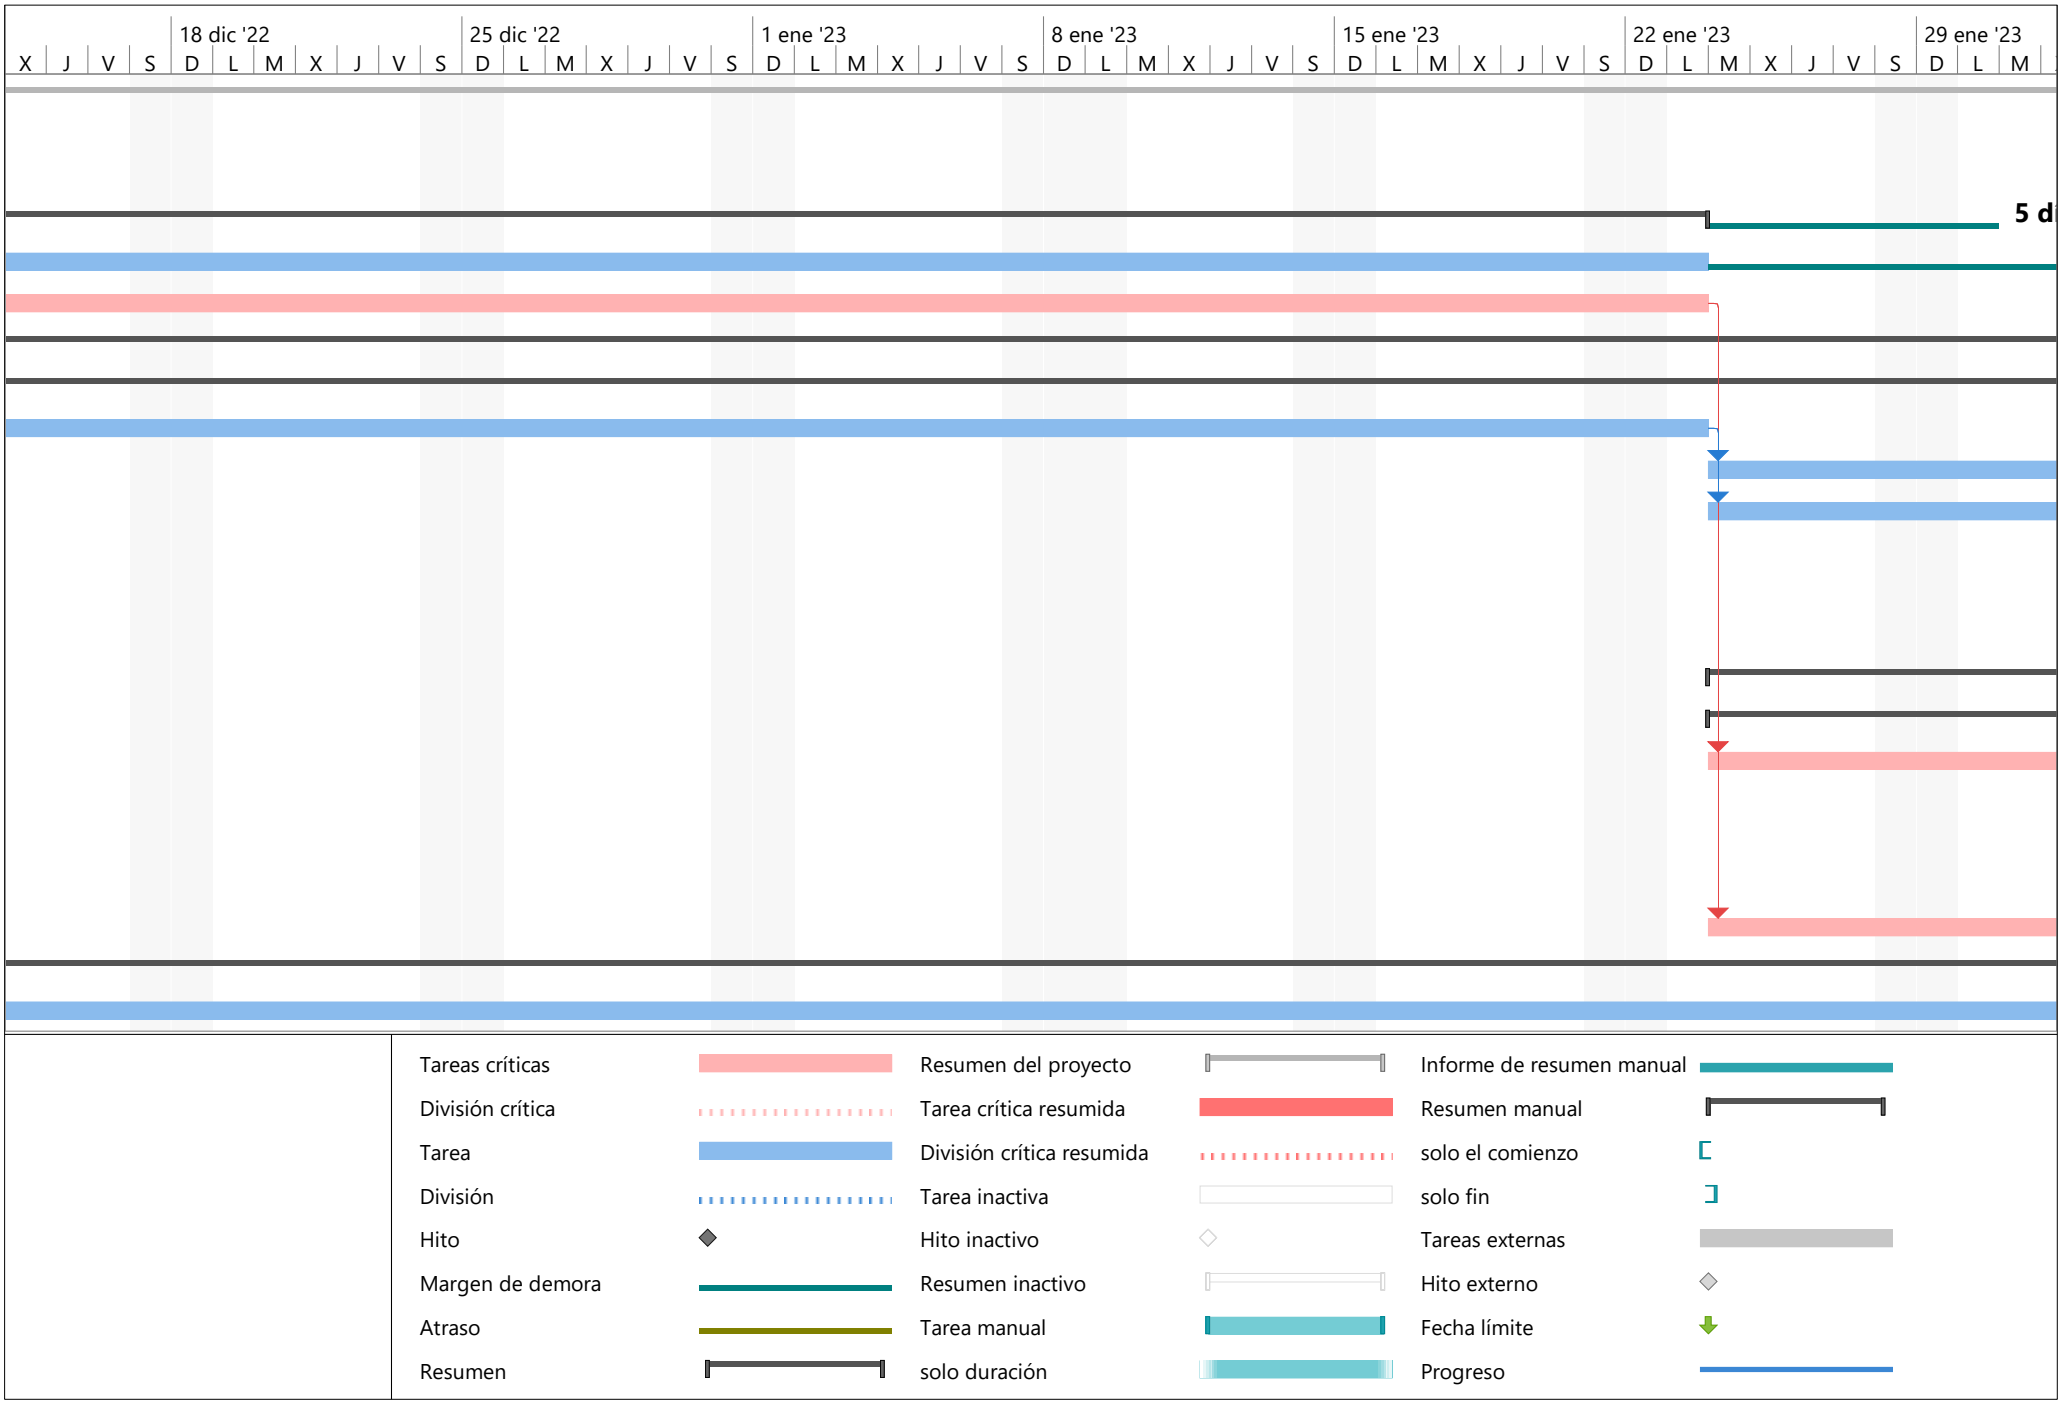

18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
15 ene '23
22 ene '23
29 ene '23
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
5 d
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso

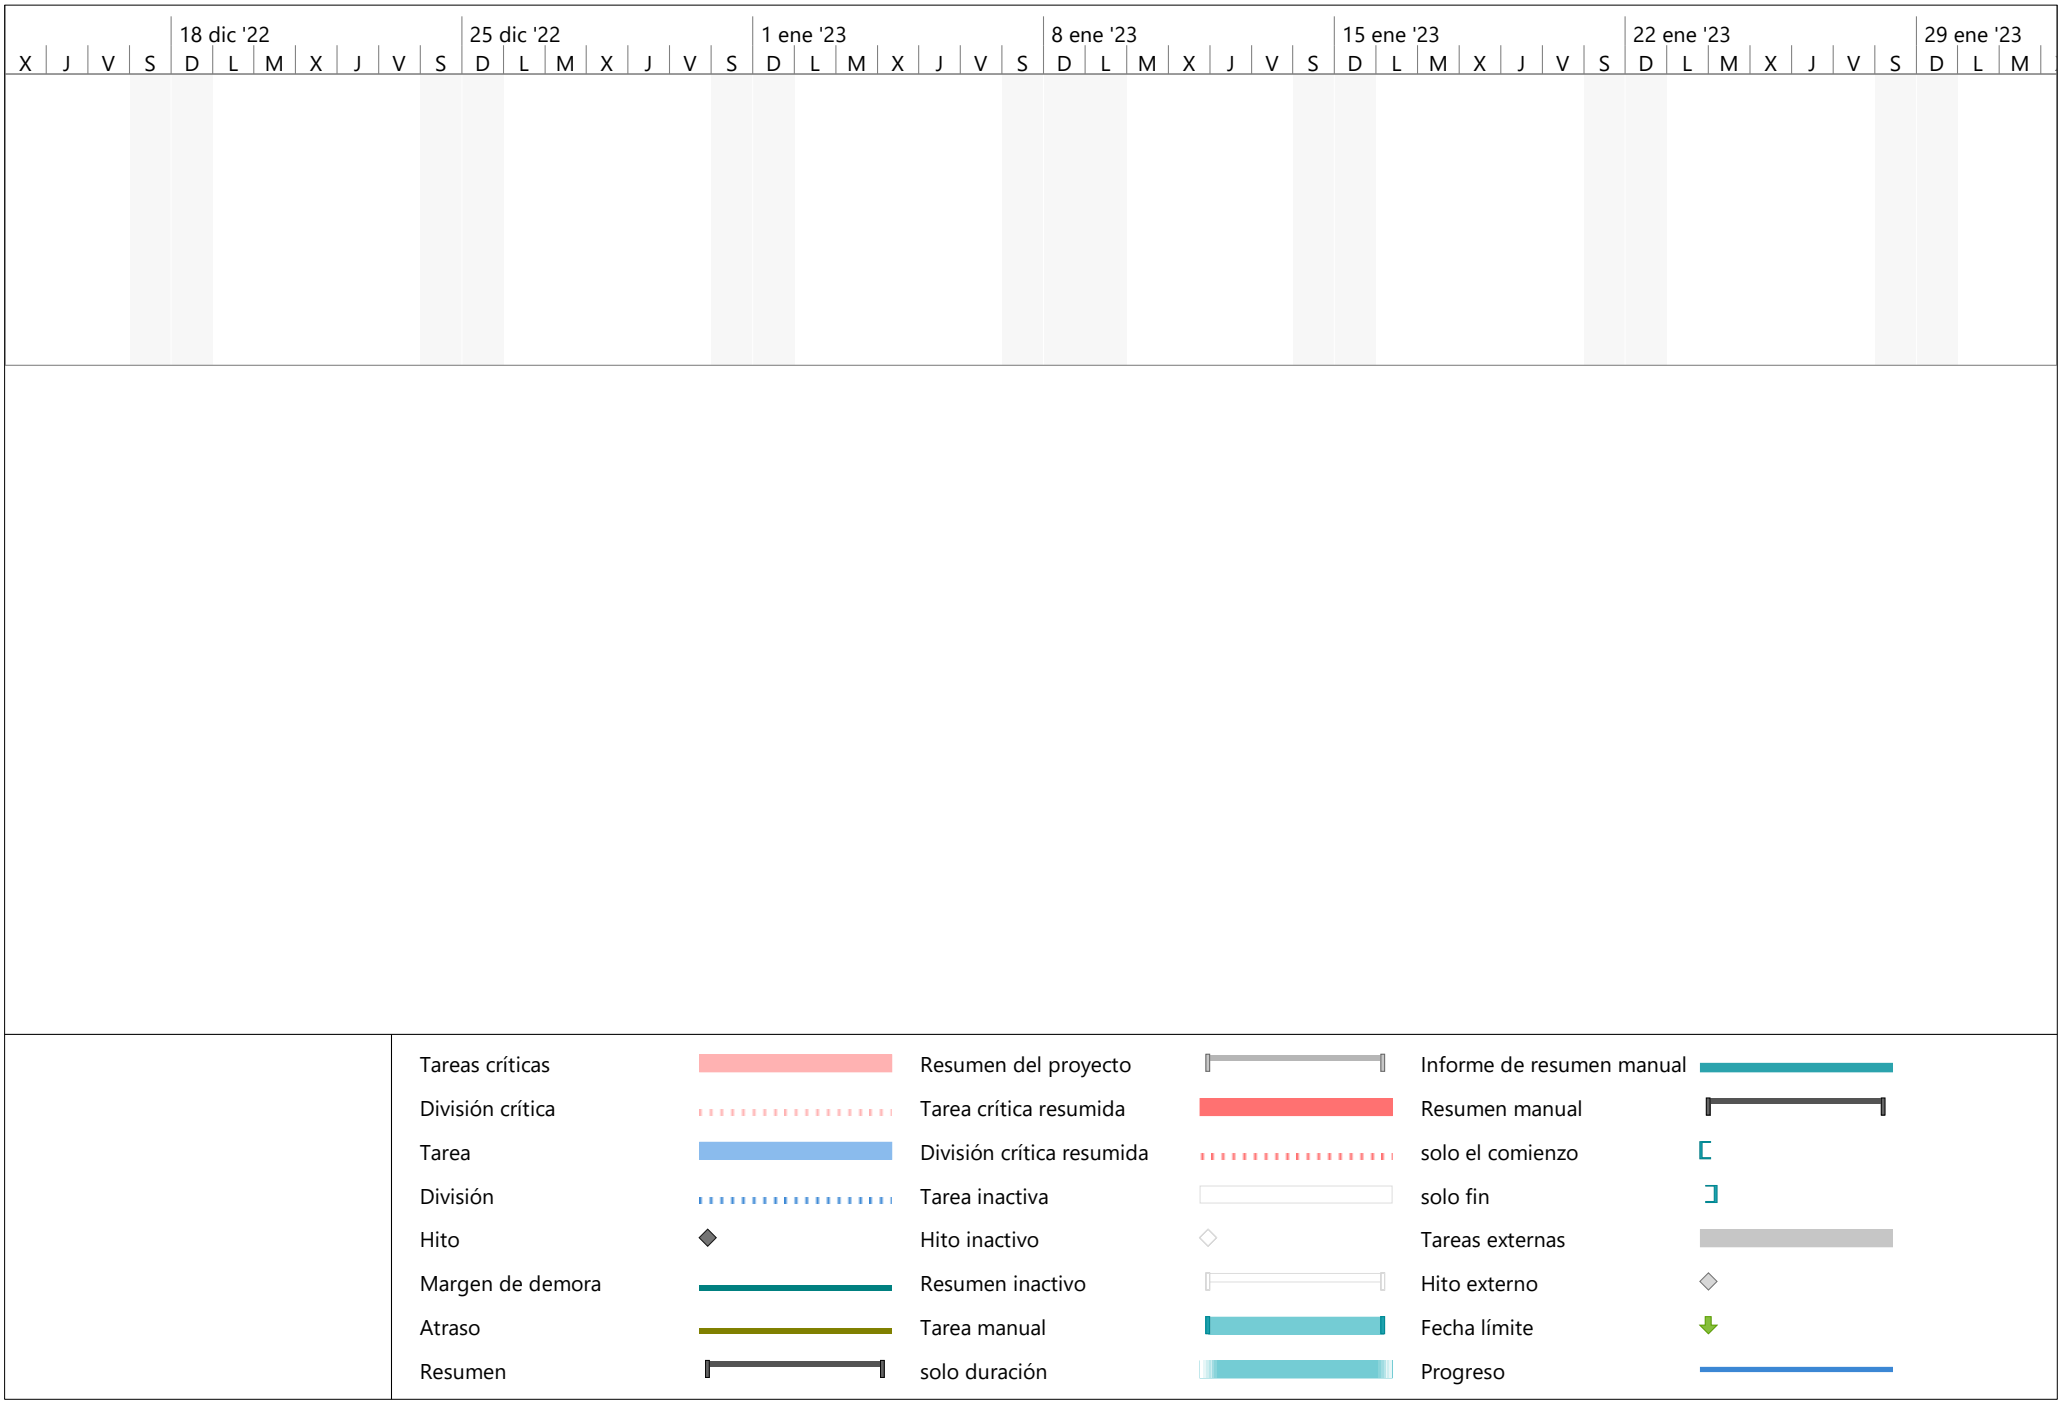
18 dic '22
25 dic '22
1 ene '23
8 ene '23
15 ene '23
22 ene '23
29 ene '23
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso

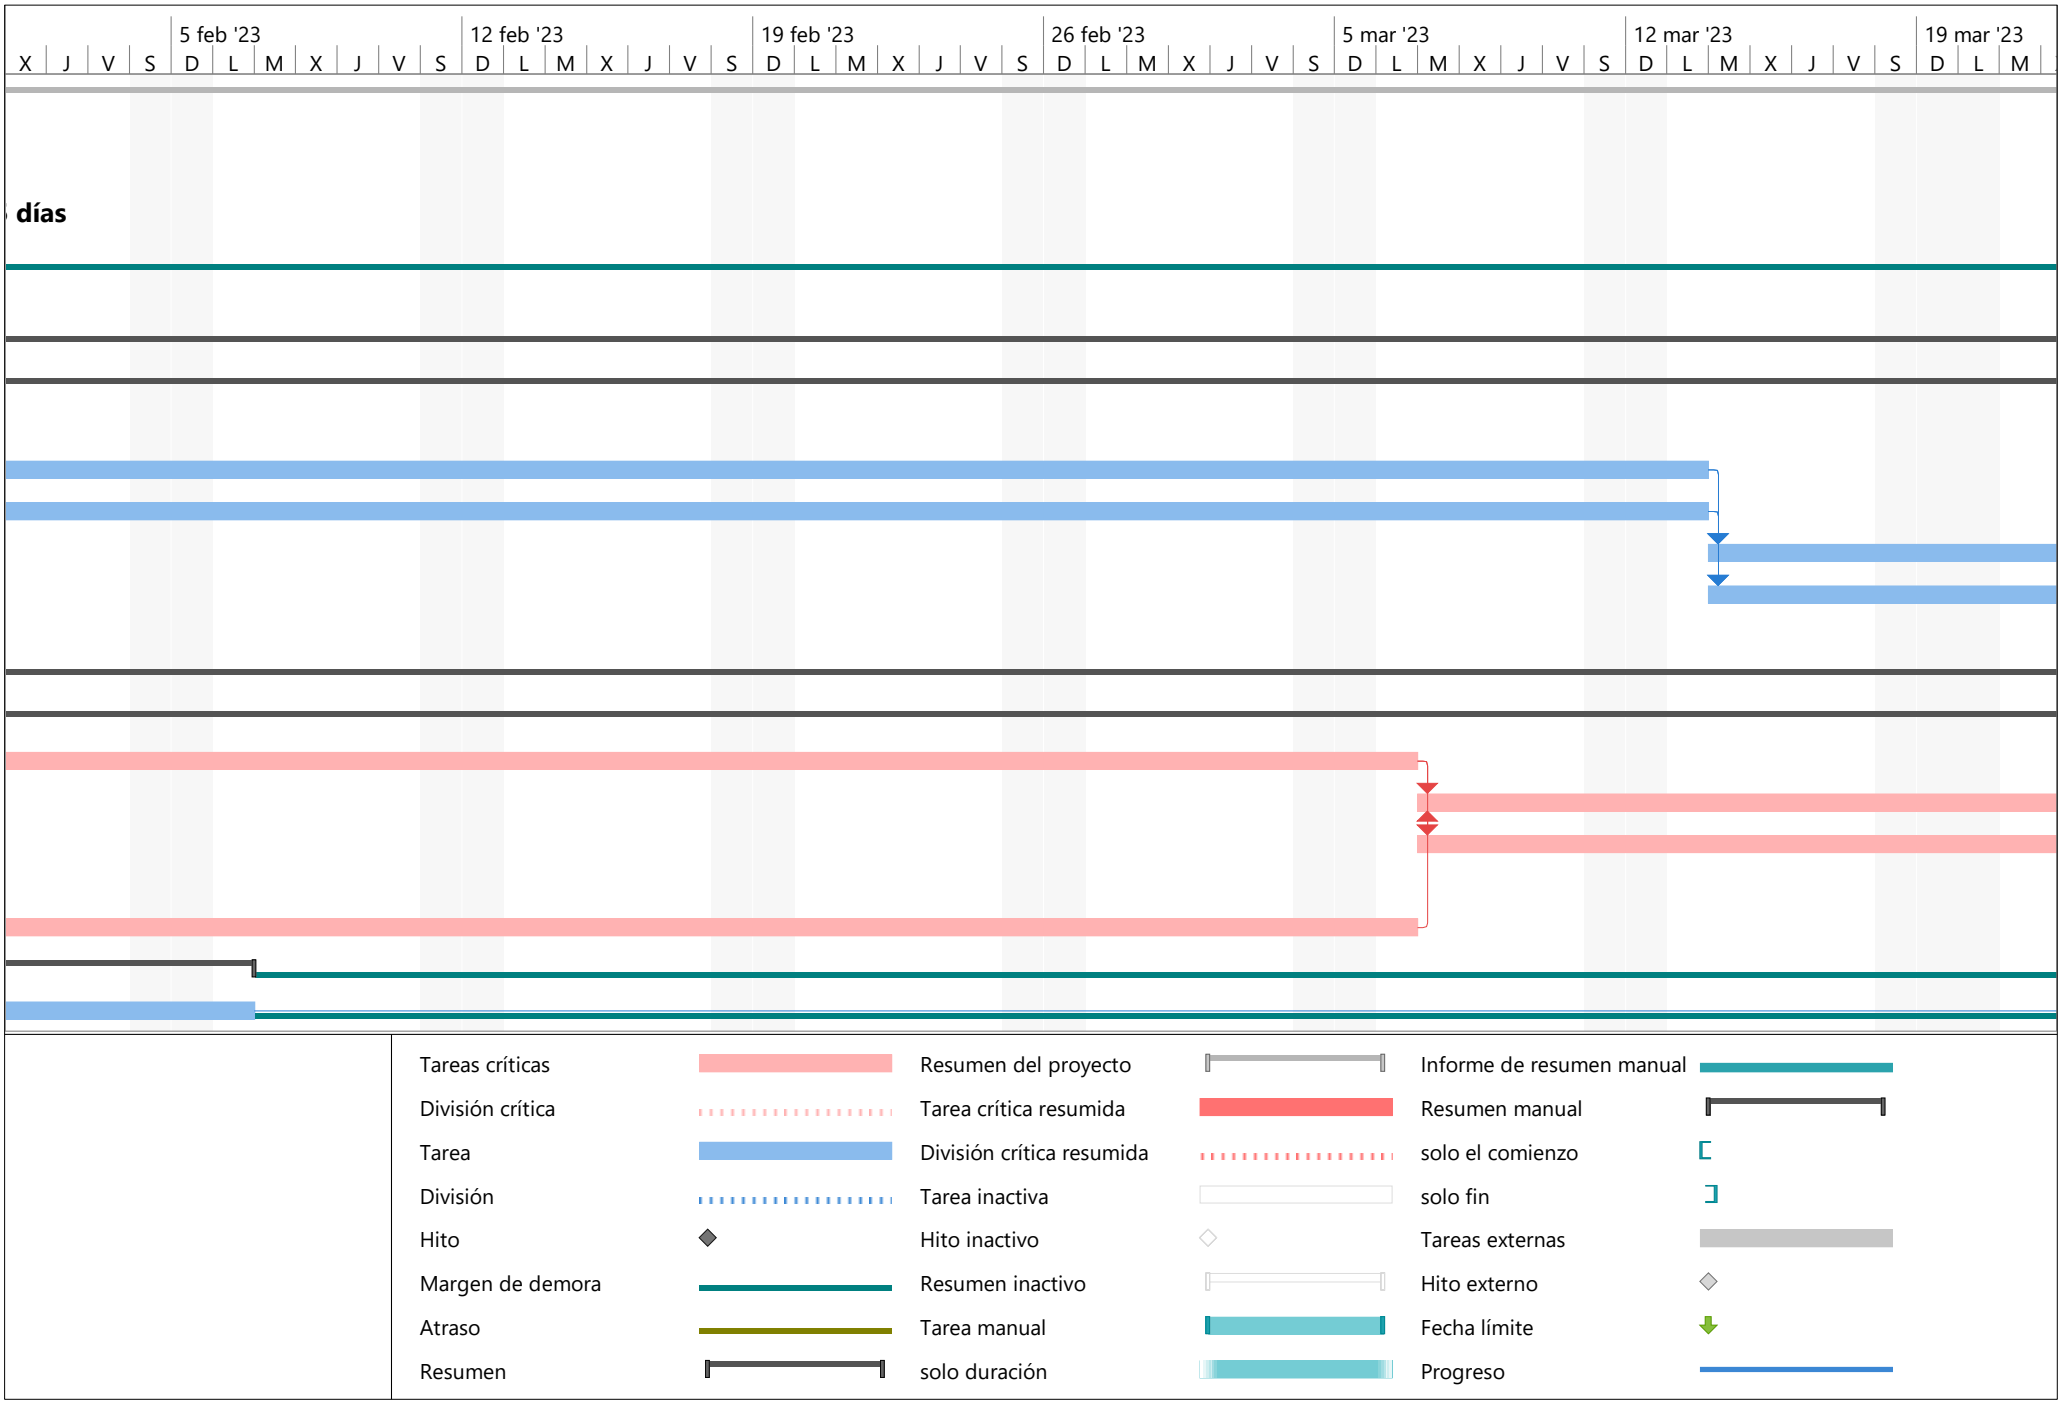

5 feb '23
12 feb '23
19 feb '23
26 feb '23
5 mar '23
12 mar '23
19 mar '23
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
días
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso



5 feb '23
12 feb '23
19 feb '23
26 feb '23
5 mar '23
12 mar '23
19 mar '23
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso

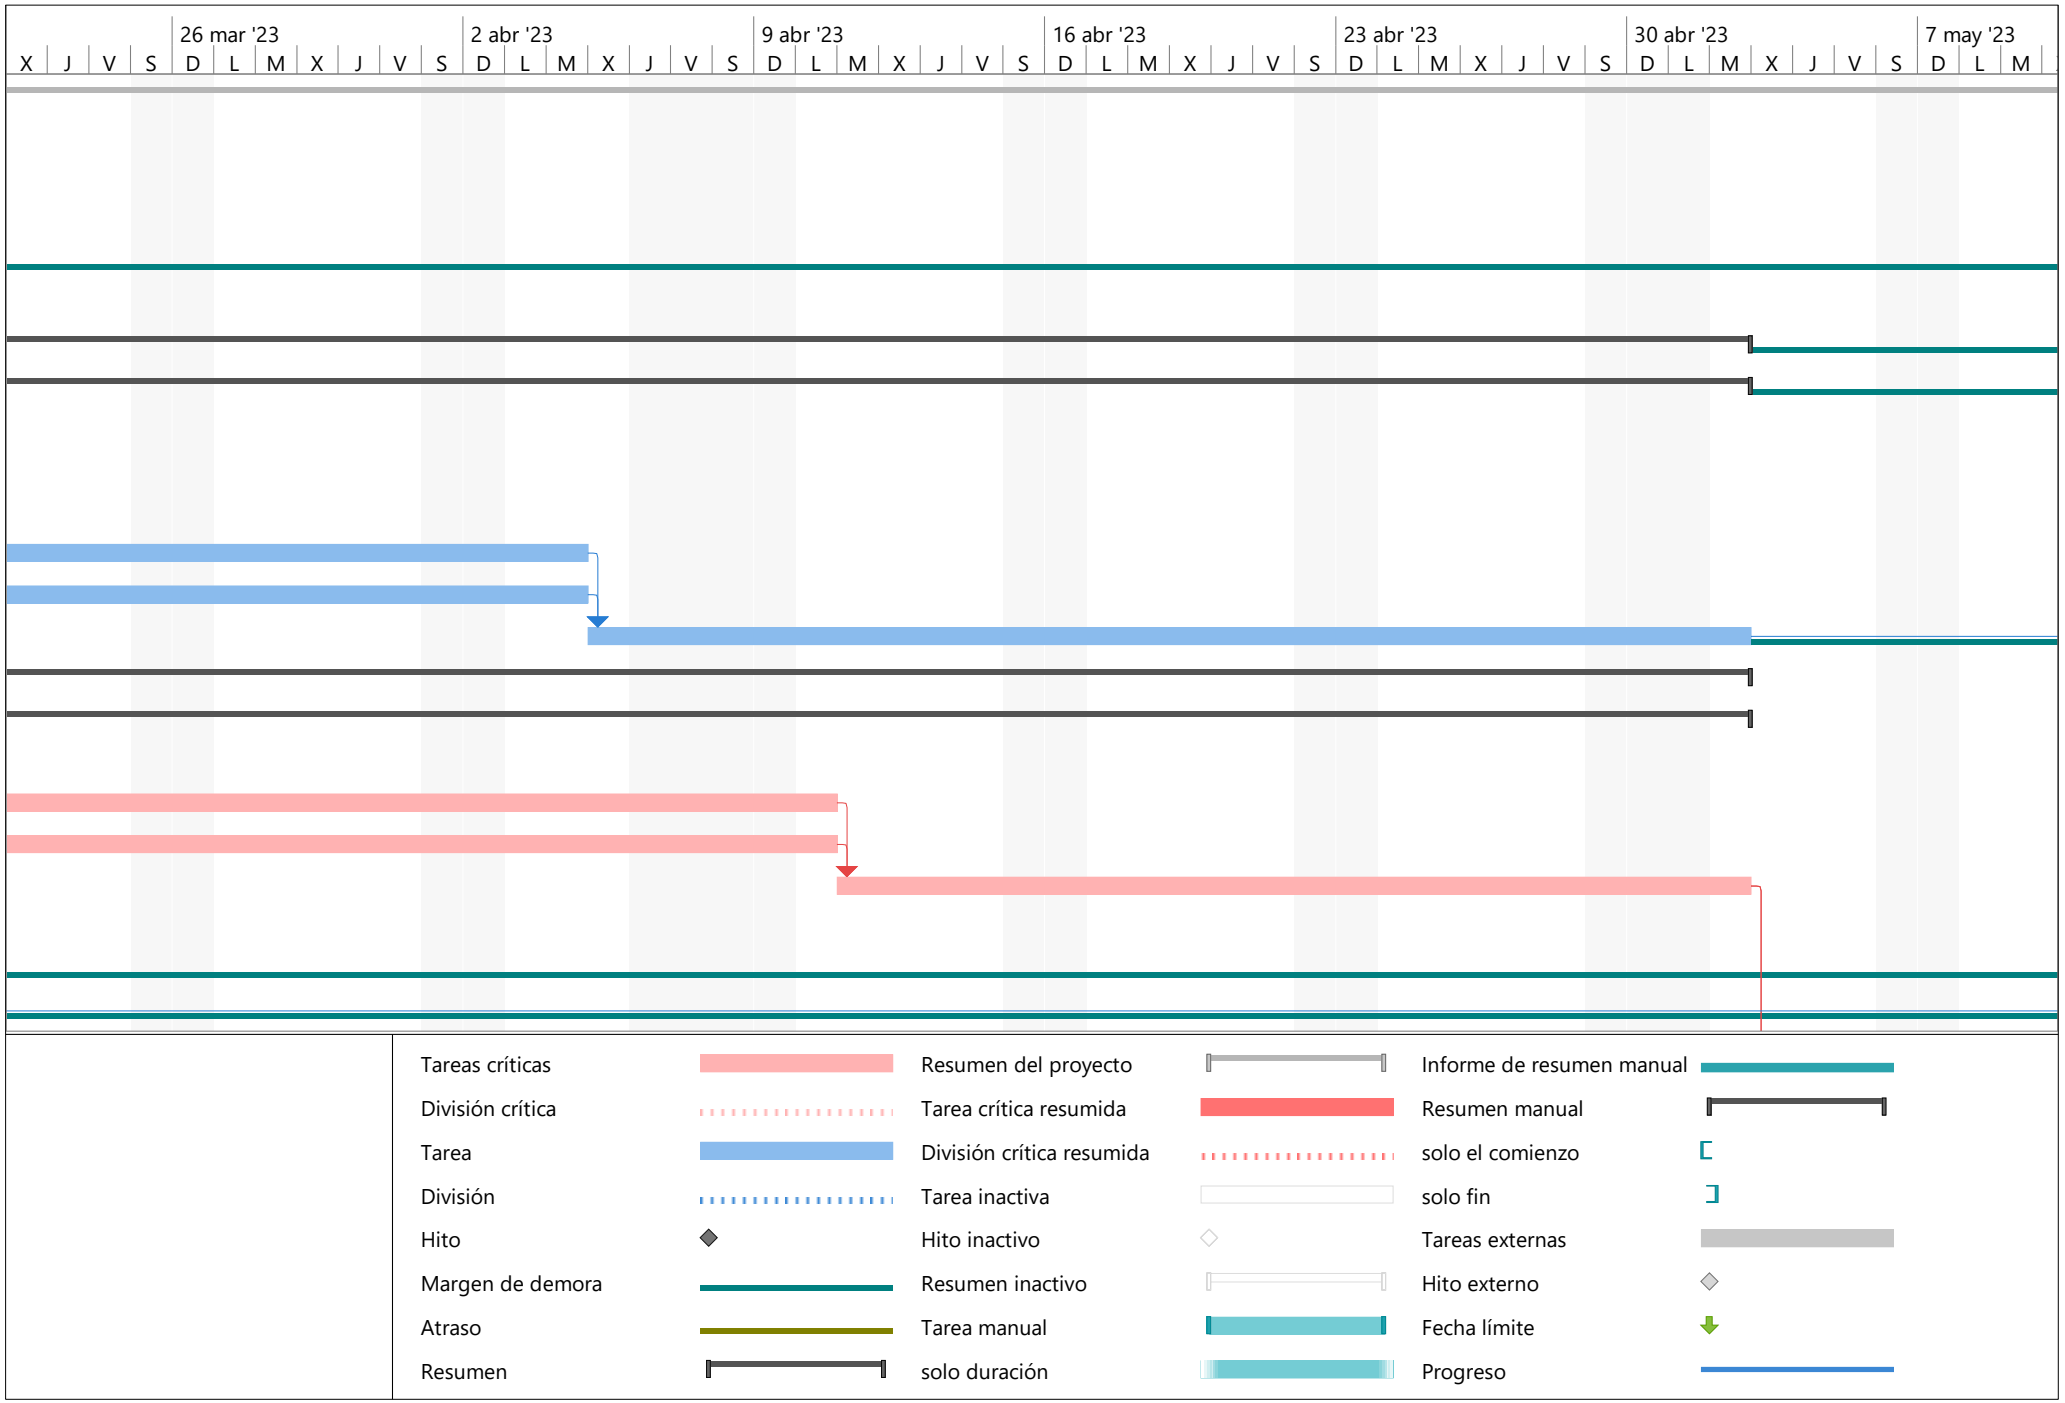
26 mar '23
2 abr '23
9 abr '23
16 abr '23
23 abr '23
30 abr '23
7 may '23
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso

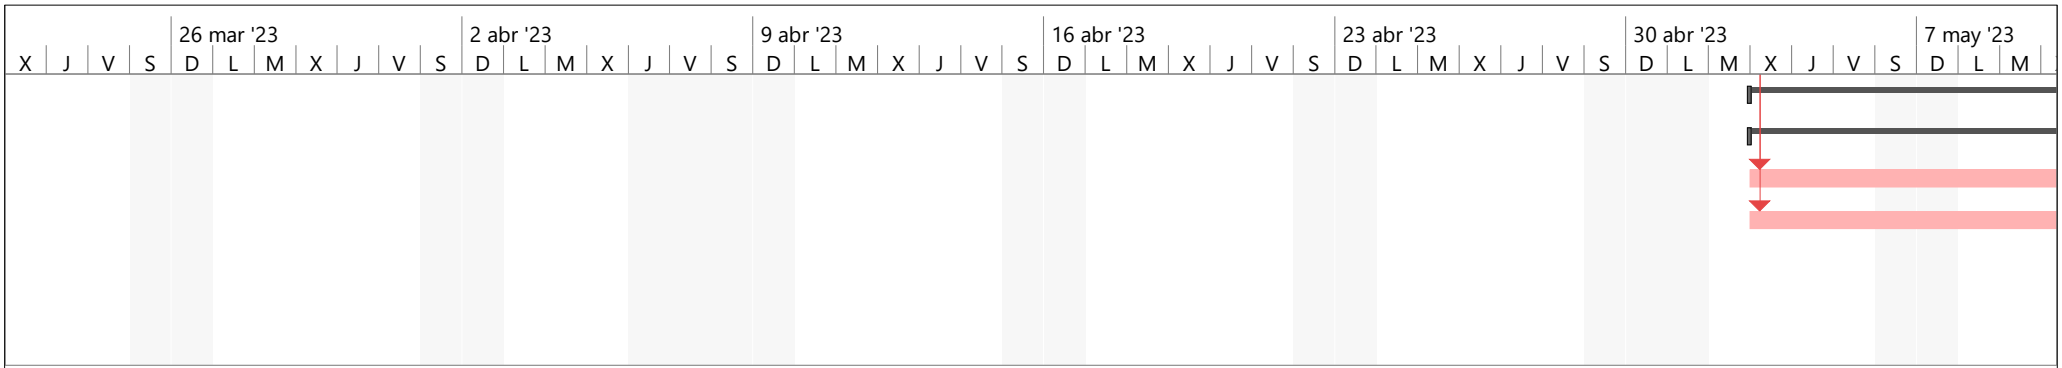

Tareas críticas		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
División crítica		Tarea crítica resumida		Resumen manual	
Tarea		División crítica resumida		solo el comienzo	
División		Tarea inactiva		solo fin	
Hito		Hito inactivo		Tareas externas	
Margen de demora		Resumen inactivo		Hito externo	
Atraso		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		solo duración		Progreso	

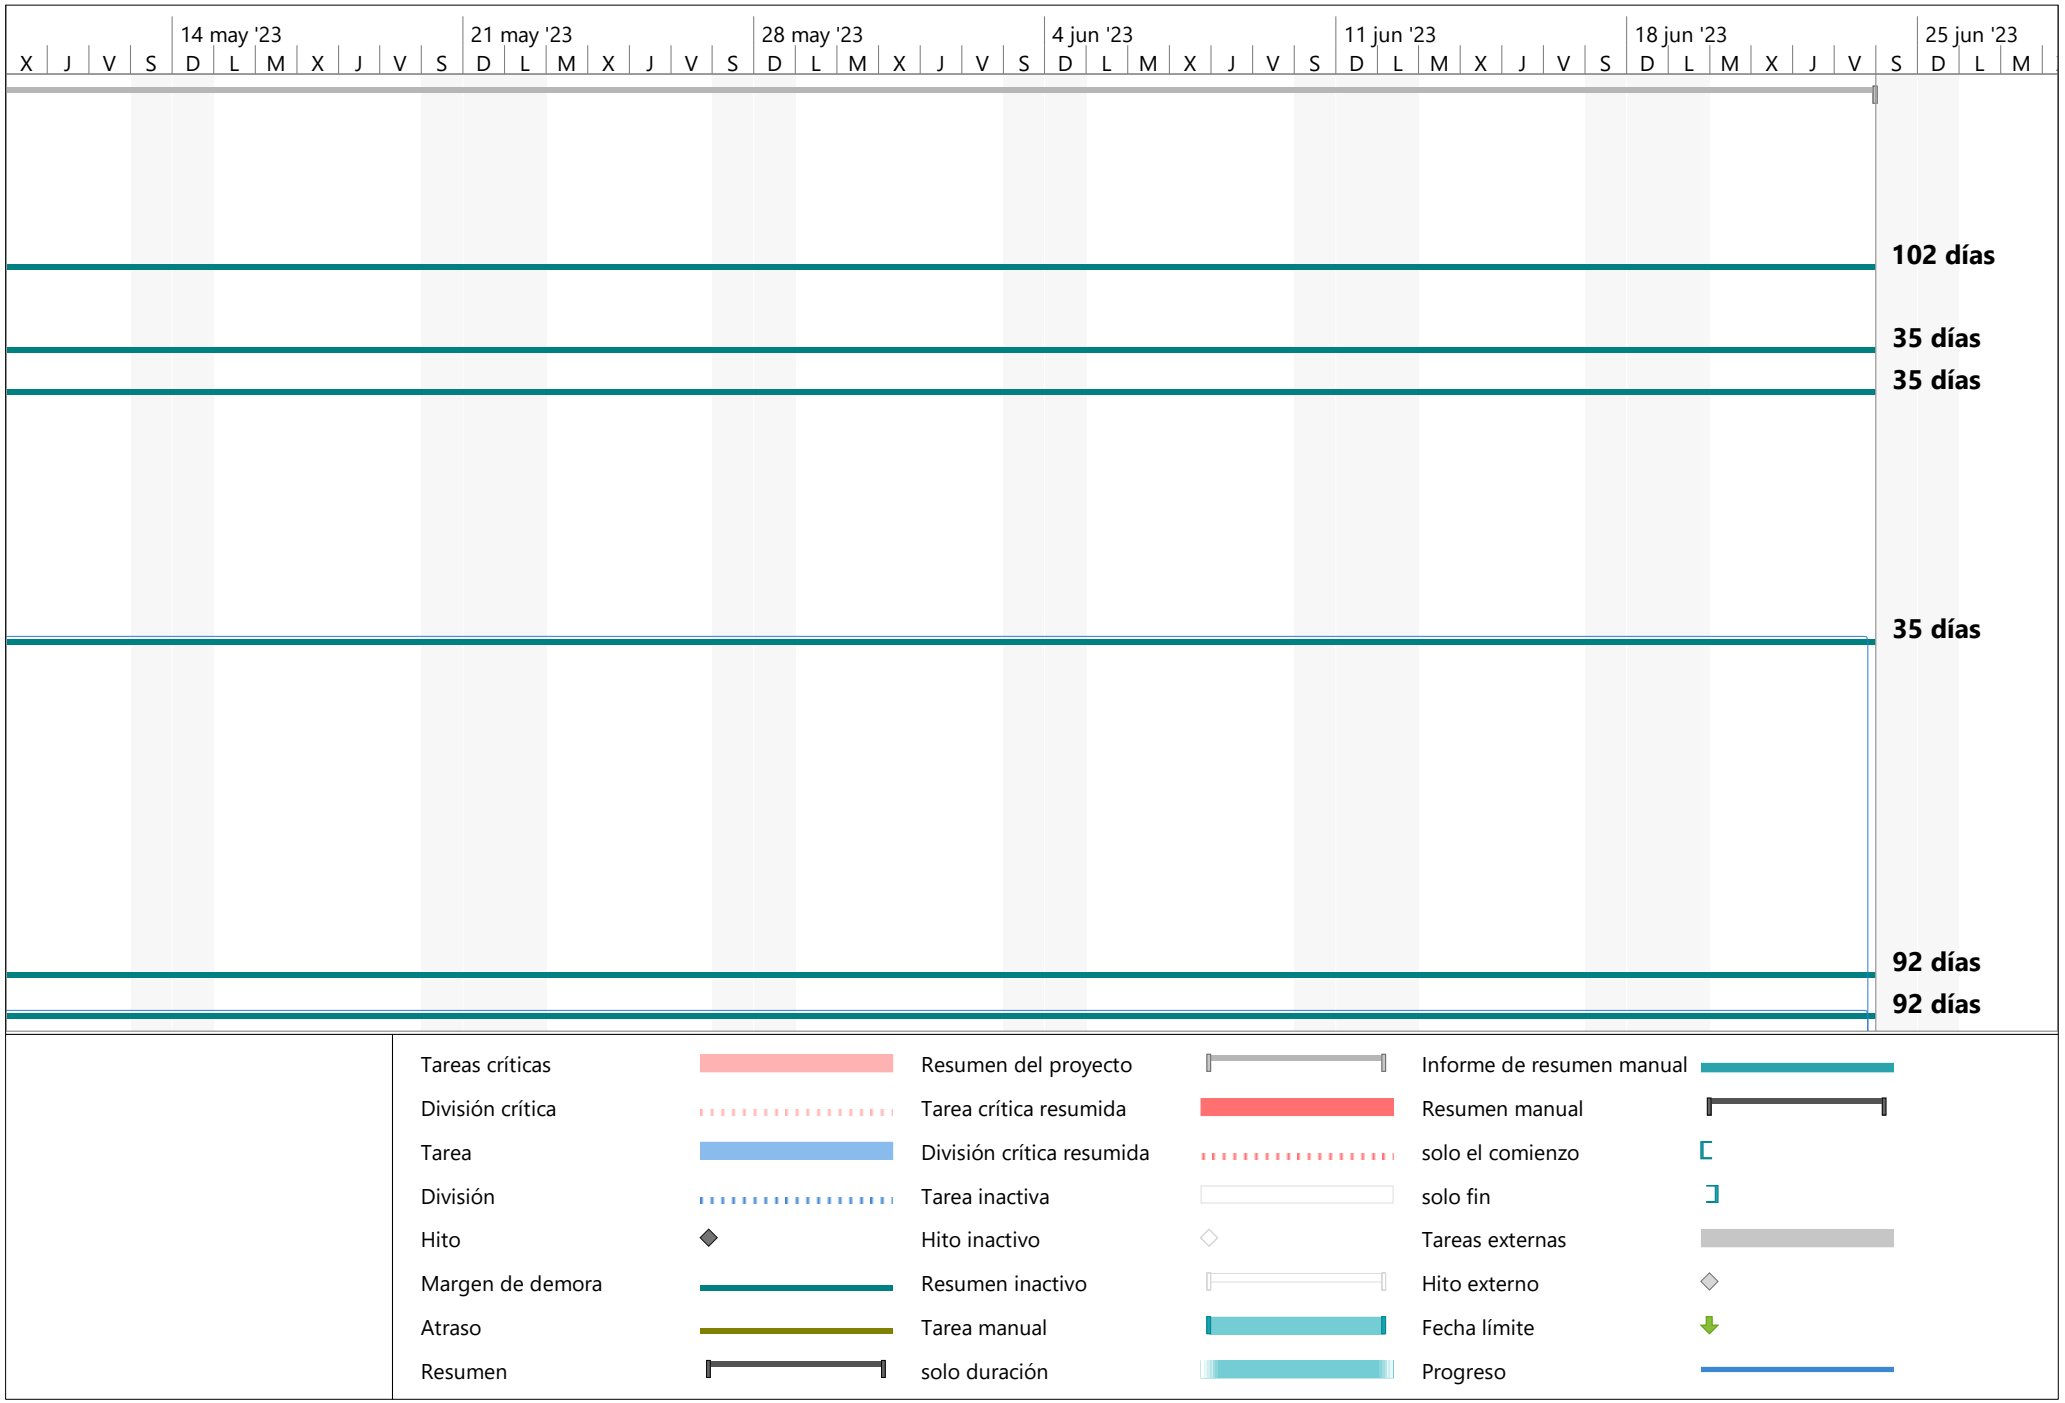
14 may '23
21 may '23
28 may '23
4 jun '23
11 jun '23
18 jun '23
25 jun '23
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
102 días
35 días
35 días
35 días
92 días
92 días
Tareas críticas
División crítica
Tarea
División
Hito
Margen de demora
Atraso
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea crítica resumida
División crítica resumida
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso

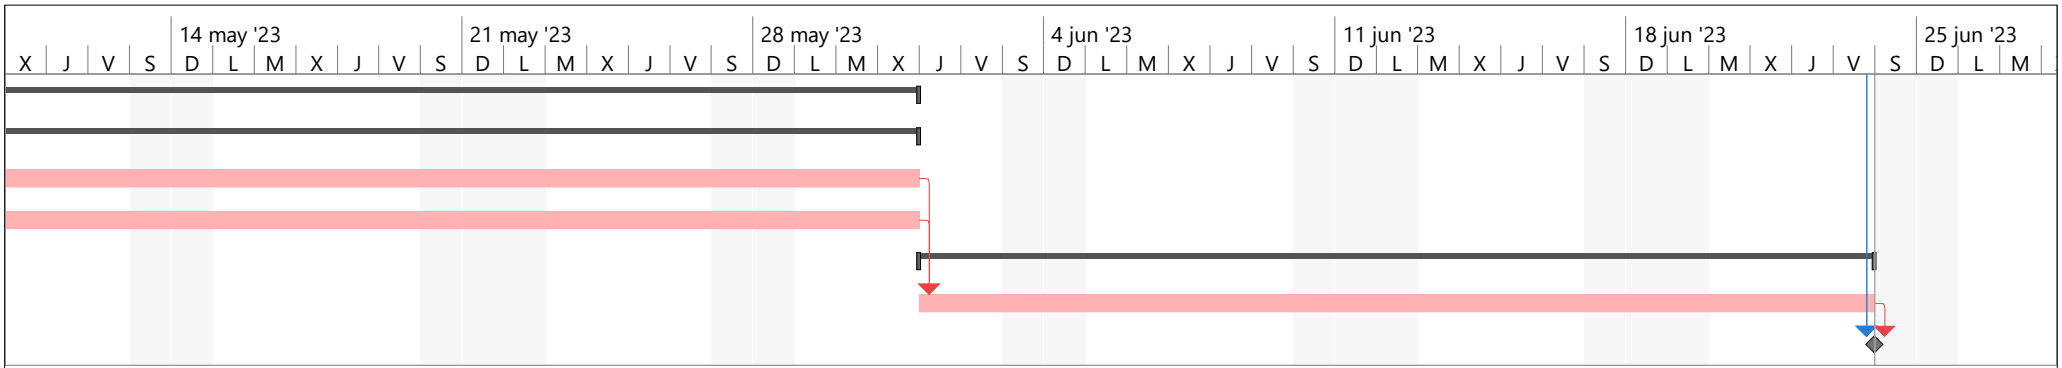

Tareas críticas		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual	
División crítica		Tarea crítica resumida		Resumen manual	
Tarea		División crítica resumida		solo el comienzo	
División		Tarea inactiva		solo fin	
Hito		Hito inactivo		Tareas externas	
Margen de demora		Resumen inactivo		Hito externo	
Atraso		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen		solo duración		Progreso	

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES,

MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 292 DE 2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL:	10 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	10 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	23/06/2022 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	23/06/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 17.086.056.743,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):**	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 17.086.056.743,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 AGOSTO DE 2022	2 SEPTIEMBRE DE 2022	3 OCTUBRE DE 2022	4 NOVIEMBRE DE 2022	5 DICIEMBRE DE 2022	6 ENERO DE 2023	7 FEBRERO DE 2023	8 MARZO DE 2023	9 ABRIL DE 2023	10 MAYO DE 2023	11 JUNIO DE 2023
GPP1 - EXPLANACIONES	$ 366.843,96	2,18%		% P	0,00%	0,00%	0,14%	0,73%	0,77%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0,00	$0,00	$23.169,93	$122.740,73	$128.877,76	$92.053,54	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				$ E											
				% E											
GPP2- ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=7m	$ 93.626,47	0,56%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,04%	0,10%	0,32%	0,06%	0,00%	0,00%
				$ P	$0,00	$0,00	$648,28	$2.160,93	$2.268,98	$6.772,99	$17.174,32	$54.417,96	$10.006,53	$176,47	$0,00
				$ E											
				% E											
GPP3- PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO PLACAS 2,5x3	$ 15.285.264,73	90,91%	0%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,27%	10,89%	53,91%	22,09%	0,76%	0,00%
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$549.244,56	$1.830.815,20	$9.064.099,09	$3.713.898,73	$127.216,15	$0,00
				$ E											
				% E											
GPP4 - TRANSPORTE	$ 968.720,57	5,76%	0%	% P	0,00%	0,00%	0,48%	1,60%	1,68%	1,68%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0,00	$0,00	$80.726,71	$269.089,05	$282.543,50	$282.543,50	$53.817,81	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				$ E											
				% E											
GPP5 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 87.366,20	0,52%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$87.366,20	$0,00
				$ E											
				% E											
GPP6 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 12.670,00	0,08%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$12.670,00
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 16.814.491,92	100%	0%												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

100%
50%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,62%	2,34%	2,46%	5,53%	11,31%	54,23%	22,15%	1,28%	0,08%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.544,92	$ 393.990,70	$ 413.690,24	$ 930.616,60	$ 1.901.807,33	$ 9.119.598,05	$ 3.723.905,27	$ 214.758,92	$ 12.670,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,62%	2,96%	5,43%	10,96%	22,27%	76,50%	98,65%	99,92%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.544,92	$ 498.535,62	$ 912.225,86	$ 1.842.842,46	$ 3.744.649,79	$ 12.863.157,84	$ 16.587.063,10	$ 16.801.821,92	$ 16.814.491,92
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.178.000,00 / $ -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.153.820,00 / $ -	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 214.233.001,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 271.564.821,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 17.086.056.743,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO			PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS			$ Valor	$ Valor
CURVAS				

OBSERVACIONES:
El contratista se encuentra en el tiempo de la presentación de documentos.

Aprueba Firma:
Nombre: CLAUDIA MARCELA IBAÑEZ MEZA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.05202228215 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: [illegible]
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 2520215487 2 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** ____

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 232 DE 2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 10 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 10 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/06/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susoensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 17.086.056.743,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 17.086.056.743,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		AGOSTO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023	MAYO DE 2023	JUNIO DE 2023
GPP1 - EXPLANACIONES	$366.844	2,18%		% P	0,00%	0,00%	0,14%	0,73%	0,77%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0,00	$0,00	$23.169,93	$122.740,73	$128.877,76	$92.055,54	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				$ E											
				% E											
GPP2- ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=7m	$93.626	0,56%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,04%	0,10%	0,32%	0,06%	0,00%	0,00%
				$ P	$0,00	$0,00	$648,28	$2.160,93	$2.268,98	$6.772,99	$17.174,32	$54.417,96	$10.006,53	$176,47	$0,00
				$ E											
				% E											
GPP3- PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO PLACAS 2,5x3	$15.285.265	90,91%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,27%	10,89%	53,91%	22,09%	0,76%	0,00%
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$549.244,56	$1.830.815,20	$9.064.090,09	$3.713.898,73	$127.216,15	$0,00
				$ E											
				% E											
GPP4 - TRANSPORTE	$968.721	5,76%		% P	0,00%	0,00%	0,48%	1,60%	1,68%	1,68%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0,00	$0,00	$80.726,71	$269.089,05	$282.543,50	$282.543,50	$53.817,81	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				$ E											
				% E											
GPP5 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$87.366	0,52%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$87.366,20	$0,00
				$ E											
				% E											
GPP6 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$12.670	0,08%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$12.670,00
				$ E											
				% E											
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 16.814.491,92	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,62%	2,34%	2,46%	5,53%	11,31%	54,23%	22,15%	1,28%	0,08%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.544,92	$ 393.990,70	$ 413.690,24	$ 930.816,60	$ 1.901.807,33	$ 9.118.508,05	$ 3.723.905,27	$ 214.758,82	$ 12.670,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,62%	2,96%	5,43%	10,96%	22,27%	76,50%	98,65%	99,92%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.544,92	$ 498.535,62	$ 912.225,86	$ 1.842.842,46	$ 3.744.649,79	$ 12.863.157,84	$ 16.587.063,10	$ 16.801.821,92	$ 16.814.491,92
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,0	$ 0,0	$0,00								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -	%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.178.000,00	$ -	%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.153.820,00	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 214.233.001,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 271.564.821,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 17.086.056.743,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: CLAUDIA MARCELA IBAÑEZ MEZA
ESSEGURO IMT
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: REDY [illegible] GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **ACTAS DE COMITÉ**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 21/10/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 232-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022, NIT. 901.613.126-9

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Dar inicio a la actividad de terraplén compacto: cumplió
Concertar mesa de trabajo entre especialistas: cumplió

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de la revisión y ajustes a los estudios y diseños
2. Actualización de Pólizas
3. Seguridad social del personal vinculado a la ejecución del proyecto
4. Socialización de formatos que debe presentar mensualmente el contratista
5. Fuentes de materiales
6. Sitio de disposición de materiales proveniente de las excavaciones y demoliciones
7. Actas de vecindad
8. Información de la meta física a la comunidad
9. Valla informativa
10. Anticipo

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance de la revisión y ajustes a los estudios y diseños: se realiza una introducción general del contrato en donde se indica que dicho contrato tiene una particularidad, puesto a que inició actividades constructivas en el mes de septiembre de 2022 debido a la emergencia invernal, en donde se está construyendo un pedraplén desde la abscisa K3+000 hacia mayores y se tiene como objetivo llegar hasta el K5+200 con esta actividad.
El contratista ya ha presentado todos los entregables producto de la etapa de revisión y/o ajustes a los diseños, por parte de la interventoría se le ha realizado observaciones a los componentes de geotecnia, al de pavimentos, al hidráulico y al componente de diseño geométrico y se está a la espera de que el contratista emita las respuestas a las observaciones, con la finalidad de poder conceptuar y si es el caso dar el visto bueno de cada uno de ellos y proceder a emitir el aval para el inicio de actividades de la estructura de pavimento. El contratista manifiesta que los especialistas están trabajando en las respuestas a las observaciones y próximamente estarían presentándolas.
2. Actualización de Pólizas: se indica que a la fecha se tienen actualizadas las pólizas según acta de inicio y se está a la espera de la aprobación de las mismas por parte del Municipio. El representante por parte del Municipio manifiesta que para la próxima semana estarían emitiendo la respectiva aprobación.
3. Seguridad social del personal vinculado a la ejecución del proyecto: se informa que el contratista ha entregado la mayoría de los soportes de afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social y está pendiente por entregar el del operador de la retroexcavadora de orugas y el de los conductores de volquetas.
4. Socialización de formatos que debe presentar mensualmente el contratista: la interventoría indica que requiere concertar una reunión con el director de obra, residente de obra o un delegado, con la finalidad de socializarles y explicarles el diligenciamiento de los formatos que deben presentar mensualmente, en los primeros días de cada mes.
El contratista pregunta como va el asunto de aclaración sobre los requisitos exigidos de los profesionales para ocupar los cargos de especialista en pavimentos y profesional SISO, dado a que en numeral 7 "INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL", del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO del proceso de licitación, no es clara la información, a lo que por parte del Municipio responden que para la próxima semana emiten la respectiva respuesta.
5. Fuente de materiales: el contratista manifiesta que no tienen definidas aún las canteras para el suministro de materiales, pero se encuentran en dialogo con diferentes canteras para tenerlas en cuenta al momento de la realización del balance de obra.
6. Sitio de disposición de materiales proveniente de las excavaciones y demoliciones: la interventoría indica que el contratista deberá radicar ante el Municipio, una solicitud de que si el Municipio cuenta con un sitio autorizado para la disposición de material de excavación y demolición. Por parte de los representantes del Municipio, se informa que si se cuenta con un sitio para tal fin.
7. Actas de vecindad: El contratista manifiesta que no ha dado inicio a la elaboración de las actas de vecindad, pero que se encuentra en la gestión de contratación de personal para realizarlas.
8. Información de la meta física a la comunidad: se indica que con anterioridad se socializó el proyecto ante la comunidad y se conformó la veeduría, quedando pendiente informar la meta física real luego de culminar la etapa preliminar de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. Se acuerda que una vez se tenga la meta física definida, se socializará con los veedores para que sean los medios trasmisores de dicha información ante la comunidad.
9. Valla informativa: la interventoría informa que está a la espera a que el Instituto Nacional de Vías-INVÍAS entregue el arte definitivo que se va a implementar en los contratos, para hacérselos llegar y le solicita al contratista que proceda a la instalación de la estructura.
10. Anticipo: el contratista informa que están haciendo el tramite de la fiducia y se está a la espera a que la aprueben. Se le pregunta a los representantes del Municipio como va el avance de la gestión del cambio de firmas, a lo cual responden que se está a la espera del banco de occidente.
Por parte del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, sugieren que se cumplan los compromisos adquiridos en este comité de obra, con la finalidad de dar celeridad a los procesos administrativos que se adelantan

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar la aprobación de pólizas según acta de inicio	25/10/2022	Municipio
Entregar soportes de pagos al Sistema general de Seguridad Social de los operadores y conductores	22/10/2022	Contratista
Emitir respuesta sobre requisitos exigidos para el cargo de especialista en pavimentos y profesional SISO	25/10/2022	Municipio
Presentar las canteras a utilizar para el suministro de materiales seleccionado	28/10/2022	Contratista
Dar inicio a la elaboración de las actas de vecindad	31/10/2022	Contratista
Cambio de firmas en los bancos	24/10/2022	Municipio

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 22/10/2022 (Día / Mes / Año)





NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CRISTIÁN ALBERTO VILLALBA MERCADO	Director de obra	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022	
JESÚS SALGADO	Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
CARLOS PEINADO CALAO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Secretario de infraestructura municipal - Supervisor del contrato de obra	MUNICIPIO DE LORICA	
ANA MILENA TORDECILLA CORRALES	Apoyo a la secretaria de infraestructura municipal	MUNICIPIO DE LORICA	

- **ACTAS DE REUNIÓN**

No se realizan acta de reunión durante el periodo

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al corte del presente informe, se tiene una inversión de obra programada del $ 361.716.710,00 correspondiente al 0,62 % y una inversión de obra ejecutada acumulada de $0,00 correspondiente al 0,0%; lo que representa un atraso del 0,62 %

Se realizó el comité de obra No. 2, en el cual se le hizo seguimiento a la ejecución del contrato de obra.

Se recomienda atender las observaciones pendientes por subsanar para culminar rápidamente la etapa de revisión y/o ajustes definitivos a los estudios y diseños

Se recomienda continuar y dar celeridad a la construcción del pedraplén, para poder atender la rápidamente la emergencia que motivó prematuramente su construcción

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
5/10/2022	OFICIO CMS-011	Entrega de los ajustes realizados a los estudios y diseños iniciales del proyecto.	Consorcio Mejoramiento Santa Lucia 2022
25/10/2022	OFICIO CMS-013	Solicitud de punto para la disposición final de material RCD.	Consorcio Mejoramiento Santa Lucia 2022
26/10/2022	OFICIO CMS-014	Notificación de estructura de drenaje con deterioro en su estructura la cual se encuentra posiblemente en garantía.	Consorcio Mejoramiento Santa Lucia 2022
29/10/2022	OFICIO CMS-015	Respuesta a observaciones realizadas a los estudios y diseños.	Consorcio Mejoramiento Santa Lucia 2022

8.1.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
5/10/2022	CVRIMG- 077 -2022	SOLCITUD PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LA REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS.	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
7/10/2022	CVRIMG- 083 -2022	Solicitud de soportes de afiliación al SGSS y pagos al día del personal vinculado a la ejecución del proyecto	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
10/10/2022	CVRIMG- 093 -2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO DE SUELOS	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
13/10/2022	CVRIMG- 099 -2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO DE PAVIMENTOS	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

13/10/2022	CVRIMG- 105 -2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO ESTRUTURAL	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
15/10/2022	CVRIMG- 107 -2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO GEOMETRICO	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022
18/10/2022	CVRIMG- 112 -2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO DE HIDROLOGIOA E HIDRAULICA	CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO – Contrato No. 232 de 2022	
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Suministro de piedra rajón para la conformación de pedraplén	Pedraplén construido
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Construcción de pedraplén	Construcción de pedraplén

REGISTRO FOTOGRÁFICO – Contrato No. 232 de 2022	
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Suministro de piedra rajón para la conformación de pedraplén	Pedraplén construido
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Pedraplén construido	Pedraplén construido

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

No se realizan actividades ambientales, sociales, prediales o de sostenibilidad durante el periodo de septiembre de 2022

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Viernes 30 de Septiembre de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: Lluvias leves.
Tarde: Seco.
Equipos:
Equipos topograficos, 1 Retroexcavadora de orugas y 5 volquetas doble troque.
Personal en obra:

Contratista	Interventoría
1. Residente de obra	1 Residente de Interventoría
1 operador de retro.	
5 Conductores de volquetas	
1 Topografo	
1 Cadenero	

Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
Observación: no se continua con la actividad de construcción de pedraplén compacto, dado a que la maquinaria en la cantera continua con daños mecánicos.

Ing. Res. Interventoría.

Sabado 01 de octubre de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: seco.
Equipos:
Equipos topograficos, 1 retroexcavadora de orugas y 5 volquetas doble troque.
Personal en obra:

Contratista	Interventoría
1. Residente de obra	1 residente de interventoría

1 Operador de retroexcavadora
5 Conductores de volquetas
1 Topografo
1 Cadenero
Actividades realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Construcción de pedraplén

Ing. Res. Interventoría.

Domingo 02 de octubre de 2022.
No se laboró por ser domigo.

Ing. Res. Interventoría.

03 de octubre de 2022.
Actividades realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Construcción de pedraplén.
Equipos y Maquinaria:
Equipos topograficos, 1 retro excavadora de oruga y 2 volquetas.
Personal en obra:
Contratista
1 Residente de obra.
1. Operador de retroexcavadora
2. Conductores de volquetas
1 Ingeniero auxiliar de obra

Interventoria
1 Residente de obra

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 04 de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: seco
Tarde: seco.
Equipos y Maquinarias
Equipos topograficos, 1 retroexcavadora de oruga y 4 volquetas.
Personal en obra:
1 Residente de obra
1 Operador de retroexcavadora
4 Conductores de volqueta
1 Ingeniero Auxiliar de obra
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Excavación de la explanación: Se realiza para sacar los baches existentes.
4. Construcción de pedraplén.

Ing. Res. Interventoria

Octubre 05 de 2022
Estado del tiempo:
Mañana. Lluvias leves. desde las 09:00 a.m hasta las 10:00 a.m
Tarde: lluvias fuertes desde las 04:00 p.m hasta las 05:00 p.m
Equipos y Maquinarias
Equipos topograficos, 1 retroexcavadora de oruga y 4 volqueta
Personal en obra:
Contratista.
1 Residente de obra.
1 operador de retroexcavadora.
4. Conductores de volquetas
1 Ingeniero auxiliar de obra

Interventoria.
1 Ing. residente de Interv.

Actividades realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Excavación de la explanación (corte con máquina).
4. Construcción de pedraplén.

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 06 de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: seco
Tarde: seco.
Observación: durante el día, se presentaron bloqueos por protestas, en la vía por donde transitan las volquetas que transportan el material de piedra rajón para la construcción del pedraplén; por tal motivo, no se desarrollaron de forma normal las actividades. El bloqueo se levanto a las 04:30p.m.
Equipos y Maquinarias:
1 retroexcavadora de orugas y 3 volquetas doble troque.
Personal en obra:

Contratista.	Interventoría.
1 Ing. Residente de obra	1. Ingeniero residente
1 operador de retroexcavadora	
3 Conductores	

Actividades realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Excavación de la explanación.
4. Construcción de Pedraplén

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 07 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: Lluvias leves desde las 03:00 a.m hasta las 04:00 a.m
Tarde: seco
Equipos y Maquinarias:
1 retroexcavadora de orugas y 3 volquetas dobletroque.
Personal en obra:
Contratista: Interventoria
1 Ingeniero residente de obra 1 Ing. Residente.
1 operador de retroexcavadora
3 conductores.
Actividades realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Retiro de baches.
4. Construcción de pedraplén

Ing. Res. Interventoria.

Octubre 08 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco
Tarde: Lluvias leves desde las 04:00 p.m hasta las 05:00 p.m
Observación: durante las horas de la mañana, se presentaron bloqueos por motivo de protestas, en la vía por donde transitan las volquetas que transportan el material de piedra rajón para la construcción del pedraplén: por tal motivo, no se desarrollaron de forma normal las actividades.
Equipos y Maquinarias:
1 retroexcavadora de orugas y 3 volquetas dobletroque.
Personal en obra: Interventoria.
Personal de obra.
1 Ingeniero residente de obra 1 Ing residente de interventoria.
1 operador de retroexcavadora

Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Construcción del pedraplén.

Ing. Res. Interventoria.

Octubre 09 de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: lluvias fuertes desde las 08:00pm hasta las 09:00 p.m.
No se laboró por ser domingo.

Ing. Res. Interventoria

Octubre 10 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco
Tarde: seco.
Equipos y Maquinarias:
1 retroexcavadora de orugas y 3 volquetas dobletroque.
Personal en obra:

Contratista	Interventoria.
1 Ing. Residente de obra	1 Ing. Residente interventoria.
1 operador de retroexcavadora	
3 conductores	

Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Construcción de pedraplén.
4. Realización de reunión.

Inge. Res. Interventoria.

Octubre 11 de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: seco
Tarde: seco.
Equipos y Maquinarias
1 retroexcavadora de orugas y 3 volquetas dobletroque.
Personal en obra:
Contratista
1 Ing. Residente de obra
1 Operador de retroexcavadora
3 Conductores.
Interventoria
1 Ing Residente de interent.

Actividades realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Construcción de pedraplén.

Ing. Res Interventoria.

Octubre 12 de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: seco
Tarde: seco - lluvias en horas de la noche desde las 10:00 p.m hasta las 11:00 p.m.
Equipos y Maquinarias:
1 retroexcavadora de orugas y 3 volquetas dobletroque.
Personal en obra.
Contratista
1 Ing. Res. de obra
1 Operador de retroexcavadora
3 Conductores
1 auxiliar de transito
Interventoria.
1 Ing. Res. de interventoria.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

3. Construcción de pedraplén

Ing. Res. Interventoria.

Octubre 13 de 2022.

Estado del tiempo:

Mañana: seco.

Tarde: seco.

Observación: Las lluvias presentadas en la noche del día anterior, colocaron en mal estado el acceso a la cantera donde se extrae el material de piedra rajón para pedraplén, por tal motivo, la actividad de construcción de pedraplén no se desarrolló de forma normal.

Equipos y Maquinarias

1 retroexcavadora de orugas y 5 volquetas doble troque.

Personal en obra:

Contratista.

1 Ing. Residente de obra.

1 Operador de retroexcavadora.

5 Conductores.

1 auxiliar de transito

Interventoría.

1 Ing. Residente de interventoría.

Actividades realizadas:

1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Construcción de pedraplén.

Ing. Res. Interventoria.

Octubre 14 de 2022

Estado del tiempo:

Mañana: Seco Tarde: Seco.

Equipos y maquinarias.

1 retroexcavadora de orugas y 5 volquetas doble troque.

Personal en obra:

Contratista

1 Residente de obra
1 operador de retroexcavadora
5 Conductores 1 auxiliar de transito.

Interventoría.

1 Ing. Residente de interventoria.
1 Ing. Director de obra
1 Ing. especialista en geotecnia.

Actividades realizadas:

1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Construcción de pedraplén.





Ing. Res. Interventoria.

Octubre 15 de 2022

Estado del tiempo:

Mañana: seco.

Tarde: seco.

Equipos y Maquinarias

2 retroexcavadora de orugas y 2 volquetas doble troque.

Personal en obra

Contratista


1 Residente de obra
1 operador de retroexcavadora.
2 Conductores
1 auxiliar de transito


Interventoria

1 Ing. Res. Interventoria.

Actividades realizadas:

1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Construcción de pedraplén





Ing. Res. Interventoria.

Octubre 16 de 2022

Estado del tiempo:

Mañana: seco

Tarde: Seco
No se laboró por ser domingo.

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 17 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: seco
No se laboró por ser festivo.

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 18 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: seco.
Equipos y Maquinarias:
1 Retroexcavadora de orugas y 3 volquetas doble troque.
Personal en obra:

Contratista.	Interventoría.
1 Ing. Residente de obra	1 Residente de interventoría.
1 Operador de retroexcavadora.	
3. Conductores	
1 auxiliar de transito.	

Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Construcción de pedraplén

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 19 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: seco.
Equipos y Maquinarias:
1. Retroexcavadora de orugas y 4 volquetas doble troque.
Personal en obra:
Contratista.
1. Ing. Residente de obra
1 Operador de retroexcavadora
4 Conductores de volquetas
1 auxiliar de transito
Interventoria
1 Ing. Res. Interventoria.
Actividades realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Construcción de Pedraplén

Ing. Res. Interventoria.

Octubre 20 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco
tarde: seco
Equipos y maquinarias:
1 retroexcavadora de orugas y 3 volquetas doble troque.
Personal en obra.
Contratista.
1 Ing. Residente de obra
1 Operador de retroexcavadora.
3 Conductores de volquetas.
1 Auxiliar de transito
Interventoria
1 Ing. Res. Interventoria.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

3. Construcción de pedraplén.

Ing. Res. Interventoría.

Octubre 21 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: Lluvias fuertes desde las 03:00 a.m hasta las 04:00 a.m y lluvias leves desde las 04:00 a.m hasta las 05:00 a.m.
Tarde: Seco.
Observación: Las lluvias presentadas no permitieron el desarrollo normal de las actividades.
Equipos y Maquinarias:
1 retroexcavadora de orugas y 3 volquetas doble troque
Personal en obra.

Contratista.	Interventoría.
1 operador de retroexcavadora	1 Ing. Residente de interventoría
1 Ingeniero residente de obra.	
3 conductores de doble troque.	
1 auxiliar de transito	

Actividades realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Construcción de pedraplén.
4. Comité de obra No. 2.

Octubre 22 de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Lluvias fuertes desde las 04:00 a.m hasta las 06:00 a.m
Tarde: Seco.
Observación: Las lluvias presentadas no permitieron el desarrollo normal de las actividades.

Equipos y Maquinarias:
1 retroexcavadora de orugas y 3 volquetas dobletroque.
Personal en obra:
Contratista.
1 Operador de retroexcavadora
1 Ingeniero residente de obra
3 conductores
1 auxiliar de transito
Interventoria.
1 Ingeniero Res. Interventoria
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Construcción de pedraplén.

Ing. Res. Interventoria.

Octubre 23 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana:
Tarde:
No se laboró por ser domingo.

Ing. Res. Interventoria.

Octubre 24 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco
Tarde: seco Noche: lluvias intensas desde las 10:30 p.m hasta las 12:00 p.m.
Equipos y Maquinarias:
1 Retroexcavadora de orugas y 2 volquetas dobletroque
Personal en obra
Contratista
Interventoria

1 operador de retroexcavadora
1 Ingeniero residente de obra
2 conductores volqueta
1 auxiliar de transito
1 Ing. residente.

Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa
3. Construcción de Pedraplén.

Octubre 25 de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: seco
Tarde: seco.
Herramientas, equipos y maquinarias:
1 Retroexcavadora de oruga → A
2 volquetas doble troque → A
Personal en obra
Contratista
1 Ing. Residente de obra
1 Operador de maquinaria.
2 Conductores de volqueta.
1 auxiliar de tránsito
Interventoria.
1 Ingeniero residente
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Construcción de pedraplén.

Octubre 26 de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: Lluvias intensas desde la 03:00 am hasta las 05:00 a.m y lluvias leves desde las 05:00 a.m hasta las 07:30 a.m.
Observación: Las lluvias presentadas saturaron el terreno donde se ejecutan las actividades; además, impidieron que las volquetas tuvieran acceso a la cantera, por tal motivo, no se pudo laborar en este día.
No se laboró por las fuertes lluvias presentadas.

Octubre 27 de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Lluvias leves desde las 08:30 a.m hasta las 11:00 a.m
Tarde: seco
Herramientas, equipos y maquinarias
1 Retroexcavadora de orugas →A
3 volquetas doble troque →A
Personal en obra:

Contratista:	Interventoría
1 Ing Residente de obra	1 Ingeniero residente
2 operador de maquinaria	
3 conductores de volqueta	
1 auxiliar de transito	

Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Construcción de pedraplén

28 de octubre de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: Seco.
Tarde: Seco.
Herramientas, equipos y maquinarias.
1 Retroexcavadora de orugas → A
3 volquetas doble troque → A
Personal en obra:
1 Ingeniero residente de obra.
1 Operador de maquinaria
3 Conductores de volquetas
1 auxiliar de transito

Interventoria.
1 Ing. Residente.

Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Construcción de pedraplén.

29 de octubre de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco
Tarde: Seco
Herramientas, equipos y maquinaria.
1 Retroexcavadora de orugas → A
3 Volquetas doble troque → A.
Personal en obra.
Contratista.
1 Ingeniero residente de obra.
1 Operador de Maquinaria.
3 Conductores de volquetas
1 auxiliar de transito

Interventoria.
1 Residente de interventoria.

Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

3. Construcción de pedraplén

30 de octubre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: seco.
No se laboró por ser domingo.

31 de octubre de 2022.
Estado del tiempo:
Mañana: seco.
Tarde: seco.
Herramientas, equipos y maquinarias
1 Retroexcavadora de orugas → A
3 volquetas dobletroque → A

Personal en obra
1 Ing. Residente de obra
1 Operador de maquinaria.
3 Conductores de volquetas.
1 auxiliar de transito.

Interventoría
1 Ing. Residente de int.

Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Construcción de pedraplén.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 162 de 2022 **Contratista:** CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

INFORME MENSUAL No. TRES (3) **MES O PERIODO:** OCTUBRE DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	285
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	287
1	**INTRODUCCIÓN**		289
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		290
2.1	Localización		290
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		291
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		291
2.4	Características técnicas del proyecto		292
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		294
3.1	Información general del contrato		294
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		294
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		295
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		295
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		296
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	297
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	308
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	310
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	314
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	371
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	323
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	325
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	335
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		337
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	340
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	342
	• Seguimiento Programa de Obra		344
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	347
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	349
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	351
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	354
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		735
5.1	Información general del contrato		735
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		735
5.3	Informes especialistas y profesionales		739
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		922
5.5	Informe matriz de riesgos.		923
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		924
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		927
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	928
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	931
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	940
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	942
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	949
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		951
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	953
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	955
7	**Conclusiones y recomendaciones**		355
8	**Anexos**		356
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		357
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		362
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		362
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		364

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** OCTUBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 162 de 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO: 26/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/01/2023
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 969.845.590,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 969.845.590,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	625
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 942.314.486,55		$ 942.314.486,55
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ 7.206.981,40	1.369.326,00	$ 8.576.307,40
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) INCLUYE IVA	$ 15.928.400,00	3.026.396,00	$ 18.954.796,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 965.449.867,95	4.395.722,00	$ 969.845.590,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 146.656.769,87
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento topográfico realizado por la interventoría y contratista



Levantamiento topográfico realizado por la interventoría y contratista

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de Sahagún, mediante el convenio interadministrativo No. 1776 de 2021, es por ello que mediante el **Proceso L.P-002-2022** se celebra el Contrato de Obra No. 162 de 2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL", El cual fue adjudicado al CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022, cuyo plazo inicial es de cinco (5) meses a partir del 26 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 969.845.590,00.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 30 de octubre de 2022; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en la zona rural del municipio de Sahagún, exactamente en la vía acceso al corregimiento Arena del Norte.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, Ubicación del Municipio de Sahagún Córdoba.

El Municipio de Sahagún está ubicado en la parte nororiental del departamento de Córdoba, y su cabecera municipal se encuentra localizada a los 08º 56´ 58" de latitud norte y 75º 26´ 52" de longitud oeste. Se encuentra a 71 Km de la capital del departamento; a una altura de 75 m.s.n.m. y una temperatura media de 26.9ºC.



Ilustración 3. Vía Acceso Arenas del Norte - Sahagún.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

La fuente de materiales empleada por el contratista es la ubicada en el corregimiento de Berasategui, entrando a la Balsa, en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. La cual cuenta con permiso minero y licencia ambiental.



Ilustración 4. Fuente de materiales - Las Balsas.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

El municipio de Sahagún que gracias a la ejecución del contrato de obra No. 162 de 2022, se beneficia principalmente la zona rural conformada por el de Arenas del Norte.

2.2.2. . BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Inicialmente la vía presenta dificultad en la movilidad, debido a su mal estado, el cual se ocasiona por el alto deterioro de la superficie de rodadura, el drenaje superficial que es deficiente. Es por ello que se realiza el mejoramiento en la vía de acceso al corregimiento

ARENAS – NORTE, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos. En la ilustración 20 se puede observar el estado inicial de la vía.

	
Estado inicial de la vía, 02/09/2022	Levantamiento en conjunto Interventoría – Contratista – 31/10/2022
	
Estado inicial de la vía, 02/09/2022	Levantamiento en conjunto Interventoría – Contratista – 31/10/2022

Ilustración 4. Estado inicial de la Vía. Cto 162 de 2022.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizará la construcción de 1450 metros de placa huella con un ancho de 6,10 metros.

Contrato 162 de 2022	
Sistema	Placa Huella
Longitud	1450 metros
Ancho Calzada	6,1 metros
Losa de concreto	0,15 metros
Subbase	0,15 metros

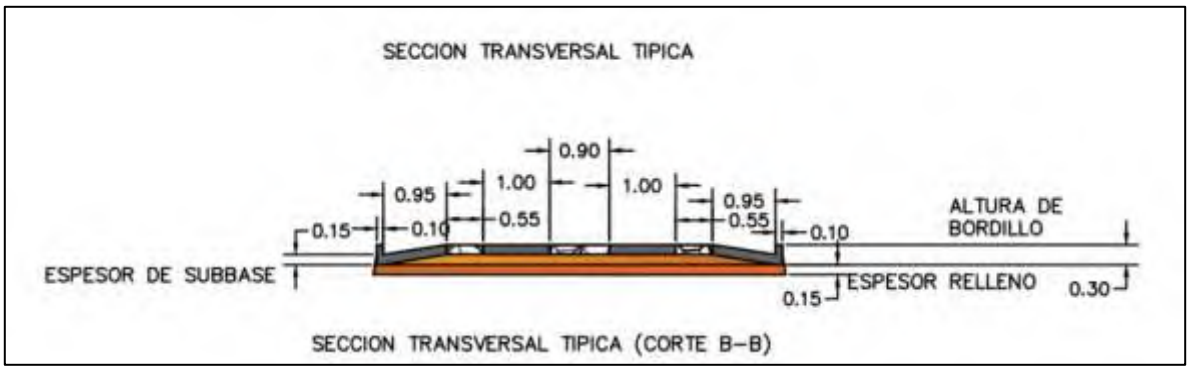


Ilustración 5. Sección Tipo Placa Huella.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-002-2022
CONTRATO No.	162 de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/06/2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"
CONTRATISTA	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
NIT	901595911-6
INTEGRANTES	• CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ • NIT. 900.793.402-4 • Participación: 95% 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ • 901.418.309-4 • Participación: 5%
DIRECCIÓN	Calle 18 No: 1J – 33, Sahagún - Córdoba, Córdoba
TELEFONO	(+57) 301 760 7304
CORREO	consorcioruralsahagunce@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 969.845.590,00
PLAZO INICIAL	5 MESES
FECHA INICIO	26/08/2022
FECHA TERMINACIÓN	26/02/2023

Tabla 1. Información Cto. 162 de 2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
ii. Se inicia la elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA.

3.2.1. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El especialista ambiental del contratista en conjunto con nuestro especialista ambiental, se encuentran trabajando en la elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA.

3.2.2. GESTIÓN SOCIAL

i. El día 27 de octubre de 2022 se realizó la socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

3.2.3. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos para ninguno de los contratos de obra a cargo de esta interventoría.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

I. A la fecha, se tiene una inversión de obra programada de $ 146.656.769,87 correspondiente al 15,56% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $0,00 correspondiente al 0,0%; lo que representa un atraso del 15,56%.Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
II. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista
III. Coordinar mesas de trabajo entre los especialistas tanto del contratista de obra como de la Interventoría para agilizar la aprobación de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

I. Informe semanal No.07, del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2022
II. Informe semanal No.08, del 07 al 13 de octubre de 2022
III. Informe semanal No.09, del 14 al 20 de octubre de 2022
IV. Informe semanal No.10, del 21 al 27 de octubre de 2022
V. Informe semanal No. 11, del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 7 del 30/09/2022 al 06/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizará la construcción de 625 metros de placa huella y un (1) Box Coulvert de sección 2x2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, tiene como alcance adelantar las actividades de mejoramiento en la vía ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022, NIT. 901595911-6

INTEGRANTES:
1. CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ, Participación: 95%
2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, Participación: 5%

CONTRATO No. 162 de 2022
FECHA DE INICIO: 8/26/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 1/26/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/26/2023

VALOR INICIAL: $ 969,845,590.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 969,845,590.00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 8/22/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 12/31/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/31/2024

VALOR INICIAL: $ 4,564,284,660.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4,564,284,660.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 942,314,487.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	km	0.625			Prog					
					Ejec					
Afirmado	Km	0.625			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular (Km)	Km	0.625			Prog					
					Ejec					
Placa Huella (Km)	Km	0.625			Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Berastegui, Municipio de Ciénaga de Oro	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: : El contratista presentó la fuente de materiales seleccionados

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado. .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En comité de obra No. 1, el contratista manifiestó que la oficina de atención al usuario estará ubicada en el campamento de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión de oficio emitido por el contratista, de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Levantamiento topográfico por la interventoría

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Se encuentra en proceso la aprobación de la programación de obra. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento topográfico realizado por interventoría



Levantamiento topográfico realizado por interventoría

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar comité de seguimiento de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO

Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 8 del 7/10/2022 al 13/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizará la construcción de 625 metros de placa huella y un (1) Box Coulvert de sección 2x2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, tiene como alcance adelantar las actividades de mejoramiento en la vía ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022, NIT. 901595911-6

INTEGRANTES: 1. CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ, Participación: 95%; 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, Participación: 5%

CONTRATO No. 162 de 2022 — VALOR INICIAL: $ 969.845.590,00

FECHA DE INICIO: 26/08/2022 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 26/01/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 969.845.590,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 26/01/2023 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%); 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%); 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022 — **VALOR INICIAL:** $ 4.564.284.660,00

FECHA DE INICIO: 22/08/2022 — **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — **VALOR ACUMULADO:** $ 4.564.284.660,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — **VALOR ANTICIPO:** $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 942.314.487,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	625			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	625			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular (Km)	m	625			Prog					
					Ejec					
Placa Huella (Km)	m	625			Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Berastegui, Municipio de Ciénaga de Oro	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: : El contratista presentó la fuente de materiales seleccionados

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En comité de obra No. 1, el contratista manifiestó que la oficina de atención al usuario estará ubicada en el campamento de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión de oficio emitido por el contratista, de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento topográfico realizado por interventoría



Levantamiento topográfico realizado por interventoría

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Hacer seguimiento a los compromisos. 2. Revisar información entregada por el contratista 3. Gestionar la bitácora de obra 4. Realizar comité de seguimiento de obra	FIRMA NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 9 del 14/10/2022 al 20/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizará la construcción de 625 metros de placa huella y un (1) Box Coulvert de sección 2x2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, tiene como alcance adelantar las actividades de mejoramiento en la vía ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022, NIT. 901595911-6

INTEGRANTES: 1. CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ, Participación: 95%; 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, Participación: 5%

CONTRATO No. 162 de 2022 — VALOR INICIAL: $ 969.845.590,00

FECHA DE INICIO: 26/08/2022 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 26/01/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 969.845.590,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 26/01/2023 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%); 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%); 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022 — **VALOR INICIAL:** $ 4.564.284.660,00

FECHA DE INICIO: 22/08/2022 — **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — **VALOR ACUMULADO:** $ 4.564.284.660,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — **VALOR ANTICIPO:** $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 942.314.487,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 43.501.789,48	4,62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (43.501.789,48)	-4,62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 43.501.789,48	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (43.501.789,48)	-4,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 28.290.609,48	3,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	km	0,625			Prog					
					Ejec					
Afirmado	Km	0,625			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular (Km)	Km	0,625			Prog					
					Ejec					
Placa Huella (Km)	Km	0,625			Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Berastegui, Municipio de Ciénaga de Oro — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO (DISPONIBLE)

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: : El contratista presentó la fuente de materiales seleccionados

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado. .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En comité de obra No. 1, el contratista manifiestó que la oficina de atención al usuario estará ubicada en el campamento de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión de oficio emitido por el contratista, de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento topográfico realizado por interventoría



Levantamiento topográfico realizado por interventoría

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Hacer seguimiento a los compromisos. 2. Revisar información entregada por el contratista 3. Gestionar la bitácora de obra	FIRMA NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 10 del 21/10/2022 al 27/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizará la construcción de 625 metros de placa huella y un (1) Box Coulvert de sección 2x2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, tiene como alcance adelantar las actividades de mejoramiento en la vía ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022, NIT. 901595911-6
INTEGRANTES:	1. CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ, Participación: 95% 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, Participación: 5%
CONTRATO No.	162 de 2022
FECHA DE INICIO:	26/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	26/01/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	26/01/2023

VALOR INICIAL:	$ 969.845.590,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 969.845.590,00
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7
INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)
CONTRATO No.	971 de 2022
FECHA DE INICIO:	22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024

VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 942.314.487,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 83.240.807,59	8,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (83.240.807,59)	-8,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.240.807,59	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (83.240.807,59)	-8,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.739.018,11	4,22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	625,0			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	625,0			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular (Km)	m	625,0			Prog					
					Ejec					
Placa Huella (Km)	m	625,0			Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1			Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Berastegui, Municipio de Ciénaga de Oro

		DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: : El contratista presentó la fuente de materiales seleccionados

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Elaboración del documento PAGA

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado. .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: el día 27 de octubre de 2022 se realizó la socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías -INVIAS

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se está elaborando el documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra física

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización del proyecto



Socialización del proyecto



Socialización del proyecto

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 11 del 28/10/2022 al 3/11/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizará la construcción de 625 metros de placa huella y un (1) Box Coulvert de sección 2x2.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto, tiene como alcance adelantar las actividades de mejoramiento en la vía ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022, NIT. 901595911-6

INTEGRANTES: 1. CONSTRUAPOYO LP S.A.S, R/L LUÍS ALBERTO PACHECO DÍAZ, Participación: 95%; 2. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S, R/L EVA SANDRIT PINEDA VASQUEZ, Participación: 5%

CONTRATO No.	162 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 969.845.590,00
FECHA DE INICIO:	26/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	26/01/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 969.845.590,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	26/01/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%); 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%); 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 942.314.487,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 146.656.769,87	15,56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (146.656.769,87)	-15,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 146.656.769,87	15,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	-
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (146.656.769,87)	-15,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 63.415.962,28	6,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 15,56% Avance o Atraso Físico %: -15,56%

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	625			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	625			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular (Km)	m	625			Prog					
					Ejec					
Placa Huella (Km)	m	625			Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1			Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Berastegui, Municipio de Ciénaga de Oro

		DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: : El contratista presentó la fuente de materiales seleccionados

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Elaboración del documento PAGA

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado. .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: el día 27 de octubre de 2022 se realizó la socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoria e Instituto Nacional de Vías -INVIAS

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se está elaborando el documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Replanteo topográfico en conjunto entre la interventoría y contratista

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Dar inicio a las actividades constructivas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra física

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento en conjunto Interventoría - Contratista



Levantamiento en conjunto Interventoría - Contratista



Levantamiento en conjunto Interventoría - Contratista

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: octubre de 2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO No. 162 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El formato no se encuentra diligenciado dado que el contrato se encuentra en la etapa de estudios y diseños y por tanto la maquinaria no ha sido trasladada a campo

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: : LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 25202-143957 CND

Firma
Nombre: ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 162 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	AURA JARABA MUÑOZ	1068136089	PALETERA	$ 1.000.000																													X	X	CRS-CE 2022	$ 66.667,00	$ 4.700,00		MUTUAL SER	7859428111	$ 2.700,00	PROTECCION	7859428111	$ 10.700,00	$ 2.700,00			
2	MARIA NELA GUERRERO	1068136896	PALETERA	$ 1.000.000																													X	X	CRS-CE 2022	$ 66.667,00	$ 4.700,00		NUEVA EPS	7859428111	$ 2.700,00	PROTECCION	7859428111	$ 10.700,00	$ 2.700,00			
3	Erwin Polo Osorio	1007801333	ESPECIALISTA	$ 1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UTRL-CE 2022	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00		NUEVA EPS	7858603521	$ 40.000,00	PORVENIR	7858603521	$ 160.000,00	$ 40.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:LUIS ALBERTO PACHECO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202143957 CND

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ ARGALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901595911
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAHAGUN	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 18 N1 J 33	TELÉFONO:	3017607
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7859428111**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	12				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1757297412

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 21.400	$ 300	$ 21.700
SUBTOTALES:										**$ 21.400**	**$ 300**	**$ 21.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 2.700	$ 100	$ 0	$ 2.800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 2.700	$ 100	$ 0	$ 2.800
SUBTOTALES:													**$ 5.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 5.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 200	$ 0	$ 9.600
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 9.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	2	$ 5.400	$ 100	$ 5.500
SUBTOTALES:			**$ 5.400**	**$ 100**	**$ 5.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES						
																												PENSIÓN										SALUD							ARP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																	
1	CC 1068136089	JARABA MUÑOZ AURA CRISTINA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	29																230201-PROTECCION	2	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 66.667		$ 4.700	2	$ 66.667	CCF16-COMFACOR	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1068136896	GUERRERO BRACAMONTE MARIA NELA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	29																230201-PROTECCION	2	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	NUEVA EPS CM	2	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 66.667		$ 4.700	2	$ 66.667	CCF16-COMFACOR	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 42.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901595911
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAHAGUN	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 18 N1 J 33	TELÉFONO:	3017607
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7855897697**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1757291281	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:													**$ 40.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 40.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 69.600	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 69.600
SUBTOTALES:									**$ 69.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 69.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:			**$ 40.000**	**$ 0**	**$ 40.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NA

CONTRATO DE OBRA No: 162 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

MES INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	806	Mejoramiento y mantenimiento de vias rurales	231901010105	Recursos del balance aportes entidades gubernamentales	162 de 2022	$ 69.845.590,00	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 969.845.590,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES			
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) INCLUYE IVA			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: : LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 25202-143957 CND

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 162 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	21	20	20	20	24	24	18	24	22	24	24	24	24	24	24	24	22	24	20	24	24	24	20	20	24	24	24	24	707
Lluvias moderadas				3	4							2								2												11
Lluvias intensas						4	4			6			0		0							4	0			4	4					26
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se dilengía en 0 debido a que en el mes de octubre no se trabjó por en campo por lo cual no se tiene registro del tiempo en obra.

Firma
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO
Resindente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202143957 CND

Firma
Nombre: ARMANDO ALDANA ALDANA
Residente de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica

Entidad	AreaOperativa	Departamento
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba

Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
1/10/2022 0:00	0	50		900
2/10/2022 0:00	0	50		900
3/10/2022 0:00	0	50		900
4/10/2022 0:00	0	50		900
5/10/2022 0:00	3	50		900
6/10/2022 0:00	0	50		900
7/10/2022 0:00	2	50		900
8/10/2022 0:00	0	50		900
9/10/2022 0:00	27	50		900
10/10/2022 0:00	0	50		900
11/10/2022 0:00	0	50		900
12/10/2022 0:00	2	50		900
13/10/2022 0:00	0	50		900
14/10/2022 0:00	0	50		900
15/10/2022 0:00	0	50		900
16/10/2022 0:00	0	50		900
17/10/2022 0:00	0	50		900
18/10/2022 0:00	0	50		900
19/10/2022 0:00	0	50		900
20/10/2022 0:00	0	50		900
21/10/2022 0:00	0	50		900
22/10/2022 0:00	0	50		900
23/10/2022 0:00	0	50		900
24/10/2022 0:00	1	50		900
25/10/2022 0:00	9	50		900
26/10/2022 0:00	15	50		900
27/10/2022 0:00	0	50		900
28/10/2022 0:00	0	50		900
29/10/2022 0:00	0	50		900
30/10/2022 0:00	0	50		900
31/10/2022 0:00	0	50		900

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 05/11/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 162 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **octubre-2022** **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
Hasta el momento no se hicieron ensayos de laboratorios debido a que en el mes de octubre aún no se había iniciado con la fase o etapa de ejecución del proyecto.

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: : LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 25202-143957 CND

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 162 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

FECHA DE INICIO: 26/08/2022

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/01/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 969.845.590,00

VALOR ACUMULADO: $ 969.845.590,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.954.796,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.954.796,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 96.984.559,00	26	8	2022	26	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100,00%	$ 290.953.677,00	26	8	2022	26	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 193.969.118,00	26	8	2022	26	1	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30,00%	$ 5.686.438,80	26	1	2023	26	1	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 290.953.677,00	26	1	2023	26	1	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101227461

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	$ 200.000.000,00	26	8	2022	26	1	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 33-40-101069333 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se actualizan las pólizas según acta de inicio

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101227461**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**09**	**2022**	**26**	**08**	**2022**	**00:00**	**26**	**01**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	**NIT: 901.595.911-6**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 18 NRO. 1 J - 33	SAHAGUN, CORDOBA	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA	**NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 14 NRO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, LA CALIDAD DEL SERVICIO, LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, EL BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL CONTRATO No. 162-2022 CUYO OBJETO Es: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARATAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS APARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.
EL AMPARO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS APARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/01/2023	26/01/2028	$290,953,677.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/08/2022	26/01/2023	$290,953,677.00	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/08/2022	26/01/2023	$96,984,559.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	26/01/2023	26/01/2028	$5,686,438.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/08/2022	26/01/2026	$193,969,118.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DLE PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 AL CONTRATO No. 162.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUEN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,620,749.00	$ ******20,000.00	$ *****881,742.00	$ *********5,522,492.00	$ ******878,547,469.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUVE SEGUROS CIA. LTDA.	215223	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101227461

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101227461**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**09**	**2022**	**26**	**08**	**2022**	**00:00**	**26**	**01**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	**NIT: 901.595.911-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 18 NRO. 1 J - 33	SAHAGUN, CORDOBA	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA	**NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 14 NRO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,620,749.00	$ ******20,000.00	$ *****881,742.00	$ *********5,522,492.00	$ ******878,547,469.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUVE SEGUROS CIA. LTDA.	215223	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006616975087(3900)000005522492(96)20230826

REFERENCIA PAGO:

1100661697508-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101227461	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	09	2022	26	08	2022	00:00	26	01	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022		**NIT: 901.595.911-6**
DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 1 J - 33	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA		**NIT: 800.096.777-8**
DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7778326

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUAPOYO L.P. S.A.S.	900793402-4	95.00
CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S	901418309-4	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101227461

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

YENYCAMACHO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101227461, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

33-44-101227461

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-40-101069333**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**09**	**2022**	**26**	**08**	**2022**	**00:00**	**26**	**01**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	**NIT: 901.595.911-6**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 18 NRO. 1 J - 33	SAHAGUN, CORDOBA	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA	**NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 14 NRO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO No. 162-2022 CUYO OBJETO Es: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARATAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
.
BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**26/08/2022**	**26/01/2023**	**$200,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DLE PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 AL CONTRATO No. 162.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUEN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****209,589.00	$ *******3,000.00	$ ******40,391.00	$ **********252,980.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUVE SEGUROS CIA. LTDA.	215223	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-40-101069333

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-40-101069333**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**09**	**2022**	**26**	**08**	**2022**	**00:00**	**26**	**01**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	**NIT: 901.595.911-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 18 NRO. 1 J - 33	SAHAGUN, CORDOBA	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA	**NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 14 NRO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****209,589.00	$ *******3,000.00	$ ******40,391.00	$ **********252,980.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUVE SEGUROS CIA. LTDA.	215223	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006616975102(3900)000000252980(96)20230826

REFERENCIA PAGO:

1100661697510-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-40-101069333	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	09	2022	26	08	2022	00:00	26	01	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022		**NIT: 901.595.911-6**
DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 1 J - 33	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3017607304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA		**NIT: 800.096.777-8**
DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUAPOYO L.P. S.A.S.	900793402-4	95.00
CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S	901418309-4	5.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

33-40-101069333

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/11/2022
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 162 de 2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

FECHA DE INICIO: 26/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 26/01/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	.....	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	.....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	.....	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	.....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	.....	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	.....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

El formato no se encuentra diligenciado, teniendo en cuenta que el contratista no ha presentado la información requerida para dicho formato

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: : LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ	Nombre:	Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO	Nombre:
Representante legal	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-143957 CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

República de Colombia

MUNICIPIO DE SAHAGUN

ALCALDIA MUNICIPAL

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA 29 / 9 / 22

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE SAHAGUN-COLOMBIA RURAL

DATOS GENERALES

CONTRATO N°162 **DE** 2022 **PLAN INICIAL** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"

CONTRATISTA:	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG
SUPERVISOR DE CONTRATO:	MARIA CAMILA BULA ORTEGA
PLAZO:	5 MESES
PRESUPUESTO:	$969.845.590,00
ANTICIPO 30%	$290.953.677,00

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe invertir en forma directa y de manera de inequívoca en el objeto contractual con sujeción a este plan de manejo e inversión.

No.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR TOTAL	%
1	Transporte de Materiales	$ 20.000.000,0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000.000	6,87%
2	Subbase Granular	$ 99.683.637,0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.683.637	34,26%
3	Material de Mejoramiento	$ 100.000.000,0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000.000	34,37%
4	Acero	$ 71.270.040,0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.270.040	24,50%
TOTAL		**$ 290.953.677,0**	**$ 0,0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 290.953.677**	**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.
b) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15 %) del anticipo para compra de equipo y respuestos

(Firma)
Contratista: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
Representante Legal

(Firma)
Interventoria : FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Director de Interventoria /Rep Legal

MEPI-MN1-IN-2-FR-2, INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** oct-22 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 162 - 2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15625 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 3-0070-0-00683-0 **BANCO** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 290.953.677,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 - 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Transporte de Materiales	$ 20.000.000,00	$ -		$ -	$ 20.000.000,00
2	Sub base Granular	$ 99.683.637,00	$ -			$ 99.683.637,00
3	Material de Mejoramiento	$ 100.000.000,00	$ -			$ 100.000.000,00
4	Acero	$ 71.270.040,00	$ -			$ 71.270.040,00
	TOTALES	$ 290.953.677,00	$ -	$ -	$ -	$ 290.953.677,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
A la fecha no se han aprobado ordenes de desembolso del anticipo a terceros.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-143957 CND

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


• Seguimiento Programa de Obra

ID	Task Mode	Nombre de tarea	UND	CANT	Duration	Start
1		**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES**			**190 days**	**Fri 8/26/22**
2		**EXPLANACIONES**			**129 days**	**Thu 10/13/22**
3		Excavaciones varias en material común en seco (Vigas rio	m3	51,00	20 days	Tue 2/14/23
4		Excavación en material común de la explanación y canale	m3	3.458,00	80 days	Thu 10/13/22
5		**PLACA HUELLA, ANCHO 6,10m**			**116 days**	**Thu 11/17/22**
6		Subbase Granular Clase C.	m3	1153,00	65 days	Fri 12/09/22
7		Afirmado (Material para Mejoramiento)	m3	1153,00	65 days	Thu 11/17/22
8		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUE	m3	391,50	70 days	Wed 12/21/22
9		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIO	m3	128,10	65 days	Fri 1/06/23
10		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	435,00	45 days	Sat 2/04/23
11		Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60%	m3	456,80	60 days	Thu 1/12/23
12		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	39.498,00	75 days	Wed 12/21/22
13		**TRANSPORTE**			**120 days**	**Tue 10/18/22**
14		Transporte de materiales provenientes de la excavación d	m3/km	35.090,00	120 days	Tue 10/18/22
15		**CARACTERIZACIÓN VIAL**			**30 days**	**Mon 2/20/23**
16		Caracaterización del corredor	km	3,052	30 days	Mon 2/20/23
17		**OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA OBRA**			**174 days**	**Fri 8/26/22**
18		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O CO	GLOB	1	90 days	Mon 11/28/22
19		REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑO	GLOB	1	45 days	Fri 8/26/22

Project: PROGRAMACION
Date: 11/05/2022 09:04

Task	**Split**	**Milestone**	**Summary**	**Project Summary**
External Tasks	**External Milestone**	**Inactive Task**	**Inactive Milestone**	**Inactive Summary**
Manual Task	**Duration-only**	**Summary Rollup**	**Manual Summary**	**Start-only**
Finish-only	**Progress**	**Deadline**		

Finish	Predecessors	Resource Names
Sat 3/25/23		
Tue 3/07/23		
Tue 3/07/23	14FF;6FS-5 day	
Fri 1/13/23	19	
Sat 3/25/23		
Mon 2/20/23	7SS+20 days	
Sat 1/28/23	4FS-51 days	
Tue 3/07/23	12SS	
Fri 3/17/23	6FS-40 days	
Sat 3/25/23	9FF+6 days	
Fri 3/17/23	8SS+20 days	
Mon 3/13/23	7FS-35 days;6S	
Wed 3/01/23		
Wed 3/01/23	4SS+3 days	
Fri 3/24/23		
Fri 3/24/23	6	
Tue 3/07/23		
Tue 3/07/23	3FF;4SS	
Thu 10/13/22		

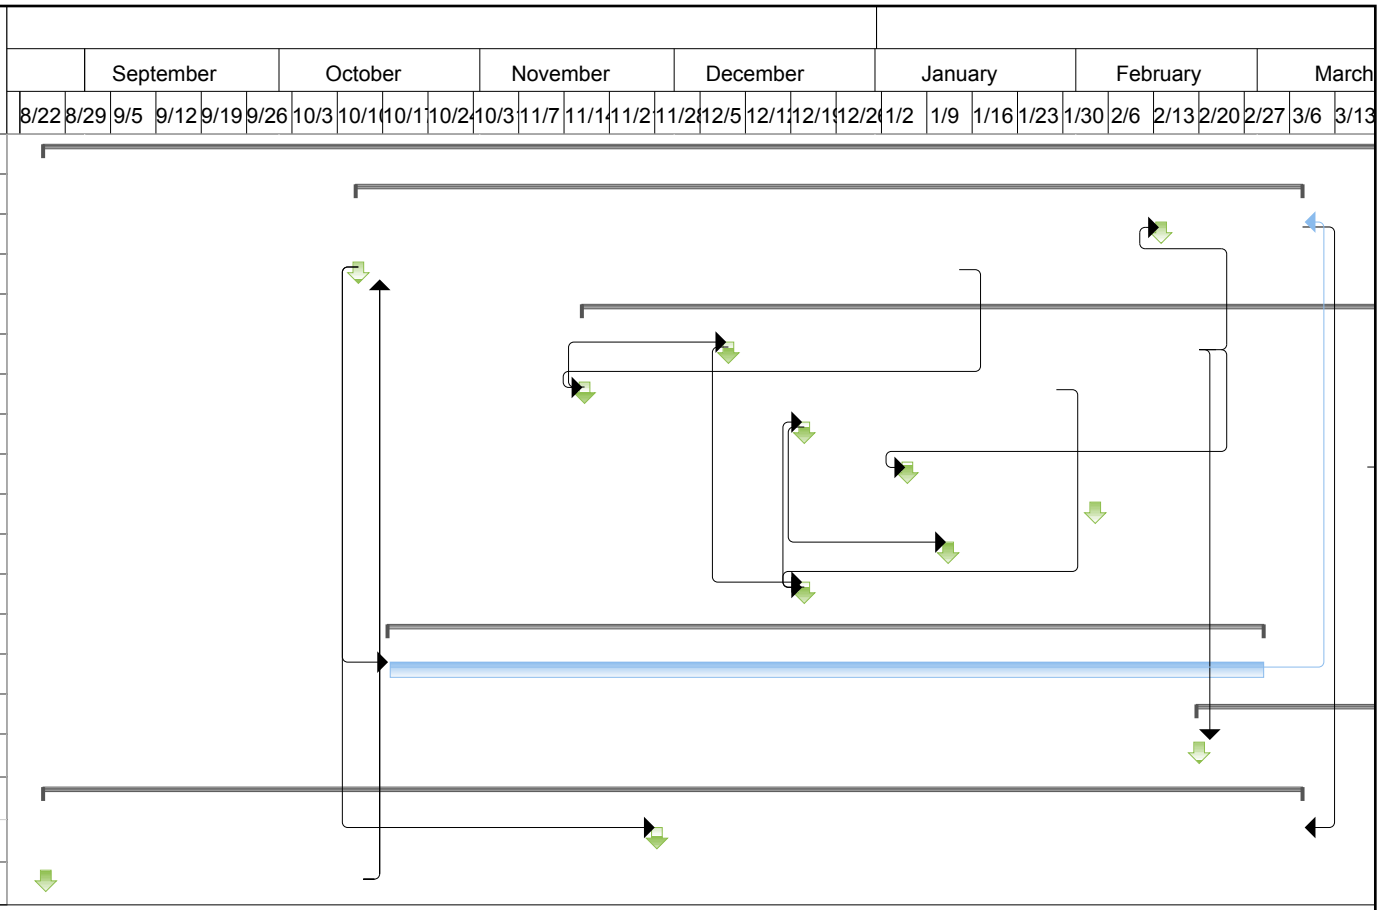

Project: PROGRAMACION
Date: 11/05/2022 09:04

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES,

MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 162 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL MG

PLAZO INICIAL:	6 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/06/2022 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	28/01/2023 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 969.845.590,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):**	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 969.845.590,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1 AGOSTO DE 2022	2 SEPTIEMBRE DE 2022	3 OCTUBRE DE 2022	4 NOVIEMBRE DE 2022	5 DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023				
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado										
GPP1 - EXPLANACIONES	$ 23.772,90	2,52%		% P	0,00%	0,00%	2,15%	0,37%	0,00%	0,00%				
				$ P			$20.305,15	$3.467,75						
				$ E										
				% E										
GPP2- ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT 2X2 (L=7m)	$ 54.317,09	5,76%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	5,41%				
				$ P					$3.353,83	$51.913,26				
				$ E										
				% E										
GPP3- PLACA HUELLA, ANCHO 6,10m	$ 815.144,10	86,50%		% P	0,00%	0,00%	11,04%	28,67%	25,76%	20,83%				
				$ P			$104.020,68	$272.686,01	$242.709,00	$196.326,81				
				$ E										
				% E										
GPP4 - TRANSPORTE	$ 48.380,40	5,13%		% P	0,00%	0,00%	2,30%	2,12%	0,05%	0,00%				
				$ P			$22.174,35	$19.936,92	$ 439,14	$0,00				
				$ E										
				% E										
GPP5 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 700,00	0,07%		% P	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%				
				$ P			$156,59	$202,64	$211,85	$128,91				
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 942.314,49**	**100%**	**0%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

100%
50%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	15,56%	31,38%	26,79%	26,26%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.656,77	$ 295.714,12	$ 252.474,62	$ 247.468,98			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	15,56%	46,93%	73,74%	100,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.656,77	$ 442.370,89	$ 694.845,51	$ 942.314,49			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.954.796,00 / $ -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 8.576.307,40 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	**$ 27.531.103,40**	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 969.845.590,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No : 25202-143957 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ PEREZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** ____

SEGUIMIENTO No. ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 162 DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL SAHAGÚN CE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/01/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 969.845.590,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 969.845.590,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6				
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		AGOSTO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023				
GPP1 - EXPLANACIONES	$23.773	2,52%		% P	0,00%	0,00%	2,15%	0,37%	0,00%	0,00%				
				$ P			$20.305,15	$3.467,75						
				$ E										
				% E										
GPP2- ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT 2X2 (L=7m)	$54.317	5,76%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	5,41%				
				$ P					$3.303,83	$51.013,26				
				$ E										
				% E										
GPP3- PLACA HUELLA, ANCHO 6,10m	$815.144	86,50%		% P	0,00%	0,00%	11,04%	28,87%	25,76%	20,83%				
				$ P			$104.020,68	$272.086,81	$242.709,80	$196.326,81				
				$ E										
				% E										
GPP4 - TRANSPORTE	$48.380	5,13%		% P	0,00%	0,00%	2,35%	2,12%	0,66%	0,00%				
				$ P			$22.174,35	$19.956,92	$6.249,14	$0,00				
				$ E										
				% E										
GPP5 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$700	0,07%		% P	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%				
				$ P			$156,59	$202,64	$211,85	$128,91				
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 942.314,49	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP. se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	15,56%	31,38%	26,79%	26,26%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$146.657	$295.714	$252.475	$247.469		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	15,56%	46,95%	73,74%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$146.657	$442.371	$694.846	$942.314		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00	0,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.954.796,00	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 8.576.307,40	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 27.531.103,40	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 969.845.590,40**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No : 25202-143957 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **ACTAS DE COMITÉ**

FECHA: 19/10/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 162 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022, NIT. 901595911-6

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Subsanar las observaciones sobre el personal profesional propuesto: cumplió
Presentación de avance parcial de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños: cumplió
Entrega del documento PAGA: no cumplió
Radicar ante el Municipio, las pólizas actualizadas según acta de inicio: cumplió

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Socialización del proyecto
3. Actualización de pólizas
4. Componente Social
5. Valla
6. Sitio de disposición de material proveniente de excavación y demolición
7. Seguridad Social
8. Socialización de formatos que debe presentar mensualmente el contratista
9. Rendimientos financieros

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños: el contratista informa que está pendiente por responder las observaciones al estudio hidraulico y al diseño de pavimento, realizadas por parte de la interventoría anteriormente. La interventoría informa que el contratista ha presentado los tomos entregables de la etapa de revisión y/o ajuste a los estudios y diseños, se le ha dado el aval al estudio de geotecnia y se tienen obseraviones en el estudio hidraulico y en el diseño de pavimento y se está a la espera de la respuesta a las observaciones. La interventoria solicita al contratista que el Box Culvert que se va a construir, sea presentado en un plano detalladamente. 2. Socialización del proyecto: se acuerda socializar el proyecto, el día 27 de octubre de 2022. El contratista manifiesta que el contrato no varía la meta física
3. Actualización de pólizas: la interventoría informa que hace falta la aprobación de las polizas según acta de inicio, por parte del Municipio. El Municipio informa que ya se encuentran aprobadas las polizas y que las remitirá a la interventoría con copia al contratista.
4. Componente Social: la interventoría pregunta como avanza la gestión de elaboración de actas de vecindad, a lo que el contratista manifiesta que son pocas viviendas y que las realizará para el 26 de octubre de 2022. 5. Valla: la interventoría manifiesta que está a la espera que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, entregue el arte definitivo que se va a implementar en los contratos, para hacérselos llegar a los contratistas.
6. Sitio de disposición de material proveniente de excavación y demolición: la interventoria pregunta al contratista como va con la solicitud ante el Municipio, del sitio para la disposición de material proveniente de excavación y demolición, a lo que responde que no ha realizado dicha solicitud, pero se compromete a realizarla en el día de hoy. Por parte del Municipio se adelanta que no se cuenta con el sitio. 7. Seguridad Social: la interventoria le recuerda nuevamente al contratista lo relacionado al pago de la seguridad social del personal vinculado a la ejecución del proyecto y le solicita que sean muy cumplidos con la presentación de la información ante la interventoría.
8. Socialización de formatos que debe presentar mensualmente el contratista: la interventoría requiere una reunión con el director de obra o residente de obra, con la finalidad de socializarles y explicarles el diligenciamiento de los formatos que deben presentar mensualmente.
9. Rendimientos financieros: el Municipio informa que desde el mes de diciembre de 2021, el banco no gira los rendimiento que tienen en la cuenta, dicha solicitud se envió al banco y se acordó que en el transcurso de esta semana se hace la consignación.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentar el plano detallado del Box Culver	28/10/2022	Contratista
Elaboración de actas de vecindad	26/10/2022	Contratista
Presentar soportes de seguridad social del personal vincualado a la ejecución del proyecto	19/10/2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 28/09/2022 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OSCAR ANTONIO RAMOS BEDOYA	Residente de obra	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
MARIA KARINA BULA ORTEGA	Secretaria de obras Pública- Municipio de Sahagún	Municipio de Sahagún - Contratante	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	Supervisor contrato de Interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- **ACTAS DE REUNIÓN**

No se realizan durante el periodo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha, se tiene una inversión de obra programada de $ 146.656.769,87 correspondiente al 15,56% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $0,00 correspondiente al 0,0%; lo que representa un atraso del 15,56%.

Se realizó el comité de obra No. 2, en el cual se le hizo seguimiento a la ejecución del contrato de obra.

Se recomienda atender las observaciones pendientes por subsanar para culminar rápidamente la etapa de revisión y/o ajustes definitivos a los estudios y diseños

Se recomienda iniciar las actividades de construcción y darles celeridad, con la finalidad de mitigar los atrasos presentados con respecto a la programación de obra

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
2/10/2022	CRS-CE-014	Remisión Informe Final de Etapa de Revisión de Estudios y Diseños	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
7/10/2022	CRS-CE-015	Remisión de documentación legal y técnica de fuente de materiales para afirmando y subbase granular	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
10/10/2022	CRS-CE-016	Solicitud de aprobación del Plan de Manejo de Transito – PMT	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
20/10/2022	CRS-CE-017	Solicitud de aprobación de cambio de profesional en el cargo de residente de obra	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
22/10/2022	CRS-CE-019	Solicitud de Información de ubicación de sitio de disposición final del material producto de las excavaciones	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
22/10/2022	CRS-CE-018	Atención a observaciones realizadas a Diseño de Pavimento	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

8.1.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
3/10/2022	CVRIMG- 071 -2022	Respuesta oficio CRS-CE-012 – Plan de Inversión del Anticipo	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
7/10/2022	CVRIMG- 088 -2022	Solicitud de soportes de afiliación al SGSS y pagos al día del personal vinculado a la ejecución del proyecto.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
10/10/2022	CVRIMG- 092 -2022	OBSERVACIONES REVISIÓN ESTUDIO DE HIDRÁULICA	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
10/10/2022	CVRIMG- 095 -2022	Aprobación revisión y/o ajustes del estudio geotécnico	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
13/10/2022	CVRIMG- 103 -2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO DE PAVIMENTOS	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

24/10/2022	CVRIMG- 123 -2022	RESPUESTA COMUNICACIÓN CRS-AMSO-001. CONCEPTO APLICABILIDAD PAGA	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
24/10/2022	CVRIMG- 127 -2022	Respuesta a solicitud de cambio del profesional residente de obra.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
26/10/2022	CVRIMG- 135 -2022	Atraso del contrato de obra.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
27/10/2022	CVRIMG- 140 -2022	Seguimiento a los compromisos acordados en el comité de obra No. 2 de fecha 19 de octubre de 2022.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022
28/10/2022	CVRIMG- 147 -2022	Aprobación revisión y/o ajuste del estudio de pavimentos.	CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO – Contrato No. 162 de 2022	
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Levantamiento topográfico conjuntamente	Levantamiento topográfico conjuntamente

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO – Contrato No. 162 de 2022	
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Socialización	Socialización

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Septiembre 27 de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. Res. Interventoria.

Septiembre 28 de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. residente

Ing. Res. Interventoria.

Septiembre 29 de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. residente

Ing. Res. Interventoria.

Septiembre 30 de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. residente

Ing. Res. Interventoria.

Octubre 01 de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Ing. Res. Interventoria

Octubre 02 de 2022
No se laboró Por ser domingo.

Ing. residente

Ing. Res. Interventoría

Octubre 03 de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Octubre 04 de 2022.
Actividad realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. residente

Miercoles, 05 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. residente

Jueves, 06 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Viernes, 07 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Sabado, 08 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. residente

Domingo, 09 de octubre de 2022
No se laboró por ser domingo.

Ing. residente

Lunes, 10 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing residente

Martes, 11 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestion administrativa.

Ing. residente

Miercoles, 12 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Jueves, 13 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. residente

Viernes, 14 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Sabado, 15 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Domingo, 16 de octubre de 2022
No se laboró Por ser domingo

Ing. residente

Lunes, 17 de octubre de 2022
Actividades realizadas.
No se laboró por ser domingo.

Ing. residente

Martes, 18 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. residente

Miercoles, 19 de octubre de 2022.
Actividades realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Comite de seguimiento de obra No.2

Ing. residente

Jueves, 20 de octubre de 2022.
Actividade realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Viernes, 21 de octubre de 2022
Actividades realizadas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Sabado, 22 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Domingo, 23 de octubre de 2022
No se laboro por ser domingo.

Ing. residente

Lunes, 24 de octubre de 2022
Actividades laboradas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Martes, 25 de octubre de 2022
Actividades laboradas.
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Miercoles 26 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa

Ing. residente

Jueves, 27 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Socialización con la comunidad, por parte del contratista de obra, Municipio-Contratante, Interventoria e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

Ing. residente

Viernes, 28 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. residente

Sabado, 29 de octubre de 2022
Actividades realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Ing. residente

Domingo, 30 de octubre de 2022
No se laboró por ser domingo

Ing. residente

Lunes, 31 de octubre de 2022.

Actividades realizadas:

1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa.
3. Replanteo topográfico en conjunto de la comisión topográfica de la Interventoría y del contratista de obra

Ingresidente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 168 de 2022 **Contratista:** CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

INFORME MENSUAL No. TRES (3) **MES O PERIODO:** OCTUBRE DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	372
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	374
1	**INTRODUCCIÓN**		376
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		377
2.1	Localización		377
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		378
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		378
2.4	Características técnicas del proyecto		379
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		381
3.1	Información general del contrato		381
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		381
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		382
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		382
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		383
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	384
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	395
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	397
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	401
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	405
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	411
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	413
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	423
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		425
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Obra		426
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	430
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	432
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	434
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	437
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		735
5.1	Información general del contrato		735
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		735
5.3	Informes especialistas y profesionales		739
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		922
5.5	Informe matriz de riesgos.		923
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		924
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		927
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	928
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	931
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	940
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	942
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	949
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		951
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	953
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	955
7	**Conclusiones y recomendaciones**		438
8	**Anexos**		439
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		440
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		442
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		445
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		447

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELLA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** OCTUBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 168 de 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIO: 26/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/08/2022
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.798.832.520,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.798.832.520,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	1450
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.767.039.820,00		$ 1.767.039.820,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 10.788.235,00	$ 2.049.765,00	$ 12.838.000,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) INCLUYE IVA	$ 15.928.319,00	$ 3.026.381,00	$ 18.954.700,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.793.756.374,00	$ 5.076.146,00	$ 1.798.832.520,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 24.275.293,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA 5/11/2022
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento topográfico realizado por la interventoría y cntratista



Levantamiento topográfico realizado por la interventoría y contratista

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio Sahagún, mediante convenio interadministrativo No. 1964 de 2021.

Es por ello que mediante el Proceso **L.P-005-2022,** se celebra el Contrato de Obra No. 168 de 2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL", El cual fue adjudicado al CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE, cuyo plazo inicial es de siete (7) meses a partir del 26 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 1.798.832.520,00.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de octubre de 2022; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

Proyecto se realiza en la zona rural del municipio de Sahagún Córdoba, en la Vía Ceiba De Leche.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.

.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, Ubicación del Municipio de Sahagún Córdoba.

El Municipio de Sahagún está ubicado en la parte nororiental del departamento de Córdoba, y su cabecera municipal se encuentra localizada a los 08º 56´ 58" de latitud norte y 75º 26´ 52" de longitud oeste. Se encuentra a 71 Km de la capital del departamento; a una altura de 75 m.s.n.m. y una temperatura media de 26.9ºC



Ilustración 3. Ubicación Vía Ceiba de Leche.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

La fuente de materiales empleada por el contratista es la ubicada en el corregimiento de Berasategui, entrando a la Balsa, en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. La cual cuenta con permiso minero y licencia ambiental.



Ilustración 3. Ubicación Fuente de materiales

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

El municipio de Sahagún que gracias a la ejecución del contrato de obra No. 168 de 2022, se beneficia principalmente la zona rural conformada por el corregimiento Ceibas de Leche.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Inicialmente la vía presenta dificultad en la movilidad, debido a su mal estado, el cual se ocasiona por el alto deterioro de la superficie de rodadura, el drenaje superficial que es deficiente es por ello que se realiza el mejoramiento de la Vía Ceiba De Leche, zona rural, del municipio de Sahagún, con la construcción de 1450 metros de placa huella, la cual tendrá un ancho de sección de 6,1 metros.

	
Via ceiba de leche, estado inicial de la vía 25/09/2022	Levantamiento en conjunto Interventoría – Contratista 31/10/2022
	
Via ceiba de leche, estado inicial de la vía 25/09/2022	Levantamiento en conjunto Interventoría – Contratista 31/10/2022

Ilustración 4. Estado inicial Vía Ceiba de Leche.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizará la construcción de 1450 metros de placa huella con un ancho de 6,10 metros.

Contrato 162 de 2022	
Sistema	Placa Huella
Longitud	1450 metros
Ancho Calzada	7.0 metros
Losa de concreto	0,15 metros
Subbase granular	0,15 metros

A continuación, se muestran las secciones típicas de la placa huella:

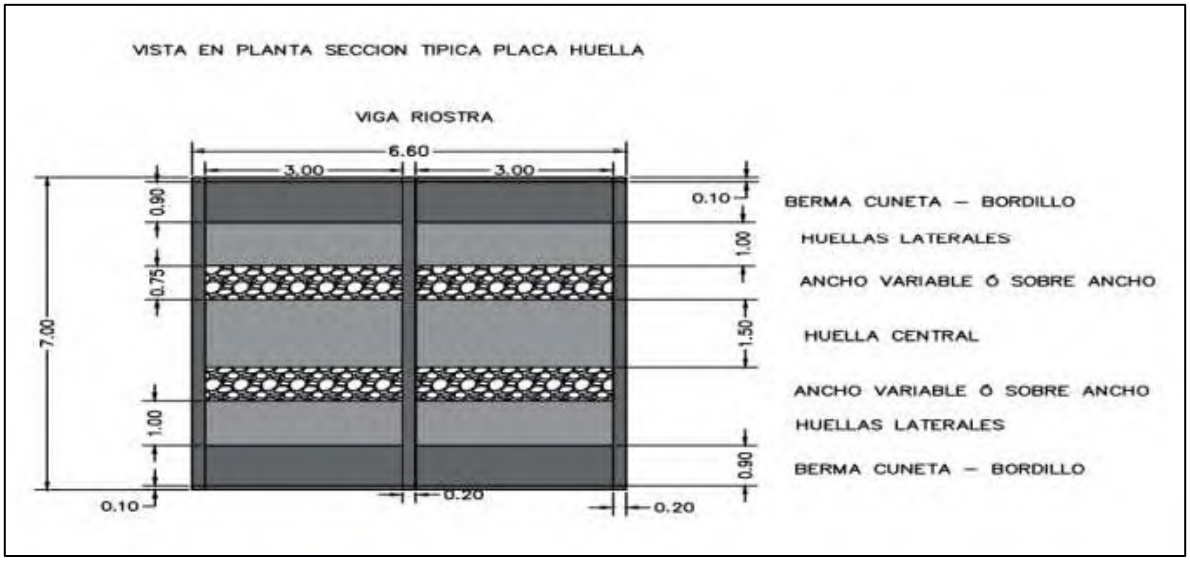


Ilustración 5. Vista en planta, sección típica placa huella.

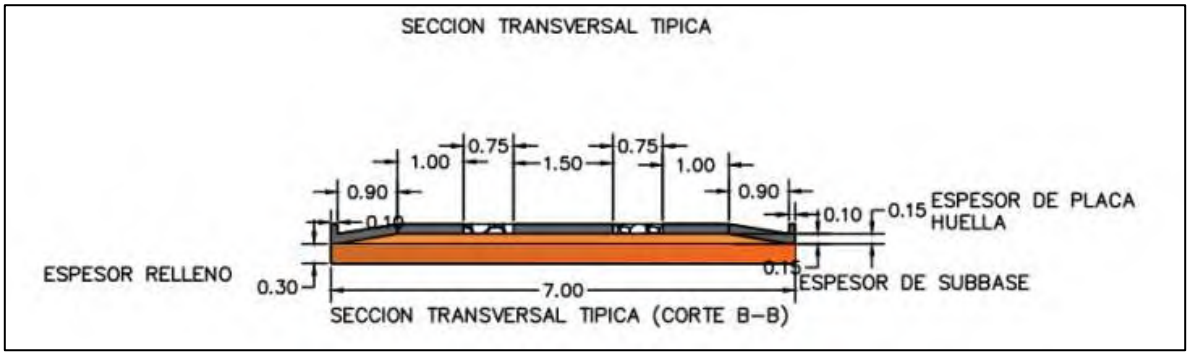


Ilustración 6. Sección transversal típica placa huella.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-005-2022
CONTRATO No.	168 de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/06/2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"
CONTRATISTA	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE
NIT	901.600.645 – 3
INTEGRANTES	• SOLUCIONES DE INGENEIRIA TRANSITO Y TRANSPORTE SAS CARLOS ALBERTO MONTES • Participación: 90% • NIT. 900.040.266-8 ALFONSO RAFAEL PACHECO • Participación: 10%
DIRECCIÓN	SAHAGUN - CORDOBA
TELEFONO	(+57) 322 9109160
CORREO	cceibadeleche@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.798.832.520,00
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA INICIO	26/08/2022
FECHA TERMINACIÓN	26/03/2022
MODIFICACIONES	OTRO SI No. 1 del 13 de septiembre de 2023

Tabla 1. Información Cto. 168 de 2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
ii. Se inicia la elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA.

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El contratista entregó el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA y está en revisión por parte de esta interventoría.

3.2.2. GESTIÓN SOCIAL

i. El día 27 de octubre de 2022 se realizó la socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

3.2.3. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos para ninguno de los contratos de obra a cargo de esta interventoría.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
ii. A corte de la semana No. 11, se tiene una inversión de obra programada de $ 24.275.293,5 correspondiente al 1,37% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $0,00 correspondiente al 0,0%; lo que representa un atraso del 1,37%.
iii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
iv. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
v. Coordinar mesas de trabajo entre los especialistas tanto del contratista de obra como de la Interventoría para agilizar la aprobación de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

I. Informe semanal No.07, del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2022
II. Informe semanal No.08, del 07 al 13 de octubre de 2022
III. Informe semanal No.09, del 14 al 20 de octubre de 2022
IV. Informe semanal No.10, del 21 al 27 de octubre de 2022
V. Informe semanal No. 11, del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA CEIBA DE LECHE

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 7 del 30/09/2022 al 06/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El obejeto del contrato tiene como alcance la construcción de 1450 metros de placa huella, con un ancho de sección de 6,10 metros.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto tiene como alcance el mejoramiento de la Vía Ceiba De Leche, zona rural, del municipio de Sahagún, con la construcción de 1450 metros de placa huella, la cual tendrá un ancho de sección de 6,1 metros.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE, NIT. 9016006453		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7	
INTEGRANTES:	1. SOLUCIONES DE INGENEIRIA TRANSITO Y TRANSPORTE SAS CARLOS ALBERTO MONTES Participación: 90% 2. ALFONSO RAFAEL PACHECO Participación: 10%		INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)	
CONTRATO No.	168 de 2022	VALOR INICIAL: $	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL: $ 4,564,284,660.00
FECHA DE INICIO:	8/26/2022	VALOR ADICIONES: $	FECHA DE INICIO:	8/22/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	3/26/2023	VALOR ACUMULADO: $ 1,798,832,520.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/31/2024	VALOR ACUMULADO: $ 4,564,284,660.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	3/26/2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	12/31/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,767,039,820.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	Km	1.450			Prog					
					Ejec					
Afirmado	Km	1.450			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	Km	1.450			Prog					
					Ejec					
Placa Huella	Km	1.450			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA CEIBA DE LECHE
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El contratista aporta permiso minero de una de las fuentes de materiales a utilizar, se le solicitará la respectiva licencia ambiental

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A fecha de 19 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En comité de obra No. 1 de fecha 15 de septiembre de 2022, se le recordó al contratista, que debe contar con una oficina para la atención al usuario, debidamente identificada en la cual se especifique el horario de atención.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión de oficio emitido por el contratista, de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y / o ajustes a los estudios y diseños.
2. Levantamiento topográfico por la interventoría

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y / o ajustes a los estudios y diseños


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Se encuentra en proceso la aprobación de la programación de obra. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Levantamiento topográfico realizado por interventoria



Levantamiento topográfico realizado por interventoria

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Realizar comité se seguimiento de obra
4. Gestionar la bitácora de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO

Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA CEIBA DE LECHE

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 8 del 7/10/2022 al 13/10/2022 **Último Informe Semanal SI** (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El obejeto del contrato tiene como alcance la construcción de 1450 metros de placa huella, con un ancho de sección de 6,10 metros.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto tiene como alcance el mejoramiento de la Vía Ceiba De Leche, zona rural, del municipio de Sahagún, con la construcción de 1450 metros de placa huella, la cual tendrá un ancho de sección de 6,1 metros.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE, NIT. 9016006453

INTEGRANTES:
1. SOLUCIONES DE INGENEIRIA TRANSITO Y TRANSPORTE SAS CARLOS ALBERTO MONTES Participación: 90%
2. ALFONSO RAFAEL PACHECO Participación: 10%

CONTRATO No. 168 de 2022
FECHA DE INICIO: 26/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 26/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 26/03/2023

VALOR INICIAL: $ 1.798.832.520,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1.798.832.520,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.767.039.820,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	1.450			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	1.450			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	1.450			Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	1.450			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA CEIBA DE LECHE
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista aporta permiso minero de una de las fuentes de materiales a utilizar, se le solicitará la respectiva licencia ambiental

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A fecha de 19 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

OBSERVACIONES: A fecha de 16 de septiembre de 2022, el contratista emite oficio de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA. Actualmente la interventoria se encuentra revisando dicho comunicado.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En comité de obra No. 1 de fecha 15 de septiembre de 2022, se le recordó al contratista, que debe contar con una oficina para la atención al usuario, debidamente identificada en la cual se especifique el horario de atención.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión de oficio emitido por el contratista, de asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y / o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y / o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta física ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra física

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento topográfico realizado por interventoría



Levantamiento topográfico realizado por interventoría

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Realizar comité se seguimiento de obra
4. Gestionar la bitácora de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA CEIBA DE LECHE

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 9 del 14/10/2022 al 20/10/2022 **Último Informe Semanal SI** ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El obejeto del contrato tiene como alcance la construcción de 1450 metros de placa huella, con un ancho de sección de 6,10 metros.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto tiene como alcance el mejoramiento de la Vía Ceiba De Leche, zona rural, del municipio de Sahagún, con la construcción de 1450 metros de placa huella, la cual tendrá un ancho de sección de 6,1 metros.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE, NIT. 9016006453

INTEGRANTES:
1. SOLUCIONES DE INGENEIRIA TRANSITO Y TRANSPORTE SAS CARLOS ALBERTO MONTES Participación: 90%
2. ALFONSO RAFAEL PACHECO Participación: 10%

CONTRATO No. 168 de 2022 — VALOR INICIAL: $ 1.798.832.520,00
FECHA DE INICIO: 26/08/2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 26/03/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 1.798.832.520,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 26/03/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022 — **VALOR INICIAL:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO: 22/08/2022 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — **VALOR ACUMULADO:** $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.767.039.820,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12.137.646,75	0,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (12.137.646,75)	-0,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12.137.646,75	0,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (12.137.646,75)	-0,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.068.823,38	0,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	Km	1,450			Prog					
					Ejec					
Afirmado	Km	1,450			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	Km	1,450			Prog					
					Ejec					
Placa Huella	Km	1,450			Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA CEIBA DE LECHE
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El contratista aporta permiso minero de una de las fuentes de materiales a utilizar, se le solicitará la respectiva licencia ambiental

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Elaboración del documento PAGA

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En comité de obra No. 1 de fecha 15 de septiembre de 2022, se le recordó al contratista, que debe contar con una oficina para la atención al usuario, debidamente identificada en la cual se especifique el horario de atención.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ._____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ._____
AVALÚOS APROBADOS: ._____
PREDIOS ADQUIRIDOS: ._____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Elaboración del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y / o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y / o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento topográfico realizado por interventoría



Levantamiento topográfico realizado por interventoría

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/10/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA CEIBA DE LECHE

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 10 del 21/10/2022 al 27/10/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El obejeto del contrato tiene como alcance la construcción de 1450 metros de placa huella, con un ancho de sección de 6,10 metros.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto tiene como alcance el mejoramiento de la Vía Ceiba De Leche, zona rural, del municipio de Sahagún, con la construcción de 1450 metros de placa huella, la cual tendrá un ancho de sección de 6,1 metros.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE, NIT. 9016006453			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. SOLUCIONES DE INGENEIRIA TRANSITO Y TRANSPORTE SAS CARLOS ALBERTO MONTES Participación: 90% 2. ALFONSO RAFAEL PACHECO Participación: 10%			INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	168 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1.798.832.520,00	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	26/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	26/03/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.798.832.520,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	26/03/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.767.039.820,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 18.206.470,13	1,03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18.206.470,13)	-1,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 18.206.470,13	1,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18.206.470,13)	-1,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.068.823,38	0,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	1450,0			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	1450,0			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	1450,0			Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	1450,0			Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA CEIBA DE LECHE
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: El contratista aporta permiso minero de una de las fuentes de materiales a utilizar, se le solicitará la respectiva licencia ambiental

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado ante interventoría - En revisión por interventoría

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: : el día 27 de octubre de 2022 se realizó la socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías -INVIAS

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y / o ajustes a los estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y / o ajustes a los estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización del proyecto



Socialización del proyecto



Socialización del proyecto

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA CEIBA DE LECHE

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 11 del 28/10/2022 al 3/11/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El obejeto del contrato tiene como alcance la construcción de 1450 metros de placa huella, con un ancho de sección de 6,10 metros.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto tiene como alcance el mejoramiento de la Vía Ceiba De Leche, zona rural, del municipio de Sahagún, con la construcción de 1450 metros de placa huella, la cual tendrá un ancho de sección de 6,1 metros.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE, NIT. 9016006453

INTEGRANTES:
1. SOLUCIONES DE INGENEIRIA TRANSITO Y TRANSPORTE SAS CARLOS ALBERTO MONTES Participación: 90%
2. ALFONSO RAFAEL PACHECO Participación: 10%

CONTRATO No.: 168 de 2022
FECHA DE INICIO: 26/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 26/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 26/03/2023

VALOR INICIAL: $ 1.798.832.520,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1.798.832.520,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.: 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.767.039.820,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 24.275.293,51	1,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (24.275.293,51)	-1,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.275.293,51	1,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24.275.293,51)	-1,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.068.823,38	0,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 1,37%
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %: -1,37%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	1450,00			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	1450,00			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	1450,00			Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	1450,00			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VIA CEIBA DE LECHE
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: El contratista aporta permiso minero de una de las fuentes de materiales a utilizar, se le solicitará la respectiva licencia ambiental

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado ante interventoría - En revisión por interventoría

OBSERVACIONES

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: : el día 27 de octubre de 2022 se realizó la socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías -INVIAS

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Revisión del documento PAGA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y / o ajustes a los estudios y diseños.
2. Replanteo topográfico en conjunto entre la interventoría y contratista

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y / o ajustes a los estudios y diseños
2. Dar inicio a las actividades constructivas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento en conjunto Interventoría - Contratista



Levantamiento en conjunto Interventoría - Contratista



Levantamiento en conjunto Interventoría - Contratista

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: octubre/2022

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO No. 168 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022

INTERVENTORÍA: ONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:El formato no se encuentra diligenciado dado que el contrato se encuentra en la etapa de estudios y diseños y por tanto la maquinaria no ha sido trasladada a campo

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202125635BLV

Firma
Nombre: ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 168 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ANDRES GARCIA	1014239477	REP. LEGAL	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	$ 666.667,00	$ 46.500	v	FAMISANAR	9442476430	$ 26.700	COLPENSIONES	9442476430	$ 106.700	$ 26.700			
2	LUIS LOPEZ	78760713	RESIDENTE PPAL	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	$ 1.333.334,00	$ 92.900	v	NUEVA EPS	9442476430	$ 53.400	COLFONDOS	9442476430	$ 213.400	$ 53.400			
3	KAREN BUSTAMANTE	1102797074	SSG	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	$ 450.000,00	$ 31.400	v	SANITAS	9442476430	$ 18.000	COLPENSIONES	9442476430	$ 72.000	$ 18.000			
4	CESAR BALMACEDA	1069464343	RESIDENTE AUX.	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	$ 1.200.000,00	$ 83.600	v	SANITAS	9442476430	$ 48.000	PORVENIR	9442476430	$ 192.000	$ 48.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Las planillas de paogo de aportes presentadas por el contratista se encuentran incompletas, se solicitará al contratista subsanar dicho requerimiento.

El contratista adjunta la certificación de fecha 8/11/2022 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los paqos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ANDRES GARCIA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 1014239477

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901600645	3	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 5 94	SAHAGUN-CORDOBA	3106541595	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1741968944	9442476430	E	2022/11/11	2022/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,177,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$3,800,001	$608,100			$3,800,001	$152,100			$3,800,001	$152,100			$3,800,001	$264,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$666,667	$106,700			$666,667	$26,700			$666,667	$26,700			$666,667	$46,500		$0	$0
Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$666,667	$106,700			$666,667	$26,700			$666,667	$26,700			$666,667	$46,500		$0	$0
1	CC	1014239477	GARCIA ANDRES	25-14	10	$666,667	$106,700	EPS017	10	$666,667	$26,700	CCF16	10	$666,667	$26,700	14-11	10	$666,667	$46,500	10	$0	$0
Centro de Trabajo: DIRECTOR DE OBRA (1 Afiliados)						$150,000	$24,000			$150,000	$6,000			$150,000	$6,000			$150,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$150,000	$24,000			$150,000	$6,000			$150,000	$6,000			$150,000	$10,500		$0	$0
2	CC	73156692	CEPEDA CESAR	230301	3	$150,000	$24,000	EPS002	3	$150,000	$6,000	CCF16	3	$150,000	$6,000	14-11	3	$150,000	$10,500	3	$0	$0
Centro de Trabajo: RESIDENTE DE OBRA (2 Afiliados)						$2,533,334	$405,400			$2,533,334	$101,400			$2,533,334	$101,400			$2,533,334	$176,500		$0	$0
Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$2,533,334	$405,400			$2,533,334	$101,400			$2,533,334	$101,400			$2,533,334	$176,500		$0	$0
3	CC	1069464343	BALMACEDA CESAR	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF16	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
4	CC	78760713	LOPEZ LUIS	231001	20	$1,333,334	$213,400	EPS037	20	$1,333,334	$53,400	CCF16	20	$1,333,334	$53,400	14-11	20	$1,333,334	$92,900	20	$0	$0
Centro de Trabajo: SISO (1 Afiliados)						$450,000	$72,000			$450,000	$18,000			$450,000	$18,000			$450,000	$31,400		$0	$0
Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$450,000	$72,000			$450,000	$18,000			$450,000	$18,000			$450,000	$31,400		$0	$0
5	CC	1102797074	BUSTAMANTE KAREN	25-14	9	$450,000	$72,000	EPS005	9	$450,000	$18,000	CCF16	9	$450,000	$18,000	14-11	9	$450,000	$31,400	9	$0	$0
Total Afiliados(5)						$3,800,001	$608,100			$3,800,001	$152,100			$3,800,001	$152,100			$3,800,001	$264,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901600645	3	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 5 94	SAHAGUN-CORDOBA	3106541595	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1741968944	9442476430	E	2022/11/11	2022/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,177,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$608,100	$0	$0	$608,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$213,400	$0	$0	$213,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$178,700	$0	$0	$178,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$216,000	$0	$0	$216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$264,900	$0	$0	$264,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$264,900	$0	$0	$264,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$152,100	$0	$0	$152,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$152,100	$0	$0	$152,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$152,100	$0	$0	$152,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$26,700	$0	$0	$26,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$53,400	$0	$0	$53,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$6,000	$0	$0	$6,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$66,000	$0	$0	$66,000
TOTAL				**5**	**$1,177,200**	**$0**	**$0**	**$1,177,200**

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 168 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

MES INFORME MENSUAL: octubre - 2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	971	Mantenimiento y mejoramiento de vías	231901010105	Recursos del balance aportes entidades gubernamentales	168 de 2022	$ 1.798.832.520,00	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.798.832.520,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRAS	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS			
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) INCLUYE IVA			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANDRES GARCIA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 1014239477

Firma
Nombre: FREDY RIVERA DE GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Municipio de Sahagun

NIT 800096777-8

Calle 14 No 10 30 Palacio Municipal C.P. 230650

Administración Central

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 971 Disponibilidad : 971 Fecha : 01/07/2022

C.C/NIT. : 901600645 Nombre : CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

Concepto : Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el Municipio de Sahagún Departamento de Córdoba del programa Colombia rural.

Código	Fte	Descripción	Valor
231901010105	G-530	Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de Sahagún departamento de Córdoba-Colombia rural.(Cuenta	1.798.832.520,00

TOTAL : UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (1.798.832.520,00)

FIRMA AUTORIZADA

Documento elaborado por 30565105

Escaneado con CamScanner

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 168 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: octubre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	21	20	20	20	24	24	18	24	22	24	24	24	23	24	24	24	22	24	20	24	24	24	20	20	24	24	24	24	706
Lluvias moderadas				3	4							2				1				2												12
Lluvias intensas						4	4			6			0		0							4	0			4	4					26
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202125635BLV

Firma
Nombre: ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica
25020140	SAHAGUN - AUT [25020140]	89.499.972.220	-75.45	60	PluviomÃ©trica

Entidad	AreaOperativa	Departamento
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba

Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
SahagÃºn	15/09/1958 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
1/10/2022 0:00	0	50		900
2/10/2022 0:00	0	50		900
3/10/2022 0:00	0	50		900
4/10/2022 0:00	0	50		900
5/10/2022 0:00	3	50		900
6/10/2022 0:00	0	50		900
7/10/2022 0:00	2	50		900
8/10/2022 0:00	0	50		900
9/10/2022 0:00	27	50		900
10/10/2022 0:00	0	50		900
11/10/2022 0:00	0	50		900
12/10/2022 0:00	2	50		900
13/10/2022 0:00	0	50		900
14/10/2022 0:00	0	50		900
15/10/2022 0:00	0	50		900
16/10/2022 0:00	0	50		900
17/10/2022 0:00	0	50		900
18/10/2022 0:00	0	50		900
19/10/2022 0:00	0	50		900
20/10/2022 0:00	0	50		900
21/10/2022 0:00	0	50		900
22/10/2022 0:00	0	50		900
23/10/2022 0:00	0	50		900
24/10/2022 0:00	1	50		900
25/10/2022 0:00	9	50		900
26/10/2022 0:00	15	50		900
27/10/2022 0:00	0	50		900
28/10/2022 0:00	0	50		900
29/10/2022 0:00	0	50		900
30/10/2022 0:00	0	50		900
31/10/2022 0:00	0	50		900

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 168 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **OCTUBRE-2022** **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

El contratista no presenta informacion de resultados de esnsayos de laboratorio durante el periodo.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ANDRES GARCIA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 1014239477

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 168 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

FECHA DE INICIO: 26/08/2022

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/03/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.798.832.520,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.798.832.520,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.954.700,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.954.700,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 179.883.252,00	26	8	2022	5	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 359.776.504,00	26	8	2022	5	10	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 359.776.504,00	26	8	2022	7	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 5.686.438,80	7	4	2023	6	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 539.649.756,00	7	4	2023	6	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101021027

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	300 SMMLV	$ 300.000.000,00	26	8	2022	7	4	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40101007354 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se actualizan las polizas según acta de inicio del contrato

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	**AGENCIA SOGAMOSO**	**51**	**51-40-101007354**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	**09**	**2022**	**26**	**08**	**2022**	**00:00**	**07**	**04**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	**NIT: 901.600.645-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 9 NRO. 0 5 - 94	SAHAGUN, CORDOBA	3219243550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE SAHAGUN	**NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA N. 168-2022 CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

ASEGURADOS:MUNICIPIO DE SAHAGUN IDENTIFICADO CON NIT.800.096.777-8 Y EL INSITUTO NACINAL DE VIAS - INVIAS, IDENTIFICADO CON NIT.800.215.807-2 Y EL CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS,MUNICIPIO DE SAHAGUN IDENTIFICADO CON NIT.800.096.777-8 Y EL INSITUTO NACINAL DE VIAS - INVIAS, IDENTIFICADO CON NIT.800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**26/08/2022**	**07/04/2023**	**$300,000,000.00**	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**26/08/2022**	**07/04/2023**	**$300,000,000.00**	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**26/08/2022**	**07/04/2023**	**$300,000,000.00**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****736,438.00	$ ******20,000.00	$ *****143,723.00	$ **********900,161.00	$ ******300,000,000.00	CONTADO


INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD	153934	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO



51-40-101007354

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101007354	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	09	2022	26	08	2022	00:00	07	04	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE		**NIT: 901.600.645-3**
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 0 5 - 94	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3219243550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAHAGUN		**NIT: 800.096.777-8**
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/08/2022	07/04/2023	$300,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/08/2022	07/04/2023	$300,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/08/2022	07/04/2023	$300,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

51-40-101007354

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

YOHANASUAREZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	**AGENCIA SOGAMOSO**	**51**	**51-40-101007354**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	**09**	**2022**	**26**	**08**	**2022**	**00:00**	**07**	**04**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	**NIT: 901.600.645-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 9 NRO. 0 5 - 94	SAHAGUN, CORDOBA	3219243550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	**NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****736,438.00	$ ******20,000.00	$ *****143,723.00	$ **********900,161.00	$ ******300,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD	153934	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015601546563(3900)000000900161(96)20230826

REFERENCIA PAGO:

1101560154656-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101007354	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	09	2022	26	08	2022	00:00	07	04	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.600.645-3**

DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 0 5 - 94 — **CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA — **TELÉFONO:** 3219243550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SAHAGUN — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL — **CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7778326

BENEFICIARIO: 800096777 - MUNICIPIO DE SAHAGUN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SOLUCIONES DE INGENIERIA TRANSITO Y TRANSPORTE S.A.S	900040266-8	90.00
PACHECO OQUENDO ALFONSO RAFAEL	15025404	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

51-40-101007354

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

YOHANASUAREZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	**AGENCIA SOGAMOSO**	**51**	**51-44-101021027**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	**09**	**2022**	**26**	**08**	**2022**	**00:00**	**06**	**04**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	**NIT: 901.600.645-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 0 5 - 94	SAHAGUN, CORDOBA	3219243550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	**NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA N.168-2022 CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

ASEGURADO//BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAHAGUN IDENTIFICADO CON NIT. 800.096.777-8 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, IDENTIFICADO CON NIT.800.215.807-2.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/08/2022	05/10/2023	$179,883,252.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/08/2022	05/10/2023	$359,766,504.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/08/2022	07/04/2026	$359,766,504.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	07/04/2023	06/04/2028	$539,649,756.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2023	06/04/2028	$5,686,438.80	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***6,942,056.00	$ ******20,000.00	$ ***1,322,790.00	$ *********8,284,847.00	$ ****1,444,752,454.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD	153934	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101021027

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

Escriba el text

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	**AGENCIA SOGAMOSO**	**51**	**51-44-101021027**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	**09**	**2022**	**26**	**08**	**2022**	**00:00**	**06**	**04**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	**NIT: 901.600.645-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 9 NRO. 0 5 - 94	SAHAGUN, CORDOBA	3219243550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAHAGUN	**NIT: 800.096.777-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	SAHAGUN, CORDOBA	7778326

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***6,942,056.00	$ ******20,000.00	$ ***1,322,790.00	$ *********8,284,847.00	$ ****1,444,752,454.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD	153934	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015601546549(3900)000008284847(96)20230826

REFERENCIA PAGO:

1101560154654-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101021027	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	09	2022	26	08	2022	00:00	06	04	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE		**NIT: 901.600.645-3**
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 0 5 - 94	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3219243550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAHAGUN		**NIT: 800.096.777-8**
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 10 - 30 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** SAHAGUN, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7778326

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SOLUCIONES DE INGENIERIA TRANSITO Y TRANSPORTE S.A.S	900040266-8	90.00
PACHECO OQUENDO ALFONSO RAFAEL	15025404	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

51-44-101021027

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

YOHANASUAREZ

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/11/2022
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 168 de 2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

FECHA DE INICIO: 26/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 7 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 26/03/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ---------- FECHA DE VERSIÓN: ----------

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ---------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ----------

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ---------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ----------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: ----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ----------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ---------- **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ----------

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ---------- **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ----------

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ----------

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/11/2022
(Día) (Mes) (Año)

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ..... **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: ANDRES GARCIA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 1014239477

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL


• Seguimiento Programa de Obra

ID	Task Mode	Nombre de tarea	UND	CANT	Duration	Start
1		**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES**			**190 days**	**Fri 8/26/22**
2		**EXPLANACIONES**			**129 days**	**Thu 10/13/22**
3		Excavaciones varias en material común en seco (Vigas rio	m3	51,00	20 days	Tue 2/14/23
4		Excavación en material común de la explanación y canale	m3	3.458,00	80 days	Thu 10/13/22
5		**PLACA HUELLA, ANCHO 6,10m**			**116 days**	**Thu 11/17/22**
6		Subbase Granular Clase C.	m3	1153,00	65 days	Fri 12/09/22
7		Afirmado (Material para Mejoramiento)	m3	1153,00	65 days	Thu 11/17/22
8		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUE	m3	391,50	70 days	Wed 12/21/22
9		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIO	m3	128,10	65 days	Fri 1/06/23
10		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	435,00	45 days	Sat 2/04/23
11		Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60%	m3	456,80	60 days	Thu 1/12/23
12		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	39.498,00	75 days	Wed 12/21/22
13		**TRANSPORTE**			**120 days**	**Tue 10/18/22**
14		Transporte de materiales provenientes de la excavación d	m3/km	35.090,00	120 days	Tue 10/18/22
15		**CARACTERIZACIÓN VIAL**			**30 days**	**Mon 2/20/23**
16		Caracaterización del corredor	km	3,052	30 days	Mon 2/20/23
17		**OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA OBRA**			**174 days**	**Fri 8/26/22**
18		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O CO	GLOB	1	90 days	Mon 11/28/22
19		REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑO	GLOB	1	45 days	Fri 8/26/22

Project: PROGRAMACION
Date: 11/05/2022 13:47

Task	**Split**	**Milestone**	**Summary**	**Project Summary**
External Tasks	**External Milestone**	**Inactive Task**	**Inactive Milestone**	**Inactive Summary**
Manual Task	**Duration-only**	**Summary Rollup**	**Manual Summary**	**Start-only**
Finish-only	**Progress**	**Deadline**		

Finish	Predecessors	Resource Names
Sat 3/25/23		
Tue 3/07/23		
Tue 3/07/23	14FF;6FS-5 day	
Fri 1/13/23	19	
Sat 3/25/23		
Mon 2/20/23	7SS+20 days	
Sat 1/28/23	4FS-51 days	
Tue 3/07/23	12SS	
Fri 3/17/23	6FS-40 days	
Sat 3/25/23	9FF+6 days	
Fri 3/17/23	8SS+20 days	
Mon 3/13/23	7FS-35 days;6S	
Wed 3/01/23		
Wed 3/01/23	4SS+3 days	
Fri 3/24/23		
Fri 3/24/23	6	
Tue 3/07/23		
Tue 3/07/23	3FF;4SS	
Thu 10/13/22		

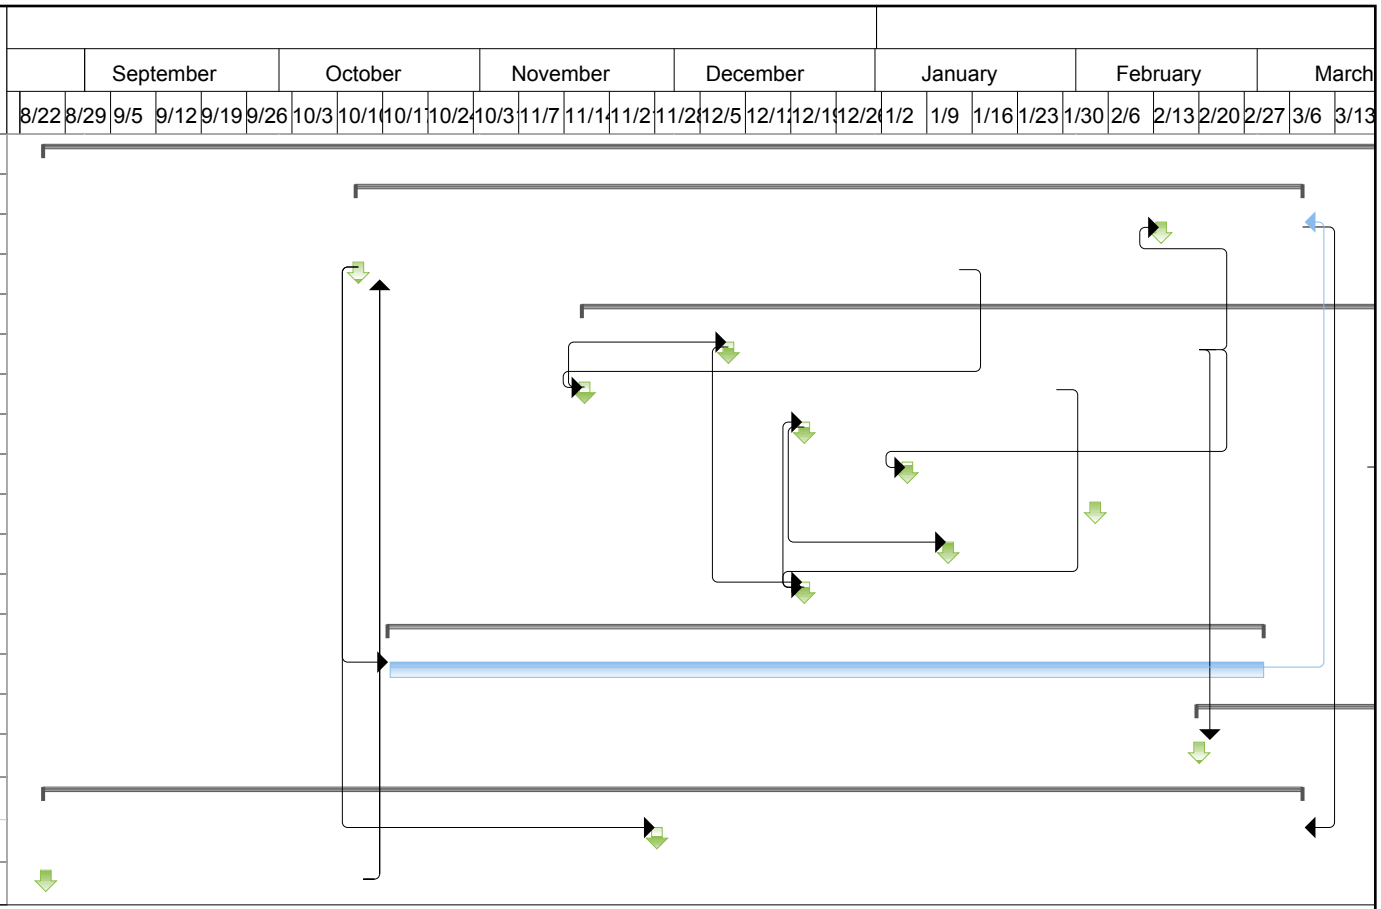

Project: PROGRAMACION
Date: 11/05/2022 13:47

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary
External Tasks	External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary
Manual Task	Duration-only	Summary Rollup	Manual Summary	Start-only
Finish-only	Progress	Deadline		

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES,

MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 168 DE 2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL:	7 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	26/08/2022 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	26/03/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 1.798.832.520,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):**	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 1.798.832.520,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 / ago-22	2 / sep-22	3 / oct-22	4 / nov-22	5 / dic-22	6 / ene-23	7 / feb-23	8 / mar-23		
GPP1 - EXPLANACIONES	$ 43.377,90	2,45%	0%	% P			$0,007	$0,007	$0,007	$0,004	$0,006	$0,000		
				$ P			$11.856,000	$12.027,082	$12.540,327	$6.783,439	$17,082	$0,000		
				$ E										
				% E										
GPP2 -PLACA HUELLA 6,10m	$ 1.658.363,52	93,85%	0%	% P			0,00%	$0,212	$0,266	$0,292	$0,138	$0,031		
				$ P			$0	$374.368,354	$470.261,702	$515.672,388	$244.082,829	$53.978,247		
				$ E										
				% E										
GPP3 - TRANSPORTE	$ 63.162,00	3,57%	0%	% P			$0,007	$0,007	$0,007	$0,009	$0,007	$0,000		
				$ P			$12.030,857	$12.030,857	$12.030,857	$15.030,571	$12.030,857	$0,000		
				$ E										
				% E										
GPP4 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 2.136,40	0,12%	0%	% P			$0,000	$0,000	$0,000	$0,000	$0,000	$0,000		
				$ P			$388,436	$388,436	$388,436	$485,545	$388,436	$97,109		
				$ E										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 1.767.039,82**	**100%**	**0%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	1,37%	22,57%	28,03%	30,45%	14,53%	3,06%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.275,29	$ 398.814,73	$ 495.221,32	$ 537.979,91	$ 256.673,20	$ 54.075,36		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	1,37%	23,94%	51,97%	82,41%	96,94%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.275,29	$ 423.090,02	$ 918.311,35	$ 1.456.291,26	$ 1.712.964,46	$ 1.767.039,82		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 12.838.000,00 / $ -	$ -	%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.954.700,00 / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 31.792.700,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.798.832.520,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANDRES FELIPE GARCIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.767.039.820,00

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 168 DE 2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 7 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.798.832.520,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.798.832.520,00

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/03/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ago-22	2 sep-22	3 oct-22	4 nov-22	5 dic-22	6 ene-23	7 feb-23	8 mar-23		
GPP1 - EXPLANACIONES	$43.378	2,45%		% P			$0,007	$0,007	$0,007	$0,004	$0,000	$0,000		
				$ P			$11.856.000	$12.027.082	$12.540.327	$6.783.409	$171.082	$0,000		
				$ E										
				% E										
GPP2 -PLACA HUELLA 6,1Om	$1.658.364	93,85%		% P			0,00%	$0,212	$0,268	$0,252	$0,138	$0,031		
				$ P			$0	$374.368.354	$470.261.702	$515.672.388	$244.082.829	$53.978.247		
				$ E										
				% E										
GPP3 - PLACA HUELLA 6,1Om	$0	0,00%		% P				-						
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3 - TRANSPORTE	$63.162	3,57%		% P			$0,007	$0,007	$0,007	$0,009	$0,007	$0,000		
				$ P			$12.030.857	$12.030.857	$12.030.857	$15.038.571	$12.030.857	$0,000		
				$ E										
				% E										
GPP4 - CARACTERIZACIÓN VIAL	$2.136	0,12%		% P			$0,000	$0,000	$0,000	$0,000	$0,000	$0,000		
				$ P			$388.436	$388.436	$388.436	$485.545	$388.436	$97.109		
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.767.039,82	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	1,37%	22,57%	28,03%	30,45%	14,53%	3,06%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$24.275	$398.815	$495.221	$537.980	$256.673	$54.075			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	1,37%	23,94%	51,97%	82,41%	96,94%	100,00%			0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$24.275	$423.090	$918.311	$1.456.291	$1.712.964	$1.767.040			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 12.838.000,00	$ -	%
	$ -		
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.954.700,00	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 31.792.700,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.798.832.520,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANDRES FELIPE GARCIA RICO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

• Actas de Comité de Obra

FECHA: 19/10/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 168 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE, NIT. 9016006453

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Presentación de avance parcial de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños: cumplió
Entrega del documento PAGA: no cumplió

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance a la Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Aprobación de pólizas
3. Socialización del proyecto
4. Componente social
5. Valla
6. Rendimientos financieros
7. Seguridad Social

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance a la Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños: la interventoría manifiesta que el contratista se encuentra atrasado en la presentación de los entregables producto de la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, ya que a la fecha sólo se han entregado los componentes de geotecnia y pavimento, de los cuales la interventoría ya conceptuó y realizó observaciones, a lo que el contratista solicitó mesa de trabajo entre especialista. La interventoría les hace un llamado de atención al contratista para que sean mas dinámicos y presenten la información puntual. Por su parte el contratista manifiesta que está pendiente por entregar el estudio hidrológico y el de sostenibilidad y se compromete entregarlos el día 19 de octubre de 2019.
En relación al PAGA, el especialista ambiental por parte del contratista menciona que ha estado en comunicación con el especialista ambiental de la interventoría y han llegado a una concertación del documento PAGA y que el día viernes 21 de octubre de 2022, estaría enviando el documento para su revisión. Con
relación a la documentación inicial, la interventoría solicita subsanar de forma la siguiente información:
- Propuesta económica y APUS, con firma del representante legal
- Programación en Project, debidamente firmada
- Relacionar todo el equipo mínimo obligatorio, de acuerdo al anexo 1 - Anexo Técnico, con su respectiva documentación
- Presentar el PMT en medio magnético-editable, debidamente firmado. 2.
Aprobación de pólizas: la interventoría solicita la aprobación de las pólizas actualizadas según acta de inicio, a lo que la secretaria de Infraestructura se compromete solicitarlas a la dependencia de Jurídica del Municipio y remitirlas a la interventoría. Con
respecto al PMT, la secretaria de Infraestructura Municipal informa que lo remitió a la Oficina de transito para su revisión y visto bueno, con la finalidad de dar la aprobación pertinente. 3.
Socialización del proyecto: se acuerda socializar el proyecto y conformar la veeduría, el día 27 de octubre de 2022.
4. Componente social: la interventoría pregunta por la gestión para la realización de las actas de vecindad, a lo que el contratista informa que en el costado de la vía a intervenir no se encuentran viviendas cercanas. Se acuerda realizar las actas de vecindad sobre los muros de fachada que están a las entradas a las fincas, el día 20 de octubre de 2022. 5. Valla: la
interventoría manifiesta que está a la espera que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, entregue el arte definitivo que se va a implementar en los contratos, para hacérselos llegar a los contratistas. El contratista manifiesta que cuenta con la estructura para la instalación de la valla.
6. Rendimientos financieros: el Municipio informa que desde el mes de diciembre de 2021, el banco no gira los rendimiento que tienen en la cuenta, dicha solicitud se envió al banco y se acordó que en el transcurso de esta semana se hace la consignación. 7. Seguridad
Social: la interventoría solicita al contratista, presentar oportunamente los soportes de afiliación y pagos de aportes al Sistema General de Seguridad Social, del personal vinculado a la ejecución de la obra.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Presentar estudio hidrológico y de sostenibilidad	19/10/2022	Contratista
Entrega del documento PAGA	21/10/2022	Contratista
Entrega de aprobación de Pólizas actualizadas y emisión de concepto del PMT	24/10/2022	Municipio de Sahagún
Realizar actas de vecindad	20/10/2022	Contratista
Presentar los soportes de afiliación y soportes de pagos de seguridad social del personal	20/10/2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21/11/2022
(Día / Mes / Año)






NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
ANDRES FELIPE GARCIA RICO	Representante Legal	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	Supervisor contrato de Interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	
MARÍA KARINA BULA ORTEGA	Secretaria de obras Pública-Municipio de Sahagún	Municipio de Sahagún - Contratante	
LUIS FERNANDO LÓPEZ HOYOS	Residente de obra	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	
DOLCEY LEIVA	Especialista Ambiental	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

• Actas de **Reunión**

No se realizan durante el periodo

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha, se tiene una inversión de obra programada de $ 24.275.293,5 correspondiente al 1,37% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $0,00 correspondiente al 0,0%; lo que representa un atraso del 1,37%.

Se realizó el comité de obra No. 2, en el cual se le hizo seguimiento a la ejecución del contrato de obra.

Se recomienda atender las observaciones pendientes por subsanar para culminar rápidamente la etapa de revisión y/o ajustes definitivos a los estudios y diseños

Se recomienda iniciar las actividades de construcción y darles celeridad, con la finalidad de mitigar los atrasos presentados con respecto a la programación de obra

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
26/10/2022	002-GAMB-CCL	DOCUEMENTO PAGA RADICACION DE LINEA BASE E IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS.	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE
21/10/2022	F-CHCL-008	APUS FIRMADOS	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE
18/10/2022	F-CHCL-007	SOLICITUD MESA DE TRABAJO ESTUDIOS Y DISEÑOS Contrato de Obra No 168-2022: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE
30/10/2022	F-CHCL-009	SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR Contrato de Obra No 168-2022: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

8.1.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

RELACIÓN DE CORRESPONDECIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
7/10/2022	CVRIMG- 080 - 2022	SOLICITUD PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LA REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS.	CONSORCIO PLACA HUELLA CEIBA DE LECHE
7/10/2022	CVRIMG- 089 - 2022	Solicitud de soportes de afiliación al SGSS y pagos al día del personal vinculado a la ejecución del proyecto.	CONSORCIO PLACA HUELLA CEIBA DE LECHE
15/10/2022	CVRIMG- 106 - 2022	INFORME OBSERVACIONES ESTUDIO DE PAVIMENTOS	CONSORCIO PLACA HUELLA CEIBA DE LECHE

15/10/2022	CVRIMG- 111 - 2022	Informe observaciones estudio geotecnia	CONSORCIO PLACA HUELLA CEIBA DE LECHE
18/10/2022	CVRIMG- 115 - 2022	Atraso del contrato de obra y solicitud de los entregables de la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.	CONSORCIO PLACA HUELLA CEIBA DE LECHE
24/10/2022	CVRIMG- 124 - 2022	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PAGA EN PROYECTOS CLASIFICADOS EN COMPLEJIDAD BAJA	CONSORCIO PLACA HUELLA CEIBA DE LECHE
26/10/2022	CVRIMG- 134 - 2022	Atraso del contrato de obra.	CONSORCIO PLACA HUELLA CEIBA DE LECHE
27/10/2022	CVRIMG- 141 - 2022	Seguimiento a los compromisos acordados en el comité de obra No. 2 de fecha 19 de octubre de 2022.	CONSORCIO PLACA HUELLA CEIBA DE LECHE
28/10/2022	CVRIMG- 144 - 2022	Aprobación revisión y/o ajuste del estudio de pavimentos.	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE
28/10/2022	CVRIMG- 150 - 2022	Remisión de observaciones al Estudio Hidráulico e Hidrológico	CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO – Contrato No. 168 de 2022	
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Levantamiento topográfico conjuntamente	Levantamiento topográfico conjuntamente

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO – Contrato No. 168 de 2022	
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	
DESCRIPCIÓN	**DESCRIPCIÓN**
Socialización del proyecto, con la comunidad	Socialización del proyecto, con la comunidad

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Día 29 Miercoles 28 de Septiembre del 2022
Etapa de revisión estudios y diseños.

Ing. Res. Interventoría.

Día 30 Jueves 29 de Septiembre del 2022
Etapa de revisión estudios y diseños

Ing. Res. Interventoría

Día 31 Viernes 30 de Septiembre del 2022
Etapa de revisión estudios y diseños


Ing. Res. Interventoría.

Sabado, 01 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa


Domingo, 02 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
No se laboró por ser domingo.

Lunes, 03 de octubre de 2022
Actividades realizadas
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa


Martes, 04 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa




Miercoles, 05 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa




Jueves, 06 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.



Viernes, 07 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.




Sabado, 08 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa





Domingo, 09 de octubre de 2022
No se laboró por ser domingo.






Lunes, 10 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa

Martes, 11 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa

Miercoles, 12 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa.

Jueves, 13 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa




Viernes, 14 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.


Sabado, 15 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa.

Domingo, 16 de octubre de 2022
No se laboró por ser domingo.


Lunes, 17 de octubre de 2022
No se laboró por ser festivo.

Martes, 18 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.


Miercoles, 19 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa
3. Realización del Comité No 2 de seguimiento de obra.




Jueves, 20 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.




Viernes, 21 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa




Sabado, 22 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa





Domingo, 23 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
No se laboró por ser domingo.






Lunes, 24 de octubre de 2022.
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa







Martes, 25 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa





Miercoles, 26 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.





Jueves, 27 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa.
3. Socialización del proyecto con la comunidad, por

Parte del contratista de obra, Municipio-Contratante, Interventoría e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

Viernes, 28 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Sabado, 29 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.

Domingo, 30 de octubre de 2022
No se laboró por ser domingo.

Lunes, 31 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Gestión administrativa.
3. Replanteo topográfico en conjunto de la comisión topográfica de la Interventoría y
