10.3 CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE OBRA.

311 706 64 17.
gerenciaposi@gmail.com
Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO DE PERSONAL

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	14/02/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
MES INFORME	NOVIEMBRE

PERSONAL/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ayudantes															3	3		5	5	5	7	7	7		7	7	7	7	7	7
Oficiales															2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
Maestro de obra															1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Residente de obra															1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Topografo															1	1		1	1	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0
Director de obra															1	1		1	0	1	0	1	0		1	0	1	0	1	1
Aux. siso															1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
Siso															1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO DE PERSONAL

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	14/02/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
MES INFORME	DICIEMBRE

PERSONAL/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ayudantes		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		5	5	5	5	5											
Oficiales		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	3	2	2											
Maestro de obra		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1											
Residente de obra		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1											
Topografo		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0											
Director de obra		1	0	1	0	1	0		1	0	1	1	1	0		1	0	1	0	1											
Aux. siso		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1											
Siso		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1											

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO DE PERSONAL

CONTRATO: EDUH-IP-005-2024

OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA

VALOR: $2.773.708.832

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"

INTERVENTOR: PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO: 15/11/2024

FECHA TERMINACIÓN: 13/03/2025

PLAZO INICIAL: 3 MESES

MES INFORME: ENERO

PERSONAL/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ayudantes																	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8
Oficiales																	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	2
Maestro de obra																	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Residente de obra																	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Topografo																	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Director de obra																	1	0		1	1	1	1	1	1		1	0	1	1	1
Aux. siso																	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Siso																	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO DE PERSONAL

CONTRATO: EDUH-IP-005-2024

OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA

VALOR: $2.773.708.832

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"

INTERVENTOR: PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO: 15/11/2024

FECHA TERMINACIÓN: 13/03/2025

PLAZO INICIAL: 3 MESES

MES INFORME: FEBRERO

PERSONAL/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ayudantes	8		8	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7
Oficiales	2		2	2	2	2	2	0		2	2	2	2	2	1		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2
Maestro de obra	1		1	1	1	1	1	2		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Residente de obra	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Topografo	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Director de obra	0		1	0	1	0	1	1		1	0	1	0	1	0		1	1	1	0	1	0		1	0	1	0	1
Aux. siso	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Siso	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO DE PERSONAL

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	8/04/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
PRORROGA 1:	26 DIAS
MES INFORME	MARZO

PERSONAL/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ayudantes	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7			7	7	7	7	7	7	7
Oficiales	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2
Maestro de obra	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
Residente de obra	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
Topografo	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Director de obra	1		1	0	1	1	0	1		1	0	1	1	1	1		1	0	1	0	1	0			1	0	1	0	1	0	1
Aux. siso	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
Siso	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO DE PERSONAL

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	8/06/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
PRORROGA 1:	26 DIAS
PRORROGA 2:	2 MESES
MES INFORME	ABRIL

PERSONAL/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ayudantes	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7		7	7	7			7		7	7	7	7	7	7		7	7	7
Oficiales	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2			2		2	2	2	2	2	2		2	2	2
Maestro de obra	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
Residente de obra	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
Topografo	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Director de obra	1	0	1	1	0		1	0	1	1	1	1		0	1	1			1		1	0	1	1	0	1		0	1	1
Aux. siso	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
Siso	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	8/06/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
PRORROGA 1:	26 DIAS
PRORROGA 2:	2 MESES
MES INFORME	MAYO

MAQUINA O EQUIPO /DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RETROEXCAVADORA		A	A		I	I	I	I	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		I		A	A	A	A	A	A
CANGURO		A	A		I	I	I	I	I	A		A	A	I	A	A	A		A	I	A	A		I		A	A	I	A	A	A
TALADRO PERCUTOR		A	A		I	I	I	I	I	A		A	I	A	A	A	A		I	A	A	A		I		A	I	A	A	A	A
MOTOBOMBA 3"		I	I		A	I	I	I	A	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
PULIDORA		I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	A	I		A	A	I	A	A	A		A	A	A	I	A	I
CONCRETADORA		I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	A	I		A	A	I	A	A	A		A	A	A	I	A	I
CIRCULAR		I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	A	I		A	A	I	A	A	A		A	A	A	I	A	I
RANA		A	A		I	I	I	I	I	A		A	I	I	A	A	A		I	I	A	A	I	I		A	I	I	A	A	A
VIBRADOR		I	I		A	A	A	A	A	I		I	I	A	I	I	I		I	A	I		A	A		I	I	A	I	I	I

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

CONVENCIONES:
A: ACTIVO
R: REPARACIÓN
I: INACTIVO

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	8/06/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
PRORROGA 1:	26 DIAS
PRORROGA 2:	2 MESES
MES INFORME	JUNIO

MAQUINA O EQUIPO /DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA			A	A																											
CANGURO			A	A																											
TALADRO PERCUTOR			A	A																											
MOTOBOMBA 3"			I	I																											
PULIDORA			A	I																											
CONCRETADORA			A	I																											
CIRCULAR			A	I																											
RANA			A	A																											
VIBRADOR			I	I																											

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

CONVENCIONES:
A: ACTIVO
R: REPARACIÓN
I: INACTIVO

10.4 TIEMPO.

311 706 64 17.
gerenciaposi@gmail.com
Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	14/02/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
MES INFORME	NOVIEMBRE

CLASE DE TIEMPO/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO																		0	4	5	4	2	8		6	3	4	7	5	8
NUBLADO																		8	1	0	2	2	0		0	5	4	1	3	0
LLUVIAS MODERADAS																		0	2	3	2	3	0		2	0	0	0	0	0
LLUVIAS INTENSAS																		0	1	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0

NOTA: EN CADA CASILLA INDIQUE EL NUMERO DE HORAS EN QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	14/02/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
MES INFORME	DICIEMBRE

CLASE DE TIEMPO/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO		3	4	8	6,5	7	8		6	8	5	4	8	5		8	8	4	5	8											
NUBLADO		5	4	0	1,5	1	0		2	0	3	3	0	3		0	0	3	3	0											
LLUVIAS MODERADAS		0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0		0	0	1	0	0											
LLUVIAS INTENSAS		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0											

NOTA: EN CADA CASILLA INDIQUE EL NUMERO DE HORAS EN QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	13/03/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
MES INFORME	ENERO

CLASE DE TIEMPO/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																	8	8		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8
NUBLADO																	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
LLUVIAS MODERADAS																	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
LLUVIAS INTENSAS																	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

NOTA: EN CADA CASILLA INDIQUE EL NUMERO DE HORAS EN QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	13/03/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
MES INFORME	FEBRERO

CLASE DE TIEMPO/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SOLEADO	8		3	4	8	6,5	7	8		6	8	5	4	8	5		8	8	4	5	8	8		8	8	8	8	8
NUBLADO	0		5	4	0	1,5	1	0		2	0	3	3	0	3		0	0	3	3	0	0		0	0	0	0	0
LLUVIAS MODERADAS	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0		0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0
LLUVIAS INTENSAS	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

NOTA: EN CADA CASILLA INDIQUE EL NUMERO DE HORAS EN QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	8/04/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
PRORROGA 1:	26 DIAS
MES INFORME	MARZO

CLASE DE TIEMPO/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	6,5		6	8	5	4	8	5		8	8	4	5	8	8		6	8	5	4	8	5			5	4	4	2	4	4	2
NUBLADO	1,5		2	0	3	3	0	3		0	0	3	3	0	0		2	0	3	3	0	3			3	3	2	2	3	2	2
LLUVIAS MODERADAS	0		0	0	0	1	0	0		0	0	1	0	0	0		0	0	0	1	0	0			0	1	2	3	1	2	3
LLUVIAS INTENSAS	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	1	0	0	1

NOTA: EN CADA CASILLA INDIQUE EL NUMERO DE HORAS EN QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	8/06/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
PRORROGA 1:	26 DIAS
PRORROGA 2:	2 MESES
MES INFORME	ABRIL

CLASE DE TIEMPO/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO	4	2	4	4	4		5	4	4	2	4	4		2	4	4			2		5	4	4	2	4	4		2	4	4
NUBLADO	2	2	3	3	2		3	3	2	2	3	2		2	3	2			2		3	3	2	2	3	2		2	3	2
LLUVIAS MODERADAS	2	3	1	1	2		0	1	2	3	1	2		3	1	2			3		0	1	2	3	1	2		3	1	2
LLUVIAS INTENSAS	0	1	0	0	0		0	0	0	1	0	0		1	0	0			1		0	0	0	1	0	0		1	0	0

NOTA: EN CADA CASILLA INDIQUE EL NUMERO DE HORAS EN QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	8/06/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
PRORROGA 1:	26 DIAS
PRORROGA 2:	2 MESES
MES INFORME	MAYO

CLASE DE TIEMPO/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO		2	4		4	4	5	4	4	2		4	4	2	4	4	4		2	4	5	4	4	2		4	2	2	4	4	
NUBLADO		2	3		2	2	3	3	2	2		2	3	2	3	2	3		2	3	3	3	2	2		2	2	2	3	2	
LLUVIAS MODERADAS		3	1		2	2	0	1	2	3		2	1	3	1	2	1		3	1	0	1	2	3		2	3	3	1	2	
LLUVIAS INTENSAS		1	0		0	0	0	0	0	1		0	0	1	0	0	0		1	0	0	0	0	1		0	1	1	0	0	

NOTA: EN CADA CASILLA INDIQUE EL NUMERO DE HORAS EN QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTROL DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	8/06/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
PRORROGA 1:	26 DIAS
PRORROGA 2:	2 MESES
MES INFORME	JUNIO

CLASE DE TIEMPO/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO			2	4																											
NUBLADO			2	2																											
LLUVIAS MODERADAS			3	2																											
LLUVIAS INTENSAS			1	0																											

NOTA: EN CADA CASILLA INDIQUE EL NUMERO DE HORAS EN QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

10.5 AVANCE FISICO FINANCIERO

311 706 64 17.
gerenciaposi@gmail.com
Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS E INTERVENTORIAS S.A.S.

INFORME FINANCIERO

CONTRATO	EDUH-IP-005-2024
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO,ANTIOQUIA
VALOR	$2.773.708.832
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
INTERVENTOR	PROYECTOS OBRAS SERVICIOS E INTERVENTORIA S.A.S.

FECHA INICIO:	15/11/2024
FECHA TERMINACIÓN:	8/06/2025
PLAZO INICIAL:	3 MESES
PRORROGA 1:	26 DIAS
PRORROGA 2:	2 MESES
MES INFORME	ABRIL

ACTA	PERIODO	FECHA DE COBRO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	I.V.A	RETENCIONES L	VALOR A PAGAR	SALDO PENDIENTE
ANTICIPO		16/11/2024	19/11/2024	$ 1.109.483.532,80	0	$ 44.000.000,00	$ 1.065.483.532,80	$ 1.664.225.299,20
ACTA 1		20/12/2024	27/12/2024	$ 1.882.929.327,00	0	$ 1.408.362.442,80	$ 474.566.884,20	$ 890.779.505,00
ACTA 2		30/01/2025	6/02/2025	$ 447.755.373,00	0	$ 95.927.904,00	$ 351.827.469,00	$ 443.024.132,00
ACTA 3		27/03/2025	8/04/2025	$ 169.628.390,00	0	$ 24.426.490,00	$ 145.201.900,00	$ 273.395.742,00
TOTAL								

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10.5 SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA.

311 706 64 17.
gerenciaposi@gmail.com
Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONAS JURIDICAS

REPRESENTANTE LEGAL

Yo Rubén Darío Zapata Castro, identificado con 71.986.298, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit. 900948991-8, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Urabá, certifico el pago de los siguientes aportes a mis empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos labores, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Apartadó a los doce (05) del mes de Mayo de 2025___

Rubén Darío Zapata Castro.

311 706 64 17.
gerenciaposi@gmail.com
Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

11. REGISTRO FOTOGRAFICO.

311 706 64 17.
gerenciaposi@gmail.com
Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

CERRAMIENTO PROVISIONAL





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

Explanación y nivelación del terreno

311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

EXCAVACIÓN





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

LLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMOS





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com


Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo


POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA REVENTADA

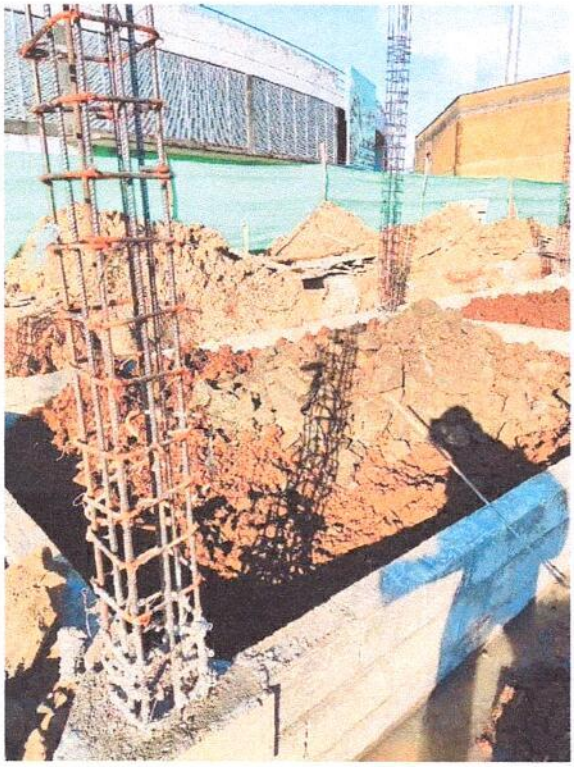

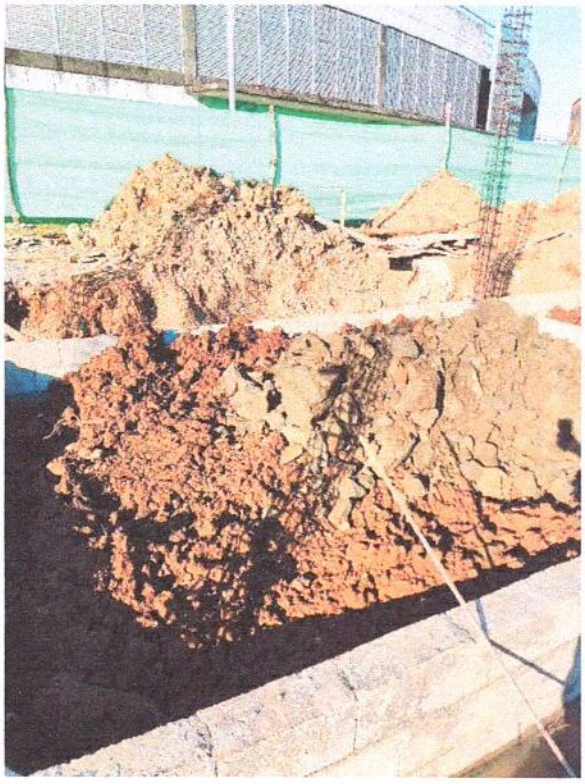

311 706 64 17.


gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

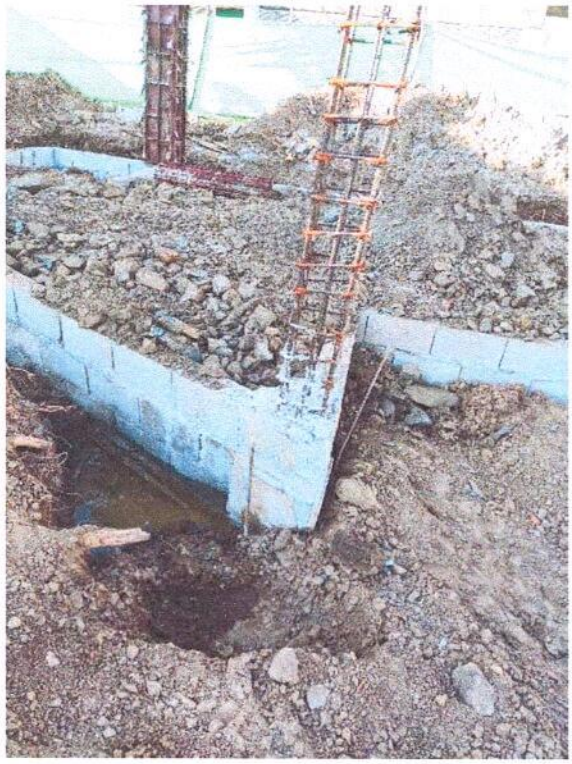



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com


Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

SOLADO DE LIMPIEZA

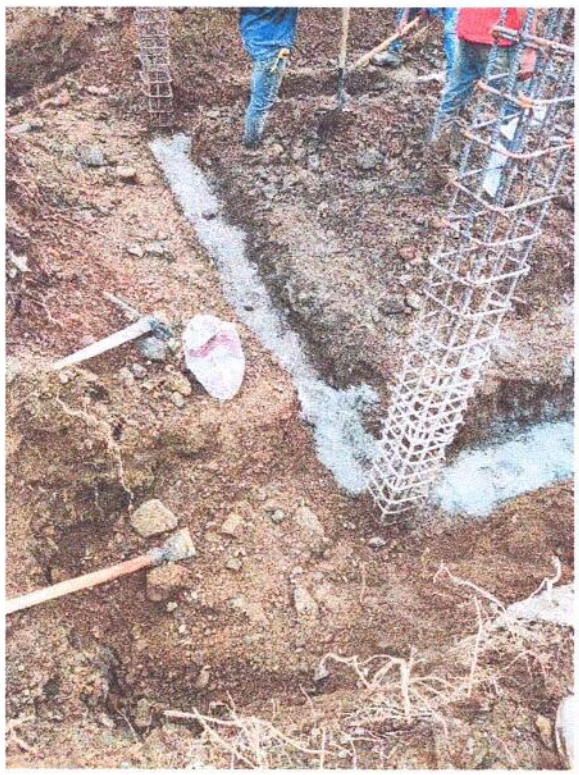



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

ZAPATAS





311 706 64 17.


gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

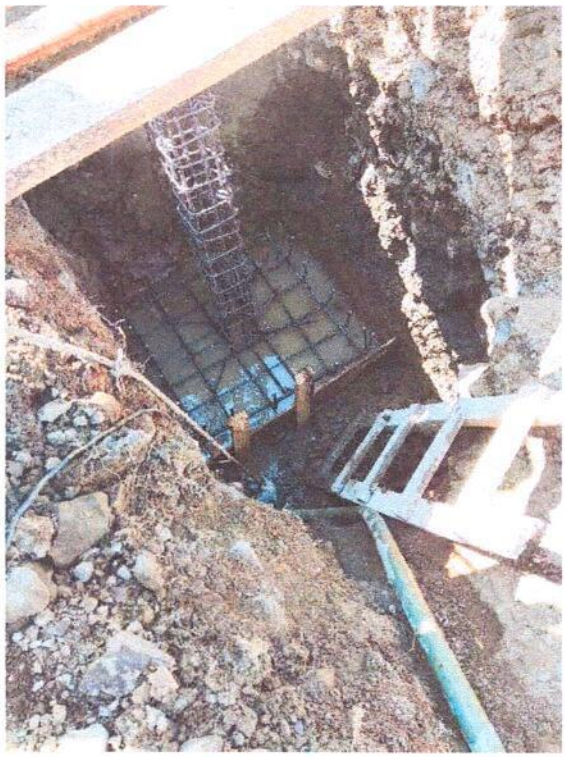



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com


Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo


POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

VIGAS DE FUNDACIÓN

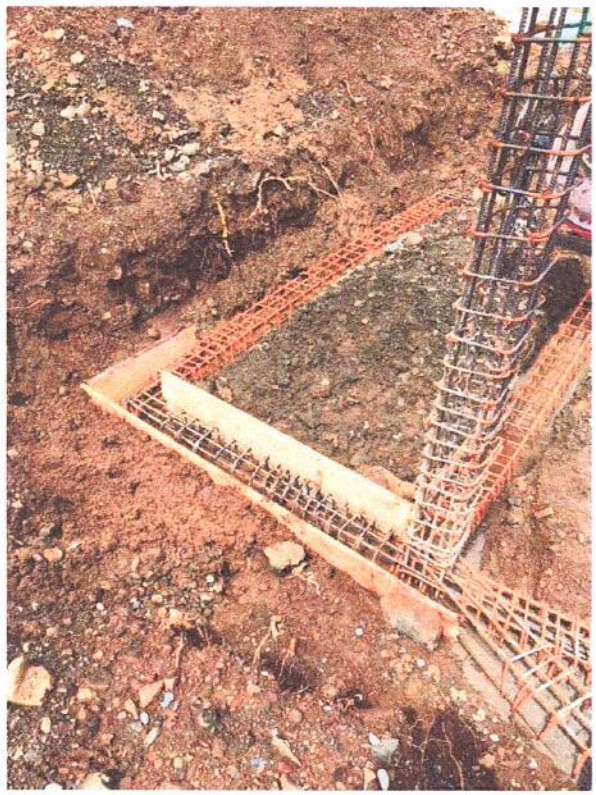

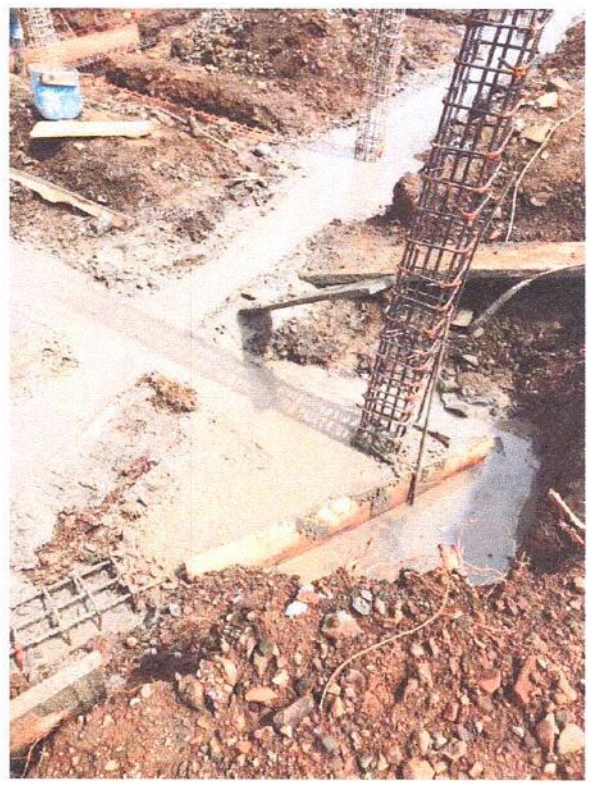

311 706 64 17.


gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

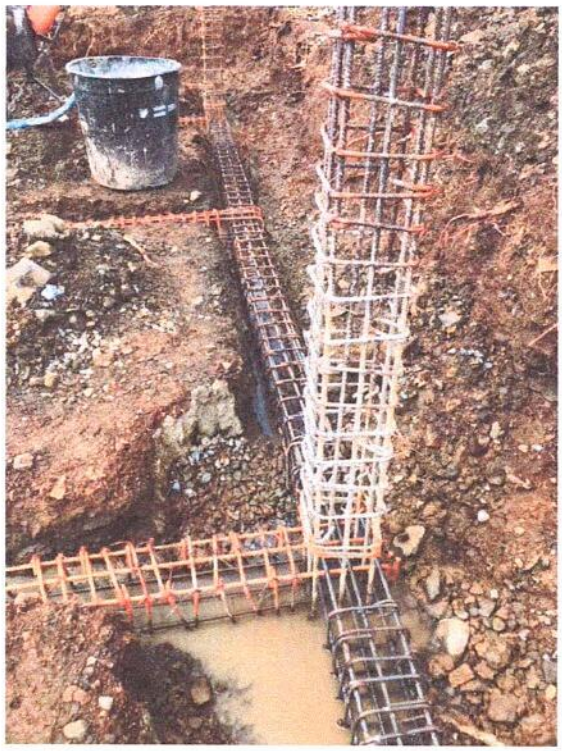



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com


Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

PEDESTALES

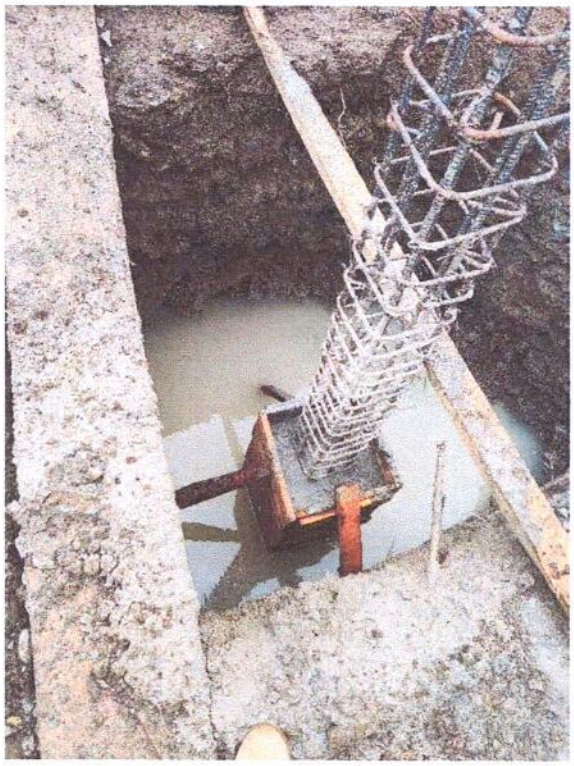



311 706 64 17.


gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

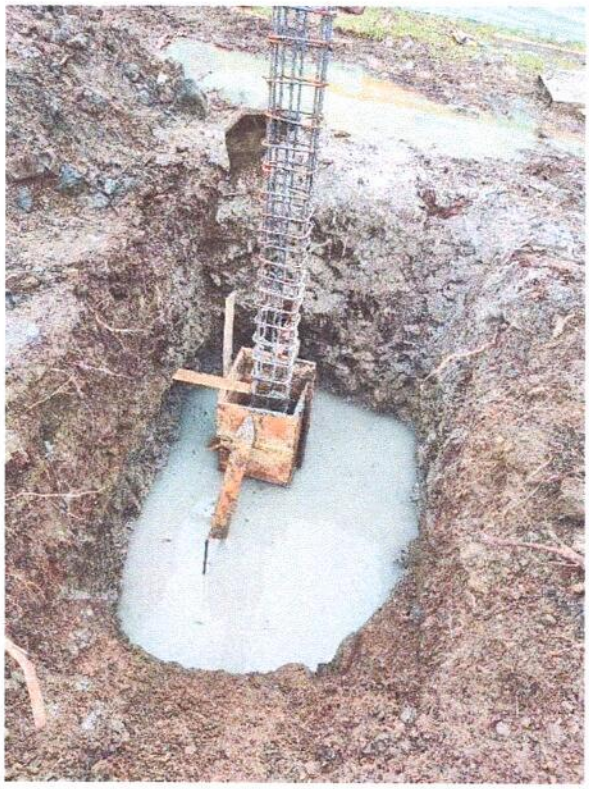



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo


POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

LOSA CONTRAPISO



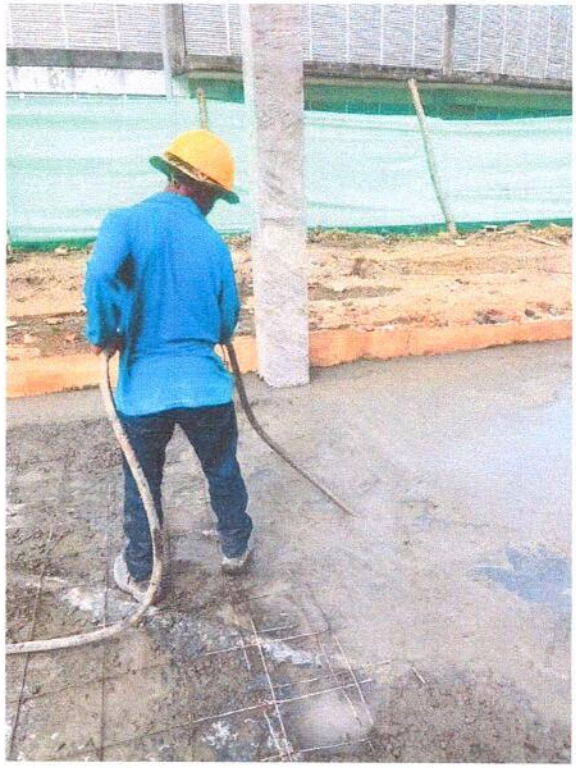

311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

MALLA ELECETROSOLDADA





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo


POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

COLUMNAS



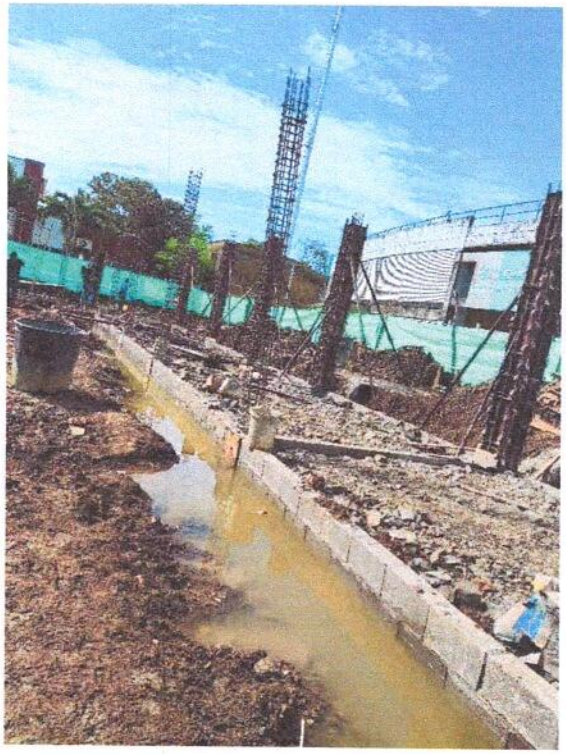

311 706 64 17.


gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

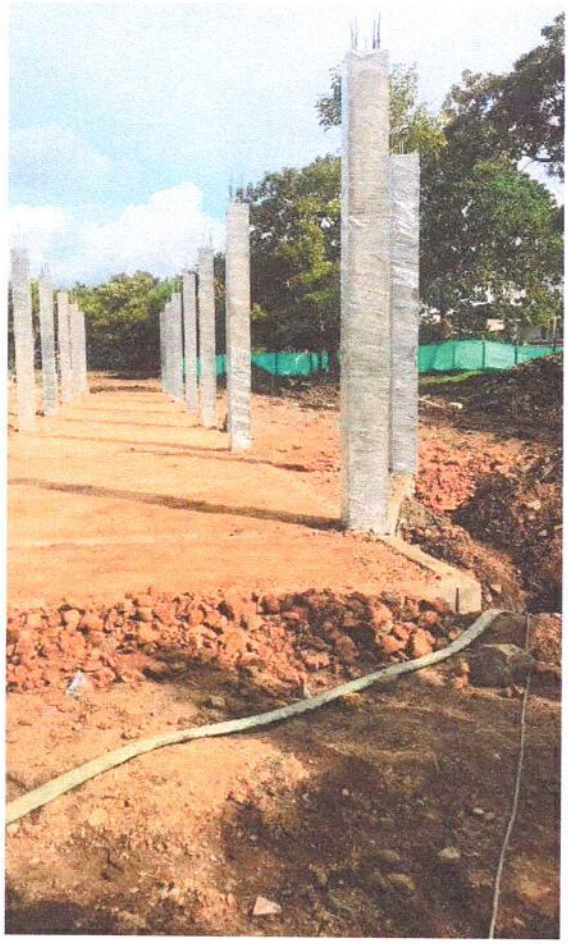



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

MAMPOSTERIA





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com


Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8



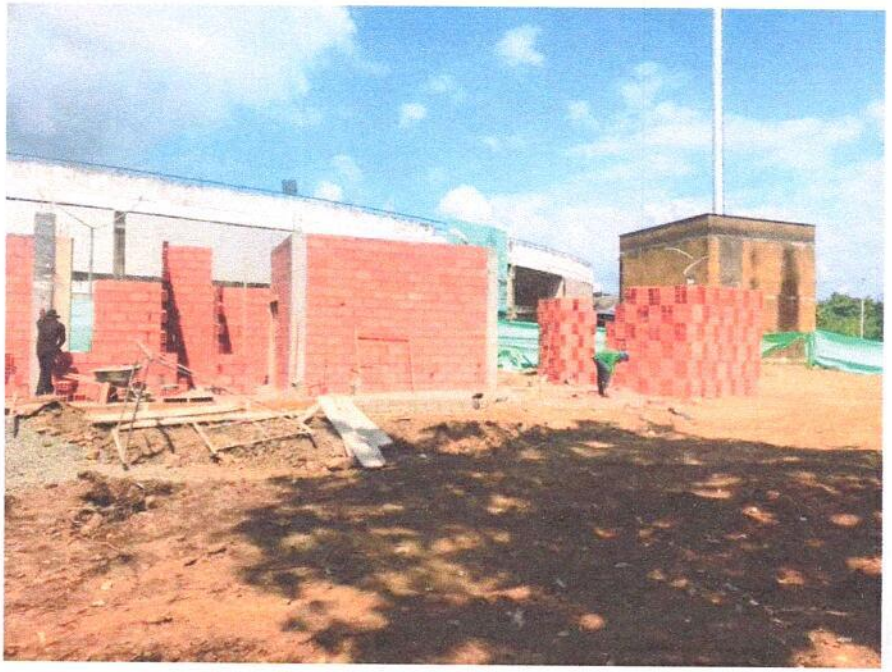

311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

EXCAVACION





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

LLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo


POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

SOLADO DE LIMPIEZA



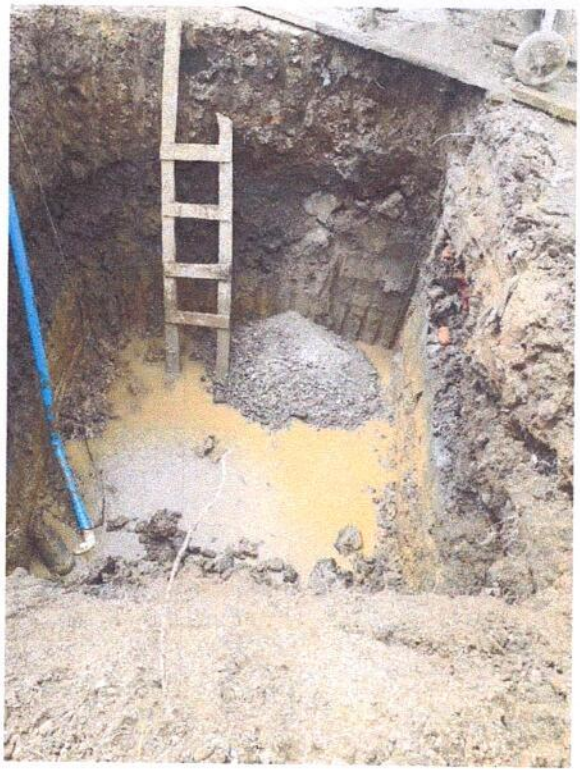

311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

ZAPATAS





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo


POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

VIGAS DE FUNDACIÓN



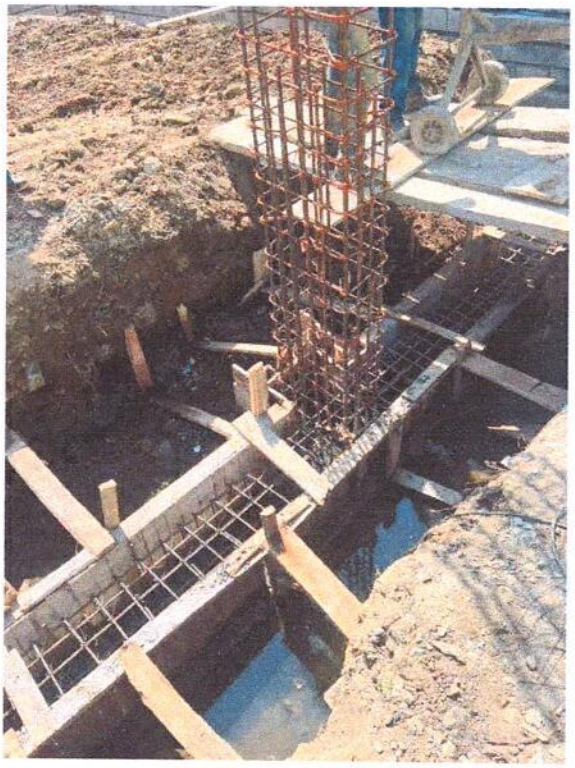

311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com


Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo


POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

PEDESTALES EN CONCRETO

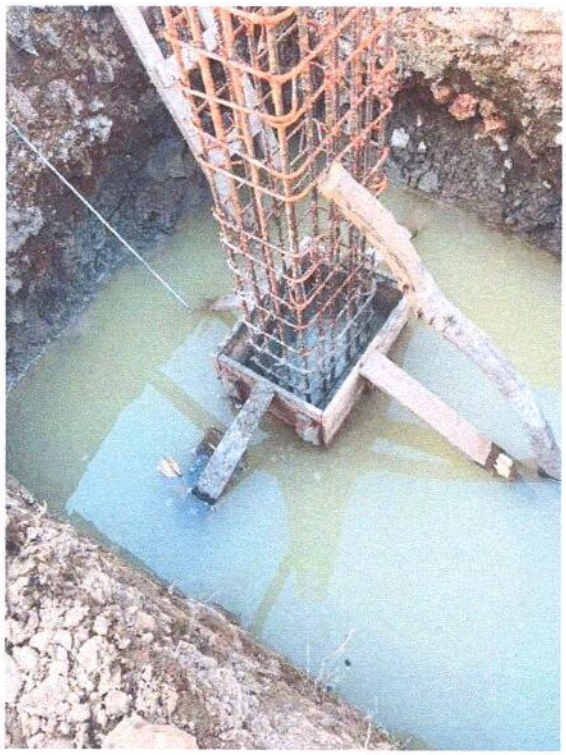

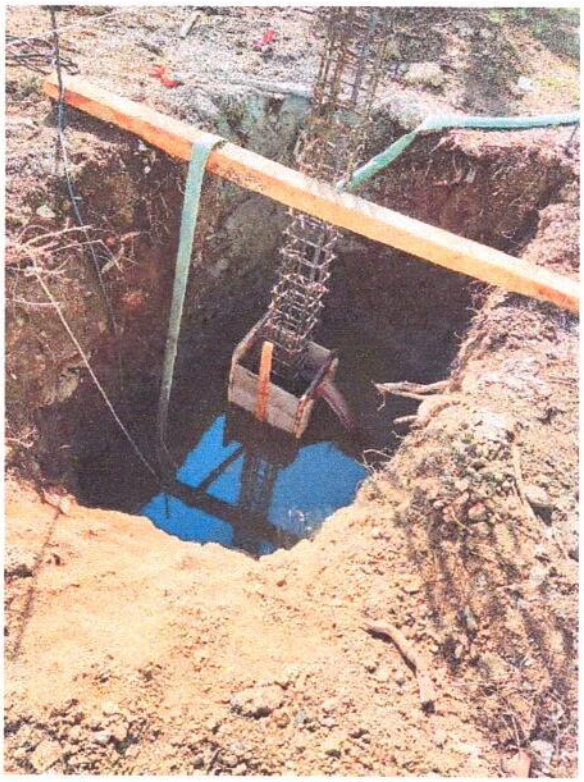

311 706 64 17.


gerenciaposi@gmail.com


Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

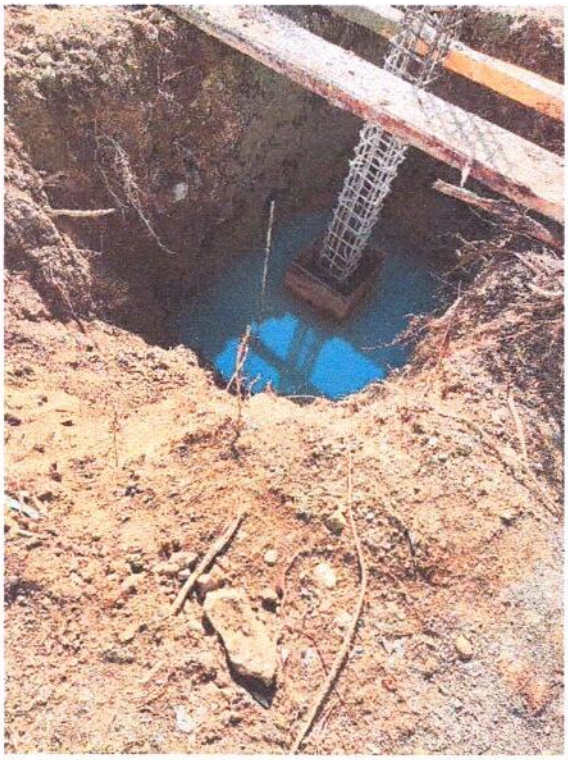

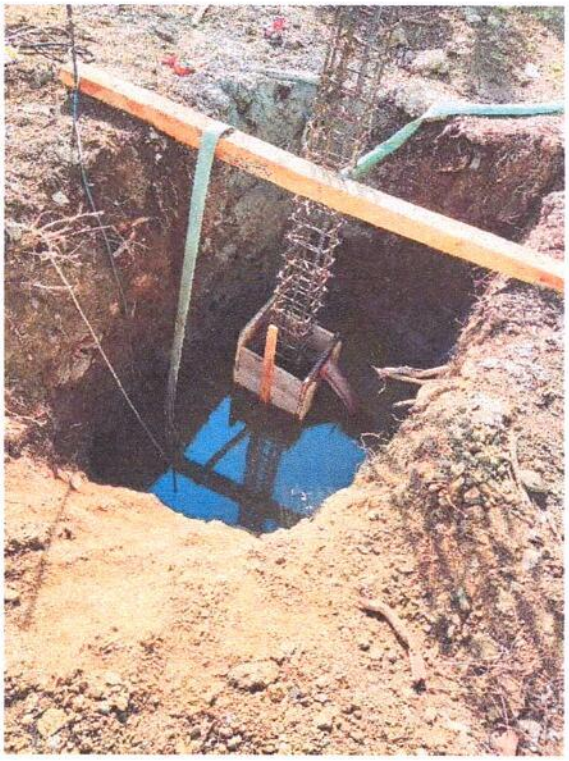

311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

LOSA CONTRAPISO





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

MALLA ELECTROSOLDADA





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8





311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

COLUMNAS





311 706 64 17.


gerenciaposi@gmail.com


Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

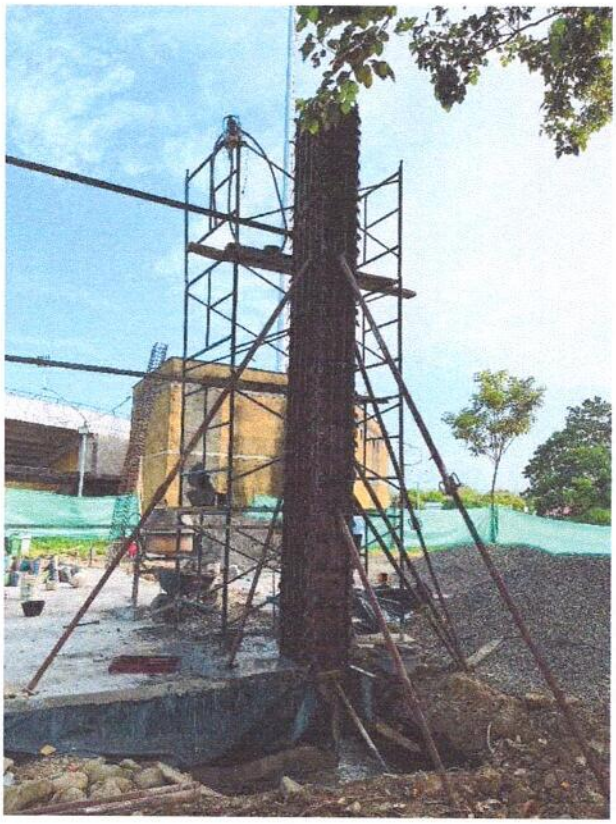

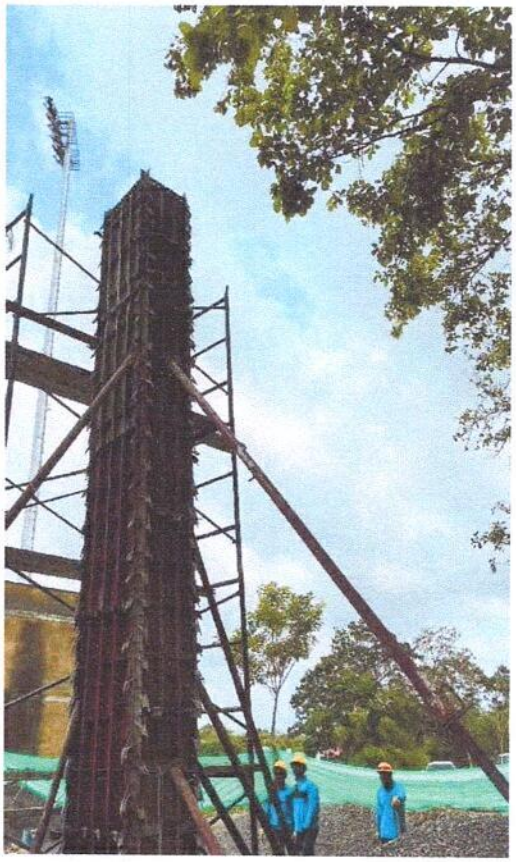

311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

VIGAS AEREAS





311 706 64 17.
gerenciaposi@gmail.com
Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo


POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

TEJA TERMOACUSTICA



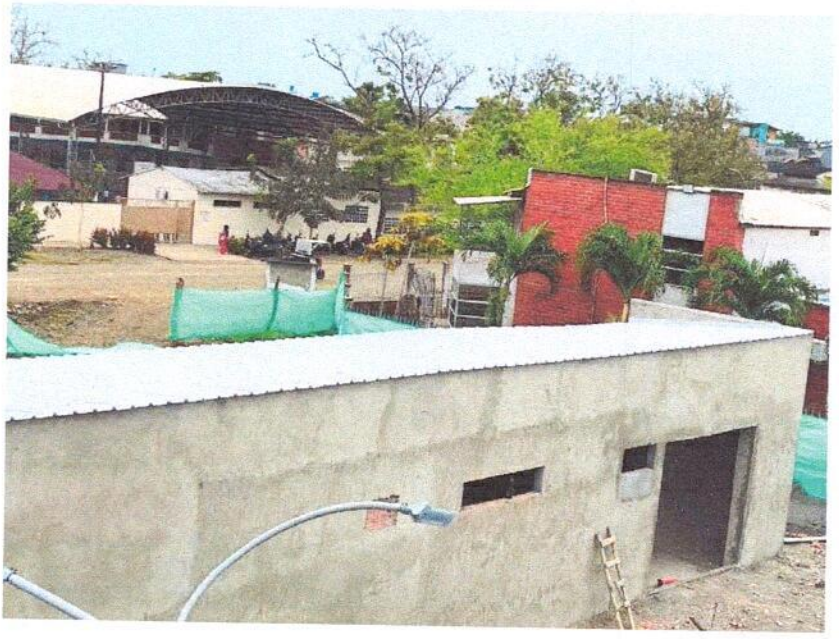

311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com


Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo


POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

PAÑETE EN MURO

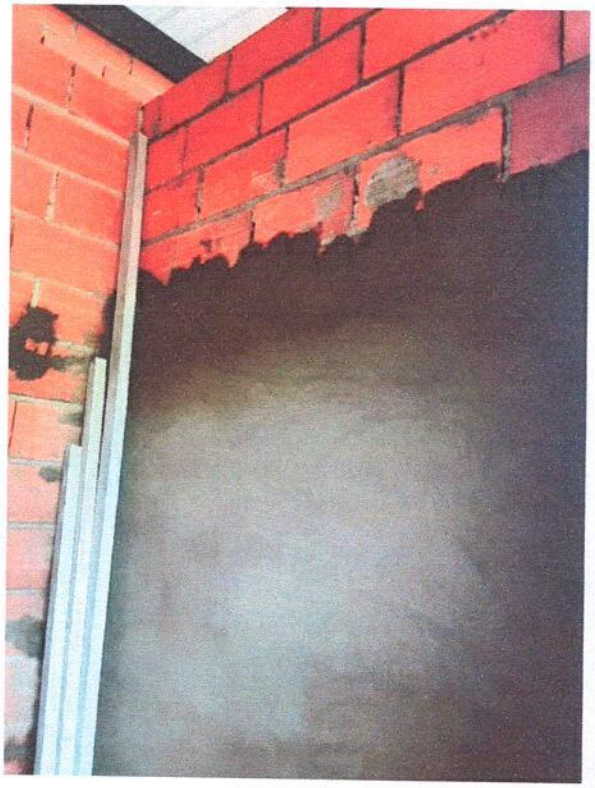

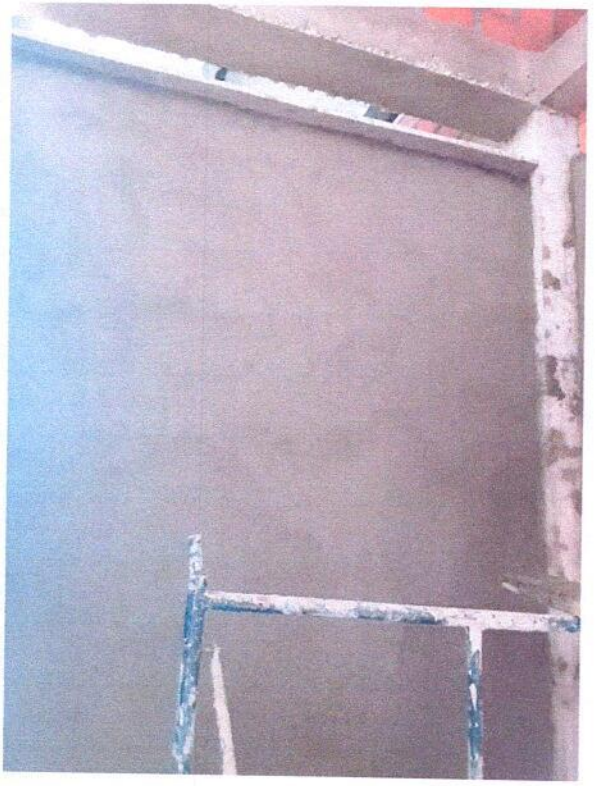

311 706 64 17.


gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

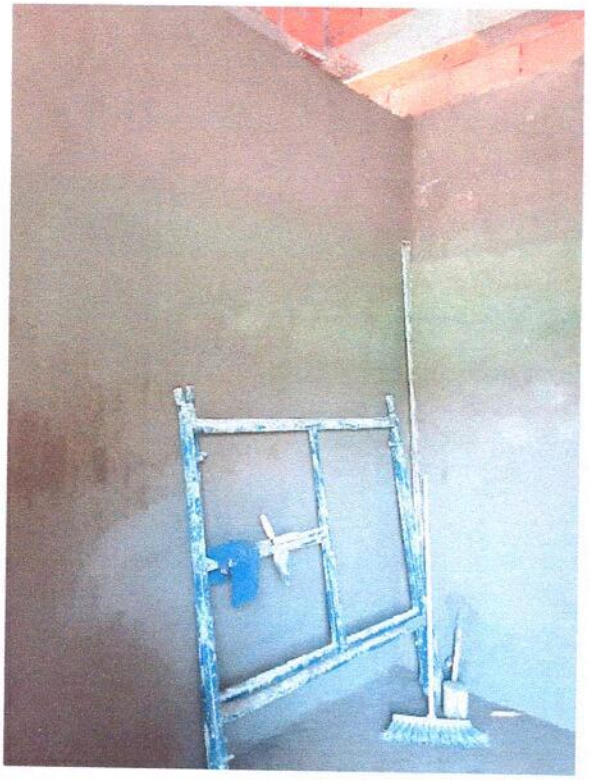



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

311 706 64 17.


gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8

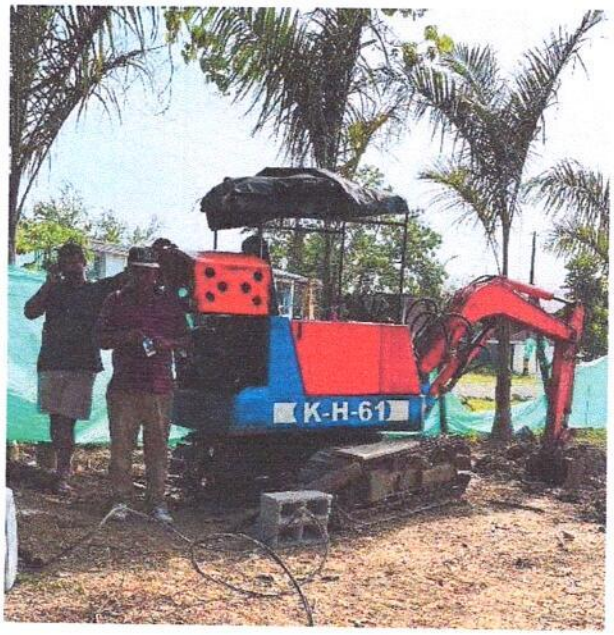



311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com


Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo

POSI S.A.S.

Proyectos, Obras, Servicios e Interventorías.

NIT. 900948991-8



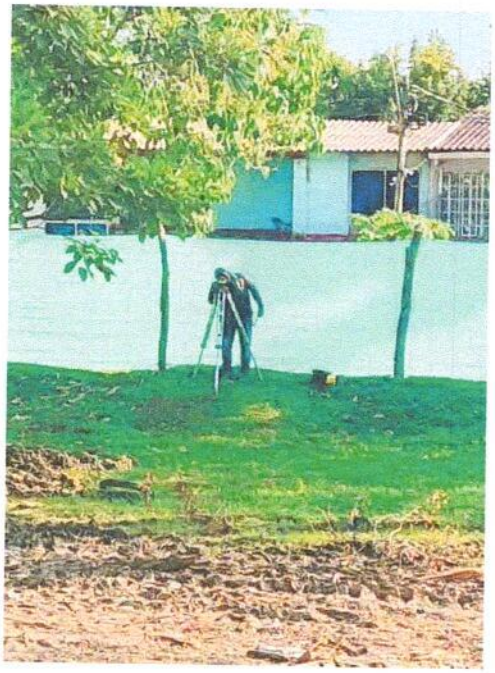

311 706 64 17.

gerenciaposi@gmail.com

Cra 101 # 94-33 Oficina 203.
Apartadó. B. El Amparo
