Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-028136 Id: 619864
Folios: 1 Fecha: 26-09-2025 12:06:15
Anexos: 1 Soporte de almacenamiento de datos/magnéticos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

PARA: Subdirección de Gestión Contractual.

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Remisión Informes de Supervisión mes agosto de 2025

REFERENCIA: Convenio interadministrativo No.1586 de 2021, Arroyohondo - Bolivar.

En mi condición de supervisora del convenio, adjunto para su archivo el siguiente informe que corresponden al mes de agosto de 2025 en el marco del convenio 1586 – 2021, suscrito con el municipio aquí mencionado:

No. DE CONVENIO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONTENIDO	FOLIO
No 1586 - 2021	ARROYOHONDO	BOLIVAR	INFORME MENSUAL AGOSTO/2025 MINISTERIO+SOPORTES	39

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del Convenio
Elaboró: Edinson Garcia - Profesional Apoyo a la Supervisión SPSCC.

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1586 DE 2021, MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **AGOSTO** DE **2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO – BOLIVAR.*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Nueva Esperanza, Casco Urbano - Municipio de Arroyohondo - Bolívar.		
BENEFICIARIO:	ARROYOHONDO - BOLIVAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.437.500.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 15.000.000,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$1.452.500.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/09/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/10/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	SERGIO ANDRES VEGA NOVOA	17/09/2021	31/03/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA	01/04/2022	31/07/2022
	REMERTO MARTINEZ	01/08/2022	28/09/2022
	LUZ YOLIMA HERRERA	29/09/2022	17/10/2022
	REMBERTO MARTINEZ POLO	18/10/2022	05/01/2023
	NORMAN ORTIZ TOVAR	06/01/2023	15/01/2023
	REMBERTO MARTINEZ POLO	16/01/2023	20/03/2023
	ANDRES FELIPE GIRALDO	21/03/2023	05/05/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ PATIÑO	06/05/2024	09/05/2024
	JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA	10/05/2024	30/06/2025
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	01/07/2025	21/07/2025
	JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA	22/07/2025	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JUAN CARLOS GOMEZ	21/09/2021	31/03/2022
	MAURICIO GUARNIZA LOPERA	29/09/2021	31/03/2022
	BRAYAM ARTURO GUZMAN	01/04/2022	31/07/2023
	ANDRÉS FELIPE DEL RÍO	01/08/2023	29/09/2024
	JUAN SEBASTIAN DUQUE	30/09/2024	31/10/2024
	ANDRÉS FELIPE DEL RÍO	01/11/2024	31/12/2024
	JUAN SEBASTIAN DUQUE	16/01/2025	12/02/2025
	EDINSON GARCIA DIAZ	13/02/2025	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 88421	29/09/2021	
	No.11422	16/01/2022	
	No 19223	20/01/2023	

	No. 11624	16/01/2024	
	No. 4125	09/01/2025	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 75-44-10-1115956	08/10/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	08/10/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		FECHA: 25/05/2022
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: 30/11/2022
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 31/03/2024
	CUARTA PRÓRRGA		FECHA: 31/08/2024
	QUINTA PRÓRROGA		FECHA: 30/11/2024
	SEXTA PRÓRROGA		FECHA: 31/03/2025
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: 26/06/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: 29/08/2023
	REINICIO		FECHA: 30/10/2023
	SUSPENSIÓN 02		FECHA: 20/12/2024
	REINICIO		FECHA: 18/12/2024
	SUSPENSIÓN 03		FECHA: 13/03/2025
	REINICIO		FECHA: 13/05/2025
	AMPLIACION No.1 DE SUSPENSIÓN 03		FECHA: 13/05/2025
	REINICIO		FECHA: 13/07/2025
	AMPLIACION No.2 DE SUSPENSIÓN 03		FECHA: 13/07/2025
	REINICIO		FECHA: 13/10/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 30/11/2022		
	FECHA: 31/05/2023		
	FECHA: 31/12/2023		
	FECHA: 30/09/2024		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 125.000.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	$1.041.667.000,00		
VALOR INTERVENTORÍA	N/A		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 187.500.000		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. UN PRIMER DESEMBOLSO del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, equivalente a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($375.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. Cuenta de cobro. 2. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud.	N/A	08/11/21	$375.000.000,00

SEGUNDO DESEMBOLSO	1. UN SEGUNDO DESEMBOLSO del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, equivalente a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($375.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito. 2. Cuenta de cobro. 3. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema	N/A	04/12/21	$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	1. UN TERCER DESEMBOLSO del veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. 2. Cuenta de cobro. 3. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud.	40%	23/12/22	$250.000.000,00
DESEMBOLSO ADICIÓN	Correspondiente a CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 187.500.000), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 75% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor	75%	10/04/2024	$187.500.000,00
ULTIMO DESEMBOLSO	ÚLTIMO DESEMBOLSO correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	N/A	$250.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.187.500.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 1.151.032.971,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: _____

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-44-101115962	Cumplimiento	$ 250.000.000	04/10/2021	31/05/2025
	Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO UNO (I) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1586 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR".		$1.041.121.785,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	30/10/2023 (Adición ministerio)		$ 187.500.000,00
	30/10/2023 (Adición municipio)		$ 15.000.000,00
Nombre contratista	**CONSORCIO ARROYOHONDO** R.L . ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA		NIT – En proceso de asignación C.C. 78.077.937
Fecha de Acta de iniciodel contrato	06-04-2022		Duración 6 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 01	08/07/2022	
	REINICIO	08/08/2022	
	SUSPENSIÓN 02	22/02/2023	
Fecha de terminación del contrato	SUSPENDIDO		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.243.621.785,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. 320-47-994000022889 **Aprobada:** 14/02/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 14/02/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO UNO (1), MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1586 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO – BOLIVAR.		$ 125.000.000,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S		
Fecha de Acta de inicio del contrato	06-04-2022		Duración 6 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 01	08/07/2022	
	REINICIO	08/08/2022	
	SUSPENSIÓN 02	22/02/2023	
Fecha de terminación del	SUSPENDIDO		

contrato		
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**VALOR TOTAL CONTRATADO:**
COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.	No. 320-47-994000022876 **Aprobada:** 14/02/2023	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	AGOSTO 2025	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	SEMANA DEL: 21/11/2024 Al 30/11/2024	
INFORME FINANCIERO	AGOSTO 2025	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**76.922.860,87** AGOSTO 2025	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		Durante este periodo, el Municipio no reportó avances en las actividades del proyecto, toda vez que el convenio se encuentra únicamente a la espera de la conexión definitiva.
OTROS		Durante este periodo, el Municipio no remitió documentación adicional, únicamente los documentos previamente informados.

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**99%**

La supervisión por parte del Ministerio en aras del seguimiento y cumplimiento a la ejecución del convenio en mención ha realizado todas las gestiones pertinentes a través de correos electrónicos y comités técnicos.

COMPONENTE TECNICO:

El día 04 de agosto de 2025, se solicitó al Municipio de Arroyohondo, mediante correo electrónico, los avances y gestiones adelantadas frente a las segundas observaciones emitidas por la empresa Afinia, en el marco de las obligaciones contractuales del convenio.

El día 04 de agosto de 2025, se solicitó al Municipio de Arroyohondo, mediante correo electrónico, la remisión del informe mensual correspondiente a julio de 2025, junto con su respectivo informe financiero y extracto bancario, en el marco de las obligaciones contractuales del convenio.

El día 06 de agosto de 2025, se reitero la solicitud al Municipio de Arroyohondo, mediante correo electrónico, los avances y gestiones adelantadas frente a las segundas observaciones emitidas por la empresa Afinia, en el marco de las obligaciones contractuales del convenio.

El día 11 de agosto de 2025, se reiteró por segunda vez la solicitud al Municipio de Arroyohondo, mediante correo electrónico, los avances y gestiones adelantadas frente a las segundas observaciones emitidas por la empresa Afinia, en el marco de las obligaciones contractuales del convenio.

El día 12 de agosto de 2025, se reiteró la solicitud al Municipio de Arroyohondo, mediante correo electrónico, la remisión del informe mensual correspondiente a julio de 2025, junto con su respectivo informe financiero y extracto bancario, en el marco de las obligaciones contractuales del convenio.

El 13 de agosto de 2025, el Municipio de Arroyohondo, Bolívar, remitió por correo electrónico el informe mensual correspondiente a junio, junto con el respectivo informe financiero y el extracto bancario.

El día 14 de agosto de 2025, se reiteró por tercera vez la solicitud al Municipio de Arroyohondo, mediante correo electrónico, los avances y gestiones adelantadas frente a las segundas observaciones emitidas por la empresa Afinia, en el marco de las obligaciones contractuales del convenio.

El día 14 de agosto de 2025, el Municipio mediante correo electrónico envió oficio de las acciones realizadas para la consecución de la certificación de conexión definitiva ante la empresa Afinia.

El día 20 de agosto de 2025 se convocó, mediante correo electrónico, al Municipio de Arroyohondo, Bolívar, a participar en el comité de seguimiento programado para el 22 de agosto de 2025.

El día 22 de agosto de 2025 se llevó a cabo una reunión de seguimiento y control con el Municipio de Arroyohondo. Durante el encuentro, y conforme a la información suministrada por el Secretario de Infraestructura, se indicó que se cargó la documentación solicitada por la empresa Afinia. Asimismo, en el comité se señaló que estaba a la espera del comunicado por la empresa Afinia, donde se informe la fecha prevista para la instalación del medidor.

El día 22 de agosto de 2025, se compartió por correo electrónico el acta del comité del 22 de agosto, así mismo se reiteró los compromisos derivados de la reunión.

El día 27 de agosto de 2025, mediante correo electrónico enviado al Municipio, se reiteró los compromisos derivados de la reunión del 22 de agosto de 2025.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el presente mes la ejecución física de obra continua en un 99% de acuerdo con el último informe semanal de interventoría, indicando que la ejecución física de obra finalizo, quedando pendiente únicamente la conexión eléctrica definitiva.

COMPONENTE FINANCIERO:
Un Primer Desembolso: 375.000.000,00
Un Segundo Desembolso: 375.000.000,00
Un Tercer Desembolso: 250.000.000,00
Adición Desembolso: 187.500.000,00
A la fecha se han desembolsado: $1.187.500.000,00.

ANEXOS:

Informe mensual del municipio agosto 2025
Informe Financiero del municipio agosto 2025
Extracto bancario agosto 2025

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

18/08/2022	15/11/2023	13/12/2023	15/02/2024	20/03/2024	12/06/2024
09/07/2024	04/12/2024 al 05/12/2024	29/07/2025 al 30/07/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Supervisora Convenio No. 1586-2021 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia -FONSECON	EDINSON GARCIA DIAZ Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Outlook

RE: Solicitud de avance sobre observaciones de Afinia – Convenio 1586-2021 (Arroyohondo, Bolívar)

Desde Edinson David Garcia Diaz <edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Fecha Lun 11/08/2025 11:04 AM
Para planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Andres Mauricio Duran Duglas <andres.duran@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Respetuosamente, se reitera la solicitud de remitir la información actualizada a la mayor brevedad posible, detallando las acciones emprendidas y los tiempos estimados para atender los requerimientos técnicos señalados por la empresa prestadora del servicio, en el marco del proceso para la obtención del certificado de conexión eléctrica definitiva del Convenio No. 1586 de 2021, suscrito con el Municipio de Arroyohondo, Bolívar.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Edinson Garcia Diaz
Ingeniero Civil – Grupo de Supervisión
Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
edinson.garcia@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Edinson David Garcia Diaz <edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Enviado: miércoles, 6 de agosto de 2025 9:30 a. m.
Para: planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
Cc: Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Andres Mauricio Duran Duglas <andres.duran@mininterior.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de avance sobre observaciones de Afinia – Convenio 1586-2021 (Arroyohondo, Bolívar)

Cordial saludo,

En atención al seguimiento del Convenio No. 1586 de 2021, suscrito con el Municipio de Arroyohondo, Bolívar, y en el marco del proceso para la obtención del certificado de conexión eléctrica definitiva, se reitera respetuosamente la solicitud de informar a esta supervisión los avances o gestiones adelantadas frente a las segundas observaciones emitidas por la empresa Afinia.

Se agradece remitir la información actualizada a la mayor brevedad posible, detallando las acciones emprendidas y los tiempos estimados para la atención de los requerimientos técnicos señalados por la empresa prestadora del servicio.

Atentamente,

Edinson Garcia Diaz
Ingeniero Civil – Grupo de Supervisión
Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
edinson.garcia@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Edinson David Garcia Diaz
Enviado: lunes, 4 de agosto de 2025 9:34 a. m.
Para: planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
Cc: Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Andres Mauricio Duran Duglas <andres.duran@mininterior.gov.co>
Asunto: Solicitud de avance sobre observaciones de Afinia – Convenio 1586-2021 (Arroyohondo, Bolívar)

Cordial saludo,

En atención al seguimiento del convenio No. 1586 de 2021, suscrito con el Municipio de Arroyohondo, Bolívar, y en el marco del proceso para la obtención del certificado de conexión eléctrica definitiva, respetuosamente se solicita informar a esta supervisión los avances o gestiones adelantadas frente a las segundas observaciones emitidas por la empresa Afinia.

Dado que este aspecto es fundamental para la finalización del proyecto y su respectiva liquidación, se agradece remitir la información actualizada con la mayor prontitud posible, indicando las acciones realizadas, y los tiempos estimados para atender dichas observaciones.

Atentamente,

Edinson Garcia Diaz
Ingeniero Civil – Grupo de Supervisión
Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
edinson.garcia@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

RE: Solicitud de informe mensual y documentación en el marco del convenio 1586-2021 ARROYOHONDO-BOLIVAR

Desde Edinson David Garcia Diaz <edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Fecha Mar 12/08/2025 5:09 PM
Para planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Andres Mauricio Duran Duglas <andres.duran@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En atención al Convenio Interadministrativo No. 1586 de 2021, suscrito entre el Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Arroyohondo - Bolivar, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR", me permito solicitar respetuosamente el cumplimiento a las obligaciones pactadas en el "ANEXO DE CONDICIONES" específicamente "**CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES**: **I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO**".

Se reitera la solicitud de remisión del informe mensual de ejecución correspondiente a julio de 2025, del Convenio N.° 1586 de 2021, junto con su respectivo informe financiero y extracto bancario, requiriendo su entrega de manera inmediata.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Edinson Garcia Diaz
Ingeniero Civil – Grupo de Supervisión
Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
edinson.garcia@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Edinson David Garcia Diaz
Enviado: lunes, 4 de agosto de 2025 9:19 a. m.
Para: planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
Cc: Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>
Asunto: Solicitud de informe mensual y documentación en el marco del convenio 1586-2021 ARROYOHONDO-BOLIVAR

Zuleivis Del Carmen Coronel Cantillo
Alcaldía de Arroyohondo – Bolívar
CALLE SANTA ELENA 6 # 6-32, Arroyohondo – Bolívar
alcaldia@arroyohondo-bolivar.gov.co
Municipio Arroyohondo – Bolívar

Jorge Gonzalez

Alcaldía de Arroyohondo – Bolívar
CALLE SANTA ELENA 6 # 6-32, Arroyohondo – Bolívar
planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co
Municipio Arroyohondo – Bolívar

Asunto. Solicitud de informe mensual de ejecución convenio No. 1586 de 2021

Cordial saludo,

En atención al Convenio Interadministrativo No. 1586 de 2021, suscrito entre el Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Arroyohondo - Bolivar, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR", me permito solicitar respetuosamente el cumplimiento a las obligaciones pactadas en el "ANEXO DE CONDICIONES" específicamente "**CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES**: **I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO**", en los siguientes numerales:

"(...) *29) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO DEL INTERIOR, de tal forma que le permita a éste hacer un seguimiento y control de dichos recursos.*

30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

33) Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

49) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento."(...)"

Por lo anterior expuesto, esta supervisión solicita la entrega del informe mensual con todos sus componentes como se describe en los numerales 29 y 49 enunciados anteriormente, estableciendo como plazo máximo de entrega el 8 **de agosto de 2025.**

Agradeciendo su colaboración

Edinson Garcia Diaz
Ingeniero Civil – Grupo de Supervisión
Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
edinson.garcia@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Solicitud de avance sobre observaciones de Afinia – Convenio 1586-2021 (Arroyohondo, Bolívar)

Desde Edinson David Garcia Diaz <edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Fecha Jue 14/08/2025 8:00 AM
Para planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Andres Mauricio Duran Duglas <andres.duran@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Respetuosamente, se reitera la solicitud de remitir, a la mayor brevedad posible, la información actualizada que detalle las acciones emprendidas por el Municipio de Arroyohondo y el contratista de obra para atender los requerimientos técnicos formulados por la empresa prestadora del servicio, en el marco del proceso de obtención del certificado de conexión eléctrica definitiva del Convenio N.° 1586 de 2021, suscrito con el Municipio de Arroyohondo, Bolívar.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Edinson Garcia Diaz
Ingeniero Civil – Grupo de Supervisión
Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
edinson.garcia@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Reunión de seguimiento al convenio No. 1586 de 2021 Arroyohondo - Bolivar

Organizer	Edinson David Garcia Diaz <edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Vie 22/08/2025, de 9:00 AM a 10:00 AM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aceptada
Asistentes necesarios	planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co, Jenny Paola Lavao Pastrana, Andres Mauricio Duran Duglas, Angie Vannessa Venegas Serrano
Mensaje enviado	Mié 20/08/2025 12:04 PM

Doctor(a)

Zuleivis Del Carmen Coronel Cantillo

Alcaldía de Arroyohondo – Bolívar

CALLE SANTA ELENA 6 # 6-32, Arroyohondo – Bolívar

alcaldia@arroyohondo-bolivar.gov.co

Municipio Arroyohondo – Bolívar

Doctor(a)

Jorge Gonzalez

Alcaldía de Arroyohondo – Bolívar

CALLE SANTA ELENA 6 # 6-32, Arroyohondo – Bolívar

planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co

Municipio Arroyohondo – Bolívar

Asunto: Reunión de seguimiento al convenio No. 1586 de 2021 (Avance de conexión eléctrica definitiva)

Cordial saludo,

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de Arroyohondo – Bolívar, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR, mediante la presente comunicación se efectúa el requerimiento formal de realizar una reunión de manera virtual para conocer el estado actual convenio No. 1586- 2021 constituido con su municipio; con el fin de lograr un correcto seguimiento convenio.

Teniendo en cuenta que el convenio tiene como fecha de reinicio el 13 de julio y que, a la fecha, no se han subsanado las causas que dieron origen a la suspensión.

Lo anterior en cumplimiento de las siguientes cláusulas:

"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

*(…)**29)** Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. **30)** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. **34)** Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría. **45)** Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.*

"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES:

*(…)**2)** Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.**3)** Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. **4)** Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso.*

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 282 316 083 302

Código de acceso: bP7jz6ij

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

Outlook

RE: Acta de reunión 22 de agosto 2025 Conv 1586-2021 Arroyohondo - Bolívar

Desde Edinson David Garcia Diaz <edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Fecha Mié 27/08/2025 11:43 AM
Para planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Andres Mauricio Duran Duglas <andres.duran@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En el marco del Convenio 1586 de 2021, y en atención a los compromisos adquiridos durante el comité del 22 de agosto, se solicita respetuosamente información actualizada sobre la respuesta emitida por la empresa AFINIA respecto a la fecha prevista para la instalación del medidor.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Edinson Garcia Diaz
Ingeniero Civil – Grupo de Supervisión
Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
edinson.garcia@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Edinson David Garcia Diaz
Enviado: viernes, 22 de agosto de 2025 10:46 a. m.
Para: planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
Cc: Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Andres Mauricio Duran Duglas <andres.duran@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>
Asunto: Acta de reunión 22 de agosto 2025 Conv 1586-2021 Arroyohondo - Bolívar

Cordial saludo,

Respetuosamente se comparte el acta de seguimiento descrita en asunto para su respectiva recopilación documental.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Edinson Garcia Diaz
Ingeniero Civil – Grupo de Supervisión
Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
edinson.garcia@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ACTA No.	220825-1586
FECHA	22/08/2025 (REUNION VIRTUAL)
CIUDAD	Bogotá
No. CONTRATO y/o CONVENIO	**1586-21**
OBJETO:	*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE* ***ARROYOHONDO – BOLIVAR.***
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	99%
MOTIVO:	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

PARTES

Ministerio del Interior	Municipio De ARROYOHONDO – BOLIVAR
Nombre: **EDINSON GARCIA DIAZ** C.C.: Cargo: : APOYO A LA SUPERVISIÓN.	Nombre**: JORGE GONZALES** C.C./ NIT: Cargo: SUPERVISOR MUNICIPIO DE **ARROYOHONDO – BOLIVAR.**
Nombre: **JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA** C.C.: Cargo: SUPERVISORA DEL CONVENIO	
Nombre: **ANDRÉS DURÁN DUGLAS** C.C.: Cargo: Profesional jurídico de apoyo a la supervisión	
Nombre: **ANGIE VANNESSA VENEGAS** C.C.: Cargo: APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN	

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 09:00 am del 22 de agosto de 2025, se inició el comité técnico de seguimiento y control de forma Virtual del convenio No. 1586 de 2021, que tiene como objeto realizar un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 en el municipio de Arroyohondo – Bolívar. Se establece el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los Asistentes.
2. Verificación de Estado Actual del Proyecto, (proceso de conexión eléctrica definitiva)
3. Conclusiones o Compromisos Finales

DESARROLLO

En virtud de la ejecución del convenio 1586-2021, se inicia la reunión a las 09:00 AM con el municipio de **ARROYOHONDO – BOLIVAR.** El propósito de la reunión fue contextualizar a la supervisión del Ministerio del Interior sobre los avances en el proceso de expedición de la conexión eléctrica definitiva. Por lo cual se le hace la solicitud al Municipio de informar los avances frente la consecución del certificado, teniendo en cuenta lo comunicado en el oficio por parte del municipio el dia 14 de agosto donde se informa que se procedió por parte del contratista a subsanar las observaciones el día 13 de agosto.

El Municipio informó que el contratista de obra realizó efectivamente la subsanación de las observaciones formuladas por la empresa AFINIA. Así mismo, señaló que, en comunicación con el contratista, este indicó que el día 23 de agosto la empresa AFINIA le confirmaría la instalación del medidor. En consecuencia, el Municipio de Arroyohondo se comprometió a enviar, a más tardar el martes 26 de agosto, un comunicado al Ministerio informando la respuesta oficial de AFINIA frente a dicha instalación.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó que el equipo técnico tiene proyectada una visita para el 18 y 19 de septiembre de 2025, con el fin de realizar el recibo de obra. En este sentido, se reiteró al Municipio de Arroyohondo el compromiso de allegar la documentación requerida para la etapa de recibo y, documentación inicial para dar inicio al proceso de liquidación del convenio.

Esto anterior sustentados bajo las siguiente clausulas:

> ***"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:*** *(…)**29)** Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. **30)** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. **34)** Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.**45)** Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. **"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES:** (...)**2)** Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.**3)** Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. **4)** Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso.*

Se finaliza el comité de seguimiento y se pactan compromisos.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**

Supervisión del Municipio de Arroyohondo	Enviar comunicado de la respuesta de la empresa Afinia	26/08/2025

Una vez leída la presente acta, esta es aprobada por todos los asistentes y se procede a diligenciar el formulario corrobora la aprobación del acta leída en esta reunión virtual.

Link de reunión:
Reunión de seguimiento al convenio No. 1586 de 2021 Arroyohondo - Bolivar | Unión a la reunión | Microsoft Teams

Link de formulario:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DIf3xAjrAU2wI6cd2U6IO9n1tO5E2LNAnBNnwEaaH3hUMFg3TjRMODJGSFdGT1FFUlFXRjZVNjhCUC4u

Información general sobre respuestas

Activo

Respuestas	Tiempo promedio	Duración
5	00:58	0 Días

1. NOMBRE

5
Respuestas

Respuestas más recientes
"JORGE GONZALEZ PEREZ"
"Edinson Garcia"
"Jenny Paola lavao"
• • •

2. CÉDULA

5
Respuestas

Respuestas más recientes
"72222530"
"1102865555"
"1018470931"
• • •

3. ENTIDAD / EMPRESA

5
Respuestas

Respuestas más recientes
"ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO BOLIVAR"
"Ministerio del Interior"
"Mininterior"
• • •

4. CORREO ELÉCTRONICO

5
Respuestas

Respuestas más recientes

"planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co"

"edinson.garcia@mininterior.gov.co"

"Jenny.lavao@mininterior.gov.co"

• • •

5. CARGO

5
Respuestas


Respuestas más recientes

"secretario de planeacion"

"Contratista"

"Supervisora"

• • •

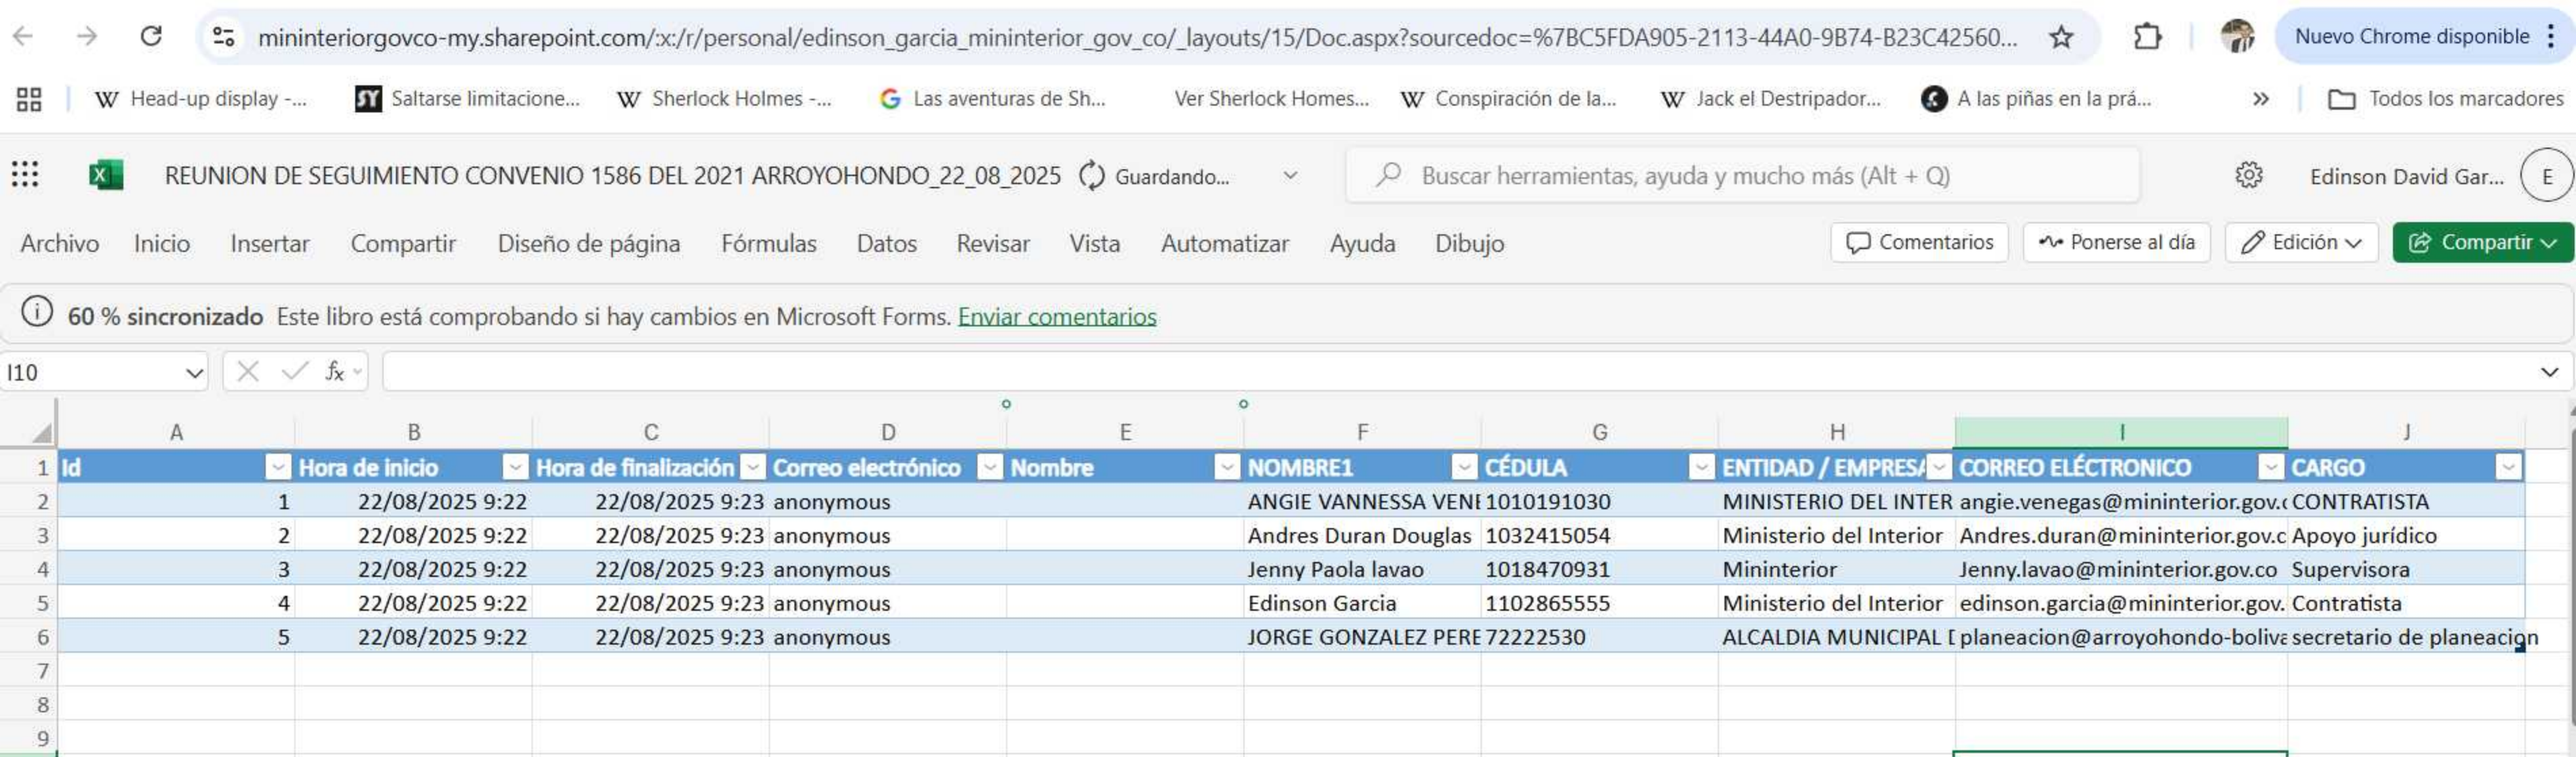

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Id	Hora de inicio	Hora de finalización	Correo electrónico	Nombre	NOMBRE1	CÉDULA	ENTIDAD / EMPRESA	CORREO ELÉCTRONICO	CARGO
2	1	22/08/2025 9:22	22/08/2025 9:23	anonymous		ANGIE VANNESSA VENI	1010191030	MINISTERIO DEL INTER	angie.venegas@mininterior.gov.c	CONTRATISTA
3	2	22/08/2025 9:22	22/08/2025 9:23	anonymous		Andres Duran Douglas	1032415054	Ministerio del Interior	Andres.duran@mininterior.gov.c	Apoyo jurídico
4	3	22/08/2025 9:22	22/08/2025 9:23	anonymous		Jenny Paola lavao	1018470931	Mininterior	Jenny.lavao@mininterior.gov.co	Supervisora
5	4	22/08/2025 9:22	22/08/2025 9:23	anonymous		Edinson Garcia	1102865555	Ministerio del Interior	edinson.garcia@mininterior.gov.	Contratista
6	5	22/08/2025 9:22	22/08/2025 9:23	anonymous		JORGE GONZALEZ PERE	72222530	ALCALDIA MUNICIPAL D	planeacion@arroyohondo-boliva	secretario de planeacion
7										
8										
9										

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1586 de 2021, MUNICIPIO DE Arroyohondo - Bolívar
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE AGOSTO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana - CIC, en el municipio de Arroyohondo – Bolívar.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Sector Nueva esperanza – Dentro Urbanización Santa Bárbara, Cabecera municipal de Arroyohondo -Bolívar.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1´250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 1´250.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	16-11-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-05-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31-05-2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Arq. Jorge González Pérez	**DESDE:** 09-01-2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Luiggi Baldovino Gallardo	16-11-2021	02-01-2024
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Víctor Hernández	09-01-2024	DD-MES-AAAA
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	2021-10-08-003	08 OCTUBRE DEL 2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	000001	14 FEBRERO DEL 2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	El Presente convenio presupuestalmente pasó financieramente a “vigencia expirada"		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N.A.	DD-MES-AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	320-47-994000011937 ; 320-47-994000022889	01-04-2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	21-09-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	Primera Prorroga OTROSI 01	FECHA: 31/05/2022	
	Segunda Prorroga OTROSI 02	FECHA: 29/11/2022	
	Tercera Prorroga OTROSI 03	FECHA: 30/10/2023	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** 06/12/2022		
	FECHA: 31/12/2023		
	FECHA: 30/09/2024		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000		

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 125.000.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0
VALOR DE OBRA	$ 1.125.000.000
VALOR INTERVENTORÍA	$ 125´000.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$202´500.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	a. Presentación de cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral por parte del representante legal, equivalente a b. la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($ 375.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	N.A.	24/11/2021	$ 375.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	c. Presentación de cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral por parte del representante legal, equivalente a d. la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($ 375.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito	N.A.	22/12/2021	$ 375.000.000
TERCER DESEMBOLSO	2. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 40% DE EJECUCIÓN DE OBRA. a. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. b. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. c. CERTIFICADO DE PAGO O CONTRATO CON LA EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE Y/O RETILAP.	40%	23/12/2022	$ 250.000.000,00

ÚLTIMO DESEMBOLSO	1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA a. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. b. ACTA FINAL AVALADA POR EL INTERVENTOR.	100%	DD/MM/AAAA	$ 250.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1´000´000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 998´655.176

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **Seguros del Estado**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-44-101115962	Cumplimiento	$ 250.000.000,00	04/10/2021	30/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: LP-004-2021	ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO UNO (1) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 1586 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR		$ 1.041.121.785
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28217&g-recaptcha-respo		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	**Empresa:** CONSORCIO ARROYOHONDO R/L: ORLANDO DAVIDID ESPITIA SEGURA **Integrantes:** GECO NORTE SAS (50% participación) Representante legal EDUARDO REYES VARGAS CC 3.715.865 ROBERTO GALLO ELJAICK NIT: 72213839-9 (50 % participación)		NIT 900.668.726-0 C.C.: 18.881.954 NIT:72213839-9 C.C.: 3.715.865
Fecha de Acta de inicio del contrato	6 de abril del 2022		Duración: 6 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	08/07/2022	
	REINICIO 01	08/08/2022	
	SUSPENSIÓN 02	22/02/2023	
	REINICIO 02	03/11/2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	31/05/2022	**Nueva Fecha actual terminación contrato**	SUSPENDIDO

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ $ 1.327.500.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	No. 320-47-994000022889 ; 320-47-994000011937 - **Aprobada:** 14/02/2023
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 14/02/2023
	No. 320-47-994000022889 ; 320-47-994000011937 - **Aprobada:** 14/02/2023

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Concurso de Mérito Abierto No. **CMA-001- 2021**		$ 125.000.000
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12887866&g-recaptcha-r		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Estudios, Consultorias y Obras s.a.s. R.L. José David Gonzalez Olivella		NIT. 901.438.268-6 C.C. 1´065.646.798
Fecha de Acta de inicio del contrato	06/04/2022		Duración: 6 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 01	08/07/2022	
	REINICIO 01	08/08/2022	
Fecha Inicial de terminación del contrato	31/05/2022	**Nueva Fecha actual terminación del contrato**	30/02/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 125.000.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Aseguradora Solidaria de Colombia**		
PÓLIZA No.	320-47-994000022876 **Aprobada: 31/03/2022**		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 17/03/2022		
	Anticipo: 17/03/2022		
	Pago de salarios, Prestaciones sociales e industriales: 17/03/2022		
	Calidad del Servicio: 17/03/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	A la fecha	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	XXX	DD-MES-AAAA
INFORME FINANCIERO	08-2025	08-09-2025
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		Corte: 08-2025
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Próximas a ejecutar	DD/MM/AAAA
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**99,00%**

% EJECUTADO DE OBRA	99,00%

- **JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

1. mediante una inspección de la empresa encargada fue aprobado el diseño del sistema eléctrico y las conexiones instaladas.
2. al día de hoy 09 de septiembre del 2025 solo están pendientes la instalación del medidor por parte de la empresa Afinia como también la certificación de conexión definitiva del proyecto.

Número de Dictamen	ASIK-RET-4153-003
Alcance	Esta inspección comprendió la revisión de la red de baja tensión desde los Bornes del transformador tipo poste marca rymel de 10 KVA con No de serie 2024111417 hasta el Tablero general. Según memorias y planos del Proyecto Proyecto Parque Sacudete Arroyohondo, ubicado la URBANIZACION SANTA BARBARA TIERRA CALIENTE B. NUEVA ESPERANZA KRA 1 CLLE 5A CAMNO DEL BONGO ARROYOHONDO LOTE AREA UTIL ETAPA I, ARROYOHONDO, BOLIVAR
Resultado	APROBADO

Descargar o Imprimir Dictamen

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

18/08/2022	15/11/2023	04/03/2023	26/11/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. JORGE GONZALEZ PEREZ Supervisora del Convenio Secretaria de Planeación/Infraestructura	**ARQ. SANTIAGO CORONELL CUETO** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Planeación/Infraestructura

Se Anexan (05) Folios

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1586 DEL 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC

INFORME FINANCIERO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PROYECTO (S):	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO UNO (I) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"	

CUENTA (AHORROS) No.: **204007025** DEL BANCO: **Banco de Bogota**

VALOR CONVENIO

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		$ 1.452.500.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO		$ 0,00
	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 1 (18 de noviembre del 2021)	$ 375.000.000,00
	GIRO 2 (13 de diciembre del 2021)	$ 375.000.000,00
	GIRO 3 (23 de diciembre del 2022)	$ 250.000.000,00
	GIRO 4 (10 de abril del 2024)	$ 187.500.000,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.187.500.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 204007025 A LA FECHA (31 DE AGOSTO 2025) **$ 1.187.500.000,00** **$ 0,82**

$0,79

VALOR CONTRATADO: $ 1.041.121.785

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP- OP-04 -2021	CONSORCIO ARROYOHONDO	$ 1.244.167.000,00	$ 83.333.000,00	$ 1.327.500.000,00
CM-001-2022	ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS s.a.s.	$ 125.000.000,00		$ 125.000.000,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.452.500.000,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR BRUTO DEL PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO PAGADO
CM-001-2022	Anticipo pago interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental a los estudios, diseñor y obras de construccion del proyecto sacudeteal parque tipo uno(1), municipio de arroyohondo, departamento de bolivar, en ejecución convenio del interadministrativo N° 1586 del 2021 celebrado entre la nacion - ministerio del interior - fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana - fonsecon con el municipio de arroyohondo - bolivar	2022-04-20-003	No.2022.CEN.01.000435	21/04/2022	$ 41.667.000,00		$ 41.667.000,00	$ 0,00	$ 41.667.000,00
LP-004-2021	Pago Parcial 01 ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO UNO(I) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1586 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO – BOLIVAR.	2022-10-28-010	No.2022.CEN.01.001164	2/11/2022	$ 83.333.000,00		$ 83.333.000,00	$ 14.166.950,00	$ 69.166.050,00
LP-004-2021	Pago Parcial 02 ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO UNO(I) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1586 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO – BOLIVAR.	2022-11-01-005	No.2022.CEN.01.001176	2/11/2022	$ 312.327.688,13		$ 312.327.688,13	$ 53.096.154,00	$ 259.231.534,13
	TRASLADO DE DEDUCCIONES	2022.CEN.1.404	2022.CEN.1.404	3/11/2022			$ 0,00	$ 0,00	$ 26.029.589,00

LP-004-2021	Pago Parcial 03 ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO UNO(I) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1586 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO – BOLIVAR.	2022-12-01-003	No.2022.CEN.01.001291	1/12/2022	$ 312.327.688,13		$ 312.327.688,13	$ 53.096.154,13	$ 259.231.534,00
	TRASLADO DE DEDUCCIONES	2022.CEN.1.435	2022.CEN.1.435	7/12/2022			$ 0,00	$ 0,00	$ 89.539.732,00
CM-001-2022	Pago Parcial 01 de Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a los estudios, diseñor y obras de construccion del proyecto sacudeteal parque tipo uno(1), municipio de arroyohondo, departamento de bolivar, en ejecución convenio del interadministrativo N° 1586 del 2021 celebrado entre la nacion - ministerio del interior - fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana - fonsecon con el municipio de arroyohondo - bolivar	2022-11-30-004	No.2022.CEN.01.001363	13/12/2022	$ 24.999.900,00		$ 24.999.900,00	$ 7.843.260,00	$ 17.156.640,00
CM-001-2022	Pago Parcial 02 de Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a los estudios, diseñor y obras de construccion del proyecto sacudeteal parque tipo uno(1), municipio de arroyohondo, departamento de bolivar, en ejecución convenio del interadministrativo N° 1586 del 2021 celebrado entre la nacion - ministerio del interior - fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana - fonsecon con el municipio de arroyohondo - bolivar	2022-11-30-005	No.2022.CEN.01.001364	13/12/2022	$ 24.999.900,00		$ 24.999.900,00	$ 3.499.990,00	$ 21.499.910,00
LP-004-2021	Pago Parcial 04 ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO UNO(I) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1586 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO – BOLIVAR.	2022-02-16-001	No.2023.CEN.01.000078	16/02/2023	$ 199.000.000,00		$ 199.000.000,00	$ 33.830.000,00	$ 165.170.000,00
	TRASLADO DE DEDUCCIONES	2023.CEN.1.88	2023.CEN.1.88	3/05/2023			$ 0,00	$ 0,00	$ 9.950.000,00
	TRASLADO DE DEDUCCIONES	2023.CEN.1.88	2023.CEN.1.88	15/09/2023			$ 0,00	$ 0,00	$ 11.940.000,00
LP-OP-04-2021	Pago Parcial 05 ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO UNO(I) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1586 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO – BOLIVAR.	ORDEN DE PAGO 394	COMPROBANTE EGRESO #424	3/05/2024	$ 152.377.795,00		$ 152.377.795,00	$ 30.475.559,00	$ 121.902.236,00
	TRASLADO DE DEDUCCIONES								15237780
	TRASLADO DE DEDUCCIONES ESTAMP JUSTICIA FAMILIAR	ORDEN DE PAGO 394	COMPROBANTE EGRESO #424	24/09/2024					3047556
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1.151.032.971,26**	**$ 0,00**	**$ 1.151.032.971,26**	**$ 196.008.067,13**	**$ 1.110.769.561,13**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/11/2021	$ 6.771,00
31/12/2021	$ 26.042,00
31/01/2022	$ 32.293,00
28/02/2022	$ 29.169,00
31/03/2022	$ 32.296,00
30/04/2022	$ 6.135,00
31/05/2022	$ 6.101,00
30/06/2022	$ 5.904,00
31/07/2022	$ 6.101,00
31/08/2022	$ 6.101,00
30/09/2022	$ 5.904,00
31/10/2022	$ 6.101,00

1000000000
-$151.032.971,26

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

EVOLUCION DE LAS DEDUCCIONES EN FAVOR DEL MUNICIPIO O DE TERCEROS, CAUSADOS A LA FECHA DE CORTE

DEDUCCIONES	DEDUCCIONES CAUSADAS	DEDUCCIONES TRASLADADAS
CAUSADAS	$ 196.008.067,13	
(-) TRASLADOS		137.459.321,00

30/11/2022	$ 3.058,00
31/12/2022	$ 949,00
31/01/2023	$ 1.866,00
28/02/2023	$ 1.135,00
31/03/2023	$ 443,00
30/04/2023	$ 429,00
31/05/2023	$ 363,00
30/06/2023	$ 346,00
31/07/2023	$ 358,00
31/08/2023	$ 358,00
30/09/2023	$ 275,00
31/10/2023	$ 255,00
30/11/2023	$ 247,00
31/12/2023	$ 255,00
31/01/2024	$ 255,00
29/02/2024	$ 238,00
31/03/2024	$ 255,00
30/04/2024	$ 1.340,00
31/05/2024	$ 887,00
30/06/2024	$ 793,00
31/07/2024	$ 820,00
31/08/2024	$ 764,00
30/09/2024	$ 660,00
31/10/2024	$ 662,00
31/11/2024	$ 641,00
31/12/2024	$ 662,00
31/01/2025	$ 662,00
28/02/2025	$ 598,00
31/03/2025	$ 662,00
31/04/2025	$ 641,00
31/05/2025	$ 662,00
30/06/2025	$ 641,00
31/07/2025	$ 662,00
31/08/2025	$ 662,00
TOTAL (3)	**$ 192.422,00**

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025083008CD2012036984



165582 1-8

MUNICIPIO DE ARROYOHONDO-CONVENIO SACUDE
CL 1 1-14
PALACIO MUNICIPAL
ARROYOHONDO ,BOLIVAR
Entrega: UR Oficina: 2041 Gerencia Oficial 6 - Cartagena
165582

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2025**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 204007025
Tipo de Cuenta: Ahorro Tradicional Oficial
Cod. Origen: 2041
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**76,922,198.87**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	662.00
Saldo Final:	**76,922,860.87**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	CARTAGENA	GCIA OFICIAL 204		662.00	76,922,860.87
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Arroyohondo Bolívar, 14 de agosto del 2025

DOCTOR:
EDINSON GARCIA
SUPERVISOR CONVENIO 1586-2021
E. S. D.

ASUNTO: AVANCE SOBRE OBSERVACIONES DE AFINIA PARA LA CONEXIÓN DEFINITIVA.

Cordial saludo

Atendiendo mi calidad de Secretario de Planeacion E Infraestructura, me dirijo a usted de la manera más atenta y cordial, con la finalidad de aportar el siguiente informe:

- Informo que el martes 22/07/2025 se realizó visita en conjunto con secretario de planeación del municipio de arroyo hondo, para la revisión de VoBo PROYECTO CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, SECTOR BARRIO NUEVA ESPERANZA EXP P92102024120002, la cual NO se da VoBo para energización. Se revisa instalación de redes MT/BT con subestación tipo poste TRAFO de 10KVA 1F, media directa y tablero de cargas a energizar, las cuales presentan las siguientes observaciones:
- Se observan discrepancias en la instalación con respecto al diseño aportado referente a las cargas instaladas. No se observa tablero de cargas en poste ESP01, ni bajante de tubería metálica IMC 1 ½", favor corregir instalación teniendo en cuenta código de colores para conductores y tubería. Se de corregir instalación en terreno de lo contrario deberá solicitar plano As Built que contemple la ubicación exacta del tablero y las cargas a energizar.
- Se evidencia en el punto EPE01 bajante de acometida en calibre #4 suelta, la cual será la disponibilidad de la instalación de la medida directa proyectada a energizar. Se debe tener en cuenta que los bajantes deberán ir en tubería IMC 1 ½" tal cual como lo indican en el diseño aprobado aplicando código de colores para conductores y tubería. Se de corregir instalación en terreno de lo contrario deberá solicitar plano As Built.
- El tablero de cargas deberá estar debidamente maquillado y señalizado de acuerdo con lo establecido en el diseño (No olvidar señalizaciones de riesgo eléctrico) ya que se encuentran expuestas a la intemperie. Los breakers

deberán identificarse mediante marquillas de acrílico firmemente remachadas. No se permitirán marquillas pegadas atornilladas hechas con rotuladora, pintura, cinta, marcador o similar. Adecuar marquillas según lo estipula normativa afinia.

De lo anterior se procedió por parte de la empresa contratista a ejecutar las obras pertinentes para subsanar las observaciones anteriores ejecutadas el 13 de agosto de 2025 hora 9:00 am.
Anexo evidencias de obras.



CONEXIÓN DE CONECTORES DE PERFORACION.



INICIO DE CONEXIÓN PARA EL TABLERO DE CARGAS.






INSTALACION DE CAJA PARA INSTALACION DE MEDIDOR Y TUBERIA IMC 1 1/2”

Cabe anotar que ya fue enviada estas evidencias al técnico de afinia el 13/082025 cuyo nombre es Néstor Rodríguez el cual nos informa que el día 19 de agosto en horas de la mañana para revisión y aprobación de la instalación del medidor y entrega de certificado de conexión definitiva.

Atentamente

JORGE GONZALEZ PEREZ
Secretario De Planeacion E Infraestructura.

Outlook

INFORME MENSUAL SACUDETE MES DE JULIO.

Desde planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
Fecha Mié 13/08/2025 2:31 PM
Para Edinson David Garcia Diaz <edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; 497_ALC <alcaldia@arroyohondo-bolivar.gov.co>; Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

INFORME FINANCIERO.pdf; INFORME FINANCIERO SACUDETE AL PARQUE JULIO 2025 (1).pdf; INFORME MENSUAL DE EJECUCION JUNIO 2025.pdf;

Buena tarde ingeniero, envío información para los fines pertinentes.
Atte,

Secretaría de Planeación Municipal
Municipio de Arroyohondo, Bolívar

Outlook

Re: Solicitud de avance sobre observaciones de Afinia – Convenio 1586-2021 (Arroyohondo, Bolívar)

Desde planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
Fecha Jue 14/08/2025 10:04 AM
Para Edinson David Garcia Diaz <edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

1 archivo adjunto (1 MB)
ACCIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO Y CONTRARTISTA PARQUE SACUDETE.pdf;

Buen dia bendiciones, envío información solicitada para los fines pertinentes
Atte,

Secretaría de Planeación Municipal
Municipio de Arroyohondo, Bolívar

El jue, 14 ago 2025 a la(s) 8:00 a.m., Edinson David Garcia Diaz (edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com) escribió:


> Cordial saludo,
>
> Respetuosamente, se reitera la solicitud de remitir, a la mayor brevedad posible, la información actualizada que detalle las acciones emprendidas por el Municipio de Arroyohondo y el contratista de obra para atender los requerimientos técnicos formulados por la empresa prestadora del servicio, en el marco del proceso de obtención del certificado de conexión eléctrica definitiva del Convenio N.° 1586 de 2021, suscrito con el Municipio de Arroyohondo, Bolívar.
>
> Atentamente,
>
> COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
>
> Edinson Garcia Diaz
> **Ingeniero Civil – Grupo de Supervisión**
> Subdirección de proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
> edinson.garcia@mininterior.gov.co
> Teléfono: 601 242 74 00
> Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
> www.mininterior.gov.co


Outlook

RESPUESTA DE GESTION DE CONEXION DEFINITA PROYECTO SACUDETE

Desde planeacion arroyohondo-bolivar <planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co>
Fecha Vie 29/08/2025 3:34 PM
Para Edinson David Garcia Diaz <edison.garcia@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Atte,
buena tarde, bendiciones ingeniero.
A continuación adjunto evidencia de respuesta por parte de Afinia de la gestión realizada por el municipio y respuesta.
Cabe anotar que todo el trabajo eléctrico fue ejecutado a satisfacción por el contratista y aprobado por el supervisor de Afinia, del cual también se solicitaban otros documentos técnicos los cuales fueron aportados hoy por el cual adjuntamos la respuesta por medio de la plataforma.
NOTA: LA FECHA QUE PRESENTA EN LA PLATAFORMA 03/12/2024 Y HORA ES EN EL MOMENTO QUE SE CARGO TODO; Y TODA VEZ SE ADJUNTE ALGÚN OTRO DOCUMENTO SIEMPRE MUESTRA LA FECHA EN QUE SE INICIÓ EL CARGUE.

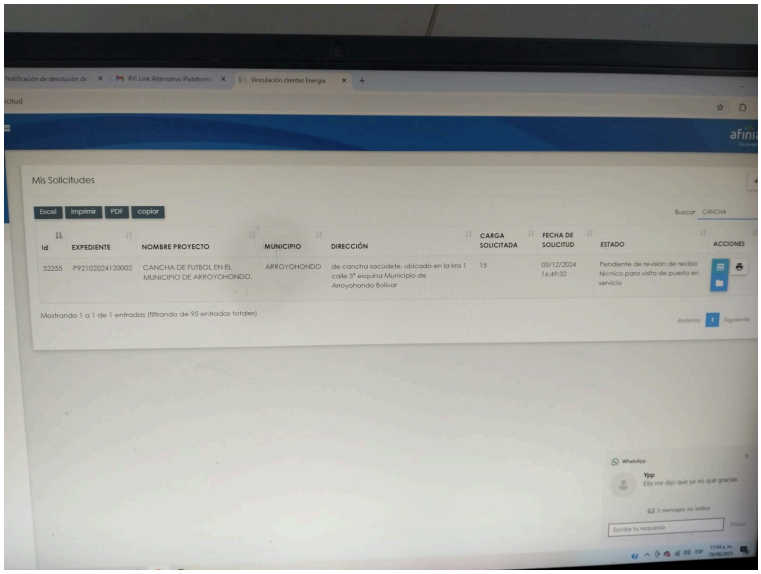

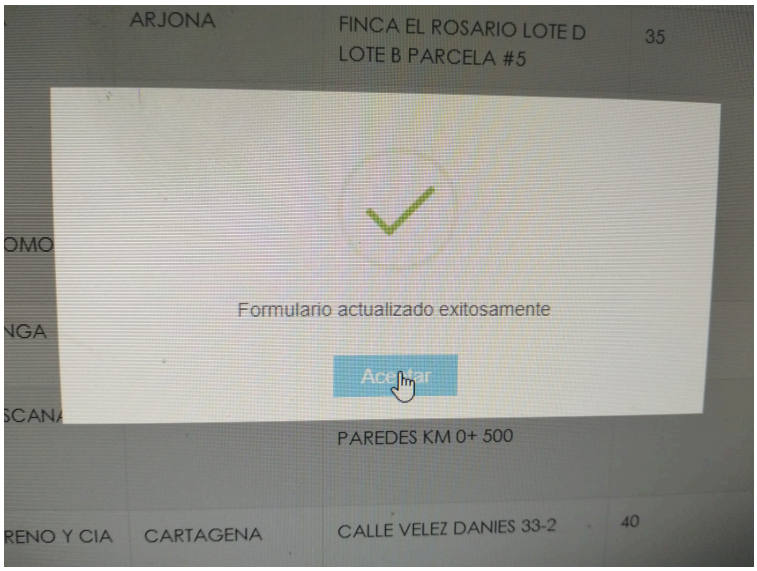

Secretaría de Planeación Municipal
Municipio de Arroyohondo, Bolívar
