
CONTROL DE AVANCE - EJECUTADO VS PROGRAMADO

SEMANA	mar-08	mar-15	mar-22	mar-29	abr-05	abr-12	abr-19	abr-26	may-03	may-10	may-17	may-24	may-31	jun-07	jun-14	jun-21	jun-28	jul-05	jul-12	jul-15
	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20	Sem 21	Sem 22	Sem 23	Sem 24	Sem 25	Sem 26	Sem 27	Sem 28	Sem 29
TIPO DE AVANCE (%)	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA						
PROGRAMADO FINANCIERO	0,00%	0,00%	0,71%	1,54%	5,39%	8,28%	14,77%	18,28%	21,66%	25,04%	34,82%	38,11%	47,47%	51,63%	65,64%	74,33%	80,42%	87,11%	91,27%	100,00%
REAL FINANCIERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
REAL FISICO	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	6,51%	7,55%	15,19%	29,07%	29,32%	29,32%	42,90%	47,51%	55,69%	63,41%	70,77%	88,75%	92,17%			
TERMINACION ANTICIPADA	0,00%	0,00%	0,71%	1,54%	5,37%	8,29%	15,04%	18,95%	22,74%	26,54%	36,80%	40,64%	44,20%	61,96%	67,53%	77,99%	89,76%	100,00%		
ATRASO FISICO	0,0%	0,0%	-0,7%	0,0%	1,1%	-0,7%	0,1%	10,1%	6,6%	2,8%	-1,983%	6,9%	11,5%	1,45%	5,13%		11,75%			
LINEAL	26,3%	30,3%	34,3%	38,3%	42,3%	46,3%	50,3%	54,3%	58,3%	62,3%	66,3%	70,3%	74,3%	78,3%	82,3%	86,3%	90,3%	94,3%	98,3%	100,0%

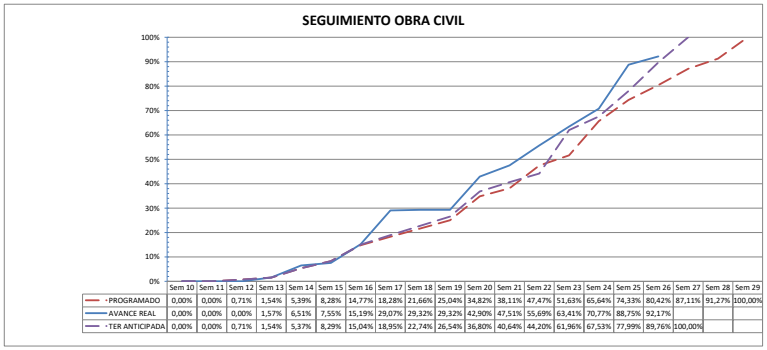

SEMANA	VALOR CAPITULO	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20	Sem 21	Sem 22	Sem 23	Sem 24	Sem 25	Sem 26	Sem 27	Sem 28	Sem 29
		mar-08	mar-15	mar-22	mar-29	abr-05	abr-12	abr-19	abr-26	may-03	may-10	may-17	may-24	may-31	jun-07	jun-14	jun-21	jun-28	jul-05	jul-12	jul-15
TIPO DE AVANCE (%)		OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA					
PRELIMINARES	$ 13.091.580,02	0,00%	0,00%	25,90%	30,82%	36,46%	6,35%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANEJO DE AGUAS	$ 5.722.096,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,63%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	2,82%	0,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	$ 17.988.541,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,75%	36,18%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,06%	0,00%	0,00%
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE	$ 43.676.365,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,64%	4,24%	7,46%	6,06%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	1,87%	0,37%	34,70%
LLENOS	$ 42.678.201,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	58,00%	33,19%
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	$ 40.787.218,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	1,39%
CONCRETOS	$ 131.053.969,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	13,45%	0,00%	0,00%	0,00%	23,75%	0,13%	0,13%	15,38%	7,76%	17,71%	2,39%	11,96%	5,20%	1,51%
ACERO	$ 110.308.368,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,08%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	1,69%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SAN	$ 27.706.982,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	32,13%	50,85%	14,99%
VIAS	$ 8.800.308,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAISAJISMO Y SILVICULTURA	$ 2.503.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%
CARPINTERIA METALICA	$ 11.292.510,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%
OBRAS EXTRAS	$ 4.944.114,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
OTROS	$ 20.221.602,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
																0,00%					
