GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha 01 OCT 2025
Hora 2:55 pm
Nº Rdo
Recibe

Ibagué, 1 de octubre 2025

Doctora:
KATERYNE LEON MIRANDA
Directora Oficina de Contratación Gobernación del Tolima.
Gobernación del Tolima

Asunto: Entrega de informes de avances según plan de acción de prorroga No. 006 del contrato interadministrativo No. 1945

Respetada doctora,

Reciban un cordial saludo por parte del Gobierno Departamental en cabeza de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat del Departamento del Tolima, augurándole los mejores éxitos en su gestión.

La Dirección de Hábitat de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, en cumplimiento de sus funciones de supervisión y seguimiento contractual, se permite remitir los informes de avance correspondientes a las acciones ejecutadas dentro del plan de acción de la Prórroga No. 006, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 1945 de 2023, cuyo objeto es: "CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA ESP, "CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL SECTOR RURAL EN LAS VEREDAS LA CASCADA Y QUEBRADA NEGRA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI."

Solicitamos respetuosamente que esta información sea cargada en la carpeta del contrato, con el fin de mantener actualizada la documentación técnica y administrativa, y facilitar el seguimiento por parte del equipo de supervisión.

Atentamente,

DIANA ESPERANZA SIFUENTES QUINTERO
Directora de Hábitat
Secretaría de Infraestructura y Hábitat

Proyectó: Ángel Edilson Ocampo - Contratista S.I.H.

egetsa

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Ibagué, 07 de febrero de 2025
EE-028-02-2025

Arquitecto
JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
Supervisor
Director de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Gobernación del Tolima
Ciudad. –

Asunto: Respuesta oficio cod. 201 - 019 solicitud informe de ejecución de contratos interadministrativos actualizados a 2025. –

Respetado Arq. Bonilla,

De acuerdo su solicitud, me permito informar: Se presenta un informe detallado sobre el estado actual de los contratos interadministrativos de electrificación rural, destacando los avances, desafíos y próximos pasos en cada uno de ellos:

- **Contrato Interadministrativo 0851 de 2020 (Vereda Las Moras):** El 6 de febrero de 2025, se recibió la aprobación de los documentos para la conexión por parte del operador de red Celsia (ver documento adjunto). Se está a la espera de la programación de la visita a campo para la recepción de la obra. Es importante mencionar que este proyecto ya cuenta con la certificación RETIE.

- **Contrato Interadministrativo 2252 de 2020:** El proyecto se encuentra **terminado**. Actualmente, se está finalizando el plano récord y las cantidades finales. Se proyecta la entrega de los documentos soporte para el acta de liquidación el viernes 14 de febrero.

- **Contrato Interadministrativo 2253 de 2020:** Durante la revisión de la plataforma de Celsia para cargar los documentos soporte y solicitar la visita de obra, se identificó que el proyecto no ha sido registrado en la plataforma debido a su antigüedad. Se debe tramitar la viabilidad desde cero. Se tiene programado radicar el proyecto en la plataforma a más tardar el miércoles 12 de febrero. A partir de esta fecha, se depende de los tiempos del operador de red, los cuales son ajenos a Egetsa.

egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

- **Contrato Interadministrativo 1397:** La obra se encuentra ejecutada al 100%. Se realizó la primera visita RETIE el 18 de noviembre de 2024. Debido al tamaño del proyecto, no fue posible realizar la visita en su totalidad, por lo que se está a la espera de la programación de una segunda visita. Este requisito es fundamental para la entrega al operador de red.

- **Contrato Interadministrativo 4601:** La obra se encuentra ejecutada al 100%. Se realizó la visita RETIE el 14 de enero de 2025, y surgieron algunas observaciones que se están subsanando. Una vez completadas, se podrá continuar con el proceso de legalización ante el operador de red.

  Adicionalmente, se encuentra pendiente la construcción de la red para uno de los usuarios del proyecto. Este usuario inicialmente rechazó el servicio, pero recientemente solicitó ser incluido como beneficiario y se procederá a realizar la instalación.

- **Contrato Interadministrativo 1945:** El contrato se encuentra en ejecución. Sin embargo, se han presentado retrasos debido a que la garrucha, medio utilizado para el transporte de materiales en la vereda Quebrada Negra, está fuera de funcionamiento.

Se ha mantenido una comunicación constante con el ingeniero Ángel Ocampo, quien brinda apoyo a la supervisión en lo correspondiente a los proyectos de electrificación rural.

Cordial saludo,

AURORA VANEGAS RODRIGUEZ
Gerente Suplente **EGETSA S.A. E.S.P.**

Proyectó Andrés Felipe Sánchez – Asistente Financiero Contable

Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co

celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Ibagué, Tolima, 11 de agosto de 2025
EE-122-08-2025

Ingeniera
DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Directora de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y hábitat
Ciudad. -

Asunto. Respuesta requerimiento técnico y Plan de acción – Contrato Interadministrativo No. 1945 de 2023.

En atención a sus comunicaciones de fecha 9 de julio, 25 de julio y 31 de julio de 2025, mediante la cual, en calidad de supervisora del **contrato interadministrativo 1945 de 2023**, solicita formalmente:

1. Informe técnico de avance de obra:

El contrato interadministrativo del asunto se encuentra vigente y en ejecución, conforme a lo establecido en el Acta de Prórroga No. 006, que extendió el plazo contractual a seiscientos (600) días calendario, con fecha de terminación prevista para el 17 de octubre de 2025.


La solicitud de prórroga presentada por EGETSA se fundamentó en eventos extraordinarios como afectaciones climáticas asociadas al fenómeno de La Niña, deterioro de la red vial rural, y dificultades en la contratación de personal técnico especializado. Estos hechos han sido documentados con soportes técnicos y registros oficiales, constituyendo causales de fuerza mayor conforme al artículo 64 del Código Civil, lo cual exime de responsabilidad al contratista por los retrasos generados.


- Actividades realizadas Vereda La Cascada.

Se realizó suministro, transporte e instalación de estructura de circuito bifásico en disposición horizontal, aislamiento en espigo, termino circuito bifásico, retención circuito bifásico, terminal circuito trifásico, retención circuito trifásico, estructuras en H terminal con disposición horizontal para circuito trifásico en doble cruceta así como circuito simple de retención de cruceta doble, instalación de estructura H de circuito simple de retención de crucetas, instalación de transformador, estructura de línea trifásica con corta circuito, estructura de derivación monofásica con corta circuito, estructura de línea monofásica con cortocircuito, seccionador de porta fusibles, instalación de ACSR,


retenidas MT, postes de fibras de vidrio de media y baja tensión, instalación de acometida aérea e instalaciones eléctricas internas, según se muestra a continuación.

Registro fotográfico:

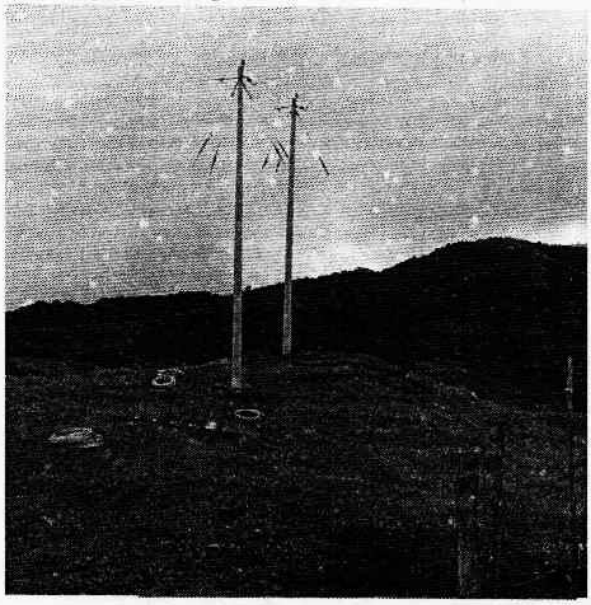

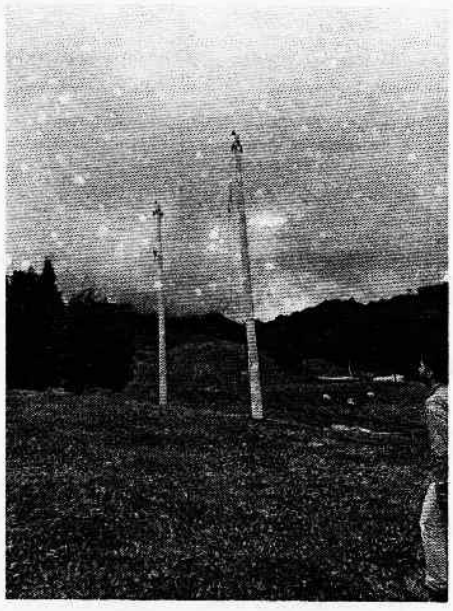



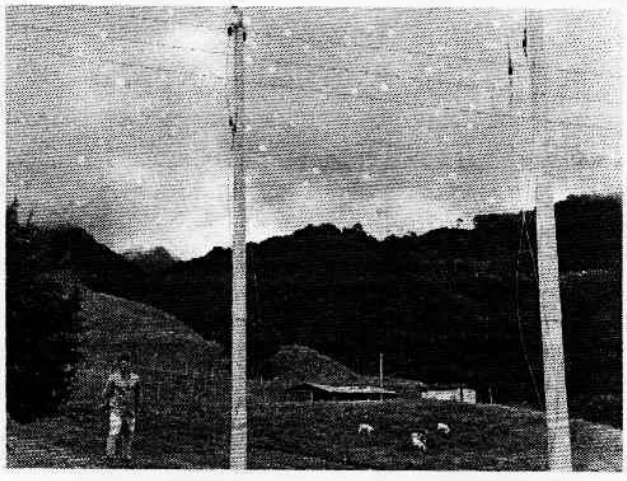


Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co


celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



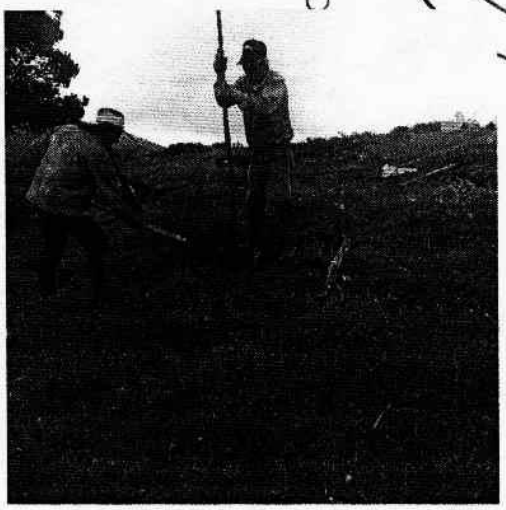

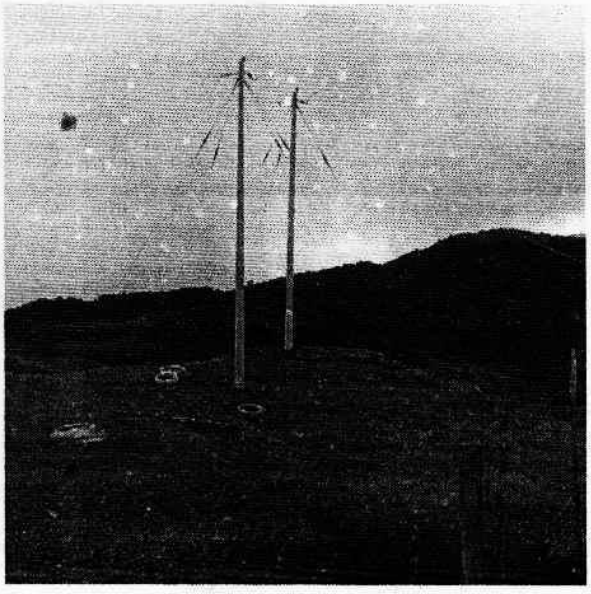




Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co


celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co


egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



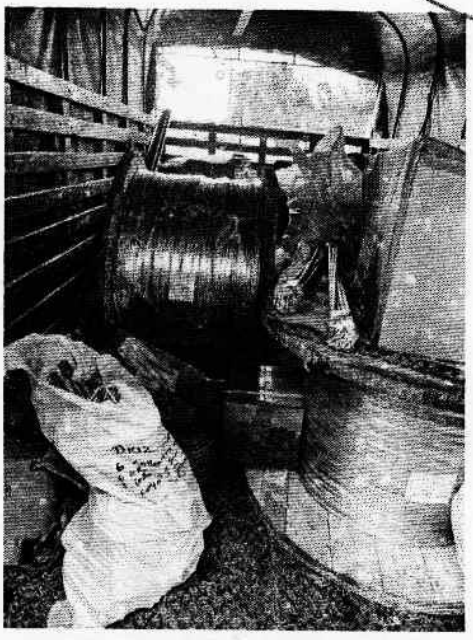

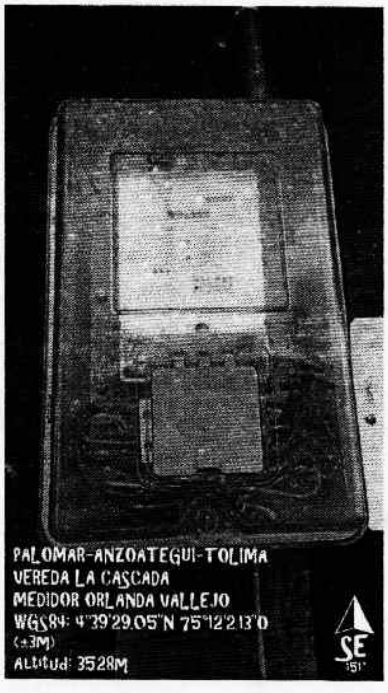

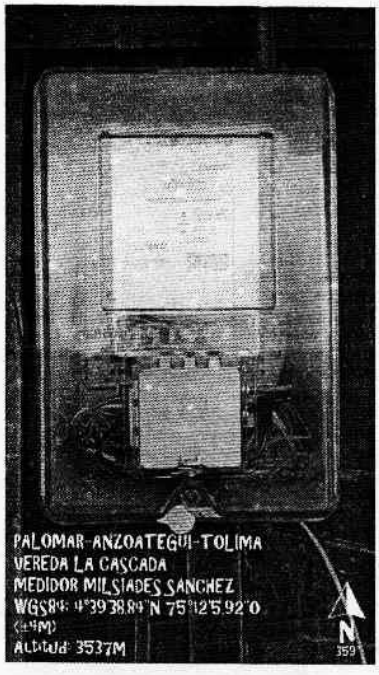

Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co

celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

2. Plan de Acción detallado

El cronograma ha sido ajustado con la mencionada prórroga y mantiene como fecha límite de ejecución el 17 de octubre de 2025. Las actividades pendientes se encuentran en desarrollo bajo condiciones operativas seguras, conforme al seguimiento técnico del contrato.

A pesar de las dificultades presentadas a lo largo del proceso, el contrato continúa en ejecución formal dentro del término vigente y conforme a las condiciones contractuales establecidas. Actualmente, las actividades en la vereda La Cascada se encuentran en etapa final de ajustes, teniendo en cuenta que ya se hizo el proceso de domiciliarias, las cuales requieren un ajuste final que se está ejecutando, y durante la semana del 11 de agosto el equipo de trabajo reiniciará labores en la vereda Quebrada Negra, con el propósito de culminar la totalidad del objeto contractual del cual Egetsa tiene el compromiso de realizar.

egetsa
Empresa Comercializadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Actividades	Tiempo ejecución SEMANAS										Responsable	Medidas Correctivas
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Reinicio actividades sector Quebrada Negra											Egetsa	
Ajustes finales en vereda la Cascada											Egetsa	
Instalación medidores e internas vereda Quebrada Negra											Egetsa	
Visita RETIE											Certificadora	
Tramites de legalización ante OR											Egetsa	
Visita para firma acta de terminación de obra											Egetsa-Infraestructura	

Semana 1 del 10 al 16 de agosto
Semana 2 del 17 al 23 de agosto
Semana 3 del 24 al 30 de agosto
Semana 4 del 31 de agosto al 6 de septiembre
Semana 5 del 7 al 13 de septiembre
Semana 6 del 14 al 20 de septiembre
Semana 7 del 21 al 27 de septiembre
Semana 8 del 28 de septiembre al 4 de octubre
Semana 9 del 5 al 11 de octubre
Semana 10 del 12 al 17 de octubre

Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co

celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Se suscribe con cordialidad quedando atentos y prestos a cualquier otra petición que se considere necesario formular para en el marco de nuestras competencias lograr atenderlo de manera suficiente y diligente.

OSCAR ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Gerente de EGETSA S.A. E.S.P.

Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co

celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

Ibagué, Tolima, 23 de septiembre de 2025
EE-155-09-2025-01

Ingeniera
DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Directora de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y hábitat
Ciudad. -

Asunto. Respuesta requerimiento informe técnico y Plan de acción – Contrato Interadministrativo No. 1945 de 2023.

En atención a su requerimiento, mediante la cual, en calidad de supervisora del **contrato interadministrativo 1945 de 2023**, solicita formalmente:

1. Informe técnico de avance de obra:

El contrato interadministrativo del asunto se encuentra vigente y en ejecución, conforme a lo establecido en el Acta de Prórroga No. 006, que extendió el plazo contractual a seiscientos (600) días calendario, con fecha de terminación prevista para el 17 de octubre de 2025.

El contrato Interadministrativo consta cuyo objeto es CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA S.S E.S.P "CONSTRUCCIÓN PÁRA LA ELECTRIFICACIÓN POR MEDIO DE REDES ELECTRICAS PARA EL SECTOR RURAL EN LAS VEREDAS LA CASCADA Y QUEBRADA NEGRA DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI".

Dentro de las actividades que se han ejecutado son:

- En la vereda La Cascada se llevó a cabo la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, como parte de un proyecto de electrificación rural contemplado dentro del contrato suscrito con la empresa. Este trabajo incluyó el diseño, instalación y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura eléctrica necesaria para garantizar el suministro de energía eléctrica de las viviendas.
- Como resultado de esta intervención, se instalaron redes de baja tensión, se realizaron las respectivas acometidas domiciliarias y se ejecutaron las instalaciones internas básicas en las viviendas beneficiarias, en cumplimiento con lo establecido en el alcance técnico del contrato. Dichos trabajos aseguran el

acceso permanente, seguro y legal a la energía eléctrica por parte de las familias residentes en esta zona rural.

- La evidencia del desarrollo de esta obra se presenta de forma resumida a través de un registro fotográfico que se encuentra en el siguiente apartado del informe. No obstante, la empresa EGETSA considera pertinente y sugiere que se realice una visita técnica por parte del equipo de supervisión de la Gobernación (Si así lo consideran pertinente), con el fin de llevar a cabo una verificación en terreno de las obras ejecutadas.
- Esta visita permitirá constatar el cumplimiento de los compromisos contractuales, verificar el estado y operatividad de las instalaciones, y proceder formalmente con el trámite correspondiente para la elaboración y firma del acta de cierre de ejecución de obra para la vereda La Cascada.


- En relación con los trabajos que se vienen desarrollando en la Vereda Quebrada Negra, se informa que actualmente se hizo verificación en terreno de la Postería construida de las redes de media tensión, como parte del proceso de electrificación rural contemplado dentro del contrato de obra. Hasta la fecha, se ha realizado con éxito el hincado de la potería, incluyendo la instalación de los respectivos templetes de anclaje y soporte, conforme a los diseños eléctricos aprobados y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
- Asimismo, se va a iniciar el tendido del cableado correspondiente a las redes de media tensión, actividad que inicia ejecución progresivamente desde la semana comprendida entre el 29 de septiembre al 5 de octubre. Este proceso incluye la distribución aérea del conductor, su adecuada tensión y fijación, así como la verificación de los puntos de empalme, cruces y distancias reglamentarias.
- Por otro lado, se tiene programado el inicio de la ejecución de las redes de baja tensión en esta misma vereda para la semana del 5 al 10 de octubre. Esta fase contempla la instalación de redes secundarias, las acometidas domiciliarias y los elementos de protección necesarios, todo conforme al cronograma establecido y al alcance contractual definido.
- Dado el avance significativo que presentan estas actividades, se considera oportuno la realización de una visita técnica conjunta con el equipo de supervisión del contrato, idealmente en la **semana del 10 de octubre**. El objetivo principal de dicha visita sería efectuar una verificación física en terreno del estado actual de ejecución de la obra, constatar la calidad de los trabajos realizados hasta el momento y facilitar la consolidación de un informe oficial de avance, debidamente avalado por la supervisión.
- Esta verificación permitirá llevar un control más preciso del cumplimiento del cronograma, identificar posibles ajustes técnicos en el proceso constructivo si


fueran necesarios, y asegurar que los trabajos continúen en concordancia con los estándares de calidad, seguridad y normativas vigentes.

- Durante la semana del 10 de octubre se inicia el proceso de instalación de redes internas de los usuarios con los requerimientos técnicos.

Actividades realizadas Vereda La Cascada.


Se realizó suministro, transporte e instalación de estructura de circuito bifásico en disposición horizontal, aislamiento en espigo, termino circuito bifásico, retención circuito bifásico, terminal circuito trifásico, retención circuito trifásico, estructuras en H terminal con disposición horizontal para circuito trifásico en doble cruceta así como circuito simple de retención de cruceta doble, instalación de estructura H de circuito simple de retención de crucetas, instalación de transformador, estructura de línea trifásica con corta circuito, estructura de derivación monofásica con corta circuito, estructura de línea monofásica con cortocircuito, seccionador de porta fusibles, instalación de ACSR, retenidas MT, postes de fibras de vidrio de media y baja tensión, instalación de acometida aérea e instalaciones eléctricas internas, según se muestra a continuación.

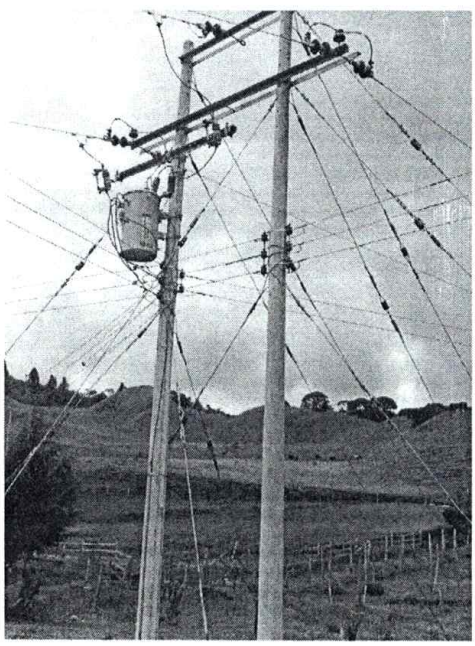


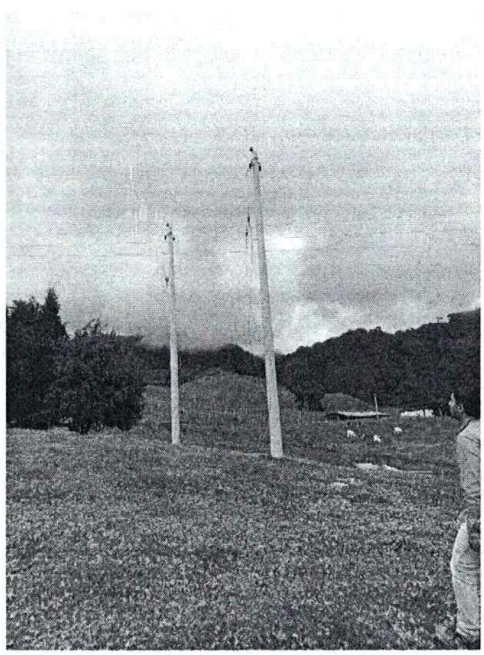


egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

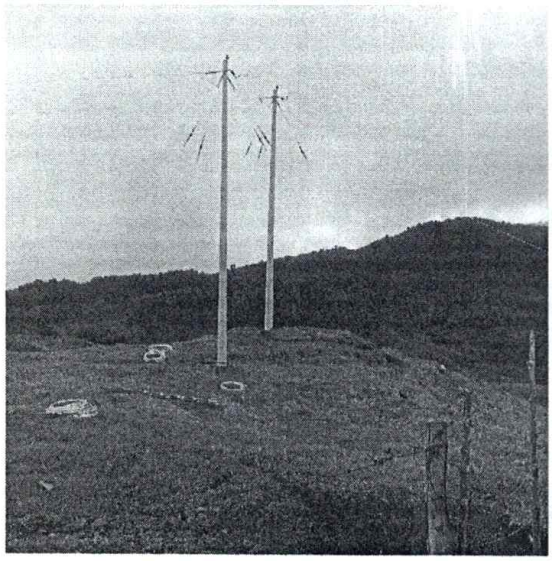

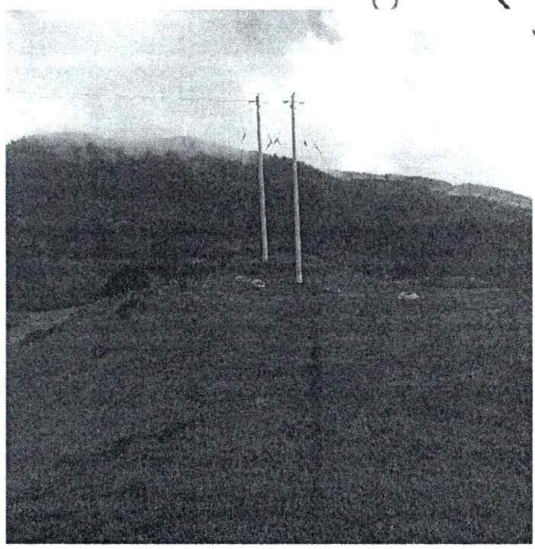



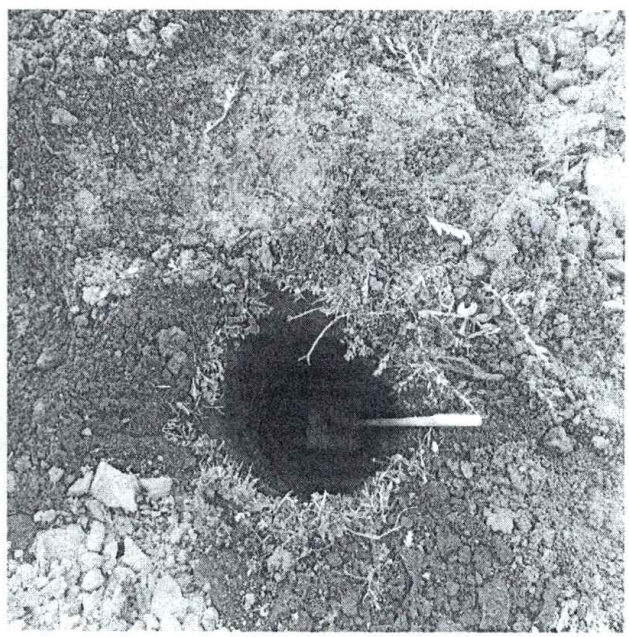



Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co


celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

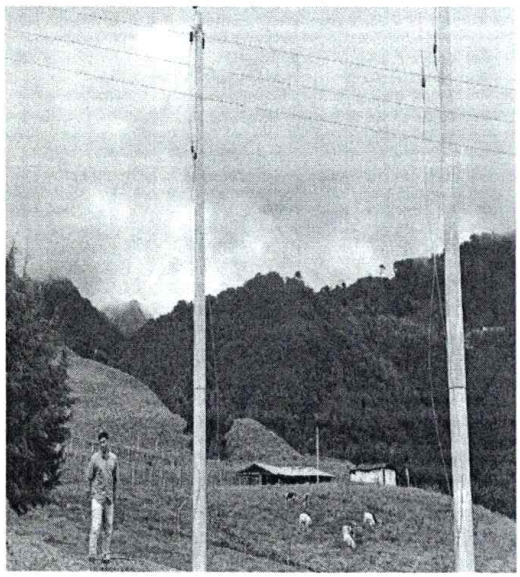

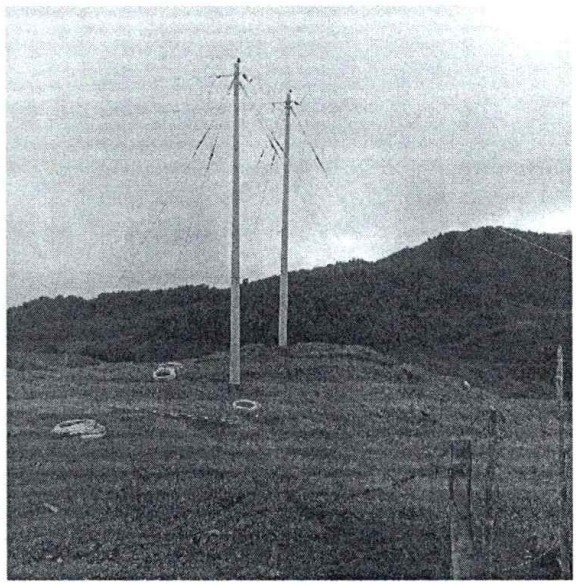

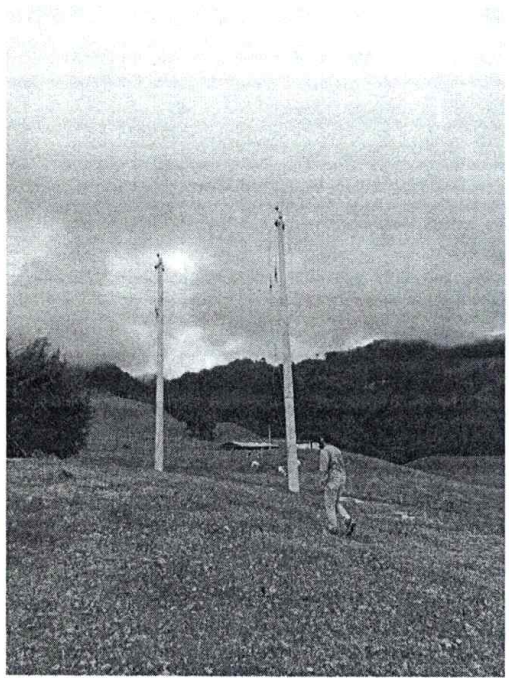





Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co


celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

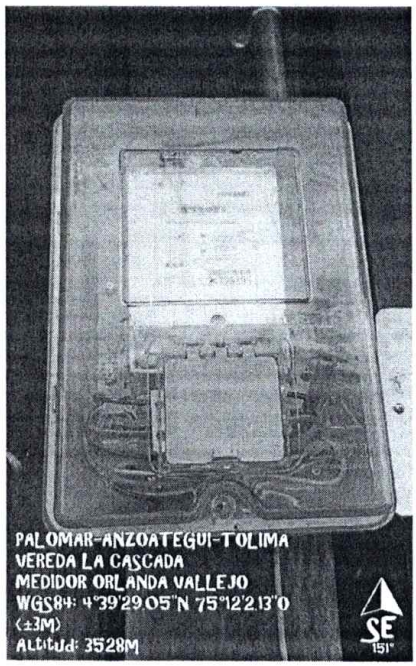

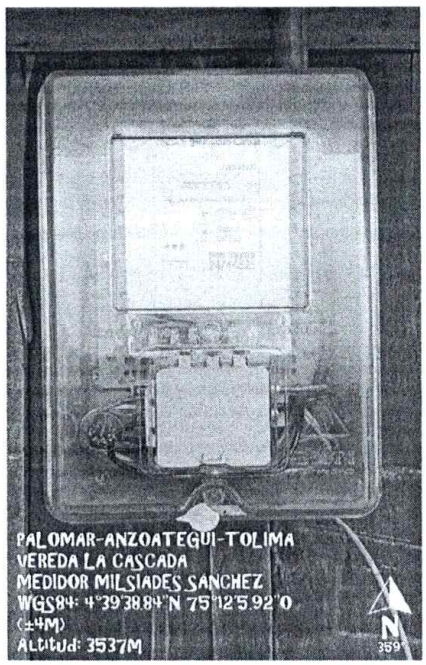

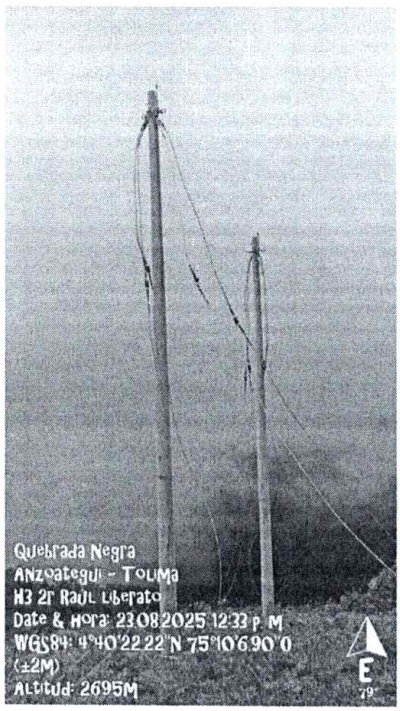



Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co


celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co


egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Actividades realizadas Vereda Quebrada Negra.

- En relación con los trabajos que se vienen desarrollando en la Vereda Quebrada Negra, se informa que actualmente se hizo verificación en terreno de la Postería construida de las redes de media tensión, como parte del proceso de electrificación rural contemplado dentro del contrato de obra. Hasta la fecha, se ha realizado con éxito el hincado de la potería, incluyendo la instalación de los respectivos templetes de anclaje y soporte, conforme a los diseños eléctricos aprobados y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
- Se hizo visita técnica con el propósito de hacer verificación de redes instaladas y pendientes, establecer cantidades de obra para hacer el proceso de compra y transporte de los materiales, así como proyección del proceso logístico constructivo.
- Durante la inspección de la obra se identificaron los siguientes hallazgos: estructuras correctamente ancladas y material previamente dispuesto en el sitio.

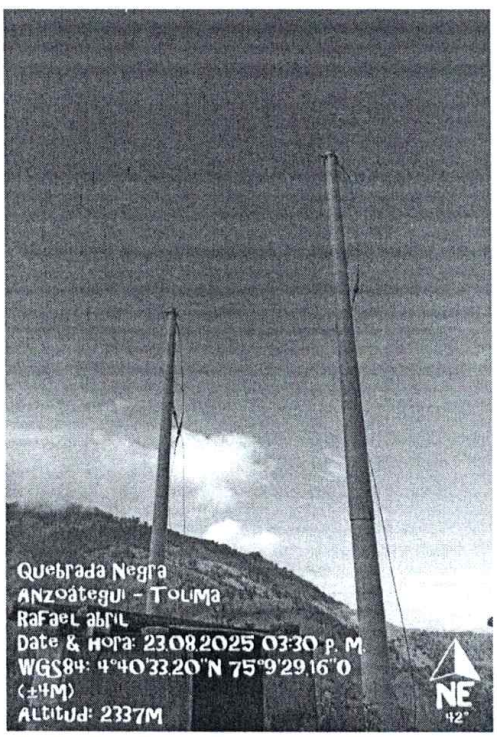

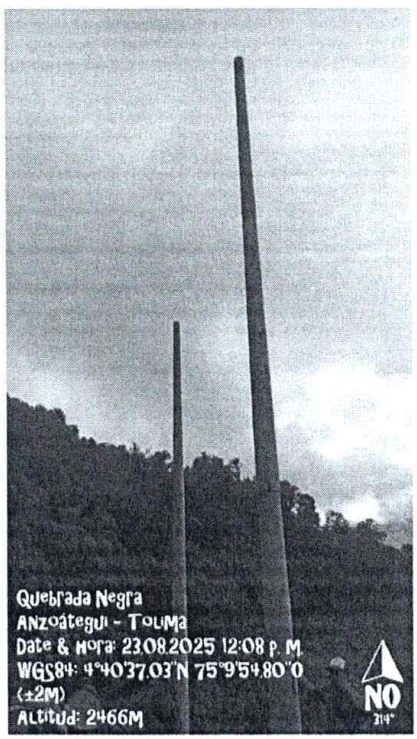


Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co


celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co


egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

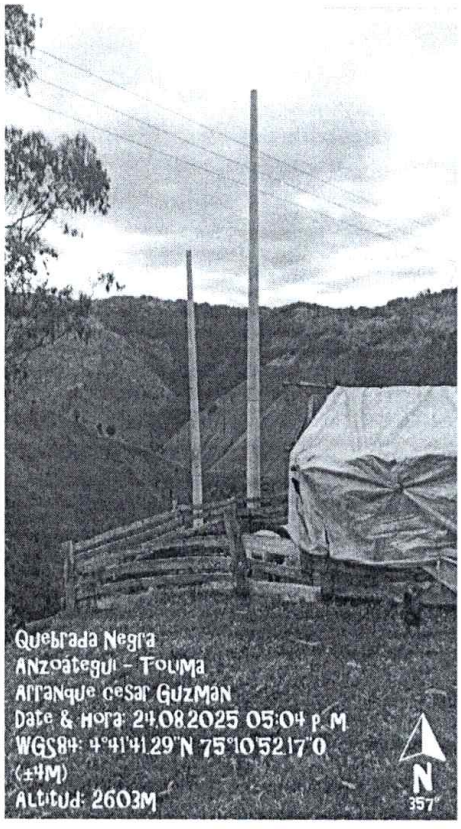



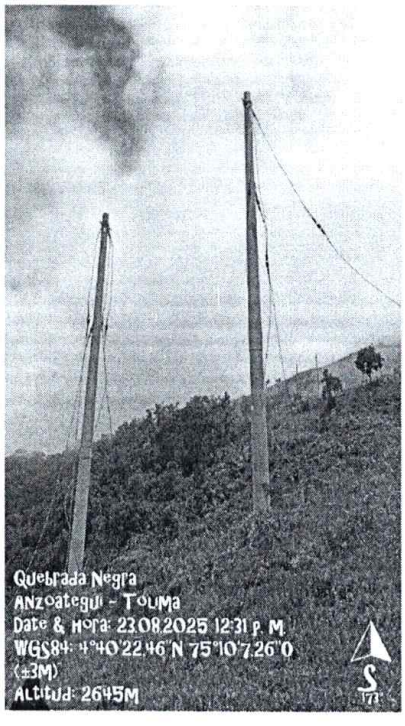


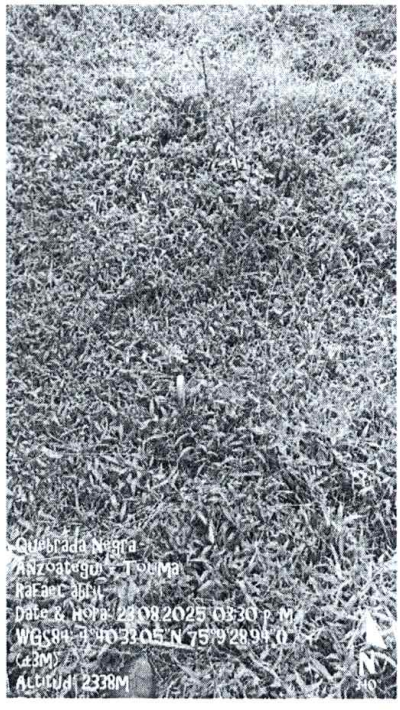


Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co

celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

Seguidamente, tenemos el arranque en media tensión para el transformador del señor Cesar Guzmán y el transformador de Fernando Ibagué.

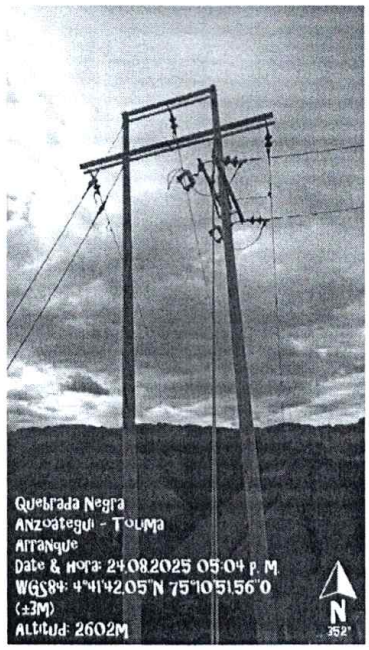



Además de la salida del arranque principal en media tensión para los transformadores de los señores Raúl Liberato, Rafael Abril y Raúl Michico.

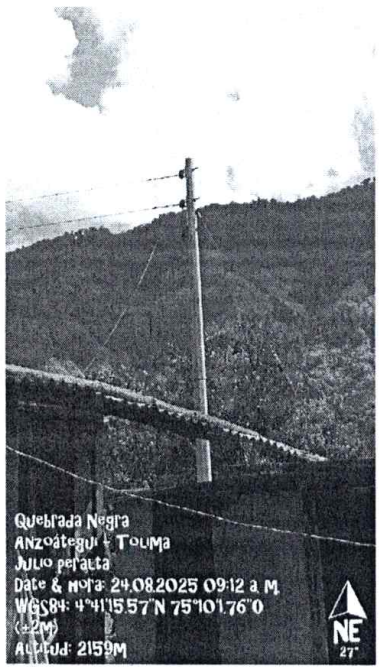



Identificación usuarios con medida monofasica.

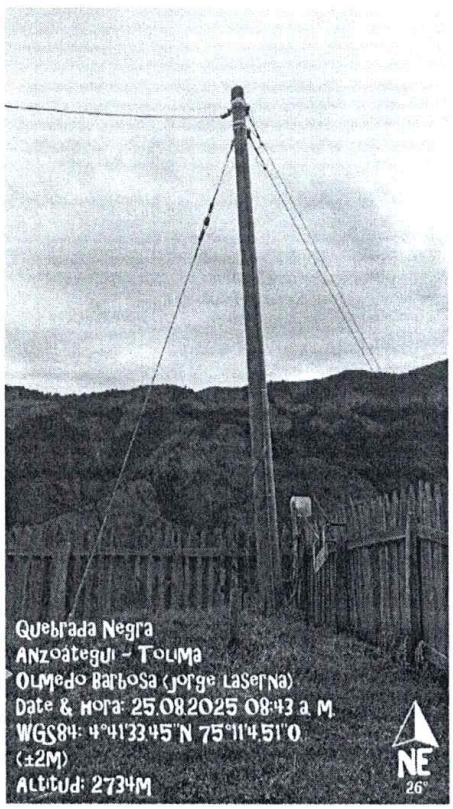

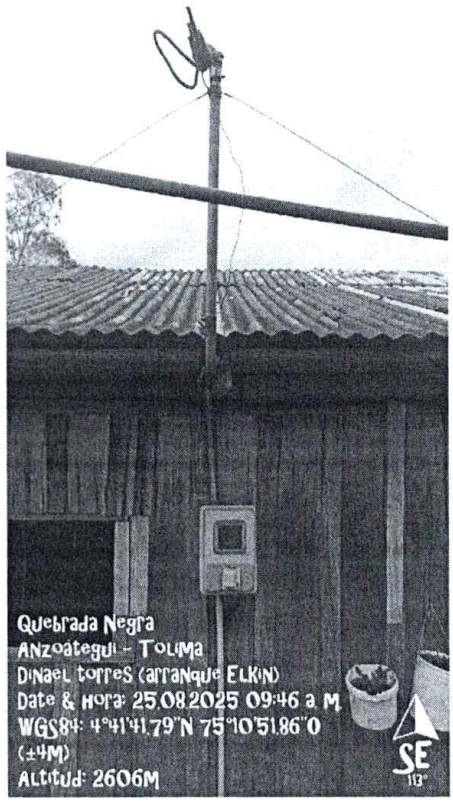

Viviendas beneficiarias visitadas en visita técnica.



Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co

celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA







Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co

celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRONOGRAMA ACTIVIDADES DESDE PRÓRROGA Y ACTUAL CON AJUSTES

Actividades	Tiempo ejecución SEMANAS										Responsable	Medidas Correctivas
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Reinicio actividades sector Quebrada Negra											Egetsa	
Ajustes finales en vereda la Cascada											Egetsa	
Instalación medidores e internas vereda Quebrada Negra											Egetsa	Instalación medida en última semana
Visita RETIE											Certificadora	
Tramites de legalización ante OR											Egetsa	
Visita para firma acta de terminación de obra											Egetsa-Infraestructura	Se sugiere visita 10 octubre

Semana 1 del 10 al 16 de agosto
Semana 2 del 17 al 23 de agosto
Semana 3 del 24 al 30 de agosto
Semana 4 del 31 de agosto al 6 de septiembre
Semana 5 del 7 al 13 de septiembre
Semana 6 del 14 al 20 de septiembre
Semana 7 del 21 al 27 de septiembre
Semana 8 del 28 de septiembre al 4 de octubre
Semana 9 del 5 al 11 de octubre
Semana 10 del 12 al 17 de octubre

Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co

celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co

egetsa
Empresa Generadora de Energía del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Se suscribe con cordialidad quedando atentos y prestos a cualquier otra petición que se considere necesario formular para en el marco de nuestras competencias lograr atenderlo de manera suficiente y diligente.

OSCAR ANDRES GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Gerente de EGETSA S.A. E.S.P.

Centro Comercial la ONCE
Calle 11 No. 2-16 Ofi. 214
Ibagué – Tolima - Colombia
Link Pagina Web: http://www.egetsa-tolima.gov.co

celular 3202497357 –(8-)2620857
gerencia.egetsa@tolima.gov.co
gerencia@egetsa-tolima.gov.co
asistente@egetsa-tolima.gov.co
