23	TUNA ALTA	**11002269 11002230**	KR 90 CALLE 154	KR 90 79 m al norte	06-06-2025	02-10-2025	202561201660132, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
23	PORTALES DEL NORTE	**11001671**	CALLE 168A KR73A	CALLE 168A KR74A	06-06-2025	02-10-2025	202561201660022, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
23	PORTALES DEL NORTE	**11013260**	CALLE 169A KR 67	CALLE 169A KR 68	06-06-2025	02-10-2025	202561201659632, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
26	ALMENDROS	**11000989, 11001062, 11000912, 11001040, 11001010 11000875**	CALLE 152B KR 113C	CALLE 152B KR 115	27-06-2025	23-10-2025	202561202030992 Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
26	LA FONTANA	**11002134 11009137**	KR 114 AV SUBA (AC 145)	KR 114 CL 148	27-06-2025	23-10-2025	202561202030992 Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
35	SAN CARLOS DE SUBA	**11002026**	KR 136A CL 143A	KR 136A CL 144	29-08-2025	27-11-2025	202561202821192 Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
35	SAN CARLOS DE SUBA	**11002045**	CL 143A KR 136A	CL 143A 8m AL ORIENTE	29-08-2025	27-11-2025	202561202821192 Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00

Se radicaron al contratista Consorcio Suba Vial VR los siguientes oficios:

- El 3 de agosto de 2025 mediante oficio SUBA-083-TH-303 se remitió las listas de chequeo evaluación de tránsito, julio 2025.
- El 12 de agosto de 2025 mediante oficio SUBA-083-TH-325 se dio Respuesta al comunicado CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-248-C. Solicitud consideración robo señales calificación asignada a PMT barrio Almendros. En este documento se adjuntó el oficio SPMT 202531208737431 emitido por secretaría de movilidad, el cual tenía como asunto: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT). En este la entidad presentó observaciones al PMT de los CIV de Almendros (11000989, 11001062, 11000912, 11001040, 11001010 y 11000875) y Fontana (11002134 y 11009137).

Se cuenta con los siguientes PMTs por aprobación proyectada:

Tabla 1 Resumen de PMT por aprobar

COT	BARRIO	CIV	Desde	Hasta	FECHA INICIO	FECHA FIN	Radicado SDM
35	GAITANA	**11004595**	CL 132BBISA KR 126D	CL 132BBISA TV 127	29-08-2025	27-12-2025	202561203043662 Por Aprobar 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00

COI

COI No. 35
AGOSTO 28 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
24667	11002026	N/A	KR 136A CL 143A	KR 136A CL 144	CONSORCIO SUBA VIAL VR	29-ago-25	27-nov-25	07:00-17:00	24 HORAS	FDLS-1009-2024	NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO EN TRES (3) ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE CALZADA Y CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL. ETAPA 3: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE EN CALZADA CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA, MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CON EL FIN DE REGULAR EL TRANSITO VEHICULAR. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION A INTERSECCIONES. GARANTIZAR EL PASO POR LOS ANDENES EXISTENTES Y SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES CON UN ANCHO MINIMO DE 1.2m COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DEL ESPACIO PUBLICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.	SI	SUBA	NATALIA CERVANTES G.	202561202821192
24668	11002045	N/A	CL 143A KR 136A	CL 143A 8m AL ORIENTE	CONSORCIO SUBA VIAL VR	29-ago-25	27-nov-25	07:00-17:00	24 HORAS	FDLS-1009-2024	NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DE ESTE FRENTE EN LA ETAPA 3 DEL PRESENTE RADICADO. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL PARA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA POR MEDIO DE SENDERO SEGREGADO MEDIANTE BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) ASOCIADO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO EN ETAPA 1: Y ETAPA 2 DEL PRESENTE RADICADO. NO SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL EN LA ETAPA 3. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA, MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CON EL FIN DE REGULAR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y SEÑALIZACION DE DESVIOS DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACION A INTERSECCIONES. GARANTIZAR EL PASO POR LOS ANDENES EXISTENTES Y SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES CON UN ANCHO MINIMO DE 1.2m COMODOS, CONTINUOS, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DEL ESPACIO PUBLICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES, SE DEBERA RESTITUIR EL ANDEN Y CALZADA EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.	SI	SUBA	NATALIA CERVANTES G.	202561202821192
24669	8003868	N/A	TV 78C CL 6C	TV 78C TV 71B	CONSORCIO TARQUI	22-ago-25	1-sep-25	22:00-05:00	22:00-05:00	IDU-2435-2024	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22-AGO-25. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS), SEGUN JUSTIFICACION TECNICA PRESENTADA.	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	KENNEDY	DEISY A. HERNANDEZ T.	CORREO ELECTRONICO DEL 22-AGO-25
24670	8003848	N/A	TV 78C TV 71B	TV 78C DG 6DBIS	CONSORCIO TARQUI	22-ago-25	1-sep-25	22:00-05:00	22:00-05:00	IDU-2435-2024	LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 22-AGO-25. PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PROPUESTOS), SEGUN JUSTIFICACION TECNICA PRESENTADA.	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	KENNEDY	DEISY A. HERNANDEZ T.	CORREO ELECTRONICO DEL 22-AGO-25

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espaco público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Diego Andrés Suárez Gómez
Subdirector Técnico de Planes de Manejo de Tránsito (E)

NOTA:

PLANO PARA ADECUACIONES DE ANDÉN COSTADO OCCIDENTE PARA FUTURO PASO PEATONAL



CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:

1. KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144

CIV: 11002026

COSTADO: DOS COSTADOS

LOCALIDAD: SUBA

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES DE ACERO 1" / PLAFONES EN MADERA	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO–01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO–01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO–24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO–04	PEATONES — PEATONES SIO–24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO–04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO–01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO–03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO–05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO–06	BICI–USUARIOS — BICI–USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR–30	CONSERVE LA DERECHA SRC–01

UBICACION

HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 3

CONSORCIO SUBA
VIAL VR

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. KR 136A ENTRE CL 143A Y CL 144

CIV: 11002026

COSTADO: DOS COSTADOS

LOCALIDAD: SUBA

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHÍCULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES DE ACERO 1"	CONOS 90cm
PLAFONES EN MADERA	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 - 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
OBRAS EN LA VÍA

PLANO 2 DE 3

CONSORCIO SUBA
VIAL VR


CL 144
KR 136A
CL 143A
KR 136A
KR 128
OBRA EN LA VÍA A 100m
SIO-01
SPO-03
SPO-05
SPO-06
SIR-30
SPO-24
SENDERO PEATONAL
VÍA CERRADA A 100m
KR 136A CERRADA AL SUR
KR 136A CERRADA AL NORTE
DESVÍO AL SUR
DESVÍO AL NORTE
DESVÍO AL OCCIDENTE
DESVÍO AL ORIENTE
VÍA CERRADA
SIO-01
Vehículos pesados
Peatones
Bicicletas
Motocicletas
9.2m
7.6m
6.5m
4.6m
2.4m
102.1m
3.4m
9.2m
7.9m
4.6m
0.9m
3.2m
3.2m
5.2m
5.2m
5

Anexo 7 Actas de comité

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité de Seguimiento No. 18.
Fecha:	11 Agosto 2025.
Lugar:	Alcaldía. (Casa de Participación L.
Dependencia:	

Hora de inicio: 10:am.
Hora de finalización: ____
Nombre del Responsable:

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o Legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	7181761	Andr. Acosta	Andr	FDLS-ZUBA										[illegible]	
CC	1013661605	Alejandro Acosta	Alejandro	Contratista										consorcio subavialvr. 1009. @gmail.com	
CC	1018479674.	Marly Andrea leiva	Andrea	Consorcio Suba Vial UR.									X	consorciosubavial vr1009.@gmail.com	Andrea leiva.
CE	1122409458	Luz Eidy Brito Orozco	Luz	Consorcio Suba TH 003										Subavrao@gmail.com	Luz Brito
CC	52118080	Sandra Acosta F	Sandra	consorcio suba vial vr2		X							X	consorcio suba vial vr.1009 @gmail.com	
CC	53161.450	Liliana Balindo Zabaleta	L/B	Consorcio Suba Vial UR		X							X	consorciosubavial vr.1009@gmail.com	
CC	1014241990	Erick Stiven Ramirez A	Erick	consorcio suba TH003											
CC	1015436127	Laura Patricia Ortiz M.	Laura.	Consorcio Suba TH 003.		X							X	Subavias@gmail.com	
CC	79148684	[illegible]	FDLS	[illegible]		X	[illegible]						X	[illegible] @[illegible]	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	Estado
1	Reunión en Lombardía con edil (CIV 11002492, 11002558, 11012036, 11002792 y 11002971)	Contratista, FDLS e interventoría	5 de agosto de 2025 5:00 pm	Se cumplió
2	Justificación de utilización de cárcamos en Sabana de Tibabuyes (CIV 11002945 y 11002757)	Contratista	Próxima semana	Pendiente
3	Elaboración de presupuesto de intervención de andenes fase 3	Contratista e interventoría	Próxima semana	Pendiente
4	Radicación estudios y diseños de Fase 1 y Fase 2 y diagnósticos fase 3	Contratista e interventoría	Próxima semana	Pendiente
5	Traslado de la red de agua potable 11004595 Gaitana	Contratista, interventoría y Acueducto	Se realizó el 31 de julio de 2025	Se cumplió
6	Respuesta al oficio del edil Andrés Cortes en Sabana de Tibabuyes (CIV 11002945 y 11002757)	Contratista	Próxima semana	Se cumplió

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

●El apoyo a la supervisión recomienda agilizar la radicación de las cuentas de cobro. El Contratista indica que el día de hoy enviará el acta a la Interventoría. La Interventoría indica que se tomará su tiempo para revisar, el apoyo a la supervisión solicita esta sea presentada antes del 14 de agosto de 2025.

●La residente de interventoría informa que se realizó visita el 5 de agosto de 2025 con el edil Jaime en Lombardía (CIV 11002492, 11002558, 11012036, 11002792 y 11002971). La directora de obra del contratista explica que el edil preguntó por qué no se consultó a la comunidad si querían cierre completo o parcial, se aclara que esto no se pregunta, el PMT simplemente se tramita. Además, a nivel técnico no es viable solicitar cierre parcial. Por otro lado, el edil tramitó ante la SDM con un derecho de petición la cancelación del PMT aprobado de Lombardía (CIV 11002492, 11002558, 11012036, 11002792 y 11002971) y Santa Cecilia (CIV 1104607, 11004687 y 11004750). La directora de obra del contratista entrega el documento recibido ya que, SDM canceló los PMT aprobados. El apoyo a la supervisión concluye que entonces la intervención de estos CIV se traslada para fase III.

●El apoyo a la supervisión indica que los tramos Turingia (CIV 11002207) y Gilmar (CIV 11003244) vienen de una acción popular, por esto deben ser prioritarios. La directora de obra del contratista reporta que se encuentran en diseños. Una vez estén listos se enviarán para aprobación de la interventoría.

●La directora de obra del contratista informa que dará respuesta al oficio recibido por interventoría respecto a la justificación del uso de cárcamos en Sabana de Tibabuyes (CIV 11002945 y 11002757), pero básicamente esta solicitud se fundamenta en la normativa vigente. La interventoría solicita justificar dado que en Gaitana, en donde, en la mesa de trabajo realizada con los especialistas de pavimentos se optó en vez de utilizar cárcamo dejar la placa en concreto.

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

●La directora de obra del contratista explica que se está elaborando el presupuesto del andén incluido recientemente en San Carlos (CIV 11002026). Se está definiendo con interventoría si este se hace en concreto estampado o escobiado. Esto se está evaluando por la solicitud de rampas que se recibió de una persona con movilidad reducida, siguiendo la normativa se tendrían que instalar losetas toperol y de línea. El apoyo a la supervisión solicita tener en cuenta los costos que implican hacer una u otra intervención.
●El apoyo a la supervisión pregunta cuando se tendrían presupuestos de fase 3. La directora de obra indica que una vez el especialista los entregue se remiten a interventoría. Cuando se aprueben se pueden elaborar los presupuestos. El apoyo a la supervisión solicita que estén listos los presupuestos para el comité del próximo 21 de agosto de 2025.
●La residente de interventoría indica que recibió del contratista de obra los diagnósticos, estos se están revisando para entregar. Se programa entrega de estos para el 19 de agosto de 2025.
●La residente de interventoría confirma que ya se realizó el traslado de la red de agua potable en Gaitana (11004595). La interventoría está programando un recorrido con el ingeniero Mahecha del Acueducto. La directora de obra del contratista explica que en Sabana de Tibabuyes se propuso hacer un anillo que conecte tubería nueva y antigua en el límite del CIV, sin embargo, el especialista hidráulico de interventoría no está de acuerdo con esta propuesta (CIV 11002945 y 11002757). Por esta razón, se está programando la reunión con Acueducto buscando que se autorice hacer un pozo o caja de inspección que permita hacer la conexión entre tuberías. Por otro lado, en Almendros ocurre la misma situación en las bocacalles que conectan con los CIV a intervenir (CIV 11000989, 11001062, 11000912, 11001040, 11001010 y 11000875).

COMPONENTE TÉCNICO

●**Frentes de ejecución de obra**

●El apoyo a la supervisión pregunta cuándo se hará fundida en San Carlos (CIV 11002026). La directora de obra aclara que aún no se encuentra autorizada dado que se encuentran realizando unos laboratorios y pruebas a la base estabilizada.
●Por otra parte, la directora de obra indica que en Gaitana (CIV 11004595) los andenes son estrechos, por lo cual su especialista para solicitar el PMT recomienda tener la vía lista, se arman senderos peatonales sobre esta y se habilita acceso a las viviendas.
●La directora de obra indica que ya se solicitó el PMT del andén no existente en San Carlos (CIV 11002026), como SDM no autoriza la intervención de ambos andenes al mismo tiempo, se debe hacer uno primero y después el otro.
●La directora de obra informa que la interventoría solicitó realizar cajas de inspección en donde se hacen las conexiones de tubería nueva y antigua en Sabana de Tibabuyes (CIV 11002757 y 11002945). Además, la otra semana se iniciaría la construcción de cárcamos para proteger las redes.
●La directora de obra reporta que en Almendros se iniciará el retiro de materiales, asfalto y concreto por separado, para cumplir con la normativa ambiental.
●El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se espera recibir informes de las inspecciones con CCTV. Se solicitará al Acueducto realizar otro pozo en la zona socavada que permita reemplazar la red. Esto aumenta los costos y plazos de ejecución del tramo. La directora de obra indica que se tienen dos propuestas, la primera utilizar una manga, esta opción toma menos tiempo de intervención, la segunda reemplazar esta tubería de forma tradicional, esto aumenta significativamente los tiempos de intervención. La residente de interventoría solicita se remita de forma oficial los presupuestos de estas dos opciones para comenzar a revisarlos. inicialmente la propuesta a zanja abierta cuesta aproximadamente 500 millones de pesos más, y esta no contempla horario 24/7 y el de la manga está estimado por un valor aproximado de 1800 millones de pesos adicionales. Esto se tratará en el recorrido que se realice con el acueducto.

●**Redes hidrosanitarias**

Inspecciones de redes

●La residente de interventoría indica que los remates contiguos y condiciones de tubería se definirán en el recorrido con el ingeniero Mahecha.

●**Redes secas**

●La residente de interventoría informa que para la presente semana no se han presentado afectaciones en redes secas

●**Varios**

●La directora de obra informa que se recibió respuesta indicando que efectivamente las vías de NIZA SUR (CIV 11011933, 11010570 y 11011935) son patrimonio, por lo cual se debe tramitar una licencia para intervenir estos frentes. Se entrega copia de la respuesta recibida. El apoyo a la supervisión solicita que se trasladen estos CIV para fase III.
●La directora de obra informa que se hizo revisión del individuo arbóreo del colegio 21 Ángeles (CIV 11002269 y 11002230). El ingeniero forestal de interventoría recomendó revisar por qué se encontraban tres troncos cuando este era un único árbol. El ingeniero forestal revisó y se espera el día de hoy, 11 de agosto de 2025, emitir un informe que se remitirá a la interventoría. Una vez aprobado se presentará un NP para la tala de los troncos que corresponden a topón.

COMPONENTE PMT

●La residente de interventoría informa que se envió la calificación del mes de julio con el comunicado SUBA-083-TH-303, indicando que la calificación se vio afectada por no tener soporte por parte del Contratista de la señalización faltante en Almendros (CIV 11000989, 11001062, 11000912, 11001040, 11001010 y 11000875). Asimismo, con el comunicado SUBA-083-TH-309 la interventoría realizó la solicitud de la denuncia instaurada y la instalación de señalización correspondiente al PMT de Sabana de Tibabuyes (CIV 11002757 y 11002945). La directora de obra del contratista aclara que las señales se instalaron, sin embargo, fueron hurtadas, esto es un hecho aislado que se sale del control del contratista por lo cual no está de acuerdo con que se afecte la calificación por esta razón. Asimismo, indica que el día de hoy secretaria de movilidad realizó recorrido encontrando observaciones al PMT de Almendros. El contratista espera el oficio para darle la respuesta.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

SST

●El componente SST del contratista de obra reporta que a la fecha las personas contratadas son 92, de los cuales 42 son ayudantes de obra. Por otro lado, no se han presentado accidentes laborales.

Ambiental

●El residente ambiental del contratista de obra explica que el día de hoy, 11 de agosto de 2025, quedó programada la reunión con el ingeniero Fabián Herrera del PIGA de la Alcaldía Local de Suba para el respectivo cargue de información a la plataforma.
●Por otro lado, el sábado, 9 de agosto de 2025, se entregó en físico a la interventoría el informe SST y ambiental para revisión final y radicación.

COMPONENTE SOCIAL

●La residente social del contratista de obra indica que hoy, 11 de agosto de 2025, se reunieron con el señor Hugo y el señor Osvaldo debido a sus ingresos no autorizados al frente de obra. Por otro lado, el señor solicitó la reunión del comité de participación. Esta reunión se está programando, se solicita participación de la Alcaldía Local de Suba en este comité. El componente SST del contratista de obra indica que en esta misma reunión se le notificaron los riesgos de su acceso sin autorización a obra. Esta entrega quedó registrada en el acta de la reunión. El componente social de interventoría complementa señalando que el contratista maneja adecuadamente las relaciones con este veedor, el cual es considerado un desafío para el proyecto.
●La residente social del contratista de obra indica que el lunes pasado, 4 de agosto de 2025, se reunió con la persona que consultó sobre la intervención de los tramos siniestrados (CIV 11004428 y 11004238), la señora solicitó que la Alcaldía le aclare por qué no se han intervenido estos tramos. El apoyo a la supervisión indica que puede presentarse a la casa de participación, oficina de infraestructura.
●Se menciona que ya fue remitida la respuesta a la solicitud del edil Andrés Cortés, referente a las bahías de Sabana de Tibabuyes (CIV 11002757 y 11002945).
●Por otro lado, desde el componente social de obra se iniciarán las actividades preliminares en la Kr 114 (CIV 11002134 y 11012980), con esto se terminaría fase 1. Después, se continuará con los andenes del colegio 21 Ángeles (CIV 11002269 y 11002230).
●La residente social del contratista de obra informa que a la fecha se tiene un 83% de mano de obra no calificada contratada.
●El apoyo a la supervisión consulta cuando terminaría la ejecución de Gaitana (CIV 11004595). La directora de obra del contratista aclara que se encuentra en gestión de autorización para continuar con base estabilizada.

Avance de la fase de ejecución

Finalmente, la residente de interventoría reporta que a la fecha el contrato de obra tiene un avance programado del 5.20% versus el avance ejecutado del 6.82%, lo cual da una desviación positiva del 1.62%.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Presupuestos de CIV de fase 3.	**Contratista**	**21 de agosto de 2025**
2	Entrega de diagnósticos al FDLS Fase 1 y Fase 2.	**Contratista e interventoría**	**19 de agosto de 2025**
3	Recorrido con ing Mahecha del Acueducto	**Contratista e interventoría**	**Próxima semana**
4	Definir el material del andén existente del CIV 11002026 (Escobeado o estampado)	**Contratista e interventoría**	**Próxima semana**
5	Informe forestal de individuo arbóreo colegio 21 Ángeles (CIV 11002269 y 11002230)	**Contratista**	**11 de agosto de 2025**
6	Justificación de utilización de cárcamos en Sabana de Tibabuyes (CIV 11002945 y 11002757)	**Contratista**	**Próxima semana**
7	Acta de recibo parcial de obra julio 2025	**Contratista**	**11 de agosto de 2025**
8	Atención al requerimiento de la SDM en Almendros	**Contratista**	**Próxima semana**

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Bogotá, D.C.

Señora
YENI BIBIANA CAMACHO MATÍNEZ
Correo electrónico: bibiana.camacho.07@gmail.com
Ciudad

Asunto: **CT Concepto técnico.** Respuesta a solicitud de información sobre la condición patrimonial de un componente de la malla vial en la ciudad de Bogotá D.C.

Radicado IDPC No. 20255110057192 del 02 de julio de 2025.

Respetada señora Camacho, reciba un cordial saludo.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) recibió la comunicación del asunto, en la que solicita información sobre la condición patrimonial de un segmento vial, al respecto, nos permitimos aclarar que:

En el numeral 5 del artículo 82 del Decreto 555 de 2021[1] se establece que cualquier intervención que se pretenda realizar en componentes de la Estructura Integradora de Patrimonios deberá ser autorizada *"(...) para Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital, sus áreas de protección del entorno patrimonial y/o predios colindantes: Por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, previo a su licenciamiento respectivo, cuando aplique".*

Adicionalmente, en el numeral 1 del artículo 85 del mencionado Decreto, se define el Área de Protección del Entorno Patrimonial (APEP) como la correspondiente a cien (100) metros lineales contados a partir del límite de los Bienes de Interés Cultural (BIC) del grupo urbano y del grupo arquitectónico con nivel de intervención 1 (N1).

Considerando lo anterior, se informa que, el Código de Identificación Vial (CIV) objeto de la consulta cuenta con condición patrimonial, como se muestra a continuación:

No.	Nombre / Dirección	UPL	CIV	Condición patrimonial
1	KR 70G entre CL 119 a CL 120	Niza	11011935 PK_ID_CALZADA 472336	SIU Niza Sur

1 Decreto Distrital 555 de 29 de diciembre de 2021 *"Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C."*

Teniendo en cuenta que, los espacios públicos que se relacionan en la tabla anterior, presentan relación con la Estructura Integradora de los Patrimonios (EIP), definida en el artículo 80 del Decreto Distrital 555 de 2021, los proyectos de intervención formulados requieren de la autorización del IDPC.

La mencionada autorización puede ser tramitada a través de una solicitud de Licencia de Intervención y ocupación del espacio público (LIOEP) allegando la totalidad de la documentación requerida (anexo 1); o en caso tal que la intervención se encuentre dentro de las excepciones a licencias mencionadas en el Decreto Nacional 1077 de 2015, se deberá adelantar el trámite de Solicitud de Autorización de Intervención en Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital, para ello se deberá radicar el formulario correspondiente (anexo 02) y allegar la documentación que se indica en el instructivo para obras mínimas en espacio público (anexo 03) o instructivo para obras permanentes (anexo 04), según el tipo de intervenciones formuladas. Adicionalmente, se informa que, todo lo relacionado con los trámites podrá ser consultado en la página web del IDPC, en los siguientes enlaces: https://idpc.gov.co/tramites/intervenciones-espacio-publico/ - https://idpc.gov.co/tramites/licencias-de-intervencion-y-ocupacion-del-espacio-publico/

Así mismo, es menester señalar que para las obras que se pretendan ejecutar, se deberá tener en cuenta la demás normativa vigente en la materia y gestionar los permisos a los que hay lugar.

En caso de requerir información adicional, podrá agendar una cita de atención personalizada al correo electrónico atencionciudadania@idpc.gov.co o a la línea telefónica 3550800 extensión 5029. Por último, se informa que, para remitir documentación técnica asociada a proyectos de intervención o anexos al documento inicial, podrá hacerse de forma presencial en la oficina de correspondencia, ubicada en la calle 12 B N 2-91 Casa Pardo, de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00pm en jornada continua o de manera virtual en formato PDF al correo electrónico correspondencia@idpc.gov.co, para su correspondiente evaluación. Tenga en cuenta que, las radicaciones virtuales realizadas después de las 5:00pm serán recibidas y radicadas el siguiente día hábil.

Atentamente,

Anexo: 01 Formulario Único Nacional Resolución 1026 de 2021
02 Formulario de solicitud de autorización de intervención en espacios públicos patrimoniales
03 Instructivo para la radicación de solicitudes de autorización de obras mínimas
04 Instructivo para la radicación de solicitudes de autorización de intervenciones permanentes

Documento 20253010056021 firmado electrónicamente por:

MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ	Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO Fecha firma: 31-07-2025 23:01:12
Aprobó:	LISSETH STEPHANIA MENDOZA GIRALDO - - Espacio Público
Proyectó:	JHON ALEJANDRO CARVAJAL MAHECHA - Profesional Universitario - Espacio Público

3192be57f1f81272eec85d26690fe9422833c7182252c35f4880fe3d425e4cee
Codigo de Verificación CV: 589b6

CIV 11001062

CALLE 152 b **ENTRE CARRERA 113 C** **KRA 114**

D=	24"	
L=	36	m
H=	2	m
Ancho zanja=	1,2	m

EXCAVACION MECANICA REDES 0 A 3,5 M	$ 5.171,00	86,4	$ 446.774,40
DEMOLICION TUBERIA	$ 9.403,00	36	$ 338.508,00
ENTIABDO	$ 54.934,00	129,6	$ 7.119.446,40
RETIRO DE MATERIAL	$ 41.256,00	112,32	$ 4.633.873,92
	$ 41.256,00	2,0357568	$ 83.987,18
TRITURADO	$ 147.462,00	19,44	$ 2.866.661,28
INST TUBERIA 24"	$ 652.333,00	36	$ 23.483.988,00
RELLENO B-200	$ 115.955,00	64,8	$ 7.513.884,00
	TOTAL LLUVIAS		**$ 46.487.123,18**
		30,33%	$ 14.099.544,46
	TOTAL LLUVIAS		**$ 60.586.667,64**

CIV 11001040

CALLE 152 b **ITRE CARRERA 114** **KRA 114 A**

D=	27"		34,29
L=	36	m	
H=	2	m	
Ancho zanja=	1,2	m	

EXCAVACION MECANICA REDES 0 A 3,5 M	$ 5.171,00	86,4	$ 446.774,40
DEMOLICION TUBERIA	$ 9.403,00	36	$ 338.508,00
ENTIABDO	$ 54.934,00	129,6	$ 7.119.446,40
RETIRO DE MATERIAL	$ 41.256,00	112,32	$ 4.633.873,92
	$ 41.256,00	2,3750496	$ 97.985,05
TRITURADO	$ 147.462,00	19,44	$ 2.866.661,28
INST TUBERIA 27"	$ 738.092,00	36	$ 26.571.312,00
RELLENO B-200	$ 115.955,00	64,8	$ 7.513.884,00
	TOTAL LLUVIAS		**$ 49.588.445,05**
		30,33%	$ 15.040.175,38
	TOTAL LLUVIAS		**$ 64.628.620,43**

CIV 11001010

CALLE 152 b **ENTRE CARRERA 1144** **KRA 114 B**

D=	30"		38,1
L=	33	m	
H=	2	m	
Ancho zanja=	1,2	m	

EXCAVACION MECANICA REDES 0 A 3,5 M	$	5.171,00	79,2	$ 409.543,20
DEMOLICION TUBERIA	$	9.403,00	33	$ 310.299,00
ENTIABDO	$	54.934,00	118,8	$ 6.526.159,20
RETIRO DE MATERIAL	$	41.256,00	102,96	$ 4.247.717,76
	$	41.256,00	2,36373984	$ 97.518,45
TRITURADO	$	147.462,00	17,82	$ 2.627.772,84
INST TUBERIA 30"	$	912.800,00	33	$ 30.122.400,00
RELLENO B-200	$	115.955,00	59,4	$ 6.887.727,00
	TOTAL LLUVIAS			**$ 51.229.137,45**
			30,33%	$ 15.537.797,39
	TOTAL LLUVIAS			**$ 66.766.934,84**

CIV 11000898

CALLE 152 b **ENTRE CARRERA 114 B** **KRA 114 D**

D=	30"		38,1
L=	77	m	
H=	2	m	
Ancho zanja=	1,2	m	

EXCAVACION MECANICA REDES 0 A 3,5 M	$	5.171,00	184,8	$ 955.600,80
DEMOLICION TUBERIA	$	9.403,00	77	$ 724.031,00
ENTIABDO	$	54.934,00	277,2	$ 15.227.704,80
RETIRO DE MATERIAL	$	41.256,00	240,24	$ 9.911.341,44
	$	41.256,00	5,51539296	$ 227.543,05
TRITURADO	$	147.462,00	41,58	$ 6.131.469,96
INST TUBERIA 30"	$	912.800,00	77	$ 70.285.600,00
RELLENO B-200	$	115.955,00	138,6	$ 16.071.363,00
	TOTAL LLUVIAS			**$ 119.534.654,05**
			30,33%	$ 36.254.860,57
	TOTAL LLUVIAS			**$ 155.789.514,63**

CIV 11000912

CALLE 152 b **ENTRE CARRERA 114 D** **KRA 114 F**

D=	36"		45,72
L=	33	m	
H=	2	m	
Ancho zanja=	1,2	m	

EXCAVACION MECANICA REDES 0 A 3,5 M	$	5.171,00	79,2	$ 409.543,20
DEMOLICION TUBERIA	$	9.403,00	33	$ 310.299,00
ENTIABDO	$	54.934,00	118,8	$ 6.526.159,20
RETIRO DE MATERIAL	$	41.256,00	102,96	$ 4.247.717,76
	$	41.256,00	2,7991656	$ 115.482,38
TRITURADO	$	147.462,00	17,82	$ 2.627.772,84
INST TUBERIA 36"	$	1.164.747,00	33	$ 38.436.651,00
RELLENO B-200	$	115.955,00	59,4	$ 6.887.727,00
	TOTAL LLUVIAS			**$ 59.561.352,38**
			30,33%	$ 18.064.958,18
	TOTAL LLUVIAS			**$ 77.626.310,55**

CIV 11000875
CALLE 152 b **ENTRE CARRERA 114 F** **KRA 115**

D=	36"		45,72
L=	33	m	
H=	2	m	
Ancho zanja=	1,2	m	

EXCAVACION MECANICA REDES 0 A 3,5 M	$	5.171,00	79,2	$ 409.543,20
DEMOLICION TUBERIA	$	9.403,00	33	$ 310.299,00
ENTIABDO	$	54.934,00	118,8	$ 6.526.159,20
RETIRO DE MATERIAL	$	41.256,00	102,96	$ 4.247.717,76
	$	41.256,00	2,7991656	$ 115.482,38
TRITURADO	$	147.462,00	17,82	$ 2.627.772,84
INST TUBERIA 36"	$	1.164.747,00	33	$ 38.436.651,00
RELLENO B-200	$	115.955,00	59,4	$ 6.887.727,00
	TOTAL LLUVIAS			**$ 59.561.352,38**
			30,33%	$ 18.064.958,18
	TOTAL LLUVIAS			**$ 77.626.310,55**

SUMA 6 CIV LLUVIAS **$ 503.024.358,64**

CIV 11000912

CALLE 152 b **ENTRE CARRERA 114 D** **KRA 114 F**

D=	36"		45,72
L=	33	m	
H=	2,3	m	
Ancho zanja=	1,2	m	

EXCAVACION MECANICA REDES 0 A 3,5 M	$	5.171,00	91,08	$ 470.974,68
DEMOLICION TUBERIA	$	9.403,00	33	$ 310.299,00
ENTIABDO	$	54.934,00	118,8	$ 6.526.159,20
RETIRO DE MATERIAL	$	41.256,00	118,404	$ 4.884.875,42
	$	41.256,00	2,7991656	$ 115.482,38
TRITURADO	$	147.462,00	17,82	$ 2.627.772,84
INST TUBERIA 36"	$	1.164.747,00	33	$ 38.436.651,00
RELLENO B-200	$	115.955,00	71,28	$ 8.265.272,40
	TOTAL LLUVIAS			**$ 61.637.486,92**
			30,33%	$ 18.694.649,78
	TOTAL LLUVIAS			**$ 80.332.136,70**

CIV 11000875
CALLE 152 b **ENTRE CARRERA 114 F** **KRA 115**

D=	36"		45,72
L=	33	m	
H=	2,3	m	
Ancho zanja=	1,2	m	

EXCAVACION MECANICA REDES 0 A 3,5 M	$	5.171,00	91,08	$ 470.974,68
DEMOLICION TUBERIA	$	9.403,00	33	$ 310.299,00
ENTIABDO	$	54.934,00	118,8	$ 6.526.159,20
RETIRO DE MATERIAL	$	41.256,00	118,404	$ 4.884.875,42
	$	41.256,00	2,7991656	$ 115.482,38
TRITURADO	$	147.462,00	17,82	$ 2.627.772,84
INST TUBERIA 36"	$	1.164.747,00	33	$ 38.436.651,00
RELLENO B-200	$	115.955,00	71,28	$ 8.265.272,40
	TOTAL LLUVIAS			**$ 61.637.486,92**
			30,33%	$ 18.694.649,78
	TOTAL LLUVIAS			**$ 80.332.136,70**

	SUMA 6 CIV LLUVIAS			**$ 508.436.010,94**

8008	REHABILITACION TUBERIA 24"	$ 3.976.567,00	36	$ 143.156.412,00
8009	REHABILITACION TUBERIA 27"	$ 5.033.700,00	36	$ 181.213.200,00
8010	REHABILITACION TUBERIA 30"	$ 6.012.016,00	33	$ 198.396.528,00
8010	REHABILITACION TUBERIA 30"	$ 6.012.016,00	77	$ 462.925.232,00
8011	REHABILITACION TUBERIA 36"	$ 7.610.050,00	33	$ 251.131.650,00
8010	REHABILITACION TUBERIA 36"	$ 7.610.050,00	33	$ 251.131.650,00
				$ 1.487.954.672,00
			30,33%	$ 451.296.652,02
				$ 1.939.251.324,02

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SPMT
20253120865395 1
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., agosto 04 de 2025

Señores
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Sandra Cuestas Fajardo
Directora de Obra
Av. Carrera 9 No. 113 – 52 Of. 906 - Edificio Torres Unidas 2.
CP: 110111
Email: consorciosubavialvr.1009@gmail.com / info.ingevolco@gmail.com
Bogota - D.C.

REF: Contrato FDLS-1009-2024 OBJETO: " Ejecutar a precios unitarios las actividades para la conservación de la malla vial local e intermedia y espacio público (Lote 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C. y las demás actividades que se detallen en el anexo técnico.

Asunto: Suspensión de Plan de Manejo de Transito (PMT) por obras sin iniciar

Localidad: Suba

Cordial saludo:

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en calidad de cabeza del sector movilidad y en cumplimiento de sus funciones como autoridad de tránsito y transporte de la ciudad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 672 de 2018[1] –en cuanto a la autorización de cierres, desvíos y medidas de mitigación por afectación del espacio público asociado a obras, eventos, aglomeraciones o emergencias, en el marco de los PMT; y el seguimiento al cumplimiento de los mismos, a través de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT)–, informa que en visita técnica de seguimiento a PMT por obra efectuada el 01 de Agosto de 2025 a las 09:28 a.m.., se evidenció que no se ha dado inicio a la implementación de los PMT autorizados según se relacionan en la Tabla 1 y como se describen a continuación:

---

[1] *"Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones"*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co

Tabla 1. Frentes de obra sin iniciar

Comité	Radicado SDM	Dirección	Tipo de Afectación
COI[2] 23 (medio impacto)	20256120165981 2	Carrera 111 entre Calle 142 y Calle 143 (ID. 15719)	Cierre total de calzada para actividades de conservación de la malla vial **Fecha inicio: 06-Junio-2025**
		Carrera 111 con Calle 142 (ID. 15720)	Cierre parcial de intersección (costado norte) para realizar actividades de conservación de la malla vial. **Fecha inicio: 06-Junio-2025**
COI 22 (bajo impacto)	20256120165988 2	Carrera 156A entre Calle 132 y Calle 132D (ID. 15081)	Cierre total de calzada para actividades de conservación de la malla vial **Fecha inicio: 06-Junio-2025**

Fuente: SDM -SPMT

Registro Fotográfico

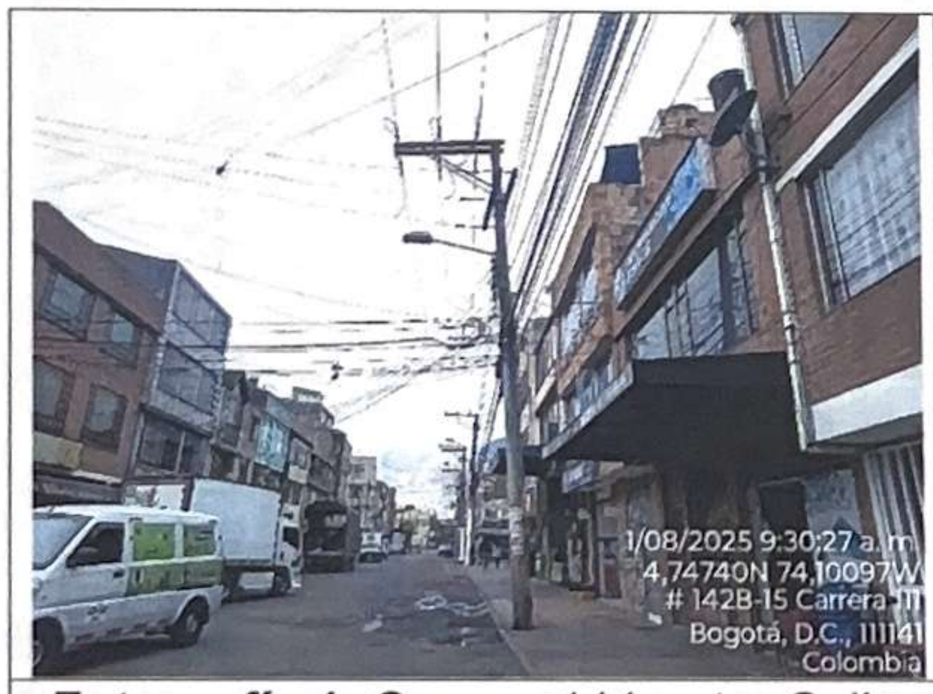


Fotografía 1. Carrera 111 entre Calle 142 y Calle 143(Vista al Sur)




Fotografía 2. Carrera 111 entre Calle 142 y Calle 143(Vista al Norte)

[2] Reporte consolidado de obras de infraestructura


Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

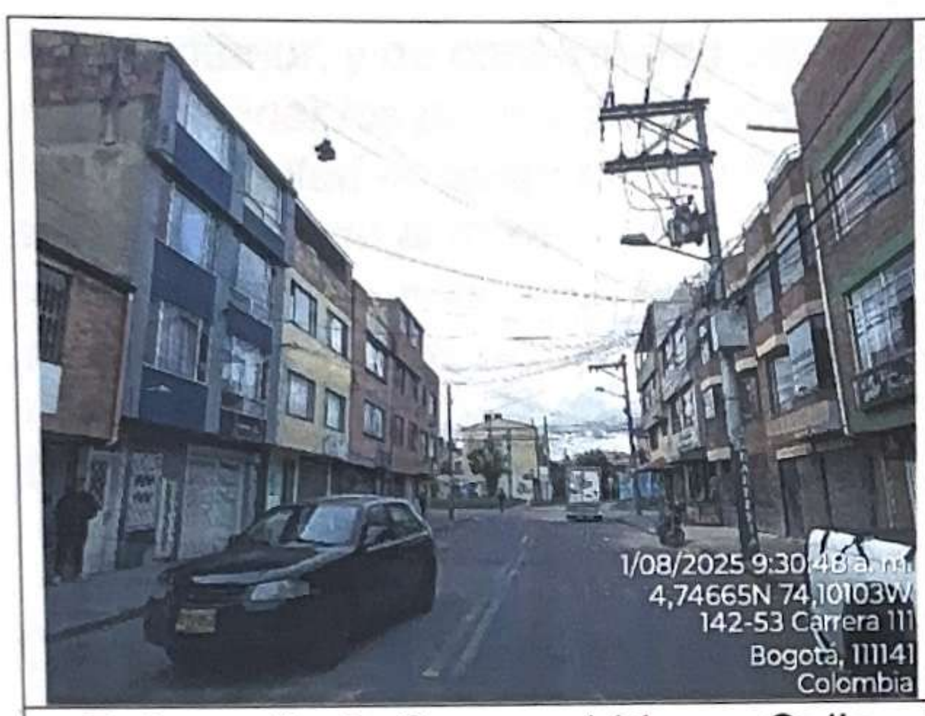

Fotografía 3. Carrera 111 con Calle 142 (Vista al Sur)

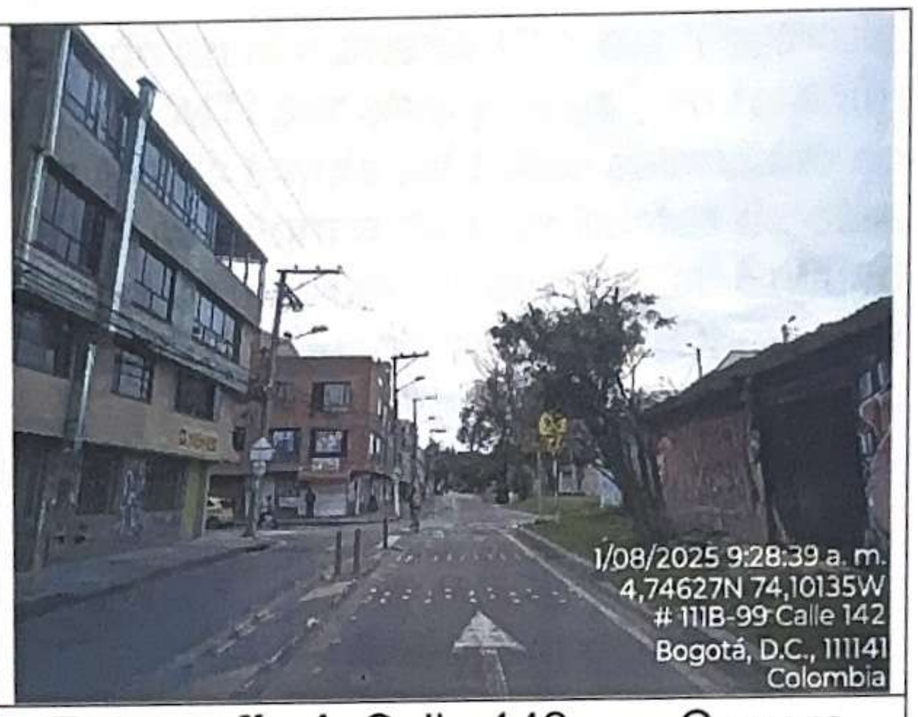

Fotografía 4. Calle 142 con Carrera 111 (Vista al Oriente)

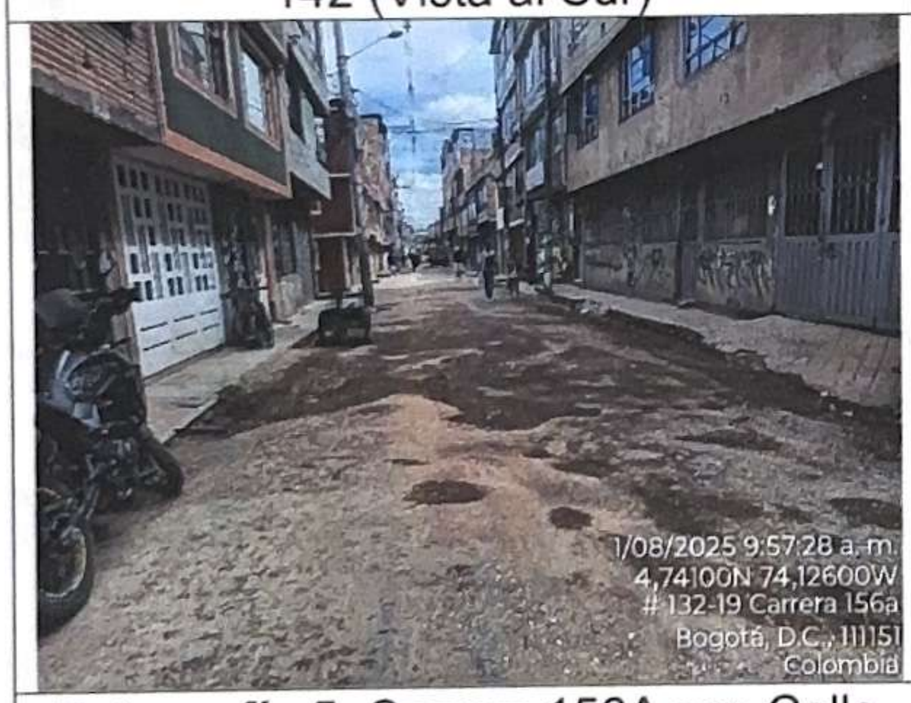

Fotografía 5. Carrera 156A con Calle 132 (Vista al Sur)



Fotografía 6. Carrera 156A con Calle 132A (Vista al Norte)

En consecuencia, la SDM informa que los cierres aprobados deben ejecutarse durante el período y en el horario autorizado, dado que la no ejecución de los mismos implica una afectación directa al proceso de aprobación de otros PMT dentro de la zona de influencia e incumple con los tiempos socializados a la comunidad afectada conforme a las Actas y cronograma presentado como parte integral del PMT.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Por lo anterior, y de conformidad con lo estipulado en el numeral 10.1 del "*Protocolo para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra y otros*", en relación con "*la potestad de suspender el PMT si transcurrido treinta (30) días calendario no se ha dado inicio al mismo*" por parte de la SDM, se informa que los frentes de obra relacionados en este comunicado serán suspendidos, por lo cual, esta Entidad publicará lo correspondiente mediante Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI) 32 del 08 de agosto de 2025, aclarando que para la ejecución de dichas obras, será necesaria la presentación del PMT nuevamente.

Cordialmente,

Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito
Firma mecánica generada en 04-08-2025 02:18 PM

Cc Edison Ricardo Duarte -director Interventoria-- Carrera 47a No. 93 – 41 CP: Subavias@gmail.com-110221(Bogota-D.C.)
cc Exmelin Hamid Lemus Franco - Supervisor-- Cra. 91 #145a-32 CP: Exmelin.lemus@gobiernobogota.gov.co / Infraestructura.suba@gobiernobogota.gov.co-111156(BOGOTA-D.C.)

Revisó: Leonardo Favio Estupiñán Muñoz –Subdirección De Planes De Manejo De Tránsito
Elaboró: Natalia Cervantes Gonzalez-Subdirección De Planes De Manejo De Tránsito

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

4-72
Correo y mucho más

Usted ha recibido el siguiente correo electrónico seguro y certificado.

Asunto
RADICADO SDM No-202531208653951

Enviado por
SECRETARIA DISTRITAL MOVILIDAD
Fecha de envío
2025-08-06 a las 13:02:33

Fecha actual
2025-08-06 a las 13:24:54

Respetado (a):

La Secretaría de Movilidad es una Entidad comprometida con la Política Distrital de Servicio al Ciudadano y con los lineamientos de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas como buenas prácticas del buen gobierno. Para el equipo es fundamental la satisfacción de los ciudadanos y las sugerencias que realicen, con miras al mejoramiento de la atención prestada.

Se remite para su conocimiento el radicado mencionado en el asunto.

Recuerde que ante la entidad para cualquier trámite o servicio no es necesario acudir a tramitadores o intermediarios. De esta manera se espera haber resuelto sus inquietudes. Para la Secretaría de Movilidad es un placer servirle.

Esta dirección de correo NO se encuentra disponible para recibir mensajes,

Documentos Adjuntos

202531208653951.pdf

SEALMAIL

Gmail

Suba Vias <subavias@gmail.com>

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO 11.08.2025 VERSION FINAL

1 mensaje

Suba Vias <subavias@gmail.com> 1 de septiembre de 2025, 2:46 p.m.
Para: Consorcio Suba Vial VR <consorciosubavialvr.1009@gmail.com>, wilmer.acosta@gobiernobogota.gov.co, Juan Pablo Sarmiento Rojas <juanpablosarmiento68@gmail.com>
CC: Laura P Ortiz M <tecnicosubavias@gmail.com>, Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>, SISOMA CONSORCIO SUBA TH 003 <sstasubaviasth003@gmail.com>

Buenas tardes,

En cumplimiento al compromiso adquirido por parte de la interventoría, y teniendo en cuenta que a la fecha no se han recibido observaciones a la versión borrador compartida el 25 de agosto de 2025, nos permitimos remitir la versión final del acta del comité de seguimiento celebrado el pasado 11 de agosto de 2025.

Quedamos atentos a sus comentarios a que haya lugar.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

2025.08.11 Comité de seguimiento No 18 v0.pdf
8960K

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GFD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Revisión Correcciones Plan de Calidad Interventoría		
Fecha:	12- Ago - 2025.	**Hora de inicio:** 10:30	**Modalidad:** Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Casa de la Participación.	**Hora de finalización:** 11:40	
Dependencia:	Oficina de Infraestructura	**Nombre del Responsable:** Juan P. Salvioto – Sofia Jacobs	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	79.244.137	Juan P. Salvioto	Juan P.	FDL. Infraest.			X						X	juanpablosalvioto68@gmail.com	
CC	1.002.158.841	Ana Sofia Jacobs		Consorcio Suba TH 003			X						X	subajas@gmail.com	Ana Sofia J.
CC	1015436127	Laura Patricia Ortiz M	Laura.	11			X						X	11	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3397000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gua.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

El apoyo a la supervisión del FDLS verifica la versión 2 del Plan de calidad de la interventoría en la cual se atienden las observaciones emitidas mediante mesa de trabajo realizada el 14 de julio de 2025 en la casa de participación del FDLS.

Una vez atendidas las observaciones, el apoyo a la supervisión solicita la radicación de este.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Radicar Plan de calidad V2	Interventoría	12 de agosto 2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GFD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70109

Objeto de la reunión: Estado del Contrato 1009-2024

Fecha: 14 Agosto 2025

Hora de inicio: 9:00am

Hora de finalización: ____

Lugar: Oficina de Interventoría

Dependencia:

Nombre del Responsable:

Modalidad: X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o Legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1090403332	Edison Ricardo Duarte		Interventoría			X						X	subarica1@gmail.com	
CC	79.244137	Juan P. Salamanca	Juan P.	FDLS. Infraest.			X						X	juanpablosalamanca68@gmail.com	
CC	79148[illegible]	[illegible]	FDLS	[illegible]		X	X						X	[illegible]	
CC	1018436127	Laura Patricia Ortiz	Laura.	Interventoría		X							X	Subarica@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada, y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 338*000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados, para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaa.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-idg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza mesa de trabajo entre el FDLS. y la Interventoría para revisar el estado del Contrato 1009-2025.

El FDLS indica que han recibido manifestaciones de la Comunidad de San Carlos CIV 1120 9026. La Interventoría indica que se esta revisando por parte del Contratista el diseño de la base estabilizada la cual ha tenido observaciones por parte de Interventoría. Asimismo, estan trabajando en el diseño del andén oriental, el cual se incluyo hace poco por parte del FDLS. En cuanto al sustento técnico de la base se espera por parte del Contratista entre el día de hoy y mañana. El FDLS recomienda la intervención del tramo por la Espontaneidad la cual es estimada a finales de agosto.

La interventoría manifiesta que los tramos de Nza Sur son de Patrimonio Cultural y se debe realizar un tramite IDPC. El FDLS revisara la Intervención. La Interv. indica que se realizo la solicitud oportunamente y hace poco la entidad contesto.

Martes 19 de agosto 2025 se realizara recorrido con Acueducto en el Sector de Almeparos para Socializar lo encontrado en campo. En cuanto al daño de la tubería 36" Profundidad aproximada de 2.50 m.

El FDLS Solicita el balance Financiero, Precios unitarios, Argumentos Especulativos. Cronograma revisar Imputabilidad. Traslapo entre Fase 1 y Fase 2. El FDLS no tiene contemplado ninguna prorroga. La Interventoría indica que el Contratista esta trabajando en diseños Fase 3, con esta información sacara presupuestos y no 14966 se Solicita tener en cuenta para intervención tambien Turingia y Gilmar.

Se menciona por parte de Interventoría la inconformidad por parte de los comerciantes en lombardía para intervención en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero.

El FDLS Solicita presentar diseños y presupuestos de los tramos listados dentro del Contrato, definir claramente los tramos de Intervención y presentar el informe de exclusión dada la limitante economica.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Revisión Cuenta de cobro interventoría No. 4 (1 Julio - 31 Julio).
Fecha:	15 de agosto de 2025
Lugar:	Casa de participación FDLS
Dependencia:	Oficina de Infraestructura
Hora de inicio:	2:00 pm
Hora de finalización:	5:30 Pm
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Nombre del Responsable:	Juan Pablo Sarmiento - Ana Sofia Jacobs

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o Legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
C.C	1.002.118.041	Ana Sofia Jacobs S.		Consorcio Suba TH 003			X						X	subavias@gmail.com	Ana Sofia S.
CC	79.244.137	Juan P. Sarmiento.	Juan P.	FDLS Infraestruct.			X						X	JuanPabloSarmiento68@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada, y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se reunen al apoyo a la supervisión e interventoría para revisión del informe de actividades y supervisión entregado en la cuenta de cobro No. 4 (Julio):

-Se corrobora que la reunión de inicio en el CIV 11002026 fue el 3 de junio de 2025. El 18 de junio de 2025 se recibió el acta resultado de esta reunión

- En el numeral 10.2.8 se encontraba duplicada la información

- En el ítem 10.4.14 se indica que el cargue de información en el PIGA ambiental se realiza mensual y la interventoría debe hacer el acompañamiento en esta actividad.

- 10.4.16 En esta obligación se pregunta por las actividades realizadas en cumplimiento al Programa de Salud en el Trabajo de interventoría. La respuesta presentada se enfocó en el programa implementado por el contratista de obra.

- En el numeral 10.4.21 se solicita incluir el número de radicado de la cuenta correspondiente al mes de julio.

- En el numeral 10.4.22 se indica que la obligación hace referencia al certificado de cumplimiento de pagos que se entrega con el acta de cobro.

- En el numeral 10.5.7 incluir en productos radicados que soportan la información mencionada en la sección de actividad.

- En el numeral 10.5.8 se aclara que a la fecha no se han realizado Preactas de pago a ESP. Tener en cuenta esta recomendación para el numeral 10.5.9.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega al FDLS de los documentos con las correcciones recibidas	Interventoría	19 de agosto 2025

NOTA 1. En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formulación.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

JP/a.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Recorrido de Obra 1009-2024 - EAB		
Fecha:	20 Agosto 2025	Hora de inicio: 9:00 am	Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Almendros - Subana - Gautaca	Hora de finalización: ____	
Dependencia:		Nombre del Responsable:	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o Legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1090403332	Edison Ricardo Duarte		Consorcio subavial TH003			X							subavial@gmail.com	
CC	7175720	Jaime Pacheco		EAAB Z1			X							jmahecha@cumplo	
CC	79.244.137	Juan P. Saavedra		RDLS Infraestructura			X						X	juanpablosaavedra68@gmail.com	
CC	52118080	Sandra Cuestas		Consorcio subavial UR			X						X	Consorcio subavial UR.1009@gmail.com	
CC	1015436027	Laura Ortiz		Consorcio subavial TH003			X						X	Subanasc@gmail.com	
3202102		Camilo Gaitan		EDDB ESP			X							glopez@cumplo.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán unidos, para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 20 de agosto se reunieron funcionarios de el Acueducto, la alcaldía, contratista e interventoría en los civ de Almendros adjudicados bajo el contrato 1009 del 2024. En esta reunion el contratista indica que la tubería pluvial en el proyecto se encuentra proyectado un campo de 20" y lo encontrado en campo son tuberías de 36" la cual previa verificada con camara tctv y se evidencia en mal estado. El acueducto indica que no es posible realizar el cambio de la tubería, ya que la tubería que se encuentra en almacen es para la atencion de emergencias.

Por otra parte, se hace la consulta de la tubería sanitaria que pasa por el frente las cuales salen de las boca calles. El acueducto indica que se debe realizar un anillo en concreto para el empalme de la tubería. Asi mismo recomienda que en las boca calle se intervenga a 1m mas. Asi mismo resalta que el cambio de la tubería en lo posible sea de pozo a pozo segun la norma. Adicionalmente el acueducto indica que al no contar con un acta de competencia no se tiene la posibilidad de el suministro de materiales debido a que hoy no se cuenta con un convenio entre las dos entidades. En resumen el acueducto manifiesta que no cuenta con recurso alguno para cubrir los gastos de reposicion de tubería. Por lo tanto se le autoriza al contratista hacer las gestiones correspondientes para la adquisicion de la tubería a remplazar en los civ y lo cual debera estar alineado con las recomendaciones de su asesor hidrosanitario. Tambien se le solicita reforzar las actividades en todos los civs e iniciar de inmediato con la excavacion correspondiente

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	Estado
1	Presupuestos de CIV de fase 3.	Contratista	21 de agosto de 2025	Pendiente, en diseños de fase 3. La interventoría indica que el contratista se encuentra en la elaboración de diseños fase 3 y que, con este insumo, presentara los presupuestos previstos para la primera semana de septiembre. Cabe resaltar que 1 tramo de Lombardía actualmente se encuentra en espera dado que por parte de la comunidad se presentó una inconformidad con las fechas de intervención de los CIV indicando que afectaría su comercio. Así mismo, cabe resaltar que en reunión realizada con la alcaldía el dia martes se manifestó que ha hoy se tiene mas del 50 % del presupuesto comprometido en los tramos que se están interviniendo.

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	Estado
2	Entrega de dispendios al PDUS Fase 1 y Fase 2.	Contratista e interventoría	19 de agosto de 2025	Se organizo la documentación para la entrega a la entidad. Se radicaría mañana. La interventoría indica que se presentan los presupuestos iniciales, sin contar con las condiciones diferentes encontradas en alineados con la empresa de EAB.
3	Reunión con Ing. Mancha del Acueducto	Contratista e interventoría	Próxima semana	De programo para el 19 de agosto de 2025, indicando en el sector de Alrededores. Se efectuó el 20 de agosto de 2025 Ayer se hizo la visita al acueducto no quiere asumir responsabilidades, se le da el aval al contratista para la ejecución y compra de materiales de las redes de acueducto.
4	Definir el material del andén existente del CIV 1 (Calle 24 (Escobado o estampado)	contratista e interventoría	Próxima semana	Pendiente. Se le solicito presentar al contratista 2 alternativas. El contratista indica que no envió el día 21 de agosto la propuesta de los dos perfiles para los anclajes en sitio Cantor. La interventoría revisara la documentación y programara una reunión para la revisión de estas propuestas con la escuela, así mismo, el contratista manifiesta su preocupación en cuanto al confinamiento hasta este mes a tener con

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	Estado
				las urbanizaciones adyacentes. Por parte de la interventoría se hace la recomendación de realizar una dilatación con tensor y que se construya un cabezote o viga reforzado con acero y asta no recio con el concreto del andén. Por parte de la supervisión se solicita el documento de inclusión y exclusión, no quiere que esto sea un hecho cumplido, si por eso ahí se solicita el documento contractual. Por lo anterior solicita la presente la próxima semana. La interventoría requiere al contratista que presente un solo documento con las inclusiones, exclusiones y sustento económico.
Ele 5	Informe forestal de individuo arbóreo relegio 21 ingeles (CIV 11002949 y 11002950)	Contratista	11 de agosto de 2022	Se cumplió, el mismo se entregó DCMESUBAVIALVR-ECO-1009-2024-294-C. En revisión por parte de la Interventoría El contratista cumplió con la entrega del informe forestal del individuo arbóreo situado en el colegio 21 ingeles, en el manifiesta que el no necesita y que procederá con la gestión para la tala de este. Por otra parte, el contratista manifiesta que la secretaría de ambiente no ha dado respuesta referente al ajuste de los pagos emitidos y tampoco ha expedido la resolución para la compensación eco con respecto al árbol talado en el

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	Estado
				CIV 11002926 hacen el aporte a la supervisión. La supervisión pregunta por el avance de ese tramo, la interventoría indica que se presentaron observaciones al diseño de mezcla de la base presentadas por el contratista el martes y observadas por la interventoría el miércoles y le acuerda que el día de mañana un reunión con los especialistas de pavimentos la puedan consensuar estos temas.
6	Justificación de utilización de cárcamos en Zalzona de Tibabuyes (CIV 11002945 y 11002727)	contratista	Próxima semana	Se cumplió, el mismo se entregó DCMESUBAVIALVR-ECO-1009-2024-256-C. En revisión por parte de la Interventoría. Se revisa y se conceptuó ayer y a la espera de una socialización para la próxima semana.
7	Acta de recibo parcial de obra julio 2025	Contratista	11 de agosto de 2025	Se entrego por parte del Contratista el 15 de agosto de 2024 y en horas de la tarde. La Interventoría realiza visitas los jueves y viernes, los cuales fueron atendidos por el Contratista de manera presta. Por lo anterior, hasta el 19 de agosto de 2024, el acta se radico en la alcaldía.
8	Atención al requerimiento de la SDM en Almendros	contratista	Próxima semana	Se cumplió el contratista obtuvo SDM?

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	Estado
				20253120873743 1 Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT), para su respuesta El contratista manifiesta que el día de hoy están en la instalación de señales, se deja evidencia de la instalación y reporte de que se hizo. La interventoría indica que está a la espera de la respuesta del contratista.

COMPONENTE TÉCNICO

Frentes de ejecución de obra

•Avance de obra CIV 11002026. Rampa para personas con movilidad reducida y definir el material del andén existente del civ 11002026 (escobado o estampado). La interventoría solicita la propuesta con planos en planta y de perfil.
El contratista indica que realizo la instalación de un relleno provisional en el costado occidental, para solicitar el PMT del costado oriental. Por parte de la interventoría se informa que se tiene en cuenta la rampa con movilidad reducida. No obstante, se aclara que esto no cumplen normativa de espacio publico por los anchos que tiene el andén. El contratista complementa que se realizó el andén provisional en el costado occidental, pero la secretaria no aprobó el PMT para la intervención del anden en el costado oriental. El contratista indica que de acuerdo con la reunión de los especialistas de pavimentos estima iniciar el vaciado de las losas la próxima semana.

•Avance de obras en CIV 11004595. Continua con avance en estructura, bordillos bajo rampa, traslado de red acueducto, se mandó registro fotográfico a movilidad para la solicitud del PMT de los andenes.

•Avance de obra Sabana de Tibabuyes (CIV 11002945 y 11002757) se conversa con el ingeniero del acueducto Mauricio Mahecha acerca de las condiciones técnicas con reposición de redes, principales y domiciliarias, falta conexión del pozo, 11002945. Se aprueba por parte de la interventoría vactor para la otra semana.

•Avance de obra Almendros. Se definió con acueducto que todos los recursos para la ejecución de las actividades sean desarrollados por el contrato. Concepto de especialista hidráulico a la espera de respuesta de parte del contratista. El contratista indica que el concepto viene enfocado a que el mismo corresponde al contrato de conservación no de diseños ni construcción. por lo anterior, conservara lo encontrado en el campo.

●Redes hidrosanitarias

Inspecciones de redes

•Se finalizo lunes 11 de agosto de 2025 la limpieza con vactor e inspección con CCTV en Almendros.

●Geotecnia y pavimentos

•El contratista de obra e interventoría se encuentran organizando la información correspondiente a diagnosticos y diseños correspondientes a Fase 1 y Fase 2 para entrega al FDLS

●Redes secas

•Para la presente semana no se han presentado afectaciones en redes secas

●Varios

•Respuesta: patrimonio urbanístico por vivienda Niza sur (CIV 11011933, 11010570 y 11011935)
•La supervisión solicita revisar la posible inclusión del CIV 11014446. La interventoría indica que no hay diseño. Por parte de la supervisión indica que esta solicitud proviene de despacho y solicita un presupuesto preliminar de costo.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

SST
•Cantidad de ingresos en la semana, maquinaria y volquetas
•Revisión de documentación
•Reunión en obra y observaciones

Ambiental
•Cantidades de RCD generados a la fecha
•Cantidad de materiales adquiridos a la fecha (incluido materiales de aprovechamiento).

COMPONENTE SOCIAL
•El avance de actas de vecindad es del 15% e informa la ingeniera directora del contrato de obra que estarán finalizadas en dos semanas. LA socialización será programada para el mes de septiembre.
•La residente social de interventoría informa que se está llevando a cabo la planeación del Programa de Sostenibilidad, el cual será entregado el día 22 de agosto, de acuerdo con el compromiso establecido entre componente sociales de obra e interventoría. Este iniciaría la implementación en el mes de septiembre.
•La residente social de obra informa que se realizó cierre total de acceso a la bahía de parqueo en el frente de Sabana de Tibabuyes, el cual ya fue restituido desde el 19 de agosto.
•Se informa que el día 22 de agosto habrá capacitación sobre "Acoso Callejero" en el frente de obra Almendros, a partir de las 8:00 a.m.
•Respecto al comité de participación de Almendros, del cual hace parte el señor Hugo Quintero, líder de la comunidad, se solicita orientación al comité de parte de la profesional social de obra para programar la fecha la cual se establece para la segunda semana de septiembre, una vez se hayan superado los temas de informes mensuales.
•La residente social de interventoría reitera la solicitud de remitir a la interventoría la respuesta a las PQRS previa al envío al ciudadano para constatar que la respuesta este de acuerdo con la consulta verificando así el cumplimiento.

Avance de la fase de ejecución

AVANCE FINANCIERO						
	PROGRAMADO			EJECUTADO		
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Ejecución programada ($)	$ 85.634.963,00	$ 880.065.128,00	Ejecución ejecutada ($)	$ 37.108.915,00	$ 1.032.964.818,00	254.437.509,00
Ejecución programada (%)	0,68%	6,99%	Ejecución ejecutada (%)	0,29%	8,20%	1,214%

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Presupuestos de CIV de fase 3.	**Contratista**	**5 de septiembre de 2025**
2	Entrega de diagnósticos al FDLS Fase 1 y Fase 2.	**Contratista e interventoría**	**22 de agosto de 2025**
3	Definir el material del andén existente del CIV 11002026 (Escobeado o estampado)	**Interventoría**	**Próxima semana**
4	Presentacion documento de inclusión y exclusion	**Contratista e interventoría**	**Próxima semana**
5	Reunión de especialistas de pavimentos para revisar el diseño de mezcla de a base esabilizado.	**Contratista e interventoría**	**22 de agosto de 2025**
6	Informe forestal de individuo arbóreo colegio 21 Ángeles (CIV 11002269 y 11002230)	**Interventoría**	**11 de agosto de 2025**
7	Consulta por parte de la alcaldia de la resolución de compensación para el CIV 11002026 (San Carlos)	**FDLS**	**Próxima semana**
8	Justificación de utilización de cárcamos en Sabana de Tibabuyes (CIV 11002945 y 11002757)	**Interventoría**	**Próxima semana**
9	Atención al requerimiento de la SDM en Almendros	**Contratista**	**Próxima semana**
10	Tramite de PMT de andenes en san Carlos y sabana de Tibabuyes	**Contratista**	**Próxima semana**

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento de Obra				
Fecha:	21/08/2025	Hora de inicio: 1:30 pm	Modalidad:	Presencial X	
Lugar:	Casa de la participación - Alcaldía Local Suba	Hora de finalización: ____		Virtual	
Dependencia:		Nombre del Responsable:		Telefónica	
				Mixta	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o Legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	53054860	Juliana Ojeda	Juliana	Suba TH003 Interventoría			X						X	socialsubavial@gmail.com	
CC	1075236242	Katherine Cortranta		Suba TH003 Interventoría			X						X	hseq-total@gmail.com	
CC	1090403332	Edison Ricardo Duarte		Suba TH003 Interventoría			X						X	subavial@gmail.com	
CC	1015436127	Laura Patricia Ortiz	Laura	Suba TH003 Interventoría			X						X	Subavia5@gmail.com	
CC	1014241970	Erick Steven Ramirez	Erick	Suba TH003 Interventoría			X								
CC	1033739248	Maidy Nayeli Combita B	Maidy	Consorcio Suba Vial VR									X		
CC	1026568535	DORIS JULIETH MORA	DORIS	Consorcio Suba Vial VR			X						X		
CC	53.161.450	Liliana Galindo Zabuleta	Lili	Consorcio Suba Vial VR			X						X	pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com	
CC	1.018479674	Mary Andrea Leiva	Andrea	Consorcio Suba Vial VR.			X						X	sst.csubavial@gmail.com.	Andrea Leiva.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en: https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento de Obra				
Fecha:	21/08/2025	Hora de inicio: 1:30pm	Modalidad:	Presencial X	
Lugar:	Casa de la Participación - Alcaldía local de Suba.	Hora de finalización: ____		Virtual	
Dependencia:		Nombre del Responsable:		Telefónica	
				Mixta	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o Legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	79148677	Oscar Yicomi	FDLS	INFRAESTRUCTURA		X	X						X	oscar.yicomi@epsbogota.gov.co	
CC	52180080	Consorcio Suba Vial VR	CSVUR	Contratista		X							X	consorciosubavialvr.1009@gmail.com	Yanneth Cuta

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados, para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE SUBA

ACTA DE REUNION

Reunión	Fecha: 5 de agosto del 2025
	Hora de Inicio: 5:30 pm
	Hora Final: 7:00 pm
	Lugar: barrio Lombardía

DESARROLLO

El señor edil John Jaime Jimenez manifestó, en nombre de la comunidad, su profunda preocupación frente a las obras a ejecutar en el tramo comprendido de la Carrera 111 entre calles 142 a la 142B, dado que los cierres solicitados por el contratista y aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) contemplan el cierre total de la calzada. Esta situación podría generar impactos negativos en las operaciones comerciales, las cuales constituyen el principal sustento económico de la población residente en este corredor vial.

Se indicó que desde la Junta Administradora Local (JAL) se remitió un oficio a la SDM solicitando seguimiento al Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado, el cual autoriza actualmente al contratista a realizar cierres completos de calzada, sin considerar las necesidades puntuales de la comunidad afectada.

En atención a las inquietudes presentadas por el edil, el ingeniero Edison Ricardo Duarte explicó el alcance técnico del proyecto, indicando que la duración estimada de las obras será de aproximadamente cuatro (4) meses, tiempo que podría extenderse debido a posibles intervenciones en redes de servicios públicos aún no definidas. La comunidad manifestó preocupación, ya que este periodo coincide con la temporada de diciembre, cuando se incrementa significativamente la actividad comercial, así como las labores de cargue y descargue.

El representante del Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS) señaló que el proyecto representa una inversión importante de recursos y generará beneficios para la comunidad, por lo que invitó a los comerciantes a considerar este proyecto como una mejora tanto a corto como a largo plazo. Se informó, además, que una vez se defina la fecha de inicio de las actividades constructivas, se convocará a una reunión de arranque en la que se detallarán las actividades técnicas, su duración y los planes de manejo correspondientes.

La representante del contratista aclaró que el alcance contractual del proyecto se limita a la intervención del eje vial, sin incluir los andenes, lo cual garantizará el paso ininterrumpido de peatones y clientes por la zona. Asimismo, explicó que el PMT fue socializado previamente con los residentes del sector, y que se cuenta con los respectivos soportes que evidencian dicha gestión. Además, afirmó que se ha mantenido contacto activo con los representantes de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Lombardía, con el fin de establecer canales de comunicación efectivos.

Frente a lo anterior, el edil John Jaime Jimenez reiteró su oposición a los cierres totales de calzada y manifestó que la SDM fue convocada a esta reunión con el fin de atender los requerimientos comunitarios, pero su ausencia en este espacio fue notoria. Invitó a los responsables del proyecto a reevaluar la metodología constructiva, proponiendo alternativas como cierres por tramos, a media calzada o parciales. Advirtió que la bahía ubicada en el costado occidental ya se encuentra cerrada completamente, y allí funcionan locales comerciales que prestan servicios a vehículos, como montallantas y lavaderos, los cuales se verían gravemente afectados por la ejecución de las obras bajo el esquema actual.

Compromisos

Van a revisar el Plan de Manejo de Tráfico con el objetivo de atender las necesidades puntuales de la comunidad. En este sentido, la próxima socialización y autorización del mismo deberá realizarse en consenso con los comerciantes del sector.

John Jaime Jimenez Zapata
Edil Localidad de Suba

LUZ MARLEN SAENZ R

Proyectó y elaboro: Luz Marlen Sáenz

Se anexa registro fotográfico


Bogotá
Colombia
Contrato No. 083-2025-INT
Lombardía, reunión
#Consorcio Suba TH003

Bogotá, 31 de Julio del 2025

Doctora:
Claudia Diaz
Secretaria de Movilidad

Asunto: Solicitud de información y socialización del PMT – Intervención en la Cra. 111 entre Calle 142C y 143, barrio Lombardía

Cordial Saludo:

Muy atentamente me dirijo a su despacho con el fin de solicitar se nos informe sobre el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) presentado ante la Secretaría Distrital de Movilidad por parte del contratista encargado de la intervención programada en la Carrera 111, entre las calles 142C y 143, en el sector de Lombardía.

La comunidad manifiesta no haber sido informada previamente sobre el cierre vial proyectado, situación que ha generado inconformidad, especialmente entre los comerciantes del sector, quienes consideran que esta medida afecta de manera significativa su actividad económica. Por lo anterior, se solicita evaluar alternativas que minimicen el impacto generado y permitan la continuidad del comercio en la zona.

Asimismo, solicitamos que en la reunión de socialización se cuente con la presencia de los ingenieros responsables del PMT, con el fin de dar respuesta a las inquietudes planteadas por la comunidad.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a una pronta respuesta.

Atentamente,

John Jaime Jimenez Zapata
Presidente Comisión Salud
Vicepresidente Comisión Seguridad
Junta Administradora Local de Suba

Proyecto y Elaboro: Luz Marlen Sáenz R
Apoyo Junta Administradora Local de Suba

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MPG	
	GESTION ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
	CÓDIGO PA01-PR14-F03	VERSIÓN 1.0

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVLIDAD

www.movilidadbogota.gov.co

Correo electrónico: contactociudadano@movilidadbogota.gov.co

Calle 13 No. 37 - 35

Tel: +57 (601) 364 9400 opción 2



Radicado ORFEO No: 202561202730362



Fecha de Radicado:	2025-07-31	**Canal de recepcion:**	Virtual - Correo electrónico
Remitente:	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE SUBA ( )	**Radicado BTE No:**	
Dignatario:		**Direccion de Correspondencia:**	CALLE 146 C BIS 90 57 (D.C./BOGOTA) (D.C./BOGOTA)
Correo electronico:	jal.suba@gobiernobogota.gov.co	**Barrio/Localidad:**	
Interesado:		**Direccion de Correspondencia:**	
Correo Electronico:		**Barrio/Localidad:**	
Tipo de Requerimiento:	Entes de Control/Solicitud de información / 10 dias	**Datos comparendo:**	/
Datos del contrato:	-	**Datos de los hechos:**	

Asunto - Referencia - Descripcion del Documento:

Asunto: Solicitud de información y socialización del PMT – Intervención en la Cra. 111 entre Calle 142C y 143, barrio Lombardía

Descripcion pqrs:

Anexos	**Notificarme por correo electronico**
NO TRAE	NO

Gmail

Suba Vias <subavias@gmail.com>

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO 21.08.2025 VERSION FINAL

1 mensaje

Suba Vias <subavias@gmail.com> 1 de septiembre de 2025, 3:17 p.m.
Para: Consorcio Suba Vial VR <consorciosubavialvr.1009@gmail.com>, Juan Pablo Sarmiento Rojas <juanpablosarmiento68@gmail.com>, wilmer.acosta@gobiernobogota.gov.co
CC: Laura P Ortiz M <tecnicosubavias@gmail.com>, Social Interventoria <socialsubavias@gmail.com>, SISOMA CONSORCIO SUBA TH 003 <sstasubaviasth003@gmail.com>

Buenas tardes,

En cumplimiento al compromiso adquirido por parte de la interventoría, y teniendo en cuenta que a la fecha no se han recibido observaciones a la versión borrador compartida el 22 de agosto de 2025, nos permitimos remitir la versión final del acta del comité de seguimiento celebrado el pasado 21 de agosto de 2025.

Quedamos atentos a sus comentarios a que haya lugar.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

2025.08.21 Comité de seguimiento No 19 v0.pdf
1916K

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: Revisión diseño de mezcla base estabilizada

Fecha: 22 agosto 2025.

Lugar: Campamento Interventoría.

Dependencia:

Hora de inicio: _____

Hora de finalización: _____

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o Legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	52118080	Sandra Cuestas	Consorcio			X							X	Consorcio Suba Vialvr1009@gmail.com	
CC	52.857.593	Verónica Torres Rincón	Interventoría		X								X	proyectos@vetori ingenieria.com	
CC	1090403332	Edison Ricardo Ducite		interventoría Consorcio SUBATHO07		X							X	subavial@gmail.com	
CC	80026555	Juan R. Trujillo R.	Consorcio				X						X	gerencia@geoingtra.com	
CC	1015436127	Laura Patricia Ortiz M	Interventoría	Consorcio Suba TH 003			X						X	Subavias@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada, y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3358000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar o rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en: https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza mesa de trabajo entre los especialistas de pavimento de obra e interventoría en la que se revisan las observaciones realizadas por la interventoría con relación al diseño de mezcla estabilizada
El especialista del contratista indica que estuvo revisando internamente las observaciones realizadas y se determinó que existen errores a nivel de digitalización, los cuales se están ajustando.
Los diseños actualmente se están ajustando al cumplimiento de la norma técnica del IDU en donde el modulo resiliente debe ser mínimo de 380 MPa. Expresa que el personal que realizo la instalación de la mezcla en el tramo de prueba es un personal idóneo el cual tiene el conocimiento amplio y suficiente para la estación de este. Asimismo, se realiza la medición con el LWD en donde se debe hacer una correlación y con ello poder llegar al modulo resiliente. Se propone por parte de la interventoría realizar ensayo de placa. El contratista indica que realizo la toma de medidas el día de ayer con LWD indicando que 4 tomas dan 400 MPa, y solo 2 se encuentran por debajo de los 380 MPA los cuales serán revisados y analizados por parte del contratista. Por otra parte, el contratista indica que se debe cumplir mínimo con los 380 MPa bien sea para la capa terminada en rígido o flexible, expone que con la dosificación del 5% de cemento aplicada en el tramo de prueba se esta alcanzando esta resistencia y que otra variación del porcentaje de cemento no alcanzara el requerimiento del módulo resiliente. La interventoría requiere presentar claramente el diseño de mezcla cumpliendo con las especificaciones IDU ET 511 -2018 E IDU ET 520-2018 ya que este será el soporte de la interventoría para realizar el seguimiento. Asimismo, la interventoría solicita se mencione la composición del aditivo, dentro de la mezcla porque en estos momentos en la información entregada no se hace referencia textual. Adicionalmente, la interventoría solicita que en el diseño se presente la clasificación de los agregados la cual debe cumplir con la especificación IDU 511 - 2018, se propone realizar para el cumplimiento y requerimiento de la Interventoría el ensayo de placa en almendros y en ese caso se pide validar los resultados de LWD en San Carlos realizar los correctivos pertinentes e iniciar con el vaciado de concreto según diseño.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	Presentar diseño ajustado	**Contratista**	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se inicia mesa de trabajo con la presencia de especialistas hidrosanitarios de obra e interventoría, residente de interventoría, director de interventoría y directora de obra:

•El director de interventoría inicia la reunión y solicita al contratista explicar sus dudas respecto a las observaciones emitidas por el especialista hidrosanitario de la Interventoría.

• La directora de obra del contratista menciona que una de las observaciones recibidas es respecto a la solicitud del diseño pluvial. El especialista hidrosanitario de obra complementa explicando que el proyecto, a nivel de alcantarillado, por su limitación presupuestal no puede cumplir a cabalidad normativa del Acueducto. Por esta razón, los diseños buscan permitir en la vía el flujo de agua y drenaje de esta. Adicionalmente, el contrato no incluye dentro de sus costos ítems relacionados con diseño de alcantarillado. Por último, el Acueducto no permite la modificación de cotas bateas, por lo tanto, se debe trabajar con las cotas existentes.

• Por otro lado, el especialista hidrosanitario de obra indica que una observación recibida expresa que no se cumple con el ancho de inundación. Cuando este ítem no se cumple, según normativa, se debe disminuir la distancia entre sumideros. Pero, nuevamente se menciona que a nivel presupuest no se pueden hacer diseños que cumplan la normativa por los costos que implica. Se solicita a la interventoría aclarar esta observación. Si la interventoría lo solicita se realizarán diseños que cumplan los requisitos establecidos por la norma, sin embargo, esto incrementará los costos del tramo significativamente.

• El director de interventoría aclara que, como menciona el especialista hidrosanitario de obra, este contrato es de conservación. El objetivo es mejorar la capacidad de drenaje de los tramos con el fin de garantizar la estabilidad de obra, no obstante, no se alcanzará a cumplir los requisitos de normativa.

•El especialista hidrosanitario de obra explica que el criterio para definir la ubicación de los sumideros es incluirlos en la mitad para tramos de 50-90 metros que no cuentan con ellos.

• El especialista hidrosanitario de interventoría indica que se solicitó dentro de las observaciones un capítulo de alcance en el cual se debe explicar todas las condiciones limitantes mencionadas en esta reunión. Por otro lado, en ciertos tramos ya existen sumideros, si estos se modifican o se cambia s ubicación se debe justificar esta modificación.

• El especialista hidrosanitario de obra concluye que incluirá un capítulo de alcance dentro del informe. Por otra parte, respecto a la observación que solicita justificar el uso del sumidero tipo rejilla. Se aclara que, para el sumidero que quedará sobre la vía, porque no se intervendrá la bahí obligatoriamente se debe utilizar el tipo rejilla, se ahondará en esta justificación dentro del informe.

• El especialista hidrosanitario de interventoría indica que esa es la solicitud. Cualquier intervención o modificación se realice debe tener su justificación. Por otro lado, explica que, respecto a la solicitud de esquemas de localización, dentro del informe no se presentaron esquemas de la vía y ubicación de los sumideros, esto debe incluirse dentro del informe.

•El especialista hidrosanitario de interventoría aclara que algunos elementos se inhabilitaran en planos. Esta situación también debe tener justificación. Aunque no se cumpla la normativa, todas las decisiones deben tener sus argumentos respectivos.

• El especialista hidrosanitario de interventoría solicita al contratista de obra incluir los parámetros de diseño dentro del informe. El especialista hidrosanitario de obra indica que se incluyó ciertos parámetros, pero las tablas son extensas por esto no se incluyen completamente. El especialist hidrosanitario de interventoría aclara que se debe presentar un resumen de los resultados. El especialista de obra aclara que se presentó un capítulo con resultados. El especialista de interventoría explica que hacen falta otros ítems como la relación de caudales. El especialista de obra señala que puede incluir relación de caudales y cotas, aunque la segunda no la considera necesaria. El especialista de interventoría concluye que se pueden incluir, por ejemplo, las relaciones de caudales, pero relacionando a que tramo corresponde. El especialista de obra concluye que hará una tabla que resuma estos datos.

• El especialista hidrosanitario de obra respecto a las observaciones sobre las áreas de drenaje explica que estas se estimaron visualmente, se están asumiendo ciertas condiciones. Calcular el área como lo solicita la normativa aumentaría significativamente los caudales y los sumideros que se debe incluir en el frente.

• El especialista hidrosanitario de interventoría observa que en el informe las convenciones están invertidas. Pero, teniendo en cuenta que no se está siguiendo normativa el especialista hidrosanitario de obra pregunta si es necesario hacer la corrección. El especialista hidrosanitario de interventor solicita que se haga la corrección partiendo de que esta información será entregada al acueducto.

•El especialista hidrosanitario de interventoría comenta que la imagen del sumidero presentado en el informe tiene baja resolución, recomienda buscar una que tenga mejor calidad visual.

• Por otro lado, el especialista hidrosanitario de obra pregunta respecto a la observación que expresa no es claro porque se plantean redes de 18" cuando el mínimo normativo son 12". Como el contrato es de conservación y los tramos son existentes, ya tienen una tubería y de acuerdo con la directrices del Acueducto se debe mantener lo que existe. El especialista hidrosanitario de interventoría está de acuerdo con lo mencionado. Se solicita incluir dentro del informe que es existente y cuales modificaciones se harán.

• El especialista hidrosanitario de obra menciona respecto a la observación de que debe contrastarse el valor mínimo permitido de esfuerzo cortante que hay unas condiciones existentes limitantes. El especialista de interventoría comenta que se debe contextualizar estos valores y si no se cump aclarar que se debe a unas condiciones que no se pueden modificar.

•El especialista hidrosanitario de interventoría aclara que la observación de que no se cuenta con convalidación de cotas se hizo inicialmente, sin el contexto ya aclarado en esta reunión.

•El director de interventoría concluye que es importante dentro del documento hacer todas las salvedades necesarias en aras de que lectores externos, como entes de control, entiendan el alcance de este contrato y la razón de las decisiones que se toman.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité de Seguimiento No 20.				
Fecha:	28 Agosto 2025.	Hora de inicio: 1:30 PM.	Modalidad:	X Presencial	
Lugar:	Casa de la participación - Alcaldía.	Hora de finalización: ____		Virtual	
Dependencia:		Nombre del Responsable:		Telefónica	
				Mixta	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o Legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1090403332	Edison Ricardo Duarte		Interventoría Consorcio SUBATH003		X								subavias@gmail.com	
CC	1014241970	Erick Steven Ramirez		interventoria consorcio subaTH003			X								
CC	53054860	Paula Juliana Ojeda A	Juliana	Consorcio SUBATH003			X						X	secvialsubavias@gmail.com	
CC	85154567	Alvaro Diazgranados		Contratación									X	3012097728	
CC	2181761	Andrei Acosta	Andrei	EDLS - EVILA										3118267609	
CC	53.161.450	Liliana Galindo Zabaleta	Lili	Consorcio Subavial UR										3112547288	
CC	1.013.661.605	Alejandro Acosta	Alejandro	Consorcio Subavial UR.										3165321988	
CC	52118080	Sandra Cuestas	Consorcio	Consorcio Subavial. UR		X							X	consorcio subavial UR. 100@gmail.com	
CC	1033739248	Maicly Nayadi Cambita	Consorcio	consorcio subavial UR		X							X		

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-idg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité de Seguimiento No 20.
Fecha:	28 Agosto 2025.
Lugar:	Casa de la participación - Alcaldía.
Dependencia:	

Hora de inicio: 1:30pm
Hora de finalización: ____
Nombre del Responsable:

Modalidad: X Presencial; ___ Virtual; ___ Telefónica; ___ Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o Legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1026568535	DORIS JULIETH MORA	JSIS	CONSORCIO SUBA VIAL VR			X						X	juliethsisizz@gmail	
CC	1015936127.	Laura Patricia Ortiz.	Laura.	Consorcio Suba TH 003			X						X	subavias@gmail.com	
CC	79148677	[illegible]	FDLS	[illegible]		X	X						X	[illegible]	
CC	85154567	Alvaro Diazgranados	—	Contratación									X	—	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en: https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	Estado
Presupuestos de CIV de fase 3.	Contratista	5 de septiembre de 2025	La interventoría menciona que se encuentra en elaboración, en diseños de fase 3, una vez se cuente con esta información se hará la presentación de los presupuestos de la fase denominada Fase 3.
Entrega de diagnósticos al FDLS Fase 1 y Fase 2.	Contratista e interventoría	22 de agosto de 2025	cumplió, se entregaron SUEA-083-TH-316 20258110229522. Asimismo, la interventoría indica que se realiza la entrega con los conceptos de los especialistas de la interventoría. Los apoyos al FDLS confirman el recibo de los documentos.
Definir el material del andén aledaño del CIV 11002026 (Escobeado o estampado)	Interventoría	Próxima semana	La interventoría mediante el SUEA-083-TH-341 dio respuesta al CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-266-C Diseños andenes CIV 11002026 según inclusión autorizada por el FDLS. En espera de la respuesta por parte del Contratista. La interventoría solicita una reunión con el FDLS la próxima semana un espacio presencial para revisar esto, indica que se tendrá que acomodar a las condiciones reales, dado que hasta la misma secretaria de movilidad rechazo el trámite del PMT al no contar con el ancho suficiente para el tránsito del personal con movilidad reducida. Por lo anterior, es claro que no se cumplirá con normativa del espacio público, adicionalmente lo que busca la reunión

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

			es realizar la consolación del tipo de concreto que se utilizara en estos andenes.
Presentación documento de inclusión y exclusión	Contratista e interventoría	Próxima semana	La interventoría indica que se encuentra el documento en elaboración. Por otra parte, expresa que no se ha realizado el presupuesto del andén costado oriental del CIV 11002026, el cual fue incluido por petición del alcalde y este se presentara con una la cifra aproximada. Asimismo, menciona y explica al asesor jurídico del FDLS que lo que corresponda al informe de inclusión y exclusión es un consolidado de presentaciones parciales que se han realizado a lo largo del desarrollo del contrato. Es importante indicar que en su momento la interventoría presento la solicitud de la exclusión de los CIVs 12 indicando que estos tramos aún tienen cubiertos garantías de estabilidad en otros contratos, según lo consultado en el SIG-IDU. Adicionalmente, la interventoría complementa que de los 82 CIVs asignados al contrato y excluyendo estos 12 quedarían 70 que de los mismos hay unos que tienen mayor prioridad por parte de la Alcaldía y que como complemento a estos la misma se comprometió con otros códigos de identificación vial PK_ ID, complementarios a los CIVs a intervenir los cuales corresponden a los andenes de San Carlos y Gaitana.
Reunión de especialistas de pavimentos para revisar el diseño de mezcla de a base estabilizada.	Contratista e interventoría	22 de agosto de 2025	Se cumplió el viernes 22 de agosto 2025

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR	Informe forestal de individuo arbóreo colagio 21 Ángales (CIV 11002269 y 11002230)	Interventoria	11 de agosto de 2025	La interventoría responde al contratista mediante SUBA-085-TH-348 para que el contratista continúe con el trámite correspondiente. La interventoría indica que según la norma el rebrote de los árboles, este se puede talar. Asimismo, se debe realizar la gestión con ENEL - CODENSA para la suspensión del servicio para poder realizar la tala de este, de la misma manera se debe realizar la socialización con la comunidad. El contratista informa que al día de hoy está solicitando a la línea 123 (Emergencias), la poda de la copa, esta realizando las gestiones pertinentes para poder intervenir los CIVs en la semana de receso escolar en el mes de octubre. Estima para esta intervención realizar la tala en la semana comprendida entre el 22 al 26 de septiembre. Finalmente, el contratista manifiesta que todos estos documentos se harán conocer al FDLS a través de la interventoria.
	Consulta por parte de la alcaldía de la resolución de compensación para el CIV 11002026 (San Carlos)	FDLS	Próxima semana	Pendiente, se menciona por parte del contratista que se realizo el acercamiento a la ventanilla de la SDA en donde se informó que se debe realizar una comunicación a fauna y silvicultura, esta respuesta tiene un tiempo estimado de 15 días hábiles, nuevamente solicita al FDLS el apoyo para revisar el tema porque existen unos saldos que no corresponden. El FDLS indica que debe realizar el acercamiento con el ingeniero Fabian de Ambiente a ver si a través de él se puede solucionar algo adicional.

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR	Justificación de utilización de cárcamos en Sabana de Tibabuyes (CIV 11002948 y 11002767)	Interventoría	Próxima semana	Se cumplió, se aprobó el no previsto de los cárcamos por parte de interventoría. Se manciona que este tramo tendrá concreto asfaltico, y se deberá realizar esta protección a las redes mediante cárcamos. Adicionalmente, la interventoría indica que la norma es demasiado estricta y que se realizó una mesa de trabajo el 27 de agosto de 2025 con los especialistas de hidráulicos se deben presentar los sumideros cada 20 metros, esta ubicación de los sumideros quedo concertada en la mesa de trabajo.
	Atención al requerimiento de la SDM en Almendros	Contratista	Próxima semana	Pendiente. El contratista indica que se encuentra realizando la instalación de la señalización en fontana y que las está cubriendo con plástico negro hasta que se inicie la intervención de este tramo. Estima dar la respuesta el lunes de la próxima semana a la comunicación de la SDM.
	Transito de PMT de andenes en san Carlos y Gaitana	Contratista	Próxima semana	En proceso, el contratista informa que espera la respuesta el día mañana san Carlos si la SDM aprueba el PMT de la intervención de los andenes. Con respecto al andén de Gaitana observaciones como es tan angosto, se presentó un registro fotográfico con un paso peatonal sobre la vía, estiman que salga la próxima semana. Se ratifica nuevamente por parte del FDLS que el contrato es de monto agotable y que se debe atterrizar el balance financiero. Por parte del contratista se requiere para soportar la modificación la comparación económica del presupuesto inicial de los tramos, esto teniendo en cuenta que en la información entregada no son claros los costos de las intervenciones. El FDLS indica que se lo solicitara al formulador.

COMPONENTE TÉCNICO

Frentes de ejecución de obra

•Avance de obra CIV 11002026. La Interventoría indica que hoy se continuo con la instalación de las losas de concreto. Asimismo, expresa que es importante tener en cuenta que este fue un tramo de prueba para la base estabilizada con cemento + aditivo y que, en la reunión de los especialistas de pavimentos, se informó que este material cumplió con las condiciones técnicas requeridas por la normativa. De acuerdo con la modelación de losas El contratista indica que mañana se realizara la tercera (3) fundida y que por el último tramo que es de 2,25 metros la mixer no pasara para la cuarta fundida, indica que presento el precio no previsto de la bomba estacionaria para revisión y aprobación por parte de interventoría. En cuanto a la intervención de los andenes, se realizarán en diferentes tiempos, según la autorización que se obtenga por parte de la SDM.
•Avance de obras en CIV 11004595. La interventoría indica que se encuentran en proceso de instalación de la base estabilizada, expresa que pueden existir quejas por parte de la comunidad, ya que el material se debe dejar 7 días en proceso de fraguado. Adicionalmente, menciona que existe unas IPE, colocada por la comunidad en el pompeyano para que los vehículos no se subieran al anden y que actualmente otras personas están tratando de retirarla. Finalmente, se menciona que en el K0+000 del CIV 11004595 se realizo un anillo de empalme entre la red existente y la red nueva cambiada por el contratista ya que, para la intervención hasta el pozo, tendrían sobre costos en diferentes alternativas como una red dirigida y que adicionalmente se saldría de la intervención del CIV, en donde se requeriría realizar la inclusión de otro CIV.

•Se realiza la presentación de John Jaime Jiménez, uno de los ediles de la localidad de suba, indica que se surtió inicialmente una reunión con la comunidad de Lombardía el martes 26 de agosto de 2025, menciona que la comunidad actualmente esta renuente por las intervenciones de almendros, tienen preocupación en la estabilidad económica de sus negocios dado el tiempo estimado de intervención entre octubre a diciembre 2025. Expresa que inicialmente los comerciantes no iban a dejar hacer la vía, pero la misma se encuentra sin intervenir desde hace 20 años, expresa que estos CIVs fueron contemplados dentro del contrato de mantenimiento y conservación No. 521, contrato que se siniestro y que, ahora con la alcaldía de cesar salamanca bajo el contrato 1009 de 2024, se volvieron a incluir. Asimismo, expresa que por esta vía pasa un colector de gran magnitud en donde según su criterio no se deberían intervenir las redes ya que el mismo se encuentra en buenas condiciones. La interventoría indica cual es la intención de reunión, expresa que el tramo se puede demorar más tiempo, son decisiones, o responsabilidades según el proceso constructivo, necesidad y condiciones de ejecución. El Contratista indica que el plan de manejo de tráfico que está suspendido y que de intervenir esta vía no realizara cierres parciales según lo solicitado por la comunidad, es decir, se realizara la vía completa. Asimismo, que el PMT en su momento si se socializo a la comunidad. Por lo anterior, el contratista indica que a la fecha no se dará respuesta a una fecha inicial de ejecución. Asimismo, aclara que no se ha realizado la inspección a las redes, por otra parte, refiere la vigencia de las actas de vecindad y si las mismas se deben actualizar. Finalmente, el contratista no deja a responsabilidad el cambio de las redes dado lo indicado por el Edil en donde indica que las mismas se encuentran en buenas condiciones. •El FDLS, indica que el alcalde se comprometió a realizar los CIVS de Portales Norte 11001671, Turingia 11002207, 11003244 GILMAR. Se recomienda pasar a la denominada fase 3, los CIVs de Niza Sur, Portales norte 110000768 y Lombardía se revisará de acuerdo con la reunión que se programa el día de hoy.
•La interventoría indica que los diseños de pavimentos se fueron escogiendo de acuerdo con las necesidades y buscando los costos y presupuestos.
•Avance de obra Almendros. El contratista solicita que en el comité de participación asistan profesionales del Fondo de Desarrollo Local de suba, se establece realizar este comité el próximo viernes 5 de septiembre de 2025 a las 4 pm. El contratista indica que, dadas las intervenciones de la tubería de aguas lluvia, se debe realizar la reprogramación y entrega del sector de almendros la cual será programada hasta la finalización del contrato. Indica que excavando se encontró una lutita, en la cual de manera inicial se excavaron los 70 cm de la estructura de pavimentos empezó a presentar consolidación, y por recomendación del especialista se va a realizar una excavación menor en la caja de vía, esperando que no sea mayor la consolidación de este material y que si se llegase a presentar mayor la deformación a previsto en la estructura de pavimentos esta se realizara el relleno adicional con base. Adicionalmente, indica que se están llevando al frente de obra las láminas metálicas para realizar el entibado. Por parte de la interventoría se menciona que el día de hoy el especialista de geotecnia de la interventoría realizo recorrido, indicando que el material encontrado efectivamente es altamente plástico. No obstante, no presenta un riesgo de ajuste al diseño propuesto inicialmente.
•Avance de obra Sabana de Tibabuyes (CIV 11002945 y 11002757). Por parte del contratista se indica que en sabana de Tibabuyes se estima la próxima semana iniciar con la protección de la tubería con los cárcamos, por esta razón indica que no se puede transitar para hacer la instalación de la base.
•Finalmente se acuerda, revisar los presupuestos en el próximo comité para revisar si se requiere realizar una adición al contrato.

●Varios

•Se realiza la presentación del Dr. Álvaro Diaz Granados, quien acompañara desde el FDLS el área jurídica el contrato de obra.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

SST
•Cantidad de ingresos en la semana, maquinaria y volquetas
•Revisión de documentación
•Reunión en obra y observaciones

Ambiental
•Cantidades de RCD generados a la fecha
•Cantidad de materiales adquiridos a la fecha (incluido materiales de aprovechamiento).

COMPONENTE SOCIAL

Se abordaron diferentes temas durante la exposición del componente técnico, entre ellos los siguientes:
1.La intervención de los andenes en el colegio 21 Ángeles se realizará en la semana de receso; ya se han adelantado reuniones preliminares con directivos de la institución.
2.Se recibe la solicitud del edil Jairo Jiménez para socializar el PMT de Lombardía a la comunidad residente y comerciante en reunión de la noche del jueves 28 de agosto, ya que la comunidad pregunta por los cierres, los tiempos y los desvíos, después de ponerse de acuerdo para permitir la intervención de la vía. Se hace la claridad de que este PMT ya había sido socializado previo a la solicitud del PMT, el cual después de aprobado por la SDM fue suspendido a solicitud del mismo edil. La interventoría, el contratista y el FDLS asistirán a reunión convocada.
3.Respecto al comité de participación ciudadana en el barrio Almendros, se reitera la importancia de llevarlo a cabo, y se programa para el viernes 5 de septiembre.
4.El comité de participación ciudadana del frente San Carlos CIV 11002026 se programará de manera virtual para el lunes 1 de septiembre con el objetivo de mostrar el avance de la obra y detalles de la ejecución, a propósito de la visita del alcalde mayor programada para el viernes 29 de agosto en horas de la mañana.

De manera general se informa que las actividades sociales se están llevando a cabo con normalidad, como lo son las actas de vecindad en la Fontana, las actualizaciones en los PSI, y los recorridos urbanos entre interventoría y contratista.

Avance de la fase de ejecución

	PROGRAMADO			EJECUTADO	
OBRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Ejecución programada ($)	$ 228.598.467,00	$ 1.108.663.595,00	Ejecución ejecutado ($)	$ 154.506.129,00	$ 1.187.470.947,00
Ejecución programado (%)	1,81%	8,80%	Ejecución ejecutado (%)	1,23%	9,43%

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Presupuestos de CIV de fase 3.	**Contratista**	**5 de septiembre de 2025**
2	Mesa de trabajo Definir el material del andén existente del CIV 11002026 (Escobeado o estampado).	**Contratista e interventoría, FDLS**	**Próxima semana**
3	Presentación documento de inclusión y exclusión	**Contratista e interventoría**	**Próxima semana**
4	Seguimiento forestal de individuo arbóreo colegio 21 Ángeles (CIV 11002269 y 11002230)	**Contratista e interventoría**	**Próxima semana**
5	Consulta por parte de la alcaldía de la resolución de compensación para el CIV 11002026 (San Carlos)	**Contratista e interventoría, FDLS**	**Próxima semana**
6	Atención al requerimiento de la SDM en Almendros	**Contratista**	**Próxima semana**
7	Tramite de PMT de andenes en san Carlos y Gaitana	**Contratista**	**Próxima semana**
8	Balance financiero del Contrato, inclusión de los CIVS de Portales Norte 11001671, Turingia 11002207, 11003244 GILMAR.	**Contratista e interventoría**	**Próxima semana**
9	Reunión en Lombardea, con los comerciantes	**Contratista e interventoría, FDLS**	**Próxima semana**
10	Comité de participación Almendros	**Contratista e interventoría, FDLS**	**5 de septiembre de 2025**
11	Reprogramación Almendros	**Contratista**	**Próxima semana**

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Anexo 8 Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
Civ 11002026
1 al 31 de Agosto 2025



FOTO 1. Retiro sadinel A10 sobrante CIV 11002026



FOTO 2. Se realiza reunión con topografía CIV 11002026



FOTO 3. Desmonte de sardinel A 10 del costado derecho CIV 11002026



FOTO 4. Desmonte de sardinel A 10 del costado derecho CIV 11002026



FOTO 5. Orden y aseo CIV 11002026



FOTO 6. Nivelación de subrasante para instalación de sardinel A10 CIV 11002026



FOTO 7. Instalación de sardinel A10 costado derecho CIV 11002026



FOTO 8. Chequeo de espesores de base CIV 11002026



FOTO 9. Toma de densidades ensayos DWF CIV 11002026



FOTO 10. Compactado la base esquina 143a CIV 11002026



FOTO 11. Verificación de levantamiento topográfico CIV 11002026



FOTO 12. Afinado de sardinel A10 CIV 11002026



FOTO 13. Instalación de formaleta metálica para fundida de concreto MR CIV 11002026



FOTO 14. Instalación de formaleta metálica para fundida de concreto MR



FOTO 15. Prueba de Slump para fluidez del concreto CIV 11002026



FOTO 16. Prueba de Slump para fluidez del concreto CIV 11002026



FOTO 17. Prueba de Slump para fluidez del concreto CIV 11002026



FOTO 18. Vaciado de concreto MR CIV 11002026



FOTO 19. Toma de muestras vigas de concreto CIV 11002026



FOTO 20. Extendido de concreto de K0+007 a K0+020 costado izquierdo CIV 11002026



FOTO 21. Vaciado de concreto MR CIV 11002026



FOTO 22. Aplicación de anti-sol sobre losa de concreto MR



FOTO 23. Afinado y flotado del concreto



FOTO 24. Vibrado de concreto MR CIV 11002026



FOTO 25. Texturizado de concreto CIV 11002026



FOTO 26. Instalación de anclajes en concreto CIV 11002026



FOTO 27. Afinado de pozo pluvial K0+110 CIV 11002026

		
FOTO 28. Vaciado de concreto MR Civ 11002026	**FOTO 29. Muestras tipo viguetas concreto MR CIV 11002026**	**FOTO 30. Extendido de concreto MR segunda franja costado izquierdo CIV 11002026**
		
FOTO 31. Afinado segunda franja de losas costado occidental concreto MR CIV 11002026	**FOTO 32. Texturizado segunda franja de losas costado occidental concreto MR CIV 11002026**	**FOTO 33. Extendido segunda franja de losas costado occidental concreto MR CIV 11002026**

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
CIV 11001010
1 al 31 de Agosto 2025


		
FOTO 1. Limpieza de tubería pluvial	**FOTO 2. Inspección de tubería con CCTV**	**FOTO 3. Carro tanque de agua para limipeza**
		
FOTO 4. Medición de altura promedio de bajo rueda	**FOTO 5. Medición de altura promedio de bajo rueda**	**FOTO 6. Excavación mecánica**
		
FOTO 7. Excavación mecánica	**FOTO 8. Excavación mecánica**	**FOTO 9. Excavación mecánica**
		
FOTO 10. Reunión con la EAAB por posible intervención de redes		

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO Civ 11000989 1 al 31 de Agosto 2025		
		
FOTO 1. Equipo Vactor para limpiar la red	FOTO 2. Llega la maquinaria al frente de obra	FOTO 3. Equipo Vactor para limpiar la red
		
FOTO 4. Equipo Vactor para limpiar la red con carro tanque de 13 m3	FOTO 5. Equipo Vactor para limpiar la red inicia actividades	FOTO 6. Equipo Vactor para limpiar la red
		
FOTO 7. Demolición de losa evidencia socavación en pozo pluvial de la esquina norte	FOTO 8. Equipo Vactor para limpiar la red	FOTO 9. Equipo inspección de redes CCTV
		
FOTO 10 : Equipo Vactor para limpiar la red finaliza limpieza he inspección de redes y pozos	FOTO 11: Inicia Excavación mecánica y cargue de volquetas	FOTO 12: Excavación mecánica y cargue de volquetas
		
FOTO 13 : Excavación mecánica y cargue de volquetas	FOTO 14: Excavación mecánica y cargue de volquetas	FOTO 15 : Excavación mecánica y cargue de volquetas
		
FOTO 16 : Excavación mecánica y cargue de volquetas	FOTO 17 : Excavación mecánica y cargue de volquetas	

REGISTRO FOTOGRAFICO
COMPONENTE TÉCNICO
Civ 11001040
1 al 31 de Agosto 2025

		
FOTO 1:Se realizan labores de topografia	**FOTO 2:Limpieza de tubería desde pozo con equipo Vactor**	**FOTO 3: Inspección con cámara CCTV**
		
FOTO 4:Inspección con cámara CCTV	**FOTO 5 :Inspección con cámara CCTV se observo infiltración en tubería pluvial**	**FOTO 6 : Cargue de excavación tipo losa**
		
FOTO 7 : Cargue de excavación tipo losa	**FOTO 8 : Cargue de excavación**	**FOTO 9: Cargue de excavación tipo losa**
		
FOTO 10: Reparación de maguera de gas por parte de Vanti	**FOTO 11: Cargue de excavación tipo losa**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
Civ 11001062
1 al 31 de Agosto 2025

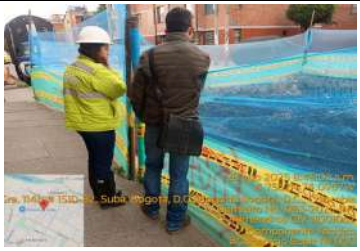		
FOTO 1 : Medición de ancho promedio de bajo rueda	**FOTO 2 : Reunion con personal de Vanty para identificacion de redes de gas natural**	**FOTO 3: Inicia Excavación mecánica**
		
FOTO 4: Inicia Excavacion mecanica y salida de volquetas	**FOTO 5: Cargue de losa de concreto**	**FOTO 6: Continua Excavacion mecanica y cargue de volquetas**
		
FOTO 7: Excavacion mecanica	**FOTO 8: Se realiza visita con el especialista en geotecnia**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
Civ 11000912
1 al 31 de Agosto 2025



FOTO 1 :Se inicia actividades de inspección de red con CCTV (Cámara de circuito cerrado de televisión)



FOTO 2 : Se evidencia infiltraciones realizando inspección con CCTV



FOTO 3 :Se evidencia infiltraciones realizando inspección con CCTV



FOTO 4 : Excavación mecánica y cargue de volquetas



FOTO 5: Excavación mecánica y cargue de volquetas



FOTO 6 : Demolición mecánica de losa



FOTO 7 : Excavación mecánica y cargue de volquetas



FOTO 8 :Excavación mecánica y cargue de volquetas



FOTO 9 : xcavación mecánica y cargue de volquetas

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
CIV 11000875
1 al 31 de Agosto 2025

		
FOTO 1 : Demolición de losa de concreto	**FOTO 2 : Demolición de losa de concreto**	**FOTO 3: Demolición de losa de concreto**
		
FOTO 4 : Demolición de tapa de pozo para limpieza red pluvial	**FOTO 5: Equipo vactor para limpieza de red**	**FOTO 6: Equipo vactor para limpieza de red**
		
FOTO 7: Equipo vactor para limpieza de red	**FOTO 8:Reunión con movilidad para recomendaciones sobre el PMT**	**FOTO 9: Equipo vactor para limpieza de red tanqueo con carro tanque 13 m3**
		
FOTO 10: Equipo de CCTV para inspección de red	**FOTO 11: Equipo de cctv para inspeccion de red**	**FOTO 12: Equipo de cctv para inspeccion de red**
		
FOTO 13: Excavación mecánica	**FOTO 14:llegada de tuberia 24"novafort**	**FOTO 15:Descargue de tubería mecánicamente**

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
1 al 31 deAgosto 2025
GAITANA CIV 11004595



FOTO 1. Instalación de sardinel A10 costado izquierdo desde K0+040,50 a K0+046



FOTO 2. Instalación de sardinel A10 costado izquierdo desde K0+002,50 a K0+025, K0+028 a K0+032 y K0+034 a K0+037



FOTO 3. Revisión de bordillo



FOTO 4. Instalación de sardinel A10 costado izquierdo desde K0+049 a K0+052,50, K0+055 a K0+058



FOTO 5. Instalación de sardinel A10 costado izquierdo desde K0+061 a K0+073



FOTO 6. Instalación de sardinel A10 costado derecho desde K0+016,50 a K0+019,50, K0+23 a K0+028 y K0+034 a K0+037



FOTO 7. Instalación de sardinel A10 costado derecho desde K0+40 a K0+043



FOTO 8. Instalación de placa fondo y construcción en mamposteria de poco pluvial K0+030



FOTO 9. Instalación de bajo rampa costado izquierdo con su respectiva cama de arena con cemento K0+061 a K0+058, K0+055 a K0+052,50, K0+049 a K046 y K040,50 a K0+037



FOTO 10. Revisión topografia



FOTO 11. Instlación de bajo rampa costado izquierdo con su tespectiva cama de arena K0+034 a K0+032, k0+028 a K0+025. Instlación de bajo rampa costado derecho con su tespectiva cama de arena K0+061 a K0+059, K0+055 a K0+052,50.



FOTO 12. Instalación de bajo rampa costado izquierdo con su respectiva cama de arena con cemento K0+046,50 a K0+043, K0+040 a K0+0378, K0+023 a K0+019,50 y K0+016,50 a K0+014,50



FOTO 13. Fundida de hombros para bajo rampa costado derecho y costado izquierdo



FOTO 14. Afinado de hombros para bajo rampas costado derecho y costado izquierdo



FOTO 15. Afinado de hombros para bajo rampas costado derecho y costado izquierdo



FOTO 16. Afinado de hombros para bajo rampas costado derecho y costado izquierdo



FOTO 17. Instalacion de sendero peatonal para propuesta de PMT para andenes



FOTO 18. Revisión general de sardinel A10, bajo rampas y hombros.



FOTO 19. Instalación de cargue de pozo pluvial K0+030



FOTO 20. Llega material AR SBG38



FOTO 21. Mezcla de AR SBG38 con cemento y aditivo liquido



FOTO 22. Instalación de base AR SBG8



FOTO 23. Compactación de base AR SBG38



FOTO 24. Instalación de dado de empalme red sanitaria 8"



FOTO 25. Instalación de base AR SBG8



FOTO 26. Compactación de base AR SBG38



FOTO 27. Llega material AR SBG38



FOTO 28. Mezcla AR SBG38 con cemento y aditivo liquido



FOTO 29. Mezcla AR SBG38 con cemento y aditivo liquido



FOTO 30. Instalación de base AR SBG8



FOTO 31. Compactación de base AR SBG38



FOTO 32. Demolición de cono de reducción de pozo sanitario con una altura de 55cm K0+063,50



FOTO 33. Construcción en mamposteria de pozo sanitario con una altura de 55cm K0+063,50

		
FOTO 34. Instalación de geotextil, material AR SBG50 capa de 5cm y geocelda	**FOTO 35. Llenado dde geocelda con material AR SBG50 capa de 20cm**	**FOTO 36. Instalacion de base AR SBG38**

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
1 al 31 deAgosto 2025
SABANA DE TIBABUYES 11002945



FOTO 1. Excavación mecanica de subrasante



FOTO 2 . Excavación manual



FOTO 3. Instalación de geotextil y material AR SBG50 capa de 11cm costado derecho



FOTO 4. Instalación de geocelda y material AR SBG50 capa de 25cm costado derecho



FOTO 5. Excavación mecanica de subrasante



FOTO 6. Chequeo de escavación subrasante



FOTO 7. Compatación de subrasante



FOTO 8. Instalación de geotextil costado derecho



FOTO 9. Instalación de material AR SBG50 capa de 11 cm costado derecho



FOTO 10. Instalación de geocelda costado derecho



FOTO 11. Llenado con material AR SBG50 capa de 36cm costado derecho



FOTO 12. Llenado con material AR SBG50 capa de 36cm costado derecho



FOTO 13. Instalación de geotextil costado izquierdo



FOTO 14. Llenado con AR SBG50 capa de 11 cm costado izquierdo



FOTO 15. Revisión topografia



FOTO 16. Excavación y demolición mecanica de red sanitaria existente 8"



FOTO 17. Demolición mecanica de carcamo exitente de red sanitaria



FOTO 18. Excavación y cargue de red sanitaria existente



FOTO 19. Excavación mecanica red sanitaria



FOTO 20. Cama con material triturado para instalación de red sanitaria 8"



FOTO 21. Cama con material triturado para instalación de red sanitaria 8"



FOTO 22. Instalacion de red sanitaria 8"



FOTO 23. Instalación de 4 Yes 8" ubicadas K0+007,50, K0+012,20, K0+017,8 y K0+024



FOTO 24. Llenado con triturado a medio tubo red sanitaria 8"



FOTO 25. Llega viaje de material triturado



FOTO 26. Chequeo topografia red sanitaria 8"



FOTO 27. Excavación y demolición mecanica de red sanitaria 8" existente



FOTO 28. Excavación y cargue de red sanitaria existente



FOTO 29. Demolición de carcamo existente (sin presencia de red de cableado)



FOTO 30. Construcción en mamposteria de 4 cajas de empalme (0,40x0,40 interno) ubicadas K0+006,30, K0+011,20, K0+017 y K0+017



FOTO 31. Instalación de red sanitaria 8" y domiciliarias 6"



FOTO 32. Demolición manual de placa fondo de pozo sanitario existente



FOTO 33. Instalacion de red sanitaria 8" y domiciliarias 6"



FOTO 34. Llenado de B200 para red sanitaria 8"



FOTO 35. Llega viaje de b200



FOTO 36. Instalación de red sanitaria 8". Instalación de 4 Yes 8" ubicadas K0+030, K0+036, K0+041 y K0+048



FOTO 37. Chequeo de niveles red ssanitaria 8"



FOTO 38. Construcción en mamposteria de 4 cajas de empalme (0,40x0,40 interno) ubicadas K0+029, k0+035, k0+040 y K0+048



FOTO 39. Excavación manual de domiciliarias



FOTO 40. Llega viaje de triturado



FOTO 41. Compactación de B200 para red sanitaria 8"



FOTO 42. Construcción en mamposteria de 2 cajas de empalme (0,40x0,40 interno) ubicadas K0+055 y K0+060,50



FOTO 43. Fundida de tapas con armado de 1/2" para cajas de empalme



FOTO 44. Compactación de subrasante



FOTO 45. Excavación manual de subrasante



FOTO 46. Compactación de B200 para red sanitaria 8"



FOTO 47. Instalación de geotextil costado izquierdo



FOTO 48. Impermeabilización de cajas de empalme domiciliarias



FOTO 49. Llenado con material AR SBG50 capa de 11cm costado izquierdo



FOTO 50. Instlacion de geocelda costado izquierdo



FOTO 51. Llenado con material AR SBG50 capa de 25cm costado izquierdo



FOTO 52. Instalación de geotextil costado izquierdo



FOTO 53. Llenado con material AR SBG50 capa 11cm costado izquierdo



FOTO 54. Instalación de geocelda costado izquierdo



FOTO 55. Demolición manual de carcamo y tuberia sumidero existente



FOTO 56. Llenado con material AR SBG50 capa de 25cm costado izquierdo



FOTO 57. Excavación manual de subrasante



FOTO 58. Instlación de geotextil



FOTO 59. Limpieza de red sanitaria con equipo VACTOR



FOTO 60. Demolición manual de pozo pluvial K0+039

		
FOTO 61. Demolición manual de pozo pluvial K0+039	**FOTO 62. Demolición manual de placa fondo pozo pluvial K0+039**	**FOTO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
1 al 31 deAgosto 2025
SABANA DE TIBABUYES 11002757



FOTO 1. Instalación de geotextil y material AR SBG50 capa de 11cm costado derecho



FOTO 2. Instalación de geocelda costado derecho



FOTO 3. Instalación de geocelda costado derecho



FOTO 4. Llega material AR SBG50



FOTO 5. Excavación y demolición de red sanitaria 8" existentes



FOTO 6. Excavación manual domiciliarias



FOTO 7. Excavación manual domiciliarias



FOTO 8. Instalación de tuberia sanitaria 8"



FOTO 9. Llega material AR SBG50



FOTO 10. Instalación de 4 domiciliarias 6" ubicadas K0+069, K0+074, K0+080, K0+085. Instalación de 4 Yes" 8" ubicadas K0+067, K0+072,20, K0+078, K0+083



FOTO 11. Construcción en mamposteria de 4 cajas de empalme (0,40x0,40 interno) ubicadas K0+069, K0+074, K0+080, K0+085.



FOTO 12. Instalación de geotextil



FOTO 13. Llenado con material AR SBG50 capa de 11 cm



FOTO 14, Capacitación con vanti



FOTO 15. Llega material AR SBG50



FOTO 16. Instalación de geocelda



FOTO 17. Instalación de geocelda



FOTO 18. Llenado con material AR SBG50 capa de 25 cm



FOTO 19. Instalación de geotextil costado izquierdo



FOTO 20. Excavación de subrasante



FOTO 21. Demolición de sumidero existente



FOTO 22. Excavación manual red sanitaria 8"



FOTO 23. Impermeabilización de cajas de empalme domiciliarias



FOTO 24. Excavación de subrasante



FOTO 25. Excavación y cargue de subrasante



FOTO 26. Instalacion de geotextil y llenado con material AR SBG50 capa 11cm



FOTO 27. Llenado con B200 para tuberia sanitaria y pluvial (sumideros)



FOTO 28. Llenado con B200 (fallo)



FOTO 29. Compactación B200 (fallo)



FOTO 30. Limpieza red sanitaria con equipo VACTOR

		
FOTO 31. Demolición mecanica de cargue pozo pluvial	**FOTO 32. Demolición manual de cono de reducción pozo pluvial con una altura de 45cm**	**FOTO 33. Instalación de geocelda y llenado con material AR SBG50 capa de 25cm costado izquierdo**
		
FOTO 34. Demolición manual de pozo inicial sanitario K0+085	**FOTO 35. Llenado con triturado tuberia red pluvial (sumideros) capa 15cm**	**FOTO 36. Demolición manual de placa fondo pozo inicial sanitario K0+085**
		
FOTO 37. Instalacion de geotextil costado derecho	**FOTO 38. Llenado con material AR SBG50 capa de 11 cm costado derecho**	**FOTO 39. Instalación de geocelda costado derecho**
		
FOTO 40. Llenado con material AR SBG50 capa 25cm costado derecho	**FOTO 41. Excavación manual para instalación de placafondo pozo inical sanitario K0+085**	**FOTO 42. Instalacion de placa fondo con su respectiv cama de triturado capa de 12 cm para pozo inicial sanitario K0+085**
		
FOTO 43. Construcción en mamposteria de pozo inicial sanitario K0+085		

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
1 al 31 deAgosto 2025
GAITANA CIV 11004595



FOTO 1. Instalación de sardinel A10 costado izquierdo desde K0+040,50 a K0+046



FOTO 2. Instalación de sardinel A10 costado izquierdo desde K0+002,50 a K0+025, K0+028 a K0+032 y K0+034 a K0+037



FOTO 3. Revisión de bordillo



FOTO 4. Instalación de sardinel A10 costado izquierdo desde K0+049 a K0+052,50, K0+055 a K0+058



FOTO 5. Instalación de sardinel A10 costado izquierdo desde K0+061 a K0+073



FOTO 6. Instalación de sardinel A10 costado derecho desde K0+016,50 a K0+019,50, K0+23 a K0+028 y K0+034 a K0+037



FOTO 7. Instalación de sardinel A10 costado derecho desde K0+40 a K0+043



FOTO 8. Instalación de placa fondo y construcción en mamposteria de poco pluvial K0+030



FOTO 9. Instalación de bajo rampa costado izquierdo con su respectiva cama de arena con cemento K0+061 a K0+058, K0+055 a K0+052,50, K0+049 a K046 y K040,50 a K0+037



FOTO 10. Revisión topografia



FOTO 11. Instlación de bajo rampa costado izquierdo con su tespectiva cama de arena K0+034 a K0+032, k0+028 a K0+025. Instlación de bajo rampa costado derecho con su tespectiva cama de arena K0+061 a K0+059, K0+055 a K0+052,50.



FOTO 12. Instalación de bajo rampa costado izquierdo con su respectiva cama de arena con cemento K0+046,50 a K0+043, K0+040 a K0+0378, K0+023 a K0+019,50 y K0+016,50 a K0+014,50



FOTO 13. Fundida de hombros para bajo rampa costado derecho y costado izquierdo



FOTO 14. Afinado de hombros para bajo rampas costado derecho y costado izquierdo



FOTO 15. Afinado de hombros para bajo rampas costado derecho y costado izquierdo



FOTO 16. Afinado de hombros para bajo rampas costado derecho y costado izquierdo



FOTO 17. Instalacion de sendero peatonal para propuesta de PMT para andenes



FOTO 18. Revisión general de sardinel A10, bajo rampas y hombros.



FOTO 19. Instalación de cargue de pozo pluvial K0+030



FOTO 20. Llega material AR SBG38



FOTO 21. Mezcla de AR SBG38 con cemento y aditivo liquido



FOTO 22. Instalación de base AR SBG8



FOTO 23. Compactación de base AR SBG38



FOTO 24. Instalación de dado de empalme red sanitaria 8"



FOTO 25. Instalación de base AR SBG8



FOTO 26. Compactación de base AR SBG38



FOTO 27. Llega material AR SBG38



FOTO 28. Mezcla AR SBG38 con cemento y aditivo liquido



FOTO 29. Mezcla AR SBG38 con cemento y aditivo liquido



FOTO 30. Instalación de base AR SBG8



FOTO 31. Compactación de base AR SBG38



FOTO 32. Demolición de cono de reducción de pozo sanitario con una altura de 55cm K0+063,50



FOTO 33. Construcción en mamposteria de pozo sanitario con una altura de 55cm K0+063,50

		
FOTO 34. Instalación de geotextil, material AR SBG50 capa de 5cm y geocelda	**FOTO 35. Llenado dde geocelda con material AR SBG50 capa de 20cm**	**FOTO 36. Instalacion de base AR SBG38**

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
1 al 31 deAgosto 2025
SABANA DE TIBABUYES 11002945



FOTO 1. Excavación mecanica de subrasante



FOTO 2 . Excavación manual



FOTO 3. Instalación de geotextil y material AR SBG50 capa de 11cm costado derecho



FOTO 4. Instalación de geocelda y material AR SBG50 capa de 25cm costado derecho



FOTO 5. Excavación mecanica de subrasante



FOTO 6. Chequeo de escavación subrasante



FOTO 7. Compatación de subrasante



FOTO 8. Instalación de geotextil costado derecho



FOTO 9. Instalación de material AR SBG50 capa de 11 cm costado derecho



FOTO 10. Instalación de geocelda costado derecho



FOTO 11. Llenado con material AR SBG50 capa de 36cm costado derecho



FOTO 12. Llenado con material AR SBG50 capa de 36cm costado derecho



FOTO 13. Instalación de geotextil costado izquierdo



FOTO 14. Llenado con AR SBG50 capa de 11 cm costado izquierdo



FOTO 15. Revisión topografia



FOTO 16. Excavación y demolición mecanica de red sanitaria existente 8"



FOTO 17. Demolición mecanica de carcamo exitente de red sanitaria



FOTO 18. Excavación y cargue de red sanitaria existente



FOTO 19. Excavación mecanica red sanitaria



FOTO 20. Cama con material triturado para instalación de red sanitaria 8"



FOTO 21. Cama con material triturado para instalación de red sanitaria 8"



FOTO 22. Instalacion de red sanitaria 8"



FOTO 23. Instalación de 4 Yes 8" ubicadas K0+007,50, K0+012,20, K0+017,8 y K0+024



FOTO 24. Llenado con triturado a medio tubo red sanitaria 8"



FOTO 25. Llega viaje de material triturado



FOTO 26. Chequeo topografia red sanitaria 8"



FOTO 27. Excavación y demolición mecanica de red sanitaria 8" existente



FOTO 28. Excavación y cargue de red sanitaria existente



FOTO 29. Demolición de carcamo existente (sin presencia de red de cableado)



FOTO 30. Construcción en mamposteria de 4 cajas de empalme (0,40x0,40 interno) ubicadas K0+006,30, K0+011,20, K0+017 y K0+017



FOTO 31. Instalación de red sanitaria 8" y domiciliarias 6"



FOTO 32. Demolición manual de placa fondo de pozo sanitario existente



FOTO 33. Instalacion de red sanitaria 8" y domiciliarias 6"



FOTO 34. Llenado de B200 para red sanitaria 8"



FOTO 35. Llega viaje de b200



FOTO 36. Instalación de red sanitaria 8". Instalación de 4 Yes 8" ubicadas K0+030, K0+036, K0+041 y K0+048



FOTO 37. Chequeo de niveles red ssanitaria 8"



FOTO 38. Construcción en mamposteria de 4 cajas de empalme (0,40x0,40 interno) ubicadas K0+029, k0+035, k0+040 y K0+048



FOTO 39. Excavación manual de domiciliarias



FOTO 40. Llega viaje de triturado



FOTO 41. Compactación de B200 para red sanitaria 8"



FOTO 42. Construcción en mamposteria de 2 cajas de empalme (0,40x0,40 interno) ubicadas K0+055 y K0+060,50



FOTO 43. Fundida de tapas con armado de 1/2" para cajas de empalme



FOTO 44. Compactación de subrasante



FOTO 45. Excavación manual de subrasante



FOTO 46. Compactación de B200 para red sanitaria 8"



FOTO 47. Instalación de geotextil costado izquierdo



FOTO 48. Impermeabilización de cajas de empalme domiciliarias



FOTO 49. Llenado con material AR SBG50 capa de 11cm costado izquierdo



FOTO 50. Instlacion de geocelda costado izquierdo



FOTO 51. Llenado con material AR SBG50 capa de 25cm costado izquierdo



FOTO 52. Instalación de geotextil costado izquierdo



FOTO 53. Llenado con material AR SBG50 capa 11cm costado izquierdo



FOTO 54. Instalación de geocelda costado izquierdo



FOTO 55. Demolición manual de carcamo y tuberia sumidero existente



FOTO 56. Llenado con material AR SBG50 capa de 25cm costado izquierdo



FOTO 57. Excavación manual de subrasante



FOTO 58. Instlación de geotextil



FOTO 59. Limpieza de red sanitaria con equipo VACTOR



FOTO 60. Demolición manual de pozo pluvial K0+039

		
FOTO 61. Demolición manual de pozo pluvial K0+039	**FOTO 62. Demolición manual de placa fondo pozo pluvial K0+039**	**FOTO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPONENTE TÉCNICO
1 al 31 deAgosto 2025
SABANA DE TIBABUYES 11002757



FOTO 1. Instalación de geotextil y material AR SBG50 capa de 11cm costado derecho



FOTO 2. Instalación de geocelda costado derecho



FOTO 3. Instalación de geocelda costado derecho



FOTO 4. Llega material AR SBG50



FOTO 5. Excavación y demolición de red sanitaria 8" existentes



FOTO 6. Excavación manual domiciliarias



FOTO 7. Excavación manual domiciliarias



FOTO 8. Instalación de tuberia sanitaria 8"



FOTO 9. Llega material AR SBG50



FOTO 10. Instalación de 4 domiciliarias 6" ubicadas K0+069, K0+074, K0+080, K0+085. Instalación de 4 Yes" 8" ubicadas K0+067, K0+072,20, K0+078, K0+083



FOTO 11. Construcción en mamposteria de 4 cajas de empalme (0,40x0,40 interno) ubicadas K0+069, K0+074, K0+080, K0+085.



FOTO 12. Instalación de geotextil



FOTO 13. Llenado con material AR SBG50 capa de 11 cm



FOTO 14, Capacitación con vanti



FOTO 15. Llega material AR SBG50



FOTO 16. Instalación de geocelda



FOTO 17. Instalación de geocelda



FOTO 18. Llenado con material AR SBG50 capa de 25 cm



FOTO 19. Instalación de geotextil costado izquierdo



FOTO 20. Excavación de subrasante



FOTO 21. Demolición de sumidero existente



FOTO 22. Excavación manual red sanitaria 8"



FOTO 23. Impermeabilización de cajas de empalme domiciliarias



FOTO 24. Excavación de subrasante



FOTO 25. Excavación y cargue de subrasante



FOTO 26. Instalacion de geotextil y llenado con material AR SBG50 capa 11cm



FOTO 27. Llenado con B200 para tuberia sanitaria y pluvial (sumideros)



FOTO 28. Llenado con B200 (fallo)



FOTO 29. Compactación B200 (fallo)



FOTO 30. Limpieza red sanitaria con equipo VACTOR

		
FOTO 31. Demolición mecanica de cargue pozo pluvial	**FOTO 32. Demolición manual de cono de reducción pozo pluvial con una altura de 45cm**	**FOTO 33. Instalación de geocelda y llenado con material AR SBG50 capa de 25cm costado izquierdo**
		
FOTO 34. Demolición manual de pozo inicial sanitario K0+085	**FOTO 35. Llenado con triturado tuberia red pluvial (sumideros) capa 15cm**	**FOTO 36. Demolición manual de placa fondo pozo inicial sanitario K0+085**
		
FOTO 37. Instalacion de geotextil costado derecho	**FOTO 38. Llenado con material AR SBG50 capa de 11 cm costado derecho**	**FOTO 39. Instalación de geocelda costado derecho**
		
FOTO 40. Llenado con material AR SBG50 capa 25cm costado derecho	**FOTO 41. Excavación manual para instalación de placafondo pozo inical sanitario K0+085**	**FOTO 42. Instalacion de placa fondo con su respectiv cama de triturado capa de 12 cm para pozo inicial sanitario K0+085**
		
FOTO 43. Construcción en mamposteria de pozo inicial sanitario K0+085		

Anexo 9. Informe de topografía

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

ALCALDIA LOCAL DE SUBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°. 083 DE 2025

INFORME TÉCNICO DE TOPOGRAFIA INTERVENTORÍA No. 05
VERSIÓN 1
ETAPA EJECUCION

1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONSORCIO SUBA TH003
BOGOTÁ, D.C., AGOSTO 2025


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
LOCALIDAD DE SUBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 083-2025-INT (119251), "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TECNICO"

INFORME TÉCNICO DE TOPOGRAFÍA INTERVENTORÍA TH003
VERSIÓN 01
FASE EJECUCION

1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONSORCIO SUBA TH003 BOGOTÁ 2024

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
JOHN MARIO MORENO	**LAURA ORTIZ M**	**RICARDO DUARTE**
Cargo: **TOPOGRAFO**	**Cargo:** **RESIDENTE TECNICO**	**Cargo:** **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 

BOGOTÁ, D.C., agosto de 2025

TABLA DE CONTENIDO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 0
1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN PROYECTO 4
2.1 Localidad de SUBA 4
3. INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 5

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe topográfico describe las actividades realizadas en el periodo comprendido del 01 de junio de 2025 al 30 de junio 2025, en el marco del proyecto CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 083-2025-INT (119251), "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TECNICO"

2. LOCALIZACIÓN PROYECTO

2.1 Localidad de SUBA

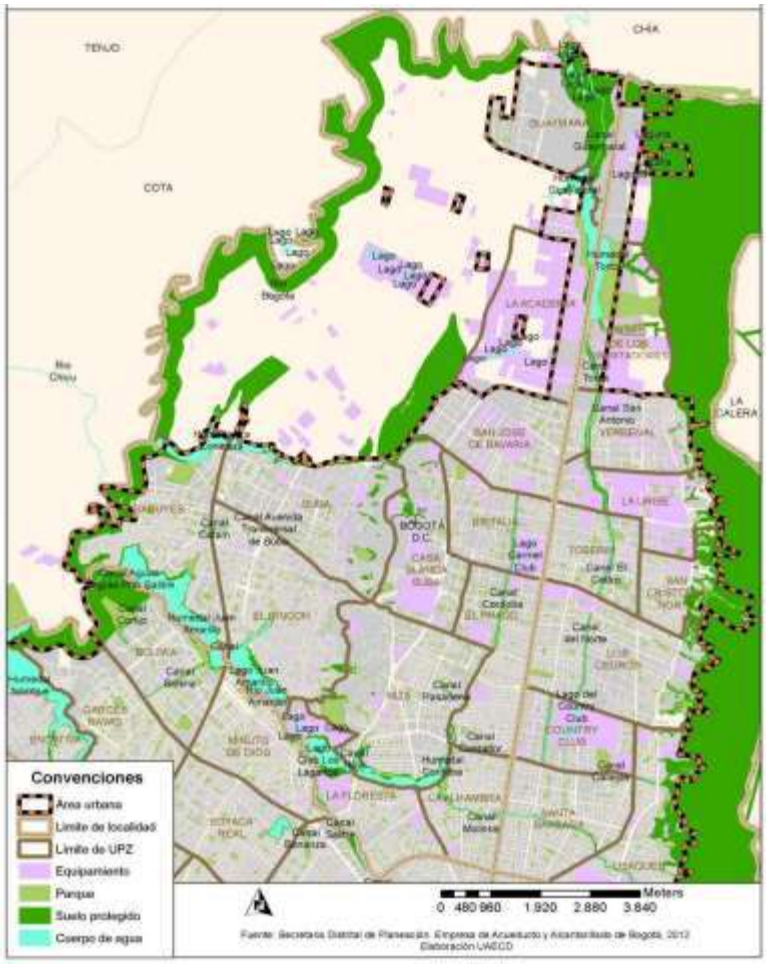


Figura 1. Localización general del proyecto localidad de SUBA

3. INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA

A continuación, se describen las metodologías, empleadas en cada uno de los procedimientos y los resultados de los mismos, ejercicios topográficos empleados durante el periodo comprendido el cual hace referencia este informe.

Labores en terreno

- Instalación Redes húmedas
- Nivelación y Compactación Sub Rasante
- Conformación Sub Base y Base
- Capa de rodadura Pavimento en Concreto o Asfalto
- Intervención de Espacio Publico

Labores posteriores de oficina

- Digitalización y cálculo de carteras topográficas (secciones)
- Calculo y digitalización de Nivelaciones
- Calculo de cantidades de obra (conciliación)
- Descarga de datos Equipos, procesamiento de carteras y digitalización
- Subida de nube de puntos, Elaboración de Planos

1. CIV 11002026 San Carlos

1.1 Instalación de redes húmedas

Labor que requiere control topográfico para mantener las pendientes y longitudes de diseño, datos para récord de obra



1.2 Nivelación y compactación de Sub Rasante



Una vez realizada la excavación mecánica se procede a compactar la Subrasante, antes de la instalación del geotextil, posterior a esto se realiza nuevamente la **Nivelación** de precisión y esas cotas se registran como céreo de subrasante

1.3 Instalación Sardinel A-10



1.4 Conformación de Sub base y Base (Estructura)



Una vez nivelada y compactada la estructura se procede a Nivelar cada capa Sub base y base y esta se compara con la cota de diseño, se registran los datos para cálculo de cantidades y récord de obra

1.5 Capa de rodadura pavimento en concreto o Asfalto

Una vez nivelada la base se procede a nivelar la formaleta es importante este proceso y anotar que la precisión es del orden del milímetro pues esto se reflejará en el terminado de pavimento



2. CIV 11004595 Gaitana

2.1 Instalación de redes húmedas



Nivelacion de excavacion, cama y atraque de tuberias, verificacion de pendientes y longitudes de diseño

2.2 Nivelación y Compactación Sub Rasante



Una vez compactada la sub rasante se realiza la nivelación u verificación de niveles con el diseño

2.3 Conformación de Subbase



2.4 Instalación sardinel A-10 Bajo rampas y empalmes



2.5 Conformación de Sub base y Base (Estructura)



3. CIV 11002757 Sabana de Tibabuyes

3.1 Excavación Mecánica




3.2 Nivelación y compactación de Sub Rasante



Une vez realizada la excavación mecánica se compacta y recibe por parte de la topografía de Interventoría, Nivelación geométrica de precisión

3.3 Instalación de redes húmedas

El componte técnico topografía realiza el control de excavación teniendo en cuenta la pendiente longitudinal, el ancho depende del balde de la maquina y se realiza el control de la cama u el atraque en triturado también el lleno con b-200 hasta la cota rasante

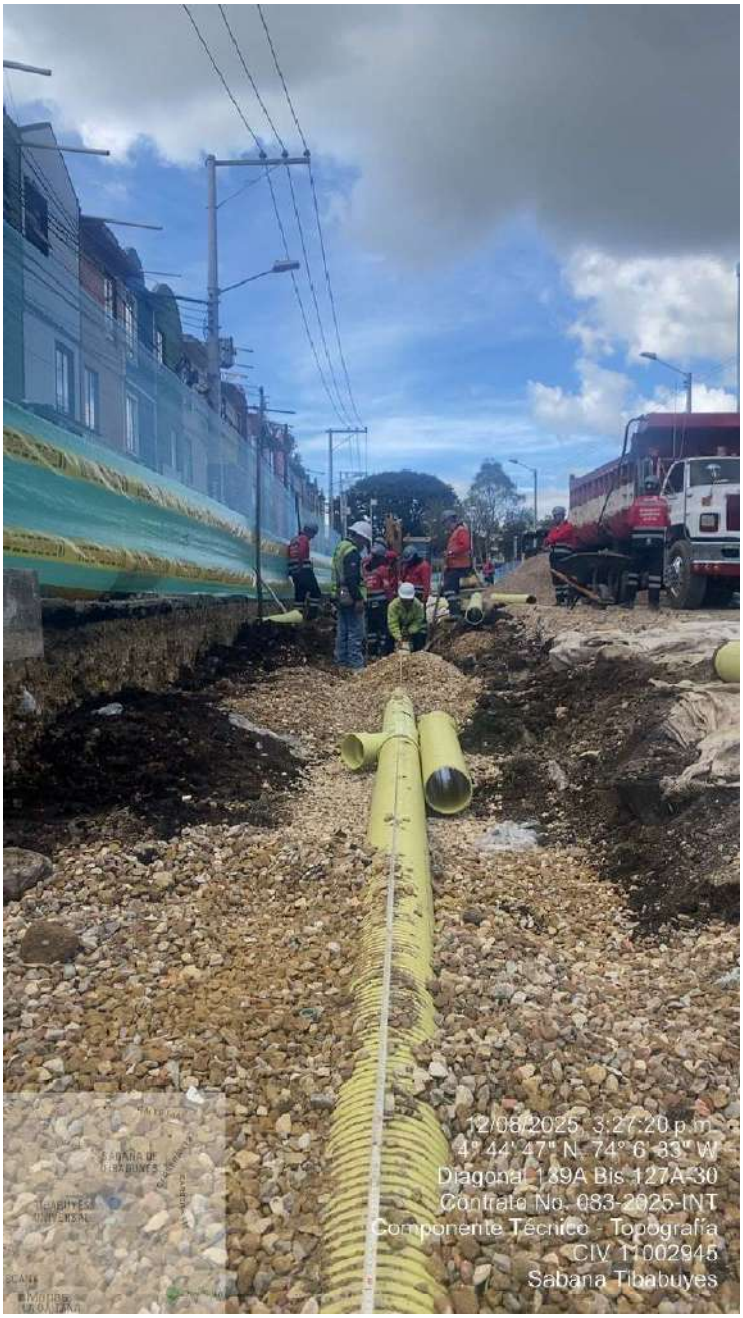
12/08/2025 3:27:20 p.m.
4° 44' 47" N, 74° 6' 33" W
Diagonal 189A Bis 127A-30
Contrato No. 083-2025-INT
Componente Técnico - Topografía
CIV 11002945
Sabana Tibabuyes

3.4 Conformación de Sub base y Base (Estructura)




4. CIV 11001040 11001010 11000875 11000912 11001062 11000989 Almendros

4.1 Demolición de pavimento existente



4.2 Excavación Mecánica Estructura

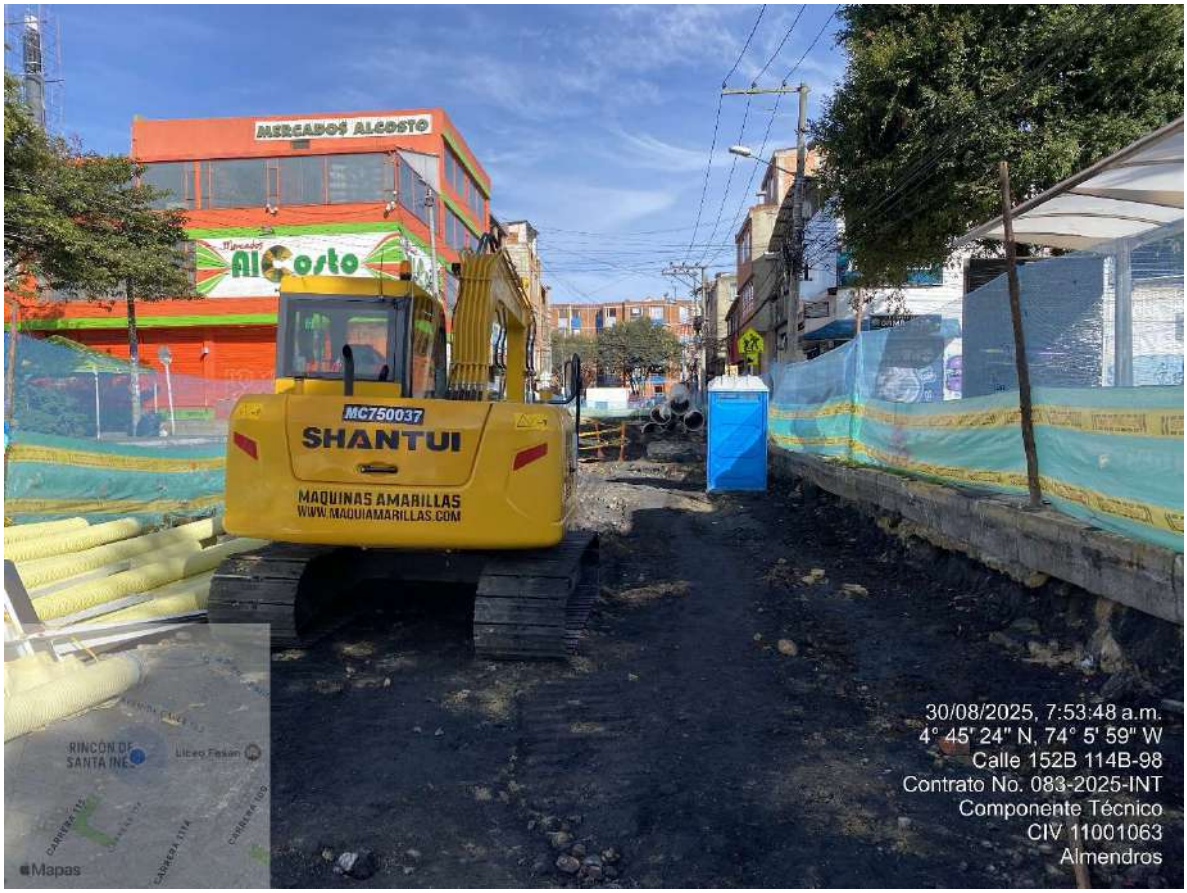

5. Conclusión

Con base en la información capturada en terreno se realiza el control de obra y a su vez es insumo para el calculo de cantidades de obra

Estos datos se procesan de mutuo acuerdo con el área técnica del contratista se realiza el avance mensual de actividades

Anexo 10. Informe del Contratista

Anexo 11. Comunicados de aprobaciones informes de Contratista

CONSORCIO SUBA TH 003

SUBA-083-TH-305
Pág. 1 de 1

Bogotá, 4 de agosto de 2025

Alcaldía Local de Suba
R No. 2025-611-020742-2
2025-08-04 15:22 - Folios: 1 Anexos: 4 C
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: CONSORCIO SUBA TH 003

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Cesar Augusto Salamanca Rojas
Supervisor del Contrato
Cra. 91 #145A-32, Suba
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría N° 083-2025-INT (119251), "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Radicación Informe mensual Contratista No.4 – Componente social – julio 2025

Respetado Sr Salamanca:

Por medio del presente y en nuestra calidad de interventoría, nos permitimos notificar que, INFORME SOCIAL #4 correspondiente al mes de JULIO radicado por el Contratista de obra mediante oficio No. CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-238C, ya fue revisado, validado, verificado y aprobado por parte de la Interventoría, por este motivo se radica adjunto a éste, el documento mencionado en el asunto, en aras de que el contratante tenga disponible el documento en archivo físico

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Anexo: 714 folios y 1 CD

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyectó: Paula J. Ojeda A.
Revisó: Ricardo Duarte
Aprobó: Ricardo Duarte

Powered by CamScanner

CONSORCIO SUBA TH 003

SUBA-083-TH-306
Pág. 1 de 1

Bogotá, 5 de agosto de 2025

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Cesar Augusto Salamanca Rojas
Supervisor del Contrato
Cra. 91 #145A-32, Suba
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría N° 083-2025-INT (119251), "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Radicación Informe mensual Interventoría No.4 – Componente social – julio 2025

Respetado Sr Salamanca:

Por medio del presente oficio el CONSORCIO SUBA TH 003 realiza la entrega del informe #4 del componente social, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2025.

Atentamente,

Alcaldía Local de Suba
R No. 2025-611-020804-2
2025-08-05 09:18 - Folios: 1 Anexos: 105
Destino: Area de Gestion de Desar
Rem/D: CONSORCIO SUBA TH 003
20256110208042

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Anexo: 105 folios y 1 CD

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyectó: Paula J. Ojeda A.
Revisó: Ricardo Duarte
Aprobó: Ricardo Duarte

Powered by CamScanner

Bogotá, 11 de agosto de 2025

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Cesar Augusto Salamanca Rojas
Supervisor del Contrato
Cra. 91 #145A-32, Suba
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría N° 083-2025-INT (119251), "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Radicación Informe mensual No.4 = Componente SST / AMBIENTAL CONTRATISTA – julio 2025

Respetado Sr Salamanca:

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos realizar la entrega del informe SST/ AMBIENTAL del contratista CONSORCIO SUBA VIAL VR, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2025.

Atentamente,

Alcaldía Local de Suba
R No. 2025-611-021206-2
2025-08-11 09:40 - Folios: 1 Anexos: 753
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: CONSORCIO SUBA TH 003
20256110212062

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Anexo: 754 folios y 1 CD

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyectó: Katherine Guañarita Díaz
Revisó: Ricardo Duarte
Aprobó: Ricardo Duarte

Bogotá, 04 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Atn. Farley Andrea Larrarte Barrera
Representante legal
consorciosubavialvr.1009@gmail.com
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra N°1009-2024-LP (119226), "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Respuesta al comunicado CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-238-C/ ENTREGA INFORME #4 DE GESTIÓN SOCIAL (MES DE JULIO DE 2025)

Respetada Ingeniera Larrarte:

Por medio de la presente, el CONSORCIO SUBA TH 003 quien funge en calidad de interventoría al contrato de obra 1009-2024-LP (119226), se permite dar respuesta a su comunicación CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-238-C, allegada mediante correo electrónico el 04 de agosto de 2025 y que tiene por asunto "ENTREGA INFORME #4 DE GESTIÓN SOCIAL (MES DE JUNIO DE 2025)"

Con base en lo requerido de su parte, emitimos aval, a la documentación relacionada a continuación:

- ENTREGA INFORME #4 DE GESTIÓN SOCIAL (MES DE JULIO DE 2025): 714 folios, 20 anexos.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyecto: Paula J. Ojeda A.
Revisó: Edison Ricardo Duarte
Aprobó: Edison Ricardo Duarte

CONSORCIO SUBA TH 003

SUBA-083-TH-313

Bogotá, 7 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Atn. Farley Andrea Larrarte Barrera
Representante legal
consorciosubavialvr.1009@gmail.com
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra N° 1009-2024-LP (119226), "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Respuesta al comunicado CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-245-C/ Aprobación de "Entrega informe #4 Técnico y PMT (Mes de julio de 2025)"

Respetada Sra. Larrarte:

Por medio de la presente, el CONSORCIO SUBA TH 003 quien funge en calidad de Interventoría al contrato de obra 1009-2024-LP (119226), se permite dar respuesta a la comunicación relacionada en el asunto

Con base en lo requerido de su parte, emitimos aval, a la documentación relacionada a continuación:

- INFORME #4 TÉCNICO (MES DE JULIO DE 2025): 212 folios
- INFORME #4 PMT (MES DE Julio DE 2025): 15 folios

No obstante, esta información está sujeta si se requiere una aclaración por parte del FDLS

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Anexo: N.A.

Copia: Apoyo a la supervisión Alejandro Victoria - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión Andrés Acosta - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyecto: Laura Patricia Ortiz Medina.
Revisó: Edison Ricardo Duarte
Aprobó: Edison Ricardo Duarte

CONSORCIO SUBA TH 003

SUBA-083-TH-314
Pág. 1 de 1

Bogotá, 6 de agosto de 2025

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Cesar Augusto Salamanca Rojas
Supervisor del Contrato
Cra. 91 #145A-32, Suba
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría N° 083-2025-INT (119251), "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Radicación Informe mensual Contratista No.4 – Componente técnico y PMT – junio 2025

Respetado Sr Salamanca:

Por medio del presente y en nuestra calidad de interventoría, nos permitimos notificar que, INFORME TÉCNICO y PMT #4 (MES DE JULIO DE 2025) radicado por el Contratista de obra, ya fue revisado, verificado, validado y aprobado por parte de la Interventoría mediante el comunicado SUBA-083-TH-313, por este motivo se radica adjunto a éste, el documento mencionado en el asunto, en aras de que el contratante tenga disponible el documento en archivo físico

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Alcaldía Local de Suba
R No. 2025-611-021054-2
2025-08-08 09:25 - Folios: 1 Anexos: 226
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: CONSORCIO SUBA TH 003
20256110210542

Anexo: 226 folios y 1 CD

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyectó: Laura Patricia Ortiz Medina.
Revisó: Ricardo Duarte
Aprobó: Ricardo Duarte

12. Acta de recibo parcial de Obra

CONSORCIO SUBA TH 003

SUBA-083-TH-337
Pág. 1 de 1

Bogotá, 19 de agosto de 2025

Alcaldía Local de Suba
R No. 2025-611-022032-2
2025-08-19 14:44 - Folios: 1 Anexos: 245
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: CONSORCIO SUBA TH 003
20256110220322

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Cesar Augusto Salamanca Rojas
Supervisor del Contrato
Cra. 91 #145A-32, Suba
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría N° 083-2025-INT (119251), "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Remisión CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-250-C
Aprobación y remisión del acta parcial de Obra No. 2

Respetado Sr Salamanca:

Por medio del presente y en nuestra calidad de interventoria, según la clausula del contrato de Interventoria 10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR numeral 10.2.38. que indica *"...Aprobar el pago al CONTRATISTA exigiendo: a) Secuencia fotográfica (antes y después) del sitio o lugar donde se desarrollaron las actividades ejecutadas en medio impreso y magnético. b) original y copia de la factura para el pago de las Obras. c) Resumen de los pagos mensuales para cada actividad. d) Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar las actividades realizadas mensualmente y por rubro presupuestal, para revisión de las memorias presentadas por el CONTRATISTA. e) Documento escrito con el recibo a satisfacción de las actividades que se van a pagar..."* nos permitimos notificar que, acta parcial de Obra No. 2 radicado por el Contratista de obra, ya fue revisado, verificado, validado y aprobado por parte de la Interventoria, el documento mencionado en el asunto, en aras de que el contratante tenga disponible el documento en archivo fisico.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoria
CONSORCIO SUBA TH 003

245
Anexo: ~~3~~ folios y 1 CD

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyectó: Laura Patricia Ortiz Medina
Revisó: Ricardo Duarte
Aprobó: Ricardo Duarte

ACTA DE CORTE

FECHA			CONSORCIO SUBA VIAL VR	BOGOTÁ
8	8	2025		
DD	MM	AA	NIT. 901484979-1	

CONTRATO N° COP 1009 2024
ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL

RECIBO PARCIAL

CONTRATO N° 1009-2024

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTORIA: CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogota D.C , a los 02 días del mes agosto de 2025 , se reunieron FARLEY ANDREA LARRATE BARRERA Representante Legal del Contratista EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL Representante legal de la Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del cobro parcial de obra y/o modificaciones del mes del 01 JULIO 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025, segun condiciones que se detallan a continuación

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			PRESENTE ACTA 1		ACTA No. 2		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
2	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 40 250,00	23,00	$ 925 750,00	21,71	$ 873 749	44,71	$ 1 799 499,00
3	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES	ML	$ 5 591,00	0,00	$ -	267,20	$ 1 493 915	267,20	$ 1 493 915,00
5	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM) A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	$ 41 256,00	925,12	$ 38 166 813,00	1462,49	$ 60 336 581	2387,61	$ 98 503 394,00
6	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	$ 6 665,00	0,00	$ -	1053,87	$ 7 024 032	1053,87	$ 7 024 032,00
9	3027	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	$ 74 159,00	0,00	$ -	203,50	$ 15 091 357	203,50	$ 15 091 357,00
10	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	$ 74 913,00	0,00	$ -	58,91	$ 4 413 125	58,91	$ 4 413 125,00
11	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 105 968,00	0,00	$ -	8,30	$ 879 534	8,30	$ 879 534,00
12	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 148 498,00	57,00	$ 8 464 386,00	29,25	$ 4 343 567	86,25	$ 12 807 953,00
13	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 263 703,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 358 260,00	0,00	$ -	66,70	$ 23 895 942	66,70	$ 23 895 942,00
68	3436	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 106 383,00	24,37	$ 2 592 589,00	0,00	$ -	24,37	$ 2 592 589,00
82	3738	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60 INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	$ 5 210,00	0,00	$ -	808,24	$ 4 210 932	808,24	$ 4 210 932,00
63	3710	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5 171,00	642,00	$ 3 319 782,00	708,16	$ 3 661 883	1350,16	$ 6 981 665,00
72	3829	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	$ 1 598,00	987,00	$ 1 575 252,00	434,34	$ 693 209	1421,34	$ 2 268 461,00
78	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO, CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y C	ML	$ 2 407,00	35,00	$ 84 245,00	262,50	$ 631 838	297,50	$ 716 083,00
81	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA INCL. SUMIN. INST.)	UN	$ 1 056 382,00	0,00	$ -	1,00	$ 1 056 382	1,00	$ 1 056 382,00
103	4144	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	$ 79 768,00	0,00	$ -	51,00	$ 4 065 108	51,00	$ 4 065 108,00
118	4252	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5 171,00	40,43	$ 209 074,00	110,92	$ 573 578	151,35	$ 782 652,00
142	4848	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB Y CARGUE)	ML	$ 9 403,00	0,00	$ -	27,47	$ 258 304	27,47	$ 258 304,00
143	4849	DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE)	ML	$ 2 868,00	4,20	$ 12 046,00	225,05	$ 645 443	229,25	$ 657 488,00
179	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 147 462,00	15,19	$ 2 240 082,00	38,81	$ 5 723 723	54,01	$ 7 963 805,00
185	5161	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	$ 12 285,00	237,20	$ 2 914 002,00	108,80	$ 1 336 608	346,00	$ 4 250 610,00
214	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	UN	$ 555 104,00	0,00	$ -	2,00	$ 1 110 208	2,00	$ 1 110 208,00
215	7513	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO)	M2	$ 28 096,00	0,00	$ -	29,34	$ 824 326	29,34	$ 824 326,00
226	7888	TAPAS PARA POZO DE INSPECCION SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 238 849,00	0,00	$ -	2,00	$ 477 698	2,00	$ 477 698,00
229	7900	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 68 907,00	720,90	$ 49 673 040,00	586,95	$ 40 444 668	1306,85	$ 90 067 738,00
247	8350	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 300 403,00	0,00	$ -	17,00	$ 5 106 851	17,00	$ 5 106 851,00
253	8616	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 181 267,00	0,00	$ -	213,35	$ 38 671 674	213,35	$ 38 671 674,00

FECHA			CONSORCIO SUBA VIAL VR	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
8	8	2025	NIT: 901484973-1	
DD	MM	AA		

CONTRATO N° COP 1009-2024

ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL

RECIBO PARCIAL

CONTRATO N° 1009-2024

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA: CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogota D.C., a los 02 dias del mes agosto de 2025, se reunieron FARLEY ANDREA LARRATE BARRERA Representante Legal del Contratista ,EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL Representante legal de la Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del cobro parcial de obra y/o modificaciones del mes del 01 JULIO 2025 AL 30 DE JULIO DEL 2025, segun condiciones que se detallan a continuacion:

254	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)	M3	$	177 797,00	188,00	$	33 425 830,00	146,74	$	26 089 316	334,74	$ 59 515 152,00
ITEMS NO PREVISTOS													
NP-1	7892	EQUIPO VACTOR SONDEO LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)	HR	$	390 639,00	25,61	$	10 001 704,00	27,50	$	10 739 823	53,11	$ 20 741 526,00
NP-2	6567	CARROTANTE IRRIGADOR DE AGUA HORA	HR	$	107 100,00	16,53	$	1 770 363,00	27,50	$	2 945 250	44,03	$ 4 715 613,00
NP-5	8160	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIAMETROS MAYORES A 36" INCL. MANO DE OBRA IDÓNEA , INFORME ESCRITO DE DIAGNOSTICO CON DVD DE VIDEO INC IVA	ML	$	15 500,00	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$ -
NP-8	4934	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	$	30 948,00	1000,53	$	30 956 480,00	947,86	$	29 329 891	1948,49	$ 60 286 351,00
NP-14		TALA ARBOL DESTACONADO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CERTIFICACION DE DISPOSICION APROVECHAMIENTO FORESTAL) (CIV 11002026)	UN	$	3 340 000,00	1,00	$	3 340 000,00		$	-	1,00	$ 3 340 000,00
NP-15		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)	M3	$	115 955,00	0,00	$	-	59,06	$	6 848 567	59,06	$ 6 848 567,00
NP-18		PLACA DE CUBIERTA D=1,0 M POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE TAPA)	UN	$	434 858,00	0,00			4,00	$	1 739 432	4,00	$ 1 739 432,00
NP-19		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE	M3	$	46 373,00	0,00			22,59	$	1 047 665	22,59	$ 1 047 665,00
NP-20		NIVELACION DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0,15M INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION)	UNO	$	135 984,00	0,00			1,00	$	135 984	1,00	$ 135 984,00
		SUBTOTAL					$	189 811 224,00		$	308 720 178		$ 496 195 417,00
COMPONENTES													
		COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,1634% COSTO DIRECTO OBRA)		$	429 656 386,00	5,1634%							
		COMPONENTE SOCIAL (4,7167% COSTO DIRECTO OBRA)		$	392 475 337,00	4,7167%							
		COMPONENTE PMT (3,1085% COSTO DIRECTO OBRA)		$	258 663 298,00	3,1085%							
		SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA					$	24 527 844,00		$	39 838 658		$ 64 366 502,00
		SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS		$	389 554 609,00								$ -
							$	-		$	-		

FECHA			CONSORCIO SUBA VIAL VR	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
8	8	2025		
DD	MM	AA	NIT: 901484979-1	

CONTRATO N° COP 1009-2024
ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL

RECIBO PARCIAL

CONTRATO N° 1009-2024

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA: CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogota D.C ; a los 02 dias del mes agosto de 2025 se reunieron FARLEY ANDREA LARRATE BARRERA Representante Legal del Contratista EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL Representante legal de la Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del cobro parcial de obra y/o modificaciones del mes del 01 JULIO 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025, segun condiciones que se detallan a continuacion

A.I.U												
	ADMINISTRACION	26,33%			$ 48.078.523,00		$ 77.692.221		$ 125.720.744,00			
	IMPREVISTO	1,00%							$			
	UTILIDAD	4,00%			$ 7.584.449,00		$ 12.268.807		$ 19.853.256,00			
	TOTAL A.I.U	30,33%			$ 55.612.972,00		$ 89.961.028		$ 145.574.000,00			
	TOTAL OBRA											
	TOTAL A FACTURAR ACTA N° 2				**$ 272.428.605,00**		**$ 435.915.864**		**$ 708.068.469,00**			

RESUMEN DEL CONTRATO

VR INICIAL CONTRATO	$ 13.388.373.112
VR ANTICIPO	$ -
VR ADICION	$ -
VR ACTUAL	$ 13.388.373.112
VR PRESENTE ACTA	$ 436.519.864

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO M/CTE

No	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N° 1	1-jul-25	$ 272.428.605,00	2,03%	$ -	$ -	$ -	$ 272.428.605,00	$ 13.115.344.507,00	2,03%
2	ACTA PARCIAL N° 2	1-ago-25	$ 435.922.207,00	3,26%	$ -	$ -	$ -	$ 435.922.207,00	$ 12.680.022.300,00	5,29%
3					$ -	$ -	$ -	$ -		
4					$ -	$ -	$ -	$ -		
5					$ -	$ -	$ -	$ -		
6					$ -	$ -	$ -	$ -		
7					$ -	$ -	$ -	$ -		
8					$ -	$ -	$ -	$ -		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los 08 dias del mes de Agosto de 2025

FARLEY ANDREA LARRATE BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO SUBA VIAL VR

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO SUBA TH 003

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE
SUBA

BOGOTÁ

MEMORIAS DE CORTE DE OBRA

CONTRATO 1009 DE 2024

FECHA			CONSORCIO SUBA VIAL VR NIT. 901484975-1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ
8	8	2025			
DD	MM	AA			

CONTRATO N° COP 1009-2024
ACTA N° 2

CONTRATO N° 1009-2024 — RECIBO PARCIAL

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO".

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA: CONSORCIO SUBA TH 883

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogota D C , a los 02 dias del mes agosto de 2025 , se reunieron FARLEY ANDREA LARRATE BARRERA Representante Legal del Contratista EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL Representante legal de la Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del cobro parcial de obra y/o modificaciones del mes del 01 JULIO 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025, segun condiciones que se detallan a continuacion con

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DESCRIPCION	UND.	PRECIO UNIT	PRESENTE ACTA 2 CIV 11002026 CANT	VALOR
2	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 40.250,00	0,78	$ 31.490,00
3	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES	ML	$ 5.591,00	122,20	$ 683.220,00
5	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM) A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	$ 41.256,00	158,03	$ 6.519.600,00
6	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES	M2	$ 6.665,00	50,91	$ 339.290,00
9	3027	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	$ 74.159,00	203,50	$ 15.091.357,00
62	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60 INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FICURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	$ 5.210,00		
63	3710	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.171,00	808,24	$ 4.210.937,00
72	3800	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	$ 1.596,00	57,86	$ 299.197,00
74	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.407,00	144,34	$ 230.369,00
214	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE	UN	$ 555.104,00	100,00	$ 240.700,00
226	7888	TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 238.849,00	1,00	$ 555.104,00
229	7900	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 68.907,00	2,00	$ 477.698,00
253	8616	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)	M3	$ 181.263,00	346,73	$ 23.892.006,00
254	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)	M3	$ 177.797,00	213,35	$ 38.671.674,00
ITEMS NO PREVISTOS					86,68	$ 15.411.812,00
NP-8	4034	GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACION)	M2	$ 30.949,00	500,55	$ 15.487.004,00
NP-18		PLACA DE CUBIERTA D=1.0 M POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, INLCUYE SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE TAPA)	UN	$ 434.858,00	4,00	$ 1.739.432,00
NP-19		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	$ 46.379,00	22,59	$ 1.047.665,00
NP-26		NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION)	UND	$ 135.984,00	1,00	$ 135.984,00
		SUBTOTAL				$ 125.064.539,00
COMPONENTES						
	COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,16% COSTO DIRECTO OBRA)		$ 429.656.286,00	5,1634%		$ 6.457.582,00
	COMPONENTE SOCIAL (4,72% COSTO DIRECTO OBRA)		$ 392.475.337,00	4,7167%		$ 5.898.919,00
	COMPONENTE PMT (3,11% COSTO DIRECTO OBRA)		$ 258.663.298,00	3,1085%		$ 3.887.831,00
	SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA					$ 16.244.132,00
	SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS		$ 380.554.609,00			
	PROVISION ATENCION REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 8,054%		$ 670.208.055,00			
	PROVISION POR CAMBIO DE VIGENCIA 4,950%		$ 411.890.515,00			
	AJUSTE POR DECIMALES		1,00			
						$ -
A.I.U						
	ADMINISTRACION		25,33%			$ 31.678.848,00
	IMPREVISTO		1,00%			
	UTILIDAD		4,00%			$ 5.002.582,00
	TOTAL A.I.U		30,33%			$ 36.681.430,00
NP-12		PAGOS A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 (PERMISO E-08-815 No. 6544109) Y PAGO DE PERMISO E-08-815(No. 6601662)	GL	$ 2.576.585,00	1,00	$
NP-13		PAGO A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 POR COMPENSACION POR APROVECHAMIENTO ARBOLADO URBANO Y JARDINERIA, SEGUN DECRETO DISTRITAL No. 531 DE 2010 y adicionado Decreto Distrital 383 de 2018 y Resolucion 3558 de 2021 SDA	GL	$ 3.931.123,00		$
	TOTAL OBRA					
	TOTAL A FACTURAR ACTA N° 1 CIV 11002026					$ 177.990.181,00

156

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCION DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 (NÚMERO) DE 2024 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1.) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM Nº 3000 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	TOTAL
ACTA 2					
EXCAVACION MANUAL DE VALVULAS EXISTENTES					
K0+001.00	0.50	0.50	0.60		0.15
K0+001.00	0.50	0.60	0.70		0.21
EXCAVACION MANUAL RED POTABLE					
K0+115.00	5.00	0.50	0.25		0.63
				TOTAL	0.99
DESCUENTO AREA EN CAJA DE VALVULAS	AREA		ALTO		
K0+001.00	0.07		0.60		0.04
DESCUENTO AREA RED DE 4" MOVISTAR	LARGO	AREA	VOLUMEN		
K0+015.00	5.00	0.03	0.15		0.15
				TOTAL DE DESCUENTOS	0.20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0.78
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					27.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					27.78
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM Nº 3011 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
K0+003.00 a las K0+110 COSTADO DERECHO	107.00			107.00	107.00
K0+110.00 A la K0+113.20 CURVA COSTADO IZQUIERDO	3.20			3.20	3.20
K0+104 a la K0+116 COSTADO IZQUIERDO	12.00			12.00	12.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					122,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					122,20
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026

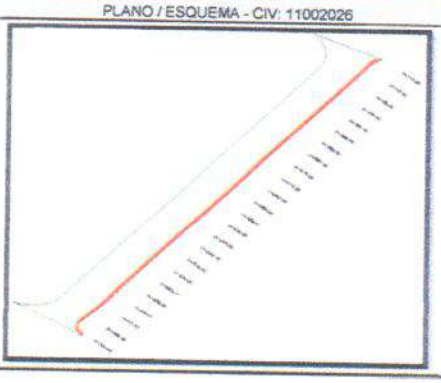

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO	PROCESO	VERSION	
FO-EO-04	EJECUCION DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TÉCNICA:

CONTRATO No 1009 (NUM. DE CONTRATO) DE 2024 (AÑO DE CONTRATO)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO LOTE 1 EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 16/12/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 3017 UNIDAD M.I SPECIFICACIÓN TECNIC

DESCRIPCION DEL ITEM TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (60 M) EN SITIO AUTORIZADO


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL 25

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA 24

CIV 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL CON DESCUENTO	EXPANSION	TOTAL
ACTA 2								
TRANSPORTE EXCAVACION MECANICA								
K0+200.00 A K0+205	5.00	9.00	0.65	29.25	1.07	51.87	1.3	75.22
K0+110A K0+116.00	6.10	9.00	0.65	35.59				
TRANSPORTE EXCAVACION MANUAL DE VALVULAS EXISTENTES								
K0+001.00	0.50	0.50	0.60	0.15	0.04	0.32	1.3	0.42
K0+001.00	0.50	0.60	0.70	0.21				
TRANSPORTE EXCAVACION MANUAL RED MOVISTAR								
K0+015.00	5.00	0.50	0.25	0.63	0.16	0.47	1.3	0.60
TRANSPORTE DEMOLICION MANUAL DE SARDINEL								
K0+000.00 a las K0+110 COSTADO DERECHO	107.00	0.20	0.80	17.12	0.00	19.55	1.3	25.42
K0+110.00 A la K0+113.20 CURVA COSTADO IZQUIERDO	3.20	0.20	0.80	0.51				
K0+104 a la K0+136 COSTADO IZQUIERDO	32.00	0.20	0.80	1.92				
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO								
K0+000 A K0+002.50 ESQUINA 1	3.78	11.04	0.20	8.35	0.00	10.18	1.3	13.24
K0+115.00 A K0+115.50 ESQUINA 2	2.50	14.35	0.20	1.84				
TRANSPORTE EXCAVACION MANUAL SUBRASANTE								
K0+000.00 A K0+005 DER	0.67	3.31	0.40	1.15	0.09	11.78	1.3	23.11
K0+110A K0+115.5 DER	1.06	0.84	0.40	0.36				
K0+000.00 A K0+005 IZQ	1.77	7.63	0.40	5.40				
K0+110 A K0+115.5 IZQ	3.24	8.37	0.40	10.86				
TRANSPORTE EXCAVACION PARA SARDINEL								
K0+012.50 A K0+100 IZQ	87.50	0.80	0.10	7.00	0.00	15.40	1.3	20.02
K0+005.00 A K0+110 DER	105.00	0.80	0.10	8.40				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA								158.03
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES								925.12
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO								1083.15
TOTAL POR EJECUTAR								0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV. 11002026

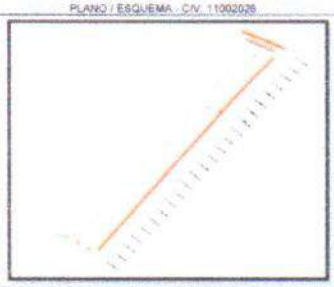

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

SE APLICAN LOS DESCUENTOS POR HUECOS Y SUMIDEROS. TRANSPORTE EXCAVACION MECANICA - VER ITEM 3110 DE 1 M
SE APLICAN LOS DESCUENTOS POR VALVULAS EN TRANSPORTE EXCAVACION MANUAL DE VALVULAS EXISTENTES - VER ITEM 3005 DE 0.4 M
SE APLICAN LOS DESCUENTOS POR LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE EXCAVACION MANUAL RED MOVISTAR - VER ITEM 3005 DE 0.6 M
PARA LOS ITEMS QUE APLICAN DESCUENTOS Y EXPANSIÓN SE ENCUENTRA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANCHO*ALTO*LARGO = CANTIDAD
CANTIDAD-DESCUENTO=TOTAL CON DESCUENTO
TOTAL CON DESCUENTO*EXPANSIÓN = TOTAL

ELABORO

P.P

Ingeniero Civil
Directora obra

REVISO

Director de Interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 3021 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR


INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH

CIV: 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL	TOTAL
ACTA 2					
K0+000 A K0+002.50 ESQUINA 1	3.78	11.04			41.73
K0+115.00 A K0+115.50 ESQUINA 2	0.50	18.35			9.18

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	50,91
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	50,91
TOTAL POR EJECUTAR	0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026

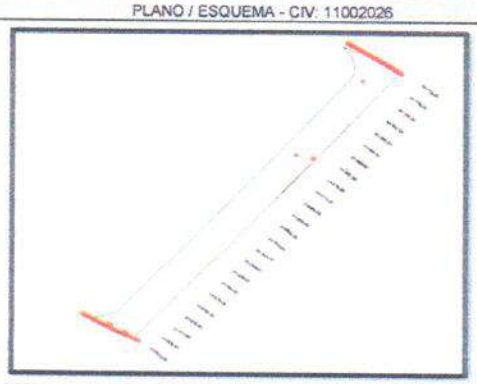

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 (Número de contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 3027 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002026

UBICACIÓN	LONGITUD				TOTAL
ACTA 2					
INSTALACIÓN SARDINEL					
K0+012.50 A K0+100 IZQ	87.50				87.50
K0+110.00 A K0+116.00 CURVA IZQ	6.00				6.00
K0+003.00 A K0+110.00 DER	107.00				107.00
K0+000.00 A K0+003.00 CURVA DER	3.00				3.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**203,50**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					203,50
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026

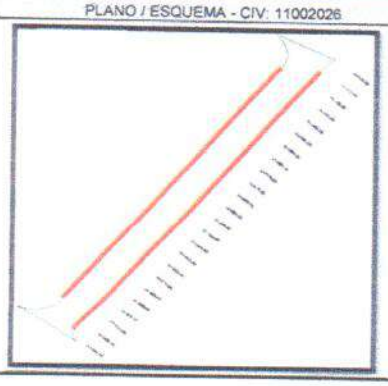

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-EJ-04	EJECUCION DE OBRAS	1.0

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1409 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO EGTE Y EEN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 16/10/2025 HASTA 31/10/2025

ITEM N° 2.06 UNIDAD KG ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA PSI. SUMINISTRO E INSTALACION" DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10 NORMA ASTM A-706 (CONTEC 0289 PARA EL ACERO POR 60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GRADO FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH

CIV: 11002026

UBICACION	AREA	PESO VARILLA DE 1/2" KG	NUMERO DE VARILLAS POR	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
AREA 2 SUMIDERO #1					
KD+049.85 A KD+052.75	6.16	0.994	11.00	67.35	67.35
AREA 3 SUMIDERO #2					
KD+049.85 A KD+052.75	6.16	0.994	11.00	67.35	67.35
AREA 4 SUMIDERO #3					
KD+073.05 A KD+075.95	6.16	0.994	11.00	67.35	67.35
AREA 5 SUMIDERO #4					
KD+073.05 A KD+075.95	6.16	0.994	11.00	67.35	67.35
AREA 6 POZO D=1.00					
KD+075.95 A KD+081.75	12.32	0.994	11.00	134.71	134.71
AREA 7 POZO D=1.70					
KD+273.05 A KD+278.85	24.04	0.994	11.00	209.41	209.41
AREA 8 POZO D=1.00					
KD+110.75 A KD+113.65	6.16	0.994	11.00	67.35	67.35
AREA 11 POZO D=1.70					
KD+104.95 A KD+107.85	6.16	0.994	11.00	67.35	67.35
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					808.24
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					808.24
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV. 11002026



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

El valor de una canasta corrugada de 1.0 pulgada es de aproximadamente $ 984 kilogramos por metro

ELABORO: Ingrid Sandra Cristales Fajardo — Directora Obra — P.P

REVISO: Ing. Edgar Rodriguez — Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM Nº 3710 UNIDAD M3 ESPECIFICACION TÉCNICA

DESCRIPCION DEL ITEM EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
K0+000.00 A K0+005	5.00	9.00	0.65		29.25
K0+110 A K0+116.10	6.10	9.00	0.65		35.69
				TOTAL	64.94
DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA			
K0+077.00 Y K0+ 106.80 POZO D=1.70 m PLUVIAL	2.00	2.28	0.65	2.96	2.96
K0+078.60 Y K0+ 113.40 POZO D= 1.00 m (1/2 POZO) SANITARIO	2.00	0.39	0.65	0.51	0.51
K0+ 074.00 SUMIDERO COSTADO DERECHO	1.00	2.77	0.65	1.80	1.80
K0+ 074.00 SUMIDEROS SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	1.00	2.77	0.65	1.80	1.80
				TOTAL DESCUENTOS	7.07
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					57.86
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					642.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					699.86
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV. 11002026

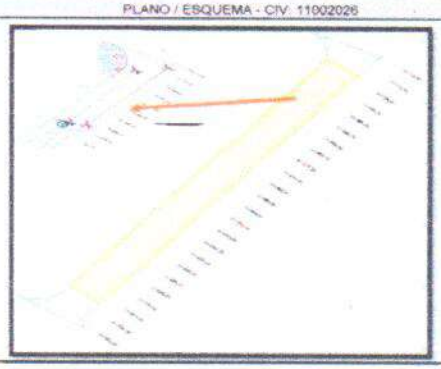

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

* EL POZO SANITARIO DE D=1 SE ENCUENTRA MITAD EN VÍA Y MITAD SOBRE ANDEN.
* SE ACLARA QUE LOS DESCUENTOS PRESENTADOS CORRESPONDEN AL ACTA #1, POR LO TANTO LAS AREAS DE LOS POZOS Y SUMIDEROS DESCONTADOS PERTENECEN A LAS ABSCISAS ANTERIORMENTE COBRADAS EN ESTE ITEM

ELABORO

PP

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION 1.0	

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 3800 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR.

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO		TOTAL
ACTA 2					
K0+000.00 A K0+005	5,00	9,00			45,00
K0+110A K0+115.5	6,10	9,00			54,90
ESQUINAS IRREGULARES DERECHA					
K0+000.00 A K0+005	0,87	3,31			2,88
K0+110 A K0+115.50	1,08	0,84			0,90
ESQUINAS IRREGULARES IZQUIERDA					
K0+000.00 A K0+005	1,77	7,63			13,51
K0+110 A K0+115.5	3,24	8,37			27,15
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					144,34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					987,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1131,34
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TECNICA**

CONTRATO No 1009 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ITEM N° 3811 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACION TÉCNICA**

DESCRIPCION DEL ÍTEM CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH


CIV 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
CORTE LONGITUDINAL AJUSTE SARDINEL EXISTENTE DERECHO					
K0+000.00 A K0+100.00	100.00			100.00	100.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					100,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					100.00
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026

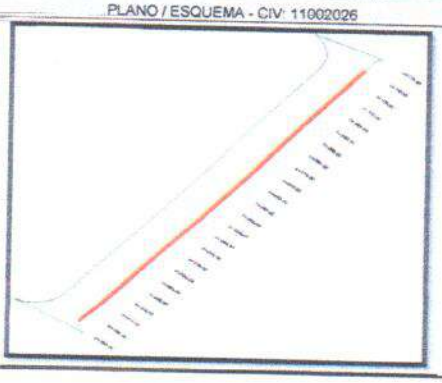

FOTOGRAFÍA

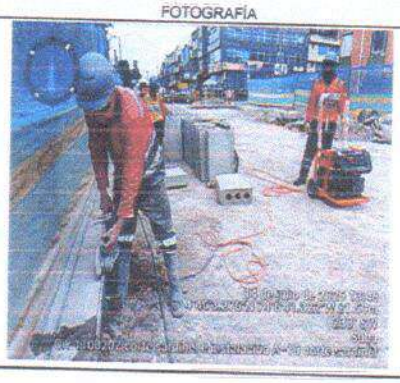

OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCION DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de Ejecución)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 7512 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO DIAMETRO INTERIOR D=1.20M DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002026

UBICACIÓN	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
DEMOLICIÓN POZO EN MAMPOSTERIA					
K0+077.00 POZO PLUVIAL D=1.70 M	1.00			1.00	1.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1.00
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026

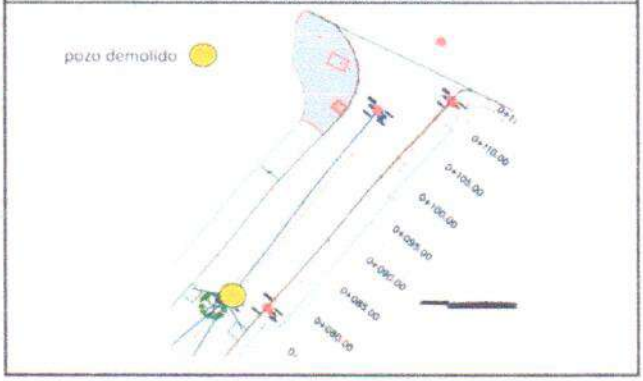

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ITEM N° 7888 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002026

UBICACIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2			
TAPAS PARA POZO			
K0-003.41 COSTADO DERECHO	1.00	1.00	1.00
K0-003.41 COSTADOIZQUIERDO	1.00	1.00	1.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			2.00
TOTAL POR EJECUTAR			0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV 11002026

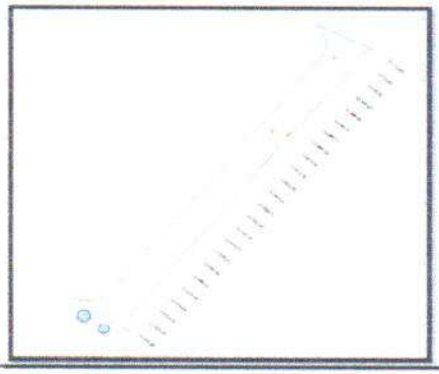

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cáestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO	PROCESO	VERSION	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 7900 UNIDAD M2 ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM GEOCELDA HOPE PERFORADA. ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACION)

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR.


INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	DESCUENTO	TOTAL
ACTA 2					
K0+000.00 A K0+005.00	5.00	9.00			45.00
K0+055.00 A K0+080.00	25.00	9.00			225.00
K0+110.00 A K0+115.50	5.50	9.00			49.50
ESQUINAS IRREGULARES DERECHA					
K0+000.00 A K0+005	0.87	3.31			2.88
K0+110A K0+115.50	1.08	0.84			0.90
ESQUINAS IRREGULARES IZQUIERDA					
K0+000.00 A K0+005	1.77	7.63			13.51
K0+110A K0+115.50	3.24	8.37			27.15
				TOTAL	363.94

DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA			
K0+077.00 Y K0+ 106.80 POZO 1.70 PLUVIAL	2.00	2.28			4.55
K0+078.60 Y K0+ 113.40 POZO 1.00 (1/2 POZO) SANITARIO	2.00	0.79			1.58
K0+ 074.00 SUMIDERO COSTADO DERECHO	1.00	2.77			2.77
K0+ 074.00 SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	1.00	2.77			2.77
K0+ 050.00 SUMIDEROS COSTADO IZQUIERDO	1.00	2.77			2.77
K0+ 050.00 SUMIDEROS COSTADO IZQUIERDO	1.00	2.77			2.77
				TOTAL DESCUENTOS	17.21
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					346.73
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					720.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1066.73
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026

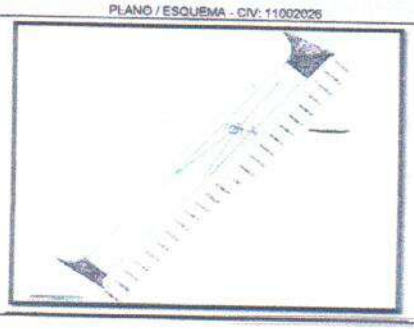

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

EL POZO SANITARIO DE D=1 SE ENCUENTRA MITAD EN VIA Y MITAD SOBRE ANDEN

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO-EC-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 8616 — UNIDAD M3 — ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCION DEL ÍTEM: BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro. Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH

CIV: 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
K0+000.00 A K0+115.5	115,50	9,00	0,20		207,90
ESQUINAS IRREGULARES DERECHA					
K0+000.00 A K0+005	0,87	3,31	0,20		0,58
K0+110A K0+116.10	1,08	0,84	0,20		0,18
ESQUINAS IRREGULARES IZQUIERDA					
K0+000.00 A K0+005	1,77	7,63	0,20		2,70
K0+110 A K0+116.10	3,24	8,37	0,20		5,43
				TOTAL	216,79
DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA			
K0+077.00 Y K0+ 106.80 POZO 1.70 PLUVIAL	2,00	2,28	0,20		0,91
K0+078.60 Y K0+ 113.40 POZO 1.00 (1/2 POZO) SANITARIO	2,00	0,79	0,20		0,32
K0+ 074.00 SUMIDERO COSTADO DERECHO	1,00	2,77	0,20		0,55
K0+ 074.00 SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	1,00	2,77	0,20		0,55
K0+ 050.00 SUMIDEROS COSTADO IZQUIERDO	1,00	2,77	0,20		0,55
K0+ 056.00 SUMIDEROS COSTADO IZQUIERDO	1,00	2,77	0,20		0,55
				TOTAL DESCUENTOS	3,44
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					213,35
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					213,35
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026

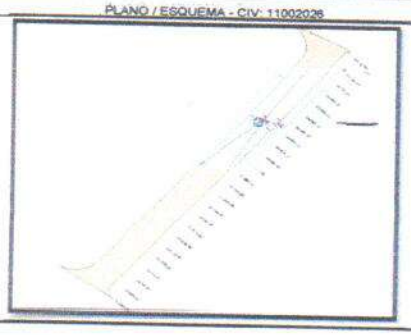

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

EL POZO SANITARIO DE D=1 SE ENCUENTRA MITAD EN VIA Y MITAD SOBRE ANDEN

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 8617 UNIDAD M3 ESPECIFICACION TÉCNICA

DESCRIPCION DEL ITEM: AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH

CIV: 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
K0+000.00 A K0+005.00	5.00	9.00	0.25		11.25
K0+055.00 A K0+080.00	25.00	9.00	0.25		56.25
K0+110.00 A K0+ 115.5	5.50	9.00	0.25		12.38
ESQUINAS IRREGULARES DERECHA					
K0+000.00 A K0+005	0.87	3.31	0.25		0.72
K0+110 A K0+115.5	1.08	0.84	0.25		0.23
ESQUINAS IRREGULARES IZQUIERDA					
K0+000.00 A K0+005	1.77	7.63	0.25		3.38
K0+110 A K0+115.5	3.24	8.37	0.25		6.79
				TOTAL	90.99
DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA			
K0+077.00 Y K0+ 106.80 POZO 1.70 PLUVIAL	2.00	2.28	0.25		1.14
K0+078.60 Y K0+ 113.40 POZO 1.00 (1/2 POZO) SANITARIO	2.00	0.79	0.25		0.39
K0+ 074.00 SUMIDERO COSTADO DERECHO	1.00	2.77	0.25		0.69
K0+ 074.00 SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	1.00	2.77	0.25		0.69
K0+ 050.00 SUMIDEROS COSTADO IZQUIERDO	1.00	2.77	0.25		0.69
K0+ 050.00 SUMIDEROS COSTADO IZQUIERDO	1.00	2.77	0.25		0.69
					0.69
				TOTAL DESCUENTOS	4.30
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					86.68
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					188.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					274.68
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Roberto Rosado Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° NP:6 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)>90 kN/mlinc. Sumin. e Instalación)

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR.

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO		DESCUENTO	TOTAL
ACTA 2					
K0+000.00 A K0+005.00	5.00	12.30			61.50
K0+055.00 A K0+080.00	25.00	12.30			307.50
K0+110.00 A K0+115.50	5.50	12.30			67.65
ESQUINAS IRREGULARES DERECHA					
K0+000.00 A K0+005	1.87	3.31			6.19
K0+110A K0+115.5	2.08	0.84			1.74
ESQUINAS IRREGULARES IZQUIERDA					
K0+000.00 A K0+005	3.50	7.63			26.71
K0+110A K0+115.5	5.10	8.37			42.69
TRASLAPOS					
K0+000.00 A K0+005.00	9.47	0.40			3.79
K0+055.00 A K0+080.00					
K0+110.00 A K0+115.50					
				TOTAL	517.76
DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA			
K0+077.00 Y K0+ 106.80 POZO 1.70 PLUVIAL	2.00	2.28			4.55
K0+078.60 Y K0+ 113.40 POZO 1.00 (1/2 POZO) SANITARIO	2.00	0.79			1.58
K0+ 074.00 SUMIDERO COSTADO DERECHO	1.00	2.77			2.77
K0+ 074.00 SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	1.00	2.77			2.77
K0+ 050.00 SUMIDEROS COSTADO IZQUIERDO	1.00	2.77			2.77
K0+ 050.00 SUMIDEROS COSTADO IZQUIERDO	1.00	2.77			2.77
				TOTAL DESCUENTOS	17.21
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					500,55
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1000.53
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1501.08
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026



FOTOGRAFÍA



Civ 11002026 excavación geocelda

OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edgar Alexander Duarte
Director de interventoria

164

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° NP18 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA DE CUBIERTA D=1.0 M POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, INLCUYE SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE TAPA)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR.

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH


CIV 11002026

UBICACIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	TOTAL
	ACTA 2		
PLACA CUBIERTA DE POZO			
K0+077.00 DERECHO	1,00	1,00	1,00
K0+078.59	1,00	1,00	1,00
K0+106.80	1,00	1,00	1,00
K0+113.40	1,00	1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			4.00
TOTAL POR EJECUTAR			0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026

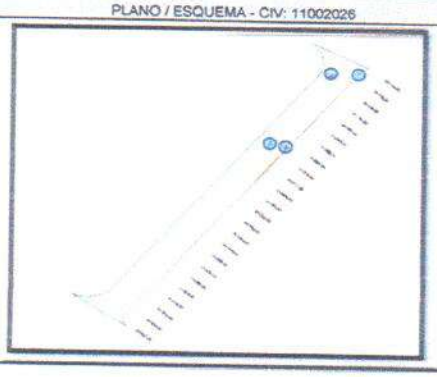

FOTOGRAFÍA

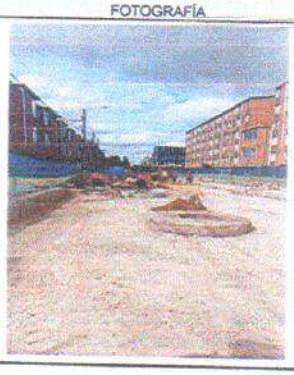

OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing.Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing.Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP-19 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCION DEL ITEM: EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH

CIV: 11002026

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
ESQUINAS IRREGULARES DERECHA					
K0+000.00 A K0+005	0.87	3.31	0.40		1.15
K0+110A K0+116.10	1.08	0.84	0.40		0.36
ESQUINAS IRREGULARES IZQUIERDA					
K0+000.00 A K0+005	1.77	7.65	0.40		0.40
K0+110 A K0+116,10	3.24	8.37	0.40		10.88
EXCAVACIÓN PARA SARDINEL					
K0+012.50 A K0+100 IZQ	87.50	0.25	0.10		2.19
K0+005.00 A K0+110 DER	105.00	0.25	0.10		2.63
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					22.59
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					22.59
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026



FOTOGRAFIA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Questas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP20 UNIDAD UN ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: NIVELACION DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA H=0.15M INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION)

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH


CIV: 11002026

UBICACIÓN	UNIDAD				TOTAL
ACTA 2					
NIVELACION DE POZO					
K0+077.00	1.00				1.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1.00
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026



FOTOGRAFÍA

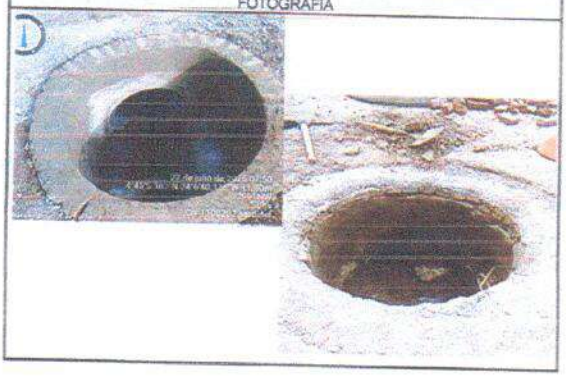

OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

172

FECHA				
2	8	2025	CONSORCIO SUBA VIAL \	BOGOTÁ
DD	MM	AA	NIT: 901484979-1	

CONTRATO N° COP 1009-2024
ACTA N° 2

RECIBO PARCIAL

CONTRATO N° 1009-2024

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO".

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTORIA: CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogotá D.C., a los 02 días del mes agosto de 2025, se reunieron FARLEY ANDREA LARRATE BARRERA Representante Legal del Contratista ,EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL Representante legal de la Interventoria para dejar constancia por medio de la presente acta del cobro parcial de obra y/o modificaciones del mes del 01 JULIO 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025, segun condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 VALOR
1	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 632.00		$
2	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 40.250.00	20.92	$ 842.259.00
3	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	$ 5.591.00	145.00	$ 810.695.00
5	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM) A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 41.256.00	375.48	$ 15.490.936.00
10	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 74.913.00	58.91	$ 4.413.125.00
11	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 105.998.00	8.30	$ 879.534.00
12	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 148.498.00	28.25	$ 3.098.564.00
63	3710	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL CONGLN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.171.00	184.24	$ 952.699.00
72	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.596.00	290.00	$ 462.840.00
74	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y	ML	$ 2.407.00	4.00	$ 9.628.00
81	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCL. SUMIN. INST.)	UN	$ 1.056.362.00	1.00	$ 1.056.362.00
103	4144	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	$ 79.798.00	51.00	$ 4.069.698.00
118	4262	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.171.00	68.21	$ 352.719.00
143	4549	DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE)	ML	$ 2.868.00	225.05	$ 645.443.00
179	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 147.462.00	25.55	$ 3.767.796.00
214	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR DAT 20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO)	UN	$ 555.104.00	1.00	$ 555.104.00
215	7513	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO)	M2	$ 26.056.00	29.34	$ 924.326.00
229	7900	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 68.907.00	240.22	$ 16.552.697.00
247	8350	YEE PVC SANITARIA D=8"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 309.403.00	17.00	$ 5.106.851.00
254	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 177.797.00	60.05	$ 10.677.504.00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP-8	4034	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	$ 30.940.00	447.41	$ 13.842.887.59
NP-15		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 115,955.00	47.93	$ 5.557.693.41
		SUBTOTAL				$ 89.965.798.00
COMPONENTES						
	COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5.16% COSTO DIRECTO OBRA)		$ 429.656.286.00	5.1634%		$ 4.645.252.00
	COMPONENTE SOCIAL (4.72% COSTO DIRECTO OBRA)		$ 392.475.237.00	4.7167%		$ 4.243.415.00
	COMPONENTE PMT (3.11% COSTO DIRECTO OBRA)		$ 258.663.298.00	3.1085%		$ 2.796.585.00
	SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA					$ 11.685.253.00
	SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS		$ 380.554.609.00			
	PROVISIÓN ATENCIÓN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 5.054%		$ 570.205.055.00			
	PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA 4.950%		$ 411.880.515.00			
	AJUSTE POR DECIMALES		1.00			
A.I.U.						
		ADMINISTRACIÓN	25.33%			$ 578.312.00
		IMPREVISTO	1.00%			
		UTILIDAD	4.00%			$ 89.961.00
		TOTAL A.I.U.	30.33%			$ 690.373.00
		TOTAL OBRA				
		TOTAL A FACTURAR ACTA N° 1 CIV 11004595				$ 102.311.432.00

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO: FO-EC-04	PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION: 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 3009 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCION DEL ITEM: EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003

CIV: 11004595

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) PARA RED DOMICILIARIA 6"					
K0+006.00 A K0+008.00	3,00	0,40	0,57	0,68	0,68
K0+012.20 A K0+014.50	3,00	0,40	0,78	0,94	0,94
K0+015.50 A K0+017.50	3,00	0,40	0,77	0,92	0,92
K0+017.00 A K0+020.00	3,00	0,40	0,71	0,85	0,85
K0+021.50 A K0+024.00	3,00	0,40	0,72	0,86	0,86
K0+024.00 A K0+026.50	3,00	0,40	0,77	0,92	0,92
K0+027.00 A K0+029.00	3,00	0,40	0,72	0,86	0,86
K0+030.50 A K0+033.00	3,00	0,40	0,56	0,67	0,67
K0+034.50 A K0+036.40	3,00	0,40	0,48	0,58	0,58
K0+037.00 A K0+039.20	3,00	0,40	0,54	0,65	0,65
K0+037.50 A K0+039.50	3,00	0,40	0,41	0,49	0,49
K0+041.50 A K0+044.00	3,00	0,40	0,55	0,66	0,66
K0+045.00 A K0+046.50	3,00	0,40	0,55	0,66	0,66
K0+050.30 A K0+053.00	3,00	0,40	0,60	0,72	0,72
K0+051.80 A K0+053.50	3,00	0,40	0,60	0,72	0,72
K0+053.50 A K0+056.00	3,00	0,40	0,40	0,48	0,48
K0+054.00 A K0+057.00	3,00	0,40	0,45	0,54	0,54
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) PARA RED 12" PLUVIAL					
K0+000.00 A K0+030.00	29,25	0,30	0,50	4,39	4,39
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) PARA RED 4" POTABLE					
K0+000.00 A K0+072.5	72,50	0,25	0,20	3,63	3,63
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) PARA RED 10" SUMIDEROS					
K0+034.50 COSTADO DERECHO	4,20	0,30	0,28	0,35	0,35
K0+034.50 COSTADO IZQUIERDO	4,10	0,30	0,28	0,34	0,34
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					20,93
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

DEBIDO A QU LA RED E LLUVIAS DE 12" (K0+000 HASTA LA K0+030) PRESENTO INTERFERENCIA SOBRE A TUBERIA RESIDUAL DE 6", SE AUTOTIZO POR PARTE DE INTERVENTORIA EL DESPLAZAMIENTO DE LA RED DE 12" (LLUVIA) EN 0,30 CM HACIA EL COSTADO NOR OCCIDENTAL, HACIENDO NECESARIA LA LABOR DE MANERA MANUAL

ELABORO

Nombre: Ing. Sandra Cuestas Fajardo
Cargo: Directora obra

REVISO

Nombre: Ing Edison Ricardo [illegible]
Cargo: Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-EC-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 3011 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11004595

UBICACIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2			
COSTADO DERECHO			
K0+000.00 A K0+072.50	72.5	72.5	72.50
COSTADO IZQUIERDO			
K0+000.00 A K0+072.50	72.5	72.5	72.50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			145.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			145.00
TOTAL POR EJECUTAR			0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

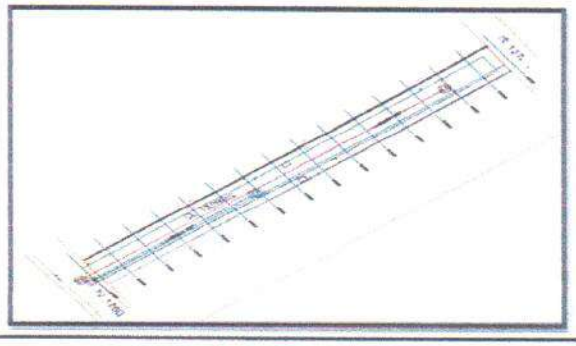

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
CODIGO	PROCESO	VERSION	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No — DE

OBJETO DEL CONTRATO

RECIBO PARCIAL No — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE — HASTA

ITEM N° — UNIDAD — ESPECIFICACIÓN TECNICA

DESCRIPCION DEL ITEM


CONTRATISTA

INTERVENTOR

CIV

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	EXPANSION	TOTAL
ACTA 2						
TRANSPORTE EXCAVACION MANUAL PARA REDES A PROFUNDIDAD DM = DM INCLUYE CARGUE PARA RED DOMICILIARIA E						
KD+000.00 A KD+338.00						
KD+077.27 A KD+374.70						
KD+111.50 A KD+311.10						
KD+107.20 A KD+220.13						
KD+107.70 A KD+218.00						
KD+114.23 A KD+275.72						
KD+121.00 A KD+329.00						
KD+135.50 A KD+193.00						
KD+254.50 A KD+296.40						
KD+137.00 A KD+277.20						
KD+137.50 A KD+329.00						
KD+187.50 A KD+264.00						
KD+287.00 A KD+349.70						
KD+150.00 A KD+152.00						
KD+157.50 A KD+311.10						
KD+213.50 A KD+266.00						
KD+194.00 A KD+329.00						
TRANSPORTE EXCAVACION MANUAL PARA REDES A PROFUNDIDAD DM = DM INCLUYE CARGUE PARA RED DE PLUVIAL						
KD+000.00 A KD+330.00	29.25	2.30	0.50		1.30	37.80
TRANSPORTE EXCAVACION MANUAL PARA REDES A PROFUNDIDAD DM = DM INCLUYE CARGUE PARA RED DE POTABLE						
KD+000.00 A KD+327.40	12.50	2.30	1.20		1.30	41.60
TRANSPORTE EXCAVACION MANUAL PARA REDES A PROFUNDIDAD DM = DM INCLUYE CARGUE PARA RED DE SANEAMIENTO						
KD+004.50 COSTADO DERECHO	4.50	2.30	0.50		1.30	16.70
KD+004.50 CONTRAPOZO (QUITARIO)	4.50	2.30	0.50		1.30	16.70
TRANSPORTE DEMOLICION DE SARDINEL						
COSTADO DERECHO						
KD+000.00 A KD+327.50	12.50	0.50	0.20		1.30	4.50
COSTADO IZQUIERDO						
KD+000.00 A KD+327.50	12.50	0.50	0.20		1.30	4.50
TRANSPORTE EXCAVACION MECANICA						
KD+000.00 A KD+375.00	15.00	4.00	0.50			
KD+000.00 A KD+329.00	5.00	4.00	0.50			
KD+000.00 A KD+329.00	5.00	4.00	0.50			
KD+000.00 A KD+330.00	5.00	4.00	0.50			
KD+000.00 A KD+392.00	20.00	4.00	0.50			
KD+000.00 A KD+327.50	12.50	4.00	0.50			
TRANSPORTE EXCAVACION MECANICA PARA RED PLUVIAL E						
KD+000.00 A KD+338.00	30.00	1.00	1.00			
KD+000.00 A KD+364.00	34.00	1.00	1.00			
TRANSPORTE EXCAVACION MECANICA PARA RED PLUVIAL E						
KD+000.00 A KD+338	29.25	1.500	0.500			
TRANSPORTE DEMOLICION RED SANITARIA E		PERIMETRO DE TUBO	ESPESOR	VOLUMEN		
KD+000.00 A KD+338.00	34.00	0.60	0.025	1.02	1.30	1.30
TRANSPORTE DEMOLICION RED COMERCIAL E						
KD+000.00 A KD+358.00	31.00	0.40	0.025	0.31	1.30	0.41
TRANSPORTE DEMOLICION RED 12" PLUVIAL						
KD+000.00 A KD+329.00	29.25	0.40	0.025	0.29	1.30	0.38
TRANSPORTE DEMOLICION RED 8" POTABLE						
KD+000.00 A KD+327.50	12.50	0.31	0.025	0.10	1.30	0.14
TRANSPORTE DEMOLICION RED 12" PLUVIAL SUMIDEROS						
KD+004.50 COSTADO DERECHO	4.50	0.50	0.025	0.06	1.30	0.11
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						375.45
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						375.45
TOTAL POR EJECUTAR						0.55

PLANO / ESQUEMA - CIV 11004556



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

EN TRANSPORTE EXCAVACION MECANICA SE APLICA EL DESCUENTO DE 0.2M3 VER ITEM 3210

ELABORO

REVISO

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 3043 UNIDAD ML ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: TUBERIA PVC U M EXT CORRUGADO/INT LISO U M NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003


CIV: 11004595

UBICACIÓN	LARGO	DESCUETO YEE	TOTAL
ACTA 2			
K0+000.50 A K0+064.00	63.50	4.590	58.91
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			**58,91**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			58.91
TOTAL POR EJECUTAR			0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

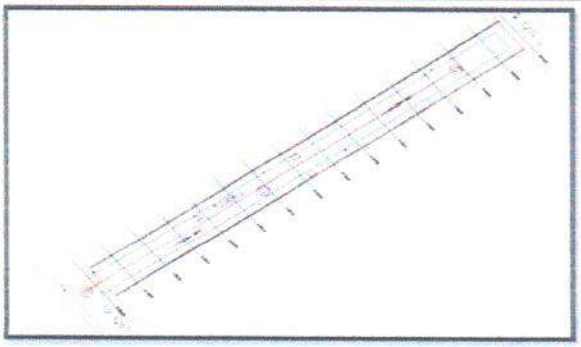

FOTOGRAFÍA

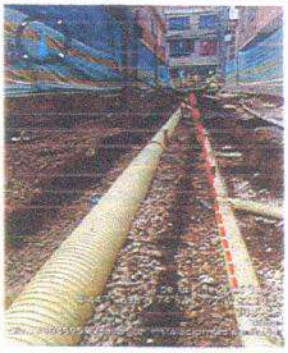

OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 3044 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U M. EXT CORRUGADO/INT LISO U M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003


CIV 11004595

UBICACIÓN	LARGO	DESCUETO YEE	TOTAL
ACTA 2			
SUMIDEROS			
K0+034.50 COSTADO DERECHO	4.20	-	4.20
K0+034.50 COSTADO IZQUIERDO	4.10	-	4.10
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			8,30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			8,30
TOTAL POR EJECUTAR			0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

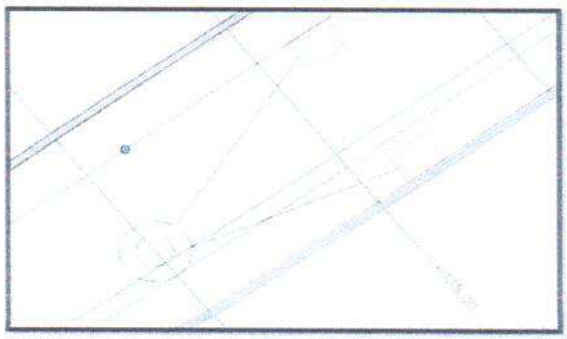

FOTOGRAFÍA

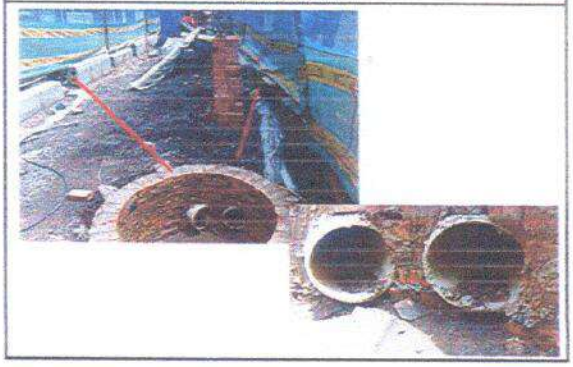

OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 3045 UNIDAD ML ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003

CIV: 11004595

UBICACIÓN	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2			
K0+000.00 A K0+030.00	29.25	29.250	29.25
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			29,25
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			29.25
TOTAL POR EJECUTAR			0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 3710 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003


CIV 11004595

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
K0+000.00 A K0+015.00	15,00	4,00	0,63	37,86	37,86
K0+015.00 A K0+020.00	5,00	4,02	0,64	12,78	12,78
K0+020.00 A K0+025.00	5,00	4,05	0,63	12,84	12,84
K0+025.00 A K0+030.00	5,00	4,05	0,63	12,68	12,68
K0+030.00 A K0+060.00	30,00	4,05	0,65	79,22	79,22
K0+060.00 A K0+072.50	12,50	4,05	0,64	32,15	32,15
				TOTAL	187,52

DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA	ALTO		
K0+030.00 POZO D= 1.70M	1,00	2,27	0,64		1,44
K0+ 64 POZO D= 1 M	1,00	0,79	0,64		0,50
K0+034.5 SUMIDERO COSTADO DERECHO	1,00	1,06	0,64		0,67
K0+034.5 SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	1,00	1,06	0,64		0,67
				TOTAL DESCUENTOS	3,28

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	184,24
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	184,239
TOTAL POR EJECUTAR	0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

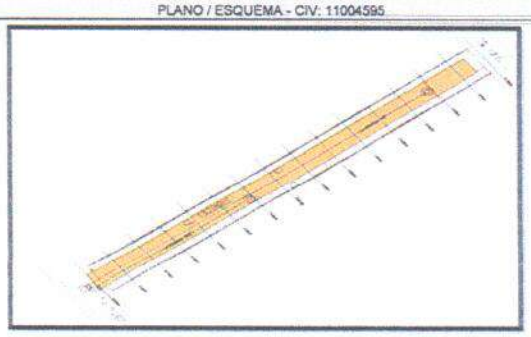

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 3600 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR.

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11004595

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
NIVELACION SUBRASANTE VIA					
K0+000,00 A K0+030,00	30,00	4,00	-	120,00	120,00
K0+030,00 A K0+072,50	42,50	4,00	-	170,00	170,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**290,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					290,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002026

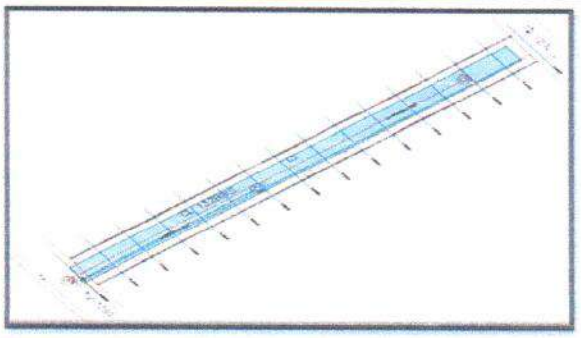

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 3811 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11004595

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
CORTE DE PAVIMENTO EMPALMES					
K0+000	4.00			4.00	4.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4.00
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

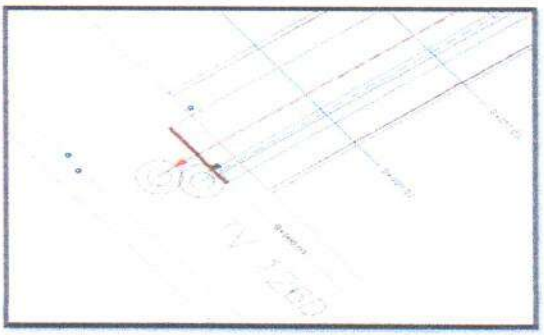

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 3879 UNIDAD UN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA FONDO D=1 70M POZO INSPEC (PREFABRICADA INCL SUMIN. INST)

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11004595

UBICACIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2			
K0+030 PLACA FONDO PLUVIAL	1.00	1.00	1.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			1.00
TOTAL POR EJECUTAR			0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 4144 UNIDAD ML ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH

CIV: 11004595

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
K0+006.00 A K0+008.00	3.00				3.00
K0+012.20 A K0+014.50	3.00				3.00
K0+015.50 A K0+017.50	3.00				3.00
K0+017.00 A K0+020.00	3.00				3.00
K0+021.50 A K0+024.00	3.00				3.00
K0+024.00 A K0+026.50	3.00				3.00
K0+027.00 A K0+029.00	3.00				3.00
K0+030.50 A K0+033.00	3.00				3.00
K0+034.50 A K0+036.40	3.00				3.00
K0+037.00 A K0+039.20	3.00				3.00
K0+037.50 A K0+039.50	3.00				3.00
K0+041.50 A K0+044.00	3.00				3.00
K0+045.00 A K0+046.50	3.00				3.00
K0+050.30 A K0+053.00	3.00				3.00
K0+051.80 A K0+053.50	3.00				3.00
K0+053.50 A K0+056.00	3.00				3.00
K0+054.00 A K0+057.00	3.00				3.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					51.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					51.00
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

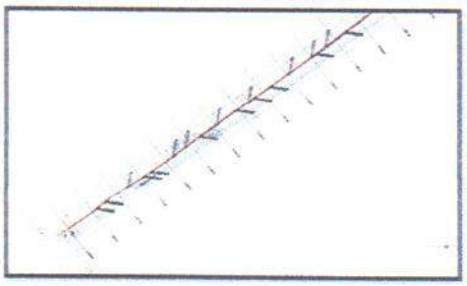

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 4262 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11004595

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA RED SANITARIA 8"					
K0+000.00 A K0+030.00	30.00	0,90	1,34	36.18	36.18
K0+0030.00 A K0+064.00	34.00	0,90	0,76	23.26	23.26
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA RED PLUVIAL 12"					
K0+000.00 A K0+030	29,25	0,60	0,50	8,78	8,78
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					68,21
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					68,21
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

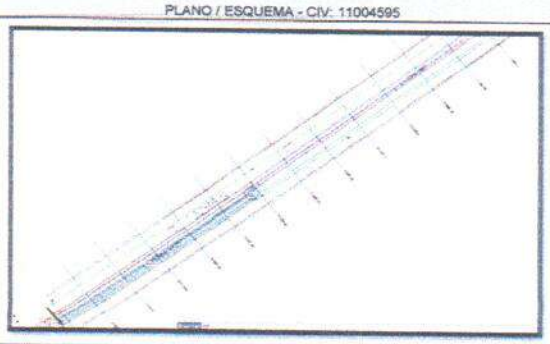

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

RED PLUVIA DE 12" (K0+000 HASTA K0+030) SE REALIZA EXCAVACIÓN MECANICA CON ALINEACIÓN EXISTENTE (TUBERIA EAAB) INSTALADA, LARGO 29,25 MT ANCHO 0,60 MT Y ALTO 0,50 MT.

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO: FO-EO-04	PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN: 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 4849 UNIDAD ML ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: DEMOLICIÓN O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003

CIV: 11004595

UBICACIÓN	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2			
DEMOLICIÓN RED SANITARIA 8"			
K0+000.00 A K0+064.00	64.00	64.00	64.00
DEMOLICIÓN RED DOMICILIARIA 6"			
K0+006.00 A K0+054.00	51.00	51.00	51.00
DEMOLICIÓN RED 12" PLUVIAL			
K0+000.00 A K0+030.00	29.25	29.25	29.25
DEMOLICIÓN RED 4" POTABLE			
K0+000.00 A K0+072.50	72.50	72.50	72.50
DEMOLICIÓN RED 8" PLUVIAL SUMIDEROS			
K0+034.5 SUMIDERO COSTADO DERECHO	4.20	4.20	4.20
K0+034.5 SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	4.10	4.10	4.10
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			225.05
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			225.05
TOTAL POR EJECUTAR			0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

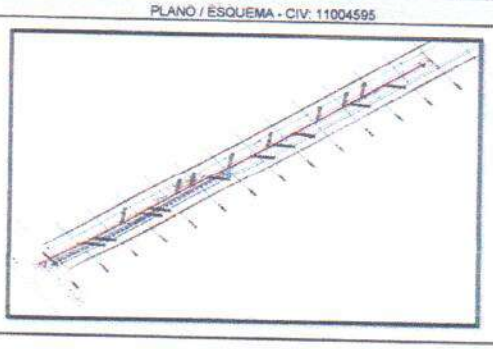

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	PROCESO
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No: 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No: 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE: 13/12/2025 0

ITEM N°: 0412 UNIDAD: M3 ESPECIFICACION TECNICA:

DESCRIPCION DEL ITEM: RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR


INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003

CIV: 11004595

UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	DIAMETRO DE TUBO	VOLUMEN DE 1/2 TUBO	CANTIDAD	TOTAL
			ACTA 2				
RELLANO RED SANITARIA 8"							
KD+000.00 A KD+064.00	64	0.9	0.15			8.64	8.64
KD+000.00 A KD+064.00	64	0.9	0.10			5.76	5.76
DESCUENTOS DE TUBO							
DESCUENTOS DE TUBO 8"	64			0.02	1.01	1.01	1.01
						TOTAL	13.35
RELLENO RED DOMICILIARIA 6"							
KD+006.00 A KD+008.50	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+012.20 A KD+014.50	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+015.50 A KD+017.50	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+017.00 A KD+020.00	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+021.50 A KD+024.00	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+024.00 A KD+026.50	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+027.00 A KD+029.00	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+030.50 A KD+033.00	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+034.50 A KD+036.40	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+037.00 A KD+039.20	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+037.50 A KD+039.50	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+041.50 A KD+044.00	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+045.00 A KD+046.50	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+050.30 A KD+053.00	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+051.80 A KD+053.50	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+053.50 A KD+056.00	3	0.4	0.15			0.18	0.18
KD+054.00 A KD+057.00	3	0.4	0.15			0.18	0.18
DESCUENTOS DE TUBO							
DESCUENTOS DE TUBO 6"	48			0.04	1.74	1.74	1.74
						TOTAL	1.92
RELLENO RED PLUVIAL 12"							
KD+000.00 A KD+030.00	30	0.9	0.3			8.10	8.10
KD+000.00 A KD+030.00	30	1	0.2			6.00	6.00
DESCUENTOS DE TUBO							
DESCUENTOS DE TUBO 12"	30			0.15	4.36	4.36	4.36
						TOTAL	9.74
RELLENO RED PLUVIAL SUMIDEROS 10"							
KD+030 A KD+035	5	0.6	0.2			0.60	0.60
KD+030 A KD+035	5	1	0.20			1.00	1.00
DESCUENTOS DE TUBO							
DESCUENTOS DE TUBO 10"	5			0.10	0.51	0.51	0.51
						TOTAL	1.09

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	35.98
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	25.5610
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuellar Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Eduardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM Nº 7512 UNIDAD UN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: DEMOLICION DE POZO. DIAMETRO INTERIOR D=1.20M. DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M. H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003


CIV: 11004595

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
K0+029.10 POZO PLUVIAL EXISTENTE				1.00	1.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1.000
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

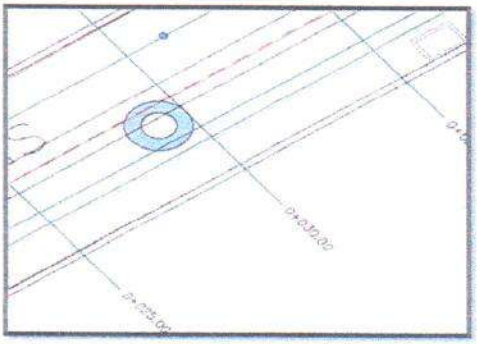

FOTOGRAFÍA

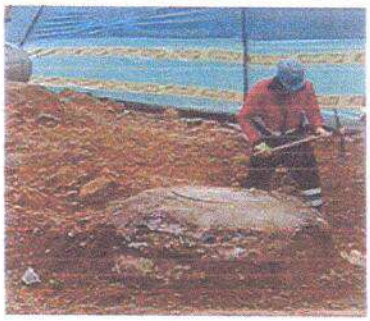

OBSERVACIONES

K0+029.10 POZO PLUVIAL EXISTENTE

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM Nº 7513 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM: DEMOLICION DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH

CIV: 11004595

UBICACIÓN	AREA		AREA INTERNA	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
PLACA CUBIERTA					
K0+029.10 CARGUE Y TAPA - POZO PLUVIAL EXISTENTE	2.27			0.000	2.270
PLACA FONDO					
K0+029.10 PLACA FONDO- POZO PLUVIAL EXISTENTE	2.27			0.000	2.270
PLACA CARCAMO PLUVIAL					
K0+029.10 PLACA FONDO- POZO PLUVIAL EXISTENTE	24.80			0.000	24.80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					29.34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					29.34
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

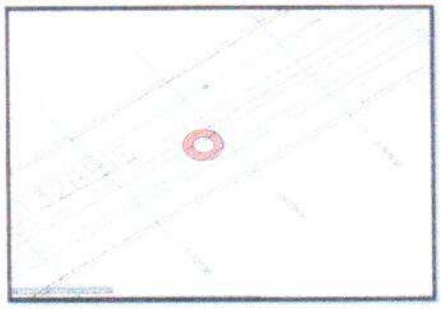

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

K0+029.10 POZO PLUVIAL EXISTENTE

ELABORÓ

Ing Sandra Quintas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Rivadeneira Duarte
Director de interventoría

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 7900 UNIDAD M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11004595

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO		TOTAL
ACTA 2				
K0+003.00 A K0+035.00	32	3,5	-	112,00
A K0+035.00 A K0+061.00	26	3,5	-	91,00
K0+061.50 K0+072.50	11,50	3,7	-	42,55
			TOTAL	245,55
DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA		
K0+030.00 POZO D= 1.70M PLUVIAL	1,00	2,27		2,27
K0+ 64 POZO D= 1 M SANITARIO	1,00	0,95		0,95
K0+034.5 SUMIDERO COSTADO DERECHO	1,00	1,06		1,06
K0+034.5 SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	1,00	1,06		1,06
			TOTAL DESCUENTOS	5,33
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA				240,22
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES				0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				240,22
TOTAL POR EJECUTAR				0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

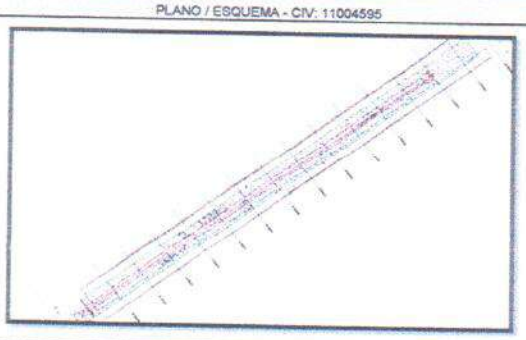

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ENTRE LAS ABSCISAS K0+035.00 A K0+072.5, SE REALIZA DESCUENTO POR POZO SANITARIO EXISTENTE
ENTRE LAS ABSCISAS K0+010.00 A K0+035.00, SE REALIZA DESCUENTO POR POZO PLUVIAL Y SUMIDEROS EXISTENTE

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO FO.EO.04	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSION 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 8350 UNIDAD UN ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCION DEL ITEM YEE PVC SANITARIA D=6"X 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11004595

UBICACIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL
	ACTA 2		
SILLA YEE - TUBERIA DE 6"			
K0+006,00 A K0+008,00	1,0	1,0	1,00
K0+012,20 A K0+014,50	1,0	1,0	1,00
K0+015,50 A K0+017,50	1,0	1,0	1,00
K0+017,00 A K0+020,00	1,0	1,0	1,00
K0+021,50 A K0+024,00	1,0	1,0	1,00
K0+024,00 A K0+026,50	1,0	1,0	1,00
K0+027,00 A K0+029,00	1,0	1,0	1,00
K0+030,50 A K0+033,00	1,0	1,0	1,00
K0+034,50 A K0+036,40	1,0	1,0	1,00
K0+037,00 A K0+039,20	1,0	1,0	1,00
K0+037,50 A K0+039,50	1,0	1,0	1,00
K0+041,50 A K0+044,00	1,0	1,0	1,00
K0+045,00 A K0+046,50	1,0	1,0	1,00
K0+050,30 A K0+053,00	1,0	1,0	1,00
K0+051,80 A K0+053,50	1,0	1,0	1,00
K0+053,50 A K0+056,00	1,0	1,0	1,00
K0+054,00 A K0+057,00	1,0	1,0	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			17,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			17,00
TOTAL POR EJECUTAR			0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

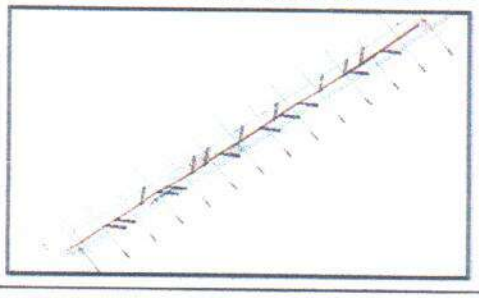

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ENTRE LAS ABSCISAS K0+035,00 A K0+072,5 SE REALIZA DESCUENTO POR POZO SANITARIO EXISTENTE
ENTRE LAS ABSCISAS K0+010,00 A K0+035,00, SE REALIZA DESCUENTO POR POZO PLUVIAL Y SUMIDEROS EXISTENTE

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO: FO-EO-04	PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN: 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 8617 — UNIDAD M3 — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003

CIV: 11004595

UBICACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO		TOTAL
ACTA 2					
SUBBASE GRANULAR					
K0+003.00 A K0+035.00	3.5	32	0.25		28.00
K0+035.00 A K0+061.00	3.5	26	0.25		22.75
K0+061.00 A K0+072.50	3.7	11.5	0.25		10.64
				TOTAL	61.39
DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA	ALTURA		
K0+030.00 POZO D= 1.70M PLUVIAL	1.00	2.27	0.25		0.57
K0+ 64 POZO D= 1 M SANITARIO	1.00	0.95	0.25		0.24
K0+034.5 SUMIDERO COSTADO DERECHO	1.00	1.06	0.25		0.26
K0+034.5 SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	1.00	1.06	0.25		0.26
				TOTAL DESCUENTOS	1.33
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					60.05
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					60.05
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

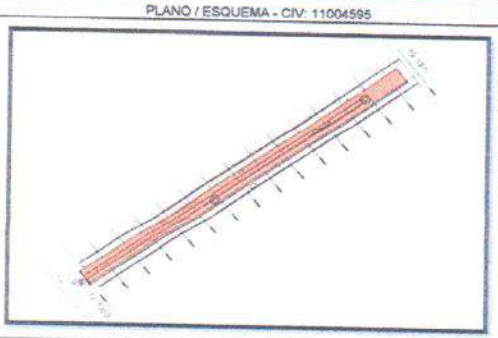

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ENTRE LAS ABSCISAS K0+035.00 A K0+072.5, SE REALIZA DESCUENTO POR POZO SANITARIO EXISTENTE
ENTRE LAS ABSCISAS K0+010.00 A K0+035.00, SE REALIZA DESCUENTO POR POZO PLUVIAL Y SUMIDEROS EXISTENTE

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Pajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO: FO-EO-04	PROCESO: EJECUCION DE OBRAS	VERSION: 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1009 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM Nº NP-8 — UNIDAD M2 — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH

CIV: 11004595

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO		TOTAL
ACTA 2					
K0+003.00 A K0+035.00	32	6.4			204.80
K0+035.00 A K0+072.50	37.5	6.4			240.00
TRASLAPOS					
TRASLAPOS	19.86	0.40			7.94
				TOTAL	452.74
DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA			
K0+030.00 POZO D= 1.70M PLUVIAL	1.00	2.27			2.27
K0+ 64 POZO D= 1 M SANITARIO	1.00	0.95			0.95
K0+034.5 SUMIDERO COSTADO DERECHO	1.00	1.06			1.06
K0+034.5 SUMIDERO COSTADO IZQUIERDO	1.00	1.06			1.06
				TOTAL DESCUENTOS	5.33
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					447.41
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					447.41
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

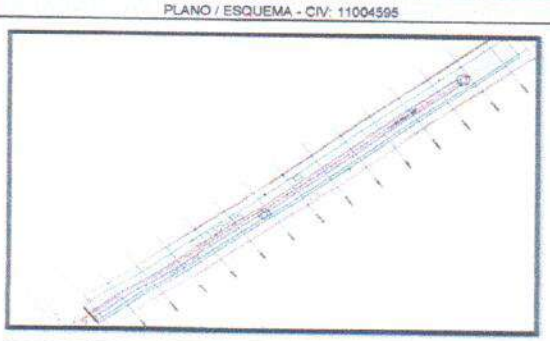

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ENTRE LAS ABSCISAS K0+035.00 A K0+072.5 SE REALIZA DESCUENTO POR POZO SANITARIO EXISTENTE
ENTRE LAS ABSCISAS K0+010.00 A K0+035.00 SE REALIZA DESCUENTO POR POZO PLUVIAL Y SUMIDEROS EXISTENTE

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP-1S UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIDOY CAMPACTACION)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11004595

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	DIAMETRO DE TUBO	DESCUENTO 1/2 TUBO	TOTAL
ACTA 2						
RELLENO RED SANITARIA DE 8"						
K0+000.00 A K0+064.00	64	0.900	0.79			45.50
RELLENO RED DOMICILIARIA 6"						
K0+006.00 A K0+054.00	45.4	0.400	0.48			8.72
RELLENO RED 12"						
K0+000.00 A K0+030.00	29.25	0.900	0.15			3.95
					TOTAL	58.170
DESCUENTOS DE TUBO						
DESCUENTOS DE TUBO 8"	64			0.06	4.14	4.14
DESCUENTOS DE TUBO 6"	48			0.04	1.74	1.74
DESCUENTOS DE TUBO 12"	30			0.15	4.36	4.36
					TOTAL DESCUENTOS	10.24
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						47,93
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						47.93
TOTAL POR EJECUTAR						0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11004595

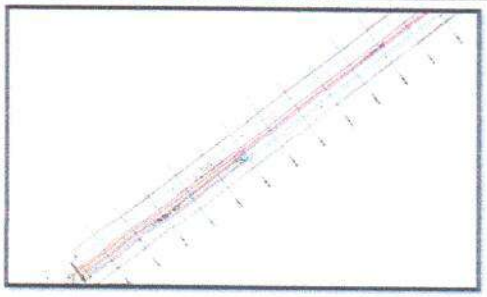

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FECHA			
8	8	2025	CONSORCIO SUBA VIAL VR
DD	MM	AA	NIT: 901484979-1

CONTRATO N° COP 1009-2024

ACTA N° 2

CONTRATO N° 1009-2024

RECIBO PARCIAL

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO".

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogotá D.C , a los 02 días del mes agosto de 2025 , se reunieron FARLEY ANDREA LARRATE BARRERA Representante Legal del Contratista ,EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL Representante legal de la Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del cobro parcial de obra y/o modificaciones del mes del 01 JULIO 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025, según condiciones que se detallan a continuacion

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA No. 2	
		DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT	CANT	VALOR
5	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 41.256,00	423,51	$ 17.472.181,00
6	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	$ 6.665,00	450,91	$ 3.005.328,00
14	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	$ 358.260,00	40,70	$ 14.581.182,00
63	3710	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.171,00	207,66	$ 1.073.817,00
74	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y OC	ML	$ 2.407,00	61,80	$ 148.753,00
119	4262	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.171,00	29,71	$ 153.636,00
142	4848	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	$ 9.403,00	1,47	$ 13.826,00
170	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4 (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 147.462,00	5,54	$ 817.591,00
186	6161	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	$ 12.285,00	98,20	$ 1.083.537,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP-1	7892	EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)	HR	$ 390.539,00	13,00	$ 5.077.007,00
NP 2	6567	CARROTANTE IRRIGADOR DE AGUA HORA	HR	$ 107.100,00	13,00	$ 1.392.300,00
NP-15		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIDOY CAMPACTACIÓN)	M3	$ 115.955,00	6,79	$ 787.685,00
		SUBTOTAL				$ 45.606.843,00
COMPONENTES						
		COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,16% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 429.656.286,00	5,1634%		$ 2.354.864,00
		COMPONENTE SOCIAL (4,72% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 392.475.337,00	4,7167%		$ -
		COMPONENTE PMT (3,11% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 258.663.298,00	3,1085%		$ 73.201,00
		SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA				$ 2.428.065,00
		SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	$ 380.554.609,00			
		PROVISION ATENCIÓN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. 8,054%	$ 670.208.055,00			
		PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA. 4,950%	$ 411.890.515,00			
		AJUSTE POR DECIMALES	1,00			
A.I.U						
		ADMINISTRACIÓN	25,33%			$ 11.552.213,00
		IMPREVISTO	1,00%			
		UTILIDAD	4,00%			$ 1.824.274,00
		TOTAL A.I.U	30,33%			$ 13.376.487,00
		TOTAL OBRA				$ 61.411.395,00
		TOTAL A FACTURAR ACTA N° 1 CIV 11002757				

195

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO		VERSIÓN
FO-CI-004	EJECUCIÓN DE OBRAS		1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No: 1099 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (UPR Y ITEN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No: 2 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE: 1/07/2025 HASTA: 31/07/2025

ITEM N°: 3012 UNIDAD: M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN DEL ITEM: TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM) A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (40 M), EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 063

CIV: 11002757

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	DESCUENTO	VOLUMEN M3	EXPANSION	TOTAL
ACTA 2								
TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)								
KD+112.80 A KD+064	48.80	9.24	0.47	211.93	4.21	207.72	30	269.90
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO				ALTO	EXPANSION	TOTAL
TRANSPORTE DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE, INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES								
KD+064.00 A KD+112.80	48.80	9.24				0.20	1.30	117.24
TRANSPORTE EXCAVACION MECANICA RED PLUVIAL								
KD+68 A KD+025	7.00	1.00				0.65	1.30	5.92
KD+076.30 A KD+110	33.70	1.00				0.65	1.30	28.46
DEMOLICIÓN RED PLUVIAL DE 14"	PERIMETRO							
KD+68 A KD+025	7.00	1.45				0.025	1.30	0.03
KD+076.30 A KD+110	33.70	1.45				0.025	1.30	1.59
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA								423.51
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES								0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO								423.51
TOTAL POR EJECUTAR								0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002757



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES:
VER DESCUENTO DE 4.2" EN EL ITEM 3710
PARA LOS ITEMS QUE APLICAN DESCUENTOS LA FORMULA SE ENCUENTRA DETERMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
LARGO*ANCHO*ALTO = CANTIDAD
CANTIDAD DESCUENTO*TOTAL AL CUAL DESCUENTO

ELABORÓ: Ingrid Sandra Cuestas Tejada — Directora obra

REVISÓ: Ing Edison Ricardo Duarte — Director de interventoría

106

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EC-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 **DE**

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ITEM N° 3021 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACION TECNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ITEM DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002757

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
K0+064.00 A K0+112.80	48.8	9.24		450.912	450.912
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**450.912**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					450.91
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV. 11002757

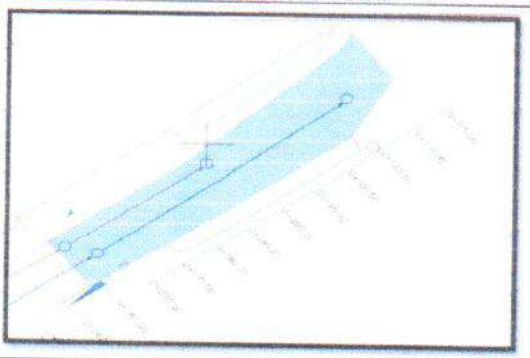

FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 3047 UNIDAD ML ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCION DEL ITEM: TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 303

CIV: 11002757

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO		TOTAL
ACTA 2					
K0+68 A K0+075	7.00				7.00
K0+076,30 A K0+110	33.70				33.70
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					40,70
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					40.70
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002757

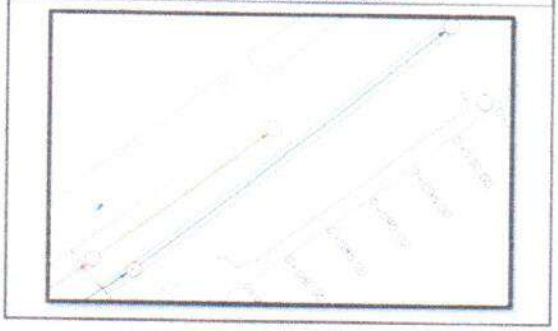

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

PP

Ing Sandra Cuestas Pajarito
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSION
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1039 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 3710 UNIDAD M3 ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCION DEL ITEM EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL JR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11002757

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO		TOTAL
ACTA 2					
K0+112.80 A K0+064	48.80	9.24	0.47		211.93
				TOTAL	211.93
DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA			
K0+067.70 POZO D= 1.70M	4.00	2.27	0.47	4.27	4.27
				TOTAL DESCUENTO	4.27
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					207.66
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					207.661
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002757

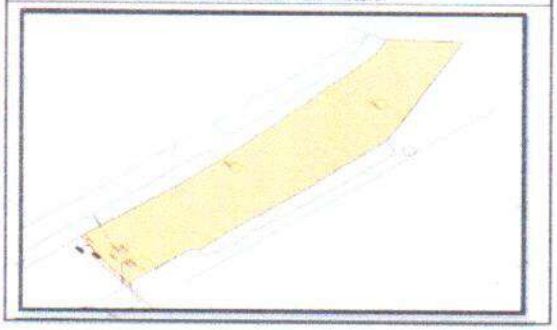

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuellas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO: FO-EO-04	PROCESO: EJECUCION DE OBRAS	VERSION: 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TECNICA

CONTRATO No: 1009 DE: 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No: 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE: 1/07/2025 HASTA: 31/07/2025

ITEM N°: 3811 UNIDAD: ML ESPECIFICACION TECNICA:

DESCRIPCIÓN DEL ITEM: CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH


CIV: 11002757

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
CORTE DE PAVIMENTO EMPALMES					
K0+112.8	8.70			8.70	8.70
K0+074.20.00 A K0+103.30 DERECHO	29.10			29.10	29.10
K0+064.00 A K0+088.00 IZQUIERDO	24.00			24.00	24.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					61.80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					61.80
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV. 11002757

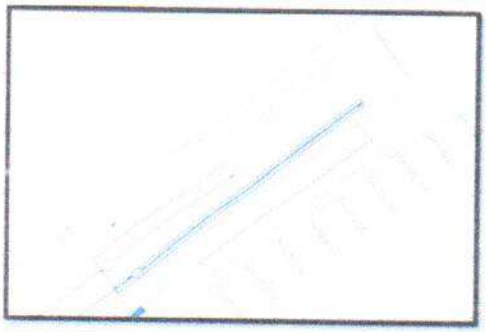

FOTOGRAFÍA

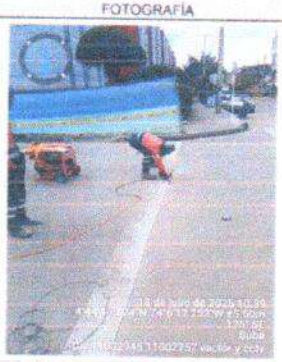

OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

Sabana

CARTERAS INSTALACION TUBERIA Plubial

FECHA:

BARRIO:

CIV:

ESPECIFICACION — MATERIAL: PVC

PULGADAS: 18"

EQUIPO: — MARCA: — No:

BM 50.012 — V (+) 0.539 — Alt inst 50.551

ABSC	POZO	DISTANCIA	COTA EXC	LECTURA	COTA LOMO	LECTURA	COTA LLENO	LECTURA
Ko+068	2	37.95	49.103		49.081	1.47		
					49.070	1.481		
					49.052	1.499		
					49.034	1.517		
					49.016	1.535		
					48.998	1.553		
					48.980	1.571		
Ko+106.00			49.163		48.962	1.589		

TERRENO

ESQUEMAS

Rasso

John Tobo

exc tubo — EXC Sobre — Dif

Ko+063 — 48.461 — 49.103 — 0.642

Ko+106 — 48.342 — 49.163 — 0.821

0.732 m

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCION DE OBRAS	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 4262 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCION DEL ITEM EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11002757

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
EXCAVACION MECANICA RED PLUVIAL 18"					
K0+68 A K0+075	7.00	1	0.73		5.11
K0+076.30 A K0+110	33.70	1	0.73		24.60
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					29.71
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					29.711
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002757

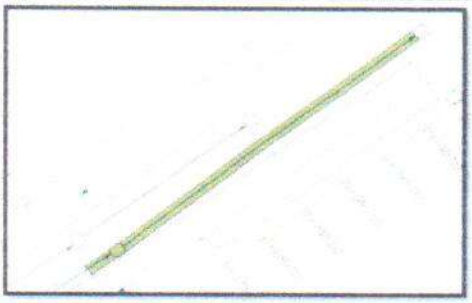

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-ED-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 — HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 4848 — UNIDAD ML — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCION DEL ÍTEM: DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø = 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB Y CARGUE)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003

CIV: 11002757

UBICACIÓN	LARGO	PERIMETRO	ESPESOR TUBO (M)	TOTAL
ACTA 2				
DEMOLICIÓN CARCAMO Y RED PLUVIAL 18"				
K0+68 A K0+075	7.00	1.45	0.025	0.25
K0+078.30 A K0+110	33.70	1.45	0.025	1.22
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA				1.47
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES				0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				1.470
TOTAL POR EJECUTAR				0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002757

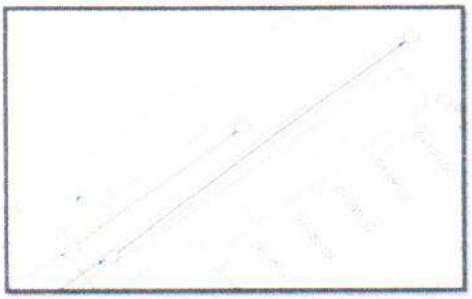

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cristina Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 5412 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11002757

UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO 1/2 TUBO	VOLUMEN	TOTAL
			ACTA 2			
RELLENO RED PLUVIAL 18"						
K0+68 A K0+075	7.00	1	0.38			2.66
K0+076.30 A K0+110	33.70	1	0.38			12.81
					TOTAL	15.47
DESCUENTO						
K0+68 A K0+075 TUBERIA DE 18"	26			0.166	4.321	4.32
K0+076.30 A K0+110 TUBERIA DE 18"	33.70			0.166	5.601	5.60
					TOTAL DESCUENTO	9.92
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						**5.54**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						5.54
TOTAL POR EJECUTAR						0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002757

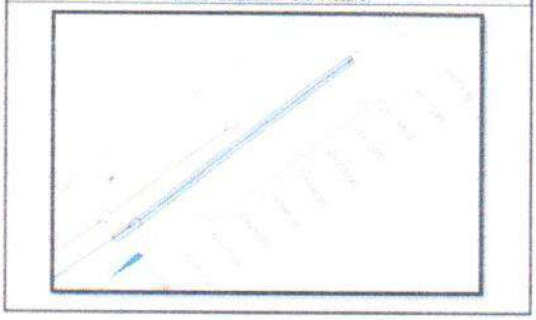

FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing. Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO.EO.04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 (Número de contrato) DE 2024 (Año de contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITAROS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO.

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 6161 UNIDAD Ml ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36"


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH

CIV: 11002757

UBICACIÓN	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2			
POZO 1 A FIN DE TUBAERIA	29.00		29.000
POZO 1 A POZO 1	59.20		59.200
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			88,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			88.20
TOTAL POR EJECUTAR			0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV 11002757



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Pajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria


PARQUE MAQUINARIA
Bogotá D.C
Tel. 3112549504
marc.pintro@gmail.com

Resumen de la Inspección de Colectores - 16/07/2025 - 24/07/2025 11:23:17

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia de Segmento	No.
16/07/2025			**24/07/2025 11:23:17 a. m.**	**1**
Nombre del proyecto			Inspeccionado Por	Numero de orden
2025_07_24 CIV 11072757			**JESUS RAMOS**	**02**

Ciudad	**BOGOTA**	No. Pozo Aguas Arrib.	**PZ 1**	**0**
Calle	**TV 127C X No 139A-19 / N139A-75**		**NOD**	Longitud Total [mi] **59,20**
Código de Ubicac.		No. Pozo Aguas Abajo	**PZ 2**	Longitud Inspeccionada **59,20**
			NOD	Año Construcción

Perfil	**Circular 200mm**	Objetivo	**Inspección Previa a una Rehabilitación**
		Metodo de inspección	
Uso	**Sanitario/Agua Residual/Agua Negra**	Dirección	**Aguas Abajo**
		Limpieza Previa	**Limpieza ligera**
Material	**Tubo de Arcilla Vitrificada**	Información Adicional	



1:136	m +	PACP Code	Observation	Counter	Photo	Grade
	0.00	AMH	Pozo de Acceso / INICIO DE INSPECCION			
	0.00	MWL	Nivel del Agua, nivel de agua 0%	00:00:00		
	1.00	JSL	Junta Separada Grande	00:02:39	24_07_2025 11_23_17	4
	1.20	CL	Grieta Longitudinal en 2 en punto	00:02:51	24_07_2025 11_23_17	2
	1.20	TFD	Acometida de Fábrica Defectuosa en 10 en punto, 150mm dia	00:03:25	24_07_2025 11_23_17	3
	2.20	JOL	Junta Desplazada Grande, 100mm	00:04:23	24_07_2025 11_23_17	4
	5.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:04:59	24_07_2025 11_23_17	3
	5.50	TFA	Acometida de Fábrica Actividad en 10 en punto, 150mm dia	00:05:47	24_07_2025 11_23_17	
	8.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:06:27	24_07_2025 11_23_17	3
	8.70	CL	Grieta Longitudinal en 1 en punto	00:06:43	24_07_2025 11_23_17	2
	9.70	JSM	Junta Separada Mediana	00:07:27	24_07_2025 11_23_17	3
	9.70	CL	Grieta Longitudinal en 8 en punto	00:07:47	24_07_2025 11_23_17	2
	11.40	TFD	Acometida de Fábrica Defectuosa en 10 en punto, 150mm dia	00:08:25	24_07_2025 11_23_17	3
	12.70	JSM	Junta Separada Mediana	00:08:50	24_07_2025 11_23_17	3
	14.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:09:34	24_07_2025 11_23_17	3
	14.10	CL	Grieta Longitudinal en 10 en punto	00:10:02	24_07_2025 11_23_17	2

PARQUE MAQUINARIA
Bogotá D.C
Tel. 3112549504
maic.pinro@gmail.com

Resumen de la Inspección de Colectores - 16/07/2025 - 24/07/2025 11:23:17

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia de Segmento	No.
16/07/2025			24/07/2025 11:23:17 a. m.	1
Nombre del proyecto			Inspeccionado Por	Numero de orden
2025_07_24 CIV 11072757			JESUS RAMOS	02




1:136 m +	PACP Code	Observation	Counter	Photo	Grade
17.20	JSM	Junta Separada Mediana	00:10:53	24_07_2025 11_23_17	3
17.20	CL	Grieta Longitudinal en 10 en punto	00:11:17	24_07_2025 11_23_17	2
17.40	TFD	Acometida de Fábrica Defectuosa en 10 en punto, 150mm dia	00:11:54	24_07_2025 11_23_17	3
17.50	CL	Grieta Longitudinal en 12 en punto	00:12:21	24_07_2025 11_23_17	2
20.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:12:47	24_07_2025 11_23_17	3
20.10	CL	Grieta Longitudinal en 12 en punto	00:13:04	24_07_2025 11_23_17	2
21.70	JSM	Junta Separada Mediana	00:13:41	24_07_2025 11_23_17	3
23.40	TFD	Acometida de Fábrica Defectuosa en 10 en punto, 150mm dia	00:14:31	24_07_2025 11_23_17	3
26.20	JSM	Junta Separada Mediana	00:15:31	24_07_2025 11_23_17	3
29.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:16:09	24_07_2025 11_23_17	3
29.10	CL	Grieta Longitudinal en 10 en punto	00:16:35	24_07_2025 11_23_17	2
29.30	TFA	Acometida de Fábrica Actividad en 10 en punto, 150mm dia	00:17:14	24_07_2025 11_23_17	
30.60	JSM	Junta Separada Mediana	00:17:40	24_07_2025 11_23_17	3
33.60	JSM	Junta Separada Mediana	00:18:22	24_07_2025 11_23_17	3
33.60	SAP	Superficie Agregado Protuberante en 11 en punto	00:18:37	24_07_2025 11_23_17	3
35.40	TFA	Acometida de Fábrica Actividad en 10 en punto, 150mm dia	00:19:19	24_07_2025 11_23_17	
38.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:19:53	24_07_2025 11_23_17	3
38.10	CL	Grieta Longitudinal en 10 en punto	00:20:15	24_07_2025 11_23_17	2
39.60	JSM	Junta Separada Mediana	00:20:40	24_07_2025 11_23_17	3
41.30	VR	Alimañas Rata, 1	00:21:16	24_07_2025 11_23_17	2
41.40	TFA	Acometida de Fábrica Actividad en 10 en punto, 150mm dia	00:21:49	24_07_2025 11_23_17	

PARQUE MAQUINARIA
Bogota D.C
Tel. 3112549504
maic.pinro@gmail.com

Resumen de la Inspección de Colectores - 16/07/2025 - 24/07/2025 11:23:17

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia de Segmento	No.
16/07/2025			24/07/2025 11:23:17 a. m.	1
Nombre del proyecto			Inspeccionado Por	Número de orden
2025_07_24 CIV 11072757			JESUS RAMOS	02



m +	PACP Code	Observation	Counter	Photo	Grade
42.70	CL	Grieta Longitudinal en 10 en punto	00:22:20	24_07_2025 11_23_17	2
44.10	JOL	Junta Desplazada Grande, 1mm	00:23:12	24_07_2025 11_23_17	4
44.10	CL	Grieta Longitudinal en 11 en punto	00:23:36	24_07_2025 11_23_17	2
45.70	JSM	Junta Separada Mediana	00:23:58	24_07_2025 11_23_17	3
47.40	TFD	Acometida de Fábrica Defectuosa en 10 en punto, 150mm dia	00:24:48	24_07_2025 11_23_17	3
48.60	JSM	Junta Separada Mediana	00:25:20	24_07_2025 11_23_17	3
51.60	JSM	Junta Separada Mediana	00:28:34	24_07_2025 11_23_17	3
53.30	TFA	Acometida de Fábrica Actividad en 10 en punto, 150mm dia	00:29:12	24_07_2025 11_23_17	
57.40	JSM	Junta Separada Mediana	00:30:10	24_07_2025 11_23_17	3
59.20	AMH	Pozo de Acceso / fin de inspeccion	00:31:07	24_07_2025 11_23_17	

QSR	QMR	QOR	SPR	MPR	OPR	SPRI	MPRI	OPRI
433B	3521	433C	91.0	17.0	108.0	2.8	2.8	2.8

PARQUE MAQUINARIA
Bogota D.C
Tel. 3112549504
maic.pintro@gmail.com

Resumen de la Inspección de Colectores - 17/07/2025 - 18/07/2025 12:49:26

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia de Segmento	No.
17/07/2025	Saturno		18/07/2025 12:49:26 p. m.	1
Nombre del proyecto			Inspeccionado Por	Numero de orden
2025_07_18 CIV 11002757			ANTONIO MORALES	01

Ciudad	BOGOTA	No. Pozo Aguas Arrib.	PZ 1	0
Calle	TV 127C X No 139A-49 / No 139A-75		NOD	Longitud Total [m] 29,00
Código de Ubicac		No. Pozo Aguas Abaj.	PZ 2	Longitud Inspeccionada 29,00
			NOD	Año Construcción

Perfil	Circular 450mm	Objetivo	Inspección Previa a una Rehabilitación
		Método de inspección	
Uso	Pluvial/Agua Lluvia	Dirección	Aguas Abajo
		Limpieza Previa	Limpieza ligera
Material	Tubo de Concreto Reforzado	Información Adicional	



1:214	m +	PACP Code	Observation	Counter	Photo	Grade
	0.00	AMH	Pozo de Acceso / INICIO DE INSPECION			
	0.00	MWL	Nivel del Agua, nivel de agua 0%	00:00:00		
	10.00	JOM	Junta Desplazada Mediana	00:04:02	18_07_2025 12_49_26	3
	22.40	SAP	Superficie Agregado Protuberante en 12 en punto	00:06:50	18_07_2025 12_49_26	3
	29.00	AMH	Pozo de Acceso / FIN DE INSPECCION	00:08:40	18_07_2025 12_49_26	
	29.00		Fin de la Tubería			

QSR	QMR	QOR	SPR	MPR	OPR	SPRI	MPRI	OPRI
3200	0000	3200	6.0	0.0	6.0	3.0	0.0	3.0

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP-1 UNIDAD HR ESPECIFICACIÓN TECNICA

DESCRIPCION DEL ITEM EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002757

UBICACIÓN	HORAS	FECHA	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2				
K0+064.00 K0+120.60	5.00	16/07/2025		5.00
K0+064.00 K0+120.60	3.00	17/07/2025		3.00
K0+064.00 K0+120.60	5.00	18/07/2025		5.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA				13.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES				2.43
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				15.43
TOTAL POR EJECUTAR				0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002757



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITAROS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° NP 2 UNIDAD HR ESPECIFICACIÓN TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CARROTANTE IRRIGADOR DE AGUA HORA


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002757

UBICACIÓN	HORAS	FECHA	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2				
K0+064.00 K0+120.60	5.00	16/07/2025		5.00
K0+064.00 K0+120.60	3.00	17/07/2025		3.00
K0+064.00 K0+120.60	5.00	18/07/2025		5.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA				13.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES				0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				13.00
TOTAL POR EJECUTAR				0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV. 11002757



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edson Ricardo Duarte
Director de interventoria

FECHA			CONSORCIO SUBA VIAL VR	BOGOTÁ
8	8	2025	NIT: 901484979-1	
DD	MM	AA		

CONTRATO N° COP 1009-2024

ACTA N° 2

CONTRATO N° 1009-2024

RECIBO PARCIAL

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO".

CONTRATISTA — CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA — CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogotá D.C., a los 02 días del mes agosto de 2025, se reunieron FARLEY ANDREA LARRATE BARRERA, Representante Legal del Contratista ,EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL, Representante legal de la Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del cobro parcial de obra y/o modificaciones del mes del 01 JULIO 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025, según condiciones que se detallan a continuación:

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT	ACTA No. 2 CANT	VALOR
5	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	$ 41.256,00	505,47	$ 20.853.864,00
6	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE, INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	$ 6.665,00	552,05	$ 3.679.413,00
14	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 358.260,00	26,00	$ 9.314.760,00
53	3710	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.171,00	258,40	$ 1.336.169,00
74	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y (	ML	$ 2.407,00	96,70	$ 232.757,00
118	4262	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.171,00	13,00	$ 67.223,00
142	4848	DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	$ 9.403,00	26,00	$ 244.478,00
170	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3	$ 147.462,00	7,72	$ 1.138.336,00
186	6161	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	$ 12.285,00	20,60	$ 253.071,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP-1	7892	EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)	HR	$ 390.539,00		$
NP-2	6567	CARROTANTE IRRIGADOR DE AGUA HORA	HR	$ 107.100,00		$
NP-15		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIDOY CAMPACTACIÓN)	M3	$ 115.955,00	4,34	$ 503.189,00
		SUBTOTAL				$ 37.823.260,00

COMPONENTES			
COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,16% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 429.656.286,00	5,1634%	$ 1.942.639,00
COMPONENTE SOCIAL (4,72% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 392.475.337,00	4,7167%	$
COMPONENTE PMT (3,11% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 258.663.298,00	3,1085%	$ 60.387,00
SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA			$ 2.003.026,00
SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS	$ 380.554.609,00		
PROVISIÓN ATENCION REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 8,054%	$ 670.208.055,00		
PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA: 4,950%	$ 411.890.515,00		
AJUSTE POR DECIMALES	1,00		

A.I.U		
ADMINISTRACIÓN	25,33%	$ 9.529.972,00
IMPREVISTO	1,00%	$ 1.504.930,00
UTILIDAD	4,00%	$ 11.034.902,00
TOTAL A.I.U	30,33%	
TOTAL OBRA		$ 50.861.188,00
TOTAL A FACTURAR ACTA N° 1 CIV 11002945		

214

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO.EO.04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° NP:15 — UNIDAD M3 — ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM: RELLENO PARA REDES EN SUBBASE B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003

CIV: 11002757

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	TOTAL
ACTA 2					
RELLENO RED PLUVIAL 18"					
K0+68 A K0+675	7.00	1	0.25	0.083	1.17
K0+676.30 A K0+110	33.70	1	0.25	0.083	5.62
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					6.79
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					6.79
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV 11002757

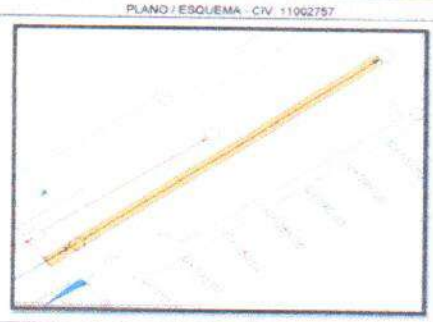

FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoría

FECHA			CONSORCIO SUBA VIAL VR	BOGOTÁ
D	D	2025	NIT. 901484979-1	
DD	MM	AA		

CONTRATO N° CDP 1009-2024
ACTA N° 2

RECIBO PARCIAL

CONTRATO N° 1009-2024

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA: CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogotá D.C. a los 02 días del mes agosto de 2025 se reunieron FARLEY ANDREA LARRATE BARRERA Representante legal del Contratista, EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL Representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del corte parcial de obra y/o modificaciones del mes del 01 JULIO 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025, según condiciones que se detallan a continuación:

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA No. 2	
		DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT	CANT	VALOR
9	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	$ 41.256,00	920,47	$ 20.850.864,00
5	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE, INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES	M2	$ 6.665,00	562,05	$ 3.679.413,00
14	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADA/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	$ 358.280,00	26,00	$ 9.314.760,00
62	3710	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.171,00	258,42	$ 1.336.169,00
74	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y A	ML	$ 2.467,00	94,70	$ 233.657,00
116	4042	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.171,00	13,00	$ 67.223,00
141	4848	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø< 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE ROTO B Y CARGUE)	ML	$ 9.403,00	26,00	$ 244.478,00
170	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)	M3	$ 147.462,00	7,72	$ 1.138.336,00
186	6721	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	$ 12.285,00	20,60	$ 253.071,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP 1	7892	EQUIPO VACTOR SONDEO LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye agua)	HR	$ 390.539,00		$
NP 2	6567	CARROTANTE IRRIGADOR DE AGUA HORA	HR	$ 107.100,00		$
NP 15		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 115.955,00	4,34	$ 503.189,00
		SUBTOTAL				$ 37.623.260,00
COMPONENTES						
		COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,16% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 427.892.280,00	5,1654%		$ 1.542.539,00
		COMPONENTE SOCIAL (4,72% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 392.475.337,00	4,7167%		$
		COMPONENTE PMT (3,11% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 258.663.208,00	3,1085%		$ 60.387,00
		SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA				$ 2.003.026,00
		SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO	$ 860.564.609,00			
		PROVISION ATENCION REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 8,264%	$ 670.208.265,00			
		PROVISION POR CAMBIO DE VIGENCIA 4,950%	$ 411.890.515,00			
		AJUSTE POR DECIMALES	1,00			
A.I.U						
		ADMINISTRACION	25,33%			$ 9.529.972,00
		IMPREVISTO	1,00%			
		UTILIDAD	4,00%			$ 1.504.930,00
		TOTAL A.I.U	30,33%			$ 11.034.902,00
		TOTAL OBRA				
		TOTAL A FACTURAR ACTA N° 1 CIV 11092945				$ 50.661.188,00

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO FO.EO.04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 3017 UNIDAD M3 ESPECIFICACION TÉCNICA

DESCRIPCION DEL ITEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM) A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11002945

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL CON DESCUENTO	EXPANSION	TOTAL
ACTA 2								
TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)								
K0+003.00 A K0+064.00	61.00	9.05	0.47	259.46	1.07	258.40	1.30	335.92
TRANSPORTE DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE, INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES								
K0+064.00 A K0+003.000	61	9.05	0.2				1.300	143.533
TRANSPORTE EXCAVACION MECANICA RED PLUVIAL								
K0+036.00 A K0+064	28	1	0.65				1.300	21.970
DEMOLICION CARCAMO DE RED PLUVIAL								
K0+106.00 A K0+064	28	1	0.12				1.300	4.056
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA								505.47
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES								0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO								505.47
TOTAL POR EJECUTAR								0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV 11002945



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

VER DESCUENTO PARA TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) ITEM 3710 DE 2.27 M3

ELABORO

PP

Ing.Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing.Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO: FO-EO-04	PROCESO: EJECUCION DE OBRAS	VERSION: 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 (Número de contrato) **DE** _____

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ITEM N° 3021 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ITEM DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE, INCLUYE CARGUE) NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002945

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
K0+064.00 A K0+003.000	61	9.05		552.050	552.050
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**552.050**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					552.05
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002945

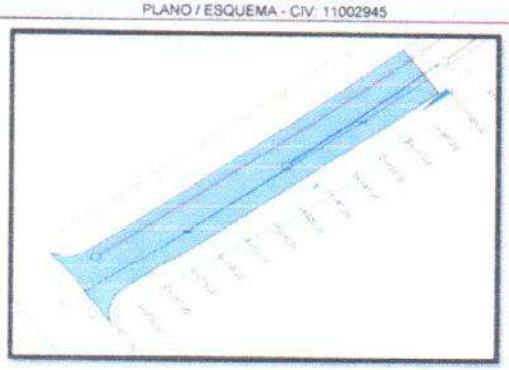

FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cbestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edisun Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1009 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/07/2025 **HASTA** 31/07/2025

ÍTEM N° 3047 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT.CORRUGADO/INT.LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11002945

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO		TOTAL
ACTA 2					
K0+038.00 A K0+064.00	26.00				26.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					26.0
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					26.000
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002945



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Firma: P.F

Nombre: Ing Sandra Cuestas Fajardo

Cargo: Directora obra

Fecha:

Empresa:

Profesión:

Dirección y teléfono de contacto:

REVISÓ

Firma:

Nombre: Ing Edison Ricardo Duarte

Cargo: Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM Nº 3710 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11002945

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	TOTAL
ACTA 2					
K0+003.00 A K0+064.00	61.00	9.65	0.47		259.46
				TOTAL	259.46
DESCUENTOS	CANTIDAD	AREA			
K0+067.70 POZO Ø= 1.70M	1.00	2.27	0.47		1.07
				TOTAL DESCUENTO	1.07
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					258.40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					258.397
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002945

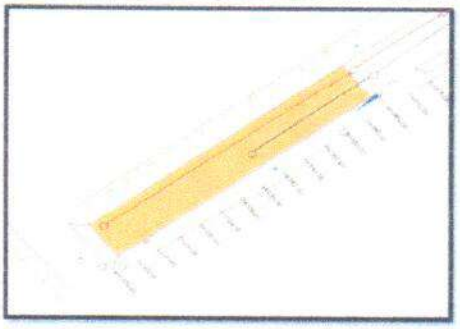

FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Rajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 3811 UNIDAD ML ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: CORTE DE PAVIMENTO INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH

CIV: 11002945

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
CORTE DE PAVIMENTO EMPALMES					
K0+003.00	9.05			9.05	9.05
K0+011.20 A K0+064.00 IZQUIERDO	52.80			52.80	52.80
K0+011.85 A K0+046.70 DERECHO	34.85			34.85	34.85
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					96.70
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					96.70
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002945

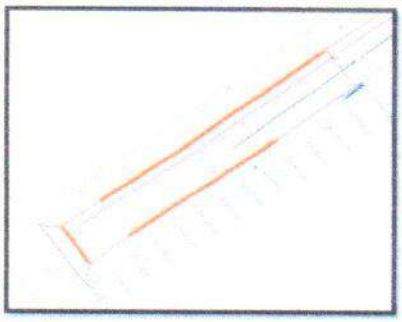

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-ED-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1), EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 4262 UNIDAD M3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11002945

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2					
EXCAVACION MECANICA RED PLUVIAL de 18"					
K0+038.00 A K0+064	26	1	0.5	0.600	13.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					12.99
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					13.000
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002945

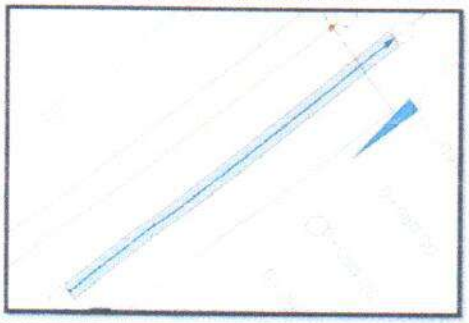

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Suestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Jose Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

Solarna

CARTERAS INSTALACION TUBERIA Plubial

FECHA:

BARRIO:

CIV:

ESPECIFICACION | MATERIAL: PVC

PULGADAS: 18"

EQUIPO: | MARCA: | No:

BM 50.012 | V(+) 1.125 | Alt inst 51.137

ABSC	POZO	DISTANCIA	COTA EXC	LECTURA	COTA LOMO	LECTURA	COTA LLENO	LECTURA
Ko+039	1	24			49.352	1.785		
					49.304	1.833		
					49.256	1.881		
					49.209	1.929		
Ko+063.00					49.160	1.977		

ESQUEMAS

Rausa

John Herrera

Exc Lleno Exc Sub. TV

Ko + 039 48.232. 49.127 0.392 > 0.50m

Ko + 063 48.590 49.139 0.60

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO: FO-EG-04	PROCESO: EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN: 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 5412 — UNIDAD M3 — ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: RELLENO EN TRITURADO DE 3/4 (INCLUYE TRANSPORTE SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003

CIV: 11002945

UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO		TOTAL
ACTA 2					
RELLENO RED PLUVIAL 18"					
K0+038.00 A K0+064	26	1	0.15		3.90
K0+038.00 A K0+064	26	0.23	1.00		5.98
				TOTAL	9.88
DESCUENTO					
TUBERIA DE 18"	26	1	0.08		2.16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					7.72
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					7.72
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002945

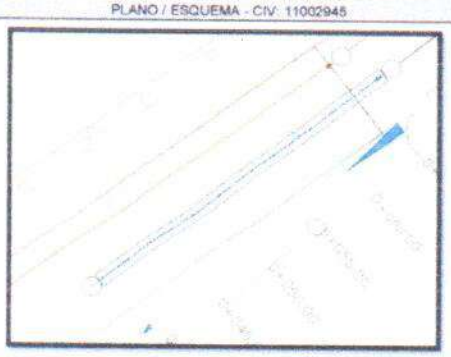

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Sajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° 5161 UNIDAD ML ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH

CIV 11002945

UBICACIÓN	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 2			
POZO 1 A POZO 2	20,60		20,60
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA			20,60
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			20,60
TOTAL POR EJECUTAR			0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002945



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Suestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria


PARQUE MAQUINARIA
Bogota D.C
Tel. 3112549504
malc.pintro@gmail.com

Resumen de la Inspección de Colectores - 16/07/2025 - 24/07/2025 11:23:17

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia de Segmento	No.
16/07/2025			24/07/2025 11:23:17 a. m.	1
Nombre del proyecto			Inspeccionado Por	Numero de orden
2025_07_24 CIV 11072757			JESUS RAMOS	02

Ciudad	BOGOTA	No. Pozo Aguas Arrib.	PZ 1	0
Calle	TV 127C X No 139A-19 / N139A-75		NOD	Longitud Total [m] 59,20
Código de Ubicac.		No. Pozo Aguas Abajo	PZ 2	Longitud Inspeccionada 59,20
			NOD	Año Construcción

Perfil	Circular 200mm	Objetivo	Inspección Previa a una Rehabilitación
		Método de inspección	
Uso	Sanitario/Agua Residual/Agua Negra	Dirección	Aguas Abajo
		Limpieza Previa	Limpieza ligera
Material	Tubo de Arcilla Vitrificada	Información Adicional	




1:136	m +	PACP Code	Observation	Counter	Photo	Grade
	0.00	AMH	Pozo de Acceso / INICIO DE INSPECCION			
	0.00	MWL	Nivel del Agua, nivel de agua 0%	00:00:00		
	1.00	JSL	Junta Separada Grande	00:02:39	24_07_2025 11_23_17	4
	1.20	CL	Grieta Longitudinal en 2 en punto	00:02:51	24_07_2025 11_23_17	2
	1.20	TFD	Acometida de Fábrica Defectuosa en 10 en punto, 150mm dia	00:03:25	24_07_2025 11_23_17	3
	2.20	JOL	Junta Desplazada Grande, 100mm	00:04:23	24_07_2025 11_23_17	4
	5.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:04:59	24_07_2025 11_23_17	3
	5.50	TFA	Acometida de Fábrica Actividad en 10 en punto, 150mm dia	00:05:47	24_07_2025 11_23_17	
	8.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:06:27	24_07_2025 11_23_17	3
	8.70	CL	Grieta Longitudinal en 1 en punto	00:06:43	24_07_2025 11_23_17	2
	9.70	JSM	Junta Separada Mediana	00:07:27	24_07_2025 11_23_17	3
	9.70	CL	Grieta Longitudinal en 8 en punto	00:07:47	24_07_2025 11_23_17	2
	11.40	TFD	Acometida de Fábrica Defectuosa en 10 en punto, 150mm dia	00:08:25	24_07_2025 11_23_17	3
	12.70	JSM	Junta Separada Mediana	00:08:50	24_07_2025 11_23_17	3
	14.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:09:34	24_07_2025 11_23_17	3
	14.10	CL	Grieta Longitudinal en 10 en punto	00:10:02	24_07_2025 11_23_17	2

PARQUE MAQUINARIA
Bogotá D.C
Tel: 3112549504
maic.pinto@gmail.com

Resumen de la Inspección de Colectores - 16/07/2025 - 24/07/2025 11:23:17

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia de Segmento	No.
16/07/2025			24/07/2025 11:23:17 a. m.	1
Nombre del proyecto			Inspeccionado Por	Número de orden
2025_07_24 CIV 11072757			JESUS RAMOS	02




m +	PACP Code	Observation	Counter	Photo	Grade
17.20	JSM	Junta Separada Mediana	00:10:53	24_07_2025 11_23_17	3
17.20	CL	Grieta Longitudinal en 10 en punto	00:11:17	24_07_2025 11_23_17	2
17.40	TFD	Acometida de Fábrica Defectuosa en 10 en punto, 150mm diá	00:11:54	24_07_2025 11_23_17	3
17.50	CL	Grieta Longitudinal en 12 en punto	00:12:21	24_07_2025 11_23_17	2
20.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:12:47	24_07_2025 11_23_17	3
20.10	CL	Grieta Longitudinal en 12 en punto	00:13:04	24_07_2025 11_23_17	2
21.70	JSM	Junta Separada Mediana	00:13:41	24_07_2025 11_23_17	3
23.40	TFD	Acometida de Fábrica Defectuosa en 10 en punto, 150mm diá	00:14:31	24_07_2025 11_23_17	3
26.20	JSM	Junta Separada Mediana	00:15:31	24_07_2025 11_23_17	3
29.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:16:09	24_07_2025 11_23_17	3
29.10	CL	Grieta Longitudinal en 10 en punto	00:16:35	24_07_2025 11_23_17	2
29.30	TFA	Acometida de Fábrica Actividad en 10 en punto, 150mm diá	00:17:14	24_07_2025 11_23_17	
30.60	JSM	Junta Separada Mediana	00:17:40	24_07_2025 11_23_17	3
33.60	JSM	Junta Separada Mediana	00:18:22	24_07_2025 11_23_17	3
33.60	SAP	Superficie Agregado Protuberante en 11 en punto	00:18:37	24_07_2025 11_23_17	3
35.40	TFA	Acometida de Fábrica Actividad en 10 en punto, 150mm diá	00:19:19	24_07_2025 11_23_17	
38.10	JSM	Junta Separada Mediana	00:19:53	24_07_2025 11_23_17	3
38.10	CL	Grieta Longitudinal en 10 en punto	00:20:15	24_07_2025 11_23_17	2
39.60	JSM	Junta Separada Mediana	00:20:40	24_07_2025 11_23_17	3
41.30	VR	Alimañas Rata, 1	00:21:16	24_07_2025 11_23_17	2
41.40	TFA	Acometida de Fábrica Actividad en 10 en punto, 150mm diá	00:21:49	24_07_2025 11_23_17	

PARQUE MAQUINARIA
Bogotá D.C
Tel: 3112549504
marc.pinto@gmail.com

Resumen de la Inspección de Colectores - 16/07/2025 - 24/07/2025 11:23:17

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia de Segmento	No.
16/07/2025			24/07/2025 11:23:17 a. m.	1
Nombre del proyecto			Inspeccionado Por	Numero de orden
2025_07_24 CIV 11072757			JESUS RAMOS	02



m +	PACP Code	Observation	Counter	Photo	Grade
42.70	CL	Grieta Longitudinal en 10 en punto	00:22:20	24_07_2025 11_23_17	2
44.10	JOL	Junta Desplazada Grande, 1mm	00:23:12	24_07_2025 11_23_17	4
44.10	CL	Grieta Longitudinal en 11 en punto	00:23:36	24_07_2025 11_23_17	2
45.70	JSM	Junta Separada Mediana	00:23:58	24_07_2025 11_23_17	3
47.40	TFD	Acometida de Fábrica Defectuosa en 10 en punto, 150mm diá	00:24:48	24_07_2025 11_23_17	3
48.60	JSM	Junta Separada Mediana	00:25:20	24_07_2025 11_23_17	3
51.60	JSM	Junta Separada Mediana	00:28:34	24_07_2025 11_23_17	3
53.30	TFA	Acometida de Fábrica Actividad en 10 en punto, 150mm diá	00:29:12	24_07_2025 11_23_17	
57.40	JSM	Junta Separada Mediana	00:30:10	24_07_2025 11_23_17	3
59.20	AMH	Pozo de Acceso / fin de inspeccion	00:31:07	24_07_2025 11_23_17	

QSR	QMR	QOR	SPR	MPR	OPR	SPRI	MPRI	OPRI
433B	3521	433C	91.0	17.0	108.0	2.8	2.8	2.8

PARQUE MAQUINARIA
. Bogota D.C
Tel: 3112549504
malc.pinto@gmail.com

Fotos de la sección - 16/07/2025 - 24/07/2025 11:23:17 a. m.

Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia de	Seccion No.
BOGOTA	TV 127C X No 139A-19 /	16/07/2025	24/07/2025 11:23:17 a. m.	1



24_07_2025 11_23_17 a. m._20c671cc-da91-4062-84d0-095ad0e5e374_20250724_114618_213.jpg, 00:02:39, 1.00m



24_07_2025 11_23_17 a. m._9e3c9c41-3998-4494-ad4d-f21ac4549ec0_20250724_114919_826.jpg, 00:02:51, 1.20m



24_07_2025 11_23_17 a. m._f6a54cea-04e4-4204-8188-04a4788c0ff6_20250724_115939_389.jpg, 00:03:25, 1.20m



24_07_2025 11_23_17 a. m._a2ba2107-bed4-43bf-86bd-fad97577a41d_20250724_115939_443.jpg, 00:03:25, 1.20m



24_07_2025 11_23_17 a. m._e7b1d45b-7f42-4547-8c42-4bec5571d99b_20250724_121356_571.jpg, 00:04:23, 2.20m



24_07_2025 11_23_17 a. m._b0095a1e-c936-43df-989d-ab8c072fa48e_20250724_121356_622.jpg, 00:04:23, 2.20m

PARQUE MAQUINARIA
. Bogotá D.C
Tel. 3112549504
maic.pinto@gmail.com

Fotos de la sección - 16/07/2025 - 24/07/2025 11:23:17 a. m.

Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia de	Sección No.
BOGOTA	TV 127C X No 139A-19 /	16/07/2025	24/07/2025 11:23:17 a. m.	1



24_07_2025 11_23_17 a. m._187c6cf7-23e1-4309-9999-4edb46f1c8a5_20250725_111443_627.jpg, 00:04:59, 5.10m



24_07_2025 11_23_17 a. m._26f02943-1776-482f-ac33-ec0aa97cbb60_20250725_111549_615.jpg, 00:05:47, 5.50m



24_07_2025 11_23_17 a. m._35e278f5-c0fa-45ca-8c85-e91f9dd63c89_20250725_111653_298.jpg, 00:06:27, 8.10m



24_07_2025 11_23_17 a. m._c4e04960-8425-40f8-b1f2-a60916ec2823_20250725_111746_150.jpg, 00:06:43, 8.70m



24_07_2025 11_23_17 a. m._b9b5dbc9-b2ae-449c-8ccc-c3f6d2def488_20250725_111941_590.jpg, 00:07:27, 9.70m



24_07_2025 11_23_17 a. m._127edbed-d0d5-45e8-aa46-0852151d7466_20250725_111952_966.jpg, 00:07:47, 9.70m

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO: FO-EC-04	PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSION: 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCION TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° NP-15 UNIDAD M3 ESPECIFICACION TECNIC

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: RELLENO PARA REDES EN SUBBASE B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIDO Y CAMPACTACION)


CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003

CIV: 11002945

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	DIEMETRO 1/2 TUBO	VOLUMEN	TOTAL
ACTA 2						
RELLENO RED PLUVIAL 18"						
K0+038.00 A K0+064.00	26	1	0.25			6.5
					TOTAL	6.5
DESCUENTO TUBERIA PLUVIAL 18"	26	1		0.083	2.16	2.16
					TOTAL DESCUENTO	2.16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						4.34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						4.34
TOTAL POR EJECUTAR						0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002945

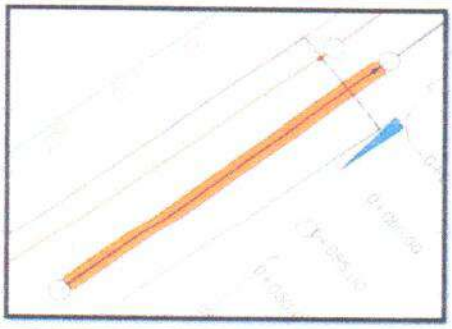

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Pajarido
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° 4848 — UNIDAD ML — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB Y CARGUE)

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003

CIV: 11002945

UBICACIÓN	LARGO				TOTAL
ACTA 2					
DEMOLICIÓN CARCAMO DE RED PLUVIAL					
K0+038.00 A K0+064	26				26.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**26.00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					26.000
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11002945



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FECHA			CONSORCIO SUBA VIAL VR NIT: 901484979-1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ
D	D	2025			
DD	MM	AA			

CONTRATO N° COP 1009-2024
ACTA N° 2

CONTRATO N° 1009-2024

RECIBO PARCIAL

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO".

CONTRATISTA — CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA — CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA No. 2	
		DESCRIPCIÓN	UND.		PRECIO UNIT	CANT	VALOR
ITEMS NO PREVISTOS							
NP-1	7892	EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)	HR	$	390.539,00	2,00	$ 781.078,00
NP-2	6567	CARROTANTE IRRIGADOR DE AGUA HORA	HR	$	107.100,00	2,00	$ 214.200,00
		SUBTOTAL					$ 995.278,00
COMPONENTES							
		COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,16% COSTO DIRECTO OBRA)	$	426.656.286,00	5,1634%		$ 51.390,00
		COMPONENTE SOCIAL (4,72% COSTO DIRECTO OBRA)	$	392.475.337,00	4,7167%		$ 46.944,00
		COMPONENTE PMT (3,11% COSTO DIRECTO OBRA)	$	258.663.298,00	3,1085%		$ 30.938,00
		SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA					$ 129.272,00
		SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	$	380.554.609,00			
		PROVISION ATENCIÓN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS: 8,054%	$	670.208.055,00			
		PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA: 4,950%	$	411.890.515,00			
		AJUSTE POR DECIMALES		1,00			
							$ -
A.I.U							
		ADMINISTRACIÓN	25,33%				$ 252.104,00
		IMPREVISTO	1,00%				
		UTILIDAD	4,00%				$ 39.811,00
		TOTAL A.I.U	30,33%				$ 291.915,00
NP-12		PAGOS A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 (PERMISO E-08-815 No. 5544109) Y PAGO DE PERMISO E-08-816(No. 6601662)	Gl	$	2.576.565,00		$ -
NP-13		PAGO A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002025 POR COMPENSACION POR APROVECHAMIENTO ARBOLADO URBANO Y JARDINERIA, SEGUN DECRETO DISTRITAL No. 531 DE 2010 y adicionado Decreto Distrital 383 de 2018 y Resolucion 3558 de 2021 SDA	Gl	$	3.931.123,00		$ -
		TOTAL OBRA					
		TOTAL A FACTURAR ACTA N° 1 CIV 11001040					$ 1.416.465,00

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP-1 UNIDAD HR ESPECIFICACION TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR


INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

APOYO A LA SUPERVISIÓN Juan Pablo Sarmiento

CIV 11001040

UBICACIÓN	HORAS	FECHA			TOTAL
ACTA 2					
CIV 11001040 CL 152B DESDE KR 114A HASTA KR 114 POZO 1 ABS K0+0.010	2.00	29/07/2025			2.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3.00
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11001040

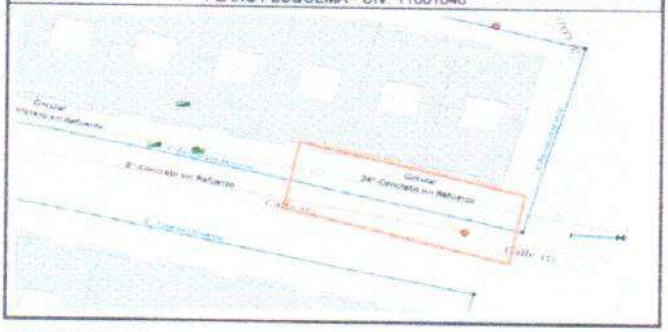

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edgar Ricardo Duarte
Director de Interventoría

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP-2 UNIDAD HR ESPECIFICACION TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA HORA

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR


INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TR 003

APOYO A LA SUPERVISIÓN Juan Pablo Sarmiento

CIV 11001040

UBICACIÓN	HORAS	FECHA			TOTAL
ACTA 2					
CIV 11001040 CL 152B DESDE KR 114A HASTA KR 114	2.00	29/07/2025			2.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3.00
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV 11001040

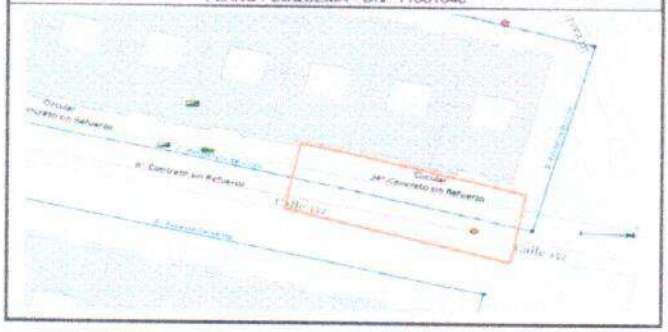

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FECHA			CONSORCIO SUBA VIAL VR	BOGOTÁ
D	M	AA	NIT: 901484979-1	
8	8	2025		
08	MM	AA		

CONTRATO N° CDP 1009-2024
ACTA N° 2

RECIBO PARCIAL

CONTRATO N° 1009-2024

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA: CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogota D.C., a los 07 dia de mes agosto de 2025 se reunieron FARLEY ANDRES LARRATE BARRERA Representante Legal de Contratista EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL Representante legal de la interventoria para dejar constancia por medio de la presente acta de corte parcial de obra y/o modificaciones del mes del 01 JULIO 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025 segun condiciones que se detallan a continuacion

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DESCRIPCION	UND.	PRECIO UNIT	ACTA No. 2 CANT	VALOR
ITEMS NO PREVISTOS						
NP 1	7892	EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye RCD)	HR	$ 380.539,00	5,50	$ 2.092.964,50
NP 2	8567	CARROTANQUE RIEGO AGUA HERRA	HR	$ 197.190,00	8,50	$ 1.675.615,00
		SUBTOTAL				$ 3.768.579,50
COMPONENTES						
		COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,16% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 429.656.286,00	5,16%		$ 221.737,00
		COMPONENTE SOCIAL (4,72% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 392.475.337,00	4,72%		$ 202.589,00
		COMPONENTE PMT (3,11% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 258.663.298,00	3,108%		$ 133.545,00
		SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA				$ 557.871,00
		SUBTOTAL 2% ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	$ 380.554.699,00			
		PROVISION ATENCION REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 0,64%	$ 670.208.065,00			
		PROVISION POR CAMBIO DE VIGENCIA 4,95%	$ 411.690.515,00			
		AJUSTE POR DECIMALES	1,00			
						$ -
A.I.U						
		ADMINISTRACION	25,30%			$ 870.338,00
		IMPREVISTO	1,00%			
		UTILIDAD	4,00%			$ 137.386,00
		TOTAL A.I.U	30,30%			$ 948.724,00
		TOTAL OBRA				
		TOTAL A FACTURAR ACTA N° 1 CTV 11081010				$ 4.603.513,50

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP-1 UNIDAD HR ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 11001010

UBICACIÓN	HORAS	FECHA			TOTAL
ACTA 2					
CIV 11001010 CL 152B ENTRE KR 114B HASTA KR 114A POZO 1 ABS K0+009	6.50	29/07/2025			6.50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					6.50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					6.50
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV 11001010

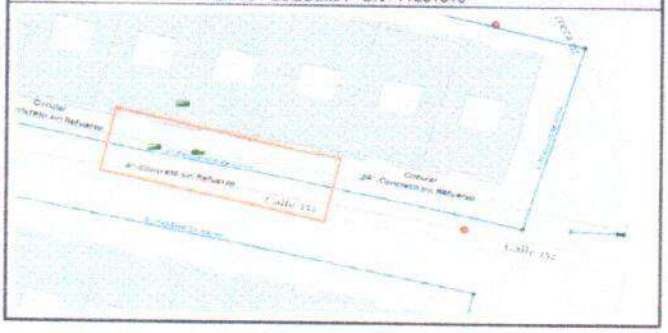

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

P.P

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP-2 UNIDAD HR ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA HORA


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003


CIV 11001010

UBICACIÓN	HORAS	FECHA			TOTAL
ACTA 2					
CIV 11001010 CL 152B ENTRE KR 114B HASTA KR 114A	6.50	29/07/2025			6.50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					6.50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					7.50
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV 11001010

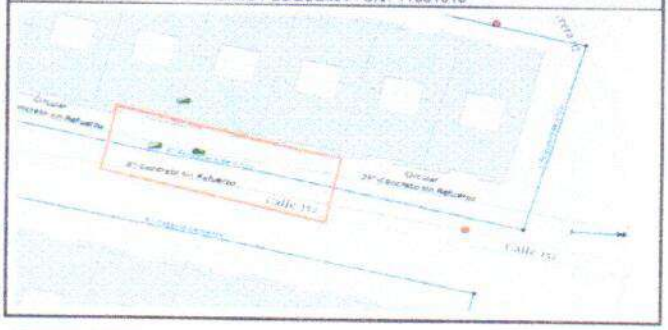

FOTOGRAFÍA

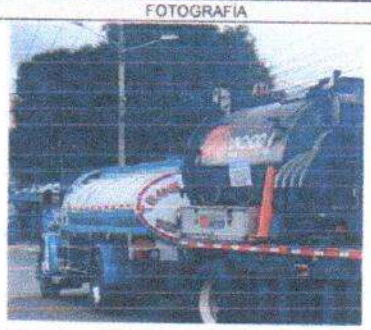

OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Rivera Duarte
Director de interventoria

FECHA				
9	9	2025	CONSORCIO SUBA VIAL VR	BOGOTÁ
DD	MM	AA	NIT: 901484979-1	

CONTRATO N° COP 1009 2024

ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO N° 1009-2024

RECIBO PARCIAL

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO".

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT	PRESENTE ACTA 2 CIV 11000989 CANT	VALOR
ITEMS NO PREVISTOS						
NP-1	7892	EQUIPO VACTOR SONDEO LIMPIEZA RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)	HR	$ 390.539,00	2,50	$ 976.347,50
NP-2	6567	CARROTANQUE SURTIDOR DE AGUA POTABLE	HR	$ 107.100,00	2,00	$ 214.200,00
		SUBTOTAL				$ 1.244.097,50
COMPONENTES						
		COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,16% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 429.656.286,00	5,1834%		$ 64.236,00
		COMPONENTE SOCIAL (4,72% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 392.475.337,00	4,7167%		$ 58.680,00
		COMPONENTE PMT (3,11% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 258.663.298,00	3,1085%		$ 38.673,00
		SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA				$ 161.591,00
		SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	$ 380.554.809,00			
						$ -
A.I.U						
		ADMINISTRACIÓN	25,33%			$ 315.130,00
		IMPREVISTO	1,00%			
		UTILIDAD	4,00%			$ 49.764,00
		TOTAL A.I.U	30,33%			$ 364.894,00
NP-12		PAGOS A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 (PERMISO E-08-815 No. 6544109) Y PAGO DE PERMISO E-08-816(No. 9601862)	GL	$ 2.576.565,00		$ -
NP-13		PAGO A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 POR COMPENSACIÓN POR APROVECHAMIENTO ARBOLADO URBANO Y JARDINERIA SEGUN DECRETO DISTRITAL No. 531 DE 2010 y adicionado Decreto Distrital 383 de 2018 y Resolucion 3556 de 2021 SDA	GL	$ 3.931.123,00		$ -
		TOTAL OBRA				
		TOTAL A FACTURAR ACTA N° 1 CIV 11000989				$ 1.770.582,50

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° NP 1 UNIDAD HR ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 1100989

UBICACIÓN	HORAS	FECHA			TOTAL
ACTA 2					
CIV 11000989 CLL 152 B ENTRE KR 114B Y KR 114D	2.50	30/07/2025			2.50
K0+000.00					
K0+071.04					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2.50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2.50
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV 11000989

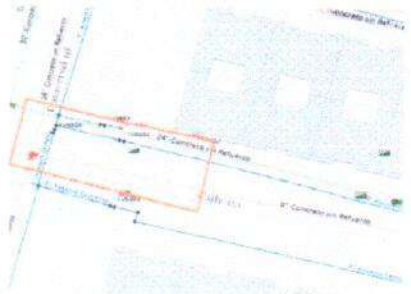

FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edisen Ricardo Duarte
Director de interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CODIGO: FO-EO-04	PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN: 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ITEM N° NP-2 UNIDAD HR ESPECIFICACIÓN TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ITEM CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA HORA


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 1100989

UBICACIÓN	HORAS	FECHA			TOTAL
ACTA 2					
CIV 11000989 CLL 152 B ENTRE KR 114B Y KR 114D	2.50	30/07/2025			2.50
K0+000.00					
K0+071.04					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2.50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2.50
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11000989

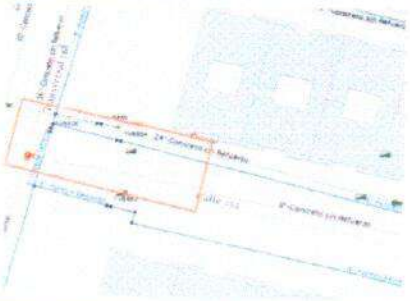

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORO

Ing Sandra Cristas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FECHA			CONSORCIO SUBA VIAL VR	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ
8	8	2025	NIT: 901484979-1		
DD	MM	AA			

CONTRATO N° COF 1009-2024
ACTA N° 2

RECIBO PARCIAL

CONTRATO N° 1009-2024

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO".

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA: CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

En Bogota D.C , a los 02 dias del mes agosto de 2025 se reunieron FARLEY ANDREA LARRATE BARRERA Representante Legal del Contratista ,EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL Representante legal de la interventoria para dejar constancia por medio de la presente acta del cobro parcial de obra y/o modificaciones de mes del 01 JULIO 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025, segun condiciones que se detallan a continuación

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA No. 2	
		DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT	CANT	VALOR
ITEMS NO PREVISTOS						
NP-1	7892	EQUIPO VACTOR SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)	HR	$ 390.539,00	2,50	$ 976.348,00
NP-2	6567	CARROTANTE IRRIGADOR DE AGUA HORA	HR	$ 107.100,00	2,50	$ 267.750,00
						$ -
		SUBTOTAL				$ 1.244.098,00
COMPONENTES						
		COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,16% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 429.656.286,00	5,1634%		$ 64.238,00
		COMPONENTE SOCIAL (4,72% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 392.475.337,00	4,7167%		$ 58.680,00
		COMPONENTE PMT (3,11% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 258.663.296,00	3,1085%		$ 38.673,00
		SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA				$ 161.591,00
		SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS	$ 360.554.609,00			
		PROVISIÓN ATENCIÓN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 8,054%	$ 670.208.055,00			
		PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA 4,950%	$ 411.890.515,00			
		AJUSTE POR DECIMALES	1,00			
						$ -
A.I.U						
		ADMINISTRACIÓN	25,33%			$ 315.130,00
		IMPREVISTO	1,00%			
		UTILIDAD	4,00%			$ 49.764,00
		TOTAL A.I.U	30,33%			$ 364.894,00
NP-12		PAGOS A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11092026 (PERMISO E-08-815 No. 654410) Y PAGO DE PERMISO E-08-816(No. 6601562)	GL	$ 2.576.505,00		$ -
NP-13		PAGO A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11092026 POR COMPENSACIÓN POR APROVECHAMIENTO ARBOLADO URBANO Y JARDINERIA, SEGUN DECRETO DISTRITAL No. 531 DE 2010 y adicionado Decreto Distrital 383 de 2018 y Resolucion 3558 de 2021 SDA.	GL	$ 3.931.123,00		$ -
		TOTAL OBRA				
		TOTAL A FACTURAR ACTA N° 1				$ 1.770.583,00

FORMATO MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP-1 UNIDAD HR ESPECIFICACIÓN TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 002

CIV 1100875

UBICACIÓN	HORAS	FECHA			TOTAL
ACTA 2					
CIV 11000875 CLL 152 B ENTRE KR 114B Y KR 114D	2.50	30/07/2025			2.50
K0+000.00					
K0+071.04					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2.50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2.50
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV 11000989



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Fabian Ricardo Duarte
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TECNICA

CONTRATO No 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP 2 UNIDAD HR ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA HORA


CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

CIV 1100875

UBICACIÓN	HORAS	FECHA			TOTAL
ACTA 2					
CIV 11000875 CLL 152 B ENTRE KR 114B Y KR 114D	2.50	30/07/2025			2.50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2.50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2.50
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11000989

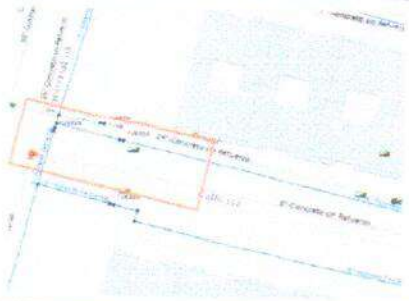

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISO

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria

FECH			CONSORCIO SUBA VIAL VR
8	8	2025	NIT: 901484979-1
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

CONTRATO N° COP 1009-2024

ACTA N° 2

RECIBO PARCIAL

CONTRATO N° 1009-2024

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO".

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVERTORIA: CONSORCIO SUBA TH 003

ACTA GENERAL DE OBRAS

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA No. 2	
		DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT	CANT	VALOR
ITEMS NO PREVISTOS						
NP-1	7892	EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)	HR	$ 390.539,00	1,00	$ 390.539,00
NP-2	6567	CARROTANTE IRRIGADOR DE AGUA HORA	HR	$ 107.100,00	1,00	$ 107.100,00
		SUBTOTAL				$ 497.639,00
COMPONENTES						
		COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,16% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 429.656.286,00	5,1634%		$ 25.695,00
		COMPONENTE SOCIAL (4,72% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 392.475.337,00	4,7167%		$ 23.472,00
		COMPONENTE PMT (3,11% COSTO DIRECTO OBRA)	$ 258.663.298,00	3,1085%		$ 15.469,00
		SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA				$ 64.636,00
		SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNÓSTICO y DISEÑOS	$ 380.554.609,00			
		PROVISIÓN ATENCIÓN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 8,054%	$ 670.208.055,00			
		PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA 4,956%	$ 411.890.515,00			
		AJUSTE POR DECIMALES	1,00			
						$ -
A.I.U						
		ADMINISTRACION	25,33%			$ 126.052,00
		IMPREVISTO	1,00%			
		UTILIDAD	4,00%			$ 19.906,00
		TOTAL A.I.U	30,33%			$ 145.958,00
NP-12		PAGOS A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 (PERMISO E-08-815 No. 5544109) Y PAGO DE PERMISO E-08-815(No. 6601662)	GL	$ 2.576.165,00		$
NP-13		PAGO A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002025 POR COMPENSACION POR APROVECHAMIENTO ARBOLADO URBANO Y JARDINERIA SEGUN DECRETO DISTRITAL No. 531 DE 2010 y adicionado Decreto Distrital 383 de 2018 y Resolucion 3558 de 2021 SDA	GL	$ 3.931.123,00	1,00	$
		TOTAL OBRA				
		TOTAL A FACTURAR ACTA N° 1 CIV 11001062				$ 708.233,00

FORMATO		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

(Indique el objeto del contrato de suscripción anterior)

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP-1 UNIDAD HR ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCION DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 11001062 (Escriba el nombre de la razón social del contratista)

(Escriba el nombre del Supervisor (si corresponde) o el gestor de FOCIS)

UBICACIÓN	HORAS	FECHA			TOTAL
ACTA 1					
CIV 11001062 CL 152B DESDE KR 114 HASTA KR 113C	1.00	31/07/2025			1.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2.00
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11001062



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing. Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing. Edison Ricardo Duque
Director de interventoria

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1009 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN A LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D C Y LAS DEMAS ACTIVIDAADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025

ÍTEM N° NP 2 UNIDAD HR ESPECIFICACIÓN TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CARROTANTE IRRIGADOR DE AGUA HORA

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003 (Escribir el nombre y cargo del interventor)

CIV 11001062 (Escribir el nombre y cargo del interventor)

(Escribir el nombre del Supervisor del delegado cuando a ello haya lugar)

UBICACIÓN	HORAS	FECHA			TOTAL
ACTA 2					
CIV 11001062 CL 152B DESDE KR 114 HASTA KR 113C	1,00	31/07/2025			1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 11001062



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing Sandra Cuestas Fajardo
Directora obra

REVISÓ

Ing Edison Ricardo Duarte
Director de interventoria
