
Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	CPTP	% completado
1	**IDU-1760-2021-CONTRUCCIONGRUPO1-CLB-20**	**$ 53.068.369.316**	**jue 2/12/21**	**632 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
2	**CONTRATO IDU-1760 2021**	**$ 53.068.369.316**	**jue 2/12/21**	**632 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
3	Acta de INICIO	$ 0	jue 2/12/21	0 días	jue 2/12/21		6FC+1 día;7FC+1 dí	$ 0	0%
4	**Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares**	**$ 662.003.856**	**jue 2/12/21**	**173 días**	**mié 13/12/23**			**$ 0**	**0%**
5	INICIO Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares	$ 0	jue 2/12/21	0 días	jue 2/12/21	3FC+1 día	19	$ 0	0%
6	Remisión Desglose AIU ofertado	$ 0	jue 2/12/21	3 días	mar 7/12/21	3FC+1 día	36	$ 0	0%
7	Remisión Plan detallado de inversión del Anticipo	$ 0	jue 2/12/21	3 días	mar 7/12/21	3FC+1 día	36	$ 0	0%
8	Remisión Análisis de precios unitarios	$ 0	jue 2/12/21	32 días	lun 17/01/22	3FC+1 día	36	$ 0	0%
9	Remisión Hojas de vida fase de ejecución	$ 0	jue 2/12/21	32 días	lun 17/01/22	3FC+1 día	36	$ 0	0%
10	Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte del INTERVENTOR del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto)	$ 0	jue 2/12/21	88 días	mié 13/04/22	3FC+1 día	36	$ 0	0%
11	Presentación para aprobación del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja (PAC) para la fase de ejecución.	$ 0	jue 2/12/21	88 días	mié 13/04/22	3FC+1 día	36	$ 0	0%
12	Entrega por parte del IDU al CONTRATISTA de la comunicación en la que constará la situación de los productos que integran los Estudios y Diseños del proyecto. (incluye confirmación de fecha estimada de entrega al CONTRATISTA de los	$ 0	jue 2/12/21	3 días	mar 7/12/21	3FC+1 día	13FC+1 día	$ 0	0%
13	Revisar y estudiar los estudios y diseños que reposen en el Centro de Documentación del IDU o en el enlace creado para cargar los documentos de los Estudios y Diseños, para determinar la existencia o no de eventuales errores técnicos en su contenido	$ 0	jue 9/12/21	74 días	vie 18/03/22	12FC+1 día	14	$ 0	0%
14	Presentación de observaciones a componentes de los Estudios y Diseños (INFORME TECNICO)	$ 0	vie 18/03/22	0 días	vie 18/03/22	13	36	$ 0	0%
15	Visita conjunta al sitio donde se ejecutará el proyecto	$ 0	jue 2/12/21	3 días	mar 7/12/21	3FC+1 día	36	$ 0	0%
16	Presentar para aprobación de la Interventoría el Plan de Calidad del proyecto, así como el Plan de inspección ensayos de laboratorio	$ 0	vie 25/03/22	0 días	vie 25/03/22	3FC+84 días	36	$ 0	0%
17	Presentación presupuesto de obra	$ 0	vie 25/03/22	0 días	vie 25/03/22	3FC+84 días	36	$ 0	0%
18	Suscribir el Contrato de Fiducia	$ 0	jue 2/12/21	11 días	lun 20/12/21	3FC+1 día	36	$ 0	0%
19	(MODIFICACION No.1 - 93%) Informe de	$ 298.055.571	jue 2/12/21	87 días	jue 31/03/22	5	36;20	$ 0	0%
20	(MODIFICACION No.1 - 7%) Informe de a	$ 22.434.289	jue 31/03/22	22 días	lun 23/05/22	19	21CC;36	$ 0	0%
21	(MODIFICACION No.1 - ADICION No.1 - F	$ 80.122.465	jue 31/03/22	22 días	lun 23/05/22	20CC	22FC+1 día	$ 0	0%
22	(MODIFICACION No.2 - ADICION No.2 - F	$ 80.122.466	mar 24/05/22	14 días	lun 13/06/22	21FC+1 día	36;23	$ 0	0%
23	(MODIFICACION No.3 - ADICION No.3 - F	$ 181.269.065	lun 13/06/22	48 días	mié 13/12/23	22	36;42CC+18 días;1	$ 0	0%
24	**COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA**	**$ 0**	**jue 2/12/21**	**133 días**	**mié 18/10/23**			**$ 0**	**0%**
25	Entrega Directorio de Actores	$ 0	jue 2/12/21	45 días	mié 2/02/22	3	36	$ 0	0%
26	Entrega Inventario de predios, metod	$ 0	jue 2/12/21	45 días	mié 2/02/22	3	36	$ 0	0%
27	Presentación metodología y cronograma del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicaciones	$ 0	jue 2/12/21	21 días	jue 30/12/21	3	36	$ 0	0%
28	PUNTO IDU	$ 0	jue 2/12/21	23 días	lun 3/01/22	3	36	$ 0	0%
29	Informe de fase de obras y gestiones preliminares	$ 0	jue 2/12/21	132 días	mié 18/10/23	3FC+1 día	36	$ 0	0%
30	**COMPONENTE AMBIENTAL Y SST**	**$ 0**	**jue 2/12/21**	**132 días**	**mié 18/10/23**			**$ 0**	**0%**
31	Presentación cronograma de actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 0	jue 2/12/21	8 días	mié 15/12/21	3FC+1 día	36	$ 0	0%
32	Remisión del Manual Ambiental de Obra (MAO)	$ 0	jue 2/12/21	73 días	vie 11/03/22	3FC+1 día	36	$ 0	0%
33	Actividades de obras y gestiones preliminares	$ 0	jue 2/12/21	132 días	mié 18/10/23	3FC+1 día	36	$ 0	0%
34	**COMPONENTE PMT SEÑALIZACION Y DESVIO**	**$ 0**	**vie 3/12/21**	**83 días**	**vie 25/03/22**			**$ 0**	**0%**
35	PMT Fase preliminar	$ 0	vie 3/12/21	83 días	vie 25/03/22	3FC+1,06 días	36	$ 0	0%
36	FIN Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares	$ 0	mié 13/12/23	0 días	mié 13/12/23	6;7;8;9;10;11;14;1	38FC+1 día	$ 0	0%
37	**FASE DE EJECUCIÓN**	**$ 52.406.365.460**	**mar 31/10/23**	**489 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
38	Inicio Fase de ejecución	$ 0	jue 14/12/23	0 días	jue 14/12/23	36FC+1 día	40;1923CC;1924CC	$ 0	0%
39	**ETAPA DE OBRA**	**$ 41.595.681.997**	**mar 31/10/23**	**489 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
40	Inicio etapa de obra	$ 0	jue 14/12/23	0 días	jue 14/12/23	38	1817FC+263 días;1	$ 0	0%
41	**CIV-16001623 ENTRE CL 10-KR 36-KR 37 A**	**$ 2.488.813.602**	**mar 31/10/23**	**361 días**	**mié 19/03/25**			**$ 0**	**0%**
42	Inicio de Tramo	$ 0	mar 31/10/23	0 días	mar 31/10/23	23CC+18 días	44;47	$ 0	0%
43	**Gestión social**	**$ 0**	**mar 31/10/23**	**24 días**	**mar 5/12/23**			**$ 0**	**0%**
44	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	mar 31/10/23	15 días	mié 22/11/23	42	53;45	$ 0	0%
45	Reunión de Inicio de obra	$ 0	mié 22/11/23	9 días	mar 5/12/23	44	53	$ 0	0%
46	**PMT**	**$ 0**	**mar 31/10/23**	**30 días**	**mié 13/12/23**			**$ 0**	**0%**
47	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	mar 31/10/23	1 día	mié 1/11/23	42	48	$ 0	0%
48	Aprobación de interventoria	$ 0	mié 1/11/23	7 días	mar 14/11/23	47	49FC+11 días	$ 0	0%
49	Radicación y Aprobación PMT a S	$ 0	mar 28/11/23	7 días	jue 7/12/23	48FC+11 días	50FC+1 día	$ 0	0%
50	Implementación PMT	$ 0	lun 11/12/23	3 días	mié 13/12/23	49FC+1 día	53	$ 0	0%
51	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 2.488.813.602**	**mié 13/12/23**	**331 días**	**mié 19/03/25**			**$ 0**	**0%**
52	**Etapa 1 - Intervención de calzad**	**$ 1.646.222.040**	**mié 13/12/23**	**123,5 días**	**mié 5/06/24**			**$ 0**	**0%**
53	Inicio Etapa 1	$ 0	mié 13/12/23	0 días	mié 13/12/23	44;45;50	54	$ 0	0%
54	Replanteo general	$ 2.999.607	jue 14/12/23	1 día	jue 14/12/23	53	55	$ 0	0%
55	Demolición de rodadura exist	$ 1.275.947	jue 14/12/23	3 días	mar 19/12/23	54	56	$ 0	0%
56	Excavacion mecanica Via	$ 15.385.417	mar 19/12/23	7 días	vie 29/12/23	55	57;59CC	$ 0	0%
57	Excavacion manual Via	$ 8.352.719	vie 29/12/23	15 días	lun 22/01/24	56	58CC;62CC+2 días;	$ 0	0%
58	Demolicion de Tuberia existen	$ 1.116.523	vie 29/12/23	15 días	lun 22/01/24	57CC	61CC;67CC	$ 0	0%
59	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 277.120.409	mar 19/12/23	113 días	lun 27/05/24	56CC	124	$ 0	0%
60	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 193.492.409	vie 29/12/23	88 días	mar 30/04/24			$ 0	0%
61	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 43.470.717	vie 29/12/23	17 días	mié 24/01/24	58CC	63CC;69CC	$ 0	0%
62	Pozos	$ 16.077.362	jue 4/01/24	86 días	mar 30/04/24	57CC+2 días	64CC+3 días	$ 0	0%
63	Instalacion de tuberia	$ 96.730.561	vie 29/12/23	16 días	mar 23/01/24	61CC	76;75	$ 0	0%
64	Conexión sumidero pozo	$ 30.991.675	lun 8/01/24	3 días	jue 11/01/24	62CC+3 días	65CC	$ 0	0%
65	Sumideros	$ 6.222.094	lun 8/01/24	83 días	mar 30/04/24	64CC	93	$ 0	0%
66	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 100.870.137	vie 29/12/23	88 días	mar 30/04/24			$ 0	0%
67	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 37.655.600	vie 29/12/23	17 días	mié 24/01/24	58CC	124	$ 0	0%
68	Pozos	$ 30.241.099	jue 4/01/24	86 días	mar 30/04/24	57CC+2 días	124	$ 0	0%
69	Instalacion de tuberia	$ 22.806.020	vie 29/12/23	16 días	mar 23/01/24	61CC	84;70CC;76FC+71 (	$ 0	0%
70	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 10.167.418	vie 29/12/23	16 días	mar 23/01/24	69CC	84;82FC+25 días	$ 0	0%
71	Redes humedas - Acueducto	$ 0	jue 25/04/24	15 días	vie 17/05/24			$ 0	0%
72	Instalacion Acometidas	$ 0	jue 25/04/24	15 días	vie 17/05/24	57CC+84 días	93	$ 0	0%
73	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	jue 25/04/24	15 días	vie 17/05/24	57CC+84 días	93	$ 0	0%
74	Redes secas	$ 36.115.898	jue 25/04/24	28,5 días	mié 5/06/24			$ 0	0%
75	Solicitud de Maniobras	$ 0	lun 29/04/24	0 días	lun 29/04/24	63;69FC+71 días	76	$ 0	0%
76	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	lun 29/04/24	12 días	vie 17/05/24	63;69FC+71 días;75	78CC+3 días	$ 0	0%
77	Rellenos para redes secas	$ 0	lun 6/05/24	16 días	mar 28/05/24	78CC+1 día	93	$ 0	0%
78	Instalacion tuberia TDP	$ 30.033.803	vie 3/05/24	15 días	vie 24/05/24	76CC+3 días	77CC+1 día;79CC+!	$ 0	0%
79	Proteccion de tuberia	$ 0	mié 15/05/24	15 días	mié 5/06/24	78CC+50%	98	$ 0	0%
80	Renivelacion camaras	$ 6.082.095	jue 25/04/24	15 días	vie 17/05/24	86FC+14 días	93	$ 0	0%
81	Conformacion de la estructura	$ 1.009.492.974	vie 23/02/24	66 días	mar 28/05/24			$ 0	0%
82	Drenaje sub superficial	$ 0	vie 23/02/24	7 días	mar 5/03/24	70FC+25 días	84;83	$ 0	0%
83	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 2.957.423	mar 5/03/24	2 días	jue 7/03/24	82	84	$ 0	0%
84	Geotextil de separacion	$ 0	jue 7/03/24	3 días	lun 11/03/24	69;70;82;83	85	$ 0	0%
85	Mejoramiento de subrasan	$ 471.396.322	lun 11/03/24	5 días	lun 18/03/24	84	86	$ 0	0%
86	Sub base Granular RCD	$ 46.682.559	lun 18/03/24	12 días	vie 5/04/24	85	80FC+14 días;87;8	$ 0	0%
87	Sardinel	$ 3.807.112	vie 5/04/24	15 días	jue 25/04/24	86	89	$ 0	0%
88	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 10.645.548	vie 5/04/24	2 días	mar 9/04/24	86	89	$ 0	0%
89	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 85.490.417	vie 26/04/24	3 días	mar 30/04/24	87;88	90	$ 0	0%
90	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 44.945.274	mar 30/04/24	15 días	mié 22/05/24	89	91CC+3 días	$ 0	0%
91	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 313.755.448	lun 6/05/24	15 días	lun 27/05/24	90CC+3 días	92CC+1 día	$ 0	0%
92	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 29.812.871	mar 7/05/24	15 días	mar 28/05/24	91CC+1 día	93	$ 0	0%
93	Fin etapa 1	$ 0	mar 28/05/24	0 días	mar 28/05/24	65;92;80;72;73;77	95FC+1 día	$ 0	0%
94	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 842.591.562	mié 29/05/24	212 días	mié 19/03/25			$ 0	0%
95	Inicio tapa 2	$ 0	mié 29/05/24	0 días	mié 29/05/24	93FC+1 día	96	$ 0	0%
96	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	mié 29/05/24	3 días	mar 4/06/24	95	97	$ 0	0%
97	Demolicion de concreto	$ 15.639.057	mar 4/06/24	12 días	jue 20/06/24	96	98	$ 0	0%
98	Excavacion manual Estructura	$ 6.011.215	jue 20/06/24	25 días	mié 24/07/24	97;79	103;100	$ 0	0%
99	Redes Humedas EAAB	$ 131.047.738	jue 18/07/24	91 días	jue 21/11/24			$ 0	0%
100	Excavacion manual	$ 4.478.086	jue 25/07/24	15 días	jue 15/08/24	98	101CC;102FF;105C	$ 0	0%
101	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 0	jue 25/07/24	16 días	jue 15/08/24	100CC	106	$ 0	0%
102	Programacion Cierre Acued	$ 0	jue 18/07/24	20 días	jue 15/08/24	100FF	103	$ 0	0%
103	Conexión Acueducto	$ 0	jue 15/08/24	1 día	jue 15/08/24	98;102	104CC	$ 0	0%
104	Empate de acueducto	$ 6.001.064	jue 15/08/24	1 día	jue 15/08/24	103CC	116;106	$ 0	0%
105	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 97.960.068	jue 25/07/24	75 días	jue 7/11/24	100CC+1 día	106	$ 0	0%
106	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 22.608.520	jue 7/11/24	10 días	jue 21/11/24	101;104;105	116	$ 0	0%
107	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 0	jue 25/07/24	1 día	jue 25/07/24	100CC	124	$ 0	0%
108	Redes Secas	$ 229.122.610	jue 25/07/24	47,82 días	lun 30/09/24			$ 0	0%
109	Excavacion manual	$ 0	jue 25/07/24	15 días	jue 15/08/24	100CC+1 día	110CC;113CC	$ 0	0%
110	Cajas de inspeccion	$ 50.447.093	jue 25/07/24	1 día	vie 26/07/24	109CC	111CC+2 días	$ 0	0%
111	Instalacion tuberia TDP	$ 135.553.667	lun 29/07/24	45,82 días	lun 30/09/24	110CC+2 días	112CC+5 días	$ 0	0%
112	Rellenos para redes secas	$ 34.380.228	lun 5/08/24	11 días	mié 21/08/24	111CC+5 días	116	$ 0	0%
113	Renivelacion de cajas de inspeccion	$ 8.741.622	jue 25/07/24	1 día	vie 26/07/24	109CC	114	$ 0	0%
114	Ejecucion de maniobras por parte de ESP	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	113	124	$ 0	0%
115	Conformacion de la estructura	$ 406.712.732	jue 21/11/24	76 días	mié 5/03/25			$ 0	0%
116	Geotextil	$ 29.355.903	jue 21/11/24	6 días	vie 29/11/24	104;106;112	117	$ 0	0%
117	Mejoramiento de subrasan	$ 46.682.559	vie 29/11/24	15 días	jue 19/12/24	116	118	$ 0	0%
118	Sub Base Granular PEA	$ 77.023.022	jue 19/12/24	15 días	lun 13/01/25	117	119	$ 0	0%
119	Bordillo Separacion de pañ	$ 64.572.191	lun 13/01/25	10 días	vie 24/01/25	118	120;121	$ 0	0%
120	Accesos Vehicular	$ 10.538.683	vie 24/01/25	7 días	mar 4/02/25	119	124	$ 0	0%
121	Arena de Peña	$ 0	vie 24/01/25	20 días	jue 20/02/25	119	122CC+5 días	$ 0	0%
122	Concreto estampado	$ 178.540.374	vie 31/01/25	25 días	mié 5/03/25	121CC+5 días	124;123	$ 0	0%
123	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 54.058.210	mié 5/03/25	10 días	mié 19/03/25	122	124	$ 0	0%
124	Fin Etapa 2	$ 0	mié 19/03/25	0 días	mié 19/03/25	59;67;68;107;120;	1917	$ 0	0%
125	**CIV-16000719 CL 18 ENTRE AK 36 - AK 39**	**$ 1.992.040.286**	**mar 31/10/23**	**307 días**	**mar 7/01/25**			**$ 0**	**0%**
126	Inicio de Tramo	$ 0	mar 31/10/23	0 días	mar 31/10/23	23CC+18 días	128;131	$ 0	0%
127	**Gestión social**	**$ 0**	**mar 31/10/23**	**24 días**	**mar 5/12/23**			**$ 0**	**0%**
128	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	mar 31/10/23	15 días	mié 22/11/23	126	137;129	$ 0	0%
129	Reunión de Inicio de obra	$ 0	mié 22/11/23	9 días	mar 5/12/23	128	137	$ 0	0%
130	**PMT**	**$ 0**	**mar 31/10/23**	**30 días**	**mié 13/12/23**			**$ 0**	**0%**
131	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	mar 31/10/23	1 día	mié 1/11/23	126	132	$ 0	0%
132	Aprobación de interventoria	$ 0	mié 1/11/23	7 días	mar 14/11/23	131	133FC+11 días	$ 0	0%
133	Radicación y Aprobación PMT a S	$ 0	mar 28/11/23	7 días	jue 7/12/23	132FC+11 días	134FC+1 día	$ 0	0%
134	Implementación PMT	$ 0	lun 11/12/23	3 días	mié 13/12/23	133FC+1 día	137	$ 0	0%
135	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 1.992.040.286**	**mié 13/12/23**	**277 días**	**mar 7/01/25**			**$ 0**	**0%**
136	**Etapa 1 - Intervención de calzad**	**$ 1.306.930.914**	**mié 13/12/23**	**118 días**	**mar 28/05/24**			**$ 0**	**0%**
137	Inicio Etapa 1	$ 0	mié 13/12/23	0 días	mié 13/12/23	128;129;134	138;1470CC+161 d	$ 0	0%
138	Replanteo general	$ 1.890.419	jue 14/12/23	1 día	jue 14/12/23	137	139	$ 0	0%
139	Demolición de rodadura exist	$ 1.275.947	jue 14/12/23	3 días	mar 19/12/23	138	140	$ 0	0%
140	Excavacion mecanica Via	$ 10.041.261	mar 19/12/23	7 días	vie 29/12/23	139	141;143CC	$ 0	0%
141	Excavacion manual Via	$ 2.912.222	vie 29/12/23	15 días	lun 22/01/24	140	142CC;146CC+2 dí	$ 0	0%
142	Demolicion de Tuberia existen	$ 1.116.523	vie 29/12/23	15 días	lun 22/01/24	141CC	145CC;151CC	$ 0	0%
143	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 188.623.366	mar 19/12/23	113 días	lun 27/05/24	140CC	208	$ 0	0%
144	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 399.553.482	vie 29/12/23	88 días	mar 30/04/24			$ 0	0%
145	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 76.995.556	vie 29/12/23	17 días	mié 24/01/24	142CC	147CC;153CC	$ 0	0%
146	Pozos	$ 18.685.705	jue 4/01/24	86 días	mar 30/04/24	141CC+2 días	148CC+3 días	$ 0	0%
147	Instalacion de tuberia	$ 279.942.494	vie 29/12/23	16 días	mar 23/01/24	145CC	160;159	$ 0	0%
148	Conexión sumidero pozo	$ 17.707.633	lun 8/01/24	3 días	jue 11/01/24	146CC+3 días	149CC	$ 0	0%
149	Sumideros	$ 6.222.094	lun 8/01/24	83 días	mar 30/04/24	148CC	177	$ 0	0%
150	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 89.612.579	vie 29/12/23	88 días	mar 30/04/24			$ 0	0%



Proyecto: 2. Preliminar 0212202
Fecha: jue 2/10/25

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Progreso manual

NOTA: EL PDT SE SUJETA A LAS APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS ESP Y DEMAS ENTIDADES ASOCIADAS A LOS ENTREGABLES, AUNADO A LA TOTALIDAD DE CAMBIOS REQUERIDO Y EVIDENCIADOS PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO IDU-1760-2021

Firma Contratista

Firma Interventoria


Nº	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	PTP	% completado
151	Relleno con Grava, Compactación y Geotextil	$ 20.164.613	vie 29/12/23	17 días	mié 24/01/24	140CC	208	$ 0	0%
152	Instalación de Drenaje	$ 23.145.442	jue 4/01/24	86 días	mar 30/04/24	141CC+2 días	208	$ 0	0%
153	Pintura	$ 23.145.442	jue 4/01/24	86 días	mar 30/04/24	141CC+2 días	208	$ 0	0%
154	Conexión domiciliaria	$ 20.793.190	mié 29/11/23	16 días	mar 19/12/23	150CC	184,184CC+25 días	$ 0	0%
155	Conexión domiciliaria	$ 20.793.190	mié 29/11/23	16 días	mar 19/12/23	150CC	184	$ 0	0%
156	Relleno Sanitario - Acumulación	$ 0	jue 25/04/24	15 días	vie 17/05/24	141CC+68 días	177	$ 0	0%
157	Instalación Acumulador	$ 0	jue 25/04/24	15 días	vie 17/05/24	141CC+68 días	177	$ 0	0%
158	Instalación Acumulador	$ 0	jue 25/04/24	15 días	vie 17/05/24	141CC+68 días	177	$ 0	0%
159	Redes varias	$ 36.110.888	lun 18/03/24	45,5 días	mié 15/05/24	147,150CC+5 días	162CC+4 días	$ 0	0%
160	Instalación Subterránea	$ 0	lun 18/03/24	15 días	vie 5/04/24	147,150CC+5 días	162CC+4 días	$ 0	0%
161	Excavación manual para Cimentación	$ 0	lun 18/03/24	15 días	vie 5/04/24	147,150CC+5 días	162CC+4 días	$ 0	0%
162	Relleno para redes varias	$ 0	mié 20/03/24	16 días	mié 17/04/24	162CC+3 días	173	$ 0	0%
163	Instalación Subterránea TDP	$ 20.013.863	jue 14/03/24	15 días	lun 1/04/24	160CC+3 días	166CC+5 días,183CC+5días,183CC+5días	$ 0	0%
164	Instalación Subterránea TDP	$ 0	jue 14/03/24	15 días	lun 1/04/24	160CC+3 días	166CC+5 días	$ 0	0%
165	Conexión domiciliaria	$ 1.082.295	mié 24/04/24	15 días	jue 16/05/24	163	177	$ 0	0%
166	Conexión domiciliaria - Acumulación	$ 1.082.295	mié 24/04/24	15 días	jue 16/05/24	163	177	$ 0	0%
167	Drenaje sub superficial	$ 0	mié 13/03/24	7 días	mar 19/03/24	166	168	$ 0	0%
168	Instalación de Drenaje de la vivienda	$ 1.744.858	mié 13/03/24	7 días	jue 21/03/24	167	169	$ 0	0%
169	Movimiento de sobrantes	$ 233.165.546	lun 11/03/24	5 días	lun 18/03/24	168	170	$ 0	0%
170	Sub Base Granular RCD	$ 28.394.617	lun 18/03/24	15 días	lun 8/04/24	169	171,172	$ 0	0%
171	Base Granular	$ 28.394.617	mar 9/04/24	15 días	mar 30/04/24	170	173	$ 0	0%
172	Impermeación con emulsión asfáltica	$ 4.475.198	mié 3/04/24	7 días	mié 10/04/24	170	173	$ 0	0%
173	Pintura	$ 0	mié 10/04/24	7 días	mié 17/04/24	171,172	174	$ 0	0%
174	Relleno para redes varias	$ 0	mié 17/04/24	16 días	mié 8/05/24	173	176	$ 0	0%
175	Instalación Subterránea TDP	$ 40.413.736	mié 17/04/24	15 días	mié 8/05/24	173	179CC+5 días	$ 0	0%
176	Instalación Subterránea TDP	$ 0	mié 17/04/24	15 días	mié 8/05/24	174CC+5 días	179CC+5 días	$ 0	0%
177	Conexión domiciliaria	$ 2.165.590	lun 6/05/24	15 días	mié 29/05/24	174CC+5 días	177	$ 0	0%
178	Conexión domiciliaria - Acumulación	$ 2.888.442	mié 8/05/24	15 días	mié 29/05/24	174CC+5 días	177	$ 0	0%
179	Redes Humedas EAAB	$ 234.271.370	jue 18/03/24	30 días	lun 6/05/24	183	180CC,180CC,180CC	$ 0	0%
180	Instalación Subterránea	$ 234.271.370	jue 18/03/24	30 días	lun 6/05/24	183	181,184	$ 0	0%
181	Instalación Subterránea	$ 0	jue 18/03/24	30 días	lun 6/05/24	183	180CC,180CC,180CC	$ 0	0%
182	Conexión domiciliaria	$ 3.098.443	jue 14/03/24	16 días	mié 3/04/24	184CC	190	$ 0	0%
183	Conexión domiciliaria - Acumulación	$ 3.098.443	jue 14/03/24	16 días	mié 3/04/24	184CC	190	$ 0	0%
184	Pavimentación Cerro Arundi	$ 0	jue 18/03/24	20 días	jue 11/04/24	184F	187	$ 0	0%
185	Concreto Acueducto	$ 0	jue 18/03/24	1 día	jue 18/03/24	184,188	186CC	$ 0	0%
186	Instalación Subterránea	$ 0	jue 18/03/24	15 días	jue 4/04/24	185CC	187	$ 0	0%
187	Instalación Tubería	$ 0	jue 25/04/24	20 días	mié 22/05/24	184F	188	$ 0	0%
188	Pavimentación Cerro Arundi	$ 0	jue 18/03/24	20 días	jue 11/04/24	184F	187	$ 0	0%
189	Instalación Subterránea	$ 0	jue 25/04/24	20 días	mié 22/05/24	187	188CC	$ 0	0%
190	Caja de inspección	$ 506.466	jue 25/07/24	1 día	jue 25/07/24	184CC	208	$ 0	0%
191	Movimiento de sobrantes	$ 185.188.189	jue 25/07/24	1 día	jue 25/07/24	184CC	208	$ 0	0%
192	Redes Secas	$ 185.174.328	jue 25/07/24	18 días	mié 21/08/24	190CC	200	$ 0	0%
193	Instalación Subterránea	$ 185.174.328	jue 25/07/24	18 días	mié 21/08/24	190CC+5 días	199CC,197CC	$ 0	0%
194	Caja de inspección	$ 5.170.824	jue 25/07/24	1 día	jue 25/07/24	190CC	199CC+2 días	$ 0	0%
195	Excavación manual para Cimentación	$ 5.170.824	jue 25/07/24	1 día	jue 25/07/24	190CC	199CC+2 días	$ 0	0%
196	Concreto estampado	$ 151.114.124	mié 28/11/24	24 días	mié 29/12/24	205CC+6 días	208,207	$ 0	0%
197	Concreto Acueducto	$ 2.165.590	mié 28/11/24	24 días	mié 29/12/24	205CC+6 días	208	$ 0	0%
198	Vegetación y Paisajismo	$ 0	mié 29/12/24	0 días	mié 29/12/24	197	208	$ 0	0%
199	Caja de inspección	$ 0	jue 29/07/24	0 días	mié 29/07/24	194,193,192,191,195,197	208	$ 0	0%
200	Ejecución de Alcantarillado	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	197	208	$ 0	0%
201	Muro de Fachada	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	197	208	$ 0	0%
202	Conformación de la estructura	$ 205.318.092	lun 9/09/24	75 días	mié 20/11/24	208,206,180	207CC+6 días	$ 0	0%
203	Cimentación	$ 205.318.092	lun 9/09/24	75 días	mié 20/11/24	208,206,180	207CC+6 días	$ 0	0%
204	Movimiento de sobrantes	$ 28.394.617	mié 14/08/24	14 días	lun 2/09/24	200CC+5 días	202	$ 0	0%
205	Sub Base Granular RCD	$ 28.394.617	mié 14/08/24	14 días	lun 2/09/24	200CC+5 días	202	$ 0	0%
206	Relleno Estructura de pafs	$ 28.370.250	lun 19/11/24	10 días	mié 4/12/24	202	204CC+6 días,205CC+5	$ 0	0%
207	Acometida de alcantarillado	$ 0	lun 19/11/24	10 días	mié 4/12/24	202	204CC+6 días,205CC+5	$ 0	0%
208	Atención de alcantarillados de pluvial	$ 0	jue 14/03/24	0 días	jue 14/03/24	202	216	$ 0	0%
209	Ejecución de mampostería	$ 0	jue 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	221	211,217CC	$ 0	0%
210	Acometida de alcantarillado	$ 0	jue 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	209CC+1 día	211,217CC	$ 0	0%
211	Transporte Disposicion	$ 19.939.185	jue 15/12/23	11,5 días	mié 10/01/24	210CC	212CC,218CC+2días	$ 0	0%
212	Concreto Acueducto	$ 0	jue 28/12/23	7 días	mié 3/01/24	211	213CC,218CC+2días	$ 0	0%
213	Redes Hidrosanitarias - Pluvial	$ 115.019.197	lun 1/04/24	30 días	mié 15/05/24	212CC	215CC,237CC	$ 0	0%
214	Redes Hidrosanitarias - Sanitario	$ 115.019.197	lun 1/04/24	30 días	mié 15/05/24	212CC	215CC,237CC	$ 0	0%
215	Pintura y Sello Base Estructura	$ 0	mié 14/05/24	30 días	mié 26/06/24	214CC+5 días,213CC+5 días	232CC+5 días	$ 0	0%
216	Instalación de Cubierta	$ 53.153.776	lun 12/02/24	36,13 días	lun 1/04/24	224CC	244,243	$ 0	0%
217	Instalación Subterránea	$ 53.153.776	lun 12/02/24	36,13 días	lun 1/04/24	224CC	244,243	$ 0	0%
218	Suministro pozo	$ 5.172.264	lun 18/03/24	10 días	mié 3/04/24	210CC+1 día	219CC	$ 0	0%
219	Redes Hidrosanitarias - Sanitario	$ 29.310.990	lun 18/03/24	10 días	mié 3/04/24	185,188,189	200	$ 0	0%
220	Redes Hidrosanitarias - Pluvial	$ 29.310.990	lun 18/03/24	10 días	mié 3/04/24	185,188,189	200	$ 0	0%
221	Redes Secas	$ 185.174.328	jue 25/07/24	18 días	mié 21/08/24	208	209CC,207CC	$ 0	0%
222	Instalación Subterránea	$ 185.174.328	jue 25/07/24	18 días	mié 21/08/24	208CC+5 días	209CC,207CC	$ 0	0%
223	Caja de inspección	$ 5.170.824	jue 25/07/24	1 día	jue 25/07/24	208CC	209CC+2 días	$ 0	0%
224	Excavación manual para Cimentación	$ 5.170.824	jue 25/07/24	1 día	jue 25/07/24	208CC	209CC+2 días	$ 0	0%
225	Concreto estampado	$ 151.114.124	mié 28/11/24	24 días	mié 29/12/24	205CC+6 días	208,207	$ 0	0%
226	Concreto Acueducto	$ 2.165.590	mié 28/11/24	24 días	mié 29/12/24	205CC+6 días	208	$ 0	0%
227	Vegetación y Paisajismo	$ 0	mié 29/12/24	0 días	mié 29/12/24	197	208	$ 0	0%
228	Caja de inspección	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	197	208	$ 0	0%
229	**Ejecución de Obras - Nivel 4to**	**$ 1.440.613.209**	**mié 14/02/24**	**303 días**	**mié 11/02/25**			**$ 0**	**0%**
230	**CN: 1020113.01 FRITRE CL 11 A # 42 - 21 - 1440.613.209**							**$ 0**	**0%**
231	Inicio de Torre	$ 0	jue 14/02/24	0 días	jue 14/02/24	42	232,233	$ 0	0%
232	Gestión social	$ 0	jue 14/02/24	24 días	vie 8/03/24	231	233	$ 0	0%
233	Puesta en marcha - Hora de Inicio	$ 0	jue 14/02/24	24 días	vie 8/03/24	231,232	234	$ 0	0%
234	Puesta en marcha de obra	$ 0	lun 4/03/24	0 días	lun 4/03/24	233	235	$ 0	0%
235	**Pilotaje**	$ 0	lun 4/03/24	9 días	vie 15/03/24	234	236	$ 0	0%
236	Atención de alcantarillados de pluvial	$ 0	jue 14/03/24	0 días	jue 14/03/24	202	216	$ 0	0%
237	Ejecución de mampostería de contención	$ 0	jue 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	221	211,217CC	$ 0	0%
238	Acometida de alcantarillado	$ 0	jue 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	209CC+1 día	211,217CC	$ 0	0%
239	Transporte Disposicion	$ 19.939.185	jue 15/12/23	11,5 días	mié 10/01/24	210CC	212CC,218CC+2días	$ 0	0%
240	Redes Hidrosanitarias - Pluvial	$ 115.019.197	lun 1/04/24	30 días	mié 15/05/24	212CC	215CC,237CC	$ 0	0%
241	Redes Hidrosanitarias - Sanitario	$ 115.019.197	lun 1/04/24	30 días	mié 15/05/24	212CC	215CC,237CC	$ 0	0%
242	Pintura y Sello Base Estructura	$ 0	mié 14/05/24	30 días	mié 26/06/24	214CC+5 días,213CC+5 días	232CC+5 días	$ 0	0%
243	Instalación de Cubierta	$ 53.153.776	lun 12/02/24	36,13 días	lun 1/04/24	224CC	244,243	$ 0	0%
244	Instalación Subterránea	$ 53.153.776	lun 12/02/24	36,13 días	lun 1/04/24	224CC	244,243	$ 0	0%
245	Suministro pozo	$ 5.172.264	lun 18/03/24	10 días	mié 3/04/24	210CC+1 día	219CC	$ 0	0%
246	Redes Hidrosanitarias - Sanitario	$ 29.310.990	lun 18/03/24	10 días	mié 3/04/24	185,188,189	200	$ 0	0%
247	Redes Hidrosanitarias - Pluvial	$ 29.310.990	lun 18/03/24	10 días	mié 3/04/24	185,188,189	200	$ 0	0%
248	Conformación de la estructura	$ 205.318.092	lun 9/09/24	75 días	mié 20/11/24	208,206,180	207CC+6 días	$ 0	0%
249	Cimentación	$ 205.318.092	lun 9/09/24	75 días	mié 20/11/24	208,206,180	207CC+6 días	$ 0	0%
250	Movimiento de sobrantes	$ 28.394.617	mié 14/08/24	14 días	lun 2/09/24	200CC+5 días	202	$ 0	0%
251	Sub Base Granular RCD	$ 28.394.617	mié 14/08/24	14 días	lun 2/09/24	200CC+5 días	202	$ 0	0%
252	Relleno Estructura de pafs	$ 28.370.250	lun 19/11/24	10 días	mié 4/12/24	202	204CC+6 días,205CC+5	$ 0	0%
253	Acometida de alcantarillado	$ 0	lun 19/11/24	10 días	mié 4/12/24	202	204CC+6 días,205CC+5	$ 0	0%
254	Atención de alcantarillados de pluvial	$ 0	jue 14/03/24	0 días	jue 14/03/24	202	216	$ 0	0%
255	Concreto estampado	$ 151.114.124	mié 28/11/24	24 días	mié 29/12/24	205CC+6 días	208,207	$ 0	0%
256	Concreto Acueducto	$ 2.165.590	mié 28/11/24	24 días	mié 29/12/24	205CC+6 días	208	$ 0	0%
257	Vegetación y Paisajismo	$ 0	mié 29/12/24	0 días	mié 29/12/24	197	208	$ 0	0%
258	Caja de inspección	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	197	208	$ 0	0%
259	Ejecución de Alcantarillado	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	197	208	$ 0	0%
260	Muro de Fachada	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	197	208	$ 0	0%
261	Acometida de alcantarillado	$ 0	jue 14/03/24	0 días	jue 14/03/24	40	211,215	$ 0	0%
262	Gestión social	$ 0	jue 14/02/24	24 días	vie 8/03/24	232	233	$ 0	0%
263	Puesta en marcha - Hora de Inicio	$ 0	jue 14/02/24	24 días	vie 8/03/24	232	221	$ 0	0%
264	Puesta en marcha de obra	$ 0	lun 4/03/24	0 días	lun 4/03/24	233	235	$ 0	0%
265	**Pilotaje**	$ 0	lun 4/03/24	9 días	vie 15/03/24	234	236	$ 0	0%
266	Atención de alcantarillados de pluvial	$ 0	jue 14/03/24	0 días	jue 14/03/24	202	216	$ 0	0%
267	Ejecución de mampostería de contención	$ 0	jue 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	221	211,217CC	$ 0	0%
268	Acometida de alcantarillado	$ 0	jue 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	209CC+1 día	211,217CC	$ 0	0%
269	Transporte Disposicion	$ 19.939.185	jue 15/12/23	11,5 días	mié 10/01/24	210CC	212CC,218CC+2días	$ 0	0%
270	Redes Hidrosanitarias - Pluvial	$ 115.019.197	lun 1/04/24	30 días	mié 15/05/24	212CC	215CC,237CC	$ 0	0%
271	Redes Hidrosanitarias - Sanitario	$ 115.019.197	lun 1/04/24	30 días	mié 15/05/24	212CC	215CC,237CC	$ 0	0%
272	Pintura y Sello Base Estructura	$ 0	mié 14/05/24	30 días	mié 26/06/24	214CC+5 días,213CC+5 días	232CC+5 días	$ 0	0%
273	Instalación de Cubierta	$ 53.153.776	lun 12/02/24	36,13 días	lun 1/04/24	224CC	244,243	$ 0	0%
274	Instalación Subterránea	$ 53.153.776	lun 12/02/24	36,13 días	lun 1/04/24	224CC	244,243	$ 0	0%
275	Suministro pozo	$ 5.172.264	lun 18/03/24	10 días	mié 3/04/24	210CC+1 día	219CC	$ 0	0%
276	Redes Hidrosanitarias - Sanitario	$ 29.310.990	lun 18/03/24	10 días	mié 3/04/24	185,188,189	200	$ 0	0%
277	Redes Hidrosanitarias - Pluvial	$ 29.310.990	lun 18/03/24	10 días	mié 3/04/24	185,188,189	200	$ 0	0%
278	Redes Secas	$ 185.174.328	jue 25/07/24	18 días	mié 21/08/24	208	209CC,207CC	$ 0	0%
279	Instalación Subterránea	$ 185.174.328	jue 25/07/24	18 días	mié 21/08/24	208CC+5 días	209CC,207CC	$ 0	0%
280	Caja de inspección	$ 5.170.824	jue 25/07/24	1 día	jue 25/07/24	208CC	209CC+2 días	$ 0	0%
281	Excavación manual para Cimentación	$ 5.170.824	jue 25/07/24	1 día	jue 25/07/24	208CC	209CC+2 días	$ 0	0%
282	Concreto estampado	$ 151.114.124	mié 28/11/24	24 días	mié 29/12/24	205CC+6 días	208,207	$ 0	0%
283	Concreto Acueducto	$ 2.165.590	mié 28/11/24	24 días	mié 29/12/24	205CC+6 días	208	$ 0	0%
284	Vegetación y Paisajismo	$ 0	mié 29/12/24	0 días	mié 29/12/24	197	208	$ 0	0%
285	Caja de inspección	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	197	208	$ 0	0%
286	Ejecución de Alcantarillado	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	197	208	$ 0	0%
287	Muro de Fachada	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	197	208	$ 0	0%
288	Acometida de alcantarillado	$ 0	jue 14/03/24	0 días	jue 14/03/24	40	211,215	$ 0	0%
289	Gestión social	$ 0	jue 14/02/24	24 días	vie 8/03/24	232	233	$ 0	0%
290	Puesta en marcha - Hora de Inicio	$ 0	jue 14/02/24	24 días	vie 8/03/24	232	221	$ 0	0%
291	Puesta en marcha de obra	$ 0	lun 4/03/24	0 días	lun 4/03/24	233	235	$ 0	0%
292	**Pilotaje**	$ 0	lun 4/03/24	9 días	vie 15/03/24	234	236	$ 0	0%
293	Atención de alcantarillados de pluvial	$ 0	jue 14/03/24	0 días	jue 14/03/24	202	216	$ 0	0%
294	Ejecución de mampostería de contención	$ 0	jue 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	221	211,217CC	$ 0	0%
295	Acometida de alcantarillado	$ 0	jue 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	209CC+1 día	211,217CC	$ 0	0%
296	Transporte Disposicion	$ 19.939.185	jue 15/12/23	11,5 días	mié 10/01/24	210CC	212CC,218CC+2días	$ 0	0%
297	Redes Hidrosanitarias - Pluvial	$ 115.019.197	lun 1/04/24	30 días	mié 15/05/24	212CC	215CC,237CC	$ 0	0%
298	Redes Hidrosanitarias - Sanitario	$ 115.019.197	lun 1/04/24	30 días	mié 15/05/24	212CC	215CC,237CC	$ 0	0%
299	**Ejecución de Obras - Nivel 5to**	**$ 1.440.844.424**	**lun 17/02/25**	**138 días**	**mié 30/07/25**			**$ 0**	**0%**
300	**CN: 1020113.01 FRITRE CL 11 A # 42 - 21 - 1440.844.424**							**$ 0**	**0%**
301	Gestión social	$ 0	lun 17/02/25	0 días	lun 17/02/25	296,297,302	301,297CC+0 días	$ 0	0%
302	Replanteo general	$ 2.165.110	lun 17/02/25	1 día	mar 18/02/25	305	307	$ 0	0%
303	Excavación mecanica Vía	$ 5.170.824	lun 17/02/25	1 día	lun 17/02/25	305	307CC+0 días	$ 0	0%
304	Excavación mecanica Vía	$ 5.170.824	lun 17/02/25	1 día	lun 17/02/25	305	307CC+0 días	$ 0	0%
305	Excavación manual para Cimentación	$ 5.170.824	lun 17/02/25	1 día	lun 17/02/25	305	307CC+0 días	$ 0	0%
306	Demolición de Tubería existente	$ 1.114.123	mié 19/02/25	30 días	mié 2/04/25	300CC+5 días	313CC+5 días,370CC	$ 0	0%
307	Demolición de Tubería existente	$ 1.114.123	mié 19/02/25	30 días	mié 2/04/25	300CC+5 días	313CC+5 días,370CC	$ 0	0%
308	Atención de alcantarillados de pluvial	$ 165.530.836	lun 3/03/25	30 días	lun 7/04/25	300CC	370CC	$ 0	0%
309	Redes Hidrosanitarias - Pluvial	$ 19.972.464	mié 2/04/25	70 días	mié 2/07/25			$ 0	0%

Proyecto: 3 Polígono 47/1/20 | Fecha: mié 3/04/25

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Hito crítico | Resumen | Resumen crítico | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tareas manuales | Duración manual | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Progreso manual | Tareas externas críticas | Duración inactiva | Hito inactivo manual | Resumen inactivo manual | Tareas externas inactivas | Hito externo inactivo | Fecha límite manual | Página 1

Nota: Color de barra: Azul: Alcantarillado, Amarillo: Acueducto, Verde: Vías, Gris: Actividades Generales, Rojo: Actividades Criticas, Naranja: Actividades Criticas Replanteo, Morado: Actividades Criticas Ejecución, Gris claro: Actividades Completadas

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	CPTP	% completado
313	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 6.810.916	lun 31/03/25	53 días	vie 13/06/25	310CC+5 días	315CC+5 días;314CC	$ 0	0%
314	Pozos	$ 6.081.594	lun 31/03/25	75 días	mar 19/08/25	313CC	345FC-1 día	$ 0	0%
315	Instalacion de tuberia	$ 0	lun 7/04/25	48 días	vie 13/06/25	313CC+5 días	316CC	$ 0	0%
316	Conexión sumidero pozo	$ 14.756.800	lun 7/04/25	48 días	vie 13/06/25	315CC	317	$ 0	0%
317	Sumideros	$ 6.222.094	vie 13/06/25	32 días	mar 2/09/25	316	376FC-11 días	$ 0	0%
318	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 40.565.407	lun 31/03/25	75 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
319	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 22.558.770	lun 31/03/25	53 días	vie 13/06/25	310CC+5 días	376CC;320CC	$ 0	0%
320	Pozos	$ 13.358.037	lun 31/03/25	75 días	mar 19/08/25	319CC	376CC;321CC+5 días	$ 0	0%
321	Instalacion de tuberia	$ 0	lun 7/04/25	48 días	vie 13/06/25	320CC+5 días	336;322CC	$ 0	0%
322	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 4.648.600	lun 7/04/25	48 días	vie 13/06/25	321CC	336;334FC+1 día	$ 0	0%
323	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 10/06/25	15 días	mar 5/08/25			$ 0	0%
324	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 10/06/25	15 días	mar 5/08/25	309CC+60 días	345	$ 0	0%
325	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 10/06/25	15 días	mar 5/08/25	309CC+60 días	345	$ 0	0%
326	Redes secas	$ 0	lun 17/02/25	106 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
327	Solicitud de Maniobras	$ 0	lun 17/02/25	0 días	lun 17/02/25	305	1917FF	$ 0	0%
328	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	lun 17/03/25	63 días	vie 13/06/25	309CC	329CC+5 días	$ 0	0%
329	Rellenos para redes secas	$ 0	vie 21/03/25	58 días	vie 13/06/25	328CC+5 días	330CC+2 días	$ 0	0%
330	Instalacion tuberia TDP	$ 0	mié 26/03/25	56 días	vie 13/06/25	329CC+2 días	331CC+5 días	$ 0	0%
331	Proteccion de tuberia	$ 0	mié 2/04/25	51 días	vie 13/06/25	330CC+5 días	332CC+40 días	$ 0	0%
332	Renivelacion camaras	$ 0	jue 29/05/25	33 días	mar 19/08/25	331CC+40 días	1917FF	$ 0	0%
333	Conformacion de la estructur	$ 1.205.175.684	lun 16/06/25	53 días	mar 30/09/25			$ 0	0%
334	Drenaje sub superficial	$ 0	lun 16/06/25	1 día	mar 17/06/25	322FC+1 día	336;335	$ 0	0%
335	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 4.121.111	mar 17/06/25	2 días	jue 19/06/25	334	336	$ 0	0%
336	Geotextil de separacion	$ 0	jue 19/06/25	1 día	vie 20/06/25	321;322;334;335	337	$ 0	0%
337	Mejoramiento de subrasant	$ 544.635.630	vie 20/06/25	2 días	mar 24/06/25	336	338	$ 0	0%
338	Sub base Granular RCD	$ 15.959.929	mar 24/06/25	2 días	jue 26/06/25	337	339;340	$ 0	0%
339	Sardinel	$ 6.845.152	jue 26/06/25	2 días	lun 4/08/25	338	341	$ 0	0%
340	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 14.834.418	jue 26/06/25	2 días	lun 4/08/25	338	341	$ 0	0%
341	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 171.235.737	lun 4/08/25	43 días	mar 30/09/25	339;340	1917FF	$ 0	0%
342	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 48.264.378	vie 8/08/25	40 días	mar 30/09/25	305FC+98 días	343CC+1 día	$ 0	0%
343	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 365.180.824	lun 11/08/25	39 días	mar 30/09/25	342CC+1 día	344CC+1 día	$ 0	0%
344	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 34.098.505	mar 12/08/25	38 días	mar 30/09/25	343CC+1 día	345FC-34 días	$ 0	0%
345	Fin etapa 1	$ 0	mar 19/08/25	11 días	mar 2/09/25	314FC-1 día;324;3	1917FF	$ 0	0%
346	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 267.034.686	jue 8/05/25	81 días	mar 30/09/25			$ 0	0%
347	Inicio Etapa 2	$ 0	jue 15/05/25	0 días	jue 15/05/25	305FC+63 días	348	$ 0	0%
348	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	jue 15/05/25	3 días	mar 20/05/25	347	349	$ 0	0%
349	Demolicion de concreto	$ 3.335.702	mar 20/05/25	72 días	mar 30/09/25	348	350CC	$ 0	0%
350	Excavacion manual Estructura	$ 567.408	vie 23/05/25	69 días	mar 30/09/25	349CC	352CC+6 días	$ 0	0%
351	Redes Humedas EAAB	$ 97.516.845	jue 8/05/25	81 días	mar 30/09/25			$ 0	0%
352	Excavacion manual	$ 5.950.070	vie 30/05/25	63 días	mar 30/09/25	350CC+6 días	353CC;357CC;359C	$ 0	0%
353	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 0	vie 30/05/25	63 días	mar 30/09/25	352CC	1917FF	$ 0	0%
354	Programacion Cierre Acued	$ 0	jue 8/05/25	81 días	mar 30/09/25	305FC+57 días	355CC+20 días;358	$ 0	0%
355	Conexión Acueducto	$ 0	mié 4/06/25	61 días	mar 30/09/25	354CC+20 días	356CC	$ 0	0%
356	Empate de acueducto	$ 11.259.586	mié 4/06/25	61 días	mar 30/09/25	355CC	1917FF	$ 0	0%
357	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 78.281.445	vie 30/05/25	63 días	mar 30/09/25	352CC	1917FF	$ 0	0%
358	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 0	jue 5/06/25	60 días	mar 30/09/25	354CC+21 días	1917FF	$ 0	0%
359	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 2.025.744	vie 30/05/25	63 días	mar 30/09/25	352CC	376CC	$ 0	0%
360	Redes Secas	$ 0	vie 30/05/25	63 días	mar 30/09/25			$ 0	0%
361	Excavacion manual	$ 0	vie 30/05/25	63 días	mar 30/09/25	352CC	362CC;365CC	$ 0	0%
362	Cajas de inspeccion	$ 0	vie 30/05/25	63 días	mar 30/09/25	361CC	363CC+2 días	$ 0	0%
363	Instalacion tuberia TDP	$ 0	mié 4/06/25	61 días	mar 30/09/25	362CC+2 días	364CC+2 días	$ 0	0%
364	Rellenos para redes secas	$ 0	vie 6/06/25	59 días	mar 30/09/25	363CC+2 días	1917FF	$ 0	0%
365	Renivelacion de cajas de inspeccion	$ 0	vie 30/05/25	63 días	mar 30/09/25	361CC	366FC-62 días	$ 0	0%
366	Ejecucion de Maniobras por parte de la ESP	$ 0	mar 3/06/25	0 días	mar 3/06/25	365FC-62 días	376CC-32 días	$ 0	0%
367	Conformacion de la estructur	$ 137.463.979	mié 11/06/25	56 días	mar 30/09/25			$ 0	0%
368	Geotextil	$ 27.867.810	mié 11/06/25	56 días	mar 30/09/25	352CC+7 días	369CC+2 días	$ 0	0%
369	Mejoramiento de subrasant	$ 15.959.929	vie 13/06/25	54 días	mar 30/09/25	368CC+2 días	370CC+4 días	$ 0	0%
370	Sub Base Granular PEA	$ 81.300.446	mié 18/06/25	50 días	mar 30/09/25	369CC+4 días	371CC+2 días	$ 0	0%
371	Bordillo Separacion de pañc	$ 0	vie 20/06/25	48 días	mar 30/09/25	370CC+2 días	372CC+3 días	$ 0	0%
372	Accesos Vehicular	$ 1.800.320	jue 26/06/25	45 días	mar 30/09/25	371CC+3 días	376CC;373CC	$ 0	0%
373	Arena de Peña	$ 0	jue 26/06/25	45 días	mar 30/09/25	372CC	374CC+5 días	$ 0	0%
374	Concreto estampado	$ 10.535.474	vie 8/08/25	40 días	mar 30/09/25	373CC+5 días	376CC;375CC+4 dí	$ 0	0%
375	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 28.150.752	mié 13/08/25	36 días	mar 30/09/25	374CC+4 días	376CC	$ 0	0%
376	Fin Etapa 2	$ 0	mar 19/08/25	33 días	mar 30/09/25	311CC;319CC;320C	1917CC-3 días	$ 0	0%
377	**CIV-16001232 ENTRE KR 41 B-CL 9 - CL 10**	**$ 1.475.485.740**	**jue 14/12/23**	**301 días**	**vie 7/02/25**			**$ 0**	**0%**
378	Inicio de Tramo	$ 0	jue 14/12/23	0 días	jue 14/12/23	40	380;383	$ 0	0%
379	**Gestión social**	**$ 0**	**jue 14/12/23**	**24 días**	**vie 19/01/24**			**$ 0**	**0%**
380	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	jue 14/12/23	15 días	lun 8/01/24	378	389;381	$ 0	0%
381	Reunión de Inicio de obra	$ 0	lun 8/01/24	9 días	vie 19/01/24	380	389	$ 0	0%
382	**PMT**	**$ 0**	**jue 14/12/23**	**30 días**	**vie 26/01/24**			**$ 0**	**0%**
383	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	jue 14/12/23	1 día	vie 15/12/23	378	384	$ 0	0%
384	Aprobación de interventoria	$ 0	vie 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	383	385FC+11 días	$ 0	0%
385	Radicación y Aprobación PMT a S	$ 0	vie 12/01/24	7 días	mar 23/01/24	384FC+11 días	386FC+1 día	$ 0	0%
386	Implementación PMT	$ 0	mié 24/01/24	3 días	vie 26/01/24	385FC+1 día	389	$ 0	0%
387	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 1.475.485.740**	**vie 26/01/24**	**271 días**	**vie 7/02/25**			**$ 0**	**0%**
388	**Etapa 1 - Intervención de calzad**	**$ 855.662.499**	**vie 26/01/24**	**118 días**	**jue 11/07/24**			**$ 0**	**0%**
389	Inicio Etapa 1	$ 0	vie 26/01/24	0 días	vie 26/01/24	380;381;386	390	$ 0	0%
390	Replanteo general	$ 1.446.875	lun 29/01/24	1 día	lun 29/01/24	389	391	$ 0	0%
391	Demolición de rodadura exist	$ 1.275.518	lun 29/01/24	3 días	jue 1/02/24	390	392	$ 0	0%
392	Excavacion mecanica Via	$ 9.727.055	jue 1/02/24	7 días	lun 12/02/24	391	393;395CC	$ 0	0%
393	Excavacion manual Via	$ 4.209.222	lun 12/02/24	15 días	vie 1/03/24	392	394CC;398CC+2 dí	$ 0	0%
394	Demolicion de Tuberia existe	$ 1.115.743	lun 12/02/24	15 días	vie 1/03/24	393CC	397CC;403CC	$ 0	0%
395	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 179.756.997	jue 1/02/24	113 días	mié 10/07/24	392CC	460	$ 0	0%
396	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 185.673.728	lun 12/02/24	88 días	vie 14/06/24			$ 0	0%
397	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 47.754.377	lun 12/02/24	17 días	mar 5/03/24	394CC	399CC;405CC	$ 0	0%
398	Pozos	$ 12.329.732	mié 14/02/24	86 días	vie 14/06/24	393CC+2 días	400CC+3 días	$ 0	0%
399	Instalacion de tuberia	$ 119.367.525	lun 12/02/24	32 días	mar 26/03/24	397CC	412;411	$ 0	0%
400	Conexión sumidero pozo	$ 0	lun 19/02/24	3 días	mié 21/02/24	398CC+3 días	401CC	$ 0	0%
401	Sumideros	$ 6.222.094	lun 19/02/24	83 días	vie 14/06/24	400CC	429	$ 0	0%
402	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 48.062.204	lun 12/02/24	88 días	vie 14/06/24			$ 0	0%
403	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 19.593.545	lun 12/02/24	17 días	mar 5/03/24	394CC	460	$ 0	0%
404	Pozos	$ 21.393.622	mié 14/02/24	86 días	vie 14/06/24	393CC+2 días	460	$ 0	0%
405	Instalacion de tuberia	$ 7.075.037	lun 12/02/24	16 días	lun 4/03/24	397CC	420;406CC;412FC+	$ 0	0%
406	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 0	lun 12/02/24	16 días	lun 4/03/24	405CC	420;418FC+25 días	$ 0	0%
407	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 11/06/24	15 días	mar 2/07/24			$ 0	0%
408	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 11/06/24	15 días	mar 2/07/24	393CC+84 días	429	$ 0	0%
409	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 11/06/24	15 días	mar 2/07/24	393CC+84 días	429	$ 0	0%
410	Redes secas	$ 48.308.451	jue 2/05/24	27 días	mar 11/06/24			$ 0	0%
411	Solicitud de Maniobras	$ 0	jue 2/05/24	0 días	jue 2/05/24	399;405FC+42 días	414CC+3 días	$ 0	0%
412	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	jue 2/05/24	12 días	lun 20/05/24	399;405FC+42 días	414CC+3 días	$ 0	0%
413	Rellenos para redes secas	$ 0	mié 8/05/24	16 días	jue 30/05/24	414CC+1 día	429	$ 0	0%
414	Instalacion tuberia TDP	$ 30.033.803	mar 7/05/24	15,11 días	mar 28/05/24	412CC+3 días;411(	413CC+1 día;415C	$ 0	0%
415	Proteccion de tuberia	$ 0	vie 17/05/24	15 días	vie 7/06/24	414CC+50%	429	$ 0	0%
416	Renivelacion camaras	$ 18.274.648	lun 20/05/24	15 días	mar 11/06/24	422	429	$ 0	0%
417	Conformacion de la estructur	$ 376.086.706	mar 9/04/24	66 días	jue 11/07/24			$ 0	0%
418	Drenaje sub superficial	$ 0	mar 9/04/24	7 días	jue 18/04/24	406FC+25 días	420;419	$ 0	0%
419	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 1.723.078	jue 18/04/24	2 días	lun 22/04/24	418	420	$ 0	0%
420	Geotextil de separacion	$ 0	lun 22/04/24	3 días	jue 25/04/24	405;406;418;419	421	$ 0	0%
421	Mejoramiento de subrasant	$ 223.076.389	jue 25/04/24	5 días	jue 2/05/24	420	422	$ 0	0%
422	Sub base Granular RCD	$ 27.198.425	jue 2/05/24	12 días	lun 20/05/24	421	416;424	$ 0	0%
423	Sardinel	$ 3.807.112	mié 19/06/24	15 días	mié 10/07/24	427FF	460	$ 0	0%
424	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 6.202.421	lun 20/05/24	2 días	mié 22/05/24	422	425FC+13 días	$ 0	0%
425	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 47.114.665	mié 12/06/24	3 días	vie 14/06/24	424FC+13 días	426	$ 0	0%
426	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 31.959.587	vie 14/06/24	15 días	vie 5/07/24	425	427CC+3 días	$ 0	0%
427	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 18.182.174	mié 19/06/24	15 días	mié 10/07/24	426CC+3 días	428CC+1 día;423FF	$ 0	0%
428	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 16.822.855	jue 20/06/24	15 días	jue 11/07/24	427CC+1 día	429	$ 0	0%
429	Fin etapa 1	$ 0	jue 11/07/24	0 días	jue 11/07/24	401;428;408;409;4	431FC+1 día	$ 0	0%
430	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 619.823.241	vie 12/07/24	152 días	vie 7/02/25			$ 0	0%
431	Inicio tapa 2	$ 0	vie 12/07/24	0 días	vie 12/07/24	429FC+1 día	432	$ 0	0%
432	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	vie 12/07/24	3 días	mié 17/07/24	431	433	$ 0	0%
433	Demolicion de concreto	$ 7.818.450	mié 17/07/24	12 días	jue 1/08/24	432	434	$ 0	0%
434	Excavacion manual Estructura	$ 7.056.664	jue 1/08/24	25 días	vie 6/09/24	433	439;436	$ 0	0%
435	Redes Humedas EAAB	$ 78.268.956	vie 30/08/24	31 días	jue 10/10/24			$ 0	0%
436	Excavacion manual	$ 4.081.190	vie 6/09/24	15 días	jue 26/09/24	434	437CC;438FF;441C	$ 0	0%
437	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 4.096.134	vie 6/09/24	16 días	vie 27/09/24	436CC	442	$ 0	0%
438	Programacion Cierre Acued	$ 0	vie 30/08/24	20 días	jue 26/09/24	436FF	439	$ 0	0%
439	Conexión Acueducto	$ 0	jue 26/09/24	1 día	vie 27/09/24	434;438	440CC	$ 0	0%
440	Empate de acueducto	$ 704.362	jue 26/09/24	1 día	vie 27/09/24	439CC	452;442	$ 0	0%
441	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 41.353.334	vie 6/09/24	15 días	vie 27/09/24	436CC+1 día	442	$ 0	0%
442	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 24.493.548	vie 27/09/24	10 días	jue 10/10/24	437;440;441	452	$ 0	0%
443	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 3.540.388	vie 6/09/24	1 día	vie 6/09/24	436CC	460	$ 0	0%
444	Redes Secas	$ 298.873.909	vie 6/09/24	18 días	mar 1/10/24			$ 0	0%
445	Excavacion manual	$ 0	vie 6/09/24	15 días	vie 27/09/24	436CC+1 día	446CC;449CC	$ 0	0%
446	Cajas de inspeccion	$ 114.226.861	vie 6/09/24	1 día	lun 9/09/24	445CC	447CC+2 días	$ 0	0%
447	Instalacion tuberia TDP	$ 57.272.613	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	446CC+2 días	448CC+5 días	$ 0	0%
448	Rellenos para redes secas	$ 116.328.179	mar 17/09/24	11 días	mar 1/10/24	447CC+5 días	452	$ 0	0%
449	Renivelacion de cajas de inspeccion	$ 11.046.256	vie 6/09/24	1 día	lun 9/09/24	445CC	450	$ 0	0%
450	Ejecucion maniobras por parte de la ESP	$ 0	lun 9/09/24	0 días	lun 9/09/24	449	460	$ 0	0%
451	Conformacion de la estructur	$ 216.574.602	jue 10/10/24	76 días	lun 27/01/25			$ 0	0%
452	Geotextil	$ 11.234.822	jue 10/10/24	7 días	lun 21/10/24	440;442;448	453	$ 0	0%
453	Mejoramiento de subrasant	$ 27.198.425	lun 21/10/24	14 días	mar 12/11/24	452	454	$ 0	0%
454	Sub Base Granular PEA	$ 66.350.943	mar 12/11/24	15 días	lun 2/12/24	453	455	$ 0	0%
455	Bordillo Separacion de pañc	$ 0	lun 2/12/24	10 días	vie 13/12/24	454	456;457	$ 0	0%
456	Accesos Vehicular	$ 14.603.502	vie 13/12/24	7 días	mar 24/12/24	455	460	$ 0	0%
457	Arena de Peña	$ 0	vie 13/12/24	20 días	mar 14/01/25	455	458CC+5 días	$ 0	0%
458	Concreto estampado	$ 97.186.910	vie 20/12/24	25 días	lun 27/01/25	457CC+5 días	460;459	$ 0	0%
459	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 11.230.660	lun 27/01/25	10 días	vie 7/02/25	458	460	$ 0	0%
460	Fin Etapa 2	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	395;403;404;443;4	1917	$ 0	0%
461	**CIV-16001194 ENTRE KR 41 B-CL 10-CL 10 A**	**$ 1.108.564.348**	**jue 14/12/23**	**302 días**	**lun 10/02/25**			**$ 0**	**0%**
462	Inicio de Tramo	$ 0	jue 14/12/23	0 días	jue 14/12/23	40	464;467	$ 0	0%
463	**Gestión social**	**$ 0**	**jue 14/12/23**	**24 días**	**vie 19/01/24**			**$ 0**	**0%**
464	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	jue 14/12/23	15 días	lun 8/01/24	462	473;465	$ 0	0%
465	Reunión de Inicio de obra	$ 0	lun 8/01/24	9 días	vie 19/01/24	464	473	$ 0	0%
466	**PMT**	**$ 0**	**jue 14/12/23**	**30 días**	**vie 26/01/24**			**$ 0**	**0%**
467	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	jue 14/12/23	1 día	vie 15/12/23	462	468	$ 0	0%
468	Aprobación de interventoria	$ 0	vie 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	467	469FC+11 días	$ 0	0%
469	Radicación y Aprobación PMT a S	$ 0	vie 12/01/24	7 días	mar 23/01/24	468FC+11 días	470FC+1 día	$ 0	0%
470	Implementación PMT	$ 0	mié 24/01/24	3 días	vie 26/01/24	469FC+1 día	473	$ 0	0%
471	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 1.108.564.348**	**vie 26/01/24**	**272 días**	**lun 10/02/25**			**$ 0**	**0%**
472	**Etapa 1 - Intervención de calzad**	**$ 651.100.754**	**vie 26/01/24**	**118 días**	**jue 11/07/24**			**$ 0**	**0%**
473	Inicio Etapa 1	$ 0	vie 26/01/24	0 días	vie 26/01/24	464;465;470	474	$ 0	0%
474	Replanteo general	$ 1.171.610	lun 29/01/24	1 día	lun 29/01/24	473	475	$ 0	0%
475	Demolición de rodadura exist	$ 1.275.518	lun 29/01/24	3 días	jue 1/02/24	474	476	$ 0	0%
476	Excavacion mecanica Via	$ 7.634.986	jue 1/02/24	7 días	lun 12/02/24	475	477;479CC	$ 0	0%



Proyecto: 2. Preliminar 0212202
Fecha: jue 2/10/25


Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Progreso manual

NOTA: EL PDT SE SUJETA A LAS APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS ESP Y DEMAS ENTIDADES ASOCIADAS A LOS ENTREGABLES, AUNADO A LA TOTALIDAD DE CAMBIOS REQUERIDO Y EVIDENCIADOS PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO IDU-1760-2021

Firma Contratista

Firma Interventoria

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	CPTP	% completado
477	Excavacion manual Via	$ 3.121.690	lun 12/02/24	15 días	vie 1/03/24	476	478CC,482CC,4	$ 0	0%
478	Demolicion de Tuberia existe	$ 1.116.523	lun 12/02/24	15 días	vie 1/03/24	477CC	483CC,487CC	$ 0	0%
479	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 140.033.129	jue 1/02/24	113 días	mié 10/07/24	476CC	544	$ 0	0%
480	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 128.830.503	lun 12/02/24	88 días	vie 14/06/24			$ 0	0%
481	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 35.555.096	lun 12/02/24	17 días	mar 5/03/24	478CC	483CC;489CC	$ 0	0%
482	Pozos	$ 3.293.161	mié 14/02/24	86 días	vie 14/06/24	477CC+2 días	484CC+3 días	$ 0	0%
483	Instalacion de tuberia	$ 83.760.152	lun 12/02/24	16 días	lun 4/03/24	481CC	496;485	$ 0	0%
484	Conexión sumidero poso	$ 0	lun 19/02/24	3 días	mié 21/02/24	482CC+3 días	485CC	$ 0	0%
485	Sumideros	$ 6.222.094	lun 19/02/24	83 días	vie 14/06/24	484CC	513	$ 0	0%
486	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 19.117.102	lun 12/02/24	88 días	vie 14/06/24			$ 0	0%
487	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 5.368.987	lun 12/02/24	17 días	mar 5/03/24	478CC	544	$ 0	0%
488	Pozos	$ 7.191.726	mié 14/02/24	86 días	vie 14/06/24	477CC+2 días	544	$ 0	0%
489	Instalacion de tuberia	$ 6.556.389	lun 12/02/24	16 días	lun 4/03/24	481CC	506;490CC;496FC+5	$ 0	0%
490	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 0	lun 12/02/24	16 días	lun 4/03/24	489CC	504;502FC+25 días	$ 0	0%
491	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 11/06/24	15 días	mar 2/07/24			$ 0	0%
492	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 11/06/24	15 días	mar 2/07/24	477CC+84 días	513	$ 0	0%
493	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 11/06/24	15 días	mar 2/07/24	477CC+84 días	513	$ 0	0%
494	Redes secas	$ 36.662.611	vie 17/05/24	33 días	mié 3/07/24			$ 0	0%
495	Solicitud de manobras	$ 0	vie 17/05/24	0 días	vie 17/05/24	483;489FC+52 días	498CC+3 días	$ 0	0%
496	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	vie 17/05/24	12 días	mar 4/06/24	483;489FC+52 días	498CC+3 días	$ 0	0%
497	Rellenos para redes secas	$ 0	mié 22/05/24	16 días	vie 14/06/24	498CC+1 día	513	$ 0	0%
498	Instalacion tuberia TDP	$ 30.580.516	mar 21/05/24	30 días	mié 3/07/24	496CC+3 días;495	495CC+1 día;499	$ 0	0%
499	Proteccion de tuberia	$ 0	mié 12/06/24	15 días	mié 3/07/24	498CC+50%	513	$ 0	0%
500	Reinstalacion camaras	$ 6.082.095	lun 20/05/24	15 días	mar 11/06/24	506	513	$ 0	0%
501	Conformacion de la estructur	$ 312.137.082	mar 9/04/24	66 días	jue 11/07/24			$ 0	0%
502	Drenaje sub superficial	$ 0	mar 9/04/24	7 días	jue 18/04/24	490FC+25 días	504;503	$ 0	0%
503	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 1.396.922	jue 18/04/24	2 días	lun 22/04/24	502	504	$ 0	0%
504	Geotextil de separacion	$ 0	lun 22/04/24	3 días	jue 25/04/24	489;490;502;503	505	$ 0	0%
505	Mejoramiento de subrasant	$ 170.980.679	jue 25/04/24	5 días	jue 2/05/24	504	506	$ 0	0%
506	Sub base Granular RCD	$ 22.050.197	jue 2/05/24	12 días	lun 20/05/24	505	500;508	$ 0	0%
507	Sardinel	$ 3.807.112	mié 19/06/24	15 días	mié 10/07/24	511FF	544	$ 0	0%
508	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 5.028.384	lun 20/05/24	2 días	mié 22/05/24	506	509FC+13 días	$ 0	0%
509	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 40.380.845	mié 12/06/24	3 días	vie 14/06/24	508FC+13 días	510	$ 0	0%
510	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 31.140.652	vie 14/06/24	15 días	vie 5/07/24	509	511CC+3 días	$ 0	0%
511	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 14.740.386	mié 19/06/24	15 días	mié 10/07/24	510CC+3 días	512CC+1 día;507FF	$ 0	0%
512	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 13.611.905	jue 20/06/24	15 días	jue 11/07/24	511CC+1 día	513	$ 0	0%
513	Fin etapa 1	$ 0	jue 11/07/24	0 días	jue 11/07/24	485,512,497,499,5	515FC+1 día	$ 0	0%
514	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 457.463.594	vie 12/07/24	153 días	lun 10/02/25			$ 0	0%
515	Inicio tapa 2	$ 0	vie 12/07/24	0 días	vie 12/07/24	513FC+1 día	516	$ 0	0%
516	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	vie 12/07/24	3 días	mié 17/07/24	515	517	$ 0	0%
517	Demolicion de concreto	$ 5.813.573	mié 17/07/24	12 días	jue 1/08/24	516	518	$ 0	0%
518	Excavacion manuel Estructur	$ 5.048.513	jue 1/08/24	25 días	vie 6/09/24	517	523;520	$ 0	0%
519	Redes Humedas EAAB	$ 59.470.479	vie 30/08/24	31 días	jue 10/10/24			$ 0	0%
520	Excavacion manual	$ 2.978.647	vie 6/09/24	15 días	jue 26/09/24	518	521CC;522FF;525CC	$ 0	0%
521	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 4.096.134	vie 6/09/24	16 días	vie 27/09/24	520CC	526	$ 0	0%
522	Programacion Cerre Acued	$ 0	vie 30/08/24	20 días	jue 26/09/24	520FF	523	$ 0	0%
523	Conexión Acueducto	$ 0	jue 26/09/24	1 día	vie 27/09/24	518;522	524CC	$ 0	0%
524	Empate de acueducto	$ 764.362	jue 26/09/24	1 día	vie 27/09/24	523CC	536;526	$ 0	0%
525	Instalacion Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 27.517.679	lun 9/09/24	15 días	vie 27/09/24	520CC+2 días	526	$ 0	0%
526	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 20.633.269	vie 27/09/24	9 días	jue 10/10/24	521;524;525	536	$ 0	0%
527	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 3.540.388	vie 6/09/24	2 días	lun 9/09/24	520CC	544	$ 0	0%
528	Redes Secas	$ 301.613.420	lun 9/09/24	18 días	mar 1/10/24			$ 0	0%
529	Excavacion manual	$ 0	lun 9/09/24	15 días	vie 27/09/24	530CC+2 días	530CC-0,9 días;535	$ 0	0%
530	Cajas de inspeccion	$ 89.302.638	lun 9/09/24	1 día	lun 9/09/24	529CC-0,9 días	531CC+2 días	$ 0	0%
531	Instalacion tuberia TDP	$ 60.513.273	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	530CC+2 días	532CC+5 días	$ 0	0%
532	Rellenos para redes secas	$ 30.513.015	mar 17/09/24	11 días	mar 1/10/24	531CC+5 días	536FC-1 día	$ 0	0%
533	Reinstalacion de cajas de inspeccion	$ 18.284.494	lun 9/09/24	1 día	lun 9/09/24	529CC-0,9 días	534FC-1 día	$ 0	0%
534	Ejecucion de manobras por parte de la ESP	$ 0	lun 9/09/24	0 días	lun 9/09/24	533FC-1 día	544	$ 0	0%
535	Conformacion de la estructur	$ 174.286.949	jue 10/10/24	76 días	lun 27/01/25			$ 0	0%
536	Geotextil	$ 9.081.272	jue 10/10/24	8 días	mar 22/10/24	524,526,532FC-1 d	537	$ 0	0%
537	Mejoramiento de subrasant	$ 22.050.197	mar 22/10/24	14 días	mar 12/11/24	536	538FC-1 día	$ 0	0%
538	Sub Base Granular PEA	$ 54.876.540	mar 12/11/24	15 días	lun 2/12/24	537FC-1 día	539	$ 0	0%
539	Bordillo Separacion de park	$ 0	lun 2/12/24	30 días	vie 13/12/24	538	540;541	$ 0	0%
540	Accesos Vehicular	$ 12.247.055	vie 13/12/24	7 días	mar 24/12/24	539	544	$ 0	0%
541	Arena de Peña	$ 0	vie 13/12/24	20 días	mar 14/01/25	539	542CC+5 días	$ 0	0%
542	Concreto estampado	$ 76.031.885	vie 20/12/24	25 días	lun 27/01/25	541CC+5 días	544;543	$ 0	0%
543	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 11.230.660	lun 27/01/25	15 días	lun 10/02/25	542	544	$ 0	0%
544	Fin Etapa 2	$ 0	lun 10/02/25	0 días	lun 10/02/25	479;487;488;527,5	519;517	$ 0	0%
545	**CV-1500\1296 ENTRE CL 10 KR 40 - KR41B**	**$ 1.716.446.802**	**lun 14/12/23**	**302 días**	**lun 10/02/25**			**$ 0**	**0%**
546	Inicio de Tramo	$ 0	jue 14/12/23	0 días	jue 14/12/23	40	548;551	$ 0	0%
547	**Gestión social**	**$ 0**	**jue 14/12/23**	**24 días**	**vie 19/01/24**			**$ 0**	**0%**
548	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	jue 14/12/23	15 días	lun 8/01/24	546	549;557	$ 0	0%
549	Reunión de Inicio de obra	$ 0	lun 8/01/24	9 días	vie 19/01/24	548	557	$ 0	0%
550	**PMT**	**$ 0**	**jue 14/12/23**	**30 días**	**vie 26/01/24**			**$ 0**	**0%**
551	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	jue 14/12/23	1 día	vie 15/12/23	546	552	$ 0	0%
552	Aprobación de interventoria	$ 0	vie 15/12/23	7 días	mié 27/12/23	551	553FC+11 días	$ 0	0%
553	Radicación y Aprobación PMT a	$ 0	vie 12/01/24	7 días	mar 23/01/24	552FC+11 días	554FC+1 día	$ 0	0%
554	Implementación PMT	$ 0	mié 24/01/24	3 días	vie 26/01/24	553FC+1 día	557	$ 0	0%
555	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 1.716.446.802**	**vie 26/01/24**	**272 días**	**lun 10/02/25**			**$ 0**	**0%**
556	**Etapa 1 - Intervención de calzad**	**$ 950.182.011**	**vie 26/01/24**	**230 días**	**jue 12/12/24**			**$ 0**	**0%**
557	Inicio Etapa 1	$ 0	vie 26/01/24	0 días	vie 26/01/24	548;549;554	558	$ 0	0%
558	Replanteo general	$ 1.873.445	lun 29/01/24	1 día	lun 29/01/24	557	559	$ 0	0%
559	Demolición de rodadura exis	$ 1.275.518	lun 29/01/24	3 días	jue 1/02/24	558	560	$ 0	0%
560	Excavacion mecanica Via	$ 11.295.652	jue 1/02/24	7 días	lun 12/02/24	559	561;563CC	$ 0	0%
561	Excavacion manual Via	$ 4.312.774	lun 12/02/24	15 días	vie 1/03/24	560	562CC;566CC+2 días	$ 0	0%
562	Demolicion de Tuberia existe	$ 1.116.523	lun 12/02/24	15 días	vie 1/03/24	561CC	565CC;571CC	$ 0	0%
563	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 182.750.814	jue 1/02/24	226 días	jue 12/12/24	560CC	628	$ 0	0%
564	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 99.978.590	lun 12/02/24	88 días	vie 14/06/24			$ 0	0%
565	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 36.422.355	lun 12/02/24	17 días	mar 5/03/24	562CC	567CC;573CC	$ 0	0%
566	Pozos	$ 14.057.642	mié 14/02/24	86 días	vie 14/06/24	561CC+2 días	568CC+3 días	$ 0	0%
567	Instalacion de tuberia	$ 43.276.499	lun 12/02/24	16 días	lun 4/03/24	565CC	580;579	$ 0	0%
568	Conexión sumidero poso	$ 0	lun 19/02/24	3 días	mié 21/02/24	566CC+3 días	569CC	$ 0	0%
569	Sumideros	$ 6.222.094	lun 19/02/24	83 días	vie 14/06/24	568CC	597	$ 0	0%
570	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 88.197.595	lun 12/02/24	88 días	vie 14/06/24			$ 0	0%
571	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 31.326.612	lun 12/02/24	17 días	mar 5/03/24	562CC	628	$ 0	0%
572	Pozos	$ 58.523.281	mié 14/02/24	86 días	vie 14/06/24	561CC+2 días	628	$ 0	0%
573	Instalacion de tuberia	$ 28.921.892	lun 12/02/24	16 días	lun 4/03/24	565CC	588;574CC;580FC+5	$ 0	0%
574	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 11.425.810	lun 12/02/24	16 días	lun 4/03/24	573CC	588;580FC+25 días	$ 0	0%
575	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 11/06/24	15 días	mar 2/07/24			$ 0	0%
576	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 11/06/24	15 días	mar 2/07/24	561CC+84 días	597	$ 0	0%
577	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 11/06/24	15 días	mar 2/07/24	561CC+84 días	597	$ 0	0%
578	Redes secas	$ 48.800.560	vie 17/05/24	33 días	mié 3/07/24			$ 0	0%
579	Solicitud de Maniobras	$ 0	vie 17/05/24	0 días	vie 17/05/24	567,573FC+52 días	583CC+3 días	$ 0	0%
580	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	vie 17/05/24	12 días	mar 4/06/24	567,573FC+52 días	583CC+3 días	$ 0	0%
581	Rellenos para redes secas	$ 0	mié 22/05/24	16 días	vie 14/06/24	582CC+1 día	597	$ 0	0%
582	Instalacion tuberia TDP	$ 30.560.755	mar 21/05/24	30 días	mié 3/07/24	580CC+3 días;579	581CC+1 día;583	$ 0	0%
583	Proteccion de tuberia	$ 0	mié 12/06/24	15 días	mié 3/07/24	582CC+50%	597	$ 0	0%
584	Reinstalacion camaras	$ 18.239.805	lun 20/05/24	15 días	mar 11/06/24	590	597	$ 0	0%
585	Conformacion de la estructur	$ 500.580.540	mar 9/04/24	66 días	jue 11/07/24			$ 0	0%
586	Drenaje sub superficial	$ 0	mar 9/04/24	7 días	jue 18/04/24	574FC+25 días	588;587	$ 0	0%
587	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 2.328.065	jue 18/04/24	2 días	lun 22/04/24	586	588	$ 0	0%
588	Geotextil de separacion	$ 0	lun 22/04/24	3 días	jue 25/04/24	573,574,586,587	589	$ 0	0%
589	Mejoramiento de subrasant	$ 301.032.627	jue 25/04/24	5 días	jue 2/05/24	588	590	$ 0	0%
590	Sub base Granular RCD	$ 36.748.411	jue 2/05/24	12 días	lun 20/05/24	589	584;592	$ 0	0%
591	Sardinel	$ 3.812.146	mié 19/06/24	15 días	mié 10/07/24	595FF	628	$ 0	0%
592	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 4.380.140	lun 20/05/24	2 días	mié 22/05/24	590	593FC+13 días	$ 0	0%
593	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 67.296.056	mié 12/06/24	3 días	vie 14/06/24	592FC+13 días	594	$ 0	0%
594	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 31.801.953	vie 14/06/24	15 días	vie 5/07/24	593	595CC+3 días	$ 0	0%
595	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 24.573.045	mié 19/06/24	15 días	mié 10/07/24	594CC+3 días	596CC+1 día;593FF	$ 0	0%
596	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 22.608.097	jue 20/06/24	15 días	jue 11/07/24	595CC+1 día	597	$ 0	0%
597	Fin etapa 1	$ 0	jue 11/07/24	0 días	jue 11/07/24	569,596,576,577,5	599FC+1 día	$ 0	0%
598	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 766.264.791	vie 12/07/24	153 días	lun 10/02/25			$ 0	0%
599	Inicio tapa 2	$ 0	vie 12/07/24	0 días	vie 12/07/24	597FC+1 día	600	$ 0	0%
600	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	vie 12/07/24	3 días	mié 17/07/24	599	601	$ 0	0%
601	Demolicion de concreto	$ 9.301.558	mié 17/07/24	12 días	jue 1/08/24	600	602	$ 0	0%
602	Excavacion manual Estructur	$ 3.394.518	jue 1/08/24	25 días	vie 6/09/24	601	607;604	$ 0	0%
603	Redes Humedas EAAB	$ 110.084.950	vie 30/08/24	31 días	jue 10/10/24			$ 0	0%
604	Excavacion manual	$ 2.417.020	vie 6/09/24	15 días	jue 26/09/24	602	605CC,606FF,609CC	$ 0	0%
605	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 8.866.794	vie 6/09/24	16 días	vie 27/09/24	604CC	610	$ 0	0%
606	Programacion Cerre Acued	$ 0	vie 30/08/24	20 días	jue 26/09/24	604FF	607	$ 0	0%
607	Conexión Acueducto	$ 0	jue 26/09/24	1 día	vie 27/09/24	602;606	608CC	$ 0	0%
608	Empate de acueducto	$ 0	jue 26/09/24	1 día	vie 27/09/24	607CC	620;610	$ 0	0%
609	Instalacion Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 55.799.789	lun 9/09/24	15 días	vie 27/09/24	604CC+2 días	610	$ 0	0%
610	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 34.782.256	vie 27/09/24	9 días	jue 10/10/24	605,608,609	620	$ 0	0%
611	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 8.219.091	vie 6/09/24	2 días	lun 9/09/24	604CC	628	$ 0	0%
612	Redes Secas	$ 364.900.540	lun 9/09/24	18 días	mar 1/10/24			$ 0	0%
613	Excavacion manual	$ 0	lun 9/09/24	15 días	vie 27/09/24	604CC+2 días	614CC-0,9 días;615	$ 0	0%
614	Cajas de inspeccion	$ 133.882.546	lun 9/09/24	1 día	lun 9/09/24	613CC-0,9 días	615CC+2 días	$ 0	0%
615	Instalacion tuberia TDP	$ 89.493.894	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	614CC+2 días	616CC+5 días	$ 0	0%
616	Rellenos para redes secas	$ 123.524.100	mar 17/09/24	11 días	mar 1/10/24	615CC+5 días	620	$ 0	0%
617	Reinstalacion de cajas de inspeccion	$ 0	lun 9/09/24	1 día	lun 9/09/24	613CC-0,9 días	618FC-1 día	$ 0	0%
618	Ejecucion de maniobras por parte de la ESP	$ 0	lun 9/09/24	0 días	lun 9/09/24	617FC-1 día	628	$ 0	0%
619	Conformacion de la estructur	$ 287.586.421	jue 10/10/24	76 días	lun 27/01/25			$ 0	0%
620	Geotextil	$ 13.590.587	jue 10/10/24	8 días	mar 22/10/24	608,610;616	621	$ 0	0%
621	Mejoramiento de subrasant	$ 36.748.411	mar 22/10/24	14 días	mar 12/11/24	620	622FC-1 día	$ 0	0%
622	Sub Base Granular PEA	$ 92.272.504	mar 12/11/24	15 días	lun 2/12/24	621FC-1 día	623	$ 0	0%
623	Bordillo Separacion de park	$ 0	lun 2/12/24	30 días	vie 13/12/24	622	624;625	$ 0	0%
624	Accesos Vehicular	$ 18.284.409	vie 13/12/24	7 días	mar 24/12/24	623	628	$ 0	0%
625	Arena de Peña	$ 0	vie 13/12/24	20 días	mar 14/01/25	623	626CC+5 días	$ 0	0%
626	Concreto estampado	$ 126.690.510	vie 20/12/24	25 días	lun 27/01/25	625CC+5 días	628;627	$ 0	0%
627	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 8.996.804	lun 27/01/25	15 días	lun 10/02/25	626	628	$ 0	0%
628	Fin Etapa 2	$ 0	lun 10/02/25	0 días	lun 10/02/25	563,571,572,611,6	591;617	$ 0	0%
629	**CV-1500\1886 ENTRE CL 8 -KR 34 A - KR 35**	**$ 1.986.768.424**	**vie 17/05/24**	**301 días**	**lun 18/08/25**			**$ 0**	**0%**
630	Inicio de Tramo	$ 0	vie 17/05/24	0 días	vie 17/05/24	40FC+110 días	632;635	$ 0	0%
631	**Gestión social**	**$ 0**	**lun 20/05/24**	**24 días**	**vie 21/06/24**			**$ 0**	**0%**
632	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	lun 20/05/24	15 días	mar 11/06/24	630	641;633	$ 0	0%
633	Reunión de Inicio de obra	$ 0	mar 11/06/24	9 días	vie 21/06/24	632	641	$ 0	0%
634	**PMT**	**$ 0**	**lun 20/05/24**	**30 días**	**mar 2/07/24**			**$ 0**	**0%**
635	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	lun 20/05/24	1 día	lun 20/05/24	630	636	$ 0	0%
636	Aprobación de interventoria	$ 0	lun 20/05/24	7 días	mié 28/05/24	635	637FC+11 días	$ 0	0%
637	Radicación y Aprobación PMT a	$ 0	vie 14/06/24	7 días	mar 25/06/24	636FC+11 días	638FC+1 día	$ 0	0%
638	Implementación PMT	$ 0	mié 26/06/24	3 días	mar 2/07/24	637FC+1 día	641	$ 0	0%
639	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 1.986.768.424**	**mar 2/07/24**	**271 días**	**lun 18/08/25**			**$ 0**	**0%**

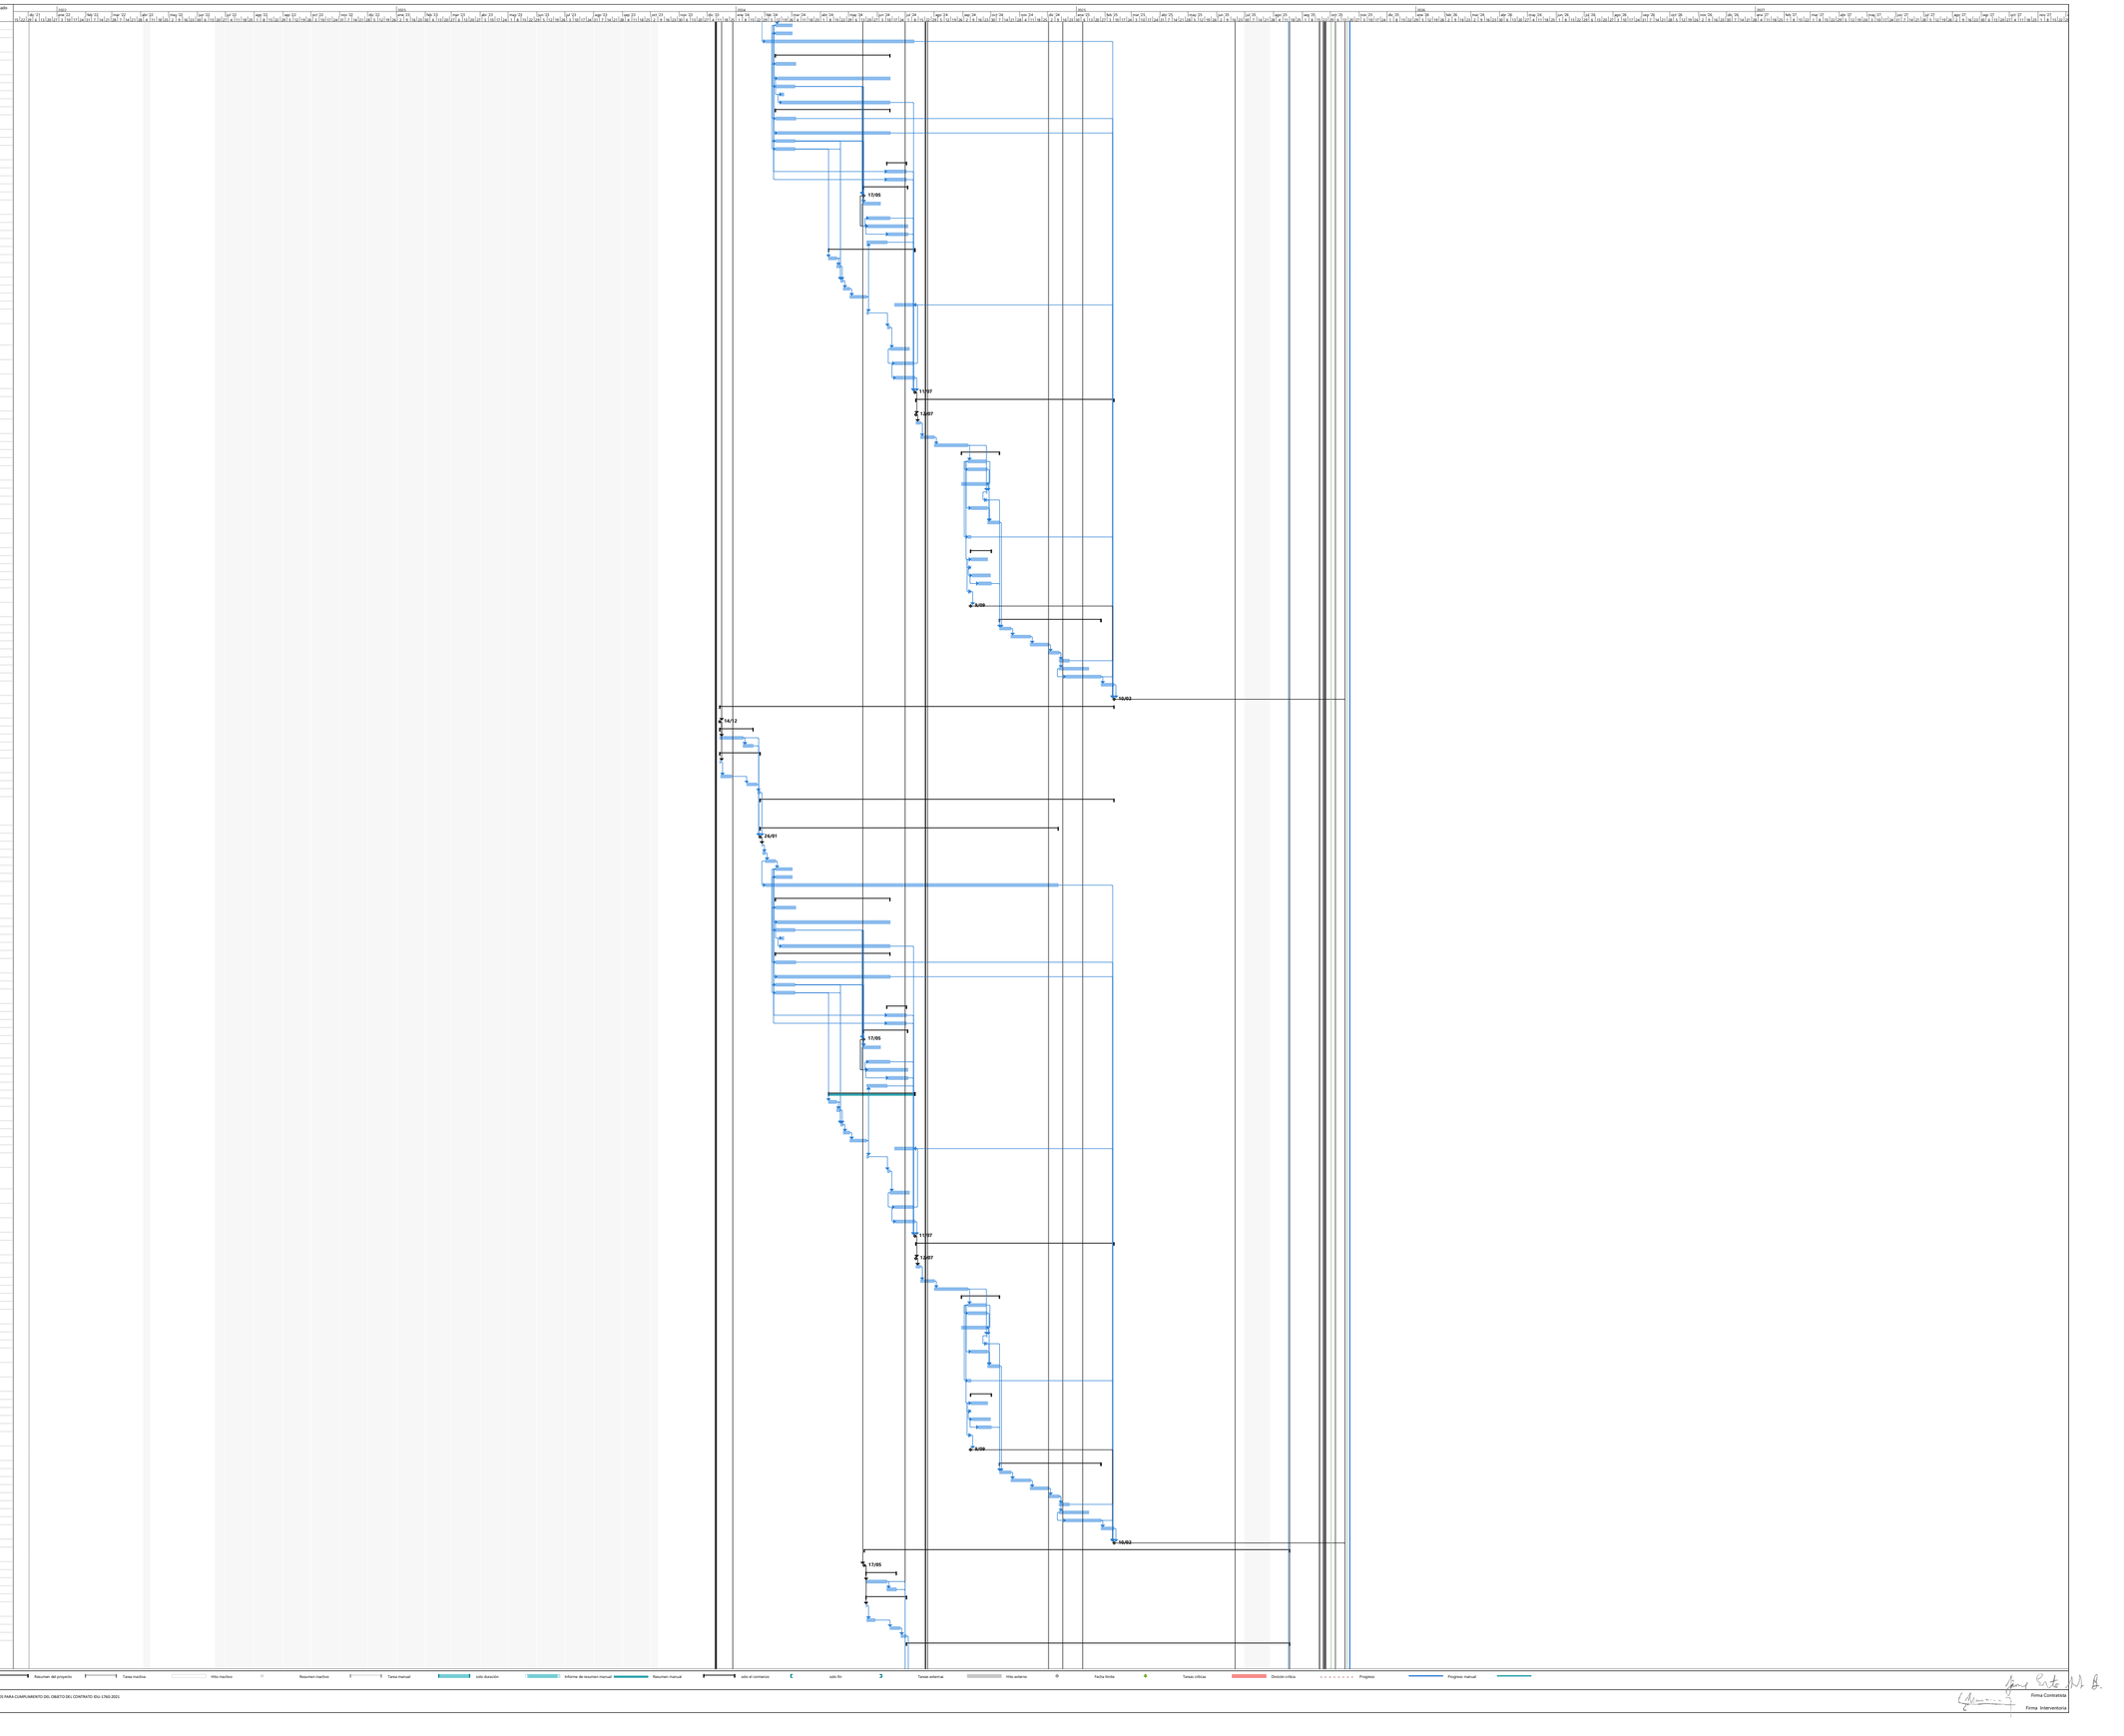

Proyecto: Z Preliminar (2)12022 Fecha: jue 2/1/25


Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Progreso manual

NOTA: EL POT SE SUJETA A LAS APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS ESP Y DEMAS ENTIDADES ASOCIADAS A LOS ENTREGABLES, ALINEADO A LA TOTALIDAD DE CAMBIOS REQUERIDO Y EVIDENCIADOS PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO: EDU 1765-2021

Firma Contratista

Firma Interventoria

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	CPTP	% completado
640	Etapa 1 - Intervención de calzad	$ 1.198.468.013	mar 2/07/24	138,5 días	jue 9/01/25			$ 0	0%
641	Inicio Etapa 1	$ 0	mar 2/07/24	0 días	mar 2/07/24	632;633;638	642	$ 0	0%
642	Replanteo general	$ 1.912.269	mar 2/07/24	1 día	mié 3/07/24	641	643	$ 0	0%
643	Demolición de rodadura exist	$ 1.275.947	mié 3/07/24	3 días	vie 5/07/24	642	644	$ 0	0%
644	Excavacion mecanica Via	$ 12.823.436	vie 5/07/24	7 días	mar 16/07/24	643	645;647CC	$ 0	0%
645	Excavacion manual Via	$ 4.260.761	mar 16/07/24	15 días	lun 5/08/24	644	646CC;650CC+2 día	$ 0	0%
646	Demolicion de Tuberia exister	$ 1.116.523	mar 16/07/24	15 días	lun 5/08/24	645CC	649CC;655CC	$ 0	0%
647	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 233.166.974	vie 5/07/24	134,5 días	jue 9/01/25	644CC	712	$ 0	0%
648	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 133.218.707	mar 16/07/24	88 días	jue 14/11/24			$ 0	0%
649	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 81.326.840	mar 16/07/24	17 días	jue 8/08/24	646CC	651CC;657CC	$ 0	0%
650	Pozos	$ 8.562.856	jue 18/07/24	86 días	jue 14/11/24	645CC+2 días	652CC+3 días	$ 0	0%
651	Instalacion de tuberia	$ 37.106.917	mar 16/07/24	16 días	mar 6/08/24	649CC	664;663	$ 0	0%
652	Conexión sumidero pozo	$ 0	mar 23/07/24	3 días	jue 25/07/24	650CC+3 días	653CC	$ 0	0%
653	Sumideros	$ 6.222.094	mar 23/07/24	83 días	jue 14/11/24	652CC	681	$ 0	0%
654	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 34.875.077	mar 16/07/24	88 días	jue 14/11/24			$ 0	0%
655	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 8.261.523	mar 16/07/24	17 días	jue 8/08/24	646CC	712	$ 0	0%
656	Pozos	$ 15.430.203	jue 18/07/24	86 días	jue 14/11/24	645CC+2 días	712	$ 0	0%
657	Instalacion de tuberia	$ 11.183.351	mar 16/07/24	16 días	mar 6/08/24	649CC	672;658CC;664FC+	$ 0	0%
658	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 0	mar 16/07/24	16 días	mar 6/08/24	657CC	672;670FC+25 días	$ 0	0%
659	Redes humedas - Acueducto	$ 0	vie 8/11/24	15 días	vie 29/11/24			$ 0	0%
660	Instalacion Acometidas	$ 0	vie 8/11/24	15 días	vie 29/11/24	645CC+84 días	681	$ 0	0%
661	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	vie 8/11/24	15 días	vie 29/11/24	645CC+84 días	681	$ 0	0%
662	Redes secas	$ 36.115.898	jue 17/10/24	25,5 días	vie 22/11/24			$ 0	0%
663	Solicitud de maniobras	$ 0	jue 17/10/24	0 días	jue 17/10/24	651;657FC+52 días	666CC+3 días	$ 0	0%
664	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	jue 17/10/24	12 días	vie 1/11/24	651;657FC+52 días	666CC+3 días	$ 0	0%
665	Rellenos para redes secas	$ 0	mar 22/10/24	16 días	jue 14/11/24	666CC+1 día	681	$ 0	0%
666	Instalacion tuberia TDP	$ 30.033.803	lun 21/10/24	15 días	mar 12/11/24	664CC+3 días;663C	665CC+1 día;667CC	$ 0	0%
667	Proteccion de tuberia	$ 0	jue 31/10/24	15 días	vie 22/11/24	666CC+50%	681	$ 0	0%
668	Renivelacion camaras	$ 6.082.095	lun 21/10/24	15 días	mar 12/11/24	674	681	$ 0	0%
669	Conformacion de la estructur	$ 739.702.421	mar 10/09/24	66 días	mar 10/12/24			$ 0	0%
670	Drenaje sub superficial	$ 0	mar 10/09/24	7 días	jue 19/09/24	658FC+25 días	672;671	$ 0	0%
671	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 2.343.708	jue 19/09/24	2 días	lun 23/09/24	670	672	$ 0	0%
672	Geotextil de separacion	$ 0	lun 23/09/24	3 días	jue 26/09/24	657;658;670;671	673	$ 0	0%
673	Mejoramiento de subrasant	$ 305.097.257	jue 26/09/24	5 días	mié 2/10/24	672	674	$ 0	0%
674	Sub base Granular RCD	$ 36.995.317	mié 2/10/24	12 días	vie 18/10/24	673	668;676	$ 0	0%
675	Sardinel	$ 3.807.112	mar 19/11/24	15 días	lun 9/12/24	679FF	712	$ 0	0%
676	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 8.436.450	lun 21/10/24	2 días	mar 22/10/24	674	677FC+13 días	$ 0	0%
677	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 67.749.661	mar 12/11/24	3 días	jue 14/11/24	676FC+13 días	678	$ 0	0%
678	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 43.779.281	jue 14/11/24	15 días	mié 4/12/24	677	679CC+3 días	$ 0	0%
679	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 248.649.885	mar 19/11/24	15 días	lun 9/12/24	678CC+3 días	680CC+1 día;675FF	$ 0	0%
680	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 22.843.750	mié 20/11/24	15 días	mar 10/12/24	679CC+1 día	681	$ 0	0%
681	Fin etapa 1	$ 0	mar 10/12/24	0 días	mar 10/12/24	653;680;660;661;6	683FC+1 día	$ 0	0%
682	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 788.300.411	mié 11/12/24	152 días	lun 18/08/25			$ 0	0%
683	Inicio tapa 2	$ 0	mié 11/12/24	0 días	mié 11/12/24	681FC+1 día	684	$ 0	0%
684	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	mié 11/12/24	3 días	lun 16/12/24	683	685	$ 0	0%
685	Demolicion de concreto	$ 9.487.335	lun 16/12/24	12 días	jue 2/01/25	684	686	$ 0	0%
686	Excavacion manual Estructura	$ 9.449.707	jue 2/01/25	25 días	jue 6/02/25	685	691;688	$ 0	0%
687	Redes Humedas EAAB	$ 177.328.359	jue 30/01/25	31 días	mié 12/03/25			$ 0	0%
688	Excavacion manual	$ 5.264.653	jue 6/02/25	15 días	mié 26/02/25	686	689CC;690FF;693C	$ 0	0%
689	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 5.445.186	jue 6/02/25	16 días	jue 27/02/25	688CC	694	$ 0	0%
690	Programacion Cierre Acued	$ 0	jue 30/01/25	20 días	mié 26/02/25	688FF	691	$ 0	0%
691	Conexión Acueducto	$ 0	mié 26/02/25	1 día	jue 27/02/25	686;690	692CC	$ 0	0%
692	Empate de acueducto	$ 0	mié 26/02/25	1 día	jue 27/02/25	691CC	704;694	$ 0	0%
693	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 103.608.634	vie 7/02/25	15 días	jue 27/02/25	688CC+1 día	694	$ 0	0%
694	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 61.490.578	jue 27/02/25	10 días	mié 12/03/25	689;692;693	704	$ 0	0%
695	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 1.519.308	jue 6/02/25	1 día	vie 7/02/25	688CC	712	$ 0	0%
696	Redes Secas	$ 233.209.168	vie 7/02/25	18 días	lun 3/03/25			$ 0	0%
697	Excavacion manual	$ 0	vie 7/02/25	15 días	jue 27/02/25	688CC+1 día	698CC;701CC	$ 0	0%
698	Cajas de inspeccion	$ 81.063.214	vie 7/02/25	1 día	vie 7/02/25	697CC	699CC+2 días	$ 0	0%
699	Instalacion tuberia TDP	$ 95.151.947	lun 10/02/25	15 días	vie 28/02/25	698CC+2 días	700CC+5 días	$ 0	0%
700	Rellenos para redes secas	$ 36.759.814	lun 17/02/25	11 días	lun 3/03/25	699CC+5 días	704	$ 0	0%
701	Renivelacion de cajas de inspeccion	$ 20.234.193	vie 7/02/25	1 día	vie 7/02/25	697CC	702	$ 0	0%
702	Ejecucion de maniobras por parte de la ESP	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	701	712	$ 0	0%
703	Conformacion de la estructur	$ 336.402.164	mié 12/03/25	76 días	vie 1/08/25			$ 0	0%
704	Geotextil	$ 14.193.913	mié 12/03/25	7 días	vie 21/03/25	692;694;700	705	$ 0	0%
705	Mejoramiento de subrasant	$ 36.995.317	vie 21/03/25	14 días	jue 10/04/25	704	706	$ 0	0%
706	Sub Base Granular PEA	$ 143.710.520	jue 10/04/25	15 días	lun 5/05/25	705	707	$ 0	0%
707	Bordillo Separacion de pañc	$ 0	lun 5/05/25	10 días	vie 16/05/25	706	708;709	$ 0	0%
708	Accesos Vehicular	$ 25.660.704	vie 16/05/25	7 días	mar 27/05/25	707	712	$ 0	0%
709	Arena de Peña	$ 0	vie 16/05/25	20 días	vie 13/06/25	707	710CC+5 días	$ 0	0%
710	Concreto estampado	$ 115.841.710	vie 23/05/25	25 días	vie 1/08/25	709CC+5 días	712;711	$ 0	0%
711	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 22.423.678	vie 1/08/25	10 días	lun 18/08/25	710	712	$ 0	0%
712	Fin Etapa 2	$ 0	lun 18/08/25	0 días	lun 18/08/25	647;655;656;695;7	1917	$ 0	0%
713	CIV-16001836 ENTRE CL 10-KR 33 - KR 34	$ 1.814.133.069	mar 2/07/24	273 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
714	Inicio de Tramo	$ 0	mar 2/07/24	0 días	mar 2/07/24	40FC+140 días	716;719	$ 0	0%
715	Gestión social	$ 0	mar 2/07/24	2 días	mié 3/07/24			$ 0	0%
716	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	mar 2/07/24	1 día	mié 3/07/24	714	725;717	$ 0	0%
717	Reunión de Inicio de obra	$ 0	mié 3/07/24	1 día	mié 3/07/24	716	725	$ 0	0%
718	PMT	$ 0	mar 2/07/24	30 días	lun 12/08/24			$ 0	0%
719	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	mar 2/07/24	1 día	mié 3/07/24	714	720	$ 0	0%
720	Aprobación de interventoria	$ 0	mié 3/07/24	7 días	jue 11/07/24	719	721FC+11 días	$ 0	0%
721	Radicación y Aprobación PMT a S	$ 0	jue 25/07/24	7 días	lun 5/08/24	720FC+11 días	722FC+1 día	$ 0	0%
722	Implementación PMT	$ 0	mar 6/08/24	3 días	lun 12/08/24	721FC+1 día	725	$ 0	0%
723	Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños	$ 1.814.133.069	lun 12/08/24	243 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
724	Etapa 1 - Intervención de calzad	$ 1.171.694.706	lun 12/08/24	119 días	jue 23/01/25			$ 0	0%
725	Inicio Etapa 1	$ 0	lun 12/08/24	0 días	lun 12/08/24	716;717;722	726	$ 0	0%
726	Replanteo general	$ 1.409.240	lun 12/08/24	1 día	mar 13/08/24	725	727	$ 0	0%
727	Demolición de rodadura exist	$ 1.275.947	mar 13/08/24	3 días	jue 15/08/24	726	728	$ 0	0%
728	Excavacion mecanica Via	$ 7.040.776	vie 16/08/24	7 días	mar 27/08/24	727	729;731CC	$ 0	0%
729	Excavacion manual Via	$ 1.354.214	mar 27/08/24	15 días	lun 16/09/24	728	730CC;734CC+2 día	$ 0	0%
730	Demolicion de Tuberia exister	$ 1.116.523	mar 27/08/24	15 días	lun 16/09/24	729CC	733CC;739CC	$ 0	0%
731	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 125.516.267	vie 16/08/24	113 días	mar 21/01/25	728CC	796	$ 0	0%
732	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 502.983.112	mar 27/08/24	88 días	mar 24/12/24			$ 0	0%
733	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 55.456.944	mar 27/08/24	17 días	mié 18/09/24	730CC	735CC;741CC	$ 0	0%
734	Pozos	$ 11.357.799	jue 29/08/24	86 días	mar 24/12/24	729CC+2 días	736CC+3 días	$ 0	0%
735	Instalacion de tuberia	$ 429.946.275	mar 27/08/24	16 días	mar 17/09/24	733CC	748;747	$ 0	0%
736	Conexión sumidero pozo	$ 0	mar 3/09/24	3 días	vie 6/09/24	734CC+3 días	737CC	$ 0	0%
737	Sumideros	$ 6.222.094	mar 3/09/24	83 días	mar 24/12/24	736CC	765	$ 0	0%
738	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 27.421.198	mar 27/08/24	88 días	mar 24/12/24			$ 0	0%
739	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 3.263.502	mar 27/08/24	17 días	mié 18/09/24	730CC	796	$ 0	0%
740	Pozos	$ 18.407.466	jue 29/08/24	86 días	mar 24/12/24	729CC+2 días	796	$ 0	0%
741	Instalacion de tuberia	$ 5.750.230	mar 27/08/24	16 días	mar 17/09/24	733CC	756;742CC;748;74	$ 0	0%
742	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 0	mar 27/08/24	16 días	mar 17/09/24	741CC	756	$ 0	0%
743	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 3/09/24	15 días	lun 23/09/24			$ 0	0%
744	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 3/09/24	15 días	lun 23/09/24	729CC+5 días	756	$ 0	0%
745	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 3/09/24	15 días	lun 23/09/24	729CC+5 días	756	$ 0	0%
746	Redes secas	$ 36.115.898	mar 17/09/24	70 días	lun 23/12/24			$ 0	0%
747	Solicitud de Maniobras	$ 0	mar 17/09/24	0 días	mar 17/09/24	735;741	750CC+3 días	$ 0	0%
748	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	mar 17/09/24	12 días	mié 2/10/24	735;741	750CC+3 días	$ 0	0%
749	Rellenos para redes secas	$ 0	lun 23/09/24	16 días	mar 15/10/24	750CC+1 día	756	$ 0	0%
750	Instalacion tuberia TDP	$ 30.033.803	vie 20/09/24	15 días	jue 10/10/24	748CC+3 días;747C	749CC+1 día;751CC	$ 0	0%
751	Proteccion de tuberia	$ 0	mar 1/10/24	15 días	mar 22/10/24	750CC+8 días	756;754	$ 0	0%
752	Renivelacion camaras	$ 6.082.095	mar 3/12/24	15 días	lun 23/12/24	758	765	$ 0	0%
753	Conformacion de la estructur	$ 467.461.531	mar 22/10/24	66 días	jue 23/01/25			$ 0	0%
754	Drenaje sub superficial	$ 0	mar 22/10/24	7 días	jue 31/10/24	751	756;755	$ 0	0%
755	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 1.424.710	jue 31/10/24	2 días	mar 5/11/24	754	756	$ 0	0%
756	Geotextil de separacion	$ 0	mar 5/11/24	3 días	vie 8/11/24	741;742;744;745;7	757	$ 0	0%
757	Mejoramiento de subrasant	$ 183.641.956	vie 8/11/24	5 días	vie 15/11/24	756	758	$ 0	0%
758	Sub base Granular RCD	$ 22.489.184	vie 15/11/24	12 días	mar 3/12/24	757	752;760	$ 0	0%
759	Sardinel	$ 3.807.112	mar 31/12/24	15 días	mié 22/01/25	763FF	765	$ 0	0%
760	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 5.128.445	mar 3/12/24	2 días	mié 4/12/24	758	761FC+13 días	$ 0	0%
761	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 41.183.685	lun 23/12/24	3 días	jue 26/12/24	760FC+13 días	762	$ 0	0%
762	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 44.185.379	jue 26/12/24	15 días	vie 17/01/25	761	763CC+3 días	$ 0	0%
763	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 151.147.419	mar 31/12/24	15 días	mié 22/01/25	762CC+3 días	764CC+1 día;759FF	$ 0	0%
764	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 14.453.641	jue 2/01/25	15 días	jue 23/01/25	763CC+1 día	765	$ 0	0%
765	Fin etapa 1	$ 0	jue 23/01/25	0 días	jue 23/01/25	737;752;764;759	767FC+1 día	$ 0	0%
766	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 642.438.363	vie 24/01/25	123 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
767	Inicio tapa 2	$ 0	vie 24/01/25	0 días	vie 24/01/25	765FC+1 día	768	$ 0	0%
768	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	vie 24/01/25	3 días	mié 29/01/25	767	769	$ 0	0%
769	Demolicion de concreto	$ 7.975.583	mié 29/01/25	12 días	jue 13/02/25	768	770	$ 0	0%
770	Excavacion manual Estructura	$ 3.786.976	jue 13/02/25	25 días	mié 19/03/25	769	775;772	$ 0	0%
771	Redes Humedas EAAB	$ 115.534.425	mié 12/03/25	31 días	vie 25/04/25			$ 0	0%
772	Excavacion manual	$ 2.055.286	mié 19/03/25	15 días	mié 9/04/25	770	773CC;774FF;777C	$ 0	0%
773	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 2.023.578	mié 19/03/25	16 días	jue 10/04/25	772CC	778	$ 0	0%
774	Programacion Cierre Acued	$ 0	mié 12/03/25	20 días	mié 9/04/25	772FF	775	$ 0	0%
775	Conexión Acueducto	$ 0	mié 9/04/25	1 día	jue 10/04/25	770;774	776CC	$ 0	0%
776	Empate de acueducto	$ 0	mié 9/04/25	1 día	jue 10/04/25	775CC	788;778	$ 0	0%
777	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 71.411.558	jue 20/03/25	15 días	jue 10/04/25	772CC+1 día	778	$ 0	0%
778	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 38.905.688	jue 10/04/25	10 días	vie 25/04/25	773;776;777	788	$ 0	0%
779	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 1.138.315	mié 19/03/25	1 día	jue 20/03/25	772CC	796	$ 0	0%
780	Redes Secas	$ 214.877.874	jue 20/03/25	18 días	lun 14/04/25			$ 0	0%
781	Excavacion manual	$ 0	jue 20/03/25	15 días	jue 10/04/25	772CC+1 día	782CC;785CC	$ 0	0%
782	Cajas de inspeccion	$ 88.180.802	jue 20/03/25	1 día	vie 21/03/25	781CC	783CC+2 días	$ 0	0%
783	Instalacion tuberia TDP	$ 54.632.960	vie 21/03/25	15 días	vie 11/04/25	782CC+2 días	784CC+5 días	$ 0	0%
784	Rellenos para redes secas	$ 52.885.595	lun 31/03/25	11 días	lun 14/04/25	783CC+5 días	788	$ 0	0%
785	Renivelacion de cajas de inspeccion	$ 19.178.517	jue 20/03/25	1 día	vie 21/03/25	781CC	786	$ 0	0%
786	Ejecucion de maniobras por parte de la ESP	$ 0	vie 21/03/25	0 días	vie 21/03/25	785	796	$ 0	0%
787	Conformacion de la estructur	$ 256.429.481	vie 25/04/25	57 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
788	Geotextil	$ 13.443.360	vie 25/04/25	7 días	mié 7/05/25	776;778;784	789	$ 0	0%
789	Mejoramiento de subrasant	$ 22.489.184	mié 7/05/25	14 días	lun 26/05/25	788	790	$ 0	0%
790	Sub Base Granular PEA	$ 94.102.696	lun 26/05/25	15 días	lun 16/06/25	789	791	$ 0	0%
791	Bordillo Separacion de pañc	$ 19.994.517	lun 16/06/25	10 días	lun 4/08/25	790	792;793	$ 0	0%
792	Accesos Vehicular	$ 15.117.235	lun 4/08/25	7 días	jue 14/08/25	791	796	$ 0	0%
793	Arena de Peña	$ 0	lun 4/08/25	11 días	mar 19/08/25	791	794CC+5 días	$ 0	0%
794	Concreto estampado	$ 91.282.489	mar 12/08/25	3 días	vie 15/08/25	793CC+5 días	796;795	$ 0	0%
795	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 43.834.024	vie 15/08/25	1 día	lun 18/08/25	794	796FC+2 días	$ 0	0%
796	Fin Etapa 2	$ 0	mar 19/08/25	0 días	mar 19/08/25	731;739;740;779;7	1917	$ 0	0%
797	CIV-16000977 / 16004754 ENTRE CL 16-KR 36 - KR 37	$ 1.424.139.037	mar 2/07/24	273 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
798	Inicio de Tramo	$ 0	mar 2/07/24	0 días	mar 2/07/24	40FC+140 días	800;803	$ 0	0%
799	Gestión social	$ 0	mar 2/07/24	24 días	jue 1/08/24			$ 0	0%
800	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	mar 2/07/24	15 días	lun 22/07/24	798	809;801	$ 0	0%
801	Reunión de Inicio de obra	$ 0	lun 22/07/24	9 días	jue 1/08/24	800	809	$ 0	0%
802	PMT	$ 0	mar 2/07/24	30 días	lun 12/08/24			$ 0	0%
803	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	mar 2/07/24	1 día	mié 3/07/24	798	804	$ 0	0%
804	Aprobación de interventoria	$ 0	mié 3/07/24	7 días	jue 11/07/24	803	805FC+11 días	$ 0	0%




Proyecto: 2. Preliminar 0212202
Fecha: jue 2/10/25

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Progreso manual


NOTA: EL PDT SE SUJETA A LAS APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS ESP Y DEMAS ENTIDADES ASOCIADAS A LOS ENTREGABLES, AUNADO A LA TOTALIDAD DE CAMBIOS REQUERIDO Y EVIDENCIADOS PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO IDU-1760-2021

Firma Contratista

Firma Interventoria

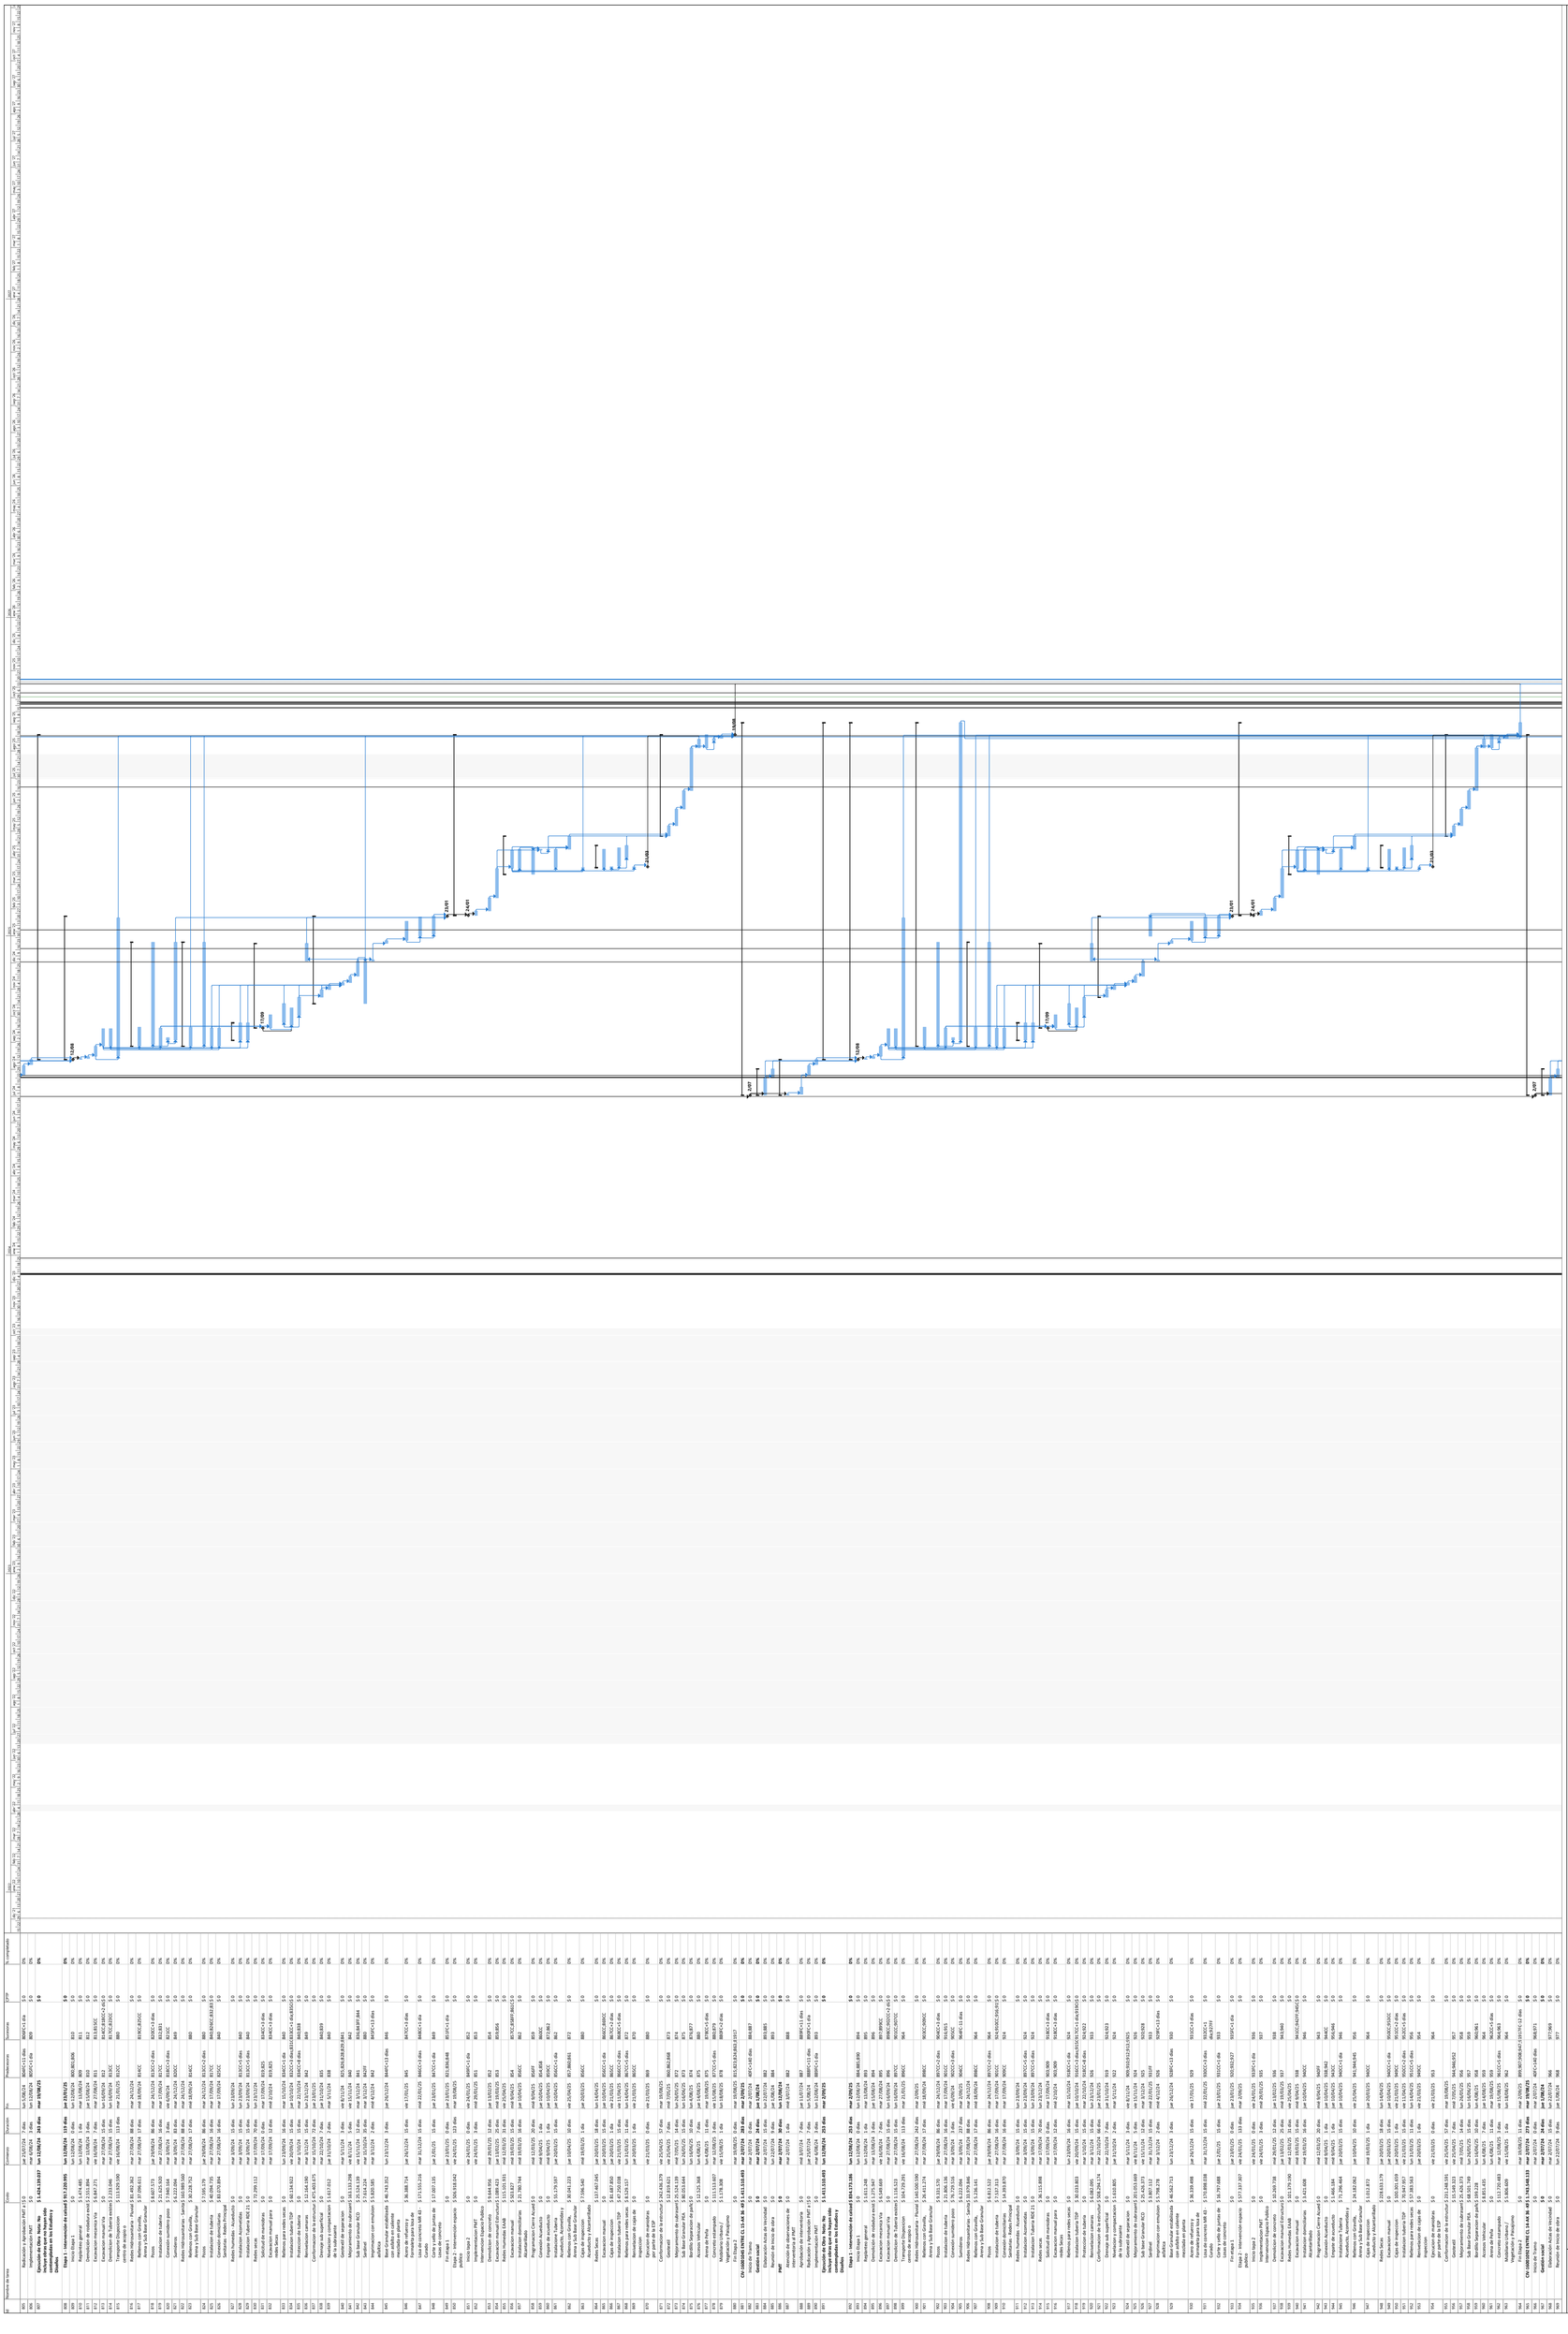

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	CPTP	% completado
970	**PMT**	**$ 0**	**mar 2/07/24**	**30 días**	**lun 12/08/24**			**$ 0**	**0%**
971	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	mar 2/07/24	1 día	mié 3/07/24	966	972	$ 0	0%
972	Aprobación de interventoria	$ 0	mié 3/07/24	7 días	jue 11/07/24	971	973FC+11 días	$ 0	0%
973	Radicación y Aprobación PMT a S	$ 0	jue 25/07/24	7 días	lun 5/08/24	972FC+11 días	974FC+1 día	$ 0	0%
974	Implementación PMT	$ 0	mar 6/08/24	3 días	lun 12/08/24	973FC+1 día	977	$ 0	0%
975	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 1.743.548.133**	**lun 12/08/24**	**243 días**	**mar 19/08/25**			**$ 0**	**0%**
976	**Etapa 1 - Intervención de calzad**	**$ 1.030.120.535**	**lun 12/08/24**	**119 días**	**jue 23/01/25**			**$ 0**	**0%**
977	Inicio Etapa 1	$ 0	lun 12/08/24	0 días	lun 12/08/24	968;969;974	978	$ 0	0%
978	Replanteo general	$ 1.515.783	lun 12/08/24	1 día	mar 13/08/24	977	979	$ 0	0%
979	Demolición de rodadura exist	$ 1.275.947	mar 13/08/24	3 días	jue 15/08/24	978	980	$ 0	0%
980	Excavacion mecanica Via	$ 7.111.070	vie 16/08/24	7 días	mar 27/08/24	979	981;983CC	$ 0	0%
981	Excavacion manual Via	$ 0	mar 27/08/24	15 días	lun 16/09/24	980	982CC;986CC+2 dí	$ 0	0%
982	Demolicion de Tuberia exister	$ 1.116.523	mar 27/08/24	15 días	lun 16/09/24	981CC	985CC;991CC	$ 0	0%
983	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 117.505.083	vie 16/08/24	113 días	mar 21/01/25	980CC	1048	$ 0	0%
984	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 308.675.714	mar 27/08/24	88 días	mar 24/12/24			$ 0	0%
985	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 74.684.535	mar 27/08/24	17 días	mié 18/09/24	982CC	987CC;993CC	$ 0	0%
986	Pozos	$ 11.378.013	jue 29/08/24	86 días	mar 24/12/24	981CC+2 días	988CC+3 días	$ 0	0%
987	Instalacion de tuberia	$ 216.391.072	mar 27/08/24	16 días	mar 17/09/24	985CC	1000;999	$ 0	0%
988	Conexión sumidero pozo	$ 0	mar 3/09/24	3 días	vie 6/09/24	986CC+3 días	989CC	$ 0	0%
989	Sumideros	$ 6.222.094	mar 3/09/24	83 días	mar 24/12/24	988CC	1017	$ 0	0%
990	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 41.544.312	mar 27/08/24	88 días	mar 24/12/24			$ 0	0%
991	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 6.040.737	mar 27/08/24	17 días	mié 18/09/24	982CC	1048	$ 0	0%
992	Pozos	$ 9.714.317	jue 29/08/24	86 días	mar 24/12/24	981CC+2 días	1048	$ 0	0%
993	Instalacion de tuberia	$ 11.395.388	mar 27/08/24	16 días	mar 17/09/24	985CC	1008;994CC;1000;	$ 0	0%
994	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 14.393.870	mar 27/08/24	16 días	mar 17/09/24	993CC	1008	$ 0	0%
995	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 3/09/24	15 días	lun 23/09/24			$ 0	0%
996	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 3/09/24	15 días	lun 23/09/24	981CC+5 días	1008	$ 0	0%
997	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 3/09/24	15 días	lun 23/09/24	981CC+5 días	1008	$ 0	0%
998	Redes secas	$ 36.115.898	mar 17/09/24	70 días	lun 23/12/24			$ 0	0%
999	Solicitud de maniobras	$ 0	mar 17/09/24	0 días	mar 17/09/24	987;993	1002CC+3 días	$ 0	0%
1000	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	mar 17/09/24	12 días	mié 2/10/24	987;993	1002CC+3 días	$ 0	0%
1001	Rellenos para redes secas	$ 0	lun 23/09/24	16 días	mar 15/10/24	1002CC+1 día	1008	$ 0	0%
1002	Instalacion tuberia TDP	$ 30.033.803	vie 20/09/24	15 días	jue 10/10/24	1000CC+3 días;99	1001CC+1 día;100	$ 0	0%
1003	Proteccion de tuberia	$ 0	mar 1/10/24	15 días	mar 22/10/24	1002CC+8 días	1008;1006	$ 0	0%
1004	Renivelacion camaras	$ 6.082.095	mar 3/12/24	15 días	lun 23/12/24	1010	1017	$ 0	0%
1005	Conformacion de la estructur	$ 515.260.205	mar 22/10/24	66 días	jue 23/01/25			$ 0	0%
1006	Drenaje sub superficial	$ 0	mar 22/10/24	7 días	jue 31/10/24	1003	1008;1007	$ 0	0%
1007	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 1.632.947	jue 31/10/24	2 días	mar 5/11/24	1006	1008	$ 0	0%
1008	Geotextil de separacion	$ 0	mar 5/11/24	3 días	vie 8/11/24	993;994;996;997;1	1009	$ 0	0%
1009	Mejoramiento de subrasant	$ 204.288.256	vie 8/11/24	5 días	vie 15/11/24	1008	1010	$ 0	0%
1010	Sub base Granular RCD	$ 25.775.646	vie 15/11/24	12 días	mar 3/12/24	1009	1004;1012	$ 0	0%
1011	Sardinel	$ 3.807.112	mar 31/12/24	15 días	mié 22/01/25	1015FF	1048	$ 0	0%
1012	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 5.877.945	mar 3/12/24	2 días	mié 4/12/24	1010	1013FC+13 días	$ 0	0%
1013	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 47.202.978	lun 23/12/24	3 días	jue 26/12/24	1012FC+13 días	1014	$ 0	0%
1014	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 36.339.498	jue 26/12/24	15 días	vie 17/01/25	1013	1015CC+3 días	$ 0	0%
1015	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 173.251.108	mar 31/12/24	15 días	mié 22/01/25	1014CC+3 días	1016CC+1 día;1011FF	$ 0	0%
1016	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 17.084.715	jue 2/01/25	15 días	jue 23/01/25	1015CC+1 día	1017	$ 0	0%
1017	Fin etapa 1	$ 0	jue 23/01/25	0 días	jue 23/01/25	989;1004;1016	1019FC+1 día	$ 0	0%
1018	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 713.427.598	vie 24/01/25	123 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
1019	Inicio tapa 2	$ 0	vie 24/01/25	0 días	vie 24/01/25	1017FC+1 día	1020	$ 0	0%
1020	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	vie 24/01/25	3 días	mié 29/01/25	1019	1021	$ 0	0%
1021	Demolicion de concreto	$ 8.238.940	mié 29/01/25	12 días	jue 13/02/25	1020	1022	$ 0	0%
1022	Excavacion manual Estructura	$ 1.885.686	jue 13/02/25	25 días	mié 19/03/25	1021	1027;1024	$ 0	0%
1023	Redes Humedas EAAB	$ 176.973.427	mié 12/03/25	31 días	vie 25/04/25			$ 0	0%
1024	Excavacion manual	$ 904.095	mié 19/03/25	15 días	mié 9/04/25	1022	1025CC;1026FF;10	$ 0	0%
1025	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 5.445.186	mié 19/03/25	16 días	jue 10/04/25	1024CC	1030	$ 0	0%
1026	Programacion Cierre Acued	$ 0	mié 12/03/25	20 días	mié 9/04/25	1024FF	1027	$ 0	0%
1027	Conexión Acueducto	$ 0	mié 9/04/25	1 día	jue 10/04/25	1022;1026	1028CC	$ 0	0%
1028	Empate de acueducto	$ 1.466.184	mié 9/04/25	1 día	jue 10/04/25	1027CC	1040;1030	$ 0	0%
1029	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 98.504.851	jue 20/03/25	15 días	jue 10/04/25	1024CC+1 día	1030	$ 0	0%
1030	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 69.133.803	jue 10/04/25	10 días	vie 25/04/25	1025;1028;1029	1040	$ 0	0%
1031	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 1.519.308	mié 19/03/25	1 día	jue 20/03/25	1024CC	1048	$ 0	0%
1032	Redes Secas	$ 202.295.397	jue 20/03/25	18 días	lun 14/04/25			$ 0	0%
1033	Excavacion manual	$ 0	jue 20/03/25	15 días	jue 10/04/25	1024CC+1 día	1034CC;1037CC	$ 0	0%
1034	Cajas de inspeccion	$ 59.432.764	jue 20/03/25	1 día	vie 21/03/25	1033CC	1035CC+2 días	$ 0	0%
1035	Instalacion tuberia TDP	$ 73.381.544	vie 21/03/25	15 días	vie 11/04/25	1034CC+2 días	1036CC+5 días	$ 0	0%
1036	Rellenos para redes secas	$ 61.503.417	lun 31/03/25	11 días	lun 14/04/25	1035CC+5 días	1040	$ 0	0%
1037	Renivelacion de cajas de inspeccion	$ 7.977.672	jue 20/03/25	1 día	vie 21/03/25	1033CC	1038	$ 0	0%
1038	Ejecucion de maniobras por parte de la ESP	$ 0	vie 21/03/25	0 días	vie 21/03/25	1037	1048	$ 0	0%
1039	Conformacion de la estructur	$ 322.855.840	vie 25/04/25	57 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
1040	Geotextil	$ 13.468.365	vie 25/04/25	7 días	mié 7/05/25	1028;1030;1036	1041	$ 0	0%
1041	Mejoramiento de subrasant	$ 25.775.646	mié 7/05/25	14 días	lun 26/05/25	1040	1042	$ 0	0%
1042	Sub Base Granular PEA	$ 158.386.739	lun 26/05/25	15 días	lun 16/06/25	1041	1043	$ 0	0%
1043	Bordillo Separacion de pañc	$ 0	lun 16/06/25	10 días	lun 4/08/25	1042	1044;1045	$ 0	0%
1044	Accesos Vehicular	$ 12.827.362	lun 4/08/25	7 días	jue 14/08/25	1043	1048	$ 0	0%
1045	Arena de Peña	$ 0	lun 4/08/25	11 días	mar 19/08/25	1043	1046CC+5 días	$ 0	0%
1046	Concreto estampado	$ 112.397.728	mar 12/08/25	3 días	vie 15/08/25	1045CC+5 días	1048;1047	$ 0	0%
1047	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 1.178.308	vie 15/08/25	1 día	lun 18/08/25	1046	1048	$ 0	0%
1048	Fin Etapa 2	$ 0	lun 18/08/25	0 días	lun 18/08/25	983;991;992;1031;	1917	$ 0	0%
1049	**CIV-16001190 ENTRE CL 11 A-KR 39 - KR 40**	**$ 1.554.766.726**	**mié 24/07/24**	**256 días**	**mar 19/08/25**			**$ 0**	**0%**
1050	Inicio de Tramo	$ 0	mié 24/07/24	0 días	mié 24/07/24	40FC+157 días	1052;1055	$ 0	0%
1051	**Gestión social**	**$ 0**	**mié 24/07/24**	**24 días**	**mar 27/08/24**			**$ 0**	**0%**
1052	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	mié 24/07/24	15 días	mié 14/08/24	1050	1061;1053	$ 0	0%
1053	Reunión de Inicio de obra	$ 0	mié 14/08/24	9 días	mar 27/08/24	1052	1061	$ 0	0%
1054	**PMT**	**$ 0**	**mié 24/07/24**	**19 días**	**mar 20/08/24**			**$ 0**	**0%**
1055	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	mié 24/07/24	1 día	mié 24/07/24	1050	1056	$ 0	0%
1056	Aprobación de interventoria	$ 0	jue 25/07/24	7 días	vie 2/08/24	1055	1057FC+1 día	$ 0	0%
1057	Radicación y Aprobación PMT a S	$ 0	lun 5/08/24	7 días	jue 15/08/24	1056FC+1 día	1058	$ 0	0%
1058	Implementación PMT	$ 0	jue 15/08/24	3 días	mar 20/08/24	1057	1061	$ 0	0%
1059	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 1.554.766.726**	**mar 27/08/24**	**232 días**	**mar 19/08/25**			**$ 0**	**0%**
1060	**Etapa 1 - Intervención de calzad**	**$ 1.062.910.645**	**mar 27/08/24**	**119 días**	**vie 7/02/25**			**$ 0**	**0%**
1061	Inicio Etapa 1	$ 0	mar 27/08/24	0 días	mar 27/08/24	1052;1053;1058	1062	$ 0	0%
1062	Replanteo general	$ 1.581.311	mar 27/08/24	1 día	mié 28/08/24	1061	1063	$ 0	0%
1063	Demolición de rodadura exist	$ 1.275.947	mié 28/08/24	3 días	lun 2/09/24	1062	1064	$ 0	0%
1064	Excavacion mecanica Via	$ 9.688.764	lun 2/09/24	7 días	mar 10/09/24	1063	1065;1067CC	$ 0	0%
1065	Excavacion manual Via	$ 2.868.720	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	1064	1066CC;1070CC+2	$ 0	0%
1066	Demolicion de Tuberia exister	$ 1.116.523	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	1065CC	1069CC;1075CC	$ 0	0%
1067	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 160.959.817	lun 2/09/24	113 días	mié 5/02/25	1064CC	1132	$ 0	0%
1068	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 150.415.161	mar 10/09/24	88 días	lun 13/01/25			$ 0	0%
1069	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 33.329.297	mar 10/09/24	17 días	mié 2/10/24	1066CC	1071CC;1077CC	$ 0	0%
1070	Pozos	$ 7.141.711	jue 12/09/24	86 días	lun 13/01/25	1065CC+2 días	1072CC+3 días	$ 0	0%
1071	Instalacion de tuberia	$ 51.060.351	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1069CC	1084;1083	$ 0	0%
1072	Conexión sumidero pozo	$ 52.661.708	mar 17/09/24	3 días	vie 20/09/24	1070CC+3 días	1073CC	$ 0	0%
1073	Sumideros	$ 6.222.094	mar 17/09/24	83 días	lun 13/01/25	1072CC	1101	$ 0	0%
1074	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 39.694.217	mar 10/09/24	88 días	lun 13/01/25			$ 0	0%
1075	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 22.847.021	mar 10/09/24	17 días	mié 2/10/24	1066CC	1132	$ 0	0%
1076	Pozos	$ 13.061.628	jue 12/09/24	86 días	lun 13/01/25	1065CC+2 días	1132	$ 0	0%
1077	Instalacion de tuberia	$ 3.785.568	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1069CC	1092;1078CC;1084	$ 0	0%
1078	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 0	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1077CC	1092	$ 0	0%
1079	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24			$ 0	0%
1080	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24	1065CC+5 días	1092	$ 0	0%
1081	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24	1065CC+5 días	1092	$ 0	0%
1082	Redes secas	$ 36.115.898	mar 1/10/24	70 días	jue 9/01/25			$ 0	0%
1083	Solicitud de maniobras	$ 0	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	1071;1077	1086CC+3 días	$ 0	0%
1084	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	mar 1/10/24	12 días	vie 18/10/24	1071;1077	1086CC+3 días	$ 0	0%
1085	Rellenos para redes secas	$ 0	lun 7/10/24	16 días	mar 29/10/24	1086CC+1 día	1092	$ 0	0%
1086	Instalacion tuberia TDP	$ 30.033.803	vie 4/10/24	15 días	vie 25/10/24	1084CC+3 días;108	1085CC+1 día;108	$ 0	0%
1087	Proteccion de tuberia	$ 0	jue 17/10/24	15 días	jue 7/11/24	1086CC+8 días	1092;1090	$ 0	0%
1088	Renivelacion camaras	$ 6.082.095	mar 17/12/24	15 días	jue 9/01/25	1094	1101	$ 0	0%
1089	Conformacion de la estructur	$ 659.194.287	jue 7/11/24	66 días	vie 7/02/25			$ 0	0%
1090	Drenaje sub superficial	$ 0	jue 7/11/24	7 días	lun 18/11/24	1087	1092;1091	$ 0	0%
1091	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 2.086.979	lun 18/11/24	2 días	mié 20/11/24	1090	1092	$ 0	0%
1092	Geotextil de separacion	$ 0	mié 20/11/24	3 días	lun 25/11/24	1077;1078;1080;1	1093	$ 0	0%
1093	Mejoramiento de subrasant	$ 271.168.504	lun 25/11/24	5 días	lun 2/12/24	1092	1094	$ 0	0%
1094	Sub base Granular RCD	$ 32.942.832	lun 2/12/24	12 días	mar 17/12/24	1093	1088;1096	$ 0	0%
1095	Sardinel	$ 3.807.112	vie 17/01/25	15 días	jue 6/02/25	1099FF	1132	$ 0	0%
1096	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 7.512.359	mar 17/12/24	2 días	jue 19/12/24	1094	1097FC+13 días	$ 0	0%
1097	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 60.327.405	jue 9/01/25	3 días	mar 14/01/25	1096FC+13 días	1098	$ 0	0%
1098	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 40.281.300	mar 14/01/25	15 días	lun 3/02/25	1097	1099CC+3 días	$ 0	0%
1099	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 221.415.237	vie 17/01/25	15 días	jue 6/02/25	1098CC+3 días	1100CC+1 día;1095FF	$ 0	0%
1100	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 19.652.559	vie 17/01/25	15 días	vie 7/02/25	1099CC+1 día	1101	$ 0	0%
1101	Fin etapa 1	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	1073;1088;1100	1103FC+1 día	$ 0	0%
1102	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 491.856.081	vie 7/02/25	112 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
1103	Inicio tapa 2	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	1101FC+1 día	1104	$ 0	0%
1104	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	vie 7/02/25	3 días	mié 12/02/25	1103	1105	$ 0	0%
1105	Demolicion de concreto	$ 6.521.255	mié 12/02/25	12 días	vie 28/02/25	1104	1106	$ 0	0%
1106	Excavacion manual Estructura	$ 2.204.380	vie 28/02/25	25 días	jue 3/04/25	1105	1111;1108	$ 0	0%
1107	Redes Humedas EAAB	$ 85.231.517	jue 27/03/25	31 días	lun 12/05/25			$ 0	0%
1108	Excavacion manual	$ 1.601.071	jue 3/04/25	15 días	vie 25/04/25	1106	1109CC;1110FF;11	$ 0	0%
1109	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 4.096.134	jue 3/04/25	16 días	lun 28/04/25	1108CC	1114	$ 0	0%
1110	Programacion Cierre Acued	$ 0	jue 27/03/25	20 días	vie 25/04/25	1108FF	1111	$ 0	0%
1111	Conexión Acueducto	$ 0	vie 25/04/25	1 día	lun 28/04/25	1106;1110	1112CC	$ 0	0%
1112	Empate de acueducto	$ 977.456	vie 25/04/25	1 día	lun 28/04/25	1111CC	1124;1114	$ 0	0%
1113	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 49.819.573	vie 4/04/25	15 días	lun 28/04/25	1108CC+1 día	1114	$ 0	0%
1114	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 27.724.411	lun 28/04/25	10 días	lun 12/05/25	1109;1112;1113	1124	$ 0	0%
1115	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 1.012.872	jue 3/04/25	1 día	vie 4/04/25	1108CC	1132	$ 0	0%
1116	Redes Secas	$ 181.720.871	vie 4/04/25	18 días	vie 2/05/25			$ 0	0%
1117	Excavacion manual	$ 0	vie 4/04/25	15 días	lun 28/04/25	1108CC+1 día	1118CC;1121CC	$ 0	0%
1118	Cajas de inspeccion	$ 60.503.909	vie 4/04/25	1 día	lun 7/04/25	1117CC	1119CC+2 días	$ 0	0%
1119	Instalacion tuberia TDP	$ 56.141.282	mar 8/04/25	15 días	mié 30/04/25	1118CC+2 días	1120CC+5 días	$ 0	0%
1120	Rellenos para redes secas	$ 52.917.259	lun 14/04/25	11 días	vie 2/05/25	1119CC+5 días	1124	$ 0	0%
1121	Renivelacion de cajas de inspeccion	$ 12.158.421	vie 4/04/25	1 día	lun 7/04/25	1117CC	1122	$ 0	0%
1122	Ejecucion de maniobras por parte de la ESP	$ 0	lun 7/04/25	0 días	lun 7/04/25	1121	1132	$ 0	0%
1123	Conformacion de la estructur	$ 207.181.254	lun 12/05/25	46 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
1124	Geotextil	$ 10.268.531	lun 12/05/25	7 días	mié 21/05/25	1112;1114;1120	1125	$ 0	0%
1125	Mejoramiento de subrasant	$ 32.942.832	mié 21/05/25	14 días	mar 10/06/25	1124	1126	$ 0	0%
1126	Sub Base Granular PEA	$ 70.686.106	mar 10/06/25	15 días	mar 5/08/25	1125	1127	$ 0	0%
1127	Bordillo Separacion de pañc	$ 0	mar 5/08/25	1 día	mié 6/08/25	1126	1128;1129	$ 0	0%
1128	Accesos Vehicular	$ 8.151.828	mié 6/08/25	1 día	vie 8/08/25	1127	1132	$ 0	0%
1129	Arena de Peña	$ 0	mié 6/08/25	9 días	mar 19/08/25	1127	1130CC+5 días	$ 0	0%
1130	Concreto estampado	$ 85.131.957	jue 14/08/25	1 día	vie 15/08/25	1129CC+5 días	1132;1131	$ 0	0%
1131	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 8.996.804	vie 15/08/25	1 día	lun 18/08/25	1130	1132	$ 0	0%
1132	Fin Etapa 2	$ 0	lun 18/08/25	0 días	lun 18/08/25	1067;1075;1076;1	1917	$ 0	0%




Proyecto: 2. Preliminar 0212202
Fecha: jue 2/10/25

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Progreso manual

NOTA: EL PDT SE SUJETA A LAS APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS ESP Y DEMAS ENTIDADES ASOCIADAS A LOS ENTREGABLES, AUNADO A LA TOTALIDAD DE CAMBIOS REQUERIDO Y EVIDENCIADOS PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO IDU-1760-2021


Firma Contratista

Firma Interventoria

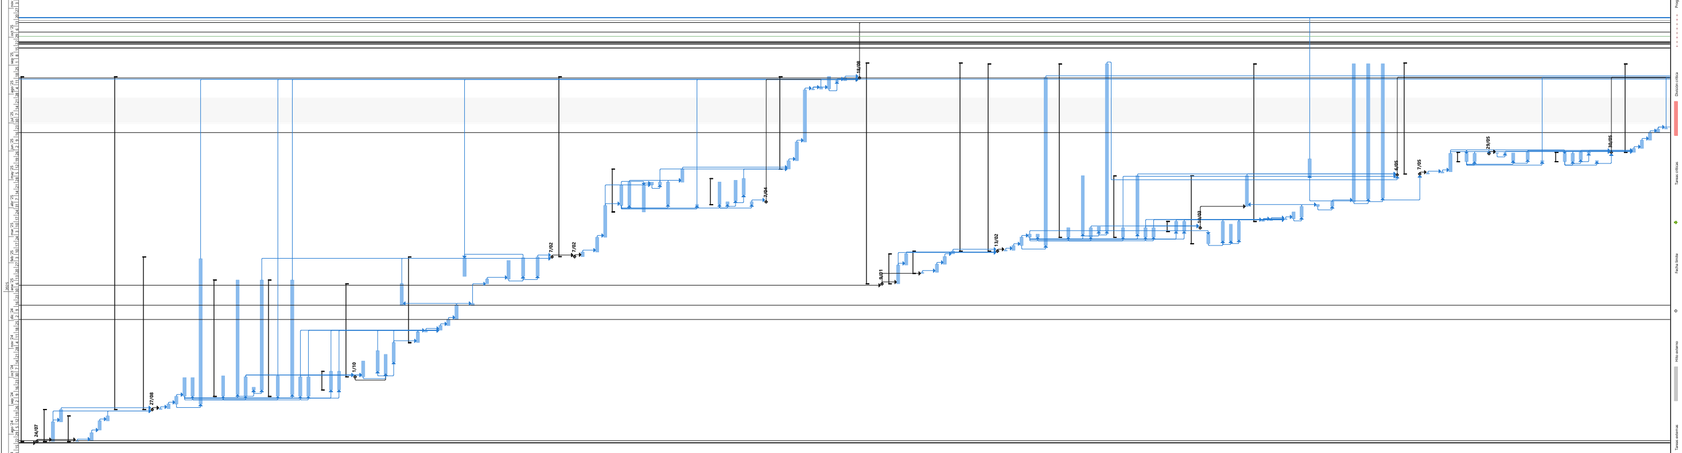


Nº	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Acabar	Nº	Predecesoras	Sucesoras	COP	% completado
1133	**CU 1100/1122 UNITEC CL 13 A KR 38 A - CL 13 A KR 39 A**	**$ 2.231.418.939**	**mié 24/07/24**	**250 días**	**mar 19/08/25**			**$ 0**	**0%**
1134	Hitos de Trams	$ 0	mié 24/07/24	0 días	mié 24/07/24	480<CU-157.4ms	1136;1139	$ 0	0%
1135	Inicio de Trams	$ 0	mié 24/07/24	0 días	mié 24/07/24	1134		$ 0	0%
1136	Demolición Actos de Vandalismo	$ 0	mié 24/07/24	20 días	mié 21/08/24	1134	1145;1157	$ 0	0%
1137	Demolición de inicio de obra	$ 0	mié 24/07/24	5 días	mié 31/07/24	1134	1145	$ 0	0%
1138	**Predios**	**$ 0**	**mié 24/07/24**	**0 días**	**mié 24/07/24**	**1134**	**1140**	**$ 0**	**0%**
1139	Atención de alcantarillas de Predios	$ 0	mié 24/07/24	5 días	mié 24/07/24	1134	1140	$ 0	0%
1140	Aislación de intervención	$ 0	jue 25/07/24	2 días	vie 2/08/24	1139	1141;CU-1.8ds	$ 0	0%
1141	Implementación Predios	$ 0	vie 2/08/24	3 días	mié 7/08/24	1140;CU-1.8ds	1142	$ 0	0%
1142	Implementación Red	$ 0	jue 1/08/24	2 días	mar 20/08/24	1141		$ 0	0%
1143	**Señalización Horizontal y Vertical Diseño**	**$ 2.231.418.939**	**mié 24/07/24**	**250 días**	**mar 19/08/25**			**$ 0**	**0%**
1144	**Etapa 1 - Intervención en calzada 1**	**$ 376.571.130**	**mié 24/07/24**	**119 días**	**mié 7/08/24**			**$ 0**	**0%**
1145	Hitos de Trams	$ 0	mié 24/07/24	0 días	mié 24/07/24	1136;1137;1142	1146	$ 0	0%
1146	Replanteo general	$ 1.340.317	mié 24/07/24	1 día	mié 24/07/24	1145	1147	$ 0	0%
1147	Demolición de andenes y cunetas	$ 14.154.000	mié 24/07/24	5 días	mié 31/07/24	1146	1148	$ 0	0%
1148	Excavación manual Via	$ 2.278.500	lun 5/08/24	2 días	mar 6/08/24	1147	1149;1151C	$ 0	0%
1149	Excavación mecanica Via	$ 2.278.500	mié 7/08/24	2 días	jue 8/08/24	1148	1150;1151C	$ 0	0%
1150	Demolición de Tuberia existente	$ 1.134.533	mar 20/08/24	10 días	lun 2/09/24	1149CC	1151CC;1159CC	$ 0	0%
1151	Transporte Disposicion Escombros	$ 103.774.839	lun 5/08/24	113 días	mié 4/12/24	1148CC	1150	$ 0	0%
1152	Redes Hidrosanitarias - Predios	$ 37.560.421	mar 10/09/24	30 días	lun 14/10/24	1100CC	1155CC;1165CC	$ 0	0%
1153	Anden y Sub Base Concreto	$ 8.844.000	mié 16/10/24	10 días	mar 29/10/24	1152CC	1154	$ 0	0%
1154	Remoción Lamina	$ 844.089	jue 31/10/24	30 días	lun 11/12/24	1100CC;CU-8ds	1100CC;CU-8ds	$ 0	0%
1155	Instalacion de Valvula	$ 19.764.405	mar 10/09/24	10 días	mar 1/10/24	1152CC	1158;1162	$ 0	0%
1156	Instalacion de Hidrantes	$ 19.764.405	mar 10/09/24	10 días	mar 1/10/24	1100CC;CU-8ds	1157;1161	$ 0	0%
1157	Suministro Tuberia RED 1"	$ 4.212.094	mié 11/09/24	10 días	mié 25/09/24	1156CC	1165	$ 0	0%
1158	Suministro	$ 4.212.094	mié 11/09/24	10 días	mié 25/09/24	1155CC	1165	$ 0	0%
1159	Redes Hidrosanitarias - Lavado	$ 4.227.185	mié 18/09/24	10 días	mié 2/10/24	1150CC	1165	$ 0	0%
1160	Redes Hidrosanitarias - Prueba	$ 4.227.185	mié 18/09/24	10 días	mié 2/10/24	1150CC	1161	$ 0	0%
1161	Anden y Sub Base Concreto	$ 8.657.981	jue 3/10/24	10 días	jue 17/10/24	1160;CU-8ds	1156	$ 0	0%
1162	Instalacion de Valvula	$ 5.593.333	mar 10/09/24	10 días	mar 1/10/24	1155CC	1178;1182CC;1165CC	$ 0	0%
1163	Instalacion de Hidrantes	$ 5.593.333	mar 10/09/24	10 días	mar 1/10/24	1155CC;CU-8ds	1178	$ 0	0%
1164	Suministro - Redes Principal	$	mié 11/09/24	10 días	mié 25/09/24	1155CC;CU-8ds	1178	$ 0	0%
1165	Redes Hidrosanitarias - Instalacion	$	mié 11/09/24	10 días	mié 25/09/24	1157;1158;1164	1176	$ 0	0%
1166	Instalacion Acometidas	$	mié 11/09/24	10 días	lun 7/10/24	1164CC;CU-8ds	1176	$ 0	0%
1167	Instalacion Valvula RED 1"	$	mié 11/09/24	10 días	mié 25/09/24	1164CC;CU-8ds	1176	$ 0	0%
1168	Redes varias	$ 96.115.988	mié 11/12/24	10 días	jue 9/01/25	1155CC;CU-8ds	1170CC;CU-8ds	$ 0	0%
1169	Señal de mantenimiento	$	lun 7/10/24	10 días	mar 15/10/24	1155;1161	1170CC;CU-8ds	$ 0	0%
1170	Instalacion redes varias	$	mié 16/10/24	10 días	mié 30/10/24	1169CC;CU-8ds	1171	$ 0	0%
1171	Instalacion Valvula FOP	$ 10.033.803	vie 4/10/24	10 días	vie 25/10/24	1168CC;CU-8ds;1181	1180;CU-1.5ds;1172	$ 0	0%
1172	Instalacion Valvula RED	$ 2.662.162	lun 7/10/24	10 días	lun 21/10/24	1171CC;CU-8ds	1174	$ 0	0%
1173	Instalacion Valvula TOP	$ 2.662.162	lun 7/10/24	10 días	lun 21/10/24	1177	1172;1180	$ 0	0%
1174	Instalacion con empalme	$ 4.834.440	mar 15/10/24	10 días	mar 29/10/24	1172CC;CU-8ds	1177	$ 0	0%
1175	Bota Cunas estabilizadas	$ 48.885.956	mié 23/10/24	20 días	mié 20/11/24	1169CC;CU-8ds	1182	$ 0	0%
1176	Redes varias predios	$ 85.197.288	mié 16/10/24	10 días	mié 30/10/24	1170CC;CU-8ds	1178	$ 0	0%
1177	Instalacion Valvula FOP	$ 10.033.803	vie 4/10/24	10 días	vie 25/10/24	1168CC;CU-8ds;1181	1180;CU-1.5ds;1173	$ 0	0%
1178	Instalacion Valvula TOP	$ 2.662.162	lun 7/10/24	10 días	lun 21/10/24	1177	1173;1180	$ 0	0%
1179	Instalacion con empalme	$ 4.834.440	mar 15/10/24	10 días	mar 29/10/24	1172CC;CU-8ds	1177	$ 0	0%
1180	Conexiones de entrada	$ 115.593.027	lun 7/10/24	30 días	lun 18/11/24	1173;1177	1178;1175	$ 0	0%
1181	Gerencia de empresas	$	mié 11/09/24	10 días	mié 25/09/24	1171	1178;1175	$ 0	0%
1182	Instalacion y conexiones	$ 5.621.969	mié 23/10/24	10 días	mié 6/11/24	1174	1176	$ 0	0%
1183	**Etapa 2 - Intervención en calzada 2**	**$ 376.571.130**	**mié 24/07/24**	**119 días**	**mié 7/08/24**			**$ 0**	**0%**
1184	Hitos de Trams	$ 0	mié 24/07/24	0 días	mié 24/07/24	480<CU-157.4ms	1186;1187;1192	$ 0	0%
1185	Replanteo general	$ 1.340.317	mié 24/07/24	1 día	mié 24/07/24	1184	1187	$ 0	0%
1186	Demolición de andenes y cunetas	$ 14.154.000	mié 24/07/24	5 días	mié 31/07/24	1185	1187	$ 0	0%
1187	Excavación mecanica Via	$ 2.278.500	mié 7/08/24	2 días	jue 8/08/24	1186	1188;1191C	$ 0	0%
1188	Demolición de concreto	$ 2.744.787	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1187	1189	$ 0	0%
1189	Excavación manual	$ 2.744.787	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1188	1190	$ 0	0%
1190	Redes Hidrosanitarias - Predios	$ 48.956.100	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1189	1191C;1193	$ 0	0%
1191	Excavación manual	$ 943.297	lun 5/08/24	10 días	lun 19/08/24	1190	1191C;1194	$ 0	0%
1192	Señalización Horizontal y Vertical Acometidas	$ 1.134.533	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1184	1193	$ 0	0%
1193	Señal de mantenimiento	$	jue 25/07/24	20 días	vie 23/08/24	1192	1195	$ 0	0%
1194	Conexion Acueducto	$	mié 24/07/24	5 días	mié 31/07/24	1191	1198;CU-1.5ds	$ 0	0%
1195	Conexion Alcantarillado	$ 977.482	mié 24/07/24	5 días	mié 31/07/24	1193	1198	$ 0	0%
1196	Instalacion Tuberia	$ 20.893.899	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1193;CU-8ds	1198	$ 0	0%
1197	Instalacion Valvula Gaveta	$	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1193;CU-8ds	1198	$ 0	0%
1198	Relleno con Gravilla	$ 30.791.160	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1194;1195;1196;1197	1208	$ 0	0%
1199	Señal de mantenimiento	$	jue 25/07/24	20 días	vie 23/08/24	1198	1201	$ 0	0%
1200	Cajas de Inspección	$ 5.133.308	lun 5/08/24	5 días	vie 9/08/24	1191CC	1216	$ 0	0%
1201	Redes Hidrosanitarias - Predios	$ 173.214.444	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1199;CU-8ds	1216	$ 0	0%
1202	Excavación manual	$ 943.297	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1200;CU-8ds	1203CC;1205CC	$ 0	0%
1203	Excavación mecanica	$ 5.620.344	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1202;CU-8ds	1204CC;CU-8ds	$ 0	0%
1204	Instalacion Tuberia FOP	$ 46.206.428	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1203;CU-8ds	1206;CU-8ds	$ 0	0%
1205	Instalacion Tuberia RED	$ 46.206.428	mié 24/07/24	10 días	mié 7/08/24	1202;CU-8ds	1206	$ 0	0%
1206	Recubrimiento de cajas de	$ 20.237.713	mié 24/07/24	5 días	mié 31/07/24	1204;1205	1209	$ 0	0%
1207	Señal de mantenimiento	$	lun 29/07/24	20 días	vie 23/08/24	1206	1210	$ 0	0%
1208	Ejecución de empalmes	$	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1198;1207	1209	$ 0	0%
1209	Gerencia de empresas	$ 183.186.560	lun 5/08/24	45 días	mar 28/08/25			$ 0	0%
1210	Conformación de la estructura	$ 183.186.560	lun 5/08/24	45 días	mar 28/08/25			$ 0	0%
1211	Gerencia	$ 14.115.997	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1208;1209	1220	$ 0	0%
1212	Señal de mantenimiento	$ 14.115.997	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1208;1209	1220	$ 0	0%
1213	Sub Base Granular PCA	$ 58.017.329	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1209	1221	$ 0	0%
1214	Sub Base Granular RCD	$ 58.017.329	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1209	1221	$ 0	0%
1215	Acceso vehicular	$ 2.780.756	mié 28/08/24	1 día	mié 28/08/24	1214	1216	$ 0	0%
1216	Acceso peatonal	$ 2.780.756	mié 28/08/24	1 día	mié 28/08/24	1214	1217;1218	$ 0	0%
1217	Concreto estampado	$ 61.020.126	jue 29/08/24	5 días	jue 5/09/24	1213;CU-8ds	1218;1221	$ 0	0%
1218	Mobiliario Urbano y Señalización	$ 10.230.660	vie 30/08/24	5 días	vie 6/09/24	1213;CU-8ds	1221	$ 0	0%
1219	Señal de mantenimiento	$	lun 8/09/25	5 días	lun 15/09/25	1211;1213;1216;1217		$ 0	0%
1220	**Ciclo Ruta - Intervención en calzada 1 CL 13 A KR 38 A - CL 13 A**	**$ 1.497.464.126**	**lun 5/08/24**	**165 días**	**mié 19/03/25**			**$ 0**	**0%**
1221	Hitos de Trams	$ 0	lun 5/08/24	0 días	lun 5/08/24	480<CU-157.4ms	1220;1222;CU-8.8ds;CU-8.8ds	$ 0	0%
1222	**Gestión social**	**$ 0**	**jue 1/08/24**	**24 días**	**lun 9/09/24**			**$ 0**	**0%**
1223	Reunión de inicio de obra	$ 0	jue 1/08/24	1 día	jue 1/08/24	1221	1224;1229	$ 0	0%
1224	**Replanteo general**	**$ 0**	**lun 5/08/24**	**2 días**	**jue 1/08/24**	**1223**	**1225**	**$ 0**	**0%**
1225	Replanteo de obra	$ 1.268.054	lun 5/08/24	2 días	jue 1/08/24	1224	1226;1228;1229;1232	$ 0	0%
1226	Demolición de andenes y cunetas	$ 14.154.000	lun 5/08/24	5 días	mié 14/08/24	1225	1227	$ 0	0%
1227	Excavación mecanica Via	$ 2.278.500	lun 5/08/24	2 días	mar 6/08/24	1226	1231;1239CC	$ 0	0%
1228	Excavación manual Via	$ 2.278.500	mié 7/08/24	2 días	jue 8/08/24	1225	1231;1239CC	$ 0	0%
1229	Transporte Disposicion Escombros	$ 103.838.391	mié 24/07/24	113 días	mié 4/12/24	1223	1230	$ 0	0%
1230	Redes Hidrosanitarias - Predios	$ 48.202.656	mié 28/08/24	107 días	mié 29/01/25	1229	1234	$ 0	0%
1231	Señalización Horizontal y Vertical	$ 68.031.944	mié 28/08/24	107 días	mié 29/01/25	1227;1228	1234	$ 0	0%
1232	**Predios**	**$ 0**	**lun 5/08/24**	**0 días**	**lun 5/08/24**	**1223**	**1233;CU-8ds**	**$ 0**	**0%**
1233	Atención de alcantarillas de	$ 3.644.263	lun 5/08/24	5 días	lun 5/08/24	1232	1234;CU-8ds	$ 0	0%
1234	Conexion acueducto pozo	$ 20.013.926	lun 5/08/24	5 días	vie 9/08/24	1230;1231;1233	1235;CU-8ds	$ 0	0%
1235	Pozos	$ 20.013.926	lun 5/08/24	10 días	vie 16/08/24	1234	1236;CU-8ds	$ 0	0%
1236	Redes Hidrosanitarias - Lavado	$ 42.629.751	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1235	1237;1238;CU-8ds	$ 0	0%
1237	Redes Hidrosanitarias - Prueba	$ 42.629.751	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1236	1238	$ 0	0%
1238	Anden y Sub Base Concreto	$ 84.132.238	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1236;1237	1239	$ 0	0%
1239	Instalacion de Valvula	$ 5.593.333	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1238	1240;1241;1242	$ 0	0%
1240	Instalacion de Hidrantes	$ 5.593.333	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1239	1243	$ 0	0%
1241	Suministro - Redes Principal	$ 5.984.063	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1239	1243	$ 0	0%
1242	Redes Hidrosanitarias - Instalacion	$	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1239	1243	$ 0	0%
1243	Instalacion Acometidas	$	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1240;1241;1242	1244	$ 0	0%
1244	Pegamento Cuna Anclaje	$	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1243	1245	$ 0	0%
1245	Instalacion Valvula RED	$	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1244	1246	$ 0	0%
1246	Instalacion Valvula TOP	$	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1245	1247	$ 0	0%
1247	Redes Humedas - Acometidas	$	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1246	1248	$ 0	0%
1248	Redes Humedas - Instalacion	$	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1247	1249	$ 0	0%
1249	Redes Humedas - Prueba	$	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1248	1250	$ 0	0%
1250	Anden y Sub Base Concreto	$	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1249	1251	$ 0	0%
1251	Instalacion Tuberia RDC	$	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1250	1252	$ 0	0%
1252	Instalacion Tuberia RDC 1	$ 17.244.753	mié 28/08/24	10 días	mié 11/09/24	1251	1253	$ 0	0%
1253	Señal	$ 3.807.112	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1252	1254	$ 0	0%
1254	Señal de mantenimiento	$ 3.807.112	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1253	1255	$ 0	0%
1255	Señal de mantenimiento	$ 4.014.160	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1254	1256	$ 0	0%
1256	Señalizacion de cumplimiento	$ 4.014.160	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1255	1257	$ 0	0%
1257	Señalizacion de advertencia	$ 4.014.160	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1256	1258	$ 0	0%
1258	Señalizacion de informacion	$ 4.014.160	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1257	1259	$ 0	0%
1259	Señalizacion de confinamiento	$ 4.014.160	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1258	1260	$ 0	0%
1260	Señalizacion de prevencion	$ 4.014.160	lun 5/08/24	10 días	mié 21/08/24	1259	1261	$ 0	0%
1261	Mobiliario Urbano y Señalización	$ 10.230.660	mié 28/08/24	5 días	mié 4/09/24	1260	1262	$ 0	0%
1262	Señal de mantenimiento	$	mié 28/08/24	20 días	mié 25/09/24	1261	1263	$ 0	0%
1263	Hitos Etapa 2	$	mié 7/05/25	0 días	mié 7/05/25	1080;CU-8ds	1272	$ 0	0%
1264	Replanteo general	$ 1.268.054	mié 7/05/25	2 días	vie 9/05/25	1263	1265	$ 0	0%
1265	Demolición Espacio Publico	$ 4.812.712	jue 8/05/25	2 días	lun 12/05/25	1264	1267	$ 0	0%
1266	Excavación manual Estructura	$ 5.545.241	mié 7/05/25	10 días	jue 29/05/25	1263	1273	$ 0	0%
1267	Excavación mecanica Estructura	$ 5.545.241	mié 7/05/25	10 días	jue 29/05/25	1265	1273	$ 0	0%
1268	Excavación manual	$ 2.278.500	mié 7/05/25	2 días	jue 8/05/25	1263	1269;CU-1.5ds	$ 0	0%
1269	Excavación mecanica	$ 2.278.500	mié 7/05/25	2 días	jue 8/05/25	1268	1270;CU-1.5ds	$ 0	0%
1270	Instalacion Subterranea	$ 4.770.660	mié 7/05/25	2 días	jue 8/05/25	1269	1271;CU-1.5ds	$ 0	0%
1271	Pegamento Cuna Anclaje	$	mié 7/05/25	1 día	mié 7/05/25	1270	1272	$ 0	0%
1272	Instalacion Valvula TOP	$ 188.810.010	mié 7/05/25	30 días	mar 17/06/25	1271;CU-1.5ds	1273	$ 0	0%
1273	Empalme de Acometidas	$ 9.478.556	mié 7/05/25	1 día	mié 7/05/25	1265;1272	1274	$ 0	0%
1274	Sub Base Granular RCD	$ 58.017.329	mié 7/05/25	5 días	mié 14/05/25	1273	1275	$ 0	0%
1275	Sub Base Granular PCA	$ 58.017.329	mié 7/05/25	5 días	mié 14/05/25	1274	1276	$ 0	0%
1276	Bordillo Separador de pavim	$ 5.497.217	mié 7/05/25	5 días	mié 14/05/25	1275	1277	$ 0	0%
1277	Señal de mantenimiento		mié 7/05/25	20 días	mié 4/06/25	1276		$ 0	0%

Tarea | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea crítica | Hito crítico | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Progreso | Progreso manual | Tareas manuales | Tareas solo de inicio | Tareas solo de fin | Duración manual | Solo el comienzo | Solo el final | Tareas agrupadas manualmente

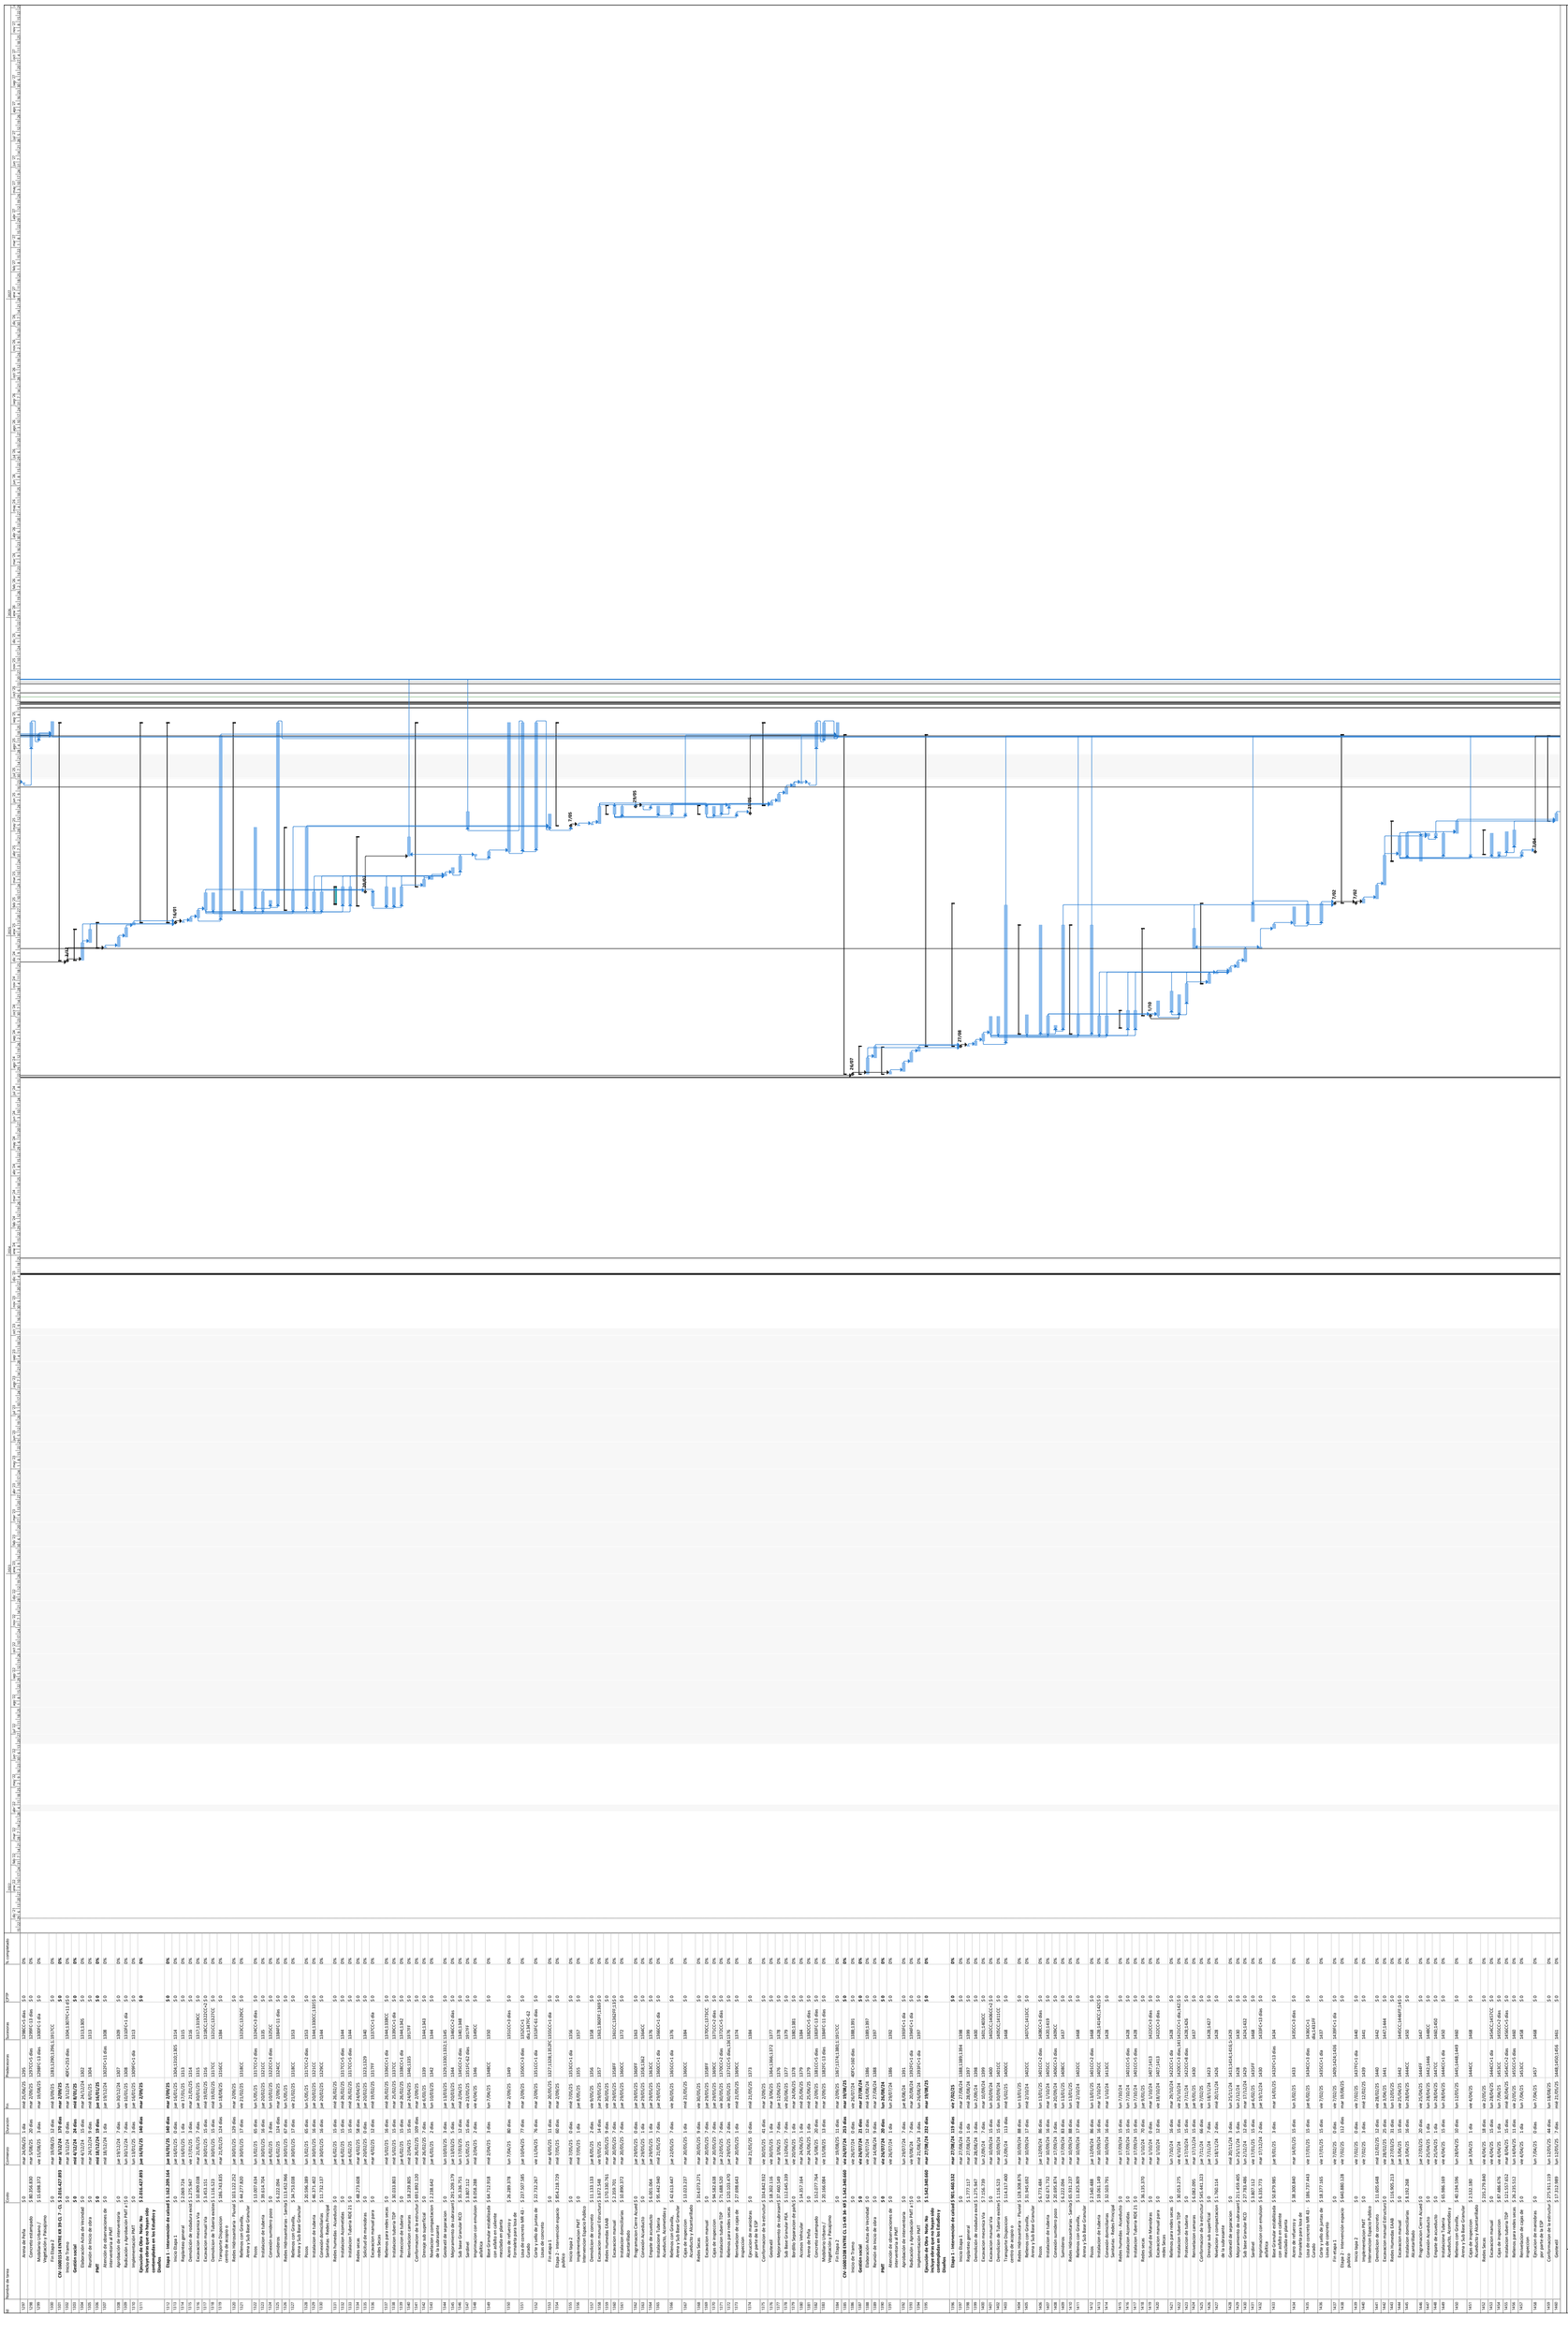

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	CPTP	% completado
1461	Mejoramiento de subrasant	$ 27.783.486	mié 21/05/25	14 días	mar 10/06/25	1460	1462	$ 0	0%
1462	Sub Base Granular PEA	$ 101.517.158	mar 10/06/25	15 días	mar 5/08/25	1461	1463	$ 0	0%
1463	Bordillo Separacion de pa	$ 0	mar 5/08/25	1 día	mié 6/08/25	1462	1464;1465	$ 0	0%
1464	Accesos Vehicular	$ 10.924.872	mié 6/08/25	1 día	vie 8/08/25	1463	1468	$ 0	0%
1465	Arena de Peña	$ 0	mié 6/08/25	7 días	lun 18/08/25	1463	1466CC+5 días	$ 0	0%
1466	Concreto estampado	$ 118.372.614	jue 14/08/25	1 día	vie 15/08/25	1465CC+5 días	1468;1467	$ 0	0%
1467	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 1.178.208	mar 19/08/25	3 días	mar 19/08/25	1466	1468	$ 0	0%
1468	Fin Etapa 2	$ 0	mar 19/08/25	0 días	mar 19/08/25	1403;1411;1412;1	1917	$ 0	0%
1469	**CIV-1600\164 ENTRE CL 15 4/8 32 A - KR 35**	**$ 986.296.400**	**vie 26/07/24**	**253 días**	**mar 19/08/25**			**$ 0**	**0%**
1470	Inicio de Tramo	$ 0	vie 26/07/24	0 días	vie 26/07/24	137CC+161 días	1472;1475	$ 0	0%
1471	**Gestión social**	**$ 0**	**vie 26/07/24**	**21 días**	**mar 27/08/24**			**$ 0**	**0%**
1472	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	vie 26/07/24	12 días	mié 14/08/24	1470	1473;1481	$ 0	0%
1473	Reunión de Inicio de obra	$ 0	mié 14/08/24	9 días	mar 27/08/24	1472	1481	$ 0	0%
1474	**PMT**	**$ 0**	**vie 26/07/24**	**20 días**	**lun 26/08/24**			**$ 0**	**0%**
1475	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	vie 26/07/24	1 día	lun 29/07/24	1470	1476	$ 0	0%
1476	Aprobación de interventoria	$ 0	lun 29/07/24	7 días	jue 8/08/24	1475	1477FC+1 día	$ 0	0%
1477	Radicación y Aprobación PMT a	$ 0	vie 9/08/24	7 días	mar 20/08/24	1476FC+1 día	1478FC+1 día	$ 0	0%
1478	Implementación PMT	$ 0	mié 21/08/24	3 días	lun 26/08/24	1477FC+1 día	1481	$ 0	0%
1479	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 986.296.400**	**mar 27/08/24**	**232 días**	**mar 19/08/25**			**$ 0**	**0%**
1480	**Etapa 1 - Intervención de calzad**	**$ 619.642.794**	**mar 27/08/24**	**119 días**	**vie 7/02/25**			**$ 0**	**0%**
1481	Inicio Etapa 1	$ 0	mar 27/08/24	0 días	mar 27/08/24	1472;1473;1478	1482	$ 0	0%
1482	Replanteo general	$ 1.195.387	mar 27/08/24	1 día	mié 28/08/24	1481	1483	$ 0	0%
1483	Demolición de rodadura exis	$ 1.275.947	mié 28/08/24	3 días	lun 2/09/24	1482	1484	$ 0	0%
1484	Excavacion mecanica Via	$ 5.071.470	lun 2/09/24	7 días	mar 10/09/24	1483	1485;1487CC	$ 0	0%
1485	Excavacion manual Via	$ 0	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	1484	1488CC;1490CC+2	$ 0	0%
1486	Demolicion de Tuberia existe	$ 1.116.523	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	1485CC	1488CC;1495CC	$ 0	0%
1487	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 84.125.257	lun 2/09/24	113 días	mié 5/02/25	1484CC	1552	$ 0	0%
1488	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 57.148.367	mar 10/09/24	88 días	lun 13/01/25			$ 0	0%
1489	Relleno con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 26.817.332	mar 10/09/24	17 días	mié 2/10/24	1486CC	1495CC;1497CC	$ 0	0%
1490	Pozos	$ 4.906.726	jue 12/09/24	86 días	lun 13/01/25	1485CC+2 días	1492CC+3 días	$ 0	0%
1491	Instalacion de tuberia	$ 15.518.600	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1489CC	1506;1503	$ 0	0%
1492	Conexión sumidero poso	$ 3.683.615	mar 17/09/24	3 días	vie 20/09/24	1490CC+3 días	1493CC	$ 0	0%
1493	Sumideros	$ 6.222.084	mar 17/09/24	83 días	lun 13/01/25	1491CC	1521	$ 0	0%
1494	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 50.904.954	mar 10/09/24	88 días	lun 13/01/25			$ 0	0%
1495	Relleno con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 3.541.727	mar 10/09/24	17 días	mié 2/10/24	1486CC	1552	$ 0	0%
1496	Pozos	$ 1.791.589	jue 12/09/24	86 días	lun 13/01/25	1485CC+2 días	1552	$ 0	0%
1497	Instalacion de tuberia	$ 35.838.721	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1489CC	1512;1498CC;1504	$ 0	0%
1498	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 9.732.917	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1497CC	1512	$ 0	0%
1499	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24			$ 0	0%
1500	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24	1485CC+5 días	1512	$ 0	0%
1501	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24	1485CC+5 días	1512	$ 0	0%
1502	Redes secas	$ 36.081.108	mar 1/10/24	70 días	jue 9/01/25			$ 0	0%
1503	Solicitud de manobras	$ 0	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	1491;1497	1506CC+3 días	$ 0	0%
1504	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	mar 1/10/24	12 días	vie 18/10/24	1491;1497	1506CC+3 días	$ 0	0%
1505	Rellenos para redes secas	$ 0	lun 7/10/24	16 días	mar 29/10/24	1506CC+1 día	1512	$ 0	0%
1506	Instalacion tuberia TDP	$ 29.999.013	vie 4/10/24	15 días	vie 25/10/24	1504CC+3 días,15	1505CC+1 día,150	$ 0	0%
1507	Proteccion de tuberia	$ 0	jue 17/10/24	15 días	jue 7/11/24	1506CC+8 días	1512;1510	$ 0	0%
1508	Remetalcion camaras	$ 6.082.095	mar 17/12/24	15 días	jue 9/01/25	1514	1521	$ 0	0%
1509	Conformacion de la estructur	$ 382.723.781	jue 7/11/24	66 días	vie 7/02/25			$ 0	0%
1510	Drenaje sub superficial	$ 0	jue 7/11/24	7 días	lun 18/11/24	1507	1512;1511	$ 0	0%
1511	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 1.193.976	lun 18/11/24	2 días	mié 20/11/24	1510	1512	$ 0	0%
1512	Geotextil de separacion	$ 0	mié 20/11/24	3 días	lun 25/11/24	1497;1498;1500;1	1513	$ 0	0%
1513	Mejoramiento de subrasant	$ 147.345.761	lun 25/11/24	5 días	lun 2/12/24	1512	1514	$ 0	0%
1514	Sub base Granular RCD	$ 18.846.548	lun 2/12/24	12 días	mar 17/12/24	1513	1508;1516	$ 0	0%
1515	Sardinel	$ 3.807.112	vie 17/01/25	15 días	jue 6/02/25	1519FF	1552	$ 0	0%
1516	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 4.297.854	mar 17/12/24	2 días	jue 19/12/24	1514	1517FC+13 días	$ 0	0%
1517	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 34.514.092	jue 9/01/25	3 días	mar 14/01/25	1516FC+13 días	1518	$ 0	0%
1518	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 33.598.556	mar 14/01/25	15 días	lun 3/02/25	1517	1519CC+3 días	$ 0	0%
1519	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 126.667.936	vie 17/01/25	15 días	jue 6/02/25	1518CC+3 días	1520CC+1 día;1515FF	$ 0	0%
1520	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 12.451.946	vie 17/01/25	15 días	vie 7/02/25	1519CC+1 día	1521	$ 0	0%
1521	Fin etapa 1	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	1493;1508;1520	1523FC+1 día	$ 0	0%
1522	Etapa 2 - Intervención espacio público	$ 366.653.606	vie 7/02/25	112 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
1523	Inicio tapa 2	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	1521FC+1 día	1524	$ 0	0%
1524	Implementacion PMT	$ 0	vie 7/02/25	3 días	mié 12/02/25	1523	1525	$ 0	0%
1525	Intervencion Espacio Publico								
1526	Demolicion de concreto	$ 7.091.980	mié 12/02/25	12 días	vie 28/02/25	1524	1526	$ 0	0%
1527	Excavacion manual Estructur	$ 866.243	vie 28/02/25	25 días	jue 3/04/25	1525	1531;1528	$ 0	0%
1528	Redes Humedas EAAB	$ 44.916.031	jue 27/03/25	31 días	lun 12/05/25			$ 0	0%
1529	Excavacion manual	$ 401.231	jue 3/04/25	15 días	vie 25/04/25	1526	1529CC;1530FF;1	$ 0	0%
1530	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 2.023.578	jue 3/04/25	16 días	lun 28/04/25	1528CC	1534	$ 0	0%
1531	Programacion Cierre Acued	$ 0	jue 27/03/25	20 días	vie 25/04/25	1528FF	1531	$ 0	0%
1532	Conexión Acueducto	$ 0	vie 25/04/25	1 día	lun 28/04/25	1526;1530	1532CC	$ 0	0%
1533	Empate de acueducto	$ 0	vie 25/04/25	1 día	lun 28/04/25	1531CC	1544;1534	$ 0	0%
1534	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 30.776.657	vie 4/04/25	15 días	lun 28/04/25	1528CC+1 día	1534	$ 0	0%
1535	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 11.208.129	lun 28/04/25	10 días	lun 12/05/25	1529;1532;1533	1544	$ 0	0%
1536	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 506.436	jue 3/04/25	1 día	vie 4/04/25	1528CC	1552	$ 0	0%
1537	Redes Secas	$ 147.727.679	vie 4/04/25	18 días	vie 2/05/25			$ 0	0%
1538	Excavacion manual	$ 0	vie 4/04/25	15 días	lun 28/04/25	1528CC+1 día	1538CC;1541CC	$ 0	0%
1539	Cajas de inspeccion	$ 64.083.824	vie 4/04/25	1 día	lun 7/04/25	1537CC	1539CC+2 días	$ 0	0%
1540	Instalacion tuberia TDP	$ 57.209.762	mar 8/04/25	15 días	mié 30/04/25	1538CC+2 días	1540CC+5 días	$ 0	0%
1541	Rellenos para redes secas	$ 8.555.517	lun 14/04/25	11 días	vie 2/05/25	1539CC+5 días	1544	$ 0	0%
1542	Remetalcion de cajas de inspeccion	$ 17.878.576	vie 4/04/25	1 día	lun 7/04/25	1537CC	1542	$ 0	0%
1543	Ejecucion de manobras por parte de la ESP	$ 0	lun 7/04/25	0 días	lun 7/04/25	1541	1552	$ 0	0%
1544	Conformacion de la estructur	$ 158.391.850	lun 12/05/25	46 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
1545	Geotextil	$ 11.546.883	lun 12/05/25	7 días	mié 21/05/25	1532;1534;1540	1545	$ 0	0%
1546	Mejoramiento de subrasant	$ 18.846.548	mié 21/05/25	14 días	mar 10/06/25	1544	1546	$ 0	0%
1547	Sub Base Granular PEA	$ 36.747.442	mar 10/06/25	15 días	mar 5/08/25	1545	1547	$ 0	0%
1548	Bordillo Separacion de pa	$ 0	mar 5/08/25	1 día	mié 6/08/25	1546	1548;1549	$ 0	0%
1549	Accesos Vehicular	$ 10.981.381	mié 6/08/25	1 día	vie 8/08/25	1547	1552	$ 0	0%
1550	Arena de Peña	$ 0	mié 6/08/25	9 días	mar 19/08/25	1547	1550CC+5 días	$ 0	0%
1551	Concreto estampado	$ 80.269.596	jue 14/08/25	1 día	vie 15/08/25	1549CC+5 días	1552;1551	$ 0	0%
1552	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 7.659.823	vie 15/08/25	1 día	lun 18/08/25	1550	1552	$ 0	0%
1553	Fin Etapa 2	$ 0	lun 18/08/25	0 días	lun 18/08/25	1487;1495;1496;1	1917	$ 0	0%
1554	**CIV-1600\956 ENTRE CL 17 8-69 34 - KR 35**	**$ 1.689.651.318**	**mié 24/07/24**	**256 días**	**mar 19/08/25**			**$ 0**	**0%**
1555	Inicio de Tramo	$ 0	mié 24/07/24	0 días	mié 24/07/24	40FC+157 días	1556;1559	$ 0	0%
1556	**Gestión social**	**$ 0**	**mié 24/07/24**	**24 días**	**mar 27/08/24**			**$ 0**	**0%**
1557	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	mié 24/07/24	15 días	mié 14/08/24	1554	1557;1565	$ 0	0%
1558	Reunión de Inicio de obra	$ 0	mié 14/08/24	9 días	mar 27/08/24	1556	1565	$ 0	0%
1559	**PMT**	**$ 0**	**mié 24/07/24**	**19 días**	**mar 20/08/24**			**$ 0**	**0%**
1560	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	mié 24/07/24	1 día	mié 24/07/24	1554	1560	$ 0	0%
1561	Aprobación de interventoria	$ 0	jue 25/07/24	7 días	vie 2/08/24	1559	1561FC+1 día	$ 0	0%
1562	Radicación y Aprobación PMT a	$ 0	lun 5/08/24	7 días	jue 15/08/24	1560FC+1 día	1562	$ 0	0%
1563	Implementación PMT	$ 0	jue 15/08/24	3 días	mar 20/08/24	1561	1565	$ 0	0%
1564	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 1.117.811.590**	**mar 27/08/24**	**119 días**	**vie 7/02/25**			**$ 0**	**0%**
1565	Inicio Etapa 1	$ 0	mar 27/08/24	0 días	mar 27/08/24	1556;1557;1562	1566	$ 0	0%
1566	Replanteo general	$ 1.825.555	mar 27/08/24	1 día	mié 28/08/24	1565	1567	$ 0	0%
1567	Demolición de rodadura exis	$ 1.275.947	mié 28/08/24	3 días	lun 2/09/24	1566	1568	$ 0	0%
1568	Excavacion mecanica Via	$ 10.852.060	lun 2/09/24	7 días	mar 10/09/24	1567	1569;1571CC	$ 0	0%
1569	Excavacion manual Via	$ 3.657.417	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	1568	1570CC;1574CC+2	$ 0	0%
1570	Demolicion de Tuberia existe	$ 1.116.523	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	1569CC	1573CC;1579CC	$ 0	0%
1571	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 204.376.333	lun 2/09/24	113 días	mié 5/02/25	1568CC	1636	$ 0	0%
1572	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 385.304.992	mar 10/09/24	88 días	lun 13/01/25			$ 0	0%
1573	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 98.268.476	mar 10/09/24	17 días	mié 2/10/24	1570CC	1575CC;1581CC	$ 0	0%
1574	Pozos	$ 10.233.594	jue 12/09/24	86 días	lun 13/01/25	1569CC+2 días	1576CC+3 días	$ 0	0%
1575	Instalacion de tuberia	$ 233.853.115	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1573CC	1588;1587	$ 0	0%
1576	Conexión sumidero poso	$ 36.727.713	mar 17/09/24	3 días	vie 20/09/24	1574CC+3 días	1577CC	$ 0	0%
1577	Sumideros	$ 6.222.084	mar 17/09/24	83 días	lun 13/01/25	1576CC	1605	$ 0	0%
1578	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 56.176.253	mar 10/09/24	88 días	lun 13/01/25			$ 0	0%
1579	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 23.175.376	mar 10/09/24	17 días	mié 2/10/24	1570CC	1636	$ 0	0%
1580	Pozos	$ 13.987.031	jue 12/09/24	86 días	lun 13/01/25	1569CC+2 días	1636	$ 0	0%
1581	Instalacion de tuberia	$ 8.607.209	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1573CC	1596;1582CC;1585	$ 0	0%
1582	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 10.406.637	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1581CC	1596	$ 0	0%
1583	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24			$ 0	0%
1584	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24	1569CC+5 días	1596	$ 0	0%
1585	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24	1569CC+5 días	1596	$ 0	0%
1586	Redes secas	$ 36.142.112	mar 1/10/24	70 días	jue 9/01/25			$ 0	0%
1587	Solicitud de manobras	$ 0	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	1575;1581	1596CC+3 días	$ 0	0%
1588	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	mar 1/10/24	12 días	vie 18/10/24	1575;1581	1596CC+3 días	$ 0	0%
1589	Rellenos para redes secas	$ 0	lun 7/10/24	16 días	mar 29/10/24	1596CC+1 día	1596	$ 0	0%
1590	Instalacion tuberia TDP	$ 30.060.017	vie 4/10/24	15 días	vie 25/10/24	1588CC+3 días,15	1589CC+1 día,159	$ 0	0%
1591	Proteccion de tuberia	$ 0	jue 17/10/24	15 días	jue 7/11/24	1596CC+8 días	1596;1594	$ 0	0%
1592	Remetalcion camaras	$ 6.082.095	mar 17/12/24	15 días	jue 9/01/25	1598	1605	$ 0	0%
1593	Conformacion de la estructur	$ 417.084.398	jue 7/11/24	66 días	vie 7/02/25			$ 0	0%
1594	Drenaje sub superficial	$ 0	jue 7/11/24	7 días	lun 18/11/24	1591	1596;1595	$ 0	0%
1595	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 1.900.092	lun 18/11/24	2 días	mié 20/11/24	1594	1596	$ 0	0%
1596	Geotextil de separacion	$ 0	mié 20/11/24	3 días	lun 25/11/24	1581;1582;1584;1	1597	$ 0	0%
1597	Mejoramiento de subrasant	$ 240.969.849	lun 25/11/24	5 días	lun 2/12/24	1596	1598	$ 0	0%
1598	Sub base Granular RCD	$ 29.992.991	lun 2/12/24	12 días	mar 17/12/24	1597	1592;1600	$ 0	0%
1599	Sardinel	$ 3.807.112	vie 17/01/25	15 días	jue 6/02/25	1603FF	1636	$ 0	0%
1600	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 4.839.601	mar 17/12/24	2 días	jue 19/12/24	1598	1601FC+13 días	$ 0	0%
1601	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 54.926.299	jue 9/01/25	3 días	mar 14/01/25	1600FC+13 días	1602	$ 0	0%
1602	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 39.080.440	mar 14/01/25	15 días	lun 3/02/25	1601	1603CC+3 días	$ 0	0%
1603	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 20.055.848	vie 17/01/25	15 días	jue 6/02/25	1602CC+3 días	1604CC+1 día;1599FF	$ 0	0%
1604	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 19.512.166	vie 17/01/25	15 días	vie 7/02/25	1603CC+1 día	1605	$ 0	0%
1605	Fin etapa 1	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	1577;1592;1604	1607FC+1 día	$ 0	0%
1606	Etapa 2 - Intervención espacio público	$ 571.839.728	vie 7/02/25	112 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
1607	Inicio tapa 2	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	1605FC+1 día	1608	$ 0	0%
1608	Implementacion PMT	$ 0	vie 7/02/25	3 días	mié 12/02/25	1607	1609	$ 0	0%
1609	Intervencion Espacio Publico								
1610	Demolicion de concreto	$ 10.152.644	mié 12/02/25	12 días	vie 28/02/25	1608	1610	$ 0	0%
1611	Excavacion manual Estructur	$ 9.332.443	vie 28/02/25	25 días	jue 3/04/25	1609	1615;1612	$ 0	0%
1612	Redes Humedas EAAB	$ 127.384.658	jue 27/03/25	31 días	lun 12/05/25			$ 0	0%
1613	Excavacion manual	$ 5.125.450	jue 3/04/25	15 días	vie 25/04/25	1610	1613CC;1614FF;1	$ 0	0%
1614	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 4.096.134	jue 3/04/25	16 días	lun 28/04/25	1612CC	1618	$ 0	0%
1615	Programacion Cierre Acued	$ 0	jue 27/03/25	20 días	vie 25/04/25	1612FF	1615	$ 0	0%
1616	Conexión Acueducto	$ 0	vie 25/04/25	1 día	lun 28/04/25	1610;1614	1616CC	$ 0	0%
1617	Empate de acueducto	$ 0	vie 25/04/25	1 día	lun 28/04/25	1615CC	1628;1618	$ 0	0%
1618	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 42.183.653	vie 4/04/25	15 días	lun 28/04/25	1612CC+1 día	1618	$ 0	0%
1619	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 74.966.549	jue 28/04/25	10 días	lun 12/05/25	1613;1616;1617	1628	$ 0	0%
1620	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 1.012.872	jue 3/04/25	1 día	vie 4/04/25	1612CC	1636	$ 0	0%
1621	Redes Secas	$ 119.197.385	vie 4/04/25	18 días	vie 2/05/25			$ 0	0%
1622	Excavacion manual	$ 0	vie 4/04/25	15 días	lun 28/04/25	1612CC+1 día	1622CC;1625CC	$ 0	0%
1623	Cajas de inspeccion	$ 46.179.816	vie 4/04/25	1 día	lun 7/04/25	1621CC	1623CC+2 días	$ 0	0%
1624	Instalacion tuberia TDP	$ 63.505.904	mar 8/04/25	15 días	mié 30/04/25	1622CC+2 días	1624CC+5 días	$ 0	0%
1625	Rellenos para redes secas	$ 9.511.665	lun 14/04/25	11 días	vie 2/05/25	1623CC+5 días	1628	$ 0	0%

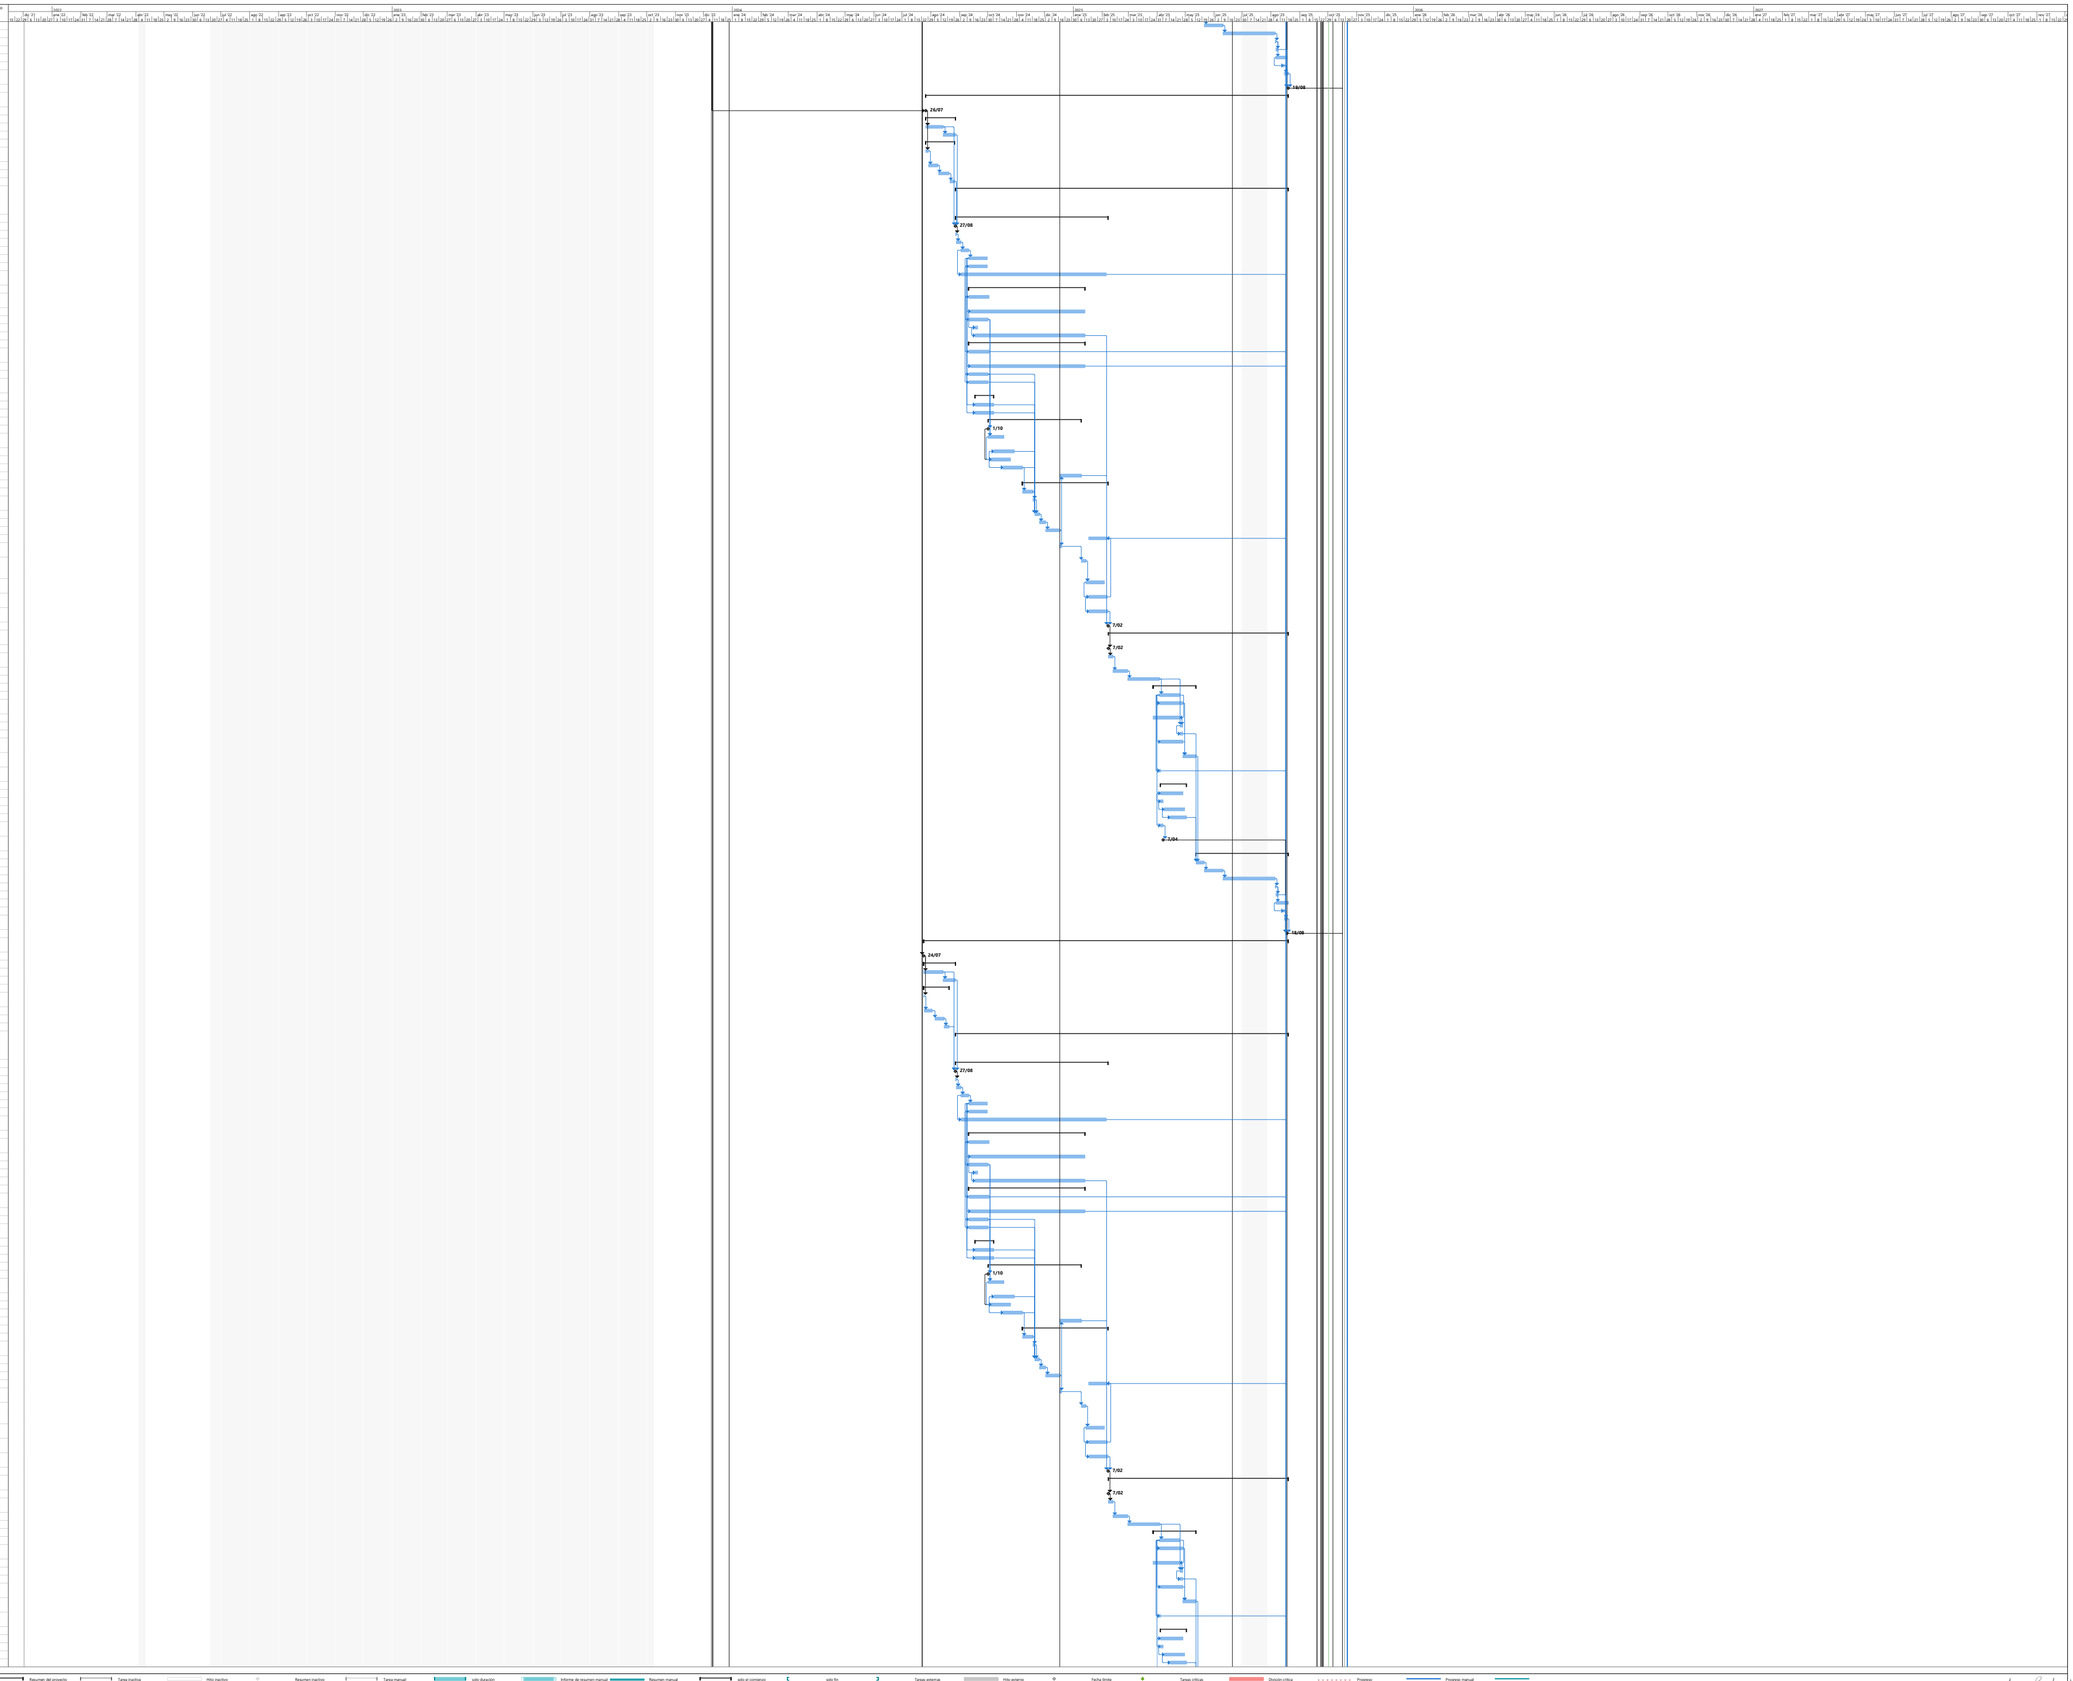

Proyecto: 2- Preliminar 0212202
Fecha: jue 2/10/25


Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | sólo el comienzo | sólo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Progreso manual

NOTA: EL PGT SE SUJETA A LAS APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS ESP Y DEMAS ENTIDADES ASOCIADAS A LOS ENTREGABLES, ALINADO A LA TOTALIDAD DE CAMBIOS REQUERIDO Y EVIDENCIADOS PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO: EDU-1760-2021

Firma Contratista

Firma Interventoria

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	CPTP	% completado
1625	Renivelacion de cajas de inspeccion	$ 0	vie 4/04/25	1 día	lun 7/04/25	1621CC	1626	$ 0	0%
1626	Ejecucion de maniobras por parte de la ESP	$ 0	lun 7/04/25	0 días	lun 7/04/25	1625	1636	$ 0	0%
1627	Conformacion de la estructur	$ 298.786.656	lun 12/05/25	46 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
1628	Geotextil	$ 16.877.431	lun 12/05/25	7 días	mié 21/05/25	1616;1618;1624	1629	$ 0	0%
1629	Mejoramiento de subrasant	$ 29.992.991	mié 21/05/25	14 días	mar 10/06/25	1628	1630	$ 0	0%
1630	Sub Base Granular PEA	$ 109.900.497	mar 10/06/25	15 días	mar 5/08/25	1629	1631	$ 0	0%
1631	Bordillo Separacion de pañc	$ 8.124.200	mar 5/08/25	1 día	mié 6/08/25	1630	1632;1633	$ 0	0%
1632	Accesos Vehicular	$ 9.198.807	mié 6/08/25	1 día	vie 8/08/25	1631	1636	$ 0	0%
1633	Arena de Peña	$ 0	mié 6/08/25	9 días	mar 19/08/25	1631	1634CC+5 días	$ 0	0%
1634	Concreto estampado	$ 124.692.730	jue 14/08/25	1 día	vie 15/08/25	1633CC+5 días	1636;1635	$ 0	0%
1635	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 6.985.942	vie 15/08/25	1 día	lun 18/08/25	1634	1636	$ 0	0%
1636	Fin Etapa 2	$ 0	lun 18/08/25	0 días	lun 18/08/25	1571;1579;1580;1	1917	$ 0	0%
1637	**CIV-16001055 ENTRE CL 17 B-KR 33-KR 34**	**$ 1.662.934.588**	**mié 24/07/24**	**256 días**	**mar 19/08/25**			**$ 0**	**0%**
1638	Inicio de Tramo	$ 0	mié 24/07/24	0 días	mié 24/07/24	40FC+157 días	1640;1643	$ 0	0%
1639	**Gestión social**	**$ 0**	**mié 24/07/24**	**24 días**	**mar 27/08/24**			**$ 0**	**0%**
1640	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	mié 24/07/24	15 días	mié 14/08/24	1638	1641;1649	$ 0	0%
1641	Reunión de Inicio de obra	$ 0	mié 14/08/24	9 días	mar 27/08/24	1640	1649	$ 0	0%
1642	**PMT**	**$ 0**	**mié 24/07/24**	**19 días**	**mar 20/08/24**			**$ 0**	**0%**
1643	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	mié 24/07/24	1 día	mié 24/07/24	1638	1644	$ 0	0%
1644	Aprobación de interventoria	$ 0	jue 25/07/24	7 días	vie 2/08/24	1643	1645FC+1 día	$ 0	0%
1645	Radicación y Aprobación PMT a S	$ 0	lun 5/08/24	7 días	jue 15/08/24	1644FC+1 día	1646	$ 0	0%
1646	Implementación PMT	$ 0	jue 15/08/24	3 días	mar 20/08/24	1645	1649	$ 0	0%
1647	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 1.662.934.588**	**mar 27/08/24**	**232 días**	**mar 19/08/25**			**$ 0**	**0%**
1648	**Etapa 1 - Intervención de calzad**	**$ 978.218.157**	**mar 27/08/24**	**119 días**	**vie 7/02/25**			**$ 0**	**0%**
1649	Inicio Etapa 1	$ 0	mar 27/08/24	0 días	mar 27/08/24	1640;1641;1646	1650	$ 0	0%
1650	Replanteo general	$ 1.804.252	mar 27/08/24	1 día	mié 28/08/24	1649	1651	$ 0	0%
1651	Demolición de rodadura exist	$ 1.275.947	mié 28/08/24	3 días	lun 2/09/24	1650	1652	$ 0	0%
1652	Excavacion mecanica Via	$ 11.104.010	lun 2/09/24	7 días	mar 10/09/24	1651	1653;1655CC	$ 0	0%
1653	Excavacion manual Via	$ 5.544.522	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	1652	1654CC;1658CC+2	$ 0	0%
1654	Demolicion de Tuberia existe	$ 1.116.523	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	1653CC	1657CC;1663CC	$ 0	0%
1655	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 204.379.467	lun 2/09/24	113 días	mié 5/02/25	1652CC	1720	$ 0	0%
1656	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 247.549.786	mar 10/09/24	88 días	lun 13/01/25			$ 0	0%
1657	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 56.341.749	mar 10/09/24	17 días	mié 2/10/24	1654CC	1659CC;1665CC	$ 0	0%
1658	Pozos	$ 7.430.484	jue 12/09/24	86 días	lun 13/01/25	1653CC+2 días	1660CC+3 días	$ 0	0%
1659	Instalacion de tuberia	$ 162.798.341	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1657CC	1672;1671	$ 0	0%
1660	Conexión sumidero pozo	$ 14.757.118	mar 17/09/24	3 días	vie 20/09/24	1658CC+3 días	1661CC	$ 0	0%
1661	Sumideros	$ 6.222.094	mar 17/09/24	83 días	lun 13/01/25	1660CC	1689	$ 0	0%
1662	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 25.612.673	mar 10/09/24	88 días	lun 13/01/25			$ 0	0%
1663	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 10.359.488	mar 10/09/24	17 días	mié 2/10/24	1654CC	1720	$ 0	0%
1664	Pozos	$ 9.601.776	jue 12/09/24	86 días	lun 13/01/25	1653CC+2 días	1720	$ 0	0%
1665	Instalacion de tuberia	$ 2.541.282	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1657CC	1680;1666CC;1672	$ 0	0%
1666	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 3.110.127	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1665CC	1680	$ 0	0%
1667	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24			$ 0	0%
1668	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24	1653CC+5 días	1680	$ 0	0%
1669	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24	1653CC+5 días	1680	$ 0	0%
1670	Redes secas	$ 42.210.150	mar 1/10/24	70 días	jue 9/01/25			$ 0	0%
1671	Solicitud de maniobras	$ 0	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	1659;1665	1674CC+3 días	$ 0	0%
1672	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	mar 1/10/24	12 días	vie 18/10/24	1659;1665	1674CC+3 días	$ 0	0%
1673	Rellenos para redes secas	$ 0	lun 7/10/24	16 días	mar 29/10/24	1674CC+1 día	1680	$ 0	0%
1674	Instalacion tuberia TDP	$ 30.049.200	vie 4/10/24	15 días	vie 25/10/24	1672CC+3 días;16	1673CC+1 día;167	$ 0	0%
1675	Proteccion de tuberia	$ 0	jue 17/10/24	15 días	jue 7/11/24	1674CC+8 días	1680;1678	$ 0	0%
1676	Renivelacion camaras	$ 12.160.950	mar 17/12/24	15 días	jue 9/01/25	1682	1689	$ 0	0%
1677	Conformacion de la estructur	$ 437.620.827	jue 7/11/24	66 días	vie 7/02/25			$ 0	0%
1678	Drenaje sub superficial	$ 0	jue 7/11/24	7 días	lun 18/11/24	1675	1680;1679	$ 0	0%
1679	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 2.008.554	lun 18/11/24	2 días	mié 20/11/24	1678	1680	$ 0	0%
1680	Geotextil de separacion	$ 0	mié 20/11/24	3 días	lun 25/11/24	1665;1666;1668;1	1681	$ 0	0%
1681	Mejoramiento de subrasant	$ 259.427.642	lun 25/11/24	5 días	lun 2/12/24	1680	1682	$ 0	0%
1682	Sub base Granular RCD	$ 31.704.850	lun 2/12/24	12 días	mar 17/12/24	1681	1676;1684	$ 0	0%
1683	Sardinel	$ 3.807.112	vie 17/01/25	15 días	jue 6/02/25	1687FF	1720	$ 0	0%
1684	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 7.229.984	mar 17/12/24	2 días	jue 19/12/24	1682	1685FC+13 días	$ 0	0%
1685	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 58.061.389	jue 9/01/25	3 días	mar 14/01/25	1684FC+13 días	1686	$ 0	0%
1686	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 33.598.556	mar 14/01/25	15 días	lun 3/02/25	1685	1687CC+3 días	$ 0	0%
1687	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 21.202.753	vie 17/01/25	15 días	jue 6/02/25	1686CC+3 días	1688CC+1 día;1683FF	$ 0	0%
1688	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 20.579.987	vie 17/01/25	15 días	vie 7/02/25	1687CC+1 día	1689	$ 0	0%
1689	Fin etapa 1	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	1661;1676;1688	1691FC+1 día	$ 0	0%
1690	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 684.716.431	vie 7/02/25	112 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
1691	Inicio tapa 2	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	1689FC+1 día	1692	$ 0	0%
1692	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	vie 7/02/25	3 días	mié 12/02/25	1691	1693	$ 0	0%
1693	Demolicion de concreto	$ 10.071.784	mié 12/02/25	12 días	vie 28/02/25	1692	1694	$ 0	0%
1694	Excavacion manual Estructura	$ 6.888.333	vie 28/02/25	25 días	jue 3/04/25	1693	1699;1696	$ 0	0%
1695	Redes Humedas EAAB	$ 91.465.733	jue 27/03/25	31 días	lun 12/05/25			$ 0	0%
1696	Excavacion manual	$ 4.271.931	jue 3/04/25	15 días	vie 25/04/25	1694	1697CC;1698FF;17	$ 0	0%
1697	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 13.315.207	jue 3/04/25	16 días	lun 28/04/25	1696CC	1702	$ 0	0%
1698	Programacion Cierre Acued	$ 0	jue 27/03/25	20 días	vie 25/04/25	1696FF	1699	$ 0	0%
1699	Conexión Acueducto	$ 0	vie 25/04/25	1 día	lun 28/04/25	1694;1698	1700CC	$ 0	0%
1700	Empate de acueducto	$ 0	vie 25/04/25	1 día	lun 28/04/25	1699CC	1712;1702	$ 0	0%
1701	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 39.592.558	vie 4/04/25	15 días	lun 28/04/25	1696CC+1 día	1702	$ 0	0%
1702	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 32.260.293	lun 28/04/25	10 días	lun 12/05/25	1697;1700;1701	1712	$ 0	0%
1703	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 2.025.744	jue 3/04/25	1 día	vie 4/04/25	1696CC	1720	$ 0	0%
1704	Redes Secas	$ 293.319.910	vie 4/04/25	18 días	vie 2/05/25			$ 0	0%
1705	Excavacion manual	$ 0	vie 4/04/25	15 días	lun 28/04/25	1696CC+1 día	1706CC;1709CC	$ 0	0%
1706	Cajas de inspeccion	$ 102.386.070	vie 4/04/25	1 día	lun 7/04/25	1705CC	1707CC+2 días	$ 0	0%
1707	Instalacion tuberia TDP	$ 114.112.470	mar 8/04/25	15 días	mié 30/04/25	1706CC+2 días	1708CC+5 días	$ 0	0%
1708	Rellenos para redes secas	$ 68.662.880	lun 14/04/25	11 días	vie 2/05/25	1707CC+5 días	1712	$ 0	0%
1709	Renivelacion de cajas de inspeccion	$ 8.158.490	vie 4/04/25	1 día	lun 7/04/25	1705CC	1710	$ 0	0%
1710	Ejecucion de maniobras pro parte de la ESP	$ 0	lun 7/04/25	0 días	lun 7/04/25	1709	1720	$ 0	0%
1711	Conformacion de la estructur	$ 281.792.363	lun 12/05/25	46 días	mar 19/08/25			$ 0	0%
1712	Geotextil	$ 15.392.144	lun 12/05/25	7 días	mié 21/05/25	1700;1702;1708	1713	$ 0	0%
1713	Mejoramiento de subrasant	$ 31.704.850	mié 21/05/25	14 días	mar 10/06/25	1712	1714	$ 0	0%
1714	Sub Base Granular PEA	$ 87.709.366	mar 10/06/25	15 días	mar 5/08/25	1713	1715	$ 0	0%
1715	Bordillo Separacion de pañc	$ 0	mar 5/08/25	1 día	mié 6/08/25	1714	1716;1717	$ 0	0%
1716	Accesos Vehicular	$ 17.453.068	mié 6/08/25	1 día	vie 8/08/25	1715	1720	$ 0	0%
1717	Arena de Peña	$ 0	mié 6/08/25	9 días	mar 19/08/25	1715	1718CC+5 días	$ 0	0%
1718	Concreto estampado	$ 129.532.935	jue 14/08/25	1 día	vie 15/08/25	1717CC+5 días	1720;1719	$ 0	0%
1719	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 1.178.308	vie 15/08/25	1 día	lun 18/08/25	1718	1720	$ 0	0%
1720	Fin Etapa 2	$ 0	lun 18/08/25	0 días	lun 18/08/25	1655;1663;1664;1	1917	$ 0	0%
1721	**CIV-16001169 ENTRE CL 17 B-KR32 - KR 33**	**$ 1.869.362.605**	**mié 24/07/24**	**266 días**	**mar 2/09/25**			**$ 0**	**0%**
1722	Inicio de Tramo	$ 0	mié 24/07/24	0 días	mié 24/07/24	40FC+157 días	1724;1727	$ 0	0%
1723	**Gestión social**	**$ 0**	**mié 24/07/24**	**24 días**	**mar 27/08/24**			**$ 0**	**0%**
1724	Elaboración Actas de Vecindad	$ 0	mié 24/07/24	15 días	mié 14/08/24	1722	1725;1733	$ 0	0%
1725	Reunión de Inicio de obra	$ 0	mié 14/08/24	9 días	mar 27/08/24	1724	1733	$ 0	0%
1726	**PMT**	**$ 0**	**mié 24/07/24**	**19 días**	**mar 20/08/24**			**$ 0**	**0%**
1727	Atención de observaciones de interventoria al PMT	$ 0	mié 24/07/24	1 día	mié 24/07/24	1722	1728	$ 0	0%
1728	Aprobación de interventoria	$ 0	jue 25/07/24	7 días	vie 2/08/24	1727	1729FC+1 día	$ 0	0%
1729	Radicación y Aprobación PMT a S	$ 0	lun 5/08/24	7 días	jue 15/08/24	1728FC+1 día	1730	$ 0	0%
1730	Implementación PMT	$ 0	jue 15/08/24	3 días	mar 20/08/24	1729	1733	$ 0	0%
1731	**Ejecución de Obra Nota: No incluye obras que no hayan sido contempladas en los Estudios y Diseños**	**$ 1.869.362.605**	**mar 27/08/24**	**242 días**	**mar 2/09/25**			**$ 0**	**0%**
1732	**Etapa 1 - Intervención de calzad**	**$ 1.119.959.366**	**mar 27/08/24**	**242 días**	**mar 2/09/25**			**$ 0**	**0%**
1733	Inicio Etapa 1	$ 0	mar 27/08/24	0 días	mar 27/08/24	1724;1725;1730	1734	$ 0	0%
1734	Replanteo general	$ 2.055.646	mar 27/08/24	1 día	mié 28/08/24	1733	1735	$ 0	0%
1735	Demolición de rodadura exist	$ 1.275.947	mié 28/08/24	3 días	lun 2/09/24	1734	1736	$ 0	0%
1736	Excavacion mecanica Via	$ 13.328.510	lun 2/09/24	7 días	mar 10/09/24	1735	1737;1739CC	$ 0	0%
1737	Excavacion manual Via	$ 12.360.983	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	1736	1738CC;1742CC+2	$ 0	0%
1738	Demolicion de Tuberia existe	$ 1.116.523	mar 10/09/24	15 días	lun 30/09/24	1737CC	1741CC;1747CC	$ 0	0%
1739	Transporte Disposicion centro de acopio o	$ 248.242.058	lun 2/09/24	113 días	mié 5/02/25	1736CC	1773	$ 0	0%
1740	Redes Hidrosanitaria - Pluvial	$ 200.381.154	mar 10/09/24	231 días	mar 2/09/25			$ 0	0%
1741	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 56.690.156	mar 10/09/24	17 días	mié 2/10/24	1738CC	1743CC;1749CC	$ 0	0%
1742	Pozos	$ 15.938.515	jue 12/09/24	86 días	lun 13/01/25	1737CC+2 días	1744CC+3 días	$ 0	0%
1743	Instalacion de tuberia	$ 104.002.467	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1741CC	1756;1755	$ 0	0%
1744	Conexión sumidero pozo	$ 17.527.922	mar 17/09/24	3 días	vie 20/09/24	1742CC+3 días	1745CC	$ 0	0%
1745	Sumideros	$ 6.222.094	mar 17/09/24	226 días	mar 2/09/25	1744CC	1773FC-122 días	$ 0	0%
1746	Redes Hidrosanitarias - Sanita	$ 108.476.635	mar 10/09/24	88 días	lun 13/01/25			$ 0	0%
1747	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 45.373.206	mar 10/09/24	17 días	mié 2/10/24	1738CC	1917FF	$ 0	0%
1748	Pozos	$ 31.871.813	jue 12/09/24	86 días	lun 13/01/25	1737CC+2 días	1917FF	$ 0	0%
1749	Instalacion de tuberia	$ 12.921.062	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1741CC	1764;1750CC;175	$ 0	0%
1750	Conexión domiciliarias Sanitarias - Redes Principal	$ 18.310.554	mar 10/09/24	16 días	mar 1/10/24	1749CC	1764	$ 0	0%
1751	Redes humedas - Acueducto	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24			$ 0	0%
1752	Instalacion Acometidas	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24	1737CC+5 días	1764	$ 0	0%
1753	Instalacion Tuberia RDE 21	$ 0	mar 17/09/24	15 días	lun 7/10/24	1737CC+5 días	1764	$ 0	0%
1754	Redes secas	$ 43.293.770	mar 1/10/24	70 días	jue 9/01/25			$ 0	0%
1755	Solicitud de maniobras	$ 0	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	1743;1749	1758CC+3 días	$ 0	0%
1756	Excavacion manual para redes Secas	$ 0	mar 1/10/24	12 días	vie 18/10/24	1743;1749	1758CC+3 días	$ 0	0%
1757	Rellenos para redes secas	$ 0	lun 7/10/24	16 días	mar 29/10/24	1758CC+1 día	1764	$ 0	0%
1758	Instalacion tuberia TDP	$ 31.132.820	vie 4/10/24	15 días	vie 25/10/24	1756CC+3 días;17	1757CC+1 día;175	$ 0	0%
1759	Proteccion de tuberia	$ 0	jue 17/10/24	15 días	jue 7/11/24	1758CC+8 días	1764;1762	$ 0	0%
1760	Renivelacion camaras	$ 12.160.950	mar 17/12/24	15 días	jue 9/01/25	1766	1917FF	$ 0	0%
1761	Conformacion de la estructur	$ 489.428.140	jue 7/11/24	189 días	mar 2/09/25			$ 0	0%
1762	Drenaje sub superficial	$ 0	jue 7/11/24	7 días	lun 18/11/24	1759	1764;1763	$ 0	0%
1763	Nivelacion y compactacion de la subrasante	$ 2.289.134	lun 18/11/24	2 días	mié 20/11/24	1762	1764	$ 0	0%
1764	Geotextil de separacion	$ 0	mié 20/11/24	3 días	lun 25/11/24	1749;1750;1752;1	1765	$ 0	0%
1765	Mejoramiento de subrasant	$ 292.379.136	lun 25/11/24	5 días	lun 2/12/24	1764	1766	$ 0	0%
1766	Sub base Granular RCD	$ 36.133.829	lun 2/12/24	12 días	mar 17/12/24	1765	1760;1768	$ 0	0%
1767	Sardinel	$ 3.807.112	vie 17/01/25	15 días	jue 6/02/25	1771CC	1917FF	$ 0	0%
1768	Imprimacion con emulsion asfaltica	$ 8.239.965	mar 17/12/24	2 días	jue 19/12/24	1766	1769FC+13 días	$ 0	0%
1769	Base Granular estabilizada con asfalto en caliente mezclada en planta	$ 66.172.080	jue 9/01/25	3 días	mar 14/01/25	1768FC+13 días	1770	$ 0	0%
1770	Acero de refuerzo y Formaleta para losa de	$ 32.711.938	mar 14/01/25	142 días	mar 2/09/25	1769	1771CC+3 días	$ 0	0%
1771	Losa de concreto MR 43 - Curado	$ 24.163.165	vie 17/01/25	139 días	mar 2/09/25	1770CC+3 días	1772CC+1 día;1767CC	$ 0	0%
1772	Corte y sello de juntas de Losas de concreto	$ 23.531.781	vie 17/01/25	138 días	mar 2/09/25	1771CC+1 día	1917FF	$ 0	0%
1773	Fin etapa 1	$ 0	vie 7/02/25	122 días	mar 2/09/25	1739;1745FC-122	1775CC-1 día	$ 0	0%
1774	Etapa 2 - Intervención espacio publico	$ 749.403.239	vie 7/02/25	123 días	mar 2/09/25			$ 0	0%
1775	Inicio tapa 2	$ 0	vie 7/02/25	0 días	vie 7/02/25	1773CC-1 día	1776	$ 0	0%
1776	Implementacion PMT Intervencion Espacio Publico	$ 0	vie 7/02/25	4 días	mié 12/02/25	1775	1777	$ 0	0%
1777	Demolicion de concreto	$ 11.231.951	mié 12/02/25	12 días	vie 28/02/25	1776	1778	$ 0	0%
1778	Excavacion manual Estructura	$ 4.879.709	vie 28/02/25	25 días	jue 3/04/25	1777	1783;1780	$ 0	0%
1779	Redes Humedas EAAB	$ 161.088.768	jue 27/03/25	31 días	lun 12/05/25			$ 0	0%
1780	Excavacion manual	$ 4.759.863	jue 3/04/25	15 días	vie 25/04/25	1778	1781CC;1782FF;17	$ 0	0%
1781	Instalacion domiciliarias Alcantarillado	$ 41.093.743	jue 3/04/25	16 días	lun 28/04/25	1780CC	1786	$ 0	0%
1782	Programacion Cierre Acued	$ 0	jue 27/03/25	20 días	vie 25/04/25	1780FF	1783	$ 0	0%
1783	Conexión Acueducto	$ 0	vie 25/04/25	1 día	lun 28/04/25	1778;1782	1784CC	$ 0	0%
1784	Empate de acueducto	$ 488.728	vie 25/04/25	1 día	lun 28/04/25	1783CC	1796;1786	$ 0	0%
1785	Instalacione Tuberia Acueducto, Acometidas y	$ 76.453.486	vie 4/04/25	15 días	lun 28/04/25	1780CC+1 día	1786	$ 0	0%
1786	Rellenos con Gravilla, Arena y Sub Base Granular	$ 32.722.152	lun 28/04/25	10 días	lun 12/05/25	1781;1784;1785	1796	$ 0	0%
1787	Cajas de inspeccion Acueducto y Alcantarillado	$ 5.570.796	jue 3/04/25	1 día	vie 4/04/25	1780CC	1804	$ 0	0%



Proyecto: 2. Preliminar 0212202
Fecha: jue 2/10/25


Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Progreso manual

NOTA: EL PDT SE SUJETA A LAS APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS ESP Y DEMAS ENTIDADES ASOCIADAS A LOS ENTREGABLES, AUNADO A LA TOTALIDAD DE CAMBIOS REQUERIDO Y EVIDENCIADOS PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO IDU-1760-2021

Firma Contratista

Firma Interventoria

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Duración	Fin	Predecesoras	Sucesoras	CPTP	% completado
1788	Redes Secas	$ 250.518.230	vie 4/04/25	81 días	mar 2/09/25			$ 0	0%
1789	Excavacion manual	$ 0	vie 4/04/25	81 días	mar 2/09/25	1780CC+1 día	1790CC,1791CC	$ 0	0%
1790	Cajas de inspeccion	$ 81.967.850	vie 4/04/25	81 días	mar 2/09/25	1789CC	1792CC+2 días	$ 0	0%
1791	Instalacion tuberia TDP	$ 91.439.146	mar 8/04/25	79 días	mar 2/09/25	1790CC+2 días	1792CC+5 días	$ 0	0%
1792	Rellenos para redes secas	$ 63.217.327	lun 14/04/25	74 días	mar 2/09/25	1791CC+5 días	1804FC-11 días	$ 0	0%
1793	Reinstalacion de cajas de inspeccion	$ 13.893.907	vie 4/04/25	81 días	mar 2/09/25	1789CC	1794FC-80 días	$ 0	0%
1794	Ejecucion de maniobras por parte de la ESP	$ 0	lun 7/04/25	80 días	mar 2/09/25	1793FC-80 días	1804FC-11 días	$ 0	0%
1795	Conformacion de la estructur	$ 320.506.273	lun 12/05/25	56 días	mar 2/09/25			$ 0	0%
1796	Geotextil	$ 17.529.620	lun 12/05/25	7 días	mié 21/05/25	1784,1786	1797	$ 0	0%
1797	Mejoramiento de subrasant	$ 36.133.829	mié 21/05/25	14 días	mar 10/06/25	1796	1798	$ 0	0%
1798	Sub Base Granular PEA	$ 92.645.815	mar 10/06/25	15 días	mar 1/08/25	1797	1799	$ 0	0%
1799	Bordillo Separacion de parki	$ 0	mar 1/08/25	1 día	mié 6/08/25	1798	1800,1801	$ 0	0%
1800	Accesos Vehicular	$ 22.303.221	mié 6/08/25	1 día	vie 8/08/25	1799	1804FC-11 días	$ 0	0%
1801	Arena de Peña	$ 0	mié 6/08/25	7 días	lun 18/08/25	1799	1802CC+5 días	$ 0	0%
1802	Concreto estampado	$ 151.893.788	jue 14/08/25	14 días	mar 2/09/25	1801CC+5 días	1803FC-13 días	$ 0	0%
1803	Mobiliario Urbano / Vegetación y Paisajismo	$ 1.178.308	vie 15/08/25	13 días	mar 2/09/25	1802FC-13 días	1804FC-12 días	$ 0	0%
1804	Fin Etapa 2	$ 0	mar 19/08/25	11 días	mar 2/09/25	1787,1792FC-11 d	1917CC	$ 0	0%
1805	**Solicitudes Empresas de servicios Publicos (Actividades no previstas)**	**$ 0**	**vie 19/09/25**	**21 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1806	EAAB - (16001232 - 16001194 - 16001296 - 16001295 - 16001514 - 16001130 - 16001190 - 16001252 - 16001623 - 16001880 - 16001092 - 16001091 - 16001045 - 16000977 - 16004754 - 16001208 - 16001360 - 16000956 - 16001055 - 16001169 - 16000739)	$ 0	mié 24/09/25	18 días	sáb 18/10/25	40FC+440 días	1917	$ 0	0%
1807	ENEL - (16001232 - 16001194 - 16001296 - 16001295 - 16001514 - 16001190 - 16001252 - 16001623 - 16001880 - 16001092 - 16001091 - 16001045 - 16004754 - 16001208 - 16001360 - 16000956 - 16001055 - 16001169 - 16000739)	$ 0	mar 23/09/25	19 días	sáb 18/10/25	40FC+439 días	1917	$ 0	0%
1808	MOVISTAR (16001296 - 16001514 - 16001194)	$ 0	jue 25/09/25	17 días	sáb 18/10/25	40FC+441 días	1917	$ 0	0%
1809	TIGO-UNE (16000974-16004754-16001045-16	$ 0	vie 26/09/25	16 días	sáb 18/10/25	40FC+442 días	1917	$ 0	0%
1810	VANTI (16001208)	$ 0	jue 25/09/25	17 días	sáb 18/10/25	40FC+441 días	1917	$ 0	0%
1811	ETB (16001295 - 16001092)	$ 0	vie 19/09/25	21 días	sáb 18/10/25	40FC+437 días	1917	$ 0	0%
1812	**Cumplimiento normativa disposicion de residuos peligroses**	**$ 0**	**lun 6/10/25**	**9 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1813	Disposicion de residuos peligroses (16001977 - 16004754 - 16001045 - 16001208 - 16001360 -	$ 0	lun 6/10/25	9 días	sáb 18/10/25	40FC+449 días	1917	$ 0	0%
1814	**AJUSTE MOBILIARIO URBANO DE ACUERDO A ACTIVIDADES NO PREVISTAS**	**$ 0**	**vie 19/09/25**	**21 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1815	Ajuste Mobiliario	$ 0	vie 19/09/25	21 días	sáb 18/10/25	40FC+437 días	1917FF	$ 0	0%
1816	**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL**	**$ 470.538.423**	**mar 17/12/24**	**195 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1817	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION HORIZONTAL	$ 470.538.423	mar 17/12/24	195 días	sáb 18/10/25	40FC+263 días	1917	$ 0	0%
1818	**DESVIOS**	**$ 6.666.537.919**	**vie 20/06/25**	**81 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1819	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE	$ 6.666.537.919	vie 20/06/25	81 días	sáb 18/10/25	40FC+397 días	1917	$ 0	0%
1820	**AJUSTES**	**$ 3.028.443.486**	**jue 28/12/23**	**449 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1821	Diciembre/2023	$ 0	jue 28/12/23	1 día	vie 29/12/23	38FC+9 días	1822FC+21 días	$ 0	0%
1822	Enero/2024	$ 3.812.900	lun 29/01/24	1 día	mar 30/01/24	1821FC+21 días	1823FC+20 días	$ 0	0%
1823	Febrero/2024	$ 0	lun 26/02/24	1 día	mar 27/02/24	1822FC+20 días	1824FC+20 días	$ 0	0%
1824	Marzo/2024	$ 0	mar 26/03/24	1 día	mié 27/03/24	1823FC+20 días	1825FC+22 días	$ 0	0%
1825	Abril/2024	$ 96.604.188	vie 26/04/24	1 día	lun 29/04/24	1824FC+22 días	1826FC+22 días	$ 0	0%
1826	Mayo/2024	$ 83.526.168	jue 30/05/24	1 día	vie 31/05/24	1825FC+22 días	1827FC+18 días	$ 0	0%
1827	Junio/2024	$ 173.037.754	jue 27/06/24	1 día	vie 28/06/24	1826FC+18 días	1828FC+22 días	$ 0	0%
1828	Julio/2024	$ 85.781.978	lun 29/07/24	1 día	mar 30/07/24	1827FC+22 días	1829FC+21 días	$ 0	0%
1829	Agosto/2024	$ 67.684.182	jue 29/08/24	1 día	vie 30/08/24	1828FC+21 días	1830FC+21 días	$ 0	0%
1830	Septiembre/2024	$ 92.583.655	vie 27/09/24	1 día	vie 27/09/24	1829FC+21 días	1831FC+22 días	$ 0	0%
1831	Octubre/2024	$ 104.750.860	mar 29/10/24	1 día	mié 30/10/24	1830FC+22 días	1832FC+20 días	$ 0	0%
1832	Noviembre/2024	$ 136.478.846	jue 28/11/24	1 día	vie 29/11/24	1831FC+20 días	1833FC+21 días	$ 0	0%
1833	Diciembre/2024	$ 141.338.270	vie 27/12/24	1 día	lun 30/12/24	1832FC+21 días	1834FC+21 días	$ 0	0%
1834	Enero/2025	$ 298.623.894	mié 29/01/25	1 día	jue 30/01/25	1833FC+21 días	1835FC+21 días	$ 0	0%
1835	Febrero/2025	$ 452.221.087	jue 27/02/25	1 día	vie 28/02/25	1834FC+21 días	1836FC+20 días	$ 0	0%
1836	Marzo/2025	$ 359.366.508	jue 27/03/25	1 día	vie 28/03/25	1835FC+20 días	1837FC+21 días	$ 0	0%
1837	Abril/2025	$ 298.623.894	mar 29/04/25	1 día	mié 30/04/25	1836FC+21 días	1838FC+21 días	$ 0	0%
1838	Mayo/2025	$ 281.296.248	jue 29/05/25	1 día	jue 29/05/25	1837FC+21 días	1839FC+19 días	$ 0	0%
1839	Junio/2025	$ 189.300.223	jue 26/06/25	1 día	vie 1/08/25	1838FC+19 días	1840FC+10 días	$ 0	0%
1840	Agosto/2025	$ 165.410.831	lun 18/08/25	1 día	lun 18/08/25	1839FC+10 días	1917,1841FC+30 d	$ 0	0%
1841	Septiembre/2025	$ 0	vie 26/09/25	1 día	lun 29/09/25	1840FC+30 días	1842FC+14 días	$ 0	0%
1842	Octubre/2025	$ 0	vie 17/10/25	1 día	sáb 18/10/25	1841FC+14 días	1921	$ 0	0%
1843	**COMPONENTES DE GESTION**	**$ 7.258.515.297**	**jue 14/12/23**	**458 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1844	Inicio Componentes de Gestión	$ 0	jue 14/12/23	0 días	jue 14/12/23	40CC	1917	$ 0	0%
1845	**Medidas de Bioseguridad**	**$ 63.295.081**	**lun 18/08/25**	**1 día**	**lun 18/08/25**			**$ 0**	**0%**
1846	Febrero/2025	$ 63.295.081	lun 18/08/25	1 día	lun 18/08/25	38FC+431 días		$ 0	0%
1847	**Gestión Social**	**$ 1.507.014.292**	**jue 28/12/23**	**449 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1848	Diciembre/2023	$ 55.458.126	jue 28/12/23	1 día	vie 29/12/23	38FC+9 días	1849FC+21 días	$ 0	0%
1849	Enero/2024	$ 68.524.597	lun 29/01/24	1 día	mar 30/01/24	1848FC+21 días	1850FC+20 días	$ 0	0%
1850	Febrero/2024	$ 108.697.927	lun 26/02/24	1 día	mar 27/02/24	1849FC+20 días	1851FC+20 días	$ 0	0%
1851	Marzo/2024	$ 95.036.842	mar 26/03/24	1 día	mié 27/03/24	1850FC+20 días	1852FC+22 días	$ 0	0%
1852	Abril/2024	$ 83.940.696	vie 26/04/24	1 día	lun 29/04/24	1851FC+22 días	1853FC+22 días	$ 0	0%
1853	Mayo/2024	$ 50.251.392	jue 30/05/24	1 día	vie 31/05/24	1852FC+22 días	1854FC+18 días	$ 0	0%
1854	Junio/2024	$ 89.023.855	jue 27/06/24	1 día	vie 28/06/24	1853FC+18 días	1855FC+22 días	$ 0	0%
1855	Julio/2024	$ 71.923.765	lun 29/07/24	1 día	mar 30/07/24	1854FC+22 días	1856FC+21 días	$ 0	0%
1856	Agosto/2024	$ 23.118.001	jue 29/08/24	1 día	vie 30/08/24	1855FC+21 días	1857FC+21 días	$ 0	0%
1857	Septiembre/2024	$ 31.622.589	vie 27/09/24	1 día	vie 27/09/24	1856FC+21 días	1858FC+22 días	$ 0	0%
1858	Octubre/2024	$ 35.778.382	mar 29/10/24	1 día	mié 30/10/24	1857FC+22 días	1859FC+20 días	$ 0	0%
1859	Noviembre/2024	$ 46.615.295	jue 28/11/24	1 día	vie 29/11/24	1858FC+20 días	1860FC+21 días	$ 0	0%
1860	Diciembre/2024	$ 48.275.066	vie 27/12/24	1 día	lun 30/12/24	1859FC+21 días	1861FC+21 días	$ 0	0%
1861	Enero/2025	$ 101.997.060	mié 29/01/25	1 día	jue 30/01/25	1860FC+21 días	1862FC+21 días	$ 0	0%
1862	Febrero/2025	$ 153.776.815	jue 27/02/25	1 día	vie 28/02/25	1861FC+21 días	1863FC+20 días	$ 0	0%
1863	Marzo/2025	$ 122.744.121	jue 27/03/25	1 día	vie 28/03/25	1862FC+20 días	1864FC+21 días	$ 0	0%
1864	Abril/2025	$ 101.997.061	mar 29/04/25	1 día	mié 30/04/25	1863FC+21 días	1865FC+21 días	$ 0	0%
1865	Mayo/2025	$ 96.078.683	jue 29/05/25	1 día	jue 29/05/25	1864FC+21 días	1866FC+19 días	$ 0	0%
1866	Junio/2025	$ 64.656.803	jue 26/06/25	1 día	vie 1/08/25	1865FC+19 días	1867FC+12 días	$ 0	0%
1867	Agosto/2025	$ 56.497.216	mar 19/08/25	1 día	mar 20/08/25	1866FC+12 días	1917,1868FC+30 d	$ 0	0%
1868	Septiembre/2025	$ 0	mar 30/09/25	1 día	mar 30/09/25	1867FC+30 días	1869FC+12 días	$ 0	0%
1869	Octubre/2025	$ 0	vie 17/10/25	1 día	sáb 18/10/25	1868FC+12 días	1921,1916	$ 0	0%
1870	**Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo**	**$ 4.089.493.419**	**jue 28/12/23**	**449 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1871	Diciembre/2023	$ 150.493.358	jue 28/12/23	1 día	vie 29/12/23	38FC+9 días	1872FC+21 días	$ 0	0%
1872	Enero/2024	$ 189.426.971	lun 29/01/24	1 día	mar 30/01/24	1871FC+21 días	1873FC+20 días	$ 0	0%
1873	Febrero/2024	$ 300.174.052	lun 26/02/24	1 día	mar 27/02/24	1872FC+20 días	1874FC+20 días	$ 0	0%
1874	Marzo/2024	$ 255.811.718	mar 26/03/24	1 día	mié 27/03/24	1873FC+20 días	1875FC+22 días	$ 0	0%
1875	Abril/2024	$ 216.623.329	vie 26/04/24	1 día	lun 29/04/24	1874FC+22 días	1876FC+22 días	$ 0	0%
1876	Mayo/2024	$ 137.584.258	jue 30/05/24	1 día	vie 31/05/24	1875FC+22 días	1877FC+18 días	$ 0	0%
1877	Junio/2024	$ 241.065.347	jue 27/06/24	1 día	vie 28/06/24	1876FC+18 días	1878FC+22 días	$ 0	0%
1878	Julio/2024	$ 197.545.147	lun 29/07/24	1 día	mar 30/07/24	1877FC+22 días	1879FC+21 días	$ 0	0%
1879	Agosto/2024	$ 62.739.138	jue 29/08/24	1 día	vie 30/08/24	1878FC+21 días	1880FC+21 días	$ 0	0%
1880	Septiembre/2024	$ 85.819.441	vie 27/09/24	1 día	vie 27/09/24	1879FC+21 días	1881FC+22 días	$ 0	0%
1881	Octubre/2024	$ 97.097.704	mar 29/10/24	1 día	mié 30/10/24	1880FC+22 días	1882FC+20 días	$ 0	0%
1882	Noviembre/2024	$ 126.507.625	jue 28/11/24	1 día	vie 29/11/24	1881FC+20 días	1883FC+21 días	$ 0	0%
1883	Diciembre/2024	$ 131.012.017	vie 27/12/24	1 día	lun 30/12/24	1882FC+21 días	1884FC+21 días	$ 0	0%
1884	Enero/2025	$ 276.806.266	mié 29/01/25	1 día	jue 30/01/25	1883FC+21 días	1885FC+21 días	$ 0	0%
1885	Febrero/2025	$ 417.329.537	jue 27/02/25	1 día	vie 28/02/25	1884FC+21 días	1886FC+20 días	$ 0	0%
1886	Marzo/2025	$ 333.110.991	jue 27/03/25	1 día	vie 28/03/25	1885FC+20 días	1887FC+21 días	$ 0	0%
1887	Abril/2025	$ 276.806.266	mar 29/04/25	1 día	mié 30/04/25	1886FC+21 días	1888FC+21 días	$ 0	0%
1888	Mayo/2025	$ 260.744.587	jue 29/05/25	1 día	jue 29/05/25	1887FC+21 días	1889FC+18 días	$ 0	0%
1889	Junio/2025	$ 175.469.844	mié 25/06/25	1 día	jue 26/06/25	1888FC+18 días	1890FC+11 días	$ 0	0%
1890	Agosto/2025	$ 153.325.823	lun 18/08/25	1 día	lun 18/08/25	1889FC+11 días	1917,1891FC+30 d	$ 0	0%
1891	Septiembre/2025	$ 0	vie 26/09/25	1 día	lun 29/09/25	1890FC+30 días	1892FC+14 días	$ 0	0%
1892	Octubre/2025	$ 0	vie 17/10/25	1 día	sáb 18/10/25	1891FC+14 días	1921,1916	$ 0	0%
1893	**Gestión Tránsito**	**$ 1.598.712.505**	**jue 28/12/23**	**449 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1894	Diciembre/2023	$ 58.832.620	jue 28/12/23	1 día	vie 29/12/23	38FC+9 días	1895FC+21 días	$ 0	0%
1895	Enero/2024	$ 74.500.003	lun 29/01/24	1 día	mar 30/01/24	1894FC+21 días	1896FC+20 días	$ 0	0%
1896	Febrero/2024	$ 117.665.240	lun 26/02/24	1 día	mar 27/02/24	1895FC+20 días	1897FC+20 días	$ 0	0%
1897	Marzo/2024	$ 101.837.987	mar 26/03/24	1 día	mié 27/03/24	1896FC+20 días	1898FC+22 días	$ 0	0%
1898	Abril/2024	$ 89.048.287	vie 26/04/24	1 día	lun 29/04/24	1897FC+22 días	1899FC+22 días	$ 0	0%
1899	Mayo/2024	$ 56.114.809	jue 30/05/24	1 día	vie 31/05/24	1898FC+22 días	1900FC+18 días	$ 0	0%
1900	Junio/2024	$ 94.119.451	jue 27/06/24	1 día	vie 28/06/24	1899FC+18 días	1901FC+22 días	$ 0	0%
1901	Julio/2024	$ 76.557.083	lun 29/07/24	1 día	mar 30/07/24	1900FC+22 días	1902FC+21 días	$ 0	0%
1902	Agosto/2024	$ 24.345.156	jue 29/08/24	1 día	vie 30/08/24	1901FC+21 días	1903FC+21 días	$ 0	0%
1903	Septiembre/2024	$ 33.301.186	vie 27/09/24	1 día	vie 27/09/24	1902FC+21 días	1904FC+22 días	$ 0	0%
1904	Octubre/2024	$ 37.677.578	mar 29/10/24	1 día	mié 30/10/24	1903FC+22 días	1905FC+20 días	$ 0	0%
1905	Noviembre/2024	$ 49.089.738	jue 28/11/24	1 día	vie 29/11/24	1904FC+20 días	1906FC+21 días	$ 0	0%
1906	Diciembre/2024	$ 50.837.613	vie 27/12/24	1 día	lun 30/12/24	1905FC+21 días	1907FC+21 días	$ 0	0%
1907	Enero/2025	$ 107.411.290	mié 29/01/25	1 día	jue 30/01/25	1906FC+21 días	1908FC+21 días	$ 0	0%
1908	Febrero/2025	$ 161.939.629	jue 27/02/25	1 día	vie 28/02/25	1907FC+21 días	1909FC+20 días	$ 0	0%
1909	Marzo/2025	$ 129.259.651	jue 27/03/25	1 día	vie 28/03/25	1908FC+20 días	1910FC+21 días	$ 0	0%
1910	Abril/2025	$ 107.411.290	mar 29/04/25	1 día	mié 30/04/25	1909FC+21 días	1911FC+21 días	$ 0	0%
1911	Mayo/2025	$ 101.178.751	jue 29/05/25	1 día	jue 29/05/25	1910FC+21 días	1912FC+18 días	$ 0	0%
1912	Junio/2025	$ 68.088.930	mié 25/06/25	1 día	jue 26/06/25	1911FC+18 días	1913FC+11 días	$ 0	0%
1913	Agosto/2025	$ 59.496.213	lun 18/08/25	1 día	lun 18/08/25	1912FC+11 días	1917,1914FC+30 d	$ 0	0%
1914	Septiembre/2025	$ 0	vie 26/09/25	1 día	lun 29/09/25	1913FC+30 días	1915FC+14 días	$ 0	0%
1915	Octubre/2025	$ 0	vie 17/10/25	1 día	sáb 18/10/25	1914FC+14 días	1921,1916	$ 0	0%
1916	Fin Componentes de Gestión	$ 0	sáb 18/10/25	0 días	sáb 18/10/25	1869,1892,1915	1917	$ 0	0%
1917	Fin Fase de ejecución	$ 0	sáb 18/10/25	0 días	sáb 18/10/25	1916,208,1468,157	1919FC+47 días	$ 0	0%
1918	**ETAPA DE RECIBO DE LA OBRA**	**$ 0**	**lun 18/08/25**	**47 días**	**sáb 18/10/25**			**$ 0**	**0%**
1919	Inicio etapa recibo de la obra	$ 0	lun 18/08/25	0 días	lun 18/08/25	1917FC+47 días	1920	$ 0	0%
1920	Recibo de obra	$ 0	lun 18/08/25	46 días	vie 17/10/25	1919	1921	$ 0	0%
1921	Fin etapa recibo de la obra	$ 0	sáb 18/10/25	0 días	sáb 18/10/25	1920,1842,1869,1	1922	$ 0	0%
1922	Fin Fase de ejecución	$ 0	sáb 18/10/25	0 días	sáb 18/10/25	1921	1926	$ 0	0%
1923	Fondo de Compensaciones	$ 56.686.169	jue 14/12/23	458 días	sáb 18/10/25	38CC	1926	$ 0	0%
1924	Ensayos de laboratorio en la fase de ejecución	$ 264.013.199	jue 14/12/23	458 días	sáb 18/10/25	38CC	1926	$ 0	0%
1925	Compensación, evaluación y seguimiento SDA	$ 203.025.312	jue 14/12/23	458 días	sáb 18/10/25	38CC	1926	$ 0	0%
1926	Fin CONTRATO IDU 1760 2021	$ 0	sáb 18/10/25	0 días	sáb 18/10/25	1922;1923;1924;1		$ 0	0%

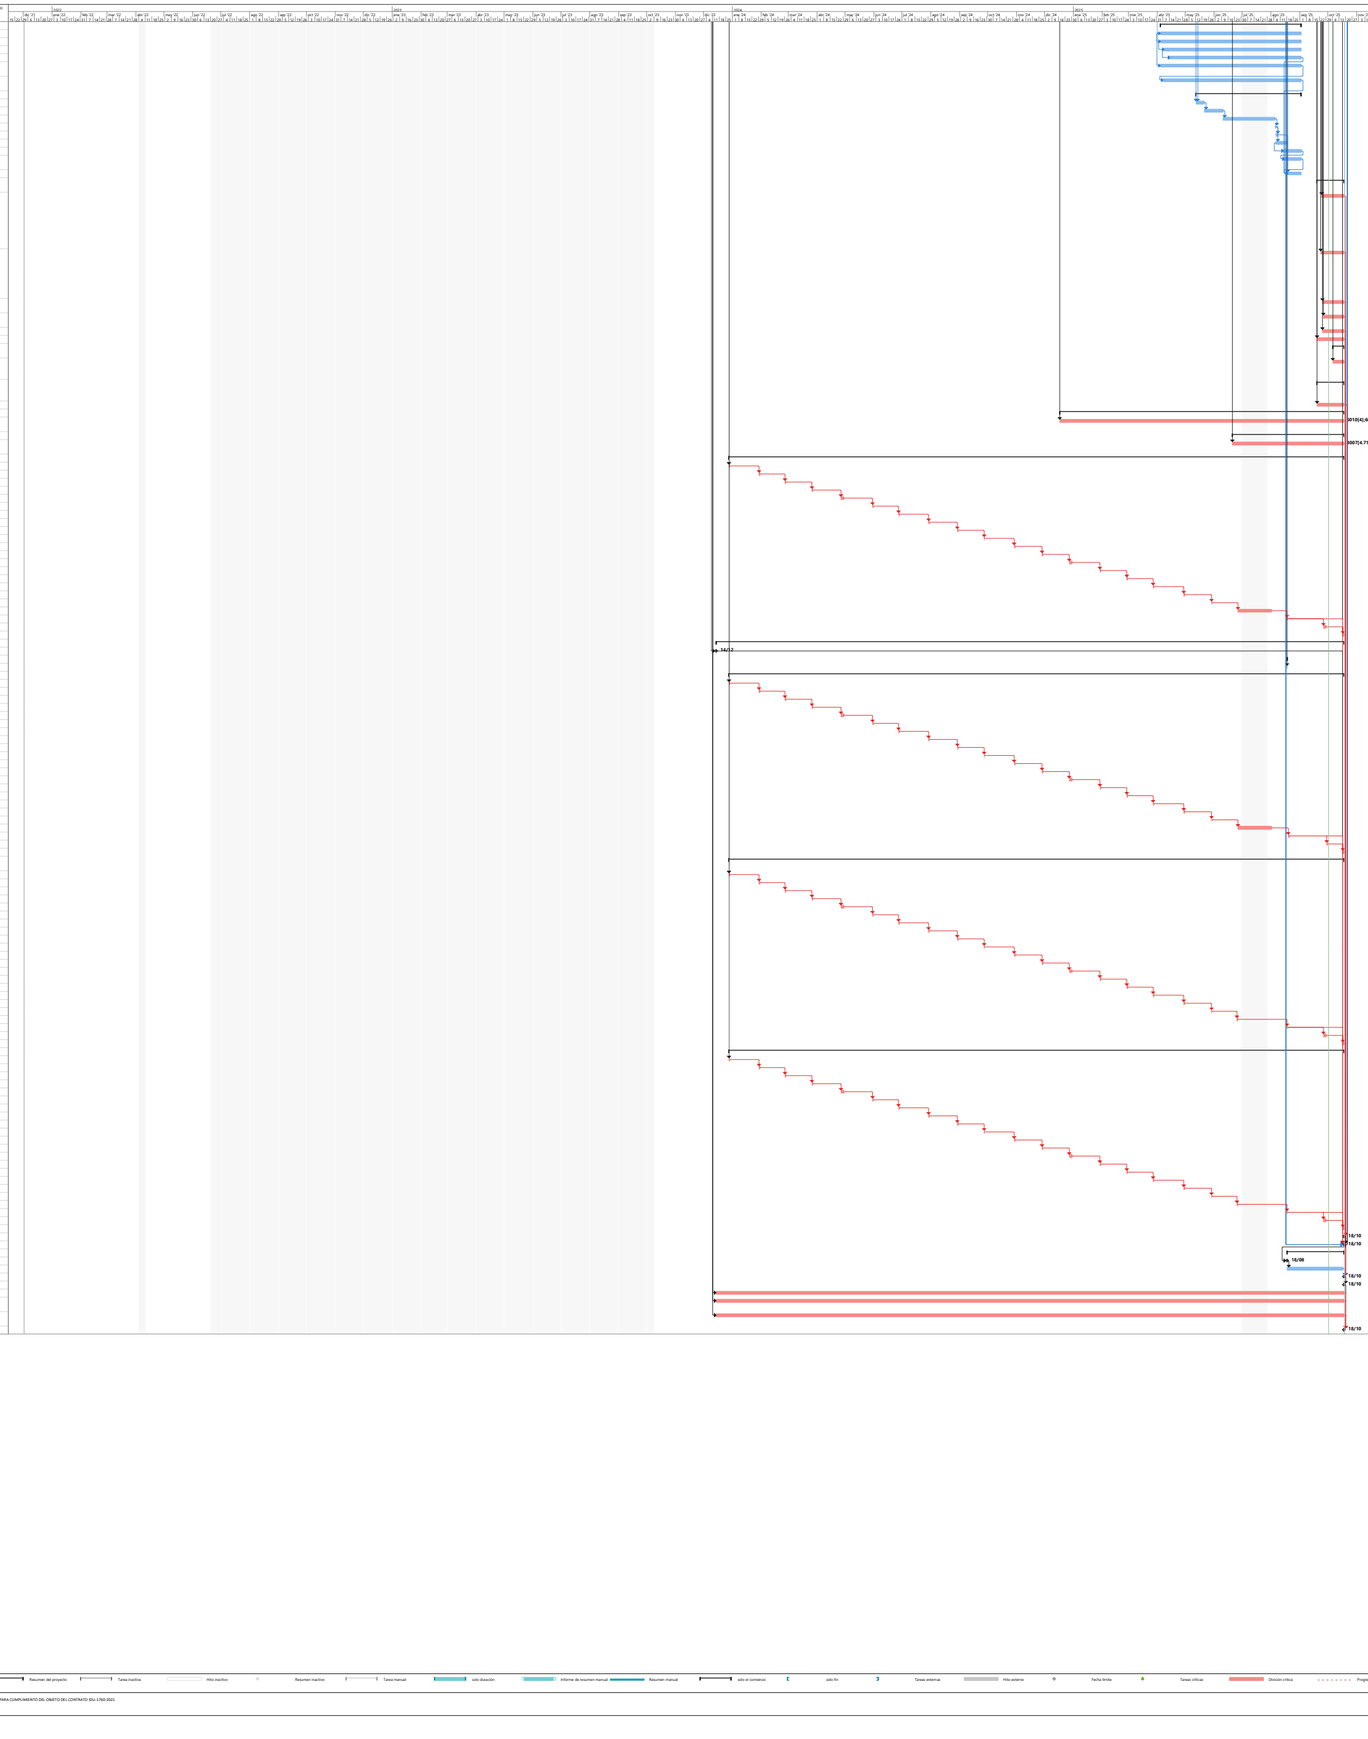

Proyecto: 2-Preliminar 02122025
Fecha: jue 2/10/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

NOTA: EL PDT SE SUJETA A LAS APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DE LAS ESP Y DEMAS ENTIDADES ASOCIADAS A LOS ENTREGABLES, AJUNADO A LA TOTALIDAD DE CAMBIOS REQUERIDO Y EVIDENCIADOS PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO IDU 1760-2021

Firma Contratista
Firma Interventoria
