	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 1 de 56

Villavicencio, 16/09/2025

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Jefe de Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio

Ref.: CONTRATO N°. 2356 DE 2025, N°. DEL PROCESO EN SECOP CD 2314 DE 2025
PERIODO No. 1 del 7 de julio de 2025 al 16 de septiembre de 2025.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	2356 DE 2025 – CD 2314 DE 2025
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X_____
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA SAS – ICT SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN	901521822 – 1
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ CC. 17.326.435 de Villavicencio
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	08/08/2025
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($649.711.440)

PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS		
FECHA DE INICIO:	7/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/10/2025		
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 08/08/2025, notificado personalmente con fecha 08/08/2025 y en plataforma SECOP II del 08/08/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO N°1 del 7/07/2025 al 16/09/2025 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 84%:

   ACTIVIDAD No. 1

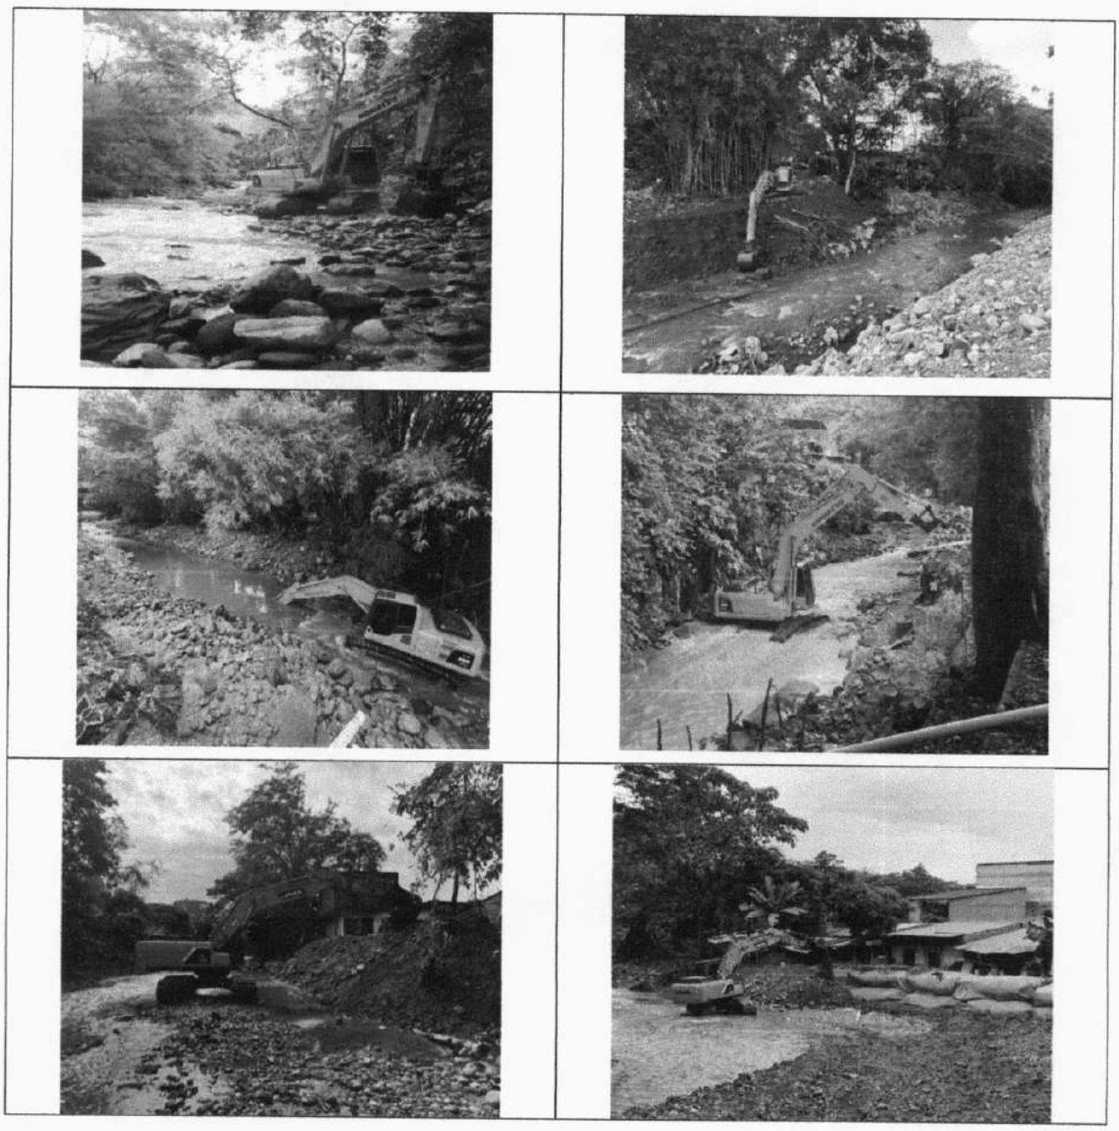
   ESTABLECER LA OBLIGACIÓN
   PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

   ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

   Durante el periodo supervisado se verificaron las actividades ejecutadas por el contratista con retroexcavadora tipo oruga en diferentes frentes de trabajo, orientadas a la excavación, perfilado y redistribución de material, con el fin de reencauzar el flujo hídrico, reforzar las márgenes mediante conformación de jarillones y mitigar riesgos de socavación y desbordamiento en puntos críticos. De manera complementaria, se supervisó la adecuación del terreno para la construcción de estructuras de contención tipo gavión, mediante movimiento de tierras, perfilado de taludes y retiro de material no apto, generando la plataforma base para su instalación y constituyendo un apoyo directo a la comunidad en la protección de sus viviendas e infraestructura. Así mismo, se constataron las labores de descolmatación realizadas en los cauces de Caño Grande, Caño Pendejo, Río Ocoa y Río Guatiquía, donde se efectuó la remoción de sedimentos y obstrucciones naturales, restableciendo la capacidad hidráulica y reduciendo el riesgo de nuevos desbordamientos. A continuación, se anexa un registro fotográfico que refleja las actividades desarrolladas en los diferentes sectores intervenidos.

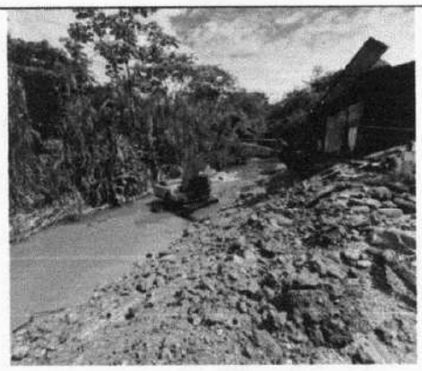
- **Caño Grande (Villa Valero – Guatapé – El Ruby – Villa del rio – La Unión – Nueva fundación – Playa rica – Villa Sonia)**

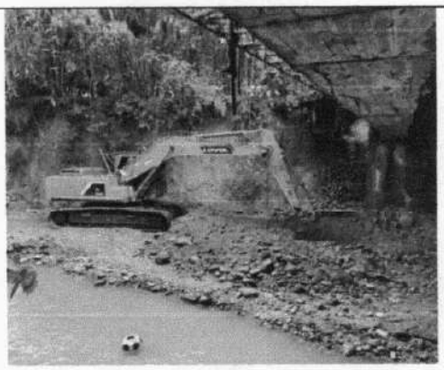
Registro fotográfico:









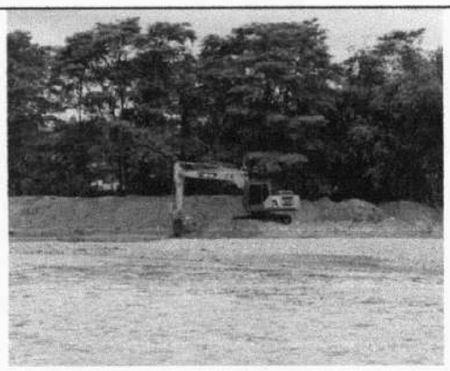


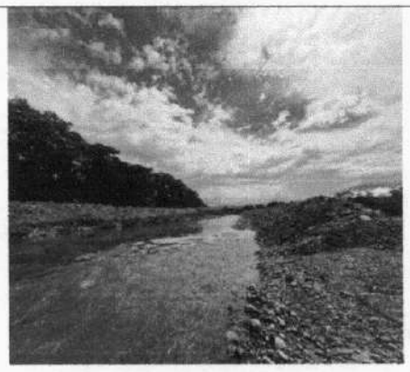


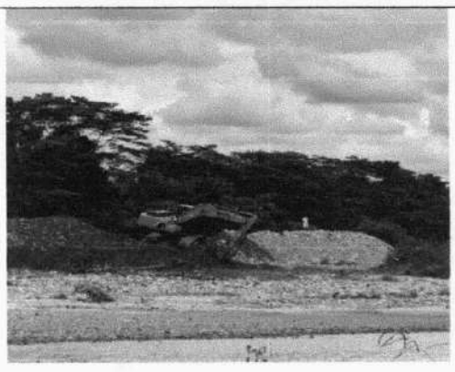


- **Rio Ocoa Sector (El Brillante – Sector Brisas de Apiay)**

Registro fotográfico:



- **Rio Guatiquia Sector Parcelas del Progreso**

Registro fotográfico:

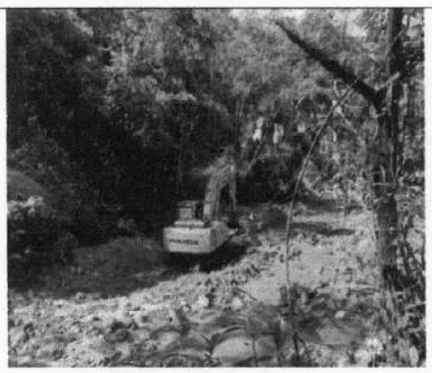







- **Caño Pendejo**

Registro fotográfico:





- **Caño Parrado – Sector Brisas de Guatiquía**

Registro fotográfico:



- **Rio Guatiquia Sector Villa Fany.**

Registro fotográfico:



RESUMEN CONSOLIDADO HORAS TRABAJADAS


SECTOR INTERVENIDO	FECHA INICIAL	HOROMETRO	FECHA FINAL	HOROMETRO FINAL	HORAS
MAQUINA N°1 (CAÑO GRANDE Y BRILLANTE)	15 de agosto de 2025	3.982,30	16 de septiembre de 2025	4.302,40	320,10
MAQUINA N°2 (PARCELAS DEL PROGRESO)	20 de agosto de 2025	6.997,10	26 de agosto de 2025	7.031,80	34,70
MAQUINA N°3 (PLAYA RICA - JUAN PABLO II)	15 de agosto de 2025	19.023,00	16 de septiembre de 2025	19.340,00	317,00
MAQUINA N°4 (RELIQUIA - PICA GANADERA)	17 de agosto de 2025	0,10	31 de agosto de 2025	68,70	68,60
MAQUINA N°5 (CUNABICHE- GUATIQUIA)	15 de agosto de 2025	2.710,80	10 de septiembre de 2025	2.977,40	266,60
MAQUINA N°6 (CUNABICHE- GUATIQUIA)	11 de septiembre de 2025	1.495,70	16 de septiembre de 2025	1.544,70	49,00
MAQUINA N°7 (CAÑO PARRADO)	16 de agosto de 2025	4.144,90	27 de agosto de 2025	4.267,80	122,90
TOTAL HORAS TABAJADAS					**1178,90**

MONITOREO REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: No 2356 del 4 agosto 2025
EQUIPO: Excavadora LOVOL 220 D N°1
OPERARIO:

Tipo de lluvia	
	Leve
	Moderadas
	Fuertes

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros		Sector Intervenido	Horas Lluvia	Actividades realizadas
15-ago-25	3.982,30	3.992,40	10,10			Villa valero	2,00	Se realiza movilizacion de la maquinaria, corte del talud que conforma curva calzada izq. y conformacion de jarillon de proteccion se tumban dos arboles en estado inestable por peticion de la comunidad.
16-ago-25	3.992,40	4.002,30	9,90			Villa valero	0,00	Se continua con el corte del talud que conforma curva calzada izq. Y conformacion de jarillon de proteccion, tambiene se inicia canalizacion aguas abajo se dispone el material al alcance del brazo de la maquinaria calzada der. , se tumba arbol inestable en compañia con personal de infrastructura por peticion de la comunidad
17-ago-25	4.002,30	4.011,60	9,30			Villa valero	0,00	Se continua con repaleo del cordon de material dejado por canalizacion Para conformacion de jarillon de protecion calzada der., se ajusta corte de curva por peticion del ingeniero.
18-ago-25	4.011,60	4.022,70	11,10			Villa valero	0,00	Se termina de organizar material calzada izq. Se amplia ancho y profundidad de canalizacion disposion de material calzada der.

19-ago-25	4.022,70	4.032,40	9,70			**Villa valero**	8,00	Se organiza el material de la canalizacion para conformacion de jarillon de proteccion calzada der. 4-5m sobre terreno estable, tambine se apoya a personal de acueducto en la instalacion de tuberia para descole pluvial calzada izq.
20-ago-25	4.032,40	4.042,60	10,20			**Villa valero**	**0,00**	Se continua con la conformacion y organizacion de materia para jarillon calzada der. , tambien se ajusto ancho de canalizacion aguas arriba se dispone materia sobre bosque para conformacion de jarillon calzada der. , reconformacion de excavacion hecha por instalacion de tuberia pluvial calzada izq. y se organizo descole pluvial calzada der. por peticion de la comunidad
21-ago-25	4.042,60	4.052,10	9,50			**P.C 1 Ruby**	**0,00**	Se organiza patios de la comunidad villa valero calzada der. , se realizo la movilizacion de la maquinaria para el P.C 1 Ruby aguas abajo, se inicia elaboracion de canal para desvio de cause calzada izq. Se dispone el material hasta donde de el alcance y repaleo calzada der. para protecion de geobolsas, el operador reporta rotura del base de valde y perdida de diente se dispone la maquinaria para desvarada, a la espera de continuar actividades dia siguente
22-ago-25	4.052,10	4.062,50	10,40			**P.C 1 Ruby**	1,00	Se continuan actividades de canalizacion margen izq. Con disposicion de material margen der. Conformacion de jarillon de protecion y cobertura de geobolsas, se amplia el ancho y la profundidad del canal y repalio para la disposicion
23-ago-25	4.062,50	4.073,10	10,60			**P.C 1 Ruby**	**0,00**	Se continua con canalizacion margen izq con dispocion margen der, se amplia el ancho del canal ademas de conformar jarillon de proteccion y cobertura de geobolsas

24-ago-25	4.073,10	4.081,10	8,00			**P.C 2 Ruby**	3,00	Se inician actividades en el punto en horas de la tarde ya que no se pudo hacer la movilizacion de la maquinaria en la mañana por lluvias, se inicia con canalizacion margen izq, con dispocion de material margen der, conformacion de jarillon de proteccion
25-ago-25	4.081,10	4.090,50	9,40			**P.C 1 Ruby**	**0,00**	Se inician actividades en el punto en horas de la tarde por presencia de lluvias, se dispone la maquinara para realizar apoyo a la comundidad en la instalacion de 5 geobolsas para conformacion de espolon
26-ago-25	4.090,50	4.100,20	9,70			**P.C 2 Ruby**	**0,00**	Se realiza cobertura de geobolsas en el PC1 ruby, canalizacion y conformacion de espolon, se moviliza la maquinaria para el PC2 ruby para continuar activiades de canalizacion y disposicion de material margen der. Conformacion de jarillon de proteccion
27-ago-25	4.100,20	4.105,90	5,70			**Puente Guatape - Villa Valero**	**0,00**	Se realiza movilizacion de la maquinaria desde PC2 ruby hacia el puente guatape, Se realiza reconformacion de talud socabado y se dispone el escombro como barrera, no se realizan actividades en horas de la tarde por varada de la maquinaria rotura de diente del valde
28-ago-25	4.105,90	4.112,80	6,90			**Puente Guatape - Villa valero**	2,00	Se continua con canalizacion de cause, y disposicion del materia hacia ambos costados, conformacion de jarillones de proteccion

29-ago-25	4.112,80	4.124,20	11,40			**Puente Guatape - Villa valero**	**0,00**	Se continua con canalizacion de cause, y disposicion del materia hacia ambos costados, conformacion de jarillones de proteccion
30-ago-25	4.124,20	4.136,00	11,80			**Puente Guatape - Villa valero**	1,00	Se continua con canalizacion de cause, y disposicion del materia hacia ambos costados, conformacion de jarillones de proteccion, se finalizan labores en el sector
31-ago-25	4.136,00	4.147,20	11,20			**Villa valero - Pc1 Ruby**	**0,00**	Se continua con canalizacion de cause, y disposicion del materia hacia ambos costados, conformacion de jarillones de proteccion, se trabaja margen izq.
1-sep-25	4.147,20	4.157,40	10,20			**Villa valero - Pc1 Ruby**	**0,00**	Se continua con canalizacion de cause, y disposicion del materia hacia ambos costados, conformacion de jarillones de proteccion, se trabaja margen der.
2-sep-25	4.157,40	4.166,40	9,00			**Pc1 - Pc2 Ruby**	8,00	Se continua con canalizacion de cause, y disposicion del materia hacia ambos costados, se realiza corte de playa anterior al pc2

3-sep-25	4.166,40	4.177,30	10,90			**Pc3 - Pc4 Ruby**	**0,00**	Se realiza ayuda a la comunidad con excavacion para un enllantado pc4, canalizacion de cause, y disposicion del materia hacia ambos costados pc3
4-sep-25	4.177,30	4.189,10	11,80			**Pc Rochela - Villa la union**	4,00	Se realiza la intervencion del Pc Rochela, se realiza canalizacion y disposcion de material margen DER, estabilizacon de talud perjudicado, tambien se inicia en el punto Villa union canalizacion y dispocion de materia margen IZQ estabilizacon de talud perjudicado
5-sep-25	4.189,10	4.200,10	11,00			**Villa la union - P.peatonal la union**	**0,00**	Se continua con la intervencion del punto villa la union, canalizacion del cause y disposicon de material sobre la margen izq estabilizacon de talud perjudicado, Se inicia la intervencion del P.peatonal la union canalizacion y dispocion de materia margen izq. estabilizacon de talud perjudicado
6-sep-25	4.200,10	4.206,10	6,00			**P.peatonal la union - Divino niño**	**0,00**	Se continua con la intervencion del P.peatonal la union canalizacion y dispocion de materia margen izq. estabilizacon de talud perjudicado, tambien se interviene divino niño se realiza estabilizacion y disposcion de material margen izq. Proteccion de talud destabilizado
7-sep-25	4.206,10	4.215,00	8,90			**Puente Vehicular Villa del rio**	2,50	Se realiza apoyo a personal de la oficina de gestion de riesgos elaboracion de gaviones para estabilizacion puente vehicular


8-sep-25	4.215,00	4.223,80	8,80			**Puente Vehicular Villa del rio**	**0,00**	Se continua con el apoyo a personal de la oficina de gestion de riesgos elaboracion de gaviones para estabilizacion puente vehicular
9-sep-25	4.223,80	4.234,90	11,10			**Puente Vehicular Villa del rio**	**0,00**	Se continua con el apoyo a personal de la oficina de gestion de riesgos elaboracion de gaviones para estabilizacion puente vehicular
10-sep-25	4.234,90	4.244,40	9,50			**El Brillante**	**0,00**	Se inicia elaboracion de canal para retirar material margen derecha, disposicion del material brisas de apiay
11-sep-25	4.244,40	4.254,00	9,60			**El Brillante**	**0,00**	Se continua con la elaboracion de canal para retirar material margen derecha, disposicion del material brisas de apiay
12-sep-25	4.254,00	4.265,00	11,00			**El Brillante**	**0,00**	Se continua con la elaboracion de canal para retirar material margen derecha, disposicion del material brisas de apiay, tambien se repalea a un mas el jarillon de proteccion para incrementar el ancho del canal

13-sep-25	4.265,00	4.272,90	7,90			El Brillante	0,00	Se continua con la elaboracion de canal para retirar material margen derecha, disposicion del material brisas de apiay, tambien se repalea a un mas el jarillon de proteccion para incrementar el ancho del canal y se realiza la conexion del canal con el cause
14-sep-25	4.272,90	4.281,20	8,30			El Brillante	0,00	Se adelantan labores de conformación de jarillón sobre ambas márgenes del cauce, utilizando material granular (grava y roca) proveniente de la misma zona de intervención. Esta estructura tiene como propósito contener el flujo del río, proteger las orillas ante eventos de creciente y encauzar las aguas dentro del lecho principal, reduciendo el riesgo de
15-sep-25	4.281,20	4.291,50	10,30			El Brillante	0,00	Se adelantan labores de conformación de jarillón sobre ambas márgenes del cauce, utilizando material granular (grava y roca) proveniente de la misma zona de intervención. Esta estructura tiene como propósito contener el flujo del río, proteger las orillas ante eventos de creciente y encauzar las aguas dentro del lecho principal, reduciendo el riesgo de
16-sep-25	4.291,50	4.302,40	10,90			El Brillante	0,00	Se adelantan labores de conformación de jarillón sobre ambas márgenes del cauce, utilizando material granular (grava y roca) proveniente de la misma zona de intervención. Esta estructura tiene como propósito contener el flujo del río, proteger las orillas ante eventos de creciente y encauzar las aguas dentro del lecho principal, reduciendo el riesgo de
TOTAL HORAS			320,10					

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: No 2356 del 4 agosto 2025
EQUIPO: Excavadora Hitachi N°2
OPERARIO:

Tipo de lluvia	
	Leve
	Moderadas
	Fuertes




Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros		Sector Intervenido	Horas Lluvia	Actividades realizadas
20-ago-25	-	-	-	-	-	-	-	Se realiza traslado de la maquina al punto de parcelas del progreso
21-ago-25	6997,1	7003,7	6,60			Parcelas del progreso	-	Se da inicio a la conformacion de espolones como medida de protección hidráulica, orientados a modificar la dirección del flujo del río y disipar su energía, con el objetivo de evitar el impacto directo sobre la margen donde se encuentra asentada la comunidad.
22-ago-25	7003,7	7007,5	3,80			Parcelas del progreso	-	se continua con la conformacion de espolones, La maquina se detiene en las labores debido a por fuga hidraulica.

23-ago-25	7007,5	7009,3	1,80			Parcelas del progreso	8	se continua con la conformacion de espolones como medida de protección hidráulica, orientados a modificar la dirección del flujo del río y disipar su energía, con el objetivo de evitar el impacto directo sobre la margen donde se encuentra asentada la comunidad
24-ago-25	7009,3	7.015,00	5,70			Parcelas del progreso	-	se continua con la conformacion de espolones como medida de protección hidráulica, orientados a modificar la dirección del flujo del río y disipar su energía, con el objetivo de evitar el impacto directo sobre la margen donde se encuentra asentada la comunidad
25-ago-25	7.015,00	7.021,60	6,60			Parcelas del progreso	-	se continua con la conformacion de espolones como medida de protección hidráulica, orientados a modificar la dirección del flujo del río y disipar su energía, con el objetivo de evitar el impacto directo sobre la margen donde se encuentra asentada la comunidad
26-ago-25	7.021,60	7.031,80	10,20			Parcelas del progreso	-	se continua con la conformacion de espolones como medida de protección hidráulica, orientados a modificar la dirección del flujo del río y disipar su energía, con el objetivo de evitar el impacto directo sobre la margen donde se encuentra asentada la comunidad
TOTAL HORAS			34,70					

REGISTRO HORAS TRABAJADAS





PROYECTO: No 2356 del 4 agosto 2025
EQUIPO: Excavadora KOMATSU 200 pc N°3
OPERARIO:



Tipo de lluvia	
	Leve
	Moderadas
	Fuertes


Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros	Sector Intervenido	Horas Lluvia	Actividades realizadas
15-ago-25	19.023,00	19.038,00	**15,00**		**Divino Niño**	**0,00**	Se moviliza la maquinaria desde villa valero hacia divino niño, se inicia devio del cause y excavacion para intervencion de obras de gaviones, colapso de estructura de gavion existente se cancelan actividades hasta coordinación de personal gavionero se vuelve a desplazar la maquinaria hasta villa valero por falta de lugar seguro para guardarla
16-ago-25	19.038,00	19.050,00	**12,00**		**Villa del Rio**	**0,00**	Se realiza movilizacion de maquinaria desde villa valero hacia villa del rio, en el transporte el operador reporta la perdida de 3 dientes del valde por lo que no se pudo realizar bien las actividades en la mañana, tarde perdida por excases de repuesto, se inician activiadades el dia siguente
17-ago-25	19.050,00	19.057,00	**7,00**		**Villa del Rio**	**1,00**	Se continua con canalizacion de rio margen izquierda y disposicion de material sobre la pata del talud destabilizado margen derecha, imprevisto logistico con el combustible




18-ago-25	19.057,00	19.065,00	8,00			Villa del Rio	0,00	Se continua con canalizacion de rio margen izquierda y disposicion de material sobre la pata del talud destabilizado margen derecha profundidad de canalizacion 3m (se continia evidenciando la presencia de grande roca la cual disminuye el rendimiento de la actividad)
19-ago-25	19.065,00	19.075,00	10,00			Villa del Rio	0,00	Se continua con canalizacion de rio margen izquierda y disposicion de material sobre la pata del talud destabilizado margen derecha profundidad de canalizacion 3m (se continia evidenciando la presencia de grande roca la cual disminuye el rendimiento de la actividad)
20-ago-25	19.075,00	19.081,00	6,00			Nueva Fundacion caño grande	0,00	Se inicia actividad de canalizacion y dispocion de material a ambas margenes, corte puente vehicula hasta el puente peatonal, no se realizan actividades en horas de la tarde por varada de la maquinaria corte electrico y cambio de baterias
21-ago-25	19.081,00	19.090,00	9,00			Nueva Fundacion caño grande	0,00	Se continua con canalizacion y dispocion de material a ambas margenes, corte puente vehicular hasta el puente peatonal profundizacion 1,5m con ancho de 4-5 m
22-ago-25	19.090,00	19.099,00	9,00			Nueva Fundacion caño grande	2,00	Se continua con canalizacion y dispocion de material a ambas margenes, corte puente vehicular hasta el puente peatonal profundizacion 1,5m con ancho de 4-5 m variable

23-ago-25	19.099,00	19.106,00	7,00			**Nueva Fundacion caño grande**	0,00	Se continua con canalizacion y dispocion de material a ambas margenes, corte puente vehicular hasta el puente peatonal
24-ago-25	19.106,00	19.117,00	11,00			**Nueva Fundacion caño grande - Villa del rio**	0,00	Se continua con canalizacion y dispocion de material a ambas margenes, se inicia corte de curva villa del rio
25-ago-25	19.117,00	19.128,00	11,00			**Villa del rio**	0,00	Se continua con canalizacion y dispocion de material a ambas margenes, se continua el corte de la curva, se finalizan actividades en el sector
26-ago-25	19.128,00	19.141,00	13,00			**Playa rica - Villa Sonia**	0,00	Se inicia con la movilizacion de la maquinaria hacia el sector de Playa rica- Villa sonia, Se genera gasto de tiempo por movilizacion ya que se encuentra en zona de dificil acceso para cargar la maquinaria a la cama baja, se realizan actividades en horas de la tarde movilizacion de rocas de gran tamaño, se reporta la rotura de base de valde y perdida de diente
27-ago-25	19.141,00	19.153,00	12,00			**Playa rica - Villa Sonia**	0,00	Se continuan actividades disposcion de rocas hacia ambos costados.

28-ago-25	19.153,00	19.163,00	**10,00**			**Playa rica - Villa Sonia**	7,00	Se continua con actividades en villa del rio, movilizacion de rocas y canalizacion del cause
29-ago-25	19.163,00	19.175,00	**12,00**			**Playa Rica**	**0,00**	Se continuan actividades disposcion de rocas hacia ambos costados.
30-ago-25	19.175,00	19.183,00	**8,00**			**Playa Rica**	0,00	**Se continuan actividades disposcion de rocas hacia ambos costados.**
31-ago-25	19.183,00	19.196,00	**13,00**			**Paya Rica**	**0,00**	Se continuan actividades disposcion de rocas hacia ambos costados.
1-sep-25	19.196,00	19.206,00	**10,00**			**Playa Rica**	**0,00**	**Se continuan actividades disposcion de rocas hacia ambos costados.**

2-sep-25	19.206,00	19.215,00	**9,00**			**Las Mercedes**	**0,00**	**se realiza trabajos en remoción de material sedimentado, que ha generado taponamientos parciales, disminuyendo la capacidad hidráulica del cauce y favoreciendo los procesos de desbordamiento e inundación. Se hace la reconformacion del canal natural para restablecer el flujo normal del agua.**
3-sep-25	19.215,00	19.225,00	**10,00**			**Las Mercedes**	**0,00**	**se realiza trabajos en remoción de material sedimentado, que ha generado taponamientos parciales, disminuyendo la capacidad hidráulica del cauce y favoreciendo los procesos de desbordamiento e inundación. Se hace la reconformacion del canal natural para restablecer el flujo normal del agua.**
4-sep-25	19.225,00	19.235,00	**10,00**			**Las Mercedes**	**0,00**	**se realiza trabajos en remoción de material sedimentado, que ha generado taponamientos parciales, disminuyendo la capacidad hidráulica del cauce y favoreciendo los procesos de desbordamiento e inundación. Se hace la reconformacion del canal natural para restablecer el flujo normal del agua.**
5-sep-25	19.235,00	19.245,00	**10,00**			**Las Mercedes**	**0,00**	**se realiza trabajos en remoción de material sedimentado, que ha generado taponamientos parciales, disminuyendo la capacidad hidráulica del cauce y favoreciendo los procesos de desbordamiento e inundación. Se hace la reconformacion del canal natural para restablecer el flujo normal del agua.**
6-sep-25	19.245,00	19.255,00	**10,00**			**Montecarlo Sector 2**	**0,00**	Se realliza traslado de la maquina de la vereda la Mercedes al sector montecarlo 2, dando inicio a trabajos de descolmatacion, llevando el material a ambos costados.

7-sep-25	19.255,00	19.259,00	4,00			Montecarlo Sector 2	6	Se presentan 6 horas de lluvia, se ingrea a realizar labores de descolmatacion, llevando el material de lado a lado
8-sep-25	19.259,00	19.271,00	12,00			Montecarlo Sector 2	0,00	Se continúa con las labores de descolmatación del cauce, mediante retiro de sedimentos acumulados. El material extraído es dispuesto en ambos márgenes del río, con el fin de facilitar el libre flujo del agua y contribuir a la estabilización de los taludes.
9-sep-25	19.271,00	19.280,00	9,00			Montecarlo Sector 2	1	Se continúa con las labores de descolmatación del cauce, mediante retiro de sedimentos acumulados. El material extraído es dispuesto en ambos márgenes del río, con el fin de facilitar el libre flujo del agua y contribuir a la estabilización de los taludes.
10-sep-25	19.280,00	19.288,00	8,00			Montecarlo Sector 2	2	Se continúa con las labores de descolmatación del cauce, mediante retiro de sedimentos acumulados. El material extraído es dispuesto en ambos márgenes del río, con el fin de facilitar el libre flujo del agua y contribuir a la estabilización de los taludes.
11-sep-25	19.288,00	19.296,00	8,00			Montecarlo Sector 2	2	Se continúa con las labores de descolmatación del cauce, mediante retiro de sedimentos acumulados. El material extraído es dispuesto en ambos márgenes del río, con el fin de facilitar el libre flujo del agua y contribuir a la estabilización de los taludes.





12-sep-25	19.296,00	19.305,00	9,00			Juan Pablo II	0,00	Se realiza intervención para desviar el cauce del río, guiando el flujo hacia una zona más estable y alejada de puntos críticos de erosión.
13-sep-25	19.305,00	19.315,00	10,00			Juan Pablo II	0,00	Se realiza intervención para desviar el cauce del río, guiando el flujo hacia una zona más estable y alejada de puntos críticos de erosión.
14-sep-25	19.315,00	19.326,00	11,00			Juan Pablo II	0,00	Se realiza intervención para desviar el cauce del río, guiando el flujo hacia una zona más estable y alejada de puntos críticos de erosión.
15-sep-25	19.326,00	19.335,00	9,00			Juan Pablo II	0,00	Se realiza intervención para desviar el cauce del río, guiando el flujo hacia una zona más estable y alejada de puntos críticos de erosión.
16-sep-25	19.335,00	19.340,00	5,00			Juan Pablo II	0,00	Se realiza intervención para desviar el cauce del río, guiando el flujo hacia una zona más estable y alejada de puntos críticos de erosión.
TOTAL HORAS			317,00					


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 27 de 56

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: No 2356 del 4 agosto 2025
EQUIPO: Excavadora KOMATSU 200 pc N°4
OPERARIO:



Tipo de lluvia	
	Leve
	Moderadas
	Fuertes

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros	Sector Intervenido	Horas Lluvia	Actividades realizadas
17-ago-25	0,1	7,5	7,4		Reliquia	0,00	reforzamiento de la orilla para contener el flujo del río y evitar procesos de socavación lateral, especialmente en puntos donde el agua impacta directamente contra el talud. La maquina ejecuta movimientos de acopio, perfilado y compactación del material, garantizando una estructura estable y con pendiente controlada.
18-ago-25	7,5	16,1	8,6		Reliquia	0,00	desviación controlada del cauce del río, mediante el movimiento y disposición de material granular
20-ago-25	16,1	23,1	7,0		Reliquia	0,00	reforzamiento de la orilla para contener el flujo del río y evitar procesos de socavación lateral, especialmente en puntos donde el agua impacta directamente contra el talud. desviación controlada del cauce del río, mediante el movimiento y disposición de material granular
21-ago-25	23,1	31,1	8,0		Reliquia	0,00	reforzamiento de la orilla para contener el flujo del río y evitar procesos de socavación lateral, especialmente en puntos donde el agua impacta directamente contra el talud. desviación controlada del cauce del río, mediante el movimiento y disposición de material granular

22-ago-25	31,1	39,2	8,1			**Reliquia**	**0,00**	reforzamiento de la orilla para contener el flujo del río y evitar procesos de socavación lateral, especialmente en puntos donde el agua impacta directamente contra el talud. desviación controlada del cauce del río, mediante el movimiento y disposición de material granular
23-ago-25	39,2	48,7	**9,5**			**Reliquia**	**0,00**	reforzamiento de la orilla para contener el flujo del río y evitar procesos de socavación lateral, especialmente en puntos donde el agua impacta directamente contra el talud. desviación controlada del cauce del río, mediante el movimiento y disposición de material granular
24-ago-25	48,7	56,1	7,4			**Reliquia**	**0,00**	reforzamiento de la orilla para contener el flujo del río y evitar procesos de socavación lateral, especialmente en puntos donde el agua impacta directamente contra el talud. desviación controlada del cauce del río, mediante el movimiento y disposición de material granular
29-ago-25	56,1	62,7	6,6			**Reliquia**	**0,00**	Fortalecer las márgenes del río con materiales como rocas o tierra para prevenir la erosión y el deslizamiento de tierra.
31-ago-25	62,7	68,7	6,0			**Reliquia**	**0,00**	**Fortalecer las márgenes del río con materiales como rocas o tierra para prevenir la erosión y el deslizamiento de tierra.**
TOTAL HORAS			**68,60**					

PROYECTO: No 2356 del 4 agosto 2025
EQUIPO: Excavadora N°5 y N°6
OPERARIO:


Tipo de lluvia	
	Leve
	Moderadas
	Fuertes

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros	Sector Intervenido	Horas Lluvia	Actividades realizadas
15-ago-25	2.710,80	2.720,30	9,50		CAÑO PARRADO-CUNABICHE-GUATIQUIA	1,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
16-ago-25	2.720,30	2.730,40	10,10		GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
17-ago-25	2.730,40	2.740,80	10,40		GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	2,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
18-ago-25	2.740,80	2.751,90	11,10		GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia

19-ago-25	2.751,90	2.760,40	8,50			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	8,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
20-ago-25	2.760,40	2.770,10	9,70			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
21-ago-25	2.770,10	2.780,20	10,10			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
22-ago-25	2.780,20	2.790,00	9,80			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	1,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
23-ago-25	2.790,00	2.798,20	8,20			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia

24-ago-25	2.798,20	2.808,20	10,00			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	3,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
25-ago-25	2.808,20	2.818,30	10,10			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
26-ago-25	2.818,30	2.828,80	10,50			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
27-ago-25	2.828,80	2.839,30	10,50			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
28-ago-25	2.839,30	2.850,00	10,70			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia

29-ago-25	2.850,00	2.860,10	10,10					
30-ago-25	2.860,10	2.870,10	10,00			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
31-ago-25	2.870,10	2.879,10	9,00			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	2,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
1-sep-25	2.879,10	2.888,30	9,20			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
2-sep-25	2.888,30	2.898,30	10,00			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	1,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia

3-sep-25	2.898,30	2.908,30	10,00			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
4-sep-25	2.908,30	2.918,40	10,10			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
5-sep-25	2.918,40	2.929,20	10,80			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
6-sep-25	2.929,20	2.939,30	10,10			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	4,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
7-sep-25	2.939,30	2.949,30	10,00			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	8,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia

8-sep-25	2.949,30	2.959,50	10,20			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
9-sep-25	2.959,50	2.969,40	9,90			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
10-sep-25	2.969,40	2.977,40	8,00			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
11-sep-25	1495,7	1500,1	4,40			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realizo cambio de maquinaria para continuar actividades descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
12-sep-25	1500,1	1512,4	12,30			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia

13-sep-25	1512,4	1518,5	6,10			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
14-sep-25	1518,5	1524,0	5,50			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
15-sep-25	1524,0	1533,1	9,10			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
16-sep-25	1533,1	1544,7	11,60			GUATIQUIA-CUNABICHE- BABARIA	0,00	Se realiza descolmatacion caño parrado, canalizacion y obras de redirecionamiento rio guatiquia
TOTAL HORAS			315,60					

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: No 2356 del 4 agosto 2025
EQUIPO: Excavadora SHANTUI N°7
OPERARIO:

Tipo de lluvia	
	Leve
	Moderadas
	Fuertes

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros	Sector Intervenido	Horas Lluvia	Actividades realizadas
16-ago-25	4144,9	4154,9	10,0	 	CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.
17-ago-25	4154,9	4165,0	10,1	 	CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.
18-ago-25	4165,0	4175,4	10,4	 	CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.
19-ago-25	4175,4	4185,9	10,5	 	CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.

20-ago-25	4185,9	4196,5	10,6			CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.
21-ago-25	4196,5	4206,6	**10,1**			CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.
22-ago-25	4206,6	4217,5	10,9			CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.
23-ago-25	4217,5	4229,5	12,0			CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.
24-ago-25	4229,5	4238,0	8,5			CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.

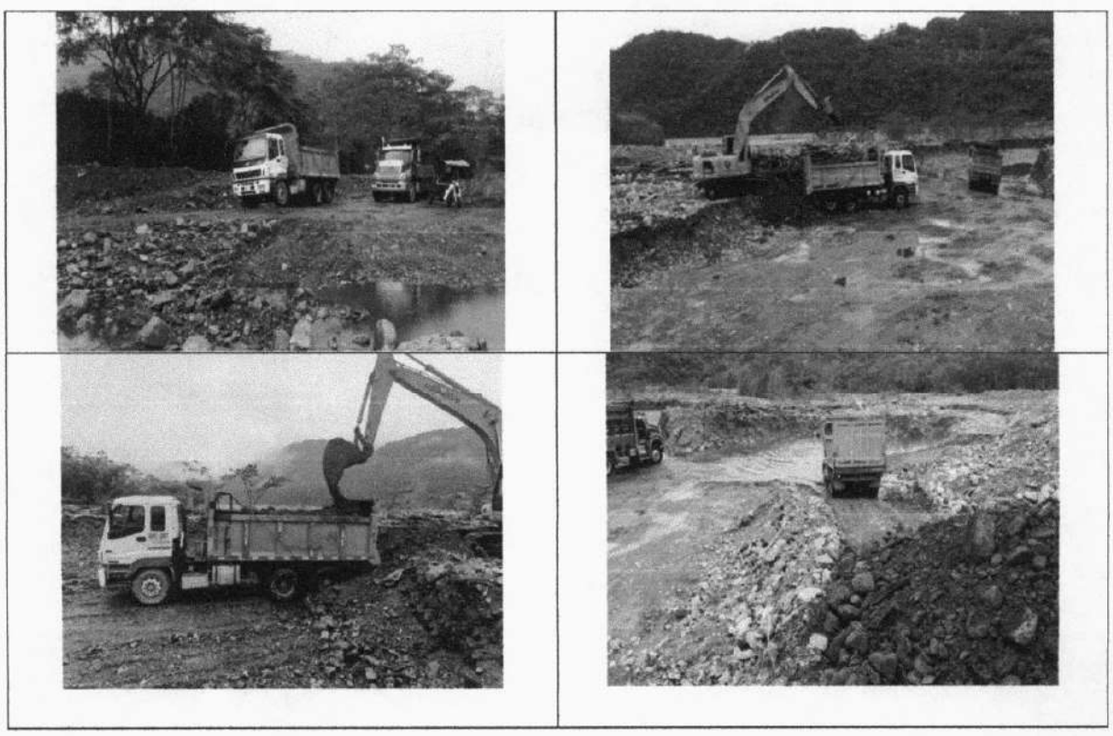
25-ago-25	4238,0	4245,6	7,6			CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.
26-ago-25	4245,6	4257,0	11,4			CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.
27-ago-25	4257,0	4267,8	10,8			CAÑO PARRADO	0,00	Se realizaron actividades de canalizacion, descolmatacion y elaboracion de jarillon de proteccion.
TOTAL HORAS			122,90					

ACTIVIDAD No. 2

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ITEM 2: VOLQUETA DOBLE TROQUE

Durante el periodo de supervisión se verificaron las actividades ejecutadas por el contratista en relación con el transporte y disposición de material de relleno, proceso que comprendió el cargue del material en los puntos de acopio previamente definidos y su posterior traslado y descarga en los sectores críticos priorizados. Dicho material fue empleado en la conformación de un jarillón de protección, con el propósito de reforzar las márgenes del cauce y mitigar los riesgos asociados a posibles crecientes súbitas. En el desarrollo de estas labores se constató la adecuada coordinación entre la operación de la maquinaria y el suministro del material, asegurando que las actividades se ejecutaran de manera continua, eficiente y conforme a los lineamientos técnicos establecidos. La supervisión permitió evidenciar que la conformación del jarillón no solo incrementó la capacidad de contención del cauce, sino que también constituyó una medida preventiva frente a procesos de erosión y socavación que pudieran comprometer la seguridad de la comunidad y la infraestructura aledaña. De igual forma, se dejó constancia de que las actividades ejecutadas por el contratista respondieron a la necesidad de intervenir los puntos vulnerables y reducir la exposición al riesgo en los sectores priorizados. A continuación, se anexa un registro fotográfico que refleja las actividades desarrolladas en los diferentes sectores intervenidos.



VOLQUETA DOBLE TROQUE						
Fecha	Dias	PLACA	MARCA	Sector Intervenido	Actividades realizadas	Registro fotografico
4/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
5/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
6/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
7/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
10/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	

11/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
12/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
13/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
14/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
15/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
16/09/2025	1	SWV207	CHEVROLET	EL BRILLANTE	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico.	
TOTAL DIAS	11					

PLANILLA REGISTRO OPERACIÓN VOLQUETA DOBLE TROQUE

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN - PLANILLA DE CONTROL VOLQUETA DOBLETROQUE

FECHA	DIAS	SECTOR INTERVENIDO	PLACA VOLQUETA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA CONDUTOR	FIRMA SUPERVISOR TECNICO
04-09-2025	1	El Brillante	SWV 207	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno	Milton Torres	
05-09-2025	1	El Brillante	SWV 207	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno	Milton Torres	
06-09-2025	1	El Brillante	SWV 207	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno	Milton Torres	
07-09-2025	1	El Brillante	SWV 207	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno	Milton Torres	
10-09-2025	1	El Brillante	SWV 207	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno	Milton Torres	
11-09-2025	1	El Brillante	SWV 207	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno	Milton Torres	
12-09-2025	1	El brillante	SWV 207	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno	Milton Torres	
13-09-2025	1	el brillante	SWV 207	Apoyo en transporte y disposición de material de relleno	Milton Torres	
14-09-2025	1	El brillante	SWV 207	Apoyo en transporte de material de relleno	Milton Torres	
15-09-2025	1	El Brillante	SWV 207	Apoyo en transporte de material de relleno	Milton Torres	
16-09-2025	1	El Brillante	SWV 207	Apoyo en el transporte y disposicion de material de relleno	Milton Torres	

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD No. 3

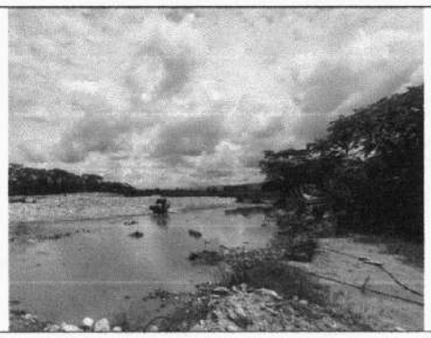
ESTABLECER LA OBLIGACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

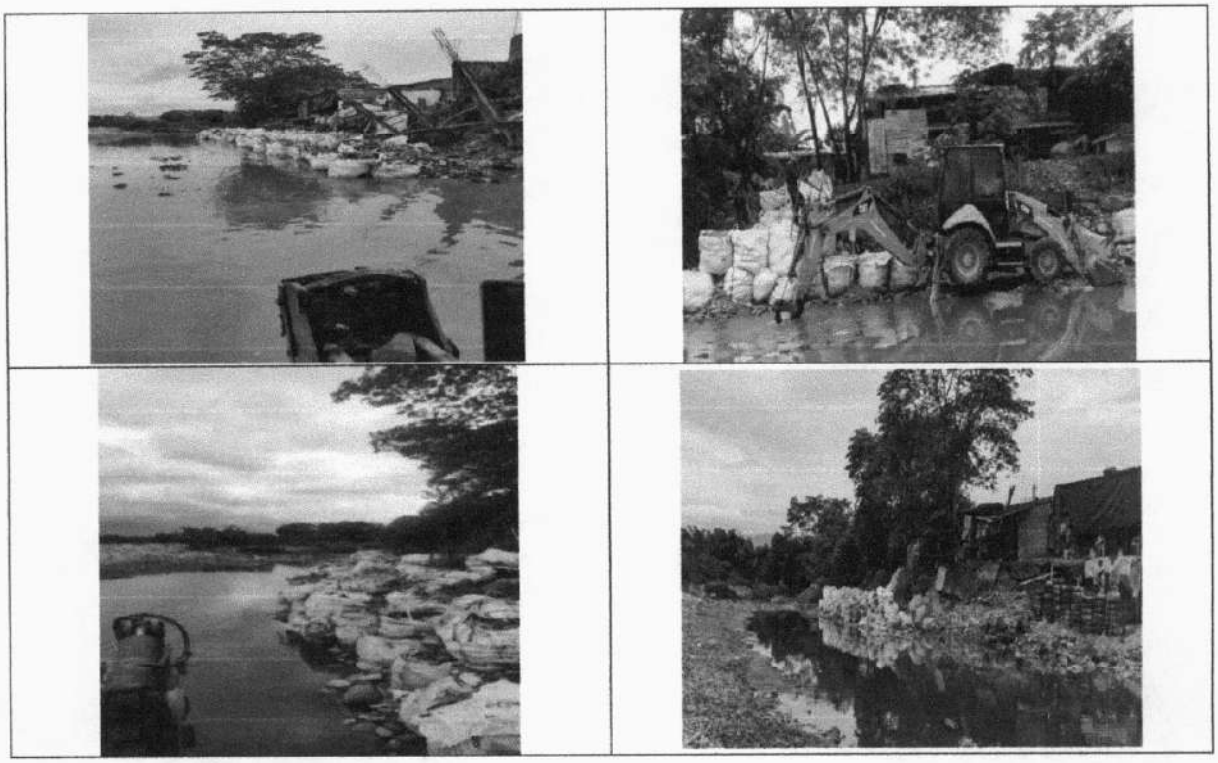
Durante el periodo de supervisión se verificaron las actividades ejecutadas por el contratista en diferentes sectores, destacándose las labores de descolmatación de cauces mediante el retiro de sedimentos y material de arrastre acumulado en los puntos críticos intervenidos. Dicho material fue dispuesto de manera controlada en las márgenes, con el fin de restablecer la sección hidráulica y mejorar la capacidad de conducción del flujo, reduciendo los riesgos de taponamientos y desbordamientos. De manera complementaria, se supervisaron las actividades de suministro, acarreo y conformación de material de préstamo, utilizado en la construcción y reforzamiento de jarillones, orientados a la contención y protección de las márgenes frente a posibles crecientes. Así mismo, se constató la ejecución de trabajos de redistribución de material, perfilado de taludes y adecuación de terrenos, generando las condiciones necesarias para la instalación de estructuras de protección como gaviones y espolones. Adicionalmente, se evidenció el apoyo brindado a la comunidad en la implementación de medidas de mitigación preventiva, a través del llenado de sacos y bolsas de contención con material granular, dispuestos en los sectores más vulnerables para reforzar la protección frente a eventos de socavación y desbordamiento. En conjunto, las actividades supervisadas reflejan una intervención integral orientada a la recuperación y fortalecimiento de la capacidad hidráulica de los cauces, contribuyendo a la protección de la infraestructura y a la seguridad de la población asentada en las áreas de influencia. A continuación, se anexa un registro fotográfico que refleja las actividades desarrolladas en los diferentes sectores intervenidos.

- **Rio Ocoa Sector El Brillante**

Registro fotográfico:

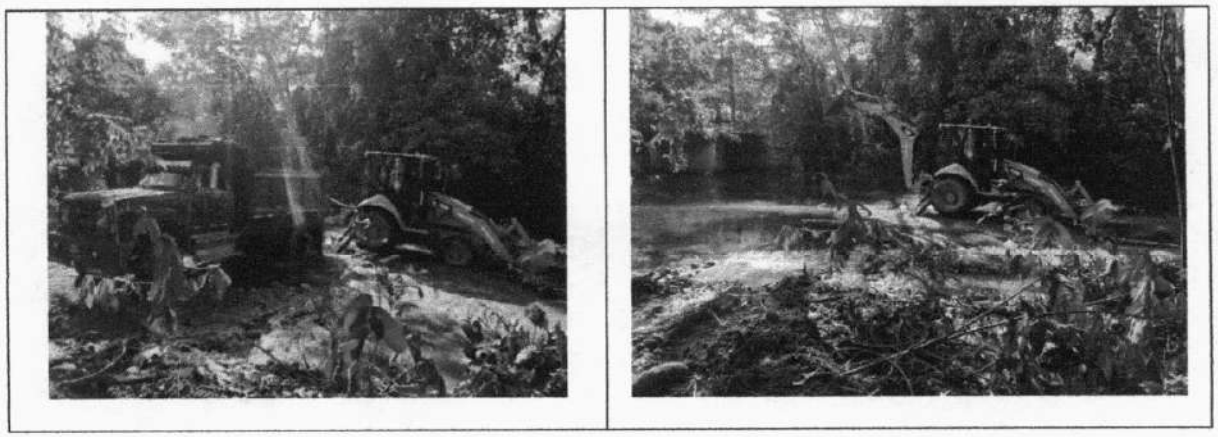






- **La Vigia**

Registro fotográfico:



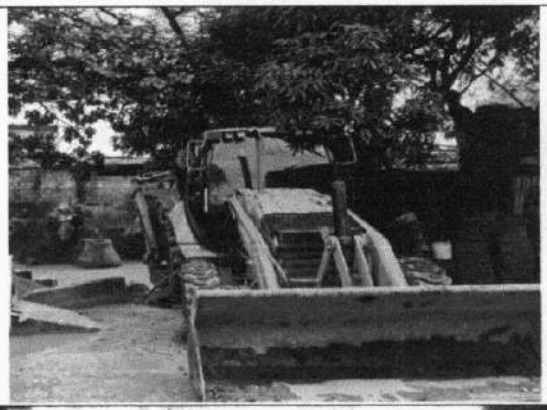


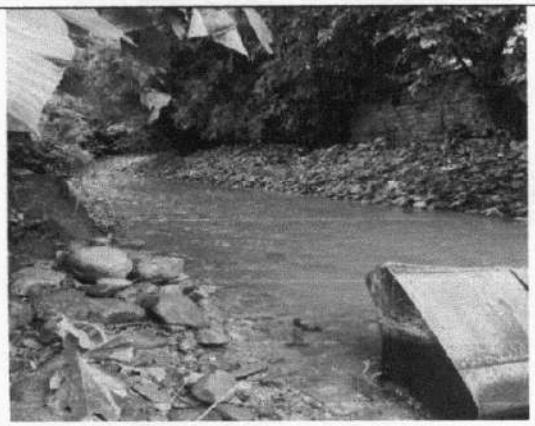


- **Caño Maizaro Sector el dos mil**

Registro fotográfico:















REGISTRO HORAS TRABAJADAS

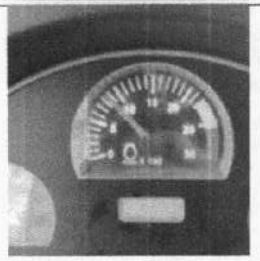
PROYECTO: No 2356 del 4 agosto 2025
EQUIPO: PAJARITA
OPERARIO:

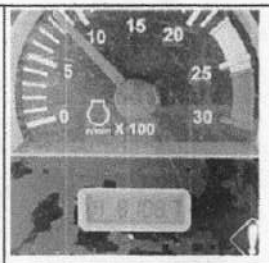



Tipo de lluvia	
	Leve
	Moderadas
	Fuertes

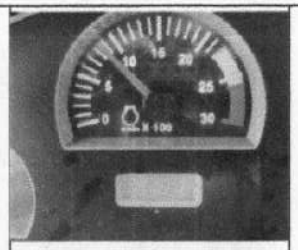

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto	Horometros	Sector Intervenido	Horas Lluvia	Actividades realizadas
15-ago-25	8.007,10	8.011,30	4,20			Buque	0,00	Apoyo al personal del acueducto en el buque
16-ago-25	8.011,30	8.018,60	7,30			VIGIA	0,00	Se realizó el apoyo con material de relleno en el acceso vial de la vereda La Vigía, con el fin de mitigar los efectos ocasionados por la creciente del Río Negro. La intervención consistió en el suministro y compactación de material para recuperar la transitabilidad en el sector afectado
17-ago-25	8.018,60	8.027,60	9,00			VIGIA	0,00	Se realizó el apoyo con material de relleno en el acceso vial de la vereda La Vigía, con el fin de mitigar los efectos ocasionados por la creciente del Río Negro. La intervención consistió en el suministro y compactación de material para recuperar la transitabilidad en el sector afectado

18-ago-25	8.027,60	8.035,10	7,50			VIGIA	0,00	Se realizó el apoyo con material de relleno en el acceso vial de la vereda La Vigía, con el fin de mitigar los efectos ocasionados por la creciente del Río Negro. La intervención consistió en el suministro y compactación de material para recuperar la transitabilidad en el sector afectado
19-ago-25	8.035,10	8.036,10	1,00			VIGIA	8	Se realizó el apoyo con material de relleno en el acceso vial de la vereda La Vigía, con el fin de mitigar los efectos ocasionados por la creciente del Río Negro. La intervención consistió en el suministro y compactación de material para recuperar la transitabilidad en el sector afectado, se paran actividades por las fuertes lluvias en el sector.
20-ago-25	8.036,10	8.042,30	6,20			VIGIA	0,00	Se realizó el apoyo con material de relleno en el acceso vial de la vereda La Vigía, con el fin de mitigar los efectos ocasionados por la creciente del Río Negro. La intervención consistió en el suministro y compactación de material para recuperar la transitabilidad en el sector afectado
21-ago-25	8.042,30	8.047,00	4,70			MAIZARO - COFREM	3	Se hace traslado de la vereda la vigia al sector la vainilla, realizando labores de descolmatación, retirando sedimentos y material de arrastre acumulado en el lecho. El material extraído es dispuesto de manera controlada en ambos márgenes del canal, permitiendo restablecer la sección hidráulica y mejorar la capacidad de conducción del flujo.
22-ago-25	8.047,00	8.051,60	4,60			MAIZARO - COFREM	2	se continua con las labores de descolmatación, retirando sedimentos y material de arrastre acumulado en el lecho. El material extraído es dispuesto de manera controlada en ambos márgenes del canal, permitiendo restablecer la sección hidráulica y mejorar la capacidad de conducción del flujo, se paran actividades por las fuertes lluvias en el sector.

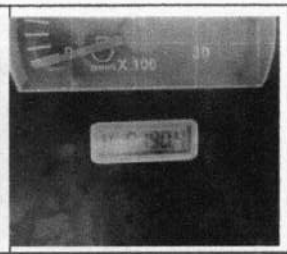

23-ago-25	8.051,60	8.058,90	7,30			MAIZARO - COFREM	0,00	Se realizan labores de descolmatación, retirando sedimentos y material de arrastre acumulado en el lecho. El material extraído es dispuesto de manera controlada en ambos márgenes del canal, permitiendo restablecer la sección hidráulica y mejorar la capacidad de conducción del flujo.
24-ago-25	8.058,90	8.066,60	7,70			MAIZARO - COFREM	0,00	Se realizan labores de descolmatación, retirando sedimentos y material de arrastre acumulado en el lecho. El material extraído es dispuesto de manera controlada en ambos márgenes del canal, permitiendo restablecer la sección hidráulica y mejorar la capacidad de conducción del flujo.
25-ago-25	8.066,60	8.074,70	8,10			MAIZARO - COFREM	0,00	Se realizan labores de descolmatación, retirando sedimentos y material de arrastre acumulado en el lecho. El material extraído es dispuesto de manera controlada en ambos márgenes del canal, permitiendo restablecer la sección hidráulica y mejorar la capacidad de conducción del flujo.
26-ago-25	8.074,70	8.078,70	4,00			EL BRILLANTE	2	se hace traslado del sector la vainilla al brillante, apoyando a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes. Se paran actividades debido a las fuertes lluvias en el sector.
27-ago-25	8.078,70	8.088,60	9,90			EL BRILLANTE	0,00	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes.

28-ago-25	8.088,60	8.089,60	1,00			EL BRILLANTE	0,00	Se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes. Se paran actividades debido a que la maquina se tuvo que reparar.
29-ago-25	8.089,60	8.093,40	3,80			EL BRILLANTE	6	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes, se paran actividades por las fuertes lluvias en el sector.
30-ago-25	8.093,40	8.099,30	5,90			EL BRILLANTE	0,00	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes.
31-ago-25	8.099,30	8.099,80	0,50			EL BRILLANTE	0,00	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes.

1-sep-25	8.099,80	8.108,70	8,90			EL BRILLANTE	0,00	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes.
2-sep-25	8.108,70	8.117,00	8,30			EL BRILLANTE	0,00	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes.
3-sep-25	8.117,00	8.126,40	9,40			EL BRILLANTE	0,00	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes.
4-sep-25	8.126,40	8.133,30	6,90			EL BRILLANTE	0,00	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes.

5-sep-25	8.133,30	8.142,70	9,40			EL BRILLANTE	0,00	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes.
6-sep-25	8.142,70	8.152,00	9,30			EL BRILLANTE	0,00	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes.
7-sep-25	8.152,00	8.157,40	5,40			EL BRILLANTE	0,00	se apoya a la comunidad en las labores de llenado de sacos con material granular, como medida de protección ante posibles afectaciones por crecientes.
8-sep-25	8.157,40	8.166,00	8,60			PUENTE CAIDO	0,00	Apoyo a personal de la oficina de gestion de riesgo con el armado de gaviones y conformacion de terraplen para movilizacion de la misma

9-sep-25	8.166,00	8.174,00	8,00			PUENTE CAIDO	**0,00**	Apoyo a personal de la comunidad con el armado de gaviones y conformacion de terraplen para movilizacion de la misma
10-sep-25	8.174,00	8.174,70	0,70			PUENTE CAIDO	**0,00**	Apoyo a personal de la oficina de gestion de riesgo con el armado de gaviones y conformacion de terraplen para movilizacion de la misma
11-sep-25	8.174,70	8.179,30	4,60			CAÑO TIGRE	**0,00**	Apoyo a personal de la oficina de gestion de riesgo con el armado de gaviones y conformacion de terraplen para movilizacion de la misma
12-sep-25	8.179,30	8.184,50	5,20			JUAN PABLO	**0,00**	Se realizan actividades de nivelacion de rasante y movilizazcion de materia para permitir el acceso vehicular y volquetas

13-sep-25	8.184,50	8.190,40	5,90			JUAN PABLO	0,00	Se realizan actividades de nivelacion de rasante y movilizazcion de materia para permitir el acceso vehicular y volquetas
14-sep-25	8.190,40	8.193,60	3,20			JUAN PABLO	0,00	Se realizan actividades de nivelacion de rasante y movilizazcion de materia para permitir el acceso vehicular y volquetas
15-sep-25	8.193,60	8.201,50	7,90			JUAN PABLO	0,00	Se realizan actividades de nivelacion de rasante y movilizazcion de materia para permitir el acceso vehicular y volquetas
16-sep-25	8.201,50	8.207,10	5,60			JUAN PABLO	0,00	Se realizan actividades de nivelacion de rasante y movilizazcion de materia para permitir el acceso vehicular y volquetas
TOTAL HORAS MAQUINA			200,00					

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**BUENA**
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENA**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENA**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENA**

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Nombre del Afiliado	SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO
No. de Identificación	NIT 901521822 – CC 86061833
Mes de Cotizado	AGOSTO
Fecha de Pago	16/09/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 444.000
Número de Planilla	9491774973
Valor pagado en SALUD	$ 57.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 229.400
Valor pagado en ARL	$ 99.800
Valor pagado en COFREM	$ 57.400

Nombre del Afiliado	MENDOZA PRIETO JOAN MANUEL
No. de Identificación	86078410
Mes de Cotizado	AGOSTO
Fecha de Pago	26/08/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.423.500
Número de Planilla	9490513270
Valor pagado en SALUD	$ 178.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 227.800
Valor pagado en ARL	$ 34.700

Nombre del Afiliado	TORRES AYA MILTON DANILO
No. de Identificación	1121929348

Mes de Cotizado	AGOSTO
Fecha de Pago	05/09/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.423.500
Número de Planilla	9490865283
Valor pagado en SALUD	$ 178.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 227.800
Valor pagado en ARL	$ 7.500

Nombre del Afiliado	YEINER SEBASTIAN ACOSTA GARCIA
No. de Identificación	1121952337
Mes de Cotizado	AGOSTO
Fecha de Pago	10/09/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.423.500
Número de Planilla	89740311
Valor pagado en SALUD	$ 185.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 236.800
Valor pagado en ARL	$ 15.500

Nombre del Afiliado	OSPINA BUITRAGO FREDY RENE
No. de Identificación	1006796988
Mes de Cotizado	AGOSTO
Fecha de Pago	13/08/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.423.500
Número de Planilla	9489918910
Valor pagado en SALUD	$ 178.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 227.800
Valor pagado en ARL	$ 34.700

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución. La información de soporte reposa en los documentos adjuntos del presente informe.

6. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	SI
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	SI
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	SI
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	SI
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	SI
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	SI
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	SI
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	SI

7. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	$0 COP	N/A	N/A	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$544.487.879 COP	N/A	7/07/2025 al 16/09/2025	84%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$105.223.560 COP	N/A	16/09/2025 al 4/10/2025	16%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$649.711.440 COP	N/A	7/07/2025 al 4/10/2025	100%

8. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO N°.1 comprendido entre el 7 de JULIO de 2025 al 16 de SEPTIEMBRE de 2025, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($544.487.879). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ**
CARGO DEL SUPERVISOR: **JEFE DE OFICINA DE GESTION DE RIESGOS**
SECRETARÍA U OFICINA: **GESTION DE RIESGOS**
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: **321 7371942**
