Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-026760 Id: 612012
Folios: 1 Fecha: 15-09-2025 15:42:35
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

# MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual.

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No. 1901 de 2022 periodo de agosto del 2025.

Cordial saludo;

Por medio de la presente remito para su información y archivo en expediente, para fines pertinentes información relacionada con el convenio No. 1901 de 2022 suscrito con el Municipio de Acacias – Meta, así:

1. Informe del Ministerio - Convenio No. 1901 de 2022, del mes de agosto del 2025 en CIENTO DOCE (112) Folios.

Atentamente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio.

Elaboró: Ing. Oscar Javier Cuadros Jiménez / Apoyo técnico a la supervisión SPSCC



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
|---|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**1901-2022** MUNICIPIO DE **ACACIAS-META** |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **AGOSTO DE 2025** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta."* | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | Lote escuela de carabineros – Acacias – Meta | | |
| **BENEFICIARIO:** | Municipio de Acacias - Meta | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 13.986.033.119,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 4.281.955.271,72 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 18.267.988.390,72 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 07/08/2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 24/03/2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 15/12/2025 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | Manuel Antonio Linares | 26/08/2024 | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Norman Eduardo Ortiz Tovar | 20/12/2022 | 19/02/2023 |
| | Manuel Antonio Linares Donato | 20/02/2023 | 28/01/2024 |
| | Julián Felipe Valencia Marín | 29/01/2024 | 17/07/2024 |
| | Edgar Ricardo González Patiño | 18/07/2024 | 29/07/2024 |
| | Angela Jaramillo Gómez | 30/07/2024 | 12/08/2024 |
| | Sergio Sanjuan Santiago | 13/08/2024 | 25/08/2024 |
| | Manuel Antonio Linares | 26/08/2024 | Actual |
| | | | |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Karen Daniela Ramirez M. | 01/02/2023 | 30/06/2023 |
| | Karen Daniela Ramirez M. | 12/07/2023 | 31/12/2023 |
| | Karen Daniela Ramirez M. | 11/01/2024 | 31/12/2024 |
| | Oscar J Cuadros Jimenez | 14/01/2025 | 25/02/2025 |
| | Hugo Mauricio Espinosa | 26/02/2025 | 17/08/2025 |
| | Oscar J Cuadros Jimenez | 18/08/2025 | 30/09/2025 |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR** | 70122 | 4/08/2022 | 31/12/2022 |
| | 31723 | 20/01/2023 | 31/12/2023 |
| | 23324 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | 164522 | 19/12/2022 | 31/12/2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 25323 | 20/01/2023 | 31/12/2023 |
| | 15424 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | N/A | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | 2024000064 | 30/08/2024 | 31/12/2024 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 3000613 | 15/12/2022 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA PRIMERA PRORROGA** | No. 3000613 | 06/06/2024 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 20/12/2022 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: 27/02/2024 |
| | PRIMERA ADICIÓN | | FECHA: 16/08/2024 |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: 25/12/2024 |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: 29/08/2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA SUSPENSIÓN | | FECHA: 31/07/2025 |
| | PRIMER REINICIO | | FECHA: 29/08/2025 |
| | | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: 18/11/2025 | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA** | $ 12.575.546.216,00 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA** | $ 1.410.386.903,00 | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | **N/A** | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | $ 4.281.955.271,72 | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | NO APLICA | 29/12/2022 | $1.100.000.000,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio. | NO APLICA | 30/11/2023 | $6.443.016.560,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos | 60% | 25/02/2025 | $ 5.154.413.247 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | | | |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $12.697.429.807,00 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $8.089.930.207,96 |

**3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora:** **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3000613 | Cumplimiento | $ 1.398.603.312,00 | 07/08/2022 | 27/09/2024 |

**Nombre Aseguradora:** **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3000613 | Cumplimiento | $ 1.398.603.312,00 | 07/08/2022 | 18/11/2025 |

**Nombre Aseguradora:** **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3000613 | Cumplimiento | $ 1.826.798.839,00 | 07/08/2022 | 18/11/2025 |

**4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato**<br><br>**CONTRA TO DE OBRA No 377 de 2023** | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META. | $ 12.575.546.216,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | 25/09/2024 | $ 4.085.588.171,45 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 | R/L. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO C.C 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 27/04/2023 | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | **PRIMERA MODIFICACIÓN**<br>AMPLIAR PLAZO HASTA: 12/11/24 | FECHA: 22/03/2024 |
| | **SEGUNDA MODIFICACIÓN**<br>ADOPCIÓN PRECIOS UNITARIOS | FECHA: 15/07/2024 |
| | **TERCERA MODIFICACIÓN**<br>ADICION VALOR Y AMPLIACIÓN PLAZO HASTA: 12/12/2024 | FECHA: 25/09/2024 |
| | **SUSPENSIÓN N. 1**<br>HASTA: 20/01/2025 | FECHA: 07/12/2024 |
| | **PRORROGA 1 SUSPENSIÓN N. 1**<br>HASTA: 20/03/2025 | FECHA: 20/01/2025 |
| | **PRORROGA 2 SUSPENSIÓN N. 1**<br>HASTA: 20/04/2025 | FECHA: 19/03/2025 |
| | **PRORROGA 3 SUSPENSIÓN N. 1**<br>HASTA: 31/05/2025 | FECHA: 18/04/2025 |
| | **PRORROGA 4 SUSPENSIÓN N. 1**<br>HASTA: 15/07/2025 | FECHA: 30/05/2025 |
| | **REINICIO SUSPENSIÓN N.1**<br>NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN 20/07/2025 | FECHA: 15/07/2025 |
| | **CUARTA MODIFICACIÓN**<br>AMPLIAR PLAZO HASTA: 31/07/25 | FECHA: 15/07/2025 |
| **Fecha de terminación del contrato** | **15/11/2025** | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | $ 16.661.034.387,45 |

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS MUNDIAL** | |
|---|---|---|
| **PÓLIZA No.** | CV-100032073 – ANEXO 7 | |
| **AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA** | CUMPLIMIENTO | DESDE: 08/10/2024 HASTA: 24/09/25 |
| | BUEN MANEJO ANTICIPO | DESDE: 08/10/2024 HASTA: 24/09/25 |
| | PRESTACIONES SOCIALES | DESDE: 08/10/2024 HASTA: 24/03/27 |
| | CALIDAD | DESDE: 13/12/24 HASTA: 24/03/27 |
| | ESTABILIDAD DE LA OBRA | DESDE: 13/12/24 HASTA: 24/03/29 |
| **PÓLIZA No.** | CV-100008254 – ANEXO 7 | |
| **AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | DESDE: 24/03/23 HASTA: 13/12/24 |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato**<br><br>**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTE DEL META | $ 1.410.386.903,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | 22/10/2024 | $ 139.037.589,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 | R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA, identificado C.C. 1.094.921.302 de Armenia. |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 27/04/2023 | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | **PRIMERA MODIFICACIÓN**<br>AMPLIACIÓN PLAZO HASTA: 12/11/24 | FECHA: 22/03/2024 |
| | **SEGUNDA MODIFICACIÓN**<br>ADCIÓN VALOR Y AMPLIACIÓN PLAZO HASTA: 12/11/24 | FECHA: 25/09/2024 |
| | **SUSPENSIÓN N. 1**<br>HASTA: 20/01/25 | FECHA: 07/12/2024 |
| | **PRORROGA 1 SUSPENSIÓN N. 1**<br>HASTA: 20/03/25 | FECHA: 20/01/2025 |
| | **PRORROGA 2 SUSPENSIÓN N. 1**<br>HASTA: 19/03/25 | FECHA: 20/04/2025 |
| | **PRORROGA 3 SUSPENSIÓN N. 1**<br>HASTA: 31/05/2025 | FECHA: 18/04/2025 |
| | **PRORROGA 4 SUSPENSIÓN N. 1**<br>HASTA: 15/07/2025 | FECHA: 30/05/2025 |
| | **REINICIO SUSPENSIÓN N.1**<br>NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN 20/07/2025 | FECHA: 15/07/2025 |
| | **CUARTA MODIFICACIÓN**<br>AMPLIAR PLAZO HASTA: 31/07/25 | FECHA: 15/07/2025 |
| **Fecha de terminación del contrato** | **15/11/2025** | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | $1.549.424.492,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS MUNDIAL** | |
| **PÓLIZA No.** | **CV-100031724- ANEXO 4** | |
| **AMPARO Y FECHA DE LA PÓLIZA** | CUMPLIMIENTO | DESDE: 25/09/24 HASTA 12/06/2025 |
| | PRESTACIONES SOCIALES | DESDE: 25/09/24 HASTA 12/12/2027 |
| | CALIDAD | DESDE: 25/09/24 HASTA 12/06/2025 |

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: JULIO 2025 | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | X (No 63 corte al 31 de Julio de 2025) | |
| INFORME FINANCIERO (julio de 2025) | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA (julio de 2025) | $ 4,359,986,261.31 | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | Instalación de celocia, instalación de esstuco y pintura y finalmente instalación de piso granulado en zona social, entre otras. | |
| OTROS | | X |

**6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **99,00%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **77,28%** |

PERIODO: AGOSTO 2025
PORCENTAJE EJECUCIÓN: 77,28%
FECHA DE INICIO: 27/04/2022 (contratos derivados)
VIGENCIA: 15/11/2025 (contratos derivados)

**Componente Técnico.**

Durante el presente periodo de agosto de 2025, el Municipio se encuentra llevando a cabo la verificación al balance del proyecto a fin de que se subsanen los motivos que originaron la suspensión No 01 del convenio, por lo tanto, la obra se encuentra suspendida sin embargo esta misma ya cuenta con un avance del 77,28% de ejecución de obra, una vez se cuente con la subsanación de la verificación al mismo se dará reinicio al convenio y por lo tanto lograr cumplir con el objeto contractual del convenio.

**Componente Administrativo**.

Durante el periodo de agosto de 2025 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del convenio 1901 de 2022.

- Los días 05 y 06 de agosto de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior llevó a cabo visita técnica al Municipio de Acacías, con el propósito de evaluar el estado contractual de los contratos derivados, el avance físico de obra y las condiciones generales del proyecto. Como resultado de dicha visita, la supervisión del Ministerio y del Municipio acordaron que no procede la presunción de adición al proyecto. En consecuencia, se solicitó remitir el alcance actualizado al objeto contractual de los contratos derivados, lo cual quedará anexado al presente informe.

- El 17 de agosto de 2025, el Municipio de Acacías remitió por correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior la comunicación titulada: "SOLICITUD DE PRÓRROGA N.° 3 Y REINICIO AL CONVENIO 1901 DE 2022", adjuntando los documentos requeridos para tramitar el reinicio del convenio y la tercera prórroga, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

- El 19 de agosto de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior envió al Municipio de Acacías un correo electrónico con el asunto: "Cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio No. 1901 de 2022", en el cual se reiteró la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo de condiciones del convenio, haciendo especial énfasis en los numerales 32, 33, 36 y 52 de la cláusula segunda.

- El 19 de agosto de 2025 el Municipio de Acacias remitió por medio de correo electrónico a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, dentro del mismo se remite el informe mensual de supervisión del mes de julio de 2025 por parte del Municipio, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio.

- El 19 de agosto de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior envió al Municipio de Acacías el acta de reanudación del convenio, bajo el asunto: "Remisión de acta de reanudación al convenio 1901 de 2022. Municipio de Acacías - Meta", solicitando su firma y posterior trámite ante la Subdirección de Gestión Contractual.

- El 25 de agosto de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior comunicó al Municipio de Acacías la devolución de la solicitud de prórroga, mediante correo electrónico titulado: "Devolución de solicitud de prórroga al convenio 1901 de 2022". La devolución se fundamentó en la ausencia de documentos de bitácora y justificación técnica, por lo que se solicitó su entrega urgente para continuar con el trámite.

- En respuesta, el mismo 25 de agosto de 2025, la supervisión del Municipio de Acacías remitió correo electrónico subsanando las observaciones realizadas por el Ministerio del Interior, lo que permitió dar continuidad al trámite en curso.

- El 26 de agosto de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior solicitó formalmente al Municipio de Acacías la remisión del acta de reinicio del convenio, mediante correo electrónico con el asunto: "*Solicitud remisión acta de reanudación convenio 1901-22*", con el fin de radicarla ante la Subdirección de Gestión Contractual.

- En la misma fecha, el Municipio de Acacías comunicó a la supervisión del Ministerio del Interior la necesidad de ajustar la fecha de suspensión consignada en el acta de reinicio, para proceder con la firma por parte del señor alcalde..

- Posteriormente, la supervisión del Ministerio del Interior dio respuesta al Municipio de Acacías, subsanando la observación formulada, y habilitando la continuidad del trámite de reinicio.

- Finalmente, el 26 de agosto de 2025, la supervisión del Municipio de Acacías remitió el acta de reinicio debidamente firmada por el señor alcalde, con el fin de que sea radicada ante la Subdirección de Gestión Contractual.

**Componente Financiero.**

- En el numeral 2 se observa los dos desembolsos realizados al convenio No. 1901 de 2022, lo que corresponde a un total desembolsado de: $ 7.543.016.560,00 y legalizado de $7.059.525.895,96.

- El 20 de diciembre de 2024 la supervisión por parte del Ministerio del Interior radicó la solicitud de tercer desembolso a la coordinación financiera y contable, pero a la fecha no se ha hecho efectivo el giro en la cuenta del convenio No. 1901 de 2022.

Teniendo en cuenta el seguimiento y control ejercido por esta supervisión y en atención al Manual de contratación en especial el numeral ***5.10.7.1. Funciones Relacionadas con el Objeto y las Obligaciones Contractuales: Literal 3 Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del Contratista;*** y el numeral ***5.10.7.2. Funciones de Supervisión Relacionadas con Aspectos Presupuestales del Contrato o Convenio: Literal 6 Solicitar las vigencias futuras, o la constitución de reservas presupuestales o cuentas por pagar, cuando a ello haya lugar. se evidenció la necesidad de realizar reprogramación***

***de los recursos de la vigencia 2024*** del convenio en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.7.1.1, para lo cual se describe la siguiente trazabilidad:

- El 26 de septiembre de 2024, se consolido por parte de la Subdirección del Proyectos el documento denominado "*Justificación Técnico-Económica y Legal Trámite Aval Fiscal y/o Vigencias Futuras*" con el fin de ser presentado ante la oficina asesora de planeación como requisito necesario para el trámite ante Ministerio de Hacienda.

- El 01 Octubre de 2024, mediante el sistema de Gestión Documental del Ministerio del Interior Radicado 2024-3-003122-029014 Id: 416625, la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana radicó ante la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Interior memorando con asunto: "Solicitud Reprogramación Vigencias Futuras Convenios en Ejecución – PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES" en el cual se realiza la solicitud formal junto con los documentos soporte para iniciar el trámite de reprogramación de 18 convenios correspondientes al proyectos de inversión, incluido el convenio 1901 de 2022 suscrito con el Municipio de Acacias – Meta.

- El ocho (08) de noviembre de 2024, se desarrolló "Mesa técnica Reprogramación Vigencias futuras proyecto de inversión BPIN 2022011000002", contando con la asistencia del DNP, OAP del Ministerio del Interior y la Subdirección de Proyectos, teniendo en cuenta que previamente esta última radicó ante la OAP del Ministerio, la solicitud de trámite de reprogramación de 18 convenios en ejecución por valor de $35.335.736.056, de fecha 01 de octubre de 2024, bajo el ID 416625, durante el desarrollo del comité el DNP manifestó lo siguiente: *"el recurso que se programa para la vigencia es un recurso que el Ministerio debe ejecutar, es decir, se debe cumplir con la anualidad del presupuesto, pues esos recursos se pierden por una no ejecución y no se pueden reprogramar para la siguiente vigencia",* aunado a ello, por parte del Ministerio del Interior se indicó lo siguiente: *"que no fue una mala planeación del proyecto, el proyecto desde el principio estuvo muy bien estructurado y blindado con todos los análisis técnicos y jurídicos que realizó la subdirección y avalados por DNP, pero surgió un tema coyuntural por cambio de administración, que generó el retraso en las obras dado que el inicio de los convenios se retrasó, iniciando su ejecución casi cuatro meses después, es decir en diciembre de 2022*."

Pese a que el Municipio de Acacias adelantó actividades en obra no cumplió con la ejecución del porcentaje como requisito para ejecutar el último desembolso.

- De igual manera se presenta el estado financiero del Convenio y sus contratos derivados, documento solicitado por la Contraloría General de la República en el marco de la mesa de seguimiento a la función de advertencia el 29 de julio de 2024:

| ESTADO FINANCIERO<br>CONVENIO No. 1901 DE 2022 - MUNICIPIO DE ACACIAS - META | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE ACACIAS - META Y MINISTERIO DEL INTERIOR<br>No. CUENTA: 647-00178-3 / BANCO DE OCCIDENTE | | | | | | |
| RECURSOS APORTADOS | | | | | | |
| VALOR CONVENIO | | $ 18.267.988.390,72 | APORTES MINISTERIO | | $ 13.986.033.119,00 | |
| | | | APORTES MUNICIPIO | | $ 0,00 | |
| | | | ADICIÓN MUNICIPIO | | $ 4.281.955.271,72 | |
| **DESEMBOLSOS** | **CONCEPTO** | **No. ORDEN DE PAGO** | **FECHA DE PAGO** | **APORTANTE** | **VALOR** | **TOTAL** |
| DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO | | | | | | |
| Primer desembolso | A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.<br>B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del | 458829322 | 29/12/2022 | Ministerio del Interior | $ 1.100.000.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | supervisor del municipio. | | | | |
| Segundo desembolso | A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio. | 422086923 | 30/11/2023 | Ministerio del Interior | $ 5.139.212.638 |
| | | 422102823 | 1/12/2023 | Ministerio del Interior | $ 1.303.803.922 |
| Tercer desembolso | A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 42898625 | 25/02/2025 | Ministerio del Interior | $ 773.161.987 |
| | | 42913625 | 25/02/2025 | Ministerio del Interior | $ 4.381.251.260 |
| **TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS** | | | | | **$ 12.697.429.807,00** |
| | | | | | |
| **DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO** | | | | | |
| Primer desembolso | Adición | | 30/08/2024 | Municipio | $ 4.281.955.272 |
| | | | | | |
| **TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS** | | | | | **$ 4.281.955.271,72** |
| | | | | | |
| **TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO** | | | | | **$ 16.979.385.078,72** |
| | | | | | |
| **PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS** | | | | | |
| **VALOR CONTRATADO** | | | | | |

| CONTRATO No. | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR CONTRATADO | VALOR ADICIÓN | VALOR TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| 377 de 2023 | CONSORCIO POLICIA - ACACIAS 2023 (EYD,OBRA) | $ 12.575.546.216,00 | $ 4.085.588.171,45 | $ 16.661.134.387,45 |
| 374 de 2023 | CONSORCIO INTERPOLICIA (INTERVENTORIA EYD,OBRA) | $ 1.410.386.903,00 | $ 139.037.589,00 | $ 1.549.424.492,00 |
| | | | TOTAL | $ 18.210.558.879,45 |

| PAGOS | CONCEPTO | No. ORDEN DE PAGO | No.COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACIÓN DE RECURSOS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA | | | | | | | |
| Primer pago | Pago parcial No.1 (EYD) | 2023002518 | 2023002731 | 6/09/2023 | Ministerio del Interior | $ 662.923.252,00 | |
| Segundo pago | Pago parcial No.2 Contrato de Obra | 2023004139 | 2023004536 | 22/12/2023 | Ministerio del Interior | $ 4.765.049.185,60 | |
| Tercer pago | Pago parcial No. 3 Contrato de Obra | 2024000075 | 2024000075 | 23/07/2024 | Ministerio del Interior | $ 1.233.740.507,36 | |
| Cuarto pago | Pago parcial No. 4 Contrato de Obra | 202400102 | 202400098 | 27/07/2024 | Municipio de Acacias | $ 2.809.961.478,54 | |
| Quinto pago | Pago parcial No. 5 contrato de obra | 2024000109 | 2024000105 | 6/12/2024 | Municipio de Acacias | $ 120.646.774,40 | |
| Sexto pago | Pago parcial No. 6 contrato de obra | 2024000110 | 2024000106 | 6/12/2024 | Municipio de Acacias | $ 1.233.273.940,00 | |
| Septimo pago | Pago parcial No. 7 contrato de obra | 2025000036 | 2025000036 | 4/04/2025 | Municipio de Acacias | $ 42.352.728,88 | |
| Octavo pago | Pago parcial No. 8 contrato de obra | 2025000035 | 2025000037 | 4/04/2025 | Ministerio del Interior | $ 629.350.356,54 | |
| TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA | | | | | | $ 11.497.298.223,32 | 69,01% |
| PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA | | | | | | | |
| Primer pago | Pago parcial No.1 (Interventoría EYD) | 2023002657 | 2023002882 | 13/09/2023 | Ministerio del Interior | $ 397.813.951 | |
| Segundo pago | Pago parcial No. 2 Contrato de Interventoria | 2024000087 | 2024000083 | 6/08/2024 | Ministerio del Interior | $ 174.770.091 | |
| Tercer pago | Pago parcial No. 3 Contrato de Interventoria | 2024000105 | 2024000102 | 15/11/2024 | Municipio de Acacias | $ 188.072.798,64 | |
| Cuarto pago | Pago parcial No. 4 Contrato de Interventoria | 2024000106 | 2024000101 | 15/11/2024 | Municipio de Acacias | $ 138.887.007,36 | |
| Quinto pago | Pago parcial No. 5 Contrato de Interventoria | 2025000041 | 2025000039 | 10/04/2025 | Ministerio del Interior | $ 226.282.864,36 | |
| Sexto pago | Pago parcial No. 6 Contrato de Interventoria | 2025000042 | 2025000040 | 10/04/2025 | Municipio de Acacias | $ 150.581,64 | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA | $ 1.125.977.294,00 | 72,67% |
| TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS | $ | 12.623.275.517,32 |
| TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A AGOSTO 2025 | $ | 4.356.109.561,40 |
| SALDO EN LA CUENTA A JULIO 2025 | $ | 4.359.986.261,31 |

NOTA:
- Ultimo extracto de JULIO 30 de 2025.
- Informe financiero del Municipio JULIO de 2025.

**Componente Jurídico.**

- El 25 de diciembre de 2024 se suscribió la segunda prórroga al convenio No. 1901 de 2022, cambiando la vigencia hasta el 31 de julio de 2025.
- El 31 de julio de 2025, se suscribió la primera suspensión al convenio No. 1901 de 2022, teniendo como fecha de reinicio el 30 de agosto de 2025 y fecha de finalización el 30 de agosto de 2025.
- El 29 de agosto de 2025, se suscribe la tercera prorroga al convenio No. 1901 de 2022, ampliando el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de diciembre de 2025.

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

Durante el mes de agosto de 2025, el Municipio de Acacías llevó a cabo reuniones internas con el propósito de subsanar los motivos que originaron la Suspensión No. 01 del convenio interadministrativo. Una vez surtidos los trámites correspondientes, y con el fin de permitir la visita técnica por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, se procedió al reinicio del convenio el día 29 de agosto de 2025.

De igual manera, se adelantó el trámite correspondiente a la tercera prórroga del convenio, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el día 15 de diciembre de 2025.

Por otro lado, la supervisión del Ministerio del Interior no ha podido realizar una gestión adecuada, ya que no se contaba con el personal necesario para garantizar el control y seguimiento oportuno al convenio.

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | 08/02/2024 | 05/03/2024 | 21/03/2024 | 02/04/2024 | 22/04/2024 |
| 04/06/2024 | 16/10/2024/<br>17/10/2024/<br>18/10/2024 | 14/11/2024<br>15/11/2024 | 05/08/2025<br>06/08/2025 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**<br>Supervisor Convenio No. 1901-22 FONSECON | **OSCAR JAVIER CUADROS JIMENEZ**<br>ELABORÓ - APOYO A LA SUPERVISIÓN |

Outlook

## SOLICITUD DE PRORROGA N 3 Y REINICIO AL CONVENIO 1901 DE 2022

**Desde** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
**Fecha** Dom 17/08/2025 12:10
**Para** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>; Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Cordial saludo

Por medio de la presente de manera muy respetuosa me permito remitir la solicitud de prórroga N3 y reinicio del convenio 1901 de 2022 cuyo objeto corresponde a "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseños y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias Departamento de Meta*". La documentación se encuentra a través del siguiente enlace de google drive https://drive.google.com/drive/folders/1cxSu_UD22lG2wYQzHTCdff5vgdeLo78m?usp=drive_link
Los correos se encuentran autorizados como editor para el acceso de la información.
Sin embargo de ser necesario el cargue de dicha documentación en otra plataforma para su trámite quedamos atentos para realizarlo.
--

Un cordial saludo,

**Iván Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Despacho
**Secretaría de Infraestructura**
**Email:** infraestructura@acacias.gov.co
**Línea PBX:** 3203509652
**Ext:** 4101
**Nit:** 892001457-3
**Dirección:** Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
**Código postal:** 507001
**www.acacias.gov.co**

**AVISO LEGAL:**Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Outlook

## Remisión de acta de reanudación al convenio 1901 de 2022. Municipio de Acacias - Meta.

**Desde** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininterior.gov.co>
**Fecha** Mar 19/08/2025 10:42
**Para** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>; Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>
**CC** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (3 MB)
ACTA DE REANUDACION 1901-22.pdf;

Bogotá D.C 19-Ago-2025

Doctor
**CARLOS JULIO PLATA BECERRA**
Alcalde.
Municipio de Acacias.
Departamento de Meta.

Ingeniero.
**IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
Supervisor.
Municipio de Acacias.
Departamento de Meta

Asunto: Remisión de acta de reanudación al convenio 1901 de 2022. Municipio de Acacias - Meta.

Cordial saludo Señor. Pantoja;

Por medio del presente y obrando en calidad de apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior para el convenio 1901 de 2022, cuyo objeto es "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META.*", Remito para su conocimiento el documento por parte de la entidad, a fin de iniciar el proceso de reinicio al convenio en mención.

Agradecemos de manera muy atenta se haga entrega del mismo en un plazo no mayor a 3 días calendario, con el fin de ser tramitado ante la subdirección de gestión contractual.

Cordialmente;

**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**
**Oscar Javier Cuadros Jiménez**
oscar.cuadros@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

## Cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio No. 1901 del 2022.

**Desde** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininterior.gov.co>
**Fecha** Mar 19/08/2025 15:03
**Para** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>

Bogotá D.C 19-Ago-2025

Doctor
**CARLOS JULIO PLATA BECERRA**
Alcalde.
Municipio de Acacias.
Departamento de Meta.

Ingeniero.
**IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
Supervisor.
Municipio de Acacias.
Departamento de Meta.

**Asunto:** Cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio No. 1901 del 2022.

Cordial saludo Sr. Plata;

En el marco del convenio interadministrativo No 1901 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Acacias - Meta, me permito solicitar el cumplimiento las obligaciones contenidas en el anexo de condiciones del convenio del asunto, así:

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** En virtud del presente convenio, **EL MUNICIPIO** tiene las siguientes obligaciones:

"(...) *32. Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre las cuentas aperturadas para el presente convenio de las que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.* (...)"." (...) *52. Remitir mensualmente los extractos de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.* (...) "

- A la fecha el Municipio de Acacias - Meta. No está dando cumplimento de esta obligación de acuerdo a que aún no se ha remitido el informe financiero y extracto bancario del mes de Julio de 2025.

"(...) *33. Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.* (...)" . " (...) *36. Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado,*

*adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.* (...)"

- A la fecha el Municipio de Acacias - Meta. No está dando cumplimento de esta obligación toda vez que aún no se hace a dado entrega a esta supervisión el informe de supervisión mensual del mes de julio del 2025.

De acuerdo con lo anterior el Municipio de Acacias no está dando cumplimiento a las obligaciones del convenio, por lo cual se requiere dar cumplimiento a las mismas en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de recibida la presente comunicación.

Cordialmente;

Interior

**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**
**Oscar Javier Cuadros Jiménez**
oscar.cuadros@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

# Re: Cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio No. 1901 del 2022.

**Desde** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
**Fecha** Mar 19/08/2025 16:56
**Para** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

4 archivos adjuntos (1 MB)

Informe mensual supervision JULIO 2025.pdf; Extracto - 2025-08-08T100522.979.pdf; INFORME.pdf; CERTIFICACION CTA MININTERIOR (14).pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito dar contestación a la solicitud con la evidencia de que se había remitido al anterior apoyo a la supervisión del ministerio del interior el ingeniero Hugo Espinosa dando cumplimiento a las obligaciones pactadas, sin embargo en aras de no generar traumatismos con la información y contribuir con el empalme de la designación del nuevo apoyo por parte del ministerio del interior el ingeniero Oscar Cuadros se anexaron los documentos adjuntos a la presente para su revisión y trámite pertinente.


Informe mensual de julio de 2025 convenio 1901 de 2022

Resumir este correo

**Infraestructura Alcaldía de Acacías** <infraestructura@acacias.gov.co>
para Hugo, Manuel, bcc: jevb.civil

cordial saludo,

por medio de la presente de manera muy respetuosa me permito remitir informe mensual del mes de julio de 2025 referente al convenio interadministrativo 1901 de 2022, adjunto informe financiero y anexos.

Un cordial saludo,

ALCALDÍA DE ACACÍAS

**Iván Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Despacho
**Secretaría de Infraestructura**
**Email:** infraestructura@acacias.gov.co
**Línea PBX:** 3203509652
**Ext:** 4101
**Nit:** 892001457-3
**Dirección:** Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
**Código postal:** 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información del contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

**4 archivos adjuntos** · Analizado por Gmail

Informe mensual ... Extracto - 2025-0... CERTIFICACION ... INFORME.pdf

Outlook

## Devolución de solicitud de prorroga al convenio 1901 de 2022.

**Desde** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininterior.gov.co>
**Fecha** Lun 25/08/2025 8:37
**Para** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
**CC** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C 25-Ago-2025

Doctor
**CARLOS JULIO PLATA BECERRA**
Alcalde.
Municipio de Acacias.
Departamento de Meta.

Ingeniero.
**IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
Supervisor.
Municipio de Acacias.
Departamento de Meta

Asunto: Devolución de solicitud de prorroga al convenio 1901 de 2022.

Cordial saludo Señor. Becerra;

Por medio de presente y obrando en calidad de apoyo a la supervisión del convenio 1901 de 2022, designado por la supervisión del Ministerio del interior, me permito hacer la devolución de la solicitud de prorroga No 03 al convenio, motivado por las observaciones de la coordinación de la subdirección, bajo los siguientes motivos:

- De acuerdo con la justificación de la supervisión del Ministerio del Interior en la página 19 *"Viabilidad Técnica. De acuerdo con los documentos presentados por el Municipio de Acacías, se han identificado dificultades en el desarrollo de las obras debido a factores externos, tales como condiciones climatológicas adversas y afectaciones en el transporte de insumos necesarios para la construcción del proyecto",* sin embargo, estas circunstancias no se relacionan en la comunicación de la alcaldía municipal, solo en la de la interventoría, y, en todo caso, no se aportan elementos como la bitácora de obra, que permitan identificar y cuantificar los días de retraso por cuenta de malas condiciones climáticas.

- Ahora bien, frente a las dificultades de orden público, la interventoría refiere: *"Adicionalmente, se presentaron desde el pasado 15 de julio del 2025 situaciones de orden público; afectando el reinicio adecuado para el transporte de materiales necesarios para adelantar las actividades de obra pendientes por ejecutar, sobreviniendo cierres totales en la vía que comunica al llano con la ciudad capital Bogotá, de donde provienen la mayoría de los proveedores relacionados con este proyecto";* más adelante indican: *"El paro comenzó el 14 de julio de 2025, convocado por agricultores del Meta y otras regiones en demanda del cumplimiento de compromisos gubernamentales previos y un precio justo para el arroz paddy verde".* No obstante, es claro que las obras tuvieron que suspenderse a partir de la suspensión No. 1 del convenio suscrita el 31 de julio de 2025, por lo cual a lo sumo dicha situación tuvo una afectación directa de 15 días en la ejecución de obra.

De acuerdo con lo anterior, esta supervisión del Ministerio del Interior, solicita de manera urgente la atención de dichas observaciones, de lo contrario el convenio se reactivara el día 30 de agosto de 2025 y como es sabido por la entidad territorial tiene fecha de vencimiento el mismo día.

Agradezco su pronto respuesta.

Cordialmente;




**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**
**Oscar Javier Cuadros Jiménez**
oscar.cuadros@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

## Re: Devolución de solicitud de prorroga al convenio 1901 de 2022.

**Desde** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
**Fecha** Lun 25/08/2025 14:42
**Para** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

2 archivos adjuntos (16 MB)
OFICIO-08262025042741.pdf; Bitácora 15-31julio.pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente de manera muy respetuosa me permito remitir la subsanación de las observaciones con sus respectivos anexos, para su conocimiento y fines pertinentes.Se anexa bitacora de los dias ejecutados en el mes de julio, mayo y junio los contratos derivados se encontraban en suspensión.

El lun, 25 ago 2025 a las 8:37, Oscar Javier Cuadros Jimenez (<oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>) escribió:

> Bogotá D.C 25-Ago-2025
>
> Doctor
> **CARLOS JULIO PLATA BECERRA**
> Alcalde.
> Municipio de Acacias.
> Departamento de Meta.
>
> Ingeniero.
> **IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
> Supervisor.
> Municipio de Acacias.
> Departamento de Meta
>
> Asunto: Devolución de solicitud de prorroga al convenio 1901 de 2022.
>
> Cordial saludo Señor. Becerra;
>
> Por medio de presente y obrando en calidad de apoyo a la supervisión del convenio 1901 de 2022, designado por la supervisión del Ministerio del interior, me permito hacer la devolución de la solicitud de prorroga No 03 al convenio, motivado por las observaciones de la coordinación de la subdirección, bajo los siguientes motivos:
>
> - De acuerdo con la justificación de la supervisión del Ministerio del Interior en la página 19 *"Viabilidad Técnica. De acuerdo con los documentos presentados por el Municipio de Acacías, se han identificado dificultades en el desarrollo de las obras debido a factores externos, tales como condiciones climatológicas adversas y afectaciones en el transporte de insumos necesarios para la construcción del proyecto",* sin embargo, estas circunstancias no se relacionan en la comunicación de la alcaldía municipal, solo en la de la interventoría, y, en todo caso, no se aportan elementos como la bitácora de

Outlook

## Solicitud remisión acta de reanudación convenio 1901-22

**Desde** Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**Fecha** Mar 26/08/2025 9:58
**Para** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>; CONTACTENOS <contactenos@acacias.gov.co>
**CC** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Astrid Carolina Moreno Limas <astrid.moreno@mininterior.gov.co>; CONTACTENOS <contactenos@previsora.gov.co>

1 archivo adjunto (777 KB)
00. POLIZA 3000613.pdf;

Coronel (r)
CARLOS JULIO PLATA BECERRA
Alcalde.
Municipio de Acacias.
Departamento de Meta.

Ingeniero.
IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Supervisor.
Municipio de Acacias.
Departamento de Meta

Asunto: Remisión de acta de reanudación al convenio 1901 de 2022. Municipio de Acacias - Meta.

Cordial saludo Señor Alcalde.

Con suma preocupación observamos que no ha sido remitida el acta de reanudación del Convenio No. 1901-22, la cual fue enviada a ustedes desde el pasado 19 de agosto de 2025. Esta acta constituye una actuación administrativa previa e indispensable, requerida para poder adelantar cualquier trámite de novedad contractual que el municipio considere presentar y suscribir.

En atención a lo anterior, se insta al municipio para que, de manera inmediata, allegue el documento citado. En caso de no contar con dicho documento en el menor tiempo posible, se procederá con la devolución de su solicitud de prórroga, lo que conllevaría al vencimiento del plazo del convenio. Como consecuencia, el municipio podría incurrir en un presunto incumplimiento de sus obligaciones, poniendo en riesgo los recursos aportados por las entidades al proyecto objeto del Convenio No. 1901-22, sin perjuicio de advertir un posible detrimento al patrimonio público y a los objetivos en materia de seguridad y convivencia que se buscaban con su ejecución

Gracias.




Profesional Especializado
**Manuel Antonio Linares Donato**
Manuel.Linares@mininterior.gov.co
Teléfono: 6012427400
Carrera 8 No 7 – 39
www.mininterior.gov.co

Outlook

## Re: Remisión de acta de reanudación al convenio 1901 de 2022. Municipio de Acacias - Meta.

**Desde** Contratación Alcaldía de Acacías <contratacion@acacias.gov.co>
**Fecha** Mar 26/08/2025 10:16
**Para** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**CC** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>; Jorge Moya Asesor Contratacion 1 <asesor1.contratacion@acacias.gov.co>; ana maria medina vanegas <ana.medinamv@gmail.com>; Pedro Andres Lasso Asesor Tecnico Contratacion <asesortecnico.contratacion@acacias.gov.co>

1 archivo adjunto (3 MB)
ACTA DE REANUDACION 1901-22.pdf;

Cordial saludo,

Frente a el acta remitida se tienen las siguientes observaciones.

1. La fecha de suscripción del acta de suspensión No. 1, corresponde al **31 de julio de 2025** y no al 30 de agosto, como lo indica el documento.

1. El día 30 de agosto de 2025 se suscribió el acta de suspensión No. 01 para el convenio No. 1901 de 2022, cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META."*, la cual fue motivada por el Municipio de Acacias manifestando lo siguiente:

Cordialmente,

**FRANKI A GÓMEZ S**
Jefe de Oficina
**Oficina de Contratación**
**Línea PBX:** 3203509652
**Nit:** 892001457-3
**Dirección:** Calle 14 No. 21 - 32 Barrio Cooperativo, Acacías (Meta)
**Código postal:** 507001
www.acacias.gov.co

**AVISO LEGAL:**Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o

Outlook

## RE: Remisión de acta de reanudación al convenio 1901 de 2022. Municipio de Acacias - Meta.

**Desde** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininterior.gov.co>
**Fecha** Mar 26/08/2025 10:21
**Para** Contratación Alcaldía de Acacías <contratacion@acacias.gov.co>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**CC** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>; Jorge Moya Asesor Contratacion 1 <asesor1.contratacion@acacias.gov.co>; ana maria medina vanegas <ana.medinamv@gmail.com>; Pedro Andres Lasso Asesor Tecnico Contratacion <asesortecnico.contratacion@acacias.gov.co>

1 archivo adjunto (3 MB)
ACTA DE REANUDACION 1901-22.pdf;

Buen día.

En atención a las observaciones que allega el Municipio de Acacias, se atiende lo requerido y se ajusta con las fechas consagradas en el secop II del convenio.

Quedo atento a cualquier comentario.

Cordialmente;

Interior

**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**
**Oscar Javier Cuadros Jiménez**
oscar.cuadros@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

---

**De:** Contratación Alcaldía de Acacías <contratacion@acacias.gov.co>
**Enviado:** martes, 26 de agosto de 2025 10:14
**Para:** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
**Cc:** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>; Jorge Moya Asesor Contratacion 1 <asesor1.contratacion@acacias.gov.co>; ana maria medina vanegas <ana.medinamv@gmail.com>; Pedro Andres Lasso Asesor Tecnico Contratacion <asesortecnico.contratacion@acacias.gov.co>
**Asunto:** Re: Remisión de acta de reanudación al convenio 1901 de 2022. Municipio de Acacias - Meta.

Cordial saludo,

Frente a el acta remitida se tienen las siguientes observaciones.

Outlook

# Re: Remisión de acta de reanudación al convenio 1901 de 2022. Municipio de Acacias - Meta.

**Desde** Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>
**Fecha** Mar 26/08/2025 11:17
**Para** Oscar Javier Cuadros Jimenez <oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (6 MB)
MINISTERIO INTERIOR-08272025045151.pdf;

Acacías 26 de agosto de 2025.

Ingeniero, Oscar Cuadros.

Por medio del presente correo, me permito allegar acta de reanudación del convenio 1901 de 2022, cuyo objeto es "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DEL META, para su conocimiento trámites pertinentes*

*Cordialmente, .*

El mar, 19 ago 2025 a las 10:42, Oscar Javier Cuadros Jimenez (<oscar.cuadros@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>) escribió:

> Bogotá D.C 19-Ago-2025
>
> Doctor
> **CARLOS JULIO PLATA BECERRA**
> Alcalde.
> Municipio de Acacias.
> Departamento de Meta.
>
> Ingeniero.
> **IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
> Supervisor.
> Municipio de Acacias.
> Departamento de Meta
>
> Asunto: Remisión de acta de reanudación al convenio 1901 de 2022. Municipio de Acacias - Meta.
>
> Cordial saludo Señor. Pantoja;
>
> Por medio del presente y obrando en calidad de apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior para el convenio 1901 de 2022, cuyo objeto es "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META.*", Remito para su conocimiento el documento por parte de la entidad, a fin de iniciar el proceso de reinicio al convenio en mención.

Agradecemos de manera muy atenta se haga entrega del mismo en un plazo no mayor a 3 días calendario, con el fin de ser tramitado ante la subdirección de gestión contractual.

Cordialmente;

**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**
**Oscar Javier Cuadros Jiménez**
oscar.cuadros@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

--

Un cordial saludo,

**Iván Mauricio Rojas Novoa**
Secretario de Despacho
**Secretaría de Infraestructura**
**Email:** infraestructura@acacias.gov.co
**Línea PBX:** 3203509652
**Ext:** 4101
**Nit:** 892001457-3
**Dirección:** Carrera 16 # 12 - 10 Barrio Centro
**Código postal:** 507001
**www.acacias.gov.co**

**AVISO LEGAL:**Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta.Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | **ACACIAS - META** | **No. CONVENIO:** | 1901-2022 |
| **FECHA DE ACTA INICIO:** | **20 DICIEMBRE DE 2022** | **FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:** | 30-08-2025 (SUEPENDIDO) |
| **ELABORÓ:** | MANUEL ANTONIO LINARES DONATO | **FECHA DE VISITA:** | 05-06-AGOSTO-2025 |
| **TIPO DE PROYECTO:** (CIC, Sacúdete CAMs, Estaciones de Policía) | **ESTACION DE POLICÍA** | | |

**ASISTENTES**

| No. | NOMBRE | CARGO | REPRESENTA A |
|---|---|---|---|
| 1. | MANUEL ANTONIO LINARES DONATO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SUPERVISOR | MINISTERIO DEL INTERIOR |
| 2. | MARIO AURELIO PEDROZA SANDOVAL | SECRETARIO PRIVADO | MUNICIPIO DE ACACIAS |
| 3. | IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – SUPERVISOR CONVENIO | MUNICIPIO DE ACACIAS |
| 4. | ANA MARIA MEDINA | AOYO JURIDICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MUNICIPIO DE ACACIAS |
| 5. | JONATHAN VEGA BAQUERO | PROFESIONAL DE APOYO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MUNICIPIO DE ACACIAS |
| 6. | FRANKI ALEXANDER GOMEZ SANCHEZ | JEFE OFICINA DE CONTRATACION | MUNICIPIO DE ACACIAS |
| 7. | PEDRO ANDRES LASSO | ARQUITECTO – OFICINA DE CONTRATACION | MUNICIPIO DE ACACIAS |
| 8 | MIGUEL GIRALDO | RESIDENTE | INTERVENTORIA |
| 9 | ANDRES MARTINO PEREZ | DELEGADO CONTRATISTA OBRA | CONTRATISTA DE OBRA |
| 10 | ISABELLA URQUIJO CAMACHO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA DE OBRA |

**DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:** CARRERA 41 – DIAGONAL PLAZA CENTENARIO

**INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS**

| No. contrato | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
|---|---|---|---|
| **Obra: OCA-LP-002-2023 No. 377 DE 2023** | **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** | **27-04-2023** | SUSPENDIDO |
| **Interventoría: OCA-CM-002-2023 No. 374-2023** | **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** | **27-04-2023** | SUSPENDIDO |

**CUADRO FINANCIERO**

| **CONCEPTO**(adjuntar celdas si es necesario) | **VALOR** | **No. COMPROBANTE DE EGRESO** | **FECHA PAGO** |
|---|---|---|---|
| | $ 0,00 | | DD/MM/AAAA |
| | $ 0,00 | | DD/MM/AAAA |

**NOTA:** SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO REMITIDO POR EL MUNICIPIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2025.

**CUENTAS RECÍPROCAS**

| | |
|---|---|
| **SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE** | Esta información fue solicitada, no obstante, no fue entregada en el desarrollo del comité. |

## DESARROLLO DE LA VISITA

### 5 DE AGOSTO DE 2025

1. **Contexto estado convenio**

El pasado 31 de julio de 2025 a solicitud del Municipio de Acacias se adelantó y suscribió la suspensión 01 al convenio 1901 de 2022 por un término de un (01) mes. Lo anterior bajo la necesidad de adelantar mesas técnicas en la cual el municipio exponga y sustente los posibles hechos que podrían generar una segunda adición de recursos.

**TERMINOS DE LA SUSPENSION 01:**

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN No. 01: | 31 de julio de 2025 |
| FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN No. 01: | 29 de agosto de 2025 |
| FECHA PREVISTA REINICIO SUSPENSIÓN No. 01: | 30 de agosto de 2025 |
| FECHA NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: | 30 de agosto de 2025 |

**ESTADO DESEMBOLSOS MINISTERIO DEL INTERIOR**

| Desembolso | Valor | Hito de Cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| Primer Desembolso Vigencia 2022 | $ 1.100.000.000 | Perfeccionamiento del Contrato | Pagado |
| Segundo Desembolso Vigencia 2023 | $ 6.443.016.560 | Entrega de los Estudios y Diseños | Pagado |
| Tercer Desembolso Vigencia 2024 | $ 5.154.413.427 | Avance 60% | Pagado |
| Ultimo Desembolso Vigencia 2024 | $ 1.288.603.312 | Cumplimiento 100% | Reserva |

Frente a los desembolsos del Ministerio del Interior, se reitera que el ultimo desembolso pactado en el convenio 1901 de 2022, se encuentra constituido como reserva presupuestal y de no adelantarse la solicitud del mismo al Ministerio del Interior previo cumplimiento y verificación de requisitos, antes del 20 de noviembre de 2025, este se constituirá como vigencia expirada, quedando a cargo del Municipio de Acacias la obligación de aportar este recursos para cubrir los pagos finales derivados de la ejecución del proyecto.

2. **Recorrido del proyecto:**

En compañía del Secretario Privado del Despacho del Alcalde, el Supervisor del Municipio, el equipo técnico-jurídico, así como los contratistas de la obra, consultoría e interventoría, se realizó un recorrido por el proyecto, en el cual se constató la inactividad en la ejecución de las obras, como consecuencia de la suspensión del convenio y de los contratos derivados.

Durante la visita, se evidenció que el avance constructivo de los distintos espacios presenta diferentes niveles de desarrollo en sus procesos y componentes. Se destaca que ya se ha superado la fase de cimentación, estructura e instalación de mampostería en los bloques correspondientes a las áreas administrativa, cuartos técnicos, salas de

reflexión, intendencia, área social, alojamientos y apartamento fiscal. Este avance también incluye la construcción de los tanques de almacenamiento de la red de suministro y del sistema de red contra incendios (RCI).

Como se mencionó previamente, el grado de avance varía según el espacio. Algunos ambientes ya cuentan con acabados en piso, pañete, pintura e instalación de ventanas. Se observó además cableado eléctrico en distintos puntos de salida y tableros, así como avances en las redes contra incendios, sanitaria, de suministro y de aguas lluvias.

En cuanto a las celosías, se identificó un avance significativo, encontrándose instaladas en cada uno de los bloques que conforman el proyecto.

En las áreas exteriores, se constató que ya están construidas la placa de parqueaderos, la plaza de formación y las garitas. No se evidencian avances en componentes como el cerramiento perimetral ni en las zonas verdes.

**3. Estado contratos derivados:**

Frente a este punto, el municipio de Acacias indica que estos se encuentran suspendidos, con fecha de reanudación 29 de agosto de 2025.

**4. Comite Instalaciones Alcaldía Municipal:**

El Secretario Privado del Señor Alcalde manifiesta la importancia de establecer y esclarecer los hechos que motivan la revisión del alcance del proyecto, conforme a lo pactado en el convenio suscrito. Enfatiza que dicho proyecto responde a las necesidades en materia de seguridad y convivencia del Municipio, considerando los retos actuales del territorio, y al mismo tiempo permite dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, específicamente en su eje programático de seguridad, definido por el Señor Alcalde.

Por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior, se reitera que la presente mesa técnica se enmarca dentro de los compromisos adquiridos con ocasión de la **Suspensión No. 01** del convenio. Su objetivo es identificar y analizar las causas que llevaron al Municipio de Acacías a solicitar la revisión del alcance del proyecto. En este sentido, se recuerda que, para la Supervisión, el alcance del proyecto es el que fue establecido y pactado mediante la primera adición al convenio, constituyéndose este como el punto de partida para cualquier revisión o evaluación posterior.

El Supervisor del Municipio de Acacías expone la situación que originó la solicitud de revisión del alcance, la cual se fundamenta en una modificación contractual suscrita en el marco del contrato de obra. Dicha modificación al contrato de obra, no fue informada al Ministerio del Interior previamente a la suscripción de la misma y responde a un incremento en las cantidades de obra del componente de cortasol (mayor número de elementos por metro cuadrado), lo cual impactó también en otras cantidades asociadas, como las correspondientes a urbanismo, cerramiento, entre otras.

De lo anteriormente dicho con relación a no informar al Ministerio del Interior de la necesidad de modificar las cantidades o alcance del contrato de obra, el Municipio manifiesta que se compromete a presentar documento que evidencia que esto fue puesto en conocimiento a la anterior supervisión del Ministerio del Interior.

Frente a lo anterior, desde la Supervisión del Ministerio del Interior se precisa que, tras revisar los diseños, en particular los detalles técnicos y constructivos del plano identificado como **DET-CELOSÍA-FACHADA-PL-01DE-01**, se constata que el elemento de celosía ya se encuentra especificado en los estudios y diseños aprobados. Por lo tanto, este componente se encuentra incluido dentro del alcance originalmente pactado para el proyecto.

En consecuencia, se sugiere que el equipo técnico y jurídico del Municipio de Acacías revise la modificación realizada al contrato de obra y adopte los correctivos que se estimen pertinentes, con el fin de evitar impactos negativos en el alcance del proyecto, así como en el cumplimiento integral del anexo de condiciones y del objeto contractual del convenio.

El arquitecto Andrés Martino, residente del contratista de obra, informa que presentará al Municipio de Acacías una propuesta de balance de cantidades de obra, con el propósito de restablecer el alcance conforme a los estudios y diseños aprobados. Igualmente, elaborará un plan estratégico para la ejecución de las actividades pendientes, dentro de un plazo razonable que permita cumplir con el objeto contractual.

Finalmente, conforme a lo manifestado por el arquitecto Martino, residente de obra, el Jefe de Contratación del Municipio indica que recibirá la propuesta de modificación contractual y, tras un análisis técnico y jurídico, presentará al Ministerio del Interior la solicitud de novedad contractual correspondiente, con el fin de garantizar la ejecución adecuada del convenio.

Para finalizar, desde la supervisión del Ministerio del Interior se hace un llamado urgente y respetuoso al Municipio, con el fin de que se adopten los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento integral de lo pactado en el anexo de condiciones contractuales, así como del objeto contractual.

Como resultado del presente comité, en el cual se abordaron aspectos relevantes desde los componentes técnico y jurídico, se da respuesta a la solicitud realizada por el Municipio de Acacías, relacionada con la revisión del alcance del proyecto actualmente en ejecución, en el marco del Convenio 1901-22.

Tras dicha revisión, se concluye que el alcance del proyecto se mantiene sin modificaciones, conforme a los estudios y diseños entregados por el Municipio de Acacías al Ministerio del Interior. Esto, toda vez que, para viabilizar el cierre financiero del proyecto, el 16 de agosto de 2024 se suscribió la primera adición al convenio, incorporando recursos para cubrir componentes mayores, tales como: áreas derivadas de los estudios y diseños, cerramiento perimetral, urbanismo exterior, muebles bajos y altos, clósets en los alojamientos y aires acondicionados.

En consecuencia, se concluye que los hechos generadores de la suspensión del convenio 1901-22 han sido aclarados, derivando en la necesidad de reanudar la ejecución del convenio. Teniendo en cuenta el nuevo plazo del mismo, se considera igualmente necesario adelantar una prórroga. Para ello, se requiere que el Municipio establezca técnicamente los tiempos requeridos, sin perder de vista las limitaciones impuestas por el cierre del año fiscal, así como el riesgo que representa una vigencia expirada ante la posibilidad de no lograr el cumplimiento del objeto del convenio al 31 de octubre de 2025.

La solicitud de prórroga debe estar acompañada de las actividades que no se lograron ejecutar en el plazo contractual para la entrega del proyecto totalmente terminado y funcional, los hitos de verificación; se sugiere que venga por cada espacio o componente que constituye el programa arquitectónico, los tiempos técnicos de ejecución incorporando acciones extraordinarias y de contingencia, certificaciones RETIE –RETILAP, recibo del Municipio e interventoría y entrega a Ministerio del Interior y Policía Nacional.

**Documentos entregados en la visita** (En caso de recibir documentación en la visita)

| |
|---|
| 1. BALANCE FINANCIERO |
| 2. |
| 3. |
| 4. |

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE** | **ACCIONES** | **FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO** |
| MUNICIPIO DE ACACIAS | SOLICITUD DE REANUDACION SUSPENSION 1 CONVENIO | 11-AGOSTO-2025 |
| MUNICIPIO DE ACACIAS | SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL-PRORROGA. | 11-AGOSTO-2025 |


**REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)**

| **FIRMA DE ASISTENTES** | |
|---|---|
| *Por parte de:* ***MINISTERIO DEL INTERIOR***<br>**Nombre y firma: MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**<br>Cargo: Profesional Especializado - Supervisor<br>Email: manuel.linares@mininterior.gov.co<br>Celular: 3102319756 | *Por parte de:* ***MUNICIPIO DE ACACIAS***<br>**Nombre y firma: MARIO AURELIO PEDROZA SANDOVAL**<br>Cargo: Secretario Privado delegado por Alcalde para esta reunion.<br>Email:<br>Celular: 3118526187. |
| *Por parte de:* ***MUNICIPIO DE ACACIAS***<br>**Nombre y firma: ANA MARIA MEDINA**<br>Cargo: Profesional apoyo Jurídico<br>Email: ana.medinam@gmail.com.<br>Celular: 3178025382. | *Por parte de:* ***MUNICIPIO DE ACACIAS***<br>**Nombre y firma: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**<br>Cargo: Supervisor Municipio<br>Email:<br>Celular: |
| *Por parte de:* ***MUNICIPIO DE ACACIAS***<br>**Nombre y firma: PEDRO ANDRES LASSO**<br>Cargo: Profesional Apoyo Oficina de Contratación<br>Email:<br>Celular: | *Por parte de:* ***MUNICIPIO DE ACACIAS***<br>**Nombre y firma: FRANKI ALEXANDER GOMEZ SANCHEZ**<br>Cargo: Jefe de Contratación<br>Email:<br>Celular: |
| *Por parte de:* ***CONTRATISTA CONSULTOR – OBRA*** **OCA-LP-002-2023 No. 377 DE 2023**<br>**Nombre y firma: ISABELLA URQUIJO CAMACHO**<br>Cargo: Representante Legal<br>Email: consorciopolicia2023@gmail.com<br>Celular: 3106731902 | *Por parte de:* ***INTERVENTORIA*** **OCA-CM-002-2023 No. 374-2023**<br>Miguel A. Giraldo.<br>**Nombre y firma: MIGUEL GIRALDO**<br>Cargo: Residente Interventoría<br>Email:<br>Celular: |


**Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.**


**REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1.**


Mínimo 6 fotos (Fotos de: Avance total de la obra)

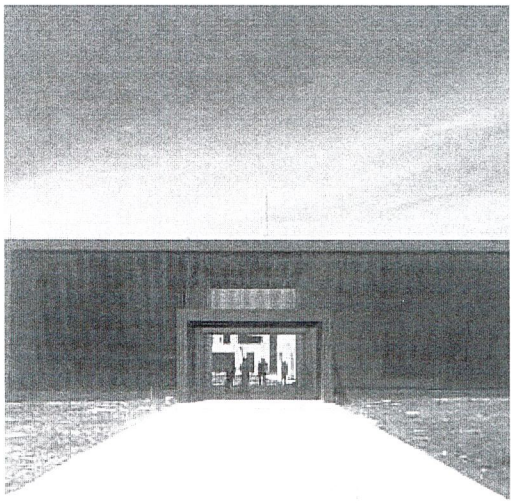





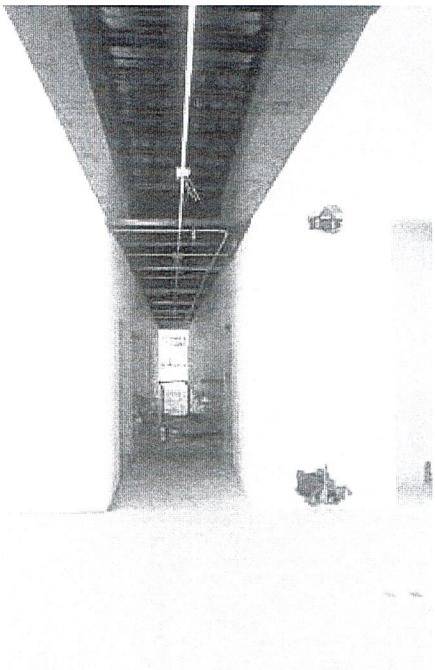


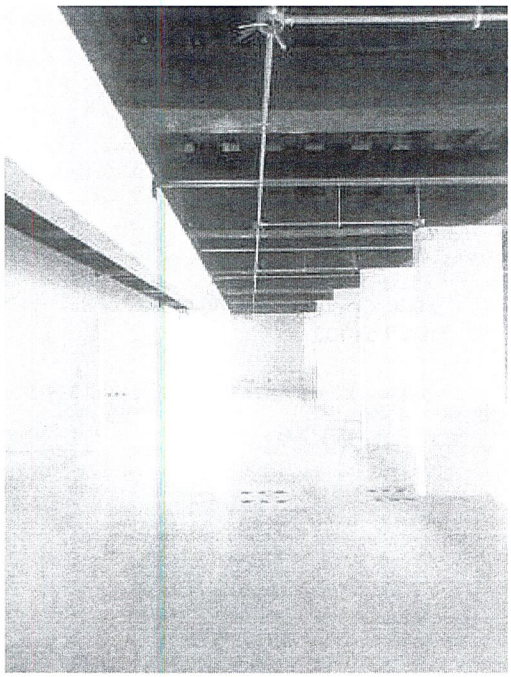

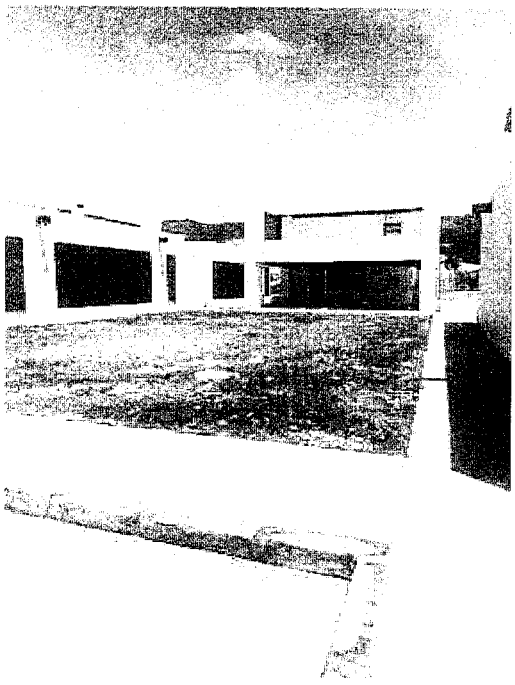

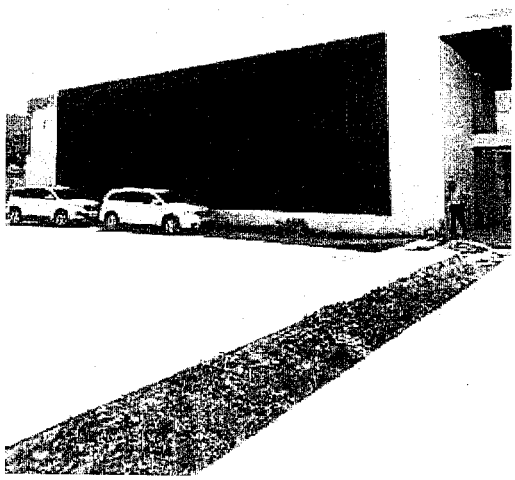

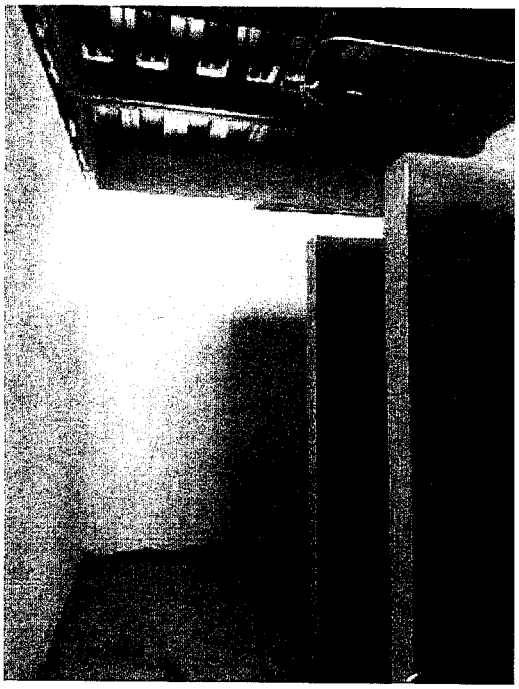

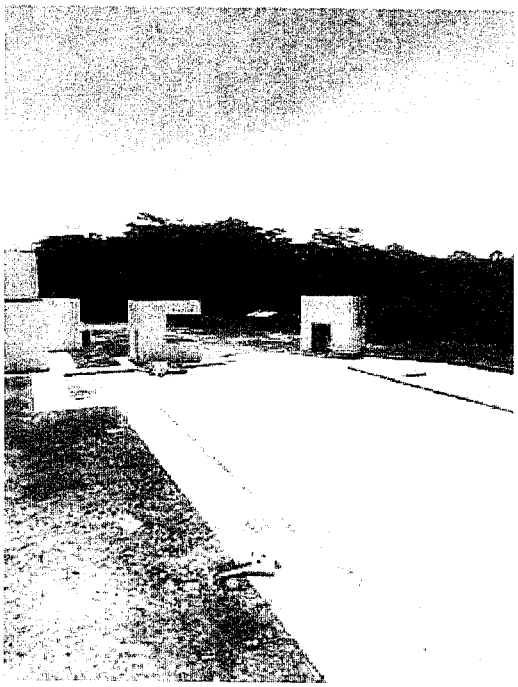

| |
|---|
| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2025 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** | Casco Urbano Municipio de Acacías Lote A Escuela Carabineros | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE ACACIAS | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 13.986.033.119,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 4.281.955.271,72 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $ 18.267.988.390,72 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 07/08/2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31/12/2024 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO** | IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ | 14/12/2022 | 31/12/2023 |
| **APOYOS ANTERIORES** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES | 18/04/2023 | 07/03/2025 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | JONATHAN EDUARDO VEGA BAQUERO | 07/03/2025 | DD/MM/AAAA |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA (MUNICIPIO)** | No. 2024000798 | 06/05/2024 | 31/12/2024 |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)** | No. 2-2022-030809 | 19/07/2022 | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 3000613 | 15/12/2022 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 20/12/2022 | | |
| | **PRIMER PRÓRROGA** | | FECHA: 27/02/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** | **PRIMER ADICIÓN** | FECHA: 16/08/2024 |
| | **SEGUNDA PRÓRROGA** | FECHA: 24/12/2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** | SUSPENSIÓN No 1 | 31/07/2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** | FECHA PREVISTA REINICIO | 30/08/2025 |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)** | FECHA: 19/02/2025- PORROGA No.2<br>DESDE 20/12/2022 HASTA 18/06/2026 | |
| **VALOR ACTUALIZADO ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA** | DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 16,661,134,387.45) | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA** | MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.549.424.492,00) | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | N/A. | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO.

- **Convenio interadministrativo/Contrato**

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO (MINISTERIO)** | **A.** Suscripción del acta de inicio. **B.** designación del supervisor del convenio por parte del municipio **C.** Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | NO APLICA | 29/12/2022 | $1.100.000.000,00 |
| | **A.** Aprobación del cronograma actualizado de | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SEGUNDO DESEMBOLSO (MINISTERIO)** | ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. **B.** Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio. | NO APLICA | 30/11/2023 | $5,139,212,638.47 |
| **TERCER DESEMBOLSO (MINISTERIO)** | **A.** Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. **B.** Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio. | NO APLICA | 1/12/2023 | $1,303,803,921.53 |
| **CUARTO DESEMBOLSO (MUNICIPIO)** | ADICIÓN NO. 1 Y PRORROGA NO. 02 AL CONVENIO 1901 DE 2022, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - DEPARTAMENTO DE META" | NO APLICA | 30/08/2024 | $4.281.955.271,72 |
| **QUINTO DESEMBOLSO (MINISTERIO)** | **A.** la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. **B.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, **C.** La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalado por el interventor. **D.** Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las | NO APLICA | 25/02/2025 | $5,154,413,247.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | certificaciones **RETIE y/o RETILAP.** | | | |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | | 0% | DD/MM/AAAA | $0,00 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | **$16.979.385.078,72** |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (Según información de contratación derivada).** | | | | **$16.979.385.078,72** |

## 3. PÓLIZAS DEL CONVENIO

**Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.**

- **INICIAL**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 3000613 | Cumplimiento | $1.398.603.312 | 7/08/2022 | 27/09/2024 |
| | Calidad de servicio | N/A. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

- **AJUSTE VIGENCIA DEL AMPARO**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 3000613 | Cumplimiento | $1.398.603.312 | 20/12/2022 | 9/02/2025 |
| | Calidad de servicio | N/A. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

- **PRIMER MODIFICACION Y PRORROGA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 3000613 | Cumplimiento | $1.398.603.312 | 09/02/2025 | 18/11/2025 |
| | Calidad de servicio | N/A. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

- **ALARATORIA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 3000613 | Cumplimiento | $1.398.603.312 | 09/02/2025 | 18/11/2025 |
| | Calidad de servicio | N/A. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

- **AJUSTE DE CENTAVOS A LA PRIMA PARA COICIDIR CON RP**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 3000613 | Cumplimiento | $1.398.603.312 | 09/02/2025 | 18/11/2025 |
| | Calidad de servicio | N/A. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

- **SEGUNDA MODIFICACION Y ADICION**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 3000613 | Cumplimiento | $1.826.798.839 | 16/08/2024 | 18/11/2025 |
| | Calidad de servicio | N/A. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

- **SEGUNDA PRORROGA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 3000613 | Cumplimiento | $1.826.798.839 | 18/11/2025 | 18/06/2026 |
| | Calidad de servicio | N/A. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

- **SUSPENSIÓN No. 1**

  En trámite.

## 4. INFROMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- **Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Obra.**

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato 377 de 2023** | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META | | $12.575.546.216,00 |
| **Adicional en valor** | 25/09/2024 | | $4.085.588.171,45 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023, Nit 901699813-1,<br>R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO<br>C.C. No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 27/ABRIL/2023 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** | PÓRROGA No. 1 | 22/03/2024 | N/A |
| | PÓRROGA No. 2 | 25/09/2024 | N/A |
| | SUSPENSIÓN 1 | 7/12/2024 | N/A |
| | AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSION 1 | 20/01/2025 | N/A |
| | AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSION 1 | 19/03/2025 | N/A |
| | FECHA TERMINACION DE LA AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSION 1 | 20/04/2025 | N/A |
| | AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSION 1 | 18/04/2025 | N/A |
| | AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSION 1 | 30/05/2025 | N/A |
| | ACTA DE REINICIO No 1 | 15/07/2025 | N/A |
| | ACTA DE PRORROGA No. 3 | 15/07/2025 | N/A |
| | SUSPENSION No. 2 | 31/07/2025 | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FECHA DE TERMINACION SEGÚN SUSPNESION No 2 | 8/09/2025 | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION 2** | 8/09/2025 | | |
| **Nuevas condiciones del contrato de obra con la Adición No.1** | Valor Fase 1: Consultoría | | $ 662.923.252,00 |
| | Valor Fase 2: Construcción de obra | | $ 15.998.211.135,45 |
| **VALOR ACTUAL TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 16.661.134.387,45 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **PÓLIZA No.** | CV-100032073 y CV-100008254 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 23/JULIO/2025 | | |

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| CV-100032073 | Cumplimiento. | $3.332.226.877,49 | 9/07/2025 | 31/12/2026 |
| | Buen manejo del anticipo | $6.664.453.754,98 | 9/07/2025 | 31/12/2026 |
| | Prestaciones sociales | $833.056.719,37 | 9/07/2025 | 31/07/2028 |
| | Calidad del servicio | $ 1.666.113.438,75 | 31/07/2025 | 31/07/2028 |
| | Estabilidad de obra | $ 1.666.113.438,75 | 31/07/2025 | 31/07/2030 |
| CV-100008254 | Amparo básico- predios, labores y operaciones | $ 833.056.719,37 | 24/03/2023 | 31/07/2025 |
| | Patronal | $ 833.056.719,37 | | |
| | Contratistas y subcontratistas | $ 833.056.719,37 | | |
| | Vehículos propios y no propios | $ 833.056.719,37 | | |

- **Contrato de Ejecución de Interventoría de Estudios y Diseños y Obra**

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato: OCA-374-2023** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META | | $1.410.386.903,00 |
| **Adicional en valor** | 22/OCTUBRE/2024 | | $ 139.037.589,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, Nit. 901696564-7<br>R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA,<br>C.C. No. 1.094.921.302 expedida en Armenia | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 27/ABRIL/2023 | | |
| **Prorrogas, Suspensiones y Reinicios** | PÓRROGA | 22/03/2024 | N/A |
| | SUSPENSIÓN 1 | 7/12/2024 | N/A |
| | AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSION 1 | 20/01/2025 | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSION 1 | 19/03/2025 | N/A |
| | FECHA TERMINACION DE LA AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSION 1 | 20/04/2025 | N/A |
| | AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSION 1 | 18/04/2025 | N/A |
| | FECHA TERMINACION DE LA AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSION 1 | 31/05/2025 | N/A |
| | ACTA DE REINICIO No 1 | 15/07/2025 | N/A |
| | ACTA DE PRORROGA No. 3 | 15/07/2025 | N/A |
| | SUSPENSION No. 2 | 31/07/2025 | N/A |
| | FECHA DE TERMINACION SEGÚN SUSPNESION No 2 | 8/09/2025 | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION 2** | 8/09/2025 | | N/A |
| | | **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | $1.549.424.492,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **PÓLIZA No.** | CV-100031724 - CV-100008150 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 14/MAYO/2025 | | |

| **PÓLIZA No.** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| **CV-100031724** | Cumplimiento | $ 309.884.898,40 | 16/04/2025 | 12/06/2025 |
| | Prestaciones sociales | $ 77.471.224,60 | 16/04/2025 | 12/12/2027 |
| | Calidad del servicio | $ 309.884.898,40 | 16/04/2025 | 12/06/2025 |
| **CV-100008150** | Responsabilidad civil extra contractual | $ 260.000.000,00 | 24/03/2023 | 05/06/2025 |

**NOTA: Las pólizas de reinicio y prorroga del contrato se encuentran en tramite ante la aseguradora.**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **99.00%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **77.28%** |
| La obra en el presente mes de julio del 2025, presenta avance con lo programado, presentando un atraso de 21.72%. Sin embargo, se realiza la suspensión del convenio 1901 de 2022 así como de los contratos derivados, esto con el fin de sustentar la necesidad de la modificación contractual en prorroga que busca adicionar el tiempo necesario para culminar las actividades que no se lograron en el plazo contractual. | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025:**

En el mes de julio del 2025, se presenta ejecución de las siguientes actividades:

- **Zona Administrativa:** presenta un avance del 80.84%, de ejecución de las actividades contratadas.
- **Zona de servicios celdas:** presenta un avance del 56.58%
- **Zona social:** presenta un avance del 91.63%, de ejecución de las actividades contratadas
- **Zona Armerillo:** presenta un avance del 92.93%, de ejecución de las actividades contratadas
- **Zona de alojamientos:** presenta un avance del 81.65%, de ejecución de las actividades contratadas
- **Garitas y shut de basuras**: presenta un avance del 90.79%, de ejecución de las actividades contratadas
- **Urbanismo y paisajismo:** presentan un avance del 62.67% de ejecución de las actividades contratadas

| FECHA | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO | PORCENTAJE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|
| **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 CONVENIO (ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORIA)** | **0.00%** | **78.18%** | **21.82%** |

**Porcentaje de ejecución con el valor actualizado del Convenio.**

**COMPONENTE FINANCIERO**
Giros y pagos realizados cuenta del Convenio 1901 – 2022

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| GIRO PRIMER DESEMBOLSO (MINISTERIO) | $ 1.100.000.000,00 |
| PAGO REALIZADO FASE I (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PARCIAL 1 OBRA | -$ 662.923.252,00 |
| PAGO REALIZADO FASE I (ESTUDIOS Y DISEÑOS) PARCIAL 1 INTER | -$397.813.951,00 |
| GIRO 2 PARTE 1 DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (MINISTERIO) | $ 5.139.212.638,47 |
| GIRO 3 PARTE 2 DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (MINISTERIO) | $ 1.303.803.921,53 |
| PAGO REALIZADO FASE II (ANTICIPO OBRA) | -$ 4.765.049.185,60 |
| PAGO REALIZADO PARCIAL 2 FASE II (OBRA) | -$ 1.233.740.507,36 |
| PAGO REALIZADO PARCIAL 2 FASE II (INTERVENTORIA) | -$ 174.770.091,00 |
| GIRO 4 VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO ADICION 1 | $ 4.281.955.271,72 |
| PAGO REALIZADO PARCIAL 3 FASE II (OBRA) | -$ 2.809.961.478,54 |
| PAGO REALIZADO PARCIAL 3 FASE II (INTERVENTORIA) | -$ 326.959.806,00 |
| PAGO REALIZADO PARCIAL 4 FASE II (OBRA) | -$ 1.353.920.714,43 |
| GIRO 5 TERCER DESEMBOLSO (MINISTERIO) | $5,154,413,247.00 |
| PAGO REALIZADO PARCIAL 5 FASE II (OBRA) | -$671.703.109.42 |
| PAGO REALIZADO PARCIAL 4 FASE II (INTER) | -$226.433.446,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL APORTES (MININTERIOR Y MUNICIPIO | $16.979.385.078,72 |
| TOTAL PAGOS REALIZADOS | $ 12.623.275.541,35 |

Se Adjunta al presente el informe financiero suscrito por la oficina de tesorería mes de JULIO de 2025.

| CONTRATO DE OBRA 377 DE 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR CONTRATO** | **VALOR EJECUTADO** | **VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR** | **VALORES NETOS** |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | $12.575.546.216,00 | | | |
| VALOR ADICIONAL | $ 4.085.588.171,45 | | | |
| ANTICIPO | | | | $ 4.765.049.185,60 |
| VALOR ACTA PARCIAL 1 (FASE I: Estudios y diseños) | | $ 662.923.252,00 | $ 0,00 | $ 662.923.252,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL 2 (FASE II: Construcción) | | $ 2.056.234.178,94 | $ 822.493.671,58 | $ 1.233.740.507,36 |
| VALOR ACTA PARCIAL 3 (FASE II: Construcción | | $ 4.683.269.130,90 | $ 1.873.307.652,36 | $ 2.809.961.478,54 |
| VALOR ACTA PARCIAL 4 (FASE II: Construcción | | $2.256.534.524,05 | $ 902.613.809,62 | $ 1.353.920.714,43 |
| VALOR ACTA PARCIAL 5 (FASE II: Construcción | | $1.119.505.182,37 | $447.802.072,95 | $671.703.109,42 |
| VALOR POR EJECUTAR | | $ 5.882.668.119,19 | $ 718.831.979,09 | $ 5.163.836.140,10 |
| SUMAS IGUALES | $16.661.134.387,45 | $16.661.134.387,45 | $ 4.765.049.185,60 | $16.661.134.387,45 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA 374 DE 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR CONTRATO** | **VALOR EJECUTADO** | **VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR** | **VALORES NETOS** |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | $ 1.410.386.903,00 | | | |
| VALOR ADICIONAL | $ 139.037.589,00 | | | |
| ANTICIPO | $ 0,00 | | | $ 0,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL 1 (FASE I: Estudios y diseños) | | $ 397.813.951,00 | $ 0,00 | $ 397.813.951,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL 2 (FASE II: Construcción) | | $ 174.770.091,00 | $ 0,00 | $ 174.770.091,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL 3 (FASE II: Construcción) | | $ 326.959.806,00 | $ 0,00 | $ 326.959.806,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR ACTA PARCIAL 4 (FASE II: Construcción) | | $226.433.446,00 | $ 0,00 | $226.433.446,00 |
| VALOR POR EJECUTAR | | $ 423.447.198,00 | $ 0,00 | $ 423.447.198,00 |
| SUMAS IGUALES | $ 1.549.424.492,00 | $ 1.549.424.492,00 | $ 0,00 | $ 1.549.424.492,00 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Estado actual de proyecto con un avance de ejecución del 77.28%











**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

Los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados, y se firma acta de inicio el día 27 de abril de 2023 y se encuentras suspendidos desde el día 31 de julio de 2025.

A corte del 31 de julio de 2025, el contrato de obra presenta una ejecución del 77.28%

## 5. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **17/02/2023** | **11/12/2023** | **15/01/2024** | **29/01/2024** | **15/02/2024** | **29/02/2024** |
| **06/03/2024** | **21/03/2024** | **08/04/2024** | **22/04/2024** | **16/05/2024** | **7/06/2024** |
| **15/07/2024** | **30/07/2024** | **23/08/2024** | **27/09/2024** | **15/10/2024** | **29/10/2024** |
| **15/11/2024** | **29/11/2024** | **6/12/2024** | **24/04/2025** | **15/05/2025** | |

## 6. SEUPERVISOR

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

**IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
Supervisor Convenio No. 1901 de 2022
Secretaría de Infraestructura - Municipio de Acacias.

Elaboró: JONATHAN VEGA BAQUERO
Apoyo a la supervisión. Contratista OCA-588-2025.

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022**
**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META**

**INFORME FINANCIERO DE JULIO 2022 AL 31-07-2025**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO (S):** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META** |

**CUENTA ( CORRIENTE) No. 647-00178-3** DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 18.267.988.390,72** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 13.986.033.119,00** |
| VALOR APORTE DEPARTAMENTO | | | $ 0,00 |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | $ 4.281.955.271,72 |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 29/12/2022 | GIRO 1 | $ 1.100.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 30/11/2022 | GIRO 2 | $ 5.139.212.638,47 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 1/12/2023 | GIRO 3 | $ 1.303.803.921,53 |
| VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO | 30/08/2024 | GIRO 4 | $ 4.281.955.271,72 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/02/2025 | GIRO 5 | $ 5.154.413.247,00 |
| | TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO | | **$ 16.979.385.078,72** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-00178-3** | | | **$ 16.979.385.078,72** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| 374 de 2023 | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 | $ 1.410.386.903,00 | $ 139.037.589,00 | $ 1.549.424.492,00 |
| 377 de 2023 | CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023 | $ 12.575.546.216,00 | $ 4.085.588.171,45 | $ 16.661.134.387,45 |
| | | | **$ 4.224.625.760,45** | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 18.210.558.879,45** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 de 2023 | Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias | 2023002657 | 2023002882. | 13/09/2023 | $ 397.813.951,00 | $ 0,00 | 326.441.951,00 |
| 377 de 2023 | Estudios Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias. | 2023002518 | 2023002731 | 6/09/2023 | $ 662.923.252,00 | $ 0,00 | 543.985.252,00 |
| 377 de 2023 | Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias | 2023004139 | 2023004536 | 22/12/2023 | $ 4.765.049.185,60 | $ 0,00 | 4.526.796.185,60 |
| 377 de 2023 | Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias | 2024000075 | 202400075 | 23/07/2024 | $ 1.233.740.507,36 | $ 0,00 | 917.080.507,00 |
| 374 de 2023 | Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias | 2024000087 | 2024000083 | 6/08/2024 | $ 174.770.091,00 | $ 0,00 | 141.726.091,00 |
| 377 de 2023 | Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias | 2024000102 | 202400098 | 27/09/2024 | | $ 2.809.961.478,54 | 2.088.738.478,54 |
| 374 de 2023 | Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias | 2024000105 | 2024000102 | 15/11/2024 | $ 188.072.798,64 | $ 0,00 | 155.911.798,64 |

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 de 2023 | Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias | 2024000106 | 202400101 | 15/11/2024 | | $ 138.887.007,36 | 115.137.007,36 |
| 377-2023 | Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias | 2024000110 | 2024000106 | 6/12/2024 | | $ 1.233.273.940,03 | 906.758.940,03 |
| 377-2023 | Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias | 2024000109 | 2024000105 | 6/12/2024 | $ 120.646.774,40 | $ 0,00 | 99.655.774,40 |
| 377-2023 | Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias | 2025000036 | 2025000036 | 4/04/2025 | | $ 42.352.752,88 | 34.091.752,88 |
| 377-2023 | Estudio Diseño y construcción de la Estación de policia en el Municipio de Acacias | 2025000035 | 2025000037 | 4/04/2025 | $ 629.350.356,54 | | 419.303.356,54 |
| 374-2023 | Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias | 2025000041 | 2025000039 | 10/04/2025 | $ 226.282.864,36 | | 181.880.864,36 |
| 374-2023 | Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias | 202500042 | 2025000040 | 10/04/2025 | | $ 150.581,64 | 118.581,64 |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 8.398.649.780,90** | **$ 4.224.625.760,45** | **$ 10.457.626.540,99** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 31/12/2022 | $ 904,11 |
| 31/01/2023 | $ 9.342,47 |
| 28/02/2023 | $ 8.438,36 |
| 31/03/2023 | $ 9.342,77 |
| 30/04/2023 | $ 9.041,40 |
| 31/05/2023 | $ 9.342,78 |
| 30/06/2023 | $ 9.041,40 |
| 31/07/2023 | $ 9.343,09 |
| 31/08/2023 | $ 9.343,09 |
| 30/09/2023 | $ 3.705,96 |
| 31/10/2023 | $ 490,60 |
| 30/11/2023 | $ 1.731,40 |
| 31/12/2023 | $ 42.653,67 |
| 31/01/2024 | $ 635.282,82 |
| 28/02/2024 | $ 1.451.988,75 |
| 31/03/2024 | $ 737.180,93 |
| 30/04/2024 | $ 385.232,92 |
| 31/05/2024 | $ 142.642,10 |
| 30/06/2024 | $ 75.853,53 |
| 31/07/2024 | $ 24.693,98 |
| 31/08/2024 | $ 6.150,75 |
| 30/09/2024 | $ 35.646,09 |
| 31/10/2024 | $ 21.501,91 |
| 30/11/2024 | $ 17.854,24 |
| 31/12/2024 | $ 5.773,22 |
| 31/01/2025 | $ 3.830,36 |
| 28/02/2025 | $ 9.108,36 |
| 31/03/2025 | $ 47.607,95 |
| 30/04/2025 | $ 41.672,26 |
| 31/05/2025 | $ 37.842,14 |
| 30/06/2025 | $ 35.835,05 |
| 31/07/2025 | $ 37.029,86 |
| **TOTAL (3)** | **$ 3.875.448,32** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| NO | NO | NO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL (4) | $ 0,00 | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 16.979.385.078,72** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (3)** | **$ 12.623.275.541,35** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | $ 3.875.448,32 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | $ 0,00 |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 3.875.448,32** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** | **$ 4.359.984.985,69** |
| **SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)** | **$ 4.359.984.985,69** |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | Pendiente girar 1.275.62 al contratista por diferencia entre lo contable y presupuestal |

**FIRMA**

Madelan Mosquera T.
Contadora Pública
T.P 203534-T

**INGRY MADELAN MOSQUERA TAYO**
Tesorera Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

**Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE**
**CUENTA No.**
**647-00178-3**
**FECHA DE CORTE: 31/07/2025**

Banco de Occidente

de generación: 06/08/2025 10:47:43
Fecha Generado por: IPORTILLA


**MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META**
**CL 14 # 21-32 BR COOPERATIVO**
**ACACIAS - META**

## RESUMEN

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,359,949,231.45 |
| + 31 CREDITOS | 37,029.86 |
| - 0 DEBITOS | 0.00 |
| SALDO ACTUAL | 4,359,986,261.31 |
| SALDO PROMEDIO | 4,359,966,725.25 |

| DIA | TRANSACCION | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,950,425.96 |
| 03 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,951,620.47 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,952,814.98 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,954,009.49 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,955,204.00 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,956,398.51 |
| 08 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,957,593.02 |
| 09 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,958,787.53 |
| 10 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,959,982.04 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,961,176.55 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,962,371.06 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,963,565.57 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,964,760.08 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,965,954.59 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,967,149.10 |
| 17 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,968,343.61 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,969,538.12 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,970,732.63 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,971,927.14 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,973,121.65 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,974,316.16 |
| 23 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,975,510.67 |
| 24 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,976,705.18 |
| 25 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,977,899.69 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,979,094.20 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.51 | 4,359,980,288.71 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.52 | 4,359,981,483.23 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.52 | 4,359,982,677.75 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.52 | 4,359,983,872.27 |
| 31 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.52 | 4,359,985,066.79 |
| 31 | INTERESES LIQUIDADOS | - | | 1,194.52 | 4,359,986,261.31 |

**BO-202508061.002**

**BANCO DE OCCIDENTE S.A.**
NIT. 890.300.279.-4

SUCURSAL ACACÍAS

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS**, identificado con NIT No. 892.001.457-3 es cuentahabiente en la Oficina Villavicencio Principal desde el 27 de Julio de 2022 con la Cuenta Corriente No. **64700178-3** denominada *MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META* la cual se encuentra activa y vigente.

Esta cuenta a generado los siguientes rendimientos financieros desde su apertura el 27 de Julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2025:

| PERIODO | | INTERESES LIQUIDADOS | |
|---|---|---|---|
| 2022 | | $ | 904,11 |
| 2023 | | $ | 121.816,99 |
| 2024 | | $ | 185.597.91 |
| 2025 | ENERO | $ | 3.830.36 |
| | FEBRERO | $ | 9.108.36 |
| | MARZO | $ | 47.607.95 |
| | ABRIL | $ | 41.672.26 |
| | MAYO | $ | 37.842.14 |
| | JUNIO | $ | 35.835.05 |
| | JULIO | $ | 37.029.86 |
| **TOTAL** | | **$** | **521.244.49** |

Se expide en Acacías/Meta con destino a **MUNICIPIO DE ACACIAS** a los seis (06) días del mes de agosto del año Dos Mil Veinticinco (2025).

Cordialmente,

**WILSON CAMELO LADINO**
Gerente de Relación Banca de Gobierno

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Banco de Occidente | Del lado de los que hacen.
Grupo AVAL

| MINISTERIO DEL INTERIOR | INFORME DE INTERVENTORIA<br>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023<br>INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | ALCALDÍA DE ACACÍAS | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DEL INTERIOR | | ACACÍAS - META | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 |
| Versión: 01 | | | |

**INFORMACIÓN GENERAL**

| INFORME SEMANAL No: | | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No | 374 de 2023 | OBJETO: | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | | DEL 16 DE JULIO 2025 AL 19 DE JULIO DE 2025 |

| INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA: **ING. Deiby Jhoanny Gomez Barrera** | RESIDENTE DE OBRA: **ING. Joe Andres Martino Pérez Díaz** |
|---|---|---|

## 1. LOCALIZACION DEL PROYECTO




**Información geográfica del predio**


Latitud: 4,00° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)



**Localización geográfica del terreno a intervenir**
Fuente: Consorcio Interpolicía 2023

**Características del Predio.**

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

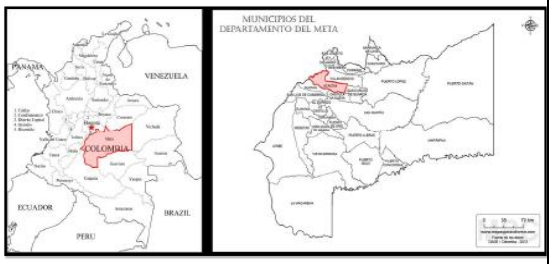


**Localización geográfica del municipio en el país y departamento**.
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.

## 2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CONTRATO:** | martes, 28 de marzo de 2023 | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 11.912.622.964,00 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | jueves, 27 de abril de 2023 | **VALOR ADICIONAL No.1 AL CONTRATO:** | $ 4.085.588.171,45 |
| **PLAZO** | DOCE (12) MESES. | **FECHA DE TERMINACION:** | domingo, 24 de marzo de 2024 |
| **PRORROGA N° 1:** | viernes, 22 de marzo de 2024 | **TIEMPO DE PRORROGA No 1,** | Siete (07) meses Dieciocho (18) dias. |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** | martes, 12 de noviembre de 2024 |
| **PRORROGA N° 2:** | miercoles, 25 de septiembre de 2024 | **TIEMPO DE PRORROGA No 2,** | Treinta y un (31) dias. |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** | viernes, 13 de diciembre de 2024 |
| **SUSPENSION N° 1:** | sabado, 07 de diciembre de 2024 | **TIEMPO DE LA SUSPENSION N°1:** | cuarenta y cinco (45) dias |
| **AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N° 1:** | lunes, 20 de enero de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N° 1:** | sesenta (60) dias |
| **AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N° 1:** | miercoles, 19 de marzo de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N° 1:** | treinta (30) dias |
| **AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N° 1:** | viernes, 18 de abril de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N° 1:** | cuarenta (40) dias |
| **AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N° 1:** | viernes, 30 de mayo de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N° 1:** | cuarenta (40) dias |
| **REINICIO N°1:** | martes, 15 de julio de 2025 | **FECHA DE TERMINACION:** | 20 de julio de 2025 |
| **PRORROGA N° 3:** | martes, 15 de julio de 2025 | **TIEMPO DE PRORROGA No 3,** | once (11) dias |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** | jueves, 31 de julio de 2025 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $ 15.998.211.135,45 | **VALOR DEL ANTICIPO:** | $ 6.399.284.454,18 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023. | **REPRESENTANTE LEGAL:** | ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO. |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 814 DIAS | **PLAZO RESTANTE:** | 12 DIAS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:** | 1,41% | **AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:** | 64,63% | **PROGRAM. SEMANA** | 98,00% | **PROGRAM. ACUMULADO** | 64,63% |
| **AVANCE FINANCIERO SEMANA:** | $ 225.394.005,23 | **AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:** | $ 10.340.398.395,04 | **PROGRAM FINANC SEMANA** | $ 15.678.246.912,74 | **PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:** | $ 15.998.211.135,45 |

| MINISTERIO DEL INTERIOR | INFORME DE INTERVENTORIA<br>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023<br>INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | ALCALDÍA DE ACACÍAS | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DEL INTERIOR | | ACACÍAS - META | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 |
| Versión: 01 | | | |

INFORMACIÓN GENERAL


| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

## 3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSION SEMANAL BASICA | % PROGRAMADO | 0,39% | 0,70% | 0,49% | 0,75% | 2,71% | 4,53% | 4,43% | 0,76% | 1,04% | 0,98% | 1,41% |
| | MILES DE PESOS | $ 62.593.060,61 | $112.167.803,88 | $78.662.624,68 | $119.301.956,79 | $ 434.271.991,74 | $ 724.071.829,56 | $ 709.074.751,21 | $ 120.873.809,69 | $ 165.984.861,46 | $ 157.245.577,72 | $ 225.394.005,23 |
| INVERSION SEMANAL ACUMULADO | % EJECUTADO | 0,39% | 0,70% | 0,49% | 0,75% | 2,71% | 4,53% | 4,43% | 0,76% | 1,04% | 0,98% | 1,41% |
| | MILES DE PESOS | $ 62.593.060,61 | $112.167.803,88 | $78.662.624,68 | $119.301.956,79 | $ 434.271.991,74 | $ 724.071.829,56 | $ 709.074.751,21 | $ 120.873.809,69 | $ 165.984.861,46 | $ 157.245.577,72 | $ 225.394.005,23 |
| INVERSION MENSUAL BASICA | % EJECUTADO | 5,04% | | | | | 10,75% | | | | 0,98% | 1,41% |
| | MILES DE PESOS | $806.997.437,71 | | | | | $1.720.005.251,93 | | | | $157.245.577,72 | $225.394.005,23 |
| INVERSION MENSUAL ACUMULADA | % PROGRAMADO | 51,49% | | | | | 62,24% | | | | 63,23% | 64,63% |
| | MILES DE PESOS | $ 8.237.753.560,17 | | | | | $ 9.957.758.812,09 | | | | $ 10.115.004.389,81 | $ 10.340.398.395,04 |

| EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA: | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJECUTADO REAL OBRA | 0,19% | 0,39% | 0,70% | 0,49% | 0,75% | 2,71% |
| PROGRAMADO CONTRATISTA | 0,19% | 0,39% | 0,70% | 0,49% | 0,75% | 2,71% |
| PROGRESIVO REAL DE OBRA | 46,45% | 46,84% | 47,54% | 48,03% | 48,78% | 51,49% |
| PROGRESIVO PROGRAMADO CONTRATISTA | 54,00% | 56,00% | 58,00% | 61,00% | 65,00% | 70,00% |

| Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,53% | 4,43% | 0,76% | 1,04% | 1,04% | 1,41% |
| 4,53% | 4,43% | 0,76% | 1,04% | 1,04% | 1,41% |
| 56,02% | 60,45% | 61,21% | 62,24% | 63,23% | 64,63% |
| 75,00% | 80,00% | 86,00% | 92,00% | 98,00% | 98,00% |

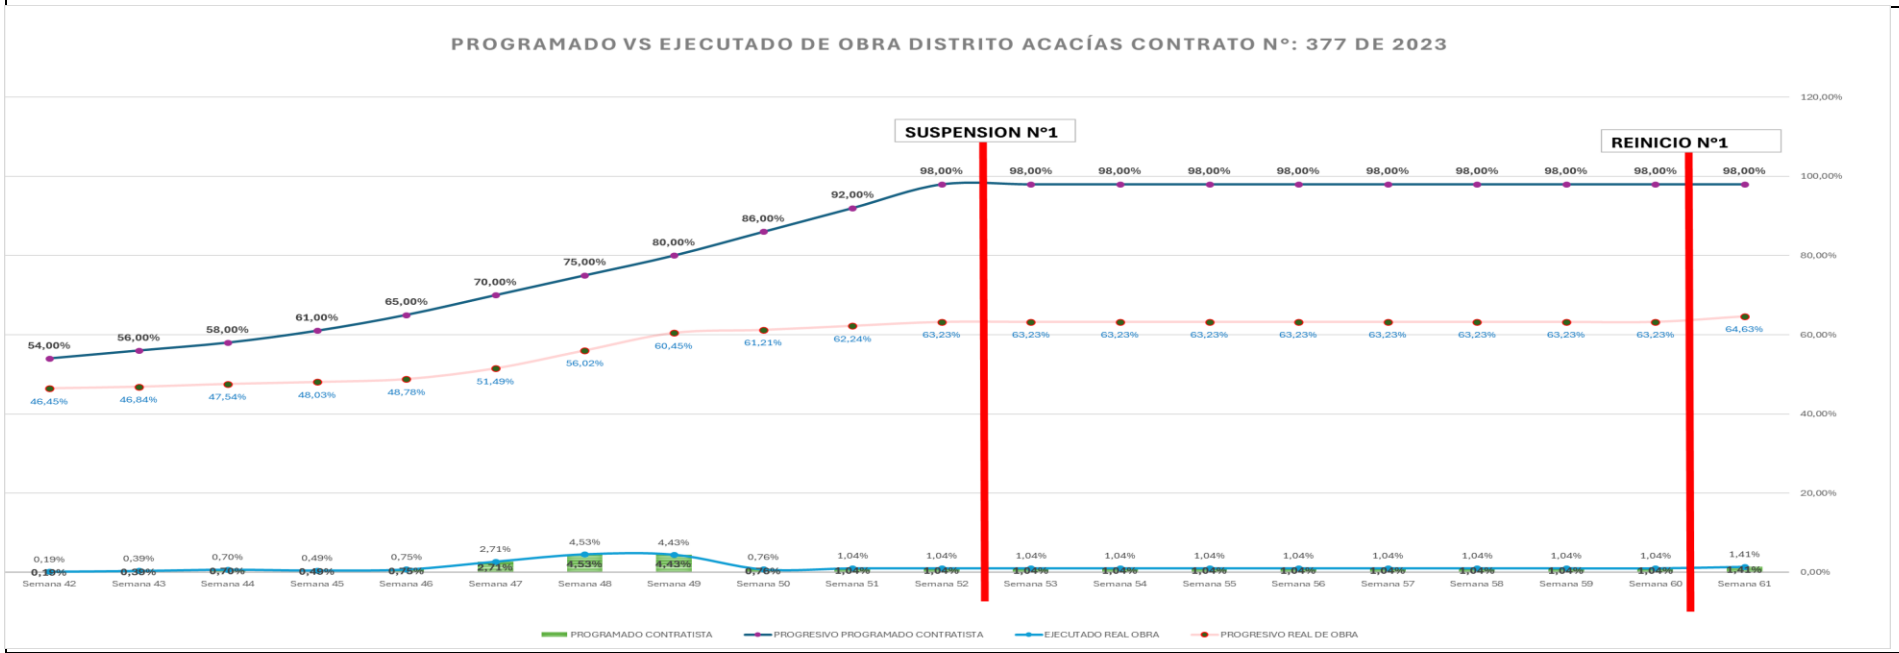


VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 JUL - AL - 19 JUL | $ 225.394.005,23 | 64,63% | $ 10.340.398.395,04 | 16 JUL - AL - 19 JUL | $ 15.678.246.912,74 | 98,00% | $ 15.998.211.135,45 | 16 JUL - AL - 19 JUL | $ 15.452.852.907,51 | -33,37% | $ 5.657.812.740,41 |
| FECHA DE INFORME | AVANCE FINANCIERO SEMANA: | AVANCE FINANCIERO | PROGRAM. ACUMULADO | FECHA DE INFORME | AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACIÓN | AVANCE FINANCIERO PROGRAMACIÓN | PROGRAMADO CONTRATO TOTAL: | FECHA DE INFORME | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO | | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONSULTORÍA |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

## 4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

| ITEM | DESCRIPCION | SEMANA ACTUAL | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | | | | |
| 0 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - | $ 662.923.252,00 | $ 662.923.252,00 |
| 1,0 | ZONA ADMINISTRATIVA | | | $ - |
| 1,1 | PRELIMINARES | $ - | $ - | $ 2.775.496,32 |
| 1,1,1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 2.775.496,32 | $ 2.775.496,32 |
| 1,2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | $ 83.441.770,20 |
| 1,2,1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 53.250.445,03 | $ 53.250.445,03 |
| 1,2,2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 19.320.429,05 | $ 19.320.429,05 |
| 1,2,3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 7.453.639,00 | $ 7.453.639,00 |
| 1,2,4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 3.417.257,12 | $ 3.417.257,12 |
| 1,3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | $ - | $ - | $ 684.996.583,92 |
| 1,3,1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 9.925.543,17 | $ 9.925.543,17 |
| 1,3,2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 89.068.776,67 | $ 89.068.776,67 |
| 1,3,3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22.936.631,46 | $ 22.936.631,46 |
| 1,3,4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 43.902.505,93 | $ 43.902.505,93 |
| 1,3,5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 124.385.605,03 | $ 124.385.605,03 |
| 1,3,6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 45.297.244,10 | $ 45.297.244,10 |
| 1,3,7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 154.967.031,26 | $ 154.967.031,26 |
| 1,3,8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 197.314.937,71 | $ 127.299.959,81 |
| 1,3,9 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 939.257,99 | $ 939.257,99 |
| 1,3,10 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 1.174.718,89 | $ - | $ 1.174.718,89 |
| 1,3,11 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 62.339.091,84 | $ 62.339.091,84 |
| 1,3,12 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 2.760.217,77 | $ 2.760.217,77 |
| 1,4 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS | $ - | $ - | $ 726.806.998,55 |
| 1,4,1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 486.005.115,30 | $ 486.005.115,30 |
| 1,4,2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 45.695.739,93 | $ 45.695.739,93 |
| 1,4,3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 128.014.331,55 | $ 128.014.331,55 |
| 1,4,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 67.091.811,77 | $ 67.091.811,77 |
| 1,5 | MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS | $ - | $ - | $ 508.907.032,92 |
| 1,5,1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 42.538.725,17 | $ 42.538.725,17 |
| 1,5,2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 48.803.714,80 | $ 48.803.714,80 |
| 1,5,4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 38.875.457,37 | $ 38.875.457,37 |
| 1,5,5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 46.727.471,05 | $ 46.727.471,05 |
| 1,5,6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 38.563.021,21 | $ 38.563.021,21 |
| 1,5,7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 200.711.571,45 | $ 200.711.571,45 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,5,8 | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | | $ 1.899.329,53 | $ 1.899.329,53 |
| 1,5,9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | | $ 17.261.160,76 | $ 17.261.160,76 |
| 1,5,10 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | | $ 4.289.607,18 | $ 4.289.607,18 |
| 1,5,11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | | $ 38.311.804,48 | $ 38.311.804,48 |
| 1,5,13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | $ 30.925.169,92 | $ 30.925.169,92 |
| **1,6** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 115.481.431,39** |
| 1,6,1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | $ 1.560.006,39 | $ 11.700.047,93 | $ 13.260.054,32 |
| 1,6,2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 22.106.131,78 | $ 22.106.131,78 |
| 1,6,3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 38.766.491,35 | $ 38.766.491,35 |
| 1,6,4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 41.348.753,94 | $ 41.348.753,94 |
| **1,7** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 270.991.215,54** |
| 1,7,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DOS PARADAS, PUERTAS AUTOMATICAS APERTURA CENTRAL, CAPACIDAD DE 500 KG. | | $ 154.195.650,00 | $ 154.195.650,00 |
| 1,7,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | $ 9.097.664,72 | $ 13.646.497,08 | $ 22.744.161,80 |
| 1,7,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM | $ 8.337.665,80 | $ - | $ 8.337.665,80 |
| 1,7,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | | $ 29.023.312,50 | $ 29.023.312,50 |
| 1,7,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | $ 30.722.292,56 | $ 30.722.292,56 |
| 1,7,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES). | | $ 16.090.338,67 | $ 16.090.338,67 |
| 1,7,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 9.877.794,21 | $ 9.877.794,21 |
| **1,8** | **CIELO RASO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **1,9** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 6.883.857,22** |
| 1,9,1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 3.340.997,40 | $ 3.340.997,40 |
| 1,9,2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 169.669,62 | $ 169.669,62 |
| 1,9,3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 561.480,22 | $ 561.480,22 |
| 1,9,4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 186.039,00 | $ 186.039,00 |
| 1,9,5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 116.422,35 | $ 116.422,35 |
| 1,9,6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.703.202,50 | $ 1.703.202,50 |
| 1,9,7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 176.488,05 | $ 176.488,05 |
| 1,9,8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 103.126,08 | $ 103.126,08 |
| 1,9,9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 242.731,50 | $ 242.731,50 |
| 1,9,10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 283.700,50 | $ 283.700,50 |
| **1,1** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.960.316,99** |
| 1,10,1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.623.871,97 | $ 1.623.871,97 |
| 1,10,2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.082.835,60 | $ 1.082.835,60 |
| 1,10,3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.734.537,69 | $ 2.734.537,69 |
| 1,10,4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.463.623,79 | $ 2.463.623,79 |
| 1.10.5 | TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 808.218,23 | $ 808.218,23 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,10,6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28.809,14 | $ 28.809,14 |
| 1,10,7 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 305.238,24 | $ 305.238,24 |
| 1,10,8 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 738.761,17 | $ 738.761,17 |
| 1,10,9 | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 44.074,51 | $ 44.074,51 |
| 1,10,10 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 449.135,83 | $ 449.135,83 |
| 1,10,11 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.681.210,82 | $ 1.681.210,82 |
| **1,11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 90.244.022,04** |
| 1,11,1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | $ 10.816.325,00 | $ 13.520.406,25 | $ 24.336.731,25 |
| 1,11,2 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 31.289.049,52 | $ 17.066.754,28 | $ 48.355.803,80 |
| 1,11,3 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 1.526.758,63 | $ - | $ 1.526.758,63 |
| 1,11,4 | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 4.155.893,97 | $ - | $ 4.155.893,97 |
| 1,11,11 | ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 1.649.918,69 | $ 8.249.593,43 | $ 9.899.512,11 |
| 1,11,12 | ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.969.322,28 | $ 1.969.322,28 |
| **1,12** | **VOZ Y DATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 75.386.745,39** |
| 1,12,1 | SALIDA PARA TOMA REGULADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.182.183,88 | $ 2.182.183,88 |
| 1,12,4 | TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 12.385.927,24 | $ - | $ 12.385.927,24 |
| 1,12,8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RACK PARA RED DE VOZ Y DATOS | | $ 24.006.144,83 | $ 24.006.144,83 |
| 1,12,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS | | $ 32.695.698,77 | $ 32.695.698,77 |
| 1,12,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2 | | $ 4.116.790,68 | $ 4.116.790,68 |
| **1,13** | **SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS - SDI** | **$ -** | **$ -** | **$ 18.746.536,51** |
| 1,13,19 | TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 18.746.536,51 | $ 18.746.536,51 |
| **1,14** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | **$ -** | **$ -** | **$ 19.332.572,96** |
| 1,14,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 8.274.913,22 | $ 8.274.913,22 |
| 1,14,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 11.057.659,74 | $ 11.057.659,74 |
| **2,00** | **ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **2,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.237.658,70** |
| 2.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | $ - | $ 1.237.658,70 | $ 1.237.658,70 |
| **2,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 26.646.864,22** |
| 2.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 17.028.989,29 | $ 17.028.989,29 |
| 2.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 6.151.766,24 | $ 6.151.766,24 |
| 2.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 2.373.298,09 | $ 2.373.298,09 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 1.092.810,60 | $ 1.092.810,60 |
| **2,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 157.725.525,85** |
| 2.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 1.632.911,94 | $ 1.632.911,94 |
| 2.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 29.857.796,14 | $ 29.857.796,14 |
| 2.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 40.554.606,45 | $ 40.554.606,45 |
| 2.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 23.653.878,14 | $ 23.653.878,14 |
| 2.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 29.038.490,21 | $ 29.038.490,21 |
| 2.3.6 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22.842.525,06 | $ 22.842.525,06 |
| 2.3.7 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 122.366,55 | $ - | $ 122.366,55 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.8 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 8.821.569,60 | $ 8.821.569,60 |
| 2.3.9 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 1.201.381,76 | $ 1.201.381,76 |
| **2,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 145.754.238,69** |
| 2.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 92.723.812,94 | $ 92.723.812,94 |
| 2.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 23.400.389,12 | $ 23.400.389,12 |
| 2.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 17.589.872,57 | $ 17.589.872,57 |
| 2.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 12.040.164,06 | $ 12.040.164,06 |
| **2,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 127.264.674,11** |
| 2.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 19.216.226,34 | $ 19.216.226,34 |
| 2.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 36.053.881,24 | $ 36.053.881,24 |
| 2.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 7.078.414,70 | $ 7.078.414,70 |
| 2.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 12.928.940,23 | $ 12.928.940,23 |
| 2.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 24.574.761,12 | $ 24.574.761,12 |
| 2.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | $ 9.647.334,04 | $ 5.788.400,42 | $ 15.435.734,46 |
| 2.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | | $ 6.282.200,57 | $ 6.282.200,57 |
| 2.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | $ 2.562.531,95 | $ 3.131.983,50 | $ 5.694.515,45 |
| **2,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 52.002.503,88** |
| 2.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | $ 8.947.199,90 | $ - | $ 8.947.199,90 |
| 2.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | $ 2.123.308,36 | $ 3.943.286,95 | $ 6.066.595,31 |
| 2.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 10.638.704,99 | $ 10.638.704,99 |
| 2.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | $ 2.635.000,37 | $ 23.715.003,31 | $ 26.350.003,68 |
| **2,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 21.267.161,57** |
| 2.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | $ 11.277.119,70 | $ 11.277.119,70 |
| 2.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 9.990.041,87 | $ 9.990.041,87 |
| **2,80** | **CIELO RASO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **2,90** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 615.648,67** |
| 2.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 53.061,00 | $ 53.061,00 |
| 2.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 12.568,12 | $ 12.568,12 |
| 2.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105.639,80 | $ 105.639,80 |
| 2.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35.436,00 | $ 35.436,00 |
| 2.9.5 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 272.512,40 | $ 272.512,40 |
| 2.9.6 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 31.144,95 | $ 31.144,95 |
| 2.9.7 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 48.546,30 | $ 48.546,30 |
| 2.9.8 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 56.740,10 | $ 56.740,10 |
| **2,10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.086.568,93** |
| 2.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 107.918,39 | $ 107.918,39 |
| 2.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 70.314,00 | $ 70.314,00 |
| 2.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 232.610,92 | $ 232.610,92 |
| 2.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 86.442,94 | $ 86.442,94 |
| 2.10.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28.809,14 | $ 28.809,14 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.10.6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 76.309,56 | $ 76.309,56 |
| 2.10.7 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105.537,31 | $ 105.537,31 |
| 2.10.8 | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 44.074,51 | $ 44.074,51 |
| 2.10.9 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 69.097,82 | $ 69.097,82 |
| 2.10.10 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 265.454,34 | $ 265.454,34 |
| **2,11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 22.640.814,60** |
| 2.11.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | $ 1.123.233,75 | $ 1.872.056,25 | $ 2 995.290,00 |
| 2.11.2 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 424.099,62 | $ - | $ 424.099,62 |
| 2.11.3 | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 219.888,57 | $ - | $ 219.888,57 |
| 2.11.6 | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 1.097.150,02 | $ - | $ 1.097.150,02 |
| 2.11.10 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 8.481.025,13 | $ 9.423.361,26 | $ 17.904.386,39 |
| **2,12** | **MEDIA TENSIÓN** | **$ -** | **$ -** | **$ 228.417.932,47** |
| 2.12.3 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA | | $ 2.341.423,22 | $ 2.341.423,22 |
| 2.12.6 | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE. | | $ 7.521.340,98 | $ 7.521.340,98 |
| 2.12.7 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA | | $ 16.773.559,56 | $ 16.773.559,56 |
| 2.12.9 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 kVA TIPO SECO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 100.808.339,03 | $ 100.808.339,03 |
| 2.12.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 DUCTOS DE 4" PVC TP | | $ 81.272.331,00 | $ 81.272.331,00 |
| 2.12.16 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | | $ 3.889.943,04 | $ 3.889.943,04 |
| 2.12.17 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 13.656.878,40 | $ 13.656.878,40 |
| 2.12.22 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | | $ 2.154.117,24 | $ 2.154.117,24 |
| **2,13** | **BAJA TENSIÓN** | **$ -** | **$ -** | **$ 206.436.098,26** |
| 2.13.1 | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE. | | $ 7.062.292,00 | $ 7.062.292,00 |
| 2.13.2 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO. | | $ 7.375.267,50 | $ 7.375.267,50 |
| 2.13.3 | ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 4.512.705,34 | $ 40.614.348,10 | $ 45.127.053,44 |
| 2.13.4 | ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 10.708.955,46 | $ 10.708.955,46 |
| 2.13.5 | ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35.724.326,31 | $ 35.724.326,31 |
| 2.13.6 | ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 7.622.902,60 | $ 68.606.123,40 | $ 76.229.026,00 |
| 2.13.7 | ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 13.292.925,39 | $ 13.292.925,39 |
| 2.13.11 | ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 10.916.252,16 | $ 10.916.252,16 |
| **2,14** | **SISTEMA DE RESPALDO** | **$ -** | **$ -** | **$ 60.364.318,08** |
| 2.14.2 | SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE DE 135 KVA CON MOTOR Y GENERADOR, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR, CAMPANA PARA EXOSTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 60.364.318,08 | $ 60.364.318,08 |
| **2,15** | **SISTEMA DE APANTALLAMIENTO** | **$ -** | **$ -** | **$ 19.592.746,60** |
| 2.15.7 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | | $ 5.462.846,16 | $ 5.462.846,16 |
| 2.15.8 | CABLE DE COBRE CU 2/0 PARA APANTALLAMIENTO E INTERCONEXIONES | | $ 14.129.900,44 | $ 14.129.900,44 |
| **3,00** | **ZONA SOCIAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **3,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.236.798,02** |
| 3.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 1.236.798,02 | $ 1.236.798,02 |
| **3,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 32.396.784,97** |
| 3.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 20.485.317,60 | $ 20.485.317,60 |
| 3.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 7.646.793,62 | $ 7.646.793,62 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 2.950.063,19 | $ 2.950.063,19 |
| 3.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 1.314.610,56 | $ 1.314.610,56 |
| **3,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 247.672.349,04** |
| 3.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 2.553.426,03 | $ 2.553.426,03 |
| 3.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22.351.117,48 | $ 22.351.117,48 |
| 3.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 6.477.329,76 | $ 6.477.329,76 |
| 3.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 19.554.445,05 | $ 19.554.445,05 |
| 3.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22.474.173,09 | $ 22.474.173,09 |
| 3.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 20.698.830,04 | $ 20.698.830,04 |
| 3.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 87.781.054,89 | $ 87.781.054,89 |
| 3.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 41.267.320,86 | $ 41.267.320,86 |
| 3.3.9 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 905.512,48 | $ - | $ 905.512,48 |
| 3.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 22.347.976,32 | $ 22.347.976,32 |
| 3.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 1.261.163,04 | $ 1.261.163,04 |
| **3,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 281.658.245,30** |
| 3.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 202.558.716,85 | $ 202.558.716,85 |
| 3.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 18.702.600,05 | $ 18.702.600,05 |
| 3.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38.652.004,33 | $ 38.652.004,33 |
| 3.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 21.744.924,07 | $ 21.744.924,07 |
| **3,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 186.624.234,69** |
| 3.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 27.506.381,27 | $ 27.506.381,27 |
| 3.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 21.711.390,10 | $ 21.711.390,10 |
| 3.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 3.081.454,98 | $ 3.081.454,98 |
| 3.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 13.492.139,55 | $ 13.492.139,55 |
| 3.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 19.274.534,25 | $ 19.274.534,25 |
| 3.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | $ 34.940.802,14 | $ 52.411.203,22 | $ 87.352.005,36 |
| 3.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | | $ 1.363.796,97 | $ 1.363.796,97 |
| 3.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | $ 3.852.759,66 | $ 8.989.772,55 | $ 12.842.532,21 |
| **3,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 43.054.255,53** |
| 3.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | $ 6.237.767,82 | $ - | $ 6.237.767,82 |
| 3.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | $ 4.426.878,80 | $ 632.411,26 | $ 5.059.290,06 |
| 3.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 11.090.300,99 | $ 11.090.300,99 |
| 3.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | $ 4.133.379,33 | $ 16.533.517,33 | $ 20.666.896,66 |
| **3,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 48.162.642,57** |
| 3.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | | $ 1.364.649,71 | $ 1.364.649,71 |
| 3.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | | $ 29.023.312,50 | $ 29.023.312,50 |
| 3.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | $ 1.611.017,10 | $ 1.611.017,10 |
| 3.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 16.163.663,26 | $ 16.163.663,26 |
| **3,80** | **CIELO RASO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **3,90** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.210.505,43** |
| 3.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 409.415,60 | $ 409.415,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 91.118,87 | $ 91.118,87 |
| 3.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 226.237,45 | $ 226.237,45 |
| 3.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 88.590,00 | $ 88.590,00 |
| 3.9.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 116.422,35 | $ 116.422,35 |
| 3.9.6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 885.665,30 | $ 885.665,30 |
| 3.9.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 72.671,55 | $ 72.671,55 |
| 3.9.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 77.344,56 | $ 77.344,56 |
| 3.9.9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 72.819,45 | $ 72.819,45 |
| 3.9.10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 170.220,30 | $ 170.220,30 |
| **3,10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 6.768.000,67** |
| 3.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.232.068,26 | $ 1.232.068,26 |
| 3.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 590.637,60 | $ 590.637,60 |
| 3.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.232.535,77 | $ 1.232.535,77 |
| 3.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 907.650,87 | $ 907.650,87 |
| 3.10.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 152.619,12 | $ 152.619,12 |
| 3.10.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 211.074,62 | $ 211.074,62 |
| 3.10.7 | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 749.266,67 | $ 749.266,67 |
| 3.10.8 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 276.391,28 | $ 276.391,28 |
| 3.10.9 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.415.756,48 | $ 1.415.756,48 |
| **3,11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 14.102.326,15** |
| 3.11.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | | $ 1.747.252,50 | $ 1.747.252,50 |
| 3.11.8 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 6.177.536,83 | $ 6.177.536,83 | $ 12.355.073,65 |
| **3,12** | **VOZ Y DATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 6.231.258,13** |
| 3.12.1 | TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.657.484,80 | $ 1.657.484,80 |
| 3.12.2 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40X0.40M EN CONCRETO 3000 PS ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | $ 2.931.442,86 | $ - | $ 2.931.442,86 |
| 3.12.3 | TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.642.330,47 | $ 1.642.330,47 |
| **4,00** | **ZONA ARMERILLO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **4,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 364.928,57** |
| 4.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 364.928,57 | $ 364.928,57 |
| **4,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 8.226.296,46** |
| 4.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 5.284.073,87 | $ 5.284.073,87 |
| 4.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | $ - | $ 1.878.442,97 | $ 1.878.442,97 |
| 4.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 724.679,07 | $ 724.679,07 |
| 4.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 339.100,55 | $ 339.100,55 |
| **4,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 65.860.621,06** |
| 4.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 584.326,33 | $ 584.326,33 |
| 4.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 10.639.488,79 | $ 10.639.488,79 |
| 4.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 25.079.310,80 | $ 25.079.310,80 |
| 4.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 6.814.152,00 | $ 6.814.152,00 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 10.040.813,90 | $ 10.040.813,90 |
| 4.3.6 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 8.533.907,05 | $ 8.533.907,05 |
| 4.3.7 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 3.822.680,16 | $ 3.822.680,16 |
| 4.3.8 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 345.942,03 | $ 345.942,03 |
| **4,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 111.839.604,94** |
| 4.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 58.049.688,60 | $ 58.049.688,60 |
| 4.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 6.063.709,30 | $ 6.063.709,30 |
| 4.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 43.226.243,40 | $ 43.226.243,40 |
| 4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 4.499.963,64 | $ 4.499.963,64 |
| **4,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 53.640.719,08** |
| 4.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 6.381.479,04 | $ 5.549.112,21 |
| 4.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 15.679.866,29 | $ 15.679.866,29 |
| 4.5.3 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1.652.374,41 | $ 1.652.374,41 |
| 4.5.4 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 4.515.452,17 | $ 4.515.452,17 |
| 4.5.5 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 9.401.871,52 | $ 9.401.871,52 |
| 4.5.6 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | $ 5.396.840,14 | $ 5.396.840,14 | $ 10.793.680,28 |
| 4.5.10 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | | $ 3.913.245,98 | $ 3.913.245,98 |
| 4.5.12 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | $ 2.135.116,22 | $ 2.135.116,22 |
| **4,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 22.604.285,89** |
| 4.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | $ 3.042.703,44 | $ - | $ 3.042.703,44 |
| 4.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | $ 1.799.032,22 | $ 317.476,27 | $ 2.116.508,49 |
| 4.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | $ 1.855.811,07 | $ 5.508.214,78 | $ 7.364.025,85 |
| 4.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 10.081.048,11 | $ 10.081.048,11 |
| **4,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 9.653.298,89** |
| 4.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 9.653.298,89 | $ 9.653.298,89 |
| **4,80** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 308.638,04** |
| 4.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 79.514,60 | $ 79.514,60 |
| 4.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28.278,27 | $ 28.278,27 |
| 4.8.3 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38.807,45 | $ 38.807,45 |
| 4.8.4 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 136.256,20 | $ 136.256,20 |
| 4.8.5 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 25.781,52 | $ 25.781,52 |
| **4,90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.363.785,53** |
| 4.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 257.805,04 | $ 257.805,04 |
| 4.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 140.628,00 | $ 140.628,00 |
| 4.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 362.510,52 | $ 362.510,52 |
| 4.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 86.442,94 | $ 86.442,94 |
| 4.9.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 76.309,56 | $ 76.309,56 |
| 4.9.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105.537,31 | $ 105.537,31 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9.7 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 69.097,82 | $ 69.097,82 |
| 4.9.8 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 265.454,34 | $ 265.454,34 |
| **4,10** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 3.906.146,30** |
| 4.10.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | | $ 416.012,50 | $ 416.012,50 |
| 4.10.7 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 3.490.133,80 | $ 3.490.133,80 |
| **4,11** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **5,00** | **ZONA ALOJAMIENTOS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **5,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 5.204.668,00** |
| 5.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 5.204.668,00 | $ 5.204.668,00 |
| **5,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 175.986.159,51** |
| 5.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2 00 M INCLUYE CARGUE | | $ 115.728.387,56 | $ 115.728.387,56 |
| 5.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 38.123.442,68 | $ 38.123.442,68 |
| 5.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 14.707.651,96 | $ 14.707.651,96 |
| 5.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 7.426.677,31 | $ 7.426.677,31 |
| **5,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.037.083.210,15** |
| 5.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 18.666.424,74 | $ 18.666.424,74 |
| 5.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 169.566.368,93 | $ 169.566.368,93 |
| 5.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 42.399.912,18 | $ 42.399.912,18 |
| 5.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 79.840.009,95 | $ 79.840.009,95 |
| 5.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 182.106.902,52 | $ 182.106.902,52 |
| 5.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 75.589.860,42 | $ 75.589.860,42 |
| 5.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 181.267.117,68 | $ 181.267.117,68 |
| 5.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 162.717.181,85 | $ 162.717.181,85 |
| 5.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 120.561.451,20 | $ 120.561.451,20 |
| 5.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 4.367.980,68 | $ 4.367.980,68 |
| **5,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 798.910.130,41** |
| 5.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 526.023.258,39 | $ 526.023.258,39 |
| 5.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 58.621.002,42 | $ 58.621.002,42 |
| 5.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 128.511.485,68 | $ 128.511.485,68 |
| 5.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 85.754.383,92 | $ 85.754.383,92 |
| **5,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 392.433.371,03** |
| 5.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 66.084.881,79 | $ 66.084.881,79 |
| 5.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 65.411.361,29 | $ 65.411.361,29 |
| 5.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 39.656.985,81 | $ 39.656.985,81 |
| 5.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 71.825.656,76 | $ 71.825.656,76 |
| 5.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 79.020.909,53 | $ 79.020.909,53 |
| 5.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 25.195.954,82 | $ 25.195.954,82 |
| 5.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | | $ 45.237.621,03 | $ 45.237.621,03 |
| **5,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 103.762.722,09** |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 2.752.246,52 | $ 2.752.246,52 |
| 5.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | $ 4.826.486,24 | $ 43.438.376,19 | $ 48.264.862,43 |
| 5.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 52.745.613,14 | $ 52.745.613,14 |
| **5,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 93.061.714,35** |
| 5.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | | $ 8.187.898,25 | $ 8.187.898,25 |
| 5.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | | $ 58.046.625,00 | $ 58.046.625,00 |
| 5.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | $ 13.413.595,55 | $ 13.413.595,55 | $ 26.827.191,10 |
| **5,80** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 22.306.434,32** |
| 5.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.296.534,00 | $ 1.296.534,00 |
| 5.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 251.362,40 | $ 251.362,40 |
| 5.8.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 6.195.353,67 | $ 6.195.353,67 |
| 5.8.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.001.067,00 | $ 1.001.067,00 |
| 5.8.5 | TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 478.145,83 | $ 478.145,83 |
| 5.8.6 | ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35.364,05 | $ 35.364,05 |
| 5.8.7 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38.807,45 | $ 38.807,45 |
| 5.8.8 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 9.401.677,80 | $ 9.401.677,80 |
| 5.8.9 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.411.904,40 | $ 1.411.904,40 |
| 5.8.10 | BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 64.708,20 | $ 64.708,20 |
| 5.8.11 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 25.781,52 | $ 25.781,52 |
| 5.8.12 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 970.926,00 | $ 970.926,00 |
| 5.8.13 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.134.802,00 | $ 1.134.802,00 |
| **5,90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 21.309.225,42** |
| 5.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4.919.279,85 | $ 4.919.279,85 |
| 5.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 928.144,80 | $ 928.144,80 |
| 5.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4.984.519,65 | $ 4.984.519,65 |
| 5.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.852.617,02 | $ 2.852.617,02 |
| 5.9.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 763.095,60 | $ 763.095,60 |
| 5.9.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 5.804.552,05 | $ 1.055.373,10 |
| 5.9.7 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.381.956,40 | $ 1.381.956,40 |
| 5.9.8 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4.424.239,00 | $ 4.424.239,00 |
| **5,10** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | | **$ 11.024.331,25** |
| 5.10.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | | $ 11.024.331,25 | $ 11.024.331,25 |
| **5,11** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **6,00** | **APARTAMENTO FISCAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **6,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 770.176,72** |
| 6.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 770.176,72 | $ 770.176,72 |
| **6,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 16.425.532,74** |
| 6.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 10.439.545,46 | $ 10.439.545,46 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 3.836.112,12 | $ 3.836.112,12 |
| 6.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 1.479.930,95 | $ 1.479.930,95 |
| 6.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 669.944,21 | $ 669.944,21 |
| **6,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 87.553.712,78** |
| 6.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 1.008.563,26 | $ 1.008.563,26 |
| 6.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 19.422.912,91 | $ 19.422.912,91 |
| 6.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 16.875.071,14 | $ 16.875.071,14 |
| 6.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 9.337.412,25 | $ 9.337.412,25 |
| 6.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 19.416.043,55 | $ 19.416.043,55 |
| 6.3.6 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 11.609.732,21 | $ 11.609.732,21 |
| 6.3.8 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 9.409.674,24 | $ 9.409.674,24 |
| 6.3.9 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 474.303,22 | $ 474.303,22 |
| **6,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 69.070.906,32** |
| 6.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 46.942.403,36 | $ 46.942.403,36 |
| 6.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 8.289.582,46 | $ 8.289.582,46 |
| 6.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 7.723.483,42 | $ 7.723.483,42 |
| 6.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 6.115.437,08 | $ 6.115.437,08 |
| **6,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 66.636.246,88** |
| 6.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 8.823.547,02 | $ 8.823.547,02 |
| 6.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 26.764.648,75 | $ 26.764.648,75 |
| 6.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 2.768.843,60 | $ 2.768.843,60 |
| 6.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 5.666.494,89 | $ 5.666.494,89 |
| 6.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 10.802.092,80 | $ 10.802.092,80 |
| 6.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 4.773.177,15 | $ 4.773.177,15 |
| 6.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | | $ 5.572.384,88 | $ 5.572.384,88 |
| 6.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | $ 1.465.057,80 | $ 1.465.057,80 |
| **6,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 18.967.788,44** |
| 6.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | | $ 575.741,57 | $ 575.741,57 |
| 6.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 4.657.758,96 | $ 4.657.758,96 |
| 6.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 13.734.287,91 | $ 13.734.287,91 |
| **6,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.359.111,03** |
| 6.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM.EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | | $ 1.705.812,14 | $ 1.705.812,14 |
| 6.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 9.653.298,89 | $ 9.653.298,89 |
| **6,80** | **CIELO RASO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **6,90** | **RED HIDRÁULICA** | | | **$ 958.020,28** |
| 6.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 216.704,20 | $ 216.704,20 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 56.556,54 | $ 56.556,54 |
| 6.9.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 77.614,90 | $ 77.614,90 |
| 6.9.6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 408.768,60 | $ 408.768,60 |
| 6.9.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 41.526,60 | $ 41.526,60 |
| 6.9.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 51.563,04 | $ 51.563,04 |
| 6.9.9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 48.546,30 | $ 48.546,30 |
| 6.9.10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 56.740,10 | $ 56.740,10 |
| **6,10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.269.199,92** |
| 6.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 462.550,20 | $ 462.550,20 |
| 6.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 323.444,40 | $ 323.444,40 |
| 6.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 514.764,94 | $ 514.764,94 |
| 6.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 129.664,41 | $ 129.664,41 |
| 6.10.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 152.619,12 | $ 152.619,12 |
| 6.10.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105.537,31 | $ 105.537,31 |
| 6.10.7 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 138.195,64 | $ 138.195,64 |
| 6.10.8 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 442.423,90 | $ 442.423,90 |
| **6,11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 624.018,75** |
| 6.11.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | | $ 624.018,75 | $ 624.018,75 |
| **6,12** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **7,00** | **GARITAS Y SHUT DE BASURAS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **7,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 268.797,17** |
| 7.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 268.797,17 | $ 268.797,17 |
| **7,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 9.297.655,57** |
| 7.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 6.230.950,77 | $ 6.230.950,77 |
| 7.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 1.924.413,72 | $ 1.924.413,72 |
| 7.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 742.430,37 | $ 742.430,37 |
| 7.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 399.860,71 | $ 399.860,71 |
| **7,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 100.790.866,41** |
| 7.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 2.113.180,16 | $ 2.113.180,16 |
| 7.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 10.703.662,07 | $ 10.703.662,07 |
| 7.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 8.386.108,09 | $ 8.386.108,09 |
| 7.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 7.687.322,94 | $ 7.687.322,94 |
| 7.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 41.215.611,54 | $ 41.215.611,54 |
| 7.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 3.211.422,13 | $ 3.211.422,13 |
| 7.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 12.931.351,24 | $ 12.931.351,24 |
| 7.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 5.352.538,88 | $ 5.352.538,88 |
| 7.3.9 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 774.475,88 | $ 774.475,88 |
| 7.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 8.233.464,96 | $ 8.233.464,96 |
| 7.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 181.728,52 | $ 181.728,52 |
| **7,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 69.105.917,09** |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 61.169.136,52 | $ 61.169.136,52 |
| 7.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 3.281.128,51 | $ 3.281.128,51 |
| 7.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.255.088,73 | $ 2.255.088,73 |
| 7.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 2.400.563,33 | $ 2.400.563,33 |
| **7,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 30.231.084,66** |
| 7.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 5.294.410,43 | $ 5.294.410,43 |
| 7.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 8.005.199,95 | $ 8.005.199,95 |
| 7.5.3 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1.027.151,66 | $ 1.027.151,66 |
| 7.5.4 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 4.531.881,56 | $ 4.531.881,56 |
| 7.5.5 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 9.477.036,08 | $ 9.477.036,08 |
| 7.5.6 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 1.895.404,98 | $ 1.895.404,98 |
| **7,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 14.417.821,57** |
| 7.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 531.052,34 | $ 531.052,34 |
| 7.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 3.725.126,79 | $ 3.725.126,79 |
| 7.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 10.161.642,44 | $ 10.161.642,44 |
| **7,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 22.632.592,64** |
| 7.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | $ 4.027.542,75 | $ 4.027.542,75 |
| 7.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 18.605.049,89 | $ 18.605.049,89 |
| **7,80** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 531.772,66** |
| 7.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 69.210,00 | $ 69.210,00 |
| 7.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 18.852,18 | $ 18.852,18 |
| 7.8.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 315.049,67 | $ 315.049,67 |
| 7.8.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35.436,00 | $ 35.436,00 |
| 7.8.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38.807,45 | $ 38.807,45 |
| 7.8.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 41.526,60 | $ 41.526,60 |
| 7.8.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 12.890,76 | $ 12.890,76 |
| **7,90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.612.427,43** |
| 7.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 224.829,98 | $ 224.829,98 |
| 7.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 84.376,80 | $ 84.376,80 |
| 7.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 885.129,85 | $ 885.129,85 |
| 7.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 172.885,88 | $ 172.885,88 |
| 7.9.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28.809,14 | $ 28.809,14 |
| 7.9.6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 76.309,56 | $ 76.309,56 |
| 7.9.7 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105.537,31 | $ 105.537,31 |
| 7.9.8 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 34.548,91 | $ 34.548,91 |
| **8,00** | **URBANISMO Y PAISAJISMO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 18.826.792,27** |
| 8.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 18.826.792,27 | $ 18.826.792,27 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 198.547.239,66** |
| 8.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 148.941.915,83 | $ 148.941.915,83 |
| 8.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 28.898.483,10 | $ 28.898.483,10 |
| 8.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 11.148.749,61 | $ 11.148.749,61 |
| 8.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 9.558.091,12 | $ 9.558.091,12 |
| **8,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 691.376.853,65** |
| 8.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 680.379,98 | $ 680.379,98 |
| 8.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1.650.950,45 | $ 1.650.950,45 |
| 8.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 5.006.631,70 | $ 5.006.631,70 |
| 8.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 979.183,72 | $ 979.183,72 |
| 8.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1.749.719,36 | $ 1.749.719,36 |
| 8.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 616.566.062,49 | $ 616.566.062,49 |
| 8.3.7 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 58.873.087,76 | $ 58.873.087,76 |
| 8.3.8 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa | | $ 2.431.371,50 | $ 2.431.371,50 |
| 8.3.9 | SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.605.654,79 | $ 2.605.654,79 |
| 8.3.10 | PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 833.811,90 | $ 833.811,90 |
| **8,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 282.125.097,37** |
| 8.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 25.856.131,99 | $ 25.856.131,99 |
| 8.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 256.268.965,38 | $ 256.268.965,38 |
| **8,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8,70** | **SIMBOLOS INSTITUCIONALES - POLICIA** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8,80** | **PAISAJISMO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8,90** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.238.990,13** |
| 8.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 279.300,80 | $ 279.300,80 |
| 8.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 12.568,12 | $ 12.568,12 |
| 8.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.047.423,31 | $ 1.047.423,31 |
| 8.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35.436,00 | $ 35.436,00 |
| 8.9.5 | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 572.494,86 | $ 572.494,86 |
| 8.9.6 | ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 123.401,50 | $ 123.401,50 |
| 8.9.7 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38.807,45 | $ 38.807,45 |
| 8.9.8 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 51.908,25 | $ 51.908,25 |
| 8.9.9 | BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 77.649,84 | $ 77.649,84 |
| **8,10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 118.877.770,83** |
| 8.10.1 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 9.694.135,49 | $ 9.694.135,49 |
| 8.10.2 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.080.536,75 | $ 1.080.536,75 |
| 8.10.3 | TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 10.787.273,75 | $ 10.787.273,75 |
| 8.10.4 | ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4.286.687,90 | $ 4.286.687,90 |
| 8.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 12.956.594,52 | $ 12.956.594,52 |
| 8.10.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 12.310.654,90 | $ 12.310.654,90 |
| 8.10.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 12.706.327,76 | $ 12.706.327,76 |
| 8.10.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 17.025.021,00 | $ 17.025.021,00 |
| 8.10.9 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | | $ 24.904.442,08 | $ 24.904.442,08 |
| 8.10.10 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | | $ 13.126.096,68 | $ 13.126.096,68 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8,11** | **RED CONTRA INCENDIO - RCI** | **$ -** | **$ -** | **$ 66.200.794,52** |
| 8.11.1 | TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.766.943,76 | $ 2.766.943,76 |
| 8.11.2 | TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.218.666,55 | $ 2.218.666,55 |
| 8.11.3 | TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 17.857.737,30 | $ 17.857.737,30 |
| 8.11.4 | BUJE 2 1/2"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 237.084,84 | $ 237.084,84 |
| 8.11.5 | BUJE 4"X2 1/2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 222.541,56 | $ 222.541,56 |
| 8.11.6 | ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 356.866,32 | $ 356.866,32 |
| 8.11.7 | ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 161.099,68 | $ 161.099,68 |
| 8.11.8 | ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.023.035,16 | $ 1.023.035,16 |
| 8.11.9 | UNION PRESIÓN 2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 229.169,07 | $ 229.169,07 |
| 8.11.10 | UNION PRESIÓN 2 1/2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 165.453,80 | $ 165.453,80 |
| 8.11.11 | UNION PRESIÓN 4" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 772.227,12 | $ 772.227,12 |
| 8.11.12 | GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 22.214.430,56 | $ 22.214.430,56 |
| 8.11.13 | SIAMESA TIPO YEE 4"X2 1/2" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 7.202.266,52 | $ 7.202.266,52 |
| 8.11.14 | VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 599.816,68 | $ 599.816,68 |
| 8.11.16 | ANCLAJE DE TECHO PARA TUBERIA DE 2" A 4", INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE,SOPORTES DE TUBERIA. | | $ 10.173.455,60 | $ 10.173.455,60 |
| **8,12** | **RED DE GAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 4.711.910,19** |
| 8.12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 20-25mm | | $ 1.717.536,91 | $ 1.717.536,91 |
| 8.12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 12-16mm | | $ 1.242.194,76 | $ 1.242.194,76 |
| 8.12.5 | TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" TIPO PESADO | | $ 695.969,84 | $ 695.969,84 |
| 8.12.6 | TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO | | $ 474.344,98 | $ 474.344,98 |
| 8.12.7 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 3/4" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA | | $ 361.025,22 | $ 361.025,22 |
| 8.12.8 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA | | $ 220.838,48 | $ 220.838,48 |
| **9,00** | **CERRAMIENTO PERIMETRAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **9,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **9,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **9,30** | **CERRAMIENTO TIPO 1** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **9,40** | **CERRAMIENTO TIPO 2** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **9,50** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **INP** | **ITEMS NO PREVISTOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 830.009.817,19** |
| INP01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENVOLVENTE TIPO CORTASOL LINEAL CON SEPARACION VARIABLE Y TRANSMITANCIA TERMICA MEDIA/BAJA. INCLUYE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE SOPORTE, ANCLAJES , APLICACIÓN DE ADITIVO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, RESINAS ALQUIDICAS Y/O PIGMENTOS PROTECTORES INHIBIDORES DE CORROSION | | $ 830.009.817,19 | $ 830.009.817,19 |
| | **PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT** | | **$ 40.892.801,82** | **$ 40.892.801,82** |
| | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA** | | **$ 67.091.651,99** | **$ 67.091.651,99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AVANCE TOTAL EJECUTADO** | **64,63%** | SUBTOTAL | **$ 225.453.223,64** | **$ 10.856.231.890,84** | **$ 10.340.398.395,04** |
| | | A.I.U | **$ 74.399.563,80** | **$ 3.582.556.523,98** | **$ 3.412.331.470,36** |
| | | **VALOR TOTAL** | **$ 299.852.787,44** | **$ 14.438.788.414,82** | **$ 13.752.729.865,40** |
| **AVANCE PROGRAMADO** | **98,00%** | | | | |
| **PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO** | **-33,37%** | | | | |

**INFORMACIÓN GENERAL**

| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

## 6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

**ACTA PARCIAL**

| CONCEPTO | VIGENTE | DESDE | HASTA | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | 24-mar-23 | 24-mar-24 | $ 628.782.310,00 | PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100008254 |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL | | 24-mar-23 | 24-mar-29 | $ 10.689.214.621,60 | PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100032073 |

| ACTAS REALIZADAS | | | CONTRATOS ADICIONALES | | | PRORROGAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | FECHA | OBSERVACION | Nº | VALOR | CAUSA | Nº | TIEMPO | CAUSAL |
| ACTA PARCIAL No. 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS | 29-jul.-2023 | N/A | 01 | $ 662.923.252,00 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 2 FASE II OBRA | 16-jul.-2024 | N/A | 02 | $ 2.056.234.178,94 | | | | } |
| ACTA PARCIAL No. 3 FASE II OBRA | 26-sep.-2024 | N/A | 03 | $ 4.683.269.120,00 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 4 FASE II OBRA | | N/A | 04 | $ 2.256.534.524,05 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 5 FASE II OBRA | | N/A | 05 | $ 1.119.505.182,37 | | | | |

## 7. INFORMACION FINANCIERA

| Nº | CONVENIO | CONCEPTO | FECHA | PORCENTAJE | VALOR | AMORTIZACION | NETO PAGADO | ACUMULADO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META" | | 19-jul.-2025 | 64,63% | $ 10.340.398.395,04 | $ 4.046.217.206,50 | $ 10.115.543.016,26 | $ 10.340.398.395,04 | $ 5.882.668.119,19 |

## 8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

°Se hace seguimiento a la elaboracion del menson en concreto en zona administrativa.
°Se hace verificacion de la aplicación de la pintura tipo vinilo en la zona administrativa.
°Se verifica la instalacion de la carpinteria metalica en zona administrativa.
°Se hace verificacion de las instalaciones electricas en la zona administrativa.
°Se hace seguimiento a la elaboracion del menson en concreto en zona de celdas.
°Se le hace seguimiento a la instalacion del piso grano marmol en la zona de celdas.
°Se hace verificacion de la aplicación de la pintura tipo vinilo en la zona de celdas.
°Se hace verificacion de las instalaciones electricas en la zona de celdas.
°Se hace seguimiento a la elaboracion del menson en concreto en zona social.
°Se le hace seguimiento a la instalacion del piso grano marmol en la zona social.
°Se hace verificacion de la aplicación de la pintura tipo vinilo en la zona social.
°Se hace verificacion de las instalaciones electricas en la zona social.

## OBSERVACIONES

° Se reinicia la ejecucion de la obra, luego del acta de suspension No. 1 del 7 de diciembre de 2024.
°Se prorroga los contratos derivados por un termino de 11 dias, esto con el fin de finalizar actividades que habian quedado inconclusas al momento de la suspension y que requerian ser finalizadas lo mas pronto, para evitar el deterioro de las mismas.
°Se esta a la espera de la solicitud de adicion y prorroga No. 4 para poder llevar acabo el 100% de las actividades.

**JUAN CAMILO ROSADA VARELA**
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA**
**CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**
**NIT.:901,696.564-7**

**Consorcio Interpolicia 2023 - Interventor**

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

**IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**
**SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS**

**Secretario de infraestructura - Supervisor**

**ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO**
**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA**
**CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023**
**NIT.:901.699.813-1**

**Consorcio Policia Acacias 2023 - Contratista**

| INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME SEMANAL No: | 61 | MES: JULIO | FECHA DE INFORME |

**10. REGISTRO FOTOGRÁFICO**











| MINISTERIO DEL INTERIOR | INFORME DE INTERVENTORIA<br>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023<br>INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | ALCALDÍA DE ACACÍAS | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DEL INTERIOR | | ACACÍAS - META | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 |
| Versión: 01 | | | |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No | 374 de 2023 | OBJETO: | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | | DEL 21 DE JULIO 2025 AL 26 DE JULIO DE 2025 |

| INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA: **ING. Deiby Jhoanny Gomez Barrera** | RESIDENTE DE OBRA: **ING. Joe Andres Martino Pérez Díaz** |
|---|---|---|

## 1. LOCALIZACION DEL PROYECTO




**Información geográfica del predio**


Latitud: 4,00° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)



**Localización geográfica del terreno a intervenir**
Fuente: Consorcio Interpolicía 2023

**Características del Predio.**

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

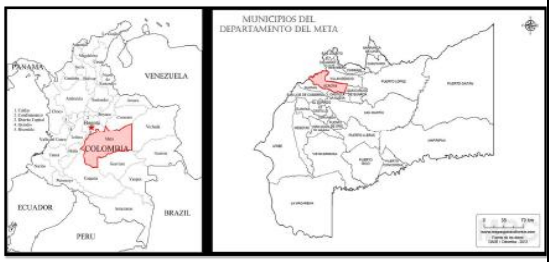


**Localización geográfica del municipio en el país y departamento**.
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.

## 2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CONTRATO:** | martes, 28 de marzo de 2023 | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 11.912.622.964,00 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | jueves, 27 de abril de 2023 | **VALOR ADICIONAL No.1 AL CONTRATO:** | $ 4.085.588.171,45 |
| **PLAZO** | DOCE (12) MESES. | **FECHA DE TERMINACION:** | domingo, 24 de marzo de 2024 |
| **PRORROGA N° 1:** | viernes, 22 de marzo de 2024 | **TIEMPO DE PRORROGA No 1,** | Siete (07) meses Dieciocho (18) dias. |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** | martes, 12 de noviembre de 2024 |
| **PRORROGA N° 2:** | miercoles, 25 de septiembre de 2024 | **TIEMPO DE PRORROGA No 2,** | Treinta y un (31) dias. |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** | viernes, 13 de diciembre de 2024 |
| **SUSPENSION N° 1:** | sabado, 07 de diciembre de 2024 | **TIEMPO DE LA SUSPENSION N°1:** | cuarenta y cinco (45) dias |
| **AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N° 1:** | lunes, 20 de enero de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N° 1:** | sesenta (60) dias |
| **AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N° 1:** | miercoles, 19 de marzo de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N° 1:** | treinta (30) dias |
| **AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N° 1:** | viernes, 18 de abril de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N° 1:** | cuarenta (40) dias |
| **AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N° 1:** | viernes, 30 de mayo de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N° 1:** | cuarenta (40) dias |
| **REINICIO N°1:** | martes, 15 de julio de 2025 | **FECHA DE TERMINACION:** | 20 de julio de 2025 |
| **PRORROGA N° 3:** | martes, 15 de julio de 2025 | **TIEMPO DE PRORROGA No 3,** | once (11) dias |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** | jueves, 31 de julio de 2025 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $ 15.998.211.135,45 | **VALOR DEL ANTICIPO:** | $ 6.399.284.454,18 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023. | **REPRESENTANTE LEGAL:** | ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO. |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 814 DIAS | **PLAZO RESTANTE:** | 12 DIAS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:** | 6,71% | **AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:** | 71,35% | **PROGRAM. SEMANA** | 99,00% | **PROGRAM. ACUMULADO** | 71,35% |
| **AVANCE FINANCIERO SEMANA:** | $ 1.073.690.390,13 | **AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:** | $ 11.414.088.785,17 | **PROGRAM FINANC SEMANA** | $ 15.838.229.024,10 | **PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:** | $ 15.998.211.135,45 |

INFORMACIÓN GENERAL


| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

## 3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSION SEMANAL BASICA | % PROGRAMADO | 4,53% | 4,43% | 0,76% | 1,04% | 0,98% | 1,41% | 6,71% |
| | MILES DE PESOS | $ 724.071.829,56 | $ 709.074.751,21 | $ 120.873.809,69 | $ 165.984.861,46 | $ 157.245.577,72 | $ 225.394.005,23 | $ 1.073.690.390,13 |
| INVERSION SEMANAL ACUMULADO | % EJECUTADO | 4,53% | 4,43% | 0,76% | 1,04% | 0,98% | 1,41% | 6,71% |
| | MILES DE PESOS | $ 724.071.829,56 | $ 709.074.751,21 | $ 120.873.809,69 | $ 165.984.861,46 | $ 157.245.577,72 | $ 225.394.005,23 | $ 1.073.690.390,13 |
| INVERSION MENSUAL BASICA | % EJECUTADO | 10,75% | | | | 0,98% | 8,12% | |
| | MILES DE PESOS | $1.720.005.251,93 | | | | $157.245.577,72 | $1.299.084.395,36 | |
| INVERSION MENSUAL ACUMULADA | % PROGRAMADO | 62,24% | | | | 63,23% | 71,35% | |
| | MILES DE PESOS | $ 9.957.758.812,09 | | | | $ 10.115.004.389,81 | $ 11.414.088.785,17 | |

| EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA: | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJECUTADO REAL OBRA | 0,19% | 0,39% | 0,70% | 0,49% | 0,75% | 2,71% |
| PROGRAMADO CONTRATISTA | 0,19% | 0,39% | 0,70% | 0,49% | 0,75% | 2,71% |
| PROGRESIVO REAL DE OBRA | 46,45% | 46,84% | 47,54% | 48,03% | 48,78% | 51,49% |
| PROGRESIVO PROGRAMADO CONTRATISTA | 54,00% | 56,00% | 58,00% | 61,00% | 65,00% | 70,00% |

| Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 61 | Semana 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,53% | 4,43% | 0,76% | 1,04% | 1,04% | 1,41% | 6,71% |
| 4,53% | 4,43% | 0,76% | 1,04% | 1,04% | 1,41% | 6,71% |
| 56,02% | 60,45% | 61,21% | 62,24% | 63,23% | 64,63% | 71,35% |
| 75,00% | 80,00% | 86,00% | 92,00% | 98,00% | 98,00% | 99,00% |

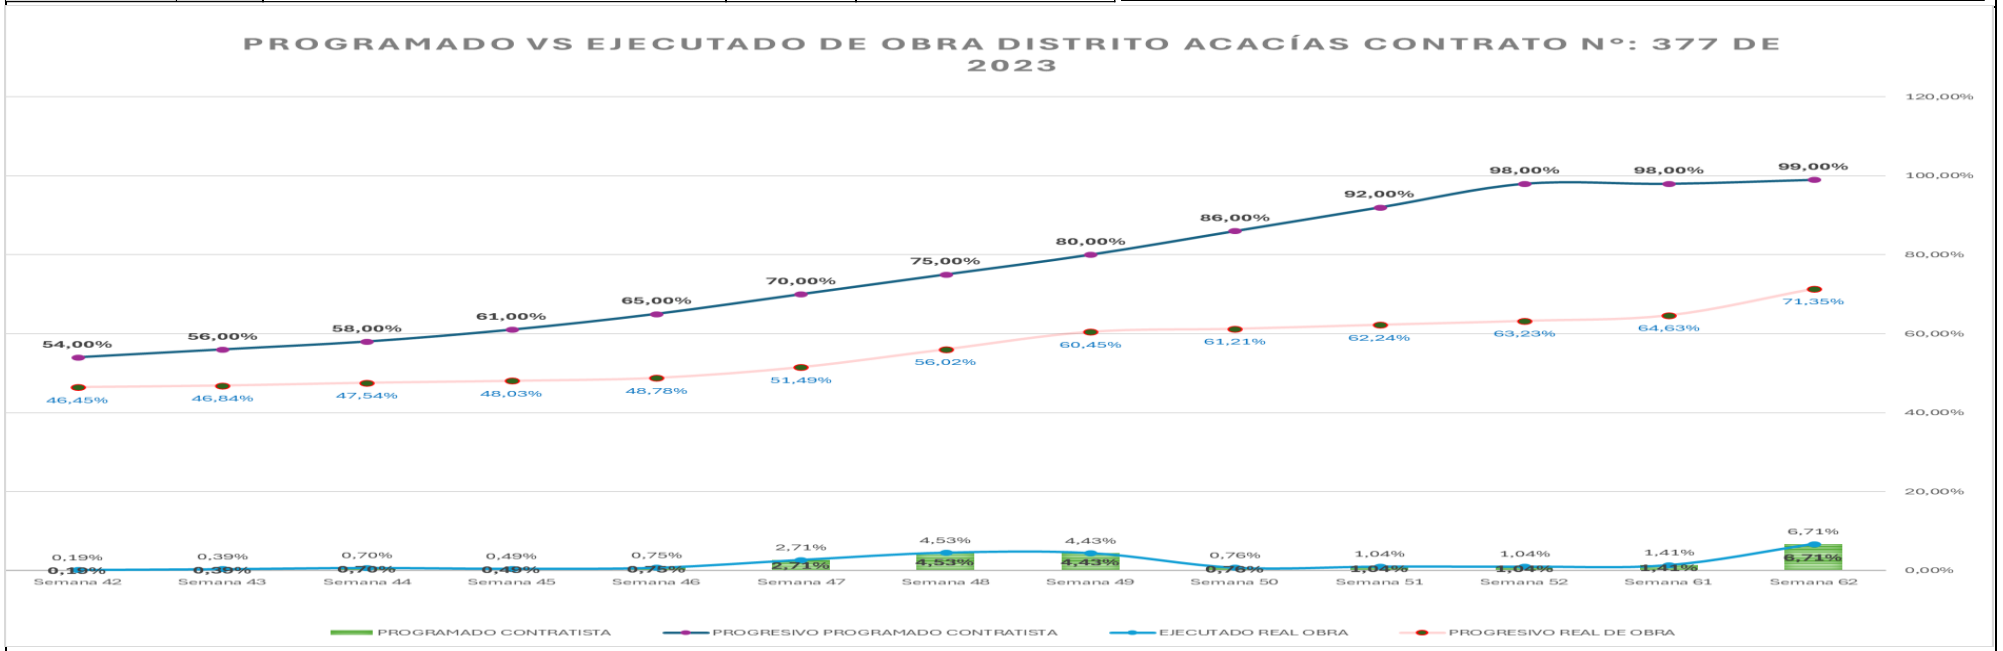


VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 JUL - AL - 26 JUL | $ 1.073.690.390,13 | 71,35% | $ 11.414.088.785,17 | 21 JUL - AL - 26 JUL | $ 15.838.229.024,10 | 99,00% | $ 15.998.211.135,45 | 21 JUL - AL - 26 JUL | $ 14.764.538.633,96 | -27,65% | $ 4.584.122.350,28 |
| FECHA DE INFORME | AVANCE FINANCIERO SEMANA: | AVANCE FINANCIERO | PROGRAM. ACUMULADO | FECHA DE INFORME | AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACIÓN | AVANCE FINANCIERO PROGRAMACIÓN | PROGRAMADO CONTRATO TOTAL: | FECHA DE INFORME | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO | | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONSULTORÍA |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

## 4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

| ITEM | DESCRIPCION | SEMANA ACTUAL | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | | | | |
| 0 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - | $ 662.923.252,00 | $ 662.923.252,00 |
| 1,0 | ZONA ADMINISTRATIVA | | | $ - |
| 1,1 | PRELIMINARES | $ - | $ - | $ 2.775.496,32 |
| 1,1,1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 2.775.496,32 | $ 2.775.496,32 |
| 1,2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | $ 83.441.770,20 |
| 1,2,1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 53.250.445,03 | $ 53.250.445,03 |
| 1,2,2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 19.320.429,05 | $ 19.320.429,05 |
| 1,2,3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 7.453.639,00 | $ 7.453.639,00 |
| 1,2,4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 3.417.257,12 | $ 3.417.257,12 |
| 1,3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | $ - | $ - | $ 684.996.583,92 |
| 1,3,1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 9.925.543,17 | $ 9.925.543,17 |
| 1,3,2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 89.068.776,67 | $ 89.068.776,67 |
| 1,3,3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22.936.631,46 | $ 22.936.631,46 |
| 1,3,4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 43.902.505,93 | $ 43.902.505,93 |
| 1,3,5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 124.385.605,03 | $ 124.385.605,03 |
| 1,3,6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 45.297.244,10 | $ 45.297.244,10 |
| 1,3,7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 154.967.031,26 | $ 154.967.031,26 |
| 1,3,8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 197.314.937,71 | $ 127.299.959,81 |
| 1,3,9 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 939.257,99 | $ 939.257,99 |
| 1,3,10 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1.174.718,89 | $ 1.174.718,89 |
| 1,3,11 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 62.339.091,84 | $ 62.339.091,84 |
| 1,3,12 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 2.760.217,77 | $ 2.760.217,77 |
| 1,4 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS | $ - | $ - | $ 726.806.998,55 |
| 1,4,1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 486.005.115,30 | $ 486.005.115,30 |
| 1,4,2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 45.695.739,93 | $ 45.695.739,93 |
| 1,4,3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 128.014.331,55 | $ 128.014.331,55 |
| 1,4,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 67.091.811,77 | $ 67.091.811,77 |
| 1,5 | MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS | $ - | $ - | $ 518.585.090,91 |
| 1,5,1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 42.538.725,17 | $ 42.538.725,17 |
| 1,5,2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 48.803.714,80 | $ 48.803.714,80 |
| 1,5,4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 38.875.457,37 | $ 38.875.457,37 |
| 1,5,5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 46.727.471,05 | $ 46.727.471,05 |
| 1,5,6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 38.563.021,21 | $ 38.563.021,21 |
| 1,5,7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 200.711.571,45 | $ 200.711.571,45 |

INFORMACIÓN GENERAL

| | INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5,8 | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | | | $ 1.899.329,53 | $ 1.899.329,53 | |
| 1,5,9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | | | $ 17.261.160,76 | $ 17.261.160,76 | |
| 1,5,10 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | | | $ 4.289.607,18 | $ 4.289.607,18 | |
| 1,5,11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | | | $ 6.385.300,75 | $ 38.311.804,48 | $ 44.697.105,22 |
| 1,5,12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | | | $ 3.292.757,25 | $ - | $ 3.292.757,25 |
| 1,5,13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | | | $ 30.925.169,92 | $ 30.925.169,92 |
| **1,6** | **PINTURA** | | | **$ -** | **$ -** | **$ 117.041.437,78** |
| 1,6,1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | | | $ 1.560.006,39 | $ 13.260.054,32 | $ 14.820.060,71 |
| 1,6,2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | | | $ 22.106.131,78 | $ 22.106.131,78 |
| 1,6,3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | | | $ 38.766.491,35 | $ 38.766.491,35 |
| 1,6,4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | | | $ 41.348.753,94 | $ 41.348.753,94 |
| **1,7** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | | | **$ -** | **$ -** | **$ 370.982.254,32** |
| 1,7,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DOS PARADAS, PUERTAS AUTOMATICAS APERTURA CENTRAL, CAPACIDAD DE 500 KG. | | | | $ 154.195.650,00 | $ 154.195.650,00 |
| 1,7,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE | | | $ 88.392.074,32 | $ - | $ 88.392.074,32 |
| 1,7,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | | | $ 9.097.664,72 | $ 22.744.161,80 | $ 31.841.826,52 |
| 1,7,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM | | | $ 2.501.299,74 | $ 8.337.665,80 | $ 10.838.965,54 |
| 1,7,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | | | | $ 29.023.312,50 | $ 29.023.312,50 |
| 1,7,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | | | $ 30.722.292,56 | $ 30.722.292,56 |
| 1,7,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES). | | | | $ 16.090.338,67 | $ 16.090.338,67 |
| 1,7,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | | | $ 9.877.794,21 | $ 9.877.794,21 |
| **1,8** | **CIELO RASO** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **1,9** | **RED HIDRÁULICA** | | | **$ -** | **$ -** | **$ 6.883.857,22** |
| 1,9,1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 3.340.997,40 | $ 3.340.997,40 |
| 1,9,2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 169.669,62 | $ 169.669,62 |
| 1,9,3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 561.480,22 | $ 561.480,22 |
| 1,9,4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 186.039,00 | $ 186.039,00 |
| 1,9,5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 116.422,35 | $ 116.422,35 |
| 1,9,6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 1.703.202,50 | $ 1.703.202,50 |
| 1,9,7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 176.488,05 | $ 176.488,05 |
| 1,9,8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 103.126,08 | $ 103.126,08 |
| 1,9,9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 242.731,50 | $ 242.731,50 |
| 1,9,10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 283.700,50 | $ 283.700,50 |
| **1,1** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | | **$ -** | **$ -** | **$ 11.960.316,99** |
| 1,10,1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 1.623.871,97 | $ 1.623.871,97 |
| 1,10,2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 1.082.835,60 | $ 1.082.835,60 |
| 1,10,3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 2.734.537,69 | $ 2.734.537,69 |
| 1,10,4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | | $ 2.463.623,79 | $ 2.463.623,79 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.5 | TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 808.218,23 | $ 808.218,23 |
| 1,10,6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28.809,14 | $ 28.809,14 |
| 1,10,7 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 305.238,24 | $ 305.238,24 |
| 1,10,8 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 738.761,17 | $ 738.761,17 |
| 1,10,9 | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 44.074,51 | $ 44.074,51 |
| 1,10,10 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 449.135,83 | $ 449.135,83 |
| 1,10,11 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.681.210,82 | $ 1.681.210,82 |
| **1,11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 96.892.508,13** |
| 1,11,1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | $ 2.704.081,25 | $ 24.336.731,25 | $ 27.040.812,50 |
| 1,11,2 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 2.844.459,05 | $ 48.355.803,80 | $ 51.200.262,85 |
| 1,11,3 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.526.758,63 | $ 1.526.758,63 |
| 1,11,4 | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4.155.893,97 | $ 4.155.893,97 |
| 1,11,11 | ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 1.099.945,79 | $ 9.899.512,11 | $ 10.999.457,90 |
| 1,11,12 | ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.969.322,28 | $ 1.969.322,28 |
| **1,12** | **VOZ Y DATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 93.161.790,88** |
| 1,12,1 | SALIDA PARA TOMA REGULADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 2.182.183,88 | $ 2.182.183,88 | $ 4.364.367,76 |
| 1,12,4 | TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 12.385.927,24 | $ 12.385.927,24 |
| 1,12,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS | $ 3.242.489,57 | $ - | $ 3.242.489,57 |
| 1,12,8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RACK PARA RED DE VOZ Y DATOS | | $ 24.006.144,83 | $ 24.006.144,83 |
| 1,12,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS | | $ 32.695.698,77 | $ 32.695.698,77 |
| 1,12,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2 | $ 12.350.372,04 | $ 4.116.790,68 | $ 16.467.162,72 |
| **1,13** | **SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS - SDI** | **$ -** | **$ -** | **$ 70.331.649,03** |
| 1,13,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X16 | $ 5.854.210,73 | $ - | $ 5.854.210,73 |
| 1,13,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X14 SIN BLINDAJE | $ 5.153.162,01 | $ - | $ 5.153.162,01 |
| 1,13,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE DATOS APANTALLADO RS-485 | $ 1.252.739,10 | $ - | $ 1.252.739,10 |
| 1,13,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO DOBLE 5H | $ 961.434,00 | $ - | $ 961.434,00 |
| 1,13,18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO SENCILLO 5H | $ 5.128.946,05 | $ - | $ 5.128.946,05 |
| 1,13,19 | TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 18.746.536,51 | $ 18.746.536,51 | $ 37.493.073,01 |
| 1,13,20 | TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 2.399.879,60 | $ - | $ 2.399.879,60 |
| 1,13,21 | TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTR E INSTALACIÓN | $ 3.819.466,54 | $ - | $ 3.819.466,54 |
| 1,13,22 | ADAPTADOR EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 1.465.777,50 | $ - | $ 1.465.777,50 |
| 1,13,23 | ADAPTADOR EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 325.527,60 | $ - | $ 325.527,60 |
| 1,13,24 | ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 187.908,24 | $ - | $ 187.908,24 |
| 1,13,25 | UNION EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 586.311,00 | $ - | $ 586.311,00 |
| 1,13,26 | UNION EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 217.018,40 | $ - | $ 217.018,40 |
| 1,13,27 | ABRAZADERA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 4.551.016,50 | $ - | $ 4.551.016,50 |
| 1,13,28 | ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 532.349,55 | $ - | $ 532.349,55 |
| 1,13,29 | VARILLA ROSCADA 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 402.829,20 | $ - | $ 402.829,20 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| **1,14** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | | **$ -** | **$ -** | **$ 86.624.897,70** |
| 1,14,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 3.509.879,28 | $ - | $ 3.509.879,28 |
| 1,14,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 5.640.165,57 | $ - | $ 5.640.165,57 |
| 1,14,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/2" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 6.345.763,37 | $ - | $ 6.345.763,37 |
| 1,14,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 4.348.338,61 | $ - | $ 4.348.338,61 |
| 1,14,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 3.896.093,88 | $ - | $ 3.896.093,88 |
| 1,14,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø7/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 3.129.324,70 | $ - | $ 3.129.324,70 |
| 1,14,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1 3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 5.439.959,54 | $ - | $ 5.439.959,54 |
| 1,14,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN TUBERÍA DE COBRE | | $ 2.583.930,04 | $ - | $ 2.583.930,04 |
| 1,14,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 5.516.608,81 | $ 8.274.913,22 | $ 13.791.522,03 |
| 1,14,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 7.371.773,16 | $ 11.057.659,74 | $ 18.429.432,90 |
| 1,14,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 1.685.182,40 | $ - | $ 1.685.182,40 |
| 1,14,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | | $ 2.546.136,45 | $ - | $ 2.546.136,45 |
| 1,14,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA EMT 3/4" (INTERIOR) | | $ 13.463.211,85 | $ - | $ 13.463.211,85 |
| 1,14,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA IMC 3/4" (EXTERIOR) | | $ 1.815.957,09 | $ - | $ 1.815.957,09 |
| **2,00** | **ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **2,10** | **PRELIMINARES** | | **$ -** | **$ -** | **$ 1.237.658,70** |
| 2.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ - | $ 1.237.658,70 | $ 1.237.658,70 |
| **2,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 26.646.864,22** |
| 2.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | | $ 17.028.989,29 | $ 17.028.989,29 |
| 2.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | | $ 6.151.766,24 | $ 6.151.766,24 |
| 2.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | | $ 2.373.298,09 | $ 2.373.298,09 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | | $ 1.092.810,60 | $ 1.092.810,60 |
| **2,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | **$ -** | **$ -** | **$ 157.725.525,85** |
| 2.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | | $ 1.632.911,94 | $ 1.632.911,94 |
| 2.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 29.857.796,14 | $ 29.857.796,14 |
| 2.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 40.554.606,45 | $ 40.554.606,45 |
| 2.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 23.653.878,14 | $ 23.653.878,14 |
| 2.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 29.038.490,21 | $ 29.038.490,21 |
| 2.3.6 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 22.842.525,06 | $ 22.842.525,06 |
| 2.3.7 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 122.366,55 | $ 122.366,55 |
| 2.3.8 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 8.821.569,60 | $ 8.821.569,60 |
| 2.3.9 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | | $ 1.201.381,76 | $ 1.201.381,76 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 145.754.238,69** |
| 2.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 92.723.812,94 | $ 92.723.812,94 |
| 2.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 23.400.389,12 | $ 23.400.389,12 |
| 2.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 17.589.872,57 | $ 17.589.872,57 |
| 2.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 12.040.164,06 | $ 12.040.164,06 |
| **2,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 143.963.773,75** |
| 2.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 19.216.226,34 | $ 19.216.226,34 |
| 2.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 36.053.881,24 | $ 36.053.881,24 |
| 2.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 7.078.414,70 | $ 7.078.414,70 |
| 2.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 12.928.940,23 | $ 12.928.940,23 |
| 2.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 24.574.761,12 | $ 24.574.761,12 |
| 2.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | $ 7.717.867,23 | $ 15.435.734,46 | $ 23.153.601,70 |
| 2.5.9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | $ 1.963.156,43 | $ - | $ 1.963.156,43 |
| 2.5.10 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | $ 253.729,08 | $ - | $ 253.729,08 |
| 2.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | $ 6.282.200,57 | $ 6.282.200,57 | $ 12.564.401,14 |
| 2.5.12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | $ 482.146,33 | $ - | $ 482.146,33 |
| 2.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | $ 5.694.515,45 | $ 5.694.515,45 |
| **2,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 52.002.503,88** |
| 2.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | | $ 8.947.199,90 | $ 8.947.199,90 |
| 2.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 6.066.595,31 | $ 6.066.595,31 |
| 2.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 10.638.704,99 | $ 10.638.704,99 |
| 2.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 26.350.003,68 | $ 26.350.003,68 |
| **2,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 22.404.369,66** |
| 2.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | $ 1.137.208,09 | $ - | $ 1.137.208,09 |
| 2.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | $ 11.277.119,70 | $ 11.277.119,70 |
| 2.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 9.990.041,87 | $ 9.990.041,87 |
| **2,80** | **CIELO RASO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **2,90** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 615.648,67** |
| 2.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 53.061,00 | $ 53.061,00 |
| 2.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 12.568,12 | $ 12.568,12 |
| 2.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105.639,80 | $ 105.639,80 |
| 2.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35.436,00 | $ 35.436,00 |
| 2.9.5 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 272.512,40 | $ 272.512,40 |
| 2.9.6 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 31.144,95 | $ 31.144,95 |
| 2.9.7 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 48.546,30 | $ 48.546,30 |
| 2.9.8 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 56.740,10 | $ 56.740,10 |
| **2,10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.086.568,93** |
| 2.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 107.918,39 | $ 107.918,39 |
| 2.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 70.314,00 | $ 70.314,00 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 232.610,92 | $ 232.610,92 |
| 2.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 86.442,94 | $ 86.442,94 |
| 2.10.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28.809,14 | $ 28.809,14 |
| 2.10.6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 76.309,56 | $ 76.309,56 |
| 2.10.7 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105.537,31 | $ 105.537,31 |
| 2.10.8 | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 44.074,51 | $ 44.074,51 |
| 2.10.9 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 69.097,82 | $ 69.097,82 |
| 2.10.10 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 265.454,34 | $ 265.454,34 |
| **2,11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 23.389.637,10** |
| 2.11.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | $ 748.822,50 | $ 2.995.290,00 | $ 3.744.112,50 |
| 2.11.2 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 424.099,62 | $ 424.099,62 |
| 2.11.3 | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 219.888,57 | $ 219.888,57 |
| 2.11.6 | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.097.150,02 | $ 1.097.150,02 |
| 2.11.10 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 17.904.386,39 | $ 17.904.386,39 |
| **2,12** | **MEDIA TENSIÓN** | **$ -** | **$ -** | **$ 228.417.932,47** |
| 2.12.3 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA | | $ 2.341.423,22 | $ 2.341.423,22 |
| 2.12.6 | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE. | | $ 7.521.340,98 | $ 7.521.340,98 |
| 2.12.7 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA | | $ 16.773.559,56 | $ 16.773.559,56 |
| 2.12.9 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 kVA TIPO SECO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 100.808.339,03 | $ 100.808.339,03 |
| 2.12.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 DUCTOS DE 4" PVC TP | | $ 81.272.331,00 | $ 81.272.331,00 |
| 2.12.16 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | | $ 3.889.943,04 | $ 3.889.943,04 |
| 2.12.17 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 13.656.878,40 | $ 13.656.878,40 |
| 2.12.22 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | | $ 2.154.117,24 | $ 2.154.117,24 |
| **2,13** | **BAJA TENSIÓN** | **$ -** | **$ -** | **$ 221.709.373,38** |
| 2.13.1 | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE. | | $ 7.062.292,00 | $ 7.062.292,00 |
| 2.13.2 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO. | | $ 7.375.267,50 | $ 7.375.267,50 |
| 2.13.3 | ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 45.127.053,44 | $ 45.127.053,44 |
| 2.13.4 | ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 1.189.883,94 | $ 10.708.955,46 | $ 11.898.839,40 |
| 2.13.5 | ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 3.969.369,59 | $ 35.724.326,31 | $ 39.693.695,90 |
| 2.13.6 | ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 76.229.026,00 | $ 76.229.026,00 |
| 2.13.7 | ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 7.384.958,55 | $ 13.292.925,39 | $ 20.677.883,94 |
| 2.13.11 | ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 2.729.063,04 | $ 10.916.252,16 | $ 13.645.315,20 |
| **2,14** | **SISTEMA DE RESPALDO** | **$ -** | **$ -** | **$ 60.364.318,08** |
| 2.14.2 | SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE DE 135 KVA CON MOTOR Y GENERADOR, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR, CAMPANA PARA EXOSTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 60.364.318,08 | $ 60.364.318,08 |
| **2,15** | **SISTEMA DE APANTALLAMIENTO** | **$ -** | **$ -** | **$ 24.891.459,27** |
| 2.15.7 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | | $ 5.462.846,16 | $ 5.462.846,16 |
| 2.15.8 | CABLE DE COBRE CU 2/0 PARA APANTALLAMIENTO E INTERCONEXIONES | $ 5.298.712,67 | $ 14.129.900,44 | $ 19.428.613,11 |
| **3,00** | **ZONA SOCIAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **3,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.236.798,02** |
| 3.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 1.236.798,02 | $ 1.236.798,02 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$** | **32.396.784,97** |
| 3.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 20.485.317,60 | $ | 20.485.317,60 |
| 3.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 7.646.793,62 | $ | 7.646.793,62 |
| 3.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 2.950.063,19 | $ | 2.950.063,19 |
| 3.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 1.314.610,56 | $ | 1.314.610,56 |
| **3,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$** | **247.672.349,04** |
| 3.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 2.553.426,03 | $ | 2.553.426,03 |
| 3.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22.351.117,48 | $ | 22.351.117,48 |
| 3.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 6.477.329,76 | $ | 6.477.329,76 |
| 3.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 19.554.445,05 | $ | 19.554.445,05 |
| 3.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22.474.173,09 | $ | 22.474.173,09 |
| 3.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 20.698.830,04 | $ | 20.698.830,04 |
| 3.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 87.781.054,89 | $ | 87.781.054,89 |
| 3.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 41.267.320,86 | $ | 41.267.320,86 |
| 3.3.9 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 905.512,48 | $ | 905.512,48 |
| 3.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 22.347.976,32 | $ | 22.347.976,32 |
| 3.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 1.261.163,04 | $ | 1.261.163,04 |
| **3,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$** | **281.658.245,30** |
| 3.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 202.558.716,85 | $ | 202.558.716,85 |
| 3.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 18.702.600,05 | $ | 18.702.600,05 |
| 3.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38.652.004,33 | $ | 38.652.004,33 |
| 3.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 21.744.924,07 | $ | 21.744.924,07 |
| **3,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$** | **196.327.215,05** |
| 3.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 27.506.381,27 | $ | 27.506.381,27 |
| 3.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 21.711.390,10 | $ | 21.711.390,10 |
| 3.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 3.081.454,98 | $ | 3.081.454,98 |
| 3.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 13.492.139,55 | $ | 13.492.139,55 |
| 3.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 19.274.534,25 | $ | 19.274.534,25 |
| 3.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 87.352.005,36 | $ | 87.352.005,36 |
| 3.5.8 | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | $ 538.053,69 | $ - | $ | 538.053,69 |
| 3.5.9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | $ 2.968.175,07 | $ - | $ | 2.968.175,07 |
| 3.5.10 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | $ 465.830,72 | $ - | $ | 465.830,72 |
| 3.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | $ 4.091.390,92 | $ 1.363.796,97 | $ | 5.455.187,89 |
| 3.5.12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | $ 1.639.529,96 | $ - | $ | 1.639.529,96 |
| 3.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | $ 12.842.532,21 | $ | 12.842.532,21 |
| **3,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$** | **45.488.659,51** |
| 3.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | $ 1.169.581,47 | $ 6.237.767,82 | $ | 7.407.349,29 |
| 3.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | $ 1.264.822,51 | $ 5.059.290,06 | $ | 6.324.112,57 |
| 3.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 11.090.300,99 | $ | 11.090.300,99 |
| 3.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 20.666.896,66 | $ | 20.666.896,66 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| **3,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 54.704.497,13** |
| 3.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE | | $ 2.447.905,44 | $ - | $ 2.447.905,44 |
| 3.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | | $ 4.093.949,12 | $ 1.364.649,71 | $ 5.458.598,83 |
| 3.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | | | $ 29.023.312,50 | $ 29.023.312,50 |
| 3.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | | $ 1.611.017,10 | $ 1.611.017,10 |
| 3.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | | $ 16.163.663,26 | $ 16.163.663,26 |
| **3,80** | **CIELO RASO** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **3,90** | **RED HIDRÁULICA** | | **$ -** | **$ -** | **$ 2.210.505,43** |
| 3.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 409.415,60 | $ 409.415,60 |
| 3.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 91.118,87 | $ 91.118,87 |
| 3.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 226.237,45 | $ 226.237,45 |
| 3.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 88.590,00 | $ 88.590,00 |
| 3.9.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 116.422,35 | $ 116.422,35 |
| 3.9.6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 885.665,30 | $ 885.665,30 |
| 3.9.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 72.671,55 | $ 72.671,55 |
| 3.9.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 77.344,56 | $ 77.344,56 |
| 3.9.9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 72.819,45 | $ 72.819,45 |
| 3.9.10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 170.220,30 | $ 170.220,30 |
| **3,10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 6.768.000,67** |
| 3.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1.232.068,26 | $ 1.232.068,26 |
| 3.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 590.637,60 | $ 590.637,60 |
| 3.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1.232.535,77 | $ 1.232.535,77 |
| 3.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 907.650,87 | $ 907.650,87 |
| 3.10.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 152.619,12 | $ 152.619,12 |
| 3.10.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 211.074,62 | $ 211.074,62 |
| 3.10.7 | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 749.266,67 | $ 749.266,67 |
| 3.10.8 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 276.391,28 | $ 276.391,28 |
| 3.10.9 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1.415.756,48 | $ 1.415.756,48 |
| **3,11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 18.344.179,18** |
| 3.11.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | | $ 1.164.835,00 | $ 1.747.252,50 | $ 2.912.087,50 |
| 3.11.2 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.017.839,09 | $ - | $ 1.017.839,09 |
| 3.11.8 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.059.178,94 | $ 12.355.073,65 | $ 14.414.252,59 |
| **3,12** | **VOZ Y DATOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 6.231.258,13** |
| 3.12.1 | TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1.657.484,80 | $ 1.657.484,80 |
| 3.12.2 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40X0.40M EN CONCRETO 3000 PS ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | | | $ 2.931.442,86 | $ 2.931.442,86 |
| 3.12.3 | TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1.642.330,47 | $ 1.642.330,47 |
| **4,00** | **ZONA ARMERILLO** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **4,10** | **PRELIMINARES** | | **$ -** | **$ -** | **$ 364.928,57** |
| 4.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | | $ 364.928,57 | $ 364.928,57 |
| **4,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 8.226.296,46** |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 5.284.073,87 | $ 5.284.073,87 |
| 4.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÀNICA CON EQUIPO PESADO. | $ - | $ 1.878.442,97 | $ 1.878.442,97 |
| 4.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 724.679,07 | $ 724.679,07 |
| 4.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 339.100,55 | $ 339.100,55 |
| **4,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 65.860.621,06** |
| 4.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 584.326,33 | $ 584.326,33 |
| 4.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 10.639.488,79 | $ 10.639.488,79 |
| 4.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 25.079.310,80 | $ 25.079.310,80 |
| 4.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 6.814.152,00 | $ 6.814.152,00 |
| 4.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 10.040.813,90 | $ 10.040.813,90 |
| 4.3.6 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 8.533.907,05 | $ 8.533.907,05 |
| 4.3.7 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 3.822.680,16 | $ 3.822.680,16 |
| 4.3.8 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 345.942,03 | $ 345.942,03 |
| **4,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 111.839.604,94** |
| 4.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 58.049.688,60 | $ 58.049.688,60 |
| 4.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 6.063.709,30 | $ 6.063.709,30 |
| 4.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 43.226.243,40 | $ 43.226.243,40 |
| 4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 4.499.963,64 | $ 4.499.963,64 |
| **4,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 58.576.733,39** |
| 4.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 6.381.479,04 | $ 5.549.112,21 |
| 4.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 15.679.866,29 | $ 15.679.866,29 |
| 4.5.3 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1.652.374,41 | $ 1.652.374,41 |
| 4.5.4 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 4.515.452,17 | $ 4.515.452,17 |
| 4.5.5 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 9.401.871,52 | $ 9.401.871,52 |
| 4.5.6 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 10.793.680,28 | $ 10.793.680,28 |
| 4.5.8 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | $ 2.072.328,82 | $ - | $ 2.072.328,82 |
| 4.5.9 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | $ 416.274,26 | $ - | $ 416.274,26 |
| 4.5.10 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | $ 1.173.973,79 | $ 3.913.245,98 | $ 5.087.219,77 |
| 4.5.11 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | $ 1.273.437,44 | $ - | $ 1.273.437,44 |
| 4.5.12 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | $ 2.135.116,22 | $ 2.135.116,22 |
| **4,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 23.364.961,75** |
| 4.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | $ 760.675,86 | $ 3.042.703,44 | $ 3.803.379,30 |
| 4.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 2.116.508,49 | $ 2.116.508,49 |
| 4.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 7.364.025,85 | $ 7.364.025,85 |
| 4.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 10.081.048,11 | $ 10.081.048,11 |
| **4,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 14.202.131,25** |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM.EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | $ 4.548.832,36 | $ - | $ 4.548.832,36 |
| 4.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 9.653.298,89 | $ 9.653.298,89 |
| **4,80** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 308.638,04** |
| 4.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 79.514,60 | $ 79.514,60 |
| 4.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28.278,27 | $ 28.278,27 |
| 4.8.3 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38.807,45 | $ 38.807,45 |
| 4.8.4 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 136.256,20 | $ 136.256,20 |
| 4.8.5 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 25.781,52 | $ 25.781,52 |
| **4,90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.363.785,53** |
| 4.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 257.805,04 | $ 257.805,04 |
| 4.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 140.628,00 | $ 140.628,00 |
| 4.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 362.510,52 | $ 362.510,52 |
| 4.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 86.442,94 | $ 86.442,94 |
| 4.9.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 76.309,56 | $ 76.309,56 |
| 4.9.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105.537,31 | $ 105.537,31 |
| 4.9.7 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 69.097,82 | $ 69.097,82 |
| 4.9.8 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 265.454,34 | $ 265.454,34 |
| **4,10** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 3.906.146,30** |
| 4.10.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | | $ 416.012,50 | $ 416.012,50 |
| 4.10.7 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 3.490.133,80 | $ 3.490.133,80 |
| **4,11** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **5,00** | **ZONA ALOJAMIENTOS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **5,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 5.204.668,00** |
| 5.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 5.204.668,00 | $ 5.204.668,00 |
| **5,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 175.986.159,51** |
| 5.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 115.728.387,56 | $ 115.728.387,56 |
| 5.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 38.123.442,68 | $ 38.123.442,68 |
| 5.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 14.707.651,96 | $ 14.707.651,96 |
| 5.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 7.426.677,31 | $ 7.426.677,31 |
| **5,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.040.533.946,90** |
| 5.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 18.666.424,74 | $ 18.666.424,74 |
| 5.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 169.566.368,93 | $ 169.566.368,93 |
| 5.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 42.399.912,18 | $ 42.399.912,18 |
| 5.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 79.840.009,95 | $ 79.840.009,95 |
| 5.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 182.106.902,52 | $ 182.106.902,52 |
| 5.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 75.589.860,42 | $ 75.589.860,42 |
| 5.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 181.267.117,68 | $ 181.267.117,68 |
| 5.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 162.717.181,85 | $ 162.717.181,85 |
| 5.3.9 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3.450.736,75 | $ - | $ 3.450.736,75 |
| 5.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 120.561.451,20 | $ 120.561.451,20 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 4.367.980,68 | $ 4.367.980,68 |
| **5,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 798.910.130,41** |
| 5.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 526.023.258,39 | $ 526.023.258,39 |
| 5.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 58.621.002,42 | $ 58.621.002,42 |
| 5.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 128.511.485,68 | $ 128.511.485,68 |
| 5.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 85.754.383,92 | $ 85.754.383,92 |
| **5,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 513.077.434,77** |
| 5.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 66.084.881,79 | $ 66.084.881,79 |
| 5.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 65.411.361,29 | $ 65.411.361,29 |
| 5.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 39.656.985,81 | $ 39.656.985,81 |
| 5.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 71.825.656,76 | $ 71.825.656,76 |
| 5.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 79.020.909,53 | $ 79.020.909,53 |
| 5.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | $ 83.986.516,08 | $ 25.195.954,82 | $ 109.182.470,90 |
| 5.5.9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | $ 3.672.300,50 | $ - | $ 3.672.300,50 |
| 5.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | $ 9.047.524,21 | $ 45.237.621,03 | $ 54.285.145,23 |
| 5.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | $ 23.937.722,97 | $ - | $ 23.937.722,97 |
| **5,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 195.811.582,69** |
| 5.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | $ 20.037.521,83 | $ - | $ 20.037.521,83 |
| 5.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | $ 19.265.725,64 | $ 2.752.246,52 | $ 22.017.972,16 |
| 5.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 48.264.862,43 | $ 48.264.862,43 |
| 5.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | $ 52.745.613,14 | $ 52.745.613,14 | $ 105.491.226,27 |
| **5,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 130.720.124,42** |
| 5.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | $ 16.375.796,50 | $ 8.187.898,25 | $ 24.563.694,74 |
| 5.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | | $ 58.046.625,00 | $ 58.046.625,00 |
| 5.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO. | $ 21.282.613,58 | $ - | $ 21.282.613,58 |
| 5.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 26.827.191,10 | $ 26.827.191,10 |
| **5,80** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 22.306.434,32** |
| 5.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.296.534,00 | $ 1.296.534,00 |
| 5.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 251.362,40 | $ 251.362,40 |
| 5.8.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 6.195.353,67 | $ 6.195.353,67 |
| 5.8.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.001.067,00 | $ 1.001.067,00 |
| 5.8.5 | TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 478.145,83 | $ 478.145,83 |
| 5.8.6 | ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35.364,05 | $ 35.364,05 |
| 5.8.7 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38.807,45 | $ 38.807,45 |
| 5.8.8 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 9.401.677,80 | $ 9.401.677,80 |
| 5.8.9 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.411.904,40 | $ 1.411.904,40 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.8.10 | BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 64.708,20 | $ 64.708,20 |
| 5.8.11 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 25.781,52 | $ 25.781,52 |
| 5.8.12 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 970.926,00 | $ 970.926,00 |
| 5.8.13 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.134.802,00 | $ 1.134.802,00 |
| **5,90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 21.309.225,42** |
| 5.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4.919.279,85 | $ 4.919.279,85 |
| 5.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 928.144,80 | $ 928.144,80 |
| 5.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4.984.519,65 | $ 4.984.519,65 |
| 5.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.852.617,02 | $ 2.852.617,02 |
| 5.9.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 763.095,60 | $ 763.095,60 |
| 5.9.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 5.804.552,05 | $ 1.055.373,10 |
| 5.9.7 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.381.956,40 | $ 1.381.956,40 |
| 5.9.8 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4.424.239,00 | $ 4.424.239,00 |
| **5,10** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | | **$ 36.235.261,20** |
| 5.10.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | $ 4.409.732,50 | $ 11.024.331,25 | $ 15.434.063,75 |
| 5.10.10 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 20.801.197,45 | $ - | $ 20.801.197,45 |
| **5,11** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **6,00** | **APARTAMENTO FISCAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **6,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 770.176,72** |
| 6.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 770.176,72 | $ 770.176,72 |
| **6,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 16.425.532,74** |
| 6.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 10.439.545,46 | $ 10.439.545,46 |
| 6.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 3.836.112,12 | $ 3.836.112,12 |
| 6.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 1.479.930,95 | $ 1.479.930,95 |
| 6.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 669.944,21 | $ 669.944,21 |
| **6,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 88.312.385,40** |
| 6.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 1.008.563,26 | $ 1.008.563,26 |
| 6.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 19.422.912,91 | $ 19.422.912,91 |
| 6.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 16.875.071,14 | $ 16.875.071,14 |
| 6.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 9.337.412,25 | $ 9.337.412,25 |
| 6.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 19.416.043,55 | $ 19.416.043,55 |
| 6.3.6 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 11.609.732,21 | $ 11.609.732,21 |
| 6.3.7 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 758.672,62 | $ - | $ 758.672,62 |
| 6.3.8 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 9.409.674,24 | $ 9.409.674,24 |
| 6.3.9 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 474.303,22 | $ 474.303,22 |
| **6,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 69.070.906,32** |
| 6.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 46.942.403,36 | $ 46.942.403,36 |
| 6.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 8.289.582,46 | $ 8.289.582,46 |
| 6.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 7.723.483,42 | $ 7.723.483,42 |
| 6.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 6.115.437,08 | $ 6.115.437,08 |
| **6,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 72.874.481,82** |
| 6.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 8.823.547,02 | $ 8.823.547,02 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 26.764.648,75 | $ 26.764.648,75 | |
| 6.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 2.768.843,60 | $ 2.768.843,60 | |
| 6.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 5.666.494,89 | $ 5.666.494,89 | |
| 6.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 10.802.092,80 | $ 10.802.092,80 | |
| 6.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | $ 4.773.177,15 | $ 4.773.177,15 | $ 9.546.354,29 | |
| 6.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | | $ 5.572.384,88 | $ 5.572.384,88 | |
| 6.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | $ 1.465.057,80 | $ 1.465.057,80 | $ 2.930.115,59 | |
| **6,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 38.812.557,57** | |
| 6.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | $ 3.454.449,43 | $ 575.741,57 | $ 4.030.191,00 | |
| 6.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | $ 2.656.031,79 | $ - | $ 2.656.031,79 | |
| 6.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 4.657.758,96 | $ 4.657.758,96 | |
| 6.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | $ 13.734.287,91 | $ 13.734.287,91 | $ 27.468.575,82 | |
| **6,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 13.064.923,16** | |
| 6.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | $ 1.705.812,14 | $ 1.705.812,14 | $ 3.411.624,27 | |
| 6.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 9.653.298,89 | $ 9.653.298,89 | |
| **6,80** | **CIELO RASO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **6,90** | **RED HIDRÁULICA** | | | **$ 958.020,28** | |
| 6.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 216.704,20 | $ 216.704,20 | |
| 6.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 56.556,54 | $ 56.556,54 | |
| 6.9.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 77.614,90 | $ 77.614,90 | |
| 6.9.6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 408.768,60 | $ 408.768,60 | |
| 6.9.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 41.526,60 | $ 41.526,60 | |
| 6.9.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 51.563,04 | $ 51.563,04 | |
| 6.9.9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 48.546,30 | $ 48.546,30 | |
| 6.9.10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 56.740,10 | $ 56.740,10 | |
| **6,10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.269.199,92** | |
| 6.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 462.550,20 | $ 462.550,20 | |
| 6.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 323.444,40 | $ 323.444,40 | |
| 6.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 514.764,94 | $ 514.764,94 | |
| 6.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 129.664,41 | $ 129.664,41 | |
| 6.10.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 152.619,12 | $ 152.619,12 | |
| 6.10.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105.537,31 | $ 105.537,31 | |
| 6.10.7 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 138.195,64 | $ 138.195,64 | |
| 6.10.8 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 442.423,90 | $ 442.423,90 | |
| **6,11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 4.214.651,23** | |
| 6.11.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | $ 624.018,75 | $ 624.018,75 | $ 1.248.037,50 | |
| 6.11.8 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 2.966.613,73 | $ - | $ 2.966.613,73 | |
| **6,12** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **7,00** | **GARITAS Y SHUT DE BASURAS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **7,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 268.797,17** | |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 268.797,17 | $ 268.797,17 |
| **7,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 9.297.655,57** |
| 7.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 6.230.950,77 | $ 6.230.950,77 |
| 7.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÀNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 1.924.413,72 | $ 1.924.413,72 |
| 7.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 742.430,37 | $ 742.430,37 |
| 7.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 399.860,71 | $ 399.860,71 |
| **7,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 100.790.866,41** |
| 7.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 2.113.180,16 | $ 2.113.180,16 |
| 7.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 10.703.662,07 | $ 10.703.662,07 |
| 7.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 8.386.108,09 | $ 8.386.108,09 |
| 7.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 7.687.322,94 | $ 7.687.322,94 |
| 7.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 41.215.611,54 | $ 41.215.611,54 |
| 7.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 3.211.422,13 | $ 3.211.422,13 |
| 7.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 12.931.351,24 | $ 12.931.351,24 |
| 7.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 5.352.538,88 | $ 5.352.538,88 |
| 7.3.9 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 774.475,88 | $ 774.475,88 |
| 7.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 8.233.464,96 | $ 8.233.464,96 |
| 7.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 181.728,52 | $ 181.728,52 |
| **7,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 69.105.917,09** |
| 7.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 61.169.136,52 | $ 61.169.136,52 |
| 7.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 3.281.128,51 | $ 3.281.128,51 |
| 7.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.255.088,73 | $ 2.255.088,73 |
| 7.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 2.400.563,33 | $ 2.400.563,33 |
| **7,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 34.671.250,23** |
| 7.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 5.294.410,43 | $ 5.294.410,43 |
| 7.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 8.005.199,95 | $ 8.005.199,95 |
| 7.5.3 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1.027.151,66 | $ 1.027.151,66 |
| 7.5.4 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 4.531.881,56 | $ 4.531.881,56 |
| 7.5.5 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 9.477.036,08 | $ 9.477.036,08 |
| 7.5.6 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | $ 1.263.603,32 | $ 1.895.404,98 | $ 3.159.008,31 |
| 7.5.8 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | $ 1.701.256,24 | $ - | $ 1.701.256,24 |
| 7.5.12 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | $ 1.475.306,00 | $ - | $ 1.475.306,00 |
| **7,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 14.417.821,57** |
| 7.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 531.052,34 | $ 531.052,34 |
| 7.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 3.725.126,79 | $ 3.725.126,79 |
| 7.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 10.161.642,44 | $ 10.161.642,44 |
| **7,70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 22.632.592,64** |
| 7.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | $ 4.027.542,75 | $ 4.027.542,75 |
| 7.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 18.605.049,89 | $ 18.605.049,89 |
| **7,80** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 531.772,66** |
| 7.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 69.210,00 | $ 69.210,00 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 18.852,18 | $ 18.852,18 |
| 7.8.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 315.049,67 | $ 315.049,67 |
| 7.8.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35.436,00 | $ 35.436,00 |
| 7.8.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38.807,45 | $ 38.807,45 |
| 7.8.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 41.526,60 | $ 41.526,60 |
| 7.8.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 12.890,76 | $ 12.890,76 |
| **7,90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.612.427,43** |
| 7.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 224.829,98 | $ 224.829,98 |
| 7.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 84.376,80 | $ 84.376,80 |
| 7.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 885.129,85 | $ 885.129,85 |
| 7.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 172.885,88 | $ 172.885,88 |
| 7.9.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28.809,14 | $ 28.809,14 |
| 7.9.6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 76.309,56 | $ 76.309,56 |
| 7.9.7 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105.537,31 | $ 105.537,31 |
| 7.9.8 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 34.548,91 | $ 34.548,91 |
| **8,00** | **URBANISMO Y PAISAJISMO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8,10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 18.826.792,27** |
| 8.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 18.826.792,27 | $ 18.826.792,27 |
| **8,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 198.547.239,66** |
| 8.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 148.941.915,83 | $ 148.941.915,83 |
| 8.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 28.898.483,10 | $ 28.898.483,10 |
| 8.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 11.148.749,61 | $ 11.148.749,61 |
| 8.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 9.558.091,12 | $ 9.558.091,12 |
| **8,30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 691.376.853,65** |
| 8.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 680.379,98 | $ 680.379,98 |
| 8.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1.650.950,45 | $ 1.650.950,45 |
| 8.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 5.006.631,70 | $ 5.006.631,70 |
| 8.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 979.183,72 | $ 979.183,72 |
| 8.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1.749.719,36 | $ 1.749.719,36 |
| 8.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 616.566.062,49 | $ 616.566.062,49 |
| 8.3.7 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 58.873.087,76 | $ 58.873.087,76 |
| 8.3.8 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa | | $ 2.431.371,50 | $ 2.431.371,50 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.9 | SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.605.654,79 | $ 2.605.654,79 |
| 8.3.10 | PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 833.811,90 | $ 833.811,90 |
| **8,40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 282.125.097,37** |
| 8.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 25.856.131,99 | $ 25.856.131,99 |
| 8.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 256.268.965,38 | $ 256.268.965,38 |
| **8,50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8,60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8,70** | **SIMBOLOS INSTITUCIONALES - POLICIA** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8,80** | **PAISAJISMO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8,90** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.238.990,13** |
| 8.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 279.300,80 | $ 279.300,80 |
| 8.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 12.568,12 | $ 12.568,12 |
| 8.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.047.423,31 | $ 1.047.423,31 |
| 8.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35.436,00 | $ 35.436,00 |
| 8.9.5 | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 572.494,86 | $ 572.494,86 |
| 8.9.6 | ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 123.401,50 | $ 123.401,50 |
| 8.9.7 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38.807,45 | $ 38.807,45 |
| 8.9.8 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 51.908,25 | $ 51.908,25 |
| 8.9.9 | BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 77.649,84 | $ 77.649,84 |
| **8,10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 118.877.770,83** |
| 8.10.1 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 9.694.135,49 | $ 9.694.135,49 |
| 8.10.2 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.080.536,75 | $ 1.080.536,75 |
| 8.10.3 | TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 10.787.273,75 | $ 10.787.273,75 |
| 8.10.4 | ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4.286.687,90 | $ 4.286.687,90 |
| 8.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 12.956.594,52 | $ 12.956.594,52 |
| 8.10.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 12.310.654,90 | $ 12.310.654,90 |
| 8.10.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 12.706.327,76 | $ 12.706.327,76 |
| 8.10.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 17.025.021,00 | $ 17.025.021,00 |
| 8.10.9 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | | $ 24.904.442,08 | $ 24.904.442,08 |
| 8.10.10 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | | $ 13.126.096,68 | $ 13.126.096,68 |
| **8,11** | **RED CONTRA INCENDIO - RCI** | **$ -** | **$ -** | **$ 66.200.794,52** |
| 8.11.1 | TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.766.943,76 | $ 2.766.943,76 |
| 8.11.2 | TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2.218.666,55 | $ 2.218.666,55 |
| 8.11.3 | TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 17.857.737,30 | $ 17.857.737,30 |
| 8.11.4 | BUJE 2 1/2"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 237.084,84 | $ 237.084,84 |
| 8.11.5 | BUJE 4"X2 1/2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 222.541,56 | $ 222.541,56 |
| 8.11.6 | ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 356.866,32 | $ 356.866,32 |
| 8.11.7 | ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 161.099,68 | $ 161.099,68 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.11.8 | ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1.023.035,16 | $ 1.023.035,16 |
| 8.11.9 | UNION PRESIÓN 2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 229.169,07 | $ 229.169,07 |
| 8.11.10 | UNION PRESIÓN 2 1/2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 165.453,80 | $ 165.453,80 |
| 8.11.11 | UNION PRESIÓN 4" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 772.227,12 | $ 772.227,12 |
| 8.11.12 | GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 22.214.430,56 | $ 22.214.430,56 |
| 8.11.13 | SIAMESA TIPO YEE 4"X2 1/2" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 7.202.266,52 | $ 7.202.266,52 |
| 8.11.14 | VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 599.816,68 | $ 599.816,68 |
| 8.11.16 | ANCLAJE DE TECHO PARA TUBERIA DE 2" A 4", INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE,SOPORTES DE TUBERIA. | | $ 10.173.455,60 | $ 10.173.455,60 |
| **8,12** | **RED DE GAS** | $ - | $ - | **$ 4.711.910,19** |
| 8.12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 20-25mm | | $ 1.717.536,91 | $ 1.717.536,91 |
| 8.12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 12-16mm | | $ 1.242.194,76 | $ 1.242.194,76 |
| 8.12.5 | TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" TIPO PESADO | | $ 695.969,84 | $ 695.969,84 |
| 8.12.6 | TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO | | $ 474.344,98 | $ 474.344,98 |
| 8.12.7 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 3/4" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA | | $ 361.025,22 | $ 361.025,22 |
| 8.12.8 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA | | $ 220.838,48 | $ 220.838,48 |
| **9,00** | **CERRAMIENTO PERIMETRAL** | $ - | $ - | $ - |
| **9,10** | **PRELIMINARES** | $ - | $ - | $ - |
| **9,20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | $ - | $ - | $ - |
| **9,30** | **CERRAMIENTO TIPO 1** | $ - | $ - | $ - |
| **9,40** | **CERRAMIENTO TIPO 2** | $ - | $ - | $ - |
| **9,50** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | $ - | $ - | $ - |
| **INP** | **ITEMS NO PREVISTOS** | $ - | $ - | **$ 1.259.661.957,86** |
| INP01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENVOLVENTE TIPO CORTASOL LINEAL CON SEPARACION VARIABLE Y TRANSMITANCIA TERMICA MEDIA/BAJA. INCLUYE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE SOPORTE, ANCLAJES , APLICACIÓN DE ADITIVO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, RESINAS ALQUIDICAS Y/O PIGMENTOS PROTECTORES INHIBIDORES DE CORROSION | $ 429.652.140,67 | $ 830.009.817,19 | $ 1.259.661.957,86 |
| | **PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT** | | **$ 40.892.801,82** | **$ 40.892.801,82** |
| | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA** | | **$ 67.091.651,99** | **$ 67.091.651,99** |
| | SUBTOTAL | **$ 1.072.097.233,11** | **$ 11.081.685.114,48** | **$ 11.412.495.628,15** |
| **AVANCE TOTAL EJECUTADO** | **71,35%** | A.I.U | **$ 353.792.086,93** | **$ 3.656.956.087,78** | **$ 3.766.123.557,29** |
| | | **VALOR TOTAL** | **$ 1.425.889.320,04** | **$ 14.738.641.202,25** | **$ 15.178.619.185,44** |
| **AVANCE PROGRAMADO** | **99,00%** | | | | |
| **PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO** | **-27,65%** | | | | |

**INFORMACIÓN GENERAL**

| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

## 6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

### ACTA PARCIAL

| CONCEPTO | VIGENTE | DESDE | HASTA | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | 24-mar-23 | 24-mar-24 | $ 628.782.310,00 | PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100008254 |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL | | 24-mar-23 | 24-mar-29 | $ 10.689.214.621,60 | PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100032073 |

| ACTAS REALIZADAS | | | CONTRATOS ADICIONALES | | | PRORROGAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | FECHA | OBSERVACION | Nº | VALOR | CAUSA | Nº | TIEMPO | CAUSAL |
| ACTA PARCIAL No. 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS | 29-jul.-2023 | N/A | 01 | $ 662.923.252,00 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 2 FASE II OBRA | 16-jul.-2024 | N/A | 02 | $ 2.056.234.178,94 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 3 FASE II OBRA | 26-sep.-2024 | N/A | 03 | $ 4.683.269.120,00 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 4 FASE II OBRA | 12-dic.-2024 | N/A | 04 | $ 2.256.534.524,05 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 5 FASE II OBRA | 3-abr.-2025 | N/A | 05 | $ 1.119.505.182,37 | | | | |

## 7. INFORMACION FINANCIERA

| Nº | CONVENIO | CONCEPTO | FECHA | PORCENTAJE | VALOR | AMORTIZACION | NETO PAGADO | ACUMULADO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META" | | 19-jul.-2025 | 71,35% | $ 11.414.088.785,17 | $ 4.046.217.206,50 | $ 10.115.543.016,26 | $ 11.414.088.785,17 | $ 5.882.668.119,19 |

## 8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

°Se hace seguimiento a la elaboracion del menson en concreto en zona administrativa.
°Se hace verificacion de la aplicación de la pintura tipo vinilo en la zona administrativa.
°Se verifica la instalacion de la carpinteria metalica en zona administrativa.
°Se hace verificacion de las instalaciones electricas en la zona administrativa.
°Se hace seguimiento a la elaboracion del menson en concreto en zona de celdas.
°Se le hace seguimiento a la instalacion del piso grano marmol en la zona de celdas.
°Se hace verificacion de la aplicación de la pintura tipo vinilo en la zona de celdas.
°Se hace verificacion de las instalaciones electricas en la zona de celdas.
°Se hace seguimiento a la elaboracion del menson en concreto en zona social.
°Se le hace seguimiento a la instalacion del piso grano marmol en la zona social.
°Se hace verificacion de la aplicación de la pintura tipo vinilo en la zona social.
°Se hace verificacion de las instalaciones electricas en la zona social.

## OBSERVACIONES

° Se reinicia la ejecucion de la obra, luego del acta de suspension No. 1 del 7 de diciembre de 2024.
°Se prorroga los contratos derivados por un termino de 11 dias, esto con el fin de finalizar actividades que habian quedado inconclusas al momento de la suspension y que requerian ser finalizadas lo mas pronto, para evitar el deterioro de las mismas.
°Se esta a la espera de la solicitud de adicion y prorroga No. 4 para poder llevar acabo el 100% de las actividades.

°

**JUAN CAMILO POSADA VARELA**
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA**
**CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**
**NIT.:901,696.564-7**

**Consorcio Interpolicia 2023 - Interventor**

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

**IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**
**SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS**

**Secretario de infraestructura - Supervisor**

**ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO**
**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA**
**CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023**
**NIT.:901.699.813-1**

**Consorcio Policia Acacias 2023 - Contratista**

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMANAL No: | 62 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |

**10. REGISTRO FOTOGRÁFICO**








| MINISTERIO DEL INTERIOR | INFORME DE INTERVENTORIA<br>CONSORCIO INTERPOLICIA 2023<br>INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | ALCALDÍA DE ACACÍAS | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DEL INTERIOR | | ACACÍAS - META | CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 |
| Versión: 01 | | | |

**INFORMACIÓN GENERAL**

| INFORME SEMANAL No: | | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No | 374 de 2023 | OBJETO: | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | | DEL 28 DE JULIO 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025 |

| INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA: **ING. Deiby Jhoanny Gomez Barrera** | RESIDENTE DE OBRA: **ING. Joe Andres Martino Pérez Díaz** |
|---|---|---|

## 1. LOCALIZACION DEL PROYECTO




**Información geográfica del predio**


Latitud: 4,00° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)



**Localización geográfica del terreno a intervenir**
Fuente: Consorcio Interpolicía 2023

**Características del Predio.**

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

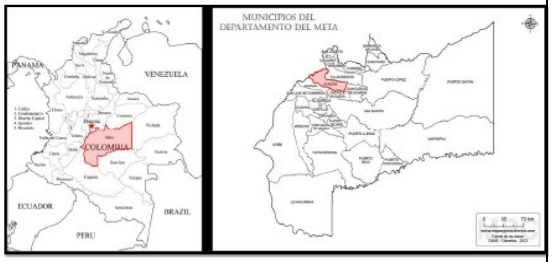


**Localización geográfica del municipio en el país y departamento**.
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.

## 2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CONTRATO:** | martes, 28 de marzo de 2023 | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 11,912,622,964.00 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | jueves, 27 de abril de 2023 | **VALOR ADICIONAL No.1 AL CONTRATO:** | $ 4,085,588,171.45 |
| **PLAZO** | DOCE (12) MESES. | **FECHA DE TERMINACION:** | domingo, 24 de marzo de 2024 |
| **PRORROGA N° 1:** | viernes, 22 de marzo de 2024 | **TIEMPO DE PRORROGA No 1,** | Siete (07) meses Dieciocho (18) dias. |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** | martes, 12 de noviembre de 2024 |
| **PRORROGA N° 2:** | miercoles, 25 de septiembre de 2024 | **TIEMPO DE PRORROGA No 2,** | Treinta y un (31) dias. |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** | viernes, 13 de diciembre de 2024 |
| **SUSPENSION N° 1:** | sabado, 07 de diciembre de 2024 | **TIEMPO DE LA SUSPENSION N°1:** | cuarenta y cinco (45) dias |
| **AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N° 1:** | lunes, 20 de enero de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N° 1:** | sesenta (60) dias |
| **AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N° 1:** | miercoles, 19 de marzo de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N° 1:** | treinta (30) dias |
| **AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N° 1:** | viernes, 18 de abril de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N° 1:** | cuarenta (40) dias |
| **AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N° 1:** | viernes, 30 de mayo de 2025 | **TIEMPO DE LA AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N° 1:** | cuarenta (40) dias |
| **REINICIO N°1:** | martes, 15 de julio de 2025 | **FECHA DE TERMINACION:** | 20 de julio de 2025 |
| **PRORROGA N° 3:** | martes, 15 de julio de 2025 | **TIEMPO DE PRORROGA No 3,** | once (11) dias |
| | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** | jueves, 31 de julio de 2025 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $ 15,998,211,135.45 | **VALOR DEL ANTICIPO:** | $ 6,399,284,454.18 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023. | **REPRESENTANTE LEGAL:** | ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO. |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 814 DIAS | **PLAZO RESTANTE:** | 12 DIAS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:** | 5.93% | **AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:** | 77.28% | **PROGRAM. SEMANA** | 99.00% | **PROGRAM. ACUMULADO** | 77.28% |
| **AVANCE FINANCIERO SEMANA:** | $ 948,783,988.14 | **AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:** | $ 12,362,872,773.31 | **PROGRAM FINANC SEMANA** | $ 15,838,229,024.10 | **PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:** | $ 15,998,211,135.45 |

INFORMACIÓN GENERAL


| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

## 3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSION SEMANAL BASICA | % PROGRAMADO | 4.53% | 4.43% | 0.76% | 1.04% | 0.98% | 1.41% | 6.71% | 5.93% |
| | MILES DE PESOS | $ 724,071,829.56 | $ 709,074,751.21 | $ 120,873,809.69 | $ 165,984,861.46 | $ 157,245,577.72 | $ 225,394,005.23 | $ 1,073,690,390.13 | $ 948,783,988.14 |
| INVERSION SEMANAL ACUMULADO | % EJECUTADO | 4.53% | 4.43% | 0.76% | 1.04% | 0.98% | 1.41% | 6.71% | 5.93% |
| | MILES DE PESOS | $ 724,071,829.56 | $ 709,074,751.21 | $ 120,873,809.69 | $ 165,984,861.46 | $ 157,245,577.72 | $ 225,394,005.23 | $ 1,073,690,390.13 | $ 948,783,988.14 |
| INVERSION MENSUAL BASICA | % EJECUTADO | 10.75% | | | | 0.98% | 14.05% | | |
| | MILES DE PESOS | $1,720,005,251.93 | | | | $157,245,577.72 | $2,247,868,383.50 | | |
| INVERSION MENSUAL ACUMULADA | % PROGRAMADO | 62.24% | | | | 63.23% | 77.28% | | |
| | MILES DE PESOS | $ 9,957,758,812.09 | | | | $ 10,115,004,389.81 | $ 12,362,872,773.31 | | |

| EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA: | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJECUTADO REAL OBRA | 0,19% | 0,39% | 0,70% | 0,49% | 0,75% | 2,71% |
| PROGRAMADO CONTRATISTA | 0,19% | 0,39% | 0,70% | 0,49% | 0,75% | 2,71% |
| PROGRESIVO REAL DE OBRA | 46,45% | 46,84% | 47,54% | 48,03% | 48,78% | 51,49% |
| PROGRESIVO PROGRAMADO CONTRATISTA | 54,00% | 56,00% | 58,00% | 61,00% | 65,00% | 70,00% |

| Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 61 | Semana 62 | Semana 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.53% | 4.43% | 0.76% | 1.04% | 1.04% | 1.41% | 6.71% | 5.93% |
| 4.53% | 4.43% | 0.76% | 1.04% | 1.04% | 1.41% | 6.71% | 5.93% |
| 56.02% | 60.45% | 61.21% | 62.24% | 63.23% | 64.63% | 71.35% | 77.28% |
| 75.00% | 80.00% | 86.00% | 92.00% | 98.00% | 98.00% | 99.00% | 99.00% |

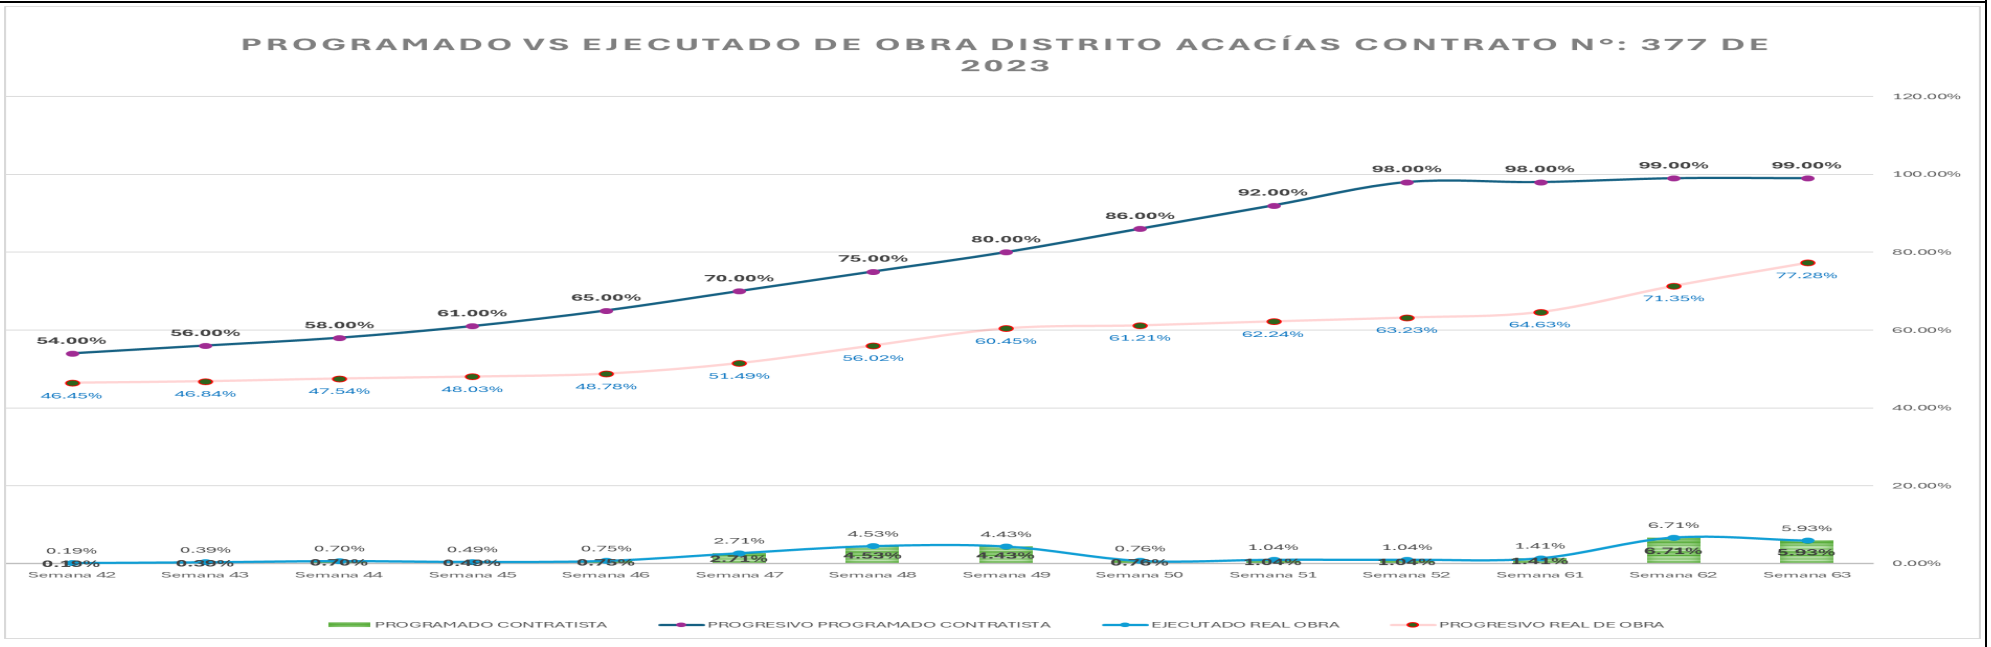


VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

| 28 JUL - AL - 31 JUL | $ 948,783,988.14 | 77.28% | $ 12,362,872,773.31 |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INFORME | AVANCE FINANCIERO SEMANA: | AVANCE FINANCIERO | PROGRAM. ACUMULADO |

| 28 JUL - AL - 31 JUL | $ 15,838,229,024.10 | 99.00% | $ 15,998,211,135.45 |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INFORME | AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACIÓN | AVANCE FINANCIERO PROGRAMACIÓN | PROGRAMADO CONTRATO TOTAL: |

| 28 JUL - AL - 31 JUL | $ 14,889,445,035.96 | -21.72% | $ 3,635,338,362.14 |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INFORME | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO | | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONSULTORÍA |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

## 4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

| ITEM | DESCRIPCION | SEMANA ACTUAL | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | | | | |
| 0 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - | $ 662,923,252.00 | $ 662,923,252.00 |
| 1.0 | ZONA ADMINISTRATIVA | | | $ - |
| 1.1 | PRELIMINARES | $ - | $ - | $ 2,775,496.32 |
| 1,1,1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 2,775,496.32 | $ 2,775,496.32 |
| 1.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | $ 83,441,770.20 |
| 1,2,1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 53,250,445.03 | $ 53,250,445.03 |
| 1,2,2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 19,320,429.05 | $ 19,320,429.05 |
| 1,2,3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 7,453,639.00 | $ 7,453,639.00 |
| 1,2,4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 3,417,257.12 | $ 3,417,257.12 |
| 1.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | $ - | $ - | $ 684,996,583.92 |
| 1,3,1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 9,925,543.17 | $ 9,925,543.17 |
| 1,3,2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 89,068,776.67 | $ 89,068,776.67 |
| 1,3,3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22,936,631.46 | $ 22,936,631.46 |
| 1,3,4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 43,902,505.93 | $ 43,902,505.93 |
| 1,3,5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 124,385,605.03 | $ 124,385,605.03 |
| 1,3,6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 45,297,244.10 | $ 45,297,244.10 |
| 1,3,7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 154,967,031.26 | $ 154,967,031.26 |
| 1,3,8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 197,314,937.71 | $ 127,299,959.81 |
| 1,3,9 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 939,257.99 | $ 939,257.99 |
| 1,3,10 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1,174,718.89 | $ 1,174,718.89 |
| 1,3,11 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 62,339,091.84 | $ 62,339,091.84 |
| 1,3,12 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 2,760,217.77 | $ 2,760,217.77 |
| 1.4 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS | $ - | $ - | $ 726,806,998.55 |
| 1,4,1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 486,005,115.30 | $ 486,005,115.30 |
| 1,4,2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 45,695,739.93 | $ 45,695,739.93 |
| 1,4,3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 128,014,331.55 | $ 128,014,331.55 |
| 1,4,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 67,091,811.77 | $ 67,091,811.77 |
| 1.5 | MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS | $ - | $ - | $ 547,619,264.91 |
| 1,5,1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 42,538,725.17 | $ 42,538,725.17 |
| 1,5,2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 48,803,714.80 | $ 48,803,714.80 |
| 1,5,4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 38,875,457.37 | $ 38,875,457.37 |
| 1,5,5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 46,727,471.05 | $ 46,727,471.05 |
| 1,5,6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 38,563,021.21 | $ 38,563,021.21 |
| 1,5,7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 200,711,571.45 | $ 200,711,571.45 |

INFORMACIÓN GENERAL

| | INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5,8 | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | | | $ 1,899,329.53 | $ 1,899,329.53 | |
| 1,5,9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | | | $ 17,261,160.76 | $ 17,261,160.76 | |
| 1,5,10 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | | | $ 4,289,607.18 | $ 4,289,607.18 | |
| 1,5,11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | | | $ 19,155,902.24 | $ 44,697,105.22 | $ 63,853,007.46 |
| 1,5,12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | | | $ 9,878,271.76 | $ 3,292,757.25 | $ 13,171,029.01 |
| 1,5,13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | | $ 30,925,169.92 | $ 30,925,169.92 | |
| **1.6** | **PINTURA** | | | **$ -** | **$ -** | **$ 117,821,440.97** |
| 1,6,1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | | | $ 780,003.20 | $ 14,820,060.71 | $ 15,600,063.90 |
| 1,6,2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | | $ 22,106,131.78 | $ 22,106,131.78 | |
| 1,6,3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | | $ 38,766,491.35 | $ 38,766,491.35 | |
| 1,6,4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | | $ 41,348,753.94 | $ 41,348,753.94 | |
| **1.7** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | | | **$ -** | **$ -** | **$ 565,581,732.93** |
| 1,7,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DOS PARADAS, PUERTAS AUTOMATICAS APERTURA CENTRAL, CAPACIDAD DE 500 KG. | | | $ 154,195,650.00 | $ 154,195,650.00 | |
| 1,7,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE | | | $ 176,784,148.63 | $ 88,392,074.32 | $ 265,176,222.95 |
| 1,7,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM.EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | | | $ 13,646,497.08 | $ 31,841,826.52 | $ 45,488,323.60 |
| 1,7,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM | | | $ 4,168,832.90 | $ 10,838,965.54 | $ 15,007,798.44 |
| 1,7,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | | | $ 29,023,312.50 | $ 29,023,312.50 | |
| 1,7,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | | $ 30,722,292.56 | $ 30,722,292.56 | |
| 1,7,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES). | | | $ 16,090,338.67 | $ 16,090,338.67 | |
| 1,7,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | | $ 9,877,794.21 | $ 9,877,794.21 | |
| **1.8** | **CIELO RASO** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **1.9** | **RED HIDRÁULICA** | | | **$ -** | **$ -** | **$ 6,883,857.22** |
| 1,9,1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 3,340,997.40 | $ 3,340,997.40 | |
| 1,9,2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 169,669.62 | $ 169,669.62 | |
| 1,9,3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 561,480.22 | $ 561,480.22 | |
| 1,9,4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 186,039.00 | $ 186,039.00 | |
| 1,9,5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 116,422.35 | $ 116,422.35 | |
| 1,9,6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1,703,202.50 | $ 1,703,202.50 | |
| 1,9,7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 176,488.05 | $ 176,488.05 | |
| 1,9,8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 103,126.08 | $ 103,126.08 | |
| 1,9,9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 242,731.50 | $ 242,731.50 | |
| 1,9,10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 283,700.50 | $ 283,700.50 | |
| **1.1** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | | **$ -** | **$ -** | **$ 11,960,316.99** |
| 1,10,1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1,623,871.97 | $ 1,623,871.97 | |
| 1,10,2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1,082,835.60 | $ 1,082,835.60 | |
| 1,10,3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 2,734,537.69 | $ 2,734,537.69 | |
| 1,10,4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 2,463,623.79 | $ 2,463,623.79 | |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.5 | TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 808,218.23 | $ 808,218.23 |
| 1,10,6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28,809.14 | $ 28,809.14 |
| 1,10,7 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 305,238.24 | $ 305,238.24 |
| 1,10,8 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 738,761.17 | $ 738,761.17 |
| 1,10,9 | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 44,074.51 | $ 44,074.51 |
| 1,10,10 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 449,135.83 | $ 449,135.83 |
| 1,10,11 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,681,210.82 | $ 1,681,210.82 |
| **1.11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 103,212,832.07** |
| 1,11,1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | | $ 27,040,812.50 | $ 27,040,812.50 |
| 1,11,2 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 5,688,918.09 | $ 51,200,262.85 | $ 56,889,180.94 |
| 1,11,3 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 169,639.85 | $ 1,526,758.63 | $ 1,696,398.48 |
| 1,11,4 | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 461,766.00 | $ 4,155,893.97 | $ 4,617,659.97 |
| 1,11,11 | ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 10,999,457.90 | $ 10,999,457.90 |
| 1,11,12 | ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,969,322.28 | $ 1,969,322.28 |
| **1.12** | **VOZ Y DATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 139,244,778.06** |
| 1,12,1 | SALIDA PARA TOMA REGULADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 3,491,494.21 | $ 4,364,367.76 | $ 7,855,861.97 |
| 1,12,2 | BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 7,435,417.86 | $ - | $ 7,435,417.86 |
| 1,12,3 | BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE FUERZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 5,630,098.59 | $ - | $ 5,630,098.59 |
| 1,12,4 | TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 1,376,214.14 | $ 12,385,927.24 | $ 13,762,141.38 |
| 1,12,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS | $ 7,565,808.99 | $ 3,242,489.57 | $ 10,808,298.55 |
| 1,12,8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RACK PARA RED DE VOZ Y DATOS | | $ 24,006,144.83 | $ 24,006,144.83 |
| 1,12,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS | $ 20,583,953.40 | $ 32,695,698.77 | $ 53,279,652.17 |
| 1,12,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2 | | $ 16,467,162.72 | $ 16,467,162.72 |
| **1.13** | **SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS - SDI** | **$ -** | **$ -** | **$ 70,331,649.03** |
| 1,13,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X16 | | $ 5,854,210.73 | $ 5,854,210.73 |
| 1,13,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X14 SIN BLINDAJE | | $ 5,153,162.01 | $ 5,153,162.01 |
| 1,13,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE DATOS APANTALLADO RS-485 | | $ 1,252,739.10 | $ 1,252,739.10 |
| 1,13,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO DOBLE 5H | | $ 961,434.00 | $ 961,434.00 |
| 1,13,18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO SENCILLO 5H | | $ 5,128,946.05 | $ 5,128,946.05 |
| 1,13,19 | TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 37,493,073.01 | $ 37,493,073.01 |
| 1,13,20 | TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2,399,879.60 | $ 2,399,879.60 |
| 1,13,21 | TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTR E INSTALACIÓN | | $ 3,819,466.54 | $ 3,819,466.54 |
| 1,13,22 | ADAPTADOR EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,465,777.50 | $ 1,465,777.50 |
| 1,13,23 | ADAPTADOR EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 325,527.60 | $ 325,527.60 |
| 1,13,24 | ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 187,908.24 | $ 187,908.24 |
| 1,13,25 | UNION EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 586,311.00 | $ 586,311.00 |
| 1,13,26 | UNION EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 217,018.40 | $ 217,018.40 |
| 1,13,27 | ABRAZADERA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4,551,016.50 | $ 4,551,016.50 |
| 1,13,28 | ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 532,349.55 | $ 532,349.55 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,13,29 | VARILLA ROSCADA 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 402,829.20 | $ 402,829.20 |
| **1.14** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | **$ -** | **$ -** | **$ 173,249,795.39** |
| 1,14,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 3,509,879.28 | $ 3,509,879.28 | $ 7,019,758.56 |
| 1,14,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 5,640,165.57 | $ 5,640,165.57 | $ 11,280,331.14 |
| 1,14,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/2" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 6,345,763.37 | $ 6,345,763.37 | $ 12,691,526.73 |
| 1,14,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 4,348,338.61 | $ 4,348,338.61 | $ 8,696,677.21 |
| 1,14,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 3,896,093.88 | $ 3,896,093.88 | $ 7,792,187.76 |
| 1,14,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø7/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 3,129,324.70 | $ 3,129,324.70 | $ 6,258,649.40 |
| 1,14,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1 3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 5,439,959.54 | $ 5,439,959.54 | $ 10,879,919.08 |
| 1,14,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN TUBERÍA DE COBRE | $ 2,583,930.04 | $ 2,583,930.04 | $ 5,167,860.08 |
| 1,14,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 13,791,522.03 | $ 13,791,522.03 | $ 27,583,044.06 |
| 1,14,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 18,429,432.90 | $ 18,429,432.90 | $ 36,858,865.79 |
| 1,14,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 1,685,182.40 | $ 1,685,182.40 | $ 3,370,364.80 |
| 1,14,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | $ 2,546,136.45 | $ 2,546,136.45 | $ 5,092,272.90 |
| 1,14,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA EMT 3/4" (INTERIOR) | $ 13,463,211.85 | $ 13,463,211.85 | $ 26,926,423.70 |
| 1,14,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA IMC 3/4" (EXTERIOR) | $ 1,815,957.09 | $ 1,815,957.09 | $ 3,631,914.18 |
| **2.00** | **ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **2.10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,237,658.70** |
| 2.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | $ - | $ 1,237,658.70 | $ 1,237,658.70 |
| **2.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 26,646,864.22** |
| 2.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 17,028,989.29 | $ 17,028,989.29 |
| 2.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 6,151,766.24 | $ 6,151,766.24 |
| 2.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 2,373,298.09 | $ 2,373,298.09 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 1,092,810.60 | $ 1,092,810.60 |
| **2.30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 157,725,525.85** |
| 2.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 1,632,911.94 | $ 1,632,911.94 |
| 2.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 29,857,796.14 | $ 29,857,796.14 |
| 2.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 40,554,606.45 | $ 40,554,606.45 |
| 2.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 23,653,878.14 | $ 23,653,878.14 |
| 2.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 29,038,490.21 | $ 29,038,490.21 |
| 2.3.6 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22,842,525.06 | $ 22,842,525.06 |
| 2.3.7 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 122,366.55 | $ 122,366.55 |
| 2.3.8 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 8,821,569.60 | $ 8,821,569.60 |
| 2.3.9 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 1,201,381.76 | $ 1,201,381.76 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | | **$ 145,754,238.69** |
| 2.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 92,723,812.94 | | $ 92,723,812.94 |
| 2.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 23,400,389.12 | | $ 23,400,389.12 |
| 2.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 17,589,872.57 | | $ 17,589,872.57 |
| 2.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 12,040,164.06 | | $ 12,040,164.06 |
| **2.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | | **$ 167,094,007.05** |
| 2.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 19,216,226.34 | | $ 19,216,226.34 |
| 2.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 36,053,881.24 | | $ 36,053,881.24 |
| 2.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 7,078,414.70 | | $ 7,078,414.70 |
| 2.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 12,928,940.23 | | $ 12,928,940.23 |
| 2.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 24,574,761.12 | | $ 24,574,761.12 |
| 2.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | $ 11,576,800.85 | $ 23,153,601.70 | | $ 34,730,402.54 |
| 2.5.9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | $ 2,453,945.54 | $ 1,963,156.43 | | $ 4,417,101.96 |
| 2.5.10 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | | $ 253,729.08 | | $ 253,729.08 |
| 2.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | $ 8,376,267.42 | $ 12,564,401.14 | | $ 20,940,668.56 |
| 2.5.12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | $ 723,219.49 | $ 482,146.33 | | $ 1,205,365.82 |
| 2.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | $ 5,694,515.45 | | $ 5,694,515.45 |
| **2.60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | | **$ 52,996,637.20** |
| 2.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | $ 994,133.32 | $ 8,947,199.90 | | $ 9,941,333.22 |
| 2.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 6,066,595.31 | | $ 6,066,595.31 |
| 2.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 10,638,704.99 | | $ 10,638,704.99 |
| 2.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 26,350,003.68 | | $ 26,350,003.68 |
| **2.70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | | **$ 23,541,577.75** |
| 2.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | $ 1,137,208.09 | $ 1,137,208.09 | | $ 2,274,416.18 |
| 2.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | $ 11,277,119.70 | | $ 11,277,119.70 |
| 2.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 9,990,041.87 | | $ 9,990,041.87 |
| **2.80** | **CIELO RASO** | **$ -** | **$ -** | | **$ -** |
| **2.90** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | | **$ 615,648.67** |
| 2.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 53,061.00 | | $ 53,061.00 |
| 2.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 12,568.12 | | $ 12,568.12 |
| 2.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105,639.80 | | $ 105,639.80 |
| 2.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35,436.00 | | $ 35,436.00 |
| 2.9.5 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 272,512.40 | | $ 272,512.40 |
| 2.9.6 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 31,144.95 | | $ 31,144.95 |
| 2.9.7 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 48,546.30 | | $ 48,546.30 |
| 2.9.8 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 56,740.10 | | $ 56,740.10 |
| **2.10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | | **$ 1,086,568.93** |
| 2.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 107,918.39 | | $ 107,918.39 |
| 2.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 70,314.00 | | $ 70,314.00 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 232,610.92 | $ 232,610.92 |
| 2.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 86,442.94 | $ 86,442.94 |
| 2.10.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28,809.14 | $ 28,809.14 |
| 2.10.6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 76,309.56 | $ 76,309.56 |
| 2.10.7 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105,537.31 | $ 105,537.31 |
| 2.10.8 | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 44,074.51 | $ 44,074.51 |
| 2.10.9 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 69,097.82 | $ 69,097.82 |
| 2.10.10 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 265,454.34 | $ 265,454.34 |
| **2.11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 23,389,637.10** |
| 2.11.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | | $ 3,744,112.50 | $ 3,744,112.50 |
| 2.11.2 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 424,099.62 | $ 424,099.62 |
| 2.11.3 | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 219,888.57 | $ 219,888.57 |
| 2.11.6 | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,097,150.02 | $ 1,097,150.02 |
| 2.11.10 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 17,904,386.39 | $ 17,904,386.39 |
| **2.12** | **MEDIA TENSIÓN** | **$ -** | **$ -** | **$ 228,417,932.47** |
| 2.12.3 | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA | | $ 2,341,423.22 | $ 2,341,423.22 |
| 2.12.6 | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE. | | $ 7,521,340.98 | $ 7,521,340.98 |
| 2.12.7 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA | | $ 16,773,559.56 | $ 16,773,559.56 |
| 2.12.9 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 kVA TIPO SECO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 100,808,339.03 | $ 100,808,339.03 |
| 2.12.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 DUCTOS DE 4" PVC TP | | $ 81,272,331.00 | $ 81,272,331.00 |
| 2.12.16 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | | $ 3,889,943.04 | $ 3,889,943.04 |
| 2.12.17 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 13,656,878.40 | $ 13,656,878.40 |
| 2.12.22 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | | $ 2,154,117.24 | $ 2,154,117.24 |
| **2.13** | **BAJA TENSIÓN** | **$ -** | **$ -** | **$ 221,709,373.38** |
| 2.13.1 | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE. | | $ 7,062,292.00 | $ 7,062,292.00 |
| 2.13.2 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO. | | $ 7,375,267.50 | $ 7,375,267.50 |
| 2.13.3 | ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 45,127,053.44 | $ 45,127,053.44 |
| 2.13.4 | ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 11,898,839.40 | $ 11,898,839.40 |
| 2.13.5 | ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 39,693,695.90 | $ 39,693,695.90 |
| 2.13.6 | ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 76,229,026.00 | $ 76,229,026.00 |
| 2.13.7 | ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 20,677,883.94 | $ 20,677,883.94 |
| 2.13.11 | ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 13,645,315.20 | $ 13,645,315.20 |
| **2.14** | **SISTEMA DE RESPALDO** | **$ -** | **$ -** | **$ 60,364,318.08** |
| 2.14.2 | SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE DE 135 KVA CON MOTOR Y GENERADOR, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR, CAMPANA PARA EXOSTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 60,364,318.08 | $ 60,364,318.08 |
| **2.15** | **SISTEMA DE APANTALLAMIENTO** | **$ -** | **$ -** | **$ 40,787,597.26** |
| 2.15.7 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | | $ 5,462,846.16 | $ 5,462,846.16 |
| 2.15.8 | CABLE DE COBRE CU 2/0 PARA APANTALLAMIENTO E INTERCONEXIONES | $ 15,896,138.00 | $ 19,428,613.11 | $ 35,324,751.10 |
| **3.00** | **ZONA SOCIAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **3.10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,236,798.02** |
| 3.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 1,236,798.02 | $ 1,236,798.02 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$** | **32,396,784.97** |
| 3.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 20,485,317.60 | $ | 20,485,317.60 |
| 3.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 7,646,793.62 | $ | 7,646,793.62 |
| 3.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 2,950,063.19 | $ | 2,950,063.19 |
| 3.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 1,314,610.56 | $ | 1,314,610.56 |
| **3.30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$** | **247,672,349.04** |
| 3.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 2,553,426.03 | $ | 2,553,426.03 |
| 3.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22,351,117.48 | $ | 22,351,117.48 |
| 3.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 6,477,329.76 | $ | 6,477,329.76 |
| 3.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 19,554,445.05 | $ | 19,554,445.05 |
| 3.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 22,474,173.09 | $ | 22,474,173.09 |
| 3.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 20,698,830.04 | $ | 20,698,830.04 |
| 3.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 87,781,054.89 | $ | 87,781,054.89 |
| 3.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 41,267,320.86 | $ | 41,267,320.86 |
| 3.3.9 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 905,512.48 | $ | 905,512.48 |
| 3.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 22,347,976.32 | $ | 22,347,976.32 |
| 3.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 1,261,163.04 | $ | 1,261,163.04 |
| **3.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$** | **281,658,245.30** |
| 3.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 202,558,716.85 | $ | 202,558,716.85 |
| 3.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 18,702,600.05 | $ | 18,702,600.05 |
| 3.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38,652,004.33 | $ | 38,652,004.33 |
| 3.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 21,744,924.07 | $ | 21,744,924.07 |
| **3.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$** | **209,117,701.91** |
| 3.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 27,506,381.27 | $ | 27,506,381.27 |
| 3.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 21,711,390.10 | $ | 21,711,390.10 |
| 3.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 3,081,454.98 | $ | 3,081,454.98 |
| 3.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 13,492,139.55 | $ | 13,492,139.55 |
| 3.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 19,274,534.25 | $ | 19,274,534.25 |
| 3.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 87,352,005.36 | $ | 87,352,005.36 |
| 3.5.8 | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | | $ 538,053.69 | $ | 538,053.69 |
| 3.5.9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | $ 2,968,175.07 | $ 2,968,175.07 | $ | 5,936,350.14 |
| 3.5.10 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | | $ 465,830.72 | $ | 465,830.72 |
| 3.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | $ 8,182,781.84 | $ 5,455,187.89 | $ | 13,637,969.73 |
| 3.5.12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | $ 1,639,529.96 | $ 1,639,529.96 | $ | 3,279,059.91 |
| 3.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | $ 12,842,532.21 | $ | 12,842,532.21 |
| **3.60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$** | **45,488,659.51** |
| 3.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | | $ 7,407,349.29 | $ | 7,407,349.29 |
| 3.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 6,324,112.57 | $ | 6,324,112.57 |
| 3.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 11,090,300.99 | $ | 11,090,300.99 |
| 3.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 20,666,896.66 | $ | 20,666,896.66 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 63,975,651.11** |
| 3.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE | | $ 2,447,905.44 | $ 2,447,905.44 | $ 4,895,810.88 |
| 3.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | | $ 6,823,248.54 | $ 5,458,598.83 | $ 12,281,847.37 |
| 3.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | | | $ 29,023,312.50 | $ 29,023,312.50 |
| 3.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | | $ 1,611,017.10 | $ 1,611,017.10 |
| 3.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | | $ 16,163,663.26 | $ 16,163,663.26 |
| **3.80** | **CIELO RASO** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **3.90** | **RED HIDRÁULICA** | | **$ -** | **$ -** | **$ 2,210,505.43** |
| 3.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 409,415.60 | $ 409,415.60 |
| 3.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 91,118.87 | $ 91,118.87 |
| 3.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 226,237.45 | $ 226,237.45 |
| 3.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 88,590.00 | $ 88,590.00 |
| 3.9.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 116,422.35 | $ 116,422.35 |
| 3.9.6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 885,665.30 | $ 885,665.30 |
| 3.9.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 72,671.55 | $ 72,671.55 |
| 3.9.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 77,344.56 | $ 77,344.56 |
| 3.9.9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 72,819.45 | $ 72,819.45 |
| 3.9.10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 170,220.30 | $ 170,220.30 |
| **3.10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 6,768,000.67** |
| 3.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1,232,068.26 | $ 1,232,068.26 |
| 3.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 590,637.60 | $ 590,637.60 |
| 3.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1,232,535.77 | $ 1,232,535.77 |
| 3.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 907,650.87 | $ 907,650.87 |
| 3.10.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 152,619.12 | $ 152,619.12 |
| 3.10.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 211,074.62 | $ 211,074.62 |
| 3.10.7 | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 749,266.67 | $ 749,266.67 |
| 3.10.8 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 276,391.28 | $ 276,391.28 |
| 3.10.9 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1,415,756.48 | $ 1,415,756.48 |
| **3.11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 25,629,084.34** |
| 3.11.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | | $ 2,912,087.50 | $ 2,912,087.50 | $ 5,824,175.00 |
| 3.11.2 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 254,459.77 | $ 1,017,839.09 | $ 1,272,298.86 |
| 3.11.8 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4,118,357.88 | $ 14,414,252.59 | $ 18,532,610.48 |
| **3.12** | **VOZ Y DATOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 6,231,258.13** |
| 3.12.1 | TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1,657,484.80 | $ 1,657,484.80 |
| 3.12.2 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40X0.40X0.40M EN CONCRETO 3000 PS ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN | | | $ 2,931,442.86 | $ 2,931,442.86 |
| 3.12.3 | TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 1,642,330.47 | $ 1,642,330.47 |
| **4.00** | **ZONA ARMERILLO** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **4.10** | **PRELIMINARES** | | **$ -** | **$ -** | **$ 364,928.57** |
| 4.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | | $ 364,928.57 | $ 364,928.57 |
| **4.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 8,226,296.46** |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 5,284,073.87 | $ 5,284,073.87 |
| 4.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | $ - | $ 1,878,442.97 | $ 1,878,442.97 |
| 4.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 724,679.07 | $ 724,679.07 |
| 4.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 339,100.55 | $ 339,100.55 |
| **4.30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 65,860,621.06** |
| 4.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 584,326.33 | $ 584,326.33 |
| 4.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 10,639,488.79 | $ 10,639,488.79 |
| 4.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 25,079,310.80 | $ 25,079,310.80 |
| 4.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 6,814,152.00 | $ 6,814,152.00 |
| 4.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 10,040,813.90 | $ 10,040,813.90 |
| 4.3.6 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 8,533,907.05 | $ 8,533,907.05 |
| 4.3.7 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 3,822,680.16 | $ 3,822,680.16 |
| 4.3.8 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 345,942.03 | $ 345,942.03 |
| **4.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 111,839,604.94** |
| 4.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 58,049,688.60 | $ 58,049,688.60 |
| 4.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 6,063,709.30 | $ 6,063,709.30 |
| 4.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 43,226,243.40 | $ 43,226,243.40 |
| 4.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 4,499,963.64 | $ 4,499,963.64 |
| **4.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 61,316,005.57** |
| 4.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0 20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 6,381,479.04 | $ 5,549,112.21 |
| 4.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 15,679,866.29 | $ 15,679,866.29 |
| 4.5.3 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 1,652,374.41 | $ 1,652,374.41 |
| 4.5.4 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 4,515,452.17 | $ 4,515,452.17 |
| 4.5.5 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 9,401,871.52 | $ 9,401,871.52 |
| 4.5.6 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 10,793,680.28 | $ 10,793,680.28 |
| 4.5.8 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | | $ 2,072,328.82 | $ 2,072,328.82 |
| 4.5.9 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | | $ 416,274.26 | $ 416,274.26 |
| 4.5.10 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | $ 2,739,272.18 | $ 5,087,219.77 | $ 7,826,491.95 |
| 4.5.11 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | | $ 1,273,437.44 | $ 1,273,437.44 |
| 4.5.12 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | $ 2,135,116.22 | $ 2,135,116.22 |
| **4.60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 23,364,961.75** |
| 4.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | | $ 3,803,379.30 | $ 3,803,379.30 |
| 4.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 2,116,508.49 | $ 2,116,508.49 |
| 4.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 7,364,025.85 | $ 7,364,025.85 |
| 4.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 10,081,048.11 | $ 10,081,048.11 |
| **4.70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 17,841,197.14** |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM.EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | $ 3,639,065.89 | $ 4,548,832.36 | $ 8,187,898.25 |
| 4.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 9,653,298.89 | $ 9,653,298.89 |
| **4.80** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 308,638.04** |
| 4.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 79,514.60 | $ 79,514.60 |
| 4.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 28,278.27 | $ 28,278.27 |
| 4.8.3 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38,807.45 | $ 38,807.45 |
| 4.8.4 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 136,256.20 | $ 136,256.20 |
| 4.8.5 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 25,781.52 | $ 25,781.52 |
| **4.90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,363,785.53** |
| 4.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 257,805.04 | $ 257,805.04 |
| 4.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 140,628.00 | $ 140,628.00 |
| 4.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 362,510.52 | $ 362,510.52 |
| 4.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 86,442.94 | $ 86,442.94 |
| 4.9.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 76,309.56 | $ 76,309.56 |
| 4.9.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 105,537.31 | $ 105,537.31 |
| 4.9.7 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 69,097.82 | $ 69,097.82 |
| 4.9.8 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 265,454.34 | $ 265,454.34 |
| **4.10** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 4,322,158.80** |
| 4.10.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | $ 416,012.50 | $ 416,012.50 | $ 832,025.00 |
| 4.10.7 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 3,490,133.80 | $ 3,490,133.80 |
| **4.11** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **5.00** | **ZONA ALOJAMIENTOS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **5.10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 5,204,668.00** |
| 5.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 5,204,668.00 | $ 5,204,668.00 |
| **5.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 175,986,159.51** |
| 5.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 115,728,387.56 | $ 115,728,387.56 |
| 5.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 38,123,442.68 | $ 38,123,442.68 |
| 5.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 14,707,651.96 | $ 14,707,651.96 |
| 5.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 7,426,677.31 | $ 7,426,677.31 |
| **5.30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,043,984,683.65** |
| 5.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 18,666,424.74 | $ 18,666,424.74 |
| 5.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 169,566,368.93 | $ 169,566,368.93 |
| 5.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 42,399,912.18 | $ 42,399,912.18 |
| 5.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 79,840,009.95 | $ 79,840,009.95 |
| 5.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 182,106,902.52 | $ 182,106,902.52 |
| 5.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 75,589,860.42 | $ 75,589,860.42 |
| 5.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 181,267,117.68 | $ 181,267,117.68 |
| 5.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 162,717,181.85 | $ 162,717,181.85 |
| 5.3.9 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | $ 3,450,736.75 | $ 3,450,736.75 | $ 6,901,473.50 |
| 5.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 120,561,451.20 | $ 120,561,451.20 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 4,367,980.68 | $ 4,367,980.68 |
| **5.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 798,910,130.41** |
| 5.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 526,023,258.39 | $ 526,023,258.39 |
| 5.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 58,621,002.42 | $ 58,621,002.42 |
| 5.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 128,511,485.68 | $ 128,511,485.68 |
| 5.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 85,754,383.92 | $ 85,754,383.92 |
| **5.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 674,752,226.31** |
| 5.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 66,084,881.79 | $ 66,084,881.79 |
| 5.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 65,411,361.29 | $ 65,411,361.29 |
| 5.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 39,656,985.81 | $ 39,656,985.81 |
| 5.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 71,825,656.76 | $ 71,825,656.76 |
| 5.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 79,020,909.53 | $ 79,020,909.53 |
| 5.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | $ 83,986,516.08 | $ 109,182,470.90 | $ 193,168,986.97 |
| 5.5.9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | $ 11,016,901.49 | $ 3,672,300.50 | $ 14,689,201.98 |
| 5.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | $ 36,190,096.82 | $ 54,285,145.23 | $ 90,475,242.05 |
| 5.5.12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | $ 20,222,253.03 | $ - | $ 20,222,253.03 |
| 5.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | $ 10,259,024.13 | $ 23,937,722.97 | $ 34,196,747.10 |
| **5.60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 221,353,597.55** |
| 5.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | $ 20,037,521.83 | $ 20,037,521.83 | $ 40,075,043.65 |
| 5.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | $ 5,504,493.04 | $ 22,017,972.16 | $ 27,522,465.20 |
| 5.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 48,264,862.43 | $ 48,264,862.43 |
| 5.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 105,491,226.27 | $ 105,491,226.27 |
| **5.70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 275,619,275.01** |
| 5.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | $ 49,127,389.49 | $ 24,563,694.74 | $ 73,691,084.23 |
| 5.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | | $ 58,046,625.00 | $ 58,046,625.00 |
| 5.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO. | $ 95,771,761.10 | $ 21,282,613.58 | $ 117,054,374.68 |
| 5.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 26,827,191.10 | $ 26,827,191.10 |
| **5.80** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 22,306,434.32** |
| 5.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,296,534.00 | $ 1,296,534.00 |
| 5.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 251,362.40 | $ 251,362.40 |
| 5.8.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 6,195,353.67 | $ 6,195,353.67 |
| 5.8.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,001,067.00 | $ 1,001,067.00 |
| 5.8.5 | TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 478,145.83 | $ 478,145.83 |
| 5.8.6 | ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35,364.05 | $ 35,364.05 |
| 5.8.7 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38,807.45 | $ 38,807.45 |
| 5.8.8 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 9,401,677.80 | $ 9,401,677.80 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.8.9 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,411,904.40 | $ 1,411,904.40 |
| 5.8.10 | BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 64,708.20 | $ 64,708.20 |
| 5.8.11 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 25,781.52 | $ 25,781.52 |
| 5.8.12 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 970,926.00 | $ 970,926.00 |
| 5.8.13 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,134,802.00 | $ 1,134,802.00 |
| **5.90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 21,309,225.42** |
| 5.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4,919,279.85 | $ 4,919,279.85 |
| 5.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 928,144.80 | $ 928,144.80 |
| 5.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4,984,519.65 | $ 4,984,519.65 |
| 5.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2,852,617.02 | $ 2,852,617.02 |
| 5.9.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 763,095.60 | $ 763,095.60 |
| 5.9.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 5,804,552.05 | $ 1,055,373.10 |
| 5.9.7 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,381,956.40 | $ 1,381,956.40 |
| 5.9.8 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4,424,239.00 | $ 4,424,239.00 |
| **5.10** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | | **$ 51,045,592.42** |
| 5.10.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | $ 4,409,732.50 | $ 15,434,063.75 | $ 19,843,796.25 |
| 5.10.10 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | $ 10,400,598.72 | $ 20,801,197.45 | $ 31,201,796.17 |
| **5.11** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **6.00** | **APARTAMENTO FISCAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **6.10** | **PRELIMINARES** | **$ -** | **$ -** | **$ 770,176.72** |
| 6.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | $ 770,176.72 | $ 770,176.72 |
| **6.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 16,425,532.74** |
| 6.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | $ 10,439,545.46 | $ 10,439,545.46 |
| 6.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | $ 3,836,112.12 | $ 3,836,112.12 |
| 6.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | $ 1,479,930.95 | $ 1,479,930.95 |
| 6.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | $ 669,944.21 | $ 669,944.21 |
| **6.30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **$ -** | **$ -** | **$ 88,312,385.40** |
| 6.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | $ 1,008,563.26 | $ 1,008,563.26 |
| 6.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 19,422,912.91 | $ 19,422,912.91 |
| 6.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 16,875,071.14 | $ 16,875,071.14 |
| 6.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 9,337,412.25 | $ 9,337,412.25 |
| 6.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 19,416,043.55 | $ 19,416,043.55 |
| 6.3.6 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 11,609,732.21 | $ 11,609,732.21 |
| 6.3.7 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 758,672.62 | $ 758,672.62 |
| 6.3.8 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 9,409,674.24 | $ 9,409,674.24 |
| 6.3.9 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 474,303.22 | $ 474,303.22 |
| **6.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 69,070,906.32** |
| 6.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 46,942,403.36 | $ 46,942,403.36 |
| 6.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 8,289,582.46 | $ 8,289,582.46 |
| 6.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 7,723,483.42 | $ 7,723,483.42 |
| 6.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | $ 6,115,437.08 | $ 6,115,437.08 |
| **6.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 88,526,440.06** |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | $ 8,823,547.02 | $ 8,823,547.02 |
| 6.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | $ 26,764,648.75 | $ 26,764,648.75 |
| 6.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | $ 2,768,843.60 | $ 2,768,843.60 |
| 6.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 5,666,494.89 | $ 5,666,494.89 |
| 6.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | $ 10,802,092.80 | $ 10,802,092.80 |
| 6.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | $ 9,546,354.29 | $ 9,546,354.29 | $ 19,092,708.58 |
| 6.5.9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | $ 2,390,680.70 | $ - | $ 2,390,680.70 |
| 6.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | $ 3,714,923.25 | $ 5,572,384.88 | $ 9,287,308.13 |
| 6.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | $ 2,930,115.59 | $ 2,930,115.59 |
| **6.60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ 38,812,557.57** |
| 6.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | | $ 4,030,191.00 | $ 4,030,191.00 |
| 6.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 2,656,031.79 | $ 2,656,031.79 |
| 6.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | $ 4,657,758.96 | $ 4,657,758.96 |
| 6.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | $ 27,468,575.82 | $ 27,468,575.82 |
| **6.70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 47,410,440.43** |
| 6.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM.EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | $ 5,686,040.45 | $ 3,411,624.27 | $ 9,097,664.72 |
| 6.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE. | $ 11,624,651.53 | $ - | $ 11,624,651.53 |
| 6.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA FABRICADO EN AGLOMERADO DE 20 MM, ACABADO EN FORMICA F8 INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL Y PUERTAS EN AGLOMERADO DE 15 MM ACABADO EN FORMICA, TOPES METÁLICOS, GUIA METÁLICA CON RODACHINAS PLÁSTICAS Y TOPE, BISAGRAS DE PARCHE Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE. | $ 9,870,943.88 | $ - | $ 9,870,943.88 |
| 6.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO BAÑOS INCLUYE MARCO DE 4 X 5 CM EN ACABADO FORMICA F8, PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE 2CM ESPESOR, CANTO TERMO FUNDIDO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE. | $ 2,679,421.29 | $ - | $ 2,679,421.29 |
| 6.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO. | $ 4,484,460.13 | $ - | $ 4,484,460.13 |
| 6.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | $ 9,653,298.89 | $ 9,653,298.89 |
| **6.80** | **CIELO RASO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **6.90** | **RED HIDRÁULICA** | | | **$ 958,020.28** |
| 6.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 216,704.20 | $ 216,704.20 |
| 6.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 56,556.54 | $ 56,556.54 |
| 6.9.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 77,614.90 | $ 77,614.90 |
| 6.9.6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 408,768.60 | $ 408,768.60 |
| 6.9.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 41,526.60 | $ 41,526.60 |
| 6.9.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 51,563.04 | $ 51,563.04 |
| 6.9.9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 48,546.30 | $ 48,546.30 |
| 6.9.10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 56,740.10 | $ 56,740.10 |
| **6.10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 2,269,199.92** |
| 6.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 462,550.20 | $ 462,550.20 |
| 6.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 323,444.40 | $ 323,444.40 |
| 6.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 514,764.94 | $ 514,764.94 |
| 6.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 129,664.41 | $ 129,664.41 |

INFORMACIÓN GENERAL

| | INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 152,619.12 | $ 152,619.12 | |
| 6.10.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 105,537.31 | $ 105,537.31 | |
| 6.10.7 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 138,195.64 | $ 138,195.64 | |
| 6.10.8 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 442,423.90 | $ 442,423.90 | |
| **6.11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 7,242,656.97** | |
| 6.11.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | | $ 1,248,037.50 | $ 1,248,037.50 | $ 2,496,075.00 | |
| 6.11.8 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,779,968.24 | $ 2,966,613.73 | $ 4,746,581.97 | |
| **6.12** | **SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - HVAC** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **7.00** | **GARITAS Y SHUT DE BASURAS** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **7.10** | **PRELIMINARES** | | **$ -** | **$ -** | **$ 268,797.17** | |
| 7.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | | $ 268,797.17 | $ 268,797.17 | |
| **7.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 9,297,655.57** | |
| 7.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | | $ 6,230,950.77 | $ 6,230,950.77 | |
| 7.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | | $ 1,924,413.72 | $ 1,924,413.72 | |
| 7.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | | $ 742,430.37 | $ 742,430.37 | |
| 7.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | | $ 399,860.71 | $ 399,860.71 | |
| **7.30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | **$ -** | **$ -** | **$ 100,790,866.41** | |
| 7.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | | $ 2,113,180.16 | $ 2,113,180.16 | |
| 7.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 10,703,662.07 | $ 10,703,662.07 | |
| 7.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 8,386,108.09 | $ 8,386,108.09 | |
| 7.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 7,687,322.94 | $ 7,687,322.94 | |
| 7.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 41,215,611.54 | $ 41,215,611.54 | |
| 7.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 3,211,422.13 | $ 3,211,422.13 | |
| 7.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 12,931,351.24 | $ 12,931,351.24 | |
| 7.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 5,352,538.88 | $ 5,352,538.88 | |
| 7.3.9 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 774,475.88 | $ 774,475.88 | |
| 7.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 8,233,464.96 | $ 8,233,464.96 | |
| 7.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | | | $ 181,728.52 | $ 181,728.52 | |
| **7.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 69,105,917.09** | |
| 7.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | | $ 61,169,136.52 | $ 61,169,136.52 | |
| 7.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 3,281,128.51 | $ 3,281,128.51 | |
| 7.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 2,255,088.73 | $ 2,255,088.73 | |
| 7.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | | | $ 2,400,563.33 | $ 2,400,563.33 | |
| **7.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 37,830,258.53** | |
| 7.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | | | $ 5,294,410.43 | $ 5,294,410.43 | |
| 7.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | | | $ 8,005,199.95 | $ 8,005,199.95 | |
| 7.5.3 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 1,027,151.66 | $ 1,027,151.66 | |
| 7.5.4 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | | $ 4,531,881.56 | $ 4,531,881.56 | |
| 7.5.5 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | | | $ 9,477,036.08 | $ 9,477,036.08 | |
| 7.5.6 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | | $ 3,159,008.31 | $ 3,159,008.31 | $ 6,318,016.61 | |
| 7.5.8 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | | | $ 1,701,256.24 | $ 1,701,256.24 | |
| 7.5.12 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | | | $ 1,475,306.00 | $ 1,475,306.00 | |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.60** | **PINTURA** | | **$ -** | **$ -** | **$ 18,251,607.51** |
| 7.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | | $ 3,833,785.94 | $ 531,052.34 | $ 4,364,838.28 |
| 7.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | | | $ 3,725,126.79 | $ 3,725,126.79 |
| 7.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | | | $ 10,161,642.44 | $ 10,161,642.44 |
| **7.70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 22,632,592.64** |
| 7.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | | | $ 4,027,542.75 | $ 4,027,542.75 |
| 7.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | | | $ 18,605,049.89 | $ 18,605,049.89 |
| **7.80** | **RED HIDRÁULICA** | | **$ -** | **$ -** | **$ 531,772.66** |
| 7.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 69,210.00 | $ 69,210.00 |
| 7.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 18,852.18 | $ 18,852.18 |
| 7.8.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 315,049.67 | $ 315,049.67 |
| 7.8.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 35,436.00 | $ 35,436.00 |
| 7.8.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 38,807.45 | $ 38,807.45 |
| 7.8.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 41,526.60 | $ 41,526.60 |
| 7.8.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 12,890.76 | $ 12,890.76 |
| **7.90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 1,612,427.43** |
| 7.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 224,829.98 | $ 224,829.98 |
| 7.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 84,376.80 | $ 84,376.80 |
| 7.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 885,129.85 | $ 885,129.85 |
| 7.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 172,885.88 | $ 172,885.88 |
| 7.9.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 28,809.14 | $ 28,809.14 |
| 7.9.6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 76,309.56 | $ 76,309.56 |
| 7.9.7 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 105,537.31 | $ 105,537.31 |
| 7.9.8 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | | $ 34,548.91 | $ 34,548.91 |
| **8.00** | **URBANISMO Y PAISAJISMO** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8.10** | **PRELIMINARES** | | **$ -** | **$ -** | **$ 18,826,792.27** |
| 8.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | | | $ 18,826,792.27 | $ 18,826,792.27 |
| **8.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 198,547,239.66** |
| 8.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | | | $ 148,941,915.83 | $ 148,941,915.83 |
| 8.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | | | $ 28,898,483.10 | $ 28,898,483.10 |
| 8.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | | | $ 11,148,749.61 | $ 11,148,749.61 |
| 8.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | | | $ 9,558,091.12 | $ 9,558,091.12 |
| **8.30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | **$ -** | **$ -** | **$ 691,376,853.65** |
| 8.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | | | $ 680,379.98 | $ 680,379.98 |
| 8.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 1,650,950.45 | $ 1,650,950.45 |
| 8.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 5,006,631.70 | $ 5,006,631.70 |
| 8.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 979,183.72 | $ 979,183.72 |
| 8.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 1,749,719.36 | $ 1,749,719.36 |
| 8.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 616,566,062.49 | $ 616,566,062.49 |
| 8.3.7 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | | | $ 58,873,087.76 | $ 58,873,087.76 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.8 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa | | $ 2,431,371.50 | $ 2,431,371.50 |
| 8.3.9 | SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2,605,654.79 | $ 2,605,654.79 |
| 8.3.10 | PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACION | | $ 833,811.90 | $ 833,811.90 |
| **8.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 282,125,097.37** |
| 8.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | | $ 25,856,131.99 | $ 25,856,131.99 |
| 8.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 256,268,965.38 | $ 256,268,965.38 |
| **8.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8.60** | **PINTURA** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8.70** | **SIMBOLOS INSTITUCIONALES - POLICIA** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8.80** | **PAISAJISMO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8.90** | **RED HIDRÁULICA** | **$ -** | **$ -** | **$ 2,238,990.13** |
| 8.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 279,300.80 | $ 279,300.80 |
| 8.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 12,568.12 | $ 12,568.12 |
| 8.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,047,423.31 | $ 1,047,423.31 |
| 8.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 35,436.00 | $ 35,436.00 |
| 8.9.5 | TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 572,494.86 | $ 572,494.86 |
| 8.9.6 | ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 123,401.50 | $ 123,401.50 |
| 8.9.7 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 38,807.45 | $ 38,807.45 |
| 8.9.8 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 51,908.25 | $ 51,908.25 |
| 8.9.9 | BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 77,649.84 | $ 77,649.84 |
| **8.10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 118,877,770.83** |
| 8.10.1 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 9,694,135.49 | $ 9,694,135.49 |
| 8.10.2 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,080,536.75 | $ 1,080,536.75 |
| 8.10.3 | TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 10,787,273.75 | $ 10,787,273.75 |
| 8.10.4 | ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 4,286,687.90 | $ 4,286,687.90 |
| 8.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 12,956,594.52 | $ 12,956,594.52 |
| 8.10.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 12,310,654.90 | $ 12,310,654.90 |
| 8.10.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 12,706,327.76 | $ 12,706,327.76 |
| 8.10.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | | $ 17,025,021.00 | $ 17,025,021.00 |
| 8.10.9 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | | $ 24,904,442.08 | $ 24,904,442.08 |
| 8.10.10 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | | $ 13,126,096.68 | $ 13,126,096.68 |
| **8.11** | **RED CONTRA INCENDIO - RCI** | **$ -** | **$ -** | **$ 66,200,794.52** |
| 8.11.1 | TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2,766,943.76 | $ 2,766,943.76 |
| 8.11.2 | TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 2,218,666.55 | $ 2,218,666.55 |
| 8.11.3 | TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 17,857,737.30 | $ 17,857,737.30 |
| 8.11.4 | BUJE 2 1/2"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 237,084.84 | $ 237,084.84 |
| 8.11.5 | BUJE 4"X2 1/2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 222,541.56 | $ 222,541.56 |
| 8.11.6 | ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 356,866.32 | $ 356,866.32 |
| 8.11.7 | ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 161,099.68 | $ 161,099.68 |

INFORMACIÓN GENERAL

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.11.8 | ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 1,023,035.16 | $ 1,023,035.16 |
| 8.11.9 | UNION PRESIÓN 2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 229,169.07 | $ 229,169.07 |
| 8.11.10 | UNION PRESIÓN 2 1/2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 165,453.80 | $ 165,453.80 |
| 8.11.11 | UNION PRESIÓN 4" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 772,227.12 | $ 772,227.12 |
| 8.11.12 | GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 22,214,430.56 | $ 22,214,430.56 |
| 8.11.13 | SIAMESA TIPO YEE 4"X2 1/2" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 7,202,266.52 | $ 7,202,266.52 |
| 8.11.14 | VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | | $ 599,816.68 | $ 599,816.68 |
| 8.11.16 | ANCLAJE DE TECHO PARA TUBERIA DE 2" A 4", INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE,SOPORTES DE TUBERIA. | | $ 10,173,455.60 | $ 10,173,455.60 |
| **8.12** | **RED DE GAS** | $ - | $ - | **$ 4,711,910.19** |
| 8.12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 20-25mm | | $ 1,717,536.91 | $ 1,717,536.91 |
| 8.12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 12-16mm | | $ 1,242,194.76 | $ 1,242,194.76 |
| 8.12.5 | TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" TIPO PESADO | | $ 695,969.84 | $ 695,969.84 |
| 8.12.6 | TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO | | $ 474,344.98 | $ 474,344.98 |
| 8.12.7 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 3/4" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA | | $ 361,025.22 | $ 361,025.22 |
| 8.12.8 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA | | $ 220,838.48 | $ 220,838.48 |
| **9.00** | **CERRAMIENTO PERIMETRAL** | $ - | $ - | $ - |
| **9.10** | **PRELIMINARES** | $ - | $ - | $ - |
| **9.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | $ - | $ - | $ - |
| **9.30** | **CERRAMIENTO TIPO 1** | $ - | $ - | $ - |
| **9.40** | **CERRAMIENTO TIPO 2** | $ - | $ - | $ - |
| **9.50** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | $ - | $ - | $ - |
| **INP** | **ITEMS NO PREVISTOS** | $ - | $ - | **$ 1,357,310,171.65** |
| INP01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENVOLVENTE TIPO CORTASOL LINEAL CON SEPARACION VARIABLE Y TRANSMITANCIA TERMICA MEDIA/BAJA. INCLUYE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE SOPORTE, ANCLAJES , APLICACIÓN DE ADITIVO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, RESINAS ALQUIDICAS Y/O PIGMENTOS PROTECTORES INHIBIDORES DE CORROSION | $ 97,648,213.79 | $ 1,259,661,957.86 | $ 1,357,310,171.65 |
| | **PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT** | | **$ 40,892,801.82** | **$ 40,892,801.82** |
| | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA** | | **$ 67,091,651.99** | **$ 67,091,651.99** |
| | SUBTOTAL | **$ 948,783,988.14** | **$ 12,153,782,347.59** | **$ 12,361,279,616.29** |
| **AVANCE TOTAL EJECUTADO** | **77.28%** | A.I.U | **$ 313,098,716.09** | **$ 4,010,748,174.70** | **$ 4,079,222,273.38** |
| | | **VALOR TOTAL** | **$ 1,261,882,704.22** | **$ 16,164,530,522.29** | **$ 16,440,501,889.67** |
| **AVANCE PROGRAMADO** | **99.00%** | | | | |
| **PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO** | **-21.72%** | | | | |

**INFORMACIÓN GENERAL**

| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: | JULIO | FECHA DE INFORME |
|---|---|---|---|---|

## 6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

### ACTA PARCIAL

| CONCEPTO | VIGENTE | DESDE | HASTA | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | 24-mar-23 | 24-mar-24 | $ 628,782,310.00 | PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100008254 |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL | | 24-mar-23 | 24-mar-29 | $ 10,689,214,621.60 | PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100032073 |

| ACTAS REALIZADAS | | | CONTRATOS ADICIONALES | | | PRORROGAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | FECHA | OBSERVACION | Nº | VALOR | CAUSA | Nº | TIEMPO | CAUSAL |
| ACTA PARCIAL No. 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS | 29-jul.-2023 | N/A | 01 | $ 662,923,252.00 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 2 FASE II OBRA | 16-jul.-2024 | N/A | 02 | $ 2,056,234,178.94 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 3 FASE II OBRA | 26-sep.-2024 | N/A | 03 | $ 4,683,269,120.00 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 4 FASE II OBRA | 12-dic.-2024 | N/A | 04 | $ 2,256,534,524.05 | | | | |
| ACTA PARCIAL No. 5 FASE II OBRA | 3-abr.-2025 | N/A | 05 | $ 1,119,505,182.37 | | | | |

## 7. INFORMACION FINANCIERA

| Nº | CONVENIO | CONCEPTO | FECHA | PORCENTAJE | VALOR | AMORTIZACION | NETO PAGADO | ACUMULADO | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META" | | 19-jul.-2025 | 77.28% | $ 12,362,872,773.31 | $ 4,046,217,206.50 | $ 10,115,543,016.26 | $ 12,362,872,773.31 | $ 5,882,668,119.19 |

## 8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

°Se hace seguimiento a la elaboracion del menson en concreto en zona administrativa.
°Se hace verificacion de la aplicación de la pintura tipo vinilo en la zona administrativa.
°Se verifica la instalacion de la carpinteria metalica en zona administrativa.
°Se hace verificacion de las instalaciones electricas en la zona administrativa.
°Se hace seguimiento a la elaboracion del menson en concreto en zona de celdas.
°Se le hace seguimiento a la instalacion del piso grano marmol en la zona de celdas.
°Se hace verificacion de la aplicación de la pintura tipo vinilo en la zona de celdas.
°Se hace verificacion de las instalaciones electricas en la zona de celdas.
°Se hace seguimiento a la elaboracion del menson en concreto en zona social.
°Se le hace seguimiento a la instalacion del piso grano marmol en la zona social.
°Se hace verificacion de la aplicación de la pintura tipo vinilo en la zona social.
°Se hace verificacion de las instalaciones electricas en la zona social.

## OBSERVACIONES

° Se reinicia la ejecucion de la obra, luego del acta de suspension No. 1 del 7 de diciembre de 2024.
°Se prorroga los contratos derivados por un termino de 11 dias, esto con el fin de finalizar actividades que habian quedado inconclusas al momento de la suspension y que requerian ser finalizadas lo mas pronto, para evitar el deterioro de las mismas.

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

**JUAN CAMILO POSADA VARELA**
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA**
**CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**
**NIT.:901,696.564-7**
**Consorcio Interpolicia 2023 - Interventor**

**IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**
**SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS**
**Secretario de infraestructura - Supervisor**

**ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO**
**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA**
**CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023**
**NIT.:901.699.813-1**
**Consorcio Policia Acacias 2023 - Contratista**

| INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME SEMANAL No: | 63 | MES: JULIO | FECHA DE INFORME |

**10. REGISTRO FOTOGRÁFICO**















