ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S BIC

CONTRATO No. SI-CMA-007-2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

CONTIENE: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°2

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 18 DE ABRIL DE 2025 - 17 DE MAYO DE 2025.

MONTERÍA - CÓRDOBA

Tabla de contenido.

1 INTRODUCCIÓN. 4
2 DECRIPCION DEL PROYECTO 5
2.1LOCALIZACIÓN. 5
2.2ESTADO INICIAL DEL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS. 5
2.3CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO 11
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 20
3.1DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA. 20
ACTAS SUSCRITAS PARA EL CONTRATO DE OBRA 23
3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 23
3.3 INFORME DE AVANCE 24
3.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA 26
3.5 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 26
3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 27
3.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 28
3.8 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA 29
3.9INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS ..30
3.10 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR. 31
4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 31
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 31
ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33
4.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 33
4.3 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORÍA 34
4.4 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA 34
4.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 35
4.6 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 35
4.7 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN 36
5 INFORMACIÓN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 36
6 INFORME DE GESTIÓN AL PLAN DE CALIDAD 37
7 CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO – FINANCIERO) 37
8 REGISTRO FOTOGRAFICO 40
9 INFORME EJECUTIVO DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA 40
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41

Imágenes.

Ilustración 1. Localización del proyecto....5
Ilustración 2. Cocina existente - Cereté....6
Ilustración 3. Área de comedor existente - Cereté....6
Ilustración 5. Área de comedor existente – San Pelayo....6
Ilustración 4. Cocina – San Pelayo....6
Ilustración 6. Cocina existente - CdO....7
Ilustración 7. Área de comedor existente - CdO....7
Ilustración 8. Cocina existente - Moñitos....7
Ilustración 9. Área de comedor existente - Moñitos....7
Ilustración 11. Área de comedor existente - Tierralta....8
Ilustración 10. Cocina existente - Tierralta....8
Ilustración 12. Cocina existente – Planeta Rica....8
Ilustración 13. Área de comedor – Planeta Rica....8
Ilustración 15. Área de comedor existente - SBDV....9
Ilustración 14. Cocina existente SBDV....9
Ilustración 17. Área de comedor existente - Canalete....9
Ilustración 16. Cocina existente - Canalete....9
Ilustración 19. Área de comedor existente - SADS....10
Ilustración 18. Cocina existente - SADS....10
Ilustración 21. Área de comedor – Los Córdobas....10
Ilustración 20. Cocina – Los Córdobas....10
Ilustración 22. Porcentaje (%) de avance físico semanal del proyecto....24
Ilustración 23. Gráfico de avance físico semanal....38
Ilustración 24. Gráfico de avance físico mensual....38
Ilustración 25. Avance financiero semanal....39
Ilustración 26. Avance financiero mensual....39

Tablas.

Tabla 1. Información general contrato de obra....20
Tabla 2. Seguimiento a garantías contractuales del contrato de obra....22
Tabla 3. Actas del contrato....23
Tabla 4. Avance programado vs Avance ejecutado....25
Tabla 5. Relación de Personal del Contratista de Obra....27
Tabla 6. Estado del tiempo.....29
Tabla 7. Información de contrato de Interventoría....31
Tabla 8. Seguimiento a garantías contractuales de interventoría....32
Tabla 9. Actas del Contrato de Interventoría....33
Tabla 10. Personal de interventoría....34

1 INTRODUCCIÓN.

El presente documento corresponde al SEGUNDO informe mensual de interventoría, en el que se relacionan las actividades desarrolladas en el segundo mes contractual comprendido entre el 18 de abril de 2025 hasta el 17 de mayo de 2025.

Este informe exhibe la Interventoría realizada al contrato de obra N° SI-LP-002-2024, cuyo objeto es *"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATICA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA",* el cual reviste una importancia fundamental para la administración departamental, al buscar impactar positivamente la calidad de vida de la población estudiantil.

La creación y optimización de estos espacios no solo proporcionarán áreas dignas y confortables para que los alumnos disfruten de sus alimentos bajo los más altos estándares de comodidad y ventilación, sino que también se conciben como lugares de esparcimiento y recreación. Se espera que estas pausas en la jornada académica, desarrolladas en estos comedores, contribuyan a renovar el entusiasmo y la motivación de los estudiantes, fortaleciendo así su proceso de aprendizaje y su interacción con la comunidad educativa.

El informe contiene las actividades desarrolladas por el Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, representado legalmente por MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ bajo el Contrato N° SI-LP-002-2024, el cual cuenta con un plazo de OCHO (8) meses y un valor total de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.135.056.075,00).

Esta interventoría es realizada por ANTICA S.A.S BIC, representada legalmente por JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ bajo el Contrato No. SI-CMA-007-2024 con un plazo de OCHO (8) meses y un valor total de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($350.649.999,00).

El seguimiento y control de la ejecución de esta obra, detallado en el presente informe, se orienta a garantizar que los objetivos pactados se cumplan a cabalidad, entregando a la comunidad educativa espacios que fomenten su bienestar integral.

2 DECRIPCION DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente del país en la región Caribe Colombiana, Departamento de Córdoba. Específicamente en los municipios de Cereté (I.E. Marceliano Polo), San Pelayo (I.E. Santa Teresita sede general Santander), Ciénaga de Oro (I.E. Marco Fidel Suarez), Moñitos (I.E. San José de Moñitos sede principal), Tierralta (I.E. Junín), Planeta Rica (I.E. Plaza bonita), San Bernardo del Viento (I.E. El Castillo), Canalete (I.E. San José de Canalete), San Andrés de Sotavento (I.E. San Simón sede sagrado corazón de Jesús) y Los Córdobas (I.E. El Ébano).



Ilustración 1. Localización del proyecto.

2.2 ESTADO INICIAL DEL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS.

De acuerdo a las solicitudes presentadas por parte de rectores y representantes de las diferentes instituciones educativas, se realizaron visitas técnicas a cada una de ellas, con el fin de verificar sus condiciones iniciales y establecer un diagnóstico preliminar, identificando las necesidades de cada Institución. En las cuales se encontró lo siguiente:

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 3. Área de comedor existente - Cereté



Ilustración 2. Cocina existente - Cereté

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER.

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 5. Área de comedor existente – San Pelayo



Ilustración 4. Cocina – San Pelayo

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAZREZ.

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 7. Área de comedor existente - CdO



Ilustración 6. Cocina existente - CdO

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 9. Área de comedor existente - Moñitos



Ilustración 8. Cocina existente - Moñitos

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNIN

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 11. Área de comedor existente - Tierralta



Ilustración 10. Cocina existente - Tierralta

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y no cuentan con la capacidad necesaria para la atención de la población estudiantil de la institución educativa; por lo tanto, es necesario realizar la construcción de un nuevo comedor.



Ilustración 13. Área de comedor – Planeta Rica



Ilustración 12. Cocina existente – Planeta Rica

7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.



Ilustración 15. Área de comedor existente - SBDV



Ilustración 14. Cocina existente SBDV

8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE.

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.



Ilustración 17. Área de comedor existente - Canalete



Ilustración 16. Cocina existente - Canalete

9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMON SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.



Ilustración 19. Área de comedor existente - SADS



Ilustración 18. Cocina existente - SADS

10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO

Las instalaciones existentes cuentan con un alto grado de deterioro y es necesario realizar trabajos de reparación de cubiertas, pinturas, resanes de muros, pisos y demás adecuaciones necesarias para la correcta operación de cocina y comedor, garantizando así la prestación de un servicio de calidad para toda la población estudiantil.



Ilustración 21. Área de comedor – Los Córdobas



Ilustración 20. Cocina – Los Córdobas

2.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la intervención de diez instituciones educativas, en diferentes municipios del Departamento de Córdoba, de la siguiente manera:

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO
   Municipio: Cereté
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER
   Municipio: San Pelayo
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ
   Municipio: Ciénaga de Oro
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS SEDE PRINCIPAL
   Municipio: Moñitos
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUNÍN
   Municipio: Tierralta
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAZA BONITA
   Municipio: Planeta Rica
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Construcción comedor escolar de 312 metros cuadrados.

7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO
   Municipio: San Bernardo del Viento
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 75,0 metros cuadrados (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).

8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CANALETE
   Municipio: Canalete
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 130,40 metros cuadrados (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).

9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
   Municipio: San Andrés de Sotavento
   Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 48,00 metros cuadrados (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).

10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÉBANO
    Municipio: Los Córdobas
    Las intervenciones a realizar en esta institución son: Adecuación Comedor escolar de 80,96 m2 (Cubiertas, Pinturas y resanes, resanes de muros, Pisos, otros).

Las actividades y el alcance a ejecutar para este proyecto se relacionan a continuación:

					Formulario 1 - Propuesta económica		
					Código: 001		Versión: 1
		GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA PRESUPUESTO OFICIAL					
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA							
Nº	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR CORREGIDO**	**VALOR TOTAL**
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1.872,00	$ 4.287,00	$ 4.287,00	$ 8.025.264,00
	1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	1.872,00	$ 7.514,00	$ 7.514,00	$ 14.066.208,00
	1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	444,00	$ 21.007,00	$ 21.007,00	$ 9.327.108,00
Subtotal							**$ 31.418.580,00**
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	171,00	$ 39.259,00	$ 39.259,00	$ 6.713.289,00
	2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	409,00	$ 6.543,00	$ 6.543,00	$ 2.676.087,00
	2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	57,00	$ 206.382,00	$ 206.382,00	$ 11.763.774,00
	2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	730,20	$ 200.140,00	$ 200.140,00	$ 146.142.228,00
	2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	270,15	$ 22.830,00	$ 22.830,00	$ 6.167.525,00

Subtotal							**$ 173.462.903,00**
3. CIMENTACIÓN (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	3,01	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	5,70	$ 890.152,00	$ 890.152,00	$ 5.073.866,00
	3,02	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	34,20	$ 1.020.946,00	$ 1.020.946,00	$ 34.916.353,00
	3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	365,40	$ 124.557,00	$ 124.557,00	$ 45.513.128,00
	3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	7.173,00	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 69.276.834,00
	3,05	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	596,40	$ 40.066,00	$ 40.066,00	$ 23.895.362,00
Subtotal							**$ 178.675.543,00**
4. ESTRUCTURAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	4,01	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	438,00	$ 135.680,00	$ 135.680,00	$ 59.427.840,00
	4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	318,00	$ 135.759,00	$ 135.759,00	$ 43.171.362,00
	4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	12.107,40	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 116.933.269,00
	4,04	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.5Mpa (2500 PSI)	ML	131,00	$ 60.002,00	$ 60.002,00	$ 7.860.262,00
	4,05	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	108,00	$ 157.726,00	$ 157.726,00	$ 17.034.408,00
	4,06	MESON PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) E=0.08, CON REFUERZO 3/8" @ .15 EN AMBOS SENTIDOS CON ACABO EN GRANITO PULIDO	M2	9,60	$ 160.024,00	$ 160.024,00	$ 1.536.230,00
Subtotal							**$ 245.963.371,00**
5. MAMPOSTERIA Y REVOQUE (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	5,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL DE 0.12MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	1.236,00	$ 99.267,00	$ 99.267,00	$ 122.694.012,00
	5,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	2.662,00	$ 56.791,00	$ 56.791,00	$ 151.177.642,00
	5,03	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	2.362,00	$ 22.172,00	$ 22.172,00	$ 52.370.264,00
	5,04	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	2.362,00	$ 23.045,00	$ 23.045,00	$ 54.432.290,00
Subtotal							**$ 380.674.208,00**
6. ESTRUCTURA - CUBIERTA (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	6,01	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	1.304,00	$ 281.430,00	$ 281.430,00	$ 366.984.720,00
	6,02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	7.925,30	$ 22.867,00	$ 22.867,00	$ 181.227.835,00
	6,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	4.379,96	$ 18.468,00	$ 18.468,00	$ 80.889.101,00

Subtotal							**$ 629.101.656,00**
7. PISOS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	7,01	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	985,80	$ 127.857,00	$ 127.857,00	$ 126.041.431,00
	7,02	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	985,80	$ 163.779,00	$ 163.779,00	$ 161.453.338,00
	7,03	ENCHAPE CERÁMICA DE 0.30 X 0.60 MTS COLOR BLANCO BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS	M2	266,40	$ 172.440,00	$ 172.440,00	$ 45.938.016,00
	7,04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	707,40	$ 35.593,00	$ 35.593,00	$ 25.178.488,00
Subtotal							**$ 358.611.273,00**
8. CARPINTERIA							
	8,01	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	42,00	$ 805.968,00	$ 805.968,00	$ 33.850.656,00
	8,02	S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0.80 X 2.2M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UN	12,00	$ 729.435,00	$ 729.435,00	$ 8.753.220,00
	8,03	S/I PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO DOBLE HOJA, DE 1,50 X 2,20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJAS DE 30 CMS EN AMBAS PUERTAS Y POR AMBOS LADOS.	UN	12,00	$ 1.717.152,00	$ 1.717.152,00	$ 20.605.824,00
	8,04	S/I CORTINA ENROLLABLE DE LAMAS DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO DE 0,6 MM ESPESOR, ACABADO EN COLOR GRIS, APERTURA MANUAL.	M2	21,60	$ 429.923,00	$ 429.923,00	$ 9.286.337,00
	8,05	S/I VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 4mm	M2	42,72	$ 356.243,00	$ 356.243,00	$ 15.218.701,00
	8,06	S/I PROTECTOR DE VENTANAS EN VARILLA DE 1/2 CUADRADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	M2	62,16	$ 175.448,00	$ 175.448,00	$ 10.905.848,00
Subtotal							**$ 98.620.586,00**
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIOS(I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE							
	9,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	246,00	$ 2.798,00	$ 2.798,00	$ 688.308,00
	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR	ML	105,00	$ 12.259,00	$ 12.259,00	$ 1.287.195,00
	9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	54,00	$ 15.603,00	$ 15.603,00	$ 842.562,00
	9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	ML	87,00	$ 14.626,00	$ 14.626,00	$ 1.272.462,00
	9,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO	UN	42,00	$ 33.494,00	$ 33.494,00	$ 1.406.748,00
	9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM	UN	18,00	$ 116.469,00	$ 116.469,00	$ 2.096.442,00
	9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM	UN	24,00	$ 33.322,00	$ 33.322,00	$ 799.728,00
	9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA	UN	6,00	$ 57.277,00	$ 57.277,00	$ 343.662,00
	9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1"	UN	6,00	$ 46.500,00	$ 46.500,00	$ 279.000,00
	9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1"	UN	12,00	$ 27.150,00	$ 27.150,00	$ 325.800,00
	9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1"	UN	6,00	$ 18.049,00	$ 18.049,00	$ 108.294,00
	9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1"	UN	12,00	$ 76.785,00	$ 76.785,00	$ 921.420,00
	9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1"	UN	12,00	$ 76.785,00	$ 76.785,00	$ 921.420,00
	9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	42,00	$ 57.691,00	$ 57.691,00	$ 2.423.022,00

	9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UN	18,00	$ 59.062,00	$ 59.062,00	$ 1.063.116,00
	9,16	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	351,00	$ 2.798,00	$ 2.798,00	$ 982.098,00
	9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	108,00	$ 34.840,00	$ 34.840,00	$ 3.762.720,00
	9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR	ML	45,00	$ 46.441,00	$ 46.441,00	$ 2.089.845,00
	9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	ML	114,00	$ 62.212,00	$ 62.212,00	$ 7.092.168,00
	9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR	ML	72,00	$ 57.990,00	$ 57.990,00	$ 4.175.280,00
	9,21	PUNTO SANITARIO 2"	UN	84,00	$ 66.284,00	$ 66.284,00	$ 5.567.856,00
	9,22	PUNTO SANITARIO 4"	UN	6,00	$ 82.396,00	$ 82.396,00	$ 494.376,00
	9,23	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM	UN	18,00	$ 618.920,00	$ 618.920,00	$ 11.140.560,00
EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO							
	9,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 1/2HP (INCLUYE MANIFOLD DE SUCCIÓN)	UN	12,00	$ 1.416.032,00	$ 1.416.032,00	$ 16.992.384,00
	9,25	TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	UN	6,00	$ 1.075.173,00	$ 1.075.173,00	$ 6.451.038,00
APARATOS SANITARIOS						$ -	$ -
	9,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE	UN	6,00	$ 616.099,00	$ 616.099,00	$ 3.696.594,00
	9,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	12,00	$ 683.223,00	$ 683.223,00	$ 8.198.676,00
	9,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UN	12,00	$ 1.019.878,00	$ 1.019.878,00	$ 12.238.536,00
	9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UN	54,00	$ 104.607,00	$ 104.607,00	$ 5.648.778,00
	9,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADOS METÁLICOS	UN	12,00	$ 1.058.191,00	$ 1.058.191,00	$ 12.698.292,00
	9,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UN	12,00	$ 616.694,00	$ 616.694,00	$ 7.400.328,00
TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE							
	9,32	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS	M3	36,00	$ 39.259,00	$ 39.259,00	$ 1.413.324,00
	9,33	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	12,00	$ 206.382,00	$ 206.382,00	$ 2.476.584,00
	9,34	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	13,82	$ 200.188,00	$ 200.188,00	$ 2.766.598,00
	9,35	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20	$ 890.152,00	$ 890.152,00	$ 1.068.182,00
	9,36	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	8,40	$ 1.020.946,00	$ 1.020.946,00	$ 8.575.946,00
	9,37	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	28,98	$ 177.056,00	$ 177.056,00	$ 5.131.083,00
	9,38	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO	M2	24,00	$ 403.099,00	$ 403.099,00	$ 9.674.376,00
	9,39	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE	KG	1.615,80	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 15.605.396,00
TANQUE AGUA POTABLE						$ -	$ -
	9,40	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20	$ 39.259,00	$ 39.259,00	$ 5.935.961,00
	9,41	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00	$ 206.382,00	$ 206.382,00	$ 5.572.314,00
	9,42	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56	$ 22.831,00	$ 22.831,00	$ 4.487.661,00
	9,43	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20	$ 890.152,00	$ 890.152,00	$ 1.068.182,00
	9,44	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.	M3	10,80	$ 1.195.256,00	$ 1.195.256,00	$ 12.908.765,00

	9,45	S/I CINTA PVC O-22	ML	117,60	$ 106.274,00	$ 106.274,00	$ 12.497.822,00
	9,46	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20	$ 1.270.097,00	$ 1.270.097,00	$ 54.868.190,00
	9,47	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 29.970.706,00
TANQUE DE AGUAS RESIDUALES							
	9,48	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	M3	151,20	$ 39.259,00	$ 39.259,00	$ 5.935.961,00
	9,49	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	27,00	$ 206.382,00	$ 206.382,00	$ 5.572.314,00
	9,50	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3-KM	196,56	$ 22.831,00	$ 22.831,00	$ 4.487.661,00
	9,51	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	1,20	$ 765.656,00	$ 765.656,00	$ 918.787,00
	9,52	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	43,20	$ 905.605,00	$ 905.605,00	$ 39.122.136,00
	9,53	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	KG	3.103,20	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 29.970.706,00
Subtotal							**$ 383.437.363,00**
10. INSTALACIONES ELECTRICAS (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA)							
	10,01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	42,00	$ 251.975,00	$ 251.975,00	$ 10.582.950,00
	10,02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (incluye interruptor, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG)	UN	18,00	$ 254.729,00	$ 254.729,00	$ 4.585.122,00
	10,03	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UN	72,00	$ 1.246.819,00	$ 1.246.819,00	$ 89.770.968,00
	10,04	SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO Y EXTERIORES (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Panel LED 24W-Wallpack LED 30W)	UN	234,00	$ 624.202,00	$ 624.202,00	$ 146.063.268,00
	10,05	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO SALIDA (incluye Tubería EMT, Tuberia PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG, cable encauchetado 3x14AWG, Luminaria LED EMERGENCIA, Aviso LED SALIDA)	UN	60,00	$ 945.986,00	$ 945.986,00	$ 56.759.160,00
	10,06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCI, (incluye TOMA DOBLE 15A - 125V, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG) TD1-C-2-C4-C6-C8-10-12-14-16	UN	126,00	$ 203.416,00	$ 203.416,00	$ 25.630.416,00
	10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS. (incluye Protecciones, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00	$ 1.282.734,00	$ 1.282.734,00	$ 7.696.404,00
	10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA (incluye Tubería PVC, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°8AWG)	UN	6,00	$ 1.914.256,00	$ 1.914.256,00	$ 11.485.536,00
	10,09	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA EN Cu 2xN°8F + 1xN°8N (incluye Tuberia PVC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	ML	25,00	$ 147.633,00	$ 147.633,00	$ 3.690.825,00

	10,10	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE MEDIDA Y ADECUACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TABLERO DE PROTECCIONES (incluye Tuberia PVC, Tuberia IMC, cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas)	UN	6,00	$ 2.526.991,00	$ 2.526.991,00	$ 15.161.946,00
	10,11	SALIDA PARA TV (incluye TOMA TV, Tuberia PVC SCH40, Tubería EMT, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Coaxial RG-6)	UN	12,00	$ 202.067,00	$ 202.067,00	$ 2.424.804,00
	10,12	CERTIFICACION Retie Y Retilap Uso Final	UN	6,00	$ 2.873.894,00	$ 2.873.894,00	$ 17.243.364,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR							
	10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	UND	6,00	$ 3.599.955,00	$ 3.599.955,00	$ 21.599.730,00
	10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 4000W	UND	6,00	$10.471.226,00	$ 10.471.226,00	$ 62.827.356,00
	10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	6,00	$ 4.413.427,00	$ 4.413.427,00	$ 26.480.562,00
	10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	48,00	$ 1.502.974,00	$ 1.502.974,00	$ 72.142.752,00
	10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE VEINTITRES (23) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PRESERVEN LA INTEGRIDAD DE LOS PANELES	UND	48,00	$ 1.104.924,00	$ 1.104.924,00	$ 53.036.352,00
	10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	18,00	$16.125.303,00	$ 16.125.303,00	$ 290.255.454,00
Subtotal							**$ 917.436.969,00**
11. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E SAN JOSE CANALETE							
ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	11,01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO	Und	1,00	$ 817.173,00	$ 817.173,00	$ 817.173,00
	11,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	102,00	$ 7.514,00	$ 7.514,00	$ 766.428,00
	11,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	55,00	$ 21.007,00	$ 21.007,00	$ 1.155.385,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS							
	11,04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	18,00	$ 39.259,00	$ 39.259,00	$ 706.662,00
	11,05	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS	ML	41,60	$ 6.543,00	$ 6.543,00	$ 272.189,00
	11,06	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	6,00	$ 206.382,00	$ 206.382,00	$ 1.238.292,00
	11,07	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	66,80	$ 200.140,00	$ 200.140,00	$ 13.369.352,00
	11,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	28,27	$ 22.827,00	$ 22.827,00	$ 645.319,00
CIMENTACIÓN							
	11,09	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI)	M3	0,60	$ 890.152,00	$ 890.152,00	$ 534.091,00
	11,10	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M3	3,60	$ 1.020.946,00	$ 1.020.946,00	$ 3.675.406,00
	11,11	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	36,20	$ 124.557,00	$ 124.557,00	$ 4.508.963,00
	11,12	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	856,20	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 8.269.180,00
	11,13	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	40,00	$ 40.066,00	$ 40.066,00	$ 1.602.640,00
ESTRUCTURAS							
	11,14	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	40,00	$ 135.860,00	$ 135.860,00	$ 5.434.400,00

	11,15	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	21,60	$ 135.759,00	$ 135.759,00	$ 2.932.394,00
	11,16	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	1.241,80	$ 9.658,00	$ 9.658,00	$ 11.993.304,00
	11,17	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	M2	18,00	$ 157.726,00	$ 157.726,00	$ 2.839.068,00
ESTRUCTURA - CUBIERTA							
	11,18	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	130,40	$ 281.430,00	$ 281.430,00	$ 36.698.472,00
	11,19	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	825,55	$ 22.867,00	$ 22.867,00	$ 18.877.852,00
	11,20	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	417,14	$ 18.468,00	$ 18.468,00	$ 7.703.742,00
PISOS							
	11,23	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	98,60	$ 127.857,00	$ 127.857,00	$ 12.606.700,00
	11,24	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	98,60	$ 163.779,00	$ 163.779,00	$ 16.148.609,00
	11,25	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	12,00	$ 35.593,00	$ 35.593,00	$ 427.116,00
PINTURA COCINA EXISTENTE							
	11,26	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	124,30	$ 5.611,00	$ 5.611,00	$ 697.447,00
	11,27	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	124,30	$ 21.227,00	$ 21.227,00	$ 2.638.516,00
Subtotal							**$ 156.558.700,00**
12. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E EL CASTILLO - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO							
	12,01	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO E= 0.10 MTS DE CONCRETO Y SOPORTE EN BLOQUE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Und	1,00	$ 196.292,00	$ 196.292,00	$ 196.292,00
	12,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	75,00	$ 21.455,00	$ 21.455,00	$ 1.609.125,00
	12,03	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	70,70	$ 5.611,00	$ 5.611,00	$ 396.698,00
	12,04	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	75,00	$ 127.857,00	$ 127.857,00	$ 9.589.275,00
	12,05	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	75,00	$ 163.779,00	$ 163.779,00	$ 12.283.425,00
	12,06	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	48,38	$ 35.593,00	$ 35.593,00	$ 1.721.989,00
	12,07	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	41,60	$ 11.404,00	$ 11.404,00	$ 474.406,00
	12,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	70,70	$ 21.227,00	$ 21.227,00	$ 1.500.749,00
Subtotal							**$ 27.771.959,00**
13. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESÚS - MUNICIPIO SAN ANDRES DE SOTAVENTO							
	13,01	DEMOLICIÓN DE PISOS EN MAL ESTADO E=0,10 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	48,00	$ 21.455,00	$ 21.455,00	$ 1.029.840,00
	13,02	DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO INCLUYE ENTRAMADO EN CERCHAS METALICAS	M2	48,00	$ 21.256,00	$ 21.256,00	$ 1.020.288,00
	13,03	S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	KG	171,40	$ 18.469,00	$ 18.469,00	$ 3.165.587,00
	13,04	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON	M2	48,00	$ 281.430,00	$ 281.430,00	$ 13.508.640,00

		AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN					
	13,05	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	48,00	$ 127.857,00	$ 127.857,00	$ 6.137.136,00
	13,06	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	48,00	$ 163.779,00	$ 163.779,00	$ 7.861.392,00
	13,07	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS	ML	47,00	$ 35.593,00	$ 35.593,00	$ 1.672.871,00
	13,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	57,80	$ 21.227,00	$ 21.227,00	$ 1.226.921,00
Subtotal							**$ 35.622.675,00**
14. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR COCINA DE LA I.E EL EBANO - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS							
	14,01	REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	46,46	$ 5.611,00	$ 5.611,00	$ 260.687,00
	14,02	DEMOLICIÓN DE PISOS EN TABLON ROJO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES	M2	80,96	$ 21.455,00	$ 21.455,00	$ 1.736.997,00
	14,03	S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	M2	80,96	$ 163.779,00	$ 163.779,00	$ 13.259.548,00
	14,04	IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOSION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE, MOHO Y HONGOS	M2	28,30	$ 31.021,00	$ 31.021,00	$ 877.894,00
	14,05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	46,46	$ 21.455,00	$ 21.455,00	$ 996.799,00
	14,06	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	ML	40,40	$ 11.404,00	$ 11.404,00	$ 460.722,00
	14,07	DESMONTE DE VENTILADORES EN MAL ESTADO	UND	4,00	$ 21.865,00	$ 21.865,00	$ 87.460,00
	14,08	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO (incluye control, Tubería PVC SCH40, Cajas de conexión, accesorios de montaje, marquillas, cableado Cu N°12AWG,cable encauchetado 3x14AWG, Ventilador de Techo residencial)	UND	4,00	$ 1.246.819,00	$ 1.246.819,00	$ 4.987.276,00
Subtotal							**$ 22.667.383,00**
					SUBTOTAL OBRAS CIVILES		**$ 3.640.023.169,00**

DOTACIÓN DE MENAJE PARA COMEDOR - COCINA DE LAS DIFERENTES SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

15. SUMINISTRO PARA COCINAS Y COMEDORES (I.E MARCELIANO POLO, CERETE - I.E SANTA TERESITA SEDE GNRAL SANTANDER, SAN PELAYO - I.E MARCO FIDEL SUAREZ; CIENAGA DE ORO - I.E SAN JOSE DE MOÑITOS - I.E PLAZA BONITA SEDE NUEVA EL EBANO, PLANETA RICA. - I.E JUNIN, TIERRALTA - I.E EL EBANO, LOS CORDOBAS - I.E SAN SIMÓN SEDE SAGRADO CORAZON DE JESÚS, SAN ANDRES DE SOTAVENTO - I.E EL CASTILLO, SAN BERNARDO DEL VIENTO - DE LA I.E SAN JOSE CANALETE)							
	15,01	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA COCINAS	UND	10,00	$30.264.373,00	$ 30.264.373,00	$ 302.643.730,00
	15,02	SUMINISTRO DE DOTACION MENAJE COCINA Y COMEDORES	UND	10,00	$ 5.004.363,00	$ 5.004.363,00	$ 50.043.630,00
	15,03	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA COMEDORES	UND	10,00	$ 6.843.299,00	$ 6.843.299,00	$ 68.432.990,00
	15,04	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE BASURA	UND	10,00	$ 659.785,00	$ 659.785,00	$ 6.597.850,00
					SUBTOTAL SUMINISTROS		**$ 427.718.200,00**

SUBTOTAL PROYECTO		**$ 4.067.741.369,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS		**$ 4.067.741.369,00**
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA - PGIO		**$ 67.314.706,00**
VALOR TOTAL PROYECTO OBRA + SUMINISTRO		**$ 4.135.056.075,00**

VALOR TOTAL EN LETRAS:	**CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO Incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION			PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=		24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=		1%
NOTA 4: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administración).(Ajustar de acuerdo al proyecto)	UTILIDAD	U=		5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=		30%

Tabla 1. Presupuesto oficial de Obra

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA.

NÚMERO DEL CONTRATO	SI-LP-002-2024
ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMETNO DE CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002. NIT N°: 901.915.670-0 Rep. Legal MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ. C.C. N°: 1.010.007.099
NIT	901915670-0
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.135.056.075,00).
CDP:	4625 DE 11 DE FEBRERO DE 2025
INTERVENTORÍA	ANTICA S.A.S BIC
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL	17 DE NOVIEMBRE DE 2025

Tabla 2. Información general contrato de obra

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NB-100369947
		ANEXO No.	0
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	13 DE FEBRERO DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	12/04/2024	$ 413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	12/02/2025	12/04/2024	$ 1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2025	12/10/2028	$ 413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	12/02/2025	12/10/2030	$ 398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/02/2025	12/04/2026	$ 41.226.771,00

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB - 100095688
		ANEXO No.	0
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	13 DE FEBRERO DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/02/2025	12/10/2025	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUNCONTRATISTAS	12/02/2025	12/10/2025	$ 569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/02/2025	12/10/2025	$ 569.400.000,00
PATRONAL	12/02/2025	12/10/2025	$ 569.400.000,00

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NB-100369947
		ANEXO No.	3
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	2 DE ABRIL DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2025	17/05/2026	$ 413.513.491,50
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	17/03/2025	17/05/2026	$ 1.240.540.474,50
PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2025	17/11/2028	$ 413.513.491,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/03/2025	17/11/2030	$ 398.655.004,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/03/2025	17/05/2026	$ 41.226.771,00

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095688
		ANEXO No.	3
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:	13 DE FEBRERO DE 2025	APROBACIÓN DE PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO	13/03/2025	17/11/2025	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	13/03/2025	17/11/2025	$ 569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13/03/2025	17/11/2025	$ 569.400.000,00
PATRONAL	13/03/2025	17/11/2025	$ 569.400.000,00

Tabla 3. Seguimiento a garantías contractuales del contrato de obra

Se verificó la actualización de las pólizas de garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista de obra, en concordancia con la suscripción del Acta de Inicio del contrato, suscrita el día 17 de marzo de 2025 entre el Consorcio INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, como contratista de obra y ANTICA S.A.S BIC, como Interventor.

- CONTROL DE GARANTIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.
  VER ANEXO N°1

ACTAS SUSCRITAS PARA EL CONTRATO DE OBRA

TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD	14 DE MARZO DE 2025
CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA DEL PROYECTO:	14 DE MARZO DE 2025
ACTA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025

Tabla 4. Actas del contrato

- ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA.
  VER ANEXO N°2

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Para el mes del que trata el presente informe, se lograron realizar las siguientes actividades:


- Localización, trazado y replanteo: 312,00 M2.
- Adecuación y nivelación del terreno: 312,00 M2.
- S/I cerramiento provisional en fique color verde para obra H=2.10M: 74,00 ML.
- Excavación manual para zapatas de 1.00x1.00 MTS: 15,20 M3.
- Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapatas en piedra rajón – material seleccionado: 9,50 M3.
- Relleno del área con material seleccionado compactado: 468,46
- Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre 10 km: 19,76 M3.
- Acero refuerzo fy=4,2MPa cimentación: 1.529,33KG.
- Columnas de 0.30 x 0.30 mts en concreto de 21 mpa (3000 psi): 221,40 ML
- Viga superior de 0.30 x 0.30 mts en concreto de 21 mpa (3000 psi): 199,80 ML
- Acero refuerzo fy=4,2MPa estructuras: 2.658,74 KG.
- Localización, trazado y replanteo manual de tubería presión: 123,00 ML
- Localización, trazado y replanteo manual de tubería presión: 175,50 ML

- Reemplazo o mejoramiento del terreno para superficie de apoyo de tanque en piedra rajón - material seleccionado (80/20) – Tanque Agua Potable: 17,34 M3.
- Solado en concreto e = 0.05 mts de 14 mpa para tanque de agua potable (2000 psi): 1,73 m3
- Acero de refuerzo fy = 420 mpa para estructura tanque agua potable: 1.836,98 KG
- Reemplazo o mejoramiento del terreno para superficie de apoyo de tanque en piedra rajón - material seleccionado (80/20) – Tanque Agua Residuales: 12,62 M3.
- Solado en concreto e = 0.05 mts de 14 mpa para tanque de agua residual (2000 psi): 1,26 m3
- Acero de refuerzo fy = 420 mpa para estructura tanque enterrado de agua residuales: 1.044,02 KG

3.3 INFORME DE AVANCE

3.3.1 AVANCE DE OBRA PROGRAMADA, EJECUTADA Y ACUMULADA DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido entre la semana N°5 y la semana N°9 del presente informe mensual, el seguimiento al avance de obra programado y ejecutado arrojó los siguientes resultados:

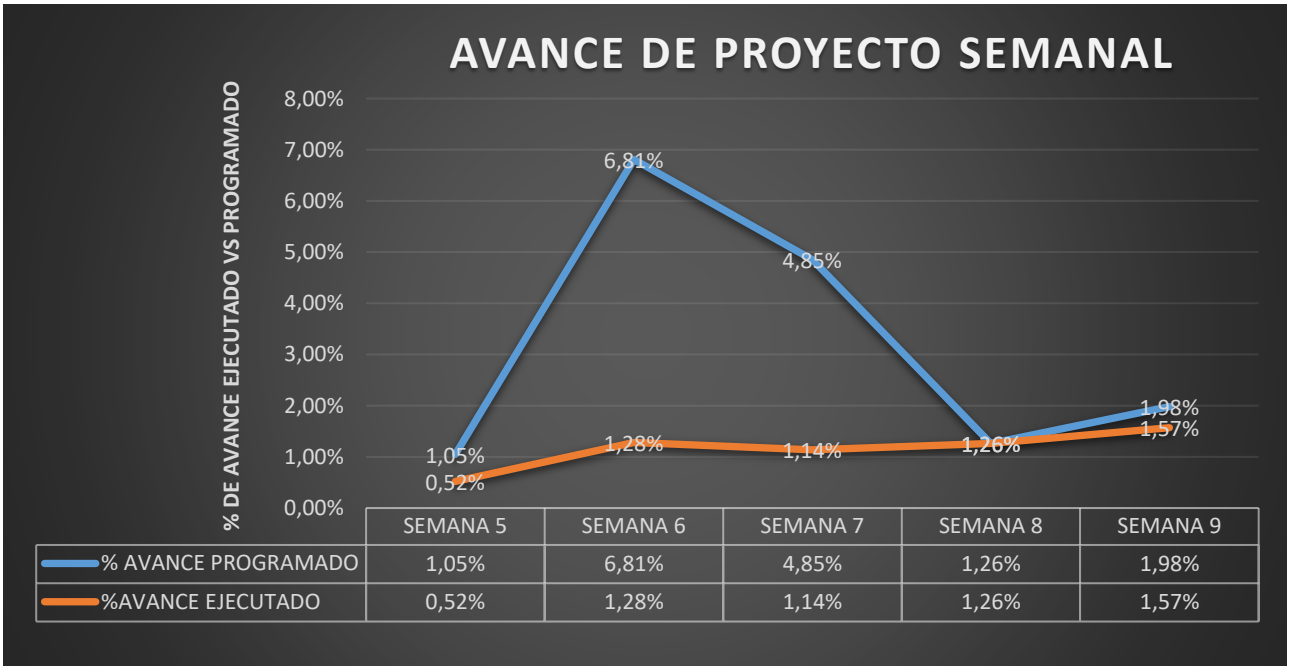

	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
% AVANCE PROGRAMADO	1,05%	6,81%	4,85%	1,26%	1,98%
%AVANCE EJECUTADO	0,52%	1,28%	1,14%	1,26%	1,57%

Ilustración 22. Porcentaje (%) de avance físico semanal del proyecto

AVANCE	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	ACUMULADO
AVANCE PROGRAMADO (%)	1,05%	6,81%	4,85%	1,26%	1,98%	15.95%
AVANCE EJECUTADO (%)	0,52%	1,28%	1,14%	1,26%	1,57%	5.77%

Tabla 5. Avance programado vs Avance ejecutado

De acuerdo con la tabla de avance anterior, para este segundo mes de ejecución, el proyecto registra un retraso del 10.18% respecto a la programación establecida. Esta situación ha sido comunicada formalmente al contratista.

En respuesta, el contratista se ha comprometido a entregar un plan de contingencia que incluya la reprogramación de obra N°1. Esta reprogramación es crucial, pues debe reflejar la situación real de la obra, asegurando que las actividades programadas coincidan con los frentes de trabajo y las intervenciones que actualmente se están ejecutando. A la fecha de cierre de este informe, seguimos a la espera de recibir dicha documentación para su respectivo análisis, verificación y aprobación.

3.3.2 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo correspondiente al presente informe mensual, esta Interventoría elaboró y remitió a la Supervisión del Contrato y a la Secretaría de Infraestructura Departamental un total de Cinco (5) informes semanales. Estos documentos, enviados vía correo electrónico, detallaron el seguimiento de todas las actividades de construcción ejecutadas durante cada semana comprendida en el periodo.

En cada informe semanal se plasmó el avance físico de las obras, las novedades relevantes, el estado de cumplimiento del cronograma, el control de calidad, los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y cualquier otra información pertinente para el adecuado seguimiento del proyecto.

- INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA
  VER ANEXO N°3

3.3.3 ACTAS DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

En el marco del seguimiento y control del programa de obra, se llevaron a cabo tres (3) comités técnicos de obra realizados en la oficina de esta interventoría. En estos espacios, conjunto con el contratista, se abordaron temas relevantes para el desarrollo del proyecto, incluyendo el seguimiento y control de la ejecución de las actividades en curso, la evaluación de realizar un balance de cantidades y la necesidad de realizar una reprogramación de obra debido a los atrasos presentados de acuerdo al cronograma.

- COMITES Y VISITAS
  VER ANEXO N°4

3.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el periodo objeto del presente informe, se ha verificado de manera constante la presencia y operatividad de los equipos mínimos requeridos en el anexo técnico del contratista en los diferentes frentes de trabajo. Se constata que el contratista ha mantenido en obra los equipos esenciales para llevar a cabo todas las actividades pertinentes, tales como el vibrador de aguja para concreto, el compactador tipo rana, el mezclador de concreto y el equipo de oxicorte.

Es importante destacar que, dada la naturaleza del proyecto y su distribución en diez (10) instituciones educativas, estos equipos han mantenido una dinámica de rotación entre las tres (3) diferentes sedes donde se desarrollan actividades actualmente. Para garantizar la continuidad y optimización de los trabajos sin generar retrasos por la disponibilidad de los equipos, los responsables de cada frente siguen la coordinación planeada inicialmente para la programación y utilización de los mismos, acordando horarios que permiten su uso oportuno cada vez que se requiere en las diferentes tareas constructivas.

- EQUIPOS DE CONTRATISTA DE OBRA
  VER ANEXO N°5

3.5 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL QUINTERO GONZÁLEZ	100%
DIRECTOR DE OBRA	KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNANDEZ	50%
RESIDENTE DE OBRA 1	ANDY MIGUEL AGÁMEZ GENEY	100%
RESIDENTE DE OBRA 2	RICARDO JAVIER CASTRO ESCOBAR	100%

RESIDENTE DE OBRA 3	JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA	100%
INGENIERO ELÉCTRICO	HÉCTOR RAMÍREZ LIBREROS	40%
INGENIERO SANITARIO	SHARON MELISA CORRALES MARTINEZ	40%

Tabla 6. Relación de Personal del Contratista de Obra

Durante el periodo de este informe, se observó que los profesionales designados por el contratista para la ejecución del proyecto demostraron la dedicación requerida y atendieron de manera diligente las responsabilidades inherentes a sus respectivos cargos.

Por su parte, el personal de obra, mantuvo la conformación de las cuadrillas de trabajo en cada uno de los frentes activos, en concordancia con la planificación establecida para las diferentes actividades constructivas. Adicionalmente, se destaca la disposición del personal técnico y administrativo del contratista para atender las solicitudes de información y coordinación por parte de la Interventoría, lo cual ha facilitado el seguimiento y la resolución de aspectos técnicos y operativos del proyecto.

3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra de N° SI-LP-002-2024 cuyo objeto es *MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.* Valor del contrato correspondiente a CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.135.056.075,00). El contrato cuenta con un anticipo del 30%.

FORMA DE PAGO:

- ANTICÍPO: Para este proyecto, a la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato. Este porcentaje se determinó con el objetivo de generar un apalancamiento financiero al contratista, a fin de que las obras se ejecuten oportunamente y sin contratiempos. PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO: Para el manejo de los recursos entregado a título de anticipo, de conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato.

- El Departamento de Córdoba cancelará el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del

30% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo. 2.- PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Es de anotar que el día 29 de abril se vió reflejado el desembolso a título del anticipo acordado para el contratista, es decir del 30% del valor del contrato, correspondiente a una suma de $ 1.240.516.822,50 en la fiducia respectiva.

3.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se presenta tabla de estado del tiempo durante el periodo del presente informe:

ESTADO DEL TIEMPO	
FECHA	DESCRIPCIÓN
18 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE SOLEADO
19 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
20 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE NUBLADO
21 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE LLUVIOSO
22 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO/ TARDE SOLEADO
23 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO/ TARDE LLUVIOSO
24 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE NUBLADO
25 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO/ TARDE LLUVIOSO
26 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE SOLEADO
27 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO/ TARDE LLUVIOSO
28 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO/ TARDE LLUVIOSO
29 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA NUBLADO / TARDE LLUVIOSO
30 DE ABRIL DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE LLUVIOSO
01 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
02 DE MAYO DE 2025	MAÑANA NUBLADO / TARDE LLUVIOSO
03 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE LLUVIOSO
04 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
05 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE LLUVIOSO
06 DE MAYO DE 2025	MAÑANA NUBLADO / TARDE LLUVIOSO
07 DE MAYO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE NUBLADO
08 DE MAYO DE 2025	MAÑANA LLUVIOSO / TARDE NUBLADO
09 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
10 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE NUBLADO
11 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO/ TARDE NUBLADO
12 DE MAYO DE 2025	MAÑANA NUBLADO / TARDE LLUVIOSO
13 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
14 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE LLUVIOSO
15 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO
16 DE MAYO DE 2025	MAÑANA NUBLADO / TARDE LLUVIOSO
17 DE MAYO DE 2025	MAÑANA SOLEADO / TARDE SOLEADO

Tabla 7. Estado del tiempo.

Durante el periodo cubierto por el presente informe, las condiciones meteorológicas presentaron variaciones que impactaron el normal desarrollo de las actividades constructivas. Se registraron un total de dieciséis (16) días con precipitaciones pluviales en las zonas de influencia del proyecto.

Estas lluvias, de diversa intensidad y duración, generaron interrupciones y afectaciones en la programación de algunas tareas, especialmente aquellas que se desarrollan a la intemperie, como las excavaciones, mejoramientos al terreno, rellenos y fundición de concreto en elementos estructurales como las columnas y vigas superiores de la estructura de los comedores, así como también los tanques enterrados de agua potable y residuales, que requieren condiciones de terreno seco para su correcta ejecución.

Estas precipitaciones incidieron en los atrasos que se reflejan a la fecha, pues era necesario esperar que el terreno se encontrara seco para darle continuidad a los trabajos, lo que en muchas ocasiones llevaba más tiempo de lo esperado.

El contratista tomó las medidas correctivas necesarias para mitigar los efectos de estas lluvias, sin embargo, es importante considerar estos eventos climáticos al analizar el avance general de la obra

- REGISTRO IDEAM
  VER ANEXO N°6

3.8 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA

En relación con el anticipo estipulado para el presente Contrato de Obra, se informa que se tramitó una cuenta por valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($1.240.516.822,00), lo que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.

De este monto, el contratista recibió un desembolso final de $1.178.490.981,50, luego de la aplicación de una retención contribución especial de obra pública correspondiente a un valor de $62.025.841,00, que equivale al 5% del valor del anticipo.

Del valor desembolsado, se ha verificado que el contratista destinó el 22.50% a la adquisición de materiales de construcción, el 25% al transporte de dichos

materiales, el 45% a la subcontratación de obra, y el 7.50% restante como avance para el pago de mano de obra.

A la fecha de presentación de este informe, ya se ha realizado un primer desembolso de fondos, restando un saldo disponible en los diferentes rubros para su futura inversión en el desarrollo del proyecto.

La Interventoría continuará monitoreando la correcta inversión y el buen manejo de los recursos del anticipo en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
  VER ANEXO N°7

3.9 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe mensual, se llevaron a cabo ensayos de resistencia a la compresión en probetas de concreto extraídas de los elementos estructurales fundidos en obra, específicamente de columnas y vigas superiores en cada una de las tres sedes que se encuentran en intervención.

El objetivo de estas pruebas es verificar el cumplimiento de la resistencia especificada en los diseños y garantizar la calidad estructural de las construcciones.

Los resultados detallados de estos ensayos, incluyendo las fechas de muestreo, los elementos evaluados, las resistencias obtenidas a diferentes edades (ej. 7, 14 y 28 días) y su comparación con los valores de diseño, se anexan en el presente informe.

El análisis de estos resultados es fundamental para esta Interventoría en su labor de control de calidad y para asegurar la durabilidad y seguridad de las edificaciones.

- ENSAYOS DE LABORATORIO
  VER ANEXO N°8

3.10 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR.

En cumplimiento de las labores de supervisión y control, se procedió a la revisión de los pagos de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) correspondientes al personal del contratista de obra que labora en el proyecto durante el periodo evaluado.

La documentación soporte de estos pagos, proporcionada por el contratista, se adjunta al presente informe para su debida verificación y archivo.

- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA
  VER ANEXO N°9

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO	SI-CMA-007-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATICA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA""
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	ANTICA S.A.S BIC
NIT	901823241-9
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ C.C. N° 1.067.958.787 de Montería
CDP N°	4725 DE 11 DE FEBRERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($350.649.999,00).
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL	17 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL - CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

Tabla 8. Información de contrato de Interventoría

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA No. CUMPLIMIENTO	CMT-100015007
		ANEXO N°	0
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21 DE FEBRERO DE 2025	FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	14/02/2025	17/04/2024	$ 35.064.999,90
PRESTACIONES SOCIALES	14/02/2025	17/10/2028	$ 35.064.999,90
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2025	17/04/2030	$ 35.064.999,90

ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA No. CUMPLIMIENTO	CMT-100015007
		ANEXO N°	2
FECHA DE EXPEDICIÓN:	28 DE MARZO DE 2025	FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	

AMPARO	VIGENCIA A FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/03/2025	21/05/2026	$ 35.064.999,90
PRESTACIONES SOCIALES	17/03/2025	21/11/2028	$ 35.064.999,90
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2030	$ 35.064.999,90

Tabla 9. Seguimiento a garantías contractuales de interventoría

- GARANTÍAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
  VER ANEXO N°10

ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD DE CIENAGA DE ORO, SAN PELAYO Y CERETÉ	14 DE MARZO DE 2025
CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA DEL PROYECTO EN CIENAGA DE ORO, SAN PELAYO Y CERETÉ:	14 DE MARZO DE 2025
ACTA DE INICIO / FINAL	17 DE MARZO DE 2025
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD DE MOÑITOS	16 DE MAYO DE 2025
CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA DEL PROYECTO EN MOÑITOS	16 DE MAYO DE 2025

Tabla 10. Actas del Contrato de Interventoría

ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- VER ANEXO N°11

4.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido en el presente informe, la labor de esta Interventoría se centró en el seguimiento integral de las actividades desarrolladas por el contratista de obra en el marco del Contrato N° SI-CMA-007-2024. Esta supervisión incluyó el control y verificación del avance de las actividades constructivas, tal como se detalla en el literal 3.2 “DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES” del presente documento, a través de visitas periódicas a los diferentes frentes de trabajo y la revisión de la documentación de soporte.

De manera regular, se informó a la entidad contratante sobre el progreso de la obra mediante la elaboración y envío de informes semanales, los cuales incluyeron registros fotográficos que evidenciaron el estado de las actividades. Asimismo, se convocaron y realizaron los comités técnicos necesarios para abordar aspectos específicos del proyecto.

Esta Interventoría mantuvo una presencia activa en el proyecto, buscando identificar de manera oportuna cualquier novedad o situación que pudiera afectar el normal desarrollo del objeto contractual, para así informar de inmediato a la entidad contratante para su conocimiento y toma de decisiones.

Para este periodo en cuestión, se pudo verificar que no se presentó ninguna anomalía que pudiera afectar el desarrollo normal del proyecto. El objetivo primordial de estas acciones es garantizar un control total de la obra en todas sus etapas y asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato para lograr el resultado esperado.

4.3 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORÍA

Para el adecuado desempeño de las labores de supervisión e inspección en los diversos frentes de trabajo del proyecto, esta Interventoría dispuso de un vehículo tipo camioneta 4x4 de manera permanente.

Este recurso móvil resultó esencial para garantizar la presencia oportuna del equipo de interventoría en las diferentes sedes de las instituciones educativas en ejecución, facilitando el seguimiento diario de las actividades, la verificación en sitio de la calidad de los trabajos y la atención eficiente a cualquier requerimiento o eventualidad que surgiera durante la ejecución de la obra.

El vehículo se mantuvo operativo y en condiciones óptimas para cumplir con las exigencias de desplazamiento inherentes a la naturaleza dispersa geográficamente del proyecto.

4.4 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ	100%
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES	20%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	NAYALIBE ELJACH MANJARREZ	100%
PROFESIONAL SG-SST	JOHAN SEBASTIAN BARRERA GONZÁLEZ	15%
ABOGADO	EDER LUIS MACHADO SOTO	5%
CONTADOR	ELI JOSÉ CUAVAS VEGA	6%
SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL	OLINDA ESTHER MANAJARREZ MARTINEZ	50%
INSPECTOR SG-SST	ALVARO JAVIER GOMEZ RAMOS	85%

Tabla 11. Personal de interventoría.

4.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría de N° SI-CMA-007-2024 cuyo objeto es "*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATICA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".* El valor del contrato corresponde a TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($350.649.999,00).

FORMA DE PAGO:

- El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, en la misma proporción de la ejecución del contrato objeto de interventoría, para lo cual será requerido cuenta de cobro o factura informe parcial de ejecución, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás requeridos por la entidad para los trámites de las cuentas. PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago final será requerido cuenta de cobro o factura, informe final de interventoría, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, acta de liquidación, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo, la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica y demás requeridos por la entidad para los trámites de las cuentas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los porcentajes de pagos mensuales no podrán ser superiores a los porcentajes de los avances físicos de la obra. PARÁGRAFO TERCERO. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

A la fecha de presentación del presente informe, no se ha realizado ningún pago a esta interventoría

4.6 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado

4.7 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

En cumplimiento de los requerimientos contractuales y normativos, se adjunta al presente informe la documentación soporte de los pagos correspondientes a los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, si aplica) del personal de la Interventoría asignado al seguimiento y control del Contrato respectivo durante el periodo evaluado.

- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA
  VER ANEXO N°12

5 INFORMACIÓN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Durante el periodo del presente informe, la gestión socio-ambiental del proyecto se centró en el seguimiento del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO). Se verificó la implementación de las medidas tomadas en materia ambiental con el objetivo de minimizar los impactos negativos.

Se observó la mejora en el reforzamiento de la gestión de residuos, la inclusión de mayores puntos ecológicos en cada una de las sedes intervenidas y una zona de disposición parcial adecuada para residuos químicos. De igual manera se ha implementado la respectiva señalización y manejo de instalaciones temporales para el adecuado almacenamiento de basuras y residuos provenientes de la obra.

En cuanto al componente social, se mantuvo comunicación con las comunidades de las diferentes instituciones educativas intervenidas a través de los canales establecidos para informarlos acerca del avance de la obra, para que estos a su vez, desarrollen un sentido de pertenencia con el proyecto y cuiden el entorno en el cual se está desarrollando el mismo.

Es de anotar que no se reportaron incidentes ni accidentes durante este periodo y en general, se han tomado las medidas requeridas tal y como lo estipula la normativa vigente.

El seguimiento a estos aspectos continuará siendo prioritario para esta Interventoría, buscando garantizar un desarrollo del proyecto que minimice impactos ambientales negativos y fomente la participación de las comunidades beneficiarias de esta importante obra.

6 INFORME DE GESTIÓN AL PLAN DE CALIDAD

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la gestión del Plan de Calidad se enfocó en asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos para la ejecución del proyecto de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y el Plan de Calidad.

Se realizaron ensayos de laboratorio para el control de calidad de los materiales empleados, cuyos resultados se encuentran adjuntos al presente informe. Adicionalmente, se llevó a cabo un monitoreo y evaluación de los procedimientos constructivos implementados por el contratista, mediante visitas técnicas regulares al proyecto.

Dada la criticidad de las actividades de fundición concreto para elementos como las columnas y vigas superiores desarrolladas durante este periodo), se intensificó la supervisión en sitio para verificar la correcta ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y los planos establecidos.

Los reportes semanales emitidos por esta Interventoría reflejan, en general, una adecuada ejecución de estas actividades, cumpliendo con los parámetros de calidad exigidos.

Esta Interventoría continuará realizando estricto seguimiento a los procesos constructivos realizados por el contratista y velando por la calidad de los recursos humanos y físicos empleados para desarrollar cada una de las actividades contractuales con el fin de que se cumpla con las diferentes normas técnicas colombianas que rigen los factores de calidad en obra.

- INFORME DE SEGUIMIENTO SST Y AL PGIO
  VER ANEXO N°13

7 CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO – FINANCIERO)

Durante el periodo del presente informe, el avance físico acumulado del proyecto se sitúa en un 9.71% de ejecución, en relación con la programación establecida que representa un 19.85%. Es decir, hasta la fecha, la obra presenta un atraso acumulado del 10.14%.

Este atraso se refleja debido a la discrepancia existente entre lo programado por el contratista y la realidad actual del proyecto.

En cuanto al componente financiero, se tramitó una cuenta a título de anticipo por valor de $1.240.516.822,00, equivalente al 30% del valor del contrato, la cual ya ha sido desembolsada al contratista.

El avance financiero a la fecha, con respecto a los pagos parciales recibidos por parte del contratista, corresponde a un 0,00% del valor del contrato.

A continuación, se presenta un cuadro detallado que representa el avance físico y financiero general de la ejecución de las actividades contractuales del proyecto, permitiendo una visión integral del estado actual de la ejecución presupuestal y del progreso constructivo.

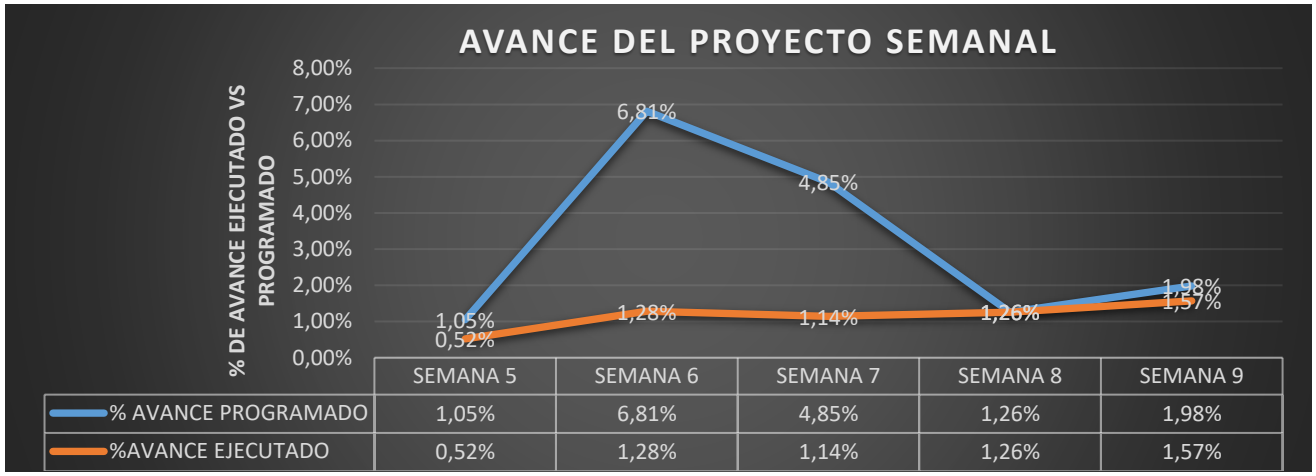


Ilustración 23. Gráfico de avance físico semanal

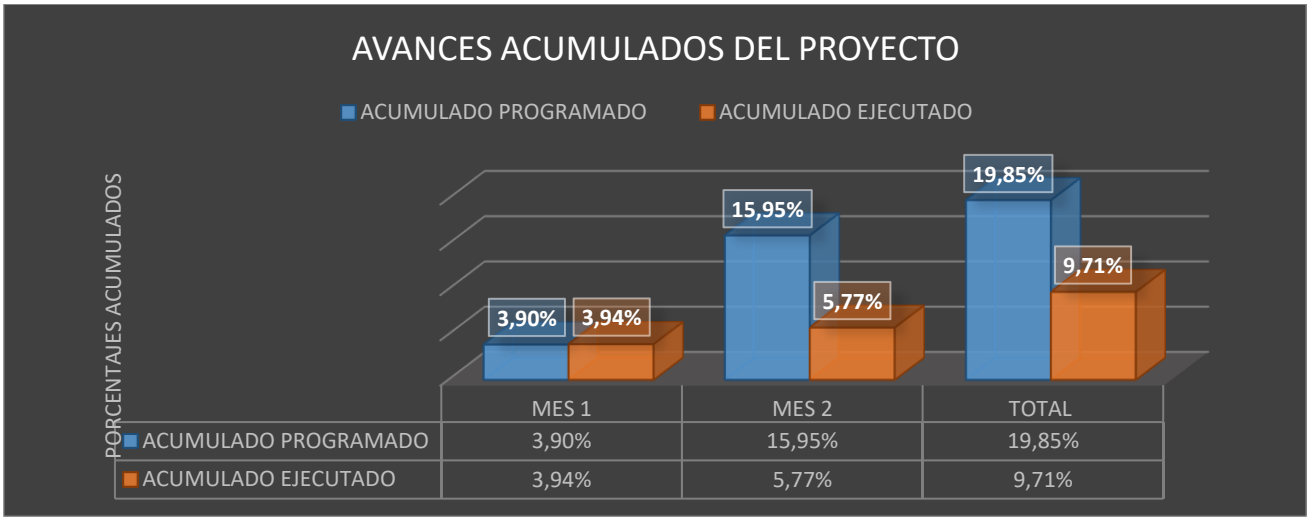


Ilustración 24. Gráfico de avance físico mensual

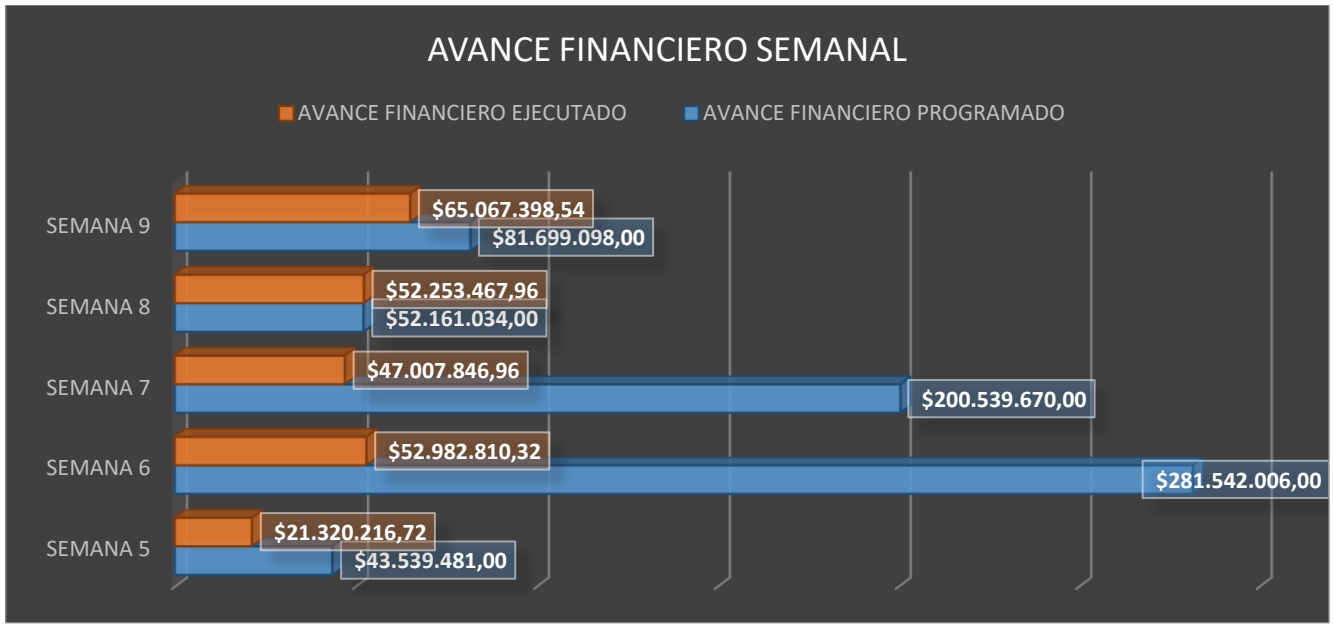


Ilustración 25. Avance financiero semanal

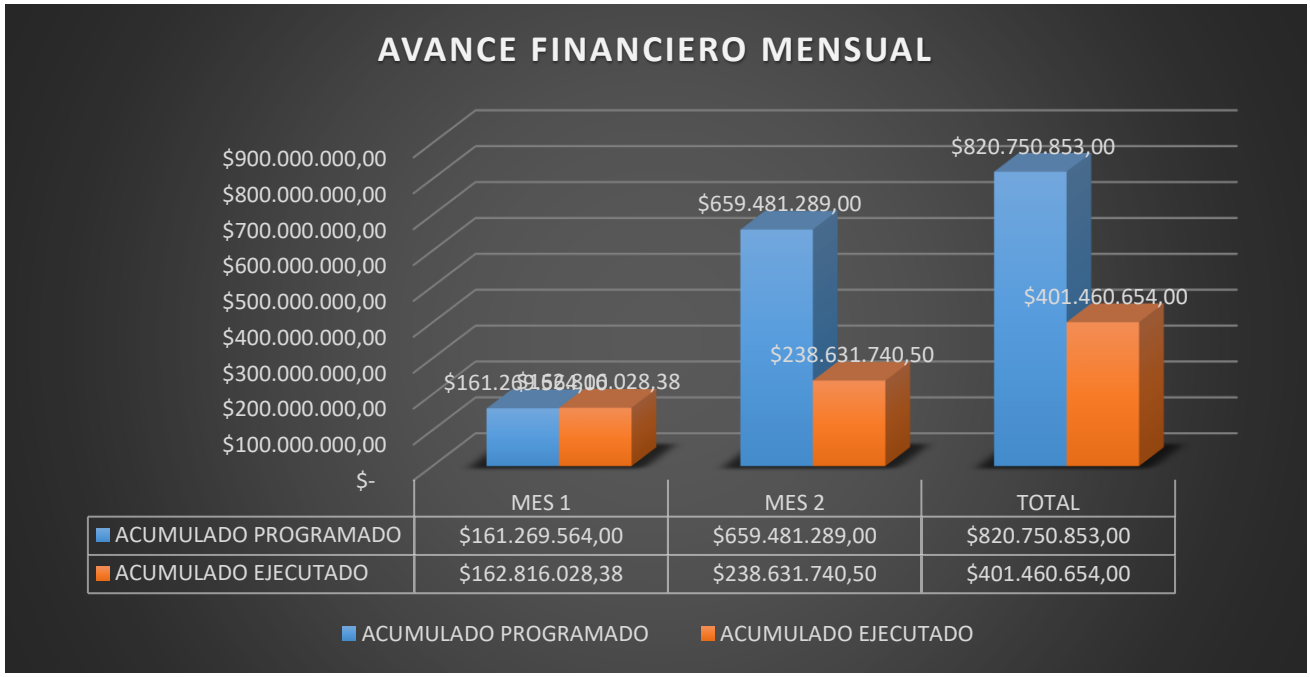


Ilustración 26. Avance financiero mensual

8 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta al presente informe mensual un registro fotográfico que documenta el avance de las actividades constructivas desarrolladas durante el periodo respectivo en los diferentes frentes de trabajo del proyecto.

Las imágenes presentadas ilustran el estado de las actividades de los capítulos de estructuras para columnas, vigas superiores, movimientos de tierra, inicio de actividades hidrosanitarias y otras labores relevantes ejecutadas en las instituciones educativas intervenidas.

Este material visual anexo al presente documento complementa la información detallada en los apartados anteriores del informe, permitiendo una mejor comprensión del progreso físico de la obra y evidenciando las condiciones de ejecución en sitio.

El registro fotográfico se organiza por institución educativa y actividad, facilitando la identificación y el seguimiento del avance en cada una de las localizaciones del proyecto.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO
  VER ANEXO N°14

9 INFORME EJECUTIVO DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA

Durante el segundo mes de ejecución de la obra, la Dirección de Interventoría desplegó una gestión integral orientada al cumplimiento técnico del objeto contractual, certificando el avance y la correcta ejecución de las actividades iniciales conforme a los requerimientos técnicos pertinentes.

En esta primera etapa constructiva correspondiente a las tres sedes en intervención, se realizó la respectiva revisión, verificación, control y seguimiento a las actividades en ejecución con respecto a la estructura de la edificación – comedor.

Con el objetivo de mantener una comunicación fluida y un seguimiento proactivo del proyecto, se programaron y coordinaron con el contratista las reuniones y comités de seguimiento periódico, asegurando así un flujo constante de información con la Supervisión. Adicionalmente, se verificó la existencia y suficiencia de los planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones técnicas indispensables para el inicio y la correcta ejecución de las obras pactadas.

La Dirección de Interventoría ha establecido y mantiene un sistema de archivo organizado y actualizado de toda la documentación relevante del proyecto. Este archivo incluye la correspondencia oficial, la información preliminar, los informes técnicos detallados, las actas de los comités de obra, los planos constructivos y cualquier otro documento esencial para el control del desarrollo del proyecto.

Esta gestión documental garantiza la disponibilidad de la información necesaria para determinar las características completas de la obra ejecutada y facilita la toma de decisiones oportuna por parte de la entidad contratante.

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante este segundo (2do) mes de ejecución, el contratista enfocó sus esfuerzos en el avance de la estructura, concretando la fundición de columnas y vigas superiores, lo cual representa un avance importante en el proyecto.

Un aspecto positivo fue la apertura de un nuevo frente de trabajo en el municipio de Moñitos, con el objetivo de acelerar el progreso general de la obra.

Los atrasos registrados en el periodo fueron el resultado de una concurrencia de factores, destacándose las constantes precipitaciones pluviales, los días no laborales correspondientes a la Semana Santa, y la discrepancia entre la programación inicial del proyecto y la realidad de la ejecución en obra. Esta combinación de situaciones incidió directamente en los atrasos observados.

Financieramente, se concretó el desembolso del anticipo al contratista, por un valor de $1.178.490.981,50, y se ha verificado que los primeros desembolsos se han realizado conforme a los rubros destinados (materiales, transporte, subcontratación y mano de obra), lo que indica un manejo inicial adecuado de estos fondos.

En cuanto a la gestión ambiental y social, el contratista ha mantenido una disposición favorable atendiendo a lo estipulado en el PGIO y PMA. De igual manera se destaca la eficiente gestión del manejo de residuos y las buenas prácticas ambientales del personal de obra

Respecto a la calidad en obra, los resultados de los ensayos de resistencia de concreto para las columnas y vigas superiores, en general, han sido positivos y han cumplido con los objetivos esperados

Sin embargo, a pesar de la ejecución de estas actividades y la apertura del nuevo frente en la Institución Educativa de Moñitos, el proyecto aún presenta un atraso

notable. El avance ejecutado acumulado es del 9.71% frente a un programado de 19.85%, lo que representa un desfase importante.

Esta situación se agrava por el hecho de que el cronograma presentado no se ajusta a la realidad de los frentes de trabajo activos. Por lo tanto, se ha solicitado al contratista la Reprogramación de Obra N°1, acompañada de un plan de contingencia, documentación que, a la fecha de este informe, sigue pendiente de entrega.

Para asegurar el cumplimiento de los tiempos pactados y garantizar el éxito del proyecto, es imperativo que esta reprogramación sea presentada y aprobada a la mayor brevedad posible.

Con el presente informe se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, en lo correspondiente a la parte técnica, financiera y jurídica.

En términos generales, esta Interventoría evalúa que el proyecto, se encuentra dentro de los parámetros esperados para su etapa. Se percibe una gestión activa por parte del contratista en el desarrollo de las actividades constructivas mencionadas en los acápites del presente documento, demostrando un compromiso con el avance de la obra. No obstante, se reitera la necesidad de que presente la documentación solicitada referente a la actualización del cronograma y plan de contingencia con el fin de evitar mayores atrasos a los registrados y así poder cumplir con los plazos pactados.

Sin otro particular, se adjuntan todos los anexos descritos en el presente documento.

_____

LACIDES J. BANQUEZ PAYARES
Director de Interventoría
ANTICA S.A.S BIC
Interventor

ANEXOS.

ANEXO N°1: GARANTIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: jX1wgGPvgwTYYx1A4PnzSw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72305636	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/02/2025	24:00 Horas Del	12/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	CLL 27 NO. 3-28, PALACIO DE NAIN	**TELÉFONO**	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	CLL 27 NO. 3-28, PALACIO DE NAIN	**TELÉFONO**	7848940

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%
HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%
CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/02/2025	24:00 Horas Del 12/04/2026	413.513.491,50	1.200.888,50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 12/02/2025	24:00 Horas Del 12/04/2026	1.240.540.474,50	3.602.665,49
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/02/2025	24:00 Horas Del 12/10/2028	413.513.491,50	3.789.596,24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/10/2025	24:00 Horas Del 12/10/2030	398.655.004,10	4.985.918,06
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 12/02/2025	24:00 Horas Del 12/04/2026	41.226.771,00	119.727,06
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.507.449.232,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	13.698.795,35
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	13.698.795,35
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	2.604.253,12
TOTAL A PAGAR	$	16.310.848,47

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72305636	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/02/2025	24:00 Horas Del	12/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Xez6JMHA5TyglzjA/nwu/Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72305647	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/02/2025	24:00 Horas Del	12/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	No. DOC. IDENTIDAD	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	TELÉFONO	3135452977
ASEGURADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	No. DOC. IDENTIDAD	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	TELÉFONO	3135452977
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%
HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%
CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	943.800,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	943.800,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	943.800,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	180.272,00
TOTAL A PAGAR	$	1.129.072,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	72305647	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/02/2025	24:00 Horas Del	12/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS ITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CORDOBA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: XlIZNhlP6GlD++aeVAX7bQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72344778	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
ASEGURADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%
HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	943.800,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	943.800,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	943.800,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	180.272,00
TOTAL A PAGAR	$	1.129.072,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/03/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72344778	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS ITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CORDOBA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KKrMhAIyU3Ba96u44ANtXw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72345192	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	**TELÉFONO**	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	**TELÉFONO**	7848940

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.

DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 11/05/2026	413.513.491,50	1.200.888,50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 11/05/2026	1.240.540.474,50	3.602.665,49
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 10/11/2028	413.513.491,50	3.789.596,24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 10/11/2025	24:00 Horas Del 10/11/2030	398.655.004,10	4.985.918,06
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 11/05/2026	41.226.771,00	119.727,06
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.507.449.232,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	13.698.795,35
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	13.698.795,35
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	2.604.253,12
TOTAL A PAGAR	$	16.310.848,47

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/03/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72345192	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%
CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100369947** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE CORDOBA / DEPARTAMENTO DE CORDOBA** , expedida por la Compañía en **18/03/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **18** días del mes **MARZO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: WKEYWkgzP7W/Ni+a8Y8xdQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72366393	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	**TELÉFONO**	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	**TELÉFONO**	7848940

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LOS AMPAROS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO CORREGIDA ACTA DE INICIO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%
HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/03/2025	24:00 Horas Del 17/05/2026	413.513.491,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 17/03/2025	24:00 Horas Del 17/05/2026	1.240.540.474,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/03/2025	24:00 Horas Del 17/11/2028	413.513.491,50	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 17/11/2025	24:00 Horas Del 17/11/2030	398.655.004,10	0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 17/03/2025	24:00 Horas Del 17/05/2026	41.226.771,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.507.449.232,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100369947	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72366393	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	10/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100369947** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE CORDOBA / DEPARTAMENTO DE CORDOBA ,** expedida por la Compañía en **02/04/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **02** días del mes **ABRIL** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72366393

Fecha de Facturación	02/04/2025	**Fecha Límite de Pago**	02/05/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	NB–100369947	**IVA**	00,00
Periodo Facturado	13/03/2025 – 10/12/2030	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
CRA 6A NO 64A 58	901915670
Intermediario	AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **02/05/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72366393

Fecha de Facturación	02/04/2025	**Fecha Límite de Pago**	02/05/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		**Prima** (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	NB–100369947	**IVA**	00,00
Periodo Facturado	13/03/2025 – 10/12/2030	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
CRA 6A NO 64A 58	901915670
Intermediario	AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000072366393(3900)000000000000(96)20250502

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072366393(3900)000000000000(96)20250502

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: gtr83treqg54L+2Srumigw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72366399	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	17/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
ASEGURADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.915.670-0
DIRECCIÓN	CRA 6A NO 64A 58	**TELÉFONO**	3135452977
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LOS AMPAROS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO CORREGIDA ACTA DE INICIO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-LP-002-2024 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO
VIBAR INGENIERIA SAS NIT. 901.566.942-0 PART.90%
HERSA CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.475.731-9 PART:10%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

María O.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100095688	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72366399	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/03/2025	24:00 Horas Del	17/11/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONFORMAN CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS ITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE CORDOBA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE CORDOBA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72366399

Fecha de Facturación	02/04/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	NB–100095688
Periodo Facturado	13/03/2025 — 17/11/2025

Fecha Límite de Pago	02/05/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
CRA 6A NO 64A 58	901915670
Intermediario	AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **02/05/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72366399

Fecha de Facturación	02/04/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	NB–100095688
Periodo Facturado	13/03/2025 — 17/11/2025

Fecha Límite de Pago	02/05/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
IVA	00,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
CRA 6A NO 64A 58	901915670
Intermediario	AD NACIONAL DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000072366399(3900)000000000000(96)20250502

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072366399(3900)000000000000(96)20250502

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ANEXO N°2: ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No.:	SI-LP-002-2024 de fecha 12 de febrero de 2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 NIT: 901915670-0 R.L: María Isabel Quintero Gonzalez C.C No.: 1.010.007.099
INTERVENTORIA:	ANTICA S.A.S BIC NIT: 901823241-9 R.L: Juan Pablo Banquez Gonzalez C.C No.: 1.067.958.787
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($4.135.056.075,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2025

En Montería, el día Diecisiete (17) de marzo de 2025 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: el señor **JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ** identificado con C.C. No. 1.067.958.787 de Montería, representante legal de **ANTICA S.A.S BIC** con Nit: 901823241-9, en su calidad de interventor del contrato, y la señora **MARÍA ISABEL QUINTERO GONZALEZ**, identificada con C.C No. 1.010.007.099 de Montería en calidad de represéntate legal de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002** con Nit. 901915670-0 en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención, las partes socializaron las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-002-2024** y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha.

ANTICA S.A.S BIC
Nit: 901823241-9
R.L: Juan Pablo Banquez González
C.C. No. 1.067.958.787
INTERVENTOR

Maria Q.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
NIT: 901915670-0
R.L: María Isabel Quintero González
C.C No.: 1.010.007.099
CONTRATISTA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Abdul Zarur Lakah	Nombre: Oscar Pineda Mendoza	Nombre: GABRIELA RUIZ CARRASCAL
Cargo: Contratista SID	Cargo: Contratista SID	Cargo: Auxiliar Admin SID
Firma:	Firma:	Firma:

Scanned with CamScanner

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

FECHA: 14 de marzo de 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO

TEMAS A TRATAR: Conformación de veeduría del proyecto

DESARROLLO DEL COMITÉ:

El objetivo de la presente acta es dejar constancia de la conformación de la Veeduría institucional que realizará el seguimiento y vigilancia al proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Departamento de Córdoba, específicamente en la institución educativa INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO en el municipio de Cereté, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución de este.

A la presente reunión asistieron las siguientes personas, quienes manifestaron su interés en conformar la Veeduría Ciudadana:

- Edgar Otero Daril – C.C. 78.713.722 – Cel. 3146138290
- Juan C. Galván – C.C. 78.699.102 – Cel. 3015878607
- Darlin P. Martínez Rodríguez – C.C.50.966.732 – Cel. 3127356674
- Anadelfa betin G. – C.C. 1.069.472.487 – Cel. 3246083745
- José Miguel Guerra M. – C.C. 78.030.940 – Cel. 3163058815
- Didier A. Padilla Padilla – C.C. 78.028.121 – Cel. 3147154026
- Fredy J. Lopez – C.C. 78.030.234 – Cel. 3103634657

- Fabian Luna Jaramillo – C.C. 1.014.669.269 – Cel. 3103409406
- Marian Yulieth Wilches Castro – Cel. 3009482787
- María Paula Guzmán Pérez – Cel. 3053552582
- Domingo Russo – C.C. 78.109.061 – Cel. 3218462916

La Veeduría del proyecto tendrá las siguientes funciones:

- Realizar seguimiento y vigilancia a la ejecución del proyecto.
- Verificar el cumplimiento de los términos de referencia y especificaciones técnicas.
- Recibir y tramitar las quejas y reclamos de la comunidad.
- Solicitar información a las entidades responsables del proyecto.

Los miembros de la Veeduría Ciudadana se comprometen a:

- Ejercer sus funciones con transparencia, objetividad e imparcialidad.
- Actuar en defensa del interés general y el bienestar de la comunidad.
- Mantener una comunicación constante con las entidades responsables del proyecto.
- Cumplir con lo establecido en la ley 850 de 2003 y demás normas aplicables.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente acta, la cual es firmada por todos los participantes.

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024 **ACTA DE ASISTENCIA**	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___

OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO*

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FECHA: 14 DE MARZO DE 2025.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO	LUGAR: CERETÉ

N°	NOMBRE	CÉDULA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	Edgar Otero Daza	78713722	eduviotda@gmail.com	3146138290	
	Juan C Galvan Pauth	78'699102		3015878607	
	Darlen P. Martinez Rodriguez	50'966732	Darlinma2016@gmail.com	3127356674	
	Clara Florez Marquez	1003.026.604	claramarflorez7	3128913573	
	Roberto A Garcia T	78 032 425		3234783074	
	Anadelfa Betin G.	1069473487	anagaby1079@hotmail.com	3246083845	
	Cesar Almanza	78030038	cesaralmanza de hoy@hotmail.com	3128468995	
	José Miguel Guerra M.	78.030.940.		3163058815	
	Didier A. Padilla Padilla	78.028.121	didier_alfonso@hotmail.com	3147154026	
	Fredy J. Lopez	78.030.234	Fredyjoselopez78@gmail.com	3103634657	
	Celen Massiel Martinez C.	1065003307.	celenmassiel@gmail.com	3043760004	

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024 **ACTA DE ASISTENCIA**	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___

OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO*

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FECHA: 14 DE MARZO DE 2025.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO	LUGAR: CERETÉ

N°	NOMBRE	CÉDULA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
(*)	Maria Angel Parra			3136547183	Maria Parra
	Juciana Henao osorio	1062608589		3009718797	Juciana Henao
	Maria Angel Rosso			3233544024	Maria Angel R.
*	fabian Luna Jaramillo	1014669269		3103409406	Fabian Luna
	Lariana Quintero Angel			3215846925	Lariana Quintero
	Ivanna Sofia Pérez Medina			3145559654	Ivanna Perez
*	Maryuri Yolietty Wilches Castro			3009482787	Maryuri
*	María Paula Guzmán Perez			3053552582	María Paula Guzmán
*	Domingo José Rosso T.	78109061	domingo_rosso@yahoo.es	3218462916	

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

FECHA: 14 de marzo de 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ – CIENAGA DE ORO

TEMAS A TRATAR: Conformación de veeduría del proyecto

DESARROLLO DEL COMITÉ:

El objetivo de la presente acta es dejar constancia de la conformación de la Veeduría institucional que realizará el seguimiento y vigilancia al proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Departamento de Córdoba, específicamente en la institución educativa Marco Fidel Suarez en el municipio de Ciénaga de Oro, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución del mismo

A la presente reunión asistieron las siguientes personas, quienes manifestaron su interés en conformar la Veeduría Ciudadana:

- Benjamín Sáenz – C.C 72.180.923 – Cel. 317 843 3088
- Karina Isabel Arcia – C.C 30.576.255 – Cel. 300 662 6074
- Cesar Calderón Doria – C.C 78.709.862 – Cel. 301 408 6248
- Eduardo García – C.C 7.383.154 – Cel. 323 349 3731
- Edinson Solano – C.C 6.879.191 – Cel. 312 665 0353

<table>
<tr><td rowspan="2">ANTICA S.A.S. BIC
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</td><td>CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.
SI-CMA-007-2024</td><td rowspan="2">ACTA DE VISITA: ☐ N°___
COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___
ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___</td></tr>
<tr><td>ACTA DE SOCIALIZACIÓN</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"</td></tr>
<tr><td>ENTIDAD CONTRATANTE:</td><td>DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</td><td>GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA DE OBRA:</td><td>CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002</td><td>CONSORCIO</td></tr>
</table>

La Veeduría del proyecto tendrá las siguientes funciones:

- Realizar seguimiento y vigilancia a la ejecución del proyecto.
- Verificar el cumplimiento de los términos de referencia y especificaciones técnicas.
- Recibir y tramitar las quejas y reclamos de la comunidad.
- Solicitar información a las entidades responsables del proyecto.

Los miembros de la Veeduría Ciudadana se comprometen a:

- Ejercer sus funciones con transparencia, objetividad e imparcialidad.
- Actuar en defensa del interés general y el bienestar de la comunidad.
- Mantener una comunicación constante con las entidades responsables del proyecto.
- Cumplir con lo establecido en la ley 850 de 2003 y demás normas aplicables.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente acta, la cual es firmada por todos los participantes.

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024 **ACTA DE ASISTENCIA**	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___

OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO*

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FECHA: 14 DE MARZO DE 2025.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO	LUGAR: CIENAGA DE ORO

N°	NOMBRE	CÉDULA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	Benjamin Saenz J	72180923	bsaenzj@yahoo.es	3178433088	
2	Richard Elidor G.	78759504	reguet.16@hotmail	3015616321	
3	Ramiro Matus	10821270	ramiromatus@hotmail.com	3043496564	
4	Carlos Pitalua Soto	2807990	PitaluaSotoCarlos	3013723260	
5	Gabriel Flórez Bonnardes	1073810610	gabrielflorez60@hotmail	3146310977	
6	Ludis Yuadrado P	50938951	Ludisnena@gmail.com	3145049953	
7	Karina Isabel Arcia	30 576.255.	angelisan@hotmail.es	3006626074	
8	Juan José Almanza P.	1138085216	Juanjosi311808@gmail.com	3001126233	
9	Nathalia Diaz		Nathyvaldez@gmail	3053940294	
10	Dianis Maricela Arrieta	1064999533		3002266605	
11	CESAR CALDERON DORIA	78709862	ccalderondoria@gmail.com	3014086248	
12	Eduardo Jorcy	7383154	eduardo3172@hotmail	3233473731	
	Edinson Salano Mestra.	6'879.191	edinsol5@hotmail.com	3R6G50353	

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

FECHA: 14 de marzo de 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER

TEMAS A TRATAR: Conformación de veeduría del proyecto

DESARROLLO DEL COMITÉ:

El objetivo de la presente acta es dejar constancia de la conformación de la Veeduría institucional que realizará el seguimiento y vigilancia al proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Departamento de Córdoba, específicamente en la institución educativa Santa Teresita Sede General Santander en el municipio de San Pelayo, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución del mismo

A la presente reunión asistieron las siguientes personas, quienes manifestaron su interés en conformar la Veeduría Ciudadana:

- Freis Ruiz Perez – C.C 78.710.033 – Cel. 314 554 6282
- Carmen García Hoyos– C.C 50.760.223 – Cel. 323 362 1317
- Adeira Ayala – C.C 52 267 244 – Cel. 300 703 6576
- Carmen Peréz Campillo – C.C 30.688.990– Cel. 323 349 3731
- Remberto Cortez – C.C 7.375.124 – Cel. 301 297 4969

<table>
<tr><td rowspan="2">ANTICA S.A.S. BIC
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</td><td>CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.
SI-CMA-007-2024</td><td rowspan="2">ACTA DE VISITA: ☐ N°___
COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___
ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___</td></tr>
<tr><td>ACTA DE SOCIALIZACIÓN</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"</td></tr>
<tr><td>ENTIDAD CONTRATANTE:</td><td>DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</td><td>GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA DE OBRA:</td><td>CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002</td><td>CONSORCIO</td></tr>
</table>

La Veeduría del proyecto tendrá las siguientes funciones:

- Realizar seguimiento y vigilancia a la ejecución del proyecto.
- Verificar el cumplimiento de los términos de referencia y especificaciones técnicas.
- Recibir y tramitar las quejas y reclamos de la comunidad.
- Solicitar información a las entidades responsables del proyecto.

Los miembros de la Veeduría Ciudadana se comprometen a:

- Ejercer sus funciones con transparencia, objetividad e imparcialidad.
- Actuar en defensa del interés general y el bienestar de la comunidad.
- Mantener una comunicación constante con las entidades responsables del proyecto.
- Cumplir con lo establecido en la ley 850 de 2003 y demás normas aplicables.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente acta, la cual es firmada por todos los participantes.

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024 **ACTA DE ASISTENCIA**	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___

OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO*

ENTIDAD CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**FECHA:** 14 DE MARZO DE 2025.
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002**	CONSORCIO	**LUGAR:** SAN PELAYO

N°	NOMBRE	CÉDULA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
	FREIS RUIZ PEREZ	78'710.033	freiseduardor@gmail.com	3145546282	
	Joel matias Pitalua bolivar				Joel matias
	David santiago Barros Benitez				David Barros
	Carmen Garcia Hoyos	50.760.223	cegarcia47@gmail.com	3233621317	Carmen Garcia
	Adeira Avila G	52267244		3007036576	Adeira Avila G
	Ana Matilda Pérez Pérez	34 984035	perezperezanamatilda1943@gmail.com	3116851938	Ana Matilda Perez P.
	Hillary Johana Vergara Reneo			300 163 8564	Hillary Vergara
	Samuel Medrano	1073814685		318 251 9945	Samuel M.
	Fernanda Buelvas Dovior			3232423987	
	Alejandro Durango Berrio			3005058970	Alejandro
	Eduardo Jhunior Segura	1073818133	Eduardosegurareyes1@	3113187292	Eduardo
	Andres David Portillo Padilla			3013667245	Fernanda Buelvas
	Kyarha andrea				Kyarha

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024 **ACTA DE ASISTENCIA**	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___

OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO*

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FECHA: 14 DE MARZO DE 2025.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO	LUGAR: SAN PELAYO

N°	NOMBRE	CÉDULA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
	Luz Maria Hernandez.			3134327749	Luz Maria
	Nikol Andrea Portillo Contreras			3106157308	Nikol Portillo
	Alonso C. Barrera Botanero			3205201096	Alonso C.
	Lacrith Valera Lopez G.			3002596720	Lacrith Valera
	Jesica Paola Fajardo Vargas			3137252979	Jesica Fajardo.
	Naem Cuadro L.			3015413371	Naem C.
	Abril Daniela Espitia Mercado.				
	Valentina Espitia Mausa			3002768369	Abril Espitia M.
	Juan Sebastian Morales.			3006973231	Valentina Espitia M.
	~~Juan David Galeano Galván~~			3022941971	~~Juan D Galeano~~
	Juan David Galeano Galván			3157736839	Juan D Galeano.
	Nilsomar Peralta Contreras	78034960		3226268862	
	Nathalia Lozanocantero				

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024 **ACTA DE ASISTENCIA**	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___

OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO*

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FECHA: 14 DE MARZO DE 2025.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO	LUGAR: SAN PELAYO

N°	NOMBRE	CÉDULA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
	Isabella Issa Galván				Isabella
	Fe peñata castellanos				
	Mario Miguel Haussa Meza			3224104149	Mario Haussa
	Saudith Paola Ballesteros			311 311 3159	Saudith Paola
	Juliana Perez	26 173 563	julianaperez@gmail	3114279740	
	Carmen Perez Compillo	30.688.990	cperezcompillo@6mail.com	3017557856	
	Ramon Santo Perez C.	7375124.		3012974969	

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

FECHA: 16 de mayo de 2025

LUGAR DE LA REUNION: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS

TEMAS A TRATAR: Socialización y Conformación de veeduría del proyecto

DESARROLLO DEL COMITÉ:

El objetivo de la presente acta es dejar constancia de la conformación de la Veeduría institucional que realizará el seguimiento y vigilancia al proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Departamento de Córdoba, específicamente en la institución educativa **SAN JOSÉ DE MOÑITOS** en el municipio de Moñitos, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución de este.

A la presente reunión asistieron las siguientes personas, quienes manifestaron su interés en conformar la Veeduría Ciudadana:

ANTICA ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	
OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*		
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO

La Veeduría del proyecto tendrá las siguientes funciones:

- Realizar seguimiento y vigilancia a la ejecución del proyecto.
- Verificar el cumplimiento de los términos de referencia y especificaciones técnicas.
- Recibir y tramitar las quejas y reclamos de la comunidad.
- Solicitar información a las entidades responsables del proyecto.

Los miembros de la Veeduría Ciudadana se comprometen a:

- Ejercer sus funciones con transparencia, objetividad e imparcialidad.
- Actuar en defensa del interés general y el bienestar de la comunidad.
- Mantener una comunicación constante con las entidades responsables del proyecto.
- Cumplir con lo establecido en la ley 850 de 2003 y demás normas aplicables.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente acta, la cual es firmada por todos los participantes.

- clodomiro Torres Berrocal
T 3212623043 cc 78757855

- Jeidis Tapia Noriega : cc: 26.147.679
Tel: 3046310573

- OTTO DAVID COGOLLO MARTINEZ
Tel: 3005133402 4 cc 6.843.455

ANTICA S.A.S. BIC CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SI-CMA-007-2024	ACTA DE VISITA: ☐ N°___ COMITÉ TÉCNICO: ☐ N°___ ACTA DE SOCIALIZACIÓN: ☐ N°___
	ACTA DE ASISTENCIA	

OBJETO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO*

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FECHA: 16 DE MAYO DE 2025.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	LUGAR: MOÑITOS

N°	NOMBRE	CÉDULA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	Enrique Alexander Andrade P	92540829	alexmat1117@gmail.com	3118026639	
2	Neiris Genes Julio	26147898	neirisgenes1979@gmail.com	3106402039	
3	María Camila Rosso Bravo	1143137726	k.ami.06@hotmail.com	3127149438	M. Camila Rosso
	Gabriela Lucia Martinez Guerrero	1063156649	Martinez3079@gmail.	3215623252	Gabriela Martinez
	Veronica Acuña Paez	1.063.161791	Averonica76@gmail.com	3235860667	Veronica Acuña
	Yoimbeth Morelos Ramos	1070089277	yoimorelosQ.Hail	3114150947	Yoimbeth
	Yolendis Arroyo Arrieta	1070810903	Yolendisarroyo069	3205977592	Yolendis
	Clodomiro torres	78757855	Javita755@	3212623049	Clodomiro
	Jeidis	26.147.679	topajeidis@gmail	3046310573	Jeidis T. A

ANEXO N°3: INFORMES SEMANALES DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 — CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC — CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 5 — Del: 14/04/2025 — Al: 20/04/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 35 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,05%	4,95%
Valor básico de la Obra programada:	$ 43.539.481,00	$ 204.809.045,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,52%	4,45%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 21.320.216,72	$ 184.149.131,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
Contrato No.	SI-LP-002-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
9,41	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA SUPERFICIE DE APOYO DE TANQUE EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20) PARA TANQUE DE AGUA POTABLE	M3	17,34	$ 206.382,00	$ 3.578.663,88
9,47	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE	KG	1836,98	$ 9.658,00	$ 17.741.552,84
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	$ 21.320.216,72
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	0,52%
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	-0,54%

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR
SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO
ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=50CM
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE UNIÓN MACHO GALVANIZADO 1" L=15CM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL GALVANIZADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO 1"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA 1"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN GALVANIZADO 1"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE 1"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE RÁPIDO METÁLICA 1"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1/2" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1", INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACION 2" PVC, PARA SOLDAR
PUNTO SANITARIO 2"	PUNTO SANITARIO 4"
SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI) (TANQUE ELEVADO)	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) (TANQUE ELEVADO)
SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI) TANQUE ENTERRADO AGUA POTABLE	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO
SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO Y EXTERIORES	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA Y AVISO SALIDA
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Y CFCI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 20 CIRCUITOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA	SOBRECIMIENTO IMPERMEABILIZADO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (CANALETE)
COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)


ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ANTICIPO	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	3,90%	3,94%
Durante el periodo	1,05%	0,52%
Acumulado actual	4,95%	4,45%
Atraso o avance acumulado	-0,50%	

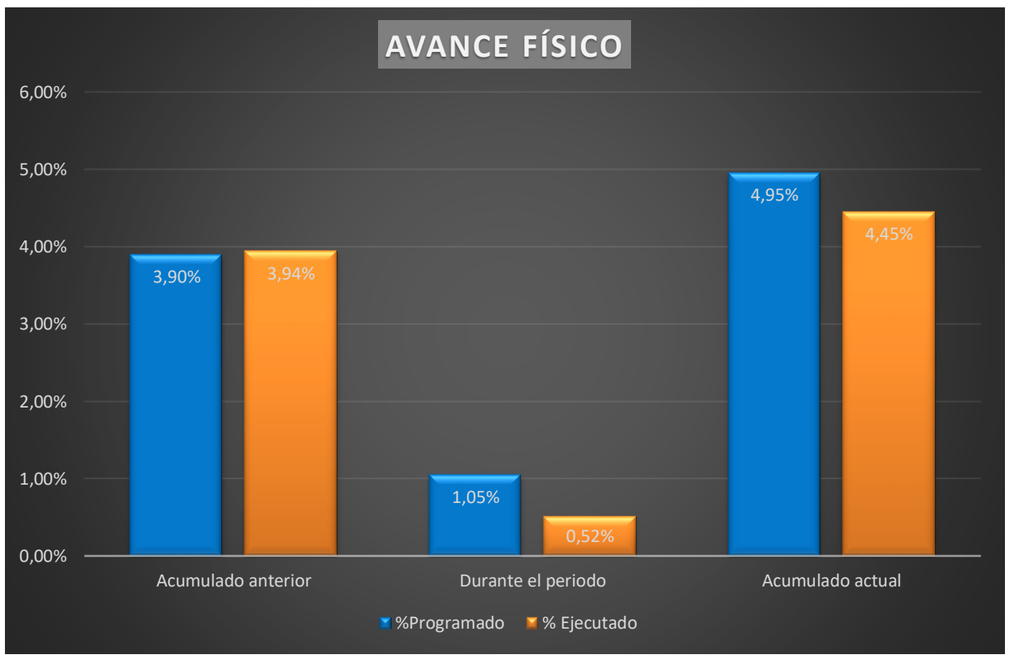

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL DE ANTICA S.A.S BIC
El proyecto para el periodo en cuestión, presenta un atraso acumulado del 0.50%. Durante la presente semana, se registró una disminución en el ritmo de ejecución de las actividades de obra, debido a que el personal del contratista laboró únicamente tres (3) días. Esta reducción en la jornada laboral se debió a la celebración de la Semana Santa, periodo durante el cual no se realizaron trabajos los días jueves, viernes y sábado santo, en observancia de las costumbres y normativas laborales correspondientes a esta festividad religiosa. Esta situación impactó directamente el avance programado para la semana en cuestión. Se le recomienda al contratista recuperar este atraso en la semana posterior para cumplir con los tiempos establecidos.	Firma Nombre: JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ Matrícula No. : 081037-0586460 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO - CERETÉ



Descripción: ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE

FOTO 1.



Descripción: ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE

FOTO 2.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTATERESITA SEDE GENERAL SANTANDER - SAN PELAYO



Descripción: MEJORAMIENTO CON PIEDRA RAJON PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE

FOTO 3.



Descripción: ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE

FOTO 4.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ - CIENAGA DE ORO



Descripción: ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE

FOTO 9.



Descripción: ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE

FOTO 10

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 — CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC — CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 6 — Del: 21/04/2025 — Al: 27/04/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 42 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,81%	11,76%
Valor básico de la Obra programada:	$ 281.542.006,00	$ 486.351.051,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,28%	5,73%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 52.982.810,32	$ 237.131.941,32

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
Contrato No.	SI-LP-002-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	188,82	$ 200.140,00	$ 37.790.434,80
9,43	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI) PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE	M3	1,73	$ 890.152,00	$ 1.539.962,96
9,49	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20) PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUAS RESIDUALES	M3	12,62	$ 206.382,00	$ 2.604.540,84
9,51	SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 14 MPA (2000 PSI) PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA RESIDUALES	M3	1,26	$ 765.656,00	$ 964.726,56
9,53	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE ENTERRADO DE AGUAS RESIDUALES	KG	1044,02	$ 9.658,00	$ 10.083.145,16
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	$ 52.982.810,32
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	1,28%
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	-5,53%

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA
COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 1/2HP (INCLUYE MANIFOLD DE SUCCIÓN)
ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA COLUMNA Y ZAPATA TANQUE	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA FONDO TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CANALETE)
PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA (CANALETE)	


ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ANTICIPO	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	4,95%	4,45%
Durante el periodo	6,81%	1,28%
Acumulado actual	11,76%	5,73%
Atraso o avance acumulado	-6,03%	

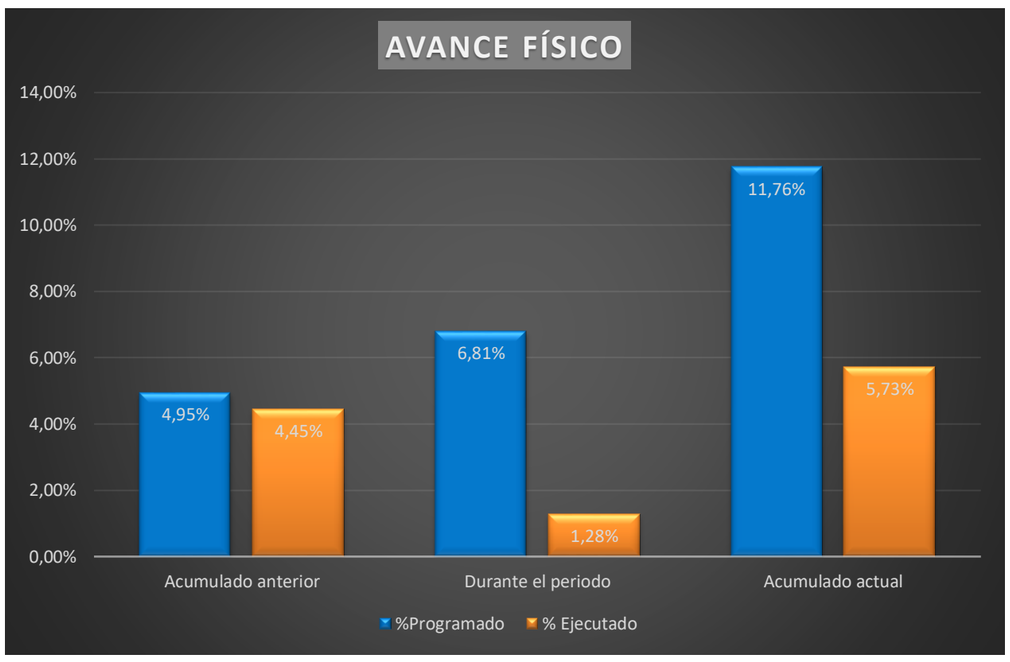

OBSERVACIONES

El proyecto para el periodo en cuestión, presenta un atraso notable del 6,03% con respecto a la programación de Obra.
Se reitera la necesidad urgente de que el contratista elabore y presente a esta Interventoría, a la mayor brevedad posible, una reprogramación de obra.
Esta situación se presenta debido a que la programación actual para la presente semana, no refleja la realidad de las actividades que se están ejecutando en los diferentes frentes de trabajo de las instituciones educativas intervenidas.
Se evidencia una incongruencia entre las actividades programadas y el estado actual de avance en sitio, lo que dificulta un seguimiento preciso y la planificación de las etapas subsiguientes del proyecto. Se requiere una reprogramación de obra N°1 que ajuste las actividades a la situación real de la obra y permita establecer una hoja de ruta confiable para la culminación del proyecto dentro de los plazos contractuales.

REPRESENTANTE LEGAL DE ANTICA S.A.S BIC

Firma

Nombre: **JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ**

Matrícula No. : 081037-0586460 COR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO - CERETÉ



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE ENTERRADO DE AGUAS RESIDUALES

FOTO 1.



Descripción: MEJORAMIENTO CON PIEDRA RAJON

FOTO 2.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTATERESITA SEDE GENERAL SANTANDER - SAN PELAYO



Descripción: MEJORAMIENTO CON PIEDRA RAJON

FOTO 3.



Descripción: SOLADO EN CONCRETO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE

FOTO 4.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ - CIENAGA DE ORO



Descripción: RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

FOTO 5.



Descripción: SOLADO EN CONCRETO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE

FOTO 6

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 — CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC — CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 7 — Del: 28/04/2025 — Al: 4/05/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 49 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,85%	16,61%
Valor básico de la Obra programada:	$ 200.539.670,00	$ 686.890.721,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,14%	6,87%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 47.007.846,96	$ 284.139.788,28

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
Contrato No.	SI-LP-002-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
4,01	COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	233,70	$ 135.680,00	$ 31.708.416,00
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	1584,12	$ 9.658,00	$ 15.299.430,96
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	$ 47.007.846,96
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	1,14%
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	-3,71%

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE
COLUMNA DE 0.40 X 0.40 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE
RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) . REF 4 D 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" @ 0.25 MTS	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS
S/I DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.50X0.50 MTS COLOR BLANCA O BEIGE	


ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ANTICIPO	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	11,76%	5,73%
Durante el periodo	4,85%	1,14%
Acumulado actual	16,61%	6,87%
Atraso o avance acumulado	-9,74%	

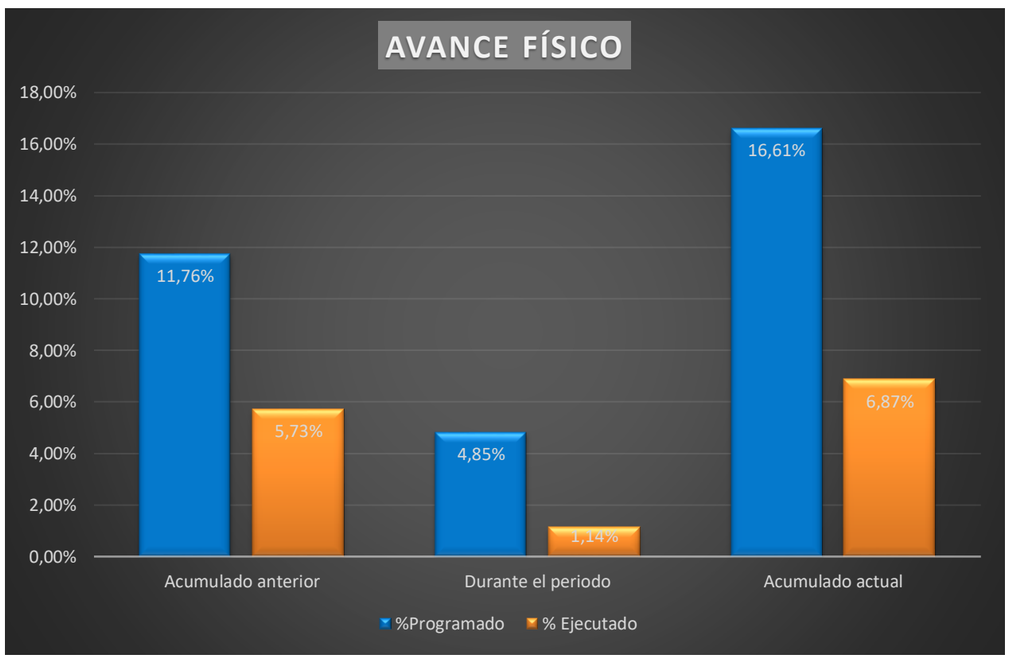

OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL DE ANTICA S.A.S BIC
Durante el presente periodo, se constata la persistencia del retraso en la ejecución del proyecto, manteniéndose en un 9,74 % con respecto a lo programado inicialmente. Esta diferencia notable entre el avance planificado y el desarrollo real de la obra genera incertidumbre en cuanto al cumplimiento de los plazos contractuales pactados. A la fecha, esta Interventoría aún se encuentra a la espera de la presentación, por parte del contratista, de la reprogramación de obra solicitada en semanas anteriores. Esta reprogramación es crucial para ajustar el cronograma a la realidad actual del proyecto y determinar las acciones necesarias para mitigar el impacto del retraso existente.	Firma Nombre: **JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ** Matrícula No. : 081037-0586460 COR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO - CERETÉ



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS

FOTO 1.



Descripción: COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 2.



Descripción: COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 3.



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS

FOTO 4.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTATERESITA SEDE GENERAL SANTANDER - SAN PELAYO



Descripción: COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 5.



Descripción: ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS

FOTO 6.

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA



Descripción: COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 7.



Descripción: COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 8.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ - CIENAGA DE ORO



Descripción: ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS

FOTO 9.



Descripción: ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS

FOTO 10



Descripción: COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 11



Descripción: COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 12

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 — CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC — CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 8 — Del: 5/05/2025 — Al: 11/05/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 56 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,26%	17,87%
Valor básico de la Obra programada:	$ 52.161.034,00	$ 739.051.755,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,26%	8,14%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 52.253.467,96	$ 336.393.256,24

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
Contrato No.	SI-LP-002-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	99,61	$ 200.140,00	$ 19.935.945,40
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN	KG	1529,33	$ 9.658,00	$ 14.770.269,14
4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	66,60	$ 135.759,00	$ 9.041.549,40
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	880,69	$ 9.658,00	$ 8.505.704,02
					$ -
					$ -
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	$ 52.253.467,96
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	1,26%
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	0,00%

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)
TANQUE ELEVADO DE 2000L PLÁSTICO	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO
S/I CINTA PVC O-22	CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) PARA TAPA Y MUROS DE TANQUE INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO
EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS
S/I DE CORREAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 MTS
REMOCION DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO	


ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ANTICIPO	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	16,61%	6,87%
Durante el periodo	1,26%	1,26%
Acumulado actual	17,87%	8,14%
Atraso o avance acumulado	-9,74%	

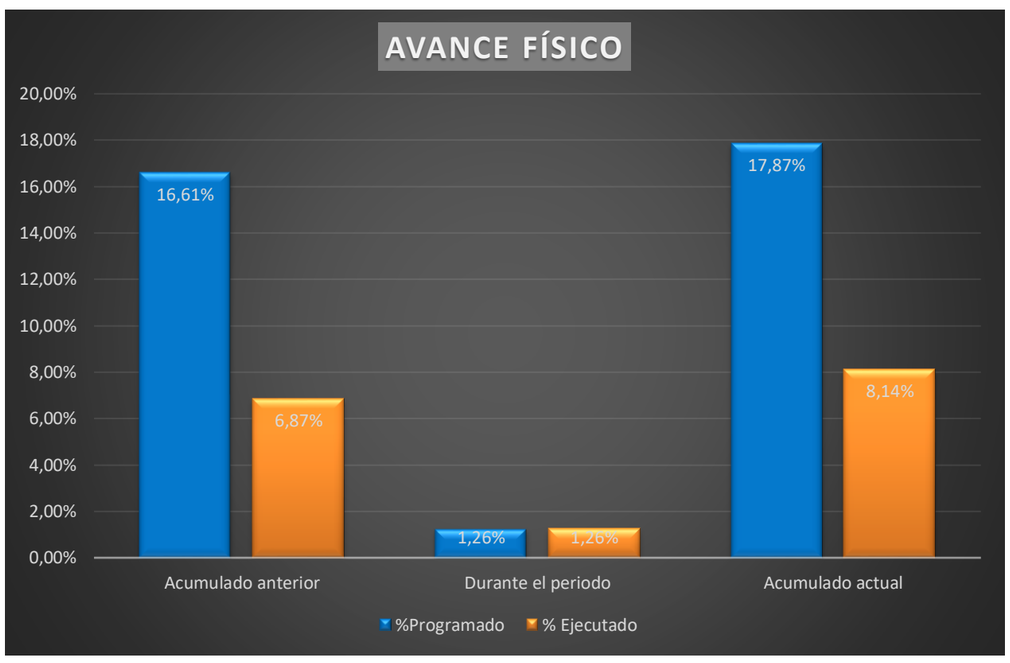

OBSERVACIONES

Durante el presente periodo, se constata la persistencia del retraso significativo en la ejecución del proyecto, manteniéndose en un 9,74% con respecto a lo programado inicialmente. Esta diferencia notable entre el avance planificado y el desarrollo real de la obra genera incertidumbre en cuanto al cumplimiento de los plazos contractuales pactados. A la fecha, esta Interventoría aún se encuentra a la espera de la presentación, por parte del contratista, de la reprogramación de obra solicitada en semanas anteriores.

REPRESENTANTE LEGAL DE ANTICA S.A.S BIC

Firma

Nombre: JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Matrícula No. : 081037-0586460 COR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO - CERETÉ



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 1.



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN

FOTO 2.



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 3.



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 4.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTATERESITA SEDE GENERAL SANTANDER - SAN PELAYO



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS

FOTO 5.



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN

FOTO 6.

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 7.



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 8.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ - CIENAGA DE ORO



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS

FOTO 9.



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS

FOTO 10



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 11



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 12

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002 — CONTRATO No: SI-LP-002-2024

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S. BIC — CONTRATO No: SI-CMA-007-2024

Semana Número: 9 — Del: 12/05/2025 — Al: 18/05/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 63 Días

Supervisor: CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,98%	19,85%
Valor básico de la Obra programada:	$ 81.699.098,00	$ 820.750.853,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,57%	9,71%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 65.067.398,54	$ 401.460.654,78

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
Contrato No.	SI-LP-002-2024
Valor Inicial:	$ 4.135.056.075,00
Valor Actualizado:	$ 4.135.056.075,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ANTICA S.A.S. BIC
Contrato No.	SI-CMA-007-2024
Valor Inicial:	$ 350.649.999,00
Valor Actualizado:	$ 350.649.999,00
Plazo Inicial:	8 MESES
Plazo Actualizado:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	17 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento:	17 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	312,00	$ 4.287,00	$ 1.337.544,00
1,02	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	312,00	$ 7.514,00	$ 2.344.368,00
1,03	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	74,00	$ 21.007,00	$ 1.554.518,00
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 MTS	M3	15,20	$ 39.259,00	$ 596.736,80
2,04	RELLENO DEL AREA CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	180,03	$ 200.140,00	$ 36.031.204,20
2,03	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)	M3	9,50	$ 206.382,00	$ 1.960.629,00
2,05	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	M3	19,76	$ 22.830,00	$ 451.120,80
4,02	VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	ML	133,20	$ 135.759,00	$ 18.083.098,80
4,03	ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	KG	193,93	$ 9.658,00	$ 1.872.975,94
9,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	123,00	$ 2.798,00	$ 344.154,00
9,16	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	175,50	$ 2.798,00	$ 491.049,00
					$ -
				COSTO TOTAL (INCLUYE AIU)	$ 65.067.398,54
				PORCENTAJE (%) EJECUTADO SEMANAL	1,57%
				PORCENTAJE (%) DE ATRASO O AVANCE SEMANAL	-0,40%

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	PLACA EN CONCRETO DE 2.00 m X 2.00 m X 0.17 m DE 3000 PSI INCLUYE REF. VARILLA DE 3/8 @ 0.15MT PARA TANQUE ELEVADO
EXCAVACIÓN MANUAL PARA TANQUE	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATA EN PIEDRA RAJON - MATERIAL SELECCIONADO (80/20)
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 10 KM	CUBIERTA TIPO SANDWICH 18 MM EN ACERO LAMINADO A500 GRADO C COLOR BLANCO CON AISLANTE EN POLIESTIRENO 18-20MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN
PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS) (canalete)	


ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ANTICIPO	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA		
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		% DE AVANCE
ACTA PARCIAL 1:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 2:	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL 3:	$ -	0,00%
TOTAL ACUMULADO	$ -	0,00%

	%Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	17,87%	8,14%
Durante el periodo	1,98%	1,57%
Acumulado actual	19,85%	9,71%
Atraso o avance acumulado	-10,14%	

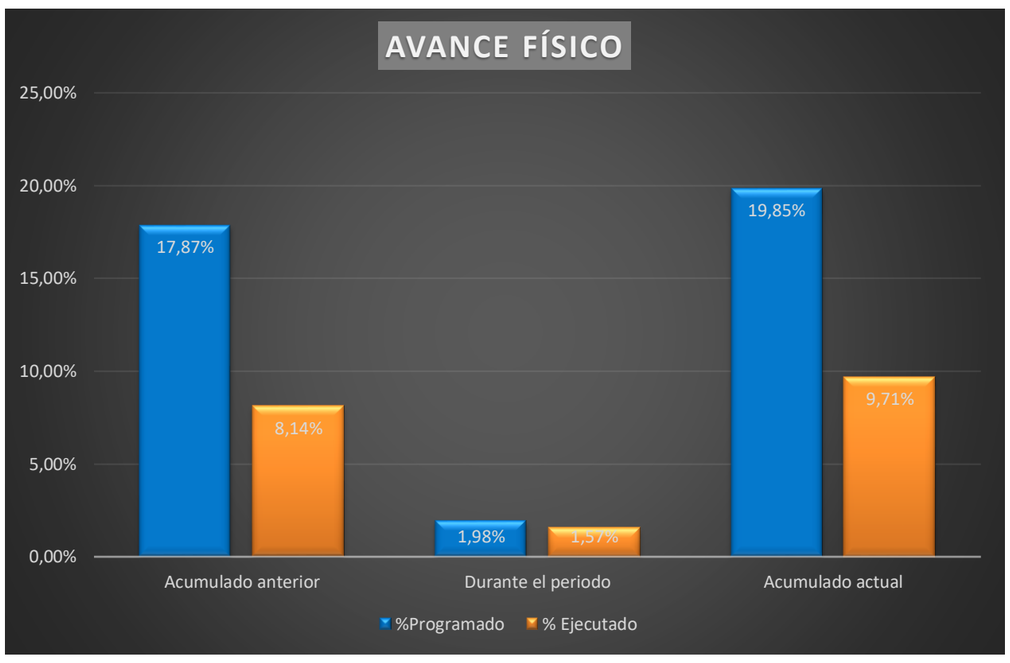

OBSERVACIONES

Durante el presente periodo, se constata la persistencia del retraso en la ejecución del proyecto, manteniéndose en un 10.14% con respecto a lo programado inicialmente. Esta diferencia notable entre el avance planificado y el desarrollo real de la obra genera incertidumbre en cuanto al cumplimiento de los plazos contractuales pactados. A la fecha, esta Interventoría aún se encuentra a la espera de la presentación, por parte del contratista, de la reprogramación de obra solicitada en informes anteriores. Por lo tanto, se le reiteró al contratista la solicitud de presentar un plan de contingencia acompañado de la respectiva reprogramación de obra a la mayor brevedad posible

REPRESENTANTE LEGAL DE ANTICA S.A.S BIC

Firma

Nombre: JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Matrícula No. : 081037-0586460 COR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO - CERETÉ



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 1.



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 2.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTATERESITA SEDE GENERAL SANTANDER - SAN PELAYO



Descripción: ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS

FOTO 3.



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 4.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ - CIENAGA DE ORO



Descripción: VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

FOTO 5.



Descripción: ACERO PARA ESTRUCTURAS

FOTO 6.

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS - MOÑITOS



Descripción: S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS

FOTO 13



Descripción: S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS

FOTO 14



Descripción:EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS

FOTO 15



Descripción: EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS

FOTO 16

ANEXO N°4: COMITÉS DE SEGUIMIENTO

ANEXO N°5: EQUIPOS DE CONTRATISTA DE OBRA

Montería, 03 de marzo de 2025

Señores
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
Ciudad

Asunto: Certificación de disponibilidad de equipos

Cordial saludo,

Yo, ALONSO ALBERTO NEGRETE HERNANDEZ identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de prestador de servicios de alquiler y mantenimiento de equipos para construcción, certifico la disponibilidad inmediata de los equipos relacionados a continuación, los cuales serán destinados para ser alquilados a la firma CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002, con NIT 901.915.670-0, en la ejecución del contrato de obra No. SI-LP-002-2024 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

EQUIPO	CANTIDAD
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	2
PLACA VIBRATORIA (COMPACTADOR RANA)	2
MEZCLADORA DE CONCRETO 1.5 BULTOS	2
EQUIPO DE OXICORTE	1

Atentamente,

ALONSO ALBERTO NEGRETE HERNANDEZ
C.C 10.951.542
AN MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE EQUIPOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14986531879

(415)7707212489984(8020) 000001498653187 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 5 1 5 4 2	7	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 5 1 5 4 2	2 0 0 0 0 7 1 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NEGRETE	HERNANDEZ	ALONSO	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 42 9 A 20

42. Correo electrónico: alonsne@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 5 9 9 1 9 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 1 2 0 2 0 6	7 7 3 0	2 0 1 2 0 2 0 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9	5	2																						

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 28 / 16 : 58: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NEGRETE HERNANDEZ ALONSO ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/02/2024 - 09:51:34
Recibo No. S000927958, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2MZgkZtDmD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : ALONSO ALBERTO NEGRETE HERNANDEZ
Identificación : CC. - 10951542
Nit : 10951542-7
Domicilio: Montería, Córdoba

MATRÍCULA

Matrícula No: 198654
Fecha de matrícula: 21 de junio de 2022
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 28 de febrero de 2024
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 42NRO.9A -20 - Barrio los laureles
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico : alonsne@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3135991903
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 42NRO.9A -20 - Barrio los laureles
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico de notificación : alonsne@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : No reportó.
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C3312
Actividad secundaria Código CIIU: N7730
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo,alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.C.P.

INFORMACION FINANCIERA

Powered by CamScanner

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $15.000.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $15.000.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $15.000.000,00
Pasivo más patrimonio: $15.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $0,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Powered by CamScanner

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/02/2024 - 09:51:34
Recibo No. S000927958, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2MZgkZtDmD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $0,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C3312.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT) Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

SANDRA SIERRA BUELVAS

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Powered by CamScanner

ANEXO N°6: REGISTRO DEL IDEAM – ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (23/05/2025 16:30)

Nombre estacion:	SALADO EL [13075020]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Climática Ordinaria
Latitud:	8.9138888890	**Longitud:**	-75.58222222	**Elevación:**	40
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA M	**Area Operativa:**	Area Operativa 02 - Atlántico	**Departamento:**	Cordoba
Municipio:	Ciénaga De Oro	**Fecha instalacíon:**	15/10/1964 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	18/04/2025 00:00-17/05/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencio	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-04-18 00:00	3.4	Preliminar
2025-04-19 00:00	0	Preliminar
2025-04-20 00:00	0	Preliminar
2025-04-21 00:00	11.4	Preliminar
2025-04-22 00:00	2	Preliminar
2025-04-23 00:00	21.4	Preliminar
2025-04-24 00:00	0	Preliminar
2025-04-25 00:00	21.8	Preliminar
2025-04-26 00:00	0	Preliminar
2025-04-27 00:00	20.5	Preliminar
2025-04-28 00:00	13.8	Preliminar
2025-04-29 00:00	6	Preliminar
2025-04-30 00:00	0.3	Preliminar
2025-05-01 00:00	0	Preliminar
2025-05-02 00:00	2.7	Preliminar
2025-05-03 00:00	23.5	Preliminar
2025-05-04 00:00	0	Preliminar
2025-05-05 00:00	3.5	Preliminar
2025-05-06 00:00	1	Preliminar
2025-05-07 00:00	4.4	Preliminar
2025-05-08 00:00	2.5	Preliminar
2025-05-09 00:00	0	Preliminar
2025-05-10 00:00	0	Preliminar
2025-05-11 00:00	0	Preliminar
2025-05-12 00:00	2.1	Preliminar
2025-05-13 00:00	0	Preliminar
2025-05-14 00:00	1.3	Preliminar
2025-05-15 00:00	0	Preliminar
2025-05-16 00:00	7.3	Preliminar
2025-05-17 00:00	0	Preliminar

ANEXO N°7: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

1. FECHA DE ELABORCIÓN	27	11	2024

DATOS GENERALES

CONTRATISTA

2. CONTRATO Nº	SI-LP-002-2024	3. FECHA DE CONTRATO	30	1	2025	4. VALOR DEL CONTRATO	$4.135.056.075,00

5. FECHA ACTA DE INICIO	13	3	2025	6. FECHA DE TERMINACIÓN	16	11	2025	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (8) MESES

8. CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

9. OBJETO:	MANTEMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMNETO DE CORDOBA

10. VALOR ANTICIPO	$1.240.516.822,50	11. % PAGO ANTICIPADO	30%

SUPERVISION

12. DESIGNACION DE INTERVENTORIA	EL ENTE CONTRATANTE ESTABLESE COMO INTERVENTORIA DEL CONTRATO A LA EMPRESA ANTICA S.A.S BIC

DESCRIPCIÓN DE INVERSIÓN ANTICIPO

VALOR CONTRATO DE OBRA	**$**	**4.135.056.075,00**
VALOR ANTICIPO 30%	**$**	**1.240.516.822,50**

ITEM	DESCRIPCIÓN CONCEPTO A INVERTIR	PORCENTAJES	MES 1	MES 2	TOTAL
1	**COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**22,50%**	$ 195.381.400	$ 83.734.886	$ 279.116.285
2	**TRANSPORTE DE MATERIALES**	**25,00%**	$ 217.090.444	$ 93.038.762	$ 310.129.206
3	**SUBCONTRATO DE OBRA**	**45,00%**	$ 390.762.799	$ 167.469.771	$ 558.232.570
4	**AVANCE PAGO MANO DE OBRA**	**7,50%**	$ 65.127.133	$ 27.911.629	$ 93.038.762
	TOTALES	**100,0%**	**$ 868.361.775,75**	**$ 372.155.046,75**	**$ 1.240.516.822,50**

FIRMA

MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

FIRMA

JUAN PLABLO BANQUEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
ANTICA S.A.S BIC

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

1. FECHA DE ELABORCIÓN	23	5	2025

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA

2. CONTRATO Nº	SI-LP-002-2024	3. FECHA DE CONTRATO	30	1	2025	4. VALOR DEL CONTRATO	$4.135.056.075,00

5. FECHA ACTA DE INICIO	13	3	2025	6. FECHA DE TERMINACIÓN	16	11	2025	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	

8. CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002
9. OBJETO:	MANTEMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMNETO DE CORDOBA

10. VALOR ANTICIPO	$1.240.516.822,50	11. % PAGO ANTICIPADO	30%	VALOR TOTAL DESEEMBOLSO	**$ 1.178.490.981,50**

SUPERVISION

12. DESIGNACION DE INTERVENTORIA	EL ENTE CONTRATANTE ESTABLESE COMO INTERVENTORIA DEL CONTRATO A LA EMPRESA ANTICA S.A.S BIC

DESCRIPCIÓN DE INVERSIÓN ANTICIPO

VALOR CONTRATO DE OBRA	**$ 4.135.056.075,00**
VALOR ANTICIPO 30%	**$ 1.240.516.822,50**
VALOR DESEEMBOLSADO	**$ 1.178.490.981,50**

ITEM	DESCRIPCIÓN CONCEPTO A INVERTIR	PORCENTAJES	VALOR TOTAL DESEEMBOLSO	PRIMER DESEEMBOLSO	SALDO DISPONIBLE	VALOR MODIFICADO
1	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,50%	$ 265.160.470,84	$ 161.774.592,14	$ 103.385.878,70	**$ 117.341.692,86**
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	25,00%	$ 294.622.745,38	$ 216.688.000,00	$ 77.934.745,38	**$ 31.416.163,50**
3	SUBCONTRATO DE OBRA	45,00%	$ 530.320.941,68	$ 390.762.000,00	$ 139.558.941,68	**$ 167.469.771,00**
4	AVANCE PAGO MANO DE OBRA	7,50%	$ 88.386.823,60	$ 65.127.133,00	$ 23.259.690,60	**$ 27.911.629,00**
	TOTALES	**100,0%**	**$ 1.178.490.981,50**	**$ 834.351.725,14**	**$ 344.139.256,36**	**$ 344.139.256,36**

FIRMA

MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

FIRMA

JUAN PLABLO BANQUEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
ANTICA S.A.S BIC



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$390.762.000,00

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados

www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$156.000.000,00

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados

www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$65.127.133,00

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados

www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$101.006.355,10

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados

www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$222.462.592,14

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados

www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$121.456.237,04

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados

www.fidubogota.com



FORMATO CERTIFICACIÓN

No. Del Fideicomiso

124462

Nombres y apellidos del Interventor

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ

Número de cédula del Interventor

CEDULA CIUDADANIA 1067958787

Número Contrato ó Descripción Negocio

124462

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total de la Solicitud

$167.469.771,00

Correo electrónico del Interventor

anticasasbic@gmail.com

Celular del Interventor

3114301257

Fiduciaria Bogotá © 2018 - Todos los derechos reservados

www.fidubogota.com

ANEXO N°8: RESULTADOS DEL ENSAYOS DE LABORATORIO

GEOTECNOLOGÍA S.A.S ingeniería y control	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO INV E-410-13**	**Codigo:**	F-ED-RC-012
		Versión:	1
		Fecha:	24/09/19
		Pagina:	1 de 1

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

LOCALIZACIÓN : DEPARTAMENTO DE CORDOBA


MATERIAL: CONCRETO 3000 PSI

FECHA : 22 de mayo de 2025

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410-13

Muestra N°	Descripcion	Fecha de Elaboración	Fecha de Ensayo	Edad (Dias)	Altura (cm)	Diametro (cm)	Carga (KN)	RELACION L/D	PATRON DE FALLA	Resistencia (Kg/cm²) Edad (Dias)		
												28
000-1	INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANO POLO COLUMNAS	24/04/2025	2/05/2025	8	30,3	15,3	345,5	1,98	TIPO-3	191,6		
000-2		24/04/2025	8/05/2025	14	30,3	15,3	369,5	1,98	TIPO-4		204,9	
000-3		24/04/2025	22/05/2025	28				-				-
001-1	INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANO POLO VIGAS AEREAS	14/05/2025	22/05/2025	8	30,0	15,3	354,8	1,96	TIPO-5	196,8		
001-2		14/05/2025	28/05/2025	14				-			-	
001-3		14/05/2025	11/06/2025	28				-				-
002-1	INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ ZAPATAS	28/04/2025	6/05/2025	8	30,0	15,3	336,6	1,96	TIPO-4	186,7		
002-2		28/04/2025	12/05/2025	14	30,3	15,3	378,5	1,98	TIPO-4		209,9	
002-3		28/04/2025	26/05/2025	28				-				-
003-1	INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ VIGAS AEREAS	14/05/2025	22/05/2025	8	30,0	15,3	332,8	1,96	TIPO-5	184,6		
003-2		14/05/2025	28/05/2025	14				-			-	
003-3		14/05/2025	11/06/2025	28				-				-
004-1	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER COLUMNAS	24/04/2025	2/05/2025	8	30,0	15,3	358,5	1,96	TIPO-4	198,8		
004-2		24/04/2025	8/05/2025	14	30,3	15,3	367,4	1,98	TIPO-4		203,8	
004-3		24/04/2025	22/05/2025	28				-				-
005-1	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL SANTANDER VIGAS AEREAS	14/05/2025	22/05/2025	8	30,0	15,3	327,4	1,96	TIPO-4	181,6		
005-2		14/05/2025	28/05/2025	14				-			-	
005-3		14/05/2025	11/06/2025	28				-				-
									RESISTENCIA PROMEDIO (Kg/cm²)	**194,2**	**204,9**	**-**
									RESISTENCIA PROMEDIO (Mpa)	**19,0**	**20,1**	**-**
									RESISTENCIA PROMEDIO (Psi)	**2762**	**2915**	**-**
									RESISTENCIA NOMINAL (Psi)		**3000**	
									PORCENTAJE DE RESISTENCIA	**92**	**97**	**-**

OBSERVACIONES :
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuiciios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.



TIPO **TIPO 2** **TIPO 3** **TIPO 4** **TIPO 5** **TIPO 6**

REVISÓ	APROBÓ
GEOTECNOLOGO JEFE DE LABORATORIO	GERENTE
FREDY RODRIGUEZ RUBIO	KELLY ANDREA RODRIGUEZ S.
Fredy Rodriguez Rubio GEOTECNOLOGO Mat. Nº 19516-00111 CPSG	GEOTECNOLOGÍA S.A.S GERENCIA TP 22202-354898 COR

ANEXO N°9: PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915670	0	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 6 A 64 A58	MONTERIA-CORDOBA	7828082	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	09144047	9486470529	E	2025/05/19	2025/05/23	BANCO DE OCCIDENTE	4	$6,197,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067940218	AGAMEZ GENEY ANDY MIGUEL	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
2	CC	1233340397	ALVAREZ ORTEGA JOSE CARLOS	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC	1020789957	BEJARANO FERNANDEZ KAMAL AUGUSTO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	78748099	CASTRO ESCOBAR RICARDO JAVIER	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
5	CC	1073813229	COGOLLO DIAZ CARMELO JAVIER	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1067942893	CORRALES MARTINEZ SHARON MELISA	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1074811877	DONCELL QUINTANA WILSON JAVIER	230301	12	$569,400	$91,200	ESSC07	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
8	CC	1073828923	GALINDO BARRERA CAMILO ANDRES	230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
9	CC	1065000853	MARTINEZ BORJA CARMELO ANTONIO	230201	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
10	CC	15092179	MEDRANO MEDRANO MAXIMO TITO	231001	12	$569,400	$91,200	ESSC07	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
11	CC	10781536	MONTES SANCHEZ ALEX HUMBERTO	25-14	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
12	CC	7382988	PLAZA LAGARES OLIER JESUS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	19191822	RAMIREZ LIBREROS HECTOR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	1102823938	SERPA DE LA CRUZ ISAIA MANUEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	1073155444	TORRES PRIOLO HERIBERTO ANTONIO	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	72237694	VERGARA PORTILLO JHOJAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(16)**			**$19,957,400**	**$3,193,800**			**$19,957,400**	**$798,800**			**$19,957,400**	**$798,800**			**$19,957,400**	**$1,389,600**		**$0**	**$0**

2025/05/29 08:16 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$3,193,800	$8,600	$0	$3,202,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$546,800	$1,500	$0	$548,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$273,400	$800	$0	$274,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,552,400	$4,100	$0	$1,556,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$821,200	$2,200	$0	$823,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,389,600	$3,700	$0	$1,393,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,389,600	$3,700	$0	$1,393,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$798,800	$2,100	$0	$800,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	16	$798,800	$2,100	$0	$800,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	$798,800	$2,500	$0	$801,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$200	$0	$57,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$171,000	$500	$0	$171,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$91,400	$300	$0	$91,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$125,400	$400	$0	$125,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$217,000	$600	$0	$217,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$300	$0	$80,300
TOTAL				**16**	**$6,181,000**	**$16,900**	**$0**	**$6,197,900**

ANEXO N°10: GARANTIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.21 15:49:40 -05:00

Código de Seguridad: BRoIWWYHl+0MH+Sh+HE/0Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100015007	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489030718	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2025	24:00 Horas Del	17/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ANTICA S.A.S BIC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.823.241-9
DIRECCIÓN	CALLE 62 A N 11 A 50	**TELÉFONO**	3114301257
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3-28	**TELÉFONO**	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3-28	**TELÉFONO**	7848940

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SI-CMA-007-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/02/2025	24:00 Horas Del 17/04/2026	35.064.999,90	82.042,49
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/02/2025	24:00 Horas Del 17/10/2028	35.064.999,90	257.655,70
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 17/10/2025	24:00 Horas Del 17/10/2030	35.064.999,90	350.842,14
		TOTAL ASEGURADO	$ 105.194.999,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ ESTELA ESCUDERO KERGUELEN	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	690.540,33
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	690.540,33
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	132.684,66
TOTAL A PAGAR	$	831.024,99

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALSA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100015007	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489030718	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2025	24:00 Horas Del	17/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

RECIBO ELECTRONICO No. 100000199

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** MONTERIA 26/02/2025 5:01:01 p.m.

VALOR TOTAL: $831.024,99

RECIBO DE: ANTICA S.A.S BIC

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901823241

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20250100020540	1294354819	BANCOLOMBIA	831.024,99

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100015007 Certificado(s): 489030718;

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.03.18 09:55:48 -05:00

Código de Seguridad: tQSEmSj5dtvQ6YIIyU2y/w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100015007	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	489031562	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2025	24:00 Horas Del	17/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ANTICA S.A.S BIC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.823.241-9
DIRECCIÓN	CALLE 62 A N 11 A 50	**TELÉFONO**	3114301257
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	**TELÉFONO**	7848940
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.935-6
DIRECCIÓN	PALACIO DE NAIN - CALLE 27 N 3 - 28	**TELÉFONO**	7848940

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SI-CMA-007-2024 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 17/05/2026	35.064.999,90	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/03/2025	24:00 Horas Del 17/11/2028	35.064.999,90	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 17/11/2025	24:00 Horas Del 17/11/2030	35.064.999,90	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 105.194.999,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUZ ESTELA ESCUDERO KERGUELEN	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/03/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100015007	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	489031562	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/03/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2025	24:00 Horas Del	17/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100015007** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **ANTICA S.A.S BIC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE CORDOBA / DEPARTAMENTO DE CORDOBA ,** expedida por la Compañía en **18/03/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **18** días del mes **MARZO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ANEXO N°11: ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	SI-CMA-007-2024 de fecha 14 de febrero de 2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	ANTICA S.A.S BIC NIT: 901823241-9 R.L: Juan Pablo Banquez Gonzalez C.C No.: 1.067.958.787
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($350.649.999,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2025

En Montería, el día Diecisiete (17) de marzo de 2025 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: la Doctora **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL** identificada con C.C. No. 50.882.640, en su calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, quien actúa como Supervisor(a) designado(a) del contrato de la referencia y el señor **JUAN PABLO BANQUEZ GONZALES** identificado con C.C. No. 1.067.958.787 de Montería, representante legal de **ANTICA S.A.S BIC** con Nit: 901823241-9, en su calidad de interventor del contrato, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención, las partes socializaron las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SI-CMA-007-2024** y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha.

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
C.C. No. 50.882.640
SUPERVISOR
Gobernación de Córdoba

ANTICA S.A.S BIC
Nit: 901823241-9
R.L: Juan Pablo Banquez González
C.C. No. 1.067.958.787
INTERVENTOR

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Juan Sebastián Arismendy	Nombre: Oscar Pineda Mendoza	Nombre: GABRIELA RUIZ CARRASCAL
Cargo: Contratista SID	Cargo: Contratista SID	Cargo: Auxiliar Admin SID
Firma	Firma	Firma

ANEXO N°12: PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901823241
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANTICA S.A.S BIC
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 62A N 11A-50 B/ LA CASTELLANA	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7965207011**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	23						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1528458554		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 227.800	$ 3.500	$ 231.300
230201	230201- PROTECCION	2	$ 787.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900	$ 0	$ 787.800	$ 11.900	$ 799.700
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 304.000	$ 4.600	$ 308.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.300	$ 0	$ 683.400	$ 10.300	$ 693.700
SUBTOTALES:										**$ 2.003.000**	**$ 30.300**	**$ 2.033.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 57.000	$ 900	$ 0	$ 57.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 57.000	$ 900	$ 0	$ 57.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 197.000	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 197.000	$ 3.000	$ 0	$ 200.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 57.000	$ 900	$ 0	$ 57.900
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 133.000	$ 2.000	$ 0	$ 135.000
SUBTOTALES:													**$ 501.000**	**$ 7.700**	**$ 0**	**$ 508.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 871.400	$ 871.400	$ 13.100	$ 0	$ 884.500
SUBTOTALES:									**$ 871.400**	**$ 13.100**	**$ 0**	**$ 884.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 501.000	$ 7.600	$ 508.600
SUBTOTALES:			**$ 501.000**	**$ 7.600**	**$ 508.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901823241
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANTICA S.A.S BIC
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 62A N 11A-50 B/ LA CASTELLANA	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7969922252**	TIPO DE PLANILLA:	K-ESTUDIANTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1527777564

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP								
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1003394449	ELJACH MANJARREZ RUBEN ALFREDO	ESTUDIANTES DEC.055/2015		$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 99.100

Planilla Pagada

ANEXO N°13: INFORME DE SEGUIMIENTO SST Y AL PGIO

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No SI-CMA-007-2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

INTERVENTORÍA: ANTICA S.A.S BIC

INFORME PGIO MENSUAL

PERIODO DE COBERTURA:

18 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 17 DE MAYO DE 2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 6
4. AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 7
5. MANEJO AMBIENTAL 8
   5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 8
      5.1.1. Capacitaciones 8
      5.1.2. Jornadas de orden, aseo y limpieza 9
      5.1.3. Puntos de disposición de desechos sólidos, manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje, residuos sólidos convencionales (basura), material de cantera 9
      5.1.4. Puntos de acopio de bolsas de cemento 10
      5.1.5 Manejo de residuos líquidos, lodos, combustibles, aceites y sustancias químicas 11
      5.1.6 Manejo y control de emisiones atmosféricas 11
      5.1.7 Manejo y recuperación de la cobertura vegetal 11
      5.1.8 Obras de concreto y materiales de construcción 11
6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12
   6.1. ACTIVIDADES BÁSICAS 12
      6.1.1. Pagos al sistema de Seguridad Social 12
      6.1.2. Capacitaciones 12
   6.2. ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVAS Y DEL TRABAJO 15
      6.2.1. Índices de accidentalidad y ausentismo 15
      6.2.2. Inspecciones 16
      6.2.3 exámenes ocupacionales de ingreso del personal 17
      6.2.4 Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Reglamento Interno de Trabajo, Política de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 17
   6.3. ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 17
      6.3.1. Supervisión de actividades en Obra 17
      6.3.2. Control y suministro de EPI's a los trabajadores 18

6.3.3. Reunión del COPASST 19
6.3.4. Señalización preventiva e informativa 19
6.3.5. Elementos y dispositivos para la atención de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro 19

1. INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través del Sistema Integrado de Gestión, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia ambiental y de salud y seguridad en el trabajo (Siso-Ambiental). Por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra. De otro lado, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales generados por las actividades propias del proceso constructivo son objeto de trabajo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual es generado y ejecutado por el contratista de obra.

Este documento presenta el informe mensual de la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo realizada durante el periodo comprendido entre el 17 de marzo hasta el 17 de abril de 2025 por parte de la Interventoría **ANTICA S.A.S BIC** en el proyecto: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

✓ Objeto del Proyecto:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
✓ Departamento:	Córdoba
✓ Municipios:	Cereté, San Pelayo, Ciénaga de oro, Moñitos, Tierralta, Planeta Rica, San Bernardo del Viento, Canalete, San Andrés de Sotavento, Los Córdobas
✓ Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto se desarrolla en el Departamento de Córdoba integrando a los Municipios de Cereté, San Pelayo, Ciénaga de oro, Moñitos, Tierralta, Planeta Rica, San Bernardo del Viento, Canalete, San Andrés de Sotavento y Los Córdobas.

A continuación se muestra una imagen en donde se expone la ubicación geográfica del proyecto dentro del mapa político de Colombia, además se discriminan los Municipios involucrados en el proyecto en el departamento de Córdoba.

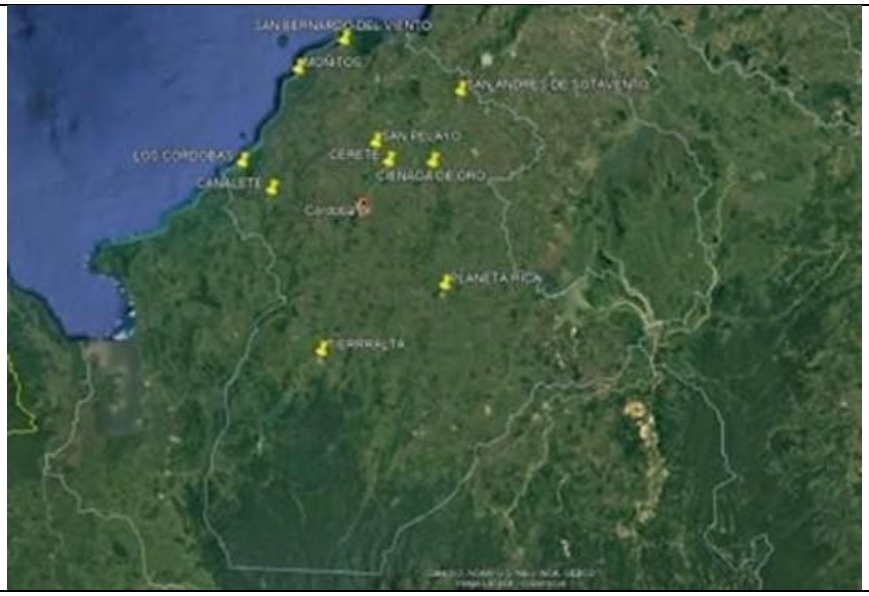


Figura 1. Localización del proyecto.

4. AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

✓ Corporación autónoma :	Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)
✓ Jurisdicción :	Todo el territorio del departamento de Córdoba
✓ Sede :	Montería
✓ Dirección :	Carrera 6 N° 61-25, Barrio Los Bongos
✓ Teléfonos:	(604) 789 06 05 – (604) 789 06 09

5. MANEJO AMBIENTAL


5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se da una descripción de las actividades de manejo ambiental realizadas durante el periodo 17 de marzo al 17 de abril de 2025 por parte del Consorcio Infraestructura Educativa 002 en el proyecto “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

5.1.1. Capacitaciones

Durante este periodo del proyecto el contratista realizó las siguientes capacitaciones ambientales:

- ✓ Medidas de Manejo Ambiental.

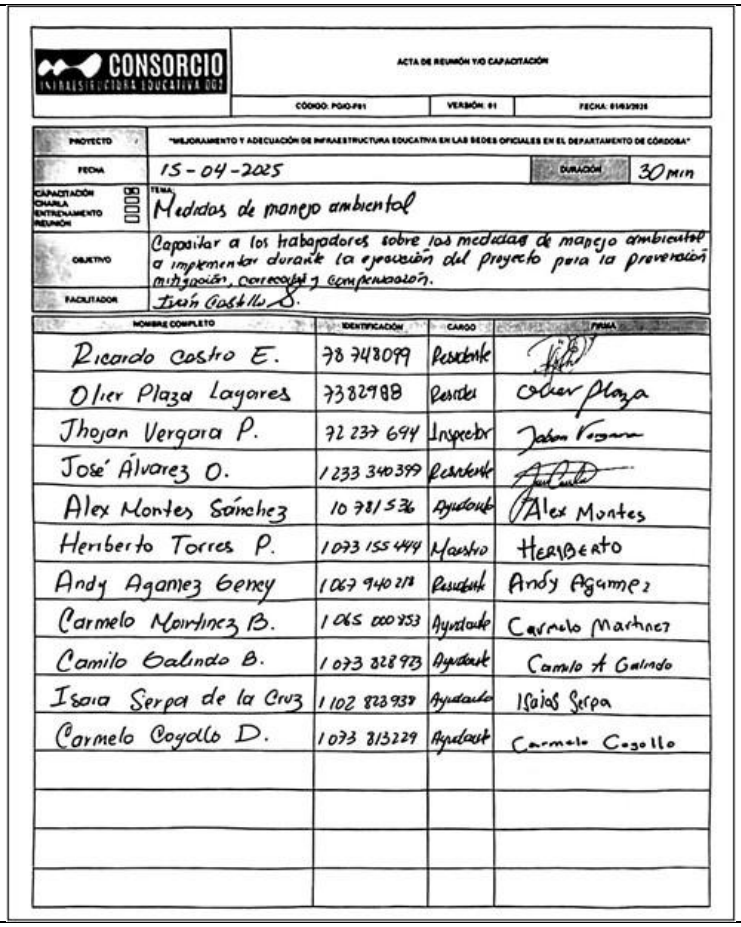

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN

CÓDIGO: POIO-F01 | VERSIÓN: 01 | FECHA: 01/01/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	15-04-2025 — DURACIÓN: 30 min
CAPACITACIÓN / CHARLA / ENTRENAMIENTO / REUNIÓN	TEMA: Medidas de manejo ambiental
OBJETIVO	Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de manejo ambiental a implementar durante la ejecución del proyecto para la prevención, mitigación, corrección y compensación.
FACILITADOR	Isaín Cogollo S.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Ricardo Castro E.	78 748099	Residente	
Olier Plaza Layares	73829188	Residente	Olier Plaza
Jhojan Vergara P.	72 237 694	Inspector	Jhojan Vergara
José Álvarez O.	1 233 340 399	Residente	
Alex Montes Sánchez	10 781 536	Ayudante	Alex Montes
Heriberto Torres P.	1 073 155 444	Maestro	HERIBERTO
Andy Agamez Gerey	1 067 940 218	Residente	Andy Agamez
Carmelo Martinez B.	1 065 000 853	Ayudante	Carmelo Martinez
Camilo Galindo B.	1 073 828 973	Ayudante	Camilo A Galindo
Isaias Serpa de la Cruz	1 102 823 937	Ayudante	Isaias Serpa
Carmelo Cogollo D.	1 073 813 229	Ayudante	Carmelo Cogollo

Capacitación Ambiental.

5.1.2. Jornadas de orden, aseo y limpieza

Durante recorridos e inspecciones de obra durante el periodo comprendido se observó condiciones de orden y aseo aceptables en los frentes de trabajo, el encargado SST llevó a cabo programa de mejoramiento de orden y aseo en todas las unidades de trabajo mejorando el criterio de orden y aseo a bueno; el material sobrante producto de las actividades realizadas es ubicado y señalizado en lugares específicos; las condiciones de orden, aseo y limpieza de los baños existentes en los frentes de obra son aceptables.

5.1.3. Puntos de disposición de desechos sólidos, manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje, residuos sólidos convencionales (basura), material de cantera

En los frentes de trabajo se cuenta con puntos de disposición de desechos sólidos para mitigar el impacto ambiental generado por la dispersión de estos, se encuentran señalizados y socializados con el personal del proyecto, se realiza separación adecuada de desechos.



Punto ecológico Institución educativa Marceliano Polo.



Material de trabajo señalizado- Institución Educativa Marceliano Polo.

En lo relacionado con escombros, el contratista entregará el material a lotes con necesidades de rellenos, previa autorización de las autoridades competentes, el material de cantera en los frentes de trabajo es cubierto con plástico con el fin de evitar la contaminación de este.

5.1.4. Puntos de acopio de bolsas de cemento

Las bolsas vacías de cemento se consideran un residuo peligroso según la LER pues se cataloga como “Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas”, el contratista cuenta con puntos de acopio de bolsas de cemento y demás sustancias químicas utilizadas en obra.



Punto de acopio para residuos de sustancias químicas.

.

5.1.5 Manejo de residuos líquidos, lodos, combustibles, aceites y sustancias químicas

El contratista cuenta con las hojas de seguridad y tarjetas de emergencia de las sustancias químicas con las que se trabajan en los frentes de trabajo, los envases donde se conservan sustancias como la gasolina y demás se encuentran rotulados en los diferentes frentes de trabajo.

Los cambios de aceite y suministro de combustible a maquinaria y equipo se realizan de conformidad con los protocolos establecidos.

5.1.6 Manejo y control de emisiones atmosféricas

La maquinaria y vehículos con los que cuenta el contratista en obra cuentan con certificado tecno mecánicos y SOAT vigentes. De igual manera el contratista implementa los siguientes controles:

- Las volquetas que transportan material operan en horarios de 7:00:00 am – 5:00:00 pm.
- Los materiales que generan material particulado son cubiertos con plásticos para el transporte a obra.
- La velocidad de las volquetas no supera los 30 km/h.
- No se realizan quemas a cielo abierto.

5.1.7 Manejo y recuperación de la cobertura vegetal

Durante este periodo de trabajo no se generaron impactos negativos por motivos de la ejecución del proyecto. De igual forma, no se requirió la ejecución de acciones de rescate como tampoco relocalización de especies silvestres.

5.1.8 Obras de concreto y materiales de construcción

Se realiza el manejo de concretos de acuerdo a los protocolos ambientales y de seguridad.

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se da una descripción de las actividades en seguridad y salud en el trabajo realizado durante el periodo 17 de marzo al 17 de abril de 2025 por parte del Consorcio Infraestructura Educativa 002 en el proyecto “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

6.1. ACTIVIDADES BÁSICAS

6.1.1. Pagos al sistema de Seguridad Social


Se hace recolección de la documentación que soporta los pagos de seguridad social efectuados por el Consorcio Infraestructura Educativa 002, se verifica que el personal que está en obra coincida con el personal que aparece en planilla, la última planilla de pago de seguridad social cancelada por el contratista tiene fecha de pago de 16 de abril de 2025.

6.1.2. Capacitaciones

Durante este periodo el contratista realizó capacitaciones con el propósito de fortalecer los conocimientos básicos de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y con esto reducir la probabilidad de ocurrencia de un incidente o accidente de trabajo; estas capacitaciones se verifican de acuerdo al cronograma de trabajo SISOMA suministrado por el contratista.

Las capacitaciones realizadas son las siguientes:

- ✓ Inducción SST
- ✓ Notificación de riesgos.
- ✓ Uso adecuado de EPP.

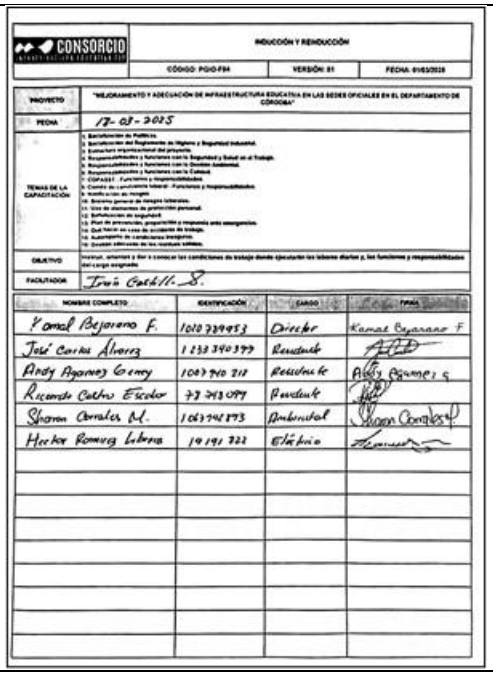

CONSORCIO


INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

CÓDIGO: PGIO-FSH	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2023

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	17-03-2025
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	1. Socialización de Políticas. 2. Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 3. Estructura organizacional del proyecto. 4. Responsabilidades y funciones con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Responsabilidades y funciones con la Gestión Ambiental. 6. Responsabilidades y funciones con la Calidad. 7. COPASST - Funciones y responsabilidades. 8. Comité de convivencia laboral - Funciones y responsabilidades. 9. Identificación de riesgos. 10. Sistema general de riesgos laborales. 11. Uso de elementos de protección personal. 12. Señalización de seguridad. 13. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 14. Qué hacer en caso de accidente de trabajo. 15. Autocuidado de condiciones inseguras. 16. Gestión ambiental de los residuos sólidos.
OBJETIVO	Instruir, orientar y dar a conocer las condiciones de trabajo donde ejecutaran las labores diarias y, las funciones y responsabilidades del cargo asignado.
FACILITADOR	Iván Castillo S.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Yamal Bejarano F.	1010 739953	Director	Kamal Bejarano F.
José Carlos Alvarez	1 233 340 399	Residente	
Andy Agamez Gomez	1067 940 711	Residente	Andy Agamez G
Ricardo Castro Escobar	77 193 099	Residente	
Sharon Corrales M.	1067 941 893	Ambiental	Sharon Corrales M
Hector Romero Lobera	10 191 722	Eléctrico	

Inducción SST.

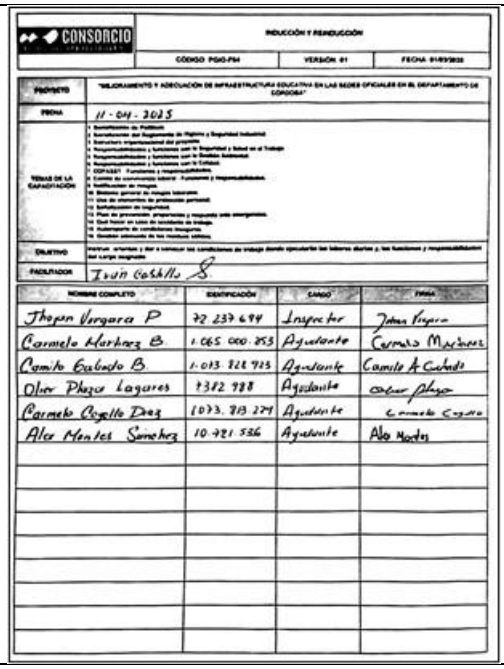

CONSORCIO


INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

CÓDIGO: PGIO-FSH	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2023

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	11-04-2025
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	1. Socialización de Políticas. 2. Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 3. Estructura organizacional del proyecto. 4. Responsabilidades y funciones con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Responsabilidades y funciones con la Gestión Ambiental. 6. Responsabilidades y funciones con la Calidad. 7. COPASST - Funciones y responsabilidades. 8. Comité de convivencia laboral - Funciones y responsabilidades. 9. Identificación de riesgos. 10. Sistema general de riesgos laborales. 11. Uso de elementos de protección personal. 12. Señalización de seguridad. 13. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 14. Qué hacer en caso de accidente de trabajo. 15. Autocuidado de condiciones inseguras. 16. Gestión ambiental de los residuos sólidos.
OBJETIVO	Instruir, orientar y dar a conocer las condiciones de trabajo donde ejecutaran las labores diarias y, las funciones y responsabilidades del cargo asignado.
FACILITADOR	Iván Castillo S.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Jhoan Vergara P.	72 237 694	Inspector	Jhoan Vergara
Carmelo Martinez B.	1.065.000.753	Ayudante	Carmelo Martinez
Camilo Estrada B.	1.013.722.925	Ayudante	Camilo A Estrada
Oliver Phayer Lagares	7372 988	Ayudante	Oliver Phayer
Carmelo Cogollo Diaz	1073.713.279	Ayudante	Carmelo Cogollo
Alex Montes Sanchez	10.721.536	Ayudante	Alex Montes

Inducción SST.

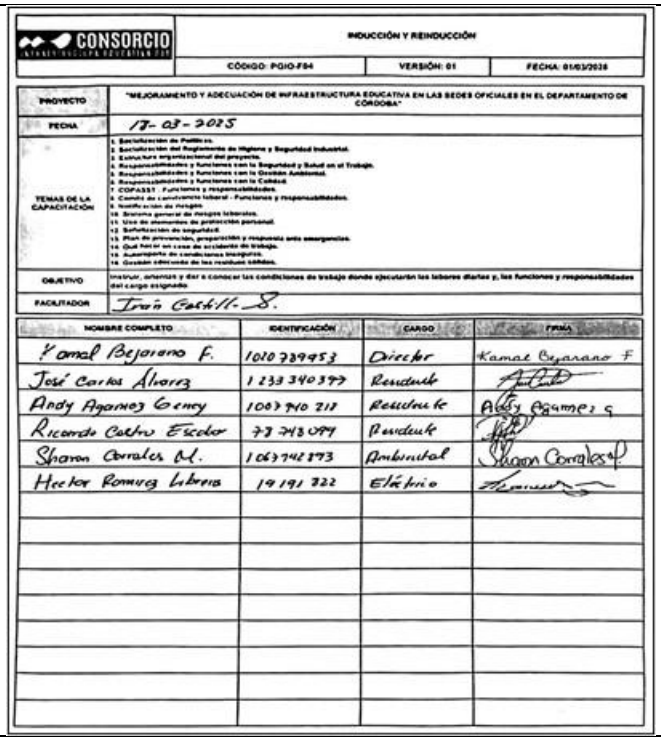


CONSORCIO	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN		
	CÓDIGO: PGIO-F04	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	17-03-2025
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	1. Socialización de Política. 2. Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 3. Estructura organizacional del proyecto. 4. Responsabilidades y funciones con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Responsabilidades y funciones con la Gestión Ambiental. 6. Responsabilidades y funciones con la Calidad. 7. COPASST - Funciones y responsabilidades. 8. Comité de convivencia laboral - Funciones y responsabilidades. 9. Identificación de riesgos. 10. Sistema general de riesgos laborales. 11. Uso de elementos de protección personal. 12. Señalización de seguridad. 13. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 14. Qué hacer en caso de accidente de trabajo. 15. Autoreporte de condiciones inseguras. 16. Gestión adecuada de los residuos sólidos.
OBJETIVO	Instruir, orientar y dar a conocer las condiciones de trabajo donde ejecutarán las labores diarias y, las funciones y responsabilidades del cargo asignado.
FACILITADOR	Iván Cashlo S.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Kamal Bejarano F.	1010739453	Director	Kamal Bejarano F
José Carlos Alvarez	1 233 340 377	Residente	
Andy Agamez Gomez	1067 940 218	Residente	Andy Agamez G
Ricardo Castro Escobar	77 743 099	Residente	
Sharon Corrales M.	1063742373	Ambiental	Sharon Corrales M
Hector Romero Lobera	19 191 722	Eléctrico	

Notificación de riesgos.

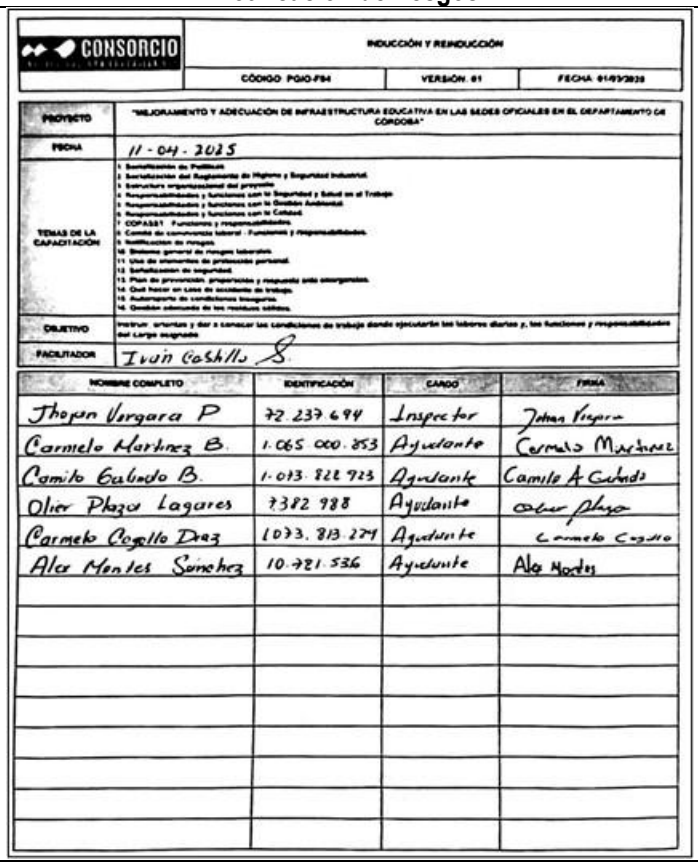


CONSORCIO	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN		
	CÓDIGO: PGIO-F04	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	11-04-2025
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	1. Socialización de Política. 2. Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 3. Estructura organizacional del proyecto. 4. Responsabilidades y funciones con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Responsabilidades y funciones con la Gestión Ambiental. 6. Responsabilidades y funciones con la Calidad. 7. COPASST - Funciones y responsabilidades. 8. Comité de convivencia laboral - Funciones y responsabilidades. 9. Identificación de riesgos. 10. Sistema general de riesgos laborales. 11. Uso de elementos de protección personal. 12. Señalización de seguridad. 13. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 14. Qué hacer en caso de accidente de trabajo. 15. Autoreporte de condiciones inseguras. 16. Gestión adecuada de los residuos sólidos.
OBJETIVO	Instruir, orientar y dar a conocer las condiciones de trabajo donde ejecutarán las labores diarias y, las funciones y responsabilidades del cargo asignado.
FACILITADOR	Iván Cashlo S.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Jhojan Vergara P	72.237.694	Inspector	Jhojan Vergara
Carmelo Martinez B.	1.065.000.853	Ayudante	Carmelo Martinez
Camilo Caldado B.	1.073.822.923	Ayudante	Camilo A Caldado
Olier Plaza Lagares	7382 988	Ayudante	Olier Plaza
Carmelo Cogollo Diaz	1073.813.279	Ayudante	Carmelo Cogollo
Alex Montes Sanchez	10.721.536	Ayudante	Alex Montes

Notificación de riesgos.

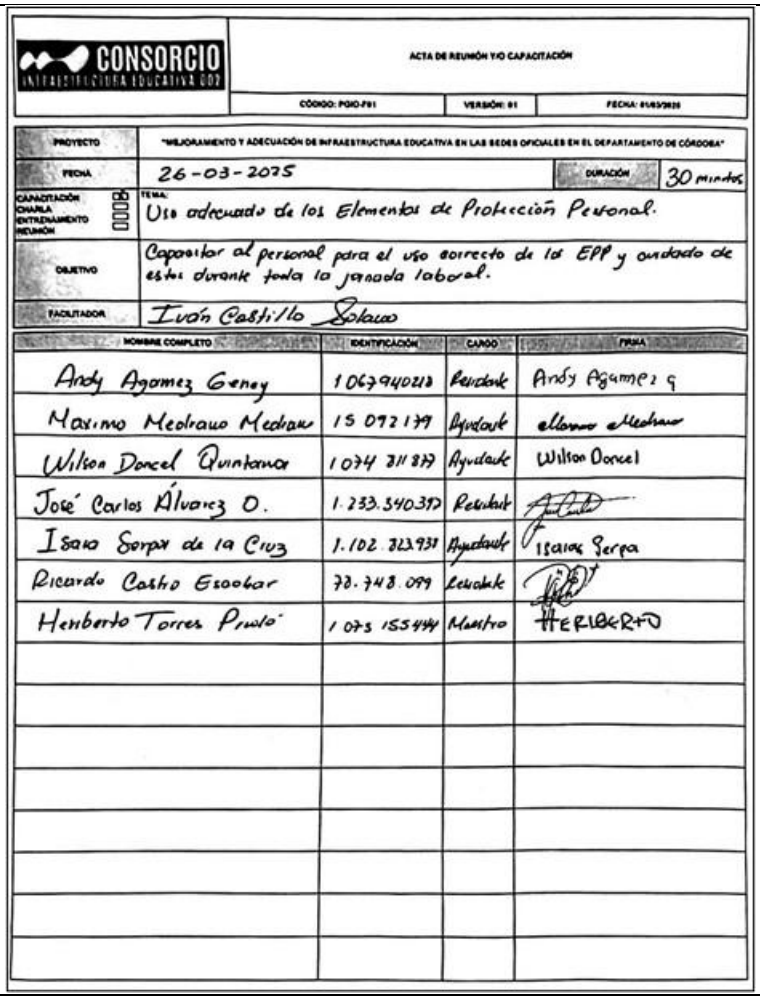

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN

CÓDIGO: PGIO-F01 | VERSIÓN: 01 | FECHA: 01/03/2025

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA	26-03-2025 — DURACIÓN: 30 minutos
CAPACITACIÓN / CHARLA / ENTRENAMIENTO / REUNIÓN	TEMA: Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal.
OBJETIVO	Capacitar al personal para el uso correcto de los EPP y cuidado de estos durante toda la jornada laboral.
FACILITADOR	Iván Castillo Salcedo

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Andy Agamez Geney	1067940213	Residente	Andy Agamez G
Maximo Medrano Medrano	15 092 179	Ayudante	Medrano Medrano
Wilson Doncel Quintana	1074 311 877	Ayudante	Wilson Doncel
José Carlos Álvarez O.	1.233.340.317	Residente	
Isaac Serpa de la Cruz	1.102.323.931	Ayudante	Isaac Serpa
Ricardo Castro Escobar	78.748.089	Residente	
Heriberto Torres Prado	1 075 155 444	Maestro	HERIBERTO

Uso adecuado de EPP.

6.2. ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVAS Y DEL TRABAJO

6.2.1. Índices de accidentalidad y ausentismo

Se realizó seguimiento continuo a las actividades en obra para minimizar los accidentes e incidentes de trabajo, durante la ejecución de las actividades en este periodo, no se presentaron accidentes de trabajo.

6.2.2. Inspecciones

Durante el periodo de trabajo el contratista realiza inspecciones preventivas en búsqueda de aumentar las condiciones de seguridad de los trabajadores, entre las inspecciones realizadas se encuentran:

- ✓ Inspección de herramientas.
- ✓ Inspecciones de botiquín.
- ✓ Inspecciones de extintores.
- ✓ Inspecciones de maquinaria y equipos.



Botiquin de primeros auxilios-Institución Educativa Marceliano Polo.



Extintor- Institución Educativa Marceliano Polo.



Camilla de emergencia- Institución Educativa Santa teresa sede San Pelayo.

6.2.3 exámenes ocupacionales de ingreso del personal

El consorcio Infraestructura Educativa 002 muestra evidencia física de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, el personal de obra de acuerdo a los resultados de los exámenes es apto para realizar las labores que el proyecto genera.

6.2.4 Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Reglamento Interno de Trabajo, Política de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas

El contratista tiene publicada en los frentes de trabajo la matriz de peligros y riesgos, se evidencia publicación del reglamento de higiene y seguridad industrial, reglamento interno de trabajo, política de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en los frentes de trabajo.

6.3. ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.3.1. Supervisión de actividades en Obra

Se realiza supervisión en las actividades en donde se requieren suministro de los EPI reglamentarios para el adecuado desempeño de las actividades respectivas en los ejes necesarios para el control seguro de trabajo en todos los frentes y áreas respectivas del proyecto.



Actividades en obra.



Actividades en obra.

6.3.2. Control y suministro de EPI's a los trabajadores

Se realiza control y entrega permanente de los elementos de protección personal (casco, tapaoidos tipo inserción, gafas, guantes, botas) a los trabajadores en el proyecto por parte del contratista con respecto a la naturaleza de la actividad realizada, los EPI en mal estado son recogidos y posteriormente reciclados. En inspecciones en campo se observaba que los trabajadores tienen buen uso de los elementos de protección personal.



Entrega de EPP y Dotación.

6.3.3. Reunión del COPASST

El encargado SST durante el periodo comprendido realizó la reunión correspondiente con los miembros del Copasst.

6.3.4. Señalización preventiva e informativa

El contratista mantiene señalización preventiva e informativa en los frentes de trabajo, identificando las posibles fuentes de accidentes e incidentes de trabajo, informando del uso obligatorio de EPI, la ruta de evacuación, los puntos de encuentro y los dispositivos para la atención de emergencias.

6.3.5. Elementos y dispositivos para la atención de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro

Se realizó inspección y verificación de los dispositivos y elementos para la atención de emergencias, tales como camilla rígida con inmovilizador de cuello, botiquín de primeros auxilios y extintores en los frentes de trabajo. Se evidencia señalización de ruta de emergencia y puntos de encuentros definidos.



Botiquin de primeros auxilios-Institución Educativa Marceliano Polo.



Extintor- Institución Educativa Marceliano Polo.



Camilla de emergencia- Institución Educativa Santa teresa sede San Pelayo.

ANEXO N°14: REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO - CERETÉ	
	
ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE	**ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE**
	
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA ESTRUCTURA TANQUE ENTERRADO DE AGUAS RESIDUALES	**MEJORAMIENTO CON PIEDRA RAJON**
	
ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	**COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)**

	
COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	**ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS**
	
VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	**ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN**
	
VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	**VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)**

	
VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	**VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA SEDE GENERAL – SANTANDER – SAN PELAYO	
	
MEJORAMIENTO CON PIEDRA RAJON PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE	**ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE**
	
SOLADO EN CONCRETO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE	**SOLADO EN CONCRETO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE**

	
COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	**ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS**

	
COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	**COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)**
	
ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	**ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA CIMENTACIÓN**

	
VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	**VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)**
	
ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	**VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ - CIENAGA DE ORO	
	
ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE	**ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE ENTERRADO DE AGUA POTABLE**

	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	**SOLADO EN CONCRETO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE**
	
ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS	**ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS**
	
COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	**COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)**

	
ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS	**ACERO DE REFUERZO FY = 4,2 MPA ESTRUCTURAS**
	
VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	**VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)**
	
VIGA SUPERIOR DE 0.30 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	**ACERO PARA ESTRUCTURAS**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MOÑITOS - MOÑITOS	
	
S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	**S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS**
	
EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS	**EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS**
