
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES QUETAME ETAPA II**	**132 días**	**mar 24/06/2**	**mié 24/12/2**
2		**CAPITULO 1. MURO DE CONTENCIÓN VEREDA LAS MERCEDES**	**63 días**	**lun 29/09/25**	**mié 24/12/2**
3		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	1 día	lun 29/09/25	lun 29/09/25
4		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	3 días	mar 30/09/25	jue 2/10/25
5		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	3 días	mar 30/09/25	jue 2/10/25
6		PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	25 días	vie 3/10/25	jue 6/11/25
7		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	15 días	vie 7/11/25	jue 27/11/25
8		CONCRETO CLASE D, f´c =3000 PSI (elevaciones)	30 días	vie 7/11/25	jue 18/12/25
9		DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	1 día	vie 19/12/25	vie 19/12/25
10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	1 día	vie 19/12/25	vie 19/12/25
11		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	3 días	vie 19/12/25	mar 23/12/2
12		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	1 día	mié 24/12/25	mié 24/12/2
13		**CAPITULO 4.3 CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA TRAMO 1 GRANADILLO (160 ML) 1 ALCANTARILLA**	**63 días**	**lun 29/09/25**	**mié 24/12/2**
14		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	3 días	lun 29/09/25	mié 1/10/25
15		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25
16		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	6 días	jue 2/10/25	jue 9/10/25
17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25
18		TUBERÍA DRENAJE PVC 160	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25
19		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	2 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25
20		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25
21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	1 día	vie 3/10/25	vie 3/10/25
22		SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	5 días	vie 3/10/25	jue 9/10/25
23		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	20 días	vie 10/10/25	jue 6/11/25
24		CONCRETO CLASE D, f´c= 3000 psi (bases)	30 días	vie 7/11/25	jue 18/12/25
25		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	30 días	vie 7/11/25	jue 18/12/25
26		AFIRMADO	4 días	vie 19/12/25	mié 24/12/2
27		**CAPITULO 4.3 CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA TRAMO 2 CAFETAL (80 ML) 1 ALCANTARILLA**	**63 días**	**lun 29/09/25**	**mié 24/12/2**
28		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	3 días	lun 29/09/25	mié 1/10/25
29		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25
30		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	6 días	jue 2/10/25	jue 9/10/25
31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25
32		TUBERÍA DRENAJE PVC 160	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25
33		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	2 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25
34		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25
35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	1 día	vie 3/10/25	vie 3/10/25
36		SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	5 días	vie 3/10/25	jue 9/10/25
37		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	20 días	vie 10/10/25	jue 6/11/25
38		CONCRETO CLASE D, f´c= 3000 psi (bases)	30 días	vie 7/11/25	jue 18/12/25
39		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	30 días	vie 7/11/25	jue 18/12/25
40		AFIRMADO	4 días	vie 19/12/25	mié 24/12/2
41		COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO)	1 día	mar 24/06/2	mar 24/06/2
42		PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	63 días	lun 29/09/25	mié 24/12/2
43		PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	63 días	mar 23/09/2	jue 18/12/25

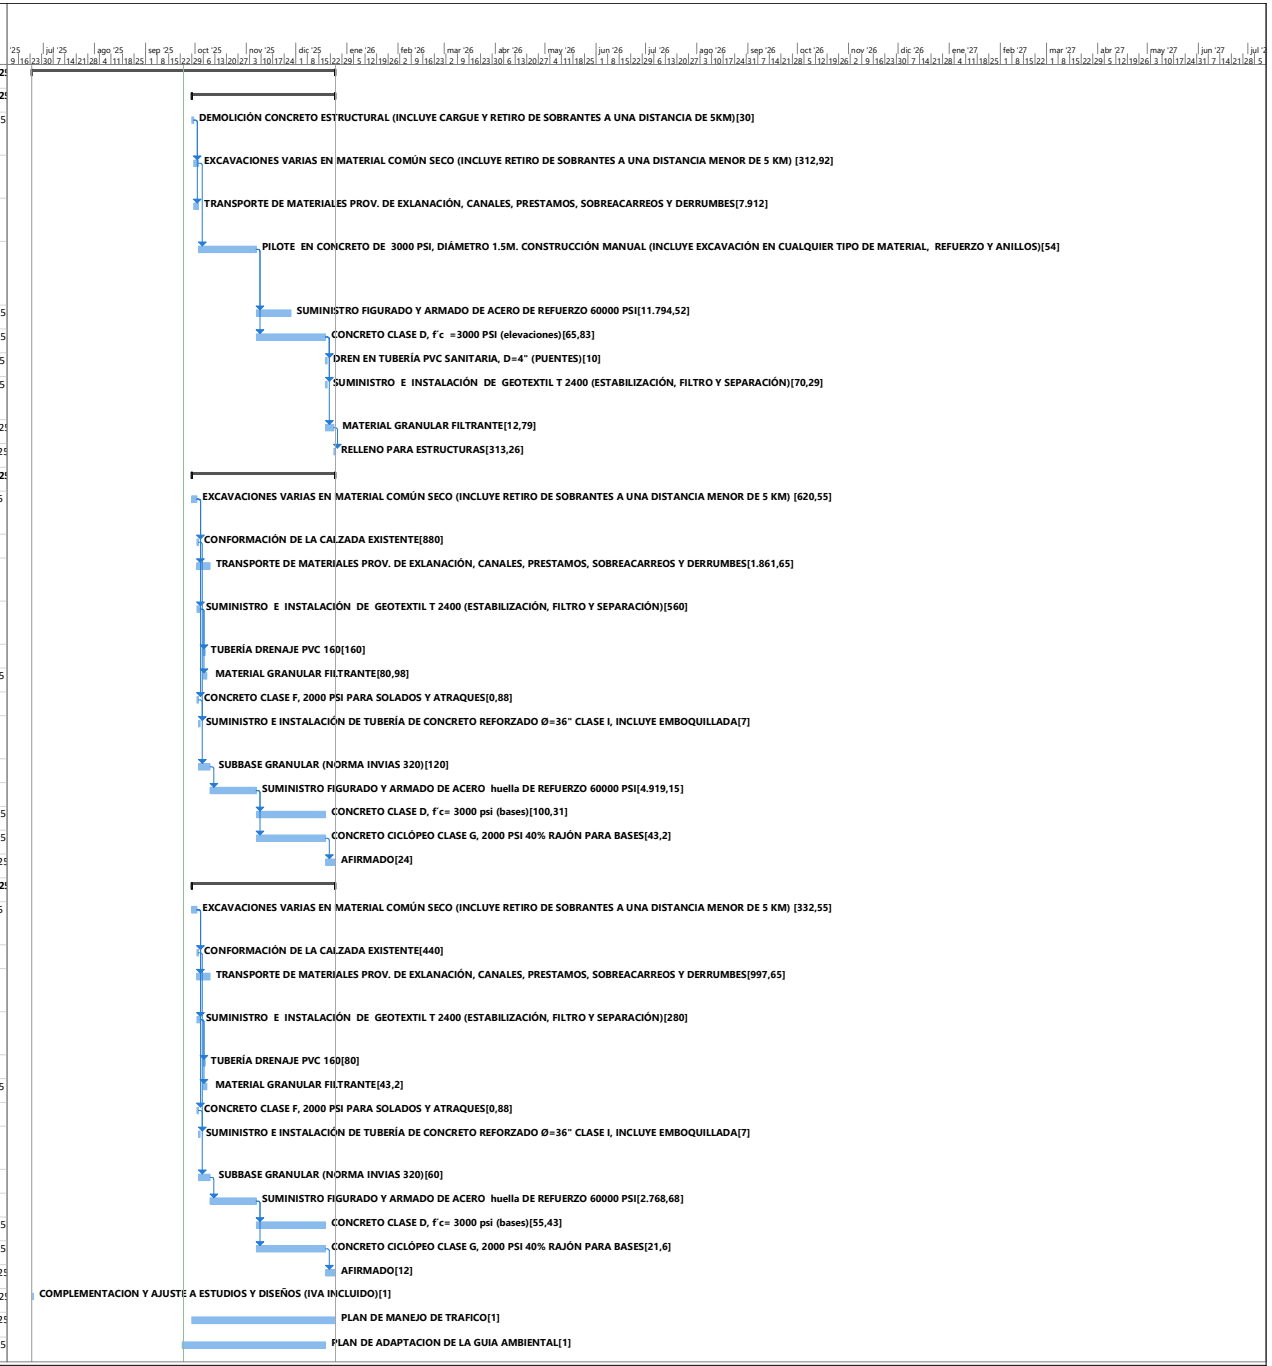

Proyecto: PROGRAMACION MU
Fecha: mié 24/09/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso
