ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013838581	NIT	901905021	CONSORCIO PARQUES VERDES

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	747-2024	3000936224	002	10-sep-25	10-sep-25	PAGADA	11-sep-25	5004576534	Transferencia Giradora	424.540.668	389.473.610	047719729 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	747-2024	3000990331	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004927733	Transferencia Giradora	311.558.436	285.823.709	047719729 CORRIENTE Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP

	29-sep-25 11:41:52
	Otra información:
•	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
•	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE

Código: GCO-GCI-F148
Versión: 03
Vigencia: 21 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE

ART 383 ☐

CONTRATO No.	Contrato de Obra Publica	747 - 2024	**FECHA:**	22/09/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIOPARQUES VERDES		**NIT. o C.C.**	901.905.021	
PERIODO:	**Del**	**21/07/2025**	**Al**	**20/08/2025**	
PAGO No.	**PAGO 5**		Documento No.	Factura de Vent	**PAVE 5**

Responsable IVA ☑

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**55070612**	**5507060000**			**311.558.436**
Retefuente Arrendamientos					**0**
Retefuente Servicios					**0**
Retefuente Honorarios					**0**
Retefuente Compras					**0**
Retefuente C.O.P	**243626**	**2436260100**	311.558.436	2,00%	**6.231.169**
Reteiva	**243625**	**2436250100**	0	15,00%	**0**
Reteica	**243627**	**2436270100**	311.558.436	0,760%	**2.367.844**
Contribución Especial	**24369004**	**2436901001**	311.558.436	5,00%	**15.577.922**
Estampilla Universidad Pedag	**24369006**	**2436900901**	311.558.436	0,50%	**1.557.792**
Otros Ajustes de Reten.					**0**
TOTAL DESCUENTOS					**25.734.727**
NETO A PAGAR	**240102**	**2401020100**			**285.823.709**

LUISA FERNANDA GUZMAN MARTINEZ
Contadora (E) F.D.L RUU

Elaboro: Leidy Diaz - Profesional de Apoyo FDLRUU
Aprobó:

Objeto del Contrato:
CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C

Rubro Presupuesta: **O230689**

OBSERVACIONES:
SE LIQUIDAN SEGÚN CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACION DEL APOYO A LA SUPERVISION Y EL SR. ALCALDE LOCAL CON MEMORANDO No.Radicado No. 20256820008873 DEL 12/09/2025.
SE REALIZA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE PARA TRAMITAR LA CAUSACIÓN CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA INSTRUCCIÓN GCO-GCI-IN003 INSTRUCCIONES CONTABLES Y GCO-GCI-IN019 INSTRUCCIONES PARA PAGOS. LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN REQUERIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CLAUSULADO DEL CONTRATO, SE PRECISA FUERON REVISADOS, AVALADOS Y APROBADOS POR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Base para pago de salud, pensión y ARL		
Aporte obligatorio para salud - 12,5%		
Aporte obligatorio para pensión - 16% (+) FSP		
Aporte obligatorio ARL		
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN		

CIRP-741-2024-111

Bogotá D.C 01 de septiembre de 2025

Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
R No. 2025-681-008749-2
2025-09-01 14:13 - Folios: 1 Anexos: 167
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: CONSORCIO INTER RUU PARQU

Doctora:
DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO
Alcaldesa Local De Rafael Uribe Uribe
Bogotá

Asunto: ENTREGA DOCUMENTOS QUINTO PAGO - COP 747 DE 2024 - OBRA

Referencia: Contrato de Interventoría No. CIN 741 de 2024 - Contrato de obra pública No. COP 747 de 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente la interventoría, CONSORCIO INTER RUU PARQUES, hace entrega de los siguientes documentos, correspondientes al pago número CINCO del contratista CONSORCIO PARQUES VERDES los cuales han sido revisados y avalados por esta interventoría:

- Acta de Obra No. 5.
- Memorias Acta de Obra No. 5.
- Factura de Venta (Original).
- RUT.
- Resolución de Facturación.
- Certificación bancaria.
- Certificación de Parafiscales.
- Copia Cédula, tarjeta profesional y certificado Junta Central de Contadores.
- Pantallazo secop
- Informe de actividades
- Clausulado.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría

CONSORCIO INTER RUU PARQUES

NIT: 901902185-3

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

(F150)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO PARQUES VERDES sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

Al periodo comprendido entre el 21 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025.

Contrato:	747 de 2024
Tipo de Contrato:	OBRA
Contratista:	CONSORCIO PARQUES VERDES
NIT	No. 901.905.021-8

Objeto: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C.".

Plazo de ejecución inicial	6 MESES Y 15 DIAS
Prorroga No. 1	3 MESES Y 7 DIAS
Fecha de inicio:	10 DE MARZO DE 2025
Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Inicial pactado:	$ 2.616.903.493,00
Adición No. 1:	$1.308.451.747,00
Valor total del contrato:	$ 3.925.355.240,00
Valor para pagar (Pago No. 5)	$ 311.558.436,00

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSORCIO PARQUES VERDES se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 03 días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Interventor o Supervisor

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
C.C. No. 79.939.003 DE BOGOTÁ
R/L CONSORCIO INTER RUU PARQUES

DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO
C.C. No. 52.883.374 de Bogotá.
ALCALDESA FDLRUU

INFORME DE SUPERVISIÓN

(F133)

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	747-2024		
Periodo y/o No. de Pago	21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025, PAGO No. 5		
Nombre Del Contratista	CONSORCIO PARQUES VERDES		
Nit:	901905021-8		
Objeto Del Contrato	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C."		
Fecha de Inicio	10 DE MARZO DE 2025		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Póliza cumplimiento	**Detalle**	**Vigencia**	**Suma asegurada**
No. 560-47-994000186240-anexo 2/ Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento	Desde 31/jul/2025 hasta 30/mar/2026	$1.177.606.572,00
	Prestaciones sociales	Desde 31/jul/2025 hasta 30/sep./2028	$196.267.762,00
	Calidad del servicio	Desde 31/jul/2025 hasta 30/sep./2026	$1.177.606.572,00
	Estabilidad de la obra	Desde la firma del acta de recibo a satisfacción hasta 5 años posteriores a esta.	$1.177.606.572,00
Póliza responsabilidad civil extracontractual	**Detalle**	**Vigencia**	**Suma asegurada**
No. 560-74-994000034258-anexo 2/ Aseguradora Solidaria de Colombia	Amparo básico – predios, labores y operaciones	Desde 30/09/2025 hasta el 31/dic/2025	$284.700.000,00
	Patronal	Desde 30/09/2025 hasta el 31/dic/2025	$284.700.000,00
	Contratistas y subcontratistas	Desde 30/09/2025 hasta el 31/dic/2025	$284.700.000,00
	Vehículos propios y no propios	Desde 30/09/2025 hasta el 31/dic/2025	$284.700.000,00

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	(25/09/2025)	($1.308.451.747,00)	(SI)
PRORROGA	(25/09/2025)	(3 MESES Y 7 DIAS)	(SI)
SUSPENSIÓN	(N/A)	(N/A)	(N/A)
OTRO SI	(N/A)	(N/A)	(N/A)


SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO


Durante el periodo de ejecución descrito en el presente informe, se realizan actividades en los 3 parques que inicialmente contemplaba el contrato 747 de 2024, no obstante, luego de la formalización de la adición y prorroga No. 1 del contrato se estableció un nuevo parque para ser intervenido, denominado Quiroga 18-202. De igual forma en el mes de julio y agosto de 2025, se realizan actividades administrativas, de aprobación de planes de gestión Social, SST y ambiental.
Se realiza control de cantidades, materiales y ejecución de las obras encargadas, supervisión SST, ambiental y social, incluyendo capacitaciones relacionadas en los anexos de cada informe.

Las actividades de obra corresponden a:

Parque Quiroga 18-042


Durante el presente periodo se realizó la aplicación de pintura koraza de color blanco en el muro de contención perimetral al parque, remates finales, empradización de zonas verdes con pasto kikuyo, suministro e instalación de señales de identificación general, informativas y cívicas.
Es necesario resaltar que en el parque existía un proyecto del IDPAC, denominado jardines de polinizadores, los cuales consistían en jardines de plantas ornamentales que permitiesen la llegada de abejas y otros insectos nativos del entorno, sin embargo, estas plantas por su bajo mantenimiento ocasionaron un problema de seguridad publica en el parque con la generación de focos de crímenes, presentándose robos a transeúntes del sector en altas horas de la noche donde los maleantes emplearon los jardines para ocultarse y asaltar a sus víctimas, hechos reportados al equipo técnico por parte de la comunidad, razón por la cual, los mismos habitantes del sector decidieron eliminar los matorrales afectando directamente el proyecto del IDPAC, cabe aclarar que esta situación es ajena al Consorcio Parques Verdes y por lo tanto no implica responsabilidad alguna en el retiro de las plantas existentes en las jardineras del parque.
Se tiene programada entrega del parque a interventoría, Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, el día 29 de agosto de 2025.

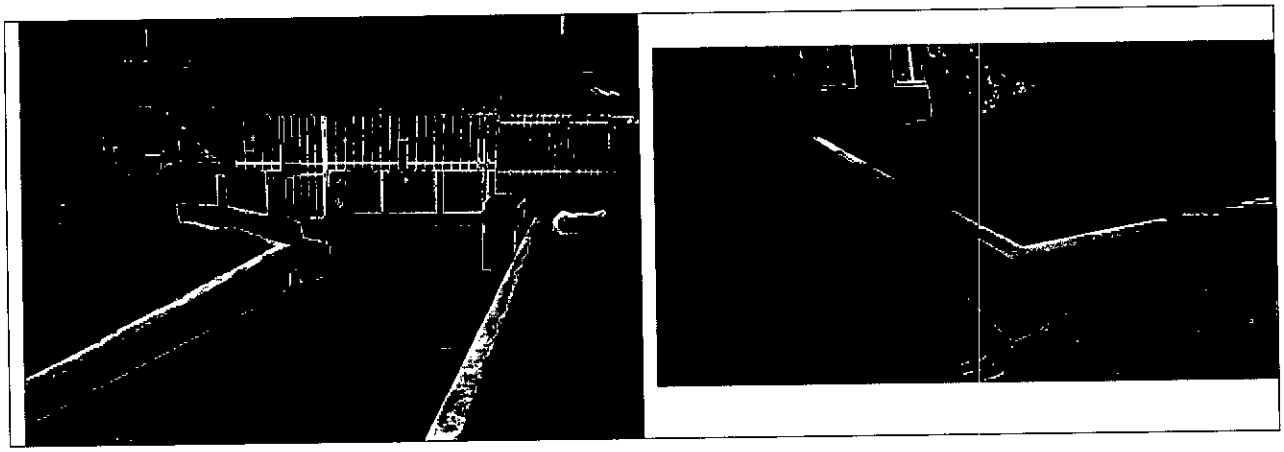


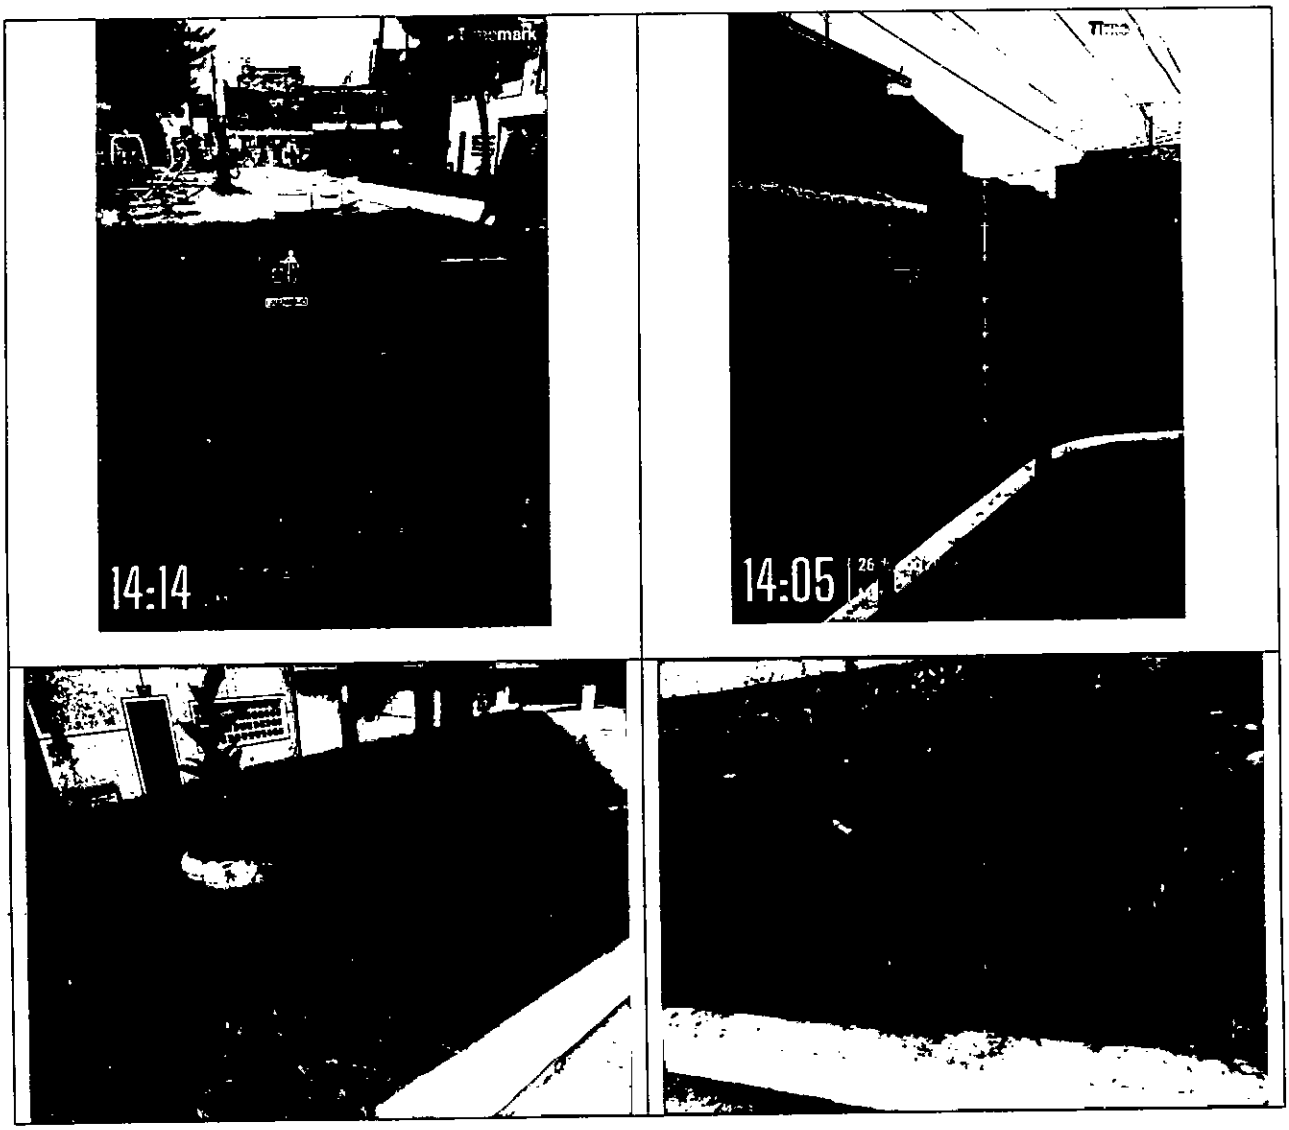

Quiroga 18-138


Se realizan obras de cambio de redes de alcantarillado combinado en el costado occidental, las cuales consisten en reemplazar la tubería de gres existente en 10" y 6" por tubería PVC corrugada de los mismos diámetros y cotas existentes.
Se construyen 6 cajas de inspección para domiciliaria de Alcantarillado, 4 sumideros con sello hidráulico, instalación de cárcamo de drenaje perimetral, demolición de andenes existentes, excavación para conformación de estructura para andenes; geotextil, subbase granulara reciclada y placa de concreto estampado en color.
Es necesario trasladar de posición varias cajas de contadores de acueducto existentes, para darle espacio a las cajas de inspección necesarias para el drenaje de las aguas residuales de las viviendas.

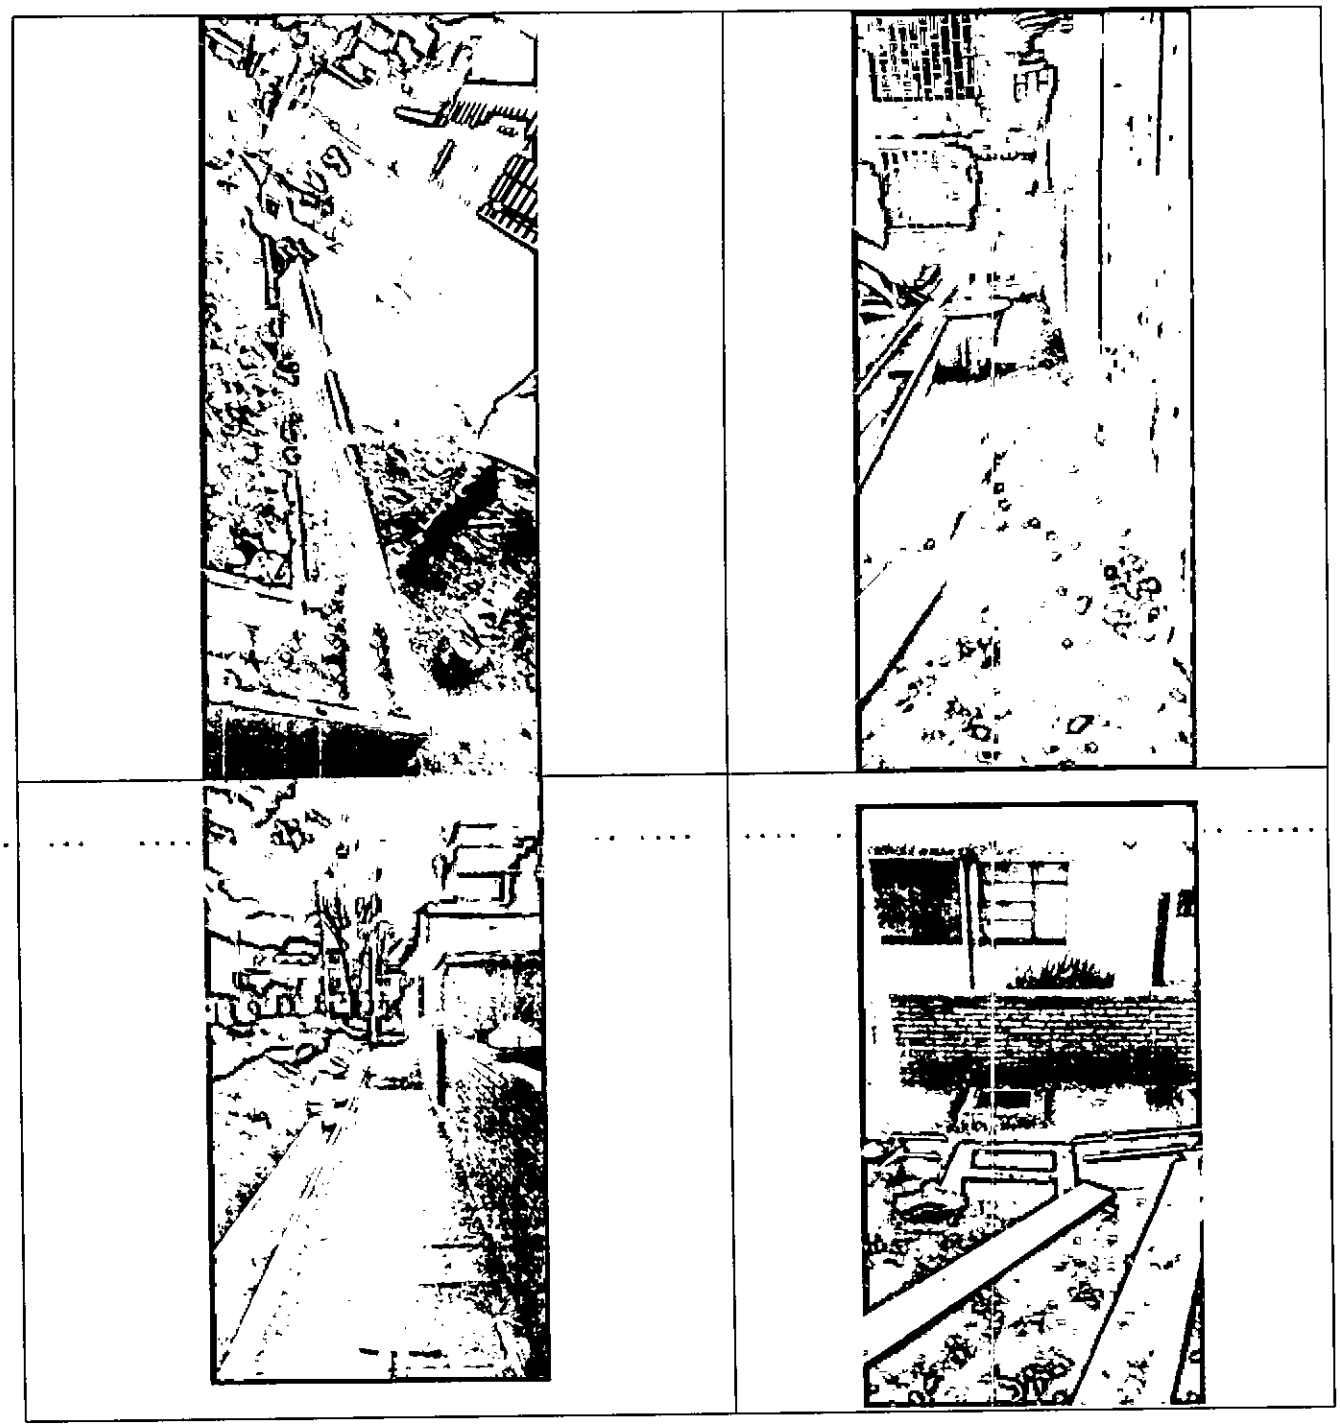

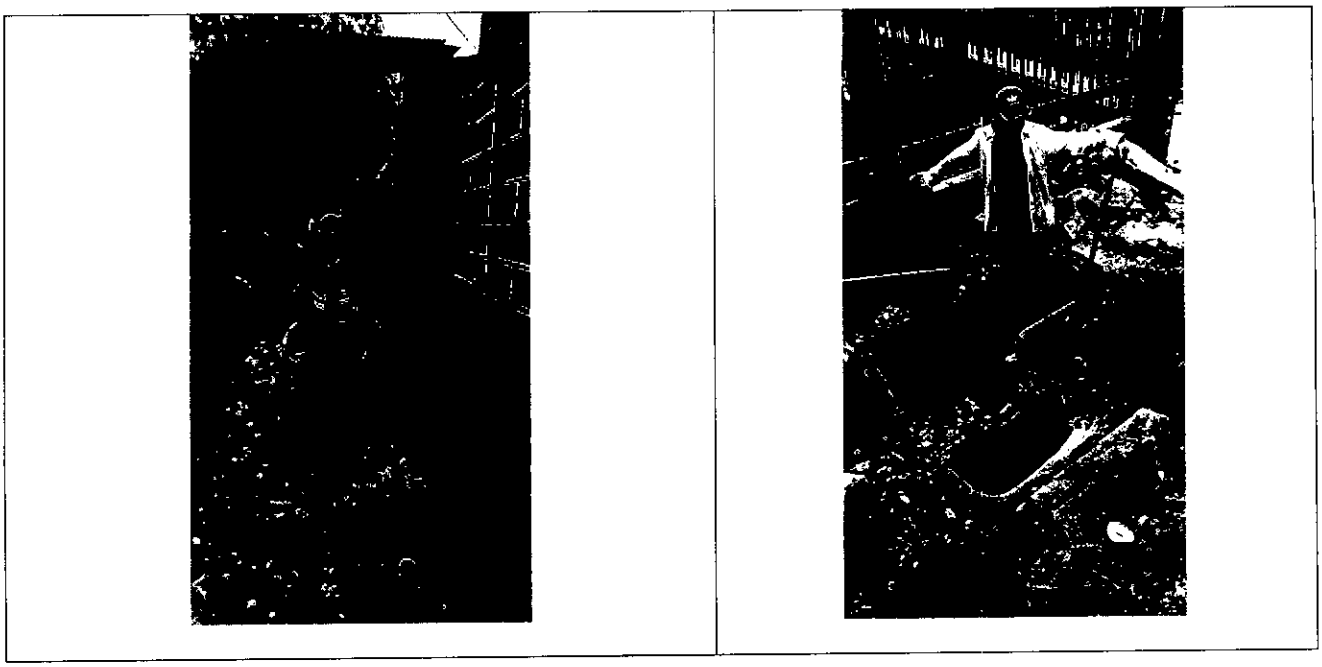

Zarazota 18-180

Se realiza excavación para conformación de terrazas de juegos biosaludables, escaleras y muros de contención, se realiza armado de acero, construcción de muros de contención en conceto reforzado, construcción de muros en bloques de concreto dovelados
En zona inferior de juegos infantiles se realiza excavación mecánica, conformación para muros de contención, suministro e instalación de bordillo prefabricado para escaleras de acceso, fundida de placa de contrapiso acabado liso; para la posterior instalación de piso en chip de caucho y placa en terraza 3 de juegos infantiles.
Se realiza conformación de estructura para placa de contrapiso y andenes de juegos biosaludables superiores, se funde concreto para senderos de acceso a terraza 1 y placa de contrapiso de terraza 1 y 2.

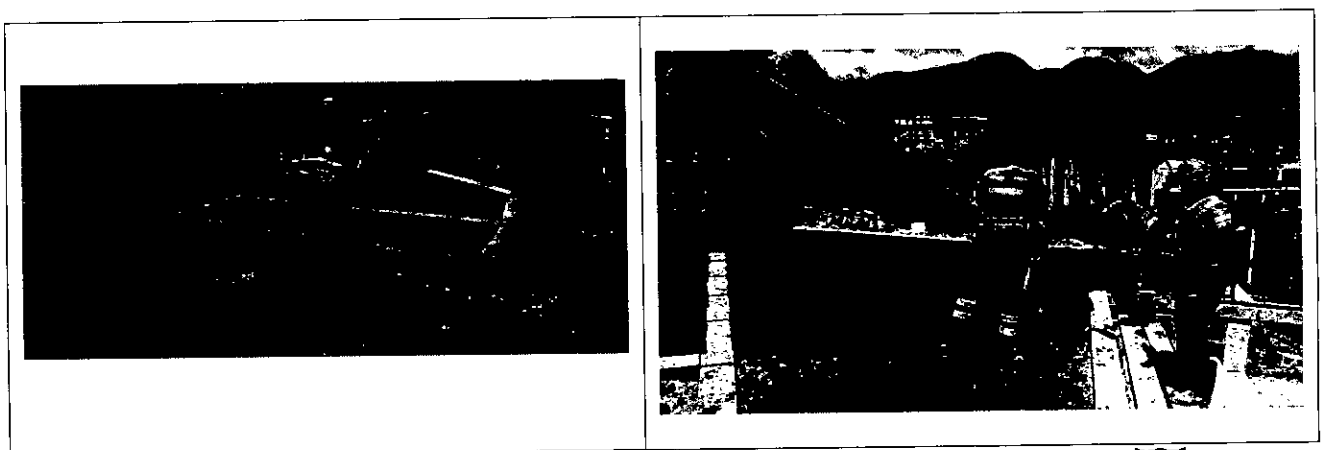




Quiroga 18-202

Durante el presente periodo, se inician las actividades preliminares de ejecución, las cuales comprenden la realización de las actas de vecindad de los predios aledaños, solicitud del PMT a la secretaria de movilidad distrital y socialización de este con la comunidad perteneciente al área de influencia directa del proyecto.
Adicional se realiza presentación del proyecto ante Vanti SA ESP, los cuales realizan visita de campo para la identificación de redes de gas existentes en el perímetro, identificándose red de 1/2 " y ¾" .
Se realiza replanteo topográfico para las áreas a intervenir, en el cual se verifica el diseño y se ajusta a las condiciones particulares del entorno.
Se especifica a los predios vecinos a la cancha central que la ejecución comprenderá el cerramiento perimetral de esta, por lo cual se restringirá el acceso a vehículos que actualmente presenta la cancha. Esto se les explica a los propietarios a través del área social y de parte de la supervisión del FDLRUU.

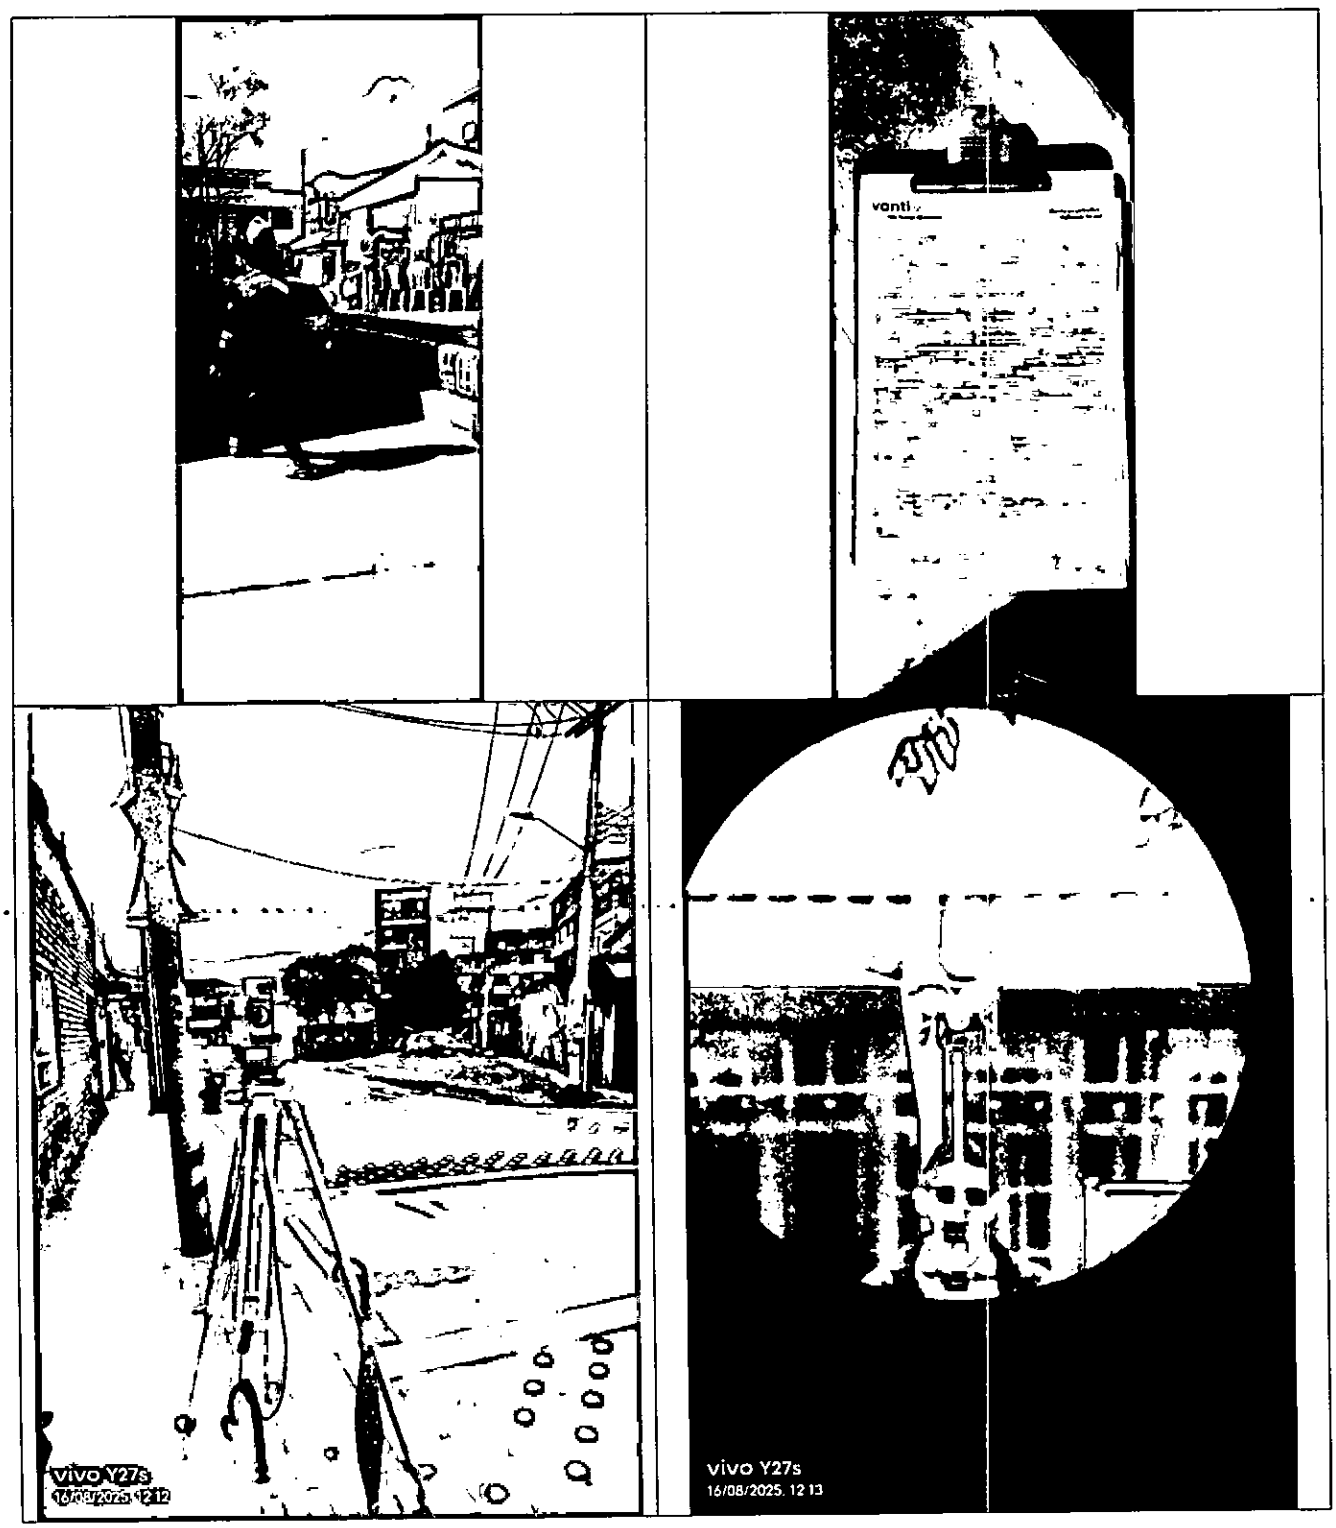


vivo Y27s
16/08/2025, 12:12
vivo Y27s
16/08/2025, 12:13

- **Obligaciones específicas del contrato 747 de 2024**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 1: Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones y la propuesta presentada, cumpliendo con todas y cada una de las especificaciones y disposiciones contenidas en los documentos referenciados que hacen parte integral del proceso.	El objeto del contrato se desarrolla cumpliendo con todos los aspectos técnicos y jurídicos que hacen parte del documento de estudios previos, pliego de condiciones y la propuesta económica presentada por el Consorcio. La ejecución de las obras se realiza en cumplimiento de cada uno de dichos documentos.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 2: Conocer a cabalidad el contrato. anexo técnico y el pliego de condiciones.	Previo al desarrollo de las actividades toda la documentación fue revisada toda vez que es necesaria para la ejecución de estas. La correcta ejecución de estas es evidencia del conocimiento y seguimiento preciso de los documentos enunciados.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 3 Suscribir el Acta de aceptación y apropiación de diseños existentes: Determinada para la Fase I del proyecto	Se realiza la respectiva acta de inicio con fecha del 10 de marzo de 2025, la cual se anexa a la documentación del acta 1. Firmada por el Consorcio Parques Verdes, y la doctora Diana Carolina Sánchez Castillo alcaldesa local de Rafael Uribe Uribe, como supervisora del contrato
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 4 Asignar el personal idóneo con experiencia para el manejo y operación de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para el mantenimiento de las obras objeto del contrato.	Durante el periodo del acta 5, se emplea un minicargador para la excavación y trasiego de materiales en el parque Zarazota 18-180, la documentación respectiva se presenta en el informe SST No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 5: La dotación del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato debe cumplir con el manual de imagen corporativa y visual de la administración del Plan de Desarrollo 2021-2024 de la Localidad Rafael Uribe Uribe, "Un nuevo contrato social y ambiental para la localidad de Rafael Uribe Uribe".	El área SST realizó entrega y verificación de dotación al personal que participo en el contrato durante el presente periodo, como se presenta en el informe SST No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 6: Los costos del transporte que genere la movilización de la maquinaría dentro de la localidad (escoltas, cama baja), así como el traslado de esta desde su localización hasta los frentes de trabajo corren por cuenta del contratista.	Durante el periodo correspondiente al Acta No. 5, en el parque Zarazota se emplea para realizar excavación mecánica en zona de terrazas. Se anexa certificado como "obligación No. 6 y 7 certificado costos de transporte".

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 7: La movilización de la maquinaria debe estar de acuerdo con lo estipulado por la Ley 769 de 2002 y afines.	Durante el periodo correspondiente al Acta No. 5, se empleó un minicargador en el parque Zarazota para excavar y conformar la zona de terrazas y muros de contención. Se anexa certificado como "obligación No. 6 y 7 certificado costos de transporte".
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 8: Diseñar los Planes de Manejo de Transito siguiendo los lineamientos de la cartilla de la secretaria de Movilidad.	Los planes de manejo de tránsito se realizan siguiendo los lineamientos de la secretaria de Movilidad de Bogotá, los cuales fueron aprobados por esta, y presentados a interventoria mediante oficio CPV-OBR-008 del 18 de marzo de 2025.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 9: Realizar a tiempo y cumpliendo con los lineamientos de la secretaria de Movilidad los trámites para la aprobación de los PMT para asegurar que en todo momento existan los permisos necesarios para la intervención de los parques.	Los planes de manejo de tránsito de los parques en ejecución fueron aprobados por la secretaria de Movilidad, mediante comunicado: • COI No. 11 -6847 y 6847 • COI No. 11 – 6848 y 6849 • COI No. 11 – 6850, 6851 Los cuales se anexan al informe técnico No. 1
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 10: Realizar y cumplir a cabalidad con el cronograma de entrega y con el plazo establecido para el desarrollo de las actividades. Cumplir a cabalidad con el perfil de los profesionales y el personal mínimo requerido.	El cronograma de obra se realiza y aprueba antes de la firma del acta de inicio del contrato, toda vez, que es requisito para la firma de esta. Se entrega a la supervisión mediante oficio de obra CIRP-741-2024-014 y radicado al FDLRUU No. 2025-681-002976-2
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 11: Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.	Se realizan las debidas señalizaciones a los individuos arbóreos y/o zonas verdes a conservar, como se presentan en el informe Ambiental No. 6. El área SST realiza la señalización de las excavaciones y zonas de precaución a fin de evitar los posibles accidentes al personal de obra y terceros.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 12: Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con las exigencias establecidas en el contrato. Tomar registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite.	Previa intervención de las actividades de ejecución de obra, se realizaron las respectivas actas de vecindad con acompañamiento y avala de la interventoria, como se presenta en los respectivos anexos del informe social No. 1. Las actas de vecindad correspondientes al parque Quiroga 18-202, se adjuntan en el informe social No. 6, previa ejecución de obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 13: Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra conforme a las especificaciones del manual del IDRD.	Se realiza los ensayos de laboratorio pertinentes para los materiales granulares (Proctor, granulometría, límites y densidades), toma de cilindros para concretos y certificados de calidad para los demás materiales incorporados a los parques, según se muestra en el informe técnico No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 14: Efectuar los correctivos pertinentes en el caso que los ensayos de laboratorio demuestren que no se está cumpliendo con las exigencias de calidad y de ejecución exigidas en el manual de especificaciones del IDRD.	No se realizan correctivos, debido a que los materiales y procedimientos cumplen con las especificaciones requeridas.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 15: Instalar en cada frente de obra la valla informativa con la información e imagen corporativa según especificaciones entregada por el FDL.	Se realiza la respectiva instalación de las vallas informativas, según cartilla de imagen institucional y previa aprobación de la interventoria y supervisión. El registro fotográfico se presenta en el informe Social No. 6
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 16: Asistir a los Comités técnicos de obra que se programen mínimo cada siete (7) días, convocados por la supervisión y/o interventoría. Se debe contar con la presencia del director de obra y todo el equipo profesional propuesto.	Se realizan los respectivos comités de obra, con asistencia de interventoria, supervisión y contratista, según se muestra en el anexo 11 del informe social No. 6
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 17: Contratar el personal cumpliendo con las normas vigentes en especial con las resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 DE 1984, CST Art 349, Resolución 2413 DE 1979 R.H.S el sector construcción, Resolución 2013 de 1986 y el Art 63 del Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad vigente en tema ambiental se deben cumplir Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Resolución 541 de 1994, Decreto Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo N° 417 de 2009.	El personal por parte del contratista que ingresa a obra fue presentado según los requisitos del plan de gestión SST, con su respectiva documentación anexa que se presenta en el informe mensual SST. No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 18: Dar cumplimiento a las disposiciones ambientales en cuanto a la implementación de la Resolución No 1115 de 2012 para el aprovechamiento de Residuos sólidos de Construcción y Demolición y la Resolución No 6981 de 2011 para la utilización del granulo de caucho reciclado en los pavimentos	Es de mencionar que la Resolución No 1115 de 2012 fue derogada por el Decreto 507 de 2023, el cual adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá D.C. Para el presente periodo se realiza aprovechamiento de RCD a través de la compra de subbase granular Reciclada Tipo C en los gestores ambientales autorizados, como material granular para el relleno e instalación de mejoramiento de la subrasante en los senderos peatonales del parque Quiroga 18-042, Quiroga 18-138, Quiroga 18-202 y Zarazota 18-180. De igual manera, se implementará el

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD
	uso de grano de caucho reciclado para conformar los pisos de la zona de juegos infantiles.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 19: Entregar a la Interventoría, copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente.	Previo al inicio de actividades, se presentó y avaló el personal mínimo requerido descrito en el pliego de condiciones. A su vez, fue contratado el personal necesario para el inicio de las obras, el cual cuenta con todas las capacidades para el correcto ejercicio de su rol.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 20: Contratar de acuerdo con el decreto 332 de 2020, el porcentaje mínimo de mujeres estipulado en la rama de actividad económica de Construcción determinado en un 6,8%	Se da cumplimiento a esta obligación con el porcentaje de mujeres dentro del talento humano del contrato. Como se presenta en la documentación anexa del informe SST No. 6
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 21: Cumplir con las normas vigentes en cuanto en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en especial con las resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 de 1984, CST Art 349, resolución 2413 de 1979 R.H.S para el sector construcción, Resolución 2013 de1986 y el Art 63 del Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad vigente en tema ambiental se deben cumplir Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Resolución 541 de 1994, Decreto Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo N° 417 de 2009.	El área SST durante el presente periodo realizó la implantación del SG-SST, a través de actividades de inducciones al personal nuevo, capacitación, entrega de dotación, reuniones del COPASST, CCL, inspecciones de seguridad, inspecciones de kit de emergencia, análisis de accidentabilidad y programa de prevención
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No: 22: Entregar en los tiempos estipulados en los estudios previos, (10 primero días después de firmada el acta de inicio) anexo técnico y demás del proceso de selección, cumpliendo con las condiciones allí descritas, la programación del contrato, el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los cronogramas de actividades para el desarrollo de la Gestión social y SS-TMA y demás insumos requeridos.	Se entregó la documentación técnica, Ambiental, SST y Social de acuerdo con pliego de condiciones del proceso de selección y es avalada por la interventoría.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 23: Presentar las hojas de vida del equipo de trabajo mínimo requerido, dentro del término previsto en los estudios previos y anexo técnico, cumpliendo con las condiciones allí descritas.	Previo al inicio de actividades, se presentó y avaló el personal mínimo requerido descrito en el pliego de condiciones. Se realizó radicado de oficio CIROP-741-016 con radicado del FDLRUU 2025-681-003085-2
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 24: Realizar los trámites ante las empresas de servicios públicos necesarios para la apropiación de los estudios y seguido a ello la ejecución.	Las actividades de diseño de redes de alcantarillado se efectuaron durante el contrato de consultoría No. 332 de 2019, el cual, obtuvo el aval de la EAAB para la intervención de las redes de alcantarillado de los parques 18-042, 18-138, Quiroga 18-202 y Zarazota 18-180.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 25: Demoler, reemplazar y asumir el costo de toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad efectuado por el interventor o incluso por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra. En este evento el contratista no tendrá derecho a reclamación o reconocimiento pecuniario alguno.	No se presentaron en el periodo en ejecución.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 26: En caso de presentarse retraso en la ejecución de las actividades, presentar ante la Interventoría un plan de choque (contingencia) que permita dar cumplimiento a la programación aprobada previamente, y cumplir la ejecución del contrato en el plazo establecido. Este plan de choque deberá ser entregado a interventoría en un plazo máximo de tres (3) días calendario una vez se reporte el retraso. Así mismo, la interventoría tendrá un tiempo máximo de tres (3) días calenda-rio para pronunciarse al respecto, y el contratista un plazo de dos (2) días calendario para ajustar las observaciones requeridas por la interventoría.	No se ha presentado hasta la fecha.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 27: Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato conforme con lo dispuesto por el Fondo de Desarrollo Local De Rafael Uribe Uribe y Entidades Distritales correspondientes.	Para el periodo de ejecución y cobro no se realizan planos récord, debido a que aun no se culmina ningún parque en su totalidad.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 28: Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.	En el periodo de ejecución y cobro, aun no se realiza la entrega de ningún parque. Cuando esto se realice se llevará a cabo la limpieza respectiva.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 29: Presentar mensualmente las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y avaladas por la Entidad CONTRATANTE.	Se realiza la entrega del acta parcial de obra No. 5 correspondiente al periodo del 21 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 30: Llevar una bitácora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director y residente de obra, y el residente y director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo re-quieran, los delegados de la Entidad CONTRATANTE. Deberá ser diligenciada en forma absolutamente legible.	En cada frente de obra permanece la respectiva bitácora, la cual es diligenciada por la interventoria, contratista y supervisión y cuyo escáner se anexa dentro del informe técnico No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 31: Ceñirse al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría Distrital de Gobierno, empleando los formatos que apliquen para la ejecución del presente contrato.	Se cumple con esta obligación exponiend el presente informe de actividades que corresponde al formato GCO-GCI-F110 y el informe de supervisión correspondiente al formato GCO-GCI-F133.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 32: Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto contractual	Se da cumplimiento a todas las obligaciones contractuales.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 33: Tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones. (No dejar sustancias con materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal). Para esto deberá tener en cuenta lo estipulado en la y el procedimiento Gestión Integral de Residuos Sólidos de la entidad.	Durante el presente periodo se llevaron actividades ambientales de acuerdo con Plan de Manejo Ambiental diseñado, como señalización y delimitación de individuos arbóreos, cubrimiento de sumideros, instalación de puntos ecológicos, instalación de PMT, separación en la fuente, capacitaciones, cronograma de actividades ambientales de obra. Como se presenta en el informe Ambiental No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 34: Realizar la gestión adecuada de los residuos que genere. Como constancia de esto se entregarán copias de los certificados de transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los mismos. (Los gestores deberán contar con los permisos respectivos de la autoridad ambiental competente).	Se realiza la debida Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de los diferentes frentes de obra a sitios autorizados como lo indica el Plan Ambiental de RCD para el mes julio y agosoto de 2025.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 35: Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.	Se realiza seguimiento por parte del especialista ambiental de la interventoría. El cual da aval al cumplimiento de las actividades ambiental con el aval del informe ambiental presentado por este consorcio.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 36: Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del manifiesto de recolección, transporte y certificado de disposición final o aprovechamiento.	Se realiza la debida Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de los diferentes frentes de obra a sitios autorizados como lo indica el Plan Ambiental de RCD para el mes de julio de 2025.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 37: Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la resolución 1138 de 2003, cuando aplique y la Resolución 472 de 2017.	Diseño del plan de gestión RCD bajo el marco normativo del Decreto 507 de 2023, como se presentó en el informe Ambiental No.1
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 38: Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en su artículo 4: "las Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desmantela- miento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la entidad anualmente". Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 25%.	Es de mencionar que la Resolución No 1115 de 2012 fue derogada por el Decreto 507 de 2023, el cual adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá D.C. Para el presente periodo se realiza aprovechamiento de RCD a través de la compra de su base granular Reciclada Tipo C en los gestores

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD
	ambientales autorizados, como material granular para el relleno e instalación de mejoramiento de la subrasante en los senderos peatonales del parque Quiroga 18-042, Quiroga 18-138, Quiroga 18-202 y Zarazota 18-180. El grano caucho reciclado será instalado y aprovecha finalizando las obras civiles, de acuerdo con la programación de obra del contrato 747 de 2024.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 39: Emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas).	El área SST realizó entrega y verificación de dotación al personal que participo en el contrato durante el presente periodo.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 40: Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.	El área ambiental delimitó y señalizo las áreas de trabajo con polisombra mixta, con el objetivo de solo intervenir el área a ejecutar para prevenir y conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 41: Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente, entregando a la Alcaldía Local los certificados de disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material.	Se realiza la debida Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de los diferentes frentes de obra a sitios autorizados como lo indica el Plan Ambiental de RCD para el mes de junio de 2025.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 42: El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la guía de manejo ambiental para el sector de la Construcción, de la Secretaría Distrital de ambiente.	Se realiza la implementación de los lineamientos estipulados de acuerdo con el Manual ambiental de obra de acuerdo con las fichas de Instalación de campamentos, controles atmosféricos, programa de residuos, manejo integral de cuerpos de agua y vegetación
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 43: Para la construcción de los parques se deberá prever el uso de llantas usadas o de materiales provenientes del aprovechamiento de estas, en las áreas que sean técnicamente susceptibles de ser provistas con dichos materiales (zonas de juego, pistas de trote, entre otras).	Implementación del plan de gestión RCD, en los diferentes frentes de obra, con la utilización del caucho reciclado para la primera capa de las áreas que contarán con piso en caucho. Y en cumplimiento de la normativa.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 44: Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, que garantice el cumplimiento normativo. La persona asignada deberá demostrar idoneidad, experiencia y será aprobada por el contra- tante y/o la interventoría.	Previo al inicio de actividades, se presentó y avaló el personal mínimo requerido descrito en el pliego de condiciones, el cual contempla el especialista ambiental y SST.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 45: Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes al manejo y conservación del medio ambiente.	Se realiza la implementación de los lineamientos estipulados de acuerdo con el Manual ambiental de obra de acuerdo con las fichas de Instalación de campamentos, controles atmosféricos, programa de residuos, manejo integral de cuerpos de agua y vegetación.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 46: Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y pre- sentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.	La ejecución del programa de seguimiento y monitoreo ambiental, a través de los indicadores de gestión es realizada a través de la evaluación de cada ficha ambiental implementada.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 47: Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.	Durante el presente periodo no se presentan actividades que generen planes de contingencia.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 48: Instalar aviso de conteo regresivo de acuerdo con las especificaciones del artículo 2 del acuerdo 787 de 2020 en cada uno de los frentes de obra del presente contrato, de igual manera presentar registro fotográfico de la actualización de este de acuerdo con la ejecución de la intervención.	En el mes de marzo se aprobó el arte presentado por este consorcio, por lo que se fabricaron los avisos de conteo regresivo y se instalaron en cada uno de los frentes. El registro fotográfico se anexa en el informe Social No. 6.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Empresa donde se aporta pago de salud	La información relacionada con el pago de planillas se presenta en el informe mensual SST No. 6, Anexo 3
Empresa donde se aporta pago de ARL	La información relacionada con el pago de planillas se presenta en el informe mensual SST No. 6, Anexo 3
Empresa donde se aporta pago de pensión	La información relacionada con el pago de planillas se presenta en el informe mensual SST No. 6, Anexo 3

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 2.616.903.493,00
Valor Adición No. 1	$ 1.308.451.747,00
Valor Total	$ 3.925.355.240,00

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O230689	Más parques en Rafael Uribe Uribe	**INICIAL**	**1079**	**$ 2.616.903.493,00**
1570		**ADICIÓN**	1741	**$1.308.451.747,00**
Valor total de los CRP				**$ 3.925.355.240,00**

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
Acta No.1 10 de marzo al 30 de abril de 2025	1670	Más parques en Rafael Uribe Uribe	1079	$ 2.616.903.493,00	$ 199.807.826,00	$ 2.417.095.667,00
Acta No. 2 01 de mayo al 20 de mayo de 2025					$143.348.787,00	$2.273.746.880,00
Acta No. 3 21 de mayo de 2025 20 de junio de 2025					$539.461.178,00	$1.734.285.702,00
Acta No. 4 21 de julio de 2025 20 de agosto de 2025					$424.540.668,00	$1.309.745.034,00
Totales					**$1.307.158.459,00**	**$1.309.745.034,00**

Resumen ejecución financiera del contrato


Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$ 2.616.903.493,00
2. Valor Adiciones:	$1.308.451.747,00
3. Valor Total:	$ 3.925.355.240,00
4. Valor Total Ejecutado:	$1.618.716.895,00
5. Saldo:	**$ 2.306.638.345,00**

INTERVENTOR

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER RUU PARQUES

SUPERVISIÓN

DIANA CAROLINA SÁNCHEZ
ALCALDESA
ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE

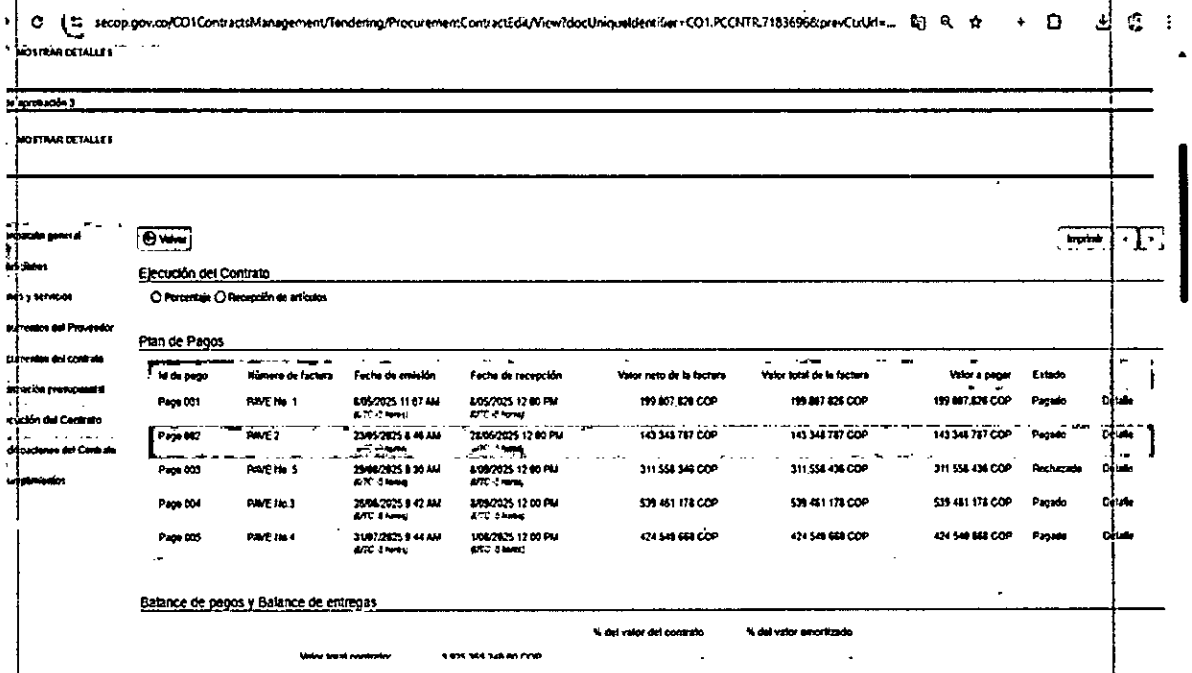

PAGOS SECOP 2

Volver

Ejecución del Contrato

O Presentación O Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	PAVE No. 1	6/05/2025 11:07 AM (UTC -5 hora)	8/05/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	139 807 829 COP	699 807 829 COP	139 807 829 COP	Aceptado	Detalle
Pago 002	PAVE 2	23/05/2025 8:45 AM (UTC -5 hora)	26/05/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	143 348 737 COP	143 348 737 COP	143 348 737 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	PAVE No. 3	29/06/2025 8:30 AM (UTC -5 hora)	8/07/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	311 558 436 COP	311 558 436 COP	311 558 436 COP	Pechazado	Detalle
Pago 004	PAVE No.3	28/06/2025 9:42 AM (UTC -5 hora)	8/07/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	539 461 178 COP	539 461 178 COP	539 461 178 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	PAVE No.4	31/07/2025 8:44 AM (UTC -5 hora)	8/08/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	424 543 958 COP	424 543 958 COP	424 543 958 COP	Rechazado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	3 925 355 240,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	882 617 791,00 COP	22,48%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	882 617 791,00 COP	22,48%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3 042 737 449,00 COP	77,51%	-

COP-747-2024 – SECOP

CONSORCIO PARQUES VERDES

Bogotá D.C. 28 de agosto de 2025

CPV-OBR-085

Señores:

ING. CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER RUU PARQUES

REFERENCIA: FDLRUU-COP-747-2024 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C"

ASUNTO: RADICACIÓN DOCUMENTACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

Cordial saludo

Por medio de la presente, me permito remitir los siguientes documentos correspondientes al pago número 05, con corte del 21 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025, de acuerdo con la lista de chequeo:

- Oficio remisorio
- Factura a nombre del Fondo de desarrollo local de Rafael Uribe Uribe
- Resolución de facturación DIAN
- Certificación bancaria
- RUT
- Cámara de comercio
- Certificación pagos de seguridad social y parafiscales
- Informe de actividades
- Acta parcial de obra No. 05
- Memorias de cantidades de obra
- Anexos

CONSORCIO PARQUES VERDES

Quedamos atentos a resolver cualquier duda.

Atentamente

ING. VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUES VERDES

carrera 73 No. 48-88, Normandía Occidental, Bogotá D.C.
Tel: 601 – 6482550/3238594027
parquesverdesconsorcio@gmail.com

CONSORCIO PARQUES VERDES

Factura Electrónica De Venta No

PAVE No. 5

Resolución de Facturación DIAN No. 18764089369388 del 24 de Febrero de 2025 Facturación Electronica Desde la FV No. 001 Hasta la No. 30 prefijo PAVE, Vence el 24 de Febrero de 2027

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Económica ICA 4290 7.60 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONSORCIO PARQUES VERDES
Nit 901905021 8

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 32 Sur # 23 62	Bogota D.C.	3660007

POR CONCEPTO DE
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5 DEL CONTRATO COP 747-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 JULIO DE 2025 AL 20 AGOSTO 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/08/2025	29/09/2025	VENDEDOR 1	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	226.637.402	0%	0	226.637.402
2	41309502	Administración	1	Und.	59.990.920	0%	0	59.990.920
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	2.266.374	0%	0	2.266.374
4	41309504	Utilidad	1	Und.	9.065.496	0%	0	9.065.496
5	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	13.598.244	0%	0	13.598.244

Valor en Letras

TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	311.558.436
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	311.558.436

Total Items 5
29/08/2025 12:16:33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CR 14 19 39 Teléfono 3238594027 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidad@armconstrucciones.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0dbd75f3d7dc4641d264b59a84bfa6ce101861d85863ca4c96f07f487ad8a29ea777ea8eecef2088353d1ee71b52aa8f --Fecha y Hora de Expedición 29/08/2025 1:28:21 p. m.

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764089369388

(415)7707212489984(8020) 001876408936938 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 0 5 0 2 1	8				

11. Razón social
CONSORCIO PARQUES VERDES

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Florencia — Cód. 2 8

24. Dirección
CR 14 19 39 BRR LA CONSOLATA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
olombia	Caquetá	Florencia

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-02-24 / 12:55:18 PM
Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ MUÑOZ VIVIANA ANDREA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1110521236 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO PARQUES VERDES

997. Fecha formalización 2025-02-24/12:55:18

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764089369388

(415)7707212489984(8020) 001876408936938 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901905021	8				

11. Razón social
CONSORCIO PARQUES VERDES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PARQUES VERDES CR 14 19 39 BRR LA CONSOLATA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	PAVE	1	30	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141181332648

(415)7707212489984(8020) 000014118133264 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 5 0 2 1	8	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona Jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PARQUES VERDES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 19 39 BRR LA CONSOLATA

42. Correo electrónico contabilidad@armconstrucciones.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 5 3 4 6 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0 / 2 0 2 4 1 2 1 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

7- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 15-05-2025 04:56:32PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181332648

(415)7707212489984(8020) 000014118133264 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 5 0 2 1	8	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 2 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 2 1 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la D'AN

4. Número de formulario 141181332648

(415)7707212489984(8020) 000014118133264 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 5 0 2 1	8	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 0 5 2 1 2 3 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	MUÑOZ	VIVIANA	ANDREA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 2 4 3 8 4 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MERCHAN	CHARRY	ALEXANDER	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-05-2025 04:56:32PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14118133264 8

(415)7707212489984(8020) 000014118133264 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 5 0 2 1	8	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 5 3 1 9 1	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO IPROGEX ZOMAC S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 0	2 0 2 4 1 2 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 8 1 2 5 2	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGECOL HS Y CIA S EN C

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	9 0	2 0 2 4 1 2 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO PARQUES VERDES identificado(a) con NITPJ 9019050218 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 047719729 desde el 19 de febrero de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 25 de agosto de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES

CONSORCIO
PARQUES VERDES

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Yo CAMILO ANDRES LADINO LLANOS, identificado con C.C. No. 1075629488 de Tocaima, y tarjeta profesional No. 321521-T de la junta central de contadores de Colombia, bajo la gravedad de juramento certifico que el Consorcio Parques Verdes con NIT 901905021-8, a la fecha se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones al sistema de protección social que incluyen; Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar y Servicio nacional de aprendizaje SENA.

Se expide a solicitud del interesado el día 28 de agosto de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C.

CONSORCIO
PARQUES VERDES

Cordialmente

VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUES VERDES

CAMILO ANDRES LADINO L.
CONTADOR PÚBLICO
CONSORCIO PARQUES VERDES

carrera 73 No. 48-88, Normandía Occidental, Bogotá D.C.
Tel: 601 – 6482550/3238594027
parquesverdesconsorcio@gmail.com

CONSORCIO
PARQUES VERDES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.075.629.488**

LADINO LLANOS

APELLIDOS

CAMILO ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1997**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

23-OCT-2015 TOCAIMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1528900-00867884-M-1075629488-20161125 0052295920A 1 47441252

carrera 73 No. 48-88, Normandía Occidental, Bogotá D.C.
Tel: 601 – 6482550/3238594027
parquesverdesconsorcio@gmail.com

CONSORCIO
PARQUES VERDES



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

321521-T

CAMILO ANDRES
LADINO LLANOS
C.C. 1075629488
RES. INSCRIPCION 46 DEL 06/02/2024
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

371583 378501

CONSORCIO
PARQUES VERDES

carrera 73 No. 48-88, Normandía Occidental, Bogotá D.C.
Tel: 601 – 6482550/3238594027
parquesverdesconsorcio@gmail.com

CONSORCIO PARQUES VERDES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2653A0BF6D934E0D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAMILO ANDRES LADINO LLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075629468 de TOCAIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 321521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

carrera 73 No. 48-88, Normandía Occidental, Bogotá D.C.
Tel: 601 – 6482550/3238594027
parquesverdesconsorcio@gmail.com

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, MILENA GONZÁLEZ ESPAÑA, identificada con C.C. No. 40.077.709 de Guadalupe Huila y tarjeta profesional No. 122254-T de la Junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contadora del Consorcio IPROGEX ZOMAC SAS, identificado con NIT 901.253.191-2, inscrito en Florencia Caquetá, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al instituto colombiano de bienestar familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. Lo anterior, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia Caquetá a los (27) días del mes de agosto de 2025, para dar cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, con destino al interesado.

MILENA GONZÁLEZ ESPAÑA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 122254-T

ALEXANDER MERCHÁN CHARRY
C.C. 1.032.438.493
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.077.709

GONZALEZ ESPAÑA

APELLIDOS

MILENA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1979

GUADALUPE
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

24-DIC-1997 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4400100-00531736-F-0040077709-20131227 0035362139A 1 8062662314

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122254-T



MILENA
GONZALEZ ESPAÑA
C.C. 40077709
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESIDENTE
HECTOR JAIME CORREA PINZON 132293

FIRMA DEL TITULAR 43193

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

666F0E96B0B0D0A2E96

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MILENA GONZALEZ ESPAÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40077709 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 122254-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022


(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, JORGE HERNAN ROA BUSTAMANTE identificado con C.C. No. 6.805.125 Florencia Caquetá, con tarjeta profesional No. 170111-T de la Junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador de INGECOL HS Y CIA S EN C, identificado con NIT 901081252-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al instituto colombiano de bienestar familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. Lo anterior, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia Caquetá a los (28) días del mes de agosto de 2025, para dar cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, con destino al interesado.

INGECOL HS Y CIA S EN C
NIT: 901081252-4
R/L Ángela Maria Segura Polonia
C.C. 1.117.489.474 de Florencia

JORGE HERNAN ROA BUSTAMANTE
C.C. No. 6.805.125
TP. 170111-T

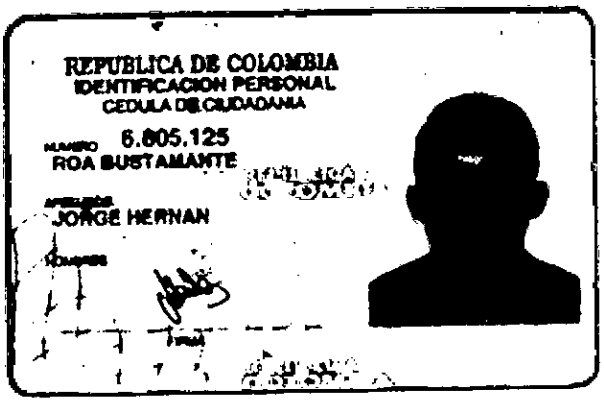


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.805.125
ROA BUSTAMANTE

APELLIDOS
JORGE HERNAN

NOMBRES

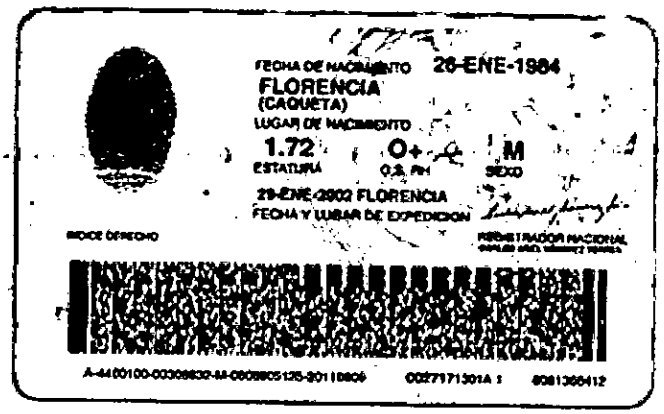

FECHA DE NACIMIENTO 26-ENE-1984
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

29-ENE-2002 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-4400100-00306830-M-0805805125-20110806 0027171301A 1 8081366412

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



170111-T

JORGE HERNAN
ROA BUSTAMANTE
C.C. 0805125
RESOLUCION INSCRIPCION 305 FECHA 30/08/2012
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 180172

FIRMA DEL TITULAR

97760

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HERNAN ROA BUSTAMANTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6805125 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 170111-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FDLRUU-LP-002-2024

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
Alcaldía local Rafael Uribe
Calle 32 Sur # 23 - 62
Bogotá

Referencia: Proceso de Contracción **FDLRUU-LP-002-2024**, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".

Estimados señores:

Los suscritos, **ALEXANDER MERCHAN CHARRY** y **ANGELA MARIA SEGURA POLANIA,** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GRUPO IPROGEX ZOMAC S.A.S y INGECOL HS Y CIA S EN C**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

NOMBRE DEL INTEGRANTE A CARGO DE LA ACTIVIDAD	COMPROMISO(1)
GRUPO IPROGEX ZOMAC S.A.S	10%
INGECOL HS Y CIA S EN C	90%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina: **CONSORCIO PARQUES VERDES**
3. El objeto del consorcio es: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".
4. La duración del consorcio es de: Plazo de ejecución del contrato y UN (01) AÑO más, contados a partir del vencimiento del plazo del contrato.
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
6. El representante de la unión temporal es: **ALEXANDER MERCHAN CHARRY**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.032.438.493 de Bogotá D.C.,** quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, formarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El señor **ALEXANDER MERCHAN CHARRY** acepta su nombramiento como representante legal de: **CONSORCIO PARQUES VERDES**
8. Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los documentos tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.

9. El domicilio del CONSORCIO es:

Dirección de correo: Carrera 14 No. 19 – 39 Barrio Consolata
Dirección electrónica: grupoiprogex@gmail.com
Celular: 313 4534688
Ciudad: Florencia - Caquetá

En constancia se firma en **FLORENCIA**, a los **DIEZ (10)** días del mes de **DICIEMBRE** de **2024**.

GRUPO IPROGEX ZOMAC S.A.S
Nit.: 901.253.191-2
R/L Alexander Merchan Charry
C.c. 1.032.438.493 de Bogotá D.C

INGECOL HS Y CIA S EN C
Nit.: 901081252-4
R/L Ángela María Segura Polonia
C.c. 1.117.489.474 de Florencia

CONSORCIO PARQUES VERDES
R/L Alexander Merchán Charry
C.c. 1.032.438.493 de Bogotá D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 5 **PERÍODO:** 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. CONTRATO Y FECHA	747 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901905021-8
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES Y 15 DIAS
PRORROGA NO. 1	3 MESES Y 7 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.616.903.493,00
VALOR ADICIÓN NO. 1	$1.308.451.747,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.925.355.240,00
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	**$ 311.558.436,00**
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	0230689
FECHA ACTA DE INICIO	10 de marzo de 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	31 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C."

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 1: Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones y la propuesta presentada, cumpliendo con todas y cada una de las especificaciones y disposiciones contenidas en los documentos referenciados que hacen parte integral del proceso.	El objeto del contrato se desarrolla cumpliendo con todos los aspectos técnicos y jurídicos que hacen parte del documento de estudios previos, pliego de condiciones y la propuesta económica presentada por el Consorcio. La ejecución de las obras se realiza en cumplimiento de cada uno de dichos documentos.	En el Informe mensual no. 6 el cual abarca todos los componentes técnicos, social, ambiental y SST, se ven reflejadas las actividades ejecutadas y el cumplimiento de estas. En las Actas de comité, se refleja el reporte semanal de los avances de obra y a su vez que verifica por todas las partes, el cumplimiento de esta obligación.	• Informe mensual no. 6 (Ambiental, Social, SST, Técnico) • Actas de Comités de obra (Anexo 7 de los informes técnicos) • Bitácoras de obra (Anexo 6 de los informes técnicos)
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 2: Conocer a cabalidad el contrato, anexo técnico y el pliego de condiciones.	Previo al desarrollo de las actividades toda la documentación fue revisada toda vez que es necesaria para la ejecución de estas. La correcta ejecución de estas es evidencia del conocimiento y seguimiento preciso de los documentos enunciados.	En el Informe mensual No. 6 el cual abarca todos los componentes técnicos, social, ambiental y SST, se ven reflejadas las actividades ejecutadas y el cumplimiento de estas, en cumplimiento de toda la documentación que hace parte del contrato.	• Informe mensual No. 6 (Ambiental, Social, SST, Técnico)
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 3 Suscribir el Acta de aceptación y apropiación de diseños existentes: Determinada para la Fase I del proyecto	Se realiza la respectiva acta de inicio con fecha del 10 de marzo de 2025, la cual se anexa a la documentación del acta 1. Firmada por el Consorcio Parques Verdes, y la doctora Diana Carolina Sánchez Castillo alcaldesa local de Rafael Uribe Uribe, como supervisora del contrato	Se presentó acta de inicio dentro del paquete de los anexos del acta parcial No. 1	Se encuentra en los anexos del informe técnico No. 1
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 4 Asignar el personal idóneo con experiencia para el manejo y operación de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para el mantenimiento de las obras objeto del contrato.	Durante el periodo del acta 1, se emplea un minicargador en la recolección de escombros del parque Quiroga 042, la documentación respectiva se presenta en el informe SST No. 3.	Se anexa dentro del informe SST No. 6 los respectivos documentos de idoneidad del operador del minicargador.	Se evidencia en el documento del Informe mensual SST No. 6.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 5: La dotación del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato debe cumplir con el manual de imagen corporativa y visual de la administración del Plan de Desarrollo 2021-2024 de la Localidad Rafael Uribe Uribe, "Un nuevo contrato social y ambiental para la localidad de Rafael Uribe Uribe".	El área SST realizó entrega y verificación de dotación al personal que participo en el contrato durante el presente periodo, como se presenta en el informe SST No. 3.	Se evidencian los respectivos soportes de entrega de dotación dentro del informe SST No. 6.	Anexo 3 del informe SST No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 6: Los costos del transporte que genere la movilización de la maquinaría dentro de la localidad (escoltas, cama baja), así como el traslado de esta desde su localización hasta los frentes de trabajo corren por cuenta del contratista.	Durante el periodo correspondiente al acta No. 1, se empleó un minicargador para la recolección de escombros en el parque Quiroga 042, se anexa certificado como "obligación No: 6 y 7 certificado costos de transporte".	Certificación de cumplimiento de la obligación especifica No. 6	Esta obligación fue presentada y adjuntada como Anexo con nombre Obligación Especifica No 6 en el informe de actividades No 06 para el periodo de julio 2025
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 7: La movilización de la maquinaría debe estar de acuerdo con lo estipulado por la Ley 769 de 2002 y afines.	Durante el periodo correspondiente al acta No. 1, se empleó un minicargador para la recolección de escombros en el parque Quiroga 042, se anexa certificado como "obligación No: 6 y 7 certificado costos de transporte".	Certificación de cumplimiento de la obligación especifica No. 7	Esta obligación fue presentada y adjuntada como Anexo con nombre Obligación Especifica No 7 en el informe de actividades No 06 para el periodo de julio 2025.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 8: Diseñar los Planes de Manejo de Transito siguiendo los lineamientos de la cartilla de la secretaria de Movilidad.	Los planes de manejo de tránsito se realizan siguiendo los lineamientos de la secretaria de Movilidad de Bogotá, los cuales fueron aprobados por esta, y presentados a interventoria mediante oficio CPV-OBR-008 del 18 de marzo de 2025.	Aprobación de PMT por parte de la SDM.	Los planes de manejo de tránsito de los parques en ejecución fueron aprobados por la secretaria de Movilidad, mediante comunicado: • COI No. 11 -6847 y 6847 • COI No. 11 – 6848 y 6849 • COI No. 11 – 6850, 6851 Los cuales se anexan al informe técnico No. 1
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 9: Realizar a tiempo y cumpliendo con los lineamientos de la secretaria de Movilidad los trámites para la aprobación de los PMT para asegurar que en	Los planes de manejo de tránsito de los parques en ejecución fueron aprobados por la secretaria de Movilidad, mediante comunicado:	Se presenta copia de los PMT aprobados por la secretaria de movilidad para cada uno de los parques	Anexo al informe tecnico No. 1

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
todo momento existan los permisos necesarios para la intervención de los parques.	• COI No. 11 -6847 y 6847 • COI No. 11 – 6848 y 6849 • COI No. 11 – 6850, 6851 Los cuales se anexan al informe técnico No. 1		
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 10: Realizar y cumplir a cabalidad con el cronograma de entrega y con el plazo establecido para el desarrollo de las actividades. Cumplir a cabalidad con el perfil de los profesionales y el personal mínimo requerido.	EL cronograma de obra se realiza y aprueba antes de la firma del acta de inicio del contrato, toda vez, que es requisito para la firma de esta. Se entrega a la supervisión mediante oficio de obra CIRP-741-2024-014 y radicado al FDLRUU No. 2025-681-002976-2	Se entrega a la supervisión mediante oficio de obra CIRP-741-2024-014 y radicado al FDLRUU No. 2025-681-002976-2	Se entrega a la supervisión mediante oficio de obra CIRP-741-2024-014 y radicado al FDLRUU No. 2025-681-002976-2, documento anexo al informe técnico No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 11: Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.	Se realizan las debidas señalizaciones a los individuos arbóreos y/o zonas verdes a conservar, como se presentan en el informe Ambiental No. 3. El área SST realiza la señalización de las excavaciones y zonas de precaución a fin de evitar los posibles accidentes al personal de obra y terceros.	Se realizan las respectivas señalizaciones, se presenta registro fotográfico en el informe Ambiental	Anexo del informe Ambiental No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 12: Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con las exigencias establecidas en el contrato. Tomar registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite.	Previa intervención de las actividades de ejecución de obra, se realizaron las respectivas actas de vecindad con acompañamiento y avala de la interventoria, como se presenta en los respectivos anexos del informe social No. 1.	En el Informe mensual No. 6, en el componente social, se realiza la descripción de dicho levantamiento y el aval de estas.	Informe mensual social No. 6
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 13: Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra conforme a las especificaciones del manual del IDRD.	Se realiza los ensayos de laboratorio pertinentes para los materiales granulares (Proctor, granulometria, límites y densidades), toma de cilindros para concretos y certificados de calidad para los demás materiales incorporados a los parques, según se muestra en el informe técnico No. 3.	Documento de trazabilidad de ensayos realizados, emitido por el laboratorio Geoconsul SAS y certificados de cantera.	Documento de trazabilidad de ensayos realizados, anexos al informe técnico No. 6.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 14: Efectuar los correctivos pertinentes en el caso que los ensayos de laboratorio demuestren que no se está cumpliendo con las exigencias de calidad y de ejecución exigidas en el manual de especificaciones del IDRD.	No se realizan correctivos, debido a que los materiales y procedimientos cumplen con las especificaciones requeridas.	No se realizan correctivos.	No se realizan correctivos.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 15: Instalar en cada frente de obra la valla informativa con la información e imagen corporativa según especificaciones entregada por el FDL.	Se realiza la respectiva instalación de las vallas informativas, según cartilla de imagen institucional y previa aprobación de la interventoria y supervisión. El registro fotográfico se presenta en el informe Social No. 3	En el Informe mensual Social No. 6, en el componente social, presenta los soportes de las vallas instaladas.	Informe mensual Social No. 6 (Social)
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 16: Asistir a los Comités técnicos de obra que se programen mínimo cada siete (7) días, convocados por la supervisión y/o interventoría. Se debe contar con la presencia del director de obra y todo el equipo profesional propuesto.	Se realizan los respectivos comités de obra, con asistencia de interventoria, supervisión y contratista, según se muestra en el anexo 11 del informe Social No. 3	Se levantan las correspondientes actas de comité celebrados y se suscribe por las partes.	Actas de comité del periodo del 21 de julio del 2025 al 20 de agosto de 2025 (Adjuntas en el Informe mensual No. 6)
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 17: Contratar el personal cumpliendo con las normas vigentes en especial con las resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 DE 1984, CST Art 349, Resolución 2413 DE 1979 R.H.S el sector construcción, Resolución 2013 de 1986 y el Art 63 del Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad vigente en tema ambiental se deben cumplir Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Resolución 541 de 1994, Decreto Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo N° 417 de 2009.	El personal por parte del contratista que ingresa a obra fue presentado según los requisitos del plan de gestión SST, con su respectiva documentación anexa que se presenta en el informe mensual SST. No. 2.	Se presentan los respectivos anexos junto al informe SST No. 6.	Informe mensual SST No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 18: Dar cumplimiento a las disposiciones ambientales en cuanto a la implementación de la Resolución No 1115 de 2012 para el aprovechamiento de Residuos sólidos de Construcción y Demolición y la Resolución No 6981 de 2011 para la utilización del granulo de caucho reciclado en los pavimentos	Es de mencionar que la Resolución No 1115 de 2012 fue derogada por el Decreto 507 de 2023, el cual adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá D.C. Para el presente periodo se realiza aprovechamiento de RCD a través de la	Informe de Aprovechamiento In Situ y certificados.	En el Anexo 03. Aprovechamiento Insitu del informe Ambiental No 06 se adjunta los soportes requeridos de acuerdo con el Decreto 507 de 2023 como soporte de la meta de

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	compra de subbase granular Reciclada Tipo C en los gestores ambientales autorizados, como material granular para el relleno e instalación de mejoramiento de la subrasante en los senderos peatonales del parque Quiroga 042. De igual manera, se implementará el uso de grano de caucho reciclado para conformar los pisos de la zona de juegos infantiles.		aprovechamiento. Estos certificados corresponden al mes de julio de 2025 debido que la expedición de los certificados por los gestores ambientales es entregada después del corte de fecha de entrega del informe a presentar.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 19: Entregar a la Interventoría, copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente.	Previo al inicio de actividades, se presentó y avaló el personal mínimo requerido descrito en el pliego de condiciones. A su vez, fue contratado el personal necesario para el inicio de las obras, el cual cuenta con todas las capacidades para el correcto ejercicio de su rol.	Hojas de vida avaladas por la interventoría mediante correo electrónico y documento de validación de perfiles profesionales mínimos requeridos (desde el periodo del 10 de marzo al 30 de marzo de 2025). A su vez se presentan las minutas de vinculación laboral del personal contratado para este periodo. Se incluye la Certificación de pago de parafiscales.	• Certificado de parafiscales y planillas pagadas que hacen parte del anexo del Informe mensual No. 6 (SST) • Los contratos fueron adjuntos en el informe de actividades No 01.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 20: Contratar de acuerdo con el decreto 332 de 2020, el porcentaje mínimo de mujeres estipulado en la rama de actividad económica de Construcción determinado en un 6,8%	Se da cumplimiento a esta obligación con el porcentaje de mujeres dentro del talento humano del contrato. Como se presenta en la documentación anexa del informe SST No. 4	Se expide documento de certificación de cumplimiento de porcentaje mínimo de contratación de mujeres en el presente periodo.	• Certificación de cumplimiento obligación específica No. 20

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 21: Cumplir con las normas vigentes en cuanto en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en especial con las resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 de 1984, CST Art 349, resolución 2413 de 1979 R.H.S para el sector construcción, Resolución 2013 de1986 y el Art 63 del Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad vigente en tema ambiental se deben cumplir Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Resolución 541 de 1994, Decreto Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo N° 417 de 2009.	El área SST durante el presente periodo realizó la implantación del SG-SST, a través de actividades de inducciones al personal nuevo, capacitación, entrega de dotación, reuniones del COPASST, CCL, inspecciones de seguridad, inspecciones de kit de emergencia, análisis de accidentabilidad y programa de prevención	Informe mensual SST No. 6.	En el documento Informe mensual SST No. 6 junto con sus anexos se podrá evidenciar la gestión respectiva del área SST durante el presente periodo.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 22: Entregar en los tiempos estipulados en los estudios previos, (10 primero días después de firmada el acta de inicio) anexo técnico y demás del proceso de selección, cumpliendo con las condiciones allí descritas, la programación del contrato, el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los cronogramas de actividades para el desarrollo de la Gestión social y SS-TMA y demás insumos requeridos.	Se entregó la documentación técnica, Ambiental, SST y Social de acuerdo con pliego de condiciones del proceso de selección y es avalada por la interventoría.	Se remite por correo electrónico a la interventoría, y se recibe respuesta de esta por este mismo medio.	Comunicaciones enviadas y recibidas por correo electrónico.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 23: Presentar las hojas de vida del equipo de trabajo mínimo requerido, dentro del término previsto en los estudios previos y anexo técnico, cumpliendo con las condiciones allí descritas.	Previo al inicio de actividades, se presentó y avaló el personal mínimo requerido descrito en el pliego de condiciones. Se realizó radicado de oficio CIROP-741-016 con radicado del FDLRUU 2025-681-003085-2	Hojas de vida avaladas por la interventoría mediante correo electrónico y documento de validación de perfiles profesionales mínimos requeridos. A su vez se presentan las minutas de vinculación laboral del personal contratado. Se incluye la Certificación de pago de parafiscales.	• Hojas de Vida avaladas • Minutas de contratos celebrados para la vinculación laboral. • Certificado de parafiscales y planillas pagadas que hacen parte del anexo del Informe mensual No. 6 (SST)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 24: Realizar los trámites ante las empresas de servicios públicos necesarios para la apropiación de los estudios y seguido a ello la ejecución.	Las actividades de diseño de redes de alcantarillado se efectuaron durante el contrato de consultoría No. 332 de 2019, el cual, obtuvo el aval de la EAAB para la intervención de las redes de alcantarillado de los parques 18-042, 18-138 y 18-180.	Informes de consultoría No. 332 de 2019	Documentación entregada por la supervisión del FDLRUU
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 25: Demoler, reemplazar y asumir el costo de toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad efectuado por el interventor o incluso por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra. En este evento el contratista no tendrá derecho a reclamación o reconocimiento pecuniario alguno.	No se presentaron en el periodo en ejecución.	No se presentó a la fecha	No se presentó a la fecha
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 26: En caso de presentarse retraso en la ejecución de las actividades, presentar ante la Interventoría un plan de choque (contingencia) que permita dar cumplimiento a la programación aprobada previamente, y cumplir la ejecución del contrato en el plazo establecido. Este plan de choque deberá ser entregado a interventoría en un plazo máximo de tres (3) días calendario una vez se reporte el retraso. Así mismo, la interventoría tendrá un tiempo máximo de tres (3) días calenda-rio para pronunciarse al respecto, y el contratista un plazo de dos (2) días calendario para ajustar las observaciones requeridas por la interventoría.	No se ha presentado hasta la fecha.	No se presentó a la fecha	No se presentó a la fecha
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 27: Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato conforme con lo dispuesto por el Fondo de Desarrollo Local De Rafael Uribe Uribe y Entidades Distritales correspondientes.	Para el periodo de ejecución y cobro no se realizan planos récord, debido a que aún no se culmina ningún parque en su totalidad.	Se presentarán una vez se concluyan las actividades de obra	Se presentarán una vez se concluyan las actividades de obra

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 28: Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.	En el periodo de ejecución y cobro, aun no se realiza la entrega de ningún parque. Cuando esto se realice se llevará a cabo la limpieza respectiva.	Se realizará una vez se concluyan las actividades de obra	Se realizará una vez se concluyan las actividades de obra
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 29: Presentar mensualmente las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y avaladas por la Entidad CONTRATANTE.	Se realiza la entrega del acta parcial de obra No. 1 correspondiente al periodo del 10 de marzo de 2025 al 30 de mayo de 2025.	Se suscribe el acta parcial No. 5 por todas las partes.	Acta parcial No. 5 que comprende el periodo del 21 de julio de 2025 al 20 de junio de 2025.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 30: Llevar una bitácora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director y residente de obra, y el residente y director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo re- quieran, los delegados de la Entidad CONTRATANTE. Deberá ser diligenciada en forma absolutamente legible.	En cada frente de obra permanece la respectiva bitácora, la cual es diligenciada por la interventoría, contratista y supervisión y cuyo escáner se anexa dentro del informe técnico No. 4.	En el Informe mensual No. 6, en el anexo técnico reposan las bitácoras de obra de los frentes que hacen parte del alcance del presente periodo.	Bitácora de obra en el anexo técnico del Informe mensual No. 6.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 31: Ceñirse al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría Distrital de Gobierno, empleando los formatos que apliquen para la ejecución del presente contrato.	Se cumple con esta obligación presentando el presente informe de actividades que corresponde al formato GCO-GCI-F110 y el informe de supervisión correspondiente al formato GCO-GCI-F133.	Se presentan el presente informe de actividades y el informe de supervisión por parte de la interventoría con corte del 21 de julio al 20 de agosto de 2025.	Informe de actividades y el informe de supervisión por parte de la interventoría

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 32: Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto contractual	Se da cumplimiento a todas las obligaciones contractuales.	Se presenta el Informe mensual No. 6 con cada uno de sus componentes (Ambiental, Social, SST, Técnico), en el cual se refleja el cumplimiento técnico y jurídico de lo estipulado en el contrato.	Informe mensual No. 6 (Ambiental, Social, SST, Técnico)
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 33: Tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones. (No dejar sustancias con materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal). Para esto deberá tener en cuenta lo estipulado en la y el procedimiento Gestión Integral de Residuos Sólidos de la entidad.	Durante el presente periodo se llevaron actividades ambientales de acuerdo con Plan de Manejo Ambiental diseñado, como señalización y delimitación de individuos arbóreos, cubrimiento de sumideros, instalación de puntos ecológicos, instalación de PMT, separación en la fuente, capacitaciones, cronograma de actividades ambientales de obra. Como se presenta en el informe Ambiental No. 3	Informe mensual Ambiental No. 6.	En el Informe mensual Ambiental No. 6 se puede evidenciar la gestión ambiental realizada en el presente periodo.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 34: Realizar la gestión adecuada de los residuos que genere. Como constancia de esto se entregarán copias de los certificados de transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los mismos. (Los gestores deberán contar con los permisos respectivos de la autoridad ambiental competente).	Se realiza la debida Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de los diferentes frentes de obra a sitios autorizados como lo indica el Plan Ambiental de RCD para el mes de mayo de 2025.	Informe mensual No. 6.	En el Anexo 04. Anexo de RCD del informe Ambiental No 06 se adjunta los soportes requeridos de acuerdo con el Decreto 507 de 2023 para la gestión de RCD del mes de julio 2025. Estos certificados corresponden al mes de agosto de 2025. Debido que la expedición de los certificados, por parte de los gestores ambientales, se entrega después del corte de fecha de entrega del informe a presentar.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 35: Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.	Se realiza seguimiento por parte del especialista ambiental de la interventoría. El cual da aval al cumplimiento de las actividades ambiental con el aval del informe ambiental presentado por este consorcio.	Radicación del Informe mensual No. 6 del componente ambiental, el cual está suscrito por las partes.	Informe mensual no. 6 (Ambiental)
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 36: Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del manifiesto de recolección, transporte y certificado de disposición final o aprovechamiento.	Se realiza la debida Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de los diferentes frentes de obra a sitios autorizados como lo indica el Plan Ambiental de RCD para el mes de mayo de 2025.	Informe mensual No. 6	En el Anexo 04. Anexo de RCD del informe Ambiental No 06 se adjunta los soportes requeridos de acuerdo con el Decreto 507 de 2023 para la gestión de RCD del mes de julio 2025. Estos certificados corresponden al mes de agosto de 2025. Debido que la expedición de los certificados, por parte de los gestores ambientales, se entrega después del corte de fecha de entrega del informe a presentar.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 37: Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la resolución 1138 de 2003, cuando aplique y la Resolución 472 de 2017.	Diseño del plan de gestión RCD bajo el marco normativo del Decreto 507 de 2023, como se presentó en el informe Ambiental No.1	Radicación del programa de RCD y entrega de MAO a interventoría y Alcaldía	Se envío a interventoria mediante el oficio de obra CPV-OBR-002 del día 27 de febrero de 2025, presente en el informe ambiental No. 1
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 38: Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en su artículo 4: "las Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por	Es de mencionar que la Resolución No.1115 de 2012 fue derogada por el Decreto 507 de 2023, el cual adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá D.C. Para el presente periodo se realiza aprovechamiento de RCD a través de la compra de su base granular Reciclada Tipo	Informe de Aprovechamiento In Situ y certificados.	En el Anexo 03. Aprovechamiento Insitu del informe Ambiental No 06 se adjunta los soportes requeridos de acuerdo con el Decreto 507 de 2023 como soporte de la meta de aprovechamiento. Estos certificados corresponden al

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
las etapas constructivas y de desmantela- miento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la entidad anualmente". Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 25%.	C en los gestores ambientales autorizados, como material granular para el relleno e instalación de mejoramiento de la subrasante en los senderos peatonales del parque Quiroga 18-042. El grano caucho reciclado será instalado y aprovecha finalizando las obras civiles, de acuerdo con la programación de obra del contrato 747 de 2024.		mes de mayo de 2025 debido que la expedición de los certificados por los gestores ambientales es entregada después del corte de fecha de entrega del informe a presentar.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 39: Emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas).	El área SST realizó entrega y verificación de dotación al personal que participo en el contrato durante el presente periodo.	Se adjunta formato de entrega de dotación al personal de obra.	Se evidencia en el documento del Informe mensual SST No. 6 en el Anexo No 06. Soporte de dotación.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 40: Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño ó deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.	El área ambiental delimitó y señalizo las áreas de trabajo con polisombra mixta, con el objetivo de solo intervenir el área a ejecutar para prevenir y conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños.	Registro fotográfico	La evidencia se encuentra en el cuerpo del documento del Informe mensual Ambiental No. 6 en el ítem 5.6 **FICHA B4: CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS**
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 41: Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente, entregando a la Alcaldía Local los certificados de disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material.	Se realiza la debida Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de los diferentes frentes de obra a sitios autorizados como lo indica el Plan Ambiental de RCD para el mes de mayo de 2025.	Certificación entregada por la escombrera autorizada al consorcio y los cuales se presentan en el informe Ambiental No. 6	En el Anexo 03. Anexo de RCD del informe Ambiental No 06 se adjunta los soportes requeridos de acuerdo con el Decreto 507 de 2023 para la gestión de RCD del mes de julio de 2025. Estos certificados corresponden al mes de agosto de 2025, debido que la expedición de

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			los certificados por los gestores ambientales es entregada después del corte de fecha de entrega del informe a presentar.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 42: El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la guía de manejo ambiental para el sector de la Construcción, de la Secretaría Distrital de ambiente.	Se realiza la implementación de los lineamientos estipulados de acuerdo con el Manual ambiental de obra de acuerdo con las fichas de Instalación de campamentos, controles atmosféricos, programa de residuos, manejo integral de cuerpos de agua y vegetación	Informe mensual Ambiental No. 6	En el Informe mensual Ambiental No. 6 se puede apreciar la trazabilidad de la gestión realizada durante el presente periodo.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 43: Para la construcción de los parques se deberá prever el uso de llantas usadas o de materiales provenientes del aprovechamiento de estas, en las áreas que sean técnicamente susceptibles de ser provistas con dichos materiales (zonas de juego, pistas de trote, entre otras).	Implementación del plan de gestión RCD, en los diferentes frentes de obra, con la utilización del caucho reciclado para la primera capa de las áreas que contarán con piso en caucho. Y en cumplimiento de la normativa.	En el presente periodo no se realiza la instalación de grano caucho reciclado debido que esta actividad se encuentra proyectada al finalizar actividades civiles.	No Aplica
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 44: Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, que garantice el cumplimiento normativo. La persona asignada deberá demostrar idoneidad, experiencia y será aprobada por el contra- tante y/o la interventoría.	Previo al inicio de actividades, se presentó y avaló el personal mínimo requerido descrito en el pliego de condiciones, el cual contempla el especialista ambiental y SST.	Hojas de vida avaladas por la interventoría mediante correo electrónico y documento de validación de perfiles profesionales mínimos requeridos. A su vez se presentan las minutas de vinculación laboral del personal contratado para este periodo. Se incluye la Certificación de pago de parafiscales.	• Hojas de Vida avaladas • Minutas de contratos celebrados para la vinculación laboral. Certificado de parafiscales y planillas pagadas que hacen parte del anexo del Informe mensual No. 6 (SST)

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 45: Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes al manejo y conservación del medio ambiente.	Se realiza la implementación de los lineamientos estipulados de acuerdo con el Manual ambiental de obra de acuerdo con las fichas de Instalación de campamentos, controles atmosféricos, programa de residuos, manejo integral de cuerpos de agua y vegetación.	Informe mensual Ambiental No. 6	En el documento del Informe mensual Ambiental No. 6 se puede apreciar la trazabilidad de la gestión realizada durante el presente periodo.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 46: Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y pre- sentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.	La ejecución del programa de seguimiento y monitoreo ambiental, a través de los indicadores de gestión es realizada a través de la evaluación de cada ficha ambiental implementada.	Indicadores de gestión ambiental.	En el documento del Informe mensual Ambiental No. 6 se puede apreciar los indicadores de gestión ambiental de acuerdo con las fichas ambientales implementadas en el presente periodo.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 47: Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.	Durante el presente periodo no se presentan actividades que generen planes de contingencia.	No se presentó a la fecha	No se presentó a la fecha
OBLIGACIÓN ESPECIFICA No. 48: Instalar aviso de conteo regresivo de acuerdo con las especificaciones del artículo 2 del acuerdo 787 de 2020 en cada uno de los frentes de obra del presente contrato, de igual manera presentar registro fotográfico de la actualización de este de acuerdo con la ejecución de la intervención.	En el mes de marzo se aprobó el arte presentado por este consorcio, por lo que se fabricaron los avisos de conteo regresivo y se instalaron en cada uno de los frentes. El registro fotográfico se anexa en el informe Social No. 3	En el Informe mensual No. 5 en el componente social, se refleja en el registro fotográfico la instalación de los avisos de conteo regresivo.	Informe mensual No. 6 (Social)




INFORMACIÓN ADICIONAL

	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	La información relacionada con el pago de planillas se presenta en el informe mensual SST No. 6, Anexo 3	La información relacionada con el pago de planillas se presenta en el informe mensual SST No. 6, Anexo 3	La información relacionada con el pago de planillas se presenta en el informe mensual SST No. 6, Anexo 3

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las OBLIGACIONES derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:**  **Nombre: VIVIANA ANDREA RODRÍGUEZ MUÑOZ** **Cargo: Representante Legal CONSORCIO PARQUES VERDES** **Cédula: 1.110.521.236**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las OBLIGACIONES establecidas en el contrato.	**INTERVENTOR** **Firma:**  **Nombre: CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA** **Cargo: Representante Legal CONSORCIO INTER RUU PARQUES** **Cédula: 79.939.003 de Bogotá**
	APOYO A LA SUPERVISIÓN **Firma:**  **Nombre: DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO** **Cargo: Alcaldesa FDLRUU** **Cédula: 52.883.374**

CONSORCIO PARQUES VERDES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO PARQUES VERDES
NIT 90905021-8

Que en cumplimiento a lo establecido en el decreto 332 de 2020 y la circular 013 de 2021 el CONSORCIO PARQUES VERDES está cumpliendo con el porcentaje mínimo de mujeres contratada para la ejecución del contrato 747 de 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C."

Para los desplazamientos de la maquinaria empleada en la ejecución de la obra se realizó el empleo o uso de vehículos apropiados para tal fin, en esta ocasión una camabaja, dando así cumplimiento a lo dispuesto por la norma ya mencionada.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá D.C. a los treinta (28) días del mes (08) de agosto del año dos mil veinticinco (2025). Y tiene como finalidad acreditar lo exigido en la obligación especifica No. 6 del contrato suscrita por mi representada, con corte del 21 de julio al 20 de agosto de 2025.

CONSORCIO PARQUES VERDES

Cordialmente

ING. VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
Cédula: 1.110.521.236
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUES VERDES

carrera 73 No. 48-88, Normandía Occidental, Bogotá D.C.
Tel: 601 – 6482550/3238594027
parquesverdesconsorcio@gmail.com

CONSORCIO
PARQUES VERDES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO PARQUES VERDES
NIT 90905021-8

Que en cumplimiento a lo establecido en el decreto 332 de 2020 y la circular 013 de 2021 el CONSORCIO PARQUES VERDES está cumpliendo con el porcentaje mínimo de mujeres contratada para la ejecución del contrato 747 de 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C."

Conforme a lo establecido en la normatividad mencionada, el porcentaje mínimo de mujeres estipulado en la rama de actividad económica de construcción es del 6,8% porcentaje que certifico y acredito se está cumpliendo por parte del consorcio para la materialización del contrato ya referido.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá D.C. a los treinta (28) días del mes (08) de agosto del año dos mil veinticinco (2025). Y tiene como finalidad acreditar lo exigido en la obligación especifica No. 20 del contrato suscrita por mi representada, con corte del 21 de julio al 20 de agosto de 2025.

CONSORCIO
PARQUES VERDES

Cordialmente

ING. VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
Cédula: 1.110.521.236
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUES VERDES

carrera 73 No. 48-88, Normandía Occidental, Bogotá D.C.
Tel: 601 – 6482550/3238594027
parquesverdesconsorcio@gmail.com

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

CONTRATO: DE OBRA IDOP 747-2024 | CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | PERIODO: ACTA No. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN | CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VERDES | INTERVENTOR: CONSORCIO INTER RIJU PARQUES

Periodo: ACTA No. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			PRECIOS CONTRACTUALES	MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 5		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1	Acero refuerzo fy=60000psi	TN	$ 5.342.556,00		-22,75	-$ 121.564.518,22	1,39	$ 7.404.782,62	-3,20	$ 7.404.782,62	3,51	$ 18.776.199,36	1,07	$ 5.701.308,64	4,58	$ 24.477.508,00
2	Localización y Replanteo con equipo	M2	$ 7.358,00		-1.846,10	-$ 13.583.583,82	4.877,69	35.891.528,60	-604,06	$ 35.891.528,60	5.481,95	$ 40.336.188,10	3.319,97	$ 24.428.339,26	8.801,92	$ 64.764.527,36
3	Canal de drenaje prefabricado en polyconcreto, pd-150v, clase de carga d400, incluye rejilla, long=1000 mm, h= 270 mm, ancho= 200mm, en color natural, (no incluye:	UN	$ 293.046,00			$ -						$ -		$ -		$ -
4	Canal de inicio / fin de drenaje prefabricado en polyconcreto , pd-150v, clase de carga d400, incluye rejilla, long=500 mm, h= 270 mm, ancho= 200mm, en color natural. incluye	UN	$ 554.127,00			$ -						$ -		$ -		$ -
5	Tuberia Novafort d=160mm excav y relleno recebo	ML	$ 110.968,00	14,98		$ 1.662.300,64	35,00	$ 3.883.880,00	-0,80	$ 3.883.880,00	35,80	$ 3.972.654,40	51,80	$ 5.748.142,40	87,60	$ 9.720.796,80
6	Tuberia Novafort d=110mm excav y relleno recebo	ML	$ 80.854,00		-11,20	-$ 905.564,80	56,00	$ 4.527.824,00	56,00	$ 4.527.824,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	Muro de contenc en gavion(cargue con Equipo)	M3	$ 373.391,00	83,93		$ 31.340.075,17	277,93	103.777.929,17	277,93	$ 103.777.929,17	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04m	M2	$ 21.435,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0.04	M2	$ 26.832,00	277,65		$ 7.449.904,80	329,52	8.841.680,64	-18,95	$ 8.841.680,64	348,47	$ 9.350.147,04	40,61	$ 1.089.647,52	389,08	$ 10.439.794,56
10	Kurbza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto	M2	$ 36.328,00			$ -					-	$ -	66,08	$ 2.400.554,24	66,08	$ 2.400.554,24
11	Contenedor raices arboles (1.30 x 1.30 int) h=1.57 Incluye bordillo A70. tierra negra	UN	$ 2.177.853,00		-4,00	-$ 8.711.412,00	6,00	13.067.118,00	6,00	$ 13.067.118,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa	UN	$ 674.593,00		-1,00	-$ 674.593,00	6,00	$ 4.047.558,00	6,00	$ 4.047.558,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13	Relleno rajon manual (Inc. Compactación Mecanica)	M3	$ 155.362,00	138,50		$ 21.517.637,00	237,30	36.867.402,60	237,30	$ 36.867.402,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	$ 146.180,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-0,00	$ -
15	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incly. Transporte	UN	$ 324.655,00	1,00		$ 324.655,00	2,00	$ 649.310,00	2,00	$ 649.310,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	Placa contrapiso h=0,15 m, 210 k/cm2+ refort	M2	$ 132.782,00	117,63		$ 15.619.148,66	310,39	41.214.204,98	310,39	$ 41.214.204,98	-	$ -	-	$ -	-0,00	$ -
17	Cable Aluminio 2 N° 4 Sum e Instalación	ML	$ 14.804,00	3,00		$ 44.412,00	112,00	$ 1.658.048,00	112,00	$ 1.658.048,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m Incly. Transporte	UN	$ 169.495,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	Trasplante y bloqueo de arbotes de 3 m a 5m	UN	$ 1.302.152,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
20	Siembra arbol chicalá H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)	UN	$ 262.089,00			$ -	5,00	$ 1.310.445,00	5,00	$ 1.310.445,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	$ 14.064,00		-48,27	-$ 678.869,28	1.624,40	22.845.561,60	1.323,33	$ 22.845.561,60	301,07	$ 4.234.248,48	-	$ -	301,07	$ 4.234.248,48
22	Cerramiento lona h=2 20 mts(Inc. Excavación)	ML	$ 25.459,00		-112,57	-$ 2.865.919,63	676,60	17.225.559,40	676,60	$ 17.225.559,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	Poste concretoAP10 m510 Kg+Base Conc (Sum+instal)	UN	$ 1.466.729,00			$ -	7,00	10.267.103,00	7,00	$ 10.267.103,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	Compactación fondo de excavación con equipos tvjano	M2	$ 1.103,00	1.058,28		$ 1.167.282,84	2.001,00	$ 2.207.103,00	1.480,61	$ 2.207.103,00	520,39	$ 573.990,17	325,41	$ 358.927,23	845,80	$ 932.917,40
25	Certificado Retie	UN	$ 2.535.718,00			$ -	2,00	$ 5.071.436,00	2,00	$ 5.071.436,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	Certificado Retilap	UN	$ 3.085.358,00			$ -	2,00	$ 6.170.716,00	2,00	$ 6.170.716,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	Alcorque metálico 1200 x 1200 mm	UN	$ 1.464.273,00		-1,00	-$ 1.464.273,00	3,00	$ 4.392.819,00	3,00	$ 4.392.819,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	$ 68.306,00	163,75		$ 11.185.244,11	820,22	56.025.947,32	458,45	$ 56.025.947,32	361,77	$ 24.711.061,62	75,64	$ 5.166.665,84	437,41	$ 29.877.727,46
29	Concreto 3000 psi escaleras sobre terreno CDRC	M3	$ 1.183.820,00		-4,07	-$ 4.818.147,40	1,81	$ 2.142.714,20	-11,22	$ 2.142.714,20	13,03	$ 15.425.174,60	-	$ -	13,03	$ 15.425.174,60
30	Empalme en Derivación (91B1) juego x 2 unidades	JG	$ 219.539,00		-6,00	-$ 1.317.234,00	1,00	$ 219.539,00	1,00	$ 219.539,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	AdoquinColores e=0.06 p<5% 4.2-1blando	M2	$ 170.838,00		-737,62	-$ 125.966.001,56	56,40	9.623.983,20	56,40	$ 9.623.983,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.5+Excav(ESPEC/IDRD)	UN	$ 691.034,00	3,00		$ 2.073.102,00	8,00	$ 5.528.272,00	-1,00	$ 5.528.272,00	9,00	$ 6.219.306,00	7,00	$ 4.837.238,00	16,00	$ 11.056.544,00
33	Barrenda Juegos Infant M-83 (M-80) sin viga +Dado(Sum+Inst	ML	$ 340.454,00	119,15		$ 40.565.094,10	287,35	97.829.456,90	268,75	$ 97.829.456,90	18,60	$ 6.332.444,40	-	$ -	18,60	$ 6.332.444,40
34	Concreto ciclopeo 2500 psi premezclado (sin formaleta)	M3	$ 418.860,00	12,95		$ 5.424.237,00	62,95	26.367.237,00	62,95	$ 26.367.237,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6

CONTRATO: DE OBRA CDP 747-2024 | CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | PERIODO: ACTA No. 6 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN | CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VERDES | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL PARQUES

Periodo: ACTA No. 6 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			PRECIOS CONTRACTUALES	MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 6		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
35	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	$ 142.325,00	6,00		$ 853.950,00	90,00	$ 12.809.250,00	90,00	$ 12.809.250,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst), Tipo Dinamico	M2	$ 407.820,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
37	Canaleta T-C prefabricada (A-120)(canal)	ML	$ 90.173,00		-212,84	-$ 19.174.386,72	86,84	$ 7.839.040,02	86,84	$ 7.839.040,02	-	$ -	16,53	$ 1.490.559,09	16,53	$ 1.490.559,09
38	Caja de inspeccion 0.60x0.60 h=0.60+Fcasv(ESPEC/SDP)	UN	$ 643.542,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
39	Inspección CCTV de tubería de alcantarillado (DIAM=110-400)mm. Incluye lavado de tubería, manejo de lodos, video acueducto y elaboración de informe de acuerdo a los	ML	$ 35.047,00		-249,82	-$ 8.755.441,54	140,00	$ 4.906.580,00	-56,70	$ 4.906.580,00	206,70	$ 7.244.214,00	-	$ -	206,70	$ 7.244.214,00
40	Tuberia pvc diam=110mm	ML	$ 109.554,00	86,70		$ 10.593.671,80	180,00	$ 19.719.720,00	180,00	$ 19.719.720,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41	Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	UN	$ 2.573.874,00			$ -	4,00	$ 10.295.496,00	2,00	$ 10.295.496,00	2,00	$ 5.147.748,00	-	$ -	2,00	$ 5.147.748,00
42	Protector de arbol de dos tubos tipo m91, Inc,. Sum + Instala	UN	$ 373.116,00	3,00		$ 1.119.348,00	6,00	$ 2.238.696,00	6,00	$ 2.238.696,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	Bordillo prefabricado A 81 sin atraque	ML	$ 68.092,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
44	Cuneta en Loseta prefabricada A58 (ula (20 X 20 x 6) cm. Suministro e instalacion (incluye 4 cm de mortero 1:5 hecho en obra para base y arena de peña para sello) IDU	M2	$ 101.762,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
45	Cuneta en Loseta prefabricada A57 (actil Alerta (20 X 20 x 6) cm. Suministro e instalacion (incluye 4 cm de mortero 1:5 hecho en obra para base y arena de peña para sello) IDU	M2	$ 101.762,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
46	Protección árbol con tela verde (CDRC) H 1 m	UN	$ 66.093,00		-4,00	-$ 264.372,00	44,00	$ 2.908.092,00	42,00	$ 2.908.092,00	2,00	$ 132.186,00	-	$ -	2,00	$ 132.186,00
47	Alquiler campamento 40 m2	UN	$ 6.220.711,00			$ -	3,00	$ 18.662.133,00	3,00	$ 18.662.133,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	Siembra arbol chirlpique	UN	$ 280.961,00			$ -	1,00	$ 280.961,00	1,00	$ 280.961,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	Piso Caucho reciclado 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	$ 407.820,00	22,26		$ 9.076.073,20	76,00	$ 30.994.320,00	76,00	$ 30.994.320,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	$ 706.601,00	24,60		$ 17.382.384,60	75,60	$ 53.419.035,60	37,60	$ 53.419.035,60	38,00	$ 26.850.838,00	-	$ -	38,00	$ 26.850.838,00
51	Muro Ladrillo TabicónToilete Común 20*10*6	M2	$ 130.386,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	BOLARDO EN CONCRETO H - 60 (SUM + INST)	UN	$ 164.018,00			$ -	5,00	$ 820.095,00	2,50	$ 820.095,00	2,50	$ 410.047,50	-	$ -	2,50	$ 410.047,50
53	Muro Concreto Premezclado 3.500psi O.F. - Formaleta	ML	$ 802.200,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	Cable de Cobre 2#12 (Suministro+Instalación)	ML	$ 11.306,00		-174,00	-$ 1.967.244,00	15,00	$ 169.590,00	15,00	$ 169.590,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	Siembra arbol Polygala	UN	$ 270.261,00	1,00		$ 270.261,00	4,00	$ 1.081.124,00	4,00	$ 1.081.124,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	Siembra arbol Calistemo	UN	$ 270.261,00			$ -	3,00	$ 810.843,00	3,00	$ 810.843,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	Siembra arbol palma alejandra	UN	$ 343.750,00		-1,00	-$ 343.750,00	5,00	$ 1.718.750,00	5,00	$ 1.718.750,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	UN	$ 851.809,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
59	Banca prefab M-30 con espald sumin+instala Z.V**	UN	$ 835.598,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
60	Canaca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	$ 811.448,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
61	Flexion piernas prensa horizontal (SUM + INST)	UN	$ 3.042.547,00			$ -	1,00	$ 3.042.547,00	0,50	$ 3.042.547,00	0,50	$ 1.521.273,50	-	$ -	0,50	$ 1.521.273,50
62	Juego MURO DESLIZADERO-EDRO NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+In	UN	$ 3.474.211,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
63	Juegos Infantiles M-6A Columpio (Sum+Instal)-STEH	UN	$ 501.928,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6

CONSORCIO PARQUES VERDES

CONTRATO: OBRA COP 341-2024

CONTRATANTE : ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

PERIODO: ACTA No. 5 DEL 31 DE JULIO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN

CONTRATISTA : CONSORCIO PARQUES VERDES

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL PARQUES

Periodo:	ACTA No. 5 DEL 31 DE JULIO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025		PRECIOS CONTRACTUALES	MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 5		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
						$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
84	INSTALACION DOTACION GIRO CADERA (twister)	UN	$ 272.107,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
85	MODULO TIMON VOLANTES (Suml+Insta) Giro manos	UN	$ 2.280.587,00	1,00		$ 2.280.587,00	2,00	$ 4.561.174,00	1,50	$ 4.561.174,00	0,50	$ 1.140.293,50	-	$ -	0,50	$ 1.140.293,50
86	MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Llevadas)Suml+Inst	UN	$ 28.604.887,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
87	Juego Columpio Suml+Inst	UN	$ 2.446.580,00			$ -	2,00	$ 4.893.160,00	-0,50	$ 4.893.160,00	2,50	$ 6.116.450,00	0,50	$ 1.223.290,00	3,00	$ 7.339.740,00
88	Juego biosaludable caminador aereo suml+Inst	UN	$ 3.520.331,00			$ -	3,00	$ 10.560.993,00	-27,00	$ 10.560.993,00	30,00	$ 105.609.930,00	-	$ -	30,00	$ 105.609.930,00
89	Banca Fonzi on concreto sin espaldar	UN	$ 3.520.331,00	3,00		$ 23.669.871,00	6,00	$ 63.973.256,00	-1,00	$ 63.973.256,00	9,00	$ 71.869.813,00	-	$ -	0,00	$ 71.869.813,00
90	Bancs MK05 I onkretus Pul t el A (suml+insta)	UN	$ 14.449.814,00			$ -	1,00	$ 14.449.814,00	0,50	$ 14.449.814,00	0,50	$ 7.224.957,00	-	$ -	0,50	$ 7.224.957,00
91	Tobogan doble T-138	UN	$ 115.204.389,00			$ -	1,00	$ 115.204.389,00	0,50	$ 115.204.389,00	0,50	$ 57.602.194,50	-	$ -	0,50	$ 57.602.194,50
92	Juego red araña 6-12 años Cap: 11 niños	UN	$ 5.000.013,00			$ -	2,00	$ 10.000.026,00	1,00	$ 10.000.026,00	1,00	$ 5.000.013,00	-	$ -	1,00	$ 5.000.013,00
93	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Suml+Inst+Transp)	UN	$ 3.386.407,00	1,00		$ 3.386.407,00	2,00	$ 6.772.814,00	0,50	$ 6.772.814,00	1,50	$ 5.079.610,50	0,50	$ 1.693.203,50	2,00	$ 6.772.814,00
94	MODULO DORSAL PECTORAL (Suministi+Insta) Brazos el	UN	$ 14.863.622,00	1,00		$ 14.863.622,00	2,00	$ 29.727.244,00	2,00	$ 29.727.244,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
95	Juego biosaludable Pectorales cf4011 eum+inst	UN	$ 6.260.130,00			$ -					1,00	$ 6.260.130,00	-	$ -	1,00	$ 6.260.130,00
96	Juego biosaludable cabalgata cf 4013 eum+inst	UN	$ 6.425.295,00			$ -	1,00	$ 6.425.295,00	-0,50	$ 6.425.295,00	1,50	$ 8.637.842,50	0,50	$ 3.212.647,50	2,00	$ 12.850.590,00
97	Juego biosaludable cabalgata cf-4313 um+Inst	UN	$ 6.064.806,00			$ -	1,00	$ 6.064.806,00	-0,50	$ 6.064.806,00	1,50	$ 9.097.209,00	0,50	$ 3.032.403,00	2,00	$ 12.129.612,00
98	Juego biosaludable hombros y brazo inclusivo eum+inst	UN	$ 19.134.133,00			$ -	1,00	$ 19.134.133,00	1,00	$ 19.134.133,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
99	Juego biosaludable hombros y brazos inclusivo cf 4917 eum+Inst	UN	$ 16.792.596,00			$ -	1,00	$ 16.792.596,00	-	$ 16.792.596,00	1,00	$ 16.792.596,00	-	$ -	1,00	$ 16.792.596,00
100	Juego biosaludable cf 4015 bicicleta manual eum+inst	UN	$ 16.792.596,00			$ -	1,00	$ 16.792.596,00	0,50	$ 16.792.596,00	0,50	$ 8.396.298,00	1,50	$ 25.188.894,00	2,00	$ 33.585.192,00
101	Juego biosaludable bicicleta inclusiva eum+inst	UN	$ 16.746.041,00			$ -	1,00	$ 16.746.041,00	0,50	$ 16.746.041,00	0,50	$ 8.373.020,50	-	$ -	0,50	$ 8.373.020,50
102	Juego biosaludable bicicleta manual inclusiva cf4015 eum+Inst	UN	$ 259.582,00			$ -	1,00	$ 259.582,00	1,00	$ 259.582,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
103	Derivación para circuito exclusivo de A.P. desde la red áreas abierta de B.T existente.	IG	$ 507.395,00	2,00		$ 1.194.790,00	11,00	$ 6.571.345,00	11,00	$ 6.571.345,00	-	$ -	2,00	$ 1.194.790,00	2,00	$ 1.194.790,00
104	Señal sig-a 1 cara (sum + inst)	UN	$ 522.570,00		-4,00	-$ 2.090.280,00	6,00	$ 3.135.420,00	8,00	$ 3.135.420,00	-	$ -	2,00	$ 1.045.140,00	2,00	$ 1.045.140,00
105	Señal sig-a 2 caras (sum + inst)	UN	$ 1.017.897,00		-3,00	-$ 3.053.691,00	2,00	$ 2.035.794,00	2,00	$ 2.035.794,00	-	$ -	1,00	$ 1.017.897,00	1,00	$ 1.017.897,00
106	Señal identificacion general IDRD	UN	$ 499.692,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
107	Tala de arboles h= 10.1 a 15 m inclv. Transporte	UN	$ 1.753.779,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
108	Anillo contenc calason e=0.10 de=+1.3 3000 psi	M3	$ 894.580,00			$ -	7,00	$ 3.131.030,00	7,00	$ 3.131.030,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
109	Atemtraje varilla cooper wa6 5/8" y 1,8m (tierra)	UN	$ 447.290,00	2,00		$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
110	Baranda H-82(Pasam2"+ Traves-2"+3Travesl.5"XCM1)	ML	$ 244.063,00			$ -	7,00	$ 1.079.911,00	7,00	$ 1.079.911,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
111	Brazo sencillo Luminaria - Suministro - Montaje e instalación	UN	$ 154.273,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
112	Caisson relleno (Concret 4000psi bombeado) d=1.2	M3	$ 582.244,00			$ -	547,00	$ 17.076.906,00	59,39	$ 17.076.906,00	488,21	$ 15.224.828,85	-	$ -	488,21	$ 15.224.828,85
113	Demol. manual anden + bordillo incl. cargue-ret	M2	$ 31.185,00	390,62		$ 12.181.484,70					54,83	$ 1.259.007,06	20,00	$ 468.040,00	74,81	$ 1.725.047,06
114	Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasl+retir+Andamios)	M2	$ 73.302,00			$ -					-	$ -	-	$ -	-	$ -
115	Desmonte y reinstalación de luminaria de alumbrado público	UN	$ 184.372,00		-6,00	-$ 1.106.232,00	1,00	$ 184.372,00	1,00	$ 184.372,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
116	Filtro geodren planar tuberia 100 mm h=2.0	ML	$ 137.793,00		-1.205,00	-$ 166.040.565,00	120,00	$ 16.535.160,00	120,00	$ 16.535.160,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
117	Fotoceldá - Suministro e instalación	UN	$ 29.738,00			$ -	7,00	$ 208.152,00	7,00	$ 208.152,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
118	Muro contencion concreto 28 MPA 4000 psi V1C e=.35	M3	$ 1.026.659,00		-27,53	-$ 28.425.316,45	4,35	$ 4.477.594,37	-39,83	$ 4.477.594,37	44,18	$ 45.454.990,62	16,94	$ 17.428.671,46	61,12	$ 62.883.862,08

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

UNIÓN TEMPORAL PARQUES VERDES

CONTRATO: DE OBRA COP 747-2024

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN

CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VERDES

PERÍODO: ACTA No 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER RIU PARQUES

Periodo: ACTA No 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			PRECIOS CONTRACTUALES	MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 5		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
98	Aforramiento Baja Tension Ø 1 1/2 Galvanizada**	UN	$ 66.237,00	37,00		$ 2.450.769,00	43,00	$ 2.848.191,00	43,00	$ 2.848.191,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
99	Poda árboles+retiro <5m Bajo GradoDificultad	UN	$ 133.304,00		-18,00	-$ 2.399.472,00	30,00	$ 3.999.120,00	30,00	$ 3.999.120,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
100	Geotextil NT2500	M2	$ 5.656,00	1.036,80		$ 5.864.140,80	1.267,80	$ 7.170.676,80	705,43	$ 7.170.676,80	562,37	$ 3.180.704,72	394,27	$ 2.229.991,12	956,64	$ 5.410.755,84
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS										-		-		-	
NP-01	EXCAVACIÓN MECANICA Y RETIRO (TIERRA)	M3	$ 64.966,00			$ -	360,00	$ 23.387.760,00	-45,61	$ 23.387.760,00	405,61	$ 26.350.859,26	63,15	$ 4.102.662,90	468,76	$ 30.453.462,16
NP-02	ANDEN EN CONCRETO REFORZADO e=.10m, 3000psi (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM D=6MM, FORMALETA, SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO, CURADOR DE CONCRETO, VIBRADOR DE CONCRETO	M2	$ 196.256,00			$ -					144,48	$ 28.644.026,88	75,80	$ 15.027.804,80	220,28	$ 43.671.831,68
NP-03	ANDEN EN CONCRETO REFORZADO e=.10, ESTAMPADO COLOR TERRACOTA, 3000psi (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM D=6MM, FORMALETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO, CURADOR DE CONCRETO, VIBRADOR DE CONCRETO	M2	$ 213.786,00			$ -	922,13	[redacted]	536,74	$ 197.130.484,18	385,39	$ 82.390.986,54	245,38	$ 52.458.806,68	630,77	$ 134.849.795,22
NP-04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON COMPACTADOR MECÁNICO	M3	$ 162.047,00			$ -	183,60	$ 16.788.069,20	-40,21	$ 16.788.069,20	143,81	$ 23.303.979,07	76,09	$ 12.330.156,23	219,90	$ 35.634.135,30
NP-05	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE DOS PERFORACIONES TIPO INDUSTRIAL, ACABADO DOBLE CARA, INCLUYE MORTERO 1:4 HECHO EN OBRA, (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CONCRETO PARA INYECCIÓN DE DOVELAS REFORZADAS)	M2	$ 119.537,00			$ -	1,00	$ 119.537,00	-161,64	$ 119.537,00	162,64	$ 19.441.497,68	17,30	$ 2.067.990,10	179,94	$ 21.509.487,78
NP-06	DOVELAS (0,08m X 0,08m) + REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL DE CONCRETO	M	$ 11.519,00			$ -	22,00	$ 253.418,00	-316,79	$ 253.418,00	338,79	$ 3.902.522,01	47,32	$ 545.079,06	386,11	$ 4.447.601,08
NP-07	BORDILLO PREFABRICADO A-80(0.35X0.2X0.80M)- CON ATRAQUE	ML	$ 99.469,00			$ -	9,00	$ 895.221,00	-293,62	$ 895.221,00	302,62	$ 30.131.145,48	56,90	$ 5.659.786,10	359,52	$ 35.790.935,58
NP-08	CÁRCAMO T-2 3000 PSI + REJILLA CONCRETO REFORZADO (CANAL)	ML	$ 448.080,00			$ -	10,00	$ 4.480.800,00	-261,38	$ 4.480.800,00	271,38	$ 121.599.950,40	-	$ -	271,38	$ 121.599.950,40
NP-09	TRASIEGO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION EN CARRETILLA DISTANCIA 0 A 100 M	m3	$ 42.278,00			$ -	5,00	$ 211.390,00	-398,17	$ 211.390,00	403,17	$ 17.045.231,26	-	$ -	403,17	$ 17.045.231,26
NP-10	SERVICIO DE BOMBEO PARA CONCRETO 0 a 60 m	M3	$ 58.637,00			$ -	1,00	$ 58.637,00	-54,77	$ 58.637,00	55,77	$ 3.270.185,49	32,31	$ 1.894.561,47	88,08	$ 5.164.746,96
NP-11	TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO/INT LISO U.M NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 125.950,00			$ -	5,00	$ 629.750,00	-20,20	$ 629.750,00	25,20	$ 3.172.940,00	26,20	$ 3.299.890,00	51,40	$ 6.472.830,00

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

CONTRATO: DE OBRA COP 747-2024

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PARQUES CATALOGADOS DE PROMINEDIO EN

CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VERDES

PERIODO: ACTA No. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER RIAU PARQUES

Periodo:	ACTA No. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		PRECIOS CONTRACTUALES	MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA 5		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
NP-12	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0,85M (PREFABRICADO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE SOBREMARCO Y TAPA)	UN	$ 5.074.043,00			$ -	1,00	$ 5.074.043,00	-5,00	$ 5.074.043,00	6,00	$ 30.444.258,00	4,00	$ 20.296.172,00	10,00	$ 50.740.430,00
NP-13	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ACRILICO CAMPOS DEPORTIVOS	M2	$ 70.718,00			$ -	$ 1,00	$ 70.718,00	-91,91	$ 70.718,00	92,09	$ 6.511.713,44	-	$ -	92,08	$ 6.511.713,44

		PORCENTAJE	TOTAL			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL
			$ 1.797.956.677,00	CD	-$	271.293.573,00	CD	$ 1.269.695.551,00	CD	$ 1.269.695.551,00	CD	$ 958.686.360,00	CD	$ 236.637.402,00	CD	$ 1.177.889.962,00
COSTOS DIRECTOS		25,47%	$ 464.807.671,00	A (25,47%)	-$	27.211.376,00	A (25,47%)	$ 388.176.112,00	A (25,47%)	$ 388.176.112,00	A (25,47%)	$ 291.994.363,00	A (25,47%)	$ 99.990.979,00	A (25,47%)	$ 311.889.772,00
ADMINISTRACIÓN		15,47%	$ 12.529.945,00	I (1,0%)	-$	2.712.935,00	I (1,0%)	$ 13.605.976,00	I (1,0%)	$ 13.605.976,00	I (1,0%)	$ 10.245.982,00	I (1,0%)	$ 2.760.214,00	I (1,0%)	$ 31.779.916,01
IMPREVISTOS		4,0%	$ 70.116.772,00	U (4,0%)	-$	10.851.741,00	U (4,0%)	$ 64.477.873,00	U (4,0%)	$ 64.477.873,00	U (4,0%)	$ 48.534.724,00	U (4,0%)	$ 9.960.496,00	U (4,0%)	$ 47.100.227,00
UTILIDAD																
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU			$ 2.384.613.234,00	CD + AIU	-$	304.669.885,00	CD + AIU	$ 1.768.666.441,00	CD + AIU	$ 1.768.666.441,00	CD + AIU	$ 1.258.196.379,00	CD + AIU	$ 357.868.192,00	CD + AIU	$ 1.568.894.843,00
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE A I U)		2,00%	$ 35.998.136,00	P.G. SOCIAL	-$	8.475.478,46	P.G. SOCIAL	$ 27.213.011,00	P.G. SOCIAL	$ 27.213.011,00	P.G. SOCIAL	$ 19.017.365,00	P.G. SOCIAL	$ 4.532.748,00	P.G. SOCIAL	$ 23.550.111,00
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST (INCLUYE A I U)		2,00%	$ 35.998.136,00	P.G. AMBIENTAL Y SST	-$	8.475.478,46	P.G. AMBIENTAL Y SST	$ 27.213.011,00	P.G. AMBIENTAL Y SST	$ 27.213.011,00	P.G. AMBIENTAL Y SST	$ 19.017.365,00	P.G. AMBIENTAL Y SST	$ 4.532.748,00	P.G. AMBIENTAL Y SST	$ 23.550.111,00
PLAN DE GESTIÓN DE TRANSITO (INCLUYE A I U)		2,00%	$ 35.998.136,00	P.G. TRÁNSITO	-$	8.475.478,46	P.G. TRÁNSITO	$ 27.213.011,00	P.G. TRÁNSITO	$ 27.213.011,00	P.G. TRÁNSITO	$ 19.017.365,00	P.G. TRÁNSITO	$ 4.532.748,00	P.G. TRÁNSITO	$ 23.550.111,00
VALOR TOTAL ACTA (COMAU+PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y TRÁNSITO)			$ 2.492.608.642,00	VALOR TOTAL	-$	571.847.306,38	VALOR TOTAL	$ 1.870.565.474,00	VALOR TOTAL	$ 1.870.565.474,00	VALOR TOTAL	$ 1.307.156.456,00	VALOR TOTAL	$ 371.550.436,00	VALOR TOTAL	$ 1.618.715.695,00
PROVISIONES PARA OBRAS INCLUYE AIU			$ 387.153.751,00													
TOTAL CONTRATO			$ 2.616.983.493,00													

RESUMEN DEL CONTRATO	$ 2.616.983.493,00
VALOR INICIAL	$ -
VALOR ANTICIPO	$ 1.309.451.247,00
VALOR ADICIÓN 1	$ 3.875.356.340,00
VALOR ACTUAL	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
VALOR FACTURADO A CORTE ANTERIOR	$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 311.550.436,00

	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	VALOR NETO A PAGAR	VALOR ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL No. 1	5/05/2025	$ 199.807.836,00	5,00%	$ -	$ 199.807.836,00	$ 199.807.836,00	$ 3.715.847.414,00	5,00%
2	ACTA PARCIAL No. 2	26/05/2025	$ 143.348.767,00	3,59%	$ -	$ 143.348.767,00	$ 343.156.613,00	$ 3.572.798.677,00	8,74%
3	ACTA PARCIAL No. 3	20/06/2025	$ 524.461.178,00	13,74%	$ -	$ 524.461.178,00	$ 867.617.791,00	$ 3.048.337.499,00	27,49%
4	ACTA PARCIAL No. 4	20/07/2025	$ 424.540.868,00	10,62%	$ -	$ 424.540.868,00	$ 1.292.158.659,00	$ 2.623.796.631,00	32,33%
5	ACTA PARCIAL No. 5	21/08/2025	$ 311.550.436,00	7,84%	$ -	$ 311.550.436,00	$ 1.618.715.695,00	$ 2.312.246.195,00	40,51%
	ACUMULADOS		$ 1.618.715.695,00						

Por el constratista:

Firma:
Nombre: VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUES VERDES

Por la Interventoría:

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ARANGUREN CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER RIAU PARQUES

Por el contratante:

Firma:
Nombre: DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTELLO
C.C. No. 52.883.375 de BOGOTÁ
ALCALDESA FOLIRIAU

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ

RESUMEN ACTA PARCIAL DE OBRA No 5

CONSORCIO PARQUES VERDES

Código	
Versión	
Fecha de Aprobación	

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA — N° DE CONTRATO: FDLRUU-LP-747 de 2024 — PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".

CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VERDES
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER RUU PARQUES

NOMBRE DEL PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACUMULADO TOTAL
URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA IV, V Y VI	18-042	CALLE 31 BIS SUR CON LA CARRERA 19 A	Mantenimiento/Mejoramiento	$ 110.016.689,00	$ 99.410.296,00	$ 94.893.381,00	$ 40 940 647,00	$ 22.450.977,00		$ 367 711.990,00
URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA VII	18-138	CALLE 32B SUR CON CARRERA 22	Mantenimiento/Mejoramiento	$ 8 208.217,00	$ 1.045.765,00	$ 200.047.995,00	$ 149.569.465,00	$ 87.852.057,00		$ 446.723.499,00
PARQUE ZARAZOTA	18-180	CARRERA 5Z CON CALLE 48I SUR COSTADO NORORIENTAL	Mantenimiento/Mejoramiento	$ 27.121.588,00	$ 3.820.355,00	$ 97.479 646,00	$ 118 314 116,00	$ 91.906 028,00		$ 338.641.733,00
URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA I, II Y III	18-202	CL 28 SUR TV 23 - TV 22B 28 24 SUR - CL 28B SUR 22 46 - TV 22B 28B 10 SUR	Mantenimiento/Mejoramiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.428.339,00		$ 24.428 339,00
SUBTOTAL				$ 145.346.494,00	$ 104.276.415,00	$ 392.421.022,00	$ 308.824.229,00	$ 226.637.402,00	$ -	$ 1.177.505.562,00
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTION SOCIAL, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN			6,0%	$ 8.720 790,00	$ 6.256.584,00	$ 23.545.260,00	$ 18.529.455,00	$ 13.598.244,00	$ -	$ 70.650.333,00
ADMINISTRACIÓN			26,47%	$ 38.473 217,00	$ 27 601.967,00	$ 103.873.844,00	$ 81 745.773,00	$ 59 990 920,00	$ -	$ 311.685.722,00
IMPREVISTOS			1,0%	$ 1.453 465,00	$ 1 042.764,00	$ 3.924.211,00	$ 3.088.242,00	$ 2.266 374,00	$ -	$ 11.775 055,00
UTILIDAD			4,0%	$ 5.813.860,00	$ 4.171.057,00	$ 15.696.841,00	$ 12.352.969,00	$ 9.065.496,00	$ -	$ 47.100.222,00
TOTAL				$ 199.807.826,00	$ 143.348.787,00	$ 539.461.178,00	$ 424.540.668,00	$ 311.558.436,00	$ -	$ 1.618.716.895,00

VALOR CONTRATO INICIAL + ADICIÓN NO.1										$ 3.925.355.240,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR										$ 2.306.638.345,00

POR EL CONTRATISTA:


Firma:
Nombre: VIVIANA ANDREA RODRÍGUEZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUES VERDES

POR LA INTERVENTORÍA:


Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER RUU PARQUES


Por la Entidad:


Firma:
Nombre: DIANA CAROLINA SANCHEZ
ALCALDESA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE




| | | |



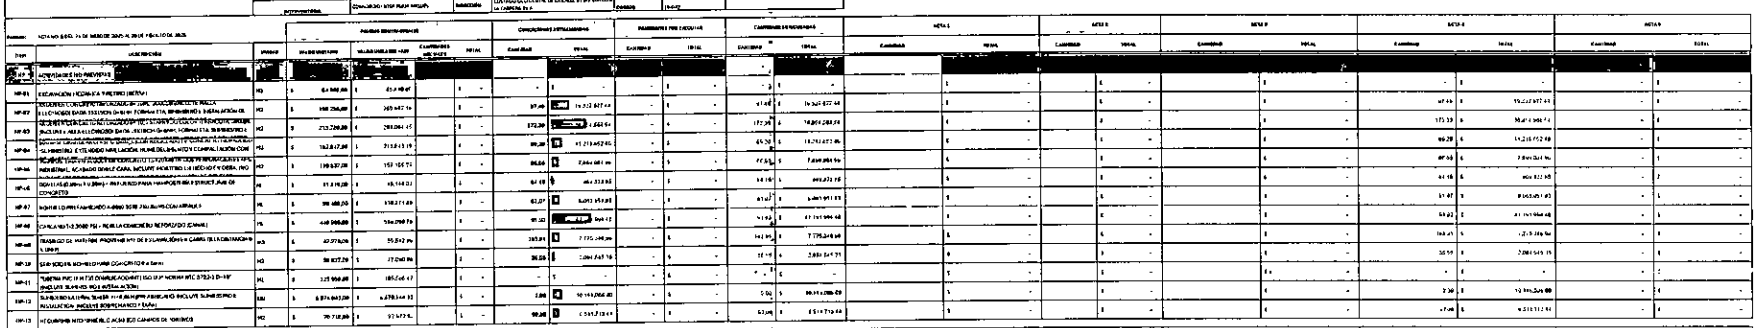





ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0


CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA IV, V Y VI CODIGO 18-042			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM: 10	Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto			M2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
1	MURO DE CONTENCIÓN ORIENTAL	38,90		0,55	1,00	21,40
	MURO DE CONTENCIÓN NORTE	13,96		0,20	1,00	2,79
	MURO DE CONTENCIÓN OCCIDENTAL	39,07		0,55	1,00	21,49
	DESCUENTO POR ACCESO PEATONAL	3,35		0,55	1,00	1,84
5	MURO MAMPOSTERIA DE CONCRETO, ALTURA PROMEDIO	14,70		0,70	1,00	10,29
	MURO MAMPOSTERIA DE CONCRETO	9,67		0,70	1,00	6,77
	MURO MAMPOSTERIA DE CONCRETO	6,00		0,70	1,00	4,20
	MURO CONTENCIÓN RAMPA NORTE	3,10		0,20	1,00	0,62
	MURO CONTENCIÓN RAMPA NORTE	1,83		0,20	1,00	0,37
				SUBTOTAL	66,08	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	66,08	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

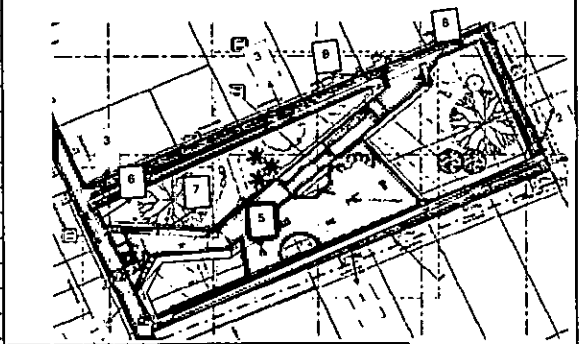





Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arambula Curres	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
T.P.	79939003	T.P.	70202-245269 TLM

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024

VERSIÓN
1.0


CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FOLIUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA IV, V Y VI CODIGO 18-042			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES	ÍTEM	80	Juego biosaludable bicicleta inclusiva sum+inst			UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	JUEGO BIOSALUDABLE INCLUSIVO				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	1,00	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	1,00	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

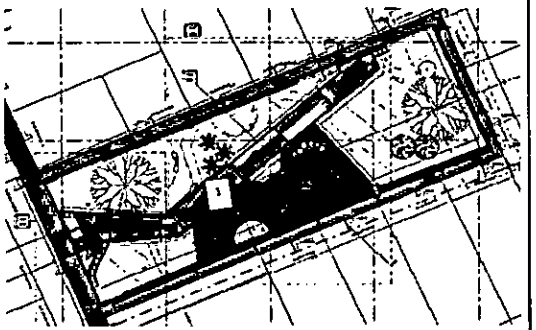



Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Cuevas	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
T.P.	79930003	T.P.	70202-246269 TLM

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE · BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0


CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA IV, V Y VI CODIGO 18-042			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES	ÍTEM :	83	Señal idg-s 1 cara (sum + inst)		.	UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
1	SEÑALIDGS PARQUE QUIROGA 042				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	2,00	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	2,00	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

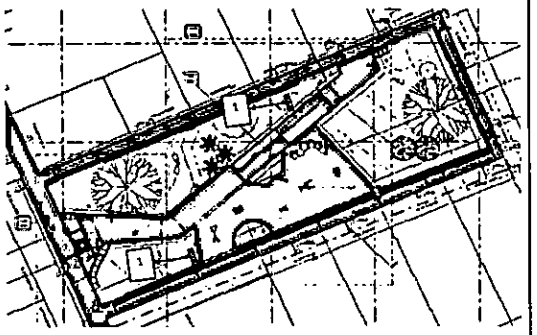



Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Currea	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
T.P.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM


	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	DE	1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES					
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA IV, V Y VI CODIGO 18-042			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES	ÍTEM,	84	Señal Idg-s 2 caras (sum + inst)				UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
1	SEÑAL IDGS 2 CARAS PARQUE QUIROGA 042				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	2,00	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	2,00	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

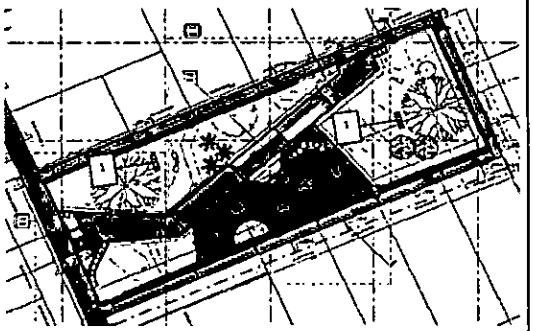



Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arambula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
T.P.	79939003	T.P.	70202-246209 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ · RAFAEL URIBE URIBE	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0


CONSORCIO PARQUES VERDES


OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA IV, V Y VI CODIGO 18-042			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES	ÍTEM°	65	Señal identificacion general IDRD			UN


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
1	SEÑAL IDENTIFICACIÓN GENERAL PARQUE QUIROGA 042				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	1,00	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	1,00	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL


LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

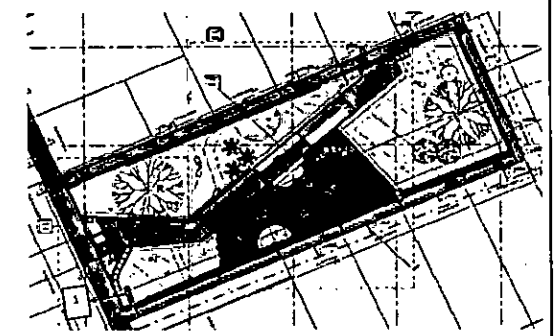





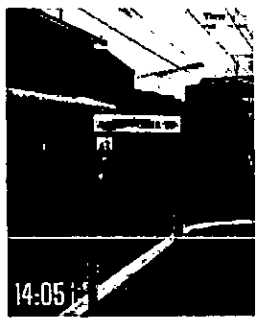

Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
T.P.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM

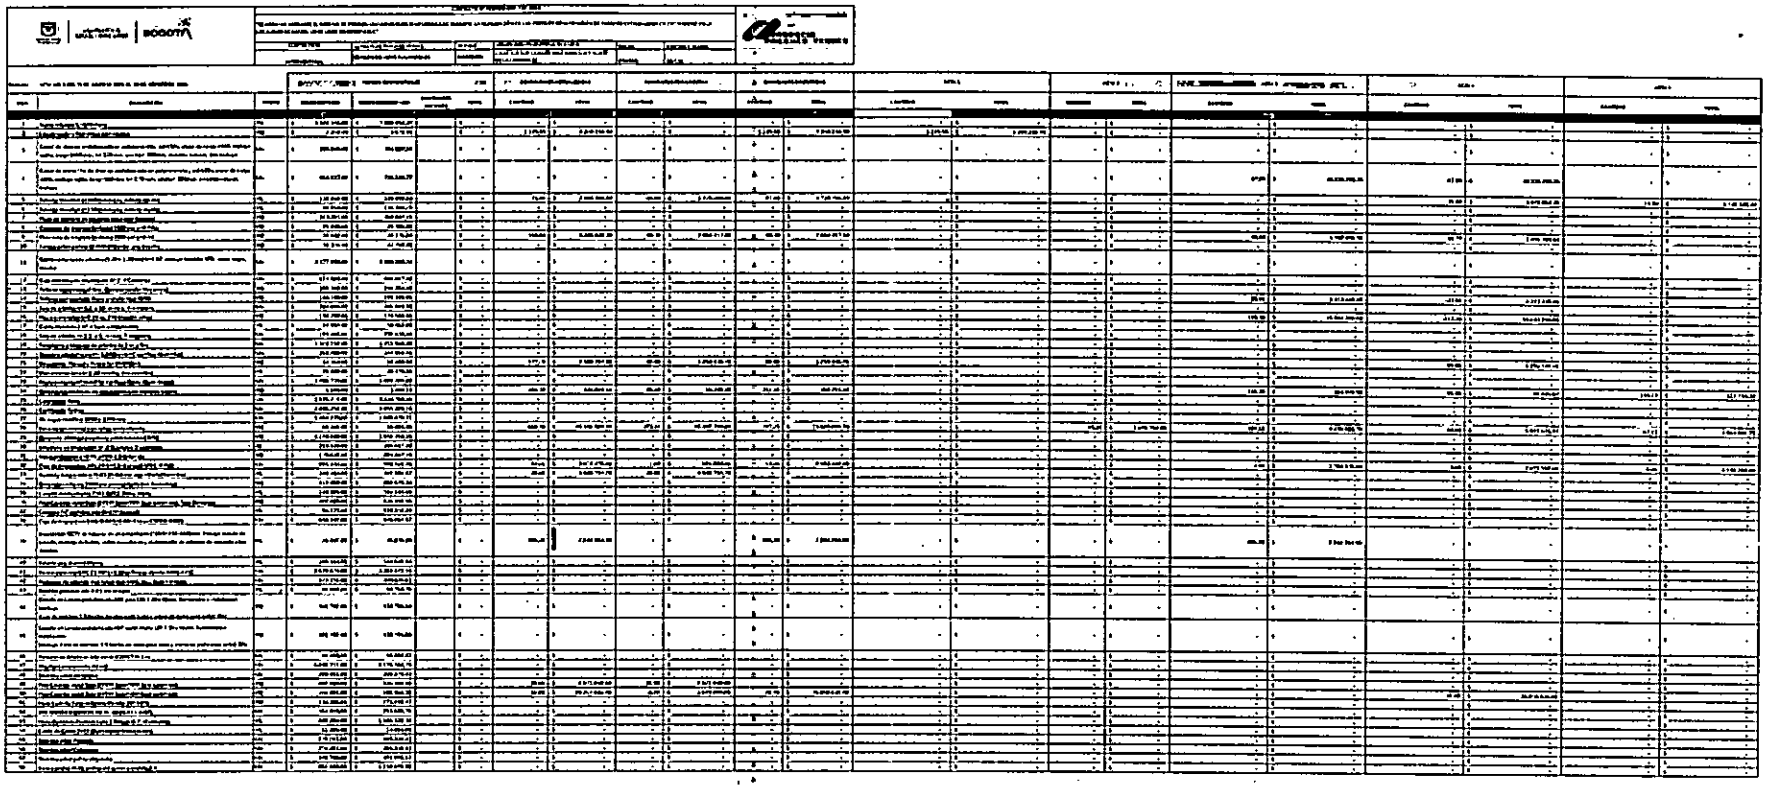



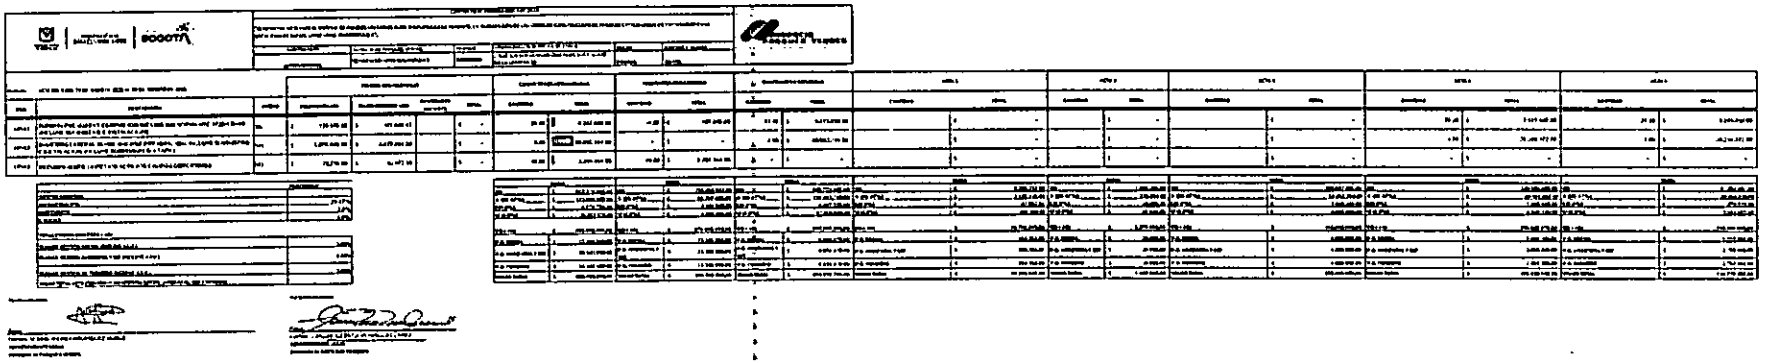

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	6	Tuberia Novafort d=160mm exca y relleno recebo			ML

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
1	Caja 10 a pozo occidental	7,20			1,00	7,20
2	Sumidero 7 a pozo occidental	3,85			1,00	3,85
3	Caja 9 a colector occidental	7,20			1,00	7,20
4	Caja 8 a colector occidental	7,60			1,00	7,60
5	caja 11 a colector occidental	7,20			1,00	7,20
6	caja 12 a colector occidental	7,80			1,00	7,80
7	Caja 13 a pozo occidental	7,15			1,00	7,15
8	sumidero 6 a pozo occidental	3,80			1,00	3,80
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	51,80	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	51,80	

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA





NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Curraa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante Legal Interventoria	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM


ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES


OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	24	Compactación fondo de excavación con equipos Liviano			M2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	COMPACTACIÓN ANDÉN COSTADO SUROCCIDENTAL	41,00	1,20		1,00	49,20
	COMPACTACIÓN ANDÉN COSTADO OCCIDENTAL	13,15	1,20		1,00	15,78
	COMPACTACIÓN ANDÉN COSTADO NOROCCIDENTAL	41,10	1,20		1,00	49,32
	AMPLIACIÓN COSTADO SUROCCIDENTAL	5,20	0,40		1,00	2,08
	AMPLIACIÓN COSTADO NOROCCIDENTAL	5,60	0,58		1,00	3,25
	DESCUENTOS					-
	Caja 10	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	Caja 9	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	Caja 8	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	caja 11	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	caja 12	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	Caja 13	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	115,79	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	115,79	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

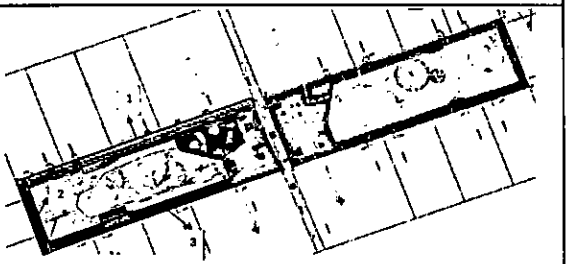



Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-240269 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	DE	1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES		FDLRUU			
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM 28		Excavacion manual con retiro suelo blando			M3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
1	Caja 10 a pozo occidental	7,20	0,85	1,00	1,00	6,12
2	Sumidero 7 a pozo occidental	3,85	0,85	1,00	1,00	3,27
3	Caja 9 a colector occidental	7,20	0,85	1,25	1,00	7,65
4	Caja 8 a colector occidental	7,60	0,85	1,25	1,00	8,08
5	caja 11 a colector occidental	7,20	0,85	1,25	1,00	7,65
6	caja 12 a colector occidental	7,80	0,85	1,25	1,00	8,29
7	Caja 13 a pozo occidental	7,15	0,85	1,25	1,00	7,60
8	sumidero 8 a pozo occidental	3,80	0,85	1,25	1,00	4,04
9	sumidero 6	1,40	1,40	1,16	1,00	2,27
10	sumidero 7	1,60	1,30	1,40	1,00	2,91
11	sumidero 8	1,60	1,30	1,20	1,00	2,50
12	sumidero 9	2,50	1,30	1,50	1,00	6,75
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	67,12	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	67,12	

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA







NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL


Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Ardenanda Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM 32	Caja de inspeccion .60x.60 h=1,5 +Excav(ESPEC/IDRD)			UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA #8 CALLE 32B SUR #22-19				1,00	1,00
	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA #9 CALLE 32B SUR #22-31				1,00	1,00
	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA #10 CALLE 32B SUR #22-37				1,00	1,00
	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA #11 CALLE 32 B SUR #22-20				1,00	1,00
	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA #12 CALLE 32B SUR #22-30				1,00	1,00
	CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA #13 CALLE 32 B SUR #22-36				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	6,00	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	6,00	

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

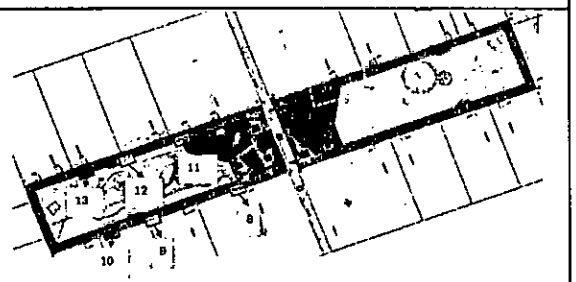





NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Cuervo	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246769 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES


OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM 67		Juego biosaludable caminador aereo sum+inst		UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	CAMINADOR AEREO				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	1,00	
				ACTA ANTERIOR	0,50	
				TOTAL	0,50	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA



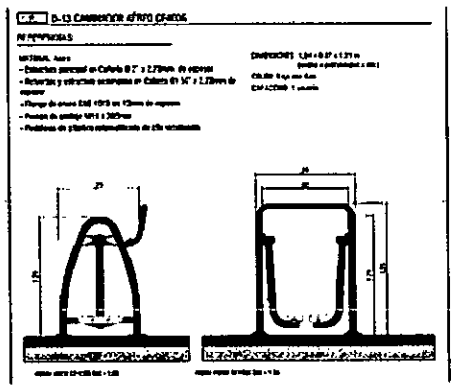

Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arambula Cortes	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-240269 TLM


ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES


OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	73	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al			UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
9	MODULO DORSAL				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	1,00	
				ACTA ANTERIOR	0,50	
				TOTAL	0,50	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

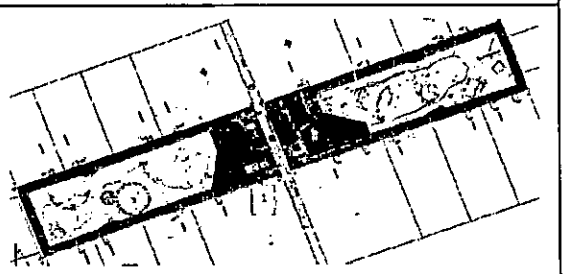

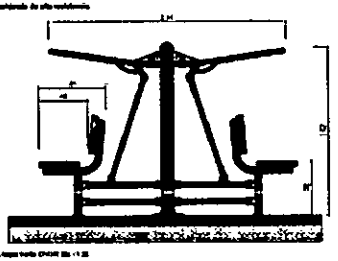


Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Cuervo	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM


ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES	5	ÍTEM	76	Juego biosaludable caballgata cf-4013 um+inst		UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	JUEGO BIOSALUDABLE CABALGATA				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	1,00	
				ACTA ANTERIOR	0,50	
				TOTAL	0,50	

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

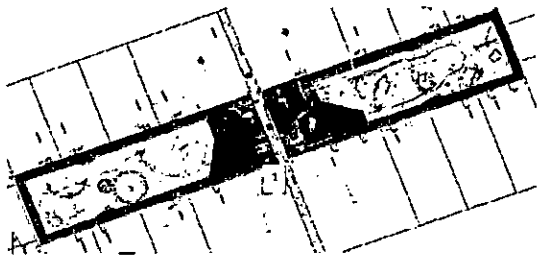



NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Cairas	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoria	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES


OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-128			Periodo:	ACTA NO. 6 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES			ÍTEM	77	Juego biosaludable hombros y brazo inclusiva sum+inst		UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	JUEGO BIOSALUDABLE HOMBROS Y BRAZOS				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	1,00	
				ACTA ANTERIOR	0,50	
				TOTAL	0,50	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA





Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arismendi Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024

VERSIÓN 1.0


CONSORCIO PARQUES VERDES


OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	FOLIO 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES		DE	1	
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM 60	Juego biosaludable bicicleta inclusiva sum+inst			UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
9	JUEGO BIOSALUDABLE HOMBROS Y BRAZOS				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	1,00	
				ACTA ANTERIOR	0,50	
				TOTAL	0,50	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

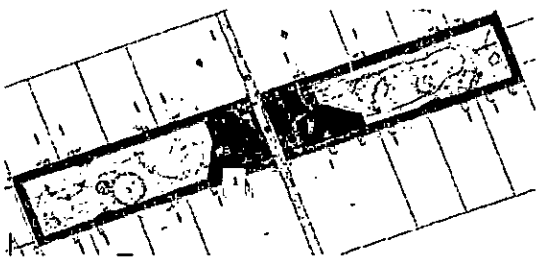

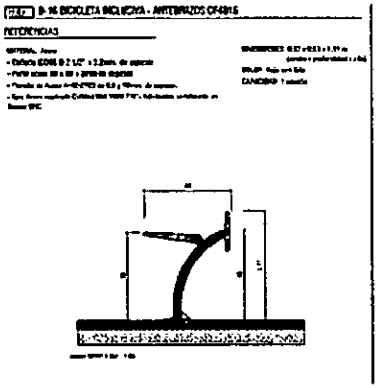

Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM


ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE · BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	92	Demol. manual anden + bordillo incl. cargue-ret			M2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	DEMOLICIÓN SUMIDEROS EXISTENTES	5,00	1,00	1,00	4,00	20,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	20,00	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	20,00	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

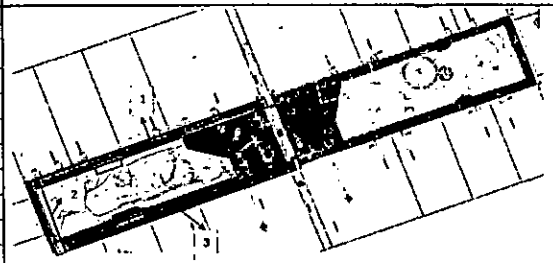





Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Currea	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	DE 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERRUU PARQUES				
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM 100		Geotextil NT2500		M2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	GEOTEXTIL ANDÉN COSTADO SUROCCIDENTAL	41,00	1,20		1,00	49,20
	GEOTEXTIL ANDÉN COSTADO OCCIDENTAL	13,15	1,20		1,00	15,78
	GEOTEXTIL ANDÉN COSTADO NOROCCIDENTAL	41,10	1,20		1,00	49,32
	AMPLIACIÓN COSTADO SUROCCIDENTAL	5,20	0,40		1,00	2,08
	AMPLIACIÓN COSTADO NOROCCIDENTAL	5,60	0,58		1,00	3,25
	DESCUENTOS					-
	Caja 10	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	Caja 9	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	Caja 8	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	caja 11	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	caja 12	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	Caja 13	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	115,78	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	115,78	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA







Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Gurrea	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	DE	1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RIUU PARQUES					
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	NP-03	ANDEN EN CONCRETO REFORZADO e=.10, ESTAMPADO COLOR TERRACOTA, 3000psi (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM D=6MM, FORMALETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO, CURADOR DE CONCRETO, VIBRADOR DE CONCRETO.		M2	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	ANDÉN COSTADO SUROCCIDENTAL	41,00	1,20		1,00	49,20
	ANDÉN COSTADO OCCIDENTAL	13,15	1,20		1,00	15,78
	ANDÉN COSTADO NOROCCIDENTAL	41,10	1,20		1,00	49,32
	AMPLIACIÓN COSTADO SUROCCIDENTAL	5,20	0,40		1,00	2,08
	AMPLIACIÓN COSTADO NOROCCIDENTAL	5,60	0,58		1,00	3,25
	DESCUENTOS					-
	Caja 10	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	Caja 9	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	Caja 8	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	caja 11	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	caja 12	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
	Caja 13	0,80	0,80		-1,00	- 0,64
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	115,79	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	115,79	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA





Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante Legal Interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0

CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	DE	1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES		FOLRUU			
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	NP-04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBC_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON COMPACTADOR MECÁNICO			M3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	ANDÉN COSTADO SUROCCIDENTAL	41,00	1,20	0,20	1,00	8,84
	ANDÉN COSTADO OCCIDENTAL	13,15	1,20	0,20	1,00	3,16
	ANDÉN COSTADO NOROCCIDENTAL	41,10	1,20	0,20	1,00	9,86
	AMPLIACIÓN COSTADO SUROCCIDENTAL JUNTO A POSTE	5,70	0,40	0,20	1,00	0,47
	COSTADO NOROCCIDENTAL NOROCCIDENTAL JUNTO A POSTE	5,60	0,58	0,20	1,00	0,65
	DESCUENTOS					-
	Caja 10	0,80	0,80	0,20	-1,00	- 0,13
	Caja 9	0,80	0,80	0,20	-1,00	- 0,13
	Caja 8	0,80	0,80	0,20	-1,00	- 0,13
	caja 11	0,80	0,80	0,20	-1,00	- 0,13
	caja 12	0,80	0,80	0,20	-1,00	- 0,13
	Caja 13	0,80	0,80	0,20	-1,00	- 0,13
	TUBERIA					-
1	Caja 10 a pozo occidental	7,20	0,85	0,25	1,00	1,53
2	Sumidero 7 a pozo occidental	3,85	0,85	0,25	1,00	0,82
3	Caja 9 a colector occidental	7,20	0,85	0,25	1,00	1,53
4	Caja 8 a colector occidental	7,60	0,85	0,25	1,00	1,62
5	caja 11 a colector occidental	7,20	0,85	0,25	1,00	1,53
6	caja 12 a colector occidental	7,80	0,85	0,25	1,00	1,66
7	Caja 13 a pozo occidental	7,15	0,85	0,25	1,00	1,52
8	sumidero 6 a pozo occidental	3,80	0,85	0,25	1,00	0,81
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	34,17	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	34,17	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA






Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Cuitiva	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-248769 TLM


ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FOLIO		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERFOLIOS PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	NP-10	SERVICIO DE BOMBEO PARA CONCRETO 0 a 60 m		M3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	ANDÉN COSTADO SUROCCIDENTAL	41,00	1,20	0,10	1,00	4,92
	ANDÉN COSTADO OCCIDENTAL	13,15	1,20	0,10	1,00	1,58
	ANDÉN COSTADO NOROCCIDENTAL	41,10	1,20	0,10	1,00	4,93
	COSTADO SUROCCIDENTAL	5,20	0,40	0,10	1,00	0,21
	COSTADO NOROCCIDENTAL	5,60	0,58	0,10	1,00	0,32
	DESCUENTOS					-
	Caja 10	0,80	0,80	0,10	-1,00	- 0,06
	Caja 9	0,80	0,80	0,10	-1,00	- 0,06
	Caja 8	0,80	0,80	0,10	-1,00	- 0,06
	caja 11	0,80	0,80	0,10	-1,00	- 0,06
	caja 12	0,80	0,80	0,10	-1,00	- 0,06
	Caja 13	0,80	0,80	0,10	-1,00	- 0,06
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	11,58	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	11,58	

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

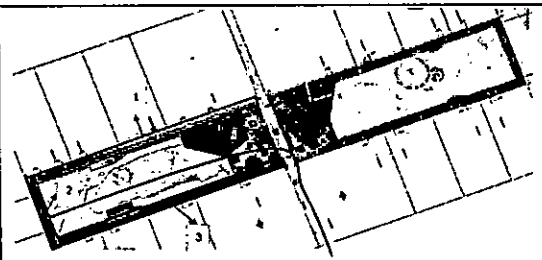





NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79539003	T.P.	70202-246209TLM


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ / RAFAEL URIBE URIBE	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	NP-11	TUBERÍA PVC U.M EXT CORRUGADO/INT LISO U.M NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ML

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
	COLECTOR OCCIDENTAL 10"	26,20			1,00	26,20
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	26,20	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	26,20	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

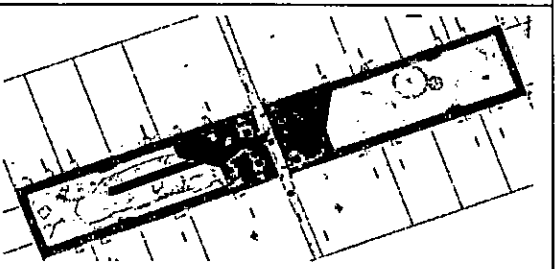





Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arbeláez Gurrea	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM


ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE · BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES


OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	DE 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	FDLRUU			
FRENTE DE OBRA	URBANIZACIÓN QUIROGA VII ETAPA 18-138			Periodo:	ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM NP-12		SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0,85M (PRFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBREMARCO Y TAPA)		UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
	SUMIDERO NOROCCIDENTAL #5				1,00	1,00
	SUMIDERO NOROCCIDENTAL #8				1,00	1,00
	SUMIDERO SUROCCIDENTAL #6				1,00	1,00
	SUMIDERO SUROCCIDENTAL #7				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	4,00	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	4,00	

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA







NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Currea	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM

RAFAEL OSPINA LIZ SRL | BOGOTÁ

CONTRATO Nº 1519-2024 CDP 747 2024

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	PARQUE	LAGUNA LA PRADERA	PLAZO	8 MESES Y 15 DIAS
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS PARQUES	DIRECCIÓN	CARRERA 13 CON CALLE 48J SUR COSTADO NORORIENTAL	CORTE	15-100

Periodo: ACTA NO. 6 21 DE JULIO DE 2026 AL 20 DE AGOSTO DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIOS CONTRACTUALES		CANTIDADES ADICIONES	TOTAL	CANTIDADES ACTAS ANTERIORES		PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS		ACTA 6		ACTA 5	
			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO +AIU			CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1	Acero estructural fy=6000kg/cm2	TN	$ 9.342.864,00	$ 7.973.454,37	$ -	$ -	-	$ -	-1,00	$ -9.341.863,13	3,68	$ 29.341.863,13	2,53	$ 13.845.464,48	1,27	$ 5.701.308,84
2	Lac de cubierta y Pergolado con capilla	M2	$ 7.350,00	$ 9.673,56	$ -	$ -	2.993,00	$ 22.836.382,68	-488,11	$ 4.366.329,48	3.685,00	$ 27.121.588,09	-	$ -	-	$ -
3	Canal de drenaje prefabricado en policoncreto, tipo 150x, diseño de carga 6400, incluye rejilla, longitud 1000 mm, h= 270 mm, ancho= 200mm, en color natural, (no incluye)	UN	$ 293.646,00	$ 368.367,58	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	Canal de drenaje prefabricado en policoncreto , tipo 150x, diseño de carga 6400, incluye rejilla, longitud 1000 mm, h= 270 mm, ancho= 200mm, en color natural, incluye	UN	$ 664.127,00	$ 728.198,77	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	Tubería filtrante d= 160mm incl o y relleno reciclo	ML	$ 198.908,00	$ 345.889,63	$ -	$ -	36,00	$ 3.997.000,00	36,00	$ 3.997.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	Tubería filtrante d=110mm incl o y relleno reciclo	ML	$ 89.954,00	$ 308.278,75	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	Muro de contención en gaviones en piedra [Incluido]	M3	$ 373.795,00	$ 450.697,15	$ -	$ -	277,93	$ [redacted]	277,93	$ 103.777.929,17	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	Concreto de limpieza (solados) 1500 psi e=5 cm.	M2	$ 21.476,00	$ 76.165,08	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	Concreto de limpieza (solados) 2500 psi e=5 cm	M2	$ 26.632,00	$ 38.278,63	$ -	$ -	132,93	$ 3.746.777,76	46,56	$ 1.323.577,82	219,99	$ 6.869.358,60	161,73	$ 4.206.171,76	48,61	$ 1.649.647,53
10	Concreto de limpieza (solados) 2500 psi e=5 cm	M2	$ 36.738,00	$ 47.705,47	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	Contenedor cub en arbolito (1.10 x 1.30 m) h= 1.57 ,incluye bandeja ATR, tierra negra, escoba	UN	$ 2.177.653,00	$ 2.863.273,34	$ -	$ -	1,00	$ 3.177.663,00	1,00	$ 2.177.663,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa	UN	$ 674.983,00	$ 806.867,42	$ -	$ -	8,00	$ 4.847.358,00	8,00	$ 4.847.358,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13	Relleno capa manual [Rec. Compactación Manual]	M3	$ 158.762,00	$ 204.294,42	$ -	$ -	131,00	$ 20.357.422,00	131,00	$ 20.353.423,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	$ 148.198,00	$ 192.183,86	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-11,96	$ 1.688.848,80	-	$ -
15	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incl. Transporte	UN	$ 324.655,00	$ 426.823,93	$ -	$ -	2,00	$ 649.310,00	2,00	$ 649.310,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	Placa anti ruido h=0.15 m, 250 kg/m2+ acero	M2	$ 132.782,00	$ 174.588,58	$ -	$ -	159,39	$ 21.164.122,98	159,39	$ 21.164.122,98	-	$ -	-57,79	$ 7.673.471,78	-	$ -
17	Capa Asfaltica 2 1/2" E. Base e Imprimación	M2	$ 14.894,00	$ 19.582,82	$ -	$ -	97,00	$ 1.475.988,00	97,00	$ 1.475.988,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incl. Transporte	UN	$ 988.456,00	$ 777.978,00	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	Transplante y bloqueo de arboles de 2 m a 5m	UN	$ 1.303.152,00	$ 1.711.938,23	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20	Bomba o arbol chicala h=1.70 (bomba+Cala+Pao Alimer Pet)	UN	$ 283.000,00	$ 344.569,61	$ -	$ -	1,00	$ 283.000,00	1,00	$ 283.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	Demarcación Manual y Pintura h=10-15CM	M2	$ 14.094,00	$ 18.488,94	$ -	$ -	1.101,00	$ 15.484.464,00	1.101,00	$ 15.484.464,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	Cerramiento tipo h= 2.20 metalico, Pre-montaje	ML	$ 25.450,00	$ 33.678,06	$ -	$ -	216,00	$ 5.499.634,00	216,00	$ 5.499.634,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	Poste concreto/PP 20 cm 0.10 h=9.5cm Cono [Tipo Inverti]	UN	$ 1.406.725,00	$ 1.936.304,42	$ -	$ -	6,00	$ 8.400.374,00	6,00	$ 8.400.374,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	Cimentación base de estructuras con equipos fotovo	UN	$ 1.983,00	$ 1.450,11	$ -	$ -	1.991,00	$ 1.214.403,00	623,00	$ 930.643,27	367,41	$ 254.883,73	-	$ -	299,63	$ 231.798,86
25	Cerrito sala Pedro	UN	$ 2.536.715,00	$ 3.222.766,45	$ -	$ -	1,00	$ 2.536.766,00	1,00	$ 2.536.716,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	Cerrito sala Santiago	UN	$ 3.056.256,00	$ 4.056.230,10	$ -	$ -	1,00	$ 3.056.256,00	1,00	$ 3.055.256,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	Alcantarillo sanitario 1200 + 1200 mm	UN	$ 1.464.273,00	$ 1.975.879,71	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	Pre-cuentas manual con retiro suelo blando	M3	$ 68.308,00	$ 88.881,55	$ -	$ -	406,72	$ 27.915.875,10	383,53	$ 26.176.908,36	29,48	$ 1.741.179,94	-151,12	$ 10.323.482,72	8,83	$ -
29	Concreto 3000 psi con aditivo retiro tol-ing CDRC	M3	$ 1.183.630,00	$ 1.656.388,15	$ -	$ -	1,81	$ 2.142.734,20	0,06	$ 71.020,76	1,75	$ 2.071.688,00	1,75	$ 2.071.688,00	-	$ -
30	Empalme en Domiciliar (9192) hasta 2 unidades	M	$ 219.530,00	$ 298.637,80	$ -	$ -	1,00	$ 219.530,00	1,00	$ 219.530,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	Adoquin Colores e=8 CM 20 Mpa A Determ	M2	$ 178.636,00	$ 224.337,78	$ -	$ -	56,48	$ 9.623.963,28	56,48	$ 9.623.963,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	Caja de inspección 60x 60 h=1.5+Esc ml (RPEC/IDRD)	UN	$ 691.634,00	$ 908.389,49	$ -	$ -	1,00	$ 1.387.068,00	1,00	$ 691.634,00	1,00	$ 691.634,00	1,00	$ 691.634,00	-	$ -
33	Escalón Amigo tubos H=40 (h=60) de cap. +Gancho Gum-Ind	ML	$ 348.454,00	$ 447.594,87	$ -	$ -	348,72	$ [redacted]	343,72	$ 81.954.088,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	Concreto ciclopeo 2500 psi premezclado (sin formaleta)	M3	$ 414.848,00	$ 533.673,34	$ -	$ -	63,95	$ 26.367.737,00	63,95	$ 26.367.737,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35	Canada electrica electrica PVC-DT47 Zona Verde	ML	$ 147.333,00	$ 187.114,60	$ -	$ -	98,00	$ 12.889.250,00	98,00	$ 12.889.250,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36	Piso Concreto reciclado 6cm (TPDH 1cm+SBH 3cm sum+imp), Tipo Diamante	M2	$ 427.630,00	$ 536.159,39	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37	Cubierta 3-C protección sol (A-120) [Incluido]	UN	$ 58.173,00	$ 118.596,44	$ -	$ -	6,94	$ 825.609,62	-6,39	$ -994.799,67	16,53	$ 1.820.389,68	-	$ -	10,53	$ 1.450.989,68
38	Caja de inspección 8 60x8 60 h=8.08+Esc ml (RPEC/IDRD)	UN	$ 643.547,00	$ 845.084,47	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
39	Instalación CCTV de subsuelo de alta profundidad (DN24-168-400)mm. Incluye tendido de tubería, montaje de bodes, video acoustico y elaboración de informe de entrega + los demás	ML	$ 35.647,00	$ 46.076,29	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40	Subsolo por dueno 110mm	ML	$ 109.954,00	$ 144.078,64	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41	Banca concreto CDC 21 MP t=1.93 m Segun diseño BANCA HC	UN	$ 2.573.674,00	$ 3.383.672,15	$ -	$ -	4,00	$ 10.295.496,00	2,00	$ 5.147.748,00	2,00	$ 5.147.748,00	-	$ -	-	$ -
42	Protector de arbol de alta tubos tipo ARL, ml, Sum + instala	UN	$ 373.136,00	$ 490.539,81	$ -	$ -	1,00	$ 373.136,00	1,00	$ 373.136,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	Bordillo prefabricado A 01 m/m de medio	ML	$ 68.982,00	$ 90.705,78	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-40,38	$ 2.923.301,12	-	$ -
44	Cerrete en Lamina prefabricada 456 guia (20 X 20 x 4) cm. Suministro e instalacion (incluye 4 cm de asentado 1:3 mezcla arena/cemento) + pintura (2 manos) IDU	M2	$ 101.703,00	$ 133.766,66	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
45	Cerrete en Lamina prefabricada 457 tipo III Alcorta (20 X 20 x 4) cm. Suministro e instalacion (incluye 4 cm de asentado 1:3 mezcla arena/cemento) + pintura (2 manos) IDU	M2	$ 101.703,00	$ 133.766,66	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
46	Protección Arbol con arbi verde (CDRC) H 1 m	UN	$ 66.083,00	$ 86.892,47	$ -	$ -	24,00	$ 1.586.232,00	24,00	$ 1.586.232,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47	Alquiler Campamentos 40 m2	UN	$ 5.236.713,00	$ 6.178.366,75	$ -	$ -	1,00	$ 6.236.713,00	1,00	$ 6.236.713,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	Sombra arbol energetico	UN	$ 266.581,00	$ 350.573,43	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	Piso Concreto reciclado 3cm (TPDH 1cm+SBH 2cm sum+imp)	M2	$ 427.629,00	$ 574.160,96	$ -	$ -	164,00	$ 72.027.288,00	64,00	$ 27.377.280,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50	Piso Concreto reciclado 8cm (TPDH 1cm+SBH 7cm sum+imp)	M2	$ 708.691,00	$ 929.988,33	$ -	$ -	43,88	$ 30.961.202,80	43,88	$ 30.961.202,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
51	Muro Lateral Tipo Reciclado con Concreto 20* 10*5	M2	$ 130.309,00	$ 171.426,67	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	RELLENO EN CONCRETO H - 20 [SUM + INST]	UN	$ 264.973,00	$ 315.676,78	$ -	$ -	5,00	$ 829.058,00	2,00	$ 410.847,30	2,00	$ 410.847,30	-	$ -	-	$ -
53	Piso Concreto Premezclado 3.500psi G.r. +formaleta	ML	$ 803.308,00	$ 1.188.173,34	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	Cable de Cobre 7x12 [Suministro+Instalación]	ML	$ 11.308,00	$ 14.864,00	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	Sombra arbol Pobogoto	UN	$ 278.281,00	$ 366.236,42	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	Sombra arbol Caballonia	UN	$ 278.281,00	$ 366.236,42	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	Sombra arbol palma alejandra	UN	$ 343.768,00	$ 451.826,13	$ -	$ -	5,00	$ 1.718.768,00	5,00	$ 1.718.768,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58	Banca peatonal H-31 sin Espald sentada empotrada 1.5	UN	$ 851.829,00	$ 1.119.675,29	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59	Banca peatonal H-30 con espald sentada empotrada 1.5	UN	$ 838.398,00	$ 1.099.588,09	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
60	Cubierta Apoyo Impermeable H-127 [sentado a nivel +]	UN	$ 611.948,00	$ 803.946,89	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
61	Tienda gimnasio grama y herramienta [SUM + INST]	UN	$ 3.043.647,00	$ 4.000.676,64	$ -	$ -	1,00	$ 3.043.647,00	0,58	$ 1.621.273,58	0,58	$ 1.621.273,58	-	$ -	-	$ -
62	Juego INFANTIL DE DISCAPACITADOS [SUM + INST]	UN	$ 3.424.211,00	$ 4.967.945,78	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63	Juegos infantiles H-56 Colompia [Sum+Instal] 4.75m	UN	$ 581.926,00	$ 858.884,74	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ

CONTRATO Nº 1-DLRUU-CDP-747-2024

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C"

CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	PARQUE	URBANIZACIÓN TARAZOTA I	PLAZO	6 MESES Y 15 DIAS
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	DIRECCIÓN	CARRERA 5Z CON CALLE 48U SUR COSTADO NORORIENTAL	CÓDIGO	18-180

CONSORCIO PARQUES VERDES

Periodo: ACTA Nº5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIOS CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS		ACTA 4		ACTA 5	
			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO +AIU	CANTIDADES INICIALES	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
64	INSTALACION DOTACION GIRO CADERA (hetsler)	UN	$ 272.107,00	$ 357.736,07		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
65	MODULO TIMON VOLANTES (Sum+Instal) Giro manos	UN	$ 2.280.587,00	$ 2.998.287,73		$ -	1,00	$ 2.280.587,00	0,50	$ 1.140.293,50	0,50	$ 1.140.293,50	-	$ -		$ -
66	MULTIFUNCIONAL(F-7)Dos Tonos(4 Usuarios)Sum+Inst	UN	$ 28.564.687,00	$ 37.556.844,94		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
67	Juego biosaludable caminador aereo sum+inst	UN	$ 2.446.580,00	$ 3.216.514,73		$ -	2,00	$ 4.893.160,00	1,00	$ 2.446.580,00	1,00	$ 2.446.580,00	-	$ -		$ -
68	Barra kubi en concreto sin espaldar	UN	$ 3.520.331,00	$ 4.628.179,17		$ -	-	$ -	-14,00	-$ 46.284.634,00	14,00	$ 46.284.634,00	-	$ -		$ -
69	Banca MEOS Spartatus Pulbet A (sum+instal)	UN	$ 7.956.657,00	$ 10.513.204,56		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
70	Tobogan doble (~134	UN	$ 14.449.914,00	$ 18.997.301,94		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
71	Juego red araña G>12 años Cap 11 niños	UN	$ 115.204.389,00	$ 151.459.210,22		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
72	ESTACION DE AHORRO URBANO (Sum+Inst+Tramo)	UN	$ 5.000.913,00	$ 6.573.547,09		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
73	MODULO DORSAL PECTORAL (Suministro+Instal) Brazos el	UN	$ 3.386.407,00	$ 4.452.109,28		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
74	Juego biosaludable Pectorales cf4011 sum+inst	UN	$ 14.363.872,00	$ 19.541.203,84		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
75	Juego biosaludable caballista cf 4013 sum+inst	UN	$ 6.260.130,00	$ 8.230.192,91		$ -	2,00	$ 12.520.260,00	1,00	$ 6.260.130,00	1,00	$ 6.260.130,00	-	$ -		$ -
76	Juego biosaludable caballista cf-4013 sum+inst	UN	$ 6.425.295,00	$ 8.447.335,34		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
77	Juego biosaludable hombros y brazo incluisva sum+inst	UN	$ 6.064.805,00	$ 7.973.400,45		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
78	Juego biosaludable hombros y brazos incluisvo cf 4017 sum+inst	UN	$ 19.134.133,00	$ 25.156.644,66		$ -	1,00	$ 19.797.696,00	1,00	$ 19.797.696,00	-	$ -	-	$ -		$ -
79	Juego biosaludable cf 4015 bicicleta manual sum+inst	UN	$ 16.797.696,00	$ 22.077.225,95		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
80	Juego biosaludable bicicleta inclusiva sum+inst	UN	$ 16.792.504,00	$ 22.077.225,95		$ -	1,00	$ 16.792.504,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
81	Juego biosaludable bicicleta manual inclusiva cf4015 sum+inst	UN	$ 16.746.041,00	$ 22.016.020,59		$ -	1,00	$ 16.746.041,00	0,50	$ 8.373.020,50	0,50	$ 8.373.020,50	-	$ -		$ -
82	Derivación para circuito exclusivo de A.P. desde la red aérea abierta de B.T existente.	IG	$ 269.582,00	$ 341.272,46		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
83	Señal idg < 1 cara (sum + Inst)	UN	$ 597.386,00	$ 785.305,21		$ -	5,00	$ 2.986.975,00	5,00	$ 2.986.975,00	-	$ -	-	$ -		$ -
84	Señal idg ≤ 2 caras (sum + Inst)	UN	$ 522.570,00	$ 687.022,75		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
85	Señalización general IDRD	UN	$ 1.017.897,00	$ 1.338.229,19		$ -	1,00	$ 1.017.897,00	1,00	$ 1.017.897,00	-	$ -	-	$ -		$ -
86	Tala de arboles h= 10.1 a 15 m.mech, Transporte	UN	$ 489.692,00	$ 658.945,97		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
87	Anillo cuneipc cassion e=0.19 d=<1.3 3000 psi	M3	$ 1.253.779,00	$ 1.648.143,25		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
88	Arandela vanilla cooper weld 5/8" y 1 Pin (Hemp)	UN	$ 447.296,00	$ 588.052,16		$ -	6,00	$ 2.683.740,00	6,00	$ 2.683.740,00	-	$ -	-	$ -		$ -
89	Baranda H-82(Pasam2"+ Travs-2"-2Travs1.5")CHU	ML	$ 244.063,00	$ 320.868,63		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
90	Bluzo sencillo Luminaria - Suministro - Montaje e Instalación	UN	$ 154.273,00	$ 202.822,73		$ -	6,00	$ 925.638,00	6,00	$ 925.638,00	-	$ -	-	$ -		$ -
91	Caisson retieno (Concret 4000psi bombeado) d=1.2	M3	$ 562.244,00	$ 739.182,19		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
92	Demol. manual anden + bordillo incl. cargue+el.	M2	$ 31.185,00	$ 40.998,92		$ -	100,00	$ 3.118.500,00	33,15	$ 1.033.782,75	66,85	$ 2.084.717,25	-	$ -		$ -
93	Demolic Muro 0.15-Teteia (Tral+relt+Andenes)	M2	$ 23.362,00	$ 30.835,14		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
94	Desmonte y reinstalación de luminaria de alumbrado público	UN	$ 184.372,00	$ 242.303,87		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
95	Filtro geodren plano/ tuberia 100 mm h=2.0	ML	$ 137.793,00	$ 181.156,46		$ -	120,00	$ 16.535.160,00	120,00	$ 16.535.160,00	-	$ -	-	$ -		$ -
96	Fotocelda - Suministro e Instalación	UN	$ 29.736,00	$ 39.093,92		$ -	6,00	$ 178.416,00	6,00	$ 178.416,00	-	$ -	-	$ -		$ -
97	Muro contención concreto 28 MPA 4000 psi V1C e= 35	M3	$ 1.028.859,00	$ 1.352.640,93		$ -	61,12	$ 62.883.862,08	61,12	$ 62.883.862,08	44,18	$ 45.454.099,62	16,94	$ 17.429.871,46		$ -
98	Alicatamiento Baja fenson ø 1 1/2 Galvanizado**	UN	$ 86.237,00	$ 87.081,78		$ -	35,00	$ 2.318.255,00	35,00	$ 2.318.255,00	-	$ -	-	$ -		$ -
99	Poda árboles+retiro <sin Bajo Grado Dificultad	UN	$ 133.304,00	$ 175.254,77		$ -	24,00	$ 3.199.296,00	24,00	$ 3.199.296,00	-	$ -	-	$ -		$ -
100	Geotextil NT2500	M2	$ 5.658,00	$ 7.435,94		$ -	454,00	$ 2.567.624,00	91,47	$ 517.354,32	362,53	$ 2.050.269,68	26,26	$ 148.526,56	276,48	$ 1.564.042,88
NP	[illegible]			$ -												
NP-01	EXCAVACIÓN MECANICA Y RETIRO (TIERRA)	M3	$ 84.968,00	$ 85.410,80		$ -	360,00	$ 23.387.760,00	-108,76	-$ 7.065.702,18	468,76	$ 30.453.462,18	405,61	$ 26.350.859,26	63,15	$ 4.102.602,90
NP-02	ANDEN EN CONCRETO REFORZADO e=.10m, 3000psi (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM DIGMM, FORMALETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO, OLVADOR DE CONCRETO, VIBRADOR DE	M2	$ 198.258,00	$ 260.847,18		$ -	-	$ -	-75,80	-$ 15.027.804,80	75,80	$ 15.027.804,80	-	$ -	75,80	$ 15.027.804,80
NP-03	ANDEN EN CONCRETO REFORZADO e=.10, ESTAMPADO COLOR TERRACOTA, 3000psi (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM DIGMM, FORMALETA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO,	M2	$ 213.788,00	$ 281.064,45		$ -	365,13	$ 78.058.692,18	177,75	$ 38.000.461,50	187,38	$ 40.058.230,68	57,79	$ 12.354.692,94	129,59	$ 27.704.537,74
NP-04	SUBBASE GRANULAR CLASE E (ISRC) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MECANICO	M3	$ 182.047,00	$ 213.043,19		$ -	24,00	$ 3.889.128,00	-38,31	-$ 6.208.020,57	62,31	$ 10.097.148,57	20,98	$ 3.304.138,33	41,92	$ 6.793.010,24
NP-05	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE 005 PERFORACIONES TIPO INDUSTRIAL, ACABADO DOBLE CARA, INCLUYE MORTERO 1:4 HIDROFUGADO, INCLUYE REFUERZO DE REFUERZO H	M2	$ 119.537,00	$ 157.155,29		$ -	1.100,00	$ 119.537.000,00	-112,88	-$ 13.490.945,82	113,88	$ 13.610.482,82	96,58	$ 11.542.492,72	17,30	$ 2.067.990,10
NP-06	DOVELAS (0.08m X 0.08m) + REFUERZO PARA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL DE CONCRETO	M	$ 11.519,00	$ 15.144,03		$ -	12.000,00	$ 138.228.000,00	-289,96	-$ 3.340.049,24	301,96	$ 3.478.277,24	254,84	$ 2.933.198,18	47,12	$ 545.079,06
NP-07	BORDILLO PREFABRICADO A-80(0.35X0.20X0.80M)-CON ATRAQUE	ML	$ 99.469,00	$ 130.771,68		$ -	6.000,00	$ 596.814.000,00	-240,86	-$ 23.958.103,34	246,86	$ 24.554.917,34	189,96	$ 18.895.131,24	56,90	$ 5.659.786,10
NP-08	CÁRCAMO T-2 3000 PSI + REJILLA CONCRETO REFORZADO (CANAL)	ML	$ 448.080,00	$ 589.090,78		$ -	7.000,00	$ 3.136.560,00	7,00	$ 3.136.560,00	-	$ -	-	$ -		$ -

[redacted]

	CONTRATO DE OBRA No. IDU-1420-2025						
	"CONTRATO DE OBRA (LLAVE EN MANO) A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROPIEDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C"						CONSERCOL PARQUES VERDES
	CONTRATISTA:	CONSERCOL PARQUES VERDES	PARQUE:	LA GRAN ESPERANZA II ETAPA	PLANO:	[illegible]	
	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAS PARQUES	DIRECCIÓN:	CARRERA 5C CON CALLE 48C SUR CATASTRAL NOMENCLATURA	CONTRATO:	20-1420	

Periodo: ACTA No. 0 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIOS CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS		ACTA 4		ACTA 5	
			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO +AIU	CANTIDADES ANTERIORES	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
NP-09	TRASIEGO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN EN CARRETILLA DISTANCIA 0 A 100 M	M3	$ 42.278,00	$ 55.282,89		$ -	3,00	$ 136.834,00	3,00	$ 136.834,00	-	$ -	-	$ -		$ -
NP-10	SERVICIO DE BOMBEO PARA CONCRETO 0 A 60 m	M3	$ 58.637,00	$ 77.090,08		$ -	-	$ -	-30,73	$ -1.315.645,81	30,73	$ 1.315.645,81	-	$ -	30,73	$ 1.315.645,81
NP-11	TUBERIA PVC U M ED T CORRUGADO/NT LISO U M NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 125.950,00	$ 165.586,47	5,00	$ 629.750,00	5,00	$ 629.750,00	5,00	$ 629.750,00	-	$ -	-	$ -		$ -
NP-12	SUMIDERO LATERAL SL-101, H=0.95M (PREFABRICADO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BOQUERAMARCO Y TAPA)	UN	$ 5.074.843,00	$ 6.670.844,33	1,00	$ 5.074.843,00	1,00	$ 5.074.843,00	1,00	$ 5.074.843,00	-	$ -	-	$ -		$ -
NP-13	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ACRÍLICO CAMPOS DEPORTIVOS	M2	$ 70.716,00	$ 92.972,95	1,00	$ 70.716,00	1,00	$ 70.716,00	1,00	$ 70.716,00	-	$ -	-	$ -		$ -

	PORCENTAJE	TOTAL
COSTOS DIRECTOS		$ -
ADMINISTRACIÓN	24,47%	$ -
IMPREVISTOS	1,0%	$ -
UTILIDAD	0,0%	$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU		$ -
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE A.I.U.)	3,00%	$ -
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST (INCLUYE A.I.U.)	3,00%	$ -
PLAN DE GESTIÓN DE TRÁNSITO (INCLUYE A.I.U.)	3,00%	$ -
VALOR TOTAL ACTA (COSTOS DIRECTOS + AIU + PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y TRÁNSITO)		$ -

	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL
CD	$ 676.720.529,00	CD	$ 329.271.000,00	CD	$ 276.641.723,00	CD	$ 330.914.136,00	CD	$ 91.909.809,00
A (24,47%)	$ 176.644.304,00	A (24,47%)	$ 80.586.467,00	A (24,47%)	$ 80.586.467,00	A (25%)	$ 91.317.367,00	A (25%)	$ 24.377.636,00
I (1,0%)	$ 6.967.296,00	I (1,0%)	$ 3.291.710,00	I (1,0%)	$ 2.866.417,00	I (1,0%)	$ 3.253.141,00	I (1,0%)	$ 870.000,00
U (0,0%)	$ 24.679.833,00	U (0,0%)	$ 23.271.193,00	U (0,0%)	$ 17.545.000,00	U (0,0%)	$ 4.722.906,00	U (0,0%)	$ 676.341,00
CD + AIU	$ 876.895.962,00	CD + AIU	$ 436.420.370,00	CD + AIU	$ 377.639.607,00	CD + AIU	$ 430.207.550,00	CD + AIU	$ 117.833.786,00
P.S. SOCIAL	$ 23.375.116,00	P.S. SOCIAL	$ 9.767.552,00	P.S. SOCIAL	$ 8.772.636,00	P.S. SOCIAL	$ 2.306.292,00	P.S. SOCIAL	$ 1.636.121,00
P.S. AMBIENTAL Y SST	$ 23.375.116,00	P.S. AMBIENTAL Y SST	$ 9.767.552,00	P.S. AMBIENTAL Y SST	$ 8.772.636,00	P.S. AMBIENTAL Y SST	$ 2.306.292,00	P.S. AMBIENTAL Y SST	$ 1.636.121,00
P.S. TRANSITO	$ 23.375.116,00	P.S. TRANSITO	$ 9.767.552,00	P.S. TRANSITO	$ 8.772.636,00	P.S. TRANSITO	$ 2.306.292,00	P.S. TRANSITO	$ 1.636.121,00
VALOR TOTAL	$ 950.869.310,00	VALOR TOTAL	$ 473.722.986,00	VALOR TOTAL	$ 405.956.795,00	VALOR TOTAL	$ 466.826.426,00	VALOR TOTAL	$ 126.343.218,00

Por el contratista:

Firma:
Nombre: VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUES VERDES

Por la interventoría:


Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ARIZABALETA ZUÑIGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIAS PARQUES

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERRUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-160			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM 1	Acero refuerzo fy=60000psi				TN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	SUBTOTAL (KG)
		# BARRA	LONGITUD ELEMENTO	PESO (KG/m)		
	ZONA DE BIOSALUDABLES SUPERIOR					
	longitudinales M1	3	8,00	0,56	20,00	67,20
	Verticales M1	4	2,50	1,00	62,00	155,00
	longitudinales M2	3	3,18	0,56	8,00	14,25
	Verticales M2	4	1,35	1,00	34,00	45,90
	longitudinales M3	3	2,18	0,56	14,00	17,09
	Verticales M3	4	1,79	1,00	24,00	42,96
	longitudinales M4	3	3,42	0,56	14,00	26,81
	Verticales M4	4	1,82	1,00	36,00	65,52
	longitudinales M5	3	3,59	0,56	14,00	28,15
	Verticales M5	4	1,77	1,00	38,00	67,26
	longitudinales M6	3	3,29	0,56	10,00	18,42
	Verticales M6	4	1,49	1,00	34,00	50,66
	longitudinales M7	3	4,03	0,56	2,00	4,51
	Verticales M7	4	1,05	1,00	42,00	44,10
	zarpa longitudinal m7	3	4,35	0,56	2,00	4,87

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

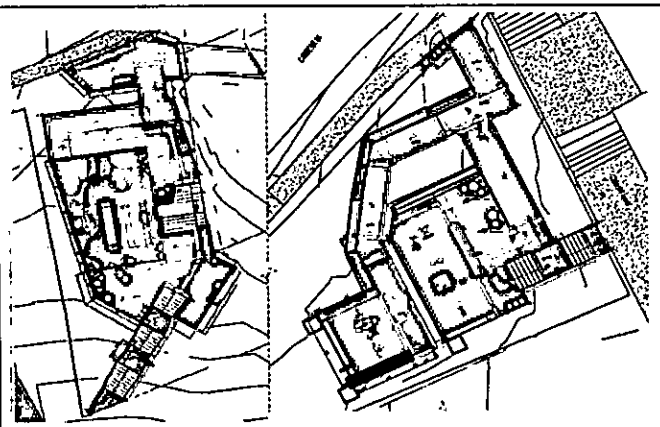

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	1	Acero refuerzo fy=60000psi			TN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES # BARRA	DIMENSIONES LONGITUD ELEMENTO	DIMENSIONES PESO (KG/m)	CANTIDAD	SUBTOTAL (KG)
	Zarpa transversal m7	4	0,65	1,00	44,00	28,60
	longitudinales M8	3	5,41	0,56	20,00	60,59
	Verticales M8	4	2,55	1,00	56,00	142,80
	zarpa longitudinal m8	3	5,41	0,56	2,00	6,06
	Zarpa transversal m8	4	0,70	1,00	56,00	39,20
	JUEGOS INFANTILES INFERIORES					-
	zarpa longitudinal muro en bloque de concreto	3	6,28	0,56	12,00	42,20
	Zarpa transversal muro en bloque de concreto	4	1,20	1,00	62,00	74,40
	zarpa longitudinal muro en bloque de concreto	3	2,20	0,56	6,00	7,39
	Zarpa transversal muro en bloque de concreto	4	0,60	1,00	22,00	13,20
						TOTAL KG
				SUBTOTAL	1,07	1067,15
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	1,07	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA





Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024

VERSIÓN 1.0


CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	DE	1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	FDLRUU				
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	B	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0.04			M2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	ZONA SUPERIOR BIOSALUDABLES					-
1	BORDILLO TERRRAZA 1	8,43	0,30		1,00	2,83
2	BORDILLO TERRRAZA 1	7,86	0,30		1,00	2,36
3	BORDILLO TERRRAZA 2	5,33	0,30		1,00	1,60
	MATERA EUCALIPTO	9,04	0,30		1,00	2,71
	ZONA INFERIOR INFANTILES					-
	BORDILLO TERRRAZA 3	7,78	0,30		1,00	2,33
	BORDILLO TERRRAZA 3 CAUCHO	17,46	0,30		1,00	5,24
	PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN MUROS					-
7	MURO TERRAZA 3 COSTADO NORTE	5,28	1,80		1,00	11,30
8	MURO TERRAZA 3 COSTADO NORTE	2,20	0,60		1,00	1,32
9	PARA VIGA DE CIMENTACIÓN MURO	5,46	2,00		1,00	10,92
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	40,61	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	40,61	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

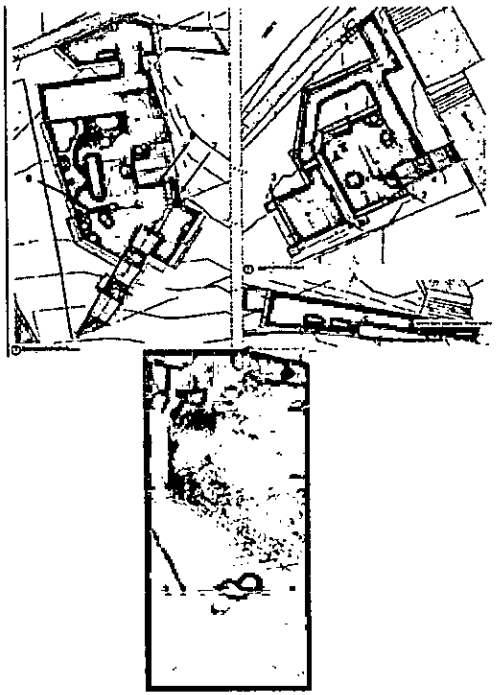


Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM


BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	NEGOCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".								
CONTRATO DE OBRA No.	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FOLIO				
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RIU PARQUES	HOJA	1	DE	1		
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 9 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025				
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	24	Compactación lenda de excavación con equipos livianos				M2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	BIOSALUDABLES					-
1	ESTRUCTURA PARA SENDERO	7,11	1,80		1,00	12,80
2	ESTRUCTURA PARA SENDERO	9,85	1,80		1,00	17,73
3	SENDERO EN TERRAZA 1	6,07	2,85		1,00	17,30
4	SENDERO EN TERRAZA 1	3,35	1,99		1,00	6,67
5	TERRAZA 1 BIOSALUDABLES	8,71	4,50		1,00	39,87
6	BAJO PLACA BIOSALUDABLES TERRAZA 2	6,30	6,30		1,00	28,41
7	EN DESCANSO ESCALERAS BIOSALUDABLES	1,55	1,85		1,00	3 02
8	EN DESCANSO ESCALERAS BIOSALUDABLES	1,50	1,90		1,00	2,84
9	PARA CINTAS DE AJUSTE ESCALERAS	1,90	0,10		10,00	1,06
	DESCUENTO MATERA EUCALIPTO TERRAZA 1					-
10	DESCUENTO MATTRA EUCALIPTO	2,24	2,26		-1,00	5,13
						-
	ZONA DE JUEGOS INFANTILES INFERIOR E= 0,20M	LADO A	LADO B	LADO C	5	-
11	PLACA TERRAZA 3	3,03	3,13	4,74	5,75	5,68
12	PLACA TERRAZA 3	3,72	4,74	5,28	6,92	8,82
13	PLACA TERRAZA 3	5,28	2,60	6,71	7,85	6,59
14	PLACA TERRAZA 3	2,60	5,84	3,86	6,70	3 68
15	PLACA TERRAZA 3	3,00	4,77	5,84	6,88	7,26
16	PLACA TERRAZA 3	4,77	5,78	2,13	6,30	4 91
17	PLACA TERRAZA 3	2,67	6,47	5,70	7,27	7,29
18	PLACA TERRAZA 3	2,18	2,57	1,70	3,23	1,63
24	PLACA DESCANSO ESCALERAS	3,00	3,78	2,07	4 42	3,09
25	PLACA DESCANSO ESCALERAS	3,78	3,00	1,05	4 21	1,91
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	
19	ESTRUCTURA DESCANSO ESCALERA	1,78	3,09		1,00	5,50
23	ESTRUCTURA DESCANSO ESCALERA	1,78	3,08		1,00	5,48
20	ESTRUCTURA BAJO PLACA DE CHIP DE CAUCHO	6,76	1,87		1,00	12,63
21	ESTRUCTURA PLACA TERRAZA 3	3,80	2,46		1,00	9,55
						-
NOTA: LAS IMAGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL				TOTAL	200,62	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	200,62	

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

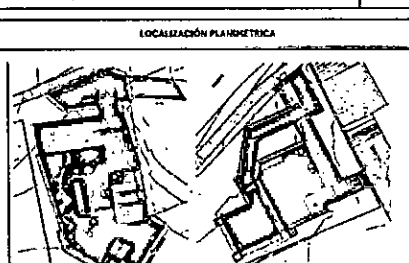



Firma		Firma	
Nombre:	Carlos Alberto Arbeláez Correa	Nombre:	Byron Camilo Feria Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoria	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79133303	T.P.	70702-240260 TLM


BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FOLIO/U			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 1 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES			ÍTEM	28	Excavacion manual con retiro suelo blando		FC3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	BIOSALUDABLES					-
6	PARA NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA TERRAZA 2	5,36	5,20	0,30	1,00	8,52
				SUBTOTAL	8,52	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	8,52	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

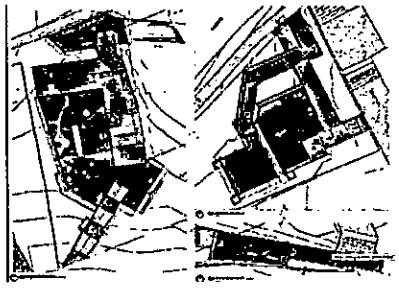

Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arboleda Cuevas	Nombre:	Byron Camilo Tafur Lopez
Cargo:	Representante Legal Interventoria	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79.536.403	C.C.	79703.346266 TLM


ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	DE	1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES					
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	32	Caja de Inspeccion .60x.60 h=1.5+Exc.av(ESPEC/IDRD)			UN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	ZONA SUPERIOR BIOSALUDABLES					-
	CAJA DE INSPECCIÓN - RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN TERRAZA 1				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	1,00	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	1,00	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

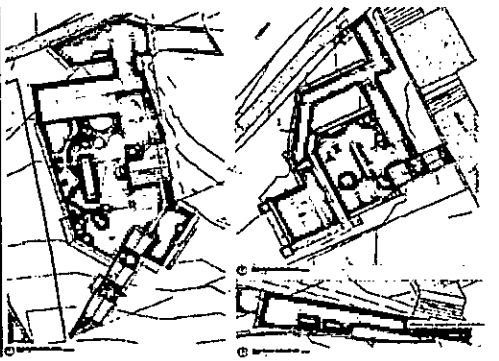



Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arambula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoria	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	37	Cañuela T-C prefabricada (A-120))(canal)			ML


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	ZONA SUPERIOR BIOSALUDABLES					-
	CAÑUELA A120 PARA RECOLECCIÓN DE AGUA EN TERRAZA 1	16,53			1,00	16,53
						-
						-
						-

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-100			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES	ÍTEM	97	Muro contencion concreto 28 MPA 4000 psi V1C e=.35			M3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	ZONA SUPERIOR BIOSALUDABLES					-
	Concreto muro terraza 1 M1	6,05	0,25	2,05	1,00	3,10
	Concreto muro sendero M2	3,23	0,25	0,9	1,00	0,73
	Concreto muro sendero M3	2,23	0,25	1,34	1,00	0,75
	Concreto muro sendero M4	3,47	0,25	1,37	1,00	1,19
	Concreto muro sendero M5	3,64	0,25	1,32	1,00	1,20
	Concreto muro sendero M6	3,34	0,25	1,04	1,00	0,87
	Concreto muro sendero M7	4,08	0,25	0,6	1,00	0,61
	Concreto zarpa muro M7	4,4	0,9	0,2	1,00	0,79
	Concreto muro sendero M8	5,46	0,25	2,1	1,00	2,87
	concreto zarpa muro M8	5,46	1,97	0,25	1,00	2,69
	ZONA INFERIOR JUEGOS INFANTILES					-
	Viga concreto muro mamposteria concreto terraza 3	6,28	1,20	0,25	1,00	1,88
	Viga concreto muro mamposteria concreto terraza 3	2,20	0,60	0,20	1,00	0,26
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		16,94
				ACTA ANTERIOR		0,00
				TOTAL		16,94

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

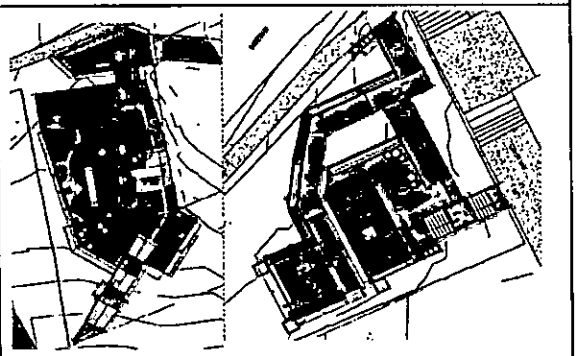



NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL


Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Ardrobata Gamea	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246769 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	Alianza Parques Verdes

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA PEATONALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FOLIO		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIAU PARQUES	IDIGA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOZA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	188	Geotextil NT2500		M2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	BIOSALUDABLES					-
1	ESTRUCTURA PARA SENDERO	7,11	1,80		1,00	12,80
2	ESTRUCTURA PARA SENDERO	9,85	1,80		1,00	17,73
3	SENDERO EN TERRAZA 1	6,07	2,85		1,00	17,30
4	SENDERO EN TERRAZA 1	3,35	1,89		1,00	6,67
5	TERRAZA 1 BIOSALUDABLES	8,71	4,58		1,00	39,87
6	BAJO PLACA BIOSALUDABLES TERRAZA 2	8,36	8,30		1,00	28,41
7	EN DESCANSO ESCALERAS BIOSALUDABLES	1,56	1,95		1,00	3,02
8	EN DESCANSO ESCALERAS BIOSALUDABLES	1,60	1,95		1,00	2,84
9	PARA CENTAS DE AJUSTE ESCALERAS	1,05	0,10		10,00	1,80
	DESCUENTO MATERA EUCALIPTO TERRAZA 1					-
10	DESCUENTO MATERA EUCALIPTO	2,25	2,25		-1,00	- 8,11
						-
	ZONA DE RIEGOS INFANTILES INFERIOR E = 0,20M	LADO A	LADO B	LADO C	$	-
11	PLACA TERRAZA 3	3,63	3,13	4,74	5,75	8,68
12	PLACA TERRAZA 3	3,72	4,74	5,36	6,82	8,62
13	PLACA TERRAZA 3	5,38	2,80	6,71	7,35	6,58
14	PLACA TERRAZA 3	2,80	5,94	3,86	8,20	3,68
15	PLACA TERRAZA 3	3,05	4,77	5,84	6,80	7,20
16	PLACA TERRAZA 3	4,77	5,70	2,13	6,30	4,91
17	PLACA TERRAZA 3	2,67	6,47	5,78	7,37	7,79
18	PLACA TERRAZA 3	2,18	2,67	1,70	3,73	1,63
24	PLACA DESCANSO ESCALERAS	3,06	3,76	2,02	4,42	3,09
25	PLACA DESCANSO ESCALERAS	3,78	3,00	3,05	4,21	1,81
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	
19	ESTRUCTURA DESCANSO ESCALERA	1,78	3,09		1,00	5,50
23	ESTRUCTURA DESCANSO ESCALERA	1,78	3,08		1,00	5,48
20	ESTRUCTURA BAJO PLACA DE CHIP DE CAUCHO	6,76	1,87		1,00	12,63
21	ESTRUCTURA PLACA TERRAZA 3	3,80	2,46		1,00	8,55
	DETRÁS DE MURO DE CONTENCIÓN					
	MURO TERRAZA 1 BIOSALUDABLES	10,63	2,87		1,00	33,45
	MURO TERRAZA 3 JUEGOS INFANTILES SUR	9,56	1,50		1,00	14,33
	MURO TERRAZA 3 JUEGOS INFANTILES NORTE	11,16	1,89		1,00	21,09
						-
NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL				SUBTOTAL	278,48	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	278,48	

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

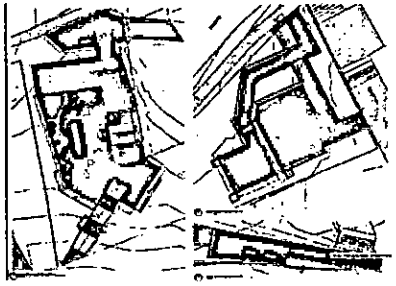





Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Acle de Correa	Nombre:	Byron Camilo Faria Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoria	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79.086003	T.P.	70200-346768 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	DE	1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES		FOLRUU			
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM NP-01		EXCAVACIÓN MECANICA Y RETIRO (TIERRA)			M3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	BIOSALUDABLES					-
	PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TERRAZA 2 ORIENTAL	7,89	2,30	1,08	1,00	35,84
	AMPLIACIÓN ZONA TERRAZA 2 COSTADO SUR CORTE TALUD SUR	7,43	2,45	1,50	1,00	27,31
						-
						-
						-

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-160			Período:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	NP-02	ANDEN EN CONCRETO REFORZADO e=.10m, 3000psi (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM D=6MM, FORMALETA, SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE			M2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	BIOSALUDABLES					
5	TERRAZA 1 BIOSALUDABLES	8,71	4,58		1,00	39,87
6	BAJO PLACA BIOSALUDABLES TERRAZA 2	5,30	5,30		1,00	28,41
	DESCUENTO MATERA EUCALIPTO TERRAZA 1					
10	DESCUENTO MATERA EUCALIPTO	2,26	2,26		-1,00	-5,11
	ZONA DE JUEGOS INFANTILES					
20	ESTRUCTURA BAJO PLACA DE CHIP DE CAUCHO	6,76	1,87		1,00	12,63

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ / RAFAEL URIBE URIBE	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD I N LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C.".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FOLIO		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER RIJU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-158			Periodo:	ACTA NO. 6 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	M2-03	ANDEN EN CONCRETO REFORZADO e=.10, ESTAMPADO COLOR TERRACOTA, 3000psi (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6 D=6MM, FORMALETA, SUMINISTRO E		M2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	BIOSALUDABLES					-
1	ESTRUCTURA PARA SENDERO	7,11	1,00		1,00	17,80
2	ESTRUCTURA PARA SENDERO	9,65	1,00		1,00	17,29
3	SENDERO EN TERRAZA 1	6,07	2,85		1,00	17,30
4	SENDERO EN TERRAZA 1	3,38	1,80		1,00	6,87
7	EN DESCANSO ESCALERAS BIOSALUDABLES	1,55	1,85		1,00	2,87
8	EN DESCANSO ESCALERAS BIOSALUDABLES	1,60	1,00		1,00	2,24
	ZONA DE JUEGOS INFANTILES INFERIOR	LADO A	LADO B	LADO C	S	-
11	PLACA TERRAZA 2	3,63	3,13	4,74	5,73	5,48
12	PLACA TERRAZA 2	3,72	4,74	6,38	8,82	8,62
13	PLACA TERRAZA 2	6,38	2,80	6,71	7,35	6,88
14	PLACA TERRAZA 2	7,65	5,84	3,85	6,70	3,88
15	PLACA TERRAZA 2	3,05	4,77	5,84	6,88	7,25
16	PLACA TERRAZA 2	4,77	5,70	2,13	5,30	4,81
17	PLACA TERRAZA 2	7,87	6,47	5,79	7,37	7,29
18	PLACA TERRAZA 2	2,18	2,87	1,78	3,71	1,83
24	PLACA DESCANSO ESCALERAS	3,05	3,78	2,83	4,47	3,05
25	PLACA DESCANSO ESCALERAS	3,78	3,80	1,84	4,21	1,91
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	
19	DESCANSO ESCALERA	1,78	3,05		1,00	5,50
22	DESCANSO ESCALERA	1,78	3,00		1,00	5,48
21	PLACA TERRAZA 2	2,88	2,48		1,00	9,86
	DESCUENTO					
29	POZO DE INSPECCIÓN	2,27			-1,00	2,27


BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERRUU PARQUES		HOM	1 DE 1	
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES	ÍTEM	NP-04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO HUMECTACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON			M3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	BIOSALUDABLES					-
1	ESTRUCTURA PARA SENDERO	7,11	1,80	0,20	1,00	7,16
2	ESTRUCTURA PARA SENDERO	8,85	1,80	0,20	1,00	3,55
3	SENDERO EN TERRAZA 1	8,07	2,85	0,20	1,00	2,46
4	SENDERO EN TERRAZA 1	3,35	1,95	0,20	1,00	1,33
5	TERRAZA 1 BIOSALUDABLES	8,71	4,58	0,20	1,00	7,97
6	BAJO PLACA BIOSALUDABLES TERRAZA 2	8,36	5,30	0,20	1,00	8,68
7	EN DESCANSO ESCALERAS BIOSALUDABLES	1,55	1,85	0,20	1,00	0,60
8	EN DESCANSO ESCALERAS BIOSALUDABLES	1,50	1,90	0,20	1,00	0,58
9	PARA CINTAS DE AJUSTE ESCALERAS	1,85	0,10	0,20	10,00	0,38
	DESCUENTO MATERA EUCALIPTO TERRAZA 1					-
10	DESCUENTO MATERA EUCALIPTO	2,26	2,26	0,20	-1,00	1,09
						-
	ZONA DE JUEGOS INFANTILES INFERIOR E = 0,20m	LADO A	LADO B	LADO C		-
11	PLACA TERRAZA 3	3,63	3,13	4,74	5,75	1,14
12	PLACA TERRAZA 3	3,72	4,74	6,36	6,82	1,77
13	PLACA TERRAZA 3	5,28	7,00	0,71	7,35	1,30
14	PLACA TERRAZA 3	7,00	5,84	3,88	6,30	0,74
15	PLACA TERRAZA 3	3,05	4,77	5,84	8,88	1,45
16	PLACA TERRAZA 3	4,77	6,70	2,13	6,30	0,98
17	PLACA TERRAZA 3	2,67	6,47	6,70	7,37	1,48
18	PLACA TERRAZA 3	2,18	2,67	1,70	3,23	0,37
24	PLACA DESCANSO ESCALERAS	3,00	3,76	2,02	4,42	0,62
25	PLACA DESCANSO ESCALERAS	3,76	3,80	1,06	4,21	0,38
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	
19	ESTRUCTURA DESCANSO ESCALERA	1,78	3,09	0,70	1,00	1,10
23	ESTRUCTURA DESCANSO ESCALERA	1,78	3,09	0,70	1,00	1,10
20	ESTRUCTURA BAJO PLACA DE CHIP DE CAUCHO	6,76	1,67	0,70	1,00	7,53
21	ESTRUCTURA PLACA TERRAZA 3	3,88	2,48	0,70	1,00	1,81
						-
				SUBTOTAL	41,92	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	41,92	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

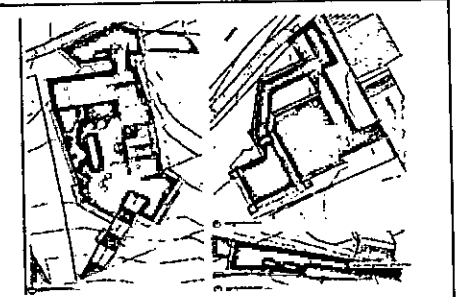





Firma:	Carlos Alberto Arboleda Cargas Representante Legal Interventoría	Firma:	Byron Camilo Ayala Lopez
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	Director de Obra
C.C.	79155403	T.P.	70505-240268 TCH

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024

VERSIÓN 1.0


CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	NP-05	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE DOS PERFORACIONES TIPO INDUSTRIAL, ACABADO DOBLE CARA, INCLUYE MORTERO 1:4 HECHO EN OBRA, (NO		M2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	ZONA SUPERIOR BIOSALUDABLES					-
	MURO EN MAMPOSTERIA TERRAZA 3	6,28		1,24	2,00	15,57
2	MURO EN MAMPOSTERIA TERRAZA 3 ESCALERAS	2,20		0,78	1,00	1,72
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	17,30	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	17,30	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

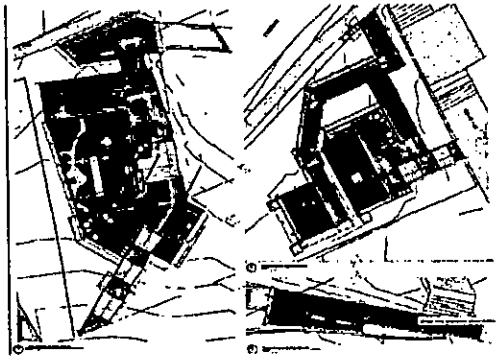



Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Xiteno Arámbula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal interventoria	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246259 TLM


ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES


OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	HOJA	1	DE	1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	FOLRUU				
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	NP-06	DOVELAS (0,06m X 0,06m) + REFUERZO PARA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL DE CONCRETO			M

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	ZONA SUPERIOR BIOSALUDABLES					-
	MURO EN MAMPOSTERIA TERRAZA 3			1,24	35,00	43,40
2	MURO EN MAMPOSTERIA TERRAZA 3 ESCALERAS			0,78	5,00	3,92
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	47,32	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	47,32	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

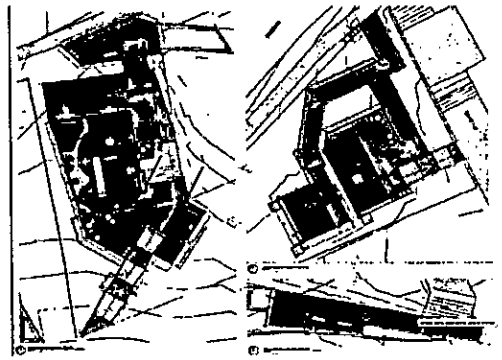

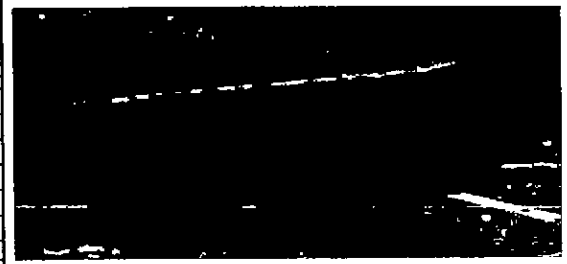

Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	T.P.	70202-246269 TLM


ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".						
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU		
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025		
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES	ÍTEM	NP-07	BORDILLO PREFABRICADO A-80(0.35X0.2X0.80H)-CON ATRAQUE			M1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	ZONA SUPERIOR BIOSALUDABLES					-
1	BORDILLO TERRRAZA 1	9,43			1,00	9,43
2	BORDILLO TERRRAZA 1	7,86			1,00	7,86
3	BORDILLO TERRRAZA 2	5,33			1,00	5,33
	MATERA EUCALIPTO	9,04			1,00	9,04
	ZONA INFERIOR INFANTILES					-
	BORDILLO TERRRAZA 3	7,78			1,00	7,78
	BORDILLO TERRRAZA 3 CAUCHO	17,46			1,00	17,46
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUB-TOTAL	56,90	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	56,90	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

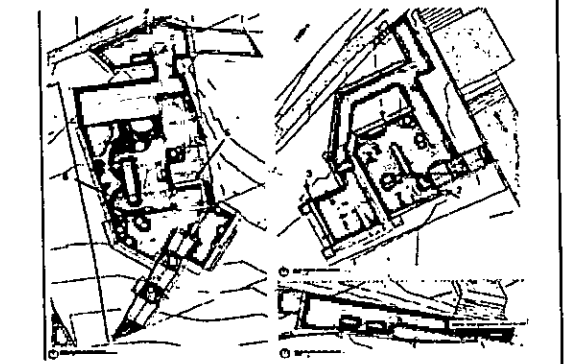



Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arambula Correa	Nombre:	Byron Camilo Falla Lopez
Cargo:	Representante Legal Interventoria	Cargo:	Director de Obra
C.C.	79939003	I.P.	70202-246269 TLM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ / ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FOLIO			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RIU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	PARQUE ZARAZOTA 18-180			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	NP-18	SERVICIO DE BOMBEO PARA CONCRETO 0 a 60 m			M3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	BIOSALUDABLES					-
1	PARA SENDERO	7,11	1,80	0,10	1,00	1,28
2	PARA SENDERO	8,85	1,80	0,10	1,00	1,77
3	SENDERO EN TERRAZA 1	6,07	2,85	0,10	1,00	1,73
4	SENDERO EN TERRAZA 1	3,35	1,99	0,10	1,00	0,67
5	TERRAZA 1 BIOSALUDABLES	8,71	4,98	0,10	1,00	3,09
6	BAJO PLACA BIOSALUDABLES TERRAZA 2	5,30	5,30	0,10	1,00	2,84
7	EN DESCANSO ESCALERAS BIOSALUDABLES	1,55	1,95	0,10	1,00	0,30
8	EN DESCANSO ESCALERAS BIOSALUDABLES	1,50	1,50	0,10	1,00	0,79
9	PARA CINTAS DE AJUSTE ESCALERAS	1,00	0,10	0,10	10,00	0,20
	DESCUENTO MATERA EUCALIPTO TERRAZA 1					-
10	DESCUENTO MATERA EUCALIPTO	2,26	2,26	0,10	-1,00	0,51
						-
	ZONA DE JUEGOS INFANTILES INFERIOR E = 0,20M	LADO A	LADO B	LADO C	$	-
11	PLACA TERRAZA 2	3,03	3,13	4,74	5,75	0,57
12	PLACA TERRAZA 3	3,72	4,74	5,38	6,97	0,89
13	PLACA TERRAZA 3	5,38	2,60	6,71	7,35	0,66
14	PLACA TERRAZA 3	7,60	5,84	3,86	6,70	0,37
15	PLACA TERRAZA 3	3,08	4,77	5,84	8,85	0,73
16	PLACA TERRAZA 3	4,77	5,70	7,13	0,30	0,48
17	PLACA TERRAZA 3	2,57	6,47	5,70	7,37	0,73
18	PLACA TERRAZA 3	2,18	2,67	1,70	3,23	0,16
24	PLACA DESCANSO ESCALERAS	3,06	3,76	2,02	4,42	0,21
25	PLACA DESCANSO ESCALERAS	3,76	3,60	1,00	4,21	0,19
		LADO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	
19	DESCANSO ESCALERA	1,78	3,08	0,10	1,00	0,55
23	DESCANSO ESCALERA	1,78	3,08	0,10	1,00	0,55
20	BAJO PLACA DE CHIP DE CAUCHO	6,76	1,87	0,10	1,00	1,26
21	PLACA TERRAZA 3	3,60	2,46	0,10	1,00	0,85
	DESCUENTO					
28	POZO DE INSPECCIÓN	2,27		0,10	-1,00	0,23
						-
				SUBTOTAL	20,73	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	20,73	

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA



NOTA: LAS IMAGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

Firma:		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arbeláez Correa	Nombre:	Byron Camilo Feria Lopez
Cargo:	Representante Legal Interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	Rpj-18003	C.P.	70202-246260 TLM

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ

CONTRATO N° FDLRUU-COP-747-2024

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".

CONSORCIO PARQUES VERDES

CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	PARQUE	URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA I, II Y III	PLAZO	9 MESES Y 20 DIAS
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	DIRECCIÓN	CL 26 SUR TV 23 - TV 22B 2B 24 SUR - CL 28B SUR 22 46 - TV 22B 28B 10 SUR	CÓDIGO	18-202

Periodo: ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 21 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIOS CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS	
			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO +AIU	CANTIDADES INICIALES	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1	Acero refuerzo fy=60000psi	TN	$ 5.342.556,00	$ 7.023.858,00		$ -	24,36	[illegible]	24,36	$ 130.144.684,16	-	$ -
2	Localizacion y Replanteo con equipo	M2	$ 7.358,00	$ 9.674,00		$ -	1.718,75	$ 12.646.583,49	-1.601,22	-$ 11.781.755,77	3.319,97	$ 24.428.339,26
3	Canal de drenaje prefabricado en polyconcreto, pd-150v, clase de carga d400, incluye rejilla, long=1000 mm, h= 270 mm, ancho= 200mm, en color natural, (no incluye.	UN	$ 293.046,00	$ 385.258,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	Canal de inicio / fin de drenaje prefabricado en polyconcreto , pd-150v, clase de carga d400, incluye rejilla, long=500 mm, h= 270 mm, ancho= 200mm, en color natural, incluye	UN	$ 554.127,00	$ 728.511,00		$ -	66,00	$ 36.572.382,00	66,00	$ 36.572.382,00	-	$ -
5	Tubería Novafort d=160mm exca y relleno recebo	ML	$ 110.868,00	$ 145.800,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	Tubería Novafort d=110mm exca y relleno recebo	ML	$ 80.854,00	$ 106.299,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	Muro de contenc en gavion(cargue con Equipo)	M3	$ 373.391,00	$ 490.867,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0,04m	M2	$ 21.435,00	$ 28.181,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0,04	M2	$ 26.632,00	$ 35.278,00		$ -	74,72	$ 2.004.929,97	74,72	$ 2.004.929,97	-	$ -
10	Kerasa sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto	M2	$ 36.328,00	$ 47.760,00		$ -	823,40	$ 33.545.275,20	823,40	$ 33.545.275,20	-	$ -
11	Contenedor raices arboles (1.30 x 1.30 int) h=1,57 ,incluye bordillo A70, tierra negra, recebo	UN	$ 2.177.853,00	$ 2.863.223,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12	Caja electrica de inspeccion AP 274 Codensa	UN	$ 674.593,00	$ 886.887,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13	Relleno rajon manual (Inc. Compactación Mecanica)	M3	$ 155.362,00	$ 204.254,00		$ -	117,00	$ 18.177.354,00	117,00	$ 18.177.354,00	-	$ -
14	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	$ 146.180,00	$ 192.183,00		$ -	240,45	$ 35.149.647,58	240,45	$ 35.149.647,58	-	$ -
15	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incly Transporte	UN	$ 324.655,00	$ 426.824,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	Placa contrapiso h=0,15 m, 210 k/cm2+ refroz	M2	$ 132.782,00	$ 174.568,00		$ -	976,72	[illegible]	976,72	$ 129.690.941,27	-	$ -
17	Cable Aluminio 2 N° 4 Sum a Instalación	ML	$ 14.804,00	$ 19.463,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	Tala de arboles h= 2,1 a 5 m Incly. Transporta	UN	$ 169.495,00	$ 222.835,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	Trasplante y bloqueo de arboles de 3 m a 5m	UN	$ 1.302.152,00	$ 1.711.939,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20	Siembra arbol chicalá H=1,50(Slamb+Caja+Tier,Abon+Tut)	UN	$ 262.086,00	$ 344.568,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	Descapota Manual y Retiro (e=10-15Cm)	M2	$ 14.064,00	$ 18.490,00		$ -	225,80	$ 3.172.836,40	225,80	$ 3.172.836,40	-	$ -
22	Cerramiento lona h=2.20 mts(Inc. Excavación)	ML	$ 25.458,00	$ 33.471,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	Poste concretoAP10 m510 Kg+ Base Conc (Sum+Instal)	UN	$ 1.466.725,00	$ 1.928.308,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	Compactación fondo de excavación con equipos liviano	M2	$ 1.103,00	$ 1.450,00		$ -	615,60	$ 679.006,80	615,60	$ 679.006,80	-	$ -
25	Certificado Retie	UN	$ 2.535.718,00	$ 3.333.708,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	Certificado Retilap	UN	$ 3.065.358,00	$ 4.056.320,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	Alcorque metálico 1200 x 1200 mm	UN	$ 1.464.273,00	$ 1.925.060,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	$ 68.306,00	$ 89.802,00		$ -	506,51	$ 34.597.899,38	506,51	$ 34.597.899,38	-	$ -
29	Concreto 3000 psi escaleras sobre terreno CDRC	M3	$ 1.183.820,00	$ 1.555.368,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	Empalme en Derivación (9181) Juego x 2 unidades	JG	$ 219.539,00	$ 288.626,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	Adoquín Colores e=0.06 pc<5% 4.2<blonde	M2	$ 170.638,00	$ 224.338,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	Caja de Inspeccion .50x 60 h=1.5+Excav(ESPECIDRD)	UN	$ 691.034,00	$ 908.502,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	Baranda Juegos infant M-83 (M-80) sin viga + Dado(Sum+Inst	ML	$ 340.454,00	$ 447.595,00		$ -	61,50	$ 20.937.921,00	61,50	$ 20.937.921,00	-	$ -
34	Concrete ciclopeo 2500 psi premezclado (sin formaleta)	M3	$ 418.880,00	$ 550.675,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35	Canalz ducto electric PVC- D2/OF Zona Verde	ML	$ 142.325,00	$ 187.115,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36	Piso Caucho reci(8cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst), Tipo Dinamico	M2	$ 407.820,00	$ 536.161,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37	Cafuela T-C prefabricada (A-120))(canal)	ML	$ 90.173,00	$ 118.550,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
38	Caja de inspeccion 0.60x0.80 h=0.80+Excav(ESPECIDRD)	UN	$ 643.542,00	$ 846.065,00		$ -	4,00	$ 2.574.168,00	4,00	$ 2.574.168,00	-	$ -
39	Inspección CCTV de tuberia de alcantarillado (DIAM=110-400)mm, incluye lavado de tuberia, manejo de lodos, video acueducto y elaboración de informe de acuerdo a los	ML	$ 35.047,00	$ 46.076,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40	Tuberia pvc diam=110mm	ML	$ 109.554,00	$ 144.031,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41	Banca concreto GRC 21 MP L=1.83 m Segun diseño BANCA MC	UN	$ 2.573.874,00	$ 3.383.672,00		$ -	2,00	$ 5.147.748,00	2,00	$ 5.147.748,00	-	$ -
42	Protector de arbol de dos tubos tipo m91, Inc. Sum + instala	UN	$ 373.116,00	$ 490.536,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	Bordillo prefabricado A 81 sin atraque	ML	$ 68.992,00	$ 90.704,00		$ -	481,57	$ 33.224.615,42	481,57	$ 33.224.615,42	-	$ -
44	Cenefa en Loseta prefabricada A58 guía (20 X 20 x 6) cm. Suministro e instalacion (Incluye 4 cm de mortero 1 5 hecho en obra para base y arena de peña para sello) IDU	M2	$ 101.782,00	$ 133.787,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
45	Cenefa en Loseta prefabricada A57 tactil Alerta (20 X 20 x 6) cm. Suministro e instalacion (Incluye 4 cm de mortero 1 5 hecho en obra para base y arena de peña para sello) IDU	M2	$ 101.782,00	$ 133.787,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
46	Protección árbol con tela verde (CDRC) H 1 m	UN	$ 66.093,00	$ 86.892,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47	Alquiler campamento 40 m2	UN	$ 6.220.711,00	$ 8.178.399,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	Siembra arbol chiripique	UN	$ 280.981,00	$ 369.279,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	Piso Caucho reci(2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	$ 407.820,00	$ 536.161,00		$ -	159,00	[illegible]	159,00	$ 112.349.559,00	-	$ -
50	Piso Caucho reci(7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	$ 706.601,00	$ 928.968,00		$ -	41,04	$ 5.351.041,44	41,04	$ 5.351.041,44	-	$ -
51	Muro Ladrillo Tabicón Tolete Común 20*10*8	M2	$ 130.386,00	$ 171.418,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SOLARDO EN CONCRETO M - 60 (SUM + INST)	UN	$ 164.019,00	$ 215.636,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53	Muro Concreto Premezclado 3.500psi G.F.+Formaleta	ML	$ 902.200,00	$ 1.186.122,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	Cable de Cobre 2#12 (Suministro+Instalación)	ML	$ 11.306,00	$ 14.864,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	Siembra arbol Polygala	UN	$ 270.781,00	$ 355.338,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	Siembra arbol Caisteimo	UN	$ 270.281,00	$ 355.338,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	Siembra arbol palma alejandra	UN	$ 343.750,00	$ 451.928,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	UN	$ 851.808,00	$ 1.119.873,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ

CONTRATO N° FDLRUU-COP-747-2024

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C"

CONSORCIO PARQUES VERDES

CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	PARQUE	URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA I, II Y III	PLAZO	9 MESES Y 20 DIAS
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIU PARQUES	DIRECCIÓN	CL 28 SUR TV 23 - TV 22B 28 24 SUR - CL 28B SUR 23 46 - TV 22B 28B 30 SUR	CÓDIGO	18-202

Periodo. ACTA NO 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 23 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIOS CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS	
			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO +AIU_	CANTIDADES INICIALES	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
59	Banca prefab M-30 con espald sumin+instala Z.V**	UN	$ 835.596,00	$ 1.098.561,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
60	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	UN	$ 611.446,00	$ 803.871,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
61	Flexion piernas prensa horizontal (SUM + INST)	UN	$ 3.042.547,00	$ 4.000.037,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62	Juego MURO DESLIZADERO-IDRD NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+In	UN	$ 3.474.211,00	$ 4.567.545,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63	Juegos infantiles M-5A Columpio (Sum+Instal)-STPM	UN	$ 501.828,00	$ 659.885,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64	INSTALACION DOTACION GIRO CADERA (twister)	UN	$ 272.107,00	$ 357.739,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65	MODULO TIMON VOLANTES (Sumi+Instal) Gto menos	UN	$ 2.280.587,00	$ 2.998.288,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
66	MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst	UN	$ 28.604.887,00	$ 37.606.845,00		$ -	1,00	$ 28.604.887,00	1,00	$ 28.604.887,00	-	$ -
67	Juego biosaludable caminador aereo sum+inst	UN	$ 2.446.580,00	$ 3.216.519,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
68	Banca Koral en concreto sin espaldar	UN	$ 3.520.331,00	$ 4.628.179,00		$ -	5,00	$ 17.601.655,00	5,00	$ 17.601.655,00	-	$ -
69	Banca MK05 konkretus Pukkel A (sum+instala)	UN	$ 7.996.657,00	$ 10.513.205,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
70	Tobogan doble T-138	UN	$ 14.449.914,00	$ 18.997.302,00		$ -	1,00	$ 14.449.914,00	1,00	$ 14.449.914,00	-	$ -
71	Juego red araña 8-12 años Cap. 11 niños	UN	$ 115.204.388,00	$ 151.469.210,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
72	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+inst+Transp)	UN	$ 5.000.013,00	$ 6.573.517,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
73	MODULO DORSAL PECTORAL (Suministr+Insta) Brazos al	UN	$ 3.386.407,00	$ 4.452.109,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74	Juego biosaludable Pectorales cf4011 sum+inst	UN	$ 14.863.622,00	$ 19.541.204,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75	Juego biosaludable cabalgata cf 4013 sum+inst	UN	$ 6.260.130,00	$ 8.230.193,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
76	Juego biosaludable cabalgata cf-4013 um+inst	UN	$ 6.425.265,00	$ 8.447.335,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	Juego biosaludable hombros y brazo inclusive sum+inst	UN	$ 5.954.808,00	$ 7.973.400,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
78	Juego biosaludable hombros y brazos inclusivo cf 4017 sum+inst	UN	$ 19.134.133,00	$ 25.155.845,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
79	Juego biosaludable cf 4015 bicicleta manual sum+inst	UN	$ 16.792.596,00	$ 22.077.226,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
80	Juego biosaludable bicicleta inclusive sum+inst	UN	$ 16.792.596,00	$ 22.077.226,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
81	Juego biosaludable bicicleta manual inclusive cf4015 sum+inst	UN	$ 16.746.041,00	$ 22.016.020,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
82	Derivación para circuito exclusivo de A P. desde la red tierra abierto de B.T existente.	JG	$ 259.582,00	$ 341.272,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
83	Señal idg-s 1 cara (sum + inst)	UN	$ 597.395,00	$ 785.395,00		$ -	4,00	$ 2.389.580,00	4,00	$ 2.389.580,00	-	$ -
84	Señal idg-s 2 caras (sum + inst)	UN	$ 522.579,00	$ 687.023,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85	Señal identificacion general IDRD	UN	$ 1.017.897,00	$ 1.338.229,00		$ -	1,00	$ 1.017.897,00	1,00	$ 1.017.897,00	-	$ -
86	Tala de arboles h= 10.1 a 15 m incly. Transporte	UN	$ 499.692,00	$ 656.845,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87	Anillo contenc caisson a=0.10 dex=1.3 3000 psi	M3	$ 1.253.779,00	$ 1.648.343,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88	Alentrizaje varilla cooper well 5/8" y 1.8m (tierra)	UN	$ 447.290,00	$ 588.052,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89	Baranda M-92(Pasam2"+ Traves-2"+3T/traves1.5")CMU.	ML	$ 244.063,00	$ 320.870,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90	Brazo sencillo Luminaria - Suministro - Montaje e instalación	UN	$ 154.273,00	$ 202.823,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
91	Cesson refleno (Concreat 4000psi bombeado) d=1.2	M3	$ 562.244,00	$ 739.182,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
92	Demol manual anden + bordillo incl. cargue-ret	M2	$ 31.185,00	$ 40.999,00		$ -	861,82	$ 26.875.884,56	861,82	$ 26.875.884,56	-	$ -
93	Demolic Muro 0,15-Tolete (Trasl+retr+Andamios)	M2	$ 23.302,00	$ 30.635,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
94	Desmonte y reinstalación de luminaria de alumbrado público	UN	$ 184.372,00	$ 242.394,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
95	Filtro geotxtil planar tuberia 100 mm f=2.0	ML	$ 137.793,00	$ 181.158,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96	Fotocelda - Suministro e instalación	UN	$ 29.736,00	$ 39.094,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97	Muro contencion concreto 28 MPA 4000 psi V1C a=.35	M3	$ 1.028.858,00	$ 1.352.641,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
98	Aforamiento Baja Tension Ø 1 1/2 Galvanizada**	UN	$ 66.237,00	$ 87.080,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
99	Poda árboles+retiro <5m Bajo GradoDificultad	UN	$ 133.304,00	$ 175.255,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
100	Geotextil NT2500	M2	$ 5.558,00	$ 7.308,00		$ -	730,50	$ 4.131.708,00	730,50	$ 4.131.708,00	-	$ -
[illegible]	[illegible]						-					
NP-01	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA)	M3	$ 64.966,00	$ 85.411,45		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-02	ANDEN FN CONCRETO REFORZADO e=.10m, 3000psi (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM D=6MM, FORMALETA, SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO, CURADOR DE CONCRETO, VIBRADROR DE CONCRETO.	M2	$ 198.256,00	$ 260.649,15		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-03	ANDEN EN CONCRETO REFORZADO e=.10, ESTAMPADO COLOR TERRACOTA, 3000psi (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM D=6MM, FORMALETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO, CURADOR DE CONCRETO, VIBRADOR DE CONCRETO.	M2	$ 213.788,00	$ 281.066,58		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON COMPACTADOR MECANICO	M3	$ 162.047,00	$ 213.044,81		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-05	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE DOS PERFORACIONES TIPO INDUSTRIAL, ACABADO DOBLE CARA, INCLUYE MORTERO 1:4 HECHO EN OBRA, (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CONCRETO PARA INYECCIÓN DE DOVELAS REFORZADAS)	M2	$ 119.537,00	$ 157.156,49		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-06	DOVELAS (0,05m X 0,05m) + REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL DE CONCRETO	M	$ 11.519,00	$ 15.144,14		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-07	BORDILLO PREFABRICADO A-80(0.35X0.2X0.60M)-CON ATRAQUE	ML	$ 99.468,00	$ 130.772,89		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-08	CARCAMO T-2 3000 PSI + REJILLA CONCRETO REFORZADO (CANAL)	ML	$ 448.060,00	$ 589.095,28		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-09	TRASIEGO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN EN CARRETILLA DISTANCIA 0 A 100 M	m3	$ 42.278,00	$ 55.583,31		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-10	SERVICIO DE BOMBEO PARA CONCRETO 0 a 60 m	M3	$ 58.637,00	$ 77.090,65		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-11	TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADOMNT LISO U.M NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 125.950,00	$ 165.587,72		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE SOBREMARCO Y TAPA)	UN	$ 5.074.043,00	$ 6.670.895,07		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-13	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO ACRILICO CAMPOS DEPORTIVOS	M2	$ 70.718,00	$ 92.973,66		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

PORCENTAJE	TOTAL

TOTAL	TOTAL	TOTAL

[redacted]

[redacted]

CONTRATO Nº IDU-IDU-CDP-747-2024

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".

CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	PARQUE	URBANIZACIÓN QUIROGA ETAPA I, II Y III	PLAZO	9 MESES Y 20 DIAS
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER RIUU PARQUES	DIRECCIÓN	CL 29 SUR TV 23 - TV 22B 28 34 SUR - CL 29B SUR 22 46 - TV 22B 29B 10 SUR	CÓDIGO	18-202

Periodo: ACTA NO. 5 DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 21 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIOS CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS	
			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + ADU	CANTIDADES SOCIALES	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
	COSTOS DIRECTOS			$ -			CD	$ 71.837.801,00	CD	$ 686.609.561,00	CD	$ 24.478.329,00
	ADMINISTRACIÓN		29,47%	$ -			A (29,47%)	$ 188.111.732,00	A (29,47%)	$ 181.745.561,00	A (29,47%)	$ 6.405.181,80
	IMPREVISTOS		1,0%	$ -			I (1,0%)	$ 7.118.279,00	I (1,0%)	$ 6.908.090,80	I (1,0%)	$ 244.263,00
	UTILIDAD		4,0%	$ -			U (4,0%)	$ 28.661.316,00	U (4,0%)	$ 27.464.282,80	U (4,0%)	$ 977.134,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + ADU			$ -			CD + ADU	$ 834.891.329,00	CD + ADU	$ 807.625.600,80	CD + ADU	$ 33.315.837,80
	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE A.I.U.)		2,00%	$ -			P.G. SOCIAL	$ 14.220.756,00	P.G. SOCIAL	$ 13.732.191,00	P.G. SOCIAL	$ 488.567,00
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST (INCLUYE A.I.U.)		2,00%	$ -			P.G. AMBIENTAL Y SST	$ 14.220.756,00	P.G. AMBIENTAL Y SST	$ 13.732.191,00	P.G AMBIENTAL Y SST	$ 488.567,00
	PLAN DE GESTIÓN DE TRÁNSITO (INCLUYE A.I.U.)		2,00%	$ -			P.G. TRÁNSITO	$ 14.220.756,00	P.G. TRÁNSITO	$ 13.732.191,00	P.G TRÁNSITO	$ 488.567,00
	VALOR TOTAL ACTA (CD+ADU+PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y TRÁFICO)			$ -			VALOR TOTAL	$ 877.663.807,00	VALOR TOTAL	$ 843.857.163,80	VALOR TOTAL	$ 33.861.638,80

Por el contratista:

Firma
Nombre: VIVIANA ANDREA RODRÍGUEZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUES VERDES

Por la interventoría:

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ARAMBULA DURGEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER RIUU PARQUES


ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTÁ	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA-COP 747-2024	VERSIÓN 1.0	CONSORCIO PARQUES VERDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".							
CONTRATO DE OBRA No	CONTRATO DE OBRA-747-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	ENTIDAD CONTRATANTE	FDLRUU			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	CI-741- 2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER RUU PARQUES	HOJA	1	DE	1	
FRENTE DE OBRA	PARQUE QUIROGA 16-202			Periodo:	ACTA NO. 5 21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
CAPÍTULO	ITEMS CONTRACTUALES		ÍTEM	2	Localización y Replanteo con equipo			M2


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL
1	REPLANTEO CON ESTACCIÓN TOTAL PARA DELIMITACIÓN DEL AREA A INTERVENIR				3319,97	3.319,97
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL	3319,97	
				ACTA ANTERIOR	0,00	
				TOTAL	3.319,97	

NOTA: LAS IMÁGENES PRESENTADAS SON ESQUEMÁTICAS, NO TIENEN ESCALA REAL

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA







Firma		Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Arámbula Correa	Nombre:	Byron Camilo Fatia Lopez
Cargo:	Representante legal Interventoría	Cargo:	Director de Obra
C.C.	70939003	T.P.	7020-246269 TLM

DATOS DEL CONTRATO		
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VERDES	
No CONTRATO	747 DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO	$	3.925.355.240,00
MESES		9
DIAS		22
TIEMPO TOTAL		292
DIARIO	$	13.442.997
MENSUAL	$	403.289.921,92

CONTROL FINANCIERO

No PAGO	VALOR MENSUAL	VALOR ACUMULADO	PENDIENTE DE PAGO	DIAS EJEC.	MES COBRO	% MENSUAL	% ACUMULADO
1	$ 199.807.826	$ 199.807.826	$ 3.725.547.414	51	10 MARZO - 30 ABRIL 2025	5,09%	5,09%
2	$ 143.348.787	$ 343.156.613	$ 3.582.198.627	20	01-20 DE MAYO 2025	3,65%	8,74%
3	$ 539.461.178	$ 882.617.791	$ 3.042.737.449	31	21 DE MAYO - 20 DE JUNIO 2025	13,74%	22,49%
4	$ 424.540.668	$ 1.307.158.459	$ 2.618.196.781	30	21 DE JUNIO - 20 DE JULIO 2025	10,82%	33,30%
5	$ 311.558.436	$ 1.618.716.895	$ 2.306.638.345	31	21 DE JUNIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025	7,94%	41,24%

PAGOS REALIZADOS

No PAGO	FACTURA	VALOR PAGADO	PERIODO DE PAGO
1	No. 1	$ 199.807.826	10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2025
2	No. 2	$ 143.348.787	01 AL 20 DE MAYO DE 2025
3	No. 3	$ 539.461.178	21 DE JUNIO - 20 DE JULIO 2025
4	No. 4	$ 424.540.668	21 DE JULIO DE 2025 - 20 DE AGOSTO DE 2025

FIRMA :
CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER RUU PARQUES
Contrato de interventoría 741 de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013838581	NIT	901905021	CONSORCIO PARQUES VERDES

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	747-2024	3000492657	002	23-may-25	23-may-25	PAGADA	26-may-25	5003050909	Transferencia Giradora	199.807.826	183.303.700	047719729 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	747-2024	3000592753	002	20-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003387608	Transferencia Giradora	143.348.787	131.508.177	047719729 CORRIENTE Banco de Bogotá		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	747-2024	3000708677	002	25-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003740640	Transferencia Giradora	539.461.178	494.901.684	047719729 CORRIENTE Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000492657	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	199.807.826	3.996.157
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	199.807.826	999.039
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	199.807.826	9.990.391
	RETEICA 7,6 X MIL	0.7600	199.807.826	1.518.539
	TOTAL DESCUENTOS			16.504.126
3000592753	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	143.348.787	2.866.976
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	143.348.787	716.744
	RETEICA 7,6 X MIL	0.7600	143.348.787	1.089.451
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	143.348.787	7.167.439

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000492657	5000852318	001	O230689	1-200-I071	2025
3000592753	5000852318	001	O230689	1-200-I071	2025
3000708677	5000852318	001	O230689	1-200-I071	2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			11.840.610
3000708677	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	539.461.178	10.789.224
	RETEICA 7,6 X MIL	0.7600	539.461.178	4.099.905
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	539.461.178	26.973.059
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	539.461.178	2.697.306
	TOTAL DESCUENTOS			44.559.494

	28-ago-25 15:18:41
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 747 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y CONSORCIO PARQUES VERDES

Entre los suscritos a saber, **DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.883.374de Bogotá, en calidad de ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, en virtud del nombramiento realizado por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto 260 de fecha 29 de julio de 2024 y Acta de Posesión No. 268 de la misma fecha, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 2019, expedido con base en lo dispuesto en el Decreto ley 1421 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien actúa como ordenadora del gasto en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, quien en lo sucesivo se denominará **EL FONDO** por una parte, y por la otra **CONSORCIO PARQUES VERDES,** identificado con NIT: 901905021-8, cuyo representante legal es **VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.521.236, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **ADICIÓN No.1 y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 747-2024,** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La información general del **Contrato de Obra Pública No 747-2024**, a la fecha es la siguiente:

No. Contrato	**747-2024**
Contratista	**CONSORCIO PARQUES VERDES**
Objeto	**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C**
Valor inicial	$ 2.616.903.493
Plazo	Seis (6) meses y Quince (15) días
Fecha de Suscripción	31 de diciembre de 2024
Fecha de Iniciación:	10 de marzo de 2025
Fecha de terminación:	25 de septiembre de 2025
Modificación No.1	Mediante la cual se ajustan las fechas de cobertura de las garantías que ampara el contrato, en consideración a la fecha del acta de inicio del contrato.
Estado:	EN EJECUCIÓN

2. Que el plazo para la ejecución del presente contrato se pactó en seis (06) meses y quince (15) días contados a partir de la firma del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplidos los requisitos para su legalización, de conformidad con lo previsto en los artículos 148 del Decreto Ley 1421 de 1993 y 41 de la Ley 80 de 1993, hecho que ocurrió el 10 de marzo de 2025.

3. Que el valor del contrato se pactó por la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.616.903.493)**, incluido el iva y todos los demás impuestos.

Entre los suscritos a saber, **DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.883.374 de Bogotá, en calidad de **ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**, en virtud del nombramiento realizado por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto 260 de fecha 29 de julio de 2024, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 2019, expedido con base en lo dispuesto en el Decreto ley 1421 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien actúa como ordenadora del gasto en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, quien en lo sucesivo se denominará **EL FONDO**, por una parte; y, por la otra, **CONSORCIO PARQUES VERDES** representada legalmente por **ALEXANDER MERCHAN CHARRY, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.438.493 de Bogotá D.C, y** conformada por **ALEXANDER MERCHAN CHARRY** y **ANGELA MARIA SEGURA POLANIA,** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GRUPO IPROGEX ZOMAC S.A.S y INGECOL HS Y CIA S EN C**, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante la Resolución No 0280 del 04 de diciembre de 2024 la Entidad abrió el Proceso de Contratación No FDLRUU-LP-002-2024
II. Que por medio de la Resolución 0472 del 23 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), convienen las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REAILIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C".

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación **FDLRUU-LP-002-2024**, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de

obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de 6 (seis) meses y 15 (quince) días calendario, contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma **DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.616.903.493)**, equivalentes a 1.838 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal y amparo bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No 1514 de fecha 04/12/2024

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O23011602330000001670	Más parques en Rafael Uribe Uribe	10 NO APLICA	1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	2.616.903.493

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

El FONDO pagará el valor de las obras por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, el valor final del contrato corresponderá a la suma de los productos que se obtengan al multiplicar las cantidades de obra

reales ejecutadas y/o entregadas y aprobadas por la interventoría y a satisfacción del FONDO, por los valores o precios unitarios pactados para cada ítem.

La Entidad pagará el valor del contrato que se celebre de la siguiente manera:

(i) Con pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales) hasta el noventa por ciento(90%) del valor total del contrato. Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. Todos los pagos están sujetos a previa revisión, aprobación y autorización de la Interventoría.

(ii) El diez (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del FONDO, la interventoría y el Contratista e ingreso al almacén de los bienes construidos y que sean susceptibles de ser reconocidos. El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor del contrato, autorizadas por el funcionario correspondiente del FONDO

El FONDO cancelará al contratista el monto de la obra ejecutada siempre y cuando se haya programado en el PAC mensual en la fecha acordada, previa radicación de los siguientes documentos en la oficina de radicación de la Alcaldía local:

- Cuenta de cobro o Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. En el caso de consorcios o uniones temporales se debe informar el número de cuenta, así como efectuar la facturación en el formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal.

- Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Acta de corte parcial o total aprobadas por el interventor del contrato y el supervisor del FDL sobre las obras ejecutadas.

- Memoria de cálculos de las obras ejecutadas en cada parque.

- Certificación bancaria. Los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesorería Distrital a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista suministre, la cual debe corresponder a una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley.

- Certificación de Cumplimiento firmado por el interventor y por el Alcalde Local autorizando el pago correspondiente.

- Informe ejecutivo de actividades (técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambientales y sociales) durante el periodo correspondiente.

- Para el pago final del 10% acta de liquidación, comprobante de ingreso al almacén de los bienes construidos y demás documentos ya mencionados.

- Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, o no se radica en las fechas de programación del PAC; los retardos o no pago serán responsabilidad del interventor o del contratista según sea el caso particular. Por tal motivo no se tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA 1. Los pagos se deben acreditar a través de la plataforma del SECOP II.

NOTA 2. De conformidad con el Numeral 6, Parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, "Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuan- tía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT". De otra parte y en virtud del parágrafo 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, añadido por el artículo 4 de la Ley 2010 de 2019 "Los límites de que trata el parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado". Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos como responsables del impuesto sobre las ventas, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

NOTA 3. Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unión Temporal deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual, una vez favorecido con el presente proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la Unión Temporal o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificación de apertura de cuenta bancaria a nombre de la respectiva figura plural.

El cálculo de impuestos y la respectiva retención sobre los pagos, se hará de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.
- Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).

- Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno.
- Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documen-tos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.
- Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.
- No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los reci-bió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).
- Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.
- Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.
- Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.
- Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del De-creto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.
- Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja".
- Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

- Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones y la propuesta presentada.
- Conocer a cabalidad el contrato, anexo técnico y el pliego de condiciones.
- Suscribir el Acta de aceptación y apropiación de diseños existentes: Determinada para la Fase I del proyecto
- Asignar el personal idóneo con experiencia para el manejo y operación de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para el mantenimiento de las obras objeto del contrato.
- La dotación del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato debe cumplir con el manual de imagen corporativa y visual de la administración del Plan de Desarrollo 2021-2024 de la Localidad Rafael Uribe Uribe, "Un nuevo contrato social y ambiental para la localidad de Rafael Uribe Uribe"..
- Los costos del transporte que genere la movilización de la maquinaría dentro de la localidad (escoltas, cama baja), así como el traslado de la misma desde su localización hasta los frentes de trabajo corren por cuenta del contratista.
- La movilización de la maquinaría debe estar de acuerdo con lo estipulado por la Ley 769 de 2002 y afines.
- Diseñar los Planes de Manejo de Transito siguiendo los lineamientos de la cartilla de la secretaria de Movilidad.
- Realizar a tiempo y cumpliendo con los lineamientos de la secretaria de Movilidad los trámites para la aprobación de los PMT para asegurar que en todo momento existan los permisos necesa-rios para la intervención de los parques.
- Realizar y cumplir a cabalidad con el cronograma de entrega y con el plazo establecido para el desarrollo de las actividades. Cumplir a cabalidad con el perfil de los profesionales y el personal mínimo requerido.
- Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
- Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuer-do con las exigencias establecidas en el contrato. Tomar registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite.
- Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los mate- riales y de la obra conforme a las especificaciones del manual del IDRD.

- Efectuar los correctivos pertinentes en el caso que los ensayos de laboratorio demuestren que no se está cumpliendo con las exigencias de calidad y de ejecución exigidas en el manual de especificaciones del IDRD.
- Instalar en cada frente de obra la valla informativa con la información e imagen corporativa según especificaciones entregada por el FDL.
- Asistir a los Comités técnicos de obra que se programen mínimo cada siete (7) días, convocados por la supervisión y/o interventoría. Se debe contar con la presencia del director de obra y todo el equipo profesional propuesto.
- Contratar el personal cumpliendo con las normas vigentes en especial con las resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 DE 1984, CST Art 349, Resolución 2413 DE 1979 R.H.S para el
- sector construcción, Resolución 2013 de 1986 y el Art 63 del Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad vigente en tema ambiental se deben cumplir Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Resolución 541 de 1994, Decreto Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo N° 417 de 2009.
- Dar cumplimiento a las disposiciones ambientales en cuanto a la implementación de la Resolución No 1115 de 2012 para el aprovechamiento de Residuos sólidos de Construcción y Demolición y la Resolución No 6981 de 2011 para la utilización del granulo de caucho reciclado en los pavimentos.
- Entregar a la Interventoría, copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente.
- Contratar de acuerdo con el decreto 332 de 2020, el porcentaje mínimo de mujeres estipulado en la rama de actividad económica de Construcción determinado en un 6,8%
- Cumplir con las normas vigentes en cuanto en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en especial con las resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 de 1984, CST Art 349, resolución 2413 de 1979 R.H.S para el sector construcción, Resolución 2013 de1986 y el Art 63 del Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad vigente en tema ambiental se deben cumplir Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Resolución 541 de 1994, Decreto Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo N° 417 de 2009.
- Entregar en los tiempos estipulados en los estudios previos, (10 primero días después de firmada el acta de inicio) anexo técnico y demás del proceso de selección, cumpliendo con las condiciones allí descritas, la programación del contrato, el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los cronogramas de actividades para el desarrollo de la Gestión social y SS-TMA y demás insumos requeridos.
- Presentar las hojas de vida del equipo de trabajo mínimo requerido, dentro del término previsto en los estudios previos y anexo técnico, cumpliendo con las condiciones allí descritas.
- Realizar los trámites ante las empresas de servicios públicos necesarios para la apropiación de los estudios y seguido a ello la ejecución.
- Demoler, reemplazar y asumir el costo de toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad efectuado por el interventor o incluso por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra. En este evento el contratista no tendrá derecho a reclamación o reconocimiento pecuniario alguno.

- En caso de presentarse retraso en la ejecución de las actividades, presentar ante la Interventoría un plan de choque (contingencia) que permita dar cumplimiento a la programación aprobada previamente, y cumplir la ejecución del contrato en el plazo establecido. Este plan de choque deberá ser entregado a interventoría en un plazo máximo de tres (3) días calendario una vez se reporte el retraso. Así mismo, la interventoría tendrá un tiempo máximo de tres (3) días calenda-rio para pronunciarse al respecto, y el contratista un plazo de dos (2) días calendario para ajustar las observaciones requeridas por la interventoría.
- Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato conforme con lo dispuesto por el Fondo de Desarrollo Local De Rafael Uribe Uribe y Entidades Distritales correspondientes.
- Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.
- Presentar mensualmente las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y avaladas por la Entidad CONTRATANTE.
- Llevar una bitácora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTER-VENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debida-mente foliada y firmada por el director y residente de obra, y el residente y director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo re- quieran, los delegados de la Entidad CONTRATANTE. Deberá ser diligenciada en forma absolutamente legible.
- Ceñirse al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría Distrital de Gobierno, empleando los formatos que apliquen para la ejecución del presente contrato.
- Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto contractual.
- Tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones. (No dejar sustancias con materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal). Para esto deberá tener en cuenta lo estipulado en la y el procedimiento Gestión Integral de Residuos Sólidos de la entidad.
- Realizar la gestión adecuada de los residuos que genere. Como constancia de esto se entregarán copias de los certificados de transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los mismos. (Los gestores deberán contar con los permisos respectivos de la autoridad ambiental competente).
- Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.
- Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del manifiesto de recolección, transporte y certificado de disposición final o aprovechamiento.

- Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la resolución 1138 de 2003, cuando aplique y la Resolución 472 de 2017.
- Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en su artículo 4: "las Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desmantela- miento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la entidad anualmente". Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 25%.
- Emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas).
- Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
- Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, entregando a la Alcaldía Local los certificados de disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del mate-rial.
- El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la guía de manejo ambiental para el sector de la Construcción, de la Secretaría Distrital de ambiente.
- Para la construcción de los parques se deberá prever el uso de llantas usadas o de materiales provenientes del aprovechamiento de las mismas, en las áreas que sean técnicamente susceptibles de ser provistas con dichos materiales (zonas de juego, pistas de trote, entre otras).
- Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, que garantice el cumplimiento normativo. La persona asignada deberá demostrar idoneidad, experiencia y será aprobada por el contra- tante y/o la interventoría.
- Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes al manejo y conservación del medio ambiente.
- Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y pre- sentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.
- Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.

- Instalar aviso de conteo regresivo de acuerdo con las especificaciones del artículo 2 del acuerdo 787 de 2020 en cada uno de los frentes de obra del presente contrato, de igual manera presentar registro fotográfico de la actualización del mismo de acuerdo a la ejecución de la intervención.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

- Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.
- Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
- Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.
- Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
- Las demás establecidas en la normatividad vigente

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales

CLÁUSULA 15. MULTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en caso de mora y/o incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, EL (LA) CONTRATISTA pagará al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE

URIBE multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato.

Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Parágrafo 7. El valor de las multas ingresará a la Tesorería Distrital. EL (LA) CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL (LA) CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20 % del valor total del Contrato. No obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía única.

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

<table>
<tr><td>Característica</td><td colspan="3">Condición</td></tr>
<tr><td>Clase</td><td colspan="3">Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td colspan="3">Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe identificada con el NIT 899999061</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>Amparo</td><td>Vigencia</td><td>Valor Asegurado</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Por el plazo del contrato y 6 meses mas</td><td>Por el diez por ciento (30%)</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Por el cinco

Por ciento (5%)</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obr ejecutadas entregadas a satisfacció</td><td>5 años contados a partir

Del recibo de las obras</td><td>Por un treinta

Por ciento (30%)</td></tr>
<tr><td>Calidad de los bienes suministrados. con una vigencia</td><td>Igual al termino de ejecución del contrato y (1) un año más</td><td>Por el treinta por ciento (30%)</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td colspan="3">Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.</td></tr>
</table>

Característica	Condición
	Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del Contrato Objeto del Contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de 5 años contados a partir del recibo de las obras contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe identificada con el NIT 899999061 y el Contratista

Característica	Condición
Tomador	Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.
Valor	En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
Vigencia	Igual al período de ejecución del Contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe identificada con el NIT 899999061
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del Contrato Objeto del Contrato Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de conformidad a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término requerido, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad

podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLÁUSULA 25. Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá asi: 1) Urbanización Quiroga Etapa lV, V y VI (Cra 19ª No 31-21 sur), 2) Urbanización Quiroga Etapa VII (V) 3) Urbanización Zarazota I (Calle 48h su No 9-11).

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

Elaboró: Jorge Andres Tamayo Castañeda/Profesional de apoyo Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Revisó:
Natalia Fajardo Morales/ Profesional Contratista Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe CPS-313-20

TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

747

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 747 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y CONSORCIO PARQUES VERDES

Entre los suscritos a saber, **DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.883.374de Bogotá, en calidad de ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, en virtud del nombramiento realizado por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto 260 de fecha 29 de julio de 2024 y Acta de Posesión No. 268 de la misma fecha, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 2019, expedido con base en lo dispuesto en el Decreto ley 1421 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien actúa como ordenadora del gasto en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, quien en lo sucesivo se denominará **EL FONDO** por una parte, y por la otra **CONSORCIO PARQUES VERDES,** identificado con NIT: 901905021-8, cuyo representante legal es **VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.521.236, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **ADICIÓN No.1 y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 747-2024,** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La información general del **Contrato de Obra Pública No 747-2024**, a la fecha es la siguiente:

No. Contrato	**747-2024**
Contratista	**CONSORCIO PARQUES VERDES**
Objeto	**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C**
Valor inicial	$ 2.616.903.493
Plazo	Seis (6) meses y Quince (15) días
Fecha de Suscripción	31 de diciembre de 2024
Fecha de Iniciación:	10 de marzo de 2025
Fecha de terminación:	25 de septiembre de 2025
Modificación No.1	Mediante la cual se ajustan las fechas de cobertura de las garantías que ampara el contrato, en consideración a la fecha del acta de inicio del contrato.
Estado:	EN EJECUCIÓN

2. Que el plazo para la ejecución del presente contrato se pactó en seis (06) meses y quince (15) días contados a partir de la firma del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplidos los requisitos para su legalización, de conformidad con lo previsto en los artículos 148 del Decreto Ley 1421 de 1993 y 41 de la Ley 80 de 1993, hecho que ocurrió el 10 de marzo de 2025.

3. Que el valor del contrato se pactó por la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.616.903.493)**, incluido el iva y todos los demás impuestos.

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 747 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y CONSORCIO PARQUES VERDES

4. De conformidad con la plataforma virtual SECOP II, durante lo corrido de su ejecución el contrato de obra pública No 747 de 2024., ha sido objeto de las siguientes modificaciones: Modificación 1: Mediante la cual se ajustan las fechas de cobertura de las garantías que ampara el contrato, en consideración a la fecha del acta de inicio del contrato.

5. Que mediante radicados No. CPV-OBR-059 y alcance No. CPV-OBR-064, remitido por la Interventoría CONSORCIO INTER RUU PARQUES, remite aprobación para que se realice Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del Contrato de Obra No. COP-747-2024 solicitada por el Contratista de obra CONSORCIO PARQUES VERDES, con el fin de continuar con la ejecución del mismo, realizando las correspondientes explicaciones a su solicitud:

"(…) Cordial saludo,
Teniendo en cuenta la solicitud de modificación al contrato de obra No. 747 de 2024 adición No. 1 y prórroga No. 1 realizada por el contratista CONSORCIO PARQUES VERDES, mediante la comunicación CPV-OBR-064 del 27 de julio de 2025, la interventoría manifiesta lo siguiente:

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 747 de 2024, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe y el contratista CONSORCIO PARQUES VERDES el día 31 de diciembre de 2024 tiene por objeto "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REAILIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C". tiene un valor inicial de $2.616.903.493 (DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS) y cuenta con fecha de inicio el día 10 de marzo de 2025 y una fecha de terminación inicial del contrato para el día 24 de septiembre de 2025

2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

La solicitud presentada por el contratista CONSORCIO PARQUES VERDES posee todo el argumento jurídico soportado en las consideraciones de la ley 80 de 1993 y las Sentencias del Honorable Consejo de Estado, que han especificado que los contratos estatales pueden ser modificados en aras de lograr su finalidad y en búsqueda de la realización de los fines del Estado y del contrato de obra No. 747 de 2024.

De igual manera, la interventoría revisó y verificó la normatividad legal vigente a la que hace referencia el contratista en el documento de solicitud de adición No. 1 y prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 747 de 2024 concluyendo que este requerimiento se ajusta en su integridad a los parámetros legales.

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

Dentro del marco del contrato de obra No. 747 de 2024 y en el anexo técnico del mismo se tiene como objetivo la construcción de 3 parques que están ubicados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, a continuación, se presentan los parques que se deben intervenir en la ejecución del contrato de obra No. 747 de 2024.

N°	Código	Nombre	Tipo	UPZ	Total, población beneficiada.
1	18-042	Urbanización Quiroga Etapa IV, V y VI	Bolsillo	Quiroga	93.787 hab.
2	18-138	Urbanización Quiroga Etapa VII	Bolsillo		
3	18-180	Urbanización Zarazota I	Vecinal	Marruecos	124.210 hab.
TOTAL PERSONAS QUE BUSCA BENEFICIAR ESTE PROYECTO					217.997

Fuente propia

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 747 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y CONSORCIO PARQUES VERDES


El contratista de obra durante el desarrollo del contrato de obra No. 747 de 2024 por medio de recorridos y reuniones entre el contratista, interventoría y supervisión identifico la necesidad que presenta el proyecto, las cuales pueden ser solucionadas a través de la adición de recursos monetarios al contrato de obra No. 747 de 2024.
A continuación, se presentan las necesidades que identifico el contratista de obra, la inclusión de un nuevo parque y la necesidad de actividades en el parque 18-180 Zarazota I; actividades que a criterio de esta interventoría son aptas para su inclusión en la ejecución de cada parque, lo que genera mayores cantidades de obra que se pueden realizar con la adición de recursos al contrato de obra No. 747 de 2024.

18-118 Urbanización Zarazota I

Se están ejecutando actividades de excavaciones y cortes para la construcción de muros de contención en la zona inferior del parque que colinda con el área circundante del colegio María Cano.


- *En el informe de geotécnica presentado dentro de la consultoría 332 de 2019, se presenta la necesidad de ejecutar obras de contención en la parte inferior del proyecto, para mitigar los efectos de un deslizamiento provocado en este talud.*


En esta zona presenta un deslizamiento de tipo rotacional, el cual debe ser evaluado toda vez que, es necesario para reconformar dicho sector con el fin de reconstituir el sendero peatonal y las obras hidráulicas inicialmente construidas en la corona del talud.



Fuente propia

De acuerdo a lo anterior y basados en los estudios y diseños previos del parque, se debe llevar a cabo la construcción de un muro de contención en concreto reforzado cimentado sobre Caisson, para el buen manejo y estabilización de la zona a intervenir. A continuación, se presenta el perfil del muro de contención y el detalle del refuerzo de los caisson a construir en esta zona de parque:

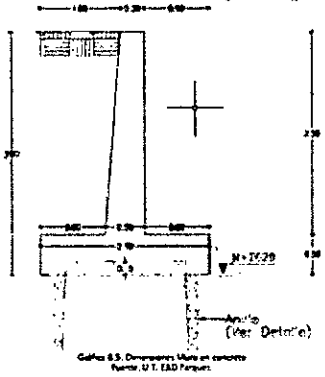

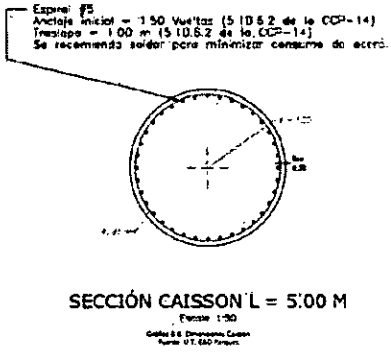

Con base en la intervención propuesta de la construcción del muro de contención en el parque Zarazota I, el presente contrato de obra 747 de 2024, se requiere una adición por valor de TRECIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 330.987.947).

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 747 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y CONSORCIO PARQUES VERDES

Inclusión de la primera etapa del parque Quiroga etapa I, II y II 18-202

El CONSORCIO PARQUES VERDES presenta la inclusión del parque Quiroga 18-202, debido a la información suministrada por parte del FDLRUU y la necesidad de incluirlo en la adición del contrato de obra 747 de 2024, parque que se encuentra priorizado por el fondo y que cuenta con estudios y diseños por medio de la consultoría del contrato 332 de 2019.

El parque Quiroga 18-202, en estos estudios y diseños, se encuentra dividido en 6 zonas y cuenta con un balance presupuestal de intervención de $2.244.897.117 para la completa ejecución del parque.

El contratista propone iniciar la intervención del parque en una primera fase la cual contaría con la ejecución de las siguientes zonas y actividades:

Zona Cancha y Zona Biosaludables:

- *Reconstrucción de cancha deportiva: La cual cuenta con la excavación de la cancha, la estabilización de la subrasante, rellenos y compactación de material, demarcación e instalación de mallas contra impacto.*
- *Construcción de Plazoleta de Biosaludables: Construcción de placa en concreto, instalación de bancas y señales y construcción de sendero.*

El valor presupuestado de la intervención de estas zonas es de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DIECIETE PESOS M/CTE ($ 652.141.017)

Zona Juegos infantiles y senderos peatonales:

- *Construcción de zona de juegos infantiles: Esta zona cuenta con la ejecución de una plazoleta para juegos infantiles la cual cuenta con la instalación de piso chip de caucho, la instalación de un juego infantil y construcción de algunos senderos.*

El valor presupuestado de la intervención de esta zona es de TRECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 325.322.783)

Basado en los valores anteriormente mencionados, el contratista de obra presenta una solicitud de adición de $ 1.308.451.747, la cual corresponde al acumulado de la construcción del muro de contención de parque Zarazota I equivalente a $ 330.987.947 y la inclusión del parque Quiroga 18-202, el cual corresponde a la reconstrucción de cancha deportiva, construcción de Zona de biosaludables y Zona de parque infantil con un valor de intervención de $ 977.463.800.

Para esta interventoría es viable la solicitud que presenta el contratista de obra pues la construcción del muro de contención en el parque 18-118 urbanización Zarazota I, reviste importancia debido a que es necesaria su construcción para generar estabilidad en el talud y brindar a la comunidad una estructura estable que ofrezca todas las condiciones de seguridad a las personas que hacen uso del parque, la construcción de este muro no es posible con el valor actual del contrato de obra No. 747 de 2024. Por otra parte la intervención de un nuevo parque el cual ya cuenta con estudios y diseños que se realizaron mediante el contrato de consultoría No. 322 de 2019 es un impulso adicional al cumplimiento de las metas planteadas por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe para generar mejora en los lugares destinados a ofrecer espacios de convivencia, espacios seguros para niños y familias, fomentar la salud pública y mejorar la calidad de vida de los habitante de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Actualmente el contrato de obra No. 747 de 2024 se encuentra en el plazo contractual pactado, que el parque Quiroga 18-202 presenta una necesidad de intervención con prontitud y que su ubicación es cercana a los parques que actualmente se están interviniendo porque son parte del alcance inicial del contrato de obra No. 747 de 2024. Su inclusión al alcance del contrato de obra esta soportada en que el contratista de obra ya cuenta con la maquinaria necesaria, el personal adecuado, tiene conocimiento de la zona, así mismo que ya dentro del contrato se tienen

establecidas las actividades de obra contractuales así como no previstas y que el valor de las actividades contractuales sería menor en comparación a una nueva licitación debido a que los precios aumentan por el cambio de vigencia, adicionalmente cuenta con toda la justificación necesaria la intervención del parque Quiroga 18-202 en este momento pues es de tener en cuenta también el tiempo que tarda un proceso de licitación desde su de etapa de estudios previos hasta el momento en que se entrega a la comunidad la obra contratada producto de ese proceso de licitación que puede durar 15 meses y que si el parque es incluido para intervención en la ejecución del contrato de obra No. 747 de 2024 se entregaría a la comunidad en 97 días.

Lo anterior estableciendo que en ningún momento se cambiaria el objeto inicial del contrato de obra No. 747 de 2024 pues se sigue buscando el objeto del contrato que es la realización de las obras de construcción de parques catalogados de proximidad en la localidad de Rafael Uribe Uribe, solo que se ampliaría el alcance del contrato al intervenir no 3 parques sino 4, también es de tener en cuenta que al nuevo parque no se le realizaran actividades de obra diferentes a las que actualmente se les realizan a los parques que son parte del alcance actual del contrato de obra.

Basado en el análisis presentado, con la aprobación de la adición y prorroga presentada por el contratista de obra CONSORCIO PARQUES VERDES, se consigue avance mayor para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la localidad de Rafael Uribe Uribe y del plan de "Espacio público inclusivo en Rafael Uribe Uribe". cuya meta es "Intervenir 10.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación" establecidos para el desarrollo y el progreso de la localidad en general.

4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES

AMBIENTALES

Durante la intervención de los parques y espacio público, se seguirá haciendo seguimiento al plan de manejo ambiental del contrato de obra teniendo en cuenta la adecuada recolección, separación, y disposición final de residuos sólidos y escombros generados. Esto con el fin de evitar afectaciones al entorno natural, proteger los sistemas de drenaje y mitigar posibles impactos negativos sobre la fauna y flora urbana circundante.

SOCIALES

Es fundamental involucrar a la comunidad en el proceso de intervención de los de los parques y el espacio público, esto permite suplir las necesidades reales de la comunidad y fomentar el cuidado colectivo de la infraestructura intervenida.

Aprobación presentada por esta interventoría, se busca ampliar acompañamiento social en los nuevos frentes de obra, asegurando que la comunidad beneficiada cuente con la suficiente información acerca del alcance de las intervenciones, los tiempos de ejecución y los beneficios esperados.

5. ANÁLISIS DEL VALOR DE LA ADICIÓN

Teniendo en cuenta que el valor inicial del contrato obra No. 747 de 2024 corresponde a $2.616.903.493 (DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS) y el valor de la adición solicitada es de $1.308.451.747 (MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS), se evidencia que la adición solicitada corresponde al 50% del valor inicial del contrato y que para esta interventoria es válida y resultaria favorable la adición de recursos en cumplimiento del objetivo del proyecto, con la anterior comparación se evidencia que dentro de la adición solicitada se está cumpliendo con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.

En cuanto a la adición en valores fijos como costo de actividades ambientales, el contratista presentó bajo las matrices establecidas para el cálculo de estos costos en la etapa precontractual del proceso FDLRUU-LP-003-2024, donde se tomaron los mismos valores establecidos con anterioridad, por lo que la interventoría considera

conveniente y acertado el ajuste de valor de estos componentes al valor presentado en la tabla de presupuesto con adición.

6. ANÁLISIS DE LA PRORROGA:

Con la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra y más actividades dentro del marco del contrato de obra No. 747 de 2024, se requiere un plazo adicional para que el contratista pueda ejecutar estas mayores cantidades de obra y actividades adicionales, por lo que el contratista presentó a la interventoría un cronograma de obra que contempla el tiempo adicional necesario para la ejecución de las diferentes actividades y cantidades adicionales, en un plazo adicional desde la fecha de terminación actual de tres (3) meses y una (1) semana, una vez revisado el cronograma realizado por el contratista, la interventoría informa que se analizaron las diferentes actividades presentadas, así como los rendimientos de las mismas. En este estudio se tuvo en cuenta, el factor climático y la condición del terreno ya que, por la temporada invernal y la ubicación geográfica de los parques, las actividades se pueden ver afectadas, así mismo se analizaron los rendimientos, los recursos con los que se van a llevar a cabo actividades como lo son el personal de obra, las herramientas, los equipos, los materiales etc.

Con base en lo anterior, y después de revisar los aspectos técnicos, ambientales, logísticos, financieros y todos los que puedan afectar el desarrollo del contrato, se avala la programación presentada por el contratista ya que cumple con los tiempos propuestos para la realización y cumplimiento del objeto del contrato, es así como con la verificación de estos parámetros técnicos se encuentra viable realizar una prórroga en tiempo al contrato de obra No. 747 de 2024 por tres (3) meses y una (1) semana. Esto con el fin de generar obras que cumplan con la calidad y estabilidad que exigen este tipo de proyectos. (…)

CONCLUSIÓN:

Por las razones anteriormente expuestas se avala la solicitud de adición al contrato de obra No. 747 de 2024 por un valor de 1.308.451.747 ***(MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS),*** *y una prórroga al contrato de obra No. 747 de 2024 por un periodo de tres (3) meses y una (1) semana a partir de la fecha actual de terminación del contrato, periodo de tiempo necesario para que el contratista de obra realice las labores necesarias en sus gestiones sociales, ambientales y técnicas para la intervención y puesta en servicio de los segmentos viales que se incluyen al contrato de obra No. 747 de 2024 con la aprobación de la adición. (…)"*

6. Que a través de formato de solicitud de modificación contractual con fecha del 29 de julio de 2025 el área de infraestructura, solicitó Adición No.1 y Prorroga No.1 al Contrato de Obra No. COP-747-2024, emitiendo concepto de viabilidad jurídica, financiera y técnica para la suscripción de modificación al Contrato, en los cuales se incluye la respectiva justificación, conforme se describe groso modo a continuación:

(…) CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Mediante radicado No. CPV-OBR-059 y alcance No. CPV-OBR-064, el contratista CONSORCIO PARQUES VERDES radica a la interventoría la solicitud prorroga No.1 y adición No.1 al contrato de obra pública 747 de 2024. Es así como la interventoría CONSORCIO INTER RUU PARQUES mediante radicado CIRP-2024-741-078 radicado FDLRUU No. 20256810067362 y alcance CIRP-2024-741-082 radicado FDLRUU No. 20256810067362 avala la prorroga No. 1 por 3 meses y 8 dias y la adicion No. 1 por valor de: $1.308.451.747

De acuerdo con lo anterior, es importante señalar los siguientes antecedentes:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 747 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y CONSORCIO PARQUES VERDES

1. *El Contrato de obra Pública No. 747 de 2024 incluye en su alcance la construcción, de tres parques los cuales actualmente se encuentran en ejecución:*

PARQUE	% de obra física ejecutada
18-042	Urbanización Quiroga Etapa VII
18-138	Parque Urbanización Quiroga Etapa VII
18-180	Urbanización Zarazota I

2. *El referido contrato, contemplaba un plazo de ejecución inicial de seis (6) meses y quince (15) dias y su ejecución inicio el 10 de marzo de 2025 y fecha de terminación inicial definida para el 24 de septiembre del año en curso.*

3. *Durante el desarrollo del contrato, el CONSORCIO PARQUES VERDES ha presentado a la interventoría CONSORCIO INTER RUU PARQUES tres (3) actas parciales.*

4. *En virtud de lo anterior, El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, ha dado tramite al pago de tres (3) actas parciales de obra por valor de $ 882.617.791, lo que corresponde a un avance financiero del 33,73%, con respecto al valor inicial del Contrato de Obra en cuestión.*

5. *Teniendo en cuenta el objeto contractual del contrato No. 747 de 2024, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe ve pertinente integrar al alcance contractual la construcción del parque URBANIZACION QUIROGA I, II, III ETAPA con Cod. 18-202 el cual cuenta con estudios y diseños.*

6. *Teniendo en cuenta las necesidades técnicas y constructivas en el parque Urbanización Zarazota I, respecto a la construcción de un muro de contención en concreto reforzado cimentado sobre caisson el cual, el FDLRUU ve viable la adición de recursos para efectuar dichas actividades.*

Por lo anterior, se hacen las siguientes precisiones

CONCEPTO APOYO A LA SUPERVISION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 741 DE 2024:

IMPACTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DEL FDRUU

• Con los recursos de la vigencia del año 2024, el FDLRUU suscribió el contrato de obra pública No. 747 de 2024 el cual buscaba incluir los siguientes avances a las metas del plan de desarrollo local: "Un nuevo contrato social y ambiental para la localidad de Rafael Uribe Uribe" del PDL 2021-2024:

Nombre del proyecto:	**Más parques en Rafael Uribe Uribe**
Código Proyecto:	**1670**
Programa:	**Más parques en Rafael Uribe Uribe**

Meta:	**Construir 2000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).**
Aporte a la meta:	**Urbanización Quiroga Etapa IV, V y VI - 685,42 m2**
	Urbanización Quiroga Etapa VII - 1.102,76 m2
	Urbanización Zarazota I - 3.686,00 m2

Al respecto, las actividades constructivas en los parques mencionadas anteriormente se encuentran en ejecución, sin embargo dada la necesidad de ejecutar las actividades de construcción de un muro de contención en el parque

Urbanización Zarazota I las cuales son necesarias para culminar la construcción de dicho parque, se hace necesario adicionar los recursos indicados por el contratista y avalados por la interventoría.

• Con la presente modificación se solicita incluir dentro del contrato la construcción del parque URBANIZACION QUIROGA I, II, III ETAPA con Cod. 18-202 el cual cuenta con estudios y diseños. Dicha inclusión aportaría al avance de las metas planteadas en el plan de desarrollo local "Rafael Uribe Uribe Camina Segura" delPDL 2025-2028:

Nombre del proyecto:	"Rafael Uribe Uribe con parques revitalizados, renovados e inclusivos
Código Proyecto:	2697
Meta:	Construir 2.400 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación)
Aporte a la meta:	Urbanización Quiroga Etapa IV, V y VI - 1718 m2 equivalente a 73,6%

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo a la documentación allegada por la interventoría del contrato de obra No. 747 de 2024, el proyecto cuenta con un avance físico general de intervención del 50,18%, el cual se encuentra soportado con las actividades de tres frentes de obra los cuales tienen el siguiente avance físico de obra:

PARQUE	% DE OBRA FÍSICA EJECUTADA	% DE OBRA PROGRAMADA
18-042 - Urbanización Quiroga Etapa VII	78,40%	75%
18-138 - Parque Urbanización Quiroga Etapa VII	33,86%	31,03%
18-180 - Urbanización Zarazota I	14,31%	14,25%

Por lo anterior, y de conformidad al seguimiento realizado por la interventoría y el apoyo a la supervisión a la ejecución del contrato de obra No. 747 de 2024, se observa que si bien se han dado actividades no previstas, estas no afectado el cronograma inicial de obra definido para la ejecución de actividades de construcción de los parques, por lo que no hay retrasos en la ejecución del contrato.

IMPACTO DE LA ADICION Y PRORROGA EN EL AVANCE Y CRONOGRAMA DE OBRA

Una vez revisado el estado actual de avance sobre el cronograma de obra del contrato No. 747 de 2024 y de acuerdo con el cronograma de obra propuesto por el contratista de obra e interventoría, con la presente modificación quedaría con una fecha de inicio del 10 de marzo de 2025 con un plazo inicial de ejecución de 6 meses y 15 días y una prórroga de 3 meses y una semana teniendo como fecha de finalización total el 31 de diciembre de 2025.

Es decir que con la presente modificación la finalización de actividades de obra de cada parque quedaría de la siguiente manera:

PARQUE	Fecha proyectada finalización de obras
18-042 - Urbanización Quiroga Etapa VII	15-08-2025
18-138 - Parque Urbanización Quiroga Etapa VII	25-09-2025
18-180 - Urbanización Zarazota I	19-12-2025
PARQUE ADICIONADO	
18-202 - Urbanización Quiroga I, II, III etapa	30-12-2025

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 747 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y CONSORCIO PARQUES VERDES

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Actualmente el contrato de obra cuenta con el siguiente avance financiero:

PAGOS	PERIODO DE COBRO	VALOR COBRO	VALOR ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR	% AVANCE	%ACUMULADO	RADICADO
1	10 de marzo de 2025 al 30 de abril de 2025.	$199.807.826	$199.807.826	$2.417.095.667	7,64%	7,64%	20256810043232
2	1 de mayo de 2025 y 20 de mayo de 2025	$143.348.787	$343.156.613	$2.273.746.880	5,48%	13,11%	20256810051412
3	21 de mayo de 2025 y 20 de junio de 2025	$539.461.178	$882.617.791	$1.734.285.702	20,614%	33,73%	20256810064092

Conforme lo anterior, conforme al acta parcial de obra No. 3 se tiene un avance financiero del 33,73% sobre el total del contrato, con un valor acumulado facturado por el contratista por valor de $882.617.791 y un saldo por cobrar de $1.734.285.702.

En concordancia a lo anterior, a continuación, se indica el avance financiero a corte del acta parcial de obra No. 3 de cada parque:

Parque	Presupuesto proyectado	Presupuesto ejecutado	% Avance
18-042 - Urbanización Quiroga Etapa VII	$533.617.908,00	$418.349.206,00	78,40%
18-138 - Parque Urbanización Quiroga Etapa VII	$849.673.932,00	$ 287.727.429,00	33,86%
18-180 - Urbanización Zarazota I	$1.233.611.657,00	$176.541.160,00	14,31%

IMPACTO DE LA ADICION Y PRORROGA EN EL AVANCE Y CRONOGRAMA DE OBRA

El contrato de obra pública No. 747 de 2024 fue suscrito por un valor de $ 2.616.903.493 es decir 2013,00 SMMLV. La presente solicitud de adición se encuentra por valor de $ 1.308.451.747 es decir 919,18 SMMLV lo cual equivale al 45,66% es decir que no supera el 50% de valor inicial del contrato.

Lo anterior conforme lo indicado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 el cual indica:

"(...) PARÁGRAFO.- En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. (...)"

Con la presente modificación por valor de $1.308.451.747 se tendría un valor total contratado de $ 3.925.355.240,00:

PAGOS	VALOR COBRO	VALOR ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR	% AVANCE	% ACUMULADO
1	$ 199.807.826	$ 199.807.826	$ 3.725.547.414	5,09%	5,09%
2	$ 143.348.787	$ 343.156.613	$ 3.582.198.627	3,65%	8,74%
3	$ 539.461.178	$ 882.617.791	$ 3.042.737.449	13,743%	22,49%

Es decir que se tendría un avance financiero del 22,49% con un saldo por ejecutar de $ 3.042.737.449.

(...)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA

La modificación contractual conforme a lo aprobado por la Interventoría se encuentra justificada en los siguientes aspectos:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 747 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y CONSORCIO PARQUES VERDES

"(...) JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

La solicitud presentada por el contratista CONSORCIO PARQUES VERDES posee todo el argumento jurídico soportado en las consideraciones de la ley 80 de 1993 y las Sentencias del Honorable Consejo de Estado, que han especificado que los contratos estatales pueden ser modificados en aras de lograr su finalidad y en búsqueda de la realización de los fines del Estado y del contrato de obra No. 747 de 2024.

De igual manera, la interventoría revisó y verificó la normatividad legal vigente a la que hace referencia el contratista en el documento de solicitud de adición No. 1 y prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 747 de 2024 concluyendo que este requerimiento se ajusta en su integridad a los parámetros legales.

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

Dentro del marco del contrato de obra No. 747 de 2024 y en el anexo técnico del mismo se tiene como objetivo la construcción de 3 parques que están ubicados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, a continuación, se presentan los parques que se deben intervenir en la ejecución del contrato de obra No. 747 de 2024.

Nº	Código	Nombre	Tipo	UPZ	Total, población beneficiada
1	18-042	Urbanización Quiroga Etapa IV, V y VI	Bolsillo	Quiroga	93.787 hab.
2	18-138	Urbanización Quiroga Etapa VII	Bolsillo		
3	18-180	Urbanización Zarazota I	Vecinal	Marruecos	124.210 hab.
TOTAL PERSONAS QUE BUSCA BENEFICIAR ESTE PROYECTO					217.997

Fuente propia

El contratista de obra durante el desarrollo del contrato de obra No. 747 de 2024 por medio de recorridos y reuniones entre el contratista, interventoria y supervisión identifico la necesidad que presenta el proyecto, las cuales pueden ser solucionadas a través de la adición de recursos monetarios al contrato de obra No. 747 de 2024.

A continuación, se presentan las necesidades que identifico el contratista de obra, la inclusión de un nuevo parque y la necesidad de actividades en el parque 18-180 Zarazota I; actividades que a criterio de esta interventoria son aptas para su inclusión en la ejecución de cada parque, lo que genera mayores cantidades de obra que se pueden realizar con la adición de recursos al contrato de obra No. 747 de 2024.

(...)

7. ANÁLISIS DE LA PRORROGA:

Con la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra y más actividades dentro del marco del contrato de obra No. 747 de 2024, se requiere un plazo adicional para que el contratista pueda ejecutar estas mayores cantidades de obra y actividades adicionales, por lo que el contratista presentó a la interventoria un cronograma de obra que contempla el tiempo adicional necesario para la ejecución de las diferentes actividades y cantidades adicionales, en un plazo adicional desde la fecha de terminación actual de tres (3) meses y una (1) semana, una vez revisado el cronograma realizado por el contratista, la interventoria informa que se analizaron las diferentes actividades presentadas, así como los rendimientos de las mismas. En este estudio se tuvo en cuenta, el factor climático y la condición del terreno ya que, por la temporada invernal y la ubicación geográfica de los parques, las actividades se pueden ver afectadas, así mismo se analizaron los rendimientos, los recursos con los que se van a llevar a cabo actividades como lo son el personal de obra, las herramientas, los equipos, los materiales etc.

Con base en lo anterior, y después de revisar los aspectos técnicos, ambientales, logísticos, financieros y todos los que puedan afectar el desarrollo del contrato, se avala la programación presentada por el contratista ya que cumple con los tiempos propuestos para la realización y cumplimiento del objeto del contrato, es así como con

la verificación de estos parámetros técnicos se encuentra viable realizar una prórroga en tiempo al contrato de obra No. 747 de 2024 por tres (3) meses y una (1) semana. Esto con el fin de generar obras que cumplan con la calidad y estabilidad que exigen este tipo de proyectos…

8. CONCLUSIÓN:

Por las razones anteriormente expuestas se avala la solicitud de adición al contrato de obra No. 747 de 2024 por un valor de 1.308.451.747 (MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS), y una prórroga al contrato de obra No. 747 de 2024 por un periodo de tres (3) meses y una (1) semana a partir de la fecha actual de terminación del contrato, periodo de tiempo necesario para que el contratista de obra realice las labores necesarias en sus gestiones sociales, ambientales y técnicas para la intervención y puesta en servicio de los segmentos viales que se incluyen al contrato de obra No. 747 de 2024 con la aprobación de la adición."

Así las cosas, de acuerdo con el balance presupuestal del Contrato revisado y aprobado por la Interventoría, es claro que con la presente solicitud de adicion No. 1 y prorroga No. 1, dará mayor alcance a los objetivos del objeto contractual, asi mismo, con la integración de la construcción del parque URBANIZACION QUIROGA I, II, III ETAPA de Cod. 18-202 se dará alcance al proyecto 2697 - Rafael Uribe Uribe con parques revitalizados, renovado e inclusivo, del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad de Rafael Uribe Uribe 2025-2028 "Rafael Uribe Uribe Camina Segura".

En virtud, de lo expuesto, la Interventoría CONSORCIO INTER RUU PARQUES, solicita a la Entidad Contratante realizar una adición de recursos por valor de MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOSCINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCT ($1.308.451.747,00) precisando frente al particular lo siguiente:

"(…)5. ANÁLISIS DEL VALOR DE LA ADICIÓN

Teniendo en cuenta que el valor inicial del contrato obra No. 747 de 2024 corresponde a $2.616.903.493 (DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS) y el valor de la adición solicitada es de $1.308.451.747 (MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS), se evidencia que la adición solicitada corresponde al 50% del valor inicial del contrato y que para esta interventoría es válida y resultaría favorable la adición de recursos en cumplimiento del objetivo del proyecto, con la anterior comparación se evidencia que dentro de la adición solicitada se está cumpliendo con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. En cuanto a la adición en valores fijos como costo de actividades ambientales, el contratista presentó bajo las matrices establecidas para el cálculo de estos costos en la etapa precontractual del proceso FDLRUU-LP-003-2024, donde se tomaron los mismos valores establecidos con anterioridad, por lo que la interventoría considera conveniente y acertado el ajuste de valor de estos componentes al valor presentado en la tabla de presupuesto con adición.

(…)

En conclusión, el CONSORCIO INTER RUU PARQUES en su calidad de interventor del contrato de obra No. 747 de 2024, aprobó lo siguiente:

- *Adición No. 1 al Contrato de Obra por un valor de MIL TRECIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.308.451.747,00) con el objetivo de realizar las actividades de construcción de un muro de contención en concreto reforzado cimentado sobre Caisson, para el buen manejo y estabilización de la zona del*

parque de Cod. 18-118 Urbanización Zarazota I y la fase No. 1 de construcción del parque Quiroga etapa I, II y II 18-202.

- *Prorroga No. 1 al contrato de obra de tres meses y una semana para que el contratista de obra realice las labores necesarias en sus gestiones sociales, ambientales y técnicas para la intervención y puesta en servicio de los parques. (…)"*

7. Que dentro de las estipulaciones pactadas en el SECOP II en referencia al Contrato de Obra No. COP-747-2024 se estableció la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato, así mismo dentro del clausulado del contrato se estipuló la posibilidad de suscribir adiciones y prórrogas.

8. La modificación de prórroga acordada por las partes al Contrato de Obra Pública No. **747-2024**, se encuentra amparada legalmente según lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que señala:

(…) Artículo 40°.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. (…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. (…) En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas y estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…).

8. Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, y que el presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró directamente con fundamento en la Ley 80 de 1993 artículo 3 " *DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL -(…) "las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."*

9. La jurisprudencia ha considerado que el plazo en los contratos estatales es susceptible de modificación, ya sea de manera unilateral por parte de las Entidades Públicas o de común acuerdo, en tanto este no constituye un elemento esencial de los Contratos Estatales. En virtud de lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 24 de agosto de 2005, señaló al tenor literal:

(…) Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato (…).

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 747 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y CONSORCIO PARQUES VERDES

10. La jurisprudencia antes citada indica frente a la adición de los contratos estatales: *"(…) es además expresamente autorizada por el artículo 40 de la ley 80, siempre y cuando no exceda el 50% del valor inicial. (…)"* hecho que se respeta en el caso de la presente adición.

11. En la actualidad el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. **747-2024,** se encuentra vigente, lo cual permite proceder con la modificación solicitada por la supervisión del contrato.

12. Para garantizar el valor de la adición solicitada el Fondo de Desarrollo Local cuenta con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1570 del 31 de julio de 2025**, expedido por el responsable de presupuesto del Fondo

Con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra pública No. **747-2024** por **TRES (03) MES y SIETE (07) días**, contados a partir del **25 de septiembre de 2025,** teniendo como nueva fecha vencimiento el **31 de diciembre de 2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA. ADICIÓN E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Adicionar el valor del **contrato** de obra pública No. **747-2024,** la suma de **MIL TRECIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.308.451.747,00) M/Cte.** el cual se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **1570 del 31 de julio de 2025** con cargo al rubro presupuestal O230117459920242697 denominado *"Rafael Uribe Uribe con parques revitalizados, renovados e inclusivos."*. Para un valor total del contrato de **TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($3.925.355.240) M/Cte.**

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y GARANTIAS: La presente Modificación se perfecciona con la correspondiente aprobación por las partes a través de la plataforma del SECOP II. El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo a través del **SECOP II,** para su correspondiente aprobación.

CLÁUSULA CUARTA. VIGENCIA: Las demás cláusulas y condiciones del contrato, se mantienen sin modificación alguna y continúan vigentes para las partes. Para constancia se firma por las partes a través de la plataforma electrónica SECOP II.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Elaboró: John Henry Bohórquez -/Profesional de apoyo Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe CPS-042-2025

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
560809781

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000034258 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD. AGE: 560 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
13	08	2025	30	09	2025	23:59	31	12	2025	23:59	92	13	08	2025

VIGENCIA DESDE — A LAS — VIGENCIA HASTA — A LAS — DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA — VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
30	09	2025	23:59	31	12	2025	23:59	92

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSORCIO PARQUES VERDES — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.905.021-8

DIRECCIÓN: KR 14 19 39 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3134534688

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES VERDES — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.905.021-8

DIRECCIÓN: KR 14 19 39 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3134534688

BENEFICIARIO: CONSORCIO PARQUES VERDES — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.905.021-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES VERDES — NIT : 901905021

ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: BOGOTA DC

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA — TIPO DE RIESGO: ESTATAL — MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284,700,000.00		
	PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	284,700,000.00		
	RCE PATRONAL	284,700,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS 'PROPIOS' Y 'NO' PROPIOS/RESPONSABILIDAD 'CIVIL' CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 901905021 - CONSORCIO PARQUES VERDES

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # COP 747-2024 REFERENTE A CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REAILIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C".

ESTA POLIZA INCLUYE GARANTIA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. VALOR ASEGURADO 200 SMMLV.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,700,000.00	$ **********215,280	$*********0.00	$ *******40,903	$ **********256,183

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
PORVENIR LIMITADA ASESORES DE SEGURO	8288	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560809781

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

LMORENOPAT 0

CBDE20700C0FFA7958

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000034258 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO PARQUES VERDES IDENTIFICACIÓN: NIT 901.905.021-8

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES VERDES IDENTIFICACIÓN: NIT 901.905.021-8

BENEFICIARIO: CONSORCIO PARQUES VERDES IDENTIFICACIÓN: NIT 901.905.021-8

TEXTO ITEM 1

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS
NIT 901253191 - GRUPO IPROGEX ZOMAC SAS - PART: 10.00%
NIT 901081252 - INGECOL HS Y CIA S EN C - PART: 90.00%

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE NIT. 899.000.061, CONSORCIO PARQUES VERDES NIT. 899.999.061 Y TERCEROS AFECTADOS.

OBJETO DE LA MODIFICACION ANEXO 2

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN DOCUMENTO ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DE FECHA 31/07/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR.

FECHA GOBLAL DE LA POLIZA:
FECHA DEL CONTRATO: 31/12/2024
FECHA ACTA DE INICIO: 10/03/2025 HASTA EL 31/12/2025.

OBJETO DE LA MODIFICACION ANEXO 1

MEDIANTE LA PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10/03/2025. LOS DEMAS TERMINOS YCONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR.

VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA.
FECHA DEL CONTRATO: 31/12/2024
FECHA ACTA DE INICIO: 10/03/2025.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000034258 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSORCIO PARQUES VERDES IDENTIFICACION: 901.905.021-8

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO PARQUES VERDES	901905021-8	BOGOTA DC	BOGOTÁ, D.C.	284,700,000.00	215,280	256,183

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
215,280	256,183

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5608097324

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000186240 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
13	08	2025	13	08	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSORCIO PARQUES VERDES IDENTIFICACIÓN. NIT 901.905.021-8

DIRECCIÓN: KR 14 19 39 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3134534688

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE IDENTIFICACIÓN. NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	31/07/2025	30/03/2026	1,177,606,572.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	31/07/2025	30/09/2028	196,267,762.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	1,177,606,572.00
CALIDAD DEL BIEN	31/07/2025	30/09/2026	1,177,606,572.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901253191 - GRUPO IPROGEX ZOMAC SAS - PART: 10.00%
NIT 901081252 - INGECOL HS Y CIA S EN C - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. COP 747-2024, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REAILIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,243,029,159.65	$ ********6,645,913	$*********0.00	$ ****1,262,724	$ ********7,908,637

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
PORVENIR LIMITADA ASESORES DE SEGURO	8288	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/ws_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560809732

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

CBDE20700C0FFA795D

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000186240 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO PARQUES VERDES IDENTIFICACIÓN: NIT 901.905.021-8

ASEGURADO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

TEXTO ITEM 1

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE NIT. 899.000.061.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

OBJETO DE LA MODIFICACION ANEXO 2

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS SEGUN DOCUMENTO DE ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DE FECHA 31/07/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR.

OBJETO DE LA MODIFICACION ANEXO 1

MEDIANTE LA PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10/03/2025. LOS DEMAS TERMINOS YCONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR.

VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA.
FECHA DEL CONTRATO: 31/12/2024
FECHA ACTA DE INICIO: 10/03/2025.

CLIENTE

766

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5608097324

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000186240 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD. AGENCIA: 560 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	08	2025	13	08	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO PARQUES VERDES — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.905.021-8

DIRECCIÓN: KR 14 19 39 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3134534688

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE — IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE — IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	31/07/2025	01/07/2026	1,177,606,572.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	31/07/2025	01/01/2029	196,267,762.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	1,177,606,572.00
CALIDAD DEL BIEN	31/07/2025	01/01/2027	1,177,606,572.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901253191 - GRUPO IPROGEX ZOMAC SAS - PART: 10.00%
NIT 901081252 - INGECOL HS Y CIA S EN C - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. COP 747-2024, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA REAILIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PARQUES CATALOGADOS DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *3,729,087,478.00	$ ********1,559,549	$**********0.00	$ ******296,314	$ ********1,855,863

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
PORVENIR LIMITADA ASESORES DE SEGURO	8288	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PAGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560809732

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá — CLIENTE

CBDE20700C0FFA765B

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000186240 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO PARQUES VERDES IDENTIFICACIÓN: NIT 901.905.021-8

ASEGURADO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.061-9

TEXTO ITEM 1

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE NIT. 899.000.061.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

OBJETO DE LA MODIFICACION ANEXO 3

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN DOCUMENTO DE ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DE FECHA 31/07/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR.

ACLARACION INICIO DE VIGENCIA GOBLAL DE LA POLIZA:
CONTRATO: 31/12/2024
ACTA DE INICIO: 10/03/2025.

OBJETO DE LA MODIFICACION ANEXO 2

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS SEGUN DOCUMENTO DE ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DE FECHA 31/07/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR.

OBJETO DE LA MODIFICACION ANEXO 1

MEDIANTE LA PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10/03/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR.

VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA.
FECHA DEL CONTRATO: 31/12/2024
FECHA ACTA DE INICIO: 10/03/2025.

CLIENTE
