INFORME DE INTERVENTORIA PARA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01









CONTRATO DE OBRA No. 439 DE 2024

ONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE RAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ARAUCA, OCTUBRE DE 2025

INFORME DE INTERVENTORIA PARA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

PERIODO: DEL (01) DE ABRIL AL (01) DE JULIO DE 2025 Y
DESDE EL (24) DE JULIO AL (26) DE SEPTIEMBRE DE 2025



CONTRATO DE OBRA No. 439 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 477 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

SUPERVISORA: DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR

FECHA DE ENTREGA: OCTUBRE DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES 6

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN 6
1.2 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 6
2 ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO 8

2.1 DESCRIPCION GENERAL 8
2.2 LOCALIZACION 9
2.3 ALCANCE 10
3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 11

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
3.2 GARANTIAS DEL CONTRATO 12
3.3 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES 15
3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS 15
3.5 ACTAS DE COMITÉ TECNICOS 17
3.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 17
3.7 BITACORA DIARIA DE OBRA 25
3.8 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 26
3.9 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 28
3.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 42
3.11 PERMISOS Y LICENCIAS 45
3.12 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 48
4 ASPECTOS TECNICOS 55

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 55
4.2 MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES AL CONTRATO 58
4.3 MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES AL CONTRATO 58
4.4 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 59
4.5 AVANCE DE LA OBRA 66
4.6 PROGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA 67
4.7 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 68
4.8 ACTIVIDADES EN OBRA EJECUTADAS 69
4.9 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 99
5 ASPECTOS FINANCIEROS 101

6 ASPECTOS AMBIENTALES 103

6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES 103
6.2 SEGUIMIENTO AL PMA O PAGA 103
6.3 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 103

7 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 105

8 CONCLUSIONES 106

9 ANEXOS 107

INTRODUCCION

LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA suscribió el contrato de obra No. 439 DE 2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", con el CONSORCIO ARAUCA AVANZA NIT. No. 901.898.039-9 representado legalmente por el señor CARLOS AUGUSTO RINCON JIMENEZ identificado con cédula de ciudadanía No 13.257.218 de Arauca.

El proyecto es adelantado por la Gobernación de Arauca, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, cuenta con la Interventoría Técnica, ejecutada por el **CONSORCIO INTER HORIZONTE**, a través del Contrato de Interventoría No. 477 de 2024, y la Supervisión de la Gobernación de Arauca a través de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento.

El presente Informe hace la recopilación de las actividades ejecutadas en desarrollo del **CONTRATO DE OBRA No. 439 DE 2024**, en el periodo comprendido **DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

La interventoría ha adelantado actividades de control y seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental encaminadas a asegurar la correcta ejecución de los trabajos, garantizando el estricto control de calidad de los diferentes materiales según las Especificaciones Técnicas del INVIAS 2022, verificando que las actividades desarrolladas sean de acuerdo a planos, plazos contractuales y verificando cantidades ejecutadas, para cumplir con el objetivo que la obra sea técnica, administrativa, financiera y ambiental aceptada de acuerdo a las pautas establecidas por el Departamento de Arauca.

1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la *Concurso de Méritos* número *CM-08-RE-00003-2024,* de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.colombiacompra.gov.co, SECOP II, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al *CONSORCIO INTER HORIZONTE* mediante Resolución *No.4844 del 30 de diciembre de 2024.*

CONTRATO DE OBRA:

El Departamento de Arauca adelantó el proceso de selección del contratista mediante la *licitación pública (obra pública)* número *LO-08-RE-003-2024,* de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.colombiacompra.gov.co, SECOP II, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al *CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L DIEGO ANDRES PRADA CIFUENTES* mediante Resolución *No.4494 del 13 de diciembre 2024.*

1.2 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No.4844 del 30 de diciembre de 2024, se procedió a la suscripción del contrato de interventoría No. 477 de 2024 el día 30 diciembre de 2024 entre Departamento de Arauca y la firma contratista CONSORCIO INTER HORIZONTE, de NIT 901.902.051-5 representada por JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ, el cual tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA con un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES y un valor de $ 669.320.214,78.

CONTRATO DE OBRA:

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación *No. 4494 del 13 de diciembre de 2024,* se procedió a la suscripción del contrato de OBRA *No. 439 de 2024 el día 17 de diciembre de 2024* entre el Departamento de Arauca y la firma contratista *CONSORCIO ARAUCA AVANZA de NIT: 901.898.039-9* representada por *DIEGO ANDRES PRADA CIFUENTES,* el cual tiene por objeto *CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA,* con un plazo de ejecución de *SEIS (06) MESES* y un valor de $ *13.539.631.160,19.*

Mediante la comunicación de radicado No. 20250802909-1 del 2 de abril de 2025, se envió a la Gobernación de Arauca, el Acta No. 001 del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, suscrita el día veintiocho (28) de febrero de 2025, donde indica que en atención a la Renuncia presentada por el señor DIEGO ANDRES PRADA CIFUENTES, se nombra como nuevo representante del CONSORCIO ARAUCA AVANZA, al señor CARLOS AUGUSTO RINCÓN JIMENEZ.

2 ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

El dique vía ha constituido una variante vial de significativa importancia para la movilidad del Municipio de Arauca, representando un desembotellamiento en las zonas céntricas y facilita el acceso a las salidas hacia el interior del País y veredas aledañas a éste y diversos barrios de zona de influencia del dique, garantizando también el desarrollo urbanístico y de expansión del territorio sobre estos sectores, que según el Plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio, conforman las zonas de expansión urbana.

Sin embargo, este dique vía se ha visto interrumpido en su estructura y componente de rodadura en el tramo comprendido entre la glorieta de Caño Jesús y la Laguna El Piquetierra, sobre la zona de influencia de los asentamientos San Vicente y Bello Horizonte, vía la cual no cuenta con una adecuada estructura y su superficie de rodadura es de material limo-arcilloso con grandes deficiencias de resistencia y que en épocas de invierno la convierte en un carreteable intransitable. Genera focos de contaminación y proliferación de plaga para los habitantes de estos asentamientos durante épocas de invierno, así como también afectaciones pulmonares por partículas limo - arcillosas en suspensión en el aire circundante en las viviendas en épocas de verano con el paso de los vehículos, también afectando por suciedad las viviendas de los asentamientos, hoy ya convertidas en Barrios por el Municipio a través de sus respectivos actos administrativo.

El mal estado de la vía conlleva a una reducción en la eficiencia y seguridad vial, aumentando tiempos de viaje y poniendo en riesgo los peatones que transitan la vía, así como la infraestructura de viviendas, dado que en las actuales condiciones no cuenta con parámetros viales, señalización ni paramentos que le indiquen al conductor cual es el área de tránsito vehicular y el ancho de su carril, siendo ello una situación compleja para la población que vulnera su integridad física.

La vía en mención que cuenta con una extensión de 884,16 metros lineales, tiene una representación importante en el desarrollo vial Municipal ya que da continuidad al dique vía, conecta de manera rápida y más corta a quienes ingresan al Municipio y cuyo destino sean las veredas Clarinetero y demás aguas abajo del Río Arauca, habitantes de los asentamientos y barrios sobre el corredor vial que de la glorieta transita hacia Clarinetero y continúa derivando otros ejes viales importantes como el de la vía a Gabanes, entre otros.

El estado actual de la vía es de deterioro significativo, constituido por subrasante y rellenos antrópicos y artesanales de material de tierra y escombros que no garantizan una adecuada estructura y soporte, dificulta la movilidad vehicular y genera un gran riesgo a la seguridad vial de la población, al ser una vía en doble sentido sin la más mínima señalización. Actualmente los asentamientos en la zona de influencia cuentan con una población total aproximadamente de 4.100 habitantes que en su mayor proporción son de escasos recursos.

La alternativa técnica de solución *"CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"* tiene como objeto principal realizar la pavimentación en pavimento flexible asfáltico confinado con

sardineles de la vía que de la Glorieta Caño Jesús conduce a la laguna El Piquetierra del Municipio de Arauca, en una extensión de 884,16 metros lineales, en el cual se conformará una estructura de vía con la instalación de un material granular para el mejoramiento de la subrasante. También contemplará capa de sub-base granular de 30 cm de espesor y una base de 20 cm y una capa de asfalto MDC-19 de 10 cm.

Así mismo, incluye en el proyecto manejo de agua lluvias a través de cunetas y se dispondrá de un Box Coulvert. Se desarrollarán obras de urbanismo a través de andenes para circulación peatonal, señalización vertical y horizontal, y también se efectuarán el desplazamiento de postes de energía que se encuentra sobre la implantación del proyecto.

2.2 LOCALIZACION

El proyecto se desarrollará en el municipio de Arauca, departamento de Arauca, en la vía que comunica la glorieta de Caño Jesús hacía el Piquetierra, zona de influencia de los barrios San Vicente y Bello Horizonte (Zona Urbana).

UBICACIÓN	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
	LATITUD	LONGITUD
INICIO	7°3'38.43"N	70°43'34.33"O
FIN	7°4'0.71"N	70°43'17.29"O

Ilustración 1. Localización de la vía



Fuente Google Earth.

2.3 ALCANCE

Con el presente proyecto se pretende realizar la pavimentación en pavimento flexible asfáltico confinado con sardineles, de la vía que de la Glorieta Caño Jesús conduce a la Laguna El Piquetierra del Municipio de Arauca, en una extensión de 884 metros lineales, en el cual se conformará una estructura de vía con la instalación de un material granular para el mejoramiento de la subrasante; el cual puede ser un material de río TM=4" de 30 cm. y se obtendrá la capacidad portante equivalente CPE y asegurando así un CBR residual mínimo de 10.00%, con el cual se realizará el diseño del pavimento. También contemplará una capa de subbase granular de 30 centímetros de espesor y una base granular de 20 centímetros para que sobre este repose el Concreto asfáltico MDC-19 de 10 Centímetros de espesor.

Se incluirá también en el proyecto el manejo de aguas lluvias a través de cunetas y se dispondrá de un Box Coulvert en el tramo a pavimentar sobre la zona baja y en el que ya existe unas alcantarillas deficientes, también se garantizará la canalización para mejorar la capacidad de escurrimiento. Se desarrollarán también obras de urbanismo a través de andenes para circulación peatonal, señalización vertical y horizontal, también se efectuarán el desplazamiento de postes de energía que se encuentran sobre la implantación del proyecto interfiriendo la zona estructural de la vía.

El proyecto contempla mejoramiento de las vías urbanas, atendiendo las necesidades de la comunidad y dando cumplimiento al componente vial del plan participativo de Desarrollo Departamental 2024-2027 para el producto VÍA URBANA PAVIMENTADA, mediante las siguientes actividades:

- CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE
- MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES
- DESMONTE Y LIMPIEZA
- PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE EN CONCRETO ASFÁLTICO
- OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO, PROTECCIÓN E HIDRÁULICAS PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
- MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL – PAGA
- PERMISOS AMBIENTALES
- INTERVENTORÍA
- SUPERVISIÓN

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de interventoría

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTOR EXTERNO:	CONSORCIO INTER HORIZONTE
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA:	JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
SUPERVISOR INTERVENTORÍA EXTERNA:	DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR Resolución No. 971 del 27/02/2025
CONTRATO No:	439 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO RINCON JIMENEZ
NIT. No:	901.898.039-9
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($13.539.631.160,19)
PLAZO CONTRACTUAL:	SEIS (06) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	SGR202324-00410 No. 2824 del 24 de octubre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SGR202324-00394 No. 3324 del 26 de diciembre de 2024
FECHA INICIO:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	01/10/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	02/07/2025
ACTA DE REINICIO No.1:	24/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN (SEGÚN REINICIO 1):	23/10/2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	01 de abril al 01 de julio de 2025 y del 24 de julio al 26 de septiembre de 2025
DIAS TRANSCURRIDOS:	155

3.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Departamento de Arauca en el Contrato de INTERVENTORIA No. 477 de 2024, se suscribe con la compañía de seguros *SEGUROS DEL ESTADO S.A.*, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA *17. GARANTÍAS* del Contrato así:

3.2.1 Pólizas de Legalización

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 31/12/2024 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por CONSORCIO INTER HORIZONTE y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 31/12/2024.

Tabla 1. Pólizas iniciales del contrato de INTERVENTORIA No. 477 del 2024.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	*31/12/2024*	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*	49-44-101035202	$ 133.864.042,96	30/12/2024	31/12/2025
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 267.728.085,91	30/12/2024	31/12/2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 100.398.032,22	30/12/2024	30/06/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 133.864.042,96	30/06/2025	30/06/2030

CONTRATO DE OBRA:

Las pólizas iniciales fueron expedidas el *30/12/2024* por la aseguradora *CONFIANZA*, tomadas por *CONSORCIO ARAUCA AVANZA* y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por el Gerente de Contratación *LUZ LILIANA MARCHENA PINZÓN* el *31/12/2024*.

Tabla 2. Pólizas iniciales del contrato de OBRA No. 439 del 2024.

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
30/12/2024	CUMPLIMIENTO	*CONFIANZA*	801043861	$2.707.926.232,00	17/12/2024	17/12/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$2.030.944.674,00	17/12/2024	17/06/2028

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.707.926.232,00	17/06/2025	17/06/2030
30/12/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*CONFIANZA*	802066811	$676.981.558,00	17/12/2024	17/06/2025

3.2.2 Ampliaciones a las pólizas

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Las pólizas fueron ampliadas según **acta de inicio** del *01/04/2025* por la aseguradora *SEGUROS DEL ESTADO S.A. por CONSORCIO INTER HORIZONTE* y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 05/05/2025.

Tabla 3. Pólizas iniciales del contrato de INTERVENTORIA No. 477 del 2024, ampliadas según acta de inicio de fecha 01/04/2025.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
3	*22/04/2025*	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*	49-44-101035202	$ 133.864.042,96	01/04/2025	02/04/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 267.728.085,91	01/04/2025	02/04/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 100.398.032,22	01/04/2025	01/10/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 133.864.042,96	30/09/2025	30/09/2030

Las pólizas fueron ampliadas según **acta de suspensión No.1** del (02/07/2025) y **Acta de Reinicio No.1** del (24/07/2025) por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. *por CONSORCIO INTER HORIZONTE* y como beneficiario el Departamento de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 12/08/2025.

Tabla 4. Pólizas del contrato de interventoría No. 477 de 2024, ampliadas según acta de reinicio No. 01 del 24/07/2025.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
5	*28/07/2025*	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	*SEGUROS DEL ESTADO S.A*	49-44-101035202	$ 133.864.042,96	01/04/2025	02/05/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 267.728.085,91	01/04/2025	02/05/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 100.398.032,22	01/04/2025	01/11/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 133.864.042,96	30/09/2025	30/09/2030

CONTRATO DE OBRA:

Las pólizas fueron ampliadas según **acta de inicio** del *01/04/2025* por la aseguradora *CONFIANZA por CONSORCIO ARAUCA AVANZA*. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 02/07/2025.

Tabla 5. Pólizas iniciales del contrato de OBRA No. 439 del 2024, ampliadas según acta de inicio de fecha 01/04/2024.

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
14/04/2025	CUMPLIMIENTO	*CONFIANZA*	801043861	$2.707.926.232,00	01/04/2025	01/04/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$2.030.944.674,00	01/04/2025	01/10/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.707.926.232,00	01/10/2025	01/10/2030
14/04/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*CONFIANZA*	802066811	$676.981.558,00	01/04/2025	01/10/2025

Las pólizas fueron ampliadas según **acta de suspensión No.1** del (02/07/2025) y **Acta de Reinicio No.1** del (24/07/2025) por la aseguradora CONFIANZA *por CONSORCIO ARAUCA AVANZA*. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de Contratación LUZ LILIANA MARCHENA PINZON el 21/08/2025.

Tabla 6. Pólizas del contrato de obra No. 439 de 2024, ampliadas según acta de reinicio No. 01 del 24/07/2025.

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
29/07/2025	CUMPLIMIENTO	*CONFIANZA*	801043861	$2.707.926.232,00	01/04/2025	23/04/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$2.030.944.674,00	01/04/2025	23/10/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$2.707.926.232,00	23/10/2025	23/10/2030
29/07/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*CONFIANZA*	802066811	$676.981.558,00	01/04/2025	23/10/2025

3.3 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del contrato de interventoría, **no** se han generado multas y sanciones durante el periodo del acta parcial.

3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Durante la ejecución del contrato de INTERVENTORIA con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 7. Actos Administrativos Contrato de INTERVENTORIA No. 477 de 2024.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
01/04/2025	Acta de inicio	*Dar inicio formal a la ejecución del contrato de la referencia.*	*CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ;* *DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR- SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA;* *EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL*
02/07/2025	Acta de suspensión No. 1	*Iniciar suspensión a las actividades hasta la subsanar las complicaciones presentadas que impiden el desarrollo de las actividades en campo.*	*CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ.* *DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR- SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* *EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL.*
24/07/2025	Acta de reinicio No. 1	*Dar reinicio a las actividades contractuales ya subsanas las complicaciones presentadas*	*CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ.* *DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR- SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* *EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL.*

CONTRATO DE OBRA:

Durante la ejecución del contrato de OBRA con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 8. Actos Administrativos Contrato de OBRA No. 439 de 2024.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
01/04/2025	Acta de inicio	*Dar inicio formal a la ejecución del contrato de la referencia*	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA* *R/L CARLOS AUGUSTO RINCÓN JIMÉNEZ.* *CONSORCIO INTER HORIZONTE* *R/L JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ.* *EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL*
02/07/2025	Acta de suspensión No. 1	*Iniciar suspensión a las actividades hasta la subsanar las complicaciones presentadas que impiden el desarrollo de las actividades en campo.*	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA* *R/L CARLOS AUGUSTO RINCÓN JIMÉNEZ.* *CONSORCIO INTER HORIZONTE* *R/L JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ.* *DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR-SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* *EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL.*
24/07/2025	Acta de reinicio No. 1	*Dar reinicio a las actividades contractuales ya subsanas las complicaciones presentadas*	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA* *R/L CARLOS AUGUSTO RINCÓN JIMÉNEZ.* *CONSORCIO INTER HORIZONTE* *R/L JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ.* *DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR-SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* *EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL.*

3.4.1 Modificaciones y/o adiciones al contrato

Durante la ejecución del contrato de obra, **no** se han generado MODIFICACIONES Y/O ADICIONES durante el periodo del acta parcial.

3.4.2 Compensación de mayores y menores cantidades.

Durante la ejecución del contrato de obra, **no** se han generado COMPENSACIÓN DE MAYORES Y MENORES durante el periodo del acta parcial.

3.5 ACTAS DE COMITÉ TECNICOS

Durante la ejecución del contrato de interventoría con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito las siguientes actas de comités técnicos desarrollados entre las partes:

Tabla 9 Actas suscritas

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
22/04/2025	ACTA DE COMITÉ TECNICO N°001	*Analizar aspectos técnicos acorde a la comunicación CO-439-2024-005 remitido a la interventoría por parte del consorcio Arauca avanza*	Director de interventoría Residente de interventoría Profesional Universitario S.I.F.D Apoyo a la supervisión

3.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de interventoría con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista y el Departamento de Arauca:

Tabla 10. Correspondencia enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA – MES ABRIL DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
7/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA EXTERNA*	*RADICACIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 477 DE 2024*
9/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*SOLICITUD DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA E INFORMACION AL CONTRATO EN REFERENCIA, DE ACUERDO A LAS LABORES EN CAMPO A REALIZAR POR LA INTERVENTORIA EXTRERNA.*
10/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA EXTERNA*	*INFORMATIVO: NOTIFICACION CAMBIO DE CORREO*
21/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*OBSERVACIONES ACTIVIDADES DE OBRA P.M.T*
21/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA EXTERNA*	*CONVOCATORIA A COMITÉ TECNICO - CONTRATO DE OBRA No. 439 DE 2024*
28/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*OBSERVACIONES COMUNICACON COP-439-2024-005 Y DEMAS CONSIDERACIONES GENERALES*
28/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACION DE OBRA*
28/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*SOLICITUD INFORME MENSUAL DE OBRA*

CORRESPONDENCIA ENVIADA – MES ABRIL DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
28/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA EXTERNA*	*REMISION POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 477 DE 2024*
29/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA EXTERNA*	*SOLICITUD DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO DE ANTICIPO*
29/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*SOLICITUD DE ELEMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES EN OBRA*
29/04/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*SOLICITUD DE IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA PARA ACTIVIDADES DE CONFORMACION*

CORRESPONDENCIA ENVIADA – MES MAYO DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
27/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*Reitera requerimiento de Plan de contingencia*
27/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	*Entrega Informe Semanal No.03 – mayo de 2025*
22/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*Solicitud de documentos faltantes*
22/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*Solicitud informe mensual – Mes mayo*
21/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*Solicitud Plan de calidad*
21/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*Reiteración – solicitud plan de contingencia*
20/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	*Entrega informe semanal No.02 – mayo de 2025*
19/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*Solicitud informe seguimiento PAGA*
16/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*Solicitud Plan de contingencia*
15/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	*Entrega informe semanal – Mayo de 2025*
14/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	*Entrega informe mensual mes abril 2025*
09/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	*Entrega de documentación requerida para el control de la ejecución de la obra*
09/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	*Respuesta radicados 20250801854-2 y 20250801849-2*
06/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*Remisión derecho de petición señora Flor Edilta Puerta*
06/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*Convocatoria a comité obra – Contrato de obra No.439 de 2024.*

CORRESPONDENCIA ENVIADA – MES MAYO DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL	
05/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	*CONSORCIO ARAUCA AVANZA*	*Reiteración entrega de documentación requerida para el control de obra*

CORRESPONDENCIA ENVIADA – MES JUNIO DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
11/06/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME MENSUAL MES MAYO DE 2025
3/06/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA	SOLICITUD TRAMITE DESEMBOLSO DE ANTICIPO
11/06/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	REQUERIMIENTO DE REPROGRAMACIÓN OBRA Y PLAN DE CONTINGENCIA
18/06/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME QUINCENAL No.01 JUNIO 2025
19/06/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	CONSORCIO ARAUCA AVANZA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA	CONVOCATORIA A COMITÉ OBRA - CONTRATO DE OBRA No. 439 de 2024
25/06/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA	Respuesta a oficio 20250802316-2
25/06/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	SOLICITUD DE RELACIÓN ACTUALIZADA DE MAQUINARIA Y LISTADO PERSONAL OPERATIVO

CORRESPONDENCIA ENVIADA – MES JULIO DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
01/07/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Solicitud de entrega de resultados de ensayos de laboratorio*
03/07/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Concepto favorable a la documentación presentada para el control de la ejecución de la obra*
28/07/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Solicitud de documentación faltante*
29/07/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Solicitud actualización de pólizas*
29/07/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Requerimiento de reprogramación de obra según acta de reinicio*

CORRESPONDENCIA ENVIADA – MES AGOSTO DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
04/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Reiteración solicitud actualización de pólizas*
04/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Solicitud reunión – Esp. Hidráulico*
08/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Reiteración solicitud reunión – Esp. Hidráulico*
08/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	*Entrega de informe mensual mes julio de 2025*
12/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Reiteración solicitud reunión prioritaria – Esp. Hidráulico*
13/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Invitación mesa de seguimiento permanente – Contraloría General de la Republica.*
14/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Confirmación de Reunión Esp. Hidráulicos*
15/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	*Remisión de situación que afecta el desarrollo del contrato de obra No. 439 de 2024*
20/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Remisión respuesta a oficio sobre afectación por reclamación de la señora Karen Andrea Rodríguez Estrada.*
20/05/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Solicitud de relación actualizada de personal operativo*
21/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	*Entrega de informe quincenal – Agosto de 2025*
22/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Solicitud de subsanaciones hidráulicas*
25/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Observaciones de actividad 4.4 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A10 0.2x0.5x0.8 m – INSTALADO.*
26/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Respuesta a oficio CO-439-2024-032.*
26/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Solicitud de elementos de protección as personal operativo*
27/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Reiteración Solicitud de subsanaciones hidráulicas*
28/08/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Reiteración solicitud de relación actualizada de personal operativo.*

CORRESPONDENCIA ENVIADA – MES SEPTIEMBRE DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
03/09/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Reiteración solicitud subsanaciones hidráulicas*
08/09/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Solicitud informe mensual – Mes agosto*
08/09/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Invitación a Mesa de seguimiento permanente – Contraloría General de la Republica*
09/09/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Respuesta a oficio sobre afectaciones por reglamentación de la señora Karen Andrea Rodríguez Estrada*

CORRESPONDENCIA ENVIADA – MES SEPTIEMBRE DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
10/09/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Solicitud de ampliación de vigencias de Resolución No. 1081 de 2025, según acta de reinicio No.01*
11/09/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Seguimiento a reunión (09) de septiembre de 2025 y aplicación de acciones correctivas ante denuncia presentada por la organización CONUCO Permacultural*
11/09/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Reiteración solicitud de informe mensual No. 05 de obra – mes Agosto*
15/09/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Reiteración solicitud de subsanaciones hidráulicos*
24/09/2025	CONSORCIO INTER HORIZONTE	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	*Solicitud de riego de agua mediante carrotanque*

Tabla 11. Correspondencia recibida

CORRESPONDENCIA RECIIBIDA – MES ABRIL DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
2/04/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA - CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	ENTREGA HOJAS DE VIDA PROFESIONALES EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA REVISIÓN - A.P.U. PROPUESTA ECONÓMICA
4/04/2025	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	AGUAS SUPERFICIALES AUTORIZACION OCUPACION DE CAUSES Y APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS.
4/04/2025	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	APRECIACIONES ENTREGA DE INFORMES DE INTERVENTORIA
5/04/2025	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DE VALLA INFORMATIVA
7/04/2025	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	SOLICITUD DENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA
22/04/2025	FLOR EDILTA PUERTA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	DERECHO DE PETICION
23/04/2025	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	DOCUMENTOS PARA EL SEGUMINETO DEL COMPONENTE AMBIENTAL

CORRESPONDENCIA RECIIBIDA – MES MAYO DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
28/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Respuesta a PQR allegada mediante radicado No.20251003574-1
22/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Concepto favorable a la documentación presentada para el control de la ejecución de la obra.
21/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Reitera solicitud Plan de Contingencia
09/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Respuesta a comunicación de radicado No.20250803403-1

CORRESPONDENCIA RECIIBIDA – MES MAYO DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
05/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Requerimiento Registro fotográfico
05/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Requerimiento entrega informe prealistamiento
05/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Requerimiento verificación cumplimiento especificaciones técnicas vigentes y demás aspectos técnicos que garanticen la estabilidad y calidad de la obra.
05/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Reitera solicitud registro fotográfico de valla informativa
05/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Remisión Denuncia anónima por presunto incumplimiento del contrato de obra No.439 de 2024
05/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Solicitud de informes semanales de seguimiento y programación actualizada
05/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Reiteración de apreciaciones entrega de informes mensuales de interventoría
05/05/2025	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL*	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA EXTERNA	Ultima reiteración solicitud entrega de documentación requerida para el control de la ejecución del contrato de la obra

CORRESPONDENCIA RECIIBIDA – MES JUNIO DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
3/06/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA EXTERNA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	RESPUESTA A PQR ALLEGADA MEDIANTE RADICADO No. 20251003574-1
9/06/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	RESPUESTA OFICIO: "CIH-CI-477-2024-027" - "CIH-CI-477-2024-006"
10/06/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA EXTERNA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	Respuesta a comunicación de radicado No.20250806162-1
11/06/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARMENTAL-INTERVENTORÍA EXTERNA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	REQUERIMIENTO ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA
17/06/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	ENTREGA CONCEPTO HIDRAULICO PARA AJUSTE DEL ALINEAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL PROYECTO
20/06/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	REPROGRAMACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA 1 - JUNIO 2025
24/06/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	RESPUESTA OFICIO: "CIH-CI-477-2024-034"
24/06/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	Respuesta a oficio 20250802316-2
27/06/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE - INTERVENTORIA	ENTREGA APUS CON FIRMA ORIGINAL

CORRESPONDENCIA RECIIBIDA – MES JULIO DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
01/07/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Solicitud de suspensión 01
02/07/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Entrega de afiliación personal nuevo – protocolos de calidad.
11/07/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Reitera requerimiento entrega de informe mensuales de interventoría.
31/07/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Reprogramación Reinicio 1
31/07/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	PLAN DE CALIDAD

CORRESPONDENCIA RECIIBIDA – MES AGOSTO DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
01/08/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Entrega de pólizas actualizadas con su respectivo soporte.
05/08/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Entrega de informe mensual de obra 4
6/08/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Entrega de pólizas actualizadas y firmadas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.
09/08/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Respuesta a solicitud de reunión – Especialista Hidráulico (oficio CIH-CI-2024-047)
12/08/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Invitación a Mesa de seguimiento Permanente – Contraloría General de la republica
13/08/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Propuesta de Reunión Técnica (CIH-CI-477-2024-046) Respuesta Reiteración – Esp. Hidráulico (CIH-CI-477-2024-049).
14/08/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Informe de situación presentada en campo – Solicitud de orientación.
20/08/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Respuesta a oficio sobre afectación por reclamación de la señora Karen Andrea Rodríguez Estrada
21/08/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Informe sobre situación que afecta la ejecución de actividades contractuales.
28/08/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Remisión de comunicación con radicado No. 20250808884-1

CORRESPONDENCIA RECIIBIDA – MES SEPTIEMBRE DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
08/09/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Requerimiento entrega de informes mensuales de interventoría
08/09/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Invitación de Mesa de Seguimiento Permanente – Contraloría General de la Republica
09/09/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Invitación a REUNIÓN DE CARÁCTER URGENTE
09/09/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Puesta en conocimiento y solicitud de acciones URGENTES frente a denuncia ciudadana por posibles casos de acoso sexual

CORRESPONDENCIA RECIIBIDA – MES SEPTIEMBRE DE 2025			
FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCION-ASUNTO
			a NNA, allegada por la ORGANIZACIÓN CONUCO PERMACULTURA
11/09/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Reiteración requerimiento entrega de informes mensuales de interventoría
11/09/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Reitera solicitud de respuesta a comunicación con radicado No.20250808884-1
11/09/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPARTAMENTAL	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Remisión de documentación e información solicitada durante Mesa de Seguimiento Permanente 1, CAT 1694, BPIN 2024005810153
12/09/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Entrega de informe Mensual de Obra 5
12/09/2025	CONSORCIO ARAUCA AVANZA	CONSORCIO INTER HORIZONTE	Respuesta institucional a denuncia presentada por organización CONUCO Permacultural – bello Horizonte

3.7 BITACORA DIARIA DE OBRA

Para la ejecución del proyecto se lleva una bitácora de obra en donde se relacionan las actividades diarias ejecutadas, personal, clima, equipo y observaciones técnicas que se presenten durante el desarrollo de las actividades del contrato de obra No. 439 de 2024 una vez celebrada el acta de inicio con fecha del 01 de abril del 2025.

La bitácora de obra es diligenciada por el ingeniero residente de la obra e ingeniero residente de la interventoría, junto con el equipo de la interventoría por medio de la cual hace el registro del seguimiento en la ejecución de las actividades contractuales de la obra, del personal ofrecido, trabajadores en campo, ítems ejecutados del proyecto, de igual forma la calidad de obras ejecutadas y las deficiencias encontradas.

3.8 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.8.1 Socialización del proyecto

El *23 de febrero de 2025*, se realizó la socialización del proyecto de objeto *"CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"*, en Salón Comunal del Barrio Bello Horizonte en el municipio de *Arauca, departamento de Arauca*, previa convocatoria realizada por el Departamento de Arauca a través de la Secretaría de Infraestructura Física Departamental.

En dicha reunión participaron representantes de la gobernación de Arauca, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión del Departamento de Arauca. En la reunión se levantó como soporte el Acta de Socialización de la obra.

3.8.2 Conformación de la veeduría ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que serán los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones.

Tabla 12. Conformación de la veeduría ciudadana para el control social del contrato de obra No. 439 del 2024.

VEEDURIA CIUDADANA					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	CORREO
1	*DIANA SOBEYDA PEREZ GARCIA*	*1.116.790.838*	*3206691021*	PRESIDENTA	*Zunistiven-29@hotmail.com*
2	*MARIELA CASTRO ROMERO*	*68.294.123*	*3223322081*	VOCERA	*Mariacastro2706@gmail.com*
3	*AURA LISET OSTOS CEBALLOS*	*1.116.775.473*	*3176973416*	VEEDORA	*Auraostos5@gmail.com*
4	*ELIECER BARAHONA*	*17.589.671*	*3185496494*	VEEDOR	*Eliecerbarahona2872@gmail.com*
5	*YARIC LECNI SANCHEZ RINCON*	*1.116.497.818*	*3144383788*	SECRETARIA	*yaricsanchez@gmail.com*
6	*ALBERTO ORTEGA MARTINEZ*	*77.143.272*	*3212356941*	VEEDOR	*Ortegamartinezalberto10@gmail.com*
7	*JENNYS MIREYA CEDEÑO CASTILLO*	*68.293.134*	*3104886743*	VEEDORA	*yenysmirella@gmail.com*

La veeduría ciudadana fue reconocida por el Ministerio Público del Municipio de *Arauca*, mediante Resolución No. 013 de 2025 del 27 de febrero de 2025 siendo nombrado como VOCERO o

representante del Comité Veedor a la señora Mariela castro romero. *Se encuentra anexado en el informe de interventoría de abril.*

3.8.3 Actas y reuniones suscritas por la veeduría ciudadana

3.8.3.1 Acta de veeduría de inicio de obra

Con el fin de dar inicio a la ejecución física de las obras, el *27/02/2025* se suscribe con la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 439 del 2024, el acta de veeduría de inicio de obra, en la cual se da a conocer por parte del contratista y la Interventoría externa aspectos como el cronograma de trabajo, vinculación del personal, acopio de materiales, fecha prevista para la terminación de las actividades, entre otros.

3.8.3.2 Reuniones con el comité veedor

Con el fin de lograr una articulación con la comunidad y sus representantes durante la ejecución del proyecto, se realizaron reuniones con el comité de veeduría ciudadana cada vez que se consideró necesario y oportuno, realizando las convocatorias previas para garantizar la asistencia de los representantes de las partes interesadas. A la fecha del presente informe se han llevado a cabo las siguientes reuniones con los voceros de la comunidad:

Tabla 13. Reuniones realizadas con la veeduría ciudadana del contrato de obra/interventoría No.439 de 2024.

FECHA	LUGAR Y HORA	ASISTENTES	TEMAS TRATADOS
25/04/2025	10:00 am	Contratista de obra; Interventoría; Integrantes del Comité veedor	Avance de actividades / preguntas de veedores

Durante el periodo de ejecución del contrato se mantuvo una comunicación fluida con el comité veedor, resolviendo las observaciones e inquietudes presentadas por ellos a la Interventoría externa, con lo cual fue posible el avance de los trabajos sin ningún tipo de percance con la comunidad beneficiaria del proyecto.

3.9 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo con el alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

3.9.1 Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 14. Personal administrativo/operativo de obra No. 439 de 2024 en el mes de abril de 2025.

MES: ABRIL DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGO	
1	RINCON	JIMENEZ	CARLOS AUGUSTO	13.257.218	Representante legal	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
2	JOYA	PEÑARANDA	MANUEL OSWALDO	1.090.402.079	Director de obra	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
3	VARGAS	PEÑARANDA	YURBY ESLEDY	1.090.447.040	Profesional Especialista hidráulico	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
4	JAIMES	PEREZ	ONEXIMO HENRY	88.234.586	Profesional Especialista en Área de vías	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
5	CACERES	RUBIO	JOSE RAFAEL	88.251.310	Profesional Especialista Estructuras	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
6	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	Profesional Especialista Geotecnia	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
7	SALINAS	OJEDA	NATALY	1.094.285.459	Profesional SISOMA	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
8	CEDEÑO	ÁLVAREZ	EDWAR MATEO	1.090.504.366	Ingeniero civil Residente de obra	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
9	MOSQUERA	CRUZ	CESAR AUGUSTO	1.116.800.718	Ingeniero civil auxiliar	$2.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
10	CASTILLO	ROMERO	JHONNY ENRIQUE	1.116.787.521	Ingeniero Eléctrico	$1.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
11	RAMIREZ	RAMIREZ	WILFREDO	1.116.787.495	ingeniero Ambiental	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
12	MADRID	ARTEAGA	MARBELLY ASTRID	68.297.403	Profesional Social	$2.200.000	06/04/2025		24	X	X	X	86421516
13	RINCON	PINEDA	SANDY EMILSE	1.116.802.362	Inspector Siso	$2.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
14	CEDEÑO		ELIO GUZMAN	17.583.414	Inspector de obra (Técnico en obras civiles)	$2.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
15	USECHE	VEGA	MARIA GISELA	60.347.923	Secretaria	$2.200.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
16	GALINDO	VARGAS	JUAN DAVID	1.003.801.266	Aux. Recursos Humanos	$2.800.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516

MES: ABRIL DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
17	MANCILLA	GARCIA	DIEGO ARMANDO	1.116.783.267	Contador	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
18	MARIN	SORIANO	WILLIAMS BOSSUET	13.459.845	Almacenista	$2.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
PERSONAL OPERATIVO													
1	BARONI	COLMENARES	JOSE LUIS	17.583.864	Maestro de obra	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	86421516
2	RIVEROS	PEREZ	ANGEL EDUARDO	17.589.961	Oficial	$2.000.000	08/04/2025		23	X	X	X	86421516
3	VARGAS	BLANCO	JAIBER ALEXIS	1.116.772.939	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		23	X	X	X	86421516
4	QUENZA	CAILE	JESUS RAMON	1.116.797.890	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		23	X	X	X	86421516
5	VERA	USCATEGUI	JESUS SEIR	1.118.551.891	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		23	X	X	X	86421516
6	GARCIA	CAPACHO	MARLINDA SAMANTA	1.116.789.548	Reguladora Vial	$1.423.500	21/04/2025		10	X	X	X	86421516
7	OSTO	PARALES	TULIA CRISTINA	68.295.896	Reguladora Vial	$1.423.500	21/04/2025		10	X	X	X	86421516
8	POLO	BALLESTEROS	YEINNY	1.006.496.898	Reguladora Vial	$1.423.500	28/04/2025		03	X	X	X	86421516
9	GUERRERO	GUTIERREZ	JOSÉ GABRIEL	74.352.915	Topógrafo	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7969315720
10	MARIN	VEGA	WILLINGTON JOSÉ	1.006.440.043	Cadenero I	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7969315720
11	PETRO	SALCEDO	FRAN ANTONIO	17.594.203	Cadenero II	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7969315720
12	OMBITA	AGUDELO	ROBERT ANTONIO	80.809.090	Topógrafo	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	90335080
13	TOVAR	PARALES	JOSE ALFREDO	17.596.652	Cadenero I	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	86390397
14	PINZON	MARTINEZ	ALFONSO	17.588.855	Cadenero II	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	86390397

Tabla 15. Personal administrativo/operativo de obra No. 439 de 2024 en el mes de mayo de 2025.

MES: MAYO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGO	
1	RINCON	JIMENEZ	CARLOS AUGUSTO	13.257.218	Representante legal	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
2	JOYA	PEÑARANDA	MANUEL OSWALDO	1.090.402.079	Director de obra	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
3	VARGAS	PEÑARANDA	YURBY ESLEDY	1.090.447.040	Profesional Especialista hidráulico	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
4	JAIMES	PEREZ	ONEXIMO HENRY	88.234.586	Profesional Especialista en Área de vías	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
5	CACERES	RUBIO	JOSE RAFAEL	88.251.310	Profesional Especialista Estructuras	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
6	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	Profesional Especialista Geotecnia	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
7	SALINAS	OJEDA	NATALY	1.094.285.459	Profesional SISOMA	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
8	CEDEÑO	ÁLVAREZ	EDWAR MATEO	1.090.504.366	Ingeniero civil Residente de obra	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
9	MOSQUERA	CRUZ	CESAR AUGUSTO	1.116.800.718	Ingeniero civil auxiliar	$2.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
10	CASTILLO	ROMERO	JHONNY ENRIQUE	1.116.787.521	Ingeniero Eléctrico	$1.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
11	RAMIREZ	RAMIREZ	WILFREDO	1.116.787.495	ingeniero Ambiental	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
12	MADRID	ARTEAGA	MARBELLY ASTRID	68.297.403	Profesional Social	$2.200.000	06/04/2025		30	X	X	X	87375699
13	RINCON	PINEDA	SANDY EMILSE	1.116.802.362	Inspector Siso	$2.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
14	CEDEÑO		ELIO GUZMAN	17.583.414	Inspector de obra (Técnico en obras civiles)	$2.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
15	USECHE	VEGA	MARIA GISELA	60.347.923	Secretaria	$2.200.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699

MES: MAYO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
16	GALINDO	VARGAS	JUAN DAVID	1.003.801.266	Aux. Recursos Humanos	$2.800.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
17	MANCILLA	GARCIA	DIEGO ARMANDO	1.116.783.267	Contador	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
18	MARIN	SORIANO	WILLIAMS BOSSUET	13.459.845	Almacenista	$2.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
PERSONAL OPERATIVO													
1	BARONI	COLMENARES	JOSE LUIS	17.583.864	Maestro de obra	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	87375699
2	RIVEROS	PEREZ	ANGEL EDUARDO	17.589.961	Oficial	$2.000.000	08/04/2025		30	X	X	X	87375699
3	VARGAS	BLANCO	JAIBER ALEXIS	1.116.772.939	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		30	X	X	X	87375699
4	QUENZA	CAILE	JESUS RAMON	1.116.797.890	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		30	X	X	X	87375699
5	VERA	USCATEGUI	JESUS SEIR	1.118.551.891	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		30	X	X	X	87375699
6	GARCIA	CAPACHO	MARLINDA SAMANTA	1.116.789.548	Reguladora Vial	$1.423.500	21/04/2025		30	X	X	X	87375699
7	OSTO	PARALES	TULIA CRISTINA	68.295.896	Reguladora Vial	$1.423.500	21/04/2025		30	X	X	X	87375699
8	POLO	BALLESTEROS	YEINNY	1.006.496.898	Reguladora Vial	$1.423.500	28/04/2025		30	X	X	X	87375699
9	GUERRERO	GUTIERREZ	JOSÉ GABRIEL	74.352.915	Topógrafo	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7969808476
10	MARIN	VEGA	WILLINGTON JOSÉ	1.006.440.043	Cadenero I	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7969808476
11	PETRO	SALCEDO	FRAN ANTONIO	17.594.203	Cadenero II	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7969808476
12	OMBITA	AGUDELO	ROBERT ANTONIO	80.809.090	Topógrafo	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	90335130
13	TOVAR	PARALES	JOSE ALFREDO	17.596.652	Cadenero I	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	87252995
14	PINZON	MARTINEZ	ALFONSO	17.588.855	Cadenero II	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	87252995
15	CRUZADO	SANCHEZ	FERNEL	17.593.156	Operador	$3.000.000	02/05/2025		29	X	X	X	87375699
16	RONALDO	TOVA	ELBER	1.116.775.251	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		19	X	X	X	87375699
17	FELIPE	ORTEGA	ELKIN	1.007.107.033	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		19	X	X	X	87375699
18	TORRES	CASTILLO	JACKSON JOSE	1.116.792.276	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		19	X	X	X	87375699

MES: MAYO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
19	SOGAMOSO		DUMAR ALBERTO	1.116.806.801	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		19	X	X	X	87375699

Tabla 16. Personal administrativo/operativo de obra No. 439 de 2024 en el mes de junio de 2025.

MES: JUNIO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGO	
1	RINCON	JIMENEZ	CARLOS AUGUSTO	13.257.218	Representante legal	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
2	JOYA	PEÑARANDA	MANUEL OSWALDO	1.090.402.079	Director de obra	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
3	VARGAS	PEÑARANDA	YURBY ESLEDY	1.090.447.040	Profesional Especialista hidráulico	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
4	JAIMES	PEREZ	ONEXIMO HENRY	88.234.586	Profesional Especialista en Área de vías	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
5	CACERES	RUBIO	JOSE RAFAEL	88.251.310	Profesional Especialista Estructuras	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
6	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	Profesional Especialista Geotecnia	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
7	SALINAS	OJEDA	NATALY	1.094.285.459	Profesional SISOMA	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
8	CEDEÑO	ÁLVAREZ	EDWAR MATEO	1.090.504.366	Ingeniero civil Residente de obra	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
9	MOSQUERA	CRUZ	CESAR AUGUSTO	1.116.800.718	Ingeniero civil auxiliar	$2.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
10	CASTILLO	ROMERO	JHONNY ENRIQUE	1.116.787.521	Ingeniero Eléctrico	$1.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
11	RAMIREZ	RAMIREZ	WILFREDO	1.116.787.495	ingeniero Ambiental	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570

MES: JUNIO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
12	MADRID	ARTEAGA	MARBELLY ASTRID	68.297.403	Profesional Social	$2.200.000	06/04/2025		30	X	X	X	88005570
13	RINCON	PINEDA	SANDY EMILSE	1.116.802.362	Inspector Siso	$2.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
14	CEDEÑO		ELIO GUZMAN	17.583.414	Inspector de obra (Técnico en obras civiles)	$2.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
15	USECHE	VEGA	MARIA GISELA	60.347.923	Secretaria	$2.200.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
16	GALINDO	VARGAS	JUAN DAVID	1.003.801.266	Aux. Recursos Humanos	$2.800.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
17	MANCILLA	GARCIA	DIEGO ARMANDO	1.116.783.267	Contador	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
18	MARIN	SORIANO	WILLIAMS BOSSUET	13.459.845	Almacenista	$2.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
PERSONAL OPERATIVO													
1	BARONI	COLMENARES	JOSE LUIS	17.583.864	Maestro de obra	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	88005570
2	RIVEROS	PEREZ	ANGEL EDUARDO	17.589.961	Oficial	$2.000.000	08/04/2025		30	X	X	X	88005570
3	VARGAS	BLANCO	JAIBER ALEXIS	1.116.772.939	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		30	X	X	X	88005570
4	QUENZA	CAILE	JESUS RAMON	1.116.797.890	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		30	X	X	X	88005570
5	VERA	USCATEGUI	JESUS SEIR	1.118.551.891	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		30	X	X	X	88005570
6	GARCIA	CAPACHO	MARLINDA SAMANTA	1.116.789.548	Reguladora Vial	$1.423.500	21/04/2025		30	X	X	X	88005570
7	OSTO	PARALES	TULIA CRISTINA	68.295.896	Reguladora Vial	$1.423.500	21/04/2025		30	X	X	X	88005570
8	POLO	BALLESTEROS	YEINNY	1.006.496.898	Reguladora Vial	$1.423.500	28/04/2025		30	X	X	X	88005570
9	GUERRERO	GUTIERREZ	JOSÉ GABRIEL	74.352.915	Topógrafo	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7973234980
10	MARIN	VEGA	WILLINGTON JOSÉ	1.006.440.043	Cadenero I	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7973234980
11	PETRO	SALCEDO	FRAN ANTONIO	17.594.203	Cadenero II	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7973234980
12	OMBITA	AGUDELO	ROBERT ANTONIO	80.809.090	Topógrafo	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	90335177
13	TOVAR	PARALES	JOSE ALFREDO	17.596.652	Cadenero I	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	88004370

MES: JUNIO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
14	PINZON	MARTINEZ	ALFONSO	17.588.855	Cadenero II	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	88004370
15	CRUZADO	SANCHEZ	FERNEL	17.593.156	Operador	$3.000.000	02/05/2025		30	X	X	X	88005570
16	RONALDO	TOVA	ELBER	1.116.775.251	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		30	X	X	X	88005570
17	FELIPE	ORTEGA	ELKIN	1.007.107.033	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		30	X	X	X	88005570
18	TORRES	CASTILLO	JACKSON JOSE	1.116.792.276	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		30	X	X	X	88005570
19	SOGAMOSO		DUMAR ALBERTO	1.116.806.801	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		30	X	X	X	88005570
20	TORRES	PALOMO	FRANKLIN EDUARDO	96.168.935	Oficial	$2.000.000	25/06/2025		06	X	X	X	88005570
21	LEONARDO	GUERRA	HORLEY	1.006.453.782	Ayudante	$1.423.500	25/06/2025		06	X	X	X	88005570
22	BOLIVAR	BAUTISTA	FERMIN	6.609.445	Ayudante	$1.423.500	25/06/2025		06	X	X	X	88005570

Tabla 17. Personal administrativo/operativo de obra No. 439 de 2024 en el mes de julio de 2025.

MES: JULIO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGO	
1	RINCON	JIMENEZ	CARLOS AUGUSTO	13.257.218	Representante legal	$1.423.500	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
2	JOYA	PEÑARANDA	MANUEL OSWALDO	1.090.402.079	Director de obra	$4.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
3	VARGAS	PEÑARANDA	YURBY ESLEDY	1.090.447.040	Profesional Especialista hidráulico	$4.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
4	JAIMES	PEREZ	ONEXIMO HENRY	88.234.586	Profesional Especialista en Área de vías	$4.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281

MES: JULIO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
5	CACERES	RUBIO	JOSE RAFAEL	88.251.310	Profesional Especialista Estructuras	$4.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
6	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	Profesional Especialista Geotecnia	$4.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
7	SALINAS	OJEDA	NATALY	1.094.285.459	Profesional SISOMA	$3.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
8	CEDEÑO	ÁLVAREZ	EDWAR MATEO	1.090.504.366	Ingeniero civil Residente de obra	$3.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
9	MOSQUERA	CRUZ	CESAR AUGUSTO	1.116.800.718	Ingeniero civil auxiliar	$2.500.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
10	CASTILLO	ROMERO	JHONNY ENRIQUE	1.116.787.521	Ingeniero Eléctrico	$1.500.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
11	RAMIREZ	RAMIREZ	WILFREDO	1.116.787.495	ingeniero Ambiental	$3.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
12	MADRID	ARTEAGA	MARBELLY ASTRID	68.297.403	Profesional Social	$2.200.000	06/04/2025		08	X	X	X	88876281
13	RINCON	PINEDA	SANDY EMILSE	1.116.802.362	Inspector Siso	$2.500.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
14	CEDEÑO		ELIO GUZMAN	17.583.414	Inspector de obra (Técnico en obras civiles)	$2.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
15	USECHE	VEGA	MARIA GISELA	60.347.923	Secretaria	$2.200.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
16	GALINDO	VARGAS	JUAN DAVID	1.003.801.266	Aux. Recursos Humanos	$2.800.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
17	MANCILLA	GARCIA	DIEGO ARMANDO	1.116.783.267	Contador	$3.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
18	MARIN	SORIANO	WILLIAMS BOSSUET	13.459.845	Almacenista	$2.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
PERSONAL OPERATIVO													
1	BARONI	COLMENARES	JOSE LUIS	17.583.864	Maestro de obra	$3.000.000	01/04/2025		08	X	X	X	88876281
2	RIVEROS	PEREZ	ANGEL EDUARDO	17.589.961	Oficial	$2.000.000	08/04/2025		08	X	X	X	88876281
3	VARGAS	BLANCO	JAIBER ALEXIS	1.116.772.939	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		08	X	X	X	88876281
4	QUENZA	CAILE	JESUS RAMON	1.116.797.890	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		08	X	X	X	88876281

MES: JULIO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
5	VERA	USCATEGUI	JESUS SEIR	1.118.551.891	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		08	X	X	X	88876281
6	GARCIA	CAPACHO	MARLINDA SAMANTA	1.116.789.548	Reguladora Vial	$1.423.500	21/04/2025		08	X	X	X	88876281
7	OSTO	PARALES	TULIA CRISTINA	68.295.896	Reguladora Vial	$1.423.500	21/04/2025		08	X	X	X	88876281
8	POLO	BALLESTEROS	YEINNY	1.006.496.898	Reguladora Vial	$1.423.500	28/04/2025		08	X	X	X	88876281
9	GUERRERO	GUTIERREZ	JOSÉ GABRIEL	74.352.915	Topógrafo	$1.423.500	01/04/2025		08	X	X	X	7976922152
10	MARIN	VEGA	WILLINGTON JOSÉ	1.006.440.043	Cadenero I	$1.423.500	01/04/2025		08	X	X	X	7976922152
11	PETRO	SALCEDO	FRAN ANTONIO	17.594.203	Cadenero II	$1.423.500	01/04/2025		08	X	X	X	7976922152
12	OMBITA	AGUDELO	ROBERT ANTONIO	80.809.090	Topógrafo	$1.423.500	01/04/2025		08	X	X	X	90377180
13	TOVAR	PARALES	JOSE ALFREDO	17.596.652	Cadenero I	$1.423.500	01/04/2025		08	X	X	X	88867734
14	PINZON	MARTINEZ	ALFONSO	17.588.855	Cadenero II	$1.423.500	01/04/2025		08	X	X	X	88867734
15	CRUZADO	SANCHEZ	FERNEL	17.593.156	Operador	$3.000.000	02/05/2025		08	X	X	X	88876281
16	RONALDO	TOVA	ELBER	1.116.775.251	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		08	X	X	X	88876281
17	FELIPE	ORTEGA	ELKIN	1.007.107.033	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		08	X	X	X	88876281
18	TORRES	CASTILLO	JACKSON JOSE	1.116.792.276	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		08	X	X	X	88876281
19	SOGAMOSO		DUMAR ALBERTO	1.116.806.801	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		08	X	X	X	88876281
20	TORRES	PALOMO	FRANKLIN EDUARDO	96.168.935	Oficial	$2.000.000	25/06/2025		08	X	X	X	88876281
21	LEONARDO	GUERRA	HORLEY	1.006.453.782	Ayudante	$1.423.500	25/06/2025		08	X	X	X	88876281
22	BOLIVAR	BAUTISTA	FERMIN	6.609.445	Ayudante	$1.423.500	25/06/2025		08	X	X	X	88876281

Tabla 18. Personal administrativo/operativo de obra No. 439 de 2024 en el mes de agosto de 2025.

MES: AGOSTO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
No.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGO	
1	RINCON	JIMENEZ	CARLOS AUGUSTO	13.257.218	Representante legal	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
2	JOYA	PEÑARANDA	MANUEL OSWALDO	1.090.402.079	Director de obra	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
3	VARGAS	PEÑARANDA	YURBY ESLEDY	1.090.447.040	Profesional Especialista hidráulico	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
4	JAIMES	PEREZ	ONEXIMO HENRY	88.234.586	Profesional Especialista en Área de vías	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
5	CACERES	RUBIO	JOSE RAFAEL	88.251.310	Profesional Especialista Estructuras	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
6	DELGADO	MONTAGUT	JOAQUIN EDUARDO	88.215.089	Profesional Especialista Geotecnia	$4.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
7	SALINAS	OJEDA	NATALY	1.094.285.459	Profesional SISOMA	$3.000.000	01/04/2025	31/08/2025	30	X	X	X	89748291
8	CEDEÑO	ÁLVAREZ	EDWAR MATEO	1.090.504.366	Ingeniero civil Residente de obra	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
9	MOSQUERA	CRUZ	CESAR AUGUSTO	1.116.800.718	Ingeniero civil auxiliar	$2.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
10	CASTILLO	ROMERO	JHONNY ENRIQUE	1.116.787.521	Ingeniero Eléctrico	$1.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
11	RAMIREZ	RAMIREZ	WILFREDO	1.116.787.495	ingeniero Ambiental	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
12	MADRID	ARTEAGA	MARBELLY ASTRID	68.297.403	Profesional Social	$2.200.000	06/04/2025		30	X	X	X	89748291
13	RINCON	PINEDA	SANDY EMILSE	1.116.802.362	Inspector Siso	$2.500.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
14	CEDEÑO		ELIO GUZMAN	17.583.414	Inspector de obra (Técnico en obras civiles)	$2.000.000	01/04/2025	20/08/2025	20	X	X	X	89748291
15	USECHE	VEGA	MARIA GISELA	60.347.923	Secretaria	$2.200.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291

MES: AGOSTO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
16	GALINDO	VARGAS	JUAN DAVID	1.003.801.266	Aux. Recursos Humanos	$2.800.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
17	MANCILLA	GARCIA	DIEGO ARMANDO	1.116.783.267	Contador	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
18	MARIN	SORIANO	WILLIAMS BOSSUET	13.459.845	Almacenista	$2.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
19	BARENO	MORA	YORDAN	1.116.801.253	Inspector de obra (Técnico en obras civiles)	$2.000.000	21/08/2025		10	X	X	X	89748291
20	VILLAMIZAR	CEPEDA	DARWIN JAIR	1.090.455.441	Auxiliar inspector de obra	$2.000.000	21/08/2025		10	X	X	X	89748291
PERSONAL OPERATIVO													
1	BARONI	COLMENARES	JOSE LUIS	17.583.864	Maestro de obra	$3.000.000	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
2	RIVEROS	PEREZ	ANGEL EDUARDO	17.589.961	Oficial	$2.000.000	08/04/2025		30	X	X	X	89748291
3	VARGAS	BLANCO	JAIBER ALEXIS	1.116.772.939	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		30	X	X	X	89748291
4	QUENZA	CAILE	JESUS RAMON	1.116.797.890	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		30	X	X	X	89748291
5	VERA	USCATEGUI	JESUS SEIR	1.118.551.891	Ayudante	$1.423.500	08/04/2025		30	X	X	X	89748291
6	GARCIA	CAPACHO	MARLINDA SAMANTA	1.116.789.548	Reguladora Vial	$1.423.500	21/04/2025		30	X	X	X	89748291
7	OSTO	PARALES	TULIA CRISTINA	68.295.896	Reguladora Vial	$1.423.500	21/04/2025		30	X	X	X	89748291
8	POLO	BALLESTEROS	YEINNY	1.006.496.898	Reguladora Vial	$1.423.500	28/04/2025		30	X	X	X	89748291
9	GUERRERO	GUTIERREZ	JOSÉ GABRIEL	74.352.915	Topógrafo	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7980816189
10	MARIN	VEGA	WILLINGTON JOSÉ	1.006.440.043	Cadenero I	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7980816189
11	PETRO	SALCEDO	FRAN ANTONIO	17.594.203	Cadenero II	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	7980816189
12	OMBITA	AGUDELO	ROBERT ANTONIO	80.809.090	Topógrafo	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	89748291
13	TOVAR	PARALES	JOSE ALFREDO	17.596.652	Cadenero I	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	89617449
14	PINZON	MARTINEZ	ALFONSO	17.588.855	Cadenero II	$1.423.500	01/04/2025		30	X	X	X	89617449
15	CRUZADO	SANCHEZ	FERNEL	17.593.156	Operador	$3.000.000	02/05/2025		30	X	X	X	89748291

MES: AGOSTO DE 2025													
DATOS GENERALES										AFILIADO A			No. PLANILLA
16	RONALDO	TOVA	ELBER	1.116.775.251	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		30	X	X	X	89748291
17	FELIPE	ORTEGA	ELKIN	1.007.107.033	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		30	X	X	X	89748291
18	TORRES	CASTILLO	JACKSON JOSE	1.116.792.276	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		30	X	X	X	89748291
19	SOGAMOSO		DUMAR ALBERTO	1.116.806.801	Ayudante	$1.423.500	12/05/2025		30	X	X	X	89748291
20	TORRES	PALOMO	FRANKLIN EDUARDO	96.168.935	Oficial	$2.000.000	25/06/2025	15/08/2025	15	X	X	X	89748291
21	LEONARDO	GUERRA	HORLEY	1.006.453.782	Ayudante	$1.423.500	25/06/2025		30	X	X	X	89748291
22	BOLIVAR	BAUTISTA	FERMIN	6.609.445	Ayudante	$1.423.500	25/06/2025		30	X	X	X	89748291
23	PEÑUELA	SANCHEZ	JHON JAIRO	1.116.785.609	Operador	$3.000.000	01/08/2025		30	X	X	X	89748291
24	HERNANDEZ	VARGAS	DIDIER SCHNEIDER	17.390.671	Operador	$3.000.000	01/08/2025		30	X	X	X	89748291
25	VELANDIA	DURAN	CARLOS REMIGIO	17.594.681	Oficial	$2.000.000	20/08/2025		11	X	X	X	89748291
26	VELANDIA	DURAN	OSMER ALBAN	1.116.773.637	Oficial	$2.000.000	20/08/2025		11	X	X	X	89748291
27	PATIÑO	PABON	EDGAR OSWALDO	1.093.750.620	Ayudante	$1.423.500	20/08/2025		11	X	X	X	89748291
28	YEPES	CASTILLO	HENRY	17.596.986	Ayudante	$1.423.500	20/08/2025		11	X	X	X	89748291
29	REMOLINA	CEDEÑO	KAREN JULIETH	1.116.772.152	Reguladora vial	$1.423.500	20/08/2025		11	X	X	X	89748291
30	RUIZ	ORTEGA	DEIBINSON FABIAN	1.116.800.539	Oficial	$2.000.000	21/08/2025		10	X	X	X	89748291
31	ALVARO	HURTADO	JHON ALEXANDER	1.116.774.443	Ayudante	$1.423.500	21/08/2025		10	X	X	X	89748291
32	RODRIGUEZ	NATEZ	JUAN FERNANDO	1.116.856.664	Ayudante	$1.423.500	21/08/2025		10	X	X	X	89748291
33	FLOREZ	FIGUEROA	ELIEZER ALEXANDER	1.116.511.185	Ayudante	$1.423.500	21/08/2025	23/08/2025	03	X	X	X	89748291
34	AVENDAÑO		FABIAN ALEJANDRO	1.116.783.936	Operador	$3.000.000	27/08/2025		04	X	X	X	89748291

El pago de las planillas de seguridad social integral del periodo del acta parcial realizados por el contratista, se presentan con las respectivas planillas de la nómina firmadas por el personal.

Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista con respecto al personal vinculado a la obra, la interventoría externa realiza seguimiento a los compromisos laborales del contratista verificando los siguientes aspectos:

Tabla 19. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista-Contrato de Interventoría No.477 de 2024.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO												OBSERVACIONES
	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		
	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	x		X		x		x		X		X		
El contratista ha entregado a la Interventoría copia de las afiliaciones del personal.	X		X		X		X		X		X		
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		X		X		X		X		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		X		X		X		X		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		X		X		X		X		X		
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		X		X		X		X		

3.9.2 Pagos salariales y liquidación del personal

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral escrito para cada uno de los meses que se relacionan en el presente informe; así mismo llevó a cabo la liquidación y pago al personal retirado de acuerdo con los requisitos de Ley.

3.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

3.10.1 Dotación del personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo con las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

Tabla 20. Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de No. 439 de 2024

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Residente, Ayudantes, oficiales , Maestro, Inspector de Obra, Almacenista, Reguladores viales, Comisión de Topografía.
GUANTES	X		X			Residente, Ayudantes, oficiales , Maestro, Inspector de Obra, Almacenista, Reguladores viales, Comisión de Topografía.
BOTAS DE SEGURIDAD	X		X			Residente, Ayudantes, oficiales , Maestro, Inspector de Obra, Almacenista, Reguladores viales, Comisión de Topografía.
BOTAS DE CAUCHO	X		X			Residente, Ayudantes, oficiales , Maestro, Inspector de Obra, Almacenista, Reguladores viales, Comisión de Topografía.
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Residente, Ayudantes, oficiales , Maestro, Inspector de Obra, Almacenista, Reguladores viales, Comisión de Topografía.
OVEROL/CAMISA/PANTALON	X		X			Residente, Ayudantes, oficiales , Maestro, Inspector de Obra, Almacenista, Reguladores viales, Comisión de Topografía.
TAPABOCAS	X		X			Residente, Ayudantes, oficiales , Maestro, Inspector de Obra, Almacenista, Reguladores viales, Comisión de Topografía.
MASCARA	X					Residente, Ayudantes, oficiales , Maestro, Inspector de Obra, Almacenista, Reguladores viales, Comisión de Topografía.
PROTECCIÓN AUDITIVA	X		X			Residente, Ayudantes, oficiales , Maestro, Inspector de Obra, Almacenista, Reguladores viales, Comisión de Topografía.



La Interventoría verificó diariamente en campo la utilización y aplicación de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo los respectivos requerimientos a los trabajadores que en determinado momento no los estaban usando.

3.10.2 Señalización de la obra

En la ejecución de los trabajos, el contratista implementó la señalización requerida para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de la señales informativas y preventivas y vallas necesarias para la ejecución de obra.

Tabla 21. Señalización instalada en la obra por el contratista – contrato de obra No. 439 de 2024.

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CINTA REFLECTIVA	X		X			
AVISOS PREVENTIVOS	x					
AVISOS INFORMATIVOS	X		X			Valla de obra
AVISOS REGLAMENTARIOS		X				
SEÑALES NOCTURNAS REFLECTANTES O LUMINOSAS (conos luminosos, flashes, licuadoras, flechas, ojos de gato, etc.)	X		X			Conos en horas del día con cinta reflectiva para precaución de transeúntes
COLOMBINAS	X		X			
BARRICADAS	X		X			
DELINEADORES	X		X			
CANECAS PLASTICAS O METALICAS	X		X			



La Interventoría diariamente verificó que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al

contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.

3.10.3 Accidentalidad en la obra

La interventoría en sus respectivas funciones en seguimiento, registro y atención a accidentes laborales presentados en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el periodo del presente informe **no** se han presentado accidentes laborales en la ejecución del contrato de obra No. 439 de 2024.

Por otro lado, la interventoría también se estuvo pendiente de cualquier accidente que se hubiese podido ocasionar a terceros en razón de la ejecución de la obra. Para el periodo de ejecución de la obra, no se presentaron accidentes a terceros en la ejecución del contrato No. 439 de 2024.

3.10.4 Sistemas de Gestión y Seguridad en el Trabajo

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales."

La interventoría CONSORCIO INTER HORIZONTE R. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ en calidad de interventoría externa del contrato No. 439 de 2024 informo al contratista de obra en el deber de sus obligaciones para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), por tanto, está atento y hace cumplir los lineamientos establecidos para este tipo de proyectos. Durante el periodo del informe presente, se realizaron charlas de seguridad y salud en el trabajo, donde también se dieron a conocer las buenas prácticas para el correcto desarrollo de la obra. Adicionalmente, se realizaron sesiones de estiramientos antes de iniciar la jornada laboral para evitar posibles lesiones.

3.11 PERMISOS Y LICENCIAS

3.11.1 Licencia de construcción u otro tipo de licencia urbanística

La secretaria de planeación del municipio de Arauca hace constar que mediante el decreto 1469 de 2010 en su artículo 11, numeral 1, literal b, estipula que no se requerirá de licencia para "la ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional, departamental y/o municipal; puertos marítimos y fluviales; infraestructura para la exploración y explotación de hidrocarburos; hidroeléctricas y sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministros de energía; sin perjuicio de las demás autorizaciones, permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia".

3.11.2 Licencia o permisos ambientales

Para el desarrollo de la presente intervención se requiere la obtención de las licencias y permisos ambientales otorgados por la entidad CORPORINOQUIA (Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia), dentro de los cuales se incluyen la concesión de aguas superficiales, la autorización para ocupación de cauces y el aprovechamiento forestal de árboles aislados.

En este sentido, mediante la suscripción del Acta de Suspensión No. 01 de la obra, firmada el día dos (02) de julio de 2025, se remitió comunicación oficial a CORPORINOQUIA, entidad que procedió a ordenar la suspensión de las licencias ambientales por un período de un (01) mes, comprendido entre el diecisiete (17) de julio de 2025 y se dio reinicio de dicha resolución el veintiséis (26) de septiembre de 2025, reanudando las vigencias de los permisos ambientales.

Tabla 22. Relación de licencias o permisos ambientales para las obras para contrato No. 439 de 2024.

TIPO DE LICENCIA O PERMISO	RESPONSABLE DEL TRAMITE	FECHA DEL TRAMITE	ACTO ADMINISTRATIVO	ENTIDAD QUE LA OTORGA	VIGENCIA
Concesión de aguas	*Departamento de Arauca*	*04/04/2025*	*Resolución No. de 700.36.25 0025*	*CORPORINOQUIA*	*Hasta el 04/10/2025*
Ocupación de cauce	*Departamento de Arauca*	*04/04/2025*	*Resolución No. de 700.36.25 0025*	*CORPORINOQUIA*	*Hasta el 04/10/2025*
Aprovechamiento Forestal	*Departamento de Arauca*	*04/04/2025*	*Resolución No. de 700.36.25 0025*	*CORPORINOQUIA*	*Hasta el 04/08/2025*

3.11.3 Licencia o permisos para explotación de materiales de construcción

La Interventoría constató que el contratista realizara la adquisición de los materiales de construcción en cantera autorizada por la Agencia Nacional de Minería que cuentan con los respectivos permisos y licencias de CORPORINOQUIA, vigentes a la fecha de adquisición de los materiales.

Para la ejecución del contrato de obra No. 439 del 2024, el contratista adquirió los materiales de construcción en las siguientes canteras:

Tabla 23. *Proveedores de materiales de cantera para la obra objeto del contrato No. 439 del 2024.*

TIPO DE MATERIAL	CANTERA	LOCALIZACION DE LA CANTERA	PERMISOS Y LICENCIAS		RESOLUCION DE CORPORINOQUIA	VIGENTE	
			Minero	Ambiental		SI	NO
ARENA (DE RIO)	*TRITURADORA EL SOL SAS*	*Municipio de Saravena*	X	X	*No. 700.41.12.0092 del 28/08/2025*	X	
GRAVAS (DE RIO)	*TRITURADORA EL SOL SAS*	*Municipio de Saravena*	X	X	*No. 700.41.12.0092 del 28/08/2025*	X	
LICENCIA AMBIENTAL	*PÉTREOS DEL LLANO LTDA*	*Municipio de Tame*	X	X	*No. 500.41-14-0534 del 14/04/2014*	X	

3.11.4 Licencia o permiso de transito

La entidad ITTDAR (instituto de tránsito y transporte de Arauca) aprueba permiso al plan de manejo de tránsito – PMT presentado por CARLOS AUGUSTO RINCON JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 13.257.218 representante legal del CONSORCIO ARAUCA AVANZA como termino máximo para la intervención y ejecución del contrato de obra No. 000-439 de 2024 construcción, pavimentación y obras de protección del dique vía sector bello horizonte municipio de Arauca, departamento de Arauca.

TIPO DE LICENCIA O PERMISO	RESPONSABLE DEL TRAMITE	FECHA DEL TRAMITE	ACTO ADMINISTRATIVO	ENTIDAD QUE LA OTORGA	VIGENCIA
Aprobación plan de manejo de tránsito PMT para cierre temporal de las vías urbanas dentro del municipio de Arauca	*Consorcio Arauca Avanza*	*14/04/2025*	*Resolución No. 1081 de 2025*	*ITTDAR*	*Hasta el 01/10/2025*

3.12 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verifico que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APUS y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constato el estado físico y de operación de maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

La maquinaria y equipo que el contratista utilizo durante el periodo de ejecución de la obra fue el siguiente:

TIPO:	EXCAVADORA
MARCA:	DOOSAN
REFERENCIA:	DX225LCA
NO. SERIE	DHKCEBACTC0010543
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	EXCAVADORA
MARCA:	DOOSAN
REFERENCIA:	DX225LCA
NO. SERIE	DHKCEBATC00110540
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	CARROTANQUE
MARCA:	KENWORTH
REFERENCIA:	XVM-658
NO. SERIE	392880
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	MINICARGADOR
MARCA:	DUMAQ
REFERENCIA:	SL800
NO. SERIE	MC065028
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	RETROEXCAVADORA
MARCA:	CATERPILLAR
REFERENCIA:	CAT0416FTLBF07382
No. SERIE	MC104821
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	VIBROCOMPACTADOR
MARCA:	VOLVO
REFERENCIA:	SD100DC
No. SERIE	VCE0S100P00199678
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	MOTONIVELADORA
MARCA:	KOMATSU
REFERENCIA:	GD511A-1
No. SERIE	11637
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	CARMIX
MARCA:	DUMAQ
REFERENCIA:	SD100M
No. SERIE	17609006
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO




TIPO:	PILOTEADORA
MARCA:	N/A
REFERENCIA:	DWB 1500
No. SERIE	LG201H01121
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	CAMIÓN-GRUA
MARCA:	PENDIENTE
REFERENCIA:	BJ1133VJPGG-1
No. SERIE	LVBV4PDB3FH500018
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	BOMBA SUMERGIBLE
MARCA:	PENDIENTE
REFERENCIA:	PENDIENTE
No. SERIE	PENDIENTE
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO

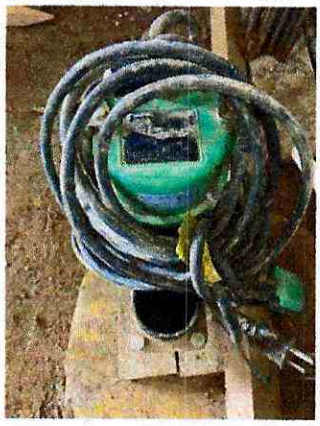

TIPO:	PLANTA ELECTRICA
MARCA:	KIPOR
REFERENCIA:	KDE12STA3
No. SERIE	PENDIENTE
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	Estación total
MARCA:	Topcon
REFERENCIA:	GTS-245NW
No. SERIE	V10112
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	Nivel automático
MARCA:	Topcon
REFERENCIA:	AT-G6
No. SERIE	6J2026
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



TIPO:	CAMIONETA
MARCA:	FOTON
REFERENCIA:	BJ2037 Y3MDV
ESTADO:	BUENO
VIBRACIONES/RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDÓNEO



Por otro lado la interventoría realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.

Tabla 24. *Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato de obra No. 439 de 2024. Desde abril hasta el presente periodo.*

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO								OBSERVACIONES
	MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		
	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	X		X		X				
Los operadores de la maquinaria y equipos se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral y ARL.	X		X		X				
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Seguro contra todo riesgo • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	X		X		X				

4 ASPECTOS TECNICOS

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra suscrito entre el Departamento de Arauca y la firma contratista *CONSORCIO ARAUCA AVANZA* contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de *SEIS (06)* meses.

Tabla 25. Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. 439 de 2024.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PREALISTAMIENTO					
1	**PRELIMINARES**				
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)	M3	5.563,13	$ 39.172,00	$ 217.918.928,36
1,2	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	7.073,20	$ 2.132,00	$ 15.080.062,40
1,3	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG	M3	2.413,75	$ 549.650,00	$ 1.326.717.687,50
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400	M2	7.515,28	$ 15.147,00	$ 113.833.946,16
1,5	MANEJO TEMPORAL DE AGUAS	MES	6,00	$ 11.259.097,00	$ 67.554.582,00
1,6	CORTE Y TALA DE ARBOLES	UND	155,00	$ 199.512,00	$ 30.924.360,00
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
2.1	SUB-BASE GRANULAR	M3	1.973,06	$ 566.044,00	$ 1.116.838.774,64
2.2	BASE GRANULAR	M3	1.578,67	$ 597.880,00	$ 943.855.219,60
2.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	6.189,05	$ 6.869,00	$ 42.512.584,45
2.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	M3	618,90	$ 2.134.014,00	$ 1.320.741.264,60
3	**SEÑALIZACION VIAL**				
3.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP - SR	UND	37,00	$ 698.742,00	$ 25.853.454,00
3.2	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	2.569,30	$ 3.970,00	$ 10.200.121,00
3.3	DEMARCACION VIAS-CEBRAS-FLECHAS-PARES	M2	330,60	$ 37.931,00	$ 12.539.988,60
4	**URBANISMO**				
4,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M	M3	479,95	$ 43.926,00	$ 21.082.283,70
4,2	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.12 M INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	579,01	$ 180.813,00	$ 104.692.535,13
4,3	CONCRETO PARA RAMPA 3000 PSI E. 0.12 m INC. MALLA ELECTROSOLDADA - ESCOBADO	M3	27,20	$ 1.521.230,00	$ 41.377.456,00
4,4	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A10 0.2x0.5x0.8 m - INSTALADO	ML	1.608,88	$ 150.853,00	$ 242.704.374,64
4,5	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A85 0.2x0.35x0.8 m - INSTALADO	ML	87,40	$ 134.559,00	$ 11.760.456,60

4,6	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO(A-100) PIEZA DE EMPALME 0.20*0.50*0.60 M.-INSTALADO	UND	60,00	$ 89.433,00	$ 5.365.980,00
4,7	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI. DE 0.10*0.20*1.00 M.-INSTALADO CON TOPOGRAFIA	ML	1.639,22	$ 55.314,00	$ 90.671.815,08
4,8	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TACTIL ESTAMPADO	M2	466,28	$ 402.537,00	$ 187.694.952,36
4,9	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TOPEROL ESTAMPADO	M2	953,05	$ 402.304,00	$ 383.415.827,20
4,10	BOLARDO EN CONCRETO TIPO IDU- 60 INCLUYE ANCLAJE EN CONCRETO	UND	73,00	$ 326.043,00	$ 23.801.139,00
4,11	EMPRADIZACION CON GRAMA BERMUDA	M2	1.187,29	$ 48.913,00	$ 58.073.915,77
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
5	**PROTECCION Y CONTENCION TERRAPLEN**				
5.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ARCILLA DE CANTERA	M3	1.621,61	$ 130.494,00	$ 211.610.375,34
5.2	SISTEMA DE CONTENCION EN PILOTES Y MURO PANTALLA	ML	20,00	$ 13.693.181,00	$ 273.863.620,00
5.3	PROTECCION DE TALUD CON MANTO TRM 500-INSTALADO Y GRAMA NATURAL	M2	900,00	$ 284.019,00	$ 255.617.100,00
6	**CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT Y CANAL**				
6.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 2-4 M (INCLUYE RETIRO)	M3	6.039,02	$ 39.172,00	$ 236.560.491,44
6.2	CONCRETO CICLOPEO H:0,2 m	M3	348,22	$ 871.178,00	$ 303.361.603,16
6.3	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (3500 PSI) PARA BOXCULVERT-INCLUYE CONSTRUCCION	M3	55,50	$ 1.461.453,00	$ 81.110.641,50
6.4	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)	KG	92.235,28	$ 14.226,00	$ 1.312.139.093,28
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400	M2	1.942,49	$ 15.035,00	$ 29.205.337,15
6.6	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG	M3	565,30	$ 572.195,00	$ 323.461.833,50
6.7	CONCRETO CLASE (C) FC=240 KG/CM2 (3500 PSI) PARA CANAL-INCLUYE CONSTRUCCION	M3	846,87	$ 1.449.383,00	$ 1.227.438.981,21
6.8	FILTRO O DRENAJE FRANCES 0.40X0.50 Y TUBERIA PVC SANIT. 4 PULG.	ML	654,14	$ 196.182,00	$ 128.330.493,48
6.9	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PSI TIPO I (80X80 cm) REFORZADA	UND	26,00	$ 1.708.047,00	$ 44.409.222,00
6.10	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN INCLUYE RETIRO	M3	151,89	$ 58.481,00	$ 8.882.679,09
7	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**				
7.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)	M3	2.460,11	$ 39.172,00	$ 96.367.428,92
7.2	ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA INSTALADA	M3	140,21	$ 93.984,00	$ 13.177.496,64
7.3	TUBERIA PVC CORRUGADA 27 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	536,70	$ 1.006.215,00	$ 540.035.590,50

7.4	TUBERIA PVC CORRUGADA 24 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	310,66	$ 886.935,00	$ 275.535.227,10
7.5	TUBERIA PVC CORRUGADA 20 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	85,82	$ 624.915,00	$ 53.630.205,30
7.6	TUBERIA PVC CORRUGADA 16 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	21,17	$ 399.754,00	$ 8.462.792,18
7.7	TUBERIA PVC CORRUGADA 14 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	10,55	$ 335.964,00	$ 3.544.420,20
7.8	TUBERIA PVC CORRUGADA 12 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	42,94	$ 244.677,00	$ 10.506.430,38
7.9	TUBERIA PVC CORRUGADA 10 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	80,61	$ 190.926,00	$ 15.390.544,86
7.10	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 27"	UND	62,00	$ 236.053,00	$ 14.635.286,00
7.11	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 24"	UND	28,00	$ 214.926,00	$ 6.017.928,00
7.12	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 20"	UND	6,00	$ 188.698,00	$ 1.132.188,00
7.13	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 10" - 16"	UND	34,00	$ 115.956,00	$ 3.942.504,00
7.14	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)	KG	23.772,62	$ 14.226,00	$ 338.189.292,12
7.15	CUNETA EN CONCRETO DE 3500 PSI REFORZAD EN (V-TIPO A) DE 0.30*0.10 M.-CONSTRUIDA	ML	1.698,30	$ 109.115,00	$ 185.310.004,50
7.16	REVESTIMIENTO EN AGROMANTO PERMANENTE-INCLUYE APLICACIÓN	M2	650,00	$ 106.338,00	$ 69.119.700,00
7.17	ENCAMADO EN TRITURADO 3/8" PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA H VARIABLE	M3	280,09	$ 571.057,00	$ 159.947.355,13
7.18	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	748,91	$ 48.934,00	$ 36.647.161,94
7.19	TAPA PARA POZO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA E=0.20 M.-INSTALADA	UND	24,85	$ 1.510.679,00	$ 37.540.373,15
7.20	POZO DE INSPECCION ALC. PLUVIAL EN CONCRETO 3500 PSI	UND	90,50	$ 1.783.371,00	$ 161.395.075,50
7.21	CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO - CONSTRUIDA	UND	26,00	$ 754.540,00	$ 19.618.040,00
7.22	PLACA CIMENTACION POZO 2.50*2.50*0.20 M EN CONCRETO 3500 PSI	UND	26,47	$ 1.647.852,00	$ 43.618.642,44
7.23	CONCRETO 3500 PSI PARA SUMIDERO COMUNICANTE ALCANTARILLADO PLUVIAL	M3	77,46	$ 1.471.281,00	$ 113.965.426,26
7.24	TAPA TIPO BASCULANTE PARA POZO ALCANTARILLADO PLUVIAL	UND	46,00	$ 1.336.699,00	$ 61.488.154,00
7.25	REJILLA TIPO PARA SUMIDERO	ML	43,60	$ 760.466,00	$ 33.156.317,60
7.26	ENTIBADO Y ACODALADO TIPO 4-INCLUYE INSTALACION	M2	2.353,00	$ 85.658,00	$ 201.553.274,00
7.27	ESCALERA DE ACCESO POZOS	ML	43,60	$ 133.229,00	$ 5.808.784,40
COMPONENTE ELECTRICO					
8	**REUBICACIÓN Y DESMANTELAMIENTO RED ELECTRICA**				
8.1	POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)	UND	3,00	$ 6.089.769,00	$ 18.269.307,00

8.2	POSTE EN CONCRETO 8 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)	UND	1,00	$ 2.604.374,00	$ 2.604.374,00
8.3	ESTRUCTURA LA 466M (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	3,00	$ 1.887.852,00	$ 5.663.556,00
8.4	ESTRUCTURA 701 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	$ 2.687.955,00	$ 2.687.955,00
8.5	ESTRUCTURA 523 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	$ 752.979,00	$ 752.979,00
8.6	ESTRUCTURA 550 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	$ 1.763.456,00	$ 1.763.456,00
8.7	ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	$ 2.681.409,00	$ 2.681.409,00
8.8	Cable ACSR 2 AWG (Incluye suministro, transporte, Tendido y Tensionado en Red Primaria 1 Hilo)	KM	0,169	$ 9.687.765,00	$ 1.637.232,00
8.9	TRASLADO RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFASICA (Incluye desmantelamiento red media tensión existente y traslado de la red de media tensión existente a los nuevos apoyos)	KM	0,300	$ 6.704.049,00	$ 2.011.215,00
8.10	DESHINCADO DE POSTE DE 14M - 12M - 8M (Incluye deshincada y traslado a bodega del OR)	UND	15,00	$ 751.739,00	$ 11.276.085,00
8.11	DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE	UND	1,00	$ 984.558,00	$ 984.558,00
8.12	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN	UND	8,00	$ 200.557,00	$ 1.604.456,00
8.13	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN	UND	11,00	$ 120.335,00	$ 1.323.685,00
				SUBTOTAL OBRA FISICA	$13.414.199.090,06
				MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	$ 130.420.409,83
				TOTAL OBRA FÍSICA	$ 13.539.631.160,19

4.2 MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES AL CONTRATO

Durante el presente periodo, no se han generado modificaciones y/o adicionales al contrato de interventoría No. 477 de 2024 ni al contrato de obra No. 439 de 2024.

4.3 MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES AL CONTRATO

*Durante el presente periodo, **no** se han generado compensación de mayores y menores al contrato de interventoría No. 477 de 2024 ni al contrato de obra No. 439 de 2024.*

4.4 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el periodo de ejecución del plazo del contrato, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems:

Tabla 26. Cantidades ejecutadas del contrato de Obra No. 439 de 2024 en Acta parcial No. 01.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE MES	VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE MES
1	PRELIMINARES						
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)	M3	5.563,13	$ 39.172,00	$ 217.918.928,36	5.145,57	$ 201.562.268,04
1.2	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	7.073,20	$ 2.132,00	$ 15.080.062,40	5.921,05	$ 12.623.678,60
1.3	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG	M3	2.413,75	$ 549.650,00	$ 1.326.717.687,50	2.027,92	$ 1.114.646.228,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400	M2	7.515,28	$ 15.147,00	$ 113.833.946,16	6.796,20	$ 102.942.041,40
1.5	MANEJO TEMPORAL DE AGUAS	MES	6,00	$ 11.259.097,00	$ 67.554.582,00	5,14	$ 57.871.758,58
1.6	CORTE Y TALA DE ARBOLES	UND	155,00	$ 199.512,00	$ 30.924.360,00	155,00	$ 30.924.360,00
				SUBTOTAL PRELIMINARES	**$ 1.772.029.566,42**		**$ 1.520.570.334,62**
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						
2.1	SUB-BASE GRANULAR	M3	1.973,06	$ 566.044,00	$ 1.116.838.774,64	1.458,76	$ 825.722.345,44
2.2	BASE GRANULAR	M3	1.578,67	$ 597.880,00	$ 943.855.219,60	1.167,01	$ 697.731.938,80
2.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	6.189,05	$ 6.869,00	$ 42.512.584,45	0,00	$ -

2.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	M3	618,90	$ 2.134.014,00	$ 1.320.741.264,60	0,00	$ -
				SUBTOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**$ 3.423.947.843,29**		**$ 1.523.454.284,24**
3	**SEÑALIZACION VIAL**						
3.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP - SR	UND	37,00	$ 698.742,00	$ 25.853.454,00	0,00	$ -
3.2	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	2.569,30	$ 3.970,00	$ 10.200.121,00	0,00	$ -
3.3	DEMARCACION VIAS-CEBRAS-FLECHAS-PARES	M2	330,60	$ 37.931,00	$ 12.539.988,60	0,00	$ -
				SUBTOTAL SEÑALIZACION VIAL	**$ 48.593.563,60**		**$ 0,00**
4	**URBANISMO**						
4,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M	M3	479,95	$ 43.926,00	$ 21.082.283,70	131,58	$ 5.779.783,08
4,2	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.12 M INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	579,01	$ 180.813,00	$ 104.692.535,13	46,50	$ 8.407.804,50
4,3	CONCRETO PARA RAMPA 3000 PSI E. 0.12 m INC. MALLA ELECTROSOLDADA - ESCOBADO	M3	27,20	$ 1.521.230,00	$ 41.377.456,00	3,06	$ 4.654.963,80
4,4	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A10 0.2x0.5x0.8 m - INSTALADO	ML	1.608,88	$ 150.853,00	$ 242.704.374,64	663,60	$ 100.106.050,80
4,5	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A85 0.2x0.35x0.8 m - INSTALADO	ML	87,40	$ 134.559,00	$ 11.760.456,60	87,40	$ 11.760.456,60
4,6	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO(A-100) PIEZA DE EMPALME 0.20*0.50*0.60 M.-INSTALADO	UND	60,00	$ 89.433,00	$ 5.365.980,00	60,00	$ 5.365.980,00
4,7	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI. DE 0.10*0.20*1.00 M.-INSTALADO CON TOPOGRAFIA	ML	1.639,22	$ 55.314,00	$ 90.671.815,08	468,00	$ 25.886.952,00
4,8	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TACTIL ESTAMPADO	M2	466,28	$ 402.537,00	$ 187.694.952,36	93,60	$ 37.677.463,20
4,9	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TOPEROL ESTAMPADO	M2	953,05	$ 402.304,00	$ 383.415.827,20	187,20	$ 75.311.308,80

4,10	BOLARDO EN CONCRETO TIPO IDU- 60 INCLUYE ANCLAJE EN CONCRETO	UND	73,00	$ 326.043,00	$ 23.801.139,00	0,00	$	-
4,11	EMPRADIZACION CON GRAMA BERMUDA	M2	1.187,29	$ 48.913,00	$ 58.073.915,77	0,00	$	-
				SUBTOTAL URBANISMO	**$ 1.170.640.735,48**			**$ 274.950.762,78**
	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
5	**PROTECCION Y CONTENCION TERRAPLEN**							
5.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ARCILLA DE CANTERA	M3	1.621,61	$ 130.494,00	$ 211.610.375,34	799,75	$	104.362.576,50
5.2	SISTEMA DE CONTENCION EN PILOTES Y MURO PANTALLA	ML	20,00	$ 13.693.181,00	$ 273.863.620,00	20,00	$	273.863.620,00
5.3	PROTECCION DE TALUD CON MANTO TRM 500-INSTALADO Y GRAMA NATURAL	M2	900,00	$ 284.019,00	$ 255.617.100,00	900,00	$	255.617.100,00
				SUBTOTAL PROTECCION Y CONTENCION TERRAPLEN	**$ 741.091.095,34**			**$ 633.843.296,50**
6	**CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT Y CANAL**							
6.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 2-4 M (INCLUYE RETIRO)	M3	6.039,02	$ 39.172,00	$ 236.560.491,44	836,85	$	32.781.088,20
6.2	CONCRETO CICLOPEO H:0,2 m	M3	348,22	$ 871.178,00	$ 303.361.603,16	0,00	$	-
6.3	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (4000 PSI) PARA BOXCULVERT-INCLUYE CONSTRUCCION	M3	55,50	$ 1.461.453,00	$ 81.110.641,50	0,00	$	-
6.4	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)	KG	92.235,28	$ 14.183,00	$ 1.308.172.976,24	0,00	$	-
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400	M2	1.942,49	$ 15.035,00	$ 29.205.337,15	130,00	$	1.954.550,00
6.6	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG	M3	565,30	$ 572.195,00	$ 323.461.833,50	36,00	$	20.599.020,00
6.7	CONCRETO CLASE (C) FC=280 KG/CM2 (4.000 PSI) PARA CANAL-INCLUYE CONSTRUCCION	M3	846,87	$ 1.449.383,00	$ 1.227.438.981,21	0,00	$	-

6.8	FILTRO O DRENAJE FRANCES 0.40X0.50 Y TUBERIA PVC SANIT. 4 PULG.	ML	654,14	$ 196.182,00	$ 128.330.493,48	0,00	$	-
6.9	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PSI TIPO I (80X80 cm) REFORZADA	UND	26,00	$ 1.708.047,00	$ 44.409.222,00	0,00	$	-
6.10	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN INCLUYE RETIRO	M3	151,89	$ 58.481,00	$ 8.882.679,09	0,00	$	-
	SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT Y CANAL				**$ 3.690.934.258,77**			**$ 55.334.658,20**
7	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**							
7.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)	M3	2.460,11	$ 39.172,00	$ 96.367.428,92	2335,09	$	91.470.145,48
7.2	ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA INSTALADA	M3	140,21	$ 93.984,00	$ 13.177.496,64	140,21	$	13.177.496,64
7.3	TUBERIA PVC CORRUGADA 27 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	536,70	$ 1.006.215,00	$ 540.035.590,50	428,66	$	431.324.121,90
7.4	TUBERIA PVC CORRUGADA 24 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	310,66	$ 886.935,00	$ 275.535.227,10	285,46	$	253.184.465,10
7.5	TUBERIA PVC CORRUGADA 20 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	85,82	$ 624.915,00	$ 53.630.205,30	80,42	$	50.255.664,30
7.6	TUBERIA PVC CORRUGADA 16 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	21,17	$ 399.754,00	$ 8.462.792,18	19,66	$	7.859.163,64
7.7	TUBERIA PVC CORRUGADA 14 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	10,55	$ 335.964,00	$ 3.544.420,20	9,95	$	3.342.841,80
7.8	TUBERIA PVC CORRUGADA 12 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	42,94	$ 244.677,00	$ 10.506.430,38	39,39	$	9.637.827,03
7.9	TUBERIA PVC CORRUGADA 10 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	80,61	$ 190.926,00	$ 15.390.544,86	61,29	$	11.701.854,54
7.10	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 27"	UND	62,00	$ 236.053,00	$ 14.635.286,00	0,00	$	-

7.11	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 24"	UND	28,00	$	214.926,00	$	6.017.928,00	0,00	$ -
7.12	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 20"	UND	6,00	$	188.698,00	$	1.132.188,00	0,00	$ -
7.13	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 10" - 16"	UND	34,00	$	115.956,00	$	3.942.504,00	0,00	$ -
7.14	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)	KG	23.772,62	$	14.183,00	$	337.167.069,46	2110,68	$ 29.935.774,44
7.15	CUNETA EN CONCRETO DE 3500 PSI REFORZAD EN (V-TIPO A) DE 0.30*0.10 M.-CONSTRUIDA	ML	1.698,30	$	109.115,00	$	185.310.004,50	0,00	$ -
7.16	REVESTIMIENTO EN AGROMANTO PERMANENTE-INCLUYE APLICACIÓN	M2	650,00	$	106.338,00	$	69.119.700,00	650,00	$ 69.119.700,00
7.17	ENCAMADO EN TRITURADO 3/8" PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA H VARIABLE	M3	280,09	$	571.057,00	$	159.947.355,13	280,09	$ 159.947.355,13
7.18	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	748,91	$	48.934,00	$	36.647.161,94	748,91	$ 36.647.161,94
7.19	TAPA PARA POZO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.20 M.-INSTALADA	M3	24,85	$	1.510.679,00	$	37.540.373,15	0,00	$ -
7.20	POZO DE INSPECCION ALC. PLUVIAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	90,50	$	1.783.371,00	$	161.395.075,50	0,00	$ -
7.21	CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO - CONSTRUIDA	UND	26,00	$	754.540,00	$	19.618.040,00	0,00	$ -
7.22	PLACA CIMENTACION DE POZO ESPESOR 0.20 M EN CONCRETO 3500 PSI	M3	26,47	$	1.647.852,00	$	43.618.642,44	3,07	$ 5.058.905,64
7.23	CONCRETO 3500 PSI PARA SUMIDERO COMUNICANTE ALCANTARILLADO PLUVIAL	M3	77,46	$	1.471.281,00	$	113.965.426,26	0,00	$ -
7.24	TAPA TIPO BASCULANTE PARA POZO ALCANTARILLADO PLUVIAL	UND	46,00	$	1.336.699,00	$	61.488.154,00	0,00	$ -
7.25	REJILLA TIPO PARA SUMIDERO	ML	43,60	$	760.466,00	$	33.156.317,60	0,00	$ -

7.26	ENTIBADO Y ACODALADO TIPO 4-INCLUYE INSTALACION	M2	2.353,00	$ 85.658,00	$ 201.553.274,00	2353,00	$	201.553.274,00
7.27	ESCALERA DE ACCESO POZOS	ML	43,60	$ 133.229,00	$ 5.808.784,40	0,00	$	-
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL				**$ 2.508.713.420,46**			**$ 1.374.215.751,58**
	COMPONENTE ELECTRICO							
8	**REUBICACIÓN Y DESMANTELAMIENTO RED ELECTRICA**							
8.1	POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)	UND	3,00	$ 6.089.769,00	$ 18.269.307,00	3,00	$	18.269.307,00
8.2	POSTE EN CONCRETO 8 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)	UND	1,00	$ 2.604.374,00	$ 2.604.374,00	1,00	$	2.604.374,00
8.3	ESTRUCTURA LA 466M (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	3,00	$ 1.887.852,00	$ 5.663.556,00	0,00	$	-
8.4	ESTRUCTURA 701 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	$ 2.687.955,00	$ 2.687.955,00	0,00	$	-
8.5	ESTRUCTURA 523 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	$ 752.979,00	$ 752.979,00	0,00	$	-
8.6	ESTRUCTURA 550 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	$ 1.763.456,00	$ 1.763.456,00	0,00	$	-
8.7	ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,00	$ 2.681.409,00	$ 2.681.409,00	0,00	$	-
8.8	Cable ACSR 2 AWG (Incluye suministro, transporte, Tendido y Tensionado en Red Primaria 1 Hilo)	KM	0,17	$ 9.687.765,00	$ 1.637.232,29	0,17	$	1.637.232,29
8.9	TRASLADO RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFASICA (Incluye desmantelamiento red media tensión existente y traslado de la red de media tensión existente a los nuevos apoyos)	KM	0,30	$ 6.704.049,00	$ 2.011.214,70	0,22	$	1.474.890,78

8.10	DESHINCADO DE POSTE DE 14M - 12M - 8M (Incluye deshicada y traslado a bodega del OR)	UND	15,00	$	751.739,00	$	11.276.085,00	15,00	$ 11.276.085,00
8.11	DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE	UND	1,00	$	984.558,00	$	984.558,00	1,00	$ 984.558,00
8.12	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN	UND	8,00	$	200.557,00	$	1.604.456,00	8,00	$ 1.604.456,00
8.13	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN	UND	11,00	$	120.335,00	$	1.323.685,00	3,00	$ 361.005,00
SUBTOTAL REUBICACIÓN Y DESMANTELAMIENTO RED ELECTRICA						**$ 53.260.267,00**			**$ 38.211.908,00**
SUBTOTAL OBRA FISICA									**$ 5.420.580.995,99**

4.5 AVANCE DE LA OBRA

4.5.1 Avance Físico de las obras

De acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas en el periodo del acta parcial No. 01, se presenta un avance de ejecución física de la obra del 40.03 %.

Ilustración 2 Avance físico del contrato de obra No. 439 de 2024.



4.5.2 Avance del plazo contractual

Con respecto al plazo contractual, de los seis (06) meses establecidos en la minuta del contrato, han transcurrido cinco (05) meses con cinco (05) días desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 86,11% del total del plazo contractual, restando veintisiete (27) días para finalizar las actividades del contrato y proceder a entregar las obras o actividades al DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Durante el trascurso en el mes de julio *se suscribió el acta de suspensión No. 01 del* contrato de obra No. 439 del 2024 e interventoría No. 477 del 2024 *el día 02 de julio de 2025 y se suscribió el acta de reinicio No. 01 el día 24 de julio de 2025 para ambos contratos.*

En cuanto al estado del tiempo para el periodo del presente informe, se ha registrado algunas lluvias; sin embargo, se han continuado con las actividades.

Tabla 27. Plazos Contrato de Obra No. 439 de 2024 e interventoría No. 477 de 2024.

PLAZO CONTRACTUAL	SEIS (06) MESES
PLAZO EJECUTADO	CINCO (05) MESES CON CINCO (05) DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR	VEINTISIETE (27) DÍAS
% PLAZO EJECUTADO	86,11%

4.6 PROGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA

Para el control de la programación de seguimiento, el contratista presentó el treinta uno (31) de julio de 2025 a la Interventoría la reprogramación de trabajo con respecto a suspensión No.01 presentada el día 02 de julio de 2025 y el cual se reinició No.01 el 24 de julio de 2025; con lo cual la reprogramación justifica el periodo de cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual se hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general.

A continuación, se presenta la siguiente tabla con los % de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.

Tabla 28. Porcentaje de avance de obra Programado Vs Ejecutado del Contrato de Obra No. 439 de 2024.

CORTES	Periodo		% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
CORTE 1	MES 1	01/04/2025 AL 30/04/2025	2.49%	1.61%
CORTE 2	MES 2	01/05/2025 AL 31/05/2025	7.24%	9.23%
CORTE 3	MES 3	01/06/2025 AL 30/06/2025	14.62.%	14,39%
CORTE 4	MES 4	01/07/2025 AL 27/07/2025	14.87%	15.92%
CORTE 5	MES 5	28/08/2025 AL 31/08/2025	29.60%	27,20%
CORTE 6	MES 6	01/09/2025 AL 28/09/2025	61.96%	40.03%
CORTE 7	MES 7	29/09/2025 AL 23/10/2025	100.00%	

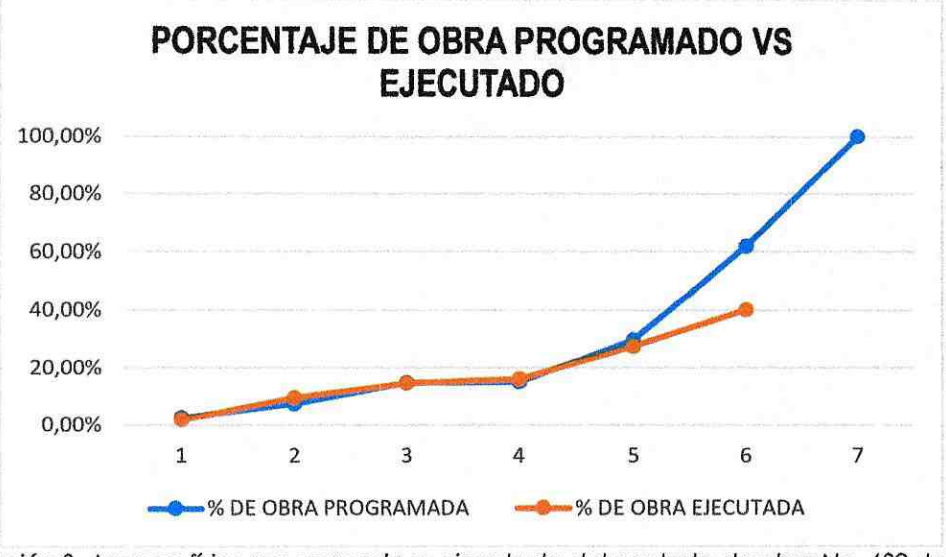


Ilustración 3. Avance físico programado vs ejecutado del contrato de obra No. 439 de 2024



Ilustración 4. Avance físico programado vs ejecutado del contrato de obra No. 439 de 2024.

4.7 IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Entre los imprevistos presentados durante la ejecución del proyecto, se destaca principalmente la temporada invernal registrada en el departamento de Arauca, la cual ocasionó retrasos significativos en el desarrollo de las actividades iniciales contempladas en la programación de obra. Las condiciones climáticas adversas impidieron la correcta ejecución de labores que requerían terreno seco y accesibilidad operativa, afectando directamente el rendimiento y la continuidad de los trabajos.

No obstante, una vez se presentaron condiciones meteorológicas favorables, el contratista reanudó las actividades en campo, priorizando las tareas críticas dentro de la ruta de trabajo establecida, con el fin de recuperar los tiempos de ejecución y minimizar el impacto generado por los eventos climáticos.

4.8 ACTIVIDADES EN OBRA EJECUTADAS.

Para el periodo de ejecución del plazo contractual comprendido entre el 01 de abril de 2025 al 26 de septiembre de 2025, la firma contratista bajo la supervisión y control de la interventoría externa, ejecuto las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ITEM 1.1. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)

Esta actividad consiste en excavar, remover, cargar con equipos mecánicos (retroexcavadora, bulldozer, cargador o Mototrailla) y transportar hasta la distancia de acarreo y colocar en lugares de disposición y desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales y préstamos indicados en las secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene la interventoría.

Equipos y Maquinaria: herramienta menor, Retroexcavadora.

ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)		
ITEM: 1.1.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	5.563,13	CANTIDAD ACUMULADA:	5.145,57
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	5.145,57	CANTIDAD POR EJECUTAR:	417,56
PORCENTAJE EJECUTADO:	92,49%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	7,51%





ITEM 1.2 CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE

Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, la renivelación y la compactación del afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado; así como la conformación o reconstrucción de cunetas.

Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, motoniveladora, vibro compactador, carrotanque.

ACTIVIDAD:	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE		
ITEM: 1.2.		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	7.073,20	CANTIDAD ACUMULADA:	5.921,05
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	5.921,05	CANTIDAD POR EJECUTAR:	1.152,15
PORCENTAJE EJECUTADO:	83,71%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	16,29%





ITEM 1.3 MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CONMAQUINADO < 4 PULG.

Este trabajo consiste en mejoramiento de la rasante y subrasante existente, el eventual retiro de parte de este material, la adición de materiales, la mezcla, humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final, de acuerdo con la presente especificación, y con las dimensiones, alineamiento y pendiente señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del interventor.

Materiales utilizados: crudo clasificado <4 pulg maquinado.
Equipos y Maquinaria: herramienta menor, motoniveladora, vibro compactador, carrotanque.

ACTIVIDAD:	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG.		
ITEM: 1.3.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2.413,75	CANTIDAD ACUMULADA:	2.027,92
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	2.027,92	CANTIDAD POR EJECUTAR:	385,83
PORCENTAJE EJECUTADO:	84,02 %	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	15,98%





ITEM 1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T 2400

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de geotextil tejido T 2400 este con el fin de prevenir la mezcla entre los suelos de subrasante y agregados o materiales seleccionados para conformar subbases, bases o materiales para construir rellenos; los que se colocarán sobre el geotextil de acuerdo con un espesor de diseño y valores de compactación establecidos, en los sitios señalados por los planos del proyecto o los indicados por el interventor.

Materiales utilizados: Geotextil T-2400.
Equipos y Maquinaria: herramienta menor.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T 2400.		
ITEM: 1.4.		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	7.515,28	CANTIDAD ACUMULADA:	6.796,20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	6.796,20	CANTIDAD POR EJECUTAR:	719,08
PORCENTAJE EJECUTADO:	90,43%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	9,57%





ITEM 1.5 MANEJO TEMPORAL DE AGUAS


Esta especificación se refiere al manejo durante la ejecución de las obras, de las aguas subterráneas y superficiales producto de las lluvias y escorrentías provenientes de las zonas de la ladera. El manejo de las aguas comprenderá el suministro y aplicación de todos los medios, materiales, organización, mano de obra y equipos, necesarios para mantener libres de agua las obras en ejecución que así lo requieran.

Materiales utilizados: Equipo no eléctrico y accesorios para manejo temporal de aguas (incluye tubería o manguera 3-8 pulg – accesorios y formaleta.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, planta eléctrica 10Kva, Bomba electro sumergible 3 pulg.*

ACTIVIDAD:	MANEJO TEMPORAL DE AGUAS		
ITEM: 1.5.		UNIDAD: MES	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	6,00	CANTIDAD ACUMULADA:	5,14
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	5,14	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,86
PORCENTAJE EJECUTADO:	85,67%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	14,33%



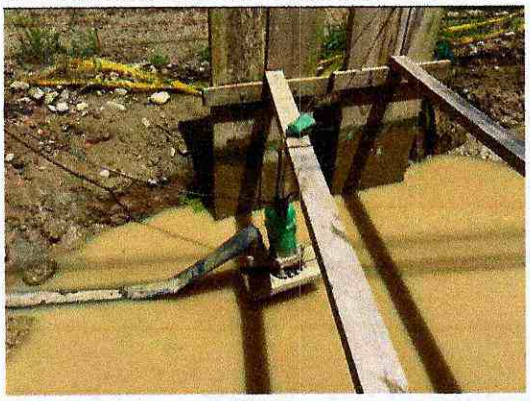

ITEM 1.6 CORTE Y TALA DE ARBOLES

Este capitulo comprende las especificaciones para los suministros y obras necesarias para los trabajos de tala y/o poda de especies existentes, de acuerdo a las indicaciones de la INTERVENTORIA.

Materiales utilizados: motosierra.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	CORTE Y TALA DE ARBOLES		
ITEM: 1.6.		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	155,00	CANTIDAD ACUMULADA:	155,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	35,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%






ITEM 2.1. SUBBASE GRANULAR

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de sub-base granular aprobado sobre superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el interventor.

Materiales utilizados: Subbase granular, agua,
Equipos y Maquinaria: *Carrotanque, Motoniveladora, Vibrocompactador, Herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	SUB-BASE GRANULAR		
ITEM: 2.1.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.973,06	CANTIDAD ACUMULADA:	1.458,76
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	1.458,76	CANTIDAD POR EJECUTAR:	514,30
PORCENTAJE EJECUTADO:	73,93%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	26,07%



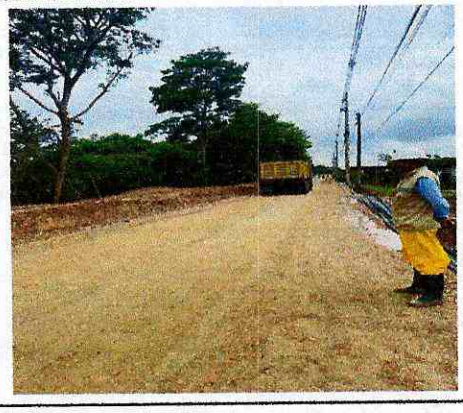

ITEM 2.2. BASE GRANULAR

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de una capa de base granular aprobado sobre una subbase, en una o varias capas, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes señalados en los planos del proyecto u ordenados por el interventor.

Materiales utilizados: Base granular, agua.
Equipos y Maquinaria: *Carrotanque, Motoniveladora, Vibrocompactador, Herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	BASE GRANULAR		
ITEM: 2.2.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.578,67	CANTIDAD ACUMULADA:	1.167,01
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	1.167,01	CANTIDAD POR EJECUTAR:	411,66
PORCENTAJE EJECUTADO:	73.92%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	26,08%





ITEM 4.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2M

Se entiende por excavación manual, el remover o quitar volúmenes de tierra u otros materiales empleando personal calificado para este trabajo, con la finalidad de conformar espacios que no requieran el uso de maquinaria especializada y sea de difícil acceso para estas.

Materiales utilizados: herramienta menor.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2M		
ITEM: 4.1.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	479,95	CANTIDAD ACUMULADA:	131,58
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	131,58	CANTIDAD POR EJECUTAR:	348,37
PORCENTAJE EJECUTADO:	27,42%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	72,58%







ITEM 4.2. PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.12 M INC. MALLA ELECTROSOLDADA.

Ejecución de losas de contrapiso en concreto reforzado. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos estructurales.

Materiales utilizados: concreto 1:2:3 3000 psi, malla electrosoldada de 5 mm, formaleta 3 usos
Equipos y Maquinaria: *vibrador para concreto, Herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.12 M INC. MALLA ELECTROSOLDADA.		
ITEM: 4.2		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	579,01	CANTIDAD ACUMULADA:	46,50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	46,50	CANTIDAD POR EJECUTAR:	532,51,66
PORCENTAJE EJECUTADO:	8,03%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	91,97%

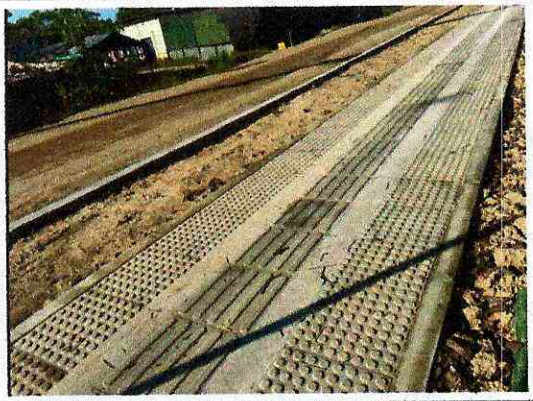

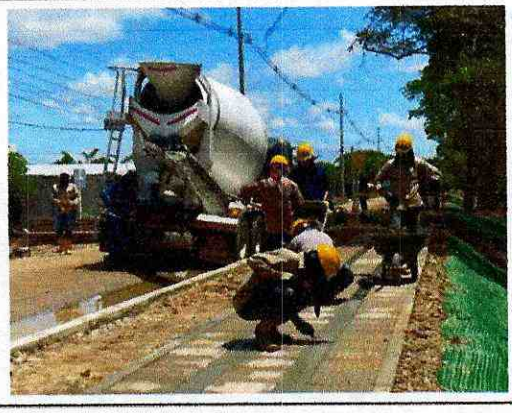

ITEM 4.3. CONCRETO PARA RAMPA 3000 PSI E. 0.12 m INC. MALLA ELECTROSOLDADA - ESCOBADO

El concreto simple para las rampas de acceso tendrán F'C= 210 Kg/cm2 de espesor 12 cm, lo establecido en los planos respectivos.

Materiales utilizados: concreto 1:2:3 3000 psi, malla electrosoldada de 5 mm, formaleta 3 usos
Equipos y Maquinaria: *vibrador para concreto, Herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	CONCRETO PARA RAMPA 3000 PSI E. 0.12 m INC. MALLA ELECTROSOLDADA - ESCOBADO.		
ITEM: 4.3		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	27.20	CANTIDAD ACUMULADA:	3.06
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	3.06	CANTIDAD POR EJECUTAR:	24.14
PORCENTAJE EJECUTADO:	11,25%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	88,75%





ITEM 4.4 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A10 0.2x0.5x0.8 m - INSTALADO

Construcción de sardineles destinados a la contención lateral de los pavimentos, afirmados y andenes. Se construirán en los sitios señalados en los planos Arquitectónicos, detalles de conformidad con los alineamientos y pendientes que establezca la interventoría.

Materiales utilizados: Sardinel prefecto 3500 psi perfor 0.80*0.20*0.50(A-10), Mortero 1:3.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A10 0.2x0.5x0.8 m - INSTALADO		
ITEM: 4.4.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.608,88	CANTIDAD ACUMULADA:	663,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	663,60	CANTIDAD POR EJECUTAR:	945,28
PORCENTAJE EJECUTADO:	41,25%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	58,75%





ITEM 4.5 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A85 0.2x0.35x0.8 m - INSTALADO

Construcción de sardineles destinados a la contención lateral de los pavimentos, afirmados y andenes. Se construirán en los sitios señalados en los planos Arquitectónicos, detalles de conformidad con los alineamientos y pendientes que establezca la interventoría.

Materiales utilizados: Sardinel prefabricado A85 0.8m*0.20*0.35m, Mortero 1:3.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A85 0.2x0.35x0.8 m - INSTALADO		
ITEM: 4.5.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	87,40	CANTIDAD ACUMULADA:	87,40
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	87,40	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ITEM 4.6 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO (A-100) PIEZA DE EMPALME 0.2x0.50x0.60 m - INSTALADO

Construcción de sardineles destinados a la contención lateral de los pavimentos, afirmados y andenes. Se construirán en los sitios señalados en los planos Arquitectónicos, detalles de conformidad con los alineamientos y pendientes que establezca la interventoría.

Materiales utilizados: Sardinel prefabricado 0.20m*0.50*0.35m-ccto psi l=0.60 (pieza de empalme, Mortero 1:3.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO (A-100) PIEZA DE EMPALME 0.2x0.50x0.60 m - INSTALADO		
ITEM: 4.6.		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	60,00	CANTIDAD ACUMULADA:	60,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	60,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%






ITEM 4.7 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI. DE 0.10*0.20*1.00 M.-INSTALADO CON TOPOGRAFIA

Instalación de bordillo prefabricados en concreto, según localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos.

Materiales utilizados: bordillo pref. C/cto 3000 psi 10*20*100 cms, tipo b-20, Mortero 1:3.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI. DE 0.10*0.20*1.00 M.-INSTALADO CON TOPOGRAFIA		
ITEM: 4.7.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.639,22	CANTIDAD ACUMULADA:	468,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	468,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	1.171,22
PORCENTAJE EJECUTADO:	28,55%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	71,45%

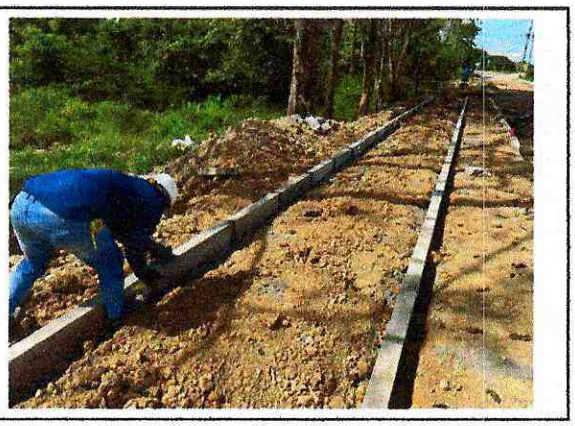



ITEM 4.8 PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TACTIL ESTAMPADO

Esta actividad comprende la construcción de placa de piso en concreto de 3000 psi E=0,10 m con acabado en loseta táctil estampado de conformidad con lo establecido en los planos arquitectónicos.

Materiales utilizados: N/A.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TACTIL ESTAMPADO		
ITEM: 4.8.		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	466,28	CANTIDAD ACUMULADA:	93,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	93,60	CANTIDAD POR EJECUTAR:	372,68
PORCENTAJE EJECUTADO:	20,07%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	79,93%





ITEM 4.9 PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TOPEROL ESTAMPADO


Esta actividad comprende la construcción de placa de piso en concreto de 3000 psi E=0,10 m con acabado en loseta toperol estampado de conformidad con lo establecido en los planos arquitectónicos.

Materiales utilizados: N/A.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TOPEROL ESTAMPADO		
ITEM: 4.9.		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	953,05	CANTIDAD ACUMULADA:	187,20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	187,20	CANTIDAD POR EJECUTAR:	765,85
PORCENTAJE EJECUTADO:	19,64%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	80,36%



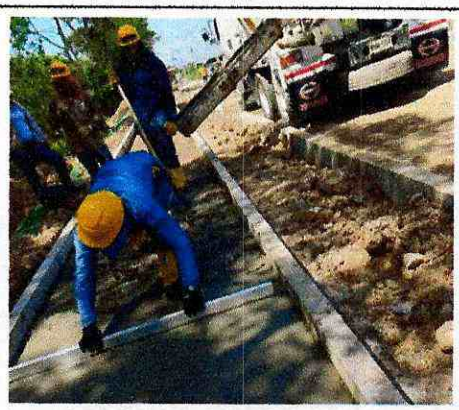

ITEM 5.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ARCILLA DE CANTERA

Esta actividad comprende el relleno y compactación con material de arcilla de cantera.

Materiales utilizados: Retroexcavadora, vibrocompactador de 10-15 ton, carrotanque.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, arcilla de cantera para relleno.*

ACTIVIDAD:	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ARCILLA DE CANTERA		
ITEM: 5.1.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.621,61	CANTIDAD ACUMULADA:	799,75
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	799,75	CANTIDAD POR EJECUTAR:	821,86
PORCENTAJE EJECUTADO:	49,32%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	50,68%






ITEM 5.2. SISTEMA DE CONTENCIÓN EN PILOTES Y MURO PANTALLA


Este ítem comprende la construcción del sistema de contención en pilotes con muro pantalla envueltos en geotextil NT 1600.

Materiales utilizados: Poste metálico 12 sch st, concreto de 3000 PSI, acero de refuerzo, Tornillo 2 1/1/2" X 1", Tubería sanitaria 2", Geotextil nt 1600, Soldadura 6013 X 1/8", Formaleta 3 usos.

Equipos y Maquinaria: *Hincador de pilotes, Retroexcavadora, Equipo oxicorte, Herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	SISTEMA DE CONTENCIÓN EN PILOTES Y MURO PANTALLA		
ITEM: 5.2.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	20,00	CANTIDAD ACUMULADA:	20,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	20,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%

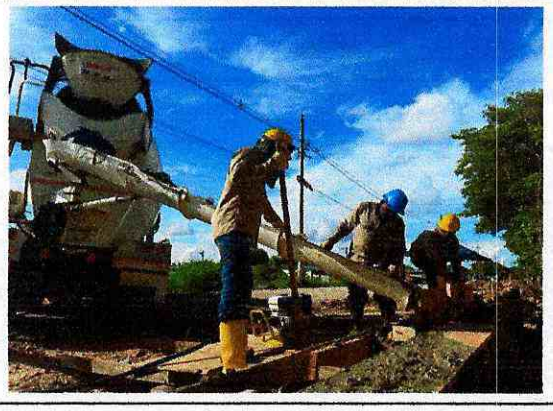

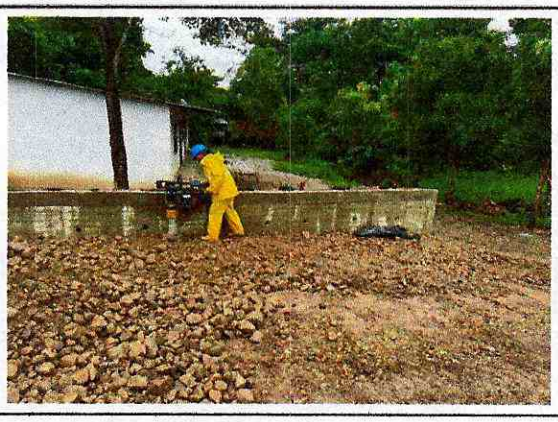

ITEM 5.3 PROTECCIÓN DE TALUD CON MANTO TRM 500-INSTALADO Y GRAMA NATURAL

Esta actividad comprende la protección del talud con la instalación de manto TRM 500 instalado y con la proporción, extendido y aplicación de cobertura vegetal de grama natural.

Materiales utilizados: Grama nativa de la región, tierra abonada y/o orgánica, agromanto terratrac trm 50 o similar.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, acero de refuerzo.*

ACTIVIDAD:	PROTECCIÓN DE TALUD CON MANTO TRM 500-INSTALADO Y GRAMA NATURAL		
ITEM: 5.3.		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	900,00	CANTIDAD ACUMULADA:	900,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	900,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ITEM 6.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 2-4 M (INCLUYE RETIRO)

Esta actividad consiste en excavar, remover, cargar con equipos mecánicos (retroexcavadora, bulldozer, cargador o mototrailla) y transportar hasta la distancia de acarreo y colocar en lugares de disposición y desecho, los materiales indiciados en las secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene la interventoría.

Materiales utilizados: N/A

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, retroexcavadora.*

ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 2-4 M (INCLUYE RETIRO)		
ITEM: 6.1.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	6.039,02	CANTIDAD ACUMULADA:	836,85
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	836,85	CANTIDAD POR EJECUTAR:	5.202,17
PORCENTAJE EJECUTADO:	13,86%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	86,14%





ITEM 6.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T 2400

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de geotextil tejido T 2400 este con el fin de prevenir la mezcla entre los suelos de subrasante y agregados o materiales seleccionados para conformar subbases, bases o materiales para construir rellenos; los que se colocarán sobre el geotextil de acuerdo con un espesor de diseño y valores de compactación establecidos, en los sitios señalados por los planos del proyecto o los indicados por el interventor.

Materiales utilizados: Geotextil T-2400.
Equipos y Maquinaria: herramienta menor.

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T 2400.		
ITEM: 6.5.		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.942,49	CANTIDAD ACUMULADA:	130,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	130,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	1.812,49
PORCENTAJE EJECUTADO:	6,69%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	93,31%





ITEM 6.6 MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CONMAQUINADO < 4 PULG.

Este trabajo consiste en mejoramiento de la rasante y subrasante existente, el eventual retiro de parte de este material, la adición de materiales, la mezcla, humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final, de acuerdo con la presente especificación, y con las dimensiones, alineamiento y pendiente señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del interventor.

Materiales utilizados: crudo clasificado <4 pulg maquinado.
Equipos y Maquinaria: herramienta menor, motoniveladora, vibro compactador, carrotanque.

ACTIVIDAD:	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG.		
ITEM: 6.6.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	565,30	CANTIDAD ACUMULADA:	36,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	36,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	529,30
PORCENTAJE EJECUTADO:	6,37 %	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	93,63%





ITEM 7.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)

Esta actividad consiste en excavar, remover, cargar con equipos mecánicos (Retroexcavadora, Bulldozer, Cargador o Mototrailla) y transportar hasta la distancia de acarreo y colocar en lugares de disposición y desecho, los materiales prevenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales y prestamos indicados en las secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene la interventoría.

Materiales utilizados: No aplica.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, retroexcavadora.*

ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)		
ITEM: 7.1.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2.460,11	CANTIDAD ACUMULADA:	2.335,09
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	2.335,09	CANTIDAD POR EJECUTAR:	125,02
PORCENTAJE EJECUTADO:	94,92%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	5,08%





ITEM 7.2 ARENA PARA CIMENTACIÓN DE LA TUBERIA INSTALADA

Esta actividad comprende del suministro e instalación de arena para la cimentación de la tubería instalada.

Materiales utilizados: Arena lavada de rio.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, vibro compactador.*

ACTIVIDAD:	ARENA PARA CIMENTACIÓN DE LA TUBERIA INSTALADA		
ITEM: 7.2.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	140,21	CANTIDAD ACUMULADA:	140,21
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	140,21	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ITEM 7.3 TUBERIA PVC CORRUGADA 27 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA

Esta actividad hace referencia a la instalación de tubería PVC corrugada para alcantarillado corrugada instalada.

Materiales utilizados: Tuberia PVC corrug. Alc. 27 Pulg., hidrosello 27 pulg., lubricante para tubería x4 kg.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, Diferencial de 5 ton.*

ACTIVIDAD:	TUBERIA CORRUGADA 27 PULG. PARA ALCANTARILLADO - INSTALADO		
ITEM: 7.3.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	536,70	CANTIDAD ACUMULADA:	428,66
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	428,66	CANTIDAD POR EJECUTAR:	108,04
PORCENTAJE EJECUTADO:	79,87%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	20,13%





ITEM 7.4 TUBERIA PVC CORRUGADA 24 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA

Esta actividad hace referencia a la instalación de tubería PVC corrugada para alcantarillado corrugada instalada.

Materiales utilizados: Tuberia PVC corrug. Alc. 24 Pulg., hidrosello 24 pulg. , lubricante para tubería x4 kg.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, Diferencial de 5 ton.*

ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC CORRUGADA 24 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA		
ITEM: 7.4.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	310,66	CANTIDAD ACUMULADA:	285,46
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	285,46	CANTIDAD POR EJECUTAR:	25,20
PORCENTAJE EJECUTADO:	91,89%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	8,11%





ITEM 7.5 TUBERIA PVC CORRUGADA 20 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA

Esta actividad hace referencia a la instalación de tubería PVC corrugada para alcantarillado corrugada instalada.

Materiales utilizados: Tuberia PVC corrug. Alc. 20 Pulg., hidrosello 20 pulg. , lubricante para tubería x4 kg.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, Diferencial de 5 ton.*

ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC CORRUGADA 20 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA		
ITEM: 7.5.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	85,82	CANTIDAD ACUMULADA:	80,42
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	80,42	CANTIDAD POR EJECUTAR:	5,40
PORCENTAJE EJECUTADO:	93,71%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	6,29%





ITEM 7.6 TUBERIA PVC CORRUGADA 16 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA

Esta actividad hace referencia a la instalación de tubería PVC corrugada para alcantarillado corrugada instalada.

Materiales utilizados: Tuberia PVC corrug. Alc. 16 Pulg., hidrosello 16 pulg., lubricante para tubería x4 kg.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, Diferencial de 5 ton.*

ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC CORRUGADA 16 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA		
ITEM: 7.6.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	21,17	CANTIDAD ACUMULADA:	19,66
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	19,66	CANTIDAD POR EJECUTAR:	1,51
PORCENTAJE EJECUTADO:	92,87%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	7,13%





ITEM 7.7 TUBERIA PVC CORRUGADA 14 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA

Esta actividad hace referencia a la instalación de tubería PVC corrugada para alcantarillado corrugada instalada.

Materiales utilizados: Tuberia PVC corrug. Alc. 14 Pulg., hidrosello 14 pulg., lubricante para tubería x4 kg.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, Diferencial de 5 ton.*

ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC CORRUGADA 14 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA		
ITEM: 7.7.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	10,55	CANTIDAD ACUMULADA:	9,95
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	9,95	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,60
PORCENTAJE EJECUTADO:	94,31%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	5,69%





ITEM 7.8 TUBERIA PVC CORRUGADA 12 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA

Esta actividad hace referencia a la instalación de tubería PVC corrugada para alcantarillado corrugada instalada.

Materiales utilizados: Tuberia PVC corrug. Alc. 12 Pulg., hidrosello 12 pulg., lubricante para tubería x4 kg.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, Diferencial de 5 ton.*

ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC CORRUGADA 12 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA		
ITEM: 7.8.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	42,94	CANTIDAD ACUMULADA:	39,39
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	39,39	CANTIDAD POR EJECUTAR:	3,55
PORCENTAJE EJECUTADO:	91,73%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	8,27%





ITEM 7.9 TUBERIA PVC CORRUGADA 10 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA

Esta actividad hace referencia a la instalación de tubería PVC corrugada para alcantarillado corrugada instalada.

Materiales utilizados: Tuberia PVC corrug. Alc. 10 Pulg., hidrosello 10 pulg., lubricante para tubería x4 kg.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, Diferencial de 5 ton.*

ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC CORRUGADA 10 PULG. PARA ALCANTARILLADO – INSTALADA		
ITEM: 7.6.		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	80,61	CANTIDAD ACUMULADA:	61,29
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	61,29	CANTIDAD POR EJECUTAR:	19632
PORCENTAJE EJECUTADO:	76,03%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	23,97%





ITEM 7.14 ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y los requerimiento de interventora.

Materiales utilizados: Acero de refuerzo de 60000 psi

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, cizaña manual, dobladora manual.*

ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)		
ITEM: 7.14.		UNIDAD: KG	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	23.772,62	CANTIDAD ACUMULADA:	2.110,68
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	2.110,68	CANTIDAD POR EJECUTAR:	2.110,68
PORCENTAJE EJECUTADO:	8,88%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	91,97%





ITEM 7.16 REVESTIMIENTO EN AGROMANTO PERMANENTE-INCLUYE APLICACIÓN

Esta actividad comprende la protección del talud con la instalación de revestimiento en agromanto permanente incluyendo la aplicación y extendido

Materiales utilizados: Agromanto terratrac tm 50 o similar, acero de refuerzo

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	REVESTIMIENTO EN AGROMANTO PERMANENTE-INCLUYE APLICACIÓN		
ITEM: 7.16.		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	650,00	CANTIDAD ACUMULADA:	650,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	650,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ITEM 7.17 ENCAMADO EN TRITURADO 3/8" PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA H VARIABLE

Esta actividad comprende el encamado en triturado de 3/8 para e atraque de la tubería de alcantarillado instalada.

Materiales utilizados: Triturado 3/8"

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	ENCAMADO EN TRITURADO 3/8" PARA ATRAQUE DE LA TUEBRIA H VARIABLE		
ITEM: 7.17.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	280,09	CANTIDAD ACUMULADA:	280,09
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	280,09	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ITEM 7.18 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN

Rellenos en material seleccionado compactado mecánicamente realizados en los sitios señalados dentro de los planos Arquitectónicos, planos estructurales y Estudio de suelos.

Materiales utilizados: Material de excavación.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	RELLENO DE COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN		
ITEM: 7.18.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	748,91	CANTIDAD ACUMULADA:	748,91
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	748,91	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ITEM 7.22 REJILLA TIPO PARA SUMIDERO

Esta actividad se refiere a la instalación de rejilla para sumidero.

Materiales utilizados: Angulo de 2 ½ x 2 ½ x 3/8", angulo de 3x3x3/8, bisagra 4" tipo industrial, platina 2 ½" x 3/8", Soldadura 6013x1/8 pulg

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	REJILLA TIPO PARA SUMIDERO		
ITEM: 7.22.		UNIDAD: M3	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	26,47	CANTIDAD ACUMULADA:	3,07
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	3,07	CANTIDAD POR EJECUTAR:	23,40
PORCENTAJE EJECUTADO:	11,60%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	88,40%





ITEM 7.26 ENTIBADO Y ACODALADO TIPO 4-INCLUYE INSTALACIÓN

Esta actividad se refiere al sistema de soporte temporal, conocido como entibado, para una excavación, donde el "tipo 4" probamente denota un sistema de características especificas como el uso de postes de madera.

Materiales utilizados: tabla burra, listo madera ordinaria, puntilla 1+ ½ A 3 pulg.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	ENTIBADO Y ACODALADO TIPO 4-INCLUYE INSTALACIÓN		
ITEM: 7.26.		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2.353,00	CANTIDAD ACUMULADA:	2.353,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	2.353,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ITEM 8.1 POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)

Esta actividad se basa en instalación de estructura poste en concreto 14 M x 1050 kg en lo cual incluye suministro, transporte y proceso hincada, aplomada y cimentada) en el área a intervenir.

Materiales utilizados: concreto de 3000 psi, poste de concreto de 14 mts x 1050 kg-f

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, grúa de 3 ton.*

ACTIVIDAD:	POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)		
ITEM: 8.1.		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3,00	CANTIDAD ACUMULADA:	3,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	3,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ITEM 8.2 POSTE EN CONCRETO 8 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)

Esta actividad se basa en instalación de estructura poste en concreto 8 M x 1050 kg en lo cual incluye suministro, transporte y proceso hincada, aplomada y cimentada) en el área a intervenir.

Materiales utilizados: concreto de 3000 psi, poste de concreto de 8 mts x 1050 kg-f

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, grúa de 3 ton.*

ACTIVIDAD:	POSTE EN CONCRETO 8 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)		
ITEM: 8.2.		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1,00	CANTIDAD ACUMULADA:	1,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	1,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ITEM 8.8 Cable ACSR 2 AWG (Incluye suministro, transporte, Tendido y Tensionado en Red Primaria 1 Hilo)

Esta actividad se basa en instalación de Cable ACSR 2 AWG (Incluye suministro, transporte, Tendido y Tensionado en Red Primaria 1 Hilo).

Materiales utilizados: cable ACSR No 2 AWG.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, camioneta pick-up.*

ACTIVIDAD:	Cable ACSR 2 AWG (Incluye suministro, transporte, Tendido y Tensionado en Red Primaria 1 Hilo)		
ITEM: 8.48		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	0,169	CANTIDAD ACUMULADA:	0,169
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	0,169	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ITEM 8.9 TRASLADO RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFASICA (Incluye desmantelamiento red media tensión existente y traslado de la red de media tensión existente a los nuevos apoyos)

Esta actividad se basa en TRASLADO RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFASICA (Incluye desmantelamiento red media tensión existente y traslado de la red de media tensión existente a los nuevos apoyos)

Materiales utilizados: N/A.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, camioneta pick-up.*

ACTIVIDAD:	TRASLADO RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFASICA (Incluye desmantelamiento red media tensión existente y traslado de la red de media tensión existente a los nuevos apoyos)		
ITEM: 8.9.		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	0,30	CANTIDAD ACUMULADA:	0,22
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	0,22	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,08
PORCENTAJE EJECUTADO:	73,33%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	26,67%




ITEM 8.10 DESHINCADO DE POSTE DE 14M - 12M - 8M (Incluye deshicada y traslado a bodega del OR)

Esta actividad se basa en DESHINCADO DE POSTE DE 14M - 12M - 8M (Incluye deshicada y traslado a bodega del OR)

Materiales utilizados: N/A.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor, grúa de 3 toneladas.*

ACTIVIDAD:	DESHINCADO DE POSTE DE 14M - 12M - 8M (Incluye deshicada y traslado a bodega del OR)		
ITEM: 8.10.		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	15,00	CANTIDAD ACUMULADA:	15,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	15,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%

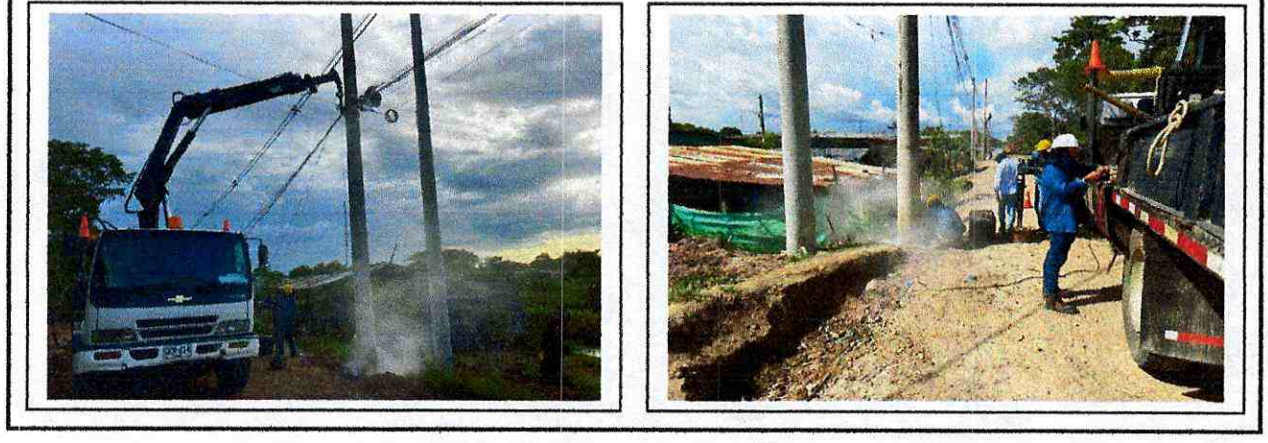


ITEM 8.11 DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE


Esta actividad se basa en DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE

Materiales utilizados: N/A.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE		
ITEM: 8.11.		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1,00	CANTIDAD ACUMULADA:	1,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	1,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%

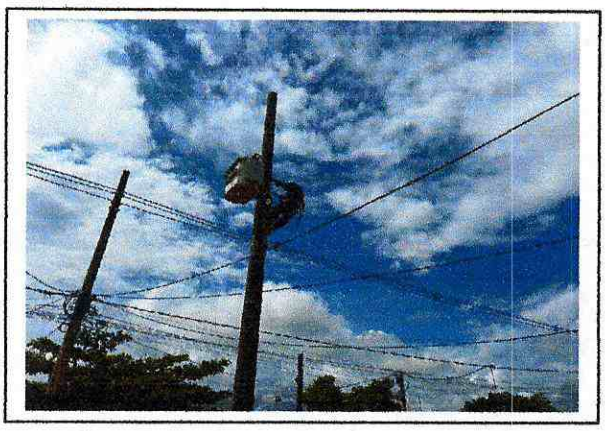

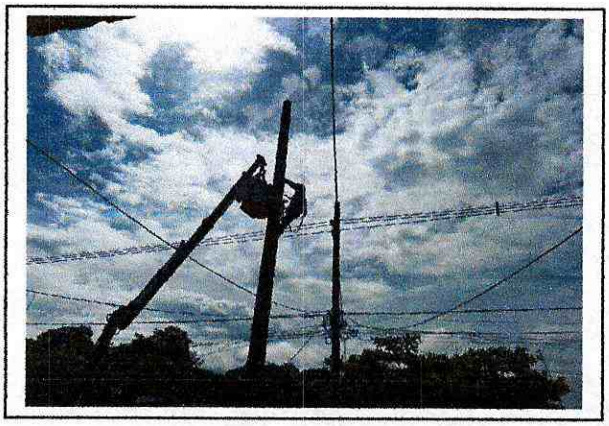


ITEM 8.12 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN

Esta actividad se basa en DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN

Materiales utilizados: N/A.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN		
ITEM: 8.12.		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	8,00	CANTIDAD ACUMULADA:	8,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	8,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%

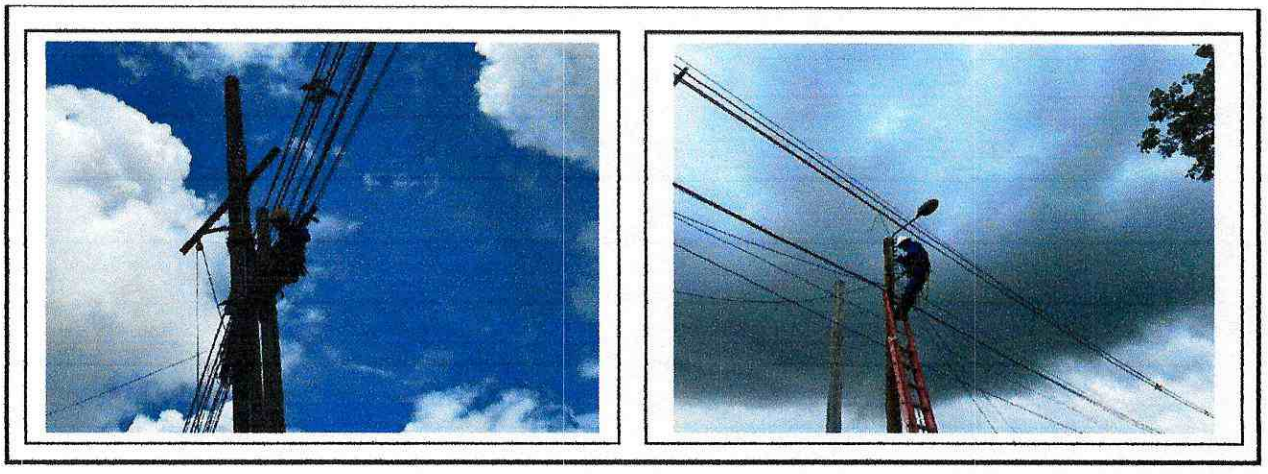

ITEM 8.13 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN

Esta actividad se basa en DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN

Materiales utilizados: N/A.

Equipos y Maquinaria: *herramienta menor.*

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN		
ITEM: 8.13.		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	11,00	CANTIDAD ACUMULADA:	3,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	3,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	8,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	27,27%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	72,73%



4.9 CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo del informe parcial, la Interventoría llevó a cabo un riguroso control de calidad para garantizar la excelencia en la ejecución de las actividades contractuales. Esto implicó la implementación de procedimientos meticulosos que abarcaron inspecciones regulares, revisiones

documentales y tomas de muestras de laboratorio. Las normas y especificaciones técnicas aplicables se utilizaron como referencia para evaluar la calidad, y se realizaron ensayos en conformidad con los requisitos contractuales. Se ha mantenido un detallado registro fotográfico que respalda el proceso de control de calidad. Los resultados de estas actividades se resumen en este informe, incluyendo hallazgos destacados, conclusiones sobre la calidad general y, en caso necesario, recomendaciones para acciones correctivas con el objetivo de garantizar el éxito continuo del proyecto.

Se anexaran en la presente acta parcial un informe de análisis de resultados de los ensayos realizados en obra.

5 ASPECTOS FINANCIEROS

En cumplimiento de las funciones descritas en el contrato de consultoría (interventoría) No. 477 de 2024, la interventoría ha realizado seguimiento a diferentes actividades de carácter financiero, las cuales son relacionadas a continuación.

5.1. MANEJO DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA:

De acuerdo con **CLÁSULA 7. FORMA DE PAGO** del contrato de obra No. 439 del 17 de diciembre de 2024:

"El Departamento de Arauca pagará el valor del contrato, previa presentación de la orden de Pago debidamente soportada, así:

a) Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del Contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la interventoría externa y satisfacción del Departamento.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca, y que sean imputables al contratista y no a la Entidad.

b) El veinte por ciento (20%) restante del valor total, previo recibo a Satisfacción y suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOTA 1: Para el cobro de la primera acta parcial su valor mínimo debe corresponder al cuarenta (40%) por ciento.

NOTA 2: Para el resto de los cobros parciales se deberá tener en cuenta lo descrito en el DECRETO No. 1202 DE 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA UN PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN EL MARCO DE LA LEY 2056 DE 2020, DECRETO 1821 DE 2020, DECRETO 804 DE 2021, ACUERDO 07 DE 2022 Y DEMÁS DISPOSICIONES CONCORDANTES".

El Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el

Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan".

Por consiguiente, para el contrato de obra No. 439 de 2024 no se maneja **ANTICIPO.**

5.1.1. Apertura de cuenta bancaria

De acuerdo con cláusula 6 del contrato de interventoría 477 del 30 de diciembre de 2024. La entidad otorgará un anticipo de hasta del cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato y se halle aprobado las garantías que lo ampare.

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA No.:	137553905
FECHA DE APERTURA:	(21/02/2025)
NOMBRE DE LA CUENTA O ENCARGO FIDUCIARIO:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA

5.1.1.1. Estado de la cuenta bancaria

Para el período del presente informe la cuenta de ahorros No. 137553905 del banco BANCO DE BOGOTA se encuentra activa.

6 ASPECTOS AMBIENTALES

6.1 SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

Se informa que para la ejecución del proyecto se requirió tramitar el permiso de CONSECIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCES Y APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS por la resolución 700.36.25.0025 por CORPORINOQUIA "por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales, autorización de ocupación de cauces y aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones". Para uso industrial de caudal de 0.2306 L/s, a captar de la margen derecha aguas abajo del rio de Arauca, sector la curva, casco urbano del municipio de Arauca, departamento de Arauca para el desarrollo del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

6.2 SEGUIMIENTO AL PMA O PAGA

Esta interventoría en la presente parcial No.01 se realizó un ***INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MMA*** de acuerdo con el documento ambiental entregado por el ***DEPARTAMENTO DE ARAUCA*** a los contratistas de obra e interventoría externa, para la correcta ejecución del contrato de obra No. 439 de 2024, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VÍA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA". Se adjuntará en el presente informe.

6.3 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

De acuerdo al cuadro de costos del proyecto y *PMA/PAGA*, se deben implementar las siguientes actividades como medidas de mitigación o compensación ambiental:

Tabla 29. Presupuesto de la mitigación o control ambiental del contrato de obra No. 439 de 2024.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Puntos ecológicos de 55 litros y de tres canecas, con estructura metálica reforzada, debidamente instalada. Con separación según código de colores verde, negro, blanco. Para ser instaladas con concertación de la comunidad.	UND	5	$7.301.647,966	$36.508.239,830
2	Siembra de árboles de especies nativas sobre el área de influencia del proyecto (la siembra incluye la preparación del terreno con abono, encerramiento, pie de amigo o tutor y mantenimiento preventivo por tres meses).	UND	465	$107.338,000	$49.912.170,000
3	Sensibilización casa a casa, orientada al uso adecuado de redes sanitarias, separación en la fuente y	UND	250	$30,000.000	$7.500.000,000

	manejo de residuos sólidos. (contempla material didáctico)				
4	Siembra de plantas ornamentales (durantas e ixoras) de 45 cm de altas para embellecimiento paisajístico, en el área de influencia directa del proyecto.	UND	500	$16,000.000	$8.000.000,000
5	Bolsas Ecológicas en LONA MADRE SELVA, tamaño de 40 cm de alto por 60 cm de ancho con fuelle de 10 cm y estampado a 1 tinta 2 Cara, con logos de la Administración Departamental, como material de apoyo a sensibilización casa a casa.	UND	250	$20.000,000	$5.000.000,000
6	Caneca en acero inoxidable marca Barcelona grande M-121, en tubo redondo de 2" calibre 18. Debidamente instalada en el Área de Influencia Directa del proyecto.	UND	10	$1.660.000,000	$16.600.000,000
7	Diseño e Instalación de vallas en el Área de Influencia Directa del proyecto, con información de las especies de flora y fauna representativas del sector y mensaje de conservación y con logos de la Administración Departamental, tubos de 1" x 1" y ángulos, medidas de 200 cm de ancho por 100 cm de alto.	UND	6	$1.150.000,000	$6.900.000,000
VALOR TOTAL MITIGACION AMBIENTAL					$130.420.409,83

A la fecha del presente informe el contratista de obra CONSORCIO ARAUCA AVANZA, no ha implementado ninguna de las actividades descritas en el presupuesto del P.A.G.A.

7 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En la ciudad de Arauca, a los dos (02) día del mes de julio de 2025, se suscribió el **Acta de Suspensión No. 01** del contrato de interventoría No. 477 de 2024, así como el contrato de obra No. 439 de 2024. teniendo en cuenta la causa de esta suspensión es "la fuerte temporada invernal que se presenta en el municipio de Arauca y en la zona del proyecto" Por un plazo de treinta (30) días, tiempo durante el cual se espera que las condiciones climáticas mejoren en la zona del proyecto y una vez subsanadas las causas de la suspensión se reanuden las actividades contractuales.

Durante el mismo periodo del mes de julio se suscribió el **Acta de reinicio No. 01** del contrato interventoría No. 477 de 2024, así como el contrato de obra No. 439 de 2024. Una vez analizadas las causas que motivaron la Suspensión No. 01, el contratista de obra y la interventoría consideran que estas han sido superadas. En lo cual se reanudan las actividades contractuales.

Por parte de esta interventoría, se ha evidenciado por parte del contratista mayor rendimiento en la ejecución de los trabajos programados una vez superadas las causas que generaron el Acta de Suspensión No. 01 del contrato de obra 439 de 2024. La interventoría mediante reportes mensuales en el cual se llevará a cabo un seguimiento minucioso de la programación de obra vs la ejecución de las actividades para así realizar un control riguroso que permita el desarrollo del contrato dentro de los plazos establecidos.

A su vez, cabe aclarar que para el período actual de ejecución se registró un ola invernal en el departamento de Arauca, por lo cual también se han visto complicaciones en la ejecución de las actividades. Los días en los cuales se han registrado lluvias en la obra pueden ser constatados mediante las bitácoras de obra anexas la presente Acta parcial No.01.

8 CONCLUSIONES

La interventoría CONSORCIO INTER HORIZONTE a la fecha ha dado cumplimiento a cada una de las actividades descritas en el contrato de Consultoría (Interventoría) No. 477 del 2024, realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental al Contrato De Obra No. 439 del 2024 objeto de la interventoría.

Que el 01 de abril del 2025 se suscribió acta de inicio del Contrato De Obra No. 439 de 2024, suscrito entre el Departamento de Arauca y la firma contratista CONSORCIO ARAUCA AVANZA por valor de TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($13.539.631.160,19) y un plazo de ejecución total de SEIS (06) meses.

Esta Interventoría ha efectuado control de calidad de las obras ejecutadas por el contratista de obra, ejecutando los ensayos de laboratorio que la normativa exige y solicitando los protocolos de calidad para los materiales procesados como el acero de refuerzo, tubería corrugada de alcantarillado pluvial, cemento, geotextil, postes de concreto para redes eléctricas, entre otros.

El Contratista ha efectuado una correcta implementación del PAGA del proyecto, proceso al cual esta Interventoría ha efectuado el seguimiento correspondiente.

El contratista cuenta con los equipos y la infraestructura necesaria para asumir de manera adecuada el proceso constructivo actual y restante del proyecto, pero se deben tener los parámetros administrativos necesarios para la continuidad del proyecto.

Como conclusión final, y teniendo en cuenta el presente informe esta interventoría AVALA el pago de la presente acta parcial al contratista por valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (5.420.580.995,99) por cuanto ha dado cumplimiento a la ejecución del contrato de obra No. 439 del 2024, de acuerdo a las especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

9 ANEXOS

(Ver Anexo del Acta parcial No 1 del contrato de obra No. 439 de 2024).
(Ver anexo del Acta parcial No. 01 de informe de análisis de resultados de ensayos realizados por el contratista de obra del contrato No. 439 de 2024)

Aprobación del Informe:	
Elaboró: **JUAN DIEGO RINCON MEDRANO** *C.C. 1.090.469.003* *Director de Interventoría del CONSORCIO INTER HORIZONTE*	Aprobó: **JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ** C.C: 1.116.775.612 Representante legal del CONSORCIO INTER HORIZONTE
