	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	7/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	31/07/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	18/06/2025	**AL:**	31/07/2025
CONTRATO Nº	005-00COFAC-DIFRA-2025	**CONTRATISTA**	VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO				
FECHA DE INICIO	18/06/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	20/08/2025		

VALOR INICIAL	$ 1.351.286.169,59	**VALOR ADICIONAL**		**VALOR REDUCCION (Si aplica)**		**VALOR TOTAL**	$ 1.351.286.169,59

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 28 DE MAYO DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 02 DE JULIO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS , LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN ES EL INICIO DE LA FASE DE DEMOLICIÓN , LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN SON LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA SOLICITUD DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRAFICO PMT, SOLICITUD DE PIN AMBIENTAL, ELABORACION DE ACTAS DE VECNIDAD Y SOLICITUD DE VISITA IDU PARA OBRAS DE URBANISMO SOBRE EL ANDEN DE LA AK 58, ESQUINA DE LA AK 60 CON AV AMERICAS (ISLETA) Y ESQUINA DE LA AK 60 CON AV AMERICAS (POMPEYANO)

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				retroexcavadora	1	Director de Obra	1	50	50	SI	
				Minicargador	1	Residente de Obra	1	100	100	SI	
				compactador	1	Residente SST	1	100	100	SI	
						Residente Ambiental	1	100	100	SI	
						Auxiliar Administrativo	1	100	100	SI	
						Ayudante de Obra	1	100	100	SI	
						TOTAL	6				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (jul 02)	2,65%	**15,23%**	**16,62%**	**-1,39%**
Semana 2 (jul 09)	4,99%			
Semana 3 (jul 17)	3,25%			
Semana 4 (jul 22)	4,34%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO






























GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		90,00%
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		75,00%
	EJECUTADO		0,00%
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		17,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		4,00%
	EJECUTADO		0,00%

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		13,00%
	EJECUTADO		0,00%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO		67,00%
	EJECUTADO		100,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
2	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
3	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
4	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
8	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

17	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
21	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
24	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
25	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
27	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
28	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
29	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
30	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	64	44	20

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades ejecutadas durante el periodo del 18 al 30 de junio de 2025 correspondieron a trámites administrativos de cada componente (verificación de a información entregada por la entidad, afiliaciones del personal, implementación del PMT y trámites ante entidades públicas para dar inicio con el desarrollo de la obra.
En el mes de julio de 2025 se realizaron actividades correspondientes a: Se suscribe acta de inicio con fecha 18 de junio de 2025.
Se realizan tramites administrativos de perfeccionamiento del contrato de Obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA
Se solicita y aprueba e implementa PMT para entrada y salida de volquetas de la calle 13
Se solicita PMT de urbanismo para intervención e obras de espacio publico (Isleta Pompeyano)- en espera de aprobación.
Se realiza solicitud de visita IDU para revisión preliminar de las obras contractuales de urbanismo.
En materia ambiental se obtiene PIN Ambiental para el proyecto.
Se realiza cerramiento de fachada costado norte y sur.
Se implementa campamento temporal de obra.
Se da inicio a al fase de demolición del bloque de dos pisos y desmonte de cubierta del bloque de 3 pisos.
Se realiza demolición de muros y losa del bloque de dos pisos.
Se realiza desmonte de estructura de cubierta y cubierta del bloque de 3 pisos
Se inicia demolición de muros de bodega de 3 pisos
Se inicia retiro de cimientos del bloque de dos pisos
Se implementa campamento de obra.
Se retiran cimientos del bloque de dos pisos
Se realiza demolición de muros de bodega de 3 pisos
Se inicia retiro de cimientos de bodega de 3 pisos
Se realiza cargue y retiro de material proveniente de demolición a sitios autorizados.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
El proyecto presenta un atraso correspondiente al -8,89% debido a que sigue pendiente la visita por parte del IDU, situación externa que afecta la programación de obra.	SI		NO	
	SI		NO	X
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1.351.286.169,59	$ 1.351.286.169,59	$ 205.800.883,63	15,23%	$ 1.145.485.285,96	85%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 1.351.286.169,59	$ 1.351.286.169,59				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA			SI		SI	
Ejemplo: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			SI		SI	
Ejemplo: ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS			SI		SI	
Ejemplo: VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			SI		SI	
Ejemplo: ACTAS DE VECINDAD			SI		SI	
Ejemplo: DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA			SI		SI	Se entregaron en original a la FAC
Ejemplo: PLAN DE CALIDAD			SI		SI	
Ejemplo: PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS			SI		SI	
Ejemplo: REVISION PRELIMINAR PROYECTO			SI		SI	
Ejemplo: VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS			SI		SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha del presente informe está pendiente por parte de la entidad el envio de los ajustes en diseños para dar continuidad con las actividades programadas .
Pendiente aprobación por pate de la entidad la solicitud de prórroga del contrato.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Durante el periodo del mes de Julio 2025 en donde se iniciaron las actividades en campo el tiempo en general fue seco con un promedio de 8 horas de lluvias durante todo el mes.

REVISO:

Residente de ObrA/ Firma y Posfirma

ELABORO:

ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH- SUPERVISOR
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)



Implementación PMT.



Ingreso de retroexcavadora.



Retiro de cerchas cubierta.



Desmonte de carpintería metálca.



Demolición mampostería bodega.



Demolición muros internos bodega.



Demolición bodega de 3 pisos.



Retiro de escombros demolición.



Demolición muros bodega.



Demolición cimientos bloque de dos pisos.



Demolición muros bodega.



Demolición pañete muro convida.

			
Retiro de cimientos bodega de 3 pisos.	Finalización demolición bodega	Demolición de sobrepiso antigua bodega.	Equipo en obra para iniciar excaación mecánica.
			
Inicio de excavación mecánica	Avance de excavación Tramo 1.	Cargue de volquets material excavado	Limpieza de sumideros existente sobre carrera 13.
			
Verificación comisión topográfica.	Descripción concreta de la actividad	Descripción concreta de la actividad	Descripción concreta de la actividad

LIBRO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025.

OBJETO: OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ENTIDAD CONTRATANTE:

CONTRATISTA: VERTICAL DISEÑO SAS - EN REORGANIZACIÓN

FECHA DE INICIO: JUNIO 19 DE 2025.

Powered by CamScanner

NOTA 1

JUNIO 19 DE 2025.

→ Se suscribe acta de inicio del contrato de Obra # 005-00/Δ -COFDC - DIFRO - 2025.

FIRMA CONTRATISTA. D.Obra. FIRMA SUPERVISIÓN.

NOTA 2

JUNIO 19 DE 2025.

→ Se da inicio a los trámites administrativos. (PMT - Entrada y Salida de vehículos) - (Ambiental).

→ Se realiza recorrido inicial de Obra

→ Se implementa campamento de Obra (Temporal).

FIRMA CONTRATISTA. D.Obra FIRMA SUPERVISIÓN.

NOTA 3

JUNIO 20 DE 2025

→ Continúan trámites administrativos.

FIRMA CONTRATISTA. D.Obra FIRMA SUPERVISIÓN

NOTA 4.

JUNIO 24 DE 2025

→ Continúan trámites administrativos.

FIRMA CONTRATISTA D.Obra. FIRMA SUPERVISIÓN.

NOTA 5

JUNIO 25 DE 2025.

→ Continúan trámites administrativos.

FIRMA CONTRATISTA D.Obra. FIRMA SUPERVISIÓN.

NOTA 6

JUNIO 26 DE 2025

→ Continúan trámites administrativos.

FIRMA CONTRATISTA D.Obra. FIRMA SUPERVISIÓN.

Powered by CamScanner

NOTA 7

Junio 27 de 2025.

→ Continúan trámite administrativos

→ Se aprueba PMT - Entrada y Salida de Volquetas CO1 No. 26

→ Se aprueba PIN Ambiental No. 27336

Firma Contratista D. Obra. Firma Supervisi

NOTA 8

Junio 28 de 2025.

→ Continúan trámite administrativos.

· Se realiza cerramiento en fachada posterior de Bodega - conjunto al Batallón de Sanidad ARC-FAC

· Se realiza provisional electrica de Obra.

· Se inicia desmonte de cubierta, marcos y ventanas del Blq de dos pisos.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA
  1 RESIDENTE SST
  1 ENCARGADO DEMOLICIONES
  2 AYUDANTES DEMOLICIONES.
  1 OFICIAL CERRAMIENTO
  1 AYUDANTE CERRAMIENTO
  1 OFICIAL ELÉCTRICO
  1 AYUDANTE ELÉCTRICO.
- CLIMA: NUBLADO (LLUVIAS 10:30AM - 11:15AM)
- JORNADA: 7AM - 6PM.

Firma Contratista D. Obra. Firma Supervisi

NOTA 9

Junio 05 de 2025

→ Continúa trámite administrativo

→ Continúan actividades de desmonte del Bloque de dos Pisos.

- PERSONAL: 1 DIRECTOR DE OBRA
  1 RESIDENTE DE OBRA
  1 COORDINADOR SST
  1 ENCARGADO DEMOLICIÓN

2 AYUDANTES DE DEMOLICIÓN
1 OP. EXCAVADORA (DEMOLICIÓN)
- CLIMA: NUBLADO (LLUVIAS 7AM - 9AM.)
- JORNADA: 7AM - 5PM.

FIRMA CONTRATISTA D. Obra.

NOTA 10
Julio 2 DE 2025
→ Continúan trámites administrativos
→ Continúa desmonte de cubierta, ventanas, marcos de puerta de bloque de 2 pisos.
→ Llegada de material para cerramiento frontal.
- PERSONAL: 1 DIRECTOR DE OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 COORDINADOR SST
1 ENCARGADO DEMOLICIÓN.
3 AYUDANTES DE DEMOLICIÓN.
1 OP. EXCAVADORA (DEMOLICIÓN).
- CLIMA: Nublado (LLUVIAS - 3PM - 6PM).
- JORNADA: 7AM - 5PM.

FIRMA CONTRATISTA D. Obra. FIRMA SUPERVISIÓN

NOTA 11
JULIO 3 DE 2025
→ Continúa desmonte de cubierta, ventanas, marcos de puerta de bloque de dos pisos
→ Inicia instalación de cerramiento frontal
→ Inicia desmonte de cubierta de bodega 3 pisos
- PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE SST
1 RESIDENTE AMBIENTAL
1 ENCARGADO DEMOLICIÓN.
3 AYUDANTES DEMOLICIÓN.
1 OP. RETROEXCAVADORA. (DEMOLICIÓN)

Powered by CamScanner

1 OFICIAL
1 AYUDANTE
- CLIMA: Nublado (Lluvia 8-30AM : 11:00AM)
Lluvia 1:30PM : 1:50PM)
Lluvia 3:10PM : 3:00PM).
- JORNADA: 7AM - 5PM.

FIRMA CONTRATISTA D'Obra. FIRMA SUPERVISOR

NOTA 12 Julio 04 de 2025.
→ Continua desmonte de cortinas, marcos de puerta, estructura de cubierta y cubierta de Bloque de 2 Piso.
→ Continua instalación de cerramiento frontal sobre c/13.
→ Continua desmonte de teja de Bloque de 3 piso.
→ PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE SST
1 RESIDENTE AMBIENTAL
1 AUX ADMINISTRATIVO.
1 AYUDANTE ADMON
1 ENCARGADO DE ALMACEN
5 AYUDANTES
1 OP EXCAVADORA (DEMOLICIÓN).
1 OFICIAL CERRAMIENTO
1 AYUDANTE CERRAMIENTO.
- CLIMA Nublado
- JORNADA 7AM - 5PM.

FIRMA CONTRATISTA D. Obra. FIRMA SUPERVISOR

NOTA 13 Julio 07 de 2025
→ Continua demolición de muro y estructura de bloque de 2 piso
→ Se implementa campamento de Obra en fachada principal
→ PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

1 RESIDENTE AMBIENTAL
1 AUX ADMON
1 AYUDANTE ADMON
1 ENCARGADO DE DEMOLICIÓN
5 AYUDANTES
1 OPERARIO EXCAVADORA (DEMOLICIÓN).

- CLIMA: NUBLADO
- JORNADA: 7AM - 5PM

FIRMA CONTRATISTA — D.Obra — FIRMA SUPERVISIÓN

NOTA 14 JULIO 08 DE 2025

- Continúa demolición Bloque 2 Piso.
- Continúa desmonte de cubierta Bloque 3 Piso.
- PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE SST
1 RESIDENTE AMBIENTAL
1 AUX ADMON
1 AYUDANTE ADMON
1 ENCARGADO DE DEMOLICIÓN.
5 AYUDANTES DE DEMOLICIÓN.
1 OPERARIO EXCAVADORA (DEMOLICIÓN).
- CLIMA: Nublado (Lluvia 9:30AM - 9:45AM
1:45PM - 2:15PM
2:30PM - 3:00PM)
- JORNADA: 7AM - 5PM.

FIRMA CONTRATISTA — D.Obra — FIRMA SUPERVISIÓN.

NOTA 15 JULIO 9 DE 2025.

→ Continúa demolición Bloque 2 Piso.
→ Continúa desmonte de cubierta Bloque 3 Piso.
- PERSONAL: 1 DIRECTOR OBRA
1 RESIDENTE OBRA.

Powered by CamScanner

1 RESIDENTE AMBIENTAL
1 RESIDENTE SST
1 AUX ADMON
1 AYUDANTE ADMON
1 ENCARGADO DE DEMOLICI.
5 AYUDANTES DE DEMOLICI
1 OP. EXCAVADORA DEMOLICI

- CLIMA: Nublado (LLUVIA 9AM - 9:20AM)
- JORNADA: 7AM - 5PM

Firma CONTRATISTA D. Obra. FIRMA SUPERVISI

NOTA 16 Julio 10 DE 2025

- Continua demolici Etapa 2 Pav
→ Se realiza demonte de Cerchas y Estructura de cubierta para bloque de 3 Pis.
→ Retiro de Escombros!
→ PERSONAL: 1 DIRECTOR DE OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE AMBIENTAL
1 RESIDENTE SST
1 AUX ADMON
1 AYUDANTE ADMON
1 ENCARGADO DE DEMOLICI
5 AYUDANTES DE DEMOLICI
1 OP. EXCAVADORA DEMOLICI
→ CLIMA: Nublado
→ JORNADA: 7AM - 5PM

Firma CONTRATISTA. D. Obra. FIRMA SUPERVISI

NOTA 17 Julio 11 DE 2025

- Se realiza cargue y retiro de escombro.
- PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

1 RESIDENTE AMBIENTAL
1 RESIDENTE SST.
1 AUX ADMON
1 AYUDANTE ADMON
1 ENCARGADO DE DEMOLICIÓN
5 AYUDANTES DE DEMOLICIÓN
1 OP. EXCAVADORA (DEMOLICIÓN).

→ CLIMA: Nublado.
→ JORNADA: 7AM - 5PM.

FIRMA CONTRATISTA

NOTA 13 JUEVES 14 de 2025.

FIRMA SUPERVISOR.

Nota Asiste a obra 15 de Julio 2025

ST Velásquez Torres Mateo.
ARQ. MAURICIO ALBERTO UBEDA LOPEZ
ST. Avendaño Fonseca William David
CT Mateus Guerrero Samanta
MY CASTILLA RODRIGUEZ WILDER BRENEY

→ El personal anteriormente mencionado realiza recorrido en obra para revisar la losa de contrapiso de la Bodega de 3 niveles y evaluar la alternativa de conservar dicha estructura; la cual está compuesta por una losa de concreto de espesor 20cm, refuerzo doble en malla electrosoldada de Ø 6.5mm; sin embargo no se pudo observar el estado actual de la losa por la etapa de demolición de muros; por lo que se reprograma la visita para final de la presente semana, con el fin de encontrar el espacio sin escombro y poder evaluar la alternativa.
→ Se revisan planos y se realizan observaciones de los diseñadores del proyecto (Ver acta de reunión del 15 de Julio).

Powered by CamScanner

NOTA 19 - El día 15 de Julio se realiza demolición de muro fachada posterior de la Bodega de 3 niveles.

- PERSONAL: 1 Residente de Obra
1 Residente Ambiental
1 Residente SST
1 Aux Admon
1 Ayudante admon
1 Encargado de Demoliciones.
5 Ayudantes de Demoliciones
1 Op. Excavadora
- CLIMA: Nublado - (Lluvias 8:30am - 8:50am)
- JORNADA: 7AM - 5PM.

Firma Contratista | Director Obra | Firma Supervisión.

NOTA 20 Julio 16 DE 2025.

→ Se realiza demolición de muro occidental de Bodega 3 piso

→ Se realiza demolición de muro en bloque sobre costado Sur

PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE AMBIENTAL
1 RESIDENTE SST
1 AUX ADMON
1 AYUDANTE ADMON
1 ENCARGADO DE DEMOLICIÓN.
5 AYUDANTES DE DEMOLICIÓN
1 OP. RETRO EXCAVADORA (Demolición)

- CLIMA: Nublado
- JORNADA: 7AM - 5PM.

FIRMA CONTRATISTA | D. Obra. | FIRMA SUPERVISIÓN

NOTA 21

Julio 17 DE 2025.

+ Se realiza cargue y retiro de material producto de excavación.

→ Se realiza visita por parte de la Entidad contratante siendo las 11:00 hrs, se presentan en obra el Coronel Soto y ST Hebert Perez Supervisor del contrato de Obra # 035-00-COTOC-DIFRA-2025. En el cual se revisa el estado actual de la losa de contrapiso de la Bodega de 3 Pisos y se solicita por parte de la Entidad Realizar un sondeo para evaluar la Alternativa que plantea el contratista VERTICAL DISEÑOS SAS de Disminuir la Estructura de pavimento de -1.05m a +0.70m; con el fin de Obtener el CBR y revisar con el equipo de Diseño Vial de la Entidad la posibilidad de disminuir la Estructura del pavimento.

- La Ing. Sandra Valdiva Especialista en Pavimentos de la Empresa VERTICAL DISEÑOS SAS; indica que la losa existente no está diseñada para soportar cargas dinámicas y que a futuro si se decide mantener la losa de contrapiso pueden generar Alveos, por la falta de Juntas de transferencia de los pavimentos rígidos.

→ La Entidad solicita realizar un Balance financiero; para evaluar la alternativa de disminución de estructura de pavimento.

- PERSONAL: 1 DIRECTOR DE OBRA
  1 ESP. PAVIMENTOS
  1 RESIDENTE DE OBRA
  1 RESIDENTE SST
  1 RESIDENTE AMBIENTAL
  1 ENCARGADO DE DEMOLICIÓN.
  5 AYUDANTES DE DEMOLICIÓN.
  1 OP. EXCAVADORA.
- CLIMA: Soleado
- JORNADA: 7AM - 5PM.

FIRMA CONTRATISTA D. Obra. FIRMA SUPERVISIÓN.

NOTA 22 Julio 18 DE 2025

→ Se realiza retiro de material producto de demolición
→ Continúa demolición de cimientos, bloque de Dx pvcs.
- PERSONAL: 1 Residente SST.
  1 Residente de Obra
  1 Residente Ambiental
  1 Encargado de Demolición.
  3 Ayudantes de Demolición.
  1 Op. Excavadora
- CLIMA: Nublado.
- JORNADA: 7AM - 5PM

FIRMA CONTRATISTA D. Obra. FIRMA SUPERVISIÓN.

Powered by CamScanner

NOTA 23 JUEVO 21 DE 2025.

→ Se realiza retiro de material proveniente de demolición.

→ Se retira la totalidad de cimientos de bloque de 2 pisos.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA
  1 RESIDENTE SST
  1 RESIDENTE AMBIENTAL
  1 ENCARGADO DE DEMOLICIÓN.
  3 AYUDANTES DE DEMOLICIÓN.
  1 OP. EXCAVADORA.
- CLIMA: Nublado (Lluvia 3:45pm - 4:30pm)
- JORNADA: 7AM - 4PM.

FIRMA CONTRATISTA D. Obra. FIRMA SUPERVISOR

NOTA 24 JUEVO 22 DE 2025.

→ Inicia demolición de Losa de contrapiso Bodega 3 pisos.

→ PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA
  1 RESIDENTE SST
  1 RESIDENTE AMBIENTAL
  1 ENCARGADO DE DEMOLICIÓN
  2 AYUDANTES DE DEMOLICIÓN.
  1 OP. EXCAVADORA.

- CLIMA: Nublado (Lluvia 9:30AM - 10:30AM; 2:25PM - 3:45PM)
- JORNADA: 7AM - 5PM.

FIRMA CONTRATISTA D. Obra. FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

NOTA 25 Jueves 23 DE 2025

→ Continua demolición de losa de contrapiso
→ Se realiza retiro de material producto de demolición.

- PERSONAL: 1 DIRECTOR DE OBRA
  1 RESIDENTE SST
  1 RESIDENTE DE OBRA
  1 RESIDENTE AMBIENTAL
  1 AUX ADMON
  1 AYUDANTE ADMON
  1 ENCARGADO DE DEMOLICIONES
  2 AYUDANTES DE DEMOLICIONES
  1 OPERADOR DE EXCAVADORA.
- CLIMA: Nublado
- JORNADA: 7am - 5pm

Firma Contratista Vo.Bo. D. Obra.

NOTA 26 Jueves 24 DE 2025

→ Finaliza demolición de losa de contrapiso
→ Inicia demolición de sobrepiso de antigua bodega de 3 Niveles
→ Se suscribe acta de reunión #4, Entre Representante de comisión IPS y Residente de Obra debido a la red de Descarga de A.R sobre predio de la FOC; (ver acta de compromisos) se solicita suspender las labores temporalmente.

- PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA
  1 RESIDENTE SST
  1 RESIDENTE AMBIENTAL
  1 AUX ADMON
  1 AYUDANTE ADMON
  1 OP. EXCAVADORA
  2 AYUDANTES

- CLIMA: Nublado (11:00am 4:30pm - 5:10pm).
- JORNADA: 7am-5pm

FIRMA CONTRATISTA D.Obra. FIRMA SUPERVISOR.

NOTA 27 Julio 25 de 2025

- Continua retiro de cimentación de Bodega de 3 pisos
- Se realiza carga y retiro de material producto de Demolición.
- PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA
  1 RESIDENTE SST
  1 RESIDENTE AMBIENTAL
  1 AUX ADMON
  1 AYUDANTE ADMON
  1 OP. EXCAVADORA
  1 ENCARGADO DE DEMOLICIONES
  2 AYUDANTES
- CLIMA: Nublado
- JORNADA: 7AM - 5PM

FIRMA CONTRATISTA D.Obra. FIRMA SUPERVISOR.

Nota 28 Julio 28 de 2025.

* Personal de Obra: 1 Director de Obra.
  1 Residente SST
  1 Residente Ambiental
  1 Auxiliar Admon.
  1 Op. Excavadora.
  3 Demolición.
* Clima: Nublado, Lloviznа ligera
* Se realiza corte y retiro de viga de cimentación sobre costado de Carrera de muro divisorio que estaba aledaño a la bodega.

Retiramos el estado en que se encuentra el muro, evidencia un deterioro notorio dado el empotramiento de cajas electricas y sistema sanitario. Se informará a la FAC y a Convida.

Director Obra.


NOTA 29

Julio 29 de 2025

Asistentes: Teniente supervisor: ST. Perez Guerrero
Especialista Estructural FAC: ST. William Avendaño
Especialista Hidrosanitario FAC: ST. Mateus Guerrero

Temas Tratados: Respecto al muro lateral convida la batería sanitaria que desagua contra el lote del proyecto se tapara y se remitira oficio a la gobernación y a la FAC informando estado actual y situación en que se encuentra dicho muro.

Estructural: El diseñador informa que se mantiene el diseño planteado para la cimentación de muros laterales contra vecinos de convida y mabe:

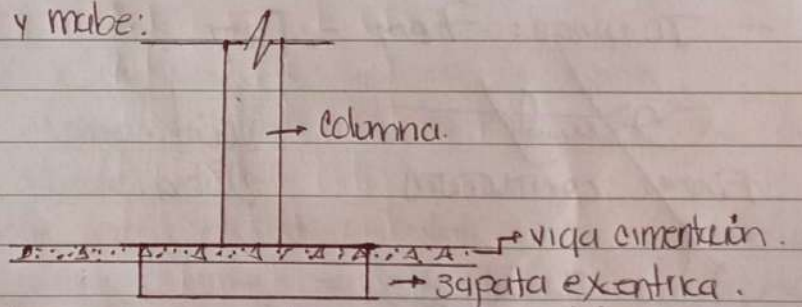

El constructor informa a la FAC que se debe reforzar el muro de cerramiento puesto que el empuje pasivo que puede tener el parqueadero por la pendiente que se va a emplear. Se sugiere revisar alternativa de contención como pata de elefante o zarpa.

Hidrosanitario: La ingeniera especialista informa que se manejará pendiente para el parqueadero del 1% y remitira plano de detalle para recolectar agua lluvia contra cañuela existente de sanidad.

El contratista informa que se regolere con urgencia toda la información para proceder con la construcción definida en los diseños, con el fin de no incurrir en atrasos de la programación.

PERSONAL: 1. Director de obra
1. Ingeniera obra
1. Residente SST
1. Residente Ambiental
1. Auxiliar Admón
1. Ayudante Admón

- Clima: soleado/ lluvia fuerte 4:30 pm.
- Jornada: 7 am - 5 pm.

El día de hoy ingresa a obra compactador caterpillar de 2500kg y miniexcavadora oruga 5700kg.

* El Teniente Perez en reunión en Obra, expresó lo siguiente:
- Entrega de parámetros informe mensual: Ambiental, SST y técnico cuya remisión se hará el 4 de cada mes.
- Informa que habrá cambio de Supervisor a partir del 9 de Agosto. lo reemplazará Mayo. Capitan Rodriguez.
- los Ajustes al Diseño serán remitidos mañana 30 de Julio, sobre el medio día.
- Compromisos para la semana: Guías por parte del Contratista el Informe Mensual junto con los anexos; Gestionar el modificatorio para la prórroga.

Desde la Dirección de Obra se remite por correo:
1) Radicado de la Información remitida a Concesión para tratar muro y derrocabe.
2) Solicitud de prórroga No 1.
3) Solicitud para entrega de Diseños definitivos y finales.

Director Obra.

Hoja 30. Julio 30 de 2025. clima: soleado Jornada 7am-5pm
Personal: 1. Director de obra
1. Ingeniera Obra.
1. Residente SST

1. Residente Ambiental
1. Auxiliar Admón
1. Ayudante Admón
2. Operadores de maquinaña.
1. Encargado de excavaciones.

El día de hoy el contratista cuenta con maquinaña y pasonal para dar inicio con la actividad de excavación sin embargo no se puede iniciar debido a que la FAC no ha entregado el ajuste en diseños.

Ingeniera Firma Supervisión.

Julio 31/25

NOTA 31. El día de hoy asiste a obra comisión topográfica de la FAC Juan Herrera y Marcela Díaz quienes hacen verificación en campo de dimensiones y coordenadas de la obra y se verificó la información entre las partes la cual concuerda con el primer levantamiento realizado por la FAC. T2 Díaz Marcela. T3 Herrera J.

PERSONAL:
1. Director de Obra
1. Ingeniero de Obra
1 Residente SST
1. Residente Ambiental
1. Auxiliar Admón.
1. Ayudante Admón
2. Operadores de maquinaña
1 Oficial
1 Topografo
1 Cadenero.

El contratista una vez se verifica levantamiento da inicio con la demarcación de niveles para posterior inicio de excavación mecánica.

clima: soleado


Jornada 7 am - 5 pm.

Ingeniera

Powered by CamScanner

Quita marcas de agua
Wondershar PDFelement

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	FRENTE de obra
0		**Programación de Obra V1**	**42 días**	**mié 18/06/25**	**mié 20/08/25**	
1	**0**	**TRAMITES ADMINISTRATIVOS**	**17 días**	**mié 18/06/25**	**lun 14/07/25**	
2	0	*ACTA DE INICIO*	0 días	mié 18/06/25	mié 18/06/25	
3	**0**	**PMT FRENTES DE OBRA 1 y 2 - Entrada y Salida de Volquetas**	**9 días**	**mié 18/06/25**	**mié 2/07/25**	
4	0	Radicación	0 días	mié 18/06/25	mié 18/06/25	
5	0	Aprobación	9 días	mié 18/06/25	mié 2/07/25	
6	**0**	**PMT FRENTES DE OBRA 3-5 - Urbanismo**	**15 días**	**jue 19/06/25**	**vie 11/07/25**	
7	0	Radicación	0 días	jue 19/06/25	jue 19/06/25	
8	0	Aprobación	15 días	jue 19/06/25	vie 11/07/25	
9	**0**	**VISITA IDU**	**17 días**	**mié 18/06/25**	**lun 14/07/25**	
10	0	Solicitud de visita	0 días	mié 18/06/25	mié 18/06/25	
11	0	Visita y Definición IDU	17 días	mié 18/06/25	lun 14/07/25	
12	0	**ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD**	7 días	vie 20/06/25	mié 2/07/25	
13	**1**	**PRELIMINARES**	**21 días**	**jue 3/07/25**	**jue 31/07/25**	
14	1.1	CAMPAMENTO DE 36 M2	2 días	jue 17/07/25	vie 18/07/25	FRENTE 1/ De
15	1.2	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 015 INCLUYE RETIRO	3 días	mar 29/07/25	jue 31/07/25	FRENTE 1/ Demolición
16	1.3	DEMOLICION TOTAL EDIFICACIONES ALTURA 5,50 A 6,00 2 PISOS O MAS CON MAQUINARIA INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO	10 días	jue 3/07/25	mié 16/07/25	FRENTE 1/ Demolición 1a FASE
17	1.4	DEMOLICION TOTAL EDIFICACIONES ALTURA 6,01 A 8,00 3 PISOS O MAS CON MAQUINARIA INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO	10 días	jue 10/07/25	mié 23/07/25	FRENTE 1/ Demolición 2 FASE
18	1.5	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	3 días	jue 24/07/25	lun 28/07/25	FRENTE 1/ Demolición 2 FASE
19	**2**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**7 días**	**jue 24/07/25**	**vie 1/08/25**	
20	2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	2 días	jue 31/07/25	vie 1/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
21	2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	2 días	jue 24/07/25	vie 25/07/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
22	**3**	**CIMENTACION**	**15 días**	**lun 28/07/25**	**mar 19/08/25**	
23	3.1	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	2 días	lun 4/08/25	mar 5/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
24	3.1	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	2 días	lun 28/07/25	mar 29/07/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
25	3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	2 días	lun 4/08/25	mar 5/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
26	3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
27	3.3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	2 días	mié 6/08/25	vie 8/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
28	3.3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	1 día	vie 1/08/25	vie 1/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
29	3.4	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	2 días	lun 11/08/25	mar 12/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
30	3.4	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	3 días	mar 5/08/25	vie 8/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
31	3.5	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	2 días	mié 13/08/25	jue 14/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
32	3.5	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	2 días	lun 11/08/25	mar 12/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
33	3.6	JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE COLUMNAS, MUROS O ELEMENTOS VERTICALES TIPO SIKAFLEX-ICOPOR O SIMILAR (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS)	3 días	jue 14/08/25	mar 19/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
34	3.6	JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE COLUMNAS, MUROS O ELEMENTOS VERTICALES TIPO SIKAFLEX-ICOPOR O SIMILAR (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS)	1 día	mar 12/08/25	mar 12/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
35	**4**	**ESTRUCTURA**	**10 días**	**lun 4/08/25**	**mar 19/08/25**	
36	4.1	COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	2 días	vie 15/08/25	mar 19/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
37	4.1	COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	2 días	lun 11/08/25	mar 12/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
38	4.2	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	2 días	vie 8/08/25	lun 11/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
39	4.2	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	3 días	lun 4/08/25	mié 6/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
40	**5**	**MAMPOSTERIA**	**12 días**	**jue 31/07/25**	**mar 19/08/25**	
41	5.1	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=025. (INCLUYE REFUERZO)	6 días	vie 8/08/25	vie 15/08/25	FRENTE 2/Muro
42	5.2	MURO EN LADRILLO GRAN FORMATO TERRACOTA 39X11,5X5 INCLUYE ACERO DE REFUERZO MORTERO RELLENO DE DOVELAS PEGA Y ANCLAJES .	3 días	mié 13/08/25	vie 15/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
43	5.3	ALFAIIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI - (20 X 5) PARA MURO DE 12 CM	12 días	jue 31/07/25	mar 19/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque

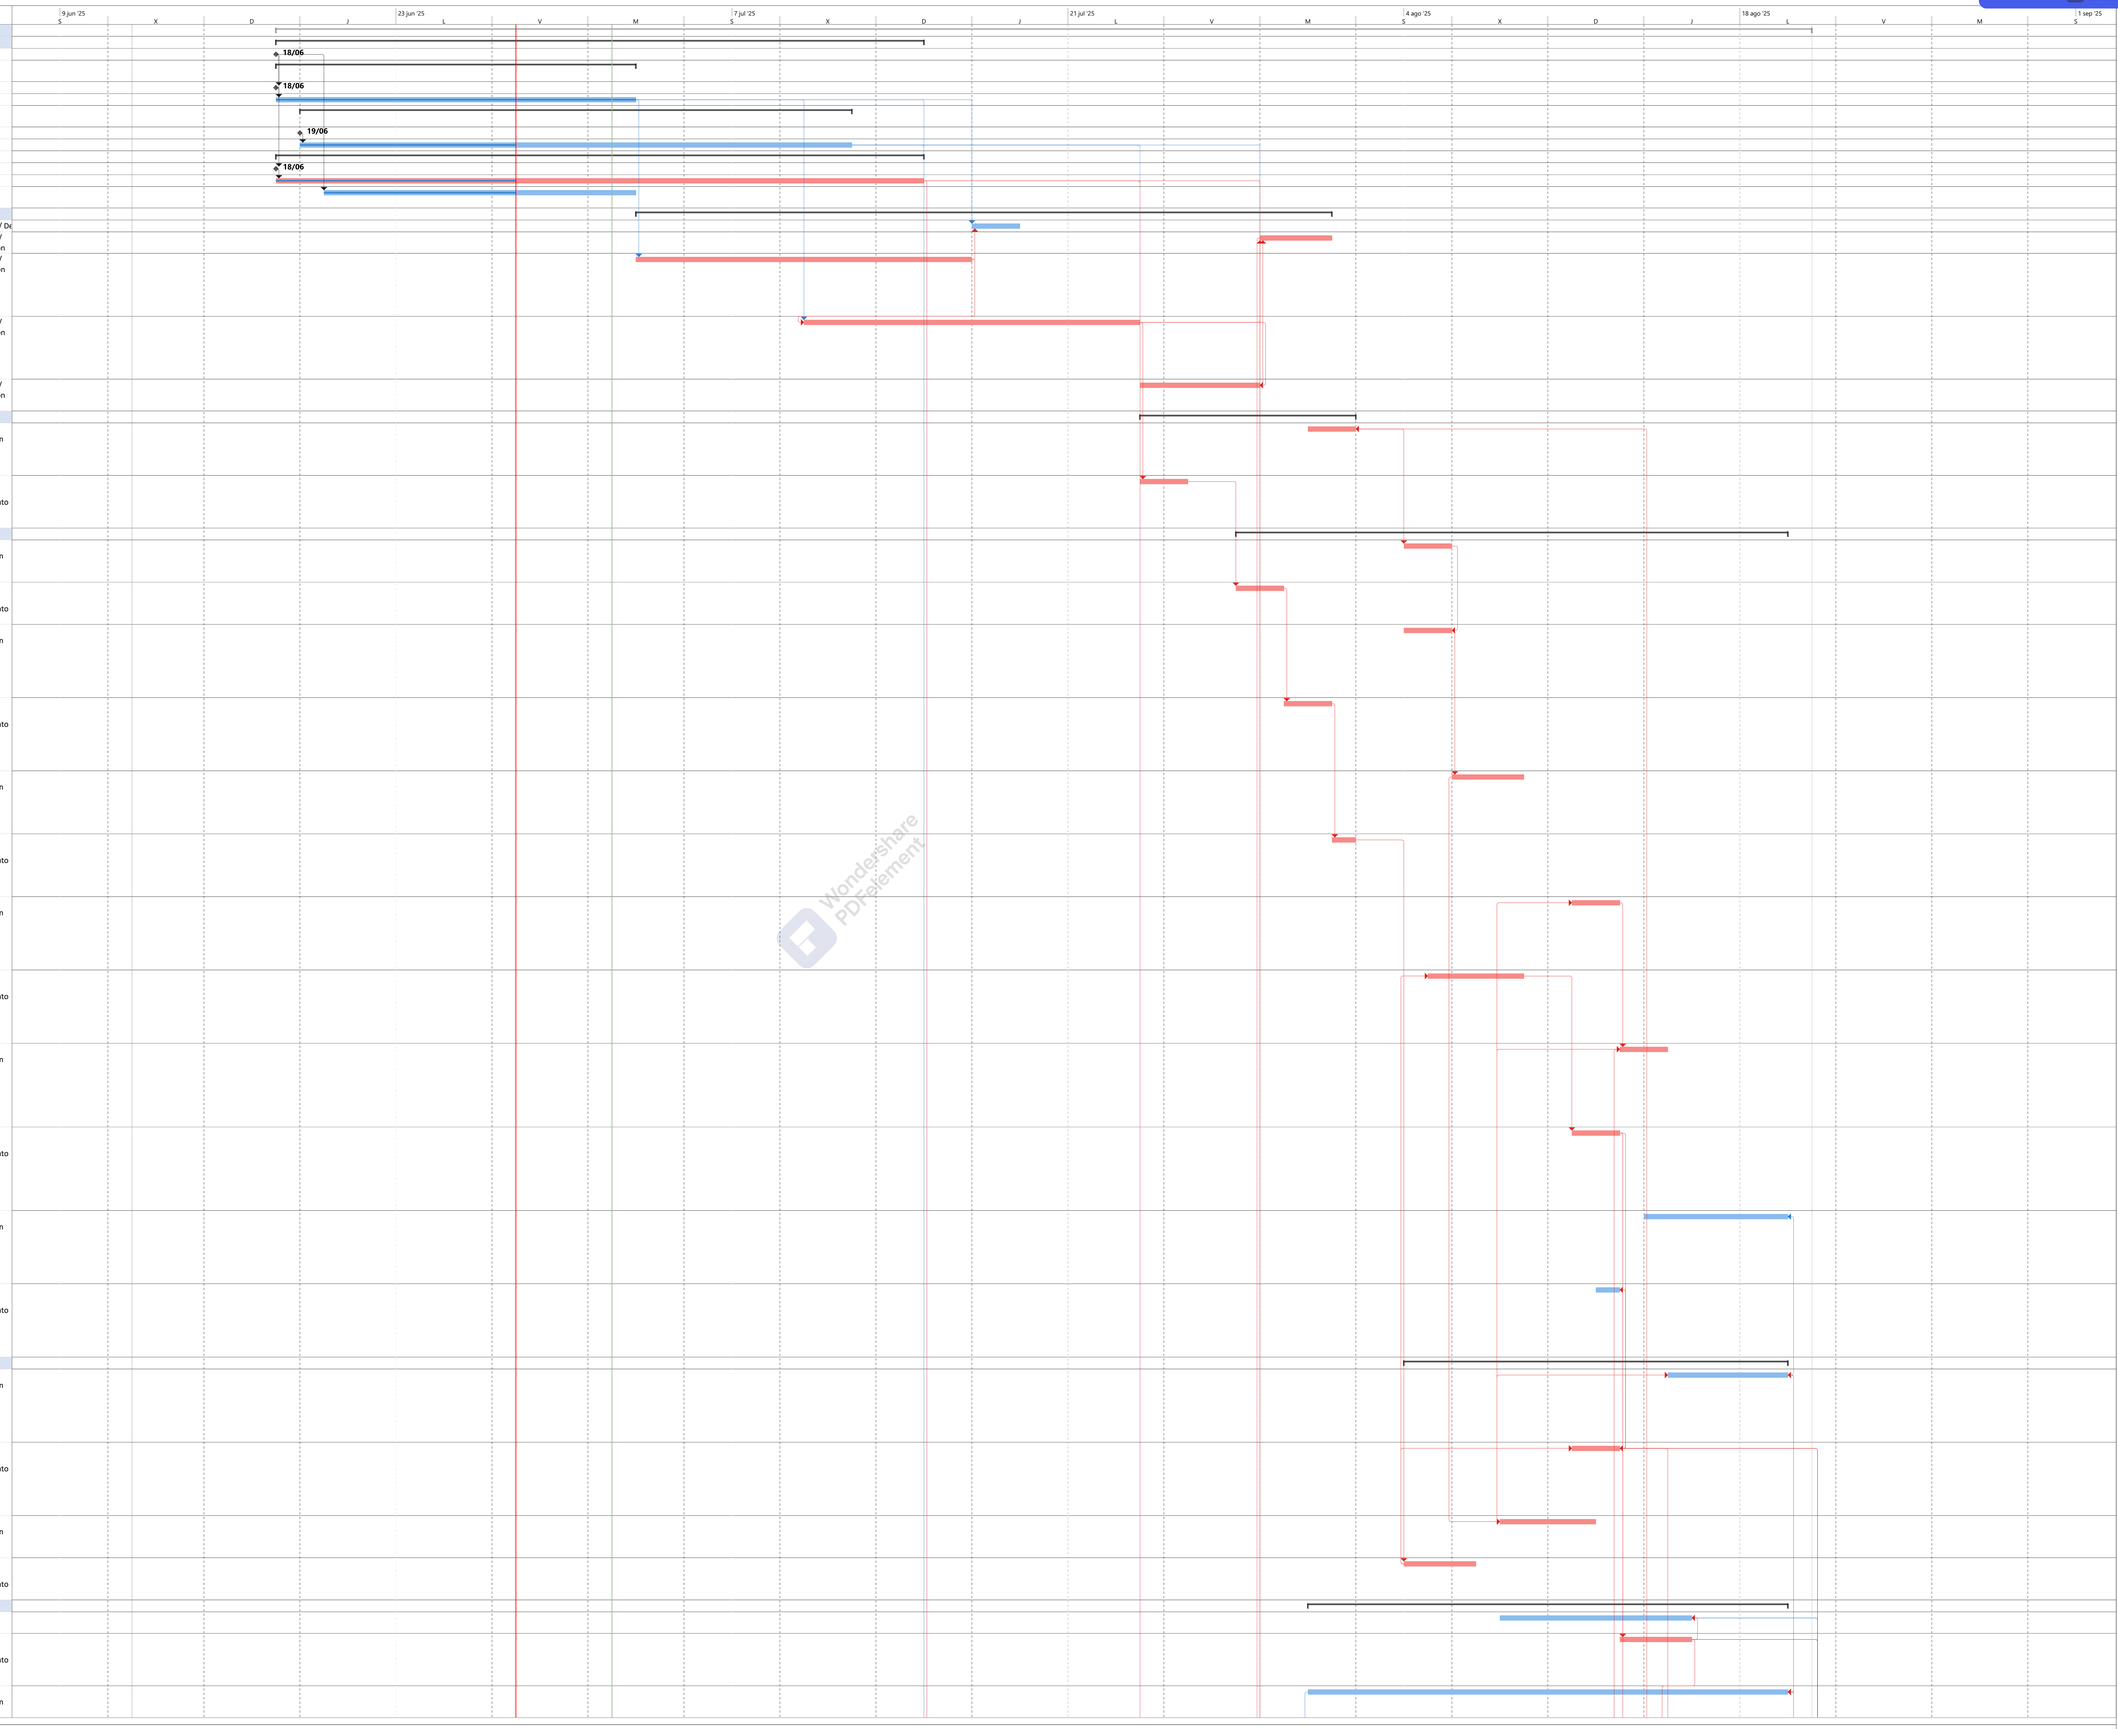


Wondershare PDFelement

Proyecto: Programación de Ob
Fecha: mié 2/07/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Quita marcas de agua
Wondershar PDFelement

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	FRENTE de obra
44	5.4	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 PV E=0,12 MTS, , INCLUYE , MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	4 días	mié 13/08/25	mar 19/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
45	**6**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**4 días**	**lun 11/08/25**	**jue 14/08/25**	
46	**6.1**	**INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS**	**4 días**	**lun 11/08/25**	**jue 14/08/25**	
47	6.1.1	CAÑUELA PREFABRICADA A-120 22X30X80, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	3 días	lun 11/08/25	mié 13/08/25	FRENTE 2/Parqueade
48	6.1.2	LIMPIEZA CANAL AGUAS LLUVIAS, EXISTENTE	3 días	mar 12/08/25	jue 14/08/25	FRENTE 2/Parqueade
49	**7**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**7 días**	**lun 11/08/25**	**mié 20/08/25**	
50	7.1	LÁMPARA LED SOLAR DE 400W PARA ALUMBRADO EXTERIOR, 36,000 LÚMENES, Y TEMPERATURA DE COLOR DE 6500K (BLANCO FRÍO). INCLUYE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 36W, BATERÍA DE 35AH, SOPORTE PARA MONTAJE EN POSTE O PARED Y CONTROL REMOTO. RESISTENTE AL AGUA CON PR	2 días	mié 13/08/25	jue 14/08/25	FRENTE 2/Parqueade
51	7.2	POSTE CÓNICO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, ALTURA DE 6 METROS, CON DIÁMETRO SUPERIOR DE 60 MM Y DIÁMETRO INFERIOR DE 130 MM. ESPESOR DE 3 MM, INCLUYE PLACA BASE DE 300X300X12 MM Y PERNOS J DE ANCLAJE. CUMPLE CON NORMATIVA NCH432 PARA RESISTENCIA A CON	2 días	mié 13/08/25	jue 14/08/25	FRENTE 2/Parqueade
52	7.3	LUMINARIA LED SOLAR AUTÓNOMA DE 50W PARA INSTALACIÓN EN MUROS EXTERIORES, CON FLUJO LUMINOSO DE 6000 LÚMENES Y TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE ENTRE 3000K, 4000K Y 6000K. OFRECE TRES MODOS DE ILUMINACIÓN: SENSOR DE MOVIMIENTO, LUZ BAJA CONSTANTE Y LUZ ALTA	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
53	7.4	JUEGO DE MARCO EN ACERO Y 2 TAPAS DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276	2 días	lun 11/08/25	mar 12/08/25	FRENTE 5/ Anden AK 58
54	**10**	**PAÑETES**	**3 días**	**vie 15/08/25**	**mié 20/08/25**	
55	10.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO COLUMNAS 1:3 - E= 15 MM. ANCHO COLUMNAS ENTRE 0,20 A 0,40	2 días	vie 15/08/25	mar 19/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
56	10.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Muro en bloque
57	**12**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**2 días**	**mar 19/08/25**	**mié 20/08/25**	
58	12.1	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO FILOS Y DILATACIONES)	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
59	**15**	**CARPINTERIA METALICA**	**12 días**	**vie 1/08/25**	**mié 20/08/25**	
60	15.1	CERRAMIENTO DE(2.70 X 1.85 DE ALTURA) EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 DE ACUERDO A DISEÑO BARROTES PARTE CENTRAL CIRCULOS DE 10CM EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 CENTRO Y PUNTAS DE LANZA DECORADAS ACABADO COLOR NEGRO ELECTROESTATICA MICROTEXTURI	12 días	vie 1/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Muro cerramiento
61	**22**	**OBRAS GENERALES**	**5 días**	**mié 13/08/25**	**mié 20/08/25**	
62	22.1	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO	5 días	mié 13/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Franja Ambiental
63	22.2	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A 1.20X1.20 LADRILLO TOLETE LECHO FILTRANTE REF. CONT.: CARTILLA DEL ESPACIO PÚBLICO BTA	5 días	mié 13/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Franja Ambiental
64	22.3	SIEMBRA DE ESPECIE ARBOREA TIPO CAYENO H= 50 CM MINIMO , (INCLUYE TIERRA NEGRA, TUTOR, ABONO Y HIDRORETENEDOR HIDROGEL)	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Franja Ambiental
65	22.4	SIEMBRA DE ESPECIE ARBOREA TIPO AYER HOY Y MAÑANA H= 50 CM MINIMO , (INCLUYE TIERRA NEGRA, TUTOR, ABONO Y HIDRORETENEDOR HIDROGEL)	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Franja Ambiental
66	22.5	SIEMBRA DE ESPECIE ARBOREA TIPO ALCAPARRO ENANO H= 70 CM MINIMO , (INCLUYE TIERRA NEGRA, TUTOR, ABONO Y HIDRORETENEDOR HIDROGEL)	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Franja Ambiental
67	22.6	SIEMBRA DE ESPECIE ARBOREA TIPO EUGENIA H= 50 CM MINIMO , (INCLUYE TIERRA NEGRA, ABONO Y HIDRORETENEDOR HIDROGEL)	5 días	mié 13/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Franja Ambiental
68	**23**	**URBANISMO**	**18 días**	**jue 24/07/25**	**mié 20/08/25**	
69	23.1	EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	4 días	mié 30/07/25	lun 4/08/25	FRENTE 2/Parqueade
70	23.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION A SITIO AUTORIZADO.	4 días	mié 30/07/25	lun 4/08/25	FRENTE 2/Parqueade
71	23.3	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE HASTA OBTENER UN CBR URBANO DEL 95%.	5 días	mié 30/07/25	mar 5/08/25	FRENTE 2/Parqueade
72	23.4	EXTENDIDO Y COMPACTACION SUBBASE GRANULAR CLASE B	3 días	mar 5/08/25	vie 8/08/25	FRENTE 2/Parqueade
73	23.5	EXTENDIDO Y COMPACTACION BASE GRANULAR CLASE B	3 días	lun 11/08/25	mié 13/08/25	FRENTE 2/Parqueade
74	23.5	EXTENDIDO Y COMPACTACION BASE GRANULAR CLASE B	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Muro
75	23.6	EXTENDIDO Y COMPACTACION DE BASE ESTABILIZADORA EN RAJON	2 días	vie 1/08/25	lun 4/08/25	FRENTE 2/Parqueade
76	23.7	GEOTEXTIL BX 40 O SIMILAR	2 días	mar 5/08/25	mié 6/08/25	FRENTE 2/Pa
77	23.8	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA (CRL)	1 día	jue 14/08/25	jue 14/08/25	FRENTE 2/Parqueade
78	23.9	PAVIMENTO ASFÁLTICO (MDC - 19 INVIAS)	2 días	mié 13/08/25	jue 14/08/25	FRENTE 2/Parqueade
79	23.10	MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.	2 días	vie 15/08/25	mar 19/08/25	FRENTE 2/Parqueade
80	23.10	MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.	7 días	lun 11/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
81	23.10	MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.	5 días	mar 12/08/25	mar 19/08/25	FRENTE 4/Pompeyan
82	23.11	MARCACION DE DISCAPACITADOS CON PINTURA TRAFICO AZUL Y BLANCO REFLECTIVA CON MICROESFERAS	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Parqueade
83	23.12	BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-10	2 días	lun 11/08/25	mar 12/08/25	FRENTE 2/Parqueade
84	23.12	BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-10	3 días	lun 4/08/25	mié 6/08/25	FRENTE 4/Pompeyan

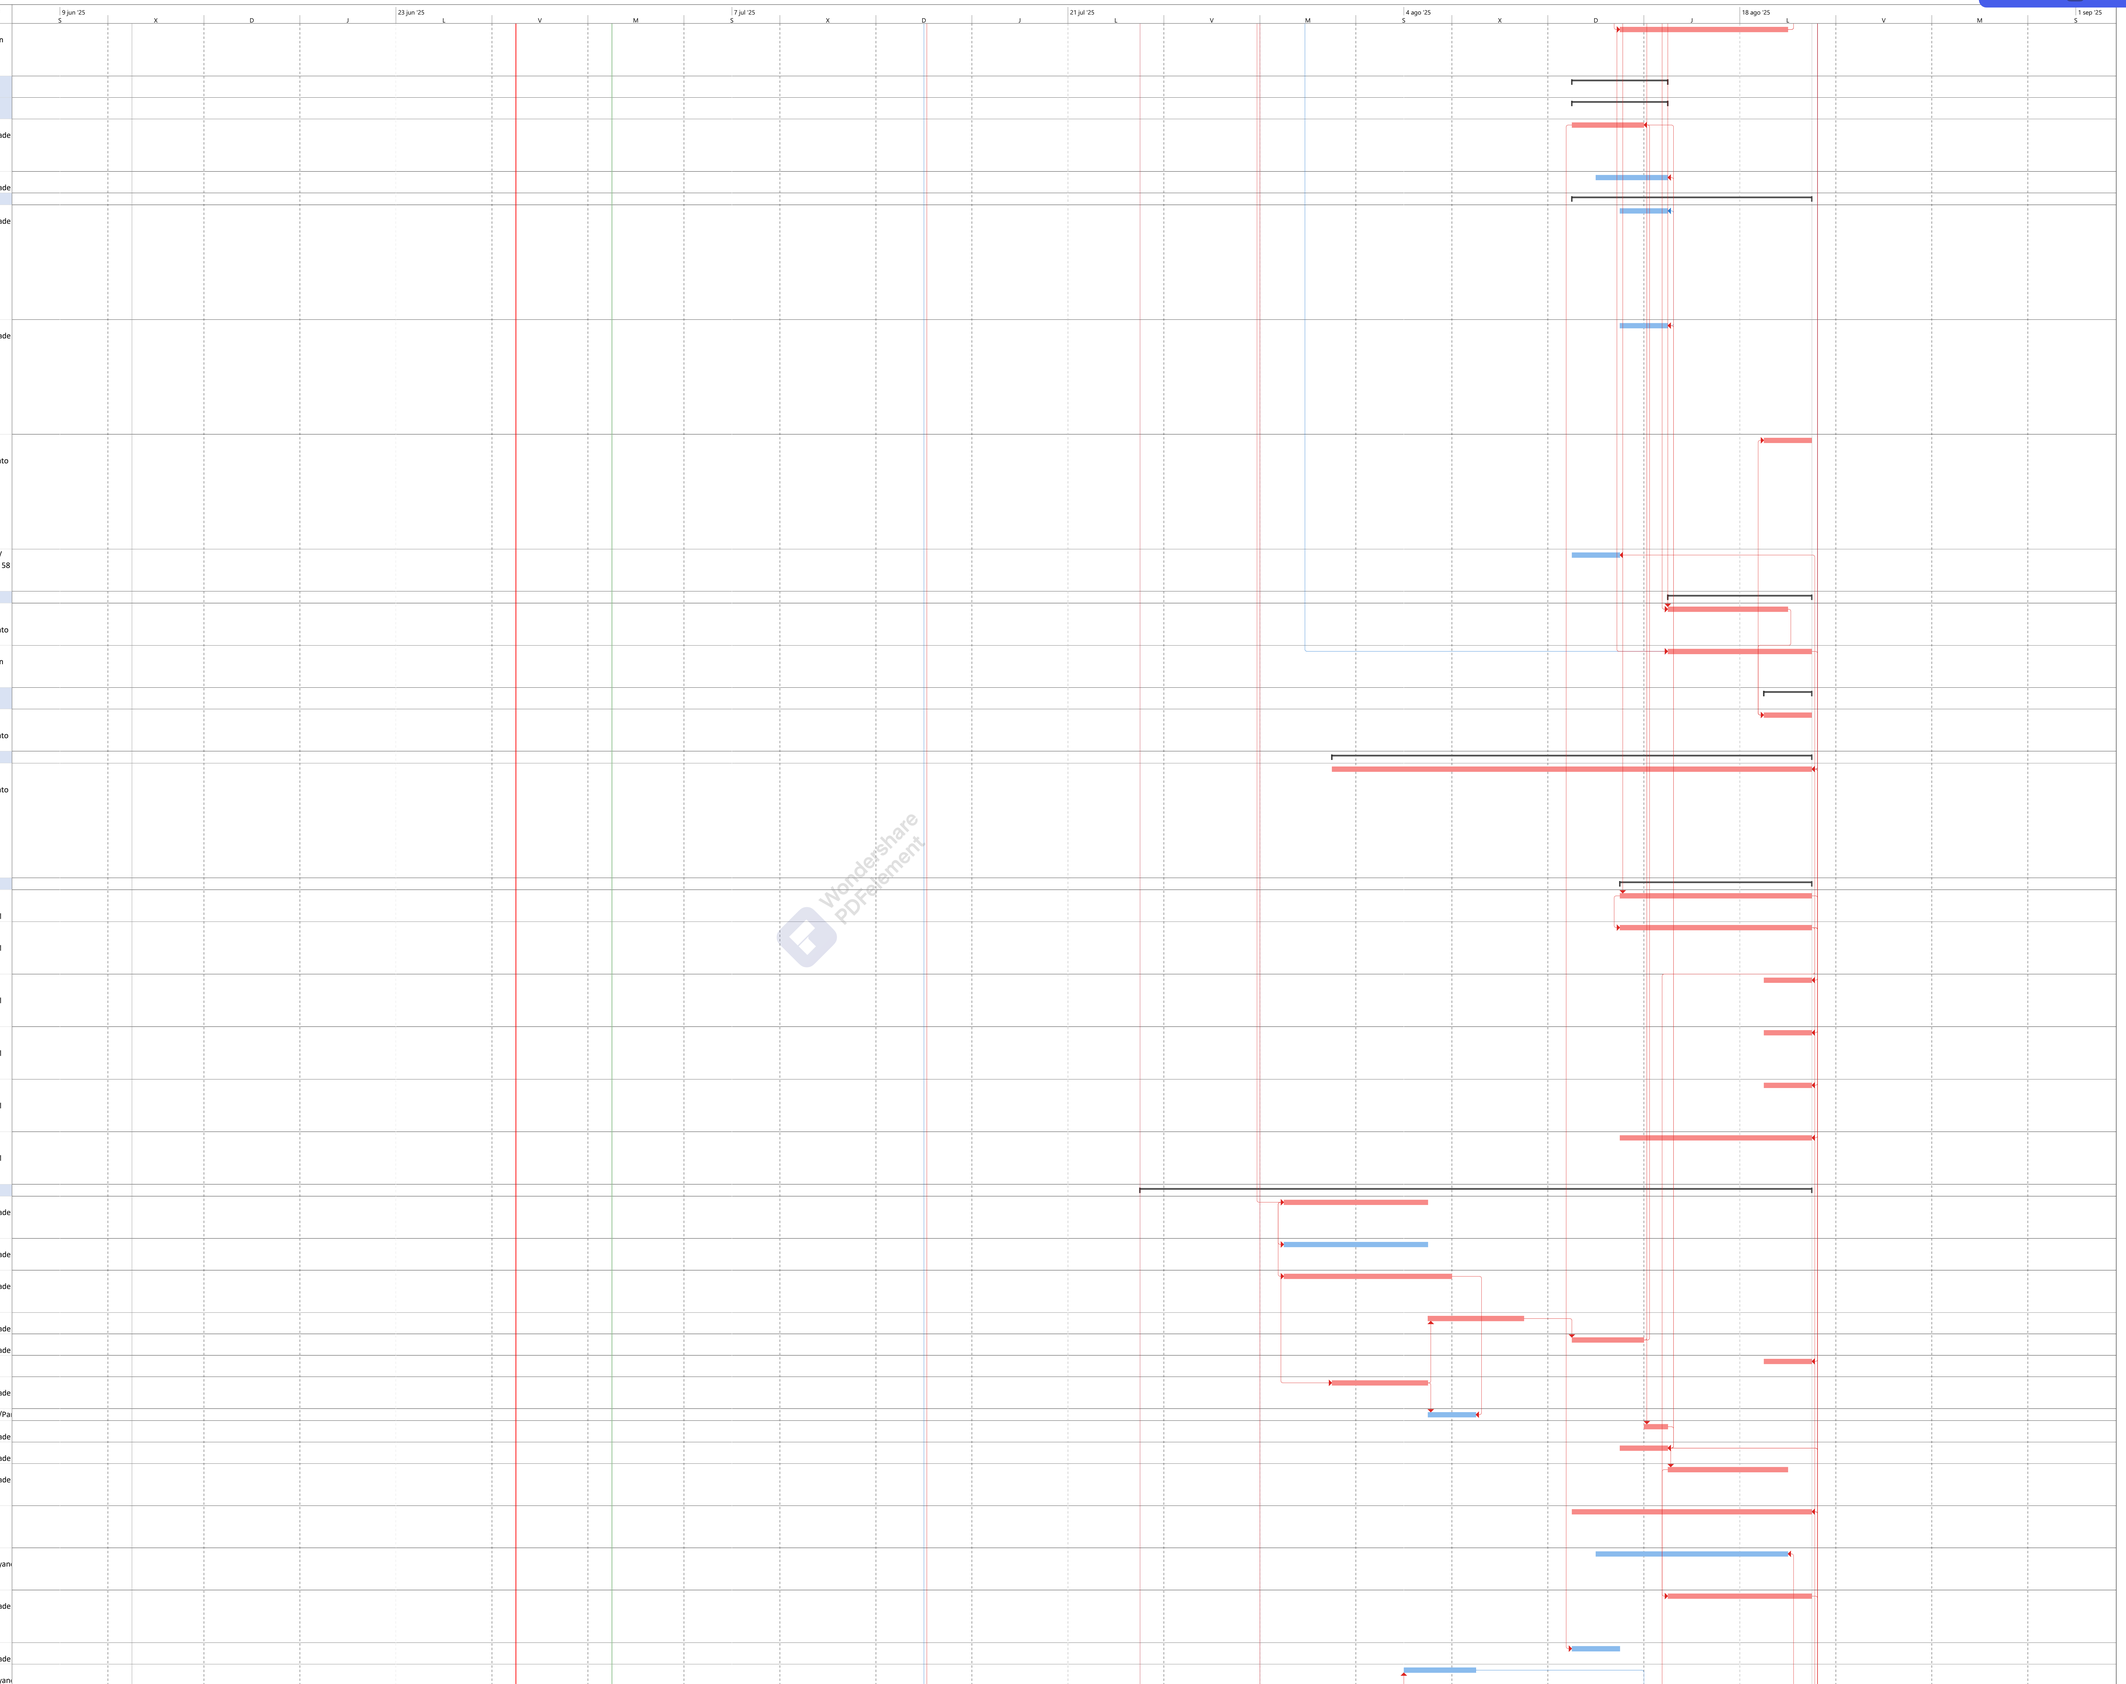


Wondershare PDFelement

Proyecto: Programación de Ob
Fecha: mié 2/07/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas criticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Quita marcas de agua
Wondershar PDFelement

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	FRENTE de obra
85	23.13	TOPELLANTA 45CM X 11CM X 10CM, INLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	4 días	jue 14/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Parqueade
86	23.14	BORDILLO BAJO RAMPA A-85	2 días	mié 13/08/25	jue 14/08/25	FRENTE 5/ Ar
87	23.14	BORDILLO BAJO RAMPA A-85	3 días	mar 29/07/25	jue 31/07/25	FRENTE 3/Isle
88	23.14	BORDILLO BAJO RAMPA A-85	5 días	lun 4/08/25	lun 11/08/25	FRENTE 4/Po
89	23.15	BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80	7 días	lun 4/08/25	mié 13/08/25	FRENTE 4/Pompeyan
90	23.16	POMPEYANO EN CONCRETO MR-45 DE E=0,20M ESTAMPADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE CURADO, MALLA DE REFUERZO, SUMINISTRO DEL ESTAMPADO DEL CONCRETO CON COLOR, DESMOLDANTE, MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SE	11 días	lun 4/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
91	23.16	POMPEYANO EN CONCRETO MR-45 DE E=0,20M ESTAMPADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE CURADO, MALLA DE REFUERZO, SUMINISTRO DEL ESTAMPADO DEL CONCRETO CON COLOR, DESMOLDANTE, MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SE	3 días	jue 14/08/25	mar 19/08/25	FRENTE 4/Pompeyan
92	23.17	TACHONES REFLECTIVOS	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isle
93	23.18	DELINEADORES TUBULARES H=0,75mt, Ø0,008m	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
94	23.19	DEMARCACION CICLOVIA CON PINTURA TRAFICO REFLECTIVA PARA POMPEYANO E ISLETA	8 días	vie 8/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
95	23.19	DEMARCACION CICLOVIA CON PINTURA TRAFICO REFLECTIVA PARA POMPEYANO E ISLETA	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 4/Pompeyan
96	23.20	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ANDEN EXISTENTE	15 días	mar 29/07/25	mié 20/08/25	FRENTE 5/ Anden AK 58
97	23.21	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA E=10 CM , INCLUYE RETIRO	7 días	jue 24/07/25	vie 1/08/25	FRENTE 4/Pompeyan
98	23.22	RETIRO E INSTALACION DE BOLARDO NUEVO EN HIERRO FUNDIDO E= 4 MM	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 5/ Anden AK 58
99	23.23	DESMONTE DE BARRERA DE CICLOVIA	1 día	vie 1/08/25	vie 1/08/25	FRENTE 3/Isleta
100	23.24	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
101	23.25	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE FONDO DE JUNTA Y SELLO.	3 días	jue 24/07/25	lun 28/07/25	FRENTE 3/Isleta
102	23.26	JUNTAS DE AISLAMIENTO INCLUYE FONDO DE JUNTA Y SELLO.	4 días	jue 14/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
103	23.27	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA	5 días	mié 13/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 5/ Anden AK 58
104	23.28	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL BLANCA - ROJA	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
105	23.29	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CON CHORRO DE AGUA A UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 3500 PSI. INCLUYE APLICACIÓN DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE TIPO SIKAGUARD-719W O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVA	5 días	mié 13/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
106	23.30	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS EXISTENTE	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
107	23.31	BORDILLO B-20 PARA CONTENEDOR DE RAICES	5 días	mié 13/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 5/ Anden AK 58
108	**24**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**7 días**	**lun 11/08/25**	**mié 20/08/25**	
109	24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR FINAL DE OBRA	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Muro en
110	24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR FINAL DE OBRA	5 días	mié 13/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Muro
111	24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR FINAL DE OBRA	5 días	mié 13/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Parqueade
112	24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR FINAL DE OBRA	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Franja
113	24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR FINAL DE OBRA	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
114	24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR FINAL DE OBRA	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 4/Pompeyan
115	24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR FINAL DE OBRA	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 5/ Anden AK 58
116	24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Muro en
117	24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	7 días	lun 11/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Muro
118	24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	5 días	mié 13/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Parqueade
119	24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 2/Franja
120	24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 3/Isleta
121	24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 4/Pompeyan
122	24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	3 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	FRENTE 5/ Anden AK 58
123	**26**	**SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS**	**12 días**	**mar 15/07/25**	**mié 30/07/25**	
124	26.1	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANISTO, INCLUYE MODELACION DE MOVILIDAD, SEÑALIZACION, PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACION.	12 días	mar 15/07/25	mié 30/07/25	

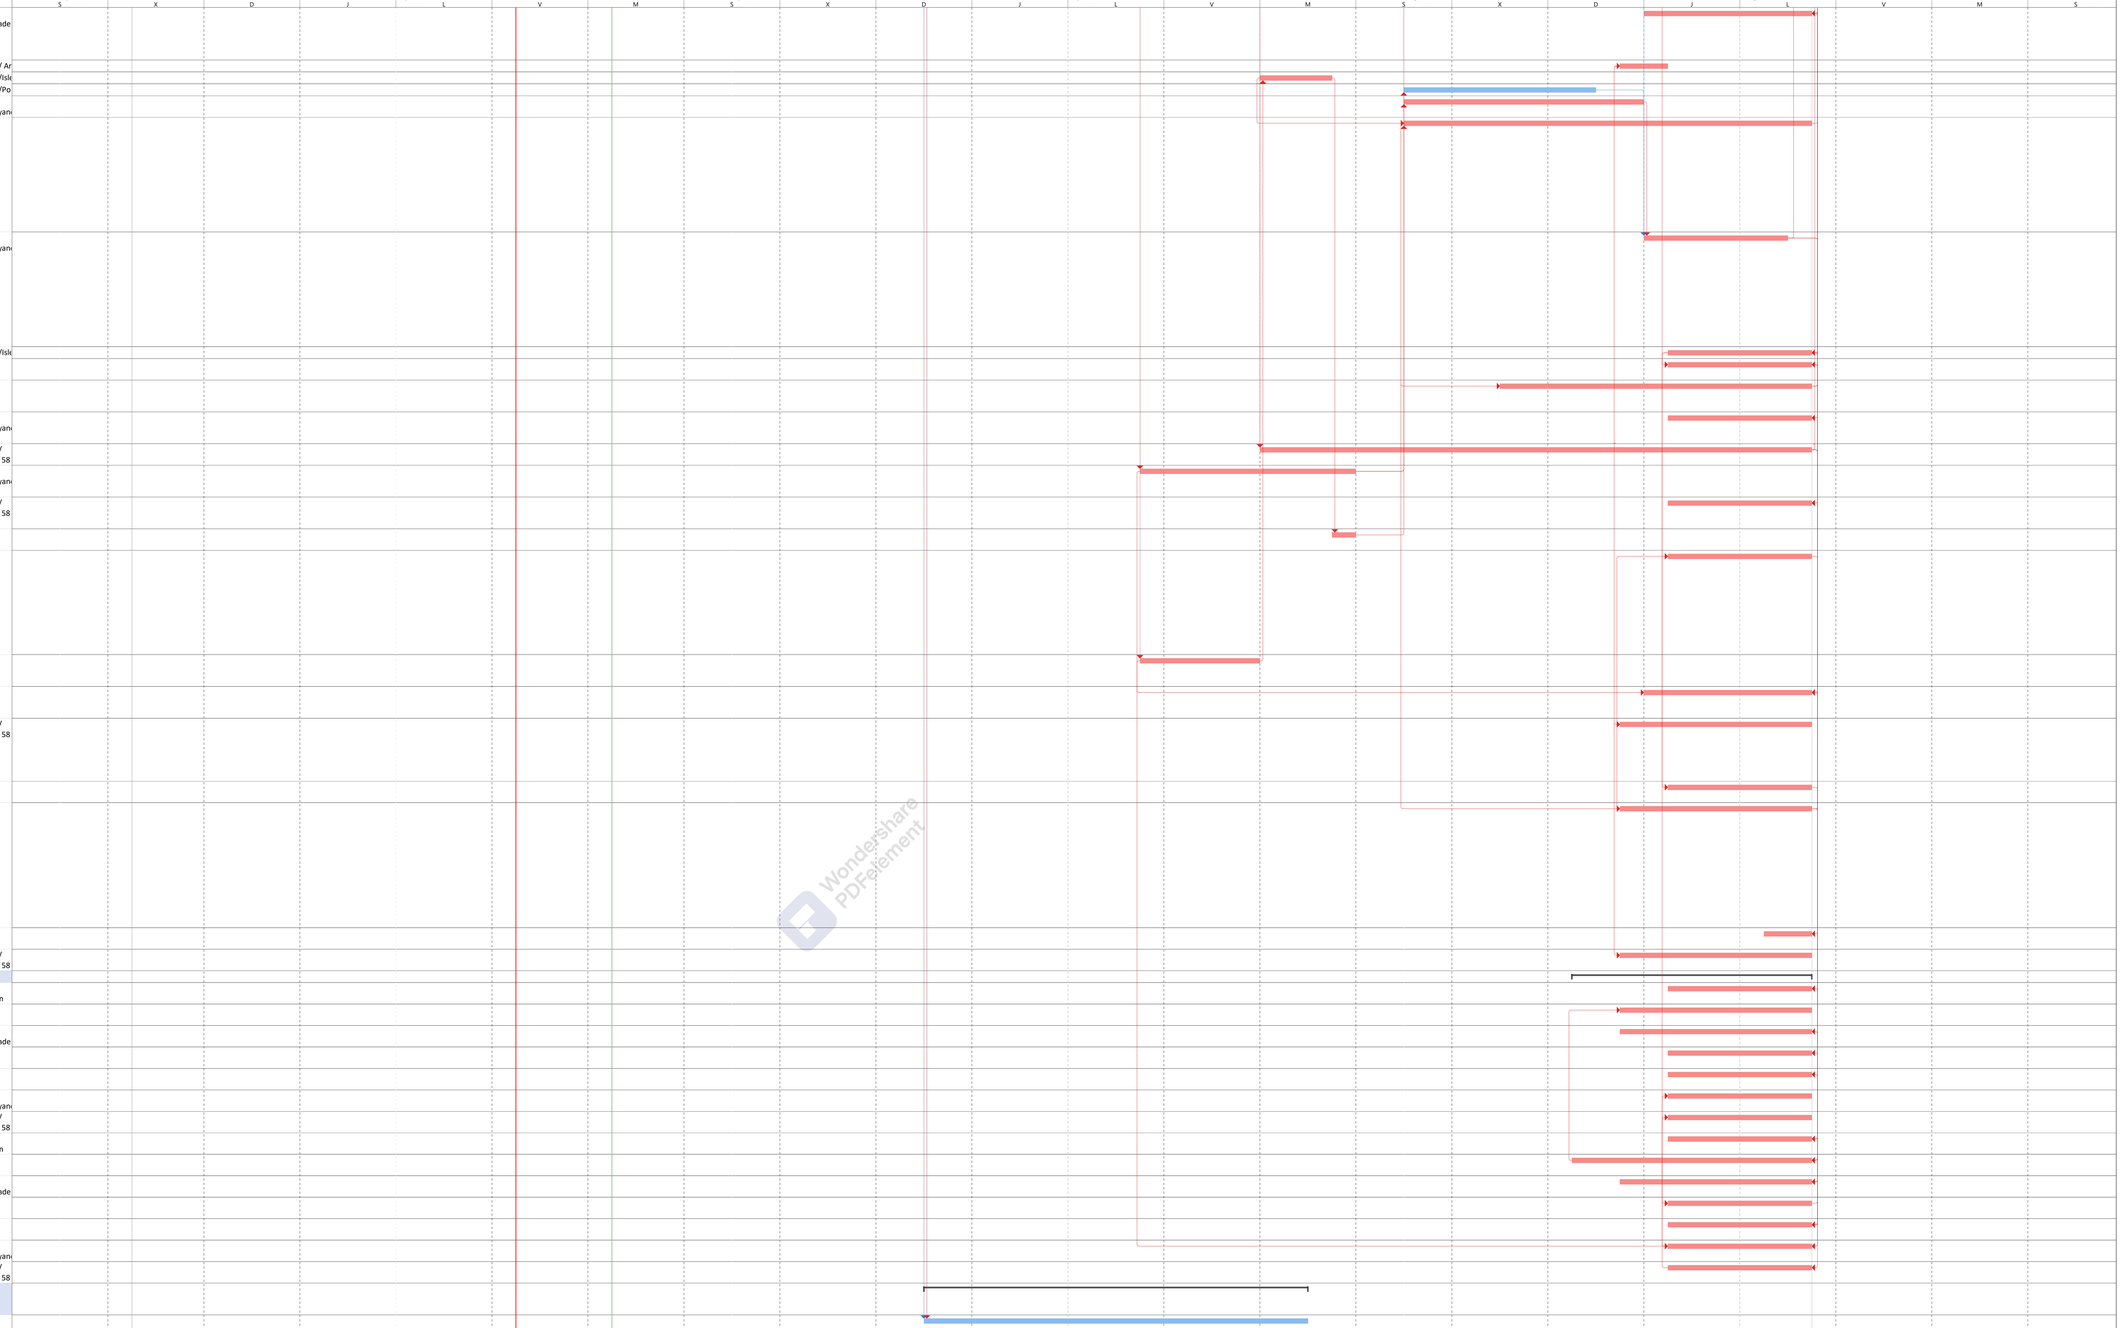

Wondershare PDFelement


Proyecto: Programación de Ob
Fecha: mié 2/07/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

LUGAR Y FECHA	Bogotá 01 de julio de 2025
CONTRATO No.	005-00-A- COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.
VALOR DEL CONTRATO	1.351.286.169,59
CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑOS S.A.S- EN REORGANIZACIÓN
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO (S. PRINCIPAL) CT. RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN (S. SUPLENTE)
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
PLAZO DE ENTREGA	20/08/2025

El día 20 del mes de Junio del 2025 a las 3:30 pm se reunieron: ST PEREZ GUERRERO HEBERTH, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en su calidad de supervisor, y ING. JEISON EDER DIAZ AYALA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR, predio ubicado Carrera 58 # 9-88

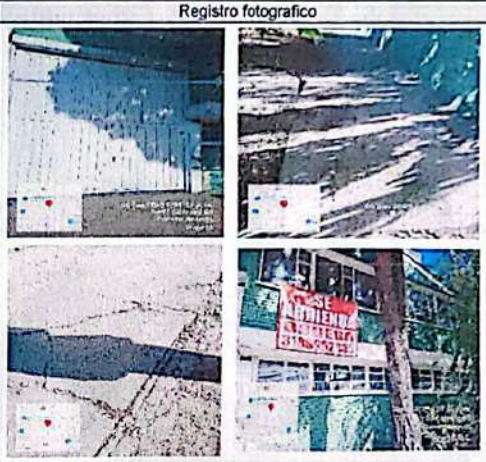Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Fachada externa que colinda con la bodega de almacenamiento y fabricación de la empresa Dismetales hacia calle 13, que cuenta con portón blanco y rampa de acceso en lozas de concreto donde se evidencian grietas y fisuras longitudinales y transversales. No se logra el ingreso se realiza gestión por el equipo de empresa contratista VERTICAL DISEÑO SAS con el fin de ubicar al propietario y/o encargado del predio sin obtener respuesta, razón por la cual se levanta acta de vecindad de inicio de fachada.	N/A
Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	**Registro fotografico**
Fachada externa que colinda con área de almacenamiento y descarga de empresa WODEM, hacia avenida Américas, mampostería en ladrillo a la vista y vinilo de color verde, ventanas metálicas.	N/A
Edificios y zonas exteriores presentes al Este	**Registro fotografico**
No se logra ingresar al predio, se realiza gestión con el fin de ubicar al propietario y/o encargado del predio sin obtener respuesta.	N/A
Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	**Registro fotografico**
Se realiza gestión con el fin de ubicar al propietario y/o encargado del predio sin obtener respuesta, razón por la cual se levanta acta de vecindad de inicio de fachada. Predio ubicado en la dirección # 9-88 edificación con ladrillo a la vista en vinilo verde, ventanas rectangulares marco metálico y vidrio y un gran letrero colgado en la parte superior que anuncia: "SE ARRIENDA BODEGA – 3186952835". Frente a la fachada hay un árbol de gran tamaño que genera sombra sobre el inmueble; cuenta con un andén de concreto que bordea la edificación, ramas pequeñas y algunas fisuras visibles en la superficie. La sombra proyectada por un árbol cercano cubre parte del paso peatonal, lo que podría disminuir la visibilidad de las irregularidades del suelo, aunque el andén está transitable, presenta grietas y residuos vegetales donde se evidencia la falta de mantenimiento.	

ANEXOS

Registro fotografico y registro filmico

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma

Representante supervisor
Firma

Persona que atiende la visita
Firma

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

LUGAR Y FECHA	Bogotá 24 de junio de 2025
CONTRATO No.	005- 00-A- COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.
VALOR DEL CONTRATO	1.351.286.169,59
CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑOS S A S- EN REORGANIZACIÓN
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO (S. PRINCIPAL) CT. RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN (S. SUPLENTE)
LOCALIZACION DE LA OBRA	DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
PLAZO DE ENTREGA	20/08/2025

El dia 20 del mes de Junio del 2025 a las 3:30 pm se reunieron: ST PEREZ GUERRERO HEBERTH, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidad de supervisor, y ING. JEISON EDER DIAZ AYALA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR, predio ubicado Calle 13 # 56-71

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
El costado norte, colinda con negocio que se encuentra como en forma de cuña en la calle 13, techada con laminas metalicas y secciones translúcidas para entrada de luz natural. Las vigas del techo son de estructura metálica, en la parte superior se observa ladrillo a la vista, mientras que en la parte inferior esta construida en bloque pintado de blanco.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	**Registro fotografico**
Área que colinda con bodega vacia con informacion de arrendamiento,Las vigas del techo son de estructura metálica, en la parte superior se observa ladrillo a la vista, mientras que en la parte inferior esta construida en bloque pintado de blanco, se observa piso en losas de concreto agrietado.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Este	**Registro fotografico**
Área interior de la bodega o espacio industrial techada con laminas metalicas y secciones translúcidas para entrada de luz natural. Las vigas del techo son de estructura metálica, en la parte superior se observa ladrillo a la vista, mientras que en la parte inferior esta construida en bloque pintado de blanco.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	**Registro fotografico**
Área de ingreso vehicular diagonal a Dispensario conjunto de sanidad militar ARC-FAC fachada en ladrillo a la vista, vinilo amarillo cuenta con anden frente al predio con fisuras, grietas desniveles y bordes levantados compuesto por losas de concreto , con poste de energia electrica, señal de transito con un porton amplio de color azul ingreso a la parte operativa; 2 nivel nivel con ventanas metalicas con ladrillo a la vista igualmente con vinilo amarillo, en la zona oeste-norte parte de muro con ladrillo a la vista y vinilo rojo, se evidencia puerta auxiliar con desgaste y oxidación en la parte inferior.	

Powered by CamScanner

ANEXOS
Registro fotografico y registro filmico
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:
Representante Legal Contratista Firma y posfirma
Representante Legal Interventoria ó supervisor Firma y posfirma
Personal Organismo de la Unidad Firma y posfirma

Disometales S.A.S
Distribuidora de Aceros y Más
NIT.: 800.212.911


Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

LUGAR Y FECHA	Bogotá 26 de junio de 2025
CONTRATO No.	00 5- 00-A- COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO
VALOR DEL CONTRATO	1.351.286.169,59
CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑOS S.A.S- EN REORGANIZACIÓN
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO (S. PRINCIPAL) CT. RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN (S. SUPLENTE)
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
PLAZO DE ENTREGA	20/08/2025

El día 26 del mes de Junio del 2025 a las 10:00 am se reunieron: ST PEREZ GUERRERO HEBERTH, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA en su calidad de supervisor, y ING. JEISON EDER DIAZ AYALA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR, predio ubicado CARRERA 58#9-47 Bogotá.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Parqueadero y muros laterales, piso en adoquín en regular estado por uso, donde se evidencia ahuellamiento zona con especies herbarias que van a ser trasladadas de acuerdo con solicitud. Talanqueras inhabilitadas con sensor, área con cámara de seguridad a reubicar, cuenta con punto hidráulico, se evidencia sardinel con fisuras. Y faltante de material entre juntas y cinta de confinamiento que presentan grietas. Muro lateral pañetado que presenta fisuras y algunas áreas con grietas. Se evidencia ahuellamiento significativo en parqueadero #44. Caseta de vigilante que presenta fisuras en muros y enchape de baño, fisura en placa contrapiso y cinta de concreto de talanquera ingreso vehicular en rampa que presenta fisuras, bolardos de separación en regular estado presentan desgaste y levantamiento de pintura. En cuanto a la fachada exterior de dispensario, en esta se evidencian abultamiento de pañete y desprendimiento de material, fisuras y grietas, evidenciadas durante recorrido no solo exterior sino interior de la entidad. Por otro lado, se realiza recorrido interno de las áreas del dispensario que cuentan con zócalo y ventana con vidrios hacia fachada de entidad, pisos enchapados en baldosa, mampostería en vinilo. Recorrido en el que se evidencian en los baños de todos los pisos fisuras en enchape de muros, piso y media caña de los baños, en cuanto a los pasillos internos se evidencian fisuras en enchape de mediacaña.	

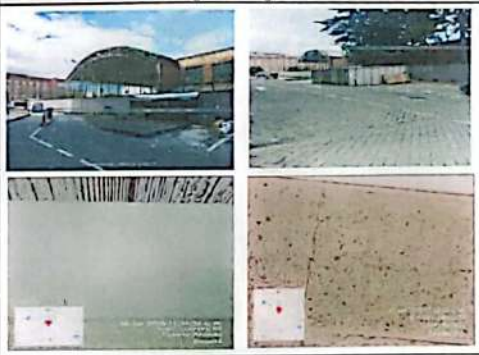Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	Registro fotografico
Parqueadero y muros laterales que colindan con muro de la institución educativa Colegio Silveria Espinoza de Rendon muro pañetado que presenta fisuras y levantamiento de material en la parte inferior, piso en adoquín en regular estado, donde se evidencia ahuellamiento. En cuanto al sardinel presenta desgaste y se evidencian algunas juntas sin boquilla, algunos adoquines se encuentran desportillados, talanqueras inhabilitadas con sensor salida vehicular en rampa con lozas de concreto. En cuanto a la fachada exterior de dispensario, en esta se evidencian abultamiento de pañete y desprendimiento de material, fisuras y grietas, evidenciadas durante recorrido no solo exterior sino interior de la entidad. Por otro lado, se realiza recorrido interno de las áreas del dispensario que cuentan con zócalo y ventana con vidrios hacia fachada de entidad, pisos enchapados en baldosa, mampostería en vinilo. Recorrido en el que se evidencian fisuras en muros de cafetería piso uno (1), en los baños de todos los pisos fisuras en enchape de muros, piso y media caña de los baños, en cuanto a los pasillos internos se evidencian fisuras en enchape de mediacaña.	

Edificios y zonas exteriores presentes al Este	Registro fotografico
Área de recepción de ingreso a usuario. Área con puerta de vidrio, que cuenta con acceso en rampa y escalones en concreto que presenta desgaste y fisuras, en costado sur se evidencia grieta en muro y levantamiento de pintura, Cerramiento en malla metálica hacia costado sur, materas en concreto y especies herbarias. Hacia el interior, ventanas en vidrio, piso en baldosa donde se evidencias fisuras normales de uso, En ventana hacia el interior del dispensario se evidencia marco y vidrio de ventana inferior desplomado. En cuanto a la fachada exterior del edificio del dispensario, en esta se evidencian abultamiento de pañete y desprendimiento de material, fisuras y grietas, evidenciadas durante recorrido no solo exterior sino interior de la entidad. En cuanto a las zonas comunes se evidencian que las lozas de concreto presentan desgaste y fisuras. Por otro lado, se realiza recorrido interno de las áreas del dispensario que cuentan con zócalo y ventana con vidrios hacia fachada de entidad, pisos enchapados en baldosa, mampostería en vinilo. Recorrido en el que se evidencian en los baños de todos los pisos fisuras en enchape de muros, piso y media caña de los baños, en cuanto a los pasillos internos se evidencian fisuras en enchape de mediacaña.	

Powered by CamScanner

Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	Registro fotografico
Área que cuenta con cinco postes con luminarias, muro pañetado que presenta fisuras, zona verde y especies herbarias. En cuanto al sardinel presenta desgaste y se evidencian algunas juntas sin boquilla, algunos adoquines se encuentran desportillados. En cuanto a la fachada exterior de dispensario, en esta se evidencian abultamiento de pañete y desprendimiento de material, fisuras y grietas, evidenciadas durante recorrido no solo exterior sino interior de la entidad. Sótano, área utilizada como parqueadero vehicular, donde se evidencian tres filtraciones de agua en placa de techo, muros. Por otro lado, se realiza recorrido interno de las áreas del dispensario que cuentan con zócalo y ventana con vidrios hacia fachada este de entidad, y muros en mampostería y ventanas con vidrio en fachada oeste, pisos enchapados en baldosa, mampostería en vinilo. Recorrido en el que se evidencian en los baños de todos los pisos fisuras en enchape de muros, piso y media caña de los baños, en cuanto a los pasillos internos se evidencian fisuras en enchape de mediacaña.	   

ANEXOS

Registro fotografico y registro filmico

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma

Representante supervisor
Firma

C. Diaz Emma
52822712
Oficial Fac

C. Diaz Emma.

Persona que atiende la visita
Firma

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

LUGAR Y FECHA	Bogotá 25 de junio de 2025
CONTRATO No	00 5- 00-A- COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.
VALOR DEL CONTRATO	1.351.286.169,59
CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑOS S A S- EN REORGANIZACIÓN
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO (S. PRINCIPAL) CT. RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN (S. SUPLENTE)
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
PLAZO DE ENTREGA	20/08/2025

El día 25 del mes de Junio del 2025 a las 3:30 pm se reunieron: ST PEREZ GUERRERO HEBERTH, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA en su calidad de supervisor, y ING. JEISON EDER DIAZ AYALA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR, Carrera 60 # 12-70, Textilia.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Colinda con bodega que se desconoce, teniendo en cuenta el alcance del proyecto y la actividad de levantamiento de actas de vecindad de inicio de obra, no son relevantes para la ejecución del mismo. Que ya no hace parte del alcance del proyecto. Sin embargo, se realiza la gestión pertinente con la empresa para el ingreso con el fin de confirmar si existe algún espacio o zona en la parte interna con alguna consideración a tener en cuenta, dejando registro fotográfico y fílmico soporte de la visita realizada, como medida preventiva previa a la ejecucion de la actividades objeto del proyecto.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	**Registro fotografico**
Colinda con bodega que se desconoce, teniendo en cuenta el alcance del proyecto y la actividad de levantamiento de actas de vecindad de inicio de obra, no son relevantes para la ejecución del mismo. Que ya no hace parte del alcance del proyecto. Sin embargo, se realiza la gestión pertinente con la empresa para el ingreso con el fin de confirmar si existe algún espacio o zona en la parte interna con alguna consideración a tener en cuenta, dejando registro fotográfico y fílmico soporte de la visita realizada, como medida preventiva previa a la ejecucion de la actividades objeto del proyecto.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Este	**Registro fotografico**
Empresa textil que colinda en fachada externa con el parqueadero del dispensario establecimiento de sanidad militar ARC-FAC, área aledaña a intervenir de acuerdo con objeto del proyecto. Muro de fachada de empresa textilia con entrada principal en la Carrera 60 # 12-70. Fachada externa al este en ladrillo a la vista, donde se evidencian algunos faltantes de material, ladrillo con desgaste normal con marcas de deslizamiento de agua normales, algunos resanes realizados, faltantes de material posiblemente por ductos de ventilación, ventanas metálicas, ductos de ventilación, donde se evidencia desgaste normal de material, marchas en fachada de deslizamiento de agua. En cuanto al muro interno del parqueadero del dispensario de sanidad militar de 1 nivel, se evidencian fisuras, levantamiento de pintura, que cuenta con zona verde la siembra de especies herbarias.	

Powered by CamScanner

Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	*Registro fotografico*
Empresa textil que colinda en fachada externa con la carrera 60. Que ya no hace parte del alcance del proyecto. Sin embargo, se realiza la gestión pertinente con la empresa para el ingreso con el fin de confirmar si existe algún espacio o zona en la parte interna con alguna consideración a tener en cuenta, dejando registro fotográfico y filmico soporte de la visita realizada, , como medida preventiva previa a la ejecucion de la actividades objeto del proyecto.	

ANEXOS

Registro fotografico y registro filmico

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma

Representante supervisor
Firma

Persona que atiende la visita
Firma

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

LUGAR Y FECHA	Bogotá 20 de junio de 2025
CONTRATO No	00 5- 00 A- COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO
VALOR DEL CONTRATO	1.351.286.169,59
CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑOS S.A.S- EN REORGANIZACIÓN
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO (S. PRINCIPAL) CT. RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN (S. SUPLENTE)
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
PLAZO DE ENTREGA	20/08/2025

El dia 20 del mes de Junio del 2025 a las 3:52 pm se reunieron: ST PEREZ GUERRERO HEBERTH, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA en su calidad de supervisor, y ING. JEISON EDER DIAZ AYALA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR, Carrera 58 calle 13 Betun Bowy. Fachada.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Al norte colinda con la calle 13. Se levanta acta de vecindad de fachada, teniendo en cuenta la distancia con el area de ejecucion del contrato. Local comercial fachada en ladrillo a la vista pintado en vinilo rojo con grafitis en muros de fachada. Con reja abierto al publico por la calle 13, piso 2 ventanas metalica. Andenes en loza de concreto que presenta desgaste, donde se evidencian fisuras y grietas longitudinales y tranversales.	

Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	Registro fotografico
Local que colinda con bodega de fabricacion de Dismetales. Se levanta acta de vecindad de fachada, teniendo en cuenta la distancia con el area de ejecucion del contrato. Local comercial fachada en ladrillo a la vista pintado en vinilo rojo con grafitis en muros de fachada hacia carrera 58. Andenes con antibajos, donde se evidencias faltantes de lozas, vegetacion, levantamiento y sobresaltos en algunas lozas de concreto en anden y en las existentes se evidencia desgaste fisuras y grietas longitudinales y tranversales, altibajos y levantamiento de material en algunas areas.	 

Edificios y zonas exteriores presentes al Este	Registro fotografico
No identificado, teniendo en cuenta que se levanta acta de vecindad de fachada.	

Powered by CamScanner

Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	Registro fotografico
local que colinda con la carrera 58. Se levanta acta de vecindad de fachada, teniendo en cuenta la distancia con el area de ejecucion del contrato. Local comercial fachada en ladrillo a la vista pintado en vinilo rojo con grafitis en Andenes con antibajos, donde se evidencias faltantes de lozas, vegetacion, levantamiento y sobresaltos en algunas lozas de concreto en anden y en las existentes se evidencia desgaste fisuras y grietas longitudinales y tranversales, altibajos y levantamiento de material en algunas areas. y cuenta con area de arbol junto a anden de la via, filos de andenes no definidos, presentan desgaste, faltantes de material.	

ANEXOS

Registro fotografico y registro filmico

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma

Representante supervisor
Firma

Yohanca Martinez
Persona que atiende la visita
Firma

Powered by CamScanner

Hacelo.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

LUGAR Y FECHA	Bogotá 24 de junio de 2025
CONTRATO No.	005- 00-A- COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO
VALOR DEL CONTRATO	1.351.286.169,59
CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑOS S.A.S- EN REORGANIZACIÓN
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO (S. PRINCIPAL) CT. RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN (S. SUPLENTE)
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
PLAZO DE ENTREGA	20/08/2025

El dia 24 del mes de Junio del 2025 a las 4:30 pm se reunieron: ST PEREZ GUERRERO HEBERTH, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en su calidad de supervisor, y ING. JEISON EDER DIAZ AYALA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR, predio ubicado Calle 13 # 58-51

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
El costado norte, entrada principal a BODEGA. área con ingreso principal por calle 13, bodega de dos (2) pisos, [illegible]nes en lozas de concreto que cuenta con fisuras longitudinales y transversales a lo largo del área. antepecho con [illegible]es redondos metálicos, rejilla de ingreso al almacén y bodega con rampa de ingreso a vehículos pesados a bodega de almacenamiento, piso dos (2) se evidencia laminas metálicas, avisos del lugar y muros en vidrio, techo en teja metálica. Piso 1. Hacia el interior de la bodega y almacén, se evidencia piso de trafico pesado en lamina de concreto donde se evidencian fisuras longitudinales y transversales, portones corredizos verticales, columnas metálicas en muros y áreas en ladrillo estucado y techo en teja metálica, No es posible ver a detalle los muros teniendo en cuenta que se encuentra con mercancia. área que cuenta con ingreso a Bodega de ingreso de almacenamiento de elementos a comercializar con rampa, muros en ladrillo a la vista pintados vinilo blanco y ductos sanitarios, piso en laminas de concreto donde se videncias fisuras longitudinales y transversales. Piso 2. Piso de tráfico pesado donde se evidencia fisuras longitudinales y transversales, muro en vidrio hacia calle 13 con base en ladrillos.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	Registro fotografico
Área interna de Bodega de un nivel, muros aparentemente en ladrillos y vinilo a la vista, teniendo en cuenta que no es posible evidenciar ya que es un espacio utilizado para almacenamiento de mercancía, piso de tráfico pesado en lamina de concreto donde se evidencian fisuras longitudinales y transversales. Techo en teja metálica y teja plástica que traspasa la luz y cerchas metálicas, cuenta con trece (13) luminarias.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Este	Registro fotografico
Área de ingreso vehicular a bodega de tráfico pesado, de acuerdo con lo informado en visita es ingreso de mulas y vehículo pesado, muros en ladrillo a la vista pintados vinilo blanco y dos (2) ductos sanitarios a la vista, piso en láminas de concreto donde se videncias fisuras longitudinales y transversales, tablero metálico en muro lateral a la zona de demolición objeto del contrato.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	Registro fotografico
Área de colinda con cafetería y restaurante Amenito. Muros laterales aparente en ladrillo, teniendo en cuenta que hay áreas que no se pueden observar por almacenamiento de mercancía y elementos a comercializar, columnas metálicas y techo con cerchas metálicas y teja de lámina, piso en láminas de concreto donde se videncias fisuras longitudinales y transversales	

Powered by CamScanner

ANEXOS
Registro fotografico y registro filmico
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:
Representante Legal Contratista Firma y posfirma
Representante Legal Interventoría ó supervisor Firma y posfirma
Yesid Perdomo Esquivel 1109244009 Personal Organico de la Unidad Firma y posfirma

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023


LUGAR Y FECHA	Bogotá 25 de junio de 2025
CONTRATO No.	00 5- 00-A- COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.
VALOR DEL CONTRATO	1.351.206.169,59
CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑOS S.A.S- EN REORGANIZACIÓN
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO (S. PRINCIPAL) CT. RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN (S. SUPLENTE)
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
PLAZO DE ENTREGA	20/08/2025

El dia 24 del mes de Junio del 2025 a las 9:30 am se reunieron: ST PEREZ GUERRERO HEBERTH, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidad de supervisor, y ING. JEISON EDER DIAZ AYALA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR, predio Insitucion Educativa Colegio Silveria Espinoza de Rendon ubicado Carrera 58 #9 -51 sede A

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte

Zona 1 . Nos encontramos con dispensario conjunto de sanidad militar ARC-FAC material predominante muro en ladrillo rojo a la vista, se observan varios arbustos y arboles con ramas que sobresalen del muro; tambien hay vegetacion baja creciendo en la parte inferior del muro, detras del muro hay una malla metalica alta sostenida por postes, se nota un entorno urbano con presencia de postes de energia, el muro presenta una abertura en la parte superior posiblemente resultado de desgaste o modificación, crecimiento de musgoel area norte-sur es utilizada como almacenamiento de la institución a la interperie (cementerio) aprox a 5 mts hacia el area de salones los cuales cuentan con ventanales metalicos y vidrios en su totalidad con estuco y vinilo blanco normales de desgaste, 2 piso con muro de ladrillo a la vista con ventanal metalico faltande una de vidrio, grietas y rompimiento en algunas piezas, en la parte superior separación metálica pintada en vinilo verde, piso en obra negra con desnivel, cuenta con doce (12) especies herbarias en regular estado.
Zona 2. Polideportivo de institución educativa
Zona aledaña al dispensario de sanidad. Polideportivo, con piso en baldosa que se evidencia con desgaste, baldosas rotas, grietas, techo en cerchas y columnas metálicas de cerramiento, bancas en concreto con desgaste pintadas en vinilo de color verde, se evidencian filtración de agua en muros laterales. Muro interno que colinda con parqueadero de dispensario de sanidad cuenta con tarima del polideportivo, muros en los que se evidencia levantamiento de pintura y material, faltante de tapa en cajas en conexión eléctrica, y humedad con moho en parte inferior de muro, en escalones para subir a tarima se evidencia faltantes de adoquines y material.
Zona 3. Zona verde y aulas de clase
Muro lateral hacia dispensario se evidencia muro en ladrillo a la vista con desgaste, grietas y rompimiento en algunas piezas, algunas grietas, ya hacia área de aulas de clase al ingreso en muro se evidencia fisura. No es permitido el ingreso a las aulas, ya que en este momento están en receso escolar por temporada de vacaciones y previo a la salida de estudiantes dejan todas las áreas cerradas.
Zona verde con especies herbarias en regular estado, pasto con altura considerable. Zona que cuenta con poste de alumbrado.

Registro fotografico

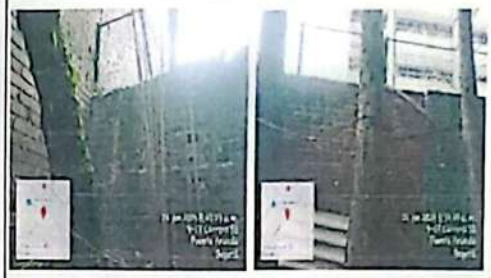


Edificios y zonas exteriores presentes al Sur

Al sur nos encontramos con la avenida americas colindando con la Policia Nacional Área de recepción de la institución educativa Área interna de un nivel con muros en ladrillo a la vista donde se encuentra ubicada la recepción y oficinas, piso en láminas de concreto con desgaste y fisuras transversales y longitudinales.

Registro fotografico



Edificios y zonas exteriores presentes al Esto

Al este nos encontramos por la carrera 58 entrada principal del colegio I.E. D Silveria Espinosa de Rendon Fachada que colinda con la carrera 58; fachada de institución educativa con muro en ladrillo a la vista pintado con vinilo café donde evidencia desgaste, grietas y rompimiento en algunas piezas, algunas grietas y ventanales metálicos con reja pintados en color hueso, caja de servicios públicos en regular estado y cuenta con dos ingresos vehiculares con rampa de ingreso en regular estado.
En cuanto al anden se evidencia piso en laminas de concreto con fisuras y grietas longitudinales y transversales. Área que cuenta con tres (3) postes de alumbrado público, dos señales de tránsito y base metálica de protección d especie herbaria en mal estado, desgastada, con oxidación.

Registro fotografico



Powered by CamScanner

...ficios y zonas exteriores presentes al Oeste	Registro fotografico
Área interna de la institución educativa que colinda con bodegas externas a área de intervención al proyecto, fachada exterior de ladrillo, corredor estrechodelimitado que nos lleva oeste-norte en estado deteriorado, se observa varuos ladrillos sueltos o faltantes, el suelto esta cubierto de vegetación crecida entre concreto, lo que sugiere acomulación de humedad y falta de mantenimiento; la pared presenta inclinaciones y deformaciones que podrian indicar problemas estructurales, en cuanto a la s aulas el techo presenta vigas expuestas, desgaste en la pintura con ventanas enrejadas.	

ANEXOS

Registro fotografico y registro filmico

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma

Representante Supervisor
Firma

Nestor Alexander Becerra.
Persona que atiende la visita
Firma


Powered by CamScanner

Copia

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

LUGAR Y FECHA	Bogotá 24 de junio de 2025
CONTRATO No.	00 5- 00-A- COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.
VALOR DEL CONTRATO	1.351.286.169,59
CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑOS S A S- EN REORGANIZACIÓN
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO (S. PRINCIPAL) CT. RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN (S. SUPLENTE)
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
PLAZO DE ENTREGA	20/08/2025

El dia 20 del mes de Junio del 2025 a las 10 00 am se reunieron: ST PEREZ GUERRERO HEBERTH, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA en su calidad de supervisor, y ING. JEISON EDER DIAZ AYALA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR, predio ubicado CARRERA 58#9-97 Bogotá.

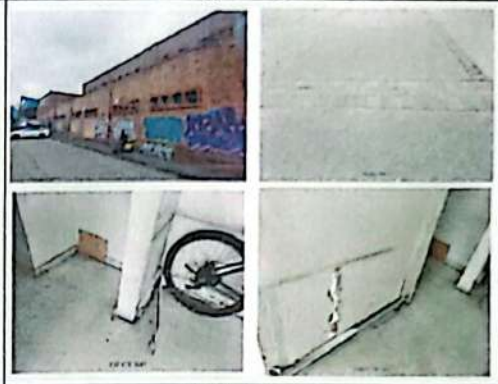Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Fachada externa hacia calle 13, con ladrillo a la vista que presenta desgaste, levantamiento de material, ventanas metálicas, seis (6) reflectores, zócalos en regular estado presentan fisuras, grietas, levantamiento de material. Andenes en lozas de concreto en regular con desgaste, grietas y fisuras longitudinales y transversales. Hacia la parte interna se encuentra la recepción, se evidencia fisuras en baldosas de piso, fisuras y grietas en muros y levantamiento de guarda escoba, muros con grietas, levantamiento de material y fisuras.	

Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	Registro fotografico
Zona área. Oficina de administrador: Se evidencia humedad en techo, muro en drywall con fisuras. Sala de reuniones que colinda con parqueadero de la armada que cuenta con techo en drywall , se evidencia humedad en techo, se evidencia espacio sin lampara, luminaria suelta, en el piso fisuras diagonales, sin canaleta, humedad en muro, daño en Drywall, muro interno. Área de parqueadero y bodegas frente a carrera 58, área que cuenta con cerramiento metálico, rampa de acceso, piso en lozas de concreto que presentan fisuras y grietas longitudinales y transversales. Rampa de acceso que presenta desgaste, fisuras y grietas longitudinales y transversales, además de levantamiento de material. Adicionalmente cuenta con acceso a bodegas de escalones donde se evidencia levantamiento de materiales. En bodega que colinda a parqueadero del dispensario en muros de fachada internos se evidencia desprendimiento de pintura, fisuras en piso, instalaciones eléctricas faltantes de luminarias. En las otras dos bodegas aledañas, se evidencia techo en drywall en mal estado, muros con desprendimiento, humedad, levantamiento de pintura, piso con fisuras. En la parte externa, andenes en lozas de concreto con desgaste y fisuras longitudinales y trasversales, andenes con desgaste de material, sardinel de anden en regular estado, falta de material en juntas.	

Edificios y zonas exteriores presentes al Este	Registro fotografico
Muro costado sur colindante con el dispensario de la entidad convida parte interna Piso 1. Área de cafetería y restaurante que cuenta con rampa de ingreso que presenta levantamiento de material en piso, fisuras en muros. En cuando a áreas comunes y oficina de celaduría de evidencian fisuras en baldosa de enchape de piso desprendimiento de guarda escoba y muros con desgaste y faltantes de material. piso 2, donde se evidencia desprendimiento de pintura fisuras, grietas en techo, marcos y rejillas de ventanas sueltas, vidrios faltantes, fisuras en baldosa de piso. En cuando a los baños de mujeres como de hombres se evidencian grietas en baldosa de enchape. En cuanto al área de oficina de subgerencia comercial en baño privado se evidencian fisuras en baldosa de enchape. En cuanto a la fachada, muro lateral colindante con dispensario ladrillo a la vista con desgaste.	

Powered by CamScanner

Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	Registro fotografico
Zona de almacenamiento de la entidad CONVIDA colindante con muro occidental que cuenta con doce (12) luminarias colgantes al techo deshabilitadas no se verifica funcionamiento en visita ya que según informa la persona que atiende la misma se encuentran desconectadas del tablero eléctrico, referente al área de zona de almacenamiento se evidencia levantamiento de pintura y material, fisuras en muro de tablero eléctrico. Adicionalmente cuenta con una puerta no habilitada (según informa la persona que atiende la visita) colindante con bodega a demoler actividad a llevar a cabo en la realización de actividades de ejecución del contrato:005-00-A-COFAC-DIFRA-2025OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. Piso en láminas de concreto con desgaste y gritas longitudinales y trasversales, mapeo general de fisuras, agrietamiento y fisuras en placa, se evidencia humedad en muros, fisuras en columnas, techo con cerchas metálicas y teja en lamina, adicionalmente se evidencia faltantes en muros de tapas en las instalaciones eléctricas.	 

ANEXOS

Registro fotografico y registro filmico

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma

Representante supervisor
Firma

Persona que atiende la visita
Firma

Powered by CamScanner

Fiduagraria	FORMATO ORDEN DE PAGO	MOP-GDP-FO-1 Versión 6

INFORMACIÓN SUMINISTRADA PARA PROCESO DE CAUSACIÓN

1. NOMBRE DEL FIDEICOMISO O SUBCUENTA: (*)	PA ANTICIPO VERTICAL DISEÑO SAS					2. CÓDIGO DEL FIDEICOMISO O SUBCUENTA: (*)		3. FECHA (DD-MM-AAAA) (*)	
4. TERCERO DE CAUSACIÓN (*)	VERTICAL DISEÑO SAS					5. No. DE IDENTIFICACIÓN (*)	900,246,243-4		
6. BENEFICIARIO DEL GIRO (*)	DANIEL FELIPE PEREZ MONTAÑA					7. No. DE IDENTIFICACIÓN (*)	1,049,639,149		
8. VALOR : (*) $	90,000,000.00								
9. FORMA DE PAGO: (*)	10. A.Cheque B.Deposito Judicial		11. RETIRO VENTANILLA		12. CONSIGNACIÓN		13. ENTREGA EN OFICINA CIUDAD:		
			14. AUTORIZADO PARA RETIRO				15. No. DE IDENTIFICACIÓN		
	16. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	X							
17. BANCO: (*)	BANCOLOMBIA		18. TIPO DE CUENTA (*)	AHORROS			19. No. DE CUENTA (*)	8591388185	
20. CONCEPTO: (*)	PRIMER PAGO DEMOLICION								
21. OBSERVACIONES:									

22. (*)mismas firmas de tarjeta de firmas

HECTOR WILLIAM BAEZ
CONTRATISTA

ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO
SUPERVISOR

FIRMA ORDENADOR (S) DEL GASTO

FIRMA ORDENADOR (S) DEL GASTO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA FIDUCIARIA

23. PRESUPUESTO: (SI/NO)	SI ☐ NO ☐	24. AREA		26. RUBRO		28. CAUSACIÓN:	SIN ☐	29. CUENTA CONTABLE	
		25. RECURSO		27. VALOR					
30. CUENTA O FONDO ORIGEN DE RECURSOS: (*)	31. FIC ☐ 32. No.DE FIC		33. CTA BANCARIA ☐		34. No. DE CUENTA		37. CON PROVISIÓN:	38. CUENTA CONTABLE:	
					35. BANCO				
	36. PAGO EXENTO DE GRAVAMEN	SI ☐	NO ☐		39. PAGO PARCIAL SEGÚN ANEXO ☐				
40. OBSERVACIONES INSTRUCION(*)									

ADMINISTRADORES

41. OTORGAN VISTO BUENO POR COMPLETITUD DE DOCUMENTOS Y PERTINENCIA DEL PAGO (*)

AUTORIZA (firma)

NOMBRE:
CARGO:

Bogotá D.C., 30 de Julio de 2025

Doctora:
Giovanna Barrera
Jefe Administración de Negocios
FIDUAGRARIA S.A.

Asunto: AUTORIZACIÓN SUPERVISOR PARA GIROS No. 02

Que en mi calidad de supervisor del contrato PA ANTICIPO VERTICAL DISEÑO SAS COD. 325562, Yo ST. Pérez Guerrero Heberth Gustavo identificado con C.C. 1.016.105.883, apruebo el desembolso por valor de $ 90.000.000,00 al tercero Daniel Felipe Pérez Montaña identificado con CEDULA No. 1.049.639.149.

Por medio de la presente autorizo el giro del FIC-600 No. 256-919598, solicitado por el fideicomitente de la siguiente manera:

Beneficiario	DANIEL FELIPE PEREZ MONTAÑA
NIT	1.049.639.149
Banco Beneficiario	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número de cuenta destino	8591388185
Concepto del giro	PRIMER PAGO DEMOLICION
Valor a Pagar	90.000.000,00

Agradezco la atención prestada.

_____

Supervisor **ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO**

Fiduagraria	FORMATO ORDEN DE PAGO	MOP-GDP-FO-1 Versión 6

INFORMACIÓN SUMINISTRADA PARA PROCESO DE CAUSACIÓN

1. NOMBRE DEL FIDEICOMISO O SUBCUENTA: (*)	PA ANTICIPO VERTICAL DISEÑO SAS					2. CÓDIGO DEL FIDEICOMISO O SUBCUENTA: (*)		3. FECHA (DD-MM-AAAA) (*)	
4. TERCERO DE CAUSACIÓN (*)	VERTICAL DISEÑO SAS					5. No. DE IDENTIFICACIÓN (*)	900,246,243-4		
6. BENEFICIARIO DEL GIRO (*)	DEMOLICIONES PINZON LOPEZ SAS					7. No. DE IDENTIFICACIÓN (*)	900.419.994-0		
8. VALOR : (*) $	90,000,000.00								
9. FORMA DE PAGO: (*)	10. A.Cheque ☐ B.Deposito Judicial ☐		11. RETIRO VENTANILLA	☐	12. CONSIGNACIÓN	☐	13. ENTREGA EN OFICINA CIUDAD:		
			14. AUTORIZADO PARA RETIRO				15. No. DE IDENTIFICACIÓN		
	16. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	X							
17. BANCO: (*)	COLPATRIA		18. TIPO DE CUENTA (*)	CORRIENTE			19. No. DE CUENTA (*)	4391016114	
20. CONCEPTO: (*)	TRANSPORTE DE MATERIAL								
21. OBSERVACIONES:									

22. (*)mismas firmas de tarjeta de firmas

HECTOR WILLIAM BAEZ CONTRATISTA	ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO SUPERVISOR
FIRMA ORDENADOR (S) DEL GASTO	FIRMA ORDENADOR (S) DEL GASTO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA FIDUCIARIA

23. PRESUPUESTO: (SI/NO)	SI ☐ NO ☐	24. AREA		26. RUBRO		28. CAUSACIÓN:	SIN ☐	29. CUENTA CONTABLE	
		25. RECURSO		27. VALOR					
30. CUENTA O FONDO ORIGEN DE RECURSOS: (*)	31. FIC ☐		33. CTA BANCARIA ☐		34. No. DE CUENTA			37. CON PROVISIÓN:	38. CUENTA CONTABLE:
	32. No.DE FIC				35. BANCO				
	36. PAGO EXENTO DE GRAVAMEN	SI ☐	NO ☐		39. PAGO PARCIAL SEGÚN ANEXO ☐				
40. OBSERVACIONES INSTRUCION(*)									

ADMINISTRADORES

41. OTORGAN VISTO BUENO POR COMPLETITUD DE DOCUMENTOS Y PERTINENCIA DEL PAGO (*)

AUTORIZA (firma)

NOMBRE:

CARGO:

Bogotá D.C., 30 de Julio de 2025

Doctora:
Giovanna Barrera
Jefe Administración de Negocios
FIDUAGRARIA S.A.


Asunto: AUTORIZACIÓN SUPERVISOR PARA GIROS No. 02

Que en mi calidad de supervisor del contrato PA ANTICIPO VERTICAL DISEÑO SAS COD. 325562, Yo ST. Pérez Guerrero Heberth Gustavo identificado con C.C. 1.016.105.883, apruebo el desembolso por valor de $ 24.092.668,57 al tercero Demoliciones Pinzón López S.A.S. identificado con NIT 900.419.994-0.

Por medio de la presente autorizo el giro del FIC-908781, solicitado por el fideicomitente de la siguiente manera:

Beneficiario	DEMOLICIONES PINZON PEREZ SAS
NIT	900.419.994-0
Banco Beneficiario	COLPATRIA
Tipo de Cuenta	CORRIENTE
Número de cuenta destino	4391016114
Concepto del giro	TRANSPORTE DE MATERIAL
Valor a Pagar	24.092.668,57

Agradezco la atención prestada.




_____

Supervisor **ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO**


FLUJO DE CAJA

16/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	7/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	4/08/2025	11/08/2025	18/08/2025
$ 0,00	$ 0,00	$ 4.529.470,05	$ 27.822.576,11	$ 62.842.808,55	$ 41.681.444,94	$ 278.781.762,19	$ 277.937.866,86	$ 547.079.068,36	$ 110.611.172,60

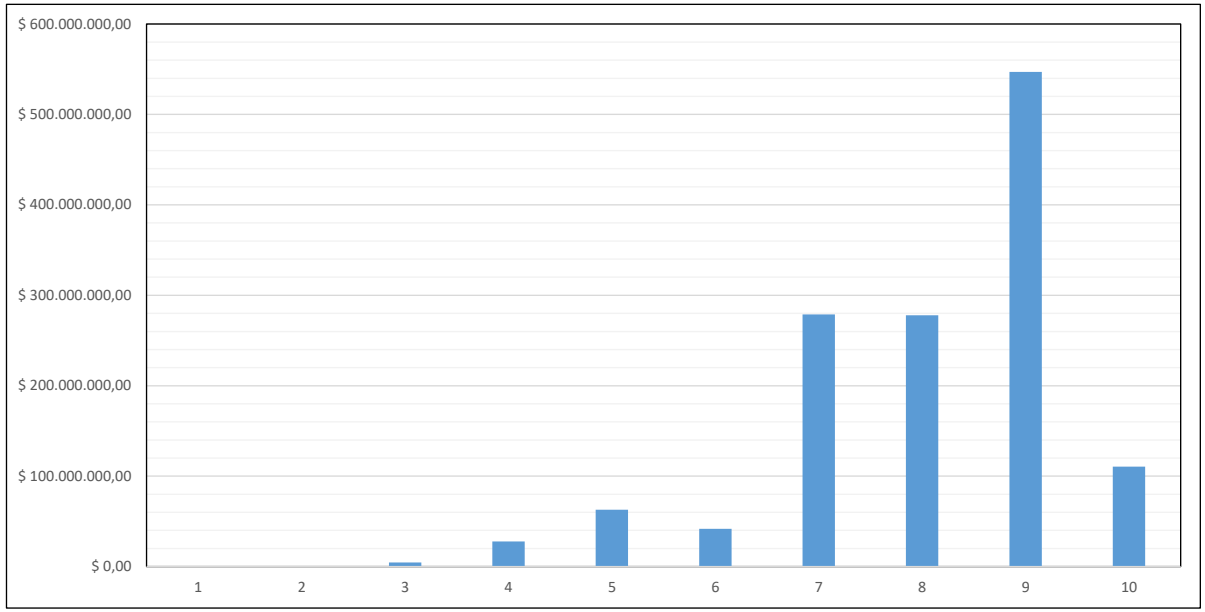

CURVA "S"

16/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	7/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	4/08/2025	11/08/2025	18/08/2025
$ 0,00	$ 0,00	$ 4.529.470,05	$ 32.352.046,15	$ 95.194.854,70	$ 136.876.299,63	$ 415.658.061,82	$ 693.595.928,67	$ 1.240.674.997,00	$ 1.351.286.169,59

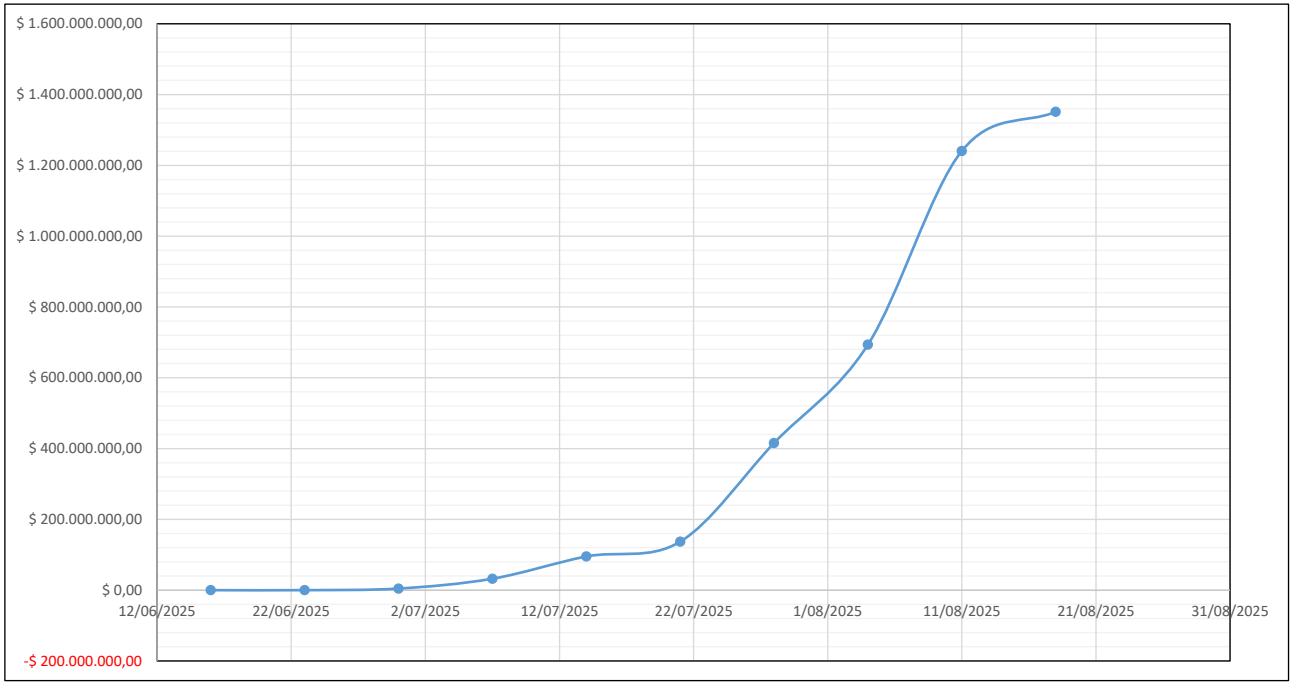

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	7/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	10/07/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	2/07/2025	**AL:**	10/07/2025
CONTRATO Nº	005-00COFAC-DIFRA-2025	**CONTRATISTA**	VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO				
FECHA DE INICIO	18/06/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	20/08/2025		

VALOR INICIAL	$ 1.351.286.169,59	**VALOR ADICIONAL**		**VALOR REDUCCION (Si aplica)**		**VALOR TOTAL**	$ 1.351.286.169,59

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 28 DE MAYO DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 02 DE JULIO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS , LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN ES EL INICIO DE LA FASE DE DEMOLICIÓN , LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN SON SON LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA SOLICITUD DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRAFICO PMT, SOLICITUD DE PIN AMBIENTAL, ELABORACION DE ACTAS DE VECNIDAD Y SOLICITUD DE VISITA IDU PARA OBRAS DE URBANISMO SOBRE EL ANDEN DE LA AK 58, ESQUINA DE LA AK 60 CON AV AMERICAS (ISLETA) Y ESQUINA DE LA AK 60 CON AV AMERICAS (POMPEYANO)

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				retroexcavadora	1	Director de Obra	1	50	50	SI	
						Residente de Obra	1	100	100	SI	
						Residente SST	1	100	100	SI	
						Residente Ambiental	1	100	100	SI	
						Auxiliar Administrativo	1	100	100	SI	
						Ayudante de Obra	1	100	100	SI	
						TOTAL	6				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (jul 02)	2,65%	**2,65%**	**2,62%**	**0,03%**
Semana 2 (jul 11)	0,00%			
Semana 3 (jul 17)	0,00%			
Semana 4 (jul 25)	0,00%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO






















GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO		**65,00%**
	EJECUTADO		**65,00%**
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**9,00%**
	EJECUTADO		**9,30%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

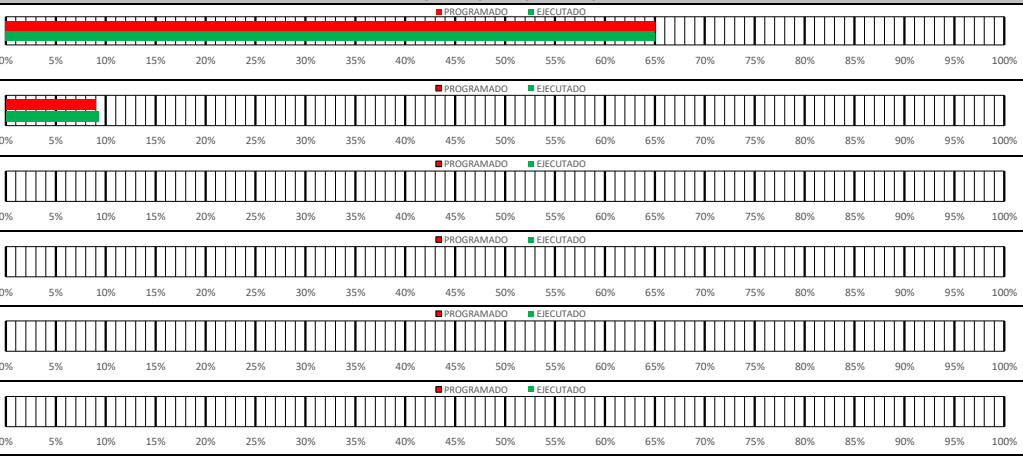

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		50,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
2	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
3	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
4	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
8	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

17	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
21	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
24	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
25	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
27	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
28	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
29	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
30	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	64	23	41

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades ejecutadas durante el periodo del 02 al 10 de julio de 2025 corresponden a:
Tramites administrativos de perfeccionamiento del contrato de Obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA
Se solicita y aprueba e implementa PMT para entrada y salida de volquetas de la calle 13
Se solicita PMT de urbanismo para intervención e obras de espacio publico (Isleta Pompeyano)- en espera de aprobación.
Se realiza solicitud de visita IDU para revisión preliminar de las obras contractuales de urbanismo.
En materia ambiental se obtiene PIN Ambiental para el proyecto.
Se realiza cerramiento de fachada costado norte y sur.
Se implementa campamento temporal de obra.
Se da inicio a al fase de demolición del bloque de dos pisos y desmonte de cubierta del bloque de 3 pisos.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
A la fecha presente informe no se reportan actividades atrasadas.	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: De acuerdo al avance de obra; se mantiene la fecha de terminación de la fase de demolición para el dia 31 de Julio de 2025.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1.351.286.169,59	$ 1.351.286.169,59	$ 35.809.083,49	2,65%	$ 1.315.477.086,10	97%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 1.351.286.169,59	$ 1.351.286.169,59				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA			SI		SI	
Ejemplo: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			SI		SI	
Ejemplo: ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS			SI		SI	
Ejemplo: VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			SI		SI	
Ejemplo: ACTAS DE VECINDAD			SI		SI	
Ejemplo: DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA			SI		SI	Se entregaron en original a la FAC
Ejemplo: PLAN DE CALIDAD			SI		SI	
Ejemplo: PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS			SI		SI	
Ejemplo: REVISION PRELIMINAR PROYECTO			SI		SI	
Ejemplo: VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS			SI		SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

CLIMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SOLEADO										
NUBLADO	6	7	6,3	9			8	8,25	8,80	9
LLOVIZNA										
LLUVIA LEVE	2	2	2,7					0,75	0,20	
LLUVIA FUERTE										
TOTAL	8	9	9	9	0	0	8	9	9	9

REVISO:

Residente de Obra/ Firma y Posfirma

ELABORO:

ST PEREZ GUERRERO HEBERTH G- SUPERVISOR
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)



Implementación PMT.



Ingreso de retroexcavadora.



Retiro de cerchas cubierta.



Desmonte de carpintería metálca.



Demolición mampostería bodega.



Demolición muros internos bodega.



Demolición bodega de 3 pisos.

Descripcion concreta de la actividad

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	7/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	16/07/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	11/07/2025	**AL:**	16/07/2025
CONTRATO Nº	005-00COFAC-DIFRA-2025	**CONTRATISTA**	VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO				
FECHA DE INICIO	18/06/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	20/08/2025		

VALOR INICIAL	$ 1.351.286.169,59	**VALOR ADICIONAL**		**VALOR REDUCCION (Si aplica)**		**VALOR TOTAL**	$ 1.351.286.169,59

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 28 DE MAYO DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 02 DE JULIO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS , LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN ES EL INICIO DE LA FASE DE DEMOLICIÓN , LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN SON LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA SOLICITUD DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRAFICO PMT, SOLICITUD DE PIN AMBIENTAL, ELABORACION DE ACTAS DE VECNIDAD Y SOLICITUD DE VISITA IDU PARA OBRAS DE URBANISMO SOBRE EL ANDEN DE LA AK 58, ESQUINA DE LA AK 60 CON AV AMERICAS (ISLETA) Y ESQUINA DE LA AK 60 CON AV AMERICAS (POMPEYANO)

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				retroexcavadora	1	Director de Obra	1	50	50	SI	
						Residente de Obra	1	100	100	SI	
						Residente SST	1	100	100	SI	
						Residente Ambiental	1	100	100	SI	
						Auxiliar Administrativo	1	100	100	SI	
						Ayudante de Obra	1	100	100	SI	
						TOTAL	6				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (jul 02)	2,65%	**4,99%**	**4,37%**	**0,62%**
Semana 2 (jul 11)	4,99%			
Semana 3 (jul 17)	0,00%			
Semana 4 (jul 25)	0,00%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO
































GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		90,00%
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		12,00%
	EJECUTADO		13,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

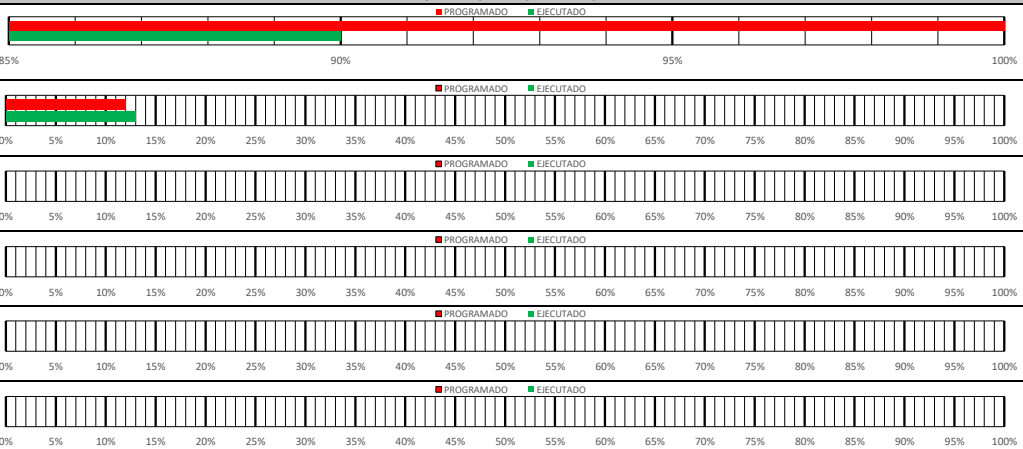

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		50,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
2	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
3	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
4	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
8	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

17	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
21	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
24	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
25	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
27	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
28	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
29	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
30	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Dias	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	64	29	35

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades ejecutadas durante el periodo del 11 al 16 de julio de 2025 corresponden a:
Se realiza demolición de muros y losa del bloque de dos pisos.
Se realiza desmonte de estructura de cubierta y cubierta del bloque de 3 pisos
Se inicia demolición de muros de bodega de 3 pisos
Se inicia retiro de cimientos del bloque de dos pisos
Se implementa campamento de obra.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
A fecha del pesente informe no se presentan atrasos y las actividades se están ejecutando dentro de los tiempos estimados en la programación de obra.	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: De acuerdo al avance de obra; se mantiene la fecha de terminación de la fase de demolición para el dia 31 de Julio de 2025.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1.351.286.169,59	$ 1.351.286.169,59	$ 67.429.179,86	4,99%	$ 1.283.856.989,73	95%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 1.351.286.169,59	$ 1.351.286.169,59				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA			SI		SI	
Ejemplo: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			SI		SI	
Ejemplo: ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS			SI		SI	
Ejemplo: VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			SI		SI	
Ejemplo: ACTAS DE VECINDAD			SI		SI	
Ejemplo: DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA			SI		SI	Se entregaron en original a la FAC
Ejemplo: PLAN DE CALIDAD			SI		SI	
Ejemplo: PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS			SI		SI	
Ejemplo: REVISION PRELIMINAR PROYECTO			SI		SI	
Ejemplo: VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS			SI		SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita por parte del equipo técnico de la entidad contratante para evaluar la alternativa de mantener la losa de contrapiso existente de la bodega de 3 pisos, contenido y compromisos de la reunión suscritas en acta consecutivo No. 02 con fecha 15 de Julio de 2025

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

ESTADO DEL CLIMA						
FECHA: SEMANA 2 DEL 11 AL 16 DE JULIO 2025	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
ESTADO: SOLEADO/SECO	9			9	9	9
ESTADO: LLUVIA LEVE						
ESTADO: LLUVIA FUERTE						
TOTALES ACUMULADOS EN HORAS	**9**	**0**	**0**	**9**	**9**	**9**

REVISO:

Residente de Obra Firma y Posfirma

ELABORO:

ST PEREZ GUERRERO HEBERTH G SUPERVISOR
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)



Retiro de escombros demolición.



Demolición muros bodega.



Demolición cimientos bloque de dos pisos.



Demolición muros bodega.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	7/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	24/07/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	17/07/2025	**AL:**	24/07/2025
CONTRATO Nº	005-00COFAC-DIFRA-2025	**CONTRATISTA**	VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO				
FECHA DE INICIO	18/06/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	20/08/2025		

VALOR INICIAL	$ 1.351.286.169,59	**VALOR ADICIONAL**		**VALOR REDUCCION (Si aplica)**		**VALOR TOTAL**	$ 1.351.286.169,59

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 28 DE MAYO DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 02 DE JULIO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS , LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN ES EL INICIO DE LA FASE DE DEMOLICIÓN , LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN SON LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA SOLICITUD DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRAFICO PMT, SOLICITUD DE PIN AMBIENTAL, ELABORACION DE ACTAS DE VECNIDAD Y SOLICITUD DE VISITA IDU PARA OBRAS DE URBANISMO SOBRE EL ANDEN DE LA AK 58, ESQUINA DE LA AK 60 CON AV AMERICAS (ISLETA) Y ESQUINA DE LA AK 60 CON AV AMERICAS (POMPEYANO)

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				retroexcavadora	1	Director de Obra	1	50	50	SI	
						Residente de Obra	1	100	100	SI	
						Residente SST	1	100	100	SI	
						Residente Ambiental	1	100	100	SI	
						Auxiliar Administrativo	1	100	100	SI	
						Ayudante de Obra	1	100	100	SI	
						TOTAL	6				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (jul 02)	2,65%	**3,25%**	**5,13%**	**-1,88%**
Semana 2 (jul 11)	4,99%			
Semana 3 (jul 17)	3,25%			
Semana 4 (jul 25)	0,00%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO
































GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**90,00%**
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**70,00%**
	EJECUTADO		**68,00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

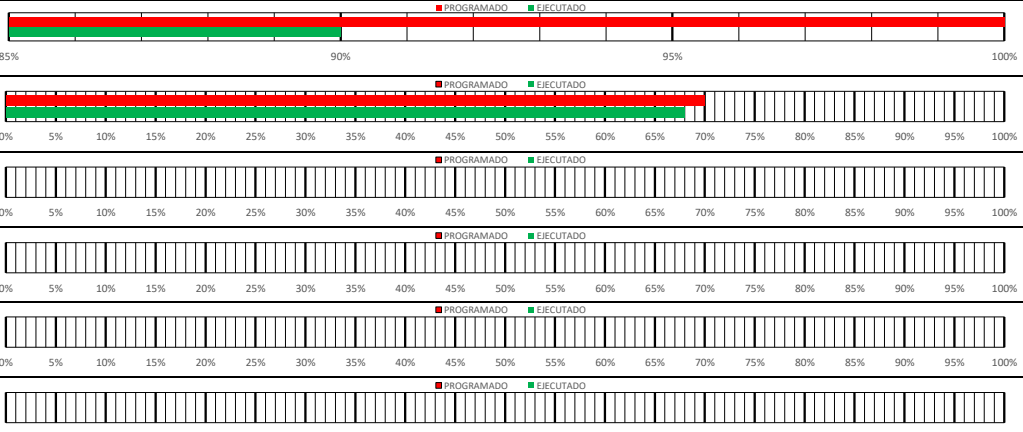

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		50,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
2	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
3	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
4	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
8	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

17	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
21	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
24	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
25	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
27	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
28	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
29	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
30	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Dias	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	64	37	27

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades ejecutadas durante el periodo del 17 al 24 de julio de 2025 corresponden a:
Se retiran cimientos del bloque de dos pisos
Se realiza demolición de muros de bodega de 3 pisos
Se inicia retiro de cimientos de bodega de 3 pisos
Se realiza cargue y retiro de material proveniente de demolición a sitios autorizados.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?				
A la fecha del presente informe se presenta atraso en el inicio del capítulo 2 correspondientes a movimiento de tierras con la actividad de excavación manual.	SI		NO		
	SI		NO	X	
	SI		NO		
	SI		NO		

OBSERVACIONES: De acuerdo al avance de obra; se mantiene la fecha de terminación de la fase de demolición para el dia 31 de Julio de 2025.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1.351.286.169,59	$ 1.351.286.169,59	$ 43.916.800,51	3,25%	$ 1.307.369.369,08	97%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 1.351.286.169,59	$ 1.351.286.169,59				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA			SI		SI	
Ejemplo: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			SI		SI	
Ejemplo: ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS			SI		SI	
Ejemplo: VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			SI		SI	
Ejemplo: ACTAS DE VECINDAD			SI		SI	
Ejemplo: DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA			SI		SI	Se entregaron en original a la FAC
Ejemplo: PLAN DE CALIDAD			SI		SI	
Ejemplo: PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS			SI		SI	
Ejemplo: REVISION PRELIMINAR PROYECTO			SI		SI	
Ejemplo: VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS			SI		SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Después de revisados los compromisos, la entidad autoriza la demolición de la losa existente del bloque de 3 pisos.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

ESTADO DEL CLIMA								
FECHA: SEMANA 3 DEL 17 AL 24 DE JULIO 2025	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
ESTADO: SOLEADO/SECO	9	9			8,75	7,80	9	7,9
ESTADO: LLUVIA LEVE								
ESTADO: LLUVIA FUERTE					0,25	1,20		1,10
TOTALES ACUMULADOS EN HORAS	**9**	**9**	**0**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**

REVISO:

Residente de Obra Firma y Posfirma

ELABORO:

ST PEREZ GUERRERO HEBERTH - SUPERVISOR
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)



Demolición pañete muro convida.



Retiro de cimientos bodega de 3 pisos.



Finalización demolición bodega



Demolición de sobrepiso antigua bodega.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	7/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	31/07/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	25/07/2025	**AL:**	31/07/2025
CONTRATO Nº	005-00COFAC-DIFRA-2025	**CONTRATISTA**	VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO				
FECHA DE INICIO	18/06/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	20/08/2025		

VALOR INICIAL	$ 1.351.286.169,59	**VALOR ADICIONAL**		**VALOR REDUCCION (Si aplica)**		**VALOR TOTAL**	$ 1.351.286.169,59

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 28 DE MAYO DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 02 DE JULIO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS , LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN ES EL INICIO DE LA FASE DE DEMOLICIÓN , LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN SON LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA SOLICITUD DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRAFICO PMT, SOLICITUD DE PIN AMBIENTAL, ELABORACION DE ACTAS DE VECNIDAD Y SOLICITUD DE VISITA IDU PARA OBRAS DE URBANISMO SOBRE EL ANDEN DE LA AK 58, ESQUINA DE LA AK 60 CON AV AMERICAS (ISLETA) Y ESQUINA DE LA AK 60 CON AV AMERICAS (POMPEYANO)

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				retroexcavadora	1	Director de Obra	1	50	50	SI	
				Minicargador	1	Residente de Obra	1	100	100	SI	
				compactador	1	Residente SST	1	100	100	SI	
						Residente Ambiental	1	100	100	SI	
						Auxiliar Administrativo	1	100	100	SI	
						Ayudante de Obra	1	100	100	SI	
						TOTAL	6				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (jul 02)	2,65%	**4,34%**	**4,50%**	**-0,16%**
Semana 2 (jul 11)	4,99%			
Semana 3 (jul 17)	3,25%			
Semana 4 (jul 25)	4,34%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO





































GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**90,00%**
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**90,00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**90,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		**17,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		13,00%
	EJECUTADO		0,00%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO		67,00%
	EJECUTADO		67,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
2	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
3	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
4	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
8	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

17	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
21	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
24	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
25	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
27	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
28	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
29	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
30	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Dias	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	64	44	20

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades ejecutadas durante el periodo del 25 al 31 de julio de 2025 corresponden a:
Se realiza demolición de placa maciza antigua bodega.
Se realiza cargue y retiro de escombro de demolición placa maciza antigua bodega.
Se inicia retiro de cimientos de bodega de 3 pisos.
Se realiza corte y retiro de material viga de cimentación sobre costado de convida de muro divisorio anexo a la bodega.
Se realiza cargue y retiro de material proveniente de demolición a sitios autorizados.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?				
El proyecto presenta un atraso correspondiente al -8,89% debido a que sigue pendiente la visita por parte del IDU, situación externa que afecta la programación de obra.	SI		NO		
	SI		NO	X	
	SI		NO		
	SI		NO		

OBSERVACIONES: Se realizó visita por parte de la entidad en donde se definió tapar la batería sanitaria ubicada en muro lateral convida.
La entidad informó que la pendiente a manejar será del 1% y se remitirá plano detalle para recolección de agua lluvia en cuneta existente de sanidad.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1.351.286.169,59	$ 1.351.286.169,59	$ 58.645.819,76	4,34%	$ 1.292.640.349,83	96%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 1.351.286.169,59	$ 1.351.286.169,59				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA			SI		SI	
Ejemplo: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			SI		SI	
Ejemplo: ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS			SI		SI	
Ejemplo: VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			SI		SI	
Ejemplo: ACTAS DE VECINDAD			SI		SI	
Ejemplo: DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA			SI		SI	Se entregaron en original a la FAC
Ejemplo: PLAN DE CALIDAD			SI		SI	
Ejemplo: PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS			SI		SI	
Ejemplo: REVISION PRELIMINAR PROYECTO			SI		SI	
Ejemplo: VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS			SI		SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La entidad enviará diseños corresondientes a optimización del asfalto.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

ESTADO DEL CLIMA							
FECHA: SEMANA 4 DEL 25 AL 31 DE JULIO 2025	25	26	27	28	29	30	31
ESTADO: SOLEADO/SECO	9			8	8,5	9	9
ESTADO: LLUVIA LEVE				1	0,5		
ESTADO: LLUVIA FUERTE							
TOTALES ACUMULADOS EN HORAS	9	0	0	9	9	9	9

REVISO:

Residente de Obra/ Firma y Posfirma

ELABORO:

ST PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO - SUPERVISOR
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)



Equipo en obra para iniciar excaación mecánica.



Inicio de excavación mecánica



Avance de excavación Tramo 1.



Cargue de volquets material excavado



Limpieza de sumideros existente sobre carrera 13.



Verificación comisión topográfica.

Descripcion concreta de la actividad.

Descripcion concreta de la actividad

CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

INFORME MENSUAL JUNIO - JULIO

CONTRATISTA VERTICAL DISEÑO S.A.S – EN REORGANIZACIÓN

BOGOTA JULIO DE 2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene toda la información referida a la gestión ambiental desarrollada durante el período de reporte, comprendido del **18 de Junio al 31 de Julio de 2025**, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de obra No 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 y cuyo objeto es; “OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”

Se reportan las actividades, controles y seguimientos ambientales realizados durante el periodo correspondiente.

Las acciones desarrolladas están enmarcadas dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y buscan prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos negativos derivados de la ejecución de las actividades constructivas.

COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Dando cumplimiento a los requerimientos se ejecutaron las siguientes actividades:

- Expedición de PIN Ambiental gestionado por radicación del Programa de Manejo ambiental de Residuos de Construcción y Demolición ante la SDA como autoridad ambiental competente.

- Durante el periodo correspondiente del **18 de Junio al 31 de Julio de 2025**, el contratista contó con el siguiente personal asignado a la gestión ambiental del proyecto.

Tabla 1 – Personal Ambiental del Contratista

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACIÓN
Residente Ambiental	Mileidy Mateus Olarte	100%

Fuente: Vertical Diseño SAS-En reorganización

- Se elaboró el informe ambiental mensual de la fase de demolición correspondiente al periodo del **01 al 31 de julio de 2025**, donde se consignan los avances realizados en el área ambiental.

- Se presenta el registro fotográfico correspondiente de las actividades y controles realizados durante el periodo de reporte.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. MANEJO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

1.1. Manejo de Campamento

Dentro del área de campamento del frente de obra, se dispone de un contenedor metálico tipo oficina, destinado a las actividades administrativas y de coordinación del personal. Este espacio se encuentra ubicado estratégicamente para facilitar la supervisión operativa y la atención de visitas técnicas.

El contenedor cuenta con ventilación adecuada, suministro de energía y mobiliario básico (escritorios, sillas, archivador), garantizando condiciones apropiadas de higiene, orden y confort para el personal administrativo.

Periódicamente se realiza limpieza interna, control de residuos generados y verificación de orden. Estas condiciones son fundamentales para el cumplimiento de los lineamientos de gestión ambiental en el entorno de obra.

1.2. Orden, Aseo y Limpieza

Durante el periodo evaluado se llevó a cabo seguimiento al estado de orden y aseo en el frente de obra, incluyendo zonas de tránsito, áreas de almacenamiento, puntos de acopio de residuos, campamento y entorno general del proyecto.

Se evidencio que el personal mantiene en su mayoría un adecuado manejo de residuos con disposición de canecas en puntos estratégicos, recolección periódica de basura y limpieza diaria.

En áreas como el punto ecológico, baños portátiles y zona de campamento, se realizaron labores de limpieza regular con buenos resultados en términos de higiene.

El mantenimiento de estas condiciones es fundamental para garantizar la seguridad en los trabajadores, evitar focos de contaminación y proyectar una imagen responsable del proyecto frente a terceros y autoridades ambientales.

El servicio de limpieza, mantenimiento y disposición final de los vertimientos de las unidades sanitarias es prestado por Soluciones Integrales de Colombia S.A.S.

1.3. Manejo Integral de Residuos Sólidos

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se generarán residuos sólidos en el frente de obra.

Por su parte, los residuos sólidos convencionales generados en el área administrativa del proyecto fueron recolectados en bolsas industriales y entregados a la empresa Área Limpia E.S.P. quien se encarga de la recolección y gestión de los residuos domésticos en la zona, con una periodicidad de tres veces por semana.

1.4. Sitios de disposición final y Sitios De Tratamiento

Durante el periodo evaluado se generaron y dispusieron RCD´s en sitios de disposición final.

Los valores de conversión a toneladas fueron tomados de la Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición - RCD en obra.

Tabla 1 – RCD Generado

INF	PERIODO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TIPO DE RCD	CANTIDAD DISPUESTA m3	CANTIDAD CERTIFICADA m3	TONELADAS	Factor de conversión
1	1 al 31 de julio de 2025	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO	Demolición	590	590	755.2	1,28
1	1 al 31 de julio de 2025	TRACOL	RESPEL	0,39	0,39	0,5	1,28
TOTAL				**590,39**	**590,39**	**755,69**	

Fuente: Vertical Diseño SAS-En reorganización

Se informa que, los factores de conversión han sido tomados de la Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra de la SDA - 2014, páginas 12 y 13.

1.5. Seguimiento al Plan De Gestión RCD

El plan de gestión de RCD presentado tiene como objeto establecer lineamientos técnicos ambientales para las actividades de tratamiento y aprovechamiento de los Residuos de la Construcción y Demolición –RCD– durante la ejecución del contrato, de acuerdo a los parámetros establecidos en las Resoluciones 1257 de 2021 y 472 de 2017. El PIN establecido por la SDA para este contrato es el **27336.**

Los formatos de reporte de las cantidades de RCD generados y dispuestos, se presentan anexos al informe.

1.6. Humectación

La humectación se realiza para evitar las emisiones de material particulado en las actividades de cargue de RCD.
Durante el periodo evaluado, se implementaron medidas de humectación como estrategia de control del material particulado (polvo) generado por el acopio y manipulación de escombros (RCD) en el frente de obra.

Se identificaron áreas críticas con acumulación temporal de escombros y residuos de construcción, las cuales fueron sometidas a riego manual diario con el fin de evitar la dispersión de partículas al aire. Esta acción se llevo a cabo especialmente en condiciones climáticas secas.

El personal encargado aplicó la humectación en capas sucesivas y de forma uniforme, evitando encharcamientos y optimizando la cobertura sobre el material.

La implementación de esta medida ha demostrado ser efectiva en la reducción del polvo en suspensión, minimizando riesgos para la salud del personal y mejorando las condiciones ambientales generales de la obra.


1.7. Manejo Integral de Sumideros

Para el periodo de reporte del presente informe, fue necesaria la implementación de medidas o acciones para proteger y/o aislar los cuerpos de agua presentes en la zona de influencia directa en el frente de obra.
Se implementaron medidas de protección como el uso de polisombra para evitar el ingreso de residuos de construcción.

1.8. Lavado De Maquinaria, Vehículos y Equipos

De acuerdo a lo propuesto, está prohibido desarrollar la actividad de lavado de maquinaria, vehículos y equipos de obra. Durante el periodo de reporte no se realizó esta actividad.

REGISTRO FOTOGRAFICO

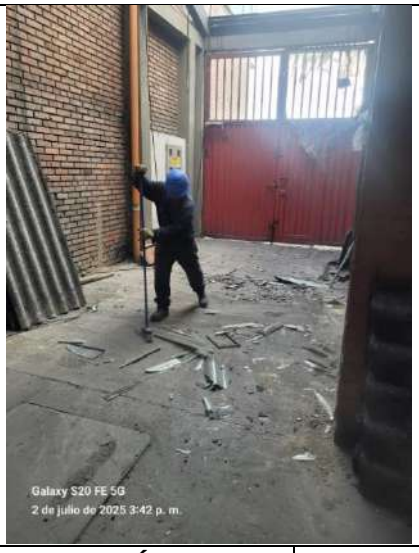			
FOTOGRAFÍA No.	**1**	**FOTOGRAFÍA No.**	**2**
DESCRIPCIÓN	Señalización kit de derrames	**DESCRIPCIÓN**	Orden y aseo
			
FOTOGRAFÍA No.	**3**	**FOTOGRAFÍA No.**	**4**
DESCRIPCIÓN	Traslado de planta	**DESCRIPCIÓN**	Cargue de residuos peligrosos

			
FOTOGRAFÍA No.	**5**	**FOTOGRAFÍA No.**	**6**
DESCRIPCIÓN	Protección de sumideros	**DESCRIPCIÓN**	Trasplante de plantas
			
FOTOGRAFÍA No.	**7**	**FOTOGRAFÍA No.**	**8**
DESCRIPCIÓN	Implementación de PMT	**DESCRIPCIÓN**	Cargue de RCD

			
FOTOGRAFÍA No.	**9**	**FOTOGRAFÍA No.**	**10**
DESCRIPCIÓN	Volqueta carpada	**DESCRIPCIÓN**	Punto ecológico
			
FOTOGRAFÍA No.	**11**	**FOTOGRAFÍA No.**	**12**
DESCRIPCIÓN	Orden y aseo	**DESCRIPCIÓN**	Humectación

			
FOTOGRAFÍA No.	**13**	**FOTOGRAFÍA No.**	**14**
DESCRIPCIÓN	Limpieza de baños	**DESCRIPCIÓN**	Punto ecológico

CERTIFICACIONES DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 6548756888964334678136

La empresa **VERTICAL DISEÑO SAS** identificado con NIT No. **900246243 – 4 EQUIPAMIENTO DISPENSARIO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC**, **AC 13 # 58 - 51,** por intermedio de **DEMOLICIONES PINZON LOPEZ SAS** identificado con NIT No. **900419994 – 0,** entregó a TRACOL S.A.S. ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA44152	TEJAS DE ASBESTO	04/07/2025	395	TEJAS DE ASBESTO		Y36 Asbesto (polvo y fibras)	

El material e trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio a TRACOL SAS ESP NIT.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (28) días del mes (Diciembre) de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

TRACOL
TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 6548756888964334678142

La empresa **VERTICAL DISEÑO SAS** identificado con NIT No. **900246243 – 4 EQUIPAMIENTO DISPENSARIO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC**, **AC 13 # 58 - 51,** por intermedio de **DEMOLICIONES PINZON LOPEZ SAS** identificado con NIT No. **900419994 – 0,** entregó a TRACOL S.A.S. ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA44173	TECHO FIBRAS DE VIDRIO CON ASBESTO	08/07/2025	115	FIBRAS DE VIDRIO		Y36 Asbesto (polvo y fibras)	

El material e trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio a TRACOL SAS ESP NIT.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (28) días del mes (Diciembre) de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A001666-046-2025

Generado el : 2025-07-26

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma DEMOLICIONES PINZON LOPEZ SAS identificada con NIT 900.419.994-0 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero VERTICAL DISEÑO SAS identificada con el Nit 900.246.243-4 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-06-10 al 2025-07-25 para la obra EQUIPAMENTO DISPENSARIO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC, cuyo objeto es: DEMOLICION MECANICA Y MANUAL con pin de obra 27336, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Concreto	15	200	256
Heterogéneo	26	390	499.2
Totales	41	590	755.2
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2025-07-26, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27336	
Nombre o razón social	VERTICAL DISEÑO SAS	
Documento de identificación o NIT	900.246.243-4	
Representante Legal	HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS	
Dirección domicilio	calle 183 7 37	
Teléfono	3185326743	
Correo electrónico	DEMOLICIONESPINZONLOPEZ20@GMAIL.COM	
Dirección de generación de RCD	CALLE 13 58 51	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	590 m3 en Toneladas 755.2
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	590 m3 en Toneladas 755.2
Fecha de recepción de los RCD	10 de junio al 25 de julio de 2025



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

QR



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PMA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

VERTICAL DISEÑO SAS – EN REORGANIZACIÓN

2025

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

TABLA DE CONTENIDO

1. DEFINICIÓN 2
2. OBJETIVOS 2
2.1. OBJETIVO GENERAL 2
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2
3. ALCANCE 3
4. POLÍTICA AMBIENTAL 4
5. MARCO JURÍDICO 5
6. DEFINICIONES 5
7. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 11
8. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 12
8.1. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 12
8.1.1. RECURSO AIRE. 12
8.1.2. RECURSO AGUA. 13
8.1.3. RECURSO SUELO. 14
8.2. PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS. 14
8.2.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS. 14
8.2.2. RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES. 17
9. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 19
10. PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 22

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

1. DEFINICIÓN

Plan de Manejo Ambiental – PMA, es un "conjunto detallado de actividades que producto de una evaluación ambiental, está orientado a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Este incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto obra o actividad" (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales).

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El plan de manejo ambiental tiene como objetivo formular las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos durante las actividades comprendidas en las obras de ingeniería civil de **VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACIÓN.**

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Proponer un conjunto de medidas de prevención, control, corrección, compensación y mitigación de los efectos sobre el ambiente que pudieran resultar de la ejecución del proyecto

- ✓ Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante la ejecución del proyecto.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

- ✓ Establecer lineamientos para responder en forma oportuna y rápida a cualquier contingencia que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

- ✓ Minimizar los posibles daños a la comunidad y su ambiente.

3. ALCANCE

El presente Plan de manejo ambiental, aplica para las actividades contempladas en los proyectos de **VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACIÓN.**

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

4. POLÍTICA AMBIENTAL

VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACIÓN, conforme al compromiso hacia el medio ambiente, parte de la premisa de "**respeto al medio ambiente"** en el desarrollo de todas sus actividades.

Para llevar a cabo su política medioambiental, atiende no sólo a las necesidades del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, las que en el futuro el medio ambiente y la sociedad en su conjunto van a requerir.

En consecuencia, tanto la política, como las estrategias y los objetivos derivados de ella son revisados anualmente a fin de adaptarlos a los nuevos requerimientos.

Los principios básicos que rigen esta política son los siguientes:

- ✓ Optimizar el consumo de los recursos naturales.
- ✓ Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios.
- ✓ Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes.
- ✓ Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la población y los ecosistemas.
- ✓ Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la gestión ambiental.
- ✓ Minimizar y aprovechar los residuos.

HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS

Representante Legal

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

5. MARCO JURÍDICO

La legislación colombiana en materia de manejo ambiental establece varias normas, entre ellas podemos destacar:

DECRETO 1076 DE 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

DECRETO 2028 DE 2010:

RESOLUCIÓN 472 DE 2015: Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción.

6. DEFINICIONES

Almacenamiento temporal: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.

Ambiente: Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u objeto. El ambiente de un individuo comprende dos tipos de constituyentes, el medio puramente físico o abiótico, en el cual él existe (aire, agua) y el componente biótico que comprende la materia orgánica no viviente y todos los organismos, plantas y

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

animales de la región, incluida la población específica a la que pertenece el organismo.

Aprovechamiento: Es la utilización de residuos mediante actividades tales como separación en la fuente, recuperación, transformación y reúso de los mismos, permitiendo la reincorporación en el ciclo económico y productivo con el fin de generar un beneficio económico y social y de reducir los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana asociados con la producción, manejo y disposición final de los residuos.

Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público exceptuando aquellos espacios cerrados y con restricciones de acceso

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente

Barrido y limpieza: Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado.

Bioseguridad: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el ambiente.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

Caja de almacenamiento: Es el recipiente metálico o de otro material técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones herméticas y que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales.

Contaminación ambiental: La presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios, en lugares, formas y concentraciones tales que afectan negativamente el entorno y las condiciones de vida, así como la salud o la higiene de los seres vivos.

Cultura de la no basura: Es el conjunto de costumbres y valores tendientes a la reducción de las cantidades de residuos generados; así como al aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables.

Disposición final controlada: Es el proceso mediante el cual se convierte el residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras.

Eliminación: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición final o a la recuperación de recursos.

Escombros: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al manejo y traslado de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de aprovechamiento o disposición final.

Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es usuario del servicio.

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.

Grandes generadores o productores: Son los usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro cúbico mensual.

Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos

Medidas de Compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y entorno natural por los impactos o efectos

negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puede ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Medidas de Corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

Medidas de Mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

Medidas de Prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que puedan generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

Micro ruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o del barrido manual o mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia predeterminada.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y protozoos

Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen.

Minimización de residuos en procesos productivos: Es la optimización de los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.

Pequeños generadores o productores: Es todo usuario no residencial que genera residuos sólidos en volumen menor a un metro cúbico mensual.

Persona prestadora del servicio público de aseo: Es aquella encargada de todas, una o varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994.

Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las

personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos.

Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos y similares del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador.

Segregación: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los residuos y similares en el momento de su generación, conforme a la clasificación establecida.

7. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

VERTICAL DISEÑO SAS – EN REORGANIZACIÓN , es una empresa colombiana dedicada al diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería civil. Está ubicada en la

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

ciudad de Bogotá D.C.. y cuenta con una sede administrativa en la CR 59 N° 152-25

Representante Legal: Hector William Baez Ramos

8. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.

8.1. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

8.1.1. RECURSO AIRE.

Objetivo: Prevenir y minimizar los impactos negativos al recurso AIRE
Lugar de aplicación: Locaciones De Instalación
Responsable: personal SSTA
Aspecto ambiental: Generación de emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión
Impacto identificado: Contaminación del aire

Medidas Propuestas	Indicadores	Medios de Verificación	Plazos		
			Inicio	Periodicidad	Finalización
Transportar cubierto el material para resanes, desde el sitio de carga hasta el de descarga.	No. carretillas cubiertas /No. carretillas utilizadas	Registro fotográfico		Cada vez que se requiera.	
Mantener húmeda la zona del proyecto, al realizar regatas, cuando el movimiento de escombros conlleve la generación de polvo en cantidades considerables.	Áreas regadas / Área total del terreno.	Registro fotográfico		Cada vez que se requiera.	
Los trabajos se realizarán solo en los horarios permitidos por el cliente, para controlar la contaminación atmosférica producida por el ruido.	No. De horas diarias trabajadas / No. De horas de trabajo establecidas.	Registro de horas laborales durante la adecuación.		Permanente	

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

8.1.2. RECURSO AGUA.

Objetivo: Prevenir y minimizar los impactos negativos al recurso AGUA
Lugar de aplicación: Locaciones De Instalación
Responsable: personal SSTA
Aspecto ambiental: Generación efluentes
Impacto identificado: Contaminación del agua

Medidas Propuestas	Indicadores	Medios de Verificación	Plazos		
			Inicio	Periodicidad	Finalización
Instalar de forma temporal las baterías sanitarias. Todos los desagües de aguas servidas de estos se conectaran a la red pública a través de una caja de revisión provisional en el terreno.	No. De baterías instaladas / No. De baterías programadas	Registro de instalación de las baterías Registro fotográfico		Permanente	
Utilizar recipientes plásticos o tanques para recoger los restos de agua resultante del lavado de las herramientas de trabajo que tienen contacto tanto con morteros como residuos de hormigón etc.,	No. De recipientes utilizados / No. De recipientes requeridos	Registro de compra de los recipientes Registro fotográfico		Cada vez que se requiera.	

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

8.1.3. RECURSO SUELO.

Objetivo: Prevenir y minimizar los impactos negativos al recurso SUELO
Lugar de aplicación: Locaciones De Instalación
Responsable: personal SSTA
Aspecto ambiental: Derrames, infiltraciones, liqueos
Impacto identificado: Contaminación del suelo

Medidas Propuestas	Indicadores	Medios de Verificación	Plazos		
			Inicio	Periodicidad	Finalización
Disponer de un espacio exclusivo en el cual se realizará la carga y descarga de escombros y provisión de materiales.	Espacio implementado / Espacio requerido.	Registro fechado		Permanente	
Mantenimiento de equipos, maquinaria y vehículos en talleres técnicos especializados, fuera del área del proyecto	No. de mantenimientos realizados/ No. de mantenimientos programados	Registro fechado		Cada vez que se requiera.	

8.2. PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS.

8.2.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS.

Objetivo:

Prevenir, tratar y disponer los residuos/desechos no peligrosos.

Manejo de residuos de obra civil

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

- Disponer de un espacio exclusivo en el cual se realizará la carga y descarga de escombros y provisión de materiales.
- Mantenimiento de equipos, maquinaria y herramientas en talleres técnicos especializados, fuera del área del proyecto
- La recolección de los residuos al interior de la obra, se adelantarán con frecuencia semanal para su traslado al sitio de almacenamiento, el cual contara con todas las protecciones del caso contra la lluvia, el sol y el viento.

Manejo de residuos metálicos

- Separar y almacenar adecuadamente los residuos metálicos sobrantes de las obras de instalación, como: tuberías, cajas eléctricas, recortes de cables de cobre y aluminio, herrajes, soportes, tornillos, etc.

Manejo de residuos en la oficina

- Realizar campañas de información y concienciación entre los empleados para la correcta separación y gestión de residuos.

- Informar a los empleados de los peligros de los productos químicos que se pueden emplear habitualmente; así se reducen los accidentes laborales y los riesgos de contaminantes.

- Aplicar la regla de las 3R's Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

- Hacer un inventario donde conste cada tipo de residuo, la cantidad y periodicidad con que se produce y su destino final.

- Separar los residuos y acondicionar un contenedor para separar cada tipo en función de sus posibilidades y requisitos de gestión.

- Utilizar, en la medida de lo posible, papel reciclado.

- Eliminar el uso de productos que pueden convertirse en residuos peligrosos (como aquellos que tienen PVC).

- Depositar en puntos limpios los residuos que no tienen sistemas de recogida convencionales o que son peligrosos.

- Evitar el uso de elementos desechables.

- No verter a la red de saneamiento público los restos de productos de limpieza ya que son tóxicos y muy perjudiciales para el medio acuático.

- Utilizar las cantidades mínimas recomendadas por los fabricantes de productos de limpieza, para evitar la contaminación del agua.

- No verter nunca a la red de saneamiento productos sólidos, líquidos o gases combustibles, inflamables o explosivos; ni irritantes, corrosivos o tóxicos.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

- Tampoco se deben verter materiales que puedan provocar obstrucciones y averías (productos de higiene, restos de comida, aceites, etc.).

8.2.2. RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES.

Objetivo:

Prevenir, tratar y disponer los residuos/desechos peligrosos y/o especiales.

Manejo de residuos por cambio de luminarias

- Generación del residuo, desmonte de luminaria o lámpara fluorescente fundidos y/o en desuso para desecho.

- Retirar la luminaria y llevarla hasta la zona de almacenamiento.

- Los tubos fluorescentes ya gastados se embalarán tal como vienen de fábrica, de forma individual con el protector de cartón y posteriormente en una caja de cartón de mayor tamaño de forma que puedan ser transportados sin riesgo de rotura. Esta caja irá rotulada como “Tubos fluorescente usados” y se cerrará con cinta adhesiva.

- Las cajas con los tubos fluorescentes usados, se entregarán a una empresa especializada en su recolección.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

- Excepcionalmente, en caso de no contar con cajas para embalar los tubos fluorescentes, se podrán sujetar en pequeños grupos con cinta adhesiva para evitar su caída y rotura, y se apilarán en un sitio seguro.

- Las bombillas de bajo consumo se recogerán en cajas de cartón, sin exceder su capacidad, y se cerrarán e identificarán.

- Las lámparas que se recolecten, se guardarán en caja de cartón, de manera que queden cubiertas y protegidas completamente.

- Realizar embalaje por tipo o código de luminaria en cajas de cartón embaladas por 10 o 12 unidades, que permitan contar con un índice de pesaje y almacenarlas por paquetes.

- Los tubos fluorescentes se colocarán dentro de una bolsa resistente, sellada y etiquetada como: **TUBOS FLUORESCENTES - SUSTANCIA PELIGROSA: CONTIENE MERCURIO Y VIDRIO.**

- Realizar un registro mensual en el formato para RESPEL.

- Ubicar los residuos en el lugar acondicionado en la zona de almacenamiento. (si es posible, almacenar los residuos en contenedor de plástico hermético o metálico).

- Programar la recolección con el gestor autorizado.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

9. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Objetivo

Capacitar a todo el personal que hace parte del proyecto sobre los temas de seguridad y salud en el trabajo y calidad ambiental, entre otras; para minimizar la posibilidad de que se presenten accidentes de trabajo y ambientales por falta de conocimiento de los trabajadores.

Impactos ambientales

- Afectación de la salud del personal que laborará en la obra y de la comunidad en general por causa de accidentes de trabajo, causados por desconocimiento y/o falta de capacitación.

- Alteraciones al medio ambiente.

Plan de acción

- Se debe elaborar un plan de capacitación en el cual se incluyan los siguientes temas:

a) Inducción y capacitación técnica

- Antes de iniciar actividades, se debe realizar una capacitación en la cual se den a conocer los procedimientos y la forma en que se deben llevar a cabo

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

cada una de las actividades relacionadas con sus funciones y responsabilidades dentro de la obra.

b). Manejo ambiental

- Se presentará al personal cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental, con el fin de dar una visión integral del proyecto.

- El personal de la obra debe conocer las funciones y responsabilidades contempladas por el Plan de Manejo Ambiental de cada una de las partes interesadas del proyecto.

- Se realizarán actividades de adecuada segregación en la fuente para evitar la contaminación de materiales y/o la mala disposición de los mismos.

c). Las que se consideren necesarias en el transcurso del desarrollo del proyecto

- En las capacitaciones se debe incluir la normatividad vigente que se debe seguir para la correcta ejecución de las diferentes actividades involucradas en el desarrollo del proyecto.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

- En caso de ingreso de personal nuevo al proyecto, este debe recibir un ciclo completo de capacitación antes de su vinculación.

- Las capacitaciones deben ser reforzadas periódicamente (mensualmente). Los temas y las frecuencias de capacitación de personal pueden cambiar de acuerdo a las necesidades detectadas durante el desarrollo del proyecto.

d. Informes

- Después de realizar las actividades de capacitación, se dejará constancia de dicha actividad, en el cual se registrará el nombre de las personas que asistieron, expositor o conferencista, temas tratados, entre otros.

- Presentar los certificados de experiencia laboral del personal de la obra, en el cual se compruebe la capacidad técnica de cada operario para realizar el cargo al que aspira

e. Evaluación de las capacitaciones

- La forma para evaluar las actividades de capacitación será por medio de inspecciones o visitas en la obra, en la cual se determinará el seguimiento de las recomendaciones dadas por el director del programa en las diferentes capacitaciones.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

10. PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Objetivo

- Informar a las partes interesadas, sobre las características y políticas del proyecto, sus impactos ambientales

Impactos ambientales

- Inconformidad de alguna de las partes interesadas que pueda sentirse ambientalmente afectada por la ejecución del proyecto.

Plan de acción

- Resolver las dudas y expectativas que pueda generar el proyecto.

- Contar con participación externa de las partes interesadas y afectadas por la ejecución del proyecto, buscando la preservación de sus derechos y el cumplimiento de sus derechos ambientales.

- Antes de iniciar las obras civiles del proyecto se presentarán las medidas de manejo ambiental planteadas a las diferentes partes interesadas; esto con el propósito de concertarlas y evitar posteriores molestias. Si estas medidas son aprobadas, se levantará un acta de la concertación en la cual se deben consignar los acuerdos y estos son de obligatorio cumplimiento para la empresa y para las partes comprometidas.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

- Se debe facilitar a toda la población interesada del proyecto, la obtención de información y la solución de inquietudes que se generen a partir de la obra.

- Se deben crear mecanismos formales e informales para promover el intercambio de información, la colaboración y cooperación entre las diferentes partes encargadas del correcto desarrollo del proyecto.

- Se deben crear los mecanismos para recopilar información necesaria y difundirla entre las partes interesadas.

Cra. 59 No. 152-25 Piso 3 Bogotá D.C.
profesionales.vertical@gmail.com Tel. 6012205326 Cel. 3002654785

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PG-RCD

CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (PMA-RCD)

VERSIÓN 1



CONTRATISTA VERTICAL DISEÑO S.A.S – EN REORGANIZACIÓN

BOGOTA JUNIO DE 2025

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (PMA-RCD)

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION MODIFICACIONES	FOLIOS
1	20/06/2025	Emisión del Documento	

CONTRATISTA - VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACIÓN	
Elaborado por:	**Revisado por:**
	
Ing. Mileidy Mateus Olarte **Cargo: Residente Ambiental**	**Arq. María José Chocontá Martínez** **Cargo: Director de Obra**

SUPERVISOR -	
Aprobado y/o Validado por:	**Aprobado por:**
	
S.T. Heberth Gustavo Perez Guerrero **Cargo: Supervisor Principal**	**CT. Jonathan Rodriguez Gómez** **Cargo: Supervisor Suplente**

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. ALCANCE 6
3. OBJETIVOS 8
   3.1. OBJETIVO GENERAL 8
   3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 8
4. MARCO NORMATIVO 9
5. GLOSARIO 13
6. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 18
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS A DESARROLLAR 19
   7.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCION Y REDUCCION DE GENERACION DE RCD 19
7.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 22
8. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR 23
9. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION SELECTIVA 24
10. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN LA OBRA 25
11. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN LA OBRA Y FUERA DE ESTA. 27
12. GESTORES DE RCD 30
13. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD 31
   13.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR EXTERNO) Y DISPOSICION FINAL. 33
   13.2 INDICADORES RCD 36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 *Información del contratista* 18
Tabla 2 *Volumen de residuos sólidos proyectados* 23
Tabla 3 *Gestores de RCD* 30
Tabla 4 *Cronograma de capacitaciones PMA-RCD año 2025* 32
Tabla 5 *Modelo para el reporte de los RCD generados* 34
Tabla 6 *Indicadores de gestión* 36

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Ficha Técnica resumen de la obra

Anexo 2. Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra

Anexo 3. Informe de Aprovechamiento In Situ

Anexo 4. Estimación costos manejo RCD

Anexo 5. Declaración responsabilidad

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de prevenir, mitigar, restaurar y compensar los impactos ambientales generados durante el proceso constructivo del contrato de obra No 005-00-A-COFAC-DIFRA cuyo objeto es: *"Obra pública para el cumplimiento del plan de regularización y manejo del dispensario conjunto de sanidad militar ARC-FAC en la ciudad de Bogotá D.C.", VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACIÓN* plantea una herramienta que se orienta a la gestión eficaz para el control de los residuos, en aras de optimizar recursos que solo tienen disposición final, para que dichos residuos se conviertan en objeto de reutilización en la ejecución de las obras.

En este sentido el plan de gestión que se propone agrupa en un mismo documento la generación de residuos producto de las actividades constructivas. Estos materiales según sus características pueden ser o no ser reciclados. Considerando lo anterior, es necesario tener en cuenta que el plan de gestión de residuos de construcción y demolición RCD en la obra cumplirá lo establecido en la Resolución 0472 de 2017 y en la Resolución 1257 de 2021.

Las medidas contempladas en este plan plantean una herramienta que nos permitirá el control adecuado de los residuos generados, fomentando una cultura de reutilización y aprovechamiento de la materia prima derivado del proceso constructivo; además de minimizar los impactos ambientales en el desarrollo de las diferentes etapas del proceso constructivo orientando a todo el personal involucrado en el proyecto al manejo y control adecuado de los residuos generados, conduciéndolos a una adecuada disposición final. Cabe mencionar que los datos para la elaboración del PGRCD fueron obtenidos de las cantidades del presupuesto inicial del contrato de obra No 005-00-A-C

2. ALCANCE

El alcance del programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición PMA – RCD, tendrá cobertura en el desarrollo de la etapa constructiva del Contrato de obra No 005-00-A-COFAC-DIFRA, cuyo objeto es *"Obra pública para el cumplimiento del plan de regularización y manejo del dispensario conjunto de sanidad militar ARC-FAC en la ciudad de Bogotá D.C*". Este documento permitirá evidenciar el potencial del material generado por las actividades de construcción realizadas a lo largo del tramo de obra.

Este Plan aplica para todas las actividades que generan residuos de construcción y demolición-RCD, durante el desarrollo del proyecto; así mismo se tendrán en cuenta los residuos que se clasifican como residuos aprovechables y no aprovechables, y se destinarán recursos físicos (volquetas, cargadores, canecas, bolsas) y humanos (Brigada de aseo, residentes, inspectores, operarios).

Para este caso, el Contrato de obra No 005-00-A-COFAC-DIFRA le corresponde el Proyecto Urbanistico denominado EQUIPAMIENTO DISPENSARIO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC BOGOTÁ D.C. generando material RCD para su reutilización o disposición final.

A continuación, se presentan la localización del proyecto:

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN GENERAL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR



Fuente: Google Maps

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar las herramientas necesarias y adecuadas para garantizar un manejo correcto de los RCD, de tal manera que nos permita adoptar estrategias para minimizar la disposición y maximizar el aprovechamiento y reutilización de los RCD, en cumplimiento de la normatividad ambiental, las obligaciones contractuales, guías y manuales, durante la ejecución del contrato de obra No 005-00-A-COFAC-DIFRA, el cual tiene como objeto *"Obra pública para el cumplimiento del plan de regularización y manejo del dispensario conjunto de sanidad militar ARC-FAC en la ciudad de Bogotá D.C*", de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución 0472 de 2017 y en la Resolución 1257 de 2021.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar los residuos de construcción y demolición RCD que se van a generar en el proyecto.

- Establecer la meta de aprovechamiento de RCD de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1257 de 2021.

- Establecer las medidas y actividades necesarias para la gestión adecuada de los RCD generados en el Proyecto.

4. MARCO NORMATIVO

Este numeral relaciona la normatividad ambiental vigente, aplicable para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición, así:

- **Decreto Ley 2811 de 1974**, Artículo 34 y 35 establece que, para el manejo de los residuos sólidos, basuras, desechos y desperdicios, se deben tener en cuenta varias reglas para su minimización y aprovechamiento basados en la búsqueda de nuevas tecnologías e investigaciones científicas.

- **Resolución 541 de 1994**, "Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación"

- **Decreto Nacional 948 de 1995**, que "Reglamenta en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire".

- **Decreto Distrital 357 de 1997**, "Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición

  final de escombros y materiales de construcción".

- **Ley 769 de 2002**, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre".

- **Acuerdo 79 de 2003**, del Concejo de Bogotá, "Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá". Artículo 85.

- **Resolución 556 de 2003**, del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente

  "Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en fuentes móviles".

- **Decreto 838 de 2005**, por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones señala: "Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de un programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida por el municipio o distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la sustituya, modifique o adicione y demás disposiciones ambientales vigentes.

- **Decreto 4741 de 2005**, "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral"

- **Decreto Distrital 312 de 2006**, articulo 26 mediante el cual se adoptó el "Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos", establece como uno de sus objetivos "Lograr un equilibrio regional en el manejo de los residuos sólidos, articulado las infraestructuras, procesos y equipamientos del Sistema, a fin de alcanzar las mayores economías de escala en la prestación del Servicio Público de Aseo, con particular referencia a la localización de infraestructuras de disposición final, tratamiento, reciclaje y aprovechamiento de residuos ordinarios secos, peligrosos, escombros y orgánicos que responda a las características de territorio diverso en el valor ambiental de la Estructura Ecológica Principal.

- **Acuerdo 257 de 2006**, por el cual se dictaron normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, dispuso como función de la Secretaría Distrital de Ambiente la de trazar los lineamientos y políticas, de conformidad con el Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión Ambiental, en lo referente a la Disposición y Manejo Integral de Residuos Sólidos.

- **Decreto Distrital 312 de 2006**, "Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital".

- **Decreto 620 de 2007**, "Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y construcción de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital".

- **Ley 1259 de 2008**, "Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones".

- **Decreto 3695 de 2009**, "Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones".

- **Decreto 034 de 2009**, Establece condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital. Determina que la movilización de vehículos y maquinaria industrial y/o de construcción deberá efectuarse entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente.

- **Acuerdo 417 de 2009 del Concejo de Bogotá**, "Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".

- **Resolución No. 2397 de 2011**, esta Secretaría reguló técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de los escombros en el peímetro urbano del Distrito Capital

- **Resolución Distrital 01115 de 2012**, de la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por la cual se regula técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital".

- **Memorando No. 2012IE107218 del 04 de septiembre de 2012**, la Subdirección de

Control Ambiental al Sector Público solicitó la modificación de la Resolución No. 2397 de
2011 "derivada de la necesidad de precisar aspectos técnicos importantes para el
ejercicio eficiente y eficaz por parte de la autoridad ambiental en el marco del programa Basura Cero – Proyecto de escombros cero- del Plan de Desarrollo Bogotá Humana…". Así mismo, ajustar el concepto de escombro a aquel utilizado en la terminología internacional que involucra los residuos objeto de aprovechamiento y/o tratamiento y los denomina "Residuos de Construcción y Demolición – RCD-".

- **Memorando No. 2012IE113646 del 19 de septiembre de 2012**, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público definió los lineamientos técnicos ambientales que deben cumplir las personas encargadas del tratamiento y/o aprovechamiento de los residuos de la construcción y demolición –RCD- en el Distrito Capital, como actividad complementaria del servicio de aseo.

- **Acuerdo 515 de 2012**, "por el cual se reglamenta el Comparendo Ambiental en el Distrito Capital.

- **Resolución Distrital 00715 de 2013**, por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico-ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito capital.

- **Decreto 2981 de 2013**, "Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo."

- **Resolución 1138 de 2013**, de la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción y se toman otras determinaciones".

- **Decreto 364 de 2013**, "Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. ,adoptado

mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004. “

- **Resolución Distrital 932 de 2015**, de la Secretaría Distrital de Ambiente, “Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012

- **Resolución 472 de 2017**, «Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones.» Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- **Decreto 840 de 2019**, “Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

- **Resolución 1257 de 2021**, «Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones» Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

5. GLOSARIO

- **Almacenamiento o acopio:** Es la acción de colocar temporalmente los RCD en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.

- **Aprovechamiento:** Es el proceso mediante el cual a través de la recuperación de los materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición, se realiza su reincorporación al ciclo económico productivo en forma ambientalmente eficiente por medio de procesos como la reutilización y el reciclaje

- **Centro de acopio:** Lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o separados y clasificados según su potencial de reuso o transformación.

- **Centro de transferencia:** Sitio adicional autorizado propiedad de un Centro de Aprovechamiento de RCD destinado para el acopio temporal de RCDs aprovechables, cuya operación está dirigida a acortar distancias para el transportador, es de aclarar que el traslado del material a los Centros de Aprovechamiento se convierte desde allí en responsabilidad del operador del Centro de transferencia. (En estas zonas solo se acopia material que podrá aprovechar el Centro de Aprovechamiento de RCD que servirán para la elaboración de materiales de construcción). En ningún caso este podrá realizar labores de transformación. Estos Centros de transferencia deberán cumplir con las mismas condiciones ambientales exigidas a los Centros de Aprovechamiento de RCD y se autorizarán previo concepto de la SDP para su localización y de la SDA para funcionamiento. Las empresas que deseen contar con centros de transferencia deberán realizar el trámite ante la SDA.

- **Centros de tratamiento y/o aprovechamiento:** sitios en donde se podrán realizar actividades de separación, clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de los escombros implementando las medidas ambientales que manejen los impactos generados. Los Centros de tratamiento y/o aprovechamiento, pueden ser: Fijos: son instalaciones que funcionan al interior de un predio cerrado, cuya maquinaria se encuentra fija; Móviles: son instalaciones y maquinarias que están acondicionadas para el desplazamiento a los sitios de generación de los escombros.

- **Escombro:** Todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la realización de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas.

- **Generador:** Persona natural o jurídica propietaria o administradora del bien público o privado en el que se desarrollen obras de excavación, construcción, demolición y/o remodelación o entidades responsables de la ejecución de obras públicas.

- **Grandes generadores:** Son los usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro cúbico mensual. También se considera gran generador las personas jurídicas de derecho público que realizan obras públicas, tales como redes urbanísticas de acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, vías, puentee, túneles, canales e interceptores hidráulicos, entre otros.

- **Gestor integral:** Persona natural o jurídica autorizada que realiza actividades de tratamiento, aprovechamiento, disposición final y transporte de RCD aprovechables.

- **Pasivo minero:** Zona de explotación minera que ha sido abandonada o inactiva y a la cual no se le ha adelantado su Plan de Manejo de Recuperación y Restauración Ambiental – PMRRA.

- **Pequeños generadores o generadores domiciliarios:** Los usuarios y/o suscriptores del servicio público de aseo que realizan reformas locativas menores en sus predios de uso habitacional.

- **Plan de gestión de RCD en la obra:** Se trata de un documento basado en la elaboración de unos formatos y un documento explicativo para su correcta implementación. Dichos formatos, una vez diligenciados, conformaran los apartados que estipula la Resolución
01115 de 2012.

- **Planta móvil:** Maquinaria portátil disponible para realizar transformación de RCD en Centros de Aprovechamiento o en frentes de obra.

- **PIN:** Número único de inscripción ante la Secretaría Distrital de Ambiente para generadores, transportadores, Centros de Aprovechamiento, Sitios de Disposición final y Gestores Integrales.

- **Poseedor:** Es el generador de los residuos o cualquier persona natural o jurídica, que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos.

- **Reciclaje:** Proceso mediante el cual se procesan y transforman los residuos de construcción y demolición, para valorizar su potencial de reincorporación como materia prima o insumos para la obtención de nuevos productos.

- **Recolección:** Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores efectuada por el concesionario del servicio.

- **Residuos de construcción y demolición – RCD-:** Se refiere a los residuos de construcción y demolición que se generan durante el desarrollo de un proyecto constructivo, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes tipos:

- **Residuos de construcción y demolición – RCD- susceptibles de aprovechamiento:**
  - Productos de excavación, nivelaciones y sobrantes de la adecuación del terreno:
    tierras y materiales pétreos no contaminados productos de la excavación, entre otros.
  - Productos usados para cimentaciones y pilotajes: Arcillas, bentonitas y demás.
  - Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos, entre otros.
  - No pétreos: vidrios, aceros, hierros, madera, plásticos, metales, cartones, yesos, dry Wall, entre otros.

- **Residuos de construcción y demolición – RCD- no susceptibles de aprovechamiento:**
  - Materiales aprovechables contaminados con residuos peligrosos.
  - Materiales que por su estado no pueden ser aprovechados.
  - Residuos peligrosos: este tipo de residuo debe ser identificado y manejado de acuerdo a los protocolos establecidos para cada caso.
  - Otros residuos con normas específicas: Amianto, asbesto cemento (tejas de Eternit) electrónicos, biosanitarios, etc. y demás que aparezcan en terreno. Incluir las definiciones de acuerdo a las normativas vigentes

- **Residuos ordinarios:** Son la parte de los residuos urbanos generada en los edificios, con excepción de:

- animales domésticos muertos, muebles y enseres;
- residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición, procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

- **Reutilización:** Es la prolongación de la vida útil de los escombros recuperados que se utilizan nuevamente, sin que para ello se requieran procesos adicionales de transformación.

- **Ruta:** Es la trayectoria sobre un mapa, del recorrido necesario para recoger los RCD en un lugar y llevarlos a otro, típicamente desde el punto de generación hasta el sitio de acopio, aprovechamiento y/o tratamiento o disposición final.

- **Transportador:** Cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de recolección y traslado de RCD en distintos puntos de generación, pudiendo asumir o no la titularidad de los mismos.

- **Tratamiento:** Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos de construcción y demolición, incrementando sus posibilidades de reutilización o y se minimizan los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana.

- **Trazabilidad:** Conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos que permiten conocer el origen, tipo, ubicación, cantidad y la trayectoria, en este caso de los RCD, en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas, así como los históricos de origen, tipo, ubicación, cantidad y trayectoria para un periodo de tiempo determinado.

- **Sitio de disposición final:** Lugar autorizado destinado para recibir y acopiar de forma definitiva el material residual del aprovechamiento en las plantas y todo aquel RCD pétreo que por sus características físicas no pudo ser objeto de aprovechamiento

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El contrato cuyo alcance es *"demolición de la bodega, cesión del espacio público al distrito y acondicionamiento urbanístico, construcción de parqueadero, mantenimiento de pompeyanos y de andenes"* Tiene una duración de tres (03) meses.

TABLA 1 ***INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA***

NOMBRE CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACIÓN
NIT	900.246.243-4
No. DEL CONTRATO	No 005-00-A-COFAC-DIFRA
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.351.286.169,59
PLAZO TOTAL	03 MESES
FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE EMPALME –3 SEMANAS
	FASE DE CONSTRUCCIÓN – 5 SEMANAS
	FASE DE ENTREGA – 1 SEMANA
FECHA INICIO DEL CONTRATO	06 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	20 DE AGOSTO DE 2025
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS
RESIDENTE AMBIENTAL	MILEIDY MATEUS OLARTE

Fuente: Vertical Diseño

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS A DESARROLLAR

A continuación, se presenta la descripción general de las actividades que se adelantaran durante la ejecución de la obra del Contrato de Obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA.

7.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCION Y REDUCCION DE GENERACION DE RCD

Teniendo en cuenta que como fundamento primordial esta la disminución de los residuos de construcción y demolición en el desarrollo del proyecto, se presentan a continuación algunas actividades tendientes a lograr la minimización en la generación de RCD.

- Se establecen la cantidad y la naturaleza de los residuos que se originarán en cada proceso o actividad constructiva específicamente, se van a generar principalmente materiales de excavación y demolición.

- En la etapa de preconstrucción en la cual se lleva a cabo la formulación del Programa de Manejo Ambiental de RCD y planeación del manejo en la etapa de construcción se identificaron los gestores autorizados para la gestión de los residuos, de todo tipo (ordinarios, peligrosos, RCD, entre otros), que se encuentran en las zonas o regiones aledañas al área de influencia del proyecto.

- Establecer las características (condiciones de admisión, distancia y tasas) de los gestores de RCD para disposición final, de los recicladores, de los centros de clasificación, entre otros; para así poder definir un escenario externo y adecuado de gestión.

- Se dispone en el proyecto de las herramientas, equipo y maquinaria necesaria y específica para llevar a cabo cada uno de los procesos constructivos en obra.

- Se utilizarán los materiales necesarios, ya estandarizados y ajustados a las líneas civiles y arquitectónicas diseñadas y planificadas, durante la fase de estudios y diseños.

- Se organizará y ambientará los sitios de trabajo en condiciones óptimas, con base en las disposiciones de seguridad y condiciones laborales en los establecimientos de trabajo.

- Se optimizará el suministro de materiales mediante sistemas mecánicos estandarizados.

- Los materiales que se utilizaran en obra se descargaran en forma ordenada y se organizaran los materiales y elementos correctamente, para evitar se afecten y no se les pueda dar uso.

- Evitar que los materiales que se estén generando como residuos se mezclen con otro tipo de materiales, en especial con los catalogados como peligrosos.

- Estas estrategias se deberán implementar en cada una de las etapas de generación de RCD, que para este caso específico son excavación, demolición y construcción, principalmente.

- Para la adquisición y almacenamiento de materiales de construcción, se tendrá en cuenta las cantidades requeridas en obra, con el fin de evitar desperdicios por contaminación del material o generación de grandes cantidades de recipientes.

- Verificar que los puntos de acopio cuenten con las medidas de manejo ambiental y de SST.

- Los materiales de construcción serán descargados y acopiados en un área que esté libre de residuos peligrosos u otros, que lo puedan contaminar y así se genere un RCD.

- Mantener las distancias y/o demarcación de los materiales de obra con los RCD, con el fin de evitar mezclas o contaminación de materiales limpios.

- Trabajar en equipo entre el área técnica y ambiental, con el fin de verificar que materiales se pueden reutilizar en la obra.

a. Procedimientos Ambientales Durante la Generación de los RCD.

- Los residuos de excavación y construcción generados en la obra y que han sido posteriormente clasificados y separados, deberán ser retirados en un plazo de 24 horas. En caso de requerirse ampliar este periodo, deberá ser notificado y autorizado por la supervisión y será cubierto en caso de material fino.

- La obra se planifica de forma tal que solo se excavará lo necesario según el diseño de la cimentación y a la vez generar el material de excavación y/o demolición que se va a transportar de forma inmediata hasta el sitio de disposición final.

- Se realizarán charlas permanentes a todo el personal de la obra, sobre la correcta separación de los RCD aprovechables y no aprovechables, implementando las estrategias de comunicación.

- Los principales materiales a utilizar en la obra como son los concretos, el acero, y los agregados pétreos, se solicitarán en las cantidades teóricas, manteniendo metas de desperdicio según se establezcan en el acta de constitución de la obra.

- Las zonas de acopio de RCD susceptibles de aprovechamiento para que no se contaminen con sustancias químicas, estarán a una distancia no menor a un (1)

metro del acopio de residuos no aprovechables, permanecerán alejados de los centros de acopio de combustibles o residuos líquidos peligrosos.

- Capacitar al personal de obra en cuanto al procedimiento para la separación de residuos según sus características (orgánicos, reciclables, peligrosos, construcción y demolición).

7.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

A continuación, se describen las actividades a ejecutar en el desarrollo del contrato:

Fase de Construcción:

Actividades preliminares (construcción de campamento, cerramientos, entre otros).

Estas se finen como el conjunto de trabajos que deben ejecutarse antes del desplante de una construcción para establecer, delimitar y proteger el terreno mismo y las construcciones colindantes, así como también facilitar y permitir el inicio de los trabajos de construcción.

Se les considera la primera fase de la ejecución de obra, puesto que dichas actividades son la preparación y adecuación del proyecto sobre el predio, lugar, terreno, etc.

Construcción de infraestructura de parqueadero (movimientos de tierra, cimentación, estructura, mamposteria).

La infraestructura de parqueadero es un espacio esencial para el estacionamiento de vehículos, facilitando la movilidad y el funcionamiento de la FAC.

Construcción de espacio público (andenes, rampas, pompeyanos, ciclo ruta, mobiliario urbano, paisajismo, arborización entre otros).

Es el conjunto de actividades necesaria para logar un espacio, lugar o territorio dentro de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc.

Señalización (demarcación vial, señalización vertical, semaforización entre otros).

8. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Durante la etapa de construcción se informará a la supervisión la cantidad de residuos generados, lo cual será verificado y controlado mensualmente por el Residente Ambiental, durante el proceso de disposición final cuando sea el caso, así como la reutilización, reciclaje u otro aprovechamiento ejecutado

TABLA 2 ***VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS PROYECTADOS***

TIPO DE RCD	TONELADAS (t)
1. Residuos de construcción y demolición – RCD – susceptibles de aprovechamiento	
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos producto de la excavación, entre otros.	900
1.2 Productos de cimentaciones	3000
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezclas de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	2000

1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, acrílico, compuestos de madera o cartón – yeso (Drywall), entre otros.	186
2. Residuos de construcción y demolición – RCD – no susceptibles de aprovechamiento	
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos	0,0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0,0
2.3. Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.5

Fuente: Vertical Diseño SAS-En Reorganización

En referencia al ítem 1.2 y teniendo en cuanta el presupuesto inicial del contrato, no se tiene contemplada esta actividad.

En referencia al ítem 2.1 en caso de generarse se hará la adecuada disposición y se informara a la supervisión con los respectivos soportes, a la fecha de presentación de este programa no se tiene un estimado de la cantidad a generar de este tipo de residuo.

En referencia al ítem 2.2 y teniendo en cuenta el presupuesto inicial del contrato, no se tiene una cantidad estimada.

Es preciso mencionar que en caso de generarse algunos de los residuos antes mencionados se harán el respectivo reporte, en los tiempos establecidos en la Resolución 1257 de 2021

9. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION SELECTIVA

Antes de iniciar las labores constructivas o previo ingreso, se deberá verificar que los vehículos que se utilizarán en el proyecto cumplan con el certificado de emisión de gases y la revisión tecno-mecánica vigente. Además, se exigirá y utilizarán únicamente volquetas que cuenten con el PIN generado por la SDA.

Las volquetas y maquinaria de la obra no excederán los 5 Km/h dentro del frente de obra, con el fin de disminuir las emisiones fugitivas y los accidentes de trabajo del personal de obra.

Las volquetas destinadas al transporte de RCD generados por la obra, contarán con el distintivo de identificación respectivo y saldrán sin exceso de carga y totalmente carpados del frente de obra.

Antes de salir de la obra se identificarán los vehículos y maquinaria a los cuales se les evidencie el material (lodos y residuos) adheridos al labrado de las llantas con el fin de que sea retirado a su salida y evitar dispersar el material en las vías aledañas al proyecto.

Se restringe el uso de bocinas, cornetas, pitos y demás elementos generadores de ruido en los vehículos del proyecto.

10. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN LA OBRA

Con el fin de llevar a cabo una adecuada gestión con los RCD generados en el proyecto, es indispensable llevar a cabo una buena separación en la fuente y recolección selectiva de los residuos, para realizar esta actividad de forma adecuada es necesario reconocer que tipo de materiales se pueden reutilizar o reciclar, entre las estrategias para una adecuada gestión se tiene:

- Se realizará una revisión de que los materiales sobrantes de las actividades de la obra, no se encuentren contaminados con otros tipos de materiales que estén catalogados como peligrosos. Si llegasen a estar contaminados se tratarán como residuos peligrosos (en caso de generarse).

- Se implementarán y adecuarán sitios para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción aprovechables (plástico, cartón, vidrio, madera, PVC, chatarra) que se reutilizarán o se dispondrán finalmente, estos acopios deberán estar debidamente señalizados, construidos con materiales resistentes y adecuados, con cubierta y cerramientos posteriores y laterales.

- Se construirá un acopio temporal para el almacenamiento de madera que se genere en el proyecto, esta madera se reutilizará en el porcentaje que se requiera, lo que no se pueda reutilizar será entregada a un gestor externo autorizado para su reciclaje. Estos residuos se almacenarán hasta que se cuenta con un volumen considerable para hacer la entrega al gestor externo.

- Se adecuará un acopio temporal para el almacenamiento de chatarra, este material será reutilizado en obra en la cantidad que se requiera y se acopiará hasta contar con un volumen considerable para ser entregado a un gestor externo autorizado para la reutilización.

- Se construirá un acopio para el almacenamiento de vidrio, plástico, papel y cartón, los cuales serán entregados a un gestor externo autorizado para recolectar y/o llevar a cabo procesos de reciclaje.

- Para la recolección de los residuos reciclables que se generaran en el proyecto, se tiene previsto la instalación de puntos ecológicos principalmente, con recipientes plásticos de diferentes colores de acuerdo al tipo de material a recolectar, los cuales contaran con sus respectivo rotulo para identificar fácilmente el tipo de residuos a depositar allí, con una bolsa al interior del mismo color del recipiente; los cuales serán descargados periódicamente y los residuos ubicados en el respectivo acopio para almacenamiento hasta ser entregados al gestor externo.

- En cuanto a los residuos peligrosos (líquidos y sólidos) que se puedan generar en el proyecto, serán almacenados en recipientes cerrados apropiadamente, debidamente rotulados y marcados como peligrosos, se ubicaran sobre una zona de almacenamiento temporal, que estará libre de humedad y calor excesivo,

construida sobre piso duro en concreto, con cubierta y cerramiento metálico, con dique de contención, debidamente señalizado, con kit para manejo de derrames, con extintor y deberá permanecer en buenas condiciones. Estos residuos serán entregados a un gestor externo autorizado para adelantar las actividades de recolección, transporte y disposición final.

- Todos los materiales que sean trasladados hasta las zonas de acopio temporal de residuos de construcción y demolición, serán cubiertos con materiales resistentes que eviten la dispersión y arrastre producto de las corrientes aéreas y las aguas lluvias, los olores ofensivos y la posible proliferación de vectores.

- Los residuos sólidos sobrantes en obra, serán clasificados en categorías como residuos ordinarios, residuos reciclables y residuos peligrosos, para su posterior disposición final y/o reciclaje al ciclo productivo.

11. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN LA OBRA Y FUERA DE ESTA.

En el desarrollo del proyecto es indispensable y muy adecuado el aprovechamiento de los RCD, dadas las condiciones del medio, las características y el alcance del proyecto; este aprovechamiento se dará a través de la reutilización de algunos materiales en obra y de la entrega de otros a gestores externos para su tratamiento. Estas actividades se darán de la siguiente manera:

- El material generado en las actividades de construcción y demolición será reutilizado siempre y cuando este sea acopiado de manera apropiada y no se mezcle con otro tipo de residuos generados en la obra.
- Los RCD producto de las excavaciones del terreno como el recebo, entre otro, serán utilizados en los procesos constructivos del proyecto como material de mejoramiento del terreno, siempre y cuando cumplan con la norma de construcción y con previa aprobación de la supervisión.

- Los residuos de fresado de pavimento asfaltico, se podrán utilizar dentro del mismo proyecto como base para estabilizaciones de suelos y terraplenes dependiendo de las necesidades del proyecto y las características de estos materiales.

- La madera que se genere durante el desarrollo de los procesos constructivos, en la medida en que se requiera se reutilizará para acondicionar zonas de depósito en la obra, instalación de senderos, ubicación de señalización temporal de obra, para los procesos constructivos y para lo que sea funcional, aquella que no sea reutilizada será entregada a un gestor autorizado.

- Los residuos ferrosos o chatarra serán reutilizados en el proyecto para los diferentes procesos constructivos en los cuales sea funcional su segundo uso, en la medida en que el mismo lo requiera y en el porcentaje establecido, aquellas cantidades que no sean reutilizados se entregarán a un gestor externo para llevar a cabo un proceso de reciclaje.

- Los RCD reciclables tales como papel, plástico y cartón se almacenarán hasta tener un volumen considerable, dado principalmente por el hecho que no se generara gran cantidad, estos se entregarán a un gestor autorizado para dar tratamientos de reciclaje.

- Los materiales susceptibles de reutilización se protegerán con el fin de que se afecten o contaminen con otras sustancias y pierdan su carácter de ser reutilizados, así como evitar que sufran deterioro por acción del viento, del agua y en fin de las diferentes condiciones ambientales.

- Los residuos peligrosos generados en el proyecto, tanto líquido como sólido, serán entregados a un gestor externo autorizado para recolectar, transportar y disponer finalmente estos.

- Se debe contar con los registros de RCD utilizados dentro de la obra y los que son llevados a disposición final y/o plantas de aprovechamiento autorizados por la autoridad ambiental competente.

- Los RCD que no puedan ser reutilizados en el mismo proyecto, serán cargados, y retirados del proyecto por un transportador autorizado y registrado, cumpliendo con las siguientes medidas.

1. El transportador deberá cumplir con lo establecido por el Ministerio de Transporte en cuanto a la trayectoria de la empresa y la experiencia del transportador relacionado con RCD, y debe mostrar capacidad técnica, de equipos y financiera para asegurar la operación.
2. Los vehículos destinados al transporte de residuos sólidos de construcción, no podrán ser llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón), y la carga deberá ir cubierta.
3. No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso, en relación con la capacidad de carga del chasis.
4. Cuando la obra no disponga de espacio para el estacionamiento temporal de volquetas, el constructor debe coordinar la salida de RCD de tal forma que no exista estacionamiento temporal en vía pública, ni obstrucción de tránsito.
5. Adicionalmente, se deberá implementar la señalización necesaria de tal manera que no se interfiera con el tráfico vehicular y peatonal.

a. Manejo en Operaciones de Revalorización

En el manejo de los RCD se establecen las distintas medidas de manejo tanto técnicas como buenas prácticas que redunden en una buena gestión.

Se cumplirán labores de orden y limpieza en el área de desarrollo e intervención del proyecto, en las vías aledañas, en la señalización, en el cerramiento y en los sumideros

ubicados en el área de trabajos. La limpieza general se realizará siempre que la obra lo requiera.

La generación de RCD se dará durante las actividades constructivas del proyecto y teniendo en cuenta las características de los diferentes materiales a generar se realizará el siguiente manejo para su revalorización y/o disposición final.

- Uso de material en obras: con previa revisión y autorización de la supervisión, se establecerá si el material generado puede ser o no usado en la obra.
- Centro de aprovechamiento: hacer entrega del material que cumpla para reutilización a centro de aprovechamiento de RCD, autorizados por la autoridad ambiental competente.
- Disposición final: el material de RCD generado y que no sea apto para aprovechamiento será enviado a sitios de disposición final que se encuentren aprobados o cuenten con permisos otorgados por la AAC.

12. GESTORES DE RCD

Para la disposición final de RCD o tratamiento de reciclaje a los RCD generados en el proyecto, se contará tentativamente con los gestores externos que a continuación se mencionan.

TABLA 3 ***GESTORES DE RCD***

GESTOR DE RCD	
Nombre o razón social	REX Ingeniería S.A.
Número de identificación o NIT	830073841-1
Representante legal	Ligia Eugenia Rodríguez Salazar
Número telefónico de contacto	3378726
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Carrera 27 No. 47ª – 35. Bogotá D.C.
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final	Disposición final de RCD.
aprovechamiento y disposición final	

GESTOR DE RCD	
Nombre o razón social	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO
Número de identificación o NIT	900767473-7
Representante legal	Alejandro Valencia Gómez
Número telefónico de contacto	3013363867
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Calle 72 No 5 – 8 Oficina 201
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final	Disposición final de RCD
GESTOR DE RCD	
Nombre o razón social	Reciclados Industriales de Colombia S.A.S
Número de identificación o NIT	900360954-1
Representante legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	3182153129
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Km 1.5 vía autopista Medellín. Cota
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final	Disposición final de RCD

Fuente: Vertical Diseño SAS

13. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

El programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición RCD, se implementará durante la ejecución de las actividades propias del contrato de obra No 005-00-A-COFAC-DIFRA.

En este sentido, la gestión de los RCD se ejecutará de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente presentando los informes periódicos y el informe final de acuerdo a los tiempos establecidos en la resolución 1257 de noviembre de 2021.

RESPONSABILIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

Las medidas que VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACIÓN, adoptará para efectuar la supervisión y seguimiento en la gestión integral de RCD son:

- La responsabilidad de la implementación del programa de manejo ambiental de gestión de residuos de construcción y demolición RCD en la obra se encuentra principalmente en el director de obra, con el seguimiento y supervisión del residente ambiental, colaboración e implementación del residente técnico.

- El residente ambiental, con la colaboración del área técnica será el encargado de garantizar que se adecuen la zona para acopio y separación de los RCD de manera adecuada, y que esta actividad se realice en condiciones de orden y limpieza.

- Los sitios de disposición final, plantas de aprovechamiento, gestores de residuos y trasportadores utilizados para la gestión de los RCD, deberán estar debidamente autorizados y registrados ante la entidad competente.

- Se realizará seguimiento y control a los vales y/o recibos emitidos por los sitios de disposición final y/o plantas de aprovechamiento del material generado por el proyecto, que ingresa a estas entidades.

- Se realizará capacitación y/o charlas informativas acerca del correcto manejo, almacenamiento y disposición de los residuos provenientes de actividades de construcción y demolición a todo el personal y empresas vinculadas al proyecto.

TABLA 4 ***CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PMA-RCD AÑO 2025***

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DEL PMA-RCD - CONTRATO DE OBRA No 1 DE 2023	

TEMA	CAPACITACIONES PROGRAMADAS		
	junio 25	julio 25	agosto 25
Socialización del PMA-RCD			
Manejo de acopios temporales de materiales de construcción y RCD			
Medidas de control de contaminación atmosférica			
Orden y Aseo			
Gestión Integral de Residuos Sólidos			
Manejo y disposición de materiales de construcción			

Fuente: Vertical Diseño SAS-En reorganización

13.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR EXTERNO) Y DISPOSICION FINAL.

Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto y la generación de RCD, que se va a dar durante el tiempo de ejecución del mismo, se cumplirá por parte de Vertical Diseño SAS-En Reorganización, el almacenamiento de los diferentes residuos de acuerdo a sus características y a las medidas anteriormente propuestas, de la misma forma se aprovechará los materiales susceptibles de reutilización, de acuerdo a sus características físicas y principalmente en la misma obra. Con aquellos RCD que son susceptibles de reutilizar pero que de acuerdo al tipo de proyecto y sus características propias no es posible hacerlo en el mismo, se llevara a cabo una actividad de entrega a un gestor externo autorizado, para su proceso de reciclaje o de transformación en materia prima.

Con los RCD que definitivamente es difícil desarrollar una actividad de reutilización y aprovechamiento en obra o ante un gestor externo autorizado, se dará un tratamiento de

disposición final a través de un gestor externo autorizado para desarrollar este tipo de actividad.

De toda la gestión mencionada anteriormente se gestionará el correspondiente soporte de la gestión adelantada en los casos de entrega a gestores externos e informes en el caso de la reutilización, para de esta manera demostrar el cumplimiento de las medidas establecidas. A continuación, se presenta la tabla con la cual se reportarán los volúmenes manejados

TABLA 5 ***MODELO PARA EL REPORTE DE LOS RCD GENERADOS***

PERIODO DE REPORTE						
TIPO DE RESIDUO	**TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO AL RECEPTOR**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN UN PUNTO LIMPIO**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLAN DE APROVECHAMIENTO**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL**	**TOTAL RCD (t)**
1. Residuos de contrucción y demolición-RCD-susceptibles de aprovechamiento.						
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: coberturas vegetales, tierras limos y materiales pétreosproductos de la excavación, entre otros.						
1.2. Productos de cimentaciones: arcillas, bentonitas y demás.						
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas,						

cantos, pétreos asfalticos, trozos de mezclas decementos y concretos hidráulicos entre otros.						
1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos y madera o cartón – yeso (drywall), entre otros						
2. Residuos de construcción y demolición – RCD- no susceptibles de aprovechamiento						
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.						
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados						
2.3. Los que Tengan caracteristicas de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad Ambiental especial establecida para su gestion.						

Fuente: Vertical Diseño SAS

13.2 INDICADORES RCD

Con el objetivo de hacer un control de la gestión adelantada con los residuos de construcción y demolición RCD, y lo contemplado en la resolución 1257 de 2021, se plantean los siguientes indicadores de seguimiento.

TABLA 6 ***INDICADORES DE GESTIÓN***

INDICADORES DE GESTION		
NUMERO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**INDICADOR**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) %	Toneladas de RCD aprovechadas/ Total de toneladas de RCD Generadas
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) %	Toneladas de RCD entregadas en punto limpio/ Total de toneladas de RCD Generadas
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) %	Toneladas de RCD entregadas en plantas de aprovechamiento/ Total de toneladas de RCD Generadas
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor %	Toneladas de RCD gestionados por receptor/Total de toneladas de RCD Generadas
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) %	Toneladas de RCD dispuestos en sitio de disposición final/Total de toneladas de RCD Generadas
7	Meta total de aprovechamiento %	25%

Fuente: Vertical Diseño SAS

De la tabla anterior (tabla 06), se aclara que el contrato de obra No 005-0-A-COFAC-DIFRA ejecutado por VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACIÓN tiene contemplado aprovechar efectivamente un porcentaje en peso del total de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, conforme a la categoría del municipio donde se desarrolle el proyecto y de acuerdo al año en ejecución y año de terminación de las actividades constructivas, por lo anterior se plantea un aprovechamiento del 25%.

Se anexa al presente documento los formatos aplicables como generador de RCD

ANEXO No. 1

FICHA RESUMEN DE OBRA

FICHA TÉCNICA RESUMEN DE LA OBRA (ANEXO 1 – GUÍA AMBIENTAL)

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social: VERTICAL DISEÑO SAS – EN REORGANIZACIÓN

NIT: 900.246.243-4

Dirección: Cra 59 No-152.25 Piso 3

Teléfono/Fax: 3014417868

Correo Electrónico: ambientalbogota2025@gmail.com

DATOS DE LA OBRA

Registro de la obra ante la SDA o PIN: Proceso de solicitud

Nombre de la Obra: Equipamiento Dispensario de Sanidad Militar FAC-ARC-BOGOTÁ

Dirección de la obra: AC 13 No 58-51

Estrato: 2

Barrio: Puente Aranda

Tiempo estimado de ejecución de la obra: Tres (03) meses

Fecha de inicio Fase de Preliminares: 3 semanas

Fecha inicio Fase de Construcción de obra: 5 semanas

Fecha estimada de Finalización de la obra: 20/08/2025

.

ANEXO No. 2

FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO

NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (PMA-RCD) - VERSION 1 OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

ANEXO 2. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMEINTO DE LOS RCD EN LA OBRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL								3. Aprovechamiento o tratamiento (X)					5. Acumulado			6. Mes de Reporte		
ETAPA	TIPOLOGIA DEL RESIDUO	COMPONENTE	OBSERVACIONES	1. Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (m3)	1. Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (T)	2. Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (m3)	2. Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (T)	Disposición final de RCD (m3)	Volumen de RCD Reutilizado (m3)	Volumen de RCD Reciclado (m3)	Otros Tratamientos	4. Lugar de disposición final (2)	Volumen total de materiales usados en obra (m3)(4)	Cantidad real generada (m3)	Justificación (3)	Volumen total de materiales de construccion usados en obra (m3) (4)	Cantidad real generada (m3)	Justificación (3)
Demolición	RCD pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes	Tipo de obra a demoler															
			Vivienda															
			Comercio															
			Dotacional															
			Vías															
			Canales															
			Puentes															
			Otros:															
	RCD no pétreos	Plásticos, PVC																
		Metales																
		Maderas																
		Cartón, papel																
		Vidrios																
		Otros																
cimentación	Residuos de cespedon	Coberturas vegetales	Realiza separación de la cobertura vegetal Si No X															
			Largo															
			Ancho															
			Alto															
	Residuos finos no expansivos y Residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes, poco o no plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría, Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con gran cantidad de finos altamente plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría	Dimensiones de material retirado					X				POSIBLES SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL: MAQUINAS AMARILLAS INGENIERIA Y TRANSPORTE LAND GRANULADOS GRECO RECICLADOS INDUSTRIALES REUTILIZACIÓN EN OBRA							
			Largo															
			Ancho															
			Alto															
	RCD pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes								X		RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., PATIO IDU, UMV - CONCREMACK						
	RCD no pétreos	Plásticos, PVC																
		Metales																
		Maderas																
		Cartón, papel																
		Vidrios																
		Otros																
	Residuos carácter metálico	Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc																
	Residuos especiales	Poliestireno, cartón - yeso (drywall), llantas usadas										ACO						

NIT. 900.246.243-4

CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (PMA-RCD) - VERSION 1

OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Construcción	peligrosos	Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, plomo, cenizas volantes, luminarias , desechos explosivos, y los residuos o desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II o que presenten las características de peligrosidad descritas en el Anexo III del Decreto4741 de 2005.																
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores (Tubería en concreto)										CONCRETARTE - PREFABRICADOS DEL SUR						

NOTA: LAS CANTIDADES Y VOLUMENES FUERON CALCULADOS TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

(1) Tratamiento: Marque con una "X" al que corresponda

(2) Lugar de disposición: sitio de disposición final aprobado por la autoridad ambiental competente y/o zona de aprovechamiento que va a utilizar para los residuos generados en obra

(3) Justificación: Breve explicación cuando las cantidades proyectadas no coincidan con las reales

(4) Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Articulo 4 de la Resolución 1115 de 2012, se debe definir el volumen de materiales a usar para con este dato calcular la cantidad de RCD´s que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo con el porcentaje de aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en que se desarrolle.

ANEXO No. 3

INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (PMA-RCD) - VERSION 1 OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL		Versión: 0 Fecha: 21/06/2025 Página: 1 de 3
Mes y año del Aprovechamiento:			Fecha de diligenciamiento:
Nombre del Proyecto:			
PIN de obra:			
Número de contrato:			
Dirección de la obra:			

	1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:
	Descripción:
	2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)
	Alto: Ancho: Largo:

NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (PMA-RCD) - VERSION 1 OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	Código: Versión: 0 Fecha: 21/06/2025 Página: 2 de 3

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (PMA-RCD) - VERSION 1 OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	Código: Versión: 0 Fecha: 21/06/2025 Página: 3 de 3

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: _____ (ton)

Duración del proceso: _____ (meses)

Área final recuperada: _____ (m2)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

EL FORMATO SE DEBE DILIGENCIAR TODOS LOS MESES,

EN EL MES EN QUE NO SE REALICE APROVECHAMIENTO SE DEBE JUSTIFICAR EN ESTE APARTADO DE MANERA AMPLIA, TÉCNICA Y SUFICIENTE, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD

ANEXO 4. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL MANEJO DE RCD

NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (PMA-RCD) - VERSION 1 OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

RCD GENERADO	ESTIMACIÓN DE RCD		DISPOSICIÓN		
	CANTIDAD SUELTA ESTIMADA	UNIDAD*	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	% DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA
Coberturas vegetales	NA	m3	NA	NA	NA
Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes, plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría	3,32	m3	$ 49.173,50	$ 163.256,02	0,00%
Concretos, cerámicos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto materiales inertes	367	m3	$ 49.173,50	$ 18046000	4,10%
Plásticos, PVC	5	m3	$ 49.173,50	$ 245.868	0,001%
Maderas	4	m3	NA	NA	NA
Cartón, papel	2	m3	$ 49.173,50	$ 98.347	0,00047%
Vidrios	0	m3	NA	NA	NA
Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc	NA	NA	NA	NA	NA
Poliestireno, cartón-yeso (drywall), llantas usadas.	NA	NA	NA	NA	NA
Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto,	NA	NA	NA	NA	NA
Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL:	381,32	m3	NA	$ 18.554.329	4,10%

ANEXO No. 5

DECLARACIÓN RESPONSABILIDAD

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL GENERADOR DE RCD

DECLARO:

1. Que soy conocedor y se da cumplimiento a las determinaciones establecidas en la Resolución 01115 de 2012, así como de las normas Distritales y Nacionales en materia de gestión de residuos y demás normas que regulan los residuos de la construcción y demolición.

2. Que el Plan de Gestión Integral de RCD presentado lleve a cabo las obligaciones que se adelantarán en obra, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 01115.

3. Que dando cumplimiento a la Resolución 01115 de 2012, en cuanto a la gestión de los residuos de construcción y demolición, presentamos el Plan de Gestión Integral de RCD en la obra, el cual está aprobado por el director del proyecto y para que sea evaluado y aprobado por la SDA.

4. Mientras que los residuos estén en la obra, los mantendré en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y evitaré la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte la posterior revalorización o disposición final.


5. Como generador de los RCD, asumo los costos de gestión y mantendré la documentación que demuestre el tratamiento y disposición final correspondiente de cada año como mínimo, durante los cinco años siguientes. En caso de utilizar los residuos generados en la misma obra, estos cumplirán los requisitos

técnicos y legales para el uso que se destinen, y se aprobará y documentará por la dirección de la obra. En el caso particular de que se prevea la reutilización de tierras extraídas de la obra, daré cumplimiento a la normatividad vigente.

6. La gestión de residuos de construcción y demolición se destina por este orden a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de revalorización.

7. Que el Plan de Gestión Integral de RCD da cumplimiento a la Resolución 01115 de 2012, al Artículo 5 de la Ley 190-95 y al Plan de Desarrollo de la actual administración en la ciudad de Bogotá D.C., sobre el manejo de Residuos y Escombros.

Para todos los efectos legales, certifico que los datos por mi señalados en el presente manual son veraces (Artículo 5 de la Ley 190/95).



HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL

VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACIÓN

NIT. 900.246.243-4


INFORME SG- SST
MENSUAL No 1 JUNIO-18-2025 a JULIO-31-2025

RECURSO HUMANO



Tipo de Trabajador	Unidad de Tiempo	Número de Trabajadores	Horas Hombre por Trabajador	Horas Hombre Totales
Directos Adm	mensual	5	176	880
Subcontratistas	mensual	12	208	2496
Total Combinado		**17**		**3376**

CONTRATISTAS	No DE TRABAJADORES	NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO
DIRECTOS	6	Maria Jose Choconta	Directora de obra	19/06/2025	
		Jeisson Diaz	Residente de obra	19/06/2025	25/07/2025
		Yurley Badillo	Residente SST	19/06/2025	
		Mileidy Mateus	Ingeniera Ambiental	19/06/2025	
		Jose Alexander Gonzalez	Aux. Administrativo	3/07/2025	
		Edwin David Suta	Ayudante de obra	4/07/2025	
DEMOLICIONES PINZON	9	Laura Pinzon	Ingeniera civil	26/06/2025	29/07/2025
		Santiago Serna	Oficial	27/06/2025	29/07/2025
		Miguel Angel Rodriguez	Operador	27/06/2025	29/07/2025
		Luis Augusto Morales	Oficial	28/06/2025	29/07/2025
		Fabian Gamba	Oficial	28/06/2025	18/07/2025
		Carlos Guerrero	Oficial	3/07/2025	25/07/2025
		Jose Guayambuco	Auxiliar de obra	4/07/2025	22/07/2025
		Pedro Pinzon	Gerente (visitante)	26/06/2025	29/07/2025
		Alejandro Serna	Encargado (visitante)	26/06/2025	29/07/2025
CERRAMIENTO	2	Manuel Fernando Daza	Ayudante de obra	28/06/2025	11/07/2025
		Oscar Contrareras	Ayudante de obra	28/06/2025	11/07/2025
ELÉCTRICOS	1	Costantino Hernandez	Tecnico electricista	20/06/2025	

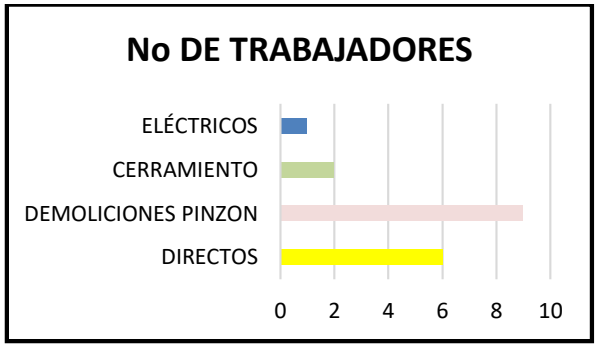


Grafica 1. Personal en obra



INDICADORES Res 0312/2019

Accidentes de Trabajo	0
Incidentes de trabajo	0
Enfermedades Laborales	0
Prevalencia E.L	0
Incidencia E.L	0
Primeros auxilios prestados	0
Mortalidades	0
Ausentismo por ATEL	0
Ausentismo Común	0
	0

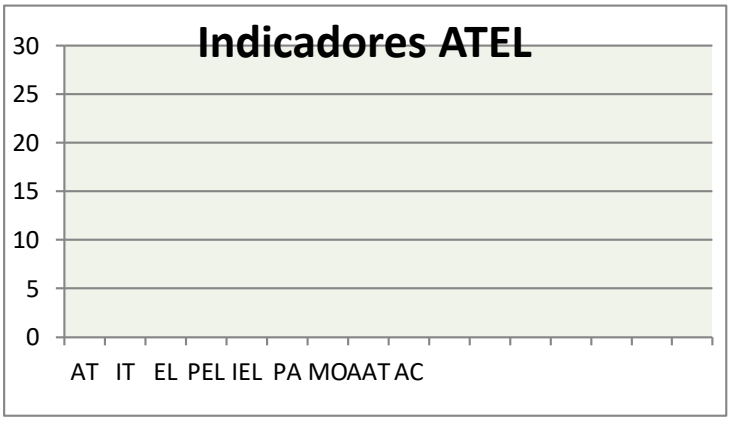


No se presentaron casos de accidentes ni enfermedades laborales.

Grafica 2. Indicadores de accidentes laborales

CONTROL DE INSPECCIONES EN AREAS

Tipo de inspección	Número de Inspecciones	Observaciones
Vehículo Chevrolet de estaca	1	Se verifica el estado del vehículo, acto para la actividad; cuenta con su documentación al día (soat, tecno mecánico, tarjeta de propiedad)
Inspección de EPP	27	Se realiza entrega de elementos de protección personal y dotación al personal en obra.
Inspección Orden Y Aseo	0	Se realiza jornada de orden y aseo en obra, lavado de baños portátiles, en contenedores y zonas comunes.
Charlas o capacitaciones	9	Se realiza capacitaciones y charlas informativas tales como: Inducción a obra, divulgación de ATS, responsabilidades en el SG-SST, prohibición de joyas, uso adecuado de EPP, orden y aseo, capacitación de política de seguridad y salud en el trabajo, charla trabajo en alturas capacitación de política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción y pausas activas.
Inspección de taladro	3	Se realiza inspección de taladro demoledor, acto para actividad.
Inspección de Pulidora	1	Se realiza inspección de Pulidora, el cual se encuentra acto para la actividad.

Permiso de trabajo en caliente, y lista de verificación	16	Se realiza apertura de trabajo en caliente y lista de verificación, para la actividad de corte (oxicorte).
Excavadora	4	Se verifica los documentos de mantenimiento, maquina aprobada para la actividad, se realiza pre operacional.
Extensión	1	Se realiza inspección pre operacional de extinciones en obra, lo cual cumple para la actividad y se almacenan bajo techo.
Extintor	1	Se realiza inspección pre operacional de extintores en obra.
Botiquín y camilla	1	Se realiza inspección de botiquín y camilla que contamos en obra, la cual están debidamente señalizados y al día.
ATS	4	Se realiza apertura de Análisis de trabajo seguro, contemplando las actividades ejecutadas.
INSPECCIÓN EN ALTURAS		
Arnés	10	Inspección realizada a Arnés marca Insafe, evidenciando que se encuentran en buen estado y apto para uso.
Líneas de vida	9	Se revisa inspección de líneas de vida Insafe , se observa que están en buenas condiciones para el trabajo.
Permisos de trabajo en alturas	10	Se revisa el permiso de trabajo en alturas donde se evidencia que se cumple con sus elementos EPP, con sus elementos de protección contra caídas y su condición de salud adecuada.
TOTAL, DE INSPECCIONES	**97**	

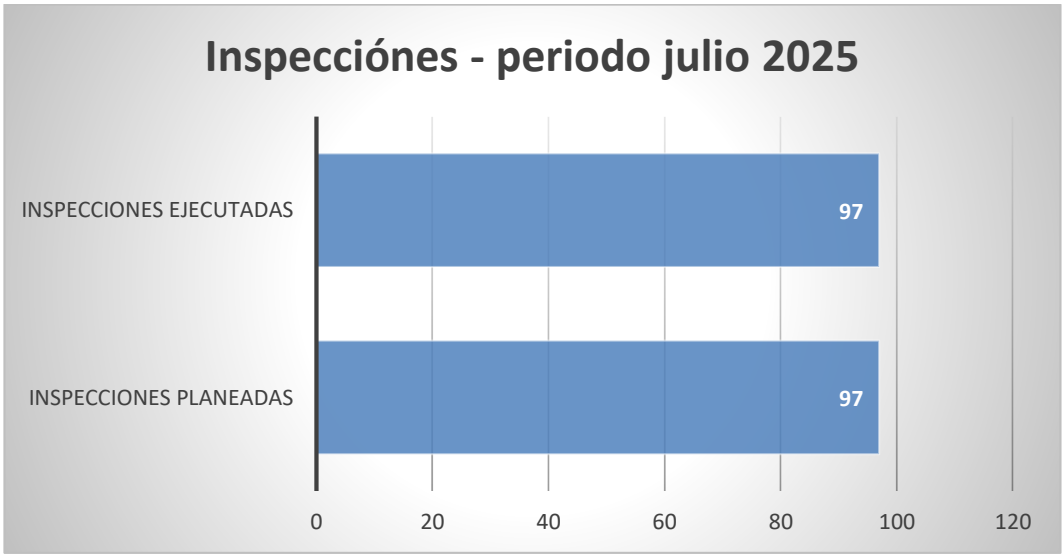

{-


Grafica 3. Inspecciones realizadas

Lo que permite evidenciar el cumplimiento del 100% de las inspecciones planeadas.

CONTROL DE BIOSEGURIDAD



Tipo de inspección	Número de Inspecciones	Observaciones
Limpieza en contenedor y en áreas y equipos en uso.	1	Se realiza orden y aseo en contenedor
TOTAL, DE INSPECCIONES	**1**	

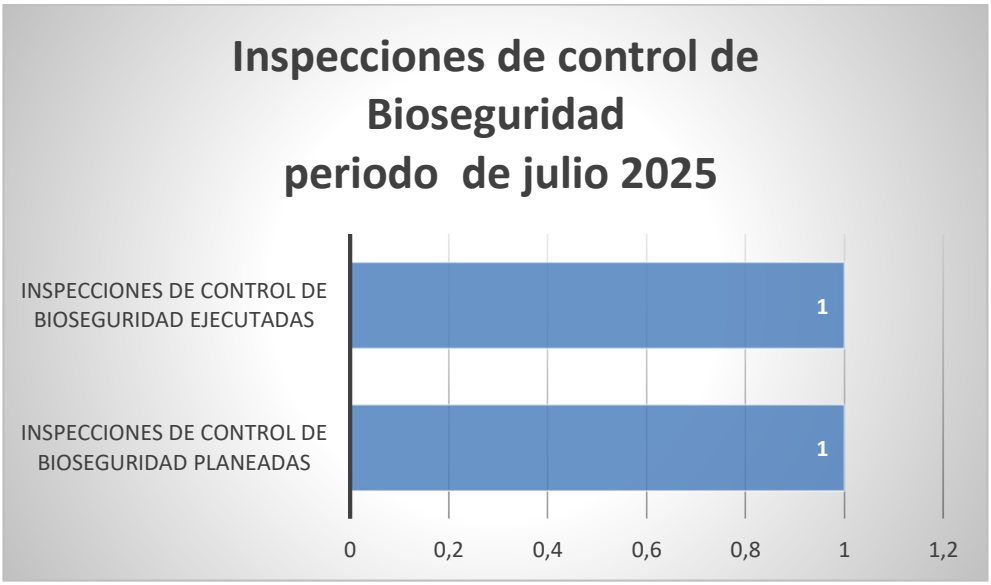

Grafica 4. Inspecciones realizadas control Bioseguridad

Lo que permite evidenciar el cumplimiento del 100%

ACTIVIDADES CON LA ARL



- Revisión documental, todos los trabajadores cuentan con ARL
- Se revisa al personal existente pago de Seguridad social con el Salario Mensual contractual y de la clasificación del riesgo laboral de cada trabajador y subcontratistas, personal nuevo certificaciones de ARL, EPS, Fondo de pensión y Caja de compensación.

LEYES APLICABLES



En el mes de julio se trabajó en alturas para ello se reviso la Resolución 4272 del 2021 realizando verificación en el ministerio de trabajo las certificaciones de alturas (por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas); también se realizó actividades con oxicorte por ello se revisó la resolución 0312 de 2019, para la seguridad en el corte con oxiacetileno que establece los procedimientos seguros, equipos adecuados y precauciones necesarias.

MANTENIMIENTOS



En la revisión documental se verifica mantenimientos preventivos de maquinaria, y demás documentación como tecno mecánica, soat y licencia de tránsito, tanto de vehículos que están fijos en obra como las volquetas visitantes.

GESTION SST



- Se realiza plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo.
- Se realizan inspecciones de equipos de emergencia como el botiquín y extintores.
- Se continua la mejora continua, demarcación de zonas de trabajo, señalización entrada de la obra, senderos peatonales, de equipos de emergencia, punto de encuentro y listado de contactos de emergencia en el ingreso.
- Se implementa buzón de sugerencias.

- Se continúa realizando recorridos y acompañamiento en la obra para seguir detectando factores de riesgos y que los colaboradores siempre estén cumpliendo con sus labores y sus elementos de protección, se realiza mejora en cuanto los EPP en la actividad de oxicorte, se implementa mandil de cuero para blindar la seguridad del operador.
- Se realiza cartelera informativa de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Se mantiene acompañamiento para supervisión de él buen manejo de máquinas, equipos y herramientas.
- Se realiza acompañamiento en uso de herramientas siempre que se esté manipulando máquinas, equipos o herramientas, se debe contar con acompañamiento para evitar que el trabajador tenga distracciones o manipule inadecuadamente el elementó, se sensibiliza a los colaboradores.
- Se delimita o señalizar cada vez que se realice un cargue o descargue de material.
- Se realiza orden y aseo dentro de la obra y sus alrededores, como el ingreso y respaldo de parqueadero de FAC, baños portátiles, campamentos.
- Se realiza seguimiento a pago de planillas de seguridad social a subcontratistas.
- Se realiza charlas pre operacionales a los subcontratistas y directos; Inducción, divulgación de ATS, pausas activas, responsabilidades en sg-sst, prohibición de joyas u/o accesorios, señalización áreas de trabajo, orden y aseo en áreas de trabajo, uso de EPP, se realiza socialización del plan de emergencias: punto de encuentro; que quedo ubicado sobre la avenida centenario finalizando el cerramiento y números de emergencias relevantes (bomberos, policía, ambulancia, defensa civil), incluyendo los números locales y nacionales; procedimientos de evacuación; el reporte de emergencia a quien se debe dirigir para proporcionar la información (ubicación y tipo de emergencia), socialización de políticas de alcohol y drogas, pausas activas.
- Se verifica el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
- Se realiza seguimiento con la entrega oportuna de EPP.
- Se realiza entrega de carnet al personal administrativo.

ANEXO

	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Periodo Julio





Fotografía No	1	Fotografía No	2
Descripción	Inducción a obra	Descripción	Inducción a obra





Fotografía No	3	Fotografía No	4
Descripción	Charla trabajo en alturas	Descripción	Socializaciones de políticas





Fotografía No	5	Fotografía No	6
Descripción	Charla preoperacional	Descripción	Charla preoperacional





Fotografía No	7	Fotografía No	8
Descripción	Charla preoperacional	Descripción	Pausas activas







Fotografía No	9	Fotografía No	Cartelera informativa SST
Descripción	Cartelera informativa SST	Descripción	Inspección de botiquín







Fotografía No	11	Fotografía No	12
Descripción	Inspección de extintores y camilla	Descripción	Aseguramiento documental





Fotografía No	13	Fotografía No	14
Descripción	Entrega de dotación	Descripción	Entrega de dotación

 		 	
Fotografía No	15	Fotografía No	16
Descripción	Entrega de dotación y EPP	Descripción	Entrega de elementos de protección personal
 		 	
Fotografía No	17	Fotografía No	18
Descripción	Entrega de elementos de protección personal	Descripción	Entrega de elementos de protección personal





Fotografía No	19
Descripción	Entrega de carnet al personal



Fotografía No	20
Descripción	Rotulación de cascos



Fotografía No	21
Descripción	Implementación de buzón de sugerencias



Fotografía No	22
Descripción	Seguimiento dotación, cambio de botas

 			
Fotografía No	23	Fotografía No	24
Descripción	Mejora continua, se implementa mandil de cuero para actividades de oxicorte	Descripción	Acompañamiento de actividades
		 	
Fotografía No	25	Fotografía No	26
Descripción	Acompañamiento de actividades	Descripción	Señalización zonas de trabajo

			
Fotografía No	27	Fotografía No	28
Descripción	Señalización de zonas de alto riesgo	Descripción	Demarcación zonas de trabajo
			
Fotografía No	29	Fotografía No	30
Descripción	Inspección de balas de oxígeno y rotulación	Descripción	Señalización zonas comunes
			
Fotografía No	31	Fotografía No	32
Descripción	Ingreso de baños portátiles y señalizados	Descripción	Señalización zonas de trabajo






Fotografía No	33
Descripción	Señalización zonas comunes



Fotografía No	34
Descripción	Inspección de herramientas eléctricas.



Fotografía No	35
Descripción	Orden y aseo



Fotografía No	36
Descripción	Orden y aseo



Fotografía No	37
Descripción	Orden y aseo




Fotografía No	38
Descripción	Orden y aseo

 		 	
Fotografía No	39	Fotografía No	40
Descripción	Orden y aseo	Descripción	Orden y aseo
 			
Fotografía No	41	Fotografía No	42
Descripción	Lavado de baños portátiles	Descripción	Orden y aseo

YURLEY BADILLO QUEZADA
Residente SST
Licencia: 00-16956 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2018

VERTICAL	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	F-SST-016 Versión 1 5/07/2017

RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES						
Proyecto	BODEGA FAC					
Vigencia (semanal)	Desde	1 7 2025	Hasta	5 7 2025	Tiempo estimado para la ejecución de la actividad (Días)	15 DIAS
Descripción de la Actividad	Demolicion mecanica y manual, desmantelamiento y desmonte de material recuperable de obra.					
Lugar donde se va a ejecutar la actividad	BODEGA FAC					

Paso a paso de la Actividad (Describa técnicamente las tareas que se desarrollan durante la actividad a ejecutar)	Identificación de peligros GTC-45	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Señalización de área		Caídas a mismo y diferente nivel Machucones, golpes, contusiones	Orden y aseo, Inspección de herramientas
Alistamiento de herramienta para desmonte de material recuperable	De seguridad (Locativo, mecánico)	Machucones, golpes, contusiones, desplome de estructura	Orden y aseo, Inspección de herramientas
Demolición manual	De seguridad (Locativo, mecánico, alturas)	Caídas a mismo y diferente nivel Machucones, golpes, contusiones	Orden y aseo, Inspección de herramientas
Demolición mecánica con retroexcavadora	De seguridad (Locativo, mecánico)	Machucones, golpes, contusiones, desplome de estructura	Inspección de herramientas, Inducción de actividades, distancia de seguridad
Recolección y apilamiento de material de demolición	De seguridad (Mecanico, locativo)	Golpes, contusiones en MMII (tránsito por superficies irregulares)	Uso de EPP, calzado de seguridad
Cargue de materiel en volquetas para transito a botaderos	De seguridad (Accidente de transito)	Atropellamientos, golpes, accidentes de tránsito	Comunicación previa con personal de volquetas y precaución con la interaccion de vehiculos y maquinaria
Limpieza de área	De seguridad (Locativo)	Caídas a mismo y diferente nivel Machucones, golpes, contusiones	Orden y aseo, Inspección de lugares de trabajo
Transporte de reetroexcavadora en cama baja	De seguridad (Accidente de transito)	Atropellamientos, golpes, accidentes de tránsito	Seguir lo cotemplado en PMT.

RESPONSABLE ENCARGADO	RESIDENTE	COORDINADOR SST
Nombre LAURA CAMILA PINZON LOPEZ	Nombre Yulley Bedoya	Nombre Laura Camila Pinzon.
C.C 1.020.780.265	C.C 1102367663	C.C 1020780265
Firma	Firma	Firma

Powered by CamScanner

Reconozco los riesgos a los cuales estaré expuesto durante el desarrollo de mi labor y me comprometo a velar por mi seguridad y salud durante las actividades asignadas, cumpliendo los controles establecidos y haciendo uso adecuado de los elementos de protección personal requeridos.

No	NOMBRE	No DOCUMENTO	FIRMA
1	Fabián Guzmán	1057710755	
2	Luis Morales	3120802	
3	Oscar Contreras	79670689	
4	Manuel Fernando Rojas R.	1049619733	
5	Santiago Saina L.	1024987371	Santiago S.
6	Carlos Guerrero F.	1020790295	Carlos Fernando
7	Tyare Ignacio.	80394715	
8	Laura Pinzon	1020780263	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

1020780263

Powered by CamScanner

VERTICAL	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO: EST VERSIÓN: 1 FECHA: 04.07.2025

PROYECTO:	CONTRATO N° 047 DE 2025	EMPRESA:	Demoliciones Pinzón López SAS

1. DATOS GENERALES Y ACTIVIDAD A DESARROLLAR

DIA(S):	DE: 07/07/25	HA: 13-07-25	MES: Julio	AÑO: 2025

FRENTE DE TRABAJO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR	Bodega FAC	METODOLOGIA/PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ASOCIADO	Demolición	ACTIVIDAD ESPECIFICA -TAREA	Demolición.
NOMBRE ING. RESIDENTE OBRA:	Jesser Diaz	TIPO DE ACTIVIDAD: Rutinaria X / No Rutinaria	Remonte		
NOMBRE DEL PROFESIONAL SST:	Yuley Bodillo Q	EN CASO DE EMERGENCIA PARA ACTIVAR MEDEVAC: NOMBRE DEL RESPONSABLE: Sara Pinzon CELULAR 3185326743 NOMBRE RESPONSABLE: Yuley Bodillo CELULAR 3180216581			

NOTA: SI EL TRABAJO ES INSEGURO NO LO INICIE Y/O SUSPENDALO INMEDIATAMENTE HASTA QUE SE TENGAN CONDICIONES SEGURAS PARA REALIZARLO

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas: Almadanas, demoledor, destornillador manilas, picas, barras Equipos: Maquina excavadora, oxicorte

3. REALICE EL SIGUIENTE ANALISIS DE RIESGOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES EN EL SITIO DONDE SE VA A REALIZAR LA TAREA (SI/NA)

TIPO	POR QUE PELIGRO	QUE SE PUEDE PASAR	QUE TAN GRAVE PUEDE SER	QUE CONTROLES SE REQUIEREN	SI / NA
Físicos	Ruido por encima de 85 dB	Pérdida o disminución de la audición	Considerar el nivel del ruido y la duración de la exposición	Uso de protección auditiva de copa o doble, estableciendo pausas activas y/o rotación de personal de acuerdo a niveles de exposición	Si
	Ruido menor de 85 dB (afecta la comunicación a corta distancia)	Pérdida o disminución de la audición	Considerar el nivel del ruido y la duración de la exposición	Uso de protección auditiva de inserción	Si
	Mala iluminación	Aumenta el riesgo de accidentes	Considerar la cantidad de luz y el trabajo que se va a desarrollar	Revisar la necesidad de iluminación adicional, en especial si se trabaja de noche	NO
	Vibración de cuerpo entero	Molestias o enfermedades de la espalda	Considerar la magnitud de la vibración, la duración de la exposición y la frecuencia de esta exposición	Revisar el estado de los sistemas de amortiguación de los vehículos o equipos Mantenimiento a equipos y vías Pausas activas	Si
	Humedad	Irritación o infección de piel	Considerar el tiempo y las condiciones de exposición y el clima o temperatura	Tomar medidas para mantener las partes del cuerpo secas (guantes, botas de caucho, delantales)	NO
	Rayos ultravioleta por trabajos de soldadura o corte	Quemaduras de piel (la gravedad depende en parte del lugar de la quemadura) Golpe de arco de soldador en los ojos	Considerar el tipo de soldadura, la cantidad de equipos de soldadura en el área y la cantidad de soldadura requerida	Usar ropa de protección de algodón y manga Usar gafas y careta de soldadura con filtros según el tipo de soldadura Aislar las zonas de soldadura Evitar la presencia de personas ajenas al trabajo de soldadura en la zona	Si
	Rayos ultravioleta por trabajo a la intemperie y exposición al sol	Quemaduras de piel y lesiones en los ojos por exposición aguda excesiva	Considerar la zona de trabajo, la hora de trabajo y la presencia de superficies que reflejan (arena, nieve, concreto)	Usar ropa de algodón de manga larga Se pueden proteger con otras prendas como monjas o aleronas Usar gafas (oscuras o claras) con protección UV Usar protector solar	Si
	Radiación ionizante (por ejemplo en pruebas no destructivas)	Se pueden producir lesiones en diferentes órganos y en la sangre	Considerar el tipo de radiación, el tiempo de exposición, el número de trabajadores presentes y las horas a las que se realiza el trabajo	Las personas deben estar entrenadas para el trabajo específico Usar medidores o dosímetros personales para controlar las dosis recibidas En el área de radiación se debe evitar la presencia de personas ajenas a la labor, señalización Según la tarea se pueden requerir elementos de protección específicos	NO
	Rayos infrarrojos (por fuentes que irradian calor, como hornos o presencia de material al rojo)	Quemaduras de piel o de ojos	Considerar el tipo de fuente, su temperatura y el tiempo de exposición	Ropa de protección de algodón según labor Gafas y caretas con filtros IR adecuados Limitación del ingreso a la zona Uso de pantallas o mamparas para aislar el área y evitar la exposición directa a calor	NO
Químicos	Líquidos - Irritantes (como los combustibles) - Corrosivos (como los ácidos) - Tóxicos (como los disolventes)	Según el caso - Irritación local de piel o mucosas - Quemaduras graves de piel y ojos - Intoxicaciones	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	No manipular productos sin identificar Revisar las fichas y MSDS para definir las precauciones que se deben aplicar Usar protección de piel, ojos y respiratoria según lo que aparece en las MSDS Capacitación de los trabajadores expuestos Verificar almacenamiento, diques, kit de derrames	Si
	Material particulado (polvo)	Enfermedad respiratoria o del pulmón según la sustancia	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	Revisar los rotulos y MSDS para definir las precauciones que se deben aplicar Protección de piel, ojos y respiratoria adecuada para el tipo de sustancia Definir si se necesita algún sistema de ventilación	Si
	Sustancias asfixiantes Gases y vapores	Atmósferas asfixiantes (según condiciones de trabajo) donde se puede presentar una fatalidad	Considerar el tipo de sustancia y el lugar donde se va a trabajar	Permisos y certificados de trabajo según necesidad Usar equipos con suministro de aire Controlar el sistema de suministro de aire Definir la necesidad de vigía para el trabajo Medición de gases y tipo según el producto Anotar otros controles específicos según labor	NO
Biológicos	Microorganismos: virus, bacterias, parásitos, hongos Casi siempre por la presencia de insectos que pueden transmitirlos	Se pueden presentar enfermedades infectocontagiosas, como dengue, malaria, infecciones de piel	Considerar el tipo de enfermedad (las infecciones de piel pueden ser menos graves que un dengue hemorrágico)	Verificación de esquemas de vacunación Usar ropa de manga larga y si es necesario monjas Usar repelentes Adecuada manipulación del agua y los alimentos Manejo adecuado de desechos y plagas Control de aguas apozadas, rocería y retiro de maleza	Si
	Animales (incluyendo insectos y ofidios) y plantas	Según el caso se pueden presentar mordeduras, picaduras, irritaciones o enfermedades transmitidas por animales (como rabia)	Considerar el tipo de animales en el área, influye la presencia de personas alérgicas	Revisión de la zona para definir si hay presencia de panales o nidos de animales Identificar si hay personas alérgicas Usar calzado y ropa adecuados para el terreno Evitar conductas como entrar en zonas de maleza sin protección, molestar a los animales o gritar Usar traje especial para insectos según labor	Si

Powered by CamScanner

ERGONÓMICOS	Esfuerzos y manejo manual de cargas	Aumento de la fatiga y posibles lesiones como desgarros musculares, dolores de espalda o de articulaciones	Considerar el peso de la carga y la duración del esfuerzo	Verificar el peso a manejar para definir la técnica de trabajo, el número de personas requeridas o la necesidad de usar ayudas mecánicas adecuadas. Capacitación a los trabajadores.	SI
	Movimientos repetitivos	Lesiones de músculos, tendones y articulaciones , por lo general de brazos y manos	Considerar si el mismo movimiento se repite una y otra vez y la presencia de descansos	Verificar los ciclos de trabajo: si la tarea es muy repetitiva, se pueda rotar entre varias tareas donde los movimientos sean diferentes. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Capacitación en prevención de lesiones osteo-musculares	SI
	Posturas prolongadas, incómodas o inadecuadas	Fatiga y posibles lesiones de muscular (espasmo, debilidad o dolor) Se pueden agudizar síntomas de enfermedades anteriores	Considerar el grado de incomodidad de la postura y el tiempo en que se debe mantener	Limitar el tiempo de trabajo en esta postura Usar apoyos para disminuir la presión o para no sostenerse en el vacío Verificar si hay otra forma de realizar la tarea Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Capacitación, incluyendo la forma segura de levantarse	SI
PSICOLABORALES	Trabajo en turnos Trabajo nocturno Atención de personas Condiciones de la tarea Gestión Organizacional	Sensación de estrés Se pueden afectar las relaciones entre las personas Posibles efectos en salud	Considerar los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, el tipo de tarea	Verificar la rotación de turnos Verificar cumplimiento de jornada de trabajo establecida Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación Fortalecer la concientización sobre reconocimiento de actitudes (estados) y comportamientos (errores) para prevención y control de riesgos Verificar condiciones de la tarea	SI
DE SEGURIDAD	Incendio y explosión	Quemaduras, asfixia, lesiones, muertes, contaminación ambiental y pérdidas económicas	Considerar la presencia y cantidad de sustancias inflamables y si estas generan ambientes donde se puedan generar explosiones	Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo en caliente Disminuir la cantidad de líquidos combustibles o inflamables cuando sea posible Almacenar las sustancias peligrosas adecuadamente Revisar la disponibilidad de extintores adecuados, suficientes y en buen estado Capacitación de los trabajadores, uso de epp según la tarea	SI
	Eléctrico	Electrización (cuadro leve), electrocución (cuadro severo), quemaduras y aumento del riesgo de incendio	Considerar las características de la fuente eléctrica y de la electricidad (alterna o continua) y las condiciones del ambiente (humedad, etc.)	Verificar controles: aterrizaje, aislamiento, protección de partes vivas y prácticas de trabajo Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo (frío o caliente), del certificado de aislamiento y del procedimiento de trabajos eléctricos y de aislamiento En el caso de electricidad continua definir los controles específicos a aplicar Definir los EPP específicos y vigilar su uso Verificar condiciones adecuadas de extensiones, tableros eléctricos	NO
	Locativo (trabajo en alturas)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento de trabajo en alturas OHS-PR-08 (debe estar disponible) Permisos de trabajo Listas de chequeo personal y equipos certificados Coordinador de TSA accesos y puntos de anclaje seguros	SI
	Locativo (Armo y desarmo de Andamios)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar, posicionamiento del andamio	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento de trabajo Armado seguro de Andamios OHS-PR-05 (debe estar disponible) Andamieros certificados Coordinador de TSA Tarjeta roja o verde para control de acceso Verificar estabilidad y diseño	NA
	Locativo (trabajos de excavación)	Lesiones por aplastamiento o ahogamiento, potencialmente mortales	Considerar terreno, tipo de excavación, condiciones del entorno	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento Manejo de Excavaciones y Taludes OHS-PR-09 (debe estar disponible) Verificar interferencias Demarcar y señalizar uso de entibados si aplica rutas de acceso y evacuación retiro de escombros de borde de excavación	NA
	Locativo (espacios confinados)	Condiciones como asfixia, ahogamiento, intoxicaciones o quemaduras, potencialmente mortales	Considerar tipo y grado de espacio confinado	Verificación del cumplimiento del procedimiento de espacios confinados OHS-PR-26 (debe estar disponible) Permiso de Trabajo Personal certificado Verificar controles antes del ingreso, mediciones, ventilación, epp Rutas de acceso y evacuación	NA
	Mecanico (izaje de cargas)	Contusiones, heridas, fricciones, fracturas, volcamientos, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del izaje, tipo de carga, equipos a utilizar y del entorno	Verificación del cumplimiento del procedimiento de Izaje Mecánico de Cargas OHS-PR-05 (debe estar disponible) Operadores, aparejadores y equipos certificados (competencias, capacidades) Listas de chequeo de equipos y aparejos Planes de izaje Verificación de condiciones del terreno. Estabilizadores con soportes adecuados, gatos extendidos Señalización y delimitación de áreas Distancias de seguridad de líneas eléctricas No debe haber personal bajo la carga, líneas de peligro	SI
	Locativo (superficies de trabajo, distribución de áreas)	Contusiones, heridas, fricciones, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del área y del entorno	Verificación de condiciones del terreno Señalización y delimitación de áreas Senderos peatonales Orden y aseo del área Demarcación de huecos y espacios de caída	SI
	Almacenamiento	Contusiones de diversa gravedad (incluso aplastamientos) por caída de objetos mal acopiados como aceros y tubería	Considerar condiciones de los acopios	Verificación de las condiciones de almacenamiento de los acopios Sistemas de almacenaje Elementos de bloqueo Señalización	SI
	Mecánico (manejo de herramientas, equipos, elementos y materiales, puntos de operación, mecanismos en movimiento, elementos a presión)	Lesiones de manos (se debe definir el riesgos, desde contusiones, pasando por fracturas hasta amputaciones) Lesiones oculares o faciales de diversa gravedad	Considerar herramientas y equipos a operar, condiciones del área y del entorno	Inspección preoperacional de herramientas y equipos Identificar puntos de atrapamiento No operar equipos sin autorización Verificación y buen uso de guardas Aplicación de los estándares de cierre y aislamiento de energía Uso de elemento protección personal Verificación de entorno de trabajo	SI
	Transporte (al interior de las instalaciones de la empresa o fuera cuando es suministrado por la empresa)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar vehículos adecuados y desplazamientos	Verificación del cumplimiento de los parametros estabracidos de seguridad vial No operar vehículos sin autorización Hacer buen uso de los vehículos Uso de rutas autorizadas	SI
	Orden público	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales (lesiones por armas blancas o de fuego, explosiones)	Considerar condiciones de seguridad de cada área	Verificación de cumplimiento de lineamientos de seguridad física Mantenimiento de cerramiento perimetral Personal autorizado en obra Uso de carnet y dotación correspondiente	SI
	Condiciones naturales (Sismo, Terremoto, Tormentas)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar eventos naturales no esperados	Verificación de condiciones climáticas Suspensión de labores cuando se requiera Ubicar puntos de resguardo adecuados Identificar puntos de encuentro para emergencias	SI
	Emergencia	Lesiones y atención de eventos	Considerar que se puede tener cualquier tipo de emergencia en cualquier momento	Verificar equipos de atención de emergencias, camillas, botiquines, extintores, rutas de evacuación, puntos de encuentro, flujograma de atención de emergencias	SI

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE PELIGROS Y RIESGOS ADICIONALES IDENTIFICADOS EN EL AREA / DURANTE LA SEMANA Y/O ACTIVIDADES SIMULTANEAS

TAREA	PELIGROS/RIESGOS IDENTIFICADOS	CONSECUENCIA POTENCIAL (Qué y por qué puede pasar?)	CONTROLES	RESPONSABLE

5. ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA LABOR

CHALECO REFLECTIVO	NA	MONOGAFAS	SI	GUANTES DE CARNAZA	SI	CARETA DE SOLDADOR	NO	ARNES DE SEGURIDAD	SI
CASCO	SI	P. AUDITIVOS SENCILLO	SI	GUANTES POLIURETANO	NO	PECHERA DE VAQUETA	NO	ESLINGA SIMPLE	NO
BOTAS DE SEGURIDAD	SI	P. AUDITIVOS COPA	SI	GUANTE VAQUETA	SI	POLAINAS	NO	ESLINGA DE RESTRICCION	SI
GAFAS	SI	DELANTAL O PETO	NO	GUANTES NITRILO	NO	CHAQUETA O MANGAS SOLD	SI	LINEA DE VIDA	SI
MASCARILLA	SI	VISOR	NO	GUANTES SOLDADOR	NO	MASC GASES/ VAPORES	NO	TIE OFF	SI

OTROS NECESARIOS PARA LA TAREA ESPECIFICA

6. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURAS	X	ESPACIOS CONFINADOS		IZAJE DE CARGAS	X	EXCAVACIONES		ELECTRICO	
TRABAJO EN CALIENTE	X	OTRO		CUAL					

7. EQUIPO QUE ELABORA Y AUTORIZA EL ATS (RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LOS CONTROLES PARA LA TAREA)

AUTORIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA	FECHA
TECNICO QUE AUTORIZA LA TAREA				
ELABORA LIDER EJECUTANTE	laura Pinzon	1020780265	LuP	070725
VERIFICA Y AUTORIZA SST	Yuliana Bedoya	1102367663	Yu-Bed3	07-0725

8. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA LABOR A LA QUE SE LA HA DIVULGADO EL ATS Y CONOCE LOS RIESGOS Y CONTROLES A IMPLEMENTAR

"MANIFIESTO QUE ME ENCUENTRO EN CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES OPTIMAS PARA DESEMPEÑAR MI LABOR DE FORMA EFICIENTE, ASÍ MISMO, MANIFIESTO QUE COMPRENDO LAS PRECAUCIONES Y CONTROLES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTO CUIDADO, CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, DE IGUAL MANERA ME COMPROMETO A REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES"

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Miguel Rodyon	79824251	OP Retro	Miguel						
Carlos Guevara	1020790295	Oficial	Carlos						
Luis Morales	3720902	oficial							
Santiago	1024987371	OP							
Jose Ignacio	80394715	OF							
Fabian Gambi	1077107755	OF							
ALEJANDRO SERNA	1022941492	OF							
laura Pinzón	1020780265	Residente	LuP						

9. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

VERTICAL	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO: SST VERSION: 1 FECHA: 04/07/2025

PROYECTO:	CONTRATO No 005-00-A-COFAC-DIFRA	EMPRESA:	Vertical diseño

1. DATOS GENERALES Y ACTIVIDAD A DESARROLLAR

INICIO: DE:	14-07-25	FIN:	18-07-25	MES:	Julio	AÑO:	2025

FRENTE DE TRABAJO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR	TNC	METODOLOGIA/PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ASOCIADO	demolicion	ACTIVIDAD ESPECIFICA -TAREA	corte acero demolicion manual
NOMBRE ING. RESIDENTE OBRA:	Jelson Duy Dyala	TIPO DE ACTIVIDAD:	RUTINARIA X		NO RUTINARIA
NOMBRE DEL PROFESIONAL SST:	Yuley Badillo	EN CASO DE EMERGENCIA PARA ACTIVAR MEDEVAC: NOMBRE DEL RESPONSABLE: Yuley Badillo CELULAR 3136016581 NOMBRE RESPONSABLE: Jelson Duy CELULAR 3242291701			

NOTA: SI EL TRABAJO ES INSEGURO NO LO INICIE Y/O SUSPENDALO INMEDIATAMENTE HASTA QUE SE TENGAN CONDICIONES SEGURAS PARA REALIZARLO

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas:	Pala, pica, maitillo barra	Equipos:	Taladro demledor, oxicorte, retroexcavadora

3. REALICE EL SIGUIENTE ANALISIS DE RIESGOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES EN EL SITIO DONDE SE VA A REALIZAR LA TAREA (SIÑA)

TIPO	POR QUÉ PELIGRO	QUÉ ME PUEDE PASAR	QUÉ TAN GRAVE PUEDE SER	QUÉ CONTROLES SE REQUIEREN	SI / NA
FISICOS	Ruido menor de 85 dB (afecta la comunicación a corta distancia)	Pérdida o disminución de la audición	Considerar el nivel del ruido y la duración de la exposición	Uso de protección auditiva de inserción	Si
	Vibración de cuerpo entero	Molestias o enfermedades de la espalda	Considerar la magnitud de la vibración, la duración de la exposición y la frecuencia de esta exposición	Revisar el estado de los sistemas de amortiguación de los vehículos o equipos Mantenimiento a equipos y vías Pausas activas	Si
	Oxicorte	Quemaduras, lesiones oculares, lesiones termicas medio, lesiones musculares, translornos musculo-esqueleticos.	Considerar la zona de trabajo, tipo de exposición, los tiempos de descanso, mantener extintores cercanos.	Verificar el estado del equipo antes de iniciar,usar siempre los EPP adecuados(careta para oxicorte, guantes de cuero, mandil de cuero, botas de seguridad, gafas de seguridad bajo la careta).	Si
	Rayos ultravioleta por trabajos de soldadura o corte	Quemaduras de piel (la gravedad depende en parte del lugar de la quemadura) Golpe de arco de soldador en los ojos	Considerar el tipo de soldadura, la cantidad de equipos de soldadura en el área y la cantidad de soldadura requerida	Usar ropa de protección de algodón y monja Usar guantes, delantal y/o polainas de cuero Usar gafas y máscara de soldadura con filtros según el tipo de soldadura Aislar las zonas de soldadura Evitar la presencia de personas ajenas al trabajo de soldadura en la zona	N/A
	Rayos ultravioleta por trabajo a la intemperie y exposición al sol	Quemaduras de piel y lesiones en los ojos por exposición aguda excesiva	Considerar la zona de trabajo, la hora de trabajo y la presencia de superficies que reflejan (arena, nieve, concreto)	Usar ropa de algodón de manga larga. Se pueden proteger con otras prendas como monjas o alerones. Usar gafas (oscuras o claras) Usar protector solar	Si
QUÍMICOS	Liquidos - Irritantes (como los combustibles) - Corrosivos (como los ácidos) - Tóxicos (como los disolventes)	Según el caso: - Irritación local de piel o mucosas - Quemaduras graves de piel y ojos - Intoxicaciones	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	No manipular productos sin identificar Revisar los rotulos y MSDS para definir las precauciones que se deben aplicar Usar protección de piel, ojos y respiratoria según lo que aparece en las MSDS Capacitación de los trabajadores expuestos Verificar almacenamiento, diques, kit de derrames	Si
	Material particulado (polvo)	Enfermedad respiratoria o del pulmón según la sustancia	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	Revisar los rótulos y MSDS para definir las precauciones que se deben aplicar Protección de piel, ojos y respiratoria adecuada para el tipo de sustancia Definir si se necesita algún sistema de ventilación	Si
	Sustancias asfixiantes Gases y vapores	Almósferas asfixiantes (según condiciones de trabajo) donde se puede presentar una fatalidad	Considerar el tipo de sustancia y el lugar donde se va a trabajar	Permisos y certificados de trabajo según necesidad Usar equipos con suministro de aire Controlar el sistema de suministro de aire Definir la necesidad de vigia para el trabajo Medición de gases y frecuencias de medición si aplica Anotar otros controles especificos según labor	SI
BIOLÓGICOS	Microorganismos: virus, bacterias, parásitos, hongos Casi siempre por la presencia de insectos que puedan transmitirlos	Se pueden presentar enfermedades infectocontagiosas, como dengue, malaria, infecciones de piel	Considerar el tipo de enfermedad (las infecciones de piel pueden ser menos graves que un dengue hemorrágico)	Verificación de esquemas de vacunación Usar ropa de manga larga y si es necesario monjas Usar repelentes Adecuada manipulación del agua y los alimentos Manejo adecuado de desechos y plagas Control de aguas apozadas, rocería y retiro de maleza	Si
	Animales (incluyendo insectos y ofidios) y plantas	Según el caso se pueden presentar mordeduras, picaduras, irritaciones o enfermedades transmitidas por animales (como rabia)	Considerar el tipo de animales en el área, influye la presencia de personas alérgicas	Revisión de la zona para definir si hay presencia de panales o nidos de animales Identificar si hay personas alérgicas Usar calzado y ropa adecuados para el terreno	NA

Powered by CamScanner

ERGONÓMICOS	Esfuerzos y manejo manual de cargas	Aumento de la fatiga y posibles lesiones como desgarros musculares, dolores de espalda o de articulaciones	Considerar el peso de la carga y la duración del esfuerzo	Verificar el peso a manejar para definir la técnica de trabajo, el número de personas requeridas o la necesidad de usar ayudas mecánicas adecuadas. Concientizar a los trabajadores.	SI
	Movimientos repetitivos	Lesiones de músculos, tendones y articulaciones , por lo general de brazos y manos	Considerar si el mismo movimiento se repite una y otra vez y la presencia de descansos	Verificar los ciclos de trabajo: si la tarea es muy repetitiva, se puede rotar entre varias tareas donde los movimientos sean diferentes. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Charla en prevención de lesiones osteo-musculares.	SI
	Posturas prolongadas, incómodas o inadecuadas	Fatiga y posibles lesiones de muscular (espasmo, debilidad o dolor) Se pueden agudizar síntomas de enfermedades anteriores	Considerar el grado de incomodidad de la postura y el tiempo en que se debe mantener	Limitar el tiempo de trabajo en esta postura Usar apoyos para disminuir la presión o para no sostenerse en el vacío Verificar si hay otra forma de realizar la tarea Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación.	SI
PSICOLABORALES	Condiciones de la tarea Gestión Organizacional	Sensación de estrés Se pueden afectar las relaciones entre las personas Posibles efectos en salud	Considerar los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, el tipo de tarea	Verificar cumplimiento de jornada de trabajo establecida Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Fortalecer la concientización sobre reconocimiento de actitudes (estados) y comportamientos (errores) para prevención y control de riesgos Verificar condiciones de la tarea	SI
DE SEGURIDAD	Incendio y explosión	Quemaduras, asfixia, lesiones, muertes, contaminación ambiental y pérdidas económicas	Considerar la presencia y cantidad de sustancias inflamables y si estas generan ambientes donde se puedan generar incendios	Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo en caliente Disminuir la cantidad de líquidos combustibles o inflamables cuando sea posible Almacenar las sustancias peligrosas adecuadamente Revisar la disponibilidad de extintores adecuados, suficientes y en buen estado Capacitación de los trabajadores, uso de epp según la tarea	SI
	Eléctrico	Electrización (cuadro leve), electrocución (cuadro severo), quemaduras y aumento del riesgo de incendio	Considerar las características de la fuente eléctrica y de la electricidad (alterna o continua) y las condiciones del ambiente (humedad, etc.)	Verificar controles: aterrizaje, aislamiento, protección de partes vivas y prácticas de trabajo Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo (frío o caliente), del certificado de aislamiento y del procedimiento de trabajos eléctricos y de aislamiento En el caso de electricidad continua definir los controles específicos a aplicar Definir los EPP específicos y vigilar su uso Verificar condiciones adecuadas de extensiones, tableros eléctricos	SI
	Locativo **(trabajo en alturas)**	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar	Permisos de trabajo Listas de chequeo personal y equipos certificados Coordinador de TSA accesos y puntos de anclaje seguros	SI
	Locativo (superficies de trabajo, distribución de áreas)	Contusiones, heridas, fricciones, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del área y del entorno	Verificación de condiciones del terreno Señalización y delimitación de áreas Senderos peatonales Orden y aseo del área Demarcación de huecos y espacios de caída	SI
	Mecánico (manejo de herramientas, equipos, elementos y materiales, puntos de operación, mecanismos en movimiento, elementos a presión)	Lesiones de manos (se debe definir el riesgos, desde contusiones, pasando por fracturas hasta amputaciones) Lesiones oculares o faciales de diversa gravedad	Considerar herramientas y equipos a operar, condiciones del área y del entorno	Inspección preoperacional de herramientas y equipos Identificar puntos de atrapamiento No operar equipos sin autorización Verificación y buen uso de guardas Uso de elemento protección personal Verificación de entorno de trabajo	SI
	Trabajos en vía pública	Atropellos, caídas, golpes con vehículos	considerar la exposicion a tráfico horarios con menos tráfico	Señalizacion adecuada de la zona vial trafico auxiliares de uso de protección personal	NA
	Transporte (al interior de las instalaciones de la empresa o fuera cuando es suministrado por la empresa)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar vehículos adecuados y desplazamientos	Verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos de seguridad vial No operar vehículos sin autorización Hacer buen uso de los vehículos Uso de rutas autorizadas	SI
	Orden público	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales (lesiones por armas blancas o de fuego, explosiones)	Considerar condiciones de seguridad de cada área	Verificación de cumplimiento de lineamientos de seguridad física Mantenimiento de cerramiento perimetral Personal autorizado en obra Uso de carnet y dotación correspondiente	SI
	Condiciones naturales (Sismo, Terremoto, Tormentas)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar eventos naturales no esperados	Verificación de condiciones climáticas Suspensión de labores cuando se requiera Ubicar puntos de resguardo adecuados Identificar puntos de encuentro para emergencias	SI
	Emergencia	Lesiones y atención de eventos	Considerar que se pueda tener cualquier tipo de emergencia en cualquier momento	Verificar equipos de atención de emergencias, camillas, botiquines, extintores, rutas de evacuación, puntos de encuentro	SI

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE PELIGROS Y RIESGOS ADICIONALES IDENTIFICADOS EN EL AREA / DURANTE LA SEMANA Y/O ACTIVIDADES SIMULTANEAS

TAREA	PELIGROS/RIESGOS IDENTIFICADOS	CONSECUENCIA POTENCIAL (Qué y por qué puede pasar?)	CONTROLES	RESPONSABLE

5. ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA LABOR

CHALECO REFLECTIVO		MONOGAFAS		GUANTES DE CARNAZA	✓	CAREETA DE SOLDADOR		ARNES DE SEGURIDAD	✓
CASCO	✓	P. AUDITIVOS SENCILLO		GUANTES POLIURETANO		PECHERA DE VAQUETA		ESLINGA EN Y	✓
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	P. AUDITIVOS COPA		GUANTE VAQUETA	✓	POLAINAS		ESLINGA DE RESTRICCION	✓
GAFAS	✓	DELANTAL O PETO		GUANTES NITRILO	✓	CHAQUETA O MANGAS SOLD		LINEA DE VIDA	✓
MASCARILLA		VISOR		GUANTES SOLDADOR		MASC GASES/ VAPORES		TE OFF	✓

OTROS NECESARIOS PARA LA TAREA ESPECIFICA

6. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURAS	X	ESPACIOS CONFINADOS		IZAJE DE CARGAS		EXCAVACIONES		ELECTRICO	
TRABAJO EN CALIENTE	X	OTRO		CUAL					

7. EQUIPO QUE ELABORA Y AUTORIZA EL ATS (RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LOS CONTROLES PARA LA TAREA)

AUTORIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA	FECHA
TECNICO QUE AUTORIZA LA TAREA	Jeiffon Diaz	1013597879		14-07-25
ELABORA LIDER EJECUTANTE	Laura Pinzon	1020780265		14-07-25
VERIFICA Y AUTORIZA SST	Wilen Badillo	1102367663		14-07-25

8. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA LABOR A LA QUE SE LA HA DIVULGADO EL ATS Y CONOCE LOS RIESGOS Y CONTROLES A IMPLEMENTAR

"MANIFIESTO QUE ME ENCUENTRO EN CONDICIONES FISICAS Y MENTALES OPTIMAS PARA DESEMPEÑAR MI LABOR DE FORMA EFICIENTE. ASÍ MISMO, MANIFIESTO QUE COMPRENDO LAS PRECAUCIONES Y CONTROLES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTO CUIDADO, CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, DE IGUAL MANERA ME COMPROMETO A REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES"

NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Luis Morales	3129802	Oficial							
Santiago Seina	1024487372	Oficial							
Alejandro Seina	1022991452	Oficial				—	—		
Carlos Guerrero	1020790295	oficial							
Jose I. Gamboa	80344715	oficial							
Miguel Rodriguez	79824231	operador							
Fabian Gamba	1057710755	oficial			—	—	—		
Laura Pinzon	1020780265	Residente				—			
Santiago Seina	1024487371	—	—	—	—	—	—		
Edwin Ruta	7009772020	Ayudante							

9. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO: SST VERSIÓN: 1 FECHA: 04/07/2025

PROYECTO:	CONTRATO No 005-00-A-COFAC-OBRA	EMPRESA:	Vertical Diseño

1. DATOS GENERALES Y ACTIVIDAD A DESARROLLAR

INICIO: DE:	21-07-25	FIN:	25-07-25	MES:	Julio	AÑO:	2025

FRENTE DE TRABAJO: DISPENSARIO CONJUNTO DE BANDAD MILITAR	FAC	METODOLOGIA/PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ASOCIADO	Remolcar	ACTIVIDAD ESPECIFICA - TAREA	Corte oxicorte Excavacion
NOMBRE ING. RESIDENTE OBRA:	Jeison Diaz, Yilley Bodilla	TIPO DE ACTIVIDAD: RUTINARIA	X	NO RUTINARIA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL SST:		EN CASO DE EMERGENCIA PARA ACTIVAR MEDEVAC: NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jeison Diaz CELULAR NOMBRE RESPONSABLE: Yilley Bodilla CELULAR 3136026581			

NOTA: SI EL TRABAJO ES INSEGURO NO LO INICIE Y/O SUSPENDALO INMEDIATAMENTE HASTA QUE SE TENGAN CONDICIONES SEGURAS PARA REALIZARLO

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas:	Pala, bala,	Equipos:	oxicorte, taladro, retro

3. REALICE EL SIGUIENTE ANALISIS DE RIESGOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES EN EL SITIO DONDE SE VA A REALIZAR LA TAREA (SI/NA)

TIPO	POR QUE PELIGRO	QUÉ ME PUEDE PASAR	QUÉ TAN GRAVE PUEDE SER	QUÉ CONTROLES SE REQUIEREN	SI / NA
FISICOS	Ruido menor de 85 dB (afecta la comunicación a corta distancia)	Perdida o disminución de la audición	Considerar el nivel del ruido y la duración de la exposición	Uso de protección auditiva de inserción	SI
	Vibración de cuerpo entero	Molestias o enfermedades de la espalda	Considerar la magnitud de la vibración, la duración de la exposición y la frecuencia de esta exposición	Revisar el estado de los sistemas de amortiguación de los vehículos o equipos Mantenimiento a equipos y vías Pausas activas	SI
	Oxicorte	Quemaduras, lesiones oculares, lesiones térmicas medio, lesiones musculares, transtornos musculo-esqueléticos.	Considerar la zona de trabajo, tipo de exposición, los tiempos de descanso, mantener extintores cercanos.	Verificar el estado del equipo antes de iniciar,usar siempre los EPP adecuados(careta para oxicorte, guantes de cuero, mandil de cuero, botas de seguridad, gafas de seguridad bajo la careta).	SI
	Rayos ultravioleta por trabajos de soldadura o corte	Quemaduras de piel (la gravedad depende en parte del lugar de la quemadura) Golpe de arco de soldador en los ojos	Considerar el tipo de soldadura, la cantidad de equipos de soldadura en el área y la cantidad de soldadura requerida	Usar ropa de protección de algodón y manga Usar guantes, delantal y/o polainas de cuero Usar gafas y máscara de soldadura con filtros según el tipo de soldadura Aislar las zonas de soldadura Evitar la presencia de personas ajenas al trabajo de soldadura en la zona	SI
	Rayos ultravioleta por trabajo a la intemperie y exposición al sol	Quemaduras de piel y lesiones en los ojos por exposición aguda excesiva	Considerar la zona de trabajo, la hora de trabajo y la presencia de superficies que reflejan (arena, nieve, concreto)	Usar ropa de algodón de manga larga. Se pueden proteger con otras prendas como monjas o alerones. Usar gafas (oscuras o claras) Usar protector solar	SI
QUIMICOS	Liquidos - Irritantes (como los combustibles) - Corrosivos (como los ácidos). - Tóxicos (como los disolventes)	Según el caso: - Irritación local de piel o mucosas - Quemaduras graves de piel y ojos - Intoxicaciones	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	No manipular productos sin identificar Revisar los rótulos y MSDS para definir las precauciones que se deben aplicar Usar protección de piel, ojos y respiratoria según lo que aparece en las MSDS Capacitación de los trabajadores expuestos Verificar almacenamiento, diques, kit de derrames	SI
	Material particulado (polvo)	Enfermedad respiratoria o del pulmón según la sustancia	Considerar el tipo da sustancia, su concentración y tipo de exposición	Revisar los rótulos y MSDS para definir las precauciones que se deben aplicar Protección de piel, ojos y respiratoria adecuada para el tipo de sustancia Definir si se necesita algún sistema de ventilación	SI
	Sustancias asfixiantes Gases y vapores	Atmósferas asfixiantes (según condiciones de trabajo) donde se pueda presentar una fatalidad	Considerar el tipo de sustancia y el lugar donde se va a trabajar	Permisos y certificados de trabajo según necesidad Usar equipos con suministro de aire Controlar el sistema de suministro de aire Definir la necesidad de vigía para el trabajo Medición de gases y frecuencias de medición si aplica Anotar otros controles específicos según labor	SI
BIOLÓGICOS	Microorganismos: virus, bacterias, parásitos, hongos Casi siempre por la presencia de insectos que pueden transmitirlos	Se pueden presentar enfermedades infectocontagiosas, como dengue, malaria, infecciones de piel	Considerar el tipo de enfermedad (las infecciones de piel pueden ser menos graves que un dengue hemorrágico)	Verificación de esquemas de vacunación Usar ropa de manga larga y si es necesario mangas Usar repelentes Adecuada manipulación del agua y los alimentos Manejo adecuado de desechos y plagas Control de aguas apozadas, rocería y retiro de maleza	SI
	Animales (incluyendo insectos y ofidios) y plantas	Según el caso se pueden presentar mordeduras, picaduras, irritaciones o enfermedades transmitidas por animales (como rabia)	Considerar el tipo de animales en el área, influye la presencia de personas alérgicas	Revisión de la zona para definir si hay presencia de panales o nidos de animales Identificar si hay personas alérgicas Usar calzado y ropa adecuados para el terreno	SI
ERGONÓMICOS	Esfuerzos y manejo manual de cargas	Aumento de la fatiga y posibles lesiones como desgarros musculares, dolores de espalda o de articulaciones	Considerar el peso de la carga y la duración del esfuerzo	Verificar el peso a manejar para definir la técnica de trabajo, el número de personas requeridas o la necesidad de usar ayudas mecánicas adecuadas. Concientizar a los trabajadores	SI
	Movimientos repetitivos	Lesiones de músculos, tendones y articulaciones , por lo general de brazos y manos	Considerar si el mismo movimiento se repite una y otra vez y la presencia de descansos	Verificar los ciclos de trabajo: si la tarea es muy repetitiva, se puede rotar entre varias tareas donde los movimientos sean diferentes. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Charla de prevención de lesiones osteo-musculares.	SI
	Posturas prolongadas, incómodas o inadecuadas	Fatiga y posibles lesiones de muscular (espasmo, debilidad o dolor) Se pueden agudizar síntomas de enfermedades anteriores	Considerar el grado de incomodidad de la postura y el tiempo en que se debe mantener	Limitar el tiempo de trabajo en esta postura Usar apoyos para disminuir la presión o para no sostenerse en el vacío Verificar si hay otra forma de realizar la tarea Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación.	SI
PSICOLABORALES	Condiciones de la tarea Gestión Organizacional	Sensación de estrés Se pueden afectar las relaciones entre las personas Posibles efectos en salud	Considerar los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, el tipo de tarea	Verificar cumplimiento de jornada de trabajo establecida Realizar pausas activas y ejercicios de calentamiento y relajación. Fortalecer la concientización sobre reconocimiento de actitudes (estados) y comportamientos (errores) para prevención y control de riesgos Verificar condiciones de la tarea	SI

Powered by CamScanner

DE SEGURIDAD	Incendio y explosión	Quemaduras, asfixia, lesiones, muertes, contaminación ambiental y pérdidas económicas	Considerar la presencia y cantidad de sustancias inflamables y si estas generan ambientes donde se puedan generar incendios	Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo en caliente Disminuir la cantidad de líquidos combustibles o inflamables cuando sea posible Almacenar las sustancias peligrosas adecuadamente Revisar la disponibilidad de extintores adecuados, suficientes y en buen estado. Capacitación de los trabajadores, uso de epp según la tarea	SI
	Eléctrico	Electrización (cuadro línea), electrocución (cuadro tablero), quemaduras y aumento del riesgo de incendio	Considerar las características de la fuente eléctrica y de la electricidad (alterna o continua) y las condiciones del ambiente (humedad, etc.)	Verificar controles: atenizaje, aislamiento, protección de partes vivas y prácticas de trabajo Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo (frío o caliente), del certificado de aislamiento y del procedimiento de trabajos eléctricos y de aislamiento En el caso de electricidad continua definir los controles específicos a aplicar Definir los EPP específicos y vigilar su uso Verificar condiciones adecuadas de extensiones, tableros eléctricos	SI
	Locativo (**trabajo en alturas**)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar	Permisos de trabajo Listas de chequeo personal y equipos certificados Coordinador de TSA accesos y puntos de anclaje seguros	N/A
	Locativo (**trabajos de excavación**)	Lesiones por aplastamiento o ahogamiento, potencialmente mortales	Considerar terreno, tipo de excavación, condiciones del entorno	Demarcar y señalizar uso de entibados si aplica rutas de acceso y evacuación retiro de escombros de borde de excavación	N/A
	Locativo (superficies de trabajo, distribución de áreas)	Contusiones, heridas, fracturas, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del área y del entorno	Verificación de condiciones del terreno Señalización y delimitación de áreas Senderos peatonales Orden y aseo del área Demarcación de huecos y espacios de caída	SI
	Mecánico (manejo de herramientas, equipos, elementos y materiales, puntos de operación, mecanismos en movimiento, elementos a presión)	Lesiones de manos (se debe definir el riesgo, desde contusiones, pasando por fracturas hasta amputaciones) Lesiones oculares o tactiles de diversa gravedad	Considerar herramientas y equipos a operar, condiciones del área y del entorno	Inspección preoperacional de herramientas y equipos Identificar puntos de atrapamiento No operar equipo sin autorización Verificación y buen uso de guardas Uso de elemento protección personal Verificación de entorno de trabajo	SI
	Trabajos en vía pública	Atropellos, caídas, golpes con vehículos	considerar la exposicion a tráfico horarios con menos tráfico	Señalizacion adecuada de la zona vial auxiliares de trafico uso de protección personal	SI
	Transporte (al interior de las instalaciones de la empresa o fuera cuando es suministrado por la empresa)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar vehículos adecuados y desplazamientos	Verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos de seguridad vial No operar vehículos sin autorización Hacer buen uso de los vehículos Uso de rutas autorizadas	SI
	Orden público	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales (lesiones por armas blancas o de fuego, explosiones)	Considerar condiciones de seguridad de cada área	Verificación de cumplimiento de lineamientos de seguridad física Mantenimiento de cerramiento perimetral Personal autorizado en obra Uso de carnet y dotación correspondiente	SI
	Condiciones naturales (Sismo, Terremoto, Tormentas)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar eventos naturales no esperados	Verificación de condiciones climáticas Suspensión de labores cuando se requiera Ubicar puntos de resguardo adecuados Identificar puntos de encuentro para emergencias	SI
	Emergencia	Lesiones y atención de eventos	Considerar que se puede tener cualquier tipo de emergencia en cualquier momento	Verificar equipos de atención de emergencias, camillas, botiquines, extintores, rutas de evacuación, puntos de encuentro.	SI

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE PELIGROS Y RIESGOS ADICIONALES IDENTIFICADOS EN EL AREA / DURANTE LA SEMANA Y/O ACTIVIDADES SIMULTANEAS

TAREA	PELIGROS/RIESGOS IDENTIFICADOS	CONSECUENCIA POTENCIAL (Qué y por qué puede pasar?)	CONTROLES	RESPONSABLE

5. ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA LABOR

CHALECO REFLECTIVO	✓	MONOGAFAS	✓	GUANTES DE CARNAZA		CARETA DE SOLDADOR	✓	ARNES DE SEGURIDAD	✓
CASCO	✓	P. AUDITIVOS SENCILLO	✓	GUANTES POLIURETANO		PECHERA DE VAQUETA	✓	ESLINGA EN Y	✓
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	P. AUDITIVOS COPA		GUANTE VAQUETA	✓	PEGAMAS		ESLINGA DE RESTRICCION	✓
GAFAS	✓	DELANTAL O PETO	✓	GUANTES NITRILO		CHAQUETA O PANTALON SOLD		LINEA DE VIDA	✓
MASCARILLA		VISOR		GUANTES SOLDADOR		MASC GASES/VAPORES		TIE OFF	

OTROS NECESARIOS PARA LA TAREA ESPECIFICA

6. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURAS		ESPACIOS CONFINADOS		USO DE CARGAS		EXCAVACIONES		ELECTRICO	
TRABAJO EN CALIENTE	✓	OTRO		CUAL					

7. EQUIPO QUE ELABORA Y AUTORIZA EL ATS (RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LOS CONTROLES PARA LA TAREA)

AUTORIZADO	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA	FECHA
TECNICO QUE AUTORIZA LA TAREA	Jeiver Alvarez	1013577399		21-07-25
SUPERVISOR/LIDER EJECUTANTE	Yuliet Bustos	1102567663		21-07-25
VERIFICA Y AUTORIZA SST				

8. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA LABOR A LA QUE SE LA HA DIVULGADO EL ATS Y CONOCE LOS RIESGOS Y CONTROLES A IMPLEMENTAR

MANIFIESTO QUE ME ENCUENTRO EN CONDICIONES FISICAS Y MENTALES OPTIMAS PARA DESEMPEÑAR LA LABOR DE FORMA SEGURA. ASI MISMO, MANIFIESTO QUE COMPRENDO LAS OBLIGACIONES Y CONTROLES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROTEGIENDO EL AMBIENTE Y CUIDADO EL CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS. DE IGUAL MANERA ME COMPROMETO A REPORTAR CUALQUIER EVENTO DE FUGA O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES

NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Edwin David Suta	1003977026	Ayudante								
Luis Mercado	1120809	oficial								
Miguel Rodriguez	72824271	OP Retro								
Carlos Guerrero	1070710295	Oficial	Carlos.	Carlos	Carlos	Carlos	—			
Santiago Jena.	1024493221	Of	Santiago	—	—	—	—			
Laura Pinzon	1070880265	Residente	LuP	—	—	—	LuP			
Luis Morales	—	—		—	—	—	—			

9. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

VERTICAL	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FT-SST-03 Versión:1 Fecha: 25/09/2023
DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 01-07-2025	CENTRO DE TRABAJO: Bogotá
LUGAR: Bodega FAC	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1 hora

TEMA: Inducción.

DICTADO POR:

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Laura Pinzón.	1020780265	Coordinadora		X	
2	Luis Morales	3720802	ofisial		X	
3	Carlos Guevara	1020[illegible]95	oficial		X	
4	Miguel A Rodriguez	79824231	op. Retro		X	
5	Santiago Sematerapa	1014487971	Of	Santiago S.	X	
6	Fabian Gomez	1057[illegible]753	Oficial	Fabian Gomez	X	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

Powered by CamScanner

VERTICAL	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FT-SST-03 Versión:1 Fecha: 25/09/2023

DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 03-07-2025	CENTRO DE TRABAJO: Bogotá
LUGAR: Bodega FA	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 30 hora

TEMA: Divulgacion ATS, responsabilidades en SG-SST. prohibicion de joyas, pirsin y usos adecuados de EPP

DICTADO POR:

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Santiago Serna	1024437371	OF	Santiago S	✓	
2	Fabian Cambio	1057710715	OF	Fabian Cambio	✓	
3	Carlos Guerrero	1020190295	OF	Carlos Guerrero	✓	
4	Jose Ignacio	80344715	OF		✓	
5	Luis Morales	3120321	OF		✓	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

Powered by CamScanner

VERTICAL	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Código: FT-SST-03 Versión:1 Fecha: 25/09/2023
DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 08 julio 2025	CENTRO DE TRABAJO: Bogotá	
LUGAR: Bogota FAC Bodega		DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

TEMA: Pausas activas

DICTADO POR:

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Carlos Guerrero	1020790295	Oficial	Carlos Guerrero	V	
2	Miguel A Rodriguez	79824251	Op Retro	Miguel	/	
3	Jose Ignacio.	80394715	OF	Jose		
4	Fabian Gamboa	1057610755	OF	Fabian		
5	Luis Morales	3220806	OF	Luis		
6	Santiago Serna	1024487371	OF	Santiago	/	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL Yuley B

Powered by CamScanner

VERTICAL	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FT-SST-03 Versión:1 Fecha: 25/09/2023

DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 10 JULIO 2025	CENTRO DE TRABAJO: Bogotá
LUGAR: FAC	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

TEMA: Capacitación Política de seguridad y salud en el trabajo
charla trabajo en alturas

DICTADO POR:

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Santiago Zamora	1024937971	OF	Santiago	X	
2	Fabian Gamboa	1057760255	OF	Fabian Gamboa	X	
3	Yose Garcia	80394715	OF	Yose	X	
4	Carlos Cerrero	1026790295	OF	Carlos Cerrero	Si	
5	Luis Morales	3720602	OFICIAL	Luis	SI	
6	Laura Pinzon	1020780265	Residente	Laura	SI	
7	Miguel Rodriguez	79824231	Operador	Miguel	SI	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

Powered by CamScanner

VERTICAL	REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: FT-SST-03 Versión:1 Fecha: 25/09/2023
DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 24 Julio 2025 | CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 40 min

TEMA: Capacitación de política, alcoholismo tabaquismo y drogadicción

DICTADO POR: Yuley Badillo

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Luis Morales	3120802	oficial		✓	
2	Miguel Rodriguez	79824231	Op Retio		✓	
3	Carlos Guerrero	1020790293	Sgto		✓	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO
NIT. 900.246.243-4

RELACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Código: F05 - 005 - DOT
Versión: 1
Fecha: 30/09/2024

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.

Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

DD	MM	AA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CANT.	CAMISA (Talla)	CANT.	PANTALON (Talla)	CANT.	CHALECO (Talla)	CANT.	ZAPATOS (Talla)	CARNET	PORTA CARNET	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
03	07	25	Fabian Gamba	1057710755	1						1	39				Fabian Gamba
01	07	25	Miguel Rodriguez	79824231	1						1	40				X
11	07	25	Laura Pinzón	1020780265	1						1	40				Laura Pinzón

QUIEN ENTREGA:	OBSERVACIONES
NOMBRE:	Laura Pinzón
FIRMA	
CARGO	Residente

Powered by CamScanner

VERTICAL NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F06 - 005 - EPP Versión: 1 Fecha: 3C/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Ignacio Cacuyamboco Mayorga — CEDULA No. 80394715

CARGO: Oficial — FECHA DE INGRESO: 04-07-25 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
04-07-25	X					X	X				X		X						X	X	X					
10-07							X				X															

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA — FIRMA DEL TRABAJADOR:

C.C. 1020780265 — C.C 80394715

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F06 - 005 - EPP
NIT. 900.246.243-4		Versión: 1
		Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Miguel Angel Rodriguez — CEDULA No. 79824231

CARGO: Operador — FECHA DE INGRESO: 01-04-2025 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBUQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
01/07/25	X		X					X			X		X				X				X					X
10/07/25							X				X															

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuento de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA — FIRMA DEL TRABAJADOR: X

C.C. 1020780265 — C.C 1020780265

Powered by CamScanner

VERTICAL NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F06 - 005 - EPP Versión: 1 Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Morales — CEDULA No. 3 120 802

CARGO: Oficial. — FECHA DE INGRESO: 26-06-25 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBUQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
26-06-25 10-07-25	X					X	X				X		X								X					Luis Morales Luis Morales

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para procedor a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA — FIRMA DEL TRABAJADOR: Luis Morales

C.C. 1010780265 — C.C 3 120 802

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO

NIT. 900.246.243-4

ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP

F06 - 006 - EPP
Versión: 1
Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.

Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Abel Guerrero **CEDULA No.** 1020790295

CARGO: Oficial demolicion **FECHA DE INGRESO:** 03-07-25 **FECHA DE RETIRO:**

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERSAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
040725	X		X				X				X		X						X	X	X	X				X Carlos Guerrero
100725							X				X															X Carlos Guerrero

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA Laura Pinzón. **FIRMA DEL TRABAJADOR:** X Carlos Guerrero

C.C 1020780265 **C.C** 1020790295

Powered by CamScanner

VERTICAL NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F06 - 006 - EPP Versión: 1 Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 006-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Santiago Serna — CEDULA No. 1024487371

CARGO: Oficial demolición — FECHA DE INGRESO: Jueves 26-07-25 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. RIVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
26-06-25 10-07-25	X						X				X		X								X					X Santiago Serna Santiago Serna

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA — FIRMA DEL TRABAJADOR: X Santiago Serna

C.C. 1020780265 — C.C 1024487371

Powered by CamScanner

VERTICAL
NIT. 900.246.243-4

ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP

F06 - 005 - EPP
Versión: 1
Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Edwin David Suta — CEDULA No. 1003.712,026

CARGO: Ayudante — FECHA DE INGRESO: 04 JULIO 2025 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBUQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCION
04-07-25	1		1			1					1				1											EP Suta B
11-07-25						1																		X		EP Suta B

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: Yuley Bedoya — FIRMA DEL TRABAJADOR: ED Suta B

C.C. 1100367663 — C.C 1003712026

Powered by CamScanner

VERTICAL	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F06 - 006 - EPP
NIT. 900.246.243-4		Versión: 1
		Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.	Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Alexander Gonzalez	CEDULA No. 1033706 036
CARGO: Aux Administrativo — FECHA DE INGRESO: 03 julio 2025	FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBUQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
03-07-25	1		37								1		1	1												
03-07-25									1																	

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DEL TRABAJADOR:
C.C. 1102061636	C.C 1033706036

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO
NIT. 900.246.243-4

RELACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Código: F08 - 006 - DOT
Versión: 1
Fecha:30/09/2024

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.

Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

DD	MM	AA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CANT.	CAMISA (Talla)	CANT.	PANTALON (Talla)	CANT.	CHALECO (Talla)	CANT.	ZAPATOS (Talla)	CARNET	PORTA CARNET	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
09	07	25	William		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		

QUIEN ENTREGA:	OBSERVACIONES
NOMBRE:	Yuliana Bedoya
FIRMA	Yuliana
CARGO	Residente SST

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO

NIT. 900.246.243-4

RELACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Código: F05 - 005 - DOT
Versión: 1
Fecha:30/09/2024

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.

Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

DD	MM	AA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CANT.	CAMISA (Talla)	CANT.	PANTALON (Talla)	CANT.	CHALECO (Talla)	CANT.	ZAPATOS (Talla)	CARNET	PORTA CARNET	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
09	07	25	Maria Jose	1000[illegible]915	—	—	—	—	1	L	—	—	1	1		

QUIEN ENTREGA:	OBSERVACIONES
NOMBRE:	Yuley Bedoya
FIRMA	Yuley
CARGO	Residente SST

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO

NIT. 900.246.243-4

RELACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Código: F08 - 006 - DOT
Versión: 1
Fecha:30/09/2024

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.

Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

DD	MM	AA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CANT.	CAMISA (Talla)	CANT.	PANTALON (Talla)	CANT.	CHALECO (Talla)	CANT.	ZAPATOS (Talla)	CARNET	PORTA CARNET	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
04	07	25	Edwin Oculd	1003712,026	1	Overol	—	-	-	-	1	37	/	/		D Segell B
10	09	25			/	/		/	/		/	/	1	1		D Seda R

QUIEN ENTREGA:	OBSERVACIONES
NOMBRE:	Yuich Bedoya
FIRMA	Yuich B
CARGO	SST

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO

NIT. 900.246.243-4

RELACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Código: F05 - 005 - DOT
Versión: 1
Fecha: 30/09/2024

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.

Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

DD	MM	AA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CANT.	CAMISA (Talla)	CANT.	PANTALON (Talla)	CANT.	CHALECO (Talla)	CANT.	ZAPATOS (Talla)	CARNET	PORTA CARNET	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
03	07	25	Jose Alexander G	1033726036	/	/	/	/	1	L	1	37	/	/	/	
10	07	25			/	/	/	/	/	/	/	/	1	1		

QUIEN ENTREGA:	OBSERVACIONES
NOMBRE:	Yuley Bodilla
FIRMA	Yuley B
CARGO	SST

Powered by CamScanner

NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F06 - 005 - EPP Versión: 1 Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Mileidy Moreus Olarte — CEDULA No. 1103713807

CARGO: Ing. Ambiental — FECHA DE INGRESO: 19-Junio-2025 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LÁTEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
11-07-25									X																	Mileidy Moreus O.

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: Yuley B — FIRMA DEL TRABAJADOR: Mileidy Moreus O

C.C. 1053667663 — C.C 1103713807

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO

NIT. 900.246.243-4

RELACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Código: F05 - 006 - DOT
Versión: 1
Fecha: 30/09/2024

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.

Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

DD	MM	AA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CANT.	CAMISA (Talla)	CANT.	PANTALON (Talla)	CANT.	CHALECO (Talla)	CANT.	ZAPATOS (Talla)	CARNET	PORTA CARNET	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
02	07	25	Mileidys Mateus	1103713807	/	/	/	/	1	L	1	37	1	/	/	Mileidy M
10	07	25	Mileidy Mateus	1103713807	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	/	Mileidy M.

QUIEN ENTREGA:	OBSERVACIONES
NOMBRE:	Yuley Bodillo
FIRMA	YuleyB
CARGO	SST

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO
NIT. 900.246.243-4

RELACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Código: F05 - 005 - DOT
Versión: 1
Fecha: 30/09/2024

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.

Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

DD	MM	AA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CANT.	CAMISA (Talla)	CANT.	PANTALON (Talla)	CANT.	CHALECO (Talla)	CANT.	ZAPATOS (Talla)	CARNET	PORTA CARNET	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
02	07	25	Yuley Bedoya	1022567663	✓	✓	✓	✓	1	L	1	35	1	✓	✓	Yuley B
10	07	25			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	Yuley B

QUIEN ENTREGA:	OBSERVACIONES
NOMBRE:	Yuley Bedoya
FIRMA	Yuley B
CARGO	SST

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO
NIT. 900.246.243-4

RELACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Código: F05 - 006 - DOT
Versión: 1
Fecha: 30/09/2024

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.

Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

DD	MM	AA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CANT.	CAMISA (Talla)	CANT.	PANTALON (Talla)	CANT.	CHALECO (Talla)	CANT.	ZAPATOS (Talla)	CARNET	PORTA CARNET	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
02	07	25	Jeisson Diaz	1013547899	/	/	/	/	1	L	1	39	1	/		
10	07	25			/	/	/	/	/	/	/	/	/	1		

QUIEN ENTREGA:	OBSERVACIONES
NOMBRE:	Yuri Alejandra Bodilla
FIRMA	
CARGO	SST

Powered by CamScanner

VERTICAL

ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP

Código: FT-SST-01
Versión:1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PEATONALES EN LA CALLE 21 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 SECTOR LIBORIO, EN LA CIUDAD DE MANIZALES

Contrato de Obra: 2309121257

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Fabian Andres Gamba

CEDULA No. 1057710755

CARGO: Oficial de demolicion

FECHA DE INGRESO: 26-06-25

FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
26-06-25	X		X				X					X	X					X	X	X	X	X				X Fabian Gamba
03-07-25			X								X		X													X Fabian Gamba
10-07-25			X																							[illegible] Fabian Gamba
15-07-25							X																			Fabian Gamba.

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: Luis Pinzon

C.C. 1070780265

FIRMA DEL TRABAJADOR: Fabian Gamba.

C.C.# 1057710755

Powered by CamScanner

VERTICAL NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F06 - 005 - EPP Versión: 1 Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Ignacio Cayambeco Mayorga — CEDULA No. 80394715

CARGO: Oficial — FECHA DE INGRESO: 04-07-25 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBUQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
04-07-25	X					X	X				X		X						X	X	X					
10-07-25							X				X															
15-07-25							X																			

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA — FIRMA DEL TRABAJADOR:

C.C. 1070780265 — C.C 80394715

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO SAS NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	FOR - 005 - EPP Versión: 1 Fecha: 30/05/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-05-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Morales — CEDULA No. 3 120 802

CARGO: Oficial. — FECHA DE INGRESO: 26-06-25 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
26-06-25	X					X	X				X		X								X					Luis Morales
10-07-25							X				X															Luis Morales
15-07-25							X								X	X							X			Luis Morales

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA — FIRMA DEL TRABAJADOR: Luis Morales

C.C. 1010780265 — C.C 3 120 802

Powered by CamScanner

VERTICAL

NIT. 900.246.343-4

ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Abel Guerrero | CEDULA No: 1020790295

CARGO: Oficial demolicion | FECHA DE INGRESO: 03-07-25 | FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. DIVERSAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A CONFORMIDAD
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBUQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
040725	X		X				X				X		X						X	X	X	X				
100725							X				X															
150725																X							X			

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: Laura Pinzón | FIRMA DEL TRABAJADOR: Carlos Guerrero

CC 1020780265 | CC 1020790295

Powered by CamScanner

VERTICAL NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F06 - 008 - EPP Versión: 1 Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-05-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Edwin David Suta — CEDULA No. 1003.712,026

CARGO: Ayudante — FECHA DE INGRESO: 04 JULIO 2025 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. UNIVERSAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBUQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
04-07-25	1		1			1					1				1											
11-07-25						1																		X		
16-07-25																		1								

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: Yuley Bedoya — FIRMA DEL TRABAJADOR: E D Suta B

C.C. 1102367663 — C.C 1003712026

Powered by CamScanner

VERTICAL

NIT: 900.536.563-0

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

FOR - 008 - EPP

Versión: 1

Fecha: 05/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO

Contrato No: 008-05-A-COFAC-DIPFM

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Alexander Gonzalez

CEDULA No: 1033706 036

CARGO: Aux Administrativo

FECHA DE INGRESO: 03 Julio 2015

FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCIÓN CABEZA		PROTECCIÓN PIES		V. NATURAL	PROTECCIÓN MANOS					PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTECCIÓN OJOS				PROTECCIÓN AUDITIVA		ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS				VESTIMENTA LABORAL				FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCIÓN	ARNES	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORTAVIENTO		
03-07-25	1		1								1		1	1													
11-07-25									1																		
15-07-25																		1									

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos. Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: [signature]

C.C. 1102621636

FIRMA DEL TRABAJADOR: [signature]

C.C. 1033706036

Powered by CamScanner

NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F56 - 008 - EPP Versión: 1 Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-06-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Mileidy Moreus Olarte — CEDULA No. 1103713807

CARGO: Ing. Ambiental — FECHA DE INGRESO: 19-Junio-2025 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
11-07-25									X																	Mileidy Moreus O.
15-07-25																		X								Mileidy Moreus O.

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos , igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: Yuley B — FIRMA DEL TRABAJADOR: Mileidy Moreus O

C.C. 1013647663 — C.C 1103713807

Powered by CamScanner

VERTICAL	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F06 - 005 - EPP
NIT. 900.246.243-4		Versión: 1
		Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Abel Guerrero — CEDULA No. 1020790295

CARGO: Oficial demolicion — FECHA DE INGRESO: 03-07-25 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. RIVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBUQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
040725	X		X				X				X		X						X	X	X	X				X Carlos Guerrero
100725							X				X															X Carlos Guerrero
150725																X							X			X Carlos Guerrero
210725							X						X													Carlos Guerrero

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: Laura Pinzón — FIRMA DEL TRABAJADOR: X Carlos Guerrero

C.C 1020780265 — C.C 1020790295

Powered by CamScanner

VERTICAL NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F06 - 005 - EPP Versión: 1 Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Morales — CEDULA No. 3 120 802

CARGO: Oficial. — FECHA DE INGRESO: 26-06-25 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERSAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLONNITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBUQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
26-06-25	X					X	X				X		X								X					X Luis Morales
10-07-25							X				X															X Luis Morales
15-07-25							X								X	X							X			Luis Morales
21-07-25																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos , igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA — FIRMA DEL TRABAJADOR: X Luis Morales

C.C 1010780265 — C.C 3 120 802

Powered by CamScanner

VERTICAL NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F08 - 008 - EPP Versión: 1 Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Miguel Angel Rodriguez — CEDULA No. 79824231

CARGO: Operador — FECHA DE INGRESO: 01-01-2025 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
01/07/25	X		X						X		X		X				X				X					X Miguel
10/07/25							X																			X Miguel
21/07/25									X				X													

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA — FIRMA DEL TRABAJADOR: X

C.C 1020780265 — C.C 1020780265

Powered by CamScanner

VERTICAL NIT. 900.246.243-4	ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP	F08 - 005 - EPP Versión: 1 Fecha: 30/09/2024

PROYECTO: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO. — Contrato No. 005-00-A-COFAC-DIFRA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Edwin David Suta — CEDULA No. 1003.712,026

CARGO: Ayudante — FECHA DE INGRESO: 04 JULIO 2025 — FECHA DE RETIRO:

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	PROTECCION CABEZA		PROTECCION PIES		P. INVERNAL	PROTECCION MANOS					PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OJOS				PROTECCION AUDITIVA		EQUIPOS ESPECIALES				COMPLEMENTARIOS			FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCION
	CASCO	GORRO SAFARI	BOTAS CUERO PUNTERA	BOTAS CAUCHO PUNTERA	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA TELA	MASCARILLA FILTRO	GAFAS OSCURAS	MONOGAFAS	GAFAS TRANSPARENTES	CARETA	COPA	INSERCION	ARNES	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LINEA DE VIDA	PETO	CHALECO REFLECTIVO MALLA	CHALECO CORPORATIVO	
04-07-25	1		1			1					1				1											
11-07-25						1																		X		
16-07-25																		1								
26-07-25											1															
23-07-25													1													
25-07-25											1															

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos . Igualmente Yo autorizo a VERTICAL DISEÑO SAS para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de daño, pérdida intencional o la no devolución del mismo.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: Yuley Bedoya — FIRMA DEL TRABAJADOR: E D Suta B

C.C. 1102367663 — C.C 1003712026

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN - CAMILLA	CÓDIGO: SST VERSIÓN: 1 FECHA: 03/07/2025

LUGAR:	FAC	FECHA:	25 Julio 2025
INSPECCIONADO POR:	Yuley Badillo	RESPONSABLE DEL ÁREA:	Jeisson Diaz

REQUISITO - validar en cada uno existencia, limpieza, vencimiento (si aplica)

	BOTIQUÍN TIPO: ELEMENTO	CANTIDAD DE ELEMENTOS	CRITICIDAD INTERVENCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	Tapabocas	20		C			
2	Estetoscopio	1		C			
3	Suero Fisiologico	1		C			
4	Lubricante primeros auxilios	1		C			
5	Alcohol	1	2026	C			
6	Gasas Precortada	10		C			
7	Jabon Yodado	1	22/03/25	C			
8	Tensiometro digital	1		C			
9	Baja lenguas	20		C			
10	Guantes	20		C			
11	Aposito de Gasa	3		C			
12	Algodon	1		C			
13	Tijeras Punta trauma	1		C			
14	Linterna	1		C			
15	Esparadrapo	1		C			
16	Aposito Adulto	3		C			
17	Venda elastica 3x5	1		C			
18	Venda elastica 5x5	1		C			
19	Venda algodon 3x5	1		C			
20	Venda algodon 6x3	1		C			
21	bolsa-valvula(RCP)	1		C			
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

	CAMILLA					
1	Instalación accequibles (sitio de ubicacion)	Alta	✓			
2	Señalización visible en buen estado	Media	✓			
3	Estado del soporte sin riesgo de caida	Alta	✓			
4	Correas de seguridad completas	Alta	✓			
5	Sujetadores para agarre disponibles	Alta	✓			
6	Inmovilizadores de cuello disponible	Alta	✓			
7	Inmovilizadores de extremidades adicionales disponibles	Media	✓			
8	Limpieza	Media	✓			
9	Otro					

Muy Alta: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia Alta: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso Media: Corrección a mediano plazo Baja: Corrección posible a largo plazo

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR SST

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL?	☐ SÍ ☐ NO	SE INCLUYO EN MATRIZ DE ACCIONES?	SÍ ☐ NO ☐	ENCARGADO DEL CIERRE:	
¿HALLAZGO CERRADO?	☐ SÍ ☐ NO	FECHA DE CIERRE:		VALIDADOR DEL CIERRE:	

ELABORADO POR:

FIRMA	Yuley B
FECHA	25-07-2025
NOMBRE	Yuley Badillo
CARGO	Residente SST

Este documento y la información que contiene es propiedad de MLL. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCION DIARIA DE EXTENCIONES ELECTRICAS	CODIGO: SST
		VERSION: 01
		FECHA: 03-07-2025

Obra en la que se realiza la inspeccion	FAC	Nombres y Apellidos del encargado	Laura Pinzon	No. C.C	1070	Firma	
Fecha de Inspeccion	03-07-2025	Nombres y Apellidos residente SST	Yuleidi	No. C.C	1076	Firma	

		EXTENCION No. 1												EXTENCION No: 2												EXTENCION No:											
	FECHA:	L		M		MC		J		V		S		L		M		MC		J		V		S		L		M		MC		J		V		S	
ITEM	ASPECTO A EVALUAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿LA EXTENCION ELECTRICA INDICA EL VOLTAJE DE CORRIENTE QUE SE PUEDE UTILIZAR?		✓												✓																						
2	¿LA EXTENCION ELECTRICA CUENTA CON POLO A TIERRA?	✓												✓																							
3	¿EL CABLE DE LA EXTENCION ELECTRICA, SE ENCIENTRA EN BUEN ESTADO?	✓												✓																							
4	¿ LOS ENCHUFES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO?	✓												✓																							
5	¿ LA EXTENCIONES ELECTRICAS SE ENCUENTRAN EN VIA AREA?		✓														✓																				
6	¿ LA EXTENCIONES ELECTRICAS SE ALMACENAN BAJO TECHO?	✓												✓																							
7	¿ LA EXTENCION ELECTRICA SE ENCUENTRA ROTULADA EN LOS ENCHUFES?		✓												✓																						

		EXTENCION No.												EXTENCION No.												EXTENCION No.											
	FECHA:	L		M		MC		J		V		S		L		M		MC		J		V		S		L		M		MC		J		V		S	
ITEM	ASPECTO A EVALUAR	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿LA EXTENCION ELECTRICA INDICA EL VOLTAJE DE CORRIENTE QUE SE PUEDE UTILIZAR?																																				
2	¿LA EXTENCION ELECTRICA CUENTA CON POLO A TIERRA?																																				
3	¿EL CABLE DE LA EXTENCION ELECTRICA, SE ENCIENTRA EN BUEN ESTADO?																																				
4	¿ LOS ENCHUFES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO?																																				
5	¿ LA EXTENCIONES ELECTRICAS SE ENCUENTRAN EN VIA AREA?																																				
6	¿ LA EXTENCIONES ELECTRICAS SE ALMACENAN BAJO TECHO?																																				
7	¿ LA EXTENCION ELECTRICA SE ENCUENTRA ROTULADA EN LOS ENCHUFES?																																				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

VERTICAL

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES - EXTINTORES

SST
001
21/07/2
1 de 1

UBICACIÓN: FAC — **FECHA REALIZACIÓN**

ÁREA Bodega

ITEM	CAPACIDAD (libras)	CLASE DE AGENTE EXTINTO	UBICACIÓN FÍSICA	FECHA ÚLTIMA CARGA			ESTADO										OBSER
				DD	MM	AAAA	Pintura B / M.E. /NA	Señalización B / M.E. /NA	Acceso B / M.E. /NA	Visibilidad B / M.E. /NA	Presión B / M.E. /NA	Pasador B / M.E. /NA	Manguera B / M.E. /NA	Boquilla B / M.E. /NA	Recipiente B / M.E. /NA	Manija B / M.E. /NA	
1	10Lb	Multipro	Bodega	—	Abril	2025	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	—
2	5Lb	multipro	Oficina	—	Junio	2025	M.E	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	—
3	5Lb	multip	Corredor	—	Junio	2025	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	—
4	10Lb	multipr	Bodega	—	Oct	2024	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	—
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUI EST

CONVENCIONES

B	Bueno
M.E.	Mal Estado
NA	No Aplica

FIRMA Y CARGO DE QUEN INSPECCIONA

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCION EQUIPOS CONTRA CAIDAS	F-SST-043 Version:001 17/01/2022

Departamento/Área: SST		Fecha: 02-07-25	
Inspeccionado Por: Laura Pinzon		Cargo: Coordinadora	
No. serial Linea de vida	Lote:	Fecha fabricación:	
No. serie arnés:	Lote: 45279	Fecha fabricación:	Abril 2025
No. serie eslinga: Rostrícola	Lote: 4782070	Fecha fabricación:	Agos 25

PARA LA INSPECCIÓN DEBE ACOMODAR EL ARNÉS Y LA ESLINGA DE MODO QUE LAS PIEZAS A INSPECCIONAR QUEDEN BIEN VISIBLES Y MARQUE CON X SEGÚN CORRESPONDA

ELEMENTO DE FIBRA

CORREAS:	B	R	M	ELEMENTOS METALICOS:	B	R	M
Hombros	X			Anillo en "D" espalda	X		
Muslos	X			Anillo en "D" cadera	X		
Sub.Pelvicas	X			Ajustador hebilla	X		
				Hebillas de correas de muslos	X		
COSTURAS:	**B**	**R**	**M**	**ELEMENTOS DE PLASTICO:**	**B**	**R**	**M**
Correas de hombro	X			Pieza de colocación del anillo de espalda "D"	X		
Correas de muslos	X						
Extremos correas de hombros	X			Guía para correa del tórax	X		
Extremos de correas de muslos	X			Trabilla	X		
Etiqueta	X						
Correas sub.pelvicas	X						

CHEQUEO VISUAL

LINEA DE VIDA PORTATIL	SI	NO	NA	ESLINGA DE RESTRICCION O POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA
Cortes o ruptura de tejido, deshilachadas o tranzadas en las riatas		X		Cortes o ruptura de tejido, deshilachadas o tranzadas en las riatas			
Correa con nudos		X		Correas o cuerdas desgastadas			
Salpicaduras de pintura y rigidez en las correas o cuerda		X		Absorvedor de choque con deformaciones			
Ganchos en estado de corrosión, golpes o deformaciones		X		Salpicadura de pintura y rigidez en las correas o cuerda			
FRENO ARRESTADOR	**SI**	**NO**	**NA**	**ANCLAJE PORTATIL**	**SI**	**NO**	**NA**
Ajustes o seguros inadecuados				Cortes o rotura de tejido, deshilachadas			
Presenta corrosión, manchas de pintura o Sustancia química				Correas o cuerdas desgastadas			
Desgastado o con deformaciones				Salpicadura de pintura y rigidez en las argollas en estado de corrosión			

OBSERVACIONES:

Firma Trabajador:	Fabian Gomez		
Responsable SISO:	NOMBRE: Laura Camila Pinzon	FIRMA:	

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCION EQUIPOS CONTRA CAIDAS	F-SST-043 Version:001 17/01/2022

Departamento/Área: SST		Fecha: 01-07-25	
Inspeccionado Por: Laura Pinzón		Cargo: Coordinadora.	
No. serial Línea de vida	Lote:	Fecha fabricación:	
No. serie arnés: X	Lote: 45279	Fecha fabricación:	Abril 2025
No. serie eslinga: Restricción	Lote: 4782070	Fecha fabricación:	Agost 2017

PARA LA INSPECCION DEBE ACOMODAR EL ARNÉS Y LA ESLINGA DE MODO QUE LAS PIEZAS A INSPECCIONAR QUEDEN BIEN VISIBLES Y MARQUE CON X SEGÚN CORRESPONDA

ELEMENTO DE FIBRA

CORREAS:	B	R	M	ELEMENTOS METALICOS:	B	R	M
Hombros	X			Anillo en "D" espalda	X		
Muslos	X			Anillo en "D" cadera	X		
Sub.Pelvicas	X			Ajustador hebilla	X		
				Hebillas de correas de muslos	X		
COSTURAS:	**B**	**R**	**M**	**ELEMENTOS DE PLASTICO:**	**B**	**R**	**M**
Correas de hombro	X			Pieza de colocación del anillo de espalda "D"	X		
Correas de muslos	X						
Extremos correas de hombros	X			Guía para correa del tórax	X		
Extremos de correas de muslos	X			Trabilla	X		
Etiqueta	X						
Correas sub.pelvicas	X						

CHEQUEO VISUAL

LINEA DE VIDA PORTATIL	SI	NO	NA	ESLINGA DE RESTRICCION O POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA
Cortes o ruptura de tejido, deshilachadas o tranzadas en las riatas		X		Cortes o ruptura de tejido, deshilachadas o tranzadas en las riatas		X	
Correa con nudos		X		Correas o cuerdas desgastadas		X	
Salpicaduras de pintura y rigidez en las correas o cuerda		X		Absorvedor de choque con deformaciones			X
Ganchos en estado de corrosión, golpes o deformaciones		X		Salpicadura de pintura y rigidez en las correas o cuerda		X	
FRENO ARRESTADOR	**SI**	**NO**	**NA**	**ANCLAJE PORTATIL**	**SI**	**NO**	**NA**
Ajustes o seguros inadecuados			X	Cortes o rotura de tejido, deshilachadas			X
Presenta corrosión, manchas de pintura o Sustancia química			X	Correas o cuerdas desgastadas			X
Desgastado o con deformaciones			X	Salpicadura de pintura y rigidez en las argollas en estado de corrosión			X

OBSERVACIONES:

Firma Trabajador:	X Fabián Gamboa	
Responsable SISO:	NOMBRE: Laura Pinzón.	FIRMA:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES	CODIGO: SST VERSION: 01 FECHA: 27-06-25

Obra en la que se realiza la inspección:	Bodega Fac	Nombres y apellidos del encargado de la actividad	Laura Pinzon	N. cc	1020780263	Firma
Marca y serie del equipo	Steelpro 500838 V 1133/18 Made	Nombres y apellidos de residente SST	Laura Pinzon	N. cc	1020780263	Firma

Importante: Para la ejecución de trabajados con la Soldadora, se deberá contar los siguientes elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección auditiva, casco, overol y calzado de seguridad.

Día de la inspección	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Fecha en la que se realiza la inspección					04-07-25	
Hora en la que se realiza la inspección					7:00	

	Descripción del estado del Arnes	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica
ARNES	CINTAS Y CORREAS																		
	Tiene perforaciones, agujeros																		
	Se encuentran Deshilachadas																		
	Se encuentran desgastadas																		
	Presentan cuarteaduras o abrasión																		
	Presentan suciedad																		
	Presenta decoloración																		
	Sin etiquetas o están ilegibles																		
	Costuras: Presenta más de dos hilos cortados en el mismo patrón de costura																		
	HERRAJES																		
	Presenta Corrosión																		
	Deformación																		
	Fisuras, golpes, hundimientos																		

Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo					+ Yhoisa Tora
Número de Cedula de ciudadanía					+ 8039-1715
Firma del trabajador					+
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo					
Número de Cedula de ciudadanía					
Firma del trabajador					
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo					
Número de Cedula de ciudadanía					
Firma del trabajador					
Nombres y apellidos del residente SST					Laura Pinzon
Número de Cedula de ciudadanía					1020780263
Firma del SST					

OBSERVACIONES: Coordinadora alturas: Laura Camila Pinzón.

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES	CODIGO: SST VERSION: 01 FECHA: 27-06-25

Obra en la que se realiza la inspección:	Bodega Fac	Nombres y apellidos del encargado de la actividad:	Laura Pinzón	N. cc	1020780265	Firma	
Marca y serie del equipo	Insafe 209 / Insafe 255	Nombres y apellidos de residente SST	Laura Pinzon	N. cc	1020780265	Firma	

Importante! Para la ejecución de trabajados con la Soplador, se deberá contener siguientes elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección auditiva, casco, overol y calzado de seguridad.

Día de la inspección	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Fecha en la que se realiza la inspección				03-07-2025	04-07-2025	05-07-2025
Hora en la que se realiza la inspección				10:00 am	7:00	7:00

	Descripción del estado del Arnes	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica
ARNES	CINTAS Y CORREAS: Tiene perforaciones, agujeros										X			V			X		
	CINTAS Y CORREAS: Se encuentran Desflilachadas										X			X			X		
	CINTAS Y CORREAS: Se encuentran desgastadas										X			X			X		
	CINTAS Y CORREAS: Presentan quemaduras o abrasión										X			X			X		
	CINTAS Y CORREAS: Presentan suciedad										X			X			X		
	CINTAS Y CORREAS: Presenta decoloración										X			X			X		
	CINTAS Y CORREAS: Sin etiquetas o están ilegibles										X			X			X		
	Costuras: Presenta más de dos hilos cortados en el mismo patrón de costura										X			X			X		
	HEBILLAS: Presenta Corrosión										X			X			X		
	HEBILLAS: Deformación										X			X			X		
	HEBILLAS: Fisuras, golpes, hundimientos										X			X			X		
	Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo										X Carlos G.			Carlos G.			Carlos G.		
	Número de Cedula de ciudadanía										1020790775			1020790775			1020780265		
	Firma del trabajador										Carlos G.			Carlos G.			Carlos G.		
	Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo																		
	Número de Cedula de ciudadanía																		
	Firma del trabajador																		
	Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo																		
	Número de Cedula de ciudadanía																		
	Firma del trabajador																		
	Nombres y apellidos del residente SST										Laura Pinzon			Laura Pinzon			Laura Pinzon		
	Número de Cedula de ciudadanía										1020780265			1020780265			1020780265		
	Firma del SST										LMP			LMP			LMP		

OBSERVACIONES:

Coordinador Altura: Laura Pinzón.

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES	CODIGO: SST VERSION: 01 FECHA: 27-06-25

Obra en la que se realiza la inspección:	Bodega Fac.	Nombres y apellidos del encargado de la actividad	Laura Pinzon	N. cc	1020780265	Firma	LMP
Planta y serie del equipo	Insafe 210 / Insafe 014	Nombres y apellidos de residente SST	Laura Pinzon	N. cc	1020780265	Firma	LMP

Importante: Para la ejecución de trabajados con la Slackline, se deberá contar los siguientes elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección auditiva, casco, overol y calzado de seguridad.

Día de la inspección	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Fecha en la que se realiza la inspección				03-07-25	04-07-25	05-07-25
Hora en la que se realiza la inspección				7:30	7:00	7:00

Descripción del estado del Arnes			Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica
ARNES	CINTAS Y COSTURAS	Tiene perforaciones, agujeros										X			X			X		
		Se encuentran Deshilachadas										X			X			X		
		Se encuentran desgastadas										X			X			X		
		Presentan quemaduras o abrasión										X			X			X		
		Presentan suciedad										X			X			X		
		Presenta decoloración										X			X			X		
		Sin etiquetas o están ilegibles										X			X			X		
	Costuras: Presenta más de dos hilos cortados en el mismo patrón de costura											X			X			X		
	HERRAJES	Presenta Corrosión										X			X			X		
		Deformación										X			X			X		
		Fisuras, golpes, hundimientos										X			X			X		
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo										Fabian Gamba			Fabian Gamba			Fabian Gamba		
Número de Cedula de ciudadanía										1057710755			1057710755			1057710755		
Firma del trabajador										Fabian Gamba						Fabian Gamba		
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo																				
Número de Cedula de ciudadanía																				
Firma del trabajador																				
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo																				
Número de Cedula de ciudadanía																				
Firma del trabajador																				
Nombres y apellidos del residente SST										Laura Pinzón			Laura Pinzón			Laura Pinzón		
Número de Cedula de ciudadanía										1020780265			1020780265			1020780265		
Firma del SST										LMP			LMP			LMP		

OBSERVACIONES:

Coordinador de Alturas: Laura Camila Pinzón.

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES	CODIGO: SST VERSION: 01 FECHA: 27-06-25

Obra en la que se realiza la inspección:	FAC	Nombres y apellidos del encargado de la actividad	Laura Pinzón	N. cc	1020780265	Firma	
Marca y serie del equipo	INSAFE 209	Nombres y apellidos de residente SST	Yuley Bedoya	N. cc	1038676653	Firma	

Importante: Para la ejecución de trabajados con la Sopladora, se deberá contar los siguientes elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección auditiva, casco, overol y calzado de seguridad

Día de la inspección	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Fecha en la que se realiza la inspección	07-07-2025	08-07-25	09-07-25	10-07-25	11-07-25	
Hora en la que se realiza la inspección	7:00Am	700	700	700	700	

	Descripción del estado del Arnes	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica
ARNES – CINTAS Y CORREAS	Tiene perforaciones, agujeros	✓			✓			✓			✓			✓					
	Se encuentran Deshilachadas	✓			✓			✓			✓			✓					
	Se encuentran desgastadas	✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan quemaduras o abrasión	✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan suciedad	✓			✓			✓			✓			✓					
	Presenta decoloración	✓			✓			✓			✓			✓					
	Sin etiquetas o están ilegibles	✓			✓			✓			✓			✓					
	Costuras: Presenta más de dos hilos cortados en el mismo patrón de costura				✓			✓			✓			✓					
HERRAJES	Presenta Corrosión	✓			✓			✓			✓			✓					
	Deformación	✓			✓			✓			✓			✓					
	Fisuras, golpes, hundimientos	✓			✓			✓			✓			✓					

Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo	Carlos Guevara	Carlos Guevara	Carlos Guevara	Carlos Guevara	Carlos Guevara	
Número de Cedula de ciudadanía	1020796295	1020796295	1020796295	1020796295	1020796295	
Firma del trabajador	Carlos Guevara	Carlos Guevara	Carlos Guevara	Carlos Guevara	Carlos Guevara	
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo						
Número de Cedula de ciudadanía						
Firma del trabajador						
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo						
Número de Cedula de ciudadanía						
Firma del trabajador						
Nombres y apellidos del residente SST	Laura Pinzon	Laura Pinzon	Laura Pinzon	Laura Pinzon	Laura Pinzon	
Número de Cedula de ciudadanía	1020780265	1020780265	1020780265	1020780265	1020780265	
Firma del SST						

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES	CODIGO: SST VERSION: 01 FECHA: 27-06-25

Obra en la que se realiza la inspección:	FAC	Nombres y apellidos del encargado de la actividad	Laura Pinzón	N. cc	1020780265	Firma	LMP	
Marca y serie del equipo	INSAFE 210	Nombres y apellidos de residente SST	Yuley Bedoya	N. cc	1020367667	Firma		

Importante: Para la ejecución de trabajados con la Soldadora, se deberá contar los siguientes elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección auditiva, casco, overol y calzado de seguridad.

Día de la inspección	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Fecha en la que se realiza la inspección	07-01-2025	08-07-25	09-07-25	10-07-25	11-07-25	
Hora en la que se realiza la inspección	7:00 AM	7:00 am	7:00 am	7:00	7:00	

	Descripción del estado del Arnes	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica
ARNES	CINTAS Y CORREAS: Tiene perforaciones, agujeros	✓			✓			✓			✓			✓					
	Se encuentran Deshilachadas	✓			✓			✓			✓			✓					
	Se encuentran desgastadas	✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan quemaduras o abrasión	✓			✓			✓			✓			✓					
	Presentan suciedad	✓			✓			✓			✓			✓					
	Presenta decoloración	✓			✓			✓			✓			✓					
	Sin etiquetas o están ilegibles	✓			✓			✓			✓			✓					
	Costuras: Presenta más de dos hilos cortados en el mismo patrón de costura	✓			✓			✓			✓			✓					
	HERRAJES: Presenta Corrosión	✓			✓			✓			✓			✓					
	Deformación	✓			✓			✓			✓			✓					
	Fisuras, golpes, hundimientos	✓			✓			✓			✓			✓					

Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo	Fabian Gamba	Fabian Gamba	Fabian Gamba	Fabian Gamba	
Número de Cedula de ciudadanía	1057710755	1057710755	1057710755	1057710755	Fabian Gam
Firma del trabajador		Fabian Gamba	Fabian Gamba	1057710755	Fabian Gamba
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo					
Número de Cedula de ciudadanía					
Firma del trabajador					
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo					
Número de Cedula de ciudadanía					
Firma del trabajador					
Nombres y apellidos del residente SST	Laura Pinzón	Laura Pinzón	Laura Pinzón	Laura Pinzón	Laura Pinzón
Número de Cedula de ciudadanía	1020780265	1020780265	1020780265	1020780265	1020780265
Firma del SST	LMP	LMP	LMP	LMP	LMP

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES	CODIGO: SST VERSION: 01 FECHA: 27-06-25

Obra en la que se realiza la inspección:	Bodega FIAC cl 13	Nombres y apellidos del encargado de la actividad	Laura Pinzon	N. CC	1020780765	Firma	
Marca y serie del equipo	Insaje 14 Steelpro 1133	Nombres y apellidos de residente SST	Juan Badillo	N. CC	1013697653	Firma	

Importante: Para la ejecución de trabajados con la Soladora, se deberá contar los siguientes elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección auditiva, casco, overol y calzado de seguridad.

Día de la inspección	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Fecha en la que se realiza la inspección			09-07-25	10-07-25	11-07-25	
Hora en la que se realiza la inspección			11:00	700	700	

	Descripción del estado del Arnes	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica
ARNES – CINTAS Y COMPRAS	Tiene perforaciones, agujeros							X			X			✓					
	Se encuentran Deshilachadas							X			X			✓					
	Se encuentran desgastadas							X			X			✓					
	Presentan quemaduras o abrasión							X			X			✓					
	Presentan suciedad							X			X			✓					
	Presenta decoloración							X			X			✓					
	Sin etiquetas o están ilegibles							X			X			✓					
	Costuras: Presentia más de dos hilos cortados en el mismo patrón de costura							X			X			✓					
HERRAJES	Presenta Corrosión							X			X			✓					
	Deformación							X			X			✓					
	Fisuras, golpes, hundimientos							X			X			✓					
	Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo							X Jose Ignacio			X			Jose Ignacio					
	Número de Cedula de ciudadanía							80394715			80394715			80394715					
	Firma del trabajador																		
	Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo																		
	Número de Cedula de ciudadanía																		
	Firma del trabajador																		
	Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo																		
	Número de Cedula de ciudadanía																		
	Firma del trabajador																		
	Nombres y apellidos del residente SST							Laura Pinzon			Laura Pinzón			Laura Pinzon					
	Número de Cedula de ciudadanía							1020780765			1020780765			1020780765					
	Firma del SST																		

OBSERVACIONES:

Firmado por Coordinador de alturas Laura Pinzón.

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES	CODIGO: SST VERSION: 01 FECHA: 27-06-25

Obra en la que se realiza la inspección:	Bodega FAC	Nombres y apellidos del encargado de la actividad	Laura Pinzon	N. cc	1020780265	Firma
Marca y serie del equipo	Insape 210	Nombres y apellidos de residente SST	[illegible]	N. cc	1073641663	Firma

Importante: Para la ejecución de trabajos con la Soldadora, se deberá contar los siguientes elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección auditiva, casco, overol y calzado de seguridad.

Día de la inspección	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Fecha en la que se realiza la inspección	14-07-25	15-07-25				
Hora en la que se realiza la inspección	7:00 am	7:00				

	Descripción del estado del Arnes	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica
ARNES	CINTAS Y CORREAS: Tiene perforaciones, agujeros	X			/														
	CINTAS Y CORREAS: Se encuentran Deshilachadas	X			/														
	CINTAS Y CORREAS: Se encuentran desgastadas	X			/														
	CINTAS Y CORREAS: Presentan quemaduras o abrasión	X			/														
	CINTAS Y CORREAS: Presentan suciedad	X			/														
	CINTAS Y CORREAS: Presenta decoloración	X			/														
	CINTAS Y CORREAS: Sin etiquetas o estan ilegibles	X			/														
	Costuras: Presenta más de dos hilos cortados en el mismo patrón de costura	X			/														
	HERRAJES: Presenta Corrosión	X			/														
	HERRAJES: Deformación	X			/														
	HERRAJES: Fisuras, golpes, hundimientos	X			/														

Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo	Fabian Bank	Fabian Bank				
Número de Cedula de ciudadanía	1057716755	1057716755				
Firma del trabajador	[signature]	[signature]				
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo						
Número de Cedula de ciudadanía						
Firma del trabajador						
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo						
Número de Cedula de ciudadanía						
Firma del trabajador						
Nombres y apellidos del residente SST	Laura Pinzon	[illegible]				
Número de Cedula de ciudadanía	1020780265	1073641663				
Firma del SST	[signature]	[signature]				

OBSERVACIONES:

Firma coordinadora de altura Laura Pinzon 1020780265 [signature]

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL ARNES	CODIGO: SST VERSION: 01 FECHA: 27-06-25

Obra en la que se realiza la inspección:	Bodega FAC	Nombres y apellidos del encargado de la actividad:	Laura Pinzon	N. CC	1020780265	Firma	
Placa y serie del equipo:	Image 209	Nombres y apellidos de residente SST	Yuleydis	N. CC	1193E+09	Firma	

Importante: Para la ejecución de trabajadora con la Soldadora, se deberá contar los siguientes elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección auditiva, casco, overol y calzado de seguridad.

Día de la inspección	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Fecha en la que se realiza la inspección	14-07-25	15-07-25				
Hora en la que se realiza la inspección	7:00 AM	7:00 AM				

Descripción del estado del Arnes			Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica	Cumple	No Cumple	No aplica
ARNES	CINTAS Y CORREAS	Tiene perforaciones, agujeros	✓			✓														
		Se encuentran Deshilachadas	✓			✓														
		Se encuentran desgastadas	✓			✓														
		Presentan quemaduras o abrasión	✓			✓														
		Presentan suciedad	✓			✓														
		Presenta decoloración	✓			✓														
		Sin etiquetas o están ilegibles	✓			✓														
	Costuras: Presenta más de dos hilos cortados en el mismo patrón de costura		✓			✓														
	HERRAJES	Presenta Corrosión	✓			✓														
		Deformación	✓			✓														
		Fisuras, golpes, hundimientos	✓																	

Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo	Carlos Guevara	Carlos Guevara																	
Número de Cedula de ciudadanía	1020790295	1020790295																	
Firma del trabajador	Carlos Guevara	Carlos Guevara																	
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo																			
Número de Cedula de ciudadanía																			
Firma del trabajador																			
Nombres y apellidos del trabajador que utiliza el equipo																			
Número de Cedula de ciudadanía																			
Firma del trabajador																			
Nombres y apellidos del residente SST	Yuleydis	Yuleydis																	
Número de Cedula de ciudadanía	1193E+09	1193E+09																	
Firma del SST	Yuleydis	Yuleydis																	

OBSERVACIONES:

Firma coordinadas allras Laura Pinzon 1020780265 LMP

Powered by CamScanner

	INSPECCION RETROEXCAVADORA	F-SST-042 Version: 002 10/04/2025

OBRA

EQUIPO Retroexcavadora SERIE 135 SE MOTOR Kummins MARCA Shantui

OPERARIO Miguel Angel Rodriguez

SEMANA DE INSPECCION DESDE 01-07/25 HASTA 05/07/25

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	FECHA/HORA				01/07/25			02/07/25			03/07/25			04/07/25			05/07/25		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	De Trabajo Traseras						X												
	De Trabajo Frontales																		
CABINA	Cinturón seguridad																		
	Extintor de Incendio 10 PQS																		
	Asiento en Buen Estado																		
	Vidrio Panoramico en Buen Estado																		
	Indicadores (Hidraulicos- Refrigerantes-Horometro-Corriente- Aceite Motor)																		
	Tubo de Escape (Exhosto)																		
	Alarma de Retroceso - Pito						X												
	Escalleras y Apoyos de Acceso																		
	Bateria y Cables																		
ESTADO MECANICO	Control fugas hidraulicas																		
	Kit Ambiental						X												
	Estado Pasadores																		
	Orugas Tensionadas																		
	Mecanismo de gira (Tornameza)																		
	Corona de Tornameza en buen estado																		
	Mando de Avance																		
	Mano de Estacionamiento																		
	Estado General Desgarrador (balde)																		
	Mandos de levante del brazo																		
	Cilindros en Buen Estado																		
	Compartimiento del Motor Aseado																		
	Zapatas																		
	Rodillos Inferiores- Superiores																		
HOROMETRO	INICIAL				4992.6			4994			4997			4998			5000		
	FINAL				4994.1			4997			4998			5000			5006		
FIRMAS	OPERADOR																		
	INSPECTOR																		

OBSERVACIONES

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCIÓN DE MAQUINARIA	Código: FT-SST-007 Versión: 1 Fecha: 10/10/2023
PROYECTO:	DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	
INSPECCIONADO POR:	Laura Pinzon	FECHA: 01-07-25
Marque con un 0 si el ítem inspeccionado cumple con las disposiciones dadas; con una X si está incumpliendo. Si el ítem inspeccionado no aplica, coloque NA		CARGO: Residente

No. MAQUINA/ EQUIPO	MÁQUINA Y/O EQUIPO	UBICACIÓN	OPERADOR	HORÓMETRO	DOCUMENTACION							EQUIPO DE CARRETERA					ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ASEO Y LIMPIEZA									OTROS	OBSERVACIONES	FIRMA OPERADOR
					TARJETA PROPIEDAD	LICENCIA CONDUCCION VIGENTE	SOAT VIGENTE	IDENTIFICACION	REVISIÓN TECNICO MECANICA	No PREOPERACIONALES	OTROS	BOTIQUIN	EXTINTOR	KIT DERRAMES	CONOS	CAUCHO HERRAMIENTA	OVEROL	PROTECCIÓN CABEZA	CALZADO	PROTECCIÓN OJOS	PROTECCIÓN MANOS	PIES	PROTECCIÓN AUDITIVA	IMPERMEABLE	ASEO Y LIMPIEZA			
135 SE	Excavadora	Bodega	Miguel Rodriguez	4992	X	NA	NO	7652823	NA	1	NO	NO	SI	SI	NA	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI		01-07-25	
135 SC	excavadora	Bodega	Miguel Rodriguez	4994	X	NA	NA	7652823	NA	1	NO	NA	SI	SI	NA	NA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI		02-07-25	
135 SZ	excavadora	Bodega	Miguel Rodriguez	4997	X	NA	NA	7652823	NA	1	NO	NA	SI	SI	NA	NA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI		03-07-25	
135 SE	excavadora	Bodega	Miguel Rodriguez	4998	X	NA	NA	7652823	NA	1	NO	NA	SI	SI	NA	NA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI		04-07-25	
135 SC	excavadora	Bodega	Miguel Rodriguez	5000	X	NA	NA	7652823	NA	1	NO	NA	SI	SI	NA	NA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI		07-07-25	

Powered by CamScanner

	INSPECCION RETROEXCAVADORA	F-SST-042 Version: 002 10/04/2025

OBRA
EQUIPO Retroexcavadora SERIE 135 SE MOTOR Kummis MARCA Shantui
OPERARIO Miguel Rodgus
SEMANA DE INSPECCION DESDE 07-07-2025 HASTA 13/07/25

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

ITEM	CONCEPTO	LUNES 07-07-25			MARTES 08-07-25			MIÉRCOLES 09-07-25			JUEVES 10-07-25			VIERNES 11-07-25			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	De Trabajo Traseras	/		/	/			/		/			/			/			
	De Trabajo Frontales	/			/			/			/			/					/
CABINA	Cinturón seguridad	/			/			/			/			/					
	Extintor de incendio 10 PQS	/			/			/			/			/					
	Asiento en Buen Estado	/			/			/			/			/					
	Vidrio Panoramico en Buen Estado	/			/			/			/			/					
	Indicadores (Hidraulicos- Refrigerantes-Horometro-Corriente- Aceite Motor)	/			/			/			/			/					
	Tubo de Escape (Exhosto) ,		/			/			/			/			/					
	Alarma de Retroceso - Pito	/			/			/			/			/					
	Escaleras y Apoyos de Acceso	/			/			/			/			/					
	Baterla y Cables	/			/			/			/			/					
ESTADO MECANICO	Control fugas hidraulicas	/		/	/		/	/		/			/			/			
	Kit Ambiental	/			/			/			/			/					/
	Estado Pasadores	/			/			/			/			/					
	Orugas Tensionadas	/			/			/			/			/					
	Mecanismo de gira (Tornameza)	/			/			/			/			/					
	Corona de Tornameza en buen estado	/			/			/			/			/					
	Mando de Avance	/			/			/			/			/					
	Mano de Estacionamiento	/			/			/			/			/					
	Estado General Desgarrador (balde)	/			/			/			/			/					
	Mandos de levante del brazo	/			/			/			/			/					
	Cilindros en Buen Estado	/			/			/			/			/					
	Compartimiento del Motor Aseado	/			/			/			/			/					
	Zapatas	/			/			/			/			/					
	Rodillos Inferiores- Superiores	/			/			/			/			/					/
HOROMETRO	INICIAL	5006			5010			5016			5024			5022					
	FINAL	5010			5016			5024			5029								
FIRMAS	OPERADOR																		
	INSPECTOR																		

OBSERVACIONES

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

Vertical	INSPECCION RETROEXCAVADORA	F-SST Version: 1 27/06/2025

OBRA: Bodega FAC
EQUIPO: Excavadora — SERIE: 865E13ERNL0000 — MOTOR: 7672876 — MARCA: Sroduc (3)
OPERARIO: Miguel Rodriguez 315
SEMANA DE INSPECCION — DESDE: 14-07-25 — HASTA: 19-07-25

CONVENCIONES: B: BUENO — M: MALO — N/A: NO APLICA

ITEM	CONCEPTO	LUNES 14-07-25			MARTES 15-07-25			MIÉRCOLES 16-07-25			JUEVES 17-07-25			VIERNES 18-07-25			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	De Trabajo Traseras	X			/			/			/			/					
	De Trabajo Frontales	X			/			/			/			/					
CABINA	Cinturón seguridad	X			/			/			/			/					
	Extintor de Incendio 10 PQS	X			/			/			/			/					
	Asiento en Buen Estado	X			/			/			/			/					
	Vidrio Panoramico en Buen Estado	X			/			/			/			/					
	Indicadores (Hidraulicos- Refrigerantes-Horometro-Corriente- Aceite Motor)	X			/			/			/			/					
	Tubo de Escape (Exhosto)	X			/			/			/			/					
	Alarma de Retroceso - Pito	X			/	/		/	/		/	/		/	/				
	Escaleras y Apoyos de Acceso	X			/			/			/			/					
	Bateria y Cables	X			/			/			/			/					
ESTADO MECANICO	Control Fugas hidráulicas				/			/			/			/					
	Kit Ambiental		X				/			/			/			/			
	Estado Pasadores	X			/			/			/			/					
	Orugas Tensionadas	X			/			/			/			/					
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X			/			/			/			/					
	Corona de Tornameza en buen estado	X			/			/			/			/					
	Mando de Avance	X			/			/			/			/					
	Mano de Estacionamiento			X	/			/			/			/					
	Estado General Desgarrador (balde)	X			/			/			/			/					
	Mandos de levante del brazo	X			/			/			/			/					
	Cilindros en Buen Estado	X			/			/			/			/					
	Compartimiento del Motor Aseado	X			/			/			/			/					
	Zapatas	X			/			/			/			/					
	Rodillos Inferiores- Superiores	X			/			/			/			/					
HOROMETRO	INICIAL	5032			5040			5047			5054			5062					
	FINAL	5040			5047			5054			5062								
FIRMAS	OPERADOR																		
	INSPECTOR	Laura P.			Laura P.			Laura P.			Laura P.			Laura P.					

OBSERVACIONES: Se recibe el balde de mantenimiento 14-07-25.

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE
14.07.25	balde desgastado	Se refuerza y se traeacta	Laura Pinzon.

Powered by CamScanner

VERTICAL	INSPECCION RETROEXCAVADORA	F-SST Version: 1 27/06/2025

OBRA

EQUIPO Retroexcavadora SERIE 135SE MOTOR Kummins MARCA Shantui

OPERARIO Miguel A Rodriguez

SEMANA DE INSPECCION DESDE 21-07-25 HASTA 25-07-25

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		21-07-25			22-07-25			23-07-25			24-07-25			25-07-25					
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	De Trabajo Traseras	/			/			/			/			/					/
	De Trabajo Frontales	/			/			/			/			/					/
CABINA	Cinturón seguridad	/			/			/			/			/					/
	Extintor de Incendio 10 PQS	/			/			/			/			/					/
	Asiento en Buen Estado	/			/			/			/			/					/
	Vidrio Panoramico en Buen Estado	/			/			/			/			/					/
	Indicadores (Hidraulicos- Refrigerantes-Horometro-Corriente- Aceite Motor)	/			/			/			/			/					/
	Tubo de Escape (Exhosto)	/			/			/			/			/					/
	Alarma de Retroceso - Pito		/			/			/			/			/					
	Escaleras y Apoyos de Acceso	/			/			/			/			/					
	Bateria y Cables	/			/			/			/			/					
ESTADO MECANICO	Control fugas hidráulicas	/			/			/			/			/					
	Kit Ambiental	/			/			/			/			/					
	Estado Pasadores	/			/			/			/			/					/
	Orugas Tensionadas	/			/			/			/			/					/
	Mecanismo de gira (Tornameza)	/			/			/			/			/					/
	Corona de Tornameza en buen estado	/			/			/			/			/					/
	Mando de Avance	/			/			/			/			/					/
	Mano de Estacionamiento	/			/			/			/			/					/
	Estado General Desgarrador (balde)	/			/			/			/			/					/
	Mandos de levante del brazo	/			/			/			/			/					/
	Cilindros en Buen Estado	/			/			/			/			/					/
	Compartimiento del Motor Aseado	/			/			/			/			/					/
	Zapatas	/			/			/			/			/					/
	Rodillos Inferiores- Superiores	/			/			/			/			/					/
HOROMETRO	INICIAL	5075			5082			5090			5092			5100					
	FINAL	5092			5090			5097			5100								
FIRMAS	OPERADOR																		
	INSPECTOR				yuleys			yuleys			yuleys			yuleys					

OBSERVACIONES

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

NIT: 900.246.243-4	INSPECCION PULIDORA	CODIGO: SST
VERTICAL DISEÑO		VERSION: 01
		FECHA: 14-07-2025

PULIDORA No: 1	ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte
ENCARGADO: Edwin Soto	MARCA: GAVO
FECHA INSPECCION: 14 JUL 2025	TIPO DISCO: 4 1/2

ITEM	ASPECTOS PULIDROA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	La carcasa de encuentra sin rupturas	✓		
2	Se cuenta con mango de agarre	✓		
3	Tiene protector de seguridad	✓		
4	El interruptor funciona correctamente	✓		
5	El botón de bloqueo funciona correctamente			
	ASPECTOS DISCO			
1	El tamaño es acorde con la pulidora	✓		
2	El contorno del disco no presenta desgaste	✓		
3	El área no presenta desgaste	✓		
4	La tuerca de fijación ajusta correctamente	✓		
	ASPECTOS DEL CABLE			
1	Es cable de alimentación está en buen estado	✓		
2	La clavija no presenta daños	✓		
	ASPECTOS DE SEGURIDAD			
1	Las partes en movimiento están en buen estado	✓		
2	Las escobillas están en buen estado	✓		
3	El rodamiento está en buen estado	✓		

OBSERVACIONES:

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	Edwin David	ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	
No. IDENTIFIFCACION	1007772026	No. IDENTIFIFCACION	
FIRMA ENCARGADO	E Soto B	FIRMA ENCARGADO	

INSPECCIONADO POR	Yulay Bedoya
No. IDENTIFIFCACION	1102367663
FIRMA INSPECTOR	Yulay B

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4	INSPECCION TALADRO	CODIGO: SST
		VERSION: 01
		FECHA: 01-04-2021

TALADRO No: 1	ACTIVIDAD A REALIZAR: Demoler
ENCARGADO: Santiago Serna	MARCA: Hilti
FECHA INSPECCION: 070725	TIPO: percutor

Item	ASPECTOS DEL TALADRO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	La carcasa se encuentra sin rupturas	X		
2	Se cuenta con empuñadura auxiliar	X		
3	La entrada del cable de energía está en buen estado	X		
4	La ventilación esta despejada	X		
5	El interruptor de encendido está en buen estado	X		
6	El mandril no presenta desgaste	X		
7	El selector funciona de acuerdo a lo indicado	X		
	ASPECTOS DE LOS ACCESORIOS			
1	Son compatibles entre si	X		
2	El mandril sujeta correctamente	X		
3	Los accesorios son del diámetro adecuado	X		
4	La llave de sujeción sujeta correctamente	X		
	ASPECTOS DE CABLE			
1	El cable está en buen estado	X		
2	La clavija no presenta daños o maltrato	X		
	ASPECTOS DESEGURIDAD			
1	Las partes en movimiento están en buen estado	X		
2	El equipo no presente recalentamiento	X		
3	El rodamiento no está desgastado	X		

OBSERVACIONES:

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	Santiago Serna	ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	Laura Pinzón
No. IDENTIFIFCACION	1024487371	No. IDENTIFIFCACION	
FIRMA ENCARGADO	Santiago Serna	FIRMA ENCARGADO	

INSPECCIONADO POR	YURLEY BADILLO QUEZADA
No. IDENTIFIFCACION	1102367663
FIRMA INSPECTOR	Laura Pinzón.

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4	INSPECCION TALADRO	CODIGO: SST
VERTICAL		VERSION: 01
		FECHA: 01-04-2021

TALADRO No: 1	ACTIVIDAD A REALIZAR: Demolición
ENCARGADO: Carlos Guerra	MARCA: Bosch
FECHA INSPECCION: 14 Julio 2015	TIPO: Demledor

Item	ASPECTOS DEL TALADRO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	La carcasa se encuentra sin rupturas	✓		
2	Se cuenta con empuñadura auxiliar	✓		
3	La entrada del cable de energía está en buen estado	✓		
4	La ventilación esta despejada	✓		
5	El interruptor de encendido está en buen estado	✓		
6	El mandril no presenta desgaste	✓		
7	El selector funciona de acuerdo a lo indicado	✓		
	ASPECTOS DE LOS ACCESORIOS			
1	Son compatibles entre si	✓		
2	El mandril sujeta correctamente	✓		
3	Los accesorios son del diámetro adecuado	✓		
4	La llave de sujeción sujeta correctamente	✓		
	ASPECTOS DE CABLE			
1	El cable está en buen estado	✓		
2	La clavija no presenta daños o maltrato	✓		
	ASPECTOS DESEGURIDAD			
1	Las partes en movimiento están en buen estado	✓		
2	El equipo no presente recalentamiento	✓		
3	El rodamiento no está desgastado	✓		

OBSERVACIONES:

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD		ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	Carlos Guerra
No. IDENTIFIFCACION		No. IDENTIFIFCACION	1020790295
FIRMA ENCARGADO		FIRMA ENCARGADO	Carlos Guerra

INSPECCIONADO POR	YURLEY BADILLO QUEZADA
No. IDENTIFIFCACION	1102367663
FIRMA INSPECTOR	

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4	INSPECCION TALADRO	CODIGO: SST
VERTICAL		VERSION: 01
		FECHA: 01-04-2021

TALADRO No: 1	ACTIVIDAD A REALIZAR: Demoler
ENCARGADO: Laura Pinzon	MARCA: Hilti
FECHA INSPECCION: 21-07-2025	TIPO: Demoledor

Item	ASPECTOS DEL TALADRO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	La carcasa se encuentra sin rupturas	✓		
2	Se cuenta con empuñadura auxiliar	✓		
3	La entrada del cable de energía está en buen estado	✓		
4	La ventilación esta despejada	✓		
5	El interruptor de encendido está en buen estado	✓		
6	El mandril no presenta desgaste	✓		
7	El selector funciona de acuerdo a lo indicado	✓		
	ASPECTOS DE LOS ACCESORIOS			
1	Son compatibles entre si	✓		
2	El mandril sujeta correctamente	✓		
3	Los accesorios son del diámetro adecuado	✓		
4	La llave de sujeción sujeta correctamente	✓		
	ASPECTOS DE CABLE			
1	El cable está en buen estado	✓		
2	La clavija no presenta daños o maltrato	✓		
	ASPECTOS DESEGURIDAD			
1	Las partes en movimiento están en buen estado	✓		
2	El equipo no presente recalentamiento	✓		
3	El rodamiento no está desgastado	✓		

OBSERVACIONES:

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	Luis Morales	ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	Carlos Cremon
No. IDENTIFIFCACION	3720402	No. IDENTIFIFCACION	1020790295
FIRMA ENCARGADO		FIRMA ENCARGADO	

INSPECCIONADO POR	YURLEY BADILLO QUEZADA
No. IDENTIFIFCACION	1102367663
FIRMA INSPECTOR	

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4 VERTICAL	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	CODIGO: SST
		Version: 01
		FECHA: 01-04-2020
VERTICAL DISEÑO		Pagina 1/3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO:	HORA DE INICIO:	FECHA DE FINALALIZACION:	HORA DE FINALIZACION:
02-07-25	7:00	02-07-25	16:30

PROYECTO DE TRABAJO:	SITIO Y ALTURA DE TRABAJO
Desmonte Cubiertas	Bodega 1 y 2 1=3m 2=9m.
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:	**OBSERVACIONES:**
Desmonte de tejas y estructura	

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (SISTEMA DE GESTION INTEGRAL) MARQUE CON UNA EQUIS "X"

RIESGOS HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO					RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL		
Por contaminación biológica					X	Caída de diferente nivel	Electrocución
RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE					X	Caídas al mismo nivel	X	Cortaduras o punzonamiento
						Derrames, Fugas		Riesgos naturales
						Atrapamientos	X	golpes, contusiones, fracturas
Contaminación de:	Agua	Aire	Suelo			Riesgo publico	X	Lesiones osteomusculares
Otros. ¿Cuál?						Quemaduras química o térmicas		riesgo quimico

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Se ha realizado una inspección previa al lugar donde se va ha ejecutar el trabajo?	X			
2. ¿El lugar de trabajo permanece en orden y aseo durante y después de realizar el trabajo, diariamente?	X			
3. ¿El trabajo se encuentra supervisado por el coordinador de la Empresa en forma permanente?	X			
4. ¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos al ejecutar el trabajo?	X			
5. ¿Se ha asignado por lo menos una persona que conozca los procedimientos de emergencia para vigilar y auxiliar el los trabajadores?	X			
6. ¿Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están disponibles para su uso y las salidas de evacuación?	X			
7. ¿Se ha colocado la señalización adecuada, se ha aislado el área para evitar que personal que esta trabajando o ajeno al trabajo sufra o provoque un incidente?			X	
8. ¿Los trabajadores están adecuadamente capacitados, entrenados y protegidos?	X			
9. ¿El sistema de descenso esta en buenas condiciones)			X	
10. ¿Se cuenta con condiciones de clima favorables.?	X			
11. ¿Se encuentra bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva (alcohol o drogas)?		X		
12. ¿Se verifico que el acceso al lugar de trabajo es el adecuado? ¿Cuál?	X			
13. ¿El empleado esta afiliado a seguridad social (ARL,AFP,EPS,CCF)?	X			

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN ALTURAS	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
13. ¿Se ha revisado el estado de los arneses, anclajes, eslingas, anillos D y los remaches de metal?	X			
14. ¿Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible.	X			
15.¿El material de los equipos de seguridad (arnés, cuerda, eslinga, mosquetones, anclajes, etc.) son normalizados para la ejecución en el área de trabajo?	X			
16. ¿Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas (mínimo 60 cm.)?			X	
17. ¿Hay un trabajador asegurado por cada línea de vida vertical?			X	
18. ¿Se utilizan puntos de anclaje adecuados (resistencia mínima de 5000lb, sitios fijos o bandas de amarre)?	X			
19. ¿Se aisló equipos y materiales de proceso contra posibles daños, cortes a bordes ?	X			
20. ¿se verifico que la silla se encuentra bien instalada?			X	
21. ¿Los andamios están en buenas condiciones.?			X	

4. VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"			Si	No	N/A	OBSERVACIONES
No.	EQUIPO	CHEQUEO				
1	Arnés, inspección general.	Buen estado	X			
2	Arnés, Correas o reatas	Buen estado	X			
		Sin fibras descosidas	X			
		Limpio	X			
		Sin pintura de ninguna clase	X			

Powered by CamScanner

3	Arnés, Ganchos, argollas y hebillas	En buen estado	X			
		Abre y cierra adecuadamente	X			
4	Eslinga con absorbedor de choque	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
5	Eslinga de posicionamiento	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
6	Línea de vida	En buen estado	X			
		Cuerdas y trenzado en extremos en buen estado	X			
		La linea de vida esta certificada	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
7	Puntos de anclaje	Adecuados	X			
		Resistentes	X			
		Sin deterioro	X			
8	Etiquetas de equipos	Legibles	X			
		Ha cumplido su vida útil		X		
9	Seguridad del equipo	Ha detenido caídas		X		
		Se revisó después de la caída			X	
10	Uso correcto del equipo	Todo el personal sabe utilizar adecuadamente los Equipos	X			
11	Uso adecuado de EPP	Todo el personal debe utilizar adecuadamente los Elementos de Proteccion Personal	X			
12	certificado medico apto para trabajos en alturas	Todo el personal ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.aprobando su aptitud fisica	X			
13	Condiciones de Salud	Todo el personal esta en buenas condiciones de salud para la ejecucion de actividades	X			
14	Certificación de aptitud medica y de competencia (curso avanzado o reentrenamiento)	Todo el personal esta certificado en alturas y ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.	X			

Powered by CamScanner

5. ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO		CRITERIO DE CALIFICACION			
	MARQUE CON UNA EQUIS "X"	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿El acceso al lugar de trabajo esta libre y despejado ante cualquier emergencia?	X			
2	Andamios ¿Cuál?			X	
3	Escaleras ¿Cuál?	X			En A
4	Otros ¿Cuál?		X		

6. HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS A UTILIZAR	Pagina 3/3
Equipo de oxicate, alicates.	

7. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

8. PERSONAL AUTORIZADO

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Laura Pinzón.	1020780265	
2	Fabian Gamba	1057710755	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

FIRMA Y NOMBRE (INSPECTOR SISO) Y/O COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
Laura Camila Pinzón.	Laura Camila Pinzón.

NOTA 1: Durante tormentas, llovizna suave y/o vientos se deben suspender el trabajo y solicitar un nuevo permiso de trabajo al reanudar la labor.

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4 VERTICAL	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	CODIGO: SST
		Version: 01
	VERTICAL DISEÑO	FECHA: 01-04-2020
		Pagina 1/3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO:	HORA DE INICIO:	FECHA DE FINALALIZACION:	HORA DE FINALIZACION:
03-07-25	7:00 am	07-07-25	17:00

PROYECTO DE TRABAJO:	SITIO Y ALTURA DE TRABAJO
BODEGA FAC CL 13	Bodega principal y 2 piso oficinas
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:	**OBSERVACIONES:**
Desmonte de cubierta, tejas y estructura	

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (SISTEMA DE GESTION INTEGRAL) MARQUE CON UNA EQUIS "X"

RIESGOS HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO		RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL			
Por contaminación biológica		X	Caída de diferente nivel		Electrocución
RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE		X	Caídas al mismo nivel	X	Cortaduras o punzonamiento
			Derrames, Fugas		Riesgos naturales
		X	Atrapamientos	X	golpes, contusiones, fracturas
Contaminación de:	Agua / Aire / Suelo		Riesgo publico	X	Lesiones osteomusculares
Otros. ¿Cuál?		X	Quemaduras química o térmicas		riesgo químico

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

MARQUE CON UNA EQUIS "X"	CRITERIO DE CALIFICACION			
	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Sé ha realizado una inspección previa al lugar donde se va ha ejecutar el trabajo?	X			
2. ¿El lugar de trabajo permanece en orden y aseo durante y después de realizar el trabajo, diariamente?	X			
3. ¿El trabajo se encuentra supervisado por el coordinador de la Empresa en forma permanente?	X			
4. ¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos al ejecutar el trabajo?	X			
5. ¿Se ha asignado por lo menos una persona que conozca los procedimientos de emergencia para vigilar y auxiliar el los trabajadores?	X			
6. ¿Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están disponibles para su uso y las salidas de evacuación?	X			
7. ¿Se ha colocado la señalización adecuada, se ha aislado el área para evitar que personal que esta trabajando o ajeno al trabajo sufra o provoque un incidente?			X	
8. ¿Los trabajadores están adecuadamente capacitados, entrenados y protegidos?	X			
9. ¿El sistema de descenso esta en buenas condiciones)			X	
10. ¿Se cuenta con condiciones de clima favorables.?	X			
11. ¿Se encuentra bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva (alcohol o drogas)?		X		
12. ¿Se verifico que el acceso al lugar de trabajo es el adecuado? ¿Cuál?	X			
13. ¿El empleado esta afiliado a seguridad social (ARL,AFP,EPS,CCF)?	X			

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN ALTURAS

MARQUE CON UNA EQUIS "X"	CRITERIO DE CALIFICACION			
	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
13. ¿Se ha revisado el estado de los arneses, anclajes, eslingas, anillos D y los remaches de metal?	X			
14. ¿Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible.	X			
15.¿El material de los equipos de seguridad (arnés, cuerda, eslinga, mosquetones, anclajes, etc.) son normalizados para la ejecucion en el área de trabajo?	X			
16. ¿Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas (mínimo 60 cm.)?			X	
17. ¿Hay un trabajador asegurado por cada línea de vida vertical?	X			
18. ¿Se utilizan puntos de anclaje adecuados (resistencia mínima de 5000lb, sitios fijos o bandas de amarre)?	X			
19. ¿Se aisló equipos y materiales de proceso contra posibles daños, cortes a bordes ?			X	
20. ¿se verifico que la silla se encuentra bien instalada?			X	
21. ¿Los andamios están en buenas condiciones.?			X	

4. VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

MARQUE CON UNA EQUIS "X"			CRITERIO DE CALIFICACION			
No	EQUIPO	CHEQUEO	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1	Arnés, inspección general.	Buen estado	X			
2	Arnés, Correas o reatas	Buen estado	X			
		Sin fibras descosidas	X			
		Limpio	X			
		Sin pintura de ninguna clase	X			
3	Arnés, Ganchos, argollas y hebillas	En buen estado	X			
		Abre y cierra adecuadamente	X			

Powered by CamScanner

4	Eslinga con absorbedor de choque	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
5	Eslinga de posicionamiento	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
6	Línea de vida	En buen estado				
		Cuerdas y trenzado en extremos en buen estado	X			
		La línea de vida esta certificada	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
7	Puntos de anclaje	Adecuados	X			
		Resistentes	X			
		Sin deterioro	X			
8	Etiquetas de equipos	Legibles	X			
		Ha cumplido su vida útil	X			
9	Seguridad del equipo	Ha detenido caídas		X		
		Se revisó después de la caída			X	
10	Uso correcto del equipo	Todo el personal sabe utilizar adecuadamente los Equipos	X			
11	Uso adecuado de EPP	Todo el personal debe utilizar adecuadamente los Elementos de Proteccion Personal	X			
12	certificado medico apto para trabajos en alturas	Todo el personal ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.aprobando su aptitud fisica	X			
13	Condiciones de Salud	Todo el personal esta en buenas condiciones de salud para la ejecucion de actividades	X			
14	Certificación de aptitud medica y de competencia (curso avanzado o reentrenamiento)	Todo el personal esta certificado en alturas y ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.	X			

5. ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO		CRITERIO DE CALIFICACION			
	MARQUE CON UNA EQUIS "X"	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿El acceso al lugar de trabajo esta libre y despejado ante cualquier emergencia?	X			
2	Andamios ¿Cuál?		X		
3	Escaleras ¿Cuál?		X		
4	Otros ¿Cuál?				

6. HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS A UTILIZAR — Pagina 3/3

Equipo oxicorte, alicates, taladro electrico.

7. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

8. PERSONAL AUTORIZADO

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Fabian Garnica	1057710755	
2	Luis Morales	3120802	
3	Carlos Guerrero	1020790295	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
Laura Camila Pinzon.	Laura Camila Pinzon

NOTA 1: Durante tormentas, llovizna suave y/o vientos se deben suspender el trabajo y solicitar un nuevo permiso de trabajo al reanudar la labor.

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4 VERTICAL	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	CODIGO: SST
		Version: 01
		FECHA: 01-04-2020
	VERTICAL DISEÑO	Pagina 1/3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO:	HORA DE INICIO:	FECHA DE FINALALIZACION:	HORA DE FINALIZACION:
04/07/25	7:00	05-07-25	14:00

PROYECTO DE TRABAJO:	SITIO Y ALTURA DE TRABAJO
BODEGA FACC 13	Bodega principal y 2 piso oficina
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:	OBSERVACIONES:
Desmonte de cobijeta, tejas y estructura	1

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (SISTEMA DE GESTION INTEGRAL) MARQUE CON UNA EQUIS "X"

RIESGOS HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO					RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL			
Por contaminación biológica				X	Caída de diferente nivel		Electrocución	
				X	Caídas al mismo nivel	X	Cortaduras o punzonamiento	
RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE					Derrames, Fugas		Riesgos naturales	
				X	Atrapamientos	X	golpes, contusiones, fracturas	
Contaminación de:	Agua	Aire	Suelo		Riesgo publico	X	Lesiones osteomusculares	
Otros. ¿Cuál?				X	Quemaduras química o térmicas		riesgo químico	

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Sé ha realizado una inspección previa al lugar donde se va ha ejecutar el trabajo?	X			
2. ¿El lugar de trabajo permanece en orden y aseo durante y después de realizar el trabajo, diariamente?	X			
3. ¿El trabajo se encuentra supervisado por el coordinador de la Empresa en forma permanente?	X			
4. ¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos al ejecutar el trabajo?	X			
5. ¿Se ha asignado por lo menos una persona que conozca los procedimientos de emergencia para vigilar y auxiliar el los trabajadores?	X			
6. ¿Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están disponibles para su uso y las salidas de evacuación?	X			
7. ¿Se ha colocado la señalización adecuada, se ha aislado el área para evitar que personal que está trabajando o ajeno al trabajo sufra o provoque un incidente?			X	
8. ¿Los trabajadores están adecuadamente capacitados, entrenados y protegidos?	X			
9. ¿El sistema de descenso esta en buenas condiciones)			X	
10. ¿Se cuenta con condiciones de clima favorables.?	X			
11. ¿Se encuentra bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva (alcohol o drogas)?		X		
12. ¿Se verifico que el acceso al lugar de trabajo es el adecuado? ¿Cuál?	X			
13. ¿El empleado esta afiliado a seguridad social (ARL,AFP,EPS,CCF)?	X			

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN ALTURAS	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
13. ¿Se ha revisado el estado de los arneses, anclajes, eslingas, anillos D y los remaches de metal?	X			
14. ¿Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible.	X			
15. ¿El material de los equipos de seguridad (arnés, cuerda, eslinga, mosquetones, anclajes, etc.) son normalizados para la ejecución en el área de trabajo?	X			
16. ¿Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas (mínimo 60 cm.)?			X	
17. ¿Hay un trabajador asegurado por cada línea de vida vertical?			X	
18. ¿Se utilizan puntos de anclaje adecuados (resistencia mínima de 5000lb, sitios fijos o bandas de amarre)?	X			
19. ¿Se aisló equipos y materiales de proceso contra posibles daños, cortes a bordes ?	X			
20. ¿se verifico que la silla se encuentra bien instalada?			X	
21. ¿Los andamios están en buenas condiciones.?			X	

4. VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"						
NO	EQUIPO	CHEQUEO	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1	Arnés, inspección general.	Buen estado	X			
2	Arnés, Correas o reatas	Buen estado	X			
		Sin fibras descosidas	X			
		Limpio	X			
		Sin pintura de ninguna clase	X			
3	Arnés, Ganchos, argollas y hebillas	En buen estado	X			
		Abre y cierra adecuadamente	X			

Powered by CamScanner

4	Eslinga con absorbedor de choque	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
5	Eslinga de posicionamiento	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
6	Línea de vida	En buen estado	X			
		Cuerdas y trenzado en extremos en buen estado	X			
		La linea de vida esta certificada	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
7	Puntos de anclaje	Adecuados	X			
		Resistentes	X			
		Sin deterioro	X			
8	Etiquetas de equipos	Legibles	X			
		Ha cumplido su vida útil		X		
9	Seguridad del equipo	Ha detenido caídas		X		
		Se revisó después de la caída				
10	Uso correcto del equipo	Todo el personal sabe utilizar adecuadamente los Equipos	X			
11	Uso adecuado de EPP	Todo el personal debe utilizar adecuadamente los Elementos de Proteccion Personal	X			
12	certificado medico apto para trabajos en alturas	Todo el personal ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional,aprobando su aptitud fisica	X			
13	Condiciones de Salud	Todo el personal esta en buenas condiciones de salud para la ejecucion de actividades	X			
14	Certificación de aptitud medica y de competencia (curso avanzado o reentrenamiento)	Todo el personal esta certificado en alturas y ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.	X			

5. ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO		CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿El acceso al lugar de trabajo esta libre y despejado ante cualquier emergencia?	X			
2	Andamios ¿Cuál?		X		
3	Escaleras ¿Cuál?	X			extensión, en A
4	Otros ¿Cuál?		X		

6. HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS A UTILIZAR

Pagina 3/3

Equipo de oxicorte, alicates, destornilladores, manilas

7. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

8. PERSONAL AUTORIZADO

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Fabian Gamboa	1057710755	
2	Carlos Guerrero	1020710295	Carlos Guerrero
3	Jose Ignacio.	80374715	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
Laura Camila Pinzón. 1020710265	Laura Camila Pinzón 1020710265

NOTA 1: Durante tormentas, lloviznа suave y/o vientos deberán suspender el trabajo y solicitar un nuevo permiso de trabajo al reanudar la labor.

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4 VERTICAL	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	CODIGO: SST
		Version: 01
		FECHA: 01-04-2020
VERTICAL DISEÑO		Pagina 1/3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO:	HORA DE INICIO:	FECHA DE FINALALIZACION:	HORA DE FINALIZACION:
07072025	7:00	070725	16:00

PROYECTO DE TRABAJO:	SITIO Y ALTURA DE TRABAJO
Bodega FAC cl 13	Cubierta Bodega y oficinas

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Desmonte de tejas, estructura metalica, vigas, y columnas superiores en muros, demolicion manual y mecanica

OBSERVACIONES:

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (SISTEMA DE GESTION INTEGRAL) MARQUE CON UNA EQUIS "X"

RIESGOS HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO					RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL		
	Por contaminación biológica				X	Caída de diferente nivel	
					X	Caídas al mismo nivel	
RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE						Derrames, Fugas	
					X	Atrapamientos	
Contaminación de:	Agua	Aire	Suelo			Riesgo publico	
Otros. ¿Cuál?					X	Quemaduras química o térmicas	

RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	
	Electrocución
X	Cortaduras o punzonamiento
X	Riesgos naturales
X	golpes, contusiones, fracturas
X	Lesiones osteomusculares
	riesgo quimico

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Sí	No	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Sé ha realizado una inspección previa al lugar donde se va ha ejecutar el trabajo?	X			
2. ¿El lugar de trabajo permanece en orden y aseo durante y después de realizar el trabajo, diariamente?	X			
3. ¿El trabajo se encuentra supervisado por el coordinador de la Empresa en forma permanente?	X			
4. ¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos al ejecutar el trabajo?	X			
5. ¿Se ha asignado por lo menos una persona que conozca los procedimientos de emergencia para vigilar y auxiliar el los trabajadores?	X			
6. ¿Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están disponibles para su uso y las salidas de evacuación?	X			
7. ¿Se ha colocado la señalización adecuada, se ha aislado el área para evitar que personal que esta trabajando o ajeno al trabajo sufra o provoque un incidente?	X			
8. ¿Los trabajadores están adecuadamente capacitados, entrenados y protegidos?	X			
9. ¿El sistema de descenso esta en buenas condiciones)			X	
10. ¿Se cuenta con condiciones de clima favorables.?	X			
11. ¿Se encuentra bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva (alcohol o drogas)?		X		
12. ¿Se verifico que el acceso al lugar de trabajo es el adecuado? ¿Cuál?	X			
13. ¿El empleado esta afiliado a seguridad social (ARL,AFP,EPS,CCF)?	X			

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN ALTURAS	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Sí	No	N/A	OBSERVACIONES
13. ¿Se ha revisado el estado de los arneses, anclajes, eslingas, anillos D y los remaches de metal?	X			
14. ¿Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible.	X			
15.¿El material de los equipos de seguridad (arnes, cuerda, eslinga, mosquetones, anclajes, etc.) son normalizados para la ejecución en el área de trabajo?	X			
16. ¿Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas (mínimo 60 cm.)?			X	
17. ¿Hay un trabajador asegurado por cada línea de vida vertical?	X			
18. ¿Se utilizan puntos de anclaje adecuados (resistencia mínima de 5000lb, sitios fijos o bandas de amarre)?	X			
19. ¿Se aisló equipos y materiales de proceso contra posibles daños, cortes a bordes ?	X			
20. ¿se verifico que la silla se encuentra bien instalada?			X	
21. ¿Los andamios están en buenas condiciones.?			X	

Powered by CamScanner

4. VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"						
No	EQUIPO	CHEQUEO	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1	Arnés, inspección general.	Buen estado	X			
2	Arnés, Correas o reatas	Buen estado	X			
		Sin fibras descosidas	X			
		Limpio	X			
		Sin pintura de ninguna clase	X			
3	Arnés, Ganchos, argollas y hebillas	En buen estado	X			
		Abre y cierra adecuadamente	X			
4	Eslinga con absorbedor de choque	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
5	Eslinga de posicionamiento	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
6	Línea de vida	En buen estado	X			
		Cuerdas y trenzado en extremos en buen estado	X			
		La linea de vida esta certificada	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
7	Puntos de anclaje	Adecuados	X			
		Resistentes	X			
		Sin deterioro	X			
8	Etiquetas de equipos	Legibles	X			
		Ha cumplido su vida útil		X		
9	Seguridad del equipo	Ha detenido caídas		X		
		Se revisó después de la caída			X	
10	Uso correcto del equipo	Todo el personal sabe utilizar adecuadamente los Equipos	X			
11	Uso adecuado de EPP	Todo el personal debe utilizar adecuadamente los Elementos de Proteccion Personal	X			
12	certificado medico apto para trabajos en alturas	Todo el personal ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.aprobando su aptitud fisica	X			
13	Condiciones de Salud	Todo el personal esta en buenas condiciones de salud para la ejecucion de actividades	X			
14	Certificación de aptitud medica y de competencia (curso avanzado o reentrenamiento)	Todo el personal esta certificado en alturas y ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.	X			

Powered by CamScanner

5. ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO		CRITERIO DE CALIFICACION			
	MARQUE CON UNA EQUIS "X"	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿El acceso al lugar de trabajo esta libre y despejado ante cualquier emergencia?	X			
2	Andamios ¿Cuál?			X	
3	Escaleras ¿Cuál?	X			
4	Otros ¿Cuál?				

6. HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS A UTILIZAR	Pagina 3/3
Equipo de oxicorte, almadanas, maceras, punteros.	

7. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

8. PERSONAL AUTORIZADO

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Carlos Guerrero	1070790295	Carlos Guerrero
2	Fabian Gamboa	1057710755	Fabian Gamboa
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

FIRMA Y NOMBRE (INSPECTOR SISO) Y/O COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
Laura Camila Pinzón 1070780265	Laura Camila Pinzón 1070780265

NOTA 1: Durante tormentas, lloviznas y/o vientos se deben suspender el trabajo y solicitar un nuevo permiso de trabajo al reanudar la labor.

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4 VERTICAL	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	CODIGO: SST
		Version: 01
		FECHA: 01-04-2020
VERTICAL DISEÑO		Pagina 1/3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO:	HORA DE INICIO:	FECHA DE FINALALIZACION:	HORA DE FINALIZACION:
08 julio 2025	7:00 am	08-07-25	16:00
PROYECTO DE TRABAJO:		**SITIO Y ALTURA DE TRABAJO**	
bodega FAC Cl 13		bodega principal	10 m
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:		**OBSERVACIONES:**	
Desmonte de tejas y estructura metalica (viga) y columnas superiores demolicion mecanica y manual			

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (SISTEMA DE GESTION INTEGRAL) MARQUE CON UNA EQUIS "X"

RIESGOS HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO					RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL			
Por contaminación biológica				X	Caída de diferente nivel		Electrocución	
RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE				X	Caídas al mismo nivel	X	Cortaduras o punzonamiento	
					Derrames, Fugas	X	Riesgos naturales	
				X	Atrapamientos	X	golpes, contusiones, fracturas	
Contaminación de:	Agua	Aire	Suelo		Riesgo publico	X	Lesiones osteomusculares	
Otros. ¿Cuál?				X	Quemaduras química o térmicas		riesgo quimico	

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Sé ha realizado una inspección previa al lugar donde se va ha ejecutar el trabajo?	✓			
2. ¿El lugar de trabajo permanece en orden y aseo durante y después de realizar el trabajo, diariamente?	✓			
3. ¿El trabajo se encuentra supervisado por el coordinador de la Empresa en forma permanente?	✓			
4. ¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos al ejecutar el trabajo?	✓			
5. ¿Se ha asignado por lo menos una persona que conozca los procedimientos de emergencia para vigilar y auxiliar en los trabajadores?	✓			
6. ¿Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están disponibles para su uso y las salidas de evacuación?	✓			
7. ¿Se ha colocado la señalización adecuada, se ha aislado el área para evitar que personal que está trabajando o ajeno al trabajo sufra o provoque un incidente?	✓			
8. ¿Los trabajadores están adecuadamente capacitados, entrenados y protegidos?	✓			
9. ¿El sistema de descanso esta en buenas condiciones)			✓	
10. ¿Se cuenta con condiciones de clima favorables.?	✓			
11. ¿Se encuentra bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva (alcohol o drogas)?		✓	✓	
12. ¿Se verifico que el acceso al lugar de trabajo es el adecuado? ¿Cuál?	✓			
13. ¿El empleado esta afiliado a seguridad social (ARL,AFP,EPS,CCF)?	✓			

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN ALTURAS	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
13. ¿Se ha revisado el estado de los arneses, anclajes, eslingas, anillos D y los remaches de metal?	✓			
14. ¿Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible.	✓			
15.¿El material de los equipos de seguridad (arnés, cuerda, eslinga, mosquetones, anclajes, etc.) son normalizados para la ejecución en el área de trabajo?	✓			
16. ¿Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas (mínimo 60 cm.)?			✓	
17. ¿Hay un trabajador asegurado por cada línea de vida vertical?	✓			
18. ¿Se utilizan puntos de anclaje adecuados (resistencia mínima de 5000lb, sitios fijos o bandas de amarre)?	✓			
19. ¿Se aisló equipos y materiales de proceso contra posibles daños, cortes a bordes ?	✓			
20. ¿se verifico que la silla se encuentra bien instalada?			✓	
21. ¿Los andamios están en buenas condiciones.?			✓	

4. VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"						
NO	EQUIPO	CHEQUEO	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1	Arnés, inspección general.	Buen estado	✓			
2	Arnés, Correas o reatas	Buen estado	✓			
		Sin fibras descosidas	✓			
		Limpio	✓			
		Sin pintura de ninguna clase	✓			
3	Arnés, Ganchos, argollas y hebillas	En buen estado	✓			
		Abre y cierra adecuadamente	✓			

Powered by CamScanner

4	Eslinga con absorbedor de choque	En buen estado	✓			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	✓			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	✓			
5	Eslinga de posicionamiento	En buen estado	✓			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	✓			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	✓			
6	Linea de vida	En buen estado	✓			
		Cuerdas y trenzado en extremos en buen estado	✓			
		La linea de vida esta certificada	✓			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	✓			
7	Puntos de anclaje	Adecuados	✓			
		Resistentes	✓			
		Sin deterioro	✓			
8	Etiquetas de equipos	Legibles	✓			
		Ha cumplido su vida útil	✓	✓		
9	Seguridad del equipo	Ha desenido caidas		✓		
		Se revisó después de la caída		✓		
10	Uso correcto del equipo	Todo el personal sabe utilizar adecuadamente los Equipos	✓			
11	Uso adecuado de EPP	Todo el personal debe utilizar adecuadamente los Elementos de Proteccion Personal	✓			
12	certificado medico apto para trabajos en alturas	Todo el personal ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.aprobando su aptitud fisica	✓			
13	Condiciones de Salud	Todo el personal esta en buenas condiciones de salud para la ejecucion de actividades	✓			
14	Certificación de aptitud medica y de competencia (curso avanzado o reentrenamiento)	Todo el personal esta certificado en alturas y ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.	✓			

5. ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO		CRITERIO DE CALIFICACION			
	MARQUE CON UNA EQUIS "X"	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿El acceso al lugar de trabajo esta libre y despejado ante cualquier emergencia?	✓			
2	Andamios ¿Cuál?		✓		
3	Escaleras ¿Cuál?		✓		
4	Otros ¿Cuál?				

6. HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS A UTILIZAR — Pagina 3/3

Equipo oxicorte, almadanas, alicates, machetas, pantero

7. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

8. PERSONAL AUTORIZADO

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Eslinga Cambial	1057710755	
2	Carlos Gutierrez	1020790098	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
laura Camila Pinzon	laura Camila Pinzon
1020780265	1020780265

NOTA 1| Durante tormentas, llovizna suave y/o vientos se deben suspender el trabajo y solicitar un nuevo permiso de trabajo al reanudar la labor.

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4 VERTICAL	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	CODIGO: SST
		Version: 01
		FECHA: 01-04-2020
VERTICAL DISEÑO		Pagina 1/3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO:	HORA DE INICIO:	FECHA DE FINALALIZACION:	HORA DE FINALIZACION:
09-07-25	7:00	09-07-25	16:30

PROYECTO DE TRABAJO: Bodega FAC CL 13

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Desmonte de cubierta, teja, estructura, demolicion manual

SITIO Y ALTURA DE TRABAJO Bodega fac 11mts

OBSERVACIONES:

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (SISTEMA DE GESTION INTEGRAL) MARQUE CON UNA EQUIS "X"

RIESGOS HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO		RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Por contaminación biológica	X	Caída de diferente nivel	Electrocución
	X	Caídas al mismo nivel	X Cortaduras o punzonamiento
RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE		Derrames, Fugas	X Riesgos naturales
		X Atrapamientos	X golpes, contusiones, fracturas
Contaminación de: Agua / Aire / Suelo		Riesgo publico	X Lesiones osteomusculares
Otros. ¿Cuál?	X	Quemaduras química o térmicas	riesgo quimico

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Se ha realizado una inspección previa al lugar donde se va ha ejecutar el trabajo?	X			
2. ¿El lugar de trabajo permanece en orden y aseo durante y después de realizar el trabajo, diariamente?	X			
3. ¿El trabajo se encuentra supervisado por el coordinador de la Empresa en forma permanente?	X			
4. ¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos al ejecutar el trabajo?	X			
5. ¿Se ha asignado por lo menos una persona que conozca los procedimientos de emergencia para vigilar y auxiliar el los trabajadores?	X			
6. ¿Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están disponibles para su uso y las salidas de evacuación?	X			
7. ¿Se ha colocado la señalización adecuada, se ha aislado el area para evitar que personal que esta trabajando o ajeno al trabajo sufra o provoque un incidente?	X			
8. ¿Los trabajadores están adecuadamente capacitados, entrenados y protegidos?	X			
9. ¿El sistema de descanso esta en buenas condiciones?			X	
10. ¿Se cuenta con condiciones de clima favorables.?	X			
11. ¿Se encuentra bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva (alcohol o drogas)?		X		
12. ¿Se verifico que el acceso al lugar de trabajo es el adecuado? ¿Cuál?	X			
13. ¿El empleado esta afiliado a seguridad social (ARL, AFP, EPS, CCF)?	X			

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN ALTURAS	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
13. ¿Se ha revisado el estado de los arneses, anclajes, eslingas, anillos D y los remaches de metal?	X			
14. ¿Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible.	X			
15.¿El material de los equipos de seguridad (arnés, cuerda, eslinga, mosquetones, anclajes, etc.) son normalizados para la ejecución en el área de trabajo?	X			
16. ¿Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas (mínimo 60 cm.)?			X	
17. ¿Hay un trabajador asegurado por cada línea de vida vertical?	X			
18. ¿Se utilizan puntos de anclaje adecuados (resistencia mínima de 5000lb, sitios fijos o bandas de amarre)?	X			
19. ¿Se aisló equipos y materiales de proceso contra posibles daños, cortes a bordes ?	X			
20. ¿se verifico que la silla se encuentra bien instalada?			X	
21. ¿Los andamios están en buenas condiciones.?			X	

4. VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"			Si	No	N/A	OBSERVACIONES
No	EQUIPO	CHEQUEO				
1	Arnés, inspección general.	Buen estado	X			
2	Arnés, Correas o reatas	Buen estado	X			
		Sin fibras desgastadas	X			
		Limpio	X			
		Sin pintura de ninguna clase	X			
3	Arnés, Ganchos, argollas y hebillas	En buen estado	X			
		Abre y cierra adecuadamente	X			

Powered by CamScanner

4	Eslinga con absorbedor de choque	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
5	Eslinga de posicionamiento	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
6	Línea de vida	En buen estado	X			
		Cuerdas y trenzado en extremos en buen estado	X			
		La linea de vida esta certificada	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
7	Puntos de anclaje	Adecuados	X			
		Resistentes	X			
		Sin deterioro	X			
8	Etiquetas de equipos	Legibles		X		
		Ha cumplido su vida útil		X		
9	Seguridad del equipo	Ha detenido caídas			X	
		Se revisó después de la caída			X	
10	Uso correcto del equipo	Todo el personal sabe utilizar adecuadamente los Equipos	X			
11	Uso adecuado de EPP	Todo el personal debe utilizar adecuadamente los Elementos de Proteccion Personal	X			
12	certificado medico apto para trabajos en alturas	Todo el personal ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.aprobando su aptitud fisica	X			
13	Condiciones de Salud	Todo el personal esta en buenas condiciones de salud para la ejecucion de actividades	X			
14	Certificación de aptitud medica y de competencia (curso avanzado o reentrenamiento)	Todo el personal esta certificado en alturas y ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.	X			

5. ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO		CRITERIO DE CALIFICACION			
	MARQUE CON UNA EQUIS "X"	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿El acceso al lugar de trabajo esta libre y despejado ante cualquier emergencia?	X			
2	Andamios ¿Cuál?			X	
3	Escaleras ¿Cuál?	X			Extensión
4	Otros ¿Cuál?		X		

6. HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS A UTILIZAR

Equipo oxicorte, porros, picas, maceta, punteros

7. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

8. PERSONAL AUTORIZADO

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Fabian Andres Gamba	1057710755	Fabian Gamba
2	Carlos Abel Guevara	1020790295	Carlos Guevara
3	Jose Ignacio Quayambuco	80394715	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
Laura Camila Pinzón 1020780265	Laura Camila Pinzón 1020780265

NOTA 1: Durante tormentas, lloviznа suave y vientos se deben suspender el trabajo y solicitar un nuevo permiso de trabajo al reanudar la labor.

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4 VERTICAL	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	CODIGO: SST
		Version: 01
		FECHA: 01-01-2020
VERTICAL DISEÑO		Pagina 1/3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO:	HORA DE INICIO:	FECHA DE FINALALIZACION:	HORA DE FINALIZACION:
10-07-2025	7:00AM	10-07-25	5:00pm

PROYECTO DE TRABAJO: Bodega FAC

SITIO Y ALTURA DE TRABAJO: Bodega principal 12m

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Desmonte y demolicion de cubierta.

OBSERVACIONES:

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (SISTEMA DE GESTION INTEGRAL) MARQUE CON UNA EQUIS "X"

RIESGOS HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO

Por contaminación biológica	

RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE

Contaminación de:	Agua	Aire	Suelo
Otros. ¿Cuál?			

RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

X	Caída de diferente nivel		Electrocución
X	Caídas al mismo nivel	X	Cortaduras o punzonamiento
X	Derrames, Fugas	X	Riesgos naturales
X	Atrapamientos	X	Golpes, contusiones, fracturas
	Riesgo publico	X	Lesiones osteomusculares
X	Quemaduras química o térmicas		riesgo químico

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

MARQUE CON UNA EQUIS "X"	CRITERIO DE CALIFICACION Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Sé ha realizado una inspección previa al lugar donde se va ha ejecutar el trabajo?	X			
2. ¿El lugar de trabajo permanece en orden y aseo durante y después de realizar el trabajo, diariamente?	X			
3. ¿El trabajo se encuentra supervisado por el coordinador de la Empresa en forma permanente?	X			
4. ¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos al ejecutar el trabajo?	X			
5. ¿Se ha asignado por lo menos una persona que conozca los procedimientos de emergencia para vigilar y auxiliar en los trabajadores?	X			
6. ¿Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están disponibles para su uso y las salidas de evacuación?	X			
7. ¿Se ha colocado la señalización adecuada, se ha aislado el area para evitar que personal que esta trabajando o ajeno al trabajo sufra o provoque un incidente?	X			
8. ¿Los trabajadores están adecuadamente capacitados, entrenados y protegidos?	X			
9. ¿El sistema de descanso esta en buenas condiciones)			X	
10. ¿Se cuenta con condiciones de clima favorables.?	X			
11. ¿Se encuentra bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva (alcohol o drogas)?		X		
12. ¿Se verifico que el acceso al lugar de trabajo es el adecuado? ¿Cuál?	X			
13. ¿El empleado esta afiliado a seguridad social (ARL, AFP, EPS, CCF)?	X			

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN ALTURAS

MARQUE CON UNA EQUIS "X"	CRITERIO DE CALIFICACION Si	No	N/A	OBSERVACIONES
13. ¿Se ha revisado el estado de los arneses, anclajes, eslingas, anillos D y los remaches de metal?	X			
14. ¿Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible.	X			
15.¿El material de los equipos de seguridad (arnes, cuerda, eslinga, mosquetones, anclajes, etc.) son homologados para la ejecución en el área de trabajo?	X			
16. ¿Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas (mínimo 60 cm.)?			X	
17. ¿Hay un trabajador asegurado por cada línea de vida vertical?	X			
18. ¿Se utilizan puntos de anclaje adecuados (resistencia mínima de 5000lb, sitios fijos o bandas de amarre)?	X			
19. ¿Se aisló equipos y materiales de proceso contra posibles daños, cortes a bordes ?	X			
20. ¿se verifico que la silla se encuentra bien instalada?			X	
21. ¿Los andamios están en buenas condiciones.?			X	

4. VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

MARQUE CON UNA EQUIS "X"			CRITERIO DE CALIFICACION Si	No	N/A	OBSERVACIONES
No	EQUIPO	CHEQUEO				
1	Arnés, inspección general.	Buen estado	X			
2	Arnés, Correas o reatas	Buen estado	X			
		Sin fibras descosidas	X			
		Limpio	X			
		Sin pintura de ninguna clase	X			
3	Arnés, Ganchos, argollas y hebillas	En buen estado	X			
		Abre y cierra adecuadamente	X			

Powered by CamScanner

4	Eslinga con absorbedor de choque	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
5	Eslinga de posicionamiento	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
6	Línea de vida	En buen estado	X			
		Cuerdas y trenzado en extremos en buen estado	X			
		La línea de vida esta certificada	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
7	Puntos de anclaje	Adecuados	X			
		Resistentes	X			
		Sin deterioro	X			
8	Etiquetas de equipos	Legibles	X			
		Ha cumplido su vida útil		X		
9	Seguridad del equipo	Ha detenido caídas		X		
		Se revisó después de la caída			X	
10	Uso correcto del equipo	Todo el personal sabe utilizar adecuadamente los Equipos	X			
11	Uso adecuado de EPP	Todo el personal debe utilizar adecuadamente los Elementos de Proteccion Personal	X			
12	certificado medico apto para trabajos en alturas	Todo el personal ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.aprobando su aptitud fisica	X			
13	Condiciones de Salud	Todo el personal esta en buenas condiciones de salud para la ejecucion de actividades	X			
14	Certificación de aptitud medica y de competencia (curso avanzado o reentrenamiento)	Todo el personal esta certificado en alturas y ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.	X			

5. ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO		CRITERIO DE CALIFICACION			
	MARQUE CON UNA EQUIS "X"	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿El acceso al lugar de trabajo esta libre y despejado ante cualquier emergencia?		X		
2	Andamios ¿Cuál?		X		
3	Escaleras ¿Cuál?	X			Extensión
4	Otros ¿Cuál?				

6. HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS A UTILIZAR — Pagina 3/3

7. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

8. PERSONAL AUTORIZADO

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Fabian Gamboa	1057710755	Fabian Gamboa
2	Jose Guayambuco	80394715	
3	Carlos Guevara	1020790295	
4	Ignacio Gm	80394/5	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
Laura Camila Pinzon 1020790265	Laura Camila Pinzon 1020790265

NOTA 1: Durante tormentas, llovizna suave y/o vientos se deben suspender el trabajo y solicitar un nuevo permiso de trabajo al reanudar la labor.

Powered by CamScanner

NIT:900246243-4 Vertical	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	CODIGO: SST
		Version: 01
	VERTICAL DISEÑO	FECHA: 01 01 2020
		Página 1/3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO:	HORA DE INICIO:	FECHA DE FINALALIZACION:	HORA DE FINALIZACION:
10-07-23	7:00 am	10-07-23	3:00 PM

PROYECTO DE TRABAJO: Bodega FAC

SITIO Y ALTURA DE TRABAJO: Bodega principal 12m

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Desmonte y demolicion de cubierta.

OBSERVACIONES:

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (SISTEMA DE GESTION INTEGRAL) MARQUE CON UNA EQUIS "X"

RIESGOS HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO				RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL			
Por contaminación biológica				X	Caída de diferente nivel		Electrocución
				X	Caídas al mismo nivel	X	Contusiones o aplastamiento
RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE				X	Derrames, Fugas	X	Riesgos naturales
				X	Atrapamientos	X	golpes, contusiones, fracturas
Contaminación de:	Agua	Aire	Suelo		Riesgo publico	X	Lesiones osteomusculares
Otros. ¿Cuál?				X	Quemaduras químicas o térmicas		riesgo químico

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Se ha realizado una inspección previa al lugar donde se va ha ejecutar el trabajo?	X			
2. ¿El lugar de trabajo permanece en orden y aseo durante y después de realizar el trabajo, diariamente?	X			
3. ¿El trabajo se encuentra supervisado por el coordinador de la Empresa en forma permanente?	X			
4. ¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos al ejecutar el trabajo?	X			
5. ¿Se ha asignado por lo menos una persona que conozca los procedimientos de emergencia para vigilar y auxiliar a los trabajadores?	X			
6. ¿Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están disponibles para su uso y las salidas de evacuación?	X			
7. ¿Se ha colocado la señalización adecuada, se ha aislado el área para evitar que personal que está trabajando o ajeno al trabajo sufra o provoque un incidente?	X			
8. ¿Los trabajadores están adecuadamente capacitados, entrenados y protegidos?	X			
9. ¿El sistema de descanso esta en buenas condiciones)			X	
10. ¿Se cuenta con condiciones de clima favorables.?	X			
11. ¿Se encuentra bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva (alcohol o drogas)?		X		
12. ¿Se verifico que el acceso al lugar de trabajo es el adecuado? ¿Cuál?	X			
13. ¿El empleado esta afiliado a seguridad social (ARL, AFP,EPS,CCF)?	X			

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN ALTURAS	CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
13. ¿Se ha revisado el estado de los arneses, anclajes, eslingas, anillos D y los remaches de metal?	X			
14. ¿Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible.	X			
15. ¿El material de los equipos de seguridad (arnés, cuerda, eslinga, mosquetones, anclajes, etc.) son homologados para la ejecución en el área de trabajo?	X			
16. ¿Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, amarre y completa seguridad de las tablas (mínimo 60 cm)?			X	
17. ¿Hay un trabajador asegurado por cada línea de vida vertical?	X			
18. ¿Se utilizan puntos de anclaje adecuados (resistencia mínima de 5000#, sobre filos o bordes de amarre)?	X			
19. ¿Se aisló equipos y materiales de proceso contra posibles daños, cortes a bordes ?			X	
20. ¿se verifico que la silla se encuentra bien instalada?			X	
21. ¿Los andamios están en buenas condiciones.?				

4. VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			CRITERIO DE CALIFICACION			
MARQUE CON UNA EQUIS "X"			Si	No	N/A	OBSERVACIONES
No	EQUIPO	CHEQUEO				
1	Arnés, inspección general.	Buen estado	X			
2	Arnés, Correas o reatas	Buen estado	X			
		Sin fibras descosidas	X			
		Limpio	X			
		Sin pintura de ninguna clase	X			
3	Arnés, Ganchos, argollas y hebillas	En buen estado	X			
		Abre y cierra adecuadamente				

Powered by CamScanner

4	Eslinga con absorbedor de choque	En buen estado				
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
5	Eslinga de posicionamiento	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
6	Linea de vida	En buen estado	X			
		Cuerdas y trenzado en extremos en buen estado	X			
		La linea de vida esta certificada	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
7	Puntos de anclaje	Adecuados	X			
		Resistentes	X			
		Sin deterioro	X			
8	Etiquetas de equipos	Legibles	X			
		Ha cumplido su vida útil	X			
9	Seguridad del equipo	Ha detenido caidas	X			
		Se revisó después de la caída		X		
10	Uso correcto del equipo	Todo el personal sabe utilizar adecuadamente los Equipos	X			
11	Uso adecuado de EPP	Todo el personal debe utilizar adecuadamente los Elementos de Proteccion Personal	X			
12	certificado medico apto para trabajos en alturas	Todo el personal ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.aprobando su aptitud fisica	X			
13	Condiciones de Salud	Todo el personal esta en buenas condiciones de salud para la ejecucion de actividades	X			
14	Certificación de aptitud medica y de competencia (curso avanzado o reentrenamiento)	Todo el personal esta certificado en alturas y ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.	X			

5. ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO		CRITERIO DE CALIFICACION			
	MARQUE CON UNA EQUIS "X"	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿El acceso al lugar de trabajo esta libre y despejado ante cualquier emergencia?	X			
2	Andamios ¿Cuál?		X		
3	Escaleras ¿Cuál?		X		
4	Otros ¿Cual?				

6. HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS A UTILIZAR

Equipos de oxicorte, polidora, porros, alicates

7. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

8. PERSONAL AUTORIZADO

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Carlos Guerrero	1020790295	Carlos Guerrero
2	Fabian Gambal	1057410755	
3	Jose Ignacio Guayambuco	80394715	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
Laura Pinzon 1070790265	Laura Pinzon 1070790265

NOTA 1: Durante tormentas, lluvias o vientos fuertes se deben suspender el trabajo y solicitar un nuevo permiso de trabajo al reanudar la labor.

Powered by CamScanner

NIT:900246743-4	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	CODIGO: 557
		Version: 01
		FECHA: 01 04 2020
	VERTICAL DISEÑO	Pagina 1/3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO:	HORA DE INICIO:	FECHA DE FINALALIZACION:	HORA DE FINALIZACION:
15-07-25	7:00 am	15-07-25	5:00 pm

PROYECTO DE TRABAJO:	SITIO Y ALTURA DE TRABAJO
Bodega FAC	Bodega principal 12m
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:	
Corte manual muros perimetrales.	OBSERVACIONES:
Demolicion mecanica.	

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (SISTEMA DE GESTION INTEGRAL) MARQUE CON UNA EQUIS "X"

RIESGOS HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO		RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL			
Por contaminación biológica		X	Caída de diferente nivel		Electrocución
		X	Caídas al mismo nivel	X	Cortaduras o punzamiento
RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE			Derrames, Fugas	X	Riesgos naturales
		X	Atrapamientos	X	golpes, contusiones, fracturas
Contaminación de: Agua / Aire / Suelo			Riesgo público	X	Lesiones osteomusculares
Otros, ¿Cuál?			Quemaduras química o térmicas		riesgo químico

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES MARQUE CON UNA EQUIS "X"	CRITERIO DE CALIFICACION			
	SI	No	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Se ha realizado una inspección previa al lugar donde se va ha ejecutar el trabajo?	X			
2. ¿El lugar de trabajo permanece en orden y aseo durante y después de realizar el trabajo, diariamente?	X			
3. ¿El trabajo se encuentra supervisado por el coordinador de la Empresa en forma permanente?	X			
4. ¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos al ejecutar el trabajo?	X			
5. ¿Se ha asignado por lo menos una persona que conozca los procedimientos de emergencia para vigilar y auxiliar en los trabajadores?	X			
6. ¿Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están disponibles para su uso y las salidas de evacuación?	X			
7. ¿Se ha colocado la señalización adecuada, se ha aislado el área para evitar que personal que esta trabajando o cerca al trabajo sufra o provoque un accidente?	X			
8. ¿Los trabajadores están adecuadamente capacitados, entrenados y protegidos?	X			
9. ¿El sistema de desagüe esta en buenas condiciones)			X	
10. ¿Se cuenta con condiciones de clima favorables.?	X			
11. ¿Se encuentra bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva (alcohol o drogas)?		X		
12. ¿Se verifico que el acceso al lugar de trabajo es el adecuado? ¿Cuál?	X			Calle angosta
13. ¿El empleado esta afiliado a seguridad social (ARL,AFP,EPS,CCF)?	X			

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN ALTURAS MARQUE CON UNA EQUIS "X"	CRITERIO DE CALIFICACION			
	SI	No	N/A	OBSERVACIONES
13. ¿Se ha revisado el estado de los arneses, anclajes, eslingas, anillos D y los remaches de rivetal?	X			
14. ¿Las eslingas usadas como dispositivos restrictivos mantienen su longitud lo mas corta posible	X			
15. ¿El material de los equipos de seguridad (arnés, cuerda, eslinga, mosquetones, anclajes, etc.) son homologados para la ejecución en el área de trabajo?	X			
16. ¿Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas (mínimo 60 cm.)?			X	
17. ¿Hay un trabajador asegurado por cada línea de vida vertical?	X			
18. ¿Se utilizan puntos de anclaje adecuados (resistencia mínima de 5000lb. sitios fijos o tuercas de acuerdo)?	X			
19. ¿Se usó equipos y materiales de proceso contra posibles daños, cortes o bordes ?	X			
20. ¿se verifico que la silla se encuentra bien instalada?			X	
21. ¿Los andamios están en buenas condiciones ?			X	

4. VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA CAIDAS MARQUE CON UNA EQUIS "X"			CRITERIO DE CALIFICACION			
NO	EQUIPO	CHEQUEO	SI	No	N/A	OBSERVACIONES
1	Arnés, inspección general	Buen estado	X			
2	Arnés, Correas o reatas	Buen estado	X			
		Sin fibras descocidas	X			
		Limpio	X			
		Sin pintura de ninguna clase	X			
3	Arnés, Ganchos, argollas y hebillas	En buen estado	X			
		Abre y cierra adecuadamente	X			

Powered by CamScanner

4	Eslinga con absorbedor de choque	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
5	Eslinga de posicionamiento	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
6	Línea de vida	En buen estado	X			
		Cuerdas y trenzado en extremos en buen estado	X			
		La línea de vida está certificada	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
7	Puntos de anclaje	Alineados	X			
		Resistentes	X			
		Sin deterioro	X			
8	Etiquetas de equipos	Legibles	X			
		Ha cumplido su vida útil		X		
9	Seguridad del equipo	Ha detenido caídas		X		
		Se revisó después de la caída			X	
10	Uso correcto del equipo	Todo el personal sabe utilizar adecuadamente los Equipos	X			
11	Uso adecuado de EPP	Todo el personal debe utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal	X			
12	certificado medico apto para trabajo en alturas	Todo el personal ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional,aprobando su actitud física	X			
13	Condiciones de Salud	Todo el personal esta en buenas condiciones de salud para la ejecucion de actividades	X			
14	Certificación de aptitud medica y de competencia (curso avanzado o reentrenamiento)	Todo el personal esta certificado en alturas y ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.	X			

5. ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO		CRITERIO DE CALIFICACION			
	MARQUE CON UNA EQUIS "X"	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿El acceso al lugar de trabajo esta libre y despejado ante cualquier emergencia?	X			
2	Andamios ¿Cuál?		X		
3	Escaleras ¿Cuál?		X		
4	Otros ¿Cuál?	X			Cerca cercana

6. HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS A UTILIZAR	Página 3/3
Excavadora, taladro percutor, picas, palas, equipo oxicorte	

7. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

8. PERSONAL AUTORIZADO

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Carlos Guerrero	1020470295	Carlos Guerrero
2	Fabian Romero	1057107754	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
Laura Pinzon 1020780243	Laura Camila Pinzon 1020780243

NOTA 1: Durante Jornadas, durante cuyo [illegible] trabajo y cuando se hallen alturas de trabajo a realizar a tarea.

Powered by CamScanner

NIT:900246743-4 VERTICAL DISEÑO	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	CODIGO: SST Version: 01 FECHA: 01 01 2020 Pagina 1/3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO:	HORA DE INICIO:	FECHA DE FINALALIZACION:	HORA DE FINALIZACION:
14-07-2025	7:00am	14-07-2025	5:00pm

PROYECTO DE TRABAJO:	SITIO Y ALTURA DE TRABAJO
Bodega FAC	Bodega principal 12m
DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:	
Corte manual y mecanico muros perimetrales.	OBSERVACIONES:

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (SISTEMA DE GESTION INTEGRAL) MARQUE CON UNA EQUIS "X"

RIESGOS HACIA LA CALIDAD DEL PRODUCTO		RIESGOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL			
Por contaminación biológica		X	Caída de diferente nivel		Electrocución
		X	Caídas al mismo nivel	X	Cortaduras o punzonamiento
RIESGOS HACIA EL MEDIO AMBIENTE			Derrames, Fugas	X	Riesgos naturales
		X	Atrapamientos	X	golpes, contusiones, fracturas
Contaminación de:	Agua / Aire / Suelo		Riesgo publico	X	Lesiones osteomusculares
Otros. ¿Cuál?		X	Quemaduras química o térmicas		riesgo químico

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES MARQUE CON UNA EQUIS "X"	CRITERIO DE CALIFICACION			
	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Se ha realizado una inspección previa al lugar donde se va ha ejecutar el trabajo?	X			
2. ¿El lugar de trabajo permanece en orden y aseo durante y después de realizar el trabajo, diariamente?	X			
3. ¿El trabajo se encuentra supervisado por el coordinador de la Empresa en forma permanente?	X			
4. ¿Los trabajadores conocen los peligros y riesgos a los cuales están expuestos al ejecutar el trabajo?	X			
5. ¿Se ha asignado por lo menos una persona que conozca los procedimientos de emergencia para vigilar y auxiliar ci los trabajadores?	X			
6. ¿Se han identificado, ubicado los equipos de emergencia y están disponibles para su uso y las salidas de evacuación?	X			
7. ¿Se ha colocado la señalización adecuada, se ha aislado el área para evitar que personal que esta trabajando o ajeno al trabajo sufra o provoque un incidente?	X			
8. ¿Los trabajadores están adecuadamente capacitados, entrenados y protegidos?	X			
9. ¿El sofeno de descenso esta en buenas condiciones)			X	
10. ¿Se cuenta con condiciones de clima favorables.?	X			
11. ¿Se encuentra bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva (alcohol o drogas)?		X		
12. ¿Se verifico que el acceso al lugar de trabajo es el adecuado? ¿Cuál?	X			
13. ¿El empleado esta afiliado a seguridad social (ARL,AFP,EPS,CCF)?	X			

3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN ALTURAS MARQUE CON UNA EQUIS "X"	CRITERIO DE CALIFICACION			
	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
13. ¿Se ha revisado el estado de los arneses, anclajes, eslingas, anillos D y los remaches de metal?	X			
14. ¿Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible.	X			
15.¿El material de los equipos de seguridad (arnes, cuerda, eslinga, mosquetones, anclajes, etc.) son normalizados para la ejecución en el área de trabajo?	X			
16. ¿Se verifico el armado de los andamios, la resistencia, amarre y cantidad requerida de las tablas (mínimo 60 cm)?			X	
17. ¿Hay un trabajador asegurado por cada línea de vida vertical?	X			
18. ¿Se utilizan puntos de anclaje adecuados (resistencia mínima de 5000lb, sitios fijos o bandas de amarre)?	X			
19. ¿Se aisló equipos y materiales de proceso contra posibles daños, cortes a bordes ?	X			
20. ¿Se verifico que la silla se encuentra bien instalada?			X	
21. ¿Los andamios están en buenas condiciones ?			X	

4. VERIFICACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CONTRA CAIDAS MARQUE CON UNA EQUIS "X"			CRITERIO DE CALIFICACION			
No	EQUIPO	CHEQUEO	Si	No	N/A	OBSERVACIONES
1	Arnés, inspección general.	Buen estado	X			
2	Arnés, Correas o riatas	Buen estado	X			
		Sin fibras descosidas	X			
		Limpio	X			
		Sin pintura de ninguna clase	X			
3	Arnés, Ganchos, argollas y hebillas	En buen estado	X			
		Abre y cierra adecuadamente	X			

Powered by CamScanner

4	Eslinga con absorbedor de choque	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
5	Eslinga de posicionamiento	En buen estado	X			
		Correas o cuerdas y costuras en buen estado	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
6	Linea de vida	En buen estado	X			
		Cuerdas y trenzado en extremos en buen estado	X			
		La linea de vida esta certificada	X			
		Ganchos cierran y abren adecuadamente	X			
7	Puntos de anclaje	Adecuados	X			
		Resistentes	X			
		Sin deterioro	X			
8	Etiquetas de equipos	Legibles	X			
		Ha cumplido su vida útil		X		
9	Seguridad del equipo	Ha detenido caidas		X		
		Se revisó después de la caída			X	
10	Uso correcto del equipo	Todo el personal sabe utilizar adecuadamente los Equipos	X			
11	Uso adecuado de EPP	Todo el personal debe utilizar adecuadamente los Elementos de Proteccion Personal	X			
12	certificado medico apto para trabajos en alturas	Todo el personal ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional,aprobando su aptitud fisica	X			
13	Condiciones de Salud	Todo el personal esta en buenas condiciones de salud para la ejecucion de actividades	X			
14	Certificación de aptitud medica y de competencia (curso avanzado o reentrenamiento)	Todo el personal esta certificado en alturas y ha sido evaluado por medico con licencia en Salud Ocupacional.	X			

5. ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO		CRITERIO DE CALIFICACION			
	MARQUE CON UNA EQUIS "X"	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	¿El acceso al lugar de trabajo esta libre y despejado ante cualquier emergencia?	X			
2	Andamios ¿Cuál?		X		
3	Escaleras ¿Cuál? Ei	X			En A
4	Otros ¿Cuál?				

6. HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS A UTILIZAR — Pagina 3/3

Demoledor electrico, equipo de oxicorte, almadanas.

7. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

8. PERSONAL AUTORIZADO

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Carlos Guevara.	1020790645	Carlos Guevara
2	Fabian Garnica	1037710755	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
Laura Camila Pinzon 1020780265	Laura Camila Pinzon 1020780265

NOTA 1: Cualquier condición, hallazgo o incidente que ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores debe suspender el trabajo y solicitar un nuevo permiso de trabajo al reanudar la labor.

Powered by CamScanner

VERTICAL	PERMISO DE TRABAJO CON OXICORTE	F-SST-036 Versión 03 10/04/2025

PERMISO VALIDO	DESDE	01-07-25	HASTA	05/07/25

RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Proyecto	Bodega FAC	Actividad a ejecutar	Corte estructura

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Corte de estructura metalica y tejas en lamina

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A EMPLEAR EN LA LABOR

Equipo de oxicorte.

Condiciones de Seguridad Generales y Elementos de Protección Personal

El personal sabe que hacer en caso de emergencia	X		El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	X		Casco con barbuquejo	X		Protección Auditiva	X	
Exámenes médicos	X		Se le ha informado al jefe de área y a la persona del SST del la actividad a realizar	X		Guantes de cuero	X		Overol de trabajo	X	
El personal esta capacitado para la actividad	X		El pago de Seguridad Social esta Vigente	X		Gafas con filtro	X				
El personal cuenta con buenas condiciones de salud para ejecutar las actividades.	X		Cuenta con una Persona de Apoyo en el Lugar de la Actividad	X		Proteccion Respiratoria	X				
Los elementos de protección personal son acordes a la actividad a realizar	X		Se ha delimitado y aislado el área de trabajo	X		Botas con punta de seguridad	X				

Condiciones de seguridad

N°	Equipos y Herramientas	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Cilindros de oxigeno y acetileno en buen estado, sin fugas ni abolladuras.	X			X			X			X			X			X		
2	Manometros funcionales y calibrados.	X			X			X			X			X			X		
3	El trabajador identifica y aleja la presencia de material combustible en el lugar de trabajo antes de iniciar la labor#			X			X			X			X			X		X
4	Mangueras en buen estado, sin grietas, cortes, ni conexiones flojas.	X			X			X			X			X			X		
5	Soplete limpio y operativo, con válvulas que funcionan correctamente.	X			X			X			X			X			X		
6	En caso de emergencia cuenta con los elementos apropiados para extinguir el fuego (Extintores en buen estado y fecha de recarga vigente)	X			X			X			X			X			X		

Condiciones de areas de trabajo

N°	Criterio	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Espacio libre de materiales inflamables o combustibles.	X			X			X			X			X			X		
2	Buena ventilación para evitar acumulación de gases.	X			X			X			X			X			X		
3	Señalización visible de "Trabajo con fuego" o "Peligro: Oxicorte en proceso".		X			X				X			X			X			X
4	Iluminación adecuada.	X			X			X			X			X			X		

VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Se ha verificado por parte del personal que firma a continuación diariamente las condiciones en el sitio de trabajo garantizando la existencia de los controles de seguridad en el personal y operacionales que se deben considerar para la autorización del permiso de trabajo

Este permiso de trabajo tiene una validez semanal	VALIDO			Desde / Hasta		QUIEN AUTORIZA		QUIEN SUPERVISA (SST)	
						NOMBRE / FIRMA	CC	NOMBRE / FIRMA	CC
LUNES									
MARTES	01	07	25	9:00	14:30	Laura Pinzon	1020780265	Laura Pinzon	1020780265
MIÉRCOLES	02	07	25	7:00	16:00	Laura Pinzón	1020780265	Laura Pinzon	1020780265
JUEVES	03	07	25	7:00	16:30	Laura Pinzón	1020780265	Laura Pinzón	1020780265
VIERNES	04	07	25	7:00	16:30	Laura Pinzón	1020780265	Laura Pinzón	1020780265.
SÁBADO	05	07	25	7:00	16:00	Laura Pinzón	[illegible]	Laura Pinzon	1020780265

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

¿El trabajo se finalizo? SI ____ NO X

¿Se entrega el área en buenas condiciones de seguridad? SI X NO ____

¿Queda cerrado definitivamente este permiso de trabajo? SI X NO ____

FECHA DE CIERRE: 05-07-25

HORA: 16:00

NOMBRE / FIRMA / CC / SUPERVISA: Laura Pinzon CC 1020780265

NOMBRE / FIRMA / CC / AUTORIZA: Laura Pinzon CC 1020780265

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

1. Fabian Gamboa	[illegible]	[illegible]	
2. [illegible]	[illegible]	[illegible]	
3. [illegible]	[illegible]	[illegible]	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Powered by CamScanner

VERTICAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: SST VERSION:1 FECHA:18/09/2023

Lugar:	Bodega 7 AC 13	Frente de trabajo:	Bodega 1y Cubierta oficinas
Actividad a realizar	Desmonte estructuacubierta		

		DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Fecha	01 07			02 07			03 07			04 07			05 07								
	Hora de inicio de la tarea	7:00			7:00			7:00			7:00			7:00								
	Hora de terminación de la tarea	16:30			16:30			16:30			17:00			16:30								
	ITEM GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Requerimientos Humanos	Hay mínimo 2 trabajadores en la actividad, uno de ellos vigía/auxiliar?	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores tienen sus aportes de Seguridad Social Vigente (EPS - ARL - AFP).?	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores manifiestan estar en buenas condiciones de salud para ejecutar la actividad	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores cuentan con la constancia de capacitación o certificación de competencia para el trabajo de soldador	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores cuentan capacitación o para el manejo de extintores	X			X			X			X			X								
	Se socializó a los trabajadores los riesgos de la actividad mediante el ATS?	X			X			X			X			X								
	Las personas encargadas de ejecutar la labor han recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	X			X			X			X			X								
	El personal sabe como actuar en caso de emergencia.	X			X			X			X			X								
EPP	Los trabajadores, tienen los elementos de Protección Personal requeridos para la actividad, conforme a la matriz de EPP. El soldador debe contar con el equipo de protección personal específico para su labor que incluye careta para soldar, guantes de carnaza largos, tapones auditivos, protector respiratorio para humos, botas de seguridad, pechera y mangas para soldar, etc.	X			X			X			X			X								
	La ropa de trabajo del personal encargado debe estar libre de cualquier sustancia o químico "grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable" de igual manera la dotación debe estar libre de humedad	X			X			X			X			X								
	Los elementos de Protección Personal requeridos para la actividad, están en buen estado.	X			X			X			X			X								
Señalización	El área donde se realicen el trabajo en caliente esta delimitada.			X			X			X			X			X						
	Se tiene en el área, mecanismo de advertencia del riesgo?.		X			X			X			X			X								
	Se han instalado mamparas para protegar y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas			X			X			X			X			X						
Herramientas y equipos	Se ha diligenciado el preoperacional de los equipos a utilizar?	X			X			X			X			X								
	Se ha inspeccionado todo el equipo y herramienta a utilizar?	X			X			X			X			X								
	Los equipos a utilizar tienen sus cables, protectores (espiral) y conexiones en buen estado.	X			X			X			X			X								
	Verificar el estado de la pinza de la masa o portaelectrodo, Verificar el estado de los bornes (inversor)			X			X			X			X			X						
	Verificar el estado y funcionamiento del interruptor, antorcha y cuerpo del equipo			X			X			X			X			X						
	Verificar el estado y funcionamiento del alimentador			X			X			X			X			X						
	Verificar funcionamiento de potenciómetros (salida de voltaje)			X			X			X			X			X						
	Verificar el estado del conductor (positivo - negativo)			X			X			X			X			X						
	Los manómetros de los cilindros de gases comprimidos se encuentran en buenas condiciones y con etiquetas legibles	X			X			X			X			X								
	Las mangueras y reguladores de los equipos, están en buen estado y no presentan fugas.	X			X			X			X			X								
	Se verificó que el manómetro del cilindro antes de empezar con la boquilla cerrada marque cero.	X			X			X			X			X								
	Los cilindros son transportados en carro porta tanques, asegurados entre sí.	X			X			X			X			X								
	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, asegurados en su soporte.	X			X			X			X			X								
	Se cuenta con cables a tierra para los equipos de soldadura de arco eléctrica			X			X			X			X			X						
	Se verificó que el circuito de alimentación tenga la capacidad suficiente para conectar los equipos de soldadura o equipos de corte			X			X			X			X			X						
	Las pinzas sujetan adecuadamente los electrodos			X			X			X			X			X						
	Se dispone en el sitio del Extintor operativo del equipo			X			X			X			X			X						
	Comentr			X			X			X			X			X						
	Se cuenta con un interruptor cercano al área de trabajo			X			X			X			X			X						
	El equipo de corte cuenta con mango aislar y guarda de seguridad.			X			X			X			X			X						
	El disco corresponde a las especificaciones del equipo			X			X			X			X			X						
	El disco es acorde a la labor y al equipo que se va a utilizar			X			X			X			X			X						

Powered by CamScanner

FECHA: 18/09/2023

	Bodega FAC 13	Frente de trabajo:	Bodega 1 y cubierta aplicanas
Actividad a realizar	Desmonte estructura y cubierta		

		DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Fecha	0107			0207			0307			0407			0507								
	Hora de inicio de la tarea	700			700			700			700			700								
	Hora de terminación de la tarea	1600			1600			1630			1630			1600								
	ITEM GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Condiciones de seguridad	El sitio donde se ejecuta el trabajo esta libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables (min 15 m de distancia)	X			X			X			X			X								
	La condiciones de ventilación son adecuadas y no permiten la acumulación de gases (en caso de que no, aplicar lista de verificación de trabajo de espacio confinado)	X			X			X			X			X								
	Soldar en dirección favorable al viento (no contrario), para prevenir quemaduras y reducir exposición a humos y/o particulas			X			X			X			X			X						
	La condiciones de iluminación son adecuadas para la labor	X			X			X			X			X								
	Los trabajos de soldadura se realizan a una distancia segura de las redes eléctricas, instalaciones eléctricas o barras colectoras eléctricas (5.6 m en media tensión y 6.8 m en alta tensión).			X			X			X			X			X						
	Se han verificado los sistemas de protección contra incendios y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo. Materiales que se puedan ver deteriorados o dañados se deben cubrir o retirar del frente de trabajo.	X			X			X			X			X								
	Las mangueras que atraviesan vias deben estar protegidas con apoyos de paso con suficiente resistencia a la compresión			X			X			X			X			X						
	Las mangueras no deben tener contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o colgar sobre ellas chopas	X			X			X			X			X								
	Los trabajos de soldadura y corte se realizan sobre suelos libres de agua o humedad	X			X			X			X			X								
	Cualquier abertura tipo ranuras, juntas de construcción o dilatación estructurales, ventanas, tragaluces o claraboyas; están protegidas para evitar que particulas incandescentes puedan generar un fuego oculto			X			X			X			X			X						
Emergencias	Se cuenta con equipo para la atención de emergencias (botiquin, camilla)	X			X			X			X			X								
	Se dispone de los medios de comunicación necesarios para la oportuna atención de posibles emergencias	X			X			X			X			X								
	El sitio en donde se realizan los trabajos permite el acceso del equipo y los grupos de rescate.	X			X			X			X			X								
	Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona. (a menos de 10 m de distancia)	X			X			X			X			X								
Cierre del trabajo	El trabajo se terminó?		X			X			X						X								
	Se cerraron las válvulas de los cilindros después de terminar los trabajos ?	X			X			X						X								
	Los equipos quedan desconectados después de terminar los trabajos ?	X			X			X						X								
	El área quedó ordenada y limpia?	X			X			X						X								
	Se avisó al personal autorizado sobre la terminación de las actividades.	X			X			X						X								
Revisó	Nombre - Apellido	Laura Pinzon			Laura Pinzon			Laura Pinzon			Laura Pinzon			Laura Pinzon								
	Cargo	Coordinadora			Coordinadora			Coordinadora			Coordinadora			Coordinadora								
	Firma	LP			LP			LP			LP			LP								

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

VERTICAL	PERMISO DE TRABAJO CON OXICORTE	F-SST-036 Versión 03 10/04/2025

PERMISO VALIDO	DESDE	07-07-25	HASTA	12-07-25

RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Proyecto	Bodega FAC	Actividad a ejecutar	Corte estructura.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Corte y despiece estructura metalica bodegas, corte aceros estructurales.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A EMPLEAR EN LA LABOR

Equipos de oxicorte, picas, almadanas.

Condiciones de Seguridad Generales y Elementos de Protección Personal

El personal sabe cómo hacer en caso de emergencia	X	El personal conoce los riesgos a los cuales está expuesto	X	Casco con barbuquejo	X			Protección Auditiva	X	
Exámenes médicos	X	Se le ha informado al jefe de área y a la persona de SST de la actividad a realizar	X	Guantes de cuero	X			Overol de trabajo	X	
El personal está capacitado para la actividad	X	El pago de Seguridad Social está vigente	X	Gafas con filtro	X					
El personal cuenta con buenas condiciones de salud para ejecutar las actividades	X	Cuenta con una Persona de Apoyo en el Lugar de la Actividad	X	Protección Respiratoria	X					
Los elementos de protección personal son acordes a la actividad a realizar	X	Se ha delimitado y aislado el área de trabajo	X	Botas con punta de seguridad	X					

Condiciones de seguridad

N°	Equipos y Herramientas	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Cilindros de oxigeno y acetileno en buen estado, sin fugas ni abolladuras.	X			X			X			X			X					
2	Manómetros funcionales y calibrados.	X			X			X			X			X					
3	El trabajador identifica y aísla la presencia de material combustible en el lugar de trabajo antes de iniciar la labor?	X			X			X			X			X					
4	Mangueras en buen estado, sin grietas, cortes, ni conexiones flojas.	X			X			X			X			X					
5	Soplete limpio y operativo, con válvulas que funcionen correctamente.	X			X			X			X			X					
6	En caso de emergencia cuenta con los elementos apropiados para extinguir el fuego (Extintores en buen estado y fecha de recarga vigente)	X			X			X			X			X					

Condiciones de areas de trabajo

N°	Criterio	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Espacio libre de materiales inflamables o combustibles.	X			X			X			X			X					
2	Buena ventilación para evitar acumulación de gases.	X			X			X			X			X					
3	Señalización visible de "Trabajo con fuego" o "Peligro: Oxicorte en proceso".			X			X			X			X			X		
4	Iluminación adecuada.	X			X			X			X			X					

VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Se ha verificado por parte del personal que firma a continuación diariamente las condiciones en el sitio de trabajo garantizando la existencia de los controles de seguridad en el personal y operacionales que se deben considerar para la autorización del permiso de trabajo

Este permiso de trabajo tiene una validez semanal	VALIDO			Desde / Hasta		QUIEN AUTORIZA		QUIEN SUPERVISA (SST)	
						NOMBRE / FIRMA	CC	NOMBRE / FIRMA	CC
LUNES	07	07	25	7:00	16:30	Laura Pinzon	1020780265		1020780265
MARTES	08	07	25	700	1630	Laura Pinzon	1020780265		1020780265
MIÉRCOLES	09	07	25	700	1630	Laura Pinzon	1020780265		1020780265
JUEVES	10	07	25	700	1630	Laura Pinzón	1020780265		1020780265
VIERNES	11	07	25	700		Laura Pinzón	1020780265		1020780265
SÁBADO									

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

¿El trabajo se finalizó? SI X NO ___

¿Se entrega el área en buenas condiciones de seguridad? SI X NO ___

¿Queda cerrado definitivamente este permiso de trabajo? SI X NO ___

FECHA DE CIERRE: HORA: 11/07/25

NOMBRE / FIRMA / CC / SUPERVISA: Laura Pinzon

NOMBRE / FIRMA / CC / AUTORIZA:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONDICIÓN FÍSICA PARA EJECUTAR TRABAJO DE TAREAS CRITICAS

Señor (a) trabajador (a): Para establecer si tiene la condición física para ejecutar la labor de trabajo en caliente, usted debe tener en cuenta lo siguiente:

¿Toma actualmente algún medicamento que le produzca somnolencia, desconcentración o debilidad?
¿En los últimos días ha presentado algún malestar, dolor o mareo que pueda afectar su desempeño en las labores de tareas críticas?
¿Se siente en condiciones de salud física y mental para ejecutar trabajos el trabajo?
¿Ha consumido sustancias psicoactivas o alucinógenas o bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas, que pueda alterar su concentración o desempeño?
¿Ha dormido bien en los últimos días, especialmente la noche anterior?
¿Ha sufrido golpes, lesiones o contusiones en los últimos días que le hayan afectado los brazos, las piernas o la espalda y que le impida realizar normalmente su labor?

Si usted cumple los requisitos debe escribir en la casilla de "Tiene la condición física" con la palabra SI, de lo contrario usted no podrá ejecutar trabajo en caliente y debe reportarlo de inmediato al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Personal Involucrado en la labor			
Nombre y Apellido	Numero de Cedula	¿Tiene la condición física? SI/NO	Firma
1. Fabian Andres Gamba	1057[illegible]355	SI	Fabian Gamba
2. Carlos Guerrero Fajardo	1020[illegible]295	SI	x Carlos Guerrero
3. Luis Moreno	3[illegible]8082	SI	x Luis
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Powered by CamScanner

VERTICAL

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: SST
VERSION: 1
FECHA: 13/07/2023

Lugar: Bodega FAC | Frente de trabajo: Bodega principal

Actividad a realizar: Corte de estructura y aceros

		DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Fecha	07/07/23			08/07/23			09/07/23			10/07/23			11-07-23								
	Hora de inicio de la tarea	7:00			7:00			7:00			7:00			7:00								
	Hora de terminación de la tarea	16:30			16:30			16:30			16:30											
	ITEM GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Requerimientos Humanos	Hay médico / trabajadores en la actividad, uno de ellos capacitados?	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores tienen sus aportes de Seguridad Social Vigente (EPS - ARL - AFP)?	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores manifiestan estar en buenas condiciones de salud para ejecutar la actividad	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores cuentan con la constancia de capacitación o certificación de competencia para el trabajo de solicitud	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores cuentan capacitación o para el manejo de extintores	X			X			X			X			X								
	Se socializó a los trabajadores los riesgos de la actividad mediante el ATS?	X			X			X			X			X								
	Las personas encargadas de ejecutar la labor han recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	X			X			X			X			X								
	El personal sabe como actuar en caso de emergencia	X			X			X			X			X								
EPP	Los trabajadores, tienen los elementos de Protección Personal requeridos para la actividad, conforme a la matriz de EPP. El soldador debe contar con el equipo de protección personal específico para su labor que incluye careta para soldar, guantes de carnaza largos, tapones auditivos, protector respiratorio para humos, botas de seguridad, peckera y mangas para soldar, etc.	X			X			X			X			X								
	La ropa de trabajo del personal encargado debe estar libre de cualquier sustancia o químico "grasa, aceites o cualquier otra sustancia inflamable" de igual manera la dotación debe estar libre de humedad	X			X			X			X			X								
	Los elementos de Protección Personal requeridos para la actividad, están en buen estado.	X			X			X			X			X								
Señalización	El área donde se realizan el trabajo en caliente esta delimitada.		X		X				X			X			X							
	Se tiene en el área, mecanismo de advertencia del riesgo?		X			X			X			X			X							
	Se han instalado biombos para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas		X			X			X			X			X							
Herramientas y equipos	Se ha diligenciado el preoperacional de los equipos a utilizar?	X			X			X			X			X								
	Se ha inspeccionado todo el equipo y herramienta a utilizar?	X			X			X			X			X								
	Los equipos a utilizar tienen sus cables, protectores (espiral) y conexiones en buen estado.	X					X			X			X			X						
	Verificar el estado de la pinza de la masa o portaelectrodo, verificar el estado de los bornes (internos)			X			X			X			X			X						
	Verificar el estado y funcionamiento del interruptor, antorcha y cuerpo del equipo			X			X			X			X			X						
	Verificar el estado y funcionamiento del alimentador	X			X			X			X			X								
	Verificar funcionamiento de potenciómetros (salida de voltaje)			X			X			X			X			X						
	Verificar el estado del conductor (positivo - negativo)			X			X			X			X			X						
	Los manómetros de los cilindros de gases comprimidos se encuentran en buenas condiciones y con etiquetas legibles	X			X			X			X			X								
	Las mangueras y reguladores de los equipos, están en buen estado y no presentan fugas.	X			X			X			X			X								
	Se verificó que el manómetro del cilindro antes de empezar con la boquilla cerrada marque cero.	X			X			X			X			X								
	Los cilindros son transportados en carro porta tanques, asegurados entre sí.	X			X			X			X			X								
	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, asegurados en su soporte.	X			X			X			X			X								
	Se cuenta con cables a tierra para los equipos de soldadura de arco eléctrico			X			X			X			X			X						
	Se verificó que el circuito de alimentación tenga la capacidad suficiente para conectar los equipos de soldadura o equipos de corte			X			X			X			X			X						
	Las pinzas sujetan adecuadamente los electrodos			X			X			X			X			X						
	Se dispone en el sitio del Estándar operativo del equipo	X			X			X			X			X								
	Lijera			X			X			X			X			X						
	Se cuenta con un interruptor cercano al área de trabajo.			X			X			X			X			X						
	El equipo de corte cuenta con mango auxiliar y guarda de seguridad.			X			X			X			X			X						
	El disco corresponde a las especificaciones del equipo			X			X			X			X			X						
	El disco es acorde a la labor y al equipo que se va a utilizar			X			X			X			X			X						

Powered by CamScanner

Lugar:	Bodega IAC	Frente de trabajo:	
Actividad a realizar			

	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
Fecha	0707			0807			0907			1007			11-07-25								
Hora de inicio	700			700			700			700			7:00								
Hora de terminación de la tarea	630			1630			1630			1630											
ITEM GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Condiciones de seguridad																					
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables (más 15 m de distancia)	X			X			X			X			X								
La condiciones de ventilación son adecuadas y no permiten la acumulación de gases (en caso de que no, aplicar hoja de verificación de trabajo en espacios confinados)	X			X			X			X			✓								
Soldar en dirección favorable al viento (no contrario), para prevenir quemaduras y reducir exposición a humos y/o particulas	X			X			X			X			X								
Las condiciones de iluminación son adecuadas para el oficio	X			X			X			X			X								
Los trabajos de soldadura se realizan a una distancia segura de las redes eléctricas, instalaciones eléctricas o barras conductoras eléctricas (3 ó m en media tensión y 6 ó m en alta tensión)	X			X			X			X			X								
Se han verificado los sistemas de protección contra incendios y de seguridad en maquinas y equipos de la zona donde se realizar el trabajo. Mantenerlos que se puedan ser deteriorados o dañados se deben cubrir o retirar del área de trabajo	X			X			X			X			X								
Se mantienen [illegible]	X			X			X			X			X								
Los energizes no deben tener contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o algún sitio riesgoso	X			X			X			X			X								
Los trabajos de soldadura y corte se realizan sobre suelos libres de agua o humedad	X			X			X			X			X								
Cualquier abertura tipo tuberías, partes de construcción o dilatación estructurales, ventanas, fragaluces o claraboyas, estan protegidas para evitar que (partículas) [illegible]	X			X			X			X			X								
Se cuenta con equipo para la atención de emergencias (botiquín, camilla)	X			X			X			X			X								
Se dispone de los medios de comunicación necesarios para la oportuna atención de posibles emergencias	X			X			X			X			X								
El sitio en donde se realizan los trabajos permite el acceso a los grupos de rescate	X			X			X			X			X								
Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona. (a menos de 15 m de distancia)	√			X			X			X			X								
		X			X		X				X			X								
Cierre del trabajo																					
El trabajo se terminó?	X			X			X			X			X								
Se cerraron las válvulas de los cilindros cargues de terminar los trabajos ?	X			X			X			X			X								
Los equipos quedan desenchufados cargues de terminar los trabajos ?	X			X			X			X			X								
El área quedó ordenada y limpia?	X			X			X			X			X								
Se dió al personal autorizado sobre la terminación de las actividades																					
Revisó	Nombre	Aurelio		Aurelio			Aurelio			Aurelio			Aurelio								
	Cargo	Instructor		Instructor			Instructor			Instructor			Instructor								
	Firma	[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]								

Este documento y la información que contiene es propiedad de SA. I. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin su autorización [illegible]

Powered by CamScanner

VERTICAL	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: SST VERSION:1 FECHA:18/09/2023

Lugar: Bodega FAC — Frente de trabajo: Bodega principal

Actividad a realizar: Demolicion mecanica y manual

		DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Fecha	14-07			15-07			16-07			17-07			18-07								
	Hora de inicio de la tarea	7:00			7:00			7:00			7:00			7:00								
	Hora de terminación de la tarea	17:00			17:00			17:00			17:00			17:00								
	ITEM GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Requerimientos Humanos	Hay mínimo 2 trabajadores en la actividad, uno de ellos vigía/auxiliar?	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores tienen sus aportes de Seguridad Social Vigente (EPS - ARL - AFP)?	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores manifiestan estar en buenas condiciones de salud para ejecutar la actividad	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores cuentan con la constancia de capacitación o certificación de competencia para el trabajo de soldador	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores cuentan capacitación o para el manejo de extintores	X			X			X			X			X								
	Se socializó a los trabajadores los riesgos de la actividad mediante el ATS?	X			X			X			X			X								
	Las personas encargadas de ejecutar la labor han recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	X			X			X			X			X								
	El personal sabe como actuar en caso de emergencia.	X			X			X			X			X								
EPP	Los trabajadores, tienen los elementos de Protección Personal requeridos para la actividad, conforme a la matriz de EPP. El soldador debe contar con el equipo de protección personal específico para su labor que incluye careta para soldar, guantes de carnaza largos, tapones auditivos, protector respiratorio para humos, botas de seguridad, pechera y mangas para soldar, etc.	X			X			X			X			X								
	La ropa de trabajo del personal encargado debe estar libre de cualquier sustancia o químico "grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable" de igual manera la dotación debe estar libre de humedad	X			X			X			X			X								
	Los elementos de Protección Personal requeridos para la actividad, están en buen estado.	X			X			X			X			X								
Señalización	El área donde se realizan el trabajo en caliente esta delimitada.	X			X			X			X			X								
	Se tiene en el área, mecanismo de advertencia del riesgo?.		X			X			X			X			X								
	Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas			X			X			X			X			X						
Herramientas y equipos	Se ha diligenciado el preoperacional de los equipos a utilizar?	X			X			X			X			X								
	Se ha inspeccionado todo el equipo y herramienta a utilizar?	X			X			X			X			X								
	Los equipos a utilizar tienen sus cables, protectores (espiral) y conexiones en buen estado.	X			X			X			X			X								
	Verificar el estado de la pinza de la masa o portaelectrodo. Verificar el estado de los bornes (inversor)			X			X			X			X			X						
	Verificar el estado y funcionamiento del interruptor, antorcha y cuerpo del equipo			X			X			X			X			X						
	Verificar el estado y funcionamiento del alimentador			X			X			X			X			X						
	Verificar funcionamiento de potenciómetros (caída de voltaje)			X			X			X			X			X						
	Verificar el estado del conductor (positivo - negativo)			X			X			X			X			X						
	Los manómetros de los cilindros de gases comprimidos se encuentran en buenas condiciones y con etiquetas legibles	X			X			X			X			X								
	Las mangueras y reguladores de los equipos, están en buen estado y no presentan fugas.	X			X			X			X			X								
	Se verificó que el manómetro del cilindro antes de empezar con la boquilla cerrada marque cero.	X			X			X			X			X								
	Los cilindros son transportados en carro porta tanques, asegurados entre sí.	X			X			X			X			X								
	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, asegurados en su soporte.	X			X			X			X			X								
	Se cuenta con cables a tierra para los equipos de soldadura de arco eléctrico			X			X			X			X			X						
	Se verificó que el circuito de alimentación tenga la capacidad suficiente para conectar los equipos de soldadura o equipos de corte			X			X			X			X			X						
	Las pinzas sujetan adecuadamente los electrodos			X			X			X			X			X						
	Se dispone en el sitio del Estándar operativo del equipo			X			X			X			X			X						
	Esmeril:		X		X			X			X			X								
	Se cuenta con un interruptor cercano al área de trabajo		X		X			X			X			X								
	El equipo de corte cuenta con mango auxiliar y guarda de seguridad.		X		X			X			X			X								
	El disco corresponde a las especificaciones del equipo		X		X			X			X			X								
	El disco es acorde a la labor y al equipo que se va a utilizar		X		X			X			X			X								

Powered by CamScanner

Lugar:	Bodega FAC	Frente de trabajo:	Bodega FAC
Actividad a realizar:	Cerde de estructura		

		DÍA 1			DÍA 2			DÍA 3			DÍA 4			DÍA 5			DÍA 6			DÍA 7		
	Fecha	14-07			15-07			16-07			17-07			18-07								
	Hora de inicio de la jornada	7:00			7:00			7:00			7:00			7:00								
	Hora de terminación de la jornada	17:00			17:00			17:00			17:00			17:00								
	ITEM GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Condiciones de seguridad	El sitio donde se ejecuta el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables (mín 15 m de distancia)	X			X			X			X			X								
	La instalaciones de energía son adecuadas y no presentan la acumulación de gases (en caso de que sea aplicable debe de verificarse de manera periódica)	X			X			X			X			X								
	Están en dirección hacia donde el viento (no contamina) para prevenir quemaduras y reducir exposición a humos y/o partículas			X			X			X			X			X						
	Las condiciones de iluminación son satisfactorias para la labor	X			X			X			X			X								
	Los trabajos de soldadura se realizan a una distancia segura de las redes eléctricas, instalaciones eléctricas o barras conectadas a electricidad (1.0 m en media tensión y 4.0 m en alta tensión)			X			X			X			X			X						
	Se han verificado los sistemas de protección contra incendios y de seguridad en maquinaria y vehículos en la zona donde se realizará el trabajo. Asimismo que se puedan ver obstrucciones o fallazgos se deben cubrir o retirar del área de trabajo	X			X			X			X			X								
	Las emergencias que se deberán dar (qué, cómo, cuándo, quién) para cada actividad están claras y son conocidas	X			X			X			X			X								
	Los trabajadores no deben tener contacto con sustancias corrosivas, tóxicas, irritantes, alérgenos, peligrosas durante algún tiempo	X			X			X			X			X								
	Las trabajos en subterráneo y cerca se realizan sobre suelos libres de agua o humedad	X			X			X			X			X								
	Cualquier abertura, tipo cámaras, pozos de construcción o situación estructurales, ventanas, trapdoors o sitio abiertos, están protegidos para evitar que cualquier tipo trabajador, incluido personal sin tener acceso			X			X			X			X			X						
Emergencias	Se cuenta con equipo para la atención de emergencias (botiquín, camilla)	X			X			X			X			X								
	Se dispone de los medios de comunicación adecuados para la coordinación de todas las actividades	X			X			X			X			X								
	El sitio en donde se realizan los trabajos permite el acceso al equipo y los grupos de rescate	X			X			X			X			X								
	Se han establecido estrategias adecuadas en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona. (a menos de 25 m de distancia)	X			X			X			X			X								
Cierre de trabajo	El trabajo se monitorea?		X			X			X			X			X								
	Se verifican los valores de los cilindros después de terminar los trabajos ?	X			X			X			X			X								
	Los equipos quedan desconectados después de terminar los trabajos ?	X			X			X			X			X								
	El área queda ordenada y limpia?	X			X			X			X			X								
	Se avisó al personal autorizado sobre la terminación de las actividades	X			X			X			X			X								
Firma	Nombre	Jose Rodrigo Rosado			Jose Rodrigo Rosado			Jose Rodrigo Rosado			Jose Rodrigo Rosado			Jose Rodrigo Rosado								
	Cargo																					
	Firma																					

Este documento y la información que contiene es propiedad de MLT. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

VERTICAL	PERMISO DE TRABAJO CON OXICORTE	F-SST-036 Versión 03 10/04/2025

PERMISO VALIDO	DESDE	14-07-25	HASTA	18-07-25

RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Proyecto	Bodega FAC	Actividad a ejecutar	Corte de elementos

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se realiza corte de refuerzo estructural en vigas y columnas, y limpieza de acero.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A EMPLEAR EN LA LABOR

Porros, picas.

Condiciones de Seguridad Generales y Elementos de Protección Personal

El personal sabe que hacer en caso de emergencia	X / NO	El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	X / NO	Casco con Barbuquejo	X / NO	Protección Auditiva	X / NO
Exámenes médicos	X / NO	Se le ha informado al jefe de área y a la persona de SST de la actividad a realizar	X / NO	Guantes de cuero	X / NO	Overol de trabajo	X / NO
El personal esta capacitado para la actividad	X / NO	El pago de Seguridad Social esta Vigente	X / NO	Gafas con filtro	X / NO		
El personal cuenta con buenas condiciones de salud para ejecutar las actividades	X / NO	Cuenta con una Persona de Apoyo en el Lugar de la Actividad	X / NO	Proteccion Respiratoria	X / NO		
Los elementos de protección personal son acordes a la actividad a realizar	X / NO	Se ha delimitado y aislado el área de trabajo	X / NO	Botas con punta de seguridad	X / NO		

Condiciones de seguridad

N°	Equipos y Herramientas	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Cilindros de oxígeno y acetileno en buen estado, sin fugas ni abolladuras.	X			X			X			X			X					
2	Manómetros funcionales y calibrados.	X			X			X			X			X					
3	EL trabajador identifica y aísla la presencia de material combustible en el lugar de trabajo antes de iniciar la labor?	X			X			X			X			X					
4	Mangueras en buen estado, sin grietas, cortes, ni conexiones flojas.	X			X			X			X			X					
5	Soplete limpio y operativo, con válvulas que funcionen correctamente.	X			X			X			X			X					
6	En caso de emergencia cuenta con los elementos apropiados para extinguir el fuego (Extintores en buen estado y fecha de recarga vigente)	X			X			X			X			X					

Condiciones de areas de trabajo

N°	Criterio	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Espacio libre de materiales inflamables o combustibles.	X			X			X			X			X					
2	Buena ventilación para evitar acumulación de gases.	X			X			X			X			X					
3	Señalización visible de "Trabajo con fuego" o "Peligro: Oxicorte en proceso".			X			X			X			X			X		
4	Iluminación adecuada.	X			X			X			X			X					

VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Se ha verificado por parte del personal que firma a continuación diariamente las condiciones en el sitio de trabajo garantizando la existencia de los controles de seguridad en el personal y operacionales que se deben considerar para la autorización del permiso de trabajo

Este permiso de trabajo tiene una validez semanal	VALIDO			Desde / Hasta		QUIEN AUTORIZA		QUIEN SUPERVISA (SST)	
						NOMBRE / FIRMA	CC	NOMBRE / FIRMA	CC
LUNES	14	07	25	7:00	17:00	Laura Pinzón	1020780265	Laura Pinzon	1020780265
MARTES	15	07	25	7:00	17:00	Laura Pinzon	1020780265	Laura Pinzón	1020780265
MIÉRCOLES	16	07	25	7:00	17:00	Laura Pinzón	1020780265	Laura Pinzon	1020780265
JUEVES	17	07	25	7:00	17:00	Laura Pinzón	1020780265	Laura Pinzón	1020780265
VIERNES	18	07	25	7:00	17:00	Laura Pinzón	1020780265	Laura Pinzon	1020780265
SÁBADO									

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

¿El trabajo se finalizó? SI ____ NO X

¿Se entrega el área en buenas condiciones de seguridad? SI X NO ____

¿Queda cerrado definitivamente este permiso de trabajo? SI X NO ____

FECHA DE CIERRE: 18-07-25

HORA: 17:00

NOMBRE / FIRMA / CC / SUPERVISA: Laura Pinzon 1020780265

NOMBRE / FIRMA / CC / AUTORIZA:

Powered by CamScanner

CONDICIÓN FISICA PARA EJECUTAR TRABAJO DE TAREAS CRITICAS

Señor (a) trabajador (a): Para establecer si tiene la condición física para ejecutar la labor de trabajo en caliente, usted debe tener en cuenta lo siguiente:

¿Toma actualmente algún medicamento que le produzca somnolencia, desconcentración o debilidad?
¿En los últimos días ha presentado algún malestar, dolor o mareo que pueda afectar su desempeño en las labores de tareas críticas?
¿Se siente en condiciones de salud física y mental para ejecutar trabajos el trabajo?
¿Ha consumido sustancias psicoactivas o alucinógenas o bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas, que pueda alterar su concentración o desempeño?
¿Ha dormido bien en los últimos días, especialmente la noche anterior?
¿Ha sufrido golpes, lesiones o contusiones en los últimos días que le hayan afectado los brazos, las piernas o la espalda y que le impida realizar normalmente su labor?

Si usted cumple los requisitos debe escribir en la casilla de "Tiene la condición física" con la palabra **SI**, de lo contrario usted no podrá ejecutar trabajo en caliente y debe reportarlo de inmediato al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Personal Involucrado en la labor			
Nombre y Apellido	Numero de Cedula	¿Tiene la condición física? SI/NO	Firma
1. Luis Morales	3720484	SI	
2. Carlos Cuervo	1020782041	SI	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Powered by CamScanner

VERTICAL	PERMISO DE TRABAJO CON OXICORTE	F-SST-036 Versión 03 10/04/2025

PERMISO VALIDO	DESDE	21-07-25	HASTA	26-07-25

RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Proyecto	FAC	Actividad a ejecutar	Corte acero

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Corte de aceros de hormigon reforzado y cimentacion

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A EMPLEAR EN LA LABOR

Equipo oxicorte, almadanas, picas, barras

Condiciones de Seguridad Generales y Elementos de Protección Personal

El personal sabe que hacer en caso de emergencia	X	El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	X	Casco con barbuquejo	X	Protección Auditiva	X
Exámenes médicos	X	Se le ha informado al jefe de área o a la persona de SST de la actividad a realizar	X	Guantes de Cuero	X	Overol de trabajo	X
El personal esta capacitado para la actividad	X	El pago de Seguridad Social esta Vigente	X	Gafas con filtro	X		
El personal cuenta con buenas condiciones de salud para ejecutar las actividades	X	Cuenta con una Persona de Apoyo en el Lugar de la Actividad	X	Protección Respiratoria	X		
Los elementos de protección personal son acordes a la actividad a realizar	X	Se ha delimitado y aislado el área de trabajo	X	Botas con punta de seguridad	X		

Condiciones de seguridad

N°	Equipos y Herramientas	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Cilindros de oxigeno y acetileno en buen estado, sin fugas ni abolladuras.	X			✓			✓			✓			✓					
2	Manómetros funcionales y calibrados.	X			✓			✓			✓			✓					
3	El trabajador identifica y aleja la presencia de material combustible en el lugar de trabajo antes de iniciar la labor?	X			✓			✓			✓			✓					
4	Mangueras en buen estado, sin grietas, cortes, ni conexiones flojas.	X			✓			✓			✓			✓					
5	Soplete limpio y operativo, con válvulas que funcionen correctamente.	X			✓			✓			✓			✓					
6	En caso de emergencia cuenta con los elementos apropiados para extinguir el fuego (Extintores en buen estado y fecha de recarga vigente)	X			✓			✓			✓			✓					

Condiciones de areas de trabajo

N°	Criterio	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Espacio libre de materiales inflamables o combustibles.	X			✓			✓			✓			✓					
2	Buena ventilación para evitar acumulación de gases.	X			✓			✓			✓			✓					
3	Señalización visible de "Trabajo con fuego" o "Peligro: Oxicorte en proceso".			X			✓			✓			✓			✓			
4	Iluminación adecuada.	X			✓			✓			✓			✓					

VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Se ha verificado por parte del personal que firma a continuación diariamente las condiciones en el sitio de trabajo garantizando la existencia de los controles de seguridad en el personal y operacionales que se deben considerar para la autorización del permiso de trabajo

Este permiso de trabajo tiene una validez semanal						QUIEN AUTORIZA		QUIEN SUPERVISA (SST)	
VALIDO				Desde / Hasta		NOMBRE / FIRMA	CC	NOMBRE / FIRMA	CC
LUNES	21	07	25	7:00	17:00	Laura Pinzon	1020780265	Yuly Bedoya / Yuly	1020780265
MARTES	22	07	25	7:00	17:00	Laura Pinzon	1020780265	Yuly Bedoya / Yuly	1020780265
MIÉRCOLES	23	07	25	7:00	17:00	Laura Pinzon	1020780265	Yuly Bedoya / Yuly	1020780265
JUEVES	24	07	25	7:00	17:00	Laura Pinzon	1020780265	Yuly Bedoya / Yuly	1020780265
VIERNES	25	07	25	7:00	17:00	Laura Pinzon	1020780265	Yuly Bedoya / Yuly	1020780265
SÁBADO									

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

¿El trabajo se finalizó? SI X NO ___

¿Se entrego el área en buenas condiciones de seguridad? SI ___ NO ___

¿Queda cerrado definitivamente este permiso de trabajo? SI ___ NO ___

FECHA DE CIERRE: ___

HORA: 17:00

NOMBRE / FIRMA / CC / SUPERVISA: Yuly

NOMBRE / FIRMA / CC / AUTORIZA: Laura Pinzon 1020780265

Powered by CamScanner

CONDICIÓN FÍSICA PARA EJECUTAR TRABAJO DE TAREAS CRITICAS

Señor (a) trabajador (a): Para establecer si tiene la condición física para ejecutar la labor de trabajo en caliente, usted debe tener en cuenta lo siguiente:

¿Toma actualmente algún medicamento que le produzca somnolencia, desconcentración o debilidad?
¿En los últimos días ha presentado algún malestar, dolor o mareo que pueda afectar su desempeño en las labores de tareas críticas?
¿Se siente en condiciones de salud física y mental para ejecutar trabajos el trabajo?
¿Ha consumido sustancias psicoactivas o alucinógenas o bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas, que pueda alterar su concentración o desempeño?
¿Ha dormido bien en los últimos días, especialmente la noche anterior?
¿Ha sufrido golpes, lesiones o contusiones en los últimos días que le hayan afectado los brazos, las piernas o la espalda y que le impida realizar normalmente su labor?

Si usted cumple los requisitos debe escribir en la casilla de "Tiene la condición física" con la palabra **SI**, de lo contrario usted no podrá ejecutar trabajo en caliente y debe reportarlo de inmediato al área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Personal Involucrado en la labor

Nombre y Apellido	Numero de Cedula	¿Tiene la condición física? SI/NO	Firma
1. Luis Morales	3120982	SI	
2. Carlos Guevara	1004988	Si	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Powered by CamScanner

VERTICAL	LISTA DE VERIFICACION PARA TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: [illegible] VERSION: 1 FECHA: [illegible]

Lugar:	Calle 13	Puesto de trabajo:	Fac
Actividad a realizar:	Oxicorte		

		DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Fecha:	21-07-25			22-07-25			23-07-25			24-07-25			25-07-25								
	Hora de inicio de la tarea:	7:00			7:00			7:00			7:00			7:00								
	Hora de terminación de la tarea:	17:00			17:00			17:00			17:00			17:00								
	ITEM GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Requerimientos Humanos	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
EPP	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
Señalización	[illegible]		X			✓		✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
Herramientas y equipos	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]	X			✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								
	[illegible]			X		✓			✓			✓			✓								

Powered by CamScanner

FECHA: 18/05/2023

Lugar: Calle 13 | Frente de trabajo: Tac

Actividad a realizar: Oxicorte

		DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6			DIA 7		
	Fecha	21-03-23			22-03-23			23-03-23			24-03-23			25-03-23								
	Hora de inicio de la tarea	7:00			7:00			7:00			7:00			7:00								
	Hora de terminación de la tarea	17:00			17:00			17:00			17:00			17:00								
	ITEM GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Condiciones de seguridad	El sitio donde se ejecuta el trabajo esta libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables (mín 15 m de distancia)	X			✓			✓			✓			✓								
	La condiciones de ventilación son adecuadas y no permiten la acumulación de gases (En caso de que no, aplicar lista de verificación de trabajo de espacio confinado)	X			✓			✓			✓			✓								
	Ubicar en dirección favorable al viento (no contrario), para prevenir quemaduras y reducir exposición a humos y/o partículas			X			✓			✓			✓			✓						
	La condiciones de iluminación son adecuadas para la labor	X			✓			✓			✓			✓								
	Los trabajos de soldadura se realizan a una distancia segura de las redes eléctricas, instalaciones eléctricas o barras colectoras eléctricas (1.8 m en media tensión y 6.4 m en alta tensión).			X			✓			✓			✓			✓						
	Se han verificado los sistemas de protección contra incendios y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo. Materiales que se puedan ver deteriorados o dañados se deben cubrir o retirar del frente de trabajo.	X			✓			✓			✓			✓								
	Las mangueras que atraviesan vías deben estar protegidas con apoyos en para con suficiente resistencia y de rompeviento	X			✓			✓			✓			✓								
	Las mangueras no deben tener contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o caigan sobre ellas chispas	X			✓			✓			✓			✓								
	Los trabajos de soldadura y corte se realizan sobre suelos libres de agua o humedad	X			✓			✓			✓			✓								
	Cualquier abertura (por ranuras, juntas de construcción o dilatación estructurales, ventanas, trapdoors o claraboyas), están protegidas para evitar que partículas incandescentes puedan generar un fuego oculto	X			✓			✓			✓			✓								
Emergencias	Se cuenta con equipo para la atención de emergencias (botiquín, camilla)	X			✓			✓			✓			✓								
	Se dispone de los medios de comunicación necesarios para la oportuna atención de posibles emergencias	X			✓			✓			✓			✓								
	El sitio en donde se realizan los trabajos permite el acceso al equipo y los grupos de rescate	X			✓			✓			✓			✓								
	Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona, (a menos de 10 m de distancia)	X			✓			✓			✓			✓								
Cierre de trabajo	El trabajo se terminó?		X			✓		✓			✓			✓								
	Se cerraron las válvulas de los cilindros después de terminar los trabajos ?	X			✓			✓			✓			✓								
	Los equipos quedan desconectados después de terminar los trabajos ?	X			✓			✓			✓			✓								
	El área quedó ordenada y limpia?	X			✓			✓			✓			✓								
	Se avisó al personal autorizado sobre la terminación de las actividades.	X			✓			✓			✓			✓								
Revisó	Nombre - Apellido	Leon Pinzon			Yuleydis			Yuleydis			Yuleydis			Yuleydis								
	Cargo	Residente			SST			SST			SST			SST								
	Firma				Yuleydis			Yuleydis			Yuleydis			Yuleydis								

Este documento y la información que contiene son propiedad de MLT. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 2359 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-01-15	2025-01-16	2026-01-15

No DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KILOS	MODELO
150800604614400O	QFV494	CAMPEROS O CAMIONETA	PARTICULAR	5700	1994

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	FURGON
LÍNEA VEHÍCULO	CHEYENNE	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
KRV321461	C1C3KRV321461		1.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANDINO, JOSE OVIDIO		CC	79425064	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13543	0	PEREIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
232	$ 833500	$ 433400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1269000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza del SOAT en soporte físico o digital entregado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el producto, comuníquese al teléfono móvil 8045 para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar de la accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 95 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga se debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Querellamos de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, durante el momento de registrar la misma en el RUNT, se comprueba que exista una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, suministre la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que desde o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a mis mismos, presentar queja ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 97 # 9A7 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3307555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011401564

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
QFV494	CHEVROLET	CHEYENNE	1994

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.700	MARRON SIENA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	FURGON	GASGASOL	3500

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KRV321461	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
C1C3KRV321461	N	C1C3KRV321461	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

SANDINO JOSE OVIDIO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 79425064

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
013317

I/E
I

FECHA IMPORT.
24/11/1994

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
08/03/2002

FECHA EXP. LIC. TTO.
17/03/2016

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

ITBOY - DIST TTO NO. 5/MONIQUIRA

LT02003800203

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181398548

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MADELENA

NIT: 900081626

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-026

Fecha de expedición: 2025/05/26

Fecha de vencimiento: 2026/05/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	QFV494	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1994
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	5700	**NRO. MOTOR:**	KRV321461
NRO. CHASIS:	C1C3KRV321461	**VIN:**	
LÍNEA:	CHEYENNE		
COLOR:	MARRON SIENA		

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE O. SANDINO

FIRMA DEL RESPONSABLE

HELVER RAFAEL NIÑO ALVAREZ

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO SAS
NIT 900.246.243-4

DESPRENDIBLE DE PAGO NOMINA

NOMBRE	JEISSON EDER DIAZ AYALA	PERIODO	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
CÉDULA	1.013.597.899	SALARIO BASE	4.500.000
CARGO	Residente de obra	AUX. TRANSPORTE	-
OBRA	CTO - FAC BOGOTÁ	DIAS LABORADOS	22

DEVENGOS	
SALARIO	3.300.000
AUX. DE TRANSPORTE	-
HORAS EXTRAS	
INCAPACIDADES	-
AUXILIO NO CONSTITUTIVO	-
VACACIONES	-
PRIMA DE SERVICIOS	275.000
TOTAL DEVENGOS	3.575.000

DEDUCCIONES	
SALUD 4%	132.000
PENSION 4%	132.000
PRÉSTAMOS	-
LICENCIA NO REMUNERADA	-
OTROS DESCUENTOS	-
TOTAL DEDUCCIONES	264.000

NETO A PAGAR $ 3.311.000

Con la firma del presente desprendible, certifico que la empresa VERTICAL DISEÑO SAS con NIT 900.246.243-4 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto salarial correspondiente al mes de JUNIO de 2025

FIRMA RECURSOS HUMANOS

FIRMA TRABAJADOR
CC. No. 1013597899

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO SAS
NIT 900.246.243-4

DESPRENDIBLE DE PAGO NOMINA

NOMBRE	GLADYS SARITA MOLINA PITA	**PERIODO**	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
CÉDULA	40.048.566	**SALARIO BASE**	1.423.500
CARGO	Asesor Ing. De vías	**AUX. TRANSPORTE**	200.000
OBRA	CTO - FAC BOGOTÁ	**DIAS LABORADOS**	22

DEVENGOS	
SALARIO	1.043.900
AUX. DE TRANSPORTE	146.667
HORAS EXTRAS	
INCAPACIDADES	-
AUXILIO NO CONSTITUTIVO	-
VACACIONES	-
PRIMA DE SERVICIOS	99.214
TOTAL DEVENGOS	**1.289.781**

DEDUCCIONES	
SALUD 4%	41.800
PENSION 4%	41.800
PRÉSTAMOS	-
LICENCIA NO REMUNERADA	-
OTROS DESCUENTOS	-
TOTAL DEDUCCIONES	**83.600**

NETO A PAGAR $ 1.206.181

Con la firma del presente desprendible, certifico que la empresa VERTICAL DISEÑO SAS con NIT 900.246.243-4 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto salarial correspondiente al mes de JUNIO de 2025

FIRMA RECURSOS HUMANOS

FIRMA TRABAJADOR
C.C. No. 40048566

VERTICAL DISEÑO SAS
NIT 900.246.243-4

DESPRENDIBLE DE PAGO NOMINA

NOMBRE	YURLEY BADILLO QUEZADA	PERIODO	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
CÉDULA	1.102.367.663	SALARIO BASE	2.500.000
CARGO	Profesional SST	AUX. TRANSPORTE	200.000
OBRA	CTO - FAC BOGOTÁ	DIAS LABORADOS	12

DEVENGOS	
SALARIO	1.000.000
AUX. DE TRANSPORTE	80.000
HORAS EXTRAS	-
INCAPACIDADES	
AUXILIO NO CONSTITUTIVO	-
VACACIONES	-
PRIMA DE SERVICIOS	90.000
TOTAL DEVENGOS	1.170.000

DEDUCCIONES	
SALUD 4%	40.000
PENSION 4%	40.000
PRÉSTAMOS	-
LICENCIA NO REMUNERADA	-
OTROS DESCUENTOS	-
TOTAL DEDUCCIONES	80.000

NETO A PAGAR $ 1.090.000

Con la firma del presente desprendible, certifico que la empresa VERTICAL DISEÑO SAS con NIT 900.246.243-4 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto salarial correspondiente al mes de JUNIO de 2025

FIRMA RECURSOS HUMANOS

Yurley B
FIRMA TRABAJADOR
C.C. No. 1102367663

Powered by CamScanner

VERTICAL DISEÑO SAS
NIT 900.246.243-4

DESPRENDIBLE DE PAGO NOMINA

NOMBRE	MILEIDY MATEUS OLARTE	PERIODO	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
CÉDULA	1.103.713.807	SALARIO BASE	2.000.000
CARGO	Profesional Ambiental	AUX. TRANSPORTE	200.000
OBRA	CTO - FAC BOGOTÁ	DIAS LABORADOS	12

DEVENGOS	
SALARIO	800.000
AUX. DE TRANSPORTE	80.000
HORAS EXTRAS	
INCAPACIDADES	-
AUXILIO NO CONSTITUTIVO	-
VACACIONES	-
PRIMA DE SERVICIOS	73.333
TOTAL DEVENGOS	953.333

DEDUCCIONES	
SALUD 4%	32.000
PENSION 4%	32.000
PRÉSTAMOS	-
LICENCIA NO REMUNERADA (Ausencia 22/Julio/2024)	
OTROS DESCUENTOS	-
TOTAL DEDUCCIONES	64.000

NETO A PAGAR $ 889.333

Con la firma del presente desprendible, certifico que la empresa VERTICAL DISEÑO SAS con NIT 900.246.243-4 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto salarial correspondiente al mes de JUNIO de 2025


FIRMA RECURSOS HUMANOS

Mileidy M

FIRMA TRABAJADOR

C.C. No. 1103713807

Powered by CamScanner

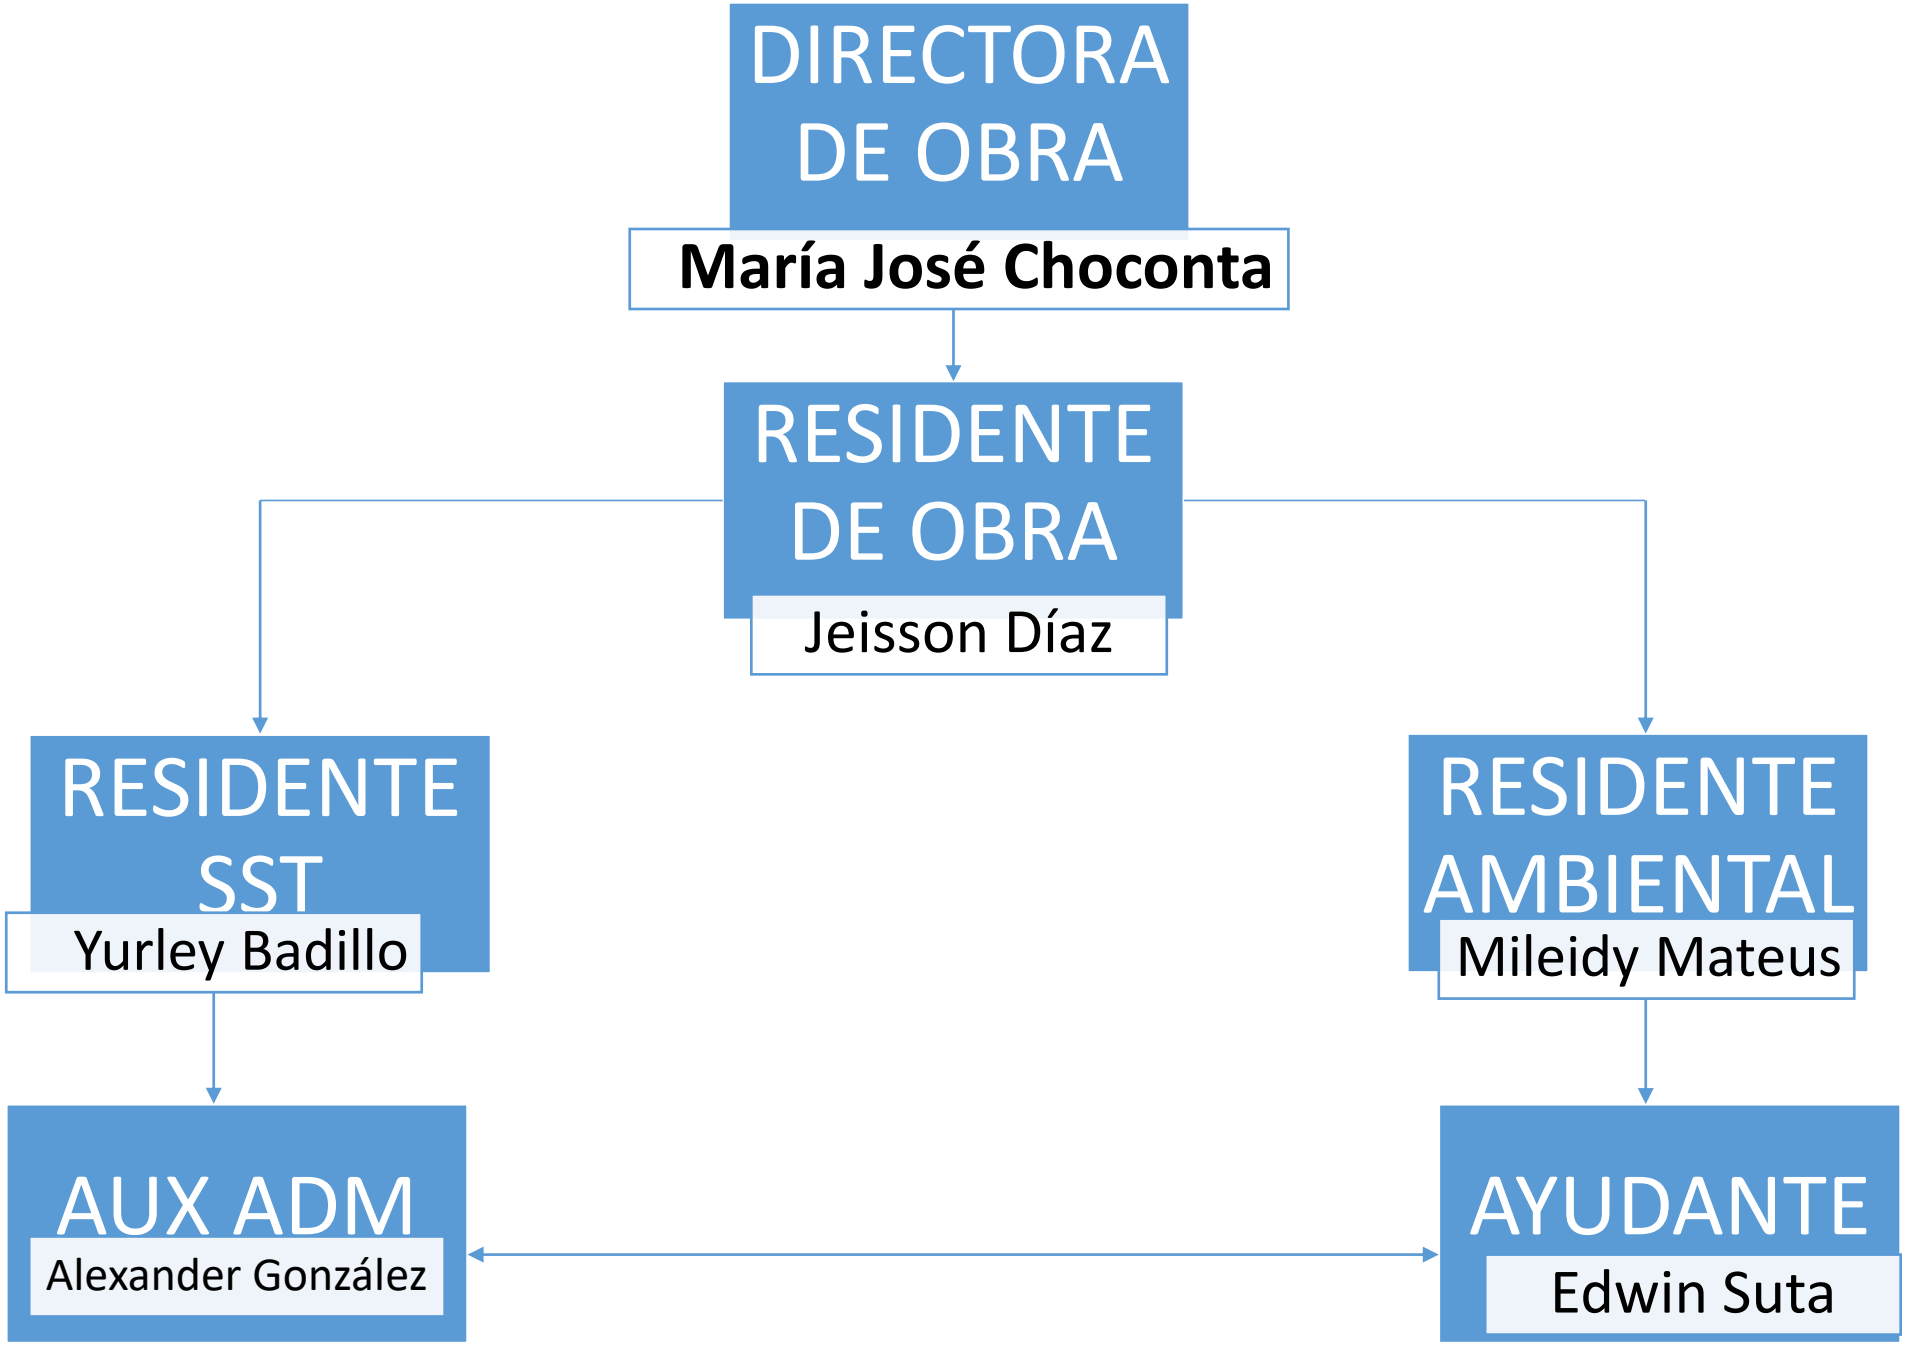
DIRECTORA DE OBRA
María José Choconta
RESIDENTE DE OBRA
Jeisson Díaz
RESIDENTE SST
Yurley Badillo
RESIDENTE AMBIENTAL
Mileidy Mateus
AUX ADM
Alexander González
AYUDANTE
Edwin Suta
