GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

MAYO-JUNIO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO ATACO

4059

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
RETROEXCAVADORA NUEVA #5	EDINSON ROJAS
VOLQUETA #15	MAURICIO PATIÑO
VOLQUETA #37	JULIO CESAR BARRAGAN
BULLDOZER #5	JEIDER CAMACHO

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

ATACO 1: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO

ATACO 2: JASMINIAS-MADROÑAL

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN







FRENTE DE TRABAJO ATACO 1



FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ATACO: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO MEJORAMIENTO DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
27/05/2025	BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO		15	7	5	35
28/05/2025			15	7	5	35
29/05/2025			15	7	5	35
31/05/2025			15	7	5	35
01/06/2025			15	7	5	35
09/06/2025			37	7	5	35
10/06/2025			37	7	5	35
11/06/2025			37	7	5	35
12/06/2025			37	7	5	35
16/06/2025			15	7	5	35
17/06/2025			15	7	5	35
18/06/2025			15	7	5	35
27/06/2025			15	7	5	35
28/06/2025			15	7	5	35
29/06/2025			37	7	5	35
30/06/2025			37	7	5	35
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA						560

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ATACO: JASMINIAS-MADROÑAL CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
27/05/2025	K0+000	K0+600	600	4	2.400
28/05/2025	K0+600	K1+200	600	4	2.400
29/05/2025	K1+200	K1+800	600	4	2.400
30/05/2025	K1+800	K2+400	600	4	2.400
31/05/2025	K2+400	K3+000	600	4	2.400
01/06/2025	K3+000	K3+600	600	4	2.400
02/06/2025	K3+600	K4+200	600	4	2.400
03/06/2025	K4+200	K4+800	600	4	2.400
11/06/2025	K4+800	K5+400	600	4	2.400
12/06/2025	K5+400	K6+000	600	4	2.400
13/06/2025	K6+000	K6+600	600	4	2.400
14/06/2025	K6+600	K7+200	600	4	2.400
15/06/2025	K7+200	K7+800	600	4	2.400
16/06/2025	K7+800	K8+400	600	4	2.400
17/06/2025	K8+400	K9+000	600	4	2.400
18/06/2025	K9+000	K9+600	600	4	2.400
25/06/2025	K9+600	K10+200	600	4	2.400
26/06/2025	K10+200	K10+800	600	4	2.400
27/06/2025	K10+800	K11+400	600	4	2.400
28/06/2025	K11+400	K12+000	600	4	2.400
29/06/2025	K12+000	K12+600	600	4	2.400
30/06/2025	K12+600	K13+200	600	4	2.400
TOTAL, CONFORMACION DE LA VIA					52.800

FRENTE DE TRABAJO ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO-JUNIO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ATACO: JASMINIAS-MADROÑAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
27/05/2025	JASMINIAS-MADROÑAL		50	3	1	150
28/05/2025			50	3	1	150
29/05/2025			50	3	1	150
30/05/2025			50	3	1	150
31/05/2025			50	3	1	150
01/06/2025			50	3	1	150
02/06/2025			50	3	1	150
03/06/2025			50	3	1	150
11/06/2025			50	3	1	150
12/06/2025			50	3	1	150
13/06/2025			50	3	1	150
14/06/2025			50	3	1	150
15/06/2025			50	3	1	150
16/06/2025			50	3	1	150
17/06/2025			50	3	1	150
18/06/2025			50	3	1	150
25/06/2025			50	3	1	150
26/06/2025			50	3	1	150
27/06/2025			60	3	1	180
28/06/2025			60	3	1	180
29/06/2025			60	3	1	180
30/06/2025			70	3	1	210
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						3.450

FRENTE DE TRABAJO ATACO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO ATACO

MAYO - JUNIO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ATACO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MAYO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INFORME MENSUAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   7.1 ACTIVIDADES EN ATACO: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO 8

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ataco – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural del municipio de Ataco específicamente en la vía de las veredas Bocas de San Pedro-Chilirco y Jasminias-Madroñal, con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficia los municipios del Ataco, se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, remoción de derrumbes, recuperación banca, apertura y extendido de material de mejoramiento con el apoyo de la retroexcavadora, bulldozer y volqueta.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ataco, ubicado en el departamento del Tolima es un municipio que forma parte de la región Andina del país. Está situado a unas 2 horas al suroeste de Ibagué, la capital del Tolima, y a aproximadamente 30 minutos de Melgar, uno de los destinos turísticos más conocidos del departamento.

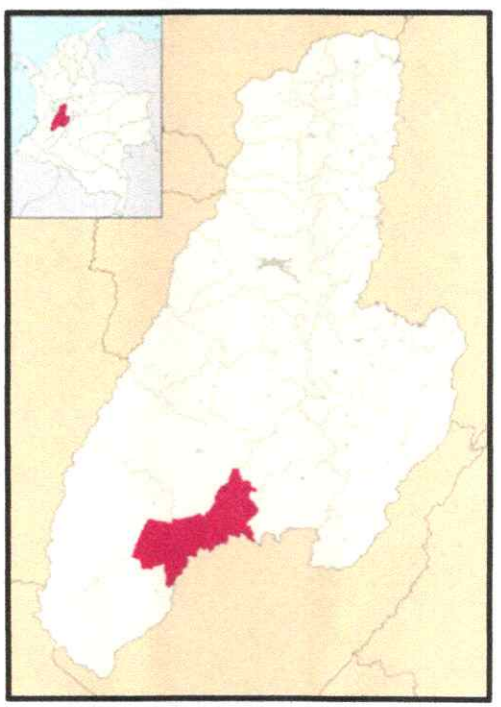

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca; estas actividades se realizaron con un kit de maquinaria amarilla el cual está conformado por 2 volquetas, un bulldozer y una retroexcavadora.

Se realizaron las actividades de mantenimiento sobre las vías Bocas de San Pedro-Chilirco y Jasminias-Madroñal, específicamente mejoramiento y conformación de la misma, limpieza de alcantarillas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en las veredas.

Se realizó el arreglo de pasos críticos en las vías mencionadas anteriormente con el apoyo de una retroexcavadora, un bulldozer y 2 volquetas, logrando remover gran cantidad de tierra, limpieza de alcantarillas y vía en general.

Esto permitió la solución y rehabilitación del corredor vial, ya que es importante restablecer el tránsito vehicular para beneficio de la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 13,2 km de vía en la vereda Jasminias-Madroñal y 3450 m3 de remoción-limpieza de tierra; el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables, se registraron lluvias equivalentes a un total de 15 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se realizaron actividades en el municipio de Ataco 4010 m3 de remoción-limpieza de tierra en la vía:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 27/05/2025 al 30/06/2025	Bocas de San Pedro-Chilirco	560
Del 27/05/2025 al 30/06/2025	Ataco y Jasminias-Madroñal	3450
TOTAL, KILÓMETROS INTERVENIDOS Y MATERIAL REMOVIDO		4010 M3

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	EDINSON ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	MAURICIO PATIÑO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO CESAR BARRAGAN
OPERARIO DE BULLDOZER	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JEIDER CAMACHO

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA


Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:


MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
BULLDOZER	#5	1
RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	1
VOLQUETA	15, 37	2

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN ATACO: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO



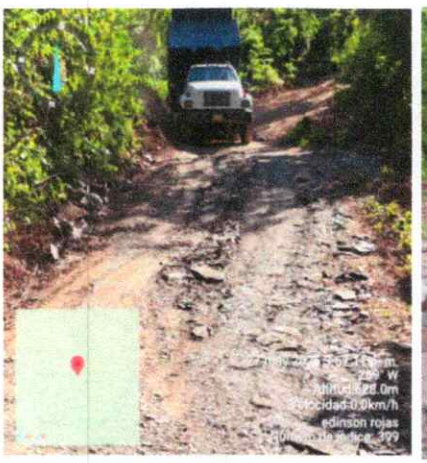

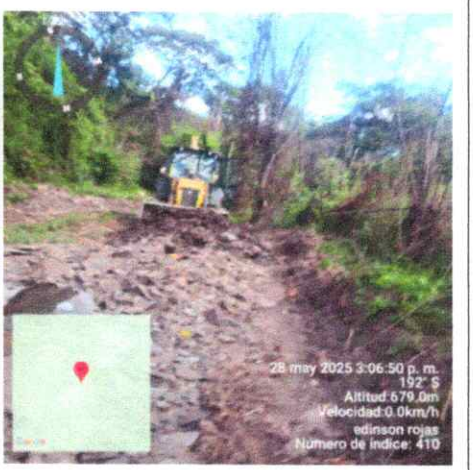

BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO





BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO








BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO

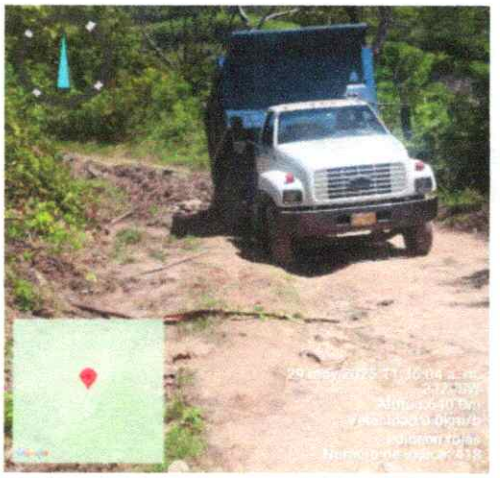





BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA







BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO






BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



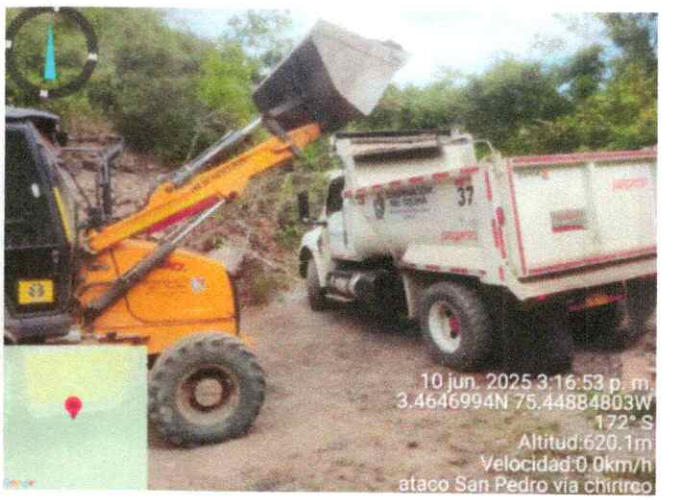

BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO








BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

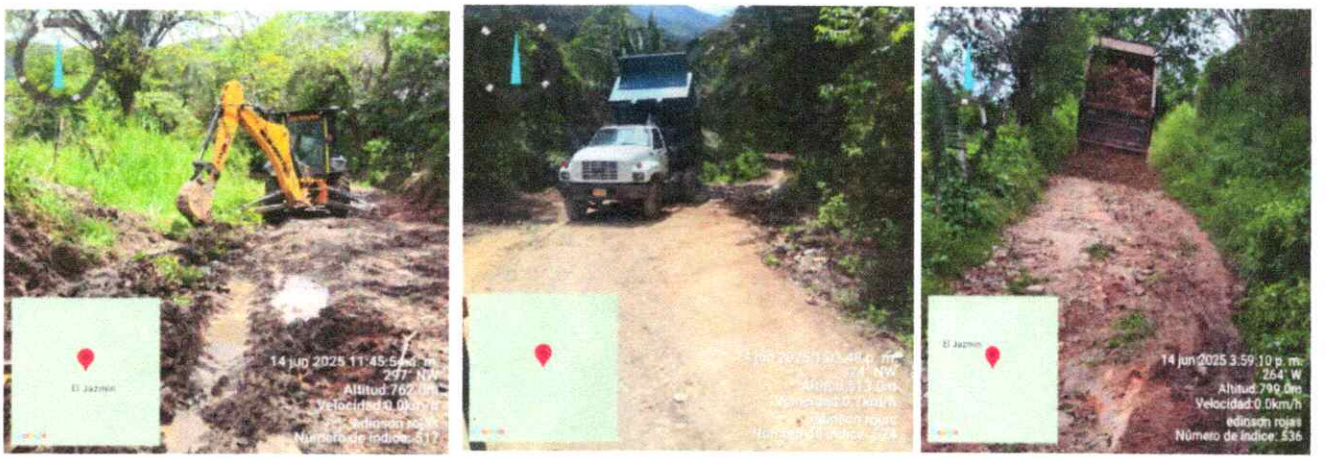


BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO



BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO


7.2 ACTIVIDADES EN ATACO: JASMINIAS – MADRUÑAL

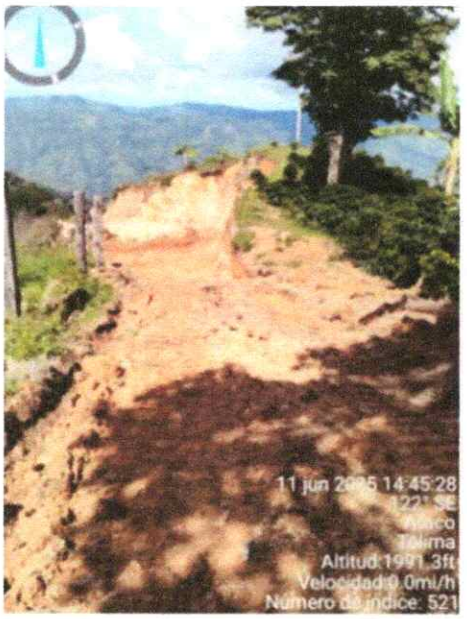



JASMINIAS – MADRUÑAL



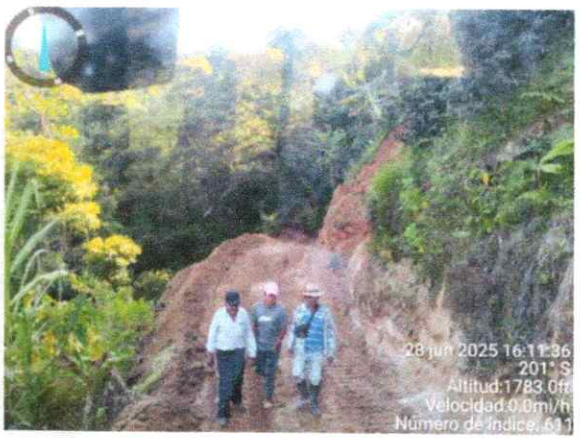

JASMINIAS – MADRUÑAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





JASMINIAS – MADRUÑAL










JASMINIAS – MADRUÑAL


UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

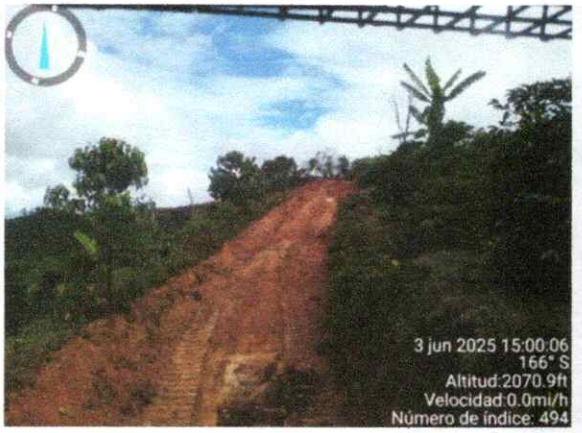

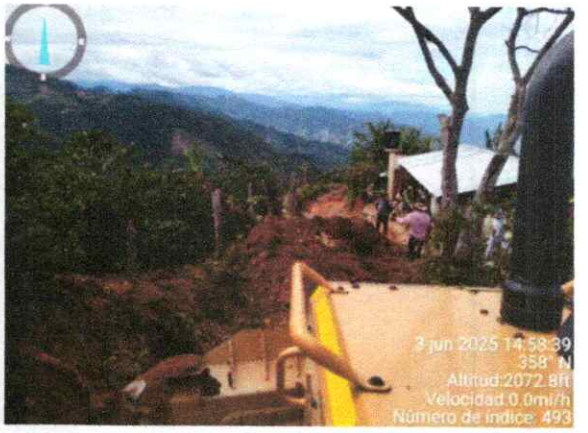

JASMINIAS – MADRUÑAL

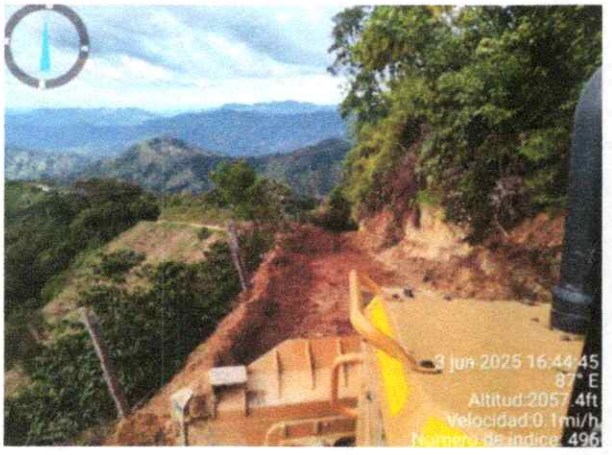

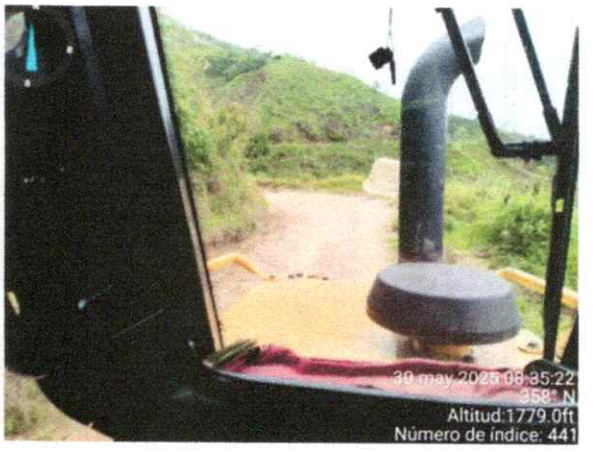

JASMINIAS – MADRUÑAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






JASMINIAS – MADRUÑAL






JASMINIAS – MADRUÑAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

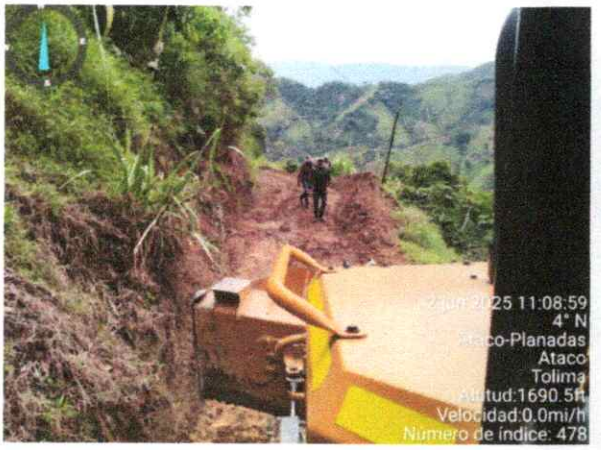



JASMINIAS – MADRUÑAL

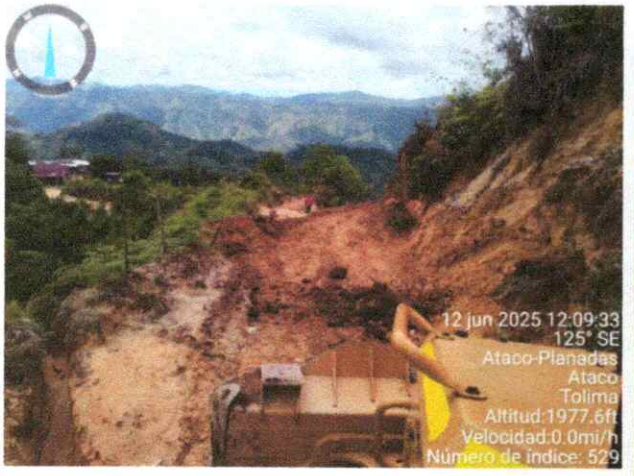



JASMINIAS – MADRUÑAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





JASMINIAS – MADRUÑAL





JASMINIAS – MADRUÑAL

Diana Tallego

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO — **MUNICIPIO: ATACO**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **560**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
27/05/2025	BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO		15	7	5	35	Se laboro Normalmente.
28/05/2025			15	7	5	35	Se laboro Normalmente.
29/05/2025			15	7	5	35	Se laboro Normalmente.
31/05/2025			15	7	5	35	Se laboro Normalmente.
01/06/2025			15	7	5	35	Se laboro Normalmente.
09/06/2025			37	7	5	35	Se laboro Normalmente.
10/06/2025			37	7	5	35	Se laboro Normalmente.
11/06/2025			37	7	5	35	Se laboro Normalmente.
12/06/2025			37	7	5	35	Se laboro Normalmente.
16/06/2025			15	7	5	35	Se laboro Normalmente.
17/06/2025			15	7	5	35	Se laboro Normalmente.
18/06/2025			15	7	5	35	Se laboro Normalmente.
27/06/2025			15	7	5	35	Se laboro Normalmente.
28/06/2025			15	7	5	35	Se laboro Normalmente.
29/06/2025			37	7	5	35	Se laboro Normalmente.
30/06/2025			37	7	5	35	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**560**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**560**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: JASMINIAS-MADROÑAL — MUNICIPIO: ATACO

REMOCIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA — UNIDAD: M3 — 3.450

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
27/05/2025	JASMINIAS-MADROÑAL		50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
28/05/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
29/05/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
30/05/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
31/05/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
01/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
02/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
03/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
11/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
12/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
13/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
14/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
15/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
16/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
17/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
18/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
25/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
26/06/2025			50	3	1	150	Se laboro Normalmente.
27/06/2025			60	3	1	180	Se laboro Normalmente.
28/06/2025			60	3	1	180	Se laboro Normalmente.
29/06/2025			60	3	1	180	Se laboro Normalmente.
30/06/2025			70	3	1	210	Se laboro Normalmente.
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						3.450	
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						3.450	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO ATACO

MAYO - JUNIO DE 2025

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025
	HOROMETRO		333	341	348	355	360	360
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025
	HOROMETRO		333	341	348	355	360	360
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Edu

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	2/06/2025						
	HOROMETRO	363						
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓						
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓						
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓						
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓						
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓						
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓						
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de combustible - Revisar	✓						
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓						
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓						
	Puntos de engrase - Lubricar	✓						
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓						
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓						
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓						
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓						
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓						
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓						
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓						
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓						
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓						
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓						

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	2/06/2025						
	HOROMETRO	363						
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓						
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓						
	Sistema de frenos - Revisar	✓						
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓						
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓						
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓						
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓						
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓						
	Espejos - Revisar	✓						
	Alarma de reversa - Revisar	✓						
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓						
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓						
	Cableado electrico - Revisar	✓						
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓						
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓						

OBSERVACIONES:

Erlinson

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	
	HOROMETRO	368	371	380	388	394	394	
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	
	HOROMETRO	368	371	380	388	394	394	
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025			
	HOROMETRO	400	407	410	416			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025			
	HOROMETRO	400	407	410	416			
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

Euclin

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)					27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025
	HOROMETRO					417	429	437
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar					✓	✓	✓
	Frreno de estacionamiento - Revisar					✓	✓	✓
	Fusibles y bombillas - Revisar					✓	✓	✓
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar					✓	✓	✓
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar					✓	✓	✓
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar					✓	✓	✓
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar					✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar					✓	✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar					✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar					✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar					✓	✓	✓
	Indicador de obstrucción - Revisar					✓	✓	✓
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)					✓	✓	✓
	Puntos de engrase - Lubricar					✓	✓	✓
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar					✓	✓	✓
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)					✓	✓	✓
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar					✓	✓	✓
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar					✓	✓	✓
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)					✓	✓	✓
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)					✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar					✓	✓	✓
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar					✓	✓	✓
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar					✓	✓	✓
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)					✓	✓	✓
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)					✓	✓	✓

1044.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)					27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025
	HOROMETRO					417	429	437
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)					✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)					✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar					✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)					✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)					✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)					✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)					✓	✓	✓
	Cinturon de seguridad - Revisar					✓	✓	✓
	Espejos - Revisar					✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar					✓	✓	✓
	Vidrio de ventanas - Limpiar					✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar					✓	✓	✓
	Cableado electrico - Revisar					✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar					✓	✓	✓
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)					✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	30/06/2025						
	HOROMETRO	443						
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓						
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓						
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓						
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓						
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓						
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓						
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de combustible - Revisar	✓						
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓						
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓						
	Puntos de engrase - Lubricar	✓						
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓						
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓						
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓						
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓						
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓						
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓						
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓						
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓						
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓						
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓						
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓						

1096

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	30/06/2025						
	HOROMETRO	443						
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓						
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓						
	Sistema de frenos - Revisar	✓						
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓						
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓						
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓						
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓						
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓						
	Espejos - Revisar	✓						
	Alarma de reversa - Revisar	✓						
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓						
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓						
	Cableado electrico - Revisar	✓						
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓						
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓						

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: EDINSON ROJAS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

1097

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 691	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	15	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ATACO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL			1531930		1532048		1532285		########		1532522		1533726			
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X			
	Tacos			X		X		X		X		X		X			
	Gato			X		X		X		X		X		X			
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X			
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X			
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X			
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X			
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X			
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X			
	Repuesto			X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X			
	Radiador			X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL			1532048		1532285		1532522		########		1533726		1534026			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1048

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 691	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	15	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ATACO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00											
	KILOMETRAJE INICIAL	1534026		1534713		1535131											
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00											
	KILOMETRAJE FINAL	1534713		1535131		1535549											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Mauricio P.	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1099

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 27 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 691	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	15	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ATACO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN									7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL									#######		1535779		1535984			
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín									X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto									X		X		X			
	Caja de Herramienta									X		X		X			
	Tacos									X		X		X			
	Gato									X		X		X			
	Linterna recargable									X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina									X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor									X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible									X		X		X			
	Nivel del aceite									X		X		X			
	Soportes motor									X		X		X			
	Estado del exhosto									X		X		X			
	Estado del switche de encendido									X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras									X		X		X			
	De trabajo traseras									X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras									X		X		X			
	Stop Traseros									X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor									X		X		X			
	Espejos laterales									X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso									X		X		X			
	Pito Normal									X		X		X			
	Frenos de Servicio									X		X		X			
	Freno de emergencia									X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).									X		X		X			
	Cinturones de Seguridad									X		X		X			
	Estado de la puertas									X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.									X		X		X			
	Limpia brisas									X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco									X		X		X			
	Estado de los asientos									X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).									X		X		X			
	Velocímetro									X		X		X			
	Batería y cables									X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos									X		X		X			
	Repuesto									X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas									X		X		X			
	Estado de correas									X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.									X		X		X			
	Radiador									X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)									X		X		X			
	Mangueras									X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)									X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco									X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco									X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco									X		X		X			
	Estado de empaques del volco									X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN									5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL									#######		1535984		1536189			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Mauricio L.	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1100

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 691	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	15	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ATACO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00														
	KILOMETRAJE INICIAL	1536189														
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X														
	Kit de contingencia según listado adjunto	X														
	Caja de Herramienta	X														
	Tacos	X														
	Gato	X														
	Linterna recargable	X														
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X														
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X														
	Estado del Tanque de combustible	X														
	Nivel del aceite	X														
	Soportes motor	X														
	Estado del exhosto	X														
	Estado del switche de encendido	X														
LUCES	De Trabajo delanteras	X														
	De trabajo traseras	X														
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X														
	Stop Traseros	X														
CABINA	Espejo Retrovisor	X														
	Espejos laterales	X														
	Alarma (o pito) de Retroceso	X														
	Pito Normal	X														
	Frenos de Servicio	X														
	Freno de emergencia	X														
	Dirección/suspensión(Terminales).	X														
	Cinturones de Seguridad	X														
	Estado de la puertas	X														
	Vidrio frontal en buen estado.	X														
	Limpia brisas	X														
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X														
	Estado de los asientos	X														
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X														
	Velocímetro	X														
	Batería y cables	X														
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X														
	Repuesto	X														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X														
	Estado de correas	X														
	Caja de cambios en buen estado.	X														
	Radiador	X														
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X														
	Mangueras	X														
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X														
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X														
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X														
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X														
	Estado de empaques del volco	X														
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00														
	KILOMETRAJE FINAL	1536375														

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Reinaldo P.	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

1101

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: LTL 736	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	MODELO: 2024	FRENTE DE TRABAJO: ATACO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	30988		31195		31265		31347								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	31195		31265		31347		31543								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Cesar B.	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: | RETRO NUEVA # 5 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO | FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			333		341		348		355		360		360	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				341		348		355		360		360		363	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Eulv		Eulv		Eulv		Eulv		Eulv		Eulv	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA #5** **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO **FRENTE DE TRABAJO:** ATACO

PERIODO: 02 DE JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	363															
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X															
	* De trabajo delanteras	2	X															
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X															
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X															
	* De stop y señal trasera	2	X															
	* De trabajo traseras	2	X															
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X															
	* Cinturón de seguridad	1	X															
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X															
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X															
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X															
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X															
	Alarma de retroceso	1	X															
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X															
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X															
	Palancas de mando	2	X															
	Pedales	Todos	X															
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X															
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X															
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X															
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X															
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X															
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X															
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X															
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X															
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X															
	Mandos de levante del brazo	2	X															
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X															
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X															
	Sistema de Dirección	1	X															
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X															
	* Huellas en buen estado	4	X															
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		368															
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA#5** **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO **FRENTE DE TRABAJO:** ATACO

PERIODO: 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	368		371		380		388		394		394			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		371		380		388		394		394		400			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Eulv		Eulv		Eulv		Eulv		Eulv		Eulv			
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.			
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO NUEVA #5 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	400		407		410		416									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X									
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		407		410		416		417									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Eulv		Eulv		Eulv		Eulv									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1106

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO NUEVA #5** **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO **FRENTE DE TRABAJO:** ATACO

PERIODO: 27 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL									417		429		437	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2									X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2									X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2									X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2									X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2									X		X		X	
	* De trabajo traseras	2									X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1									X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1									X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1									X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1									X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos									X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1									X		X		X	
	Alarma de retroceso	1									X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2									X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1									X		X		X	
	Palancas de mando	2									X		X		X	
	Pedales	Todos									X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo									X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos									X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos									X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2									X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1									X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas									X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas									X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1									X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2									X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2									X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos									X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo									X		X		X	
	Sistema de Dirección	1									X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas										X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4									X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL										429		437		443	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:										Erik		Erik		Erik	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:										Diana G.		Diana G.		Diana G.	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1107

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO NUEVA #5 MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	443															
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X															
	* De trabajo delanteras	2	X															
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X															
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X															
	* De stop y señal trasera	2	X															
	* De trabajo traseras	2	X															
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X															
	* Cinturón de seguridad	1	X															
	Extintor de incendio (10 ibs PQS)	1	X															
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X															
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X															
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X															
	Alarma de retroceso	1	X															
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X															
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X															
	Palancas de mando	2	X															
	Pedales	Todos	X															
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X															
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X															
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X															
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X															
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X															
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X															
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X															
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X															
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X															
	Mandos de levante del brazo	2	X															
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X															
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X															
	Sistema de Dirección	1	X															
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X															
	* Huellas en buen estado	4	X															
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		447															
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1108

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: BULLDOZER #5 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: JASMINIAS-MADROÑAL FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			3148		3156		3164		3172		3180		3181	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				3156		3164		3172		3180		3181		3188	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Jaider C.		Jaider C.		Jaider C.		Jaider C.		Jaider C.		Jaider C.	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1304

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: BULLDOZER #5 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: JASMINIAS-MADROÑAL FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 03 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3188		3195											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X											
	Palancas de mando	2	X		X											
	Pedales	Todos	X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X										
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X										
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X										
	Mandos de levante del brazo	2		X		X										
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3195		3206											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: | BULLDOZER #5 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: JASMINIAS-MADROÑAL | FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 11 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					3206		3220		3229		3233		3237	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2					X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos					X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2						X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						3220		3229		3229		3237		3245	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Fader C.		Fader C.		Fader C.		Fader C.		Fader C.	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: | BULLDOZER #5 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: JASMINIAS-MADROÑAL | FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 16 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3245		3254		3264									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3254		3264		3271									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Jader C.		Jader C.		Jader C.									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Dana O.		Dana O.		Dana O.									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: BULLDOZER #5 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: JASMINIAS-MADROÑAL FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 25 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					3271		3278		3286		3295		3303	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2					X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos					X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2						X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						3278		3286		3295		3303		3311	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Jader C.		Jader C.		Jader C.		Jader C.		Jader C.	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Jeer

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: | BULLDOZER #5 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: JASMINIAS-MADROÑAL | FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 30 DE JUNIO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3311															
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X															
	* De trabajo delanteras	2	X															
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X															
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X															
	* De stop y señal trasera	2	X															
	* De trabajo traseras	2	X															
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X															
	* Cinturón de seguridad	1	X															
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X															
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X															
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X															
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X															
	Alarma de retroceso	1	X															
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X															
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X															
	Palancas de mando	2	X															
	Pedales	Todos	X															
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X															
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X															
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X														
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X															
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X														
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X															
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X															
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X															
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X														
	Mandos de levante del brazo	2		X														
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X															
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X															
	Sistema de Dirección	1	X															
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X															
	* Huellas en buen estado	4	X															
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3319															
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Kelly C.															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana G.															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ATACO

MAYO- JUNIO DE 2025

REMANENTE COMBUSTIBLE CONTRATO ANTERIOR FRENTE ATACO

FRENTE	GLS
ATACO 1	180,844
ATACO 2 PAUJIL	60,162

1115

FRENTE ATACO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
5	26-may-25	8:46:08	107646	**21,000**	$ 222.180,00	ESTACION DISTRACOM	Mauricio Patiño V#15	FRENTE ATACO 1

TOTAL MES	21,000
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	180,844
TOTAL ACPM	201,844

CONSUMO MES	96,000
REMANENTE JUNIO	105,844

1226

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO: ATACO VEREDA : ATACO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: ATACO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(26)		MARTES (27)		MIERCOLES (28)		JUEVES(29)		VIERNES(30)		SABADO(31)		DOMINGO ()		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	EDISON ROJAS					20				25						45,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO	21								30						51,000
3																		

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES ( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES( )		VIERNES ( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	EDISON ROJAS															0,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO															0,000
3																		

OBSERVACIONES: Viene del contrato anterior 180,844 gl.Se trasladan 105,844 gl para el mes de Junio. 96,000

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

1117

FRENTE PAUJIL								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
6	31-may-25	10:33:04	107905	**51,910**	$ 549.208,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 2 PAUJIL
7	31-may-25	10:32:25	107906	**64,032**	$ 677.459,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 2 PAUJIL

TOTAL MES	115,942
REMANENTE CONTRATO ANTEIOR	60,162
TOTAL ACPM	176,104

CONSUMO MES	95,000
REMANENTE JUNIO	81,104

1228

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO: ATACO VEREDA : PAUJIL COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: PAUJIL

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(26)		MARTES (27)		MIERCOLES (28)		JUEVES(29)		VIERNES(30)		SABADO(31)		DOMINGO ()		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO					20	Jeider Camacho	25	Jeider Camacho			50	Jeider Camacho			95,000
2																		

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES ( )		MARTES ( )		MIERCOLES ( )		JUEVES( )		VIERNES ( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO															0,000
2																		

95,000

OBSERVACIONES: Viene del contrato anterior 60,162 gl.Se trasladan 81,104 gl para el mes de Junio.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Ortiz

VoBo COORDINADOR:

1229

FRENTE ATACO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
15	6-jun-25	12:43:21	108270	**62,498**	$ 660.604,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 1
24	6-jun-25	12:06:08	108262	**34,003**	$ 359.412,00	ESTACION DISTRACOM	Julio Cesar Barragan V#37	FRENTE ATACO 1
25	6-jun-25	12:17:02	108263	**60,562**	$ 640.140,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 1
150	20-jun-25	15:16:28	109188	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 1
151	20-jun-25	15:30:15	109194	**82,219**	$ 872.344,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 1

TOTAL MES	332,590
REMANENTE MES ANTERIOR	105,844
TOTAL ACPM	438,434

CONSUMO MES	361,003
REMANENTE JULIO	77,431

FRENTE ATACO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
16	6-jun-25	12:41:50	108271	**93,661**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 2 PANJI
17	6-jun-25	12:50:49	108273	**71,826**	$ 759.201,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 2 PANJI
18	6-jun-25	13:02:05	108275	**9,484**	$ 100.246,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 2 PANJI
148	20-jun-25	15:16:57	109187	**93,308**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 2 PANJI
149	20-jun-25	15:32:39	109191	**26,551**	$ 281.706,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO 2 PANJI

TOTAL MES	294,830
REMANENTE MES ANTERIOR	81,104
TOTAL ACPM	375,934

CONSUMO MES	375,934
REMANENTE JULIO	0,000

1220

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: ATACO 1 VEREDA : BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: BOCAS DE SAN PEDRO-CHILIRCO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO (1)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS																	0,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO															30		30,000
3	VOLQUETA	37	JULIO CESAR BARRAGAN																	0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (2)		MARTES (3)		MIERCOLES (4)		JUEVES (5)		VIERNES (6)		SABADO(7)		DOMINGO (8)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS	15																15,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO																	0,000
3	VOLQUETA	37	JULIO CESAR BARRAGAN									34,003								34,003
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (9)		MARTES (10)		MIERCOLES (11)		JUEVES (12)		VIERNES (13)		SABADO (14)		DOMINGO (15)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS					30						30						60,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO			30														30,000
3	VOLQUETA	37	JULIO CESAR BARRAGAN																	0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (16)		MARTES (17)		MIERCOLES (18)		JUEVES (19)		VIERNES (20)		SABADO (21)		DOMINGO (22)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS			30				30										60,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO					30												30,000
3	VOLQUETA	37	JULIO CESAR BARRAGAN																	0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (23)		MARTES (24)		MIERCOLES (25)		JUEVES (26)		VIERNES (27)		SABADO (28)		DOMINGO (29)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS											30						30,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO									12								12,000
3	VOLQUETA	37	JULIO CESAR BARRAGAN																	0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	NUEVA #5	EDINSON ROJAS	30																30,000
2	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO	30																30,000
3	VOLQUETA	37	JULIO CESAR BARRAGAN																	0,000
																				0,000

361,003

OBSERVACIONES: Viene 105,844 gls del mes de mayo. Remanente de 77,431 para el mes de julio.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Castiego

VoBo COORDINADOR:

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACION DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: ATACO 2 VEREDA : JASMINIAS-MADROÑAL COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: JASMINIAS-MADROÑAL

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO (1)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO													30	Jeider C.			30,000
																				0,000
																				0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (2)		MARTES (3)		MIERCOLES (4)		JUEVES (5)		VIERNES (6)		SABADO(7)		DOMINGO (8)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO	50	Jeider C.			50	Jeider C.											100,000
																				0,000
																				0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (9)		MARTES (10)		MIERCOLES (11)		JUEVES (12)		VIERNES (13)		SABADO (14)		DOMINGO (15)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO							30	Jeider C.			60	Jeider C.					90,000
																				0,000
																				0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (16)		MARTES (17)		MIERCOLES (18)		JUEVES (19)		VIERNES (20)		SABADO (21)		DOMINGO (22)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO	55,934	Jeider C.															55,934
																				0,000
																				0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (23)		MARTES (24)		MIERCOLES (25)		JUEVES (26)		VIERNES (27)		SABADO (28)		DOMINGO (29)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO					50	Jeider C.							50	Jeider C.			100,000
																				0,000
																				0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (30)		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO																	0,000
																				0,000
																				0,000
																				0,000

375,934

OBSERVACIONES: Viene 81,104 gls del mes de mayo.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Ortiz

VoBo COORDINADOR:

0122

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 26/05/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 21,000 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 26 de Mayo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Abaco

1223

dlstracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No REFA 10764b

Distribuciones y Transportes de C

NIT 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Sujeto Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

[illegible] 20/12/2024

Vto Vencimiento 21/12/2024

Naturaleza Credito

Cliente GOBERNACION DEL TOL

Contrato OC 125653

Nit 800113672

Direccion CR 5 CL 11 ED GO

Telefono 2611616

Placa OIT691

Kilometro 153060

Cedula 1005690434

Hora Ini 08 46 08

Hora Fin 08 52 28

Combustible DIESEL

Volumen 21.0000

Precio $10580

Total $222180

Panel MIC499

Lad/Man/Pos 1/1/1

Despachador CBHANDZ83 03

Empleado DEVIA BEJOS LEON

Validado ID Electronico

Entrego

Recibi

1005690434

Nombre

UTIS

VERSION 1

1024

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco (Paujil)
FECHA : 31/05/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 115,942 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 31 de Mayo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

1125

distracom

*COPIA(2)

Remision de Venta

No. REFK 107905

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distracomelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha Emision:	2025/05/31
Vencimiento:	2025/06/30
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	DC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:33:04
Hora Fin:	10:40:26
Combustible:	DIESEL
Volumen:	51.9100
Precio:	$10580
Total:	$549208
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Bullbozon

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 107906

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha Emision:	2025/05/31
Vencimiento:	2025/06/30
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	DC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:32:25
Hora Fin:	10:40:31
Combustible:	DIESEL
Volumen:	64.0320
Precio:	$10580
Total:	$677459
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	CBHAND283-02
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Bullbozon

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 06/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 157,063 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 06 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

1127

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108270
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATAC01
Kilometros: 0

Hora Ini: 12:43:21
Hora Fin: 12:50:31

Combustible: DIESEL
Volumen: 62.4980
Precio: $10570
Total: $660604

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283:03
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado ID Electronico

Entrego: ATAC0

Recibi:

Nombre:

1128

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 108262

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision	2025/06/06
Vencimiento	2025/07/06
Naturaleza	Credito

Cliente	GOBERNACION DEL TOL
Contrato	OC 125653
NIT	800113672
Direccion	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono	2611616
Placa	LTL736
Kilometros	30986
Cedula	800113672
Hora Ini	12:06:08
Hora Fin	12:15:30
Combustible	DIESEL
Volumen	34.0030
Precio	$10570
Total	$359412
Panel	MFC499
Lad/Man/Pos	1/1/1
Dispositivo	CBHAND283 03
Empleado	LUISA FERNANDA GA

Validado ID Electronico

Entrego: ~~IBAGUE~~

Recibi: ATACO1

Nombre: JOF #37

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 108263

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL 3137434826

Fecha remision	2025/06/06
Vencimiento	2025/07/06
Naturaleza	Credito

Cliente	GOBERNACION DEL TOL
Contrato	OC 125653
NIT	800113672
Direccion	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono	2611616
Placa	IBAGUE
Control	Ibague
Kilometros	0
Hora Ini	12:17:02
Hora Fin	12:24:08
Combustible	DIESEL
Volumen	60.5620
Precio	$10570
Total	$640140
Panel	MFC499
Lad/Man/Pos	1/1/1
Dispositivo	CBHAND283 03
Empleado	LUISA FERNANDA GA

Validado ID Electronico

Entrego: ~~IBAGUE~~

Recibi: ATACO1

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 20/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 175,527 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109194
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/20
Vencimiento: 2025/07/20
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATAC01
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 15:30:15
Hora Fin: 15:41:35

Combustible: DIESEL
Volumen: 82.2190
Precio: $10610
Total: $872344

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego: ATAC 1 KIT

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 109188
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/20
Vencimiento: 2025/07/20
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATAC01
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 15.16:28
Hora Fin: 15:30:09

Combustible: DIESEL
Volumen: 93.3080
Precio: $10610
Total: $990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego: KIT ATAC0

Recibi:

Nombre:

1131

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco (Paujil)
FECHA : 06/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 174,971 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 06 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

1032

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108271
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATACO
Kilometros: 0

Hora Ini: 12 41 50
Hora Fin: 12:53:57

Combustible: DIESEL
Volumen: 93.6610
Precio: $10570
Total: $990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: CBHAND283-03
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:
ATAG Buldoz

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108273
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATACO
Kilometros: 0

Hora Ini: 12:50:49
Hora Fin: 13:00:47

Combustible: DIESEL
Volumen: 71.8260
Precio: $10570
Total: $759201

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:
Buldoz ATAG.

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 108275
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/06/06
Vencimiento: 2025/07/06
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATACO
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:02:05
Hora Fin: 13:03:56

Combustible: DIESEL
Volumen: 9.4840
Precio: $10570
Total: $100246

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:
Buldoz ATAG

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco (Paujil)
FECHA : 20/06/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 119,859 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de Junio del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

1134

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 109187

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
NIT:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO2
Kilometros:	0
Hora Ini:	15:16:57
Hora Fin:	15:28:42
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.3080
Precio:	$10610
Total:	$990060
Panel:	MTC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283 03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego: Bolleza ATACO2

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(2)

Remision de Venta

No. REFK 109191

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomelltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/06/20
Vencimiento:	2025/07/20
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
NIT:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO2
Kilometros:	0
Hora Ini:	15:32:39
Hora Fin:	15:37:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	26.5510
Precio:	$10610
Total:	$281706
Panel:	MTC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	CBHAND283 03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego: Kit ATACO2

Recibi:

Nombre:
