Ingeniera
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	SEPTIEMBRE 2025

Respetada Ingeniera

De conformidad con lo establecido en la resolución 970 del 2 de abril de 2024, "(…) Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el capítulo correspondiente a la Supervisión de Contratos y Convenios (…)" y de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 denominado: OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, así:

"(…)3.1.33 Apoyar la Supervisión en la remisión al archivo de Gestión, de todos los documentos que se generen en el desarrollo del contrato o convenio e informar a este, en caso de requerirse su actualización, realizando el debido seguimiento o gestiones para mantener actualizado el mismo. De acuerdo con las políticas de seguridad y Privacidad de la Información, establecidas por la entidad (…)"

Y oficio **2024S-VBOG-005279 del 31 de enero de 2025**, mediante el cual se notifica DESIGNACIÓN como apoyo a la supervisión; dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	4227 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA	**NIT:**	891.680.089-4
CONFORMACION:	No Aplica		
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre 2024	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-091015

Valor Inicial:	$ 8.700.000.000,00
Valor Adiciones:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 8.700.000.000,00
Anticipo Entregado:	$ 4.350.000.000,00
Anticipo Amortizado:	$ 532.899.976,00
Saldo por Amortizar:	$ 3.817.100.024,00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Suspensión 1	N.A
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124124	14/11/2024	NACIÓN	10	$ 3.200.000.000	$ 2.763.322.024,00
		NACIÓN	10	$ 5.500.000.000	$ 1.053.778.000,00

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar
							$ 4.350.000.000,00
1	DICIEMBRE 2024.	$ 96.222.000,00	$ -	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00
2	ENERO 2025.	$ 96.222.000,00	$ -	$ 192.444.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00
3	FEBRERO 2025	$ 185.122.000,00		$ 377.566.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00
4	MARZO 2025	$ 235.568.000,00		$ 613.134.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00
5	ABRIL 2025	$ 114.126.000,00		$ 727.260.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00
6	MAYO 2025	$ 182.492.000,00		$ 909.752.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00
7	JUNIO 2025	$ 156.047.952,00		$ 1.065.799.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00
8	JULIO 2025.	$ 266.818.400,00		$ 1.332.618.352,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00
9	AGOSTO 2025	$ 1.958.563.885,74		$ 3.291.182.237,74	$ 979.281.942,87	$ 979.281.942,87	$ 2.704.408.881,13
TOTALES		$ 3.291.182.237,74		$ 3.291.182.237,74	$ 1.645.591.118,87	$ 1.645.591.118,87	$ 2.704.408.881,13

}AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 42%
% Básico ejecutado acumulado: 58%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…diciembre	…1
…agosto	…2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 870.000.000	3002762 Anexo 5 – Prórroga 1	23/12/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 4.300.000.000		23/12/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 1.740.000.000		23/12/2024	01/01/2029
Calidad de los Servicios	$ 2.610.000.000		23/12/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y

				RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…			

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4262 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC	**NIT:**	891.800.330-1
CONFORMACIÓN:	N.A		
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre de 2024	**No. Oficio:**	2024S-VBOG-087817
Valor Inicial:	$ 2.375.000.000,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 2.375.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 1.187.500.000,00		
Anticipo Amortizado:	$ 201.231.909,50		
Saldo por Amortizar:	$ 986.268.090,50		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Suspensión 1	N.A		
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124024	14/11/2024	NACIÓN	10	$2.300.000.000	$ 911.268.090,50
		NACIÓN	10	$75.000.000	$ 75.000.000

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar
							$ 1.187.500.000,00
1	DICIEMBRE 2024.	$ 45.222.400,00	$ -	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ENERO DE 2025.	$ 6.159.800,00		$ 51.382.200,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
3	FEBRERO 2025.	$ 84.109.000,00		$ 135.491.200,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00
4	MARZO 2025.	$ 114.346.000,00		$ 249.837.200,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00	$ 1.062.581.400,00
5	ABRIL 2025.	$ 35.970.200,00		$ 285.807.400,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00	$ 1.044.596.300,00
6	MAYO 2025.	$ 51.962.000,00		$ 337.769.400,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00	$ 1.018.615.300,00
7	JUNIO 2025.	$ 64.694.419,00		$ 402.463.819,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50	$ 986.268.090,50
8	JULIO 2025.	$ 148.418.477,00		$ 550.882.296,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50	$ 912.058.852,00
9	AGOSTO 2025.	$ 576.278.477,00		$ 1.127.160.773,00	$ 288.139.238,50	$ 288.139.238,50	$ 623.919.613,50
						$ -	
TOTALES		$ 1.127.160.773,00	$ -	$ 1.127.160.773,00	$ 563.580.386,50	$ 563.580.386,50	$ 623.919.613,50

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…diciembre	…1
…agosto	…2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Berkley International Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento del Contrato	$ 237.500.000	83183 Anexo 4– Según Mod y y 2	12/11/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 1.187.500.000		12/11/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 475.000.000		12/11/2024	31/12/2028
Calidad de los Servicios	$ 712.500.000		12/11/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…


ASPECTOS TÉCNICOS:

Para el presente periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Componente Técnico:

Se realizó recorrido a la zona del proyecto, donde se identificó el difícil acceso.

Recorrido al corredor (41Km) y verificación de trabajos de campo tanto topografía como geotecnia.

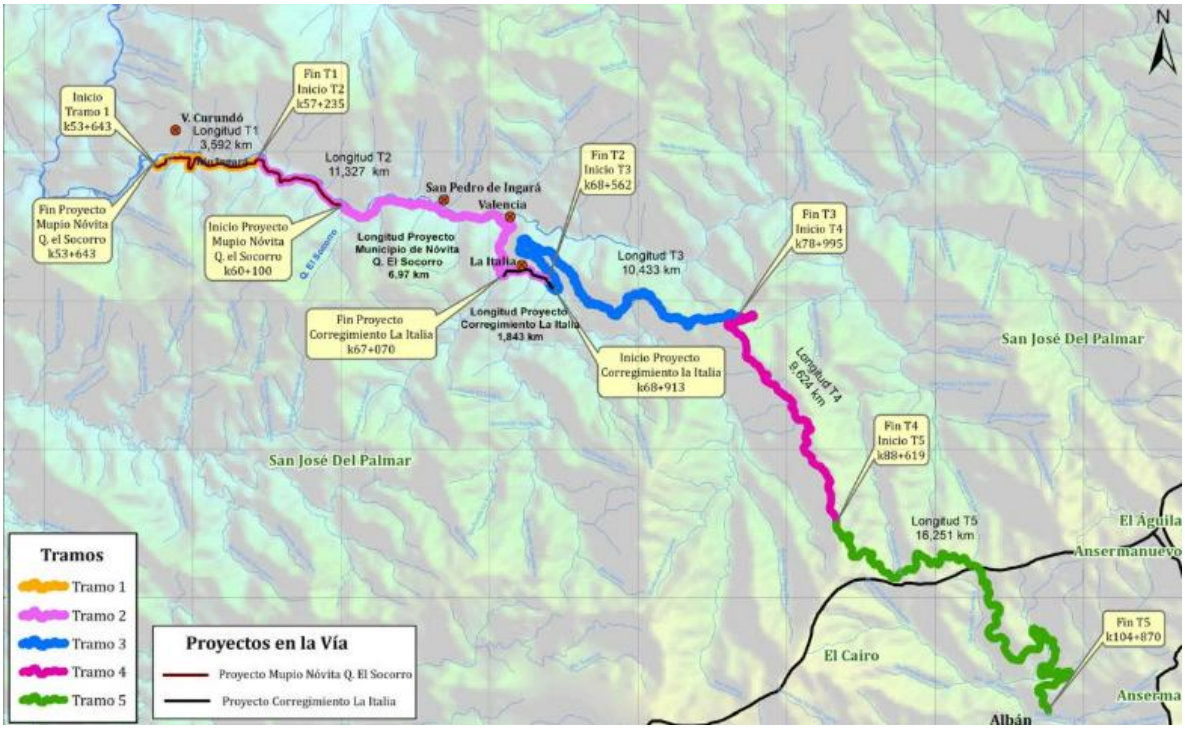

Se realizo comité técnico de, se estableció por parte del profesional de apoyo que las actas de costos tanto de la consultoría como de la interventoría deben ser remitidas al el para su revisión y observaciones, así mismo cuando las actas estén subsanadas él las remitirá al supervisor del contrato de interventoría y dará el trámite en el INVIAS.

El propósito de esta jornada es verificar el avance de las actividades, evaluar el cumplimiento de los requerimientos establecidos y concertar, junto con los actores involucrados, las fases pendientes de desarrollo.

Se observó:
Realización de perforaciones en elementos estructurales de concreto mediante equipo extractor de núcleos cilíndricos, con el fin de obtener muestras representativas para la evaluación de la resistencia a la compresión, conforme a los procedimientos establecidos en la norma ASTM C42/C42M.

- Las actividades se realizaron en los siguientes puntos:
- (Puente el socorro) en tramo dos (2)
- (Puente Toro viejo), oreel rio toro viejo

Topografía: Las actividades se enfocaron en la verificación geométrica y la definición precisa de puntos de control geodésico, mediante los siguientes trabajos:

- Reconocimiento y registro de los mojones existentes en campo y determinación precisa de coordenadas mediante sistemas GNSS (como GPS, GLONASS, Galileo) entre la ubicación física y los registros cartográficos o planos oficiales para validar su correspondencia.

- Determinación de coordenadas longitudinales para la verificación geométrica del alineamiento del eje vial, a partir de un análisis de la congruencia entre el diseño teórico del eje y su materialización en campo y la correcta disposición del eje de la vía en planta, asegurando que cumpla con los parámetros de diseño geométrico establecidos.
- Establecer físicamente los mojones en el terreno para la identificación visual y cartográfica de los puntos y/o instalación permanente de estructuras que marcan límites o puntos de control geodésico, desde el punto conocido como cruce el Cairo, tramo (5), K104+870 m.
- Implantar físicamente los vértices en el terreno para la materialización de la poligonal, mediante el posicionamiento de mojones o hitos georreferenciados, garantizando su estabilidad, visibilidad y exactitud conforme a los parámetros del levantamiento topográfico.










26 sept 2025 11:16:14 a. m.
Contrato 4262 de 2024











CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE NÓVITA
COCOMAN
BIENVENIDOS
al Consejo Comunitario Mayor de Nóvita
COCOMAN





Se observó que se realizaron las siguientes actividades en campo:

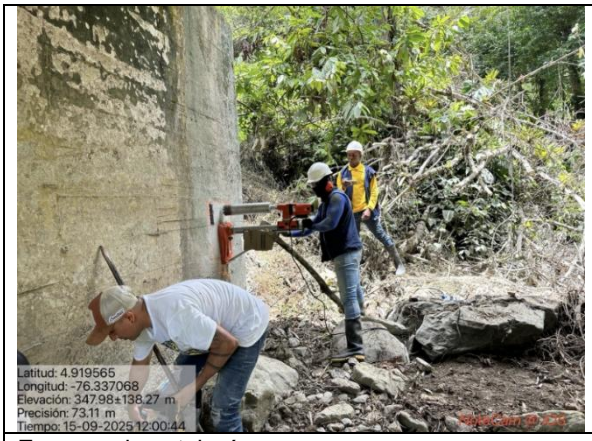	
Ensayos de patología Punto inicio puente sobre quebrada el socorro Ensayo de extracción de núcleo, carbonatación y esclerometría	Ensayos de patología Punto inicio puente sobre quebrada el socorro Ensayo de extracción de núcleo, carbonatación y esclerometría

Ensayos de patología Punto inicio puente sobre quebrada el Toro sobre la entrada a la Italia Ensayo de extracción de núcleo, carbonatación y esclerometría	Ensayos de patología Punto inicio puente sobre quebrada el Toro sobre la entrada a la Italia Ensayo de extracción de núcleo, carbonatación y esclerometría

	
Ensayos de patología puente sobre río habitad sobre la salida a la Italia Ensayo de extracción de núcleo, carbonatación y esclerometría	Ensayos de patología puente sobre río habitad sobre la salida a la Italia Ensayo de extracción de núcleo, carbonatación y esclerometría

	
K4+400 donde termina el pavimento desde palmar hacia crucero Ensayo de extracción de núcleos	K4+400 donde termina el pavimento desde palmar hacia crucero Ensayo de extracción de núcleos

ASPECTOS JURÍDICOS.

Para el presente periodo no se adelantaron aspectos jurídicos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se encuentra al día en facturación tanto el contrato de consultoría como el de interventoría

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

No hay reporte para el presente periodo.

Cordialmente,
