Ingeniera
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	AGOSTO 2025

Respetada Ingeniera

De conformidad con lo establecido en la resolución 970 del 2 de abril de 2024, "(…) Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el capítulo correspondiente a la Supervisión de Contratos y Convenios (…)" y de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 denominado: OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, así:

"(…)3.1.33 Apoyar la Supervisión en la remisión al archivo de Gestión, de todos los documentos que se generen en el desarrollo del contrato o convenio e informar a este, en caso de requerirse su actualización, realizando el debido seguimiento o gestiones para mantener actualizado el mismo. De acuerdo con las políticas de seguridad y Privacidad de la Información, establecidas por la entidad (…)"

Y oficio **2024S-VBOG-005279 del 31 de enero de 2025**, mediante el cual se notifica DESIGNACIÓN como apoyo a la supervisión; dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	4227 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA	**NIT:**	891.680.089-4
CONFORMACION:	No Aplica		
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre 2024	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-091015

Valor Inicial:	$ 8.700.000.000,00
Valor Adiciones:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 8.700.000.000,00
Anticipo Entregado:	$ 4.350.000.000,00
Anticipo Amortizado:	$ 532.899.976,00
Saldo por Amortizar:	$ 3.817.100.024,00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Suspensión 1	N.A
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124124	14/11/2024	NACIÓN	10	$ 3.200.000.000	$ 2.763.322.024,00
		NACIÓN	10	$ 5.500.000.000	$ 1.053.778.000,00

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AMORTIZACIÓN	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	96.222.000,00	48.111.000,00	48.111.000,00
Acta 2 enero 2025	96.222.000,00	48.111.000,00	48.111.000,00
Acta 3 febrero 2025	185.122.000,00	92.561.000,00	92.561.000,00
Acta 4 marzo 2025	235.568.000,00	117.784.000,00	117.784.000,00
Acta 5 mayo 2025	114.126.000,00	57.063.000,00	57.063.000,00
Acta 6 junio 2025	182.492.000,00	91.246.000,00	91.246.000,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 36,74%
% Básico ejecutado acumulado: 21,72%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 870.000.000	3002762 Anexo 5 – Prórroga 1	23/12/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 4.300.000.000		23/12/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 1.740.000.000		23/12/2024	01/01/2029
Calidad de los Servicios	$ 2.610.000.000		23/12/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…			

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4262 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC	**NIT:**	891.800.330-1
CONFORMACIÓN:	N.A		
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre de 2024	**No. Oficio:**	2024S-VBOG-087817
Valor Inicial:	$ 2.375.000.000,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 2.375.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 1.187.500.000,00		
Anticipo Amortizado:	$ 201.231.909,50		
Saldo por Amortizar:	$ 986.268.090,50		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Suspensión 1	N.A		
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124024	14/11/2024	NACIÓN	10	$2.300.000.000	$ 911.268.090,50
		NACIÓN	10	$75.000.000	$ 75.000.000

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AMORTIZACIÓN	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	45.222.400	22.611.200	22.611.200
Acta 2 enero 2025	6.159.800,00	3.079.900,00	3.079.900,00
Acta 3 febrero 2025	84.109.000,00	42.054.500,00	42.054.500,00
Acta 4 marzo 2025	114.346.000,00	57.173.000,00	57.173.000,00
Acta 5 abril 2025	35.970.200,00	17.985.100,00	17.985.100,00
Acta 6 mayo 2025	51.962.000,00	25.981.000,00	25.981.000,00

Acta 7 junio 2025	64.694.419,00	32.347.209,50	32.347.209,50

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Berkley International Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 237.500.000	83183 Anexo 4– Según Mod y y 2	12/11/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 1.187.500.000		12/11/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 475.000.000		12/11/2024	31/12/2028
Calidad de los Servicios	$ 712.500.000		12/11/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

ASPECTOS TÉCNICOS:

Para el presente periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Componente Técnico:

El proyecto tiene como fecha de finalización el 30 de noviembre de 2025.

Las actas de costos correspondientes al mes de noviembre serán radicadas a inicios de diciembre, se proyectan con un saldo del 10 % del valor de los contratos, según lo estipulado en el Acta de Modificación No. 2. Esta proyección tiene en cuenta la recepción de entregas parciales en septiembre y entregas finales en octubre de 2025.

Se estima que podría quedar un saldo no ejecutable cercano a los $300 millones, según fue informado por el consultor durante el último comité semanal. Sin embargo, esta situación está sujeta a la ejecución o no de actividades ambientales que dependen de la respuesta del Ministerio del Interior respecto a la procedencia de consultas previas, así como de las determinaciones en materia de planes de manejo arqueológico.

A la fecha, se han ejecutado la totalidad de los trabajos de campo, y el proyecto no presenta dificultades técnicas ni operativas para su ejecución.




En cuanto a la dimensión social, el proyecto ha tenido una excelente acogida por parte de la comunidad, incluyendo líderes sociales y representantes de entidades locales, según lo evidenciado en la jornada de socialización realizada el 5 de agosto de 2025 en la ciudad de Leticia.

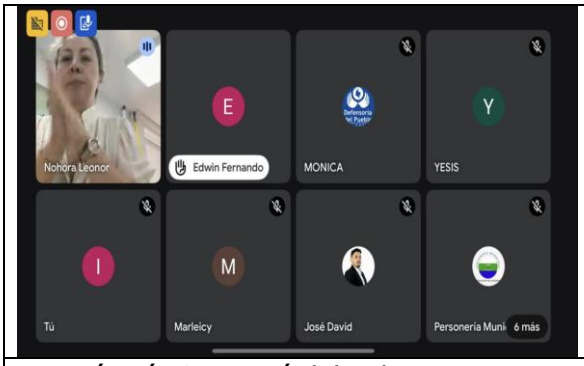
Se realizo comité técnico de seguimiento semanal el día 12 de agosto de 2025
La consultoría envío plan de contingencia No 03, reprogramación de actividades y flujo de caja actualizado
Se realizo reunión técnica componente BIM con la interventoría, INVIAS y consultoría el día 14 de agosto de 2025
Asistencia a reunión convocada por la Procuraduría general de Risaralda en donde se abordaron los siguientes temas:

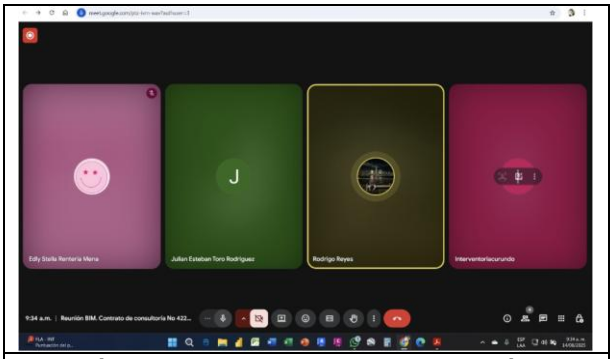
- Presentación del informe sobre la emergencia presentada en el mes de agosto en el punto crítico del sector La Virgen e informe de los compromisos establecidos en

la reunión sostenida entre la Alcaldía de San José del Palmar y Gobernación del Valle.

- Gobernación del Valle del Cauca: Avance en la ejecución del convenio con el Comité de Cafeteros para la mitigación del riesgo en la vía.
- Gobernación del Chocó: Informe sobre el estado del contrato de mantenimiento que actualmente se ejecuta en el sector la Virgen en San José del Palmar
- Avance en la ejecución del contrato de estudios y diseños de la vía San José del Palmar – El Cairo. En ambos casos, indicar el estado de cumplimiento del cronograma de obras

	
Comité técnico de seguimiento semanal 12/08/2025	Comité técnico de seguimiento semanal 12/08/2025
	
Reunión vía San José del Palmar-Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025	Reunión vía San José del Palmar-Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025

	
Reunión vía San José del Palmar-Convocada por la procuraduría general de Risaralda 13/08/2025	Reunión BIM Especialistas interventoría, consultoría, INVIAS 14/08/2025



Reunión BIM Especialistas interventoría, consultoría, INVIAS 14/08/2025

Revisión de información secundaria: Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa: Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

Adquisición de cartografía y demás información técnica: Esta actividad consistió en la obtención y análisis de cartografía e información técnica necesaria para el proyecto, enfocándose en el cálculo de los parámetros morfométricos de las cuencas hidrográficas. Los resultados permiten caracterizar la forma, dimensión y dinámica de las cuencas, lo cual es fundamental para la planificación, diseño y evaluación de los estudios ambientales e hidrológicos del proyecto.

Gestión administrativa orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

Sección de trabajo dedicada al análisis de las alternativas de modificación del alcance del proyecto: Se llevo a cabo la sección de trabajo enfocada en el análisis detallado de las distintas alternativas para modificar el alcance del proyecto. Se evalúan las opciones disponibles considerando sus impactos técnicos, económicos y sociales, con el fin de identificar la mejor alternativa que permita optimizar los resultados del proyecto sin afectar sus objetivos principales. Este análisis es fundamental para la toma de decisiones informadas y para asegurar que cualquier cambio en el alcance se gestione de manera adecuada, garantizando la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Reunión para el análisis de información secundaria y seguimiento de los avances del componente predial: Fue realizada con el propósito de revisar la información secundaria disponible y evaluar los avances del componente predial, identificando hallazgos y definiendo acciones a seguir para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto

En cumplimiento de los compromisos establecidos por la consultoría, se entregó para su revisión y evaluación el documento de análisis de alternativas de modificación del alcance del proyecto, con sus respectivos anexos, así como la propuesta de ajustes al desarrollo BIM, el flujo de caja y la reprogramación de actividades.

Secciones de trabajo para la revisión de oficios pendientes por enviar a entidades, reiteraciones y aclaraciones con base a información cartográfica: Consistió en organizar y estructurar el trabajo relacionado con los oficios pendientes de envío a diferentes entidades. Incluye la revisión detallada de cada documento para asegurar que la información sea correcta y completa, la identificación de casos donde se requiera reiterar información o aclarar datos previos, y la verificación de la información cartográfica que respalda los contenidos, garantizando así la precisión y consistencia de los oficios antes de su remisión.

Reunión con especialista social para revisar los avances en la estructuración del componente social en el volumen 17: Esta reunión tiene como objetivo evaluar el progreso en la elaboración del componente social del Volumen 17, identificando los avances alcanzados, los aspectos pendientes y las recomendaciones del especialista para asegurar la correcta estructuración y cumplimiento de los lineamientos establecidos. Se busca garantizar que la información social esté completa, coherente y alineada con los objetivos del proyecto.

Comité de seguimiento virtual con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría

Comité de seguimiento virtual realizado el 21 de agosto de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

Reunión para la revisión y uso de herramienta para los estudios de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto – 22 de agosto de 2025: Se revisaron los requerimientos técnicos del volumen de presupuesto. Asimismo, se empleó Plexos Project como herramienta de apoyo para la organización y gestión del presupuesto, facilitando el control, la planificación y la asignación eficiente de los recursos.


Elaboración de oficios dirigidos a entidades gubernamentales y privadas: Se desarrolló la redacción de comunicaciones oficiales con el objetivo de solicitar información técnica y/o administrativa relevante para el avance del proyecto. Esta actividad es clave para obtener insumos necesarios para los estudios y diseños, así como para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos con las comunidades y demás actores involucrados.

Entrega del informe preliminar del Volumen IX – Estudio de Hidráulica, hidrogeología y socavación.

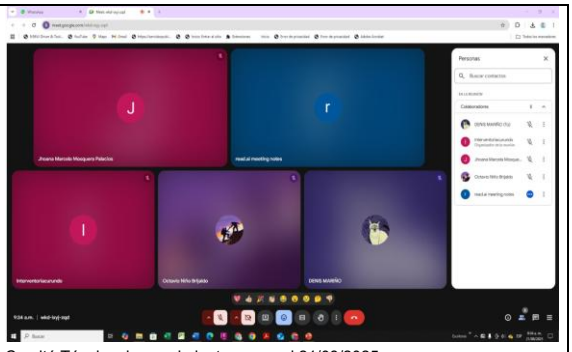
Logística para el ingreso a campo para el levantamiento de información primaria del componente de Topografía, Geotecnia y Patología.

Ajuste al diagnóstico técnico y financiero (propuesta para el acta de modificación N°2).

Reunión técnica en conjunto del componente de estructura, residente de campo y el coordinador técnico con el propósito de ubicar las coordenadas de los puentes alrededor del corredor.



Reunión convocada por el ministerio del interior



Comité Técnico de seguimiento semanal 21/08/2025

Comité de seguimiento virtual realizado el 25 de agosto de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

Planeación y levantamiento de información para el ingreso a campo de los componentes social, forestal y biológico – 25 de agosto de 2025: Se llevó a cabo una mesa de trabajo con los profesionales de la consultoría de los componentes social, biológico y forestal, con el propósito de socializar los ajustes en los tramos definidos para la ejecución de actividades de campo, y de esta manera realizar la planeación y organizar el levantamiento de la información correspondiente en territorio.

Ingreso a campo de los componentes de Topografía, Geotecnia y Patología – 25 y 26 de agosto de 2025: Entre el 25 y 26 de agosto de 2025 se realizó el ingreso a campo de los equipos profesionales de los componentes de topografía, geotecnia y patología, con el objetivo de adelantar el levantamiento de información, la toma de muestras, la exploración geotécnica del eje de la vía y la evaluación patológica correspondiente


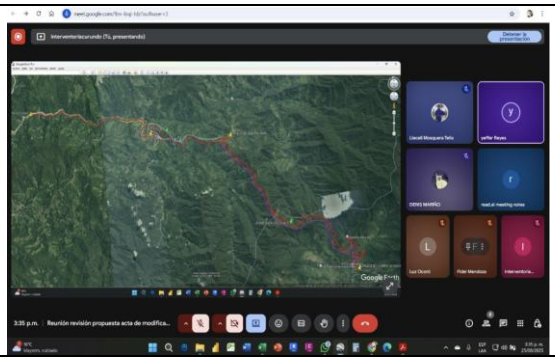
Comité de seguimiento mensual: Se llevó a cabo el 27 de agosto de 2025 en la ciudad de Bogotá, con participación presencial del equipo de consultoría, interventoría y del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)

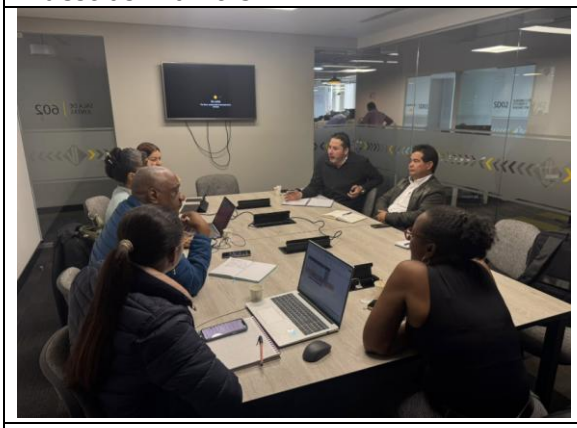
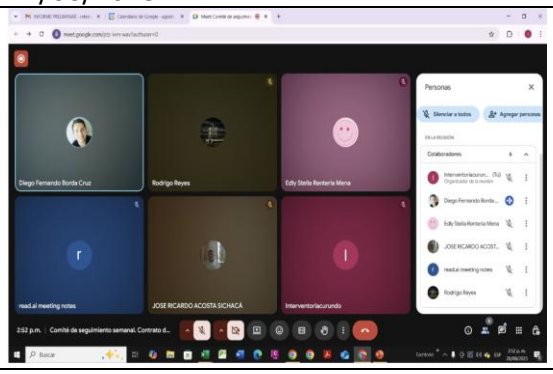
Seguimiento virtual realizado el 28 de agosto de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

Entrega de los informes preliminares correspondientes a:

- 1.Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
- 2.Volumen XI: Estudio de diseño de estructuras.
- 3.Volumen XII. Estudio de urbanismo y paisajismo
- 4.Volumen XIV. Estudio de riesgos
- 5.Volumen XV: Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones.
- 6.Volumen XVII. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.

Mesa de trabajo del volumen de presupuestos para la revisión de los cálculo de rendimientos de equipos – 30 de agosto de 2025: La actividad se centró en la elaboración de cuadros comparativos y cálculos de rendimiento de equipos de construcción, integrando tanto parámetros teóricos como prácticos. Para ello, se analizaron las capacidades operativas de cada equipo, las condiciones del terreno y los tiempos de operación, incorporando factores de corrección que permiten ajustar los valores estimados a escenarios reales. De esta manera, se logró obtener una aproximación más confiable del desempeño de los equipos, lo que facilita la planificación, la estimación de costos y la optimización de los recursos en proyectos de construcción.

	
Comité técnico de seguimiento semanal 25/08/2025	Comité técnico de seguimiento semanal 25/08/2025
	
Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5	Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5
	
Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5	Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5

	
Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5	Ensayos DCP cada 300 metros con toma de muestras Tramo 5
	
Comité Técnico de seguimiento Mensual 27/08/2025	Comité Técnico de seguimiento Mensual 27/08/2025
	
Comité técnico de seguimiento semanal 28/08/2025	Comité técnico de seguimiento semanal 28/08/2025

ASPECTOS JURÍDICOS.

Para el presente periodo no se adelantaron aspectos jurídicos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
En tramite acta de costo del mes de julio.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
El 16 de julio se adelantó comisión en la ciudad de Quibdó, cuyo objeto fue "*Participación socialización al consejo comunitario de COCOMAN".*

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

No hay reporte para el presente periodo.

Cordialmente,



YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ
CONTRATISTA
CC 7179871
CTO 798 DE 2025
