GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**4**	FECHA:	**8**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**20**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	AL	**19**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**								

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Departamento de Boyacá, Provincia centro, Municipio de Tunja, casco urbano, calle 59 entre Av. Universitaria y carrera 2 Este (Antigua via a Paipa)

INFORMACION GENERAL

ENTIDAD TERRITORIAL	
GOBERNACION DE BOYACA	**MUNICIPIO DE TUNJA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO	**LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA**
Teléfono: 7 420150 Dirección CLL 20 # 9-90 Tunja (Boy)	Teléfono: 7405770 Ext 1100 Dirección Cll 19 # 9 -95 Ed. Municipal
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 1/04/2025	-

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
$ 4.835.148.229,44	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.835.148.229,44**

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: PROYECTO BPIN No. 2024 00415 0443 - A1

El municipio de Tunja celebró previamente los contratos de obra e interventoria Nos. 1557 de 2023 y 1639 de 2023 respectivamente, para la "Construcción y mejoramiento del tramo vial de la calle 59 entre la vía antigua a Paipa (Carrera 2 a Este) y la Avenida Universitaria". Previa suscripción del convenio No. 1940 de 2025, el estado y alcance de los contratos citados contempla "la construcción de la calzada Norte con obras de espacio público y puente vehicular 1 sobre el rio jordán, la construcción de la calzada sur entre el K0+000 (sector Carrera 2 y el cruce Férreo K0+075), la construcción de la infraestructura del puente vehicular 2 en la calzada sur (Cimentación y Vigas de Cimentación) y la construcción del cruce férreo. Dichas actividades son financiadas con recursos del municipio y Otros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al presente informe cero)

Con la anterior aclaración y de acuerdo al proyecto de inversión BPIN No. 2024 0415 0443 - A1, se resume el alcance del convenio 1940/2025 mediante la construcción de las siguientes obras en la calzada sur (eje 1): espacio público (ciclovia y sendero peatonal) entre la carrera 2 este y el conjunto residencial Hayuelos (K0+000 al K0+190), calzada vehicular sur entre el cruce férreo y el acceso al conjunto Hayuelos (K0+070 al K0+190), incluyendo losas de acceso y superestructura del puente vehicular de 30m de luz sobre le rio Jordán, señalización vertical y horizontal, pozos y sumideros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. LP-AMT-0012023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	1/02/2023
Estudios Previos	1/02/2023
Proyecto de pliego de condiciones	NO APLICA
Pliego de condiciones definitivos	1/02/2023
Acto de adjudicación	17/06/2023

Gobernación de Boyacá		VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME No:	4	FECHA:	8	de	OCTUBRE	de	2025				
PERIODO: DEL	20	de	AGOSTO	de	2025	AL	19	de	SEPTIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025								

Link del proceso:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3905187&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. CM-AMT0022023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	30/03/2023
Estudios Previos	30/03/2023
Proyecto de pliego de condiciones	NO APLICA
Pliego de condiciones definitivos	30/03/2023
Acto de adjudicación	17/06/2023

Link del proceso:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4241140&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR INICIAL:	ADICIONALES MPIO/OTROS:	ADICIONAL CNV GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL:
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA NIT 891.800.846-1	$ 9.031.645.799,00	$ 578.429.718,63	**$ 4.518.872.292,37**	$ 14.128.947.810,00

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA No. 1557 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA".

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO HAYUELOS - NIT. 901.725.176-8	**LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS - C.C. 9.523864**
Teléfono: 3192451875 Dirección Km 2 vía Cajicá-Chía Ed. Belenus Of 504	Teléfono: 3192451875 Dirección jpena@femeingenieria.com

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR INICIAL:	ADICIONALES MPIO/OTROS:	ADICIONAL CONVENIO	VALOR TOTAL:
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA NIT 891.800.846-1	$ 714.000.000,00	$ 99.369.520,93	**$ 316.275.937,07**	$ 1.129.645.458,00

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1639 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA"

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO TUNJA JI 2 - NIT: 901728023-3	**JORGE E PARRA SALINAS - C.C. 79.262.203**
Teléfono: (601)6129434 Dirección: Cll 125 # 20 70 Of. 602 BOGOTÀ	Teléfono: (601)6129434 Dirección: jpsingenieria@gmail.com.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**


INFORME No:	**4**	FECHA:	**8**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**		
PERIODO: DEL	**20**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	AL	**19**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**						

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	20	5	2025	17	7	2023	17	7	2023
PLAZO INICIAL	6 MESES			05 MESES, 14 DIAS			05 MESES, 14 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	19	11	2025	31	12	2023	31	12	2023
ADICIONES EN PLAZO	-			17 meses y 6 dias			17 meses y 6 dias		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	19	11	2025	7	11	2025	7	11	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**91,4%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**66,7%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO PRINCIPAL CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

De acuerdo al informe No. 4 con corte al 19/09/2025, presentado por el municipio mediante oficio 1.10-3 292 y subsanado por correo electrónico de fecha 07/10/2025, y según informe de interventoria No. 22 con corte a sept/2025, se reporta avance fisico del 91,4% representado en las siguientes actividades del convenio: Cerramiento, Excavaciones, Pedraplen, Afirmado, Subbase granular, Geotextil para estabilización y separación de capas granulares, Losetas, Bordillos, Solados, Concreto elevaciones 300psi, Concreto placas y vigas 4000psi, Acero refuerzo PDR60, Estructura metálica puente vehicular, Apoyos en neopreno, Mortero grouting anclajes.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	20	5	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	06 meses

GOBERNACIÓN DE Boyacá		VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME No:	4	FECHA:	8	de	OCTUBRE	de	2025				
PERIODO: DEL	20	de	AGOSTO	de	2025	AL	19	de	SEPTIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025								

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	882-000060-82	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	SUCURSAL:	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1940 DE 2025				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
DESEMBOLSO INICIAL (Comprobante Egreso No. 8314)	50%	4	6	2025	$ 2.417.574.114,72
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 2.417.574.114,72**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN			LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
A - ETAPA PRECONTRACTUAL DE OBRA (previa suscripción de convenio)			Proceso Secop: LP-AMT-0012023
B - ETAPA PRECONTRACTUAL DE INTERVENTORIA (previa suscripción de convenio)			Proceso Secop: CM-AMT0022023
C - EJECUCIÓN DE OBRA			
DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD FUNCIONAL Obras calzada sur (eje 1)	AVANCE APROX	%	
1. PAVIMENTACIÓN CALZADA VEHICULAR SUR (K0+070 AL K0+190), ESPACIO PÚBLICO (CICLOVIA Y SENDERO PEATONAL - K0+000 AL K0+190)			
PRELIMINARES			
Excavación de cortes, canales y prestamos en material común a maquina incluye cargue y acarreo libre de 5 km	(563/563) m3	100%	K0+170 - K0+185
AFIRMADOS, SUBBASES, BASES			
Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para afirmado hasta un diámetro de 2" y un índice plástico igual o menor a 9% y compacto al 95% del proctor (incluye al 5km)	(1143/1143) m3	100%	K0+085 - K0+132
Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (incluye acarreo libre de 5km)	(203/214) m3	95%	K0+085 - K0+132
Suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para base granular (incluye acarreo libre de 5km	(15/131) m3	11%	
Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).	(35160/35160) m3-km	100%	K0+085 - K0+132
CARPETA ASFALTICA			
Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H	(335/1708) m2	20%	
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL			
Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (incluye acarreo libre de 5km)	(125/145) m3	86%	K0+000 - K0+070
Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).	(2450/2755) m3-km	89%	K0+000 - K0+070
Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10, incluye mortero de pega segun NORMA NTC-4109	(70/150) ml	47%	
Suministro e instalación de adoquín peatonal concreto 6 cm	(115/299) m2	38%	K0+000 - K0+070
Construcción de carpeta asfáltica en caliente tipo MDC 10 espesor 7,5 cm, incluye suministro y compactación , acarreo libre de 10km	(130/308) m2	42%	
Suministro e instalación loseta podotáctil guía (líneas) 40*40 cm	(55/72) m2	76%	K0+000 - K0+070
Suministro e instalación loseta podotáctil alerta (puntos) 40*40 cm	(60/80) m2	75%	K0+000 - K0+070

INFORME No:	4	FECHA:	8	de	OCTUBRE	de	2025				
PERIODO: DEL	20	de	AGOSTO	de	2025	AL	19	de	SEPTIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025								

Suministro e instalación de bordillo prefabricado A-80	(405/509) ml	80%	K0+000 - K0+070
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
Cerramiento en vara rolliza y lona h=2m.distancia entre postes 3m	(321/388) m	83%	K0+000 - K0+210
Pedraplén compacto	(267/276) m	97%	K0+170 - K0+185
Excavaciones varias en material común en seco (incluye acarreo libre 5 km)	(92/92) m3	100%	
Excavación manual en material común (incluye retiro)	(30,6/38) m3	81%	
Suministro e instalación de concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) para elevaciones, h<3.0 mts	(10,4/12) m3	87%	
Suministro e instalación de geotextil t, resist ultima a la rotura (tira ancha)=45.2 kn/m para estabilización subrasante/capas -separación subrasante/capas granulares y/o subdrenes/filtros	(595/600) m2	99%	
Demolición muros ladrillo e = 0.15 mts.	(8/15) m2	53%	
2. LOSAS DE ACCESO Y SUPERESTRUCTURA PUENTE VEHICULAR L= 30M			
PUENTE - CONCRETOS			
Solado concreto espesor e=0.07mts 14Mpa (2000psi)	(71/71) m2	100%	
Suministro Figurada y Amarre de acero de 60000 psi 420 Mpa	(2953/2953) Kg	100%	
Concreto de 28 mpa - (4000 psi) para placas y vigas , longitud mayor a 14 m (para silla de apoyos superestructura placa aproximación y viga cimentación aletas)	(32/32) m3	100%	
PUENTE - SUPERESTRUCTURA			
Suministro Figurada y Amarre de acero de 60000 psi 420 Mpa	(16000/16059) Kg	100%	
Suministro, transporte, fabricación, ensamblaje y montaje de estructura metálica	(117000/117060) Kg	100%	
PUENTE - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
Suministro e instalación apoyos elastómeros de neopreno 40cm*40cm*6.9cm dureza 60 - 5 laminas de 4mm	(4/4) und	100%	
Estampado para concreto de andenes (acabado y curado, suministro y mano de obra. incluye juego de moldes, color endurecedor de cuarzo, desmoldante en polvo color, sellador acrílico transparente semilustre). no incluye concreto	(169/171) m2	99%	
Mortero tipo grouting para anclajes y rellenos de precisión	(65/721) Lt	9%	
Suministro e instalacion de desagues en tuberia sanitaria pvc d=4"	(22,8/26) m	88%	
Placa en concreto de 28 mpa -(4000 psi) longitud mayor a 14 m, e=24 cm	(415,8/420) m2	99%	
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL			
4. PRUEBA DE CARGA			
D - EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA			
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA	9		84 corte a 20/07 a 92 corte a 14/09
INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA	4		INFORMES No. 19 a 22
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA			
SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE, SOCIAL			

Nota: Se relaciona avance de actividades enmarcadas en el convenio, de acuerdo al informe No. 4 presentado por el municipio e informe mensual de interventoria No. 22 corte a 16/09/2025 (balance de obra TOMO 3, Informe semanal 92, pag.103-109)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**4**	FECHA:	**8**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**20**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	AL	**19**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**								

SOLICITUDES PRESENTADAS

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
21/04/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000559-INFDDIV. SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA INICIACIÓN DE CONVENIO	Oficio 1.10-3.3 408 de fecha 29/04/2025 con radicado interno No. E-2025-025371-VU, allegado por correo electrónico
21/04/2025	SUPERVISOR - SEC.CONTRATACION	RAD. S-2025-000560-INFDDIV. SOLICITUD ACLARACIÓN CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA - SUPERVISIÓN	-
2/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. SU OFICIO No. 1.10-3.3 408 DE FECHA 29/04/2025…	Oficio 1.10-3.030 de fecha 09/05/2025 allegado por correo electrónico
9/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. SU OFICIO No. 1.10-3.030 DE FECHA 09/05/2025	Oficio 1.10-3.039 de fecha 19/05/2025 allegado por correo electrónico (Radicación final de documentos para iniciación de convenio)
22/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000720-INFDDIV. LINEAMIENTOS PARA TRAMITE DE RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO	Oficio ATU2025EE026211 de fecha 27/05/2025 - DOCUMENTOS DESEMBOLSO 50%
22/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000722-INFDDIV. ASPECTOS A TENER EN CUENTA Y LINEAMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES.	-
23/05/2025	SUPERVISOR - SEC.CONTRATACION/Procesos de Selección	Correo electronico. ACTA DE INICIACIÓN DE CONVENIO E INFORME DE SUPERVISIÓN No. 0	-
27/05/2025	SUPERVISOR - TESORERIA/Central de Cuentas	Correo electronico. DESEMBOLSO INICIAL (50%), CONVENIO N° 1940 DE 2025	-
19/06/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000936-INFDDIV. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 1 DEL PERIODO 20/05/2025 AL 19/06/2025. DE INFORMES MENSUALES.	Correo electronico de fecha 02/07/2025 - Envío de Informe No.1 Convenio 1940 Gobernación
3/07/2025	SUPERVISOR - TESORERIA	Correo electronico. Solicitud de información cuenta bancaria para devolución de rendimientos financieros	Correo electronico de fecha 03/07/2025 - Certificación cuenta - Traslado al municipio
4/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 079. Actualización de certificación cuenta bancaria para devolución de rendimientos financieros	Correo electronico de fecha 07/07/2025 - Traslado a Tesorería
4/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 081. Establecimiento comites de obra	Rad. No. S-2025-001037-INFDDIV de fecha 09/07/2025

INFORME No:	4	FECHA:	8	de	OCTUBRE	de	2025

PERIODO: DEL	20	de	AGOSTO	de	2025	AL	19	de	SEPTIEMBRE	de	2025

CONVENIO No:	1940	DE	2025		

7/07/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-001016-INFDDIV. Su correo electrónico de fecha 02/07/2025 – INFORME MENSUAL No. 1 DE INFORMES MENSUALES. (observaciones)	Oficio 1.10-3.087 de fecha 09/07/2025 allegado por correo electrónico
14/07/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. Su oficio 1.10-3 087 de fecha 09/07/2025…	-
14/07/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. CONVOCATORIA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EL DIA 16/07/2025	-
23/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 130. Envío informe semanal No. 84	-
25/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 107. Envío informe mensual No. 2	-
28/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 147. Envío informe semanal No. 85	-
4/08/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-001202-INFDDIV. REQUISITOS PARA SUSCRIPCIÓN DE ACTYAS PARCIALES DEL CONVENIO	-
4/08/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 156. Envío informe semanal No. 86	-
11/08/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 165. Envío informe semanal No. 87	-
19/08/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 193. Envío informe semanal No. 88	-
19/08/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-001268-INFDDIV. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 3…	Oficio 1.10-3.211 de fecha 27/08/2025 allegado por correo electrónico 29/08/2025
25/08/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 205. Envío informe semanal No. 89	-
1/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 218. Envío informe semanal No. 90	-
3/09/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Correo electronico. Requerimiento evidencias de devolución de rendimientos financieros	Oficio 1.13-2-1.1 025 de fecha 03/09/2025 allegado por correo electrónico. Oficio 1.10-3 236. Envío certificación…
8/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.1-2 2160. Solicitud de giro de recursos por avance parcial de obra ACTA PARCIAL 1 DE CONVENIO	S-2025-001414-INFDDIV de fecha 15/09/2025
8/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 237. Envío informe semanal No. 91	-

INFORME No:	4	FECHA:	8	de	OCTUBRE	de	2025

PERIODO: DEL	20	de	AGOSTO	de	2025	AL	19	de	SEPTIEMBRE	de	2025

CONVENIO No:	1940	DE	2025		

16/09/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	S-2025-001430-INFDDIV. RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO (ACTAS PARCIALES – ACTA DE LIQUIDACIÓN)	-
16/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 262. Envío informe semanal No. 92	-
16/09/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	S-2025-001431-INFDDIV. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 4 DEL PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025.	Oficio 1.10-3 292 de fecha 24/09/2025.. Radicación informe mensual 4
19/09/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Correo electronico. RE: 1_1.1-2 2160 Solicitud de Giro Convenio 1940_2025 - Comentarios subsanados (S-2025-001414-INFDDIV)	Correo electronico de fecha 24/09/2025... remisión documentos ajustados... Oficio 1.10-3 279
23/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 287. Envío informe semanal No. 93	-
26/09/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	S-2025-001492-INFDDIV. OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL No. 4 DEL PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025 y BALANCE DE CANTIDADES PARA TRAMITE DE ACTA PARCIAL 1 DEL CONVENIO	Oficio 1.10-3 299 de fecha 07/10/2025. Ajustes informe mensual 4 y documentos acta parcial 1...
30/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 311. Envío informe semanal No. 94	-
7/10/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 330. Envío informe semanal No. 95	-
7/10/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 331. Envío solicitud de prorroga 1 del convenio	-

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta comité No. 01 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	13	5	2025	Etapa previa iniciación de convenio
Acta comité No. 02 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	16	7	2025	Etapa ejecución
Acta comité No. 03 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	21	7	2025	Etapa ejecución

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

Gobernación de Boyacá		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**4**	FECHA:	**8**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**20**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	AL	**19**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**								

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME N° 01	20	5	2025	19	6	2025	Informe mensual Avance 47.3%. Formato A-AD GC-F-045 y anexos (NO CONFORMIDADES PENDIENTES POR SUBSANAR EN PROXIMO INFORME)
INFORME N° 02	20	5	2025	19	7	2025	Informe acumulado Avance 59,4%. Formato A-AD-GC-F-045 y anexos
INFORME N° 03	20	7	2025	19	8	2025	Informe mensual Avance 84,5%. Formato A-AD GC-F-045 y anexos
INFORME N° 04	20	8	2025	19	9	2025	Informe mensual Avance 91,4%. Formato A-AD GC-F-045 y anexos

OBSERVACIONES:

1. El municipio de Tunja celebró previamente los contratos de obra e interventoria Nos. 1557 de 2023 y 1639 de 2023 respectivamente, para la "Construcción y mejoramiento del tramo vial de la calle 59 entre la vía antigua a Paipa (Carrera 2 a Este) y la Avenida Universitaria". Previa suscripción del convenio No. 1940 de 2025, el estado y alcance de los contratos citados contempla "la construcción de la calzada Norte con obras de espacio público y puente vehicular 1 sobre el rio jordán, la construcción de la calzada sur entre el K0+000 (sector Carrera 2 y el cruce Férreo K0+075), la construcción de la infraestructura del puente vehicular 2 en la calzada sur (Cimentación y Vigas de Cimentación) y la construcción del cruce férreo. Dichas actividades son financiadas con recursos del municipio y Otros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

2. Con la anterior aclaración y de acuerdo al proyecto de inversión BPIN No. 2024 0415 0443 - A1, se resume el alcance del convenio 1940/2025 mediante la construcción de las siguientes obras en la calzada sur (eje 1): espacio público (ciclovia y sendero peatonal) entre la carrera 2 este y el conjunto residencial Hayuelos (K0+000 al K0+190), calzada vehicular sur entre el cruce férreo y el acceso al conjunto Hayuelos (K0+070 al K0+190), incluyendo losas de acceso y superestructura del puente vehicular de 30m de luz sobre le rio Jordán, señalización vertical y horizontal, pozos y sumideros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

3. El avance y detalle de la información registrada en el presente informe se encuentra soportado en informe del convenio No. 4 presentado por el municipio y sus correspondientes anexos (informe mensual de interventoria No. 22, informes semanales, soportes de seguimiento y ejecución contratos de obra e interventoria, certificaciones de cumplimiento).

4. El municipio realizó la respectiva devolución de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Departamento, en constancia de lo cual se generaron los siguientes comprobantes de ingreso en la Tesorería General de la Gobernación de Boyacá:

DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INGRESO CONSIGNACIÓN N°	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ($)	PERIODO
7822	29/08/2025	713.649,94	jun-25
7821	29/08/2025	666.647,14	jul-25
8314	24/09/2025	81.236,75	ago-25

5. Al presente informe se adjunta: correspondencia enviada y recibida.

ENLACE SECOP (PROCESO CD-GB-1896-2025): https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7883552&isFromPublicArea=True&isModal=False

GOBERNACIÓN DE Boyacá		VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME No:	4	FECHA:	8	de	OCTUBRE	de	2025				
PERIODO: DEL	20	de	AGOSTO	de	2025	AL	19	de	SEPTIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025								

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	NO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	NO	
Acto administrativo mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	NO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	NO	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	SI	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	SI	
Acta de socialización del contrato de obra	NO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio	SI	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	NO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Bitácora de obra	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	YA SE RADICO	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	
Informes laboratorio, pruebas y ensayos realizados para verificar cumplimiento de normas y especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento fichas ambientales)	SI	


GOBERNACIÓN DE Boyacá		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**4**		FECHA:	**8**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**20**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	AL	**19**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**	
CONVENIO No:	**1940**		DE	**2025**								

Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Correspondencia enviada y recibida	**SI**	
Registro de instalación Valla informativa	**N.A.**	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio	**SI**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**SI**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**SI**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	**NO**	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	**SI**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras	**SI**	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**SI**	
Informes laboratorio, pruebas y ensayos realizados para verificar cumplimiento de normas y especificaciones técnicas	**SI**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Correspondencia enviada y recibida	**SI**	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: 

Supervisor Departamento

NOMBRE: **Ing. JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO**

ANEXO	INFORME SUPERVISIÓN No	PERIODO		CONVENIO No
CORRESPONDENCIA ENVIADA	4	20/08/2025	19/09/2025	1940/2025

CORRESPONDENCIA ENVIADA

S-2025-001492-INFDDIV

TUNJA, 26 de septiembre de 2025

Contraseña:MLO54jZ4D2

Señor
MIKHAIL KRASNOV
Alcalde Municipal de Tunja
contactenos@tunja-boyaca.gov.co
atencionalciudadano@tunja.gov.co
alcaldia@tunja-boyaca.gov
Calle 19 N° 9-95, Edificio Municipal
Teléfono: 7405770
La ciudad

REFERENCIA: CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL No. 4 DEL PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025 y BALANCE DE CANTIDADES PARA TRAMITE DE ACTA PARCIAL 1 DEL CONVENIO

Cordial saludo respetado Alcalde,

Mediante la presente, me permito realizar las siguientes observaciones relacionadas con “INFORME MENSUAL No. 4 DEL CONVENIO No 1940/2025, y BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS PARA TRAMITE DE ACTA PARCIAL 1 DE CONVENIO:

1. INFORME MENSUAL No 4 RADICADO MEDIANTE OFICIO 1.10-3 292 DE FECHA 24/09/2025

- La fecha de terminación real de los contratos de obra e interventoría reportada en formato F-045 (pag.3 tomo 1), no es consistente con las prórrogas adjuntas en evidencias y soportes de ejecución (pag. 2 a 5 tomo 2, pag. 2 a 5 tomo 4). Se requiere verificar y ajustar

- La información registrada en el cuadro POLIZAS VIGENTES del formato F-045 (pag.5 tomo 1), no se encuentra actualizada de acuerdo a las prórrogas No. 7, suscritas para los contratos de obra e interventoría. Se requiere actualizar formato F-045 e incluir soportes y evidencias correspondientes (pólizas y actas de aprobación)

- Se observan inconsistencias en el balance de cantidades ejecutadas en marco del convenio, reportadas en informe mensual de interventoría No. 22. La cantidad ejecutada del ítem "Suministro Figurada y Amarre de acero de 60000 psi 420 Mpa", supera el presupuesto inicial, 7.200Kg vs 2.953Kg (ver pag. 103 tomo 3, concretos puente – informe semanal 92). Se requiere verificar y subsanar

2. BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS PARA TRAMITE DE ACTA PARCIAL 1 DE CONVENIO

- En el cuadro "ANEXO. SOLICITUD PAGO PARCIAL 1 DEL CONVENIO No. 1940 DE 2025 - DISCRIMINACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO RECURSOS GOBERNACIÓN", se observa que la cantidad ejecutada del ítem "Excavaciones varias en material común en seco (incluye acarreo libre 5 km)" del capitulo ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS, supera la cantidad establecida en el presupuesto inicial del convenio (230m3 de 92m3). Se requiere verificar la inconsistencia, y corregir cada uno de los documentos susceptibles de ajuste, que soportan la solicitud del desembolso de recursos por avance de obra (carta de solicitud, balance de ejecución, memorias de cantidades), así como también verificar y ajustar de ser el caso las actas parciales 7 y 8 del contrato de obra y sus correspondientes sábanas de cantidades ejecutadas.

Por lo anterior, el documento "ACTA PARCIAL 1 DEL CONVENIO 1940/2025" remitido mediante correo electrónico de fecha 25/09/2025, deberá ser ajustado una vez verificada y validada su respuesta.

Atentamente,

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUPERVISOR

Con copia a:
Ing. LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA /Secretaria Infraestructura Territorial Tunja/Infraestructura@tunja.gov.co
procesosdeseleccion@boyaca.gov.co

Elaboró: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO / SEC INFRAESTRUCTURA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Outlook

RE: 1_1.1-2 2160 Solicitud de Giro Convenio 1940_2025 - Comentarios subsanados (S-2025-001414-INFDDIV)

Desde JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
Fecha Vie 19/09/2025 12:33
Para Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>

Cordial saludo ingeniera:

Me permito realizar las siguientes observaciones para su oportuna revisión y subsanación,

- La fecha de las ACTAS DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN 7 y 8, no son consistentes con la fecha registrada en los CUADROS DE CANTIDADES correspondientes. Se observa que incluso, EL ACTA 7 presenta una fecha anterior a la registrada en el CUADRO DE CANTIDADES. Se solicita sustentar claramente.

- Faltan las certificaciones del cumplimiento del contrato de Interventoria expedidas por el supervisor, y es necesario ajustar las certificaciones de obra ya que solo especifican cumplimento del periodo "17/07/2025 al 16/08/2025" y es necesario certificar cumplimento acumulado desde el inicio del convenio hasta la fecha (sugiero no relacionar periodo de cumplimiento sino dejar solo la fecha de expedición)

- El municipio debe estar al día en la devolución de rendimientos financieros a la fecha de suscripción del acta Parcial del convenio. Falta devolución de rendimientos de agosto

Atentamente,

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
SUPERVISOR

De: Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de septiembre de 2025 8:59
Para: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
Cc: Apoyo_Infraestructura_JT <apoyo.infraestructura.jt@gmail.com>
Asunto: 1_1.1-2 2160 Solicitud de Giro Convenio 1940_2025 - Comentarios subsanados (S-2025-001414-INFDDIV)

Respetado Ingeniero Alba,

En atención a su comunicación S-2025-001414-INFDDIV del 15 de septiembre pasado, en donde se solicita la atención a algunas observaciones, enviamos la solicitud de giro de recursos por avance parcial de obra – Acta No. 1, con la correspondiente corrección.

1_1.1-2 2160_Solicitud_Giro_Convenio_1940_2025.pdf

2a_CORTE_1_CONVENIO_1940-2025.xlsx

2a_CORTE_1_CONVENIO_1940-2025_250919_080226.pdf

2b_ACTA_OBRA_No_7.pdf

2c_ACTA_OBRA_No_8.pdf

2d_ACTA_INTERVENTORIA_No_7.pdf

2e_ACTA_INTERVENTORIA_No_8.pdf

2f_Certificaciones.pdf

3_Certificación Bancaria Municipio De Tunja - Convenio Interadministrativo 1940.pdf

4a_Certificacion Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Septiembre.pdf

4b_CEDULA JACQUELINE EGEA.pdf

4c_TARJETA PROFESIONAL.pdf

4d_certificado de antecedentes JJC_julio.pdf

5_Certificacion_rend_financieros.pdf

6_Informe_Mensual_AADGCF045_3_2_Signed.pdf

De antemano agradezco su gestión y quedo pendiente de sus comentarios.

Cordialmente.

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial

S-2025-001431-INFDDIV

TUNJA, 16 de septiembre de 2025

Contraseña:fAViAWN9Ml

Señor
MIKHAIL KRASNOV
Alcalde Municipal de Tunja
contactenos@tunja-boyaca.gov.co
atencionalciudadano@tunja.gov.co
alcaldia@tunja-boyaca.gov
Calle 19 N° 9-95, Edificio Municipal
Teléfono: 7405770
La ciudad

REFERENCIA: CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 4 DEL PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025.

Cordial saludo respetado Alcalde,

Mediante la presente, me permito solicitar la presentación del INFORME MENSUAL No. 4 DEL CONVENIO No 1940/2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025, acatando los lineamientos de forma y contenido precisados en oficio Rad. No. S-2025-000722-INFDDIV de fecha 22/05/2025, y las observaciones realizadas previamente por esta supervisión.

Su respuesta debe ser remitida al correo institucional: juan.alba@boyaca.gov.co, en un término no superior a 26/09/2025.

Atentamente,

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUPERVISOR

Con copia a:
Ing. LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA /Secretaria Infraestructura Territorial Tunja/Infraestructura@tunja.gov.co
procesosdeseleccion@boyaca.gov.co

Elaboró: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO / SEC INFRAESTRUCTURA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO

S-2025-001430-INFDDIV

TUNJA, 16 de septiembre de 2025

Contraseña:5kgVIGhxsd

Señor
MIKHAIL KRASNOV
Alcalde Municipal de Tunja
contactenos@tunja-boyaca.gov.co
atencionalciudadano@tunja.gov.co
alcaldia@tunja-boyaca.gov
Calle 19 N° 9-95, Edificio Municipal
Teléfono: 7405770
La ciudad

REFERENCIA: CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

ASUNTO: RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO (ACTAS PARCIALES – ACTA DE LIQUIDACIÓN)

Cordial saludo respetado Alcalde,

Con el fin de brindar orientaciones para el tràmite de radicación de cuentas de cobro de actas parciales y pago final ante la Central de Cuentas del Departamento; me permito realizar las siguientes aclaraciones, teniendo en cuenta las directrices dadas desde la Secretaria de Hacienda, mediante CIRCULAR No C-2021-000541-CIR de fecha 23/06/2021:

- *Los documentos para el desembolso de anticipos y tramites de pago de cuentas parciales y finales del convenio, debe ser remitida desde la supervisión al correo central.cuentas@boyaca.gov.co, previa radicación por parte del municipio.*

- *Por lo anterior, se requiere al municipio presentar el diligenciamiento del formato A-GF-GI-F-006 - CONSTANCIA DE RADICACIÓN CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS MUNICIPIOS Y OTROS, adjuntando los anexos que apliquen según se indica en el mismo formato, de forma ordenada y consecutiva, descargándolos directamente de la plataforma SECOP II, compilándolos en un (1) archivo PDF sin comprimir, y remitiéndolos a través de correo electrónico dirigido a la supervisión, especificando en el asunto: acta N°, convenio N° , año XXXX, nombre y Nit del contratista".*

- *Es preciso resaltar, que la radicación de cuentas de cobro procede una vez se verifique, que las actas parciales o finales han sido aprobadas y cargadas en el proceso correspondiente del SECOP 2.*

Atentamente,



JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUPERVISOR

Anexos:
CIRCULAR No C-2021-000541-CIR (01 pdf)
Formato A-GF-GI-F-006 (01 excel)

Con copia a:
Ing. LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA /Secretaria Infraestructura Territorial Tunja/Infraestructura@tunja.gov.co
procesosdeseleccion@boyaca.gov.co

Elaboró: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO / SEC INFRAESTRUCTURA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO

S-2025-001414-INFDDIV

TUNJA, 15 de septiembre de 2025

Contraseña:9HGvRZjP11

Señor
MIKHAIL KRASNOV
Alcalde Municipal de Tunja
contactenos@tunja-boyaca.gov.co
atencionalciudadano@tunja.gov.co
alcaldia@tunja-boyaca.gov
Calle 19 N° 9-95, Edificio Municipal
Teléfono: 7405770
La ciudad

REFERENCIA: CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: Su oficio 1.1-2 2160 de fecha 08/09/2025 “solicitud giro de recursos por avance parcial de obra – Acta parcial 1 de convenio…”

Cordial saludo,

En atención a su solicitud citada en el asunto de la referencia, una vez verificados los documentos adjuntos al oficio No. 1.1-2 2160, allegado por correo electrónico el día jueves 11/09/2025, y acorde a los requisitos para la suscripción de actas parciales del convenio, informados mediante radicado No. S-2025-001202-INFDDIV del 04/08/2025; me permito realizar las siguientes observaciones:

1. Carta de solicitud de giro de recursos por avance parcial de obra: *El valor y el porcentaje deben ser consistentes (verificar aproximación de decimales del porcentaje en operación aritmética).*

2. Acta(s) parcial(es) de contrato(s) derivados del convenio incluyendo sábana de cantidades contratadas y ejecutadas, memorias de cantidades de obra, y certificaciones de cumplimiento:

- *Faltan documentos “acta parcial y certificaciones de cumplimiento (listadas en requisitos de informes mensuales”.*
- *Se sugiere ajustar las sábanas discriminando las cantidades ejecutadas de la columna “presente acta” en: “convenio 1940/2025” y “otros recursos”.*
- *Incluir firmas en cuadro detallado del balance de ejecución de actividades del convenio (contrartista, interventoría, supervisión)*

- *Registrar firmas en memorias de cantidades*
- *Revisar memoria de cantidades ítem "PEDRAPLEN COMPACTO" la localización de las obras no corresponde al alcance del convenio, se hace referencia a "calzada norte – eje 2.*

3. Certificación de cuenta bancaria para consignación del pago: *actualizar fecha de expedición.*

4. Certificación de cumplimiento de afiliaciones y pagos de seguridad social, riesgos laborales, y obligaciones parafiscales del municipio. CUMPLE.

5. Certificación y soporte de rendimientos financieros de los recursos aportados por el departamento, y evidencias correspondientes de su devolución/reintegro a la cuenta indicada por la supervisión. CUMPLE

6. Copia Informe mensual del municipio que soporte el % de avance parcial, formato A-AD-GC-F-045. CUMPLE

Como se ha indicado con anterioridad, se aclara que ésta supervisión no dará trámite de actas parciales del convenio, sin estricto cumplimiento de los lineamientos, observaciones y solicitudes relacionados con la presentación de informes por parte del municipio y previa visita de campo.

Atentamente,



JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUPERVISOR

Con copia a:
Ing. LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA /Secretaria Infraestructura Territorial Tunja/Infraestructura@tunja.gov.co
procesosdeseleccion@boyaca.gov.co

ANEXO	INFORME SUPERVISIÓN No	PERIODO		CONVENIO No
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	4	20/08/2025	19/09/2025	1940/2025

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1.10-3 299

Tunja, 07 de octubre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Atención a comentarios oficio S-2025-001492-INFDDIV del 26 de septiembre de 2025 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho la atención a los comentarios relacionados en su oficio S-2025-001492-INFDDIV del 26 de septiembre de 2025:

1- INFORME MENSUAL No 4 RADICADO MEDIANTE OFICIO 1.10-3 292 DE FECHA 24/09/2025

- La fecha de terminación real de los contratos de obra e interventoría reportada en formato F-045 (pag.3 tomo 1), no es consistente con las prórrogas adjuntas en evidencias y soportes de ejecución (pag. 2 a 5 tomo 2, pag. 2 a 5 tomo 4). Se requiere verificar y ajustar.

R/. En el formato F-045 (1_A-AD-GC-F-045_septiembre_2025_1), se corrigió la fecha de los contratos de obra 1557 de 2023 y de interventoría 1639 de 2023, a la terminación pactada mediante prórroga No. del 17 de septiembre de 2025, donde se acuerda la terminación de obra para el día 7 de noviembre de 2025.

- La información registrada en el cuadro POLIZAS VIGENTES del formato F-045 (pag.5 tomo 1), no se encuentra actualizada de acuerdo a las prórrogas No. 7, suscritas para los contratos de obra e interventoría. Se requiere actualizar formato F-045 e incluir soportes y evidencias correspondientes (pólizas y actas de aprobación)

R/. En el formato F-045 (1_A-AD-GC-F-045_septiembre_2025_1) se relacionaron las fechas de las pólizas actualizadas de acuerdo con la prórroga 7 y certificadas por la oficina de contratos de la Alcaldía de Tunja, mediante acta de aprobación (2_Actas_Aprobacion_Polizas).

- Se observan inconsistencias en el balance de cantidades ejecutadas en marco del convenio, reportadas en informe mensual de interventoría No. 22. La cantidad ejecutada del ítem "Suministro Figurada y Amarre de acero de 60000 psi 420 Mpa", supera el presupuesto inicial, 7.200Kg vs 2.953Kg (ver pag. 103 tomo 3, concretos puente – informe semanal 92). Se requiere verificar y subsanar

R/. Se corrigió el error en la cantidad, el valor subsanado ahora se presenta como 2.953Kg, en la página 106 del tomo 3, numeral 33, concretos Puente – Informe semanal 92 (3_Inf_4_Tomo_3_1).

2- BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS PARA TRAMITE DE ACTA PARCIAL 1 DE CONVENIO

- En el cuadro "ANEXO. SOLICITUD PAGO PARCIAL 1 DEL CONVENIO No. 1940 DE 2025 - DISCRIMINACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO RECURSOS GOBERNACIÓN", se observa que la cantidad ejecutada del ítem "Excavaciones varias en material común en seco (incluye acarreo libre 5 km)" del capitulo ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS, supera la cantidad establecida en el presupuesto inicial del convenio (230m3 de 92m3). Se requiere verificar la inconsistencia, y corregir cada uno de los documentos susceptibles de ajuste, que soportan

la solicitud del desembolso de recursos por avance de obra (carta de solicitud, balance de ejecución, memorias de cantidades), así como también verificar y ajustar de ser el caso las actas parciales 7 y 8 del contrato de obra y sus correspondientes sábanas de cantidades ejecutadas.

R/. Se corrigió el valor en la carta de solicitud del giro (4_1.1-2 2317_Carta_Giro_Acta_01_1) el avance físico-financiero a la fecha corresponde al 80.37 %, equivalente a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA LEGAL ($3,885,831,572.13), la cantidad del item 5.10 Excavaciones varias en material común en seco (incluye acarreo libre 5 km) se cambió a 92m3 (5_CORTE 1 CONVENIO 1940-2025 v1.3) así como en la memoria (5_CORTE 1 CONVENIO 1940-2025 v1 pg. 17), el acta parcial 7 no tuvo afectación con el cambio, el acta parcial 8 se modificó en su página 2 (6_ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN 08-signed1) y también en el cuadro de cantidades página 10 (7_CUADRO DE CANTIDADES 08_Sabana y Memorias_250929_171254_1).

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

1.10-3 331

Tunja, 07 de octubre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío Solicitud de Prórroga al Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

En atención al Convenio Interadministrativo No. 1940/2025 – Aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja para la construcción y mejoramiento del tramo vial sobre la Calle 59 entre la vía antigua a Paipa y Avenida Universitaria (puentes, estructura vial, urbanismo y obras complementarias) del municipio de Tunja – Boyacá, cuya vigencia contractual vence el próximo 19 de noviembre de 2025, me permito solicitar de manera formal la prórroga del plazo de ejecución, soportado en los términos del oficio 1.1-2 2324 firmado por el señor Alcalde Municipal y contenido en los anexos de esta comunicación.

Entre otros factores, se estima que el proceso de recibo a satisfacción y liquidación de la documentación para el cierre del contrato puede tardar un mes adicional luego de la fecha de terminación del convenio que es el 19 de noviembre próximo, entonces, con fundamento en lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 (arts. 16 y 40), la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 (art. 2.2.1.2.4.1), se solicita respetuosamente la ampliación del plazo del convenio por veintitrés (23) días calendario, contados a partir del vencimiento inicial, extendiendo la vigencia hasta el viernes 12 de diciembre de 2025.

Esta ampliación se hace necesaria con el fin de garantizar que la ejecución contractual permita culminar las actividades y efectuar el respectivo cierre contractual antes del viernes 12 de diciembre de 2025.

De antemano agradezco su gestión y quedo atento a la expedición de la respectiva autorización para proceder con la documentación correspondiente.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

1.10-3 330

Tunja, 07 de octubre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío informe semanal No. 95 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe semanal No. 95 de la interventoría referente al convenio del asunto, para su conocimiento.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

1.10-3 311

Tunja, 30 de septiembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío informe semanal No. 94 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe semanal No. 94 de la interventoría referente al convenio del asunto, para su conocimiento.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	29	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

SEMANA No. 94 Del 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Hasta 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato 650 Días Tiempo para la finalización del contrato 40 Días

Nombre del Supervisor: Ing. Jaime Arturo Tovar Rodríguez

Cargo: SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada(%)	0,61%	95,24%	Obra Ejecutada (%)	0,27%	95,25%
Valor Obra Programada	$ 86.186.581,64	$ 13.456.409.894,24	Valor Obra Ejecutada	$ 37.579.337,00	$ 13.458.045.159,41
Diferencia Semanal		0,34%	Diferencia Acumulada		-0,01%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Constructor	CONSORCIO HAYUELOS	Interventor	CONSORCIO TUNJA JI 2
Contrato N°	1557 DE 2023	Contrato N°	1639 DE 2023
Valor Inicial	$ 9.031.645.799,00	Valor Inicial	$ 714.000.000,00
Valor adición N°1	$ 323.123.318,00	Valor adición N°1	$ 81.452.949,00
Valor adición N°2	$ 4.774.178.693,00	Valor adición N°2	$ 334.192.509,00
Valor Actualizado	$ 14.128.947.810,00	Valor Actualizado	$ 1.129.645.458,00
Plazo Inicial	5.48 Meses	Plazo Inicial	5.48 Meses
Fecha de Inicio	17/07/2023	Fecha de Inicio	17/07/2023
Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023	Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023
Prorroga 1	1/01/2024	Prorroga 1	1/01/2024
Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses	Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses
Prorroga 2	28/05/2024	Prorroga 2	28/05/2024
Tiempo Prorroga 2	1 Mes	Tiempo Prorroga 2	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024
Prorroga 3	10/06/2024	Prorroga 3	10/06/2024
Tiempo Prorroga 3	1 Mes	Tiempo Prorroga 3	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024
Prorroga 4	15/08/2024	Prorroga 4	15/08/2024
Tiempo Prorroga 4	1 Mes	Tiempo Prorroga 4	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024
Suspensión 1	3/09/2024	Suspensión 1	3/09/2024
Tiempo Suspensión 1	15 Días	Tiempo Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024	Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024
Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024	Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 17/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 1	HASTA 17/10/2024
Acta de Reinicio N°1	17/10/2024	Acta de Reinicio N°1	17/10/2024

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	29	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Valor Adicional N°1	$	323.123.318,00	Valor Adicional N°1	$	81.452.949,00
Prorroga 5		17/10/2024	Prorroga 5		17/10/2024
Tiempo Prorroga 5		15 Días	Tiempo Prorroga 5		15 Días
Suspensión 2		8/11/2024	Suspensión 2		8/11/2024
Tiempo Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024	Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025
Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025	Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025
Acta de Reinicio N°2		3/02/2025	Acta de Reinicio N°2		3/02/2025
Suspensión 3		4/02/2025	Suspensión 3		4/02/2025
Tiempo Suspensión 3		25 Días	Tiempo Suspensión 3		25 Días
Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025	Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025
Acta de Reinicio N°3		28/02/2025	Acta de Reinicio N°3		28/02/2025
Prorroga 6		28/02/2025	Prorroga 6		28/02/2025
Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses	Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses
Valor Adicional N°2	$	4.774.178.693,00	Valor Adicional N°2	$	334.192.509,00
Prorroga 7		18/09/2025	Prorroga 7		18/09/2025
Tiempo Prorroga 7		50 Días	Tiempo Prorroga 7		50 Días
Fecha de Terminación Final		HASTA 07/11/2025	Fecha de Terminación Final		HASTA 07/11/2025
Anticipo		N/A	Anticipo		N/A
% Avance del Anticipo		N/A	% Avance del Anticipo		N/A
Acta Parcial N° 1	$	1.807.173.935,00	Acta Parcial N° 1	$	142.866.784,00
Acta Parcial N° 2	$	3.276.730.721,00	Acta Parcial N° 2	$	259.043.123,00
Acta Parcial N° 3	$	1.235.393.508,00	Acta Parcial N° 3	$	97.664.477,00
Acta Parcial N° 4	$	890.165.121,00	Acta Parcial N° 4	$	70.372.323,00
Acta Parcial N° 5	$	968.072.877,00	Acta Parcial N° 5	$	76.531.321,00
Acta Parcial N° 6	$	879.018.416,00	Acta Parcial N° 6	$	69.429.626,00
Acta Parcial N° 7	$	2.523.639.363,00	Acta Parcial N° 7	$	209.958.422,00
Valor Actas Parciales	$	11.580.193.941,00	Valor Actas Parciales	$	925.866.076,00
Saldo	$	2.548.753.869,00	Saldo	$	203.779.382,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N° 94

Lunes 22/09/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de instalación de Sardinel A10 en la vía sector intermedio. Continúan labores de construcción del sumidero ubicado en el Eje 1, en el sector de Hayuelos.

Martes 23/09/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de instalación de Sardinel A10 en la vía sector intermedio. Continúan labores de construcción del sumidero ubicado en el Eje 1, en el sector de Hayuelos.

Miércoles 24/09/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de instalación de Sardinel A10 en la vía sector intermedio. Continúan labores de construcción del sumidero ubicado en el Eje 1, en el sector de Hayuelos.

Jueves 25/09/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de instalación de Sardinel A10 en la vía sector intermedio. Continúan labores de construcción del sumidero ubicado en el Eje 1, en el sector de Hayuelos. Se realiza conformación de la capa de base granular, en el sector intermedio.

Viernes 26/09/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de instalación de Sardinel A10 en la vía sector intermedio. Se realiza el vaciado de concreto del sumidero ubicado en el Eje 1, en el sector de Hayuelos. Continua conformación de la capa de base granular, en el sector intermedio.

Sábado 27/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el sector intermedio. Llegan a obra las barandas metálicas del puente.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	29	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

CANTIDADES SEMANA N° 94

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA					SEMANA 94		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES								
2	3.02.03	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 14.486,00	0,00	$ -	563,00	$ 8.155.618,00
Subtotal						$ -		$ 8.155.618,00
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES								
5	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	$ 1.483.583,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3	$ 91.500,00	0,00	$ -	1.143,00	$ 104.584.500,00
7	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	$ 123.000,00	0,00	$ -	213,00	$ 26.199.000,00
8	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM	M3	$ 138.000,00	55,00	$ 7.590.000,00	130,00	$ 17.940.000,00
9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	0,00	$ -	35.160,00	$ 70.320.000,00
Subtotal						$ 7.590.000,00		$ 219.043.500,00
CARPETA ASFÁLTICA								
10	3.06.09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	$ 4.265,00	0,00	$ -	335,00	$ 1.428.775,00
Subtotal						$ -		$ 1.428.775,00
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL								
14	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	$ 123.000,00	5,00	$ 615.000,00	140,00	$ 17.220.000,00
16	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	100,00	$ 200.000,00	2.750,00	$ 5.500.000,00
17	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	$ 65.000,00	0,00	$ -	150,00	$ 9.750.000,00
18	1.11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	M2	$ 63.000,00	50,00	$ 3.150.000,00	245,00	$ 15.435.000,00
19	1.18.04	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17,5 MPa - (2500 PSI)	M2	$ 134.000,00	10,00	$ 1.340.000,00	10,00	$ 1.340.000,00
20	APU 01	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC 10 ESPESOR 7,5 CM , INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN , ACARREO LIBRE DE 10k	M2	$ 76.645,00	0,00	$ -	130,00	$ 9.963.850,00
21	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	$ 90.000,00	5,00	$ 450.000,00	65,00	$ 5.850.000,00
22	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	$ 90.000,00	10,00	$ 900.000,00	75,00	$ 6.750.000,00
24	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	$ 54.616,00	30,00	$ 1.638.480,00	485,00	$ 26.488.760,00
Subtotal						$ 8.293.480,00		$ 98.297.610,00
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-4_01	**REF 3.13.19**	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	ML	$ 39.106,00	0,00	$ -	321,00	$ 12.553.026,00
NP-5_01	3.02.10	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	$ 155.207,00	0,00	$ -	276,00	$ 42.837.132,00
102	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM	$ 1.700,00	540,00	$ 918.000,00	540,00	$ 918.000,00
NP-10_01	3.02.07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)	M3	$ 21.358,00	0,00	$ -	92,00	$ 1.964.936,00
NP-11_01	2.01.10	RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 179.491,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.974.401,00
103	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 82.976,00	2,00	$ 165.952,00	37,60	$ 3.119.897,60
107	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	$ 47.941,00	0,00	$ -	1,00	$ 47.941,00
NP-25_01	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	$ 1.344.598,00	0,00	$ -	11,40	$ 15.328.417,20
NP-29_01	3.13.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=45.2 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	$ 12.380,19	0,00	$ -	595,00	$ 7.366.210,67
NP-32_01	1.01.33	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	$ 17.718,00	0,00	$ -	8,00	$ 141.744,00
NP-37_01	2.05.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	$ 263.569,00	0,00	$ -	12,00	$ 3.162.828,00
NP-42_01	2.07.07	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	$ 350.603,00	2,00	$ 701.206,00	2,00	$ 701.206,00

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	29	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

NP-44_01	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR	M3	$ 117.840,00	10,00	$ 1.178.400,00	10,00	$ 1.178.400,00
NP-45_01	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	$ 33.872,00	20,00	$ 677.440,00	49,00	$ 1.659.728,00
NP-64_01	**REF 3.08.18 3.08.17**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-85	ML	$ 71.123,00	15,00	$ 1.066.845,00	15,00	$ 1.066.845,00
NP-65_01	**REF 3.08.18 3.08.17**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-100	UND	$ 80.676,00	2,00	$ 161.352,00	2,00	$ 161.352,00
NP-75_01	**REF 2.06.25 3.10.11 COT**	SUMIDERO LATERAL (INGRESO DE FLUJO MIXTO CON REJILLA EN POLIPROPILENO)	UND	$ 5.499.328,00	0,80	$ 4.399.462,40	0,80	$ 4.399.462,40
Subtotal						**$ 9.268.657,40**		**$ 101.151.205,47**
SECCIÓN 02 - CONSTRUCCION PUENTES						**$ 12.427.200,00**		**$ 4.018.020.069,00**
CONCRETOS								
31	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	$ 47.941,00	0,00	$ -	71,00	$ 3.403.811,00
33	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 8.120,00	0,00	$ -	2.953,00	$ 23.978.360,00
35	3.10.02	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M (PARA SILLA DE APOYOS SUPERESTRUCTURA PLACA APROXIMACIÓN Y VIGA CIMENTACION ALETAS)	M3	$ 1.250.000,00	0,00	$ -	32,00	$ 40.000.000,00
Subtotal						$ -		**$ 67.382.171,00**
SUPERESTRUCTURA								
38	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 8.120,00	0,00	$ -	16.000,00	$ 129.920.000,00
39	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	$ 29.000,00	0,00	$ -	117.000,00	$ 3.393.000.000,00
41	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (BARANDA TIPO INVIAS SEGÚN DISEÑOS)	KG	$ 29.000,00	400,00	$ 11.600.000,00	400,00	$ 11.600.000,00
45	3.06.03	CONSTRUCCIÓNDE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) (TABLERO)	M3	$ 1.037.732,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal						**$ 11.600.000,00**		**$ 3.534.520.000,00**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-47_02	**REF 3.13.13 3.12.06 1.22.14 3.13.22 3.10.07 1.20.09 2.01.10 COT**	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN CON REFUERZO DE LAMINA DE ACERO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (NORMA EN 10025)	#N/D	$ 3.609.762,00	0,00	$ -	10,00	$ 36.097.620,00
NP-48_02	**REF 3.13.43 3.12.06 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTÓMEROS DE NEOPRENO 40CM*40CM*6.9CM DUREZA 60 - 5 LAMINAS DE 4mm	UND	$ 1.516.178,00	0,00	$ -	4,00	$ 6.064.712,00
NP-49_02	**REF 1.03.20 COT**	ESTAMPADO PARA CONCRETO DE ANDENES (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). NO INCLUYE CONCRETO	M2	$ 78.832,00	0,00	$ -	169,00	$ 13.322.608,00
NP-50_02	**REF 3.13.13 1.03.19 3.08.18 COT**	MORTERO TIPO GROUTING PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN	LT	$ 31.111,00	0,00	$ -	65,00	$ 2.022.215,00
NP-63_02	**REF 3.10.09 2.05.09**	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=4"	ML	$ 60.957,00	0,00	$ -	22,80	$ 1.389.819,60
NP-70_02	**REF 1.03.20 3.10.02**	PLACA EN CONCRETO DE 28 MPA -(4000 PSI) LONGITUD MAYOR A 14 M, E=24 CM	M2	$ 275.223,00	0,00	$ -	415,80	$ 114.437.723,40
NP-71_02	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	KG	$ 4.339,00	0,00	$ -	0,00	$ -
VAR.1	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE LUZ 30M	KG	$ 2.068,00	0,00	$ -	117.000,00	$ 241.956.000,00
VAR.2	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (BARANDA TIPO INVIAS SEGÚN DISEÑOS)	KG	$ 2.068,00	400,00	$ 827.200,00	400,00	$ 827.200,00
Subtotal						**$ 827.200,00**		**$ 416.117.898,00**
Subtotal						$ -		$ -
			SUBTOTAL OBRAS			**$ 37.579.337,40**		**$ 4.446.096.777,47**

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	29	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (OBRA)	$ 36.752.137,40	**93,0%**	**$ 4.200.743.898,87**
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (INTERVENTORIA)		**93,0%**	**$ 294.010.126,21**
TOTAL ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025		**93,0%**	**$ 4.494.754.025,08**
TOTAL RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2025			**$ 4.835.148.229,44**
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (OBRA)			$ 4.518.872.292,37
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (INTERVENTORIA)			$ 316.275.937,07
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA ADICION N°3	$ 827.200,00		**$ 245.352.878,60**
TOTAL RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			**$ 273.222.972,56**
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (OBRA) ADICION N°3			$ 255.306.400,63
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			$ 17.916.571,93
TOTAL ADICION N°3 (OBRA)			**$ 4.774.178.693,00**
TOTAL ADICION N°3 (INTERVENTORIA)			**$ 334.192.509,00**
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA			**$ 14.128.947.810,00**
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			**$ 1.129.645.458,00**

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Lunes 29/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Realizar instalación de la baranda metálica del puente.

Martes 30/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, losetas y adoquines en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continuar labores conformación de la base granular en el sector intermedio y en el sector de Hayuelos.

Miércoles 31/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, losetas y adoquines en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continuar labores conformación de la base granular en el sector intermedio y en el sector de Hayuelos.

Jueves 01/10/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, losetas y adoquines en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continuar labores conformación de la base granular en el sector intermedio y en el sector de Hayuelos.

Viernes 02/10/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, losetas y adoquines en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continuar labores conformación de la base granular en el sector intermedio y en el sector de Hayuelos.

Sábado 03/10/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, losetas y adoquines en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continuar labores conformación de la base granular en el sector intermedio y en el sector de Hayuelos.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA N° 94

INSTALACION BORDILLOS Y SARDINELES







ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	29	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

INSTALACION ADOQUIN Y LOSETAS ESPACIO PUBLICO







CONFORMACION BASE GRANULAR SECTOR INTERMIEDIO







CONSTRUCCION SUMIDERO SECTOR HAYUELOS







ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	29	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME



Elaboró ING RICHARD A. ACOSTA T.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



Nombre: ING CESAR A. PALACIOS W.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Secretaría de
Infraestructura
Territorial

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

1.10-3 292

Tunja, 24 de septiembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío Informe Mensual No. 4 del Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe No. 4, correspondiente al seguimiento técnico y administrativo del convenio interinstitucional del asunto, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Mayor de Tunja, cuyo objeto es la terminación de las obras de infraestructura vial en la calle 59 de esta ciudad. El presente informe contiene el estado actual de ejecución, actividades desarrolladas, avances físicos y financieros, así como el seguimiento de la documentación pertinente para el adecuado desarrollo del proyecto.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

1.10-3 279

Tunja, 24 de septiembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío comentarios subsanados Acta No 1 del Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

De acuerdo con la reunion del 22 de septiembre de 2025, en la que se generaron comentarios de la revision documental enviada con la solicitud de giro del convenio del asunto para cubrir las actas parciales No.7 y No. 8 de los contratos No. 1557 de 2023 correspondiente a obra y No. 1639 de 2023 de interventoría, se remiten las siguientes aclaraciones:

1- La fecha de las ACTAS DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN 7 y 8, no son consistentes con la fecha registrada en los CUADROS DE CANTIDADES correspondientes. Se observa que incluso, EL ACTA 7 presenta una fecha anterior a la registrada en el CUADRO DE CANTIDADES. Se solicita sustentar claramente.

R/. Dentro de los procesos de revision y seguimiento a los contratos de la alcaldía, se tiene que cuando se recibe, en este caso, los documentos de actas y al presentarse hallazgos durante la revision documental, se procede con la devolución de los documentos a su fuente para corrección, se hace necesario entonces, actualizar la fecha de la nueva entrega del documento y devolverlo junto con la subsanación de las observaciones para la nueva revision y de ser el caso su aprobación, es por esto que los documentos anexados en las actas No. 7 y No. 8, presentan fechas distintas, prevaleciendo la más antígua como fecha de radicación original, como se muestra en el siguiente cuadro.

Acta	Documento	Fecha	Motivo
7	1a_CUADRO DE CANTIDADES 07_Sabana_250625_143725	3 de junio de 2025	Fecha posterior a la de acta de obra por atención a comentarios
7	2b_ACTA_OBRA_No_7	31 de mayo de 2025	
7	2d_ACTA_INTERVENTORIA_No_7	12 de junio de 2025	
8	1b_CUADRO DE CANTIDADES 08_Sabana-signed_250904_100914	31 de julio de 2025	
8	2c_ACTA_OBRA_No_8	20 de agosto de 2025	Fecha posterior al cuadro de cantidades por atención a comentarios
8	2e_ACTA_INTERVENTORIA_No_8	29 de agosto de 2025	

2- Faltan las certificaciones del cumplimiento del contrato de Interventoria expedidas por el supervisor, y es necesario ajustar las certificaciones de obra ya que solo especifican cumplimento del periodo "17/07/2025 al 16/08/2025" y es necesario certificar cumplimento acumulado desde el inicio del convenio hasta la fecha.

R/. Se anexa el documento "2a_Certificaciones_cumplimiento_supervision", que contiene las certificaciones solicitadas.
Para las certificaciones de interventoría se anexa el documento "2b_Certificaciones_Interventoria" que contiene verificación del cumplimiento de obligaciones del contrato de obra 1557 de 2023, cubriendo todo el período hasta el 19 de septiembre de 2025.

3- El municipio debe estar al día en la devolución de rendimientos financieros a la fecha de suscripción del acta Parcial del convenio. Falta devolución de rendimientos de agosto.

R/ Se anexa el documento "3_Certificado_Devolucion_Rendimientos_Agosto_2025", que contiene una relación del valor de la devolución del mes de Agosto, el comprobante de egresos, comprobante de la obligación a terceros – vigencia fiscal 2025 y el comprobante de pago exitoso, junto con la certificación bancaria.

4- El acta 8 de obra tiene fecha 20/08/2025 y el acta 8 de Interventoria 29/08/2025, por lo cual no podríamos soportar el acta parcial del convenio con el informe mensual 3 que tiene fecha de corte a 19/08/2025. RADICAR INFORME MENSUAL 4 con corte a 19/09/2026.

R/. Se anexa oficio remisorio "4_1.10-3 292_Oficio_Inf_Gob_04" del informe No. 4 de Gobernacion con fecha de cobertura el día 19 de septiembre de 2025, que junto con los anteriores informes cubren todo el período del acta desde el 20 de mayo de 2025 hasta el 19 de septiembre de 2025.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar
Anexos:

- 2a_Certificaciones_cumplimiento_supervision
- 2b_Certificaciones_Interventoria
- 3_Certificado_Devolucion_Rendimientos_Agosto_2025
- 4_1.10-3 292_Oficio_Inf_Gob_04

Outlook

1.10-3 279 Envío comentarios Acta No1 subsanados

Desde Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>
Fecha Mié 24/09/2025 15:26
Para JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
CC Apoyo_Infraestructura_JT <apoyo.infraestructura.jt@gmail.com>

5 archivos adjuntos (7 MB)

2b_Certificaciones_Interventoria.pdf; 1.10-3 279_Envio_comentarios_Acta_No1_subsanados.pdf; 3_Certificado_Devolucion_Rendimientos_Agosto_2025.pdf; 2a_Certificaciones_cumplimiento_supervision.pdf; 4_1.10-3 292_Oficio_Inf_Gob_04.pdf;

Respetado Ingeniero Alba,

De acuerdo con la reunión del 22 de septiembre de 2025, en la que se generaron comentarios de la revisión documental enviada con la solicitud de giro del convenio del asunto para cubrir las actas parciales No.7 y No. 8 de los contratos No. 1557 de 2023 correspondiente a obra y No. 1639 de 2023 de interventoría, se remite la atención a los comentarios.

De antemano le agradezco la gestión y quedo pendiente de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial

Alcaldía Mayor de Tunja

1.10-3 287

Tunja, 23 de septiembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío informe semanal No. 93 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe semanal No. 93 de la interventoría referente al convenio del asunto, para su conocimiento.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	22	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

SEMANA No. 93 Del 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Hasta 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato 643 Días Tiempo para la finalización del contrato 47 Días

Nombre del Supervisor: Ing. Jaime Arturo Tovar Rodríguez

Cargo: SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO			EJECUTADO		
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada(%)	0,57%	94,63%	Obra Ejecutada (%)	0,25%	94,99%
Valor Obra Programada	$ 80.535.002,52	$ 13.370.223.312,60	Valor Obra Ejecutada	$ 35.941.301,00	$ 13.420.465.822,41
Diferencia Semanal	0,32%		Diferencia Acumulada		-0,36%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Constructor	CONSORCIO HAYUELOS	Interventor	CONSORCIO TUNJA JI 2
Contrato N°	1557 DE 2023	Contrato N°	1639 DE 2023
Valor Inicial	$ 9.031.645.799,00	Valor Inicial	$ 714.000.000,00
Valor adición N°1	$ 323.123.318,00	Valor adición N°1	$ 81.452.949,00
Valor adición N°2	$ 4.774.178.693,00	Valor adición N°2	$ 334.192.509,00
Valor Actualizado	$ 14.128.947.810,00	Valor Actualizado	$ 1.129.645.458,00
Plazo Inicial	5.48 Meses	Plazo Inicial	5.48 Meses
Fecha de Inicio	17/07/2023	Fecha de Inicio	17/07/2023
Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023	Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023
Prorroga 1	1/01/2024	Prorroga 1	1/01/2024
Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses	Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses
Prorroga 2	28/05/2024	Prorroga 2	28/05/2024
Tiempo Prorroga 2	1 Mes	Tiempo Prorroga 2	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024
Prorroga 3	10/06/2024	Prorroga 3	10/06/2024
Tiempo Prorroga 3	1 Mes	Tiempo Prorroga 3	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024
Prorroga 4	15/08/2024	Prorroga 4	15/08/2024
Tiempo Prorroga 4	1 Mes	Tiempo Prorroga 4	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024
Suspensión 1	3/09/2024	Suspensión 1	3/09/2024
Tiempo Suspensión 1	15 Días	Tiempo Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024	Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024
Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024	Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 17/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 1	HASTA 17/10/2024
Acta de Reinicio N°1	17/10/2024	Acta de Reinicio N°1	17/10/2024

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	22	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Valor Adicional N°1	$ 323.123.318,00	Valor Adicional N°1	$ 81.452.949,00
Prorroga 5	17/10/2024	Prorroga 5	17/10/2024
Tiempo Prorroga 5	15 Días	Tiempo Prorroga 5	15 Días
Suspensión 2	8/11/2024	Suspensión 2	8/11/2024
Tiempo Suspensión 2	1 Mes	Tiempo Suspensión 2	1 Mes
Fecha de Terminación Suspensión 2	HASTA 07/12/2024	Fecha de Terminación Suspensión 2	HASTA 07/12/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 2	6/12/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 2	6/12/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2	45 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2	45 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 21/01/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 21/01/2025
Ampliación N°2 de Suspensión 2	21/01/2025	Ampliación N°2 de Suspensión 2	21/01/2025
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2	1 Mes	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2	1 Mes
Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2	HASTA 20/02/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2	HASTA 20/02/2025
Acta de Reinicio N°2	3/02/2025	Acta de Reinicio N°2	3/02/2025
Suspensión 3	4/02/2025	Suspensión 3	4/02/2025
Tiempo Suspensión 3	25 Días	Tiempo Suspensión 3	25 Días
Fecha de Terminación Suspensión 3	HASTA 28/02/2025	Fecha de Terminación Suspensión 3	HASTA 28/02/2025
Acta de Reinicio N°3	28/02/2025	Acta de Reinicio N°3	28/02/2025
Prorroga 6	28/02/2025	Prorroga 6	28/02/2025
Tiempo Prorroga 6	6,5 Meses	Tiempo Prorroga 6	6,5 Meses
Valor Adicional N°2	$ 4.774.178.693,00	Valor Adicional N°2	$ 334.192.509,00
Prorroga 7	18/09/2025	Prorroga 7	18/09/2025
Tiempo Prorroga 7	50 Días	Tiempo Prorroga 7	50 Días
Fecha de Terminación Final	HASTA 07/11/2025	Fecha de Terminación Final	HASTA 07/11/2025
Anticipo	N/A	Anticipo	N/A
% Avance del Anticipo	N/A	% Avance del Anticipo	N/A
Acta Parcial N° 1	$ 1.807.173.935,00	Acta Parcial N° 1	$ 142.866.784,00
Acta Parcial N° 2	$ 3.276.730.721,00	Acta Parcial N° 2	$ 259.043.123,00
Acta Parcial N° 3	$ 1.235.393.508,00	Acta Parcial N° 3	$ 97.664.477,00
Acta Parcial N° 4	$ 890.165.121,00	Acta Parcial N° 4	$ 70.372.323,00
Acta Parcial N° 5	$ 968.072.877,00	Acta Parcial N° 5	$ 76.531.321,00
Acta Parcial N° 6	$ 879.018.416,00	Acta Parcial N° 6	$ 69.429.626,00
Acta Parcial N° 7	$ 2.523.639.363,00	Acta Parcial N° 7	$ 209.958.422,00
Valor Actas Parciales	$ 11.580.193.941,00	Valor Actas Parciales	$ 925.866.076,00
Saldo	$ 2.548.753.869,00	Saldo	$ 203.779.382,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N° 93

Lunes 15/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de instalación de Sardinel A10 en la vía sector intermedio. Continúan las labores de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaletas para los New jerséis del puente.

Martes 16/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de instalación de Sardinel A10 en la vía sector intermedio. Se realiza vaciado de concreto para los últimos módulos de los New jerséis del puente.

Miércoles 17/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de instalación de Sardinel A10 en la vía sector intermedio.

Jueves 18/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de instalación de Sardinel A10 en la vía sector intermedio.

Viernes 19/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de instalación de Sardinel A10 en la vía sector intermedio. Inician labores de figurado y amarre de acero de refuerzo para el sumidero del eje 1 en el sector de Hayuelos. Se realiza conformación de la capa de base granular de la vía del eje 1, en el sector intermedio.

Sábado 20/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan labores de figurado y amarre de acero de refuerzo para el sumidero del eje 1 en el sector de Hayuelos.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	22	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

CANTIDADES SEMANA N° 93

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA					SEMANA 93		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES								
2	3.02.03	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 14.486,00	0,00	$ -	563,00	$ 8.155.618,00
Subtotal						$ -		$ 8.155.618,00
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES								
5	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	$ 1.483.583,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3	$ 91.500,00	0,00	$ -	1.143,00	$ 104.584.500,00
7	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	$ 123.000,00	10,00	$ 1.230.000,00	213,00	$ 26.199.000,00
8	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM	M3	$ 138.000,00	60,00	$ 8.280.000,00	75,00	$ 10.350.000,00
9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	0,00	$ -	35.160,00	$ 70.320.000,00
Subtotal						$ 9.510.000,00		$ 211.453.500,00
CARPETA ASFALTICA								
10	3.06.09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	$ 4.265,00	0,00	$ -	335,00	$ 1.428.775,00
Subtotal						$ -		$ 1.428.775,00
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL								
14	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	$ 123.000,00	10,00	$ 1.230.000,00	135,00	$ 16.605.000,00
16	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	200,00	$ 400.000,00	2.650,00	$ 5.300.000,00
17	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	$ 65.000,00	80,00	$ 5.200.000,00	150,00	$ 9.750.000,00
18	1.11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	M2	$ 63.000,00	80,00	$ 5.040.000,00	195,00	$ 12.285.000,00
20	APU 01	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC 10 ESPESOR 7,5 CM , INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÒN , ACARREO LIBRE DE 10k	M2	$ 76.645,00	0,00	$ -	130,00	$ 9.963.850,00
21	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	$ 90.000,00	5,00	$ 450.000,00	60,00	$ 5.400.000,00
22	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	$ 90.000,00	5,00	$ 450.000,00	65,00	$ 5.850.000,00
24	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	$ 54.616,00	50,00	$ 2.730.800,00	455,00	$ 24.850.280,00
Subtotal						$ 15.500.800,00		$ 90.004.130,00
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-4_01	REF 3.13.19	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	ML	$ 39.106,00	0,00	$ -	321,00	$ 12.553.026,00
NP-5_01	3.02.10	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	$ 155.207,00	0,00	$ -	276,00	$ 42.837.132,00
NP-10_01	3.02.07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)	M3	$ 21.358,00	0,00	$ -	92,00	$ 1.964.936,00
NP-11_01	2.01.10	RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 179.491,00	11,00	$ 1.974.401,00	11,00	$ 1.974.401,00
103	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 82.976,00	5,00	$ 414.880,00	35,60	$ 2.953.945,60
NP-25_01	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	$ 1.344.598,00	4,00	$ 5.378.392,00	14,40	$ 19.362.211,20
NP-29_01	3.13.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=45.2 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	$ 12.380,19	0,00	$ -	595,00	$ 7.366.210,67
NP-32_01	1.01.33	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	$ 17.718,00	0,00	$ -	8,00	$ 141.744,00
NP-37_01	2.05.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	$ 263.569,00	12,00	$ 3.162.828,00	12,00	$ 3.162.828,00
Subtotal						$ 10.930.501,00		$ 94.886.113,07
SECCIÓN 02 - CONSTRUCCION PUENTES						$ -		$ 4.003.980.889,00
CONCRETOS								
31	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	$ 47.941,00	0,00	$ -	71,00	$ 3.403.811,00
33	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	$ 8.120,00	0,00	$ -	7.200,00	$ 58.464.000,00

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	22	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

33	1.02.42	420 Mpa	KG	$	8.120,00	0,00	$ -	7.200,00	$	58.464.000,00
35	3.10.02	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M (PARA SILLA DE APOYOS SUPERESTRUCTURA PLACA APROXIMACIÓN Y VIGA CIMENTACION ALETAS)	M3	$	1.250.000,00	0,00	$ -	32,00	$	40.000.000,00
Subtotal							$ -		$	**101.867.811,00**
SUPERESTRUCTURA										
38	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$	8.120,00	0,00	$ -	16.000,00	$	129.920.000,00
39	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	$	29.000,00	0,00	$ -	117.000,00	$	3.393.000.000,00
Subtotal							$ -		$	**3.522.920.000,00**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS										
NP-48_02	**REF 3.13.43 3.12.06 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTÓMEROS DE NEOPRENO 40CM*40CM*6.9CM DUREZA 60 - 5 LAMINAS DE 4mm	UND	$	1.516.178,00	0,00	$ -	4,00	$	6.064.712,00
NP-49_02	**REF 1.03.20 COT**	ESTAMPADO PARA CONCRETO DE ANDENES (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). NO INCLUYE CONCRETO	M2	$	78.832,00	0,00	$ -	169,00	$	13.322.608,00
NP-50_02	**REF 3.13.13 1.03.19 3.08.18 COT**	MORTERO TIPO GROUTING PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN	LT	$	31.111,00	0,00	$ -	65,00	$	2.022.215,00
NP-63_02	**REF 3.10.09 2.05.09**	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=4"	ML	$	60.957,00	0,00	$ -	22,80	$	1.389.819,60
NP-70_02	**REF 1.03.20 3.10.02**	PLACA EN CONCRETO DE 28 MPA -(4000 PSI) LONGITUD MAYOR A 14 M, E=24 CM	M2	$	275.223,00	0,00	$ -	415,80	$	114.437.723,40
VAR. 1	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE LUZ 30M	KG	$	2.068,00	0,00	$ -	117.000,00	$	241.956.000,00
Subtotal							$ -		$	**379.193.078,00**
Subtotal							$ -		$	-
			SUBTOTAL OBRAS				$ 35.941.301,00		$	**4.409.909.025,07**

ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (OBRA)	$ 35.941.301,00	**92,2%**	**$ 4.165.383.346,47**
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (INTERVENTORIA)		**92,2%**	**$ 291.535.240,64**
TOTAL ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025		**92,2%**	**$ 4.456.918.587,11**
TOTAL RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2025			**$ 4.835.148.229,44**
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (OBRA)			$ 4.518.872.292,37
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (INTERVENTORIA)			$ 316.275.937,07
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA ADICION N°3	$ -		**$ 244.525.678,60**
TOTAL RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			**$ 273.222.972,56**
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (OBRA) ADICION N°3			$ 255.306.400,63
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			$ 17.916.571,93
TOTAL ADICION N°3 (OBRA)			**$ 4.774.178.693,00**
TOTAL ADICION N°3 (INTERVENTORIA)			**$ 334.192.509,00**
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA			**$ 14.128.947.810,00**
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			**$ 1.129.645.458,00**

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Lunes 22/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continuar labores de figurado y amarre de acero de refuerzo para el sumidero del eje 1 en el sector de Hayuelos.

Martes 23/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, losetas y adoquines en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continuar labores de figurado y amarre de acero de refuerzo para el sumidero del eje 1 en el sector de Hayuelos.

Miércoles 24/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, losetas y adoquines en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Realizar el vaciado de la placa de fondo para el sumidero del eje 1 en el sector de Hayuelos.

Jueves 25/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, losetas y adoquines en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continuar labores de figurado y amarre de acero de refuerzo para el sumidero del eje 1 en el sector de Hayuelos.

Viernes 26/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, losetas y adoquines en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Realizar el vaciado de las paredes del sumidero del eje 1 en el sector de Hayuelos.

Sábado 27/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, losetas y adoquines en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	22	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA N° 93

AMARRE DE ACERO DE REFUERZO E INSTALACION DE FORMALETA PARA NEW JERSEYS DEL PUENTE







VACIADO DE CONCRETO MODULOS NEW JERSEYS DEL PUENTE








INSTALACION DE BORDILLO, LOSETA ALERTA, GUIA Y ADOQUIN EN ESPACIO PUBLICO



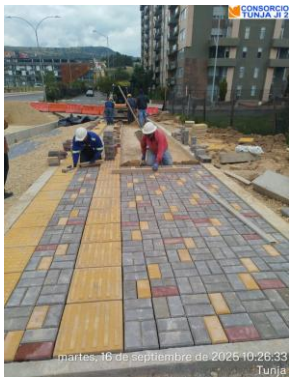



ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	22	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

INSTALACION DE SARDINEL A-10, VIA EJE 1 SECTOR INTERMEDIO







FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA SUMIDERO EJE 1 SECTOR HAYUELOS








CONFORMACION CAPA DE BASE GRANULAR VIA EJE 1 SECTOR INTERMEDIO





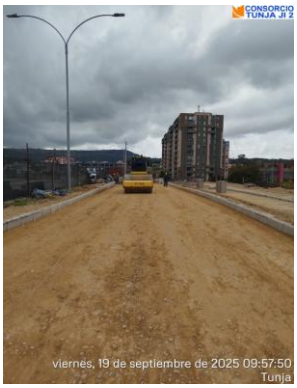

Elaboró ING RICHARD A. ACOSTA T.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Nombre: ING CESAR A. PALACIOS W.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1.10-3 262

Tunja, 16 de septiembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío informe semanal No. 92 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe semanal No. 92 de la interventoría referente al convenio del asunto, para su conocimiento.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

NIT.891800846-1
Carrera 9 # 19-56 Casa del Fundador Tunja - Boyacá
Tel: 7405770 atencionalciudadano@tunja.gov.co
www.tunja-boyaca.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	15	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

SEMANA No. 92 Del 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Hasta 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato 636 Días Tiempo para la finalización del contrato 4 Días

Nombre del Supervisor: Ing. Jaime Arturo Tovar Rodríguez

Cargo: SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada(%)	1,07%	99,42%	Obra Ejecutada (%)	0,23%	94,73%
Valor Obra Programada	$ 151.179.741,57	$ 14.046.999.912,70	Valor Obra Ejecutada	$ 31.959.332,00	$ 13.384.524.521,41
Diferencia Semanal		0,84%	Diferencia Acumulada		4,69%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Constructor	CONSORCIO HAYUELOS	Interventor	CONSORCIO TUNJA JI 2
Contrato N°	1557 DE 2023	Contrato N°	1639 DE 2023
Valor Inicial	$ 9.031.645.799,00	Valor Inicial	$ 714.000.000,00
Valor adición N°1	$ 323.123.318,00	Valor adición N°1	$ 81.452.949,00
Valor adición N°2	$ 4.774.178.693,00	Valor adición N°2	$ 334.192.509,00
Valor Actualizado	$ 14.128.947.810,00	Valor Actualizado	$ 1.129.645.458,00
Plazo Inicial	5.48 Meses	Plazo Inicial	5.48 Meses
Fecha de Inicio	17/07/2023	Fecha de Inicio	17/07/2023
Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023	Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023
Prorroga 1	1/01/2024	Prorroga 1	1/01/2024
Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses	Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses
Prorroga 2	28/05/2024	Prorroga 2	28/05/2024
Tiempo Prorroga 2	1 Mes	Tiempo Prorroga 2	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024
Prorroga 3	10/06/2024	Prorroga 3	10/06/2024
Tiempo Prorroga 3	1 Mes	Tiempo Prorroga 3	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024
Prorroga 4	15/08/2024	Prorroga 4	15/08/2024
Tiempo Prorroga 4	1 Mes	Tiempo Prorroga 4	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024
Suspensión 1	3/09/2024	Suspensión 1	3/09/2024
Tiempo Suspensión 1	15 Días	Tiempo Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024	Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024
Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024	Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 17/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 1	HASTA 17/10/2024
Acta de Reinicio N°1	17/10/2024	Acta de Reinicio N°1	17/10/2024

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	15	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Valor Adicional N°1	$	323.123.318,00	Valor Adicional N°1	$	81.452.949,00
Prorroga 5		17/10/2024	Prorroga 5		17/10/2024
Tiempo Prorroga 5		15 Días	Tiempo Prorroga 5		15 Días
Suspensión 2		8/11/2024	Suspensión 2		8/11/2024
Tiempo Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024	Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025
Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025	Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025
Acta de Reinicio N°2		3/02/2025	Acta de Reinicio N°2		3/02/2025
Suspensión 3		4/02/2025	Suspensión 3		4/02/2025
Tiempo Suspensión 3		25 Días	Tiempo Suspensión 3		25 Días
Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025	Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025
Acta de Reinicio N°3		28/02/2025	Acta de Reinicio N°3		28/02/2025
Prorroga 6		28/02/2025	Prorroga 6		28/02/2025
Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses	Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses
Valor Adicional N°2	$	4.774.178.693,00	Valor Adicional N°2	$	334.192.509,00
Fecha de Terminación Final		HASTA 18/09/2025	Fecha de Terminación Final		HASTA 18/09/2025
Anticipo		N/A	Anticipo		N/A
% Avance del Anticipo		N/A	% Avance del Anticipo		N/A
Acta Parcial N° 1	$	1.807.173.935,00	Acta Parcial N° 1	$	142.866.784,00
Acta Parcial N° 2	$	3.276.730.721,00	Acta Parcial N° 2	$	259.043.123,00
Acta Parcial N° 3	$	1.235.393.508,00	Acta Parcial N° 3	$	97.664.477,00
Acta Parcial N° 4	$	890.165.121,00	Acta Parcial N° 4	$	70.372.323,00
Acta Parcial N° 5	$	968.072.877,00	Acta Parcial N° 5	$	76.531.321,00
Acta Parcial N° 6	$	879.018.416,00	Acta Parcial N° 6	$	69.429.626,00
Valor Actas Parciales	$	9.056.554.578,00	Valor Actas Parciales	$	715.907.654,00
Saldo	$	5.072.393.232,00	Saldo	$	413.737.804,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N° 92

Lunes 08/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan las labores de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaletas para los New jerseys del puente.

Martes 09/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan las labores de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaletas para los New jerseys del puente. Se realiza la excavación y posterior instalación de la tubería de 10" para el sumidero ubicado en el eje 1 en el sector de Hayuelos.

Miércoles 10/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan las labores de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaletas para los New jerseys del puente.

Jueves 11/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan las labores de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaletas para los New jerseys del puente. Se realiza la instalación de la carpeta asfáltica para la ciclorruta del espacio publico del Eje 1, desde el K0+010 al K0+070. Se realiza vaciado de concreto de tres módulos de los New Jerseys del puente.

Viernes 12/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan las labores de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaletas para los New jerseys del puente.

Sábado 13/09/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continúan las labores de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaletas para los New jerseys del puente.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	15	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

CANTIDADES SEMANA N° 92

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA					SEMANA 92		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES								
2	3.02.03	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 14.486,00	7,00	$ 101.402,00	563,00	$ 8.155.618,00
3	3.12.04	TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS.	M3-KM	$ 2.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal						**$ 101.402,00**		**$ 8.155.618,00**
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES								
5	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	$ 1.483.583,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3	$ 91.500,00	0,00	$ -	1.143,00	$ 104.584.500,00
7	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	$ 123.000,00	0,00	$ -	203,00	$ 24.969.000,00
8	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM	M3	$ 138.000,00	15,00	$ 2.070.000,00	15,00	$ 2.070.000,00
9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	0,00	$ -	35.160,00	$ 70.320.000,00
Subtotal						**$ 2.070.000,00**		**$ 201.943.500,00**
CARPETA ASFALTICA								
10	3.06.09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	$ 4.265,00	130,00	$ 554.450,00	335,00	$ 1.428.775,00
Subtotal						**$ 554.450,00**		**$ 1.428.775,00**
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL								
14	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	$ 123.000,00	0,00	$ -	125,00	$ 15.375.000,00
16	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	200,00	$ 400.000,00	2.450,00	$ 4.900.000,00
17	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	$ 65.000,00	70,00	$ 4.550.000,00	70,00	$ 4.550.000,00
18	1.11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	M2	$ 63.000,00	0,00	$ -	115,00	$ 7.245.000,00
20	APU 01	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC 10 ESPESOR 7,5 CM , INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÒN , ACARREO LIBRE DE 10k	M2	$ 76.645,00	130,00	$ 9.963.850,00	130,00	$ 9.963.850,00
21	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	$ 90.000,00	3,00	$ 270.000,00	55,00	$ 4.950.000,00
22	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	$ 90.000,00	3,00	$ 270.000,00	60,00	$ 5.400.000,00
24	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	$ 54.616,00	120,00	$ 6.553.920,00	405,00	$ 22.119.480,00
Subtotal						**$ 22.007.770,00**		**$ 74.503.330,00**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-4_01	**REF 3.13.19**	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	ML	$ 39.106,00	0,00	$ -	321,00	$ 12.553.026,00
NP-5_01	3.02.10	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	$ 155.207,00	0,00	$ -	276,00	$ 42.837.132,00
NP-10_01	3.02.07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)	M3	$ 21.358,00	2,50	$ 53.395,00	92,00	$ 1.964.936,00
103	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 82.976,00	5,00	$ 414.880,00	30,60	$ 2.539.065,60
NP-25_01	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	$ 1.344.598,00	3,00	$ 4.033.794,00	10,40	$ 13.983.819,20
NP-29_01	3.13.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=45.2 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	$ 12.380,19	220,00	$ 2.723.640,92	595,00	$ 7.366.210,67
NP-32_01	1.01.33	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	$ 17.718,00	0,00	$ -	8,00	$ 141.744,00
Subtotal						**$ 7.225.709,92**		**$ 83.955.612,07**
SECCIÓN 02 - CONSTRUCCION PUENTES						**$ -**		**$ 4.003.980.889,00**
CONCRETOS								
31	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	$ 47.941,00	0,00	$ -	71,00	$ 3.403.811,00
33	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 8.120,00	0,00	$ -	7.200,00	$ 58.464.000,00

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	15	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

35	3.10.02	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M (PARA SILLA DE APOYOS SUPERESTRUCTURA PLACA APROXIMACIÓN Y VIGA CIMENTACION ALETAS)	M3	$ 1.250.000,00	0,00	$ -	32,00	$ 40.000.000,00
Subtotal						$ -		$ 101.867.811,00
SUPERESTRUCTURA								
38	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 8.120,00	0,00	$ -	16.000,00	$ 129.920.000,00
39	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	$ 29.000,00	0,00	$ -	117.000,00	$ 3.393.000.000,00
Subtotal						$ -		$ 3.522.920.000,00
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-48_02	**REF 3.13.43 3.12.06 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTÓMEROS DE NEOPRENO 40CM*40CM*6.9CM DUREZA 60 - 5 LAMINAS DE 4mm	UND	$ 1.516.178,00	0,00	$ -	4,00	$ 6.064.712,00
NP-49_02	**REF 1.03.20 COT**	ESTAMPADO PARA CONCRETO DE ANDENES (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). NO INCLUYE CONCRETO	M2	$ 78.832,00	0,00	$ -	169,00	$ 13.322.608,00
NP-50_02	**REF 3.13.13 1.03.19 3.08.18 COT**	MORTERO TIPO GROUTING PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN	LT	$ 31.111,00	0,00	$ -	65,00	$ 2.022.215,00
NP-63_02	**REF 3.10.09 2.05.09**	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=4"	ML	$ 60.957,00	0,00	$ -	22,80	$ 1.389.819,60
NP-70_02	**REF 1.03.20 3.10.02**	PLACA EN CONCRETO DE 28 MPA -(4000 PSI) LONGITUD MAYOR A 14 M, E=24 CM	M2	$ 275.223,00	0,00	$ -	415,80	$ 114.437.723,40
VAR.1	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE LUZ 30M	KG	$ 2.068,00	0,00	$ -	117.000,00	$ 241.956.000,00
Subtotal						$ -		$ 379.193.078,00
			SUBTOTAL OBRAS			$ 31.959.331,92		$ 4.373.967.724,07

ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (OBRA)	$ 31.959.331,92	**91,4%**	**$ 4.129.442.045,47**
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (INTERVENTORIA)		**91,4%**	**$ 289.019.708,46**
TOTAL ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025		**91,4%**	**$ 4.418.461.753,93**
TOTAL RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2025			**$ 4.835.148.229,44**
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (OBRA)			$ 4.518.872.292,37
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (INTERVENTORIA)			$ 316.275.937,07
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA ADICION N°3	$ -		**$ 244.525.678,60**
TOTAL RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			**$ 273.222.972,56**
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (OBRA) ADICION N°3			$ 255.306.400,63
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			$ 17.916.571,93
TOTAL ADICION N°3 (OBRA)			**$ 4.774.178.693,00**
TOTAL ADICION N°3 (INTERVENTORIA)			**$ 334.192.509,00**
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA			**$ 14.128.947.810,00**
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			**$ 1.129.645.458,00**

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Lunes 15/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Continuar las labores de amarre de acero de refuerzo e instalación de formaletas para los New jerseys del puente.

Martes 16/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Realizar el vaciado de concreto de los tres últimos módulos de los New Jerseys del puente.

Miércoles 17/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, loseta táctil y loseta guía en el espacio público del Eje 1, en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio.

Jueves 18/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, loseta táctil y loseta guía en el espacio público del Eje 1, en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Realizar desencofrado de las formaletas de los New Jerseys fundidos el día martes.

Viernes 19/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, loseta táctil y loseta guía en el espacio público del Eje 1, en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio.

Sábado 20/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, sardineles, loseta táctil y loseta guía en el espacio público del Eje 1, en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	15	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA


CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA


DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA N° 92

AMARRE DE ACERO DE REFUERZO E INSTALACION DE FORMALETA PARA NEW JERSEYS DEL PUENTE



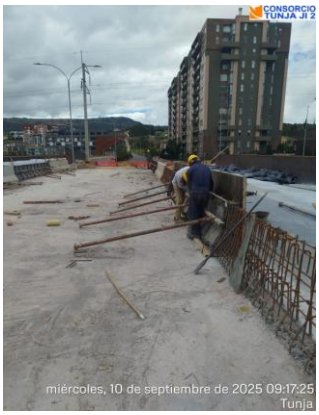

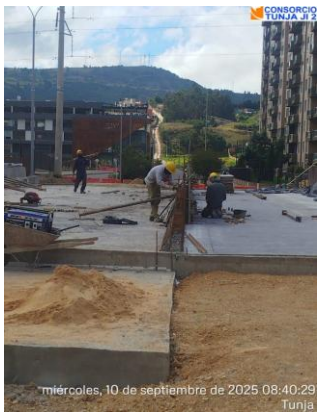

VACIADO DE CONCRETO MODULOS NEW JERSEYS DEL PUENTE







IMPRIMACION E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA CICLORRUTA ESPACIO PUBLICO EJE 1 K0+000 AL K0+070







ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	15	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA PARA SUMIDERO EJE 1 SECTOR HAYUELOS







INSTALACION BORDILLO Y SARDINEL ESPACIO PUBLICO EJE 1







Elaboró ING RICHARD A. ACOSTA T.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Nombre: ING CESAR A. PALACIOS W.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

1.1-2 2160

Tunja, 08 de septiembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Solicitud de giro de recursos por avance parcial de obra – Acta No. 1 - Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

En mi calidad de Representante Legal del Municipio de Tunja y en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1940 de 2025, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja, me permito solicitar respetuosamente el giro de recursos correspondientes al avance parcial de la ejecución de las actividades del presupuesto del convenio, incluyendo la interventoría.

De acuerdo con los informes técnicos y financieros allegados, soportados en evidencias documentales y registros fotográficos, el avance físico-financiero a la fecha corresponde al 80.48 %, equivalente a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON 46 CENTAVOS MONEDA LEGAL ($3.891.271.511,46), recursos que se encuentran debidamente certificados por la interventoría.

En este sentido, y en cumplimiento de las disposiciones contractuales y financieras del convenio, solicitamos se efectúe el desembolso del valor indicado, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades programadas.

Se enviarán los siguientes anexos:

1. Acta parcial del contrato derivado del convenio, incluyendo sábana de cantidades contratadas y ejecutadas, memorias de cantidades de obra y certificaciones de cumplimiento.
2. Certificación de cuenta bancaria para consignación del pago, con fecha de expedición vigente.
3. Certificación de cumplimiento de afiliaciones y pagos de seguridad social, riesgos laborales y obligaciones parafiscales del municipio, incluyendo copia de documento de identidad, matrícula profesional, certificación de vigencia de Contador Público y certificado de antecedentes vigente.
4. Certificación y soporte de rendimientos financieros de los recursos aportados por el departamento, y evidencias de su devolución o reintegro a la cuenta indicada por la

supervisión (incluye certificación de tesorería con número de convenio, año, valor y concepto; soportes de consignación o transferencia con información legible de fecha, valor y número de cuenta; certificación bancaria de rendimientos generados y copia de extractos bancarios detallados).

5. Copia del Informe mensual 3 del municipio que soporta el porcentaje de avance parcial, en el formato A-AD-GC-F045.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

MIKHAIL KRASNOV
Alcalde Municipal
Alcaldía Mayor del Municipio de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar
Revisó: Ing. Lina María Bautista

1.10-3 236

Tunja, 08 de septiembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío certificación devolución rendimientos del Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho la certificación de la devolución de rendimientos del mes de Junio y Julio del convenio interinstitucional del asunto, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Mayor de Tunja, cuyo objeto es la terminación de las obras de infraestructura vial en la calle 59 de esta ciudad.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

Departamento
Administrativo
de Hacienda Pública

TUNJA

1.13.2-1.1 025

Tunja, 3 de septiembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
Profesional Universitario
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial
Gobernación de Boyacá

Asunto: Certificación de Tesorería – Devolución de rendimientos Convenio No. 1940 de 2025.

Atento saludo, Ingeniero Alba:

Por medio del presente, me permito certificar que a la fecha se ha efectuado la devolución de los rendimientos financieros generados en el marco del **Convenio No. 1940 de 2025**, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja para la construcción y mejoramiento del tramo vial sobre la Calle 59, entre la vía antigua a Paipa y la Avenida Universitaria (puentes, estructura vial, urbanismo y obras complementarias) del Municipio de Tunja – Boyacá".*

A continuación, se detalla la información correspondiente a la devolución. De igual manera, me permito informar que la devolución de los rendimientos del mes de agosto se encuentra en trámite, dado que los extractos bancarios son generados entre el 1 y el 10 del mes siguiente.

CTA DE AHORROS / BANCOLOMBIA No. 88200006082					
Convenio No. 1940 de 2025, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja para la construcción y mejoramiento del tramo vial sobre la Calle 59, entre la vía antigua a Paipa y la Avenida Universitaria (puentes, estructura vial, urbanismo y obras complementarias) del Municipio de Tunja – Boyacá".*					
MES	**AÑO**	**VALOR EXTRACTO**	**EG DEVOL. REND FINANCIEROS**	**FECHA DEVOLUCION**	**VALOR DEVOLUCION**
JUNIO	2025	713.649,94	202507179	19/AGT/2025	713.649,94
JULIO	2025	666.647,14	202507814	28/AGT/2025	666.647,14
TOTAL		**1.380.297,08**			**1.380.297,08**

Se anexa soportes de consignación con la evidencia de exitoso, certificación bancaria de rendimientos generados y copia del extracto bancario.

Quedamos atentos cualquier inquietud al respecto.

MELBA FONSECA TIBATA
Tesorera General-Unidad Gestión Tesorería

Proyectó: Patricia Rodríguez Peralta- Profesional U. Contratista

Anexos:
- 1_ Dev. RF Junio_ Cv. 1940 de 2025
- 2_ Ext. 30-DE-06-25-E-BANCOLOMBIA-6082
- 3_ Dev. RF Julio_ Cv. 1940 de 2025
- 4_ Ext. 30-DE-07-25-E-BANCOLOMBIA-6082
- 5_Certificación bancaria.

Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 7

AÑO	MES	DÍA
2025	8	12

$ 713.649,94

Páguese a: DEPARTAMENTO DE BOYACA Nit: 891.800.498

La Suma de: SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 882-000060-82
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 [illegible] 882-000060-8 2[illegible]0

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO BOYACA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	EG.202507179
12 DE AGOSTO DEL 2025	

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE BOYACA Id. 891.800.498

POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2025, GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS NO. 882-000060-82 DE BANCOLOMBIA Y CONSIGNADOS A LA CUENTA CORRIENTE NO. 291-01820-8 DEL BANCO ITAÚ A NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN CU

POR VALOR DE: $ 713.649,94

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 882-000060-82	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: MUNICIPIO DE TUNJA - CV

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24072601 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA	$ 713.649,94	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE			
11100600600102 - BANCOLOMBIA AHORROS NO. 882	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 713.649,94
DETALLE DEL PAGO: MUNICIPIO DE TUNJA - CV INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2025 - DEPA			
TOTALES		$ 713.649,94	$ 713.649,94

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
		-		

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
CORREDOR CACUA SONIA AMPARO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FONSECA TIBATÁ MELBA TESORERA GENERAL	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE
OBSERVACIONES		

ELABORÓ: SCORREDOR **IMPRIMIÓ:** scorredor IP: 45.65.232.194

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

OBLIGACIÓN PAGO A TERCEROS No. 20250087

VIGENCIA FISCAL - 2025

Nit. 891800846

TIPO:	Obligacion	**FECHA:**	05/08/2025	**ESTADO:**	ELABORADO
DESCRIPCIÓN:	TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2025, GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS NO. 882-000060-82 DE BANCOLOMBIA Y CONSIGNADOS A LA CUENTA CORRIENTE NO. 291-01820-8 DEL BANCO ITAÚ A NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN CU				

COD. TERCERO:	891.800.498	**NOMBRE TERCERO:**	DEPARTAMENTO DE BOYACA		
TOTAL VALOR:	$ 713.649,94	**TOTAL PAGADO:**	$ 0,00		
TOTAL RETENCIÓN:	$ 0,00	**TOTAL NETO:**	$ 713.649,94		
VALOR EN LETRAS:	SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L.				

RESUMEN

Nro.	Descripción	Valor	Deducciones	Pagado	Saldo
	TOTALES	$ 713.649,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 713.649,94

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
	TOTALES		

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN

ELABORA

RODRIGUEZ PERALTA SANDRA PATRICIA
CONTRATISTA

APRUEBA

EGEA CHARRIS JACQUELINE DE JESUS
CONTADORA TP: 136123-T

IP: 45.65.232.194 ELABORÓ: IMPRIMIÓ: prodriguez

Empresa: MUNICIPIO DE TUNJA **Nit:** 891800846
Usuario: JAIRO PINTO

22 de Agosto de 2025 10:24:05 AM
Dirección IP: 45.65.232.198

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 19 de agosto de 2025 - 11:30 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
MUNICIPIO DE TUNJA
NIT: 891800846
FECHA: 22/08/2025

Entidad	ITAÚ
Producto Beneficiario	291018208
Identificación Beneficiario	891800498
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	DEPARTAMENTO DE BO
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	713,649.94
Oficina de Entrega	0
Referencia	20257179
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/08/19
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

Nro. Registro	Estado Transacción	
2	Correcta	☐

Ver

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 88200006082

SUCURSAL LIBERTADORES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N• 1940 DE

CL 19 9 95 PI 2

TUNJA (BOYACA) BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	2,175,840,491
TOTAL ABONOS	$	2,418,287,764.66	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	713,649.94
SALDO ACTUAL	$	2,418,287,764.66	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/06	PAGO INTERBANC DEPARTAMENTO DE			2,417,574,114.72	2,417,574,114.72
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			713,649.94	2,418,287,764.66
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

CHEQUE No. 0 7

AÑO	MES	DIA
2025	8	27

$ 666.647,14

Páguese a: DEPARTAMENTO DE BOYACA Nit: 891.800.498

La Suma de: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 882-000060-82
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 [illegible] 882-000060-82 20

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO BOYACA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	EG.202507814
27 DE AGOSTO DEL 2025	

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE BOYACA Id. 891.800.498

POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DE 2025, GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS NO. 882-000060-82 DE BANCOLOMBIA Y CONSIGNADOS A LA CUENTA CORRIENTE NO. 291-01820-8 DEL BANCO ITAÚ A NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN CUM

POR VALOR DE: $ 666.647,14

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 882-000060-82	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: MUNICIPIO DE TUNJA - CV

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24072601 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA	$ 666.647,14	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DE			
11100600600102 - BANCOLOMBIA AHORROS NO. 882	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 666.647,14
DETALLE DEL PAGO: MUNICIPIO DE TUNJA - CV INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2025 - DEPA			
TOTALES		$ 666.647,14	$ 666.647,14

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Preparado por:	Aprobado por:		
CORREDOR CACUA SONIA AMPARO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-09	FONSECA TIBATÁ MELBA TESORERA GENERAL	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE	
OBSERVACIONES			

ELABORÓ: SCORREDOR **IMPRIMIÓ:** scorredor IP: 45.65.232.194

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

OBLIGACIÓN PAGO A TERCEROS No. 20250097

VIGENCIA FISCAL - 2025

Nit. 891800846

TIPO:	Obligacion	**FECHA:**	26/08/2025	**ESTADO:**	ELABORADO
DESCRIPCIÓN:	TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DE 2025, GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS NO. 882-000060-82 DE BANCOLOMBIA Y CONSIGNADOS A LA CUENTA CORRIENTE NO. 291-01820-8 DEL BANCO ITAÚ A NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN CUM				

COD. TERCERO:	891.800.498	**NOMBRE TERCERO:**	DEPARTAMENTO DE BOYACA
TOTAL VALOR:	$ 666.647,14	**TOTAL PAGADO:**	$ 0,00
TOTAL RETENCIÓN:	$ 0,00	**TOTAL NETO:**	$ 666.647,14
VALOR EN LETRAS:	SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/L.		

RESUMEN

Nro.	Descripción	Valor	Deducciones	Pagado	Saldo
	TOTALES	$ 666.647,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 666.647,14

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
	TOTALES		

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN

ELABORA

RODRIGUEZ PERALTA SANDRA PATRICIA
CONTRATISTA

APRUEBA

EGEA CHARRIS JACQUELINE DE JESUS
CONTADORA TP: 136123-T

IP: 45.65.232.194 **ELABORÓ:** **IMPRIMIÓ:** prodriguez

Empresa: MUNICIPIO DE TUNJA **Nit:** 891800846
Usuario: JAIRO PINTO

2 de Septiembre de 2025 2:58:07 PM
Dirección IP: 45.65.232.198

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de agosto de 2025 - 4:20 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
MUNICIPIO DE TUNJA
NIT: 891800846
FECHA: 02/09/2025

Entidad	ITAÚ
Producto Beneficiario	291018208
Identificación Beneficiario	891800498
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	DEPARTAMENTO DE BO
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	666,647.14
Oficina de Entrega	0
Referencia	20257814
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/08/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO

Regresar

Nro. Registro	Estado Transacción	
2	Correcta	☐

Ver

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 88200006082

SUCURSAL LIBERTADORES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N• 1940 DE

CL 19 9 95 PI 2

TUNJA (BOYACA) BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,418,287,764.66	*SALDO PROMEDIO*	$	1,998,283,272
TOTAL ABONOS	$	666,647.14	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,860,749,662.39	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	666,647.14
SALDO ACTUAL	$	558,204,749.41	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			634,532.34	2,418,922,297.00
25/07	PAGO A PROVE CONSORCIO HAYUE			-1,860,749,662.39	558,172,634.61
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			32,114.80	558,204,749.41
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Tunja, 05 de septiembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT número 891800846 presenta la siguiente información:

Nombre Producto	Numero producto	Fecha de Apertura	Estado	Fecha de corte	Interés Pagado
CUENTA AHORROS	882-000060-82	2025/05/05	ACTIVA	30/06/2025	$713,649.94
CUENTA AHORROS	882-000060-82	2025/05/05	ACTIVA	31/07/2025	$666,647.14
CUENTA AHORROS	882-000060-82	2025/05/05	ACTIVA	30/08/2025	$81,236.75

*Importante: esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

Grupo Bancolombia

1.10-3 237

Tunja, 08 de Septiembe de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío informe semanal No. 91 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe semanal No. 91 de la interventoría referente al convenio del asunto, para su conocimiento.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

1.10-3 218

Tunja, 01 de Septiembe de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío informe semanal No. 90 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe semanal No. 90 de la interventoría referente al convenio del asunto, para su conocimiento.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	1	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

SEMANA No. 90 Del 25 DE AGOSTO DE 2025 Hasta 31 DE AGOSTO DE 2025

Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato 622 Días Tiempo para la finalización del contrato 18 Días

Nombre del Supervisor: Ing. Jaime Arturo Tovar Rodríguez

Cargo: SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada(%)	1,23%	97,19%	Obra Ejecutada (%)	0,71%	94,24%
Valor Obra Programada	$ 173.786.058,06	$ 13.731.924.376,54	Valor Obra Ejecutada	$ 100.648.911,00	$ 13.315.350.171,41
Diferencia Semanal		0,52%	Diferencia Acumulada		2,95%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Constructor	CONSORCIO HAYUELOS	Interventor	CONSORCIO TUNJA JI 2
Contrato N°	1557 DE 2023	Contrato N°	1639 DE 2023
Valor Inicial	$ 9.031.645.799,00	Valor Inicial	$ 714.000.000,00
Valor adición N°1	$ 323.123.318,00	Valor adición N°1	$ 81.452.949,00
Valor adición N°2	$ 4.774.178.693,00	Valor adición N°2	$ 334.192.509,00
Valor Actualizado	$ 14.128.947.810,00	Valor Actualizado	$ 1.129.645.458,00
Plazo Inicial	5.48 Meses	Plazo Inicial	5.48 Meses
Fecha de Inicio	17/07/2023	Fecha de Inicio	17/07/2023
Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023	Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023
Prorroga 1	1/01/2024	Prorroga 1	1/01/2024
Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses	Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses
Prorroga 2	28/05/2024	Prorroga 2	28/05/2024
Tiempo Prorroga 2	1 Mes	Tiempo Prorroga 2	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024
Prorroga 3	10/06/2024	Prorroga 3	10/06/2024
Tiempo Prorroga 3	1 Mes	Tiempo Prorroga 3	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024
Prorroga 4	15/08/2024	Prorroga 4	15/08/2024
Tiempo Prorroga 4	1 Mes	Tiempo Prorroga 4	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024
Suspensión 1	3/09/2024	Suspensión 1	3/09/2024
Tiempo Suspensión 1	15 Días	Tiempo Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024	Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024
Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024	Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 17/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 1	HASTA 17/10/2024
Acta de Reinicio N°1	17/10/2024	Acta de Reinicio N°1	17/10/2024

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	1	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Valor Adicional N°1	$	323.123.318,00	Valor Adicional N°1	$	81.452.949,00
Prorroga 5		17/10/2024	Prorroga 5		17/10/2024
Tiempo Prorroga 5		15 Días	Tiempo Prorroga 5		15 Días
Suspensión 2		8/11/2024	Suspensión 2		8/11/2024
Tiempo Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024	Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025
Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025	Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025
Acta de Reinicio N°2		3/02/2025	Acta de Reinicio N°2		3/02/2025
Suspensión 3		4/02/2025	Suspensión 3		4/02/2025
Tiempo Suspensión 3		25 Días	Tiempo Suspensión 3		25 Días
Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025	Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025
Acta de Reinicio N°3		28/02/2025	Acta de Reinicio N°3		28/02/2025
Prorroga 6		28/02/2025	Prorroga 6		28/02/2025
Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses	Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses
Valor Adicional N°2	$	4.774.178.693,00	Valor Adicional N°2	$	334.192.509,00
Fecha de Terminación Final		HASTA 18/09/2025	Fecha de Terminación Final		HASTA 18/09/2025
Anticipo		N/A	Anticipo		N/A
% Avance del Anticipo		N/A	% Avance del Anticipo		N/A
Acta Parcial N° 1	$	1.807.173.935,00	Acta Parcial N° 1	$	142.866.784,00
Acta Parcial N° 2	$	3.276.730.721,00	Acta Parcial N° 2	$	259.043.123,00
Acta Parcial N° 3	$	1.235.393.508,00	Acta Parcial N° 3	$	97.664.477,00
Acta Parcial N° 4	$	890.165.121,00	Acta Parcial N° 4	$	70.372.323,00
Acta Parcial N° 5	$	968.072.877,00	Acta Parcial N° 5	$	76.531.321,00
Acta Parcial N° 6	$	879.018.416,00	Acta Parcial N° 6	$	69.429.626,00
Valor Actas Parciales	$	9.056.554.578,00	Valor Actas Parciales	$	715.907.654,00
Saldo	$	5.072.393.232,00	Saldo	$	413.737.804,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N° 90

Lunes 25/08/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos, losetas prefabricadas y adoquín en el espacio público del Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuan las labores de amarre de acero de refuerzo para los New jerseys del puente. Continuan las labores de conformación de la estructura de la vía en el sector de Hayuelos, eje 1. Se realiza el vaciado del solado de limpieza para las placas de aproximación del puente..

Martes 26/08/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos, losetas prefabricadas y adoquín en el espacio público del Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Inician las labores de amarre de acero de refuerzo para las placas de aproximacion del puente. Continuan las labores de conformación de la estructura de la vía en el sector de Hayuelos, eje 1.

Miércoles 27/08/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos, losetas prefabricadas y adoquín en el espacio público del Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuan las labores de amarre de acero de refuerzo para las placas de aproximacion del puente. Continuan las labores de conformación de la estructura de la vía en el sector de Hayuelos, eje 1.

Jueves 28/08/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos, losetas prefabricadas y adoquín en el espacio público del Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuan las labores de amarre de acero de refuerzo para las placas de aproximacion del puente. Continuan las labores de conformación de la estructura de la vía en el sector de Hayuelos, eje 1. Continuan labores de conformacion de la estructura del espacio publico en la zona intermedia del Eje 1 (cruce ferreo al puente).

Viernes 29/08/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos, losetas prefabricadas y adoquín en el espacio público del Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuan las labores de amarre de acero de refuerzo para los New jerseys del puente. Continuan las labores de conformación de la estructura de la vía en el sector de Hayuelos, eje 1. Continuan labores de conformacion de la estructura del espacio publico en la zona intermedia del Eje 1 (cruce ferreo al puente).

Sábado 30/08/2025: Continúan las actividades de instalación de bordillos, losetas prefabricadas y adoquín en el espacio público del Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Se realiza el vaciado de concreto de las dos placas de aproximacion del puente.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	1	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

CANTIDADES SEMANA N° 90

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA					SEMANA 90		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SECCIÓN 01 - CONSTRUCCIÓN CALLE 59						**$ 30.701.443,00**		**$ 308.932.485,25**
EXPLANACIONES								
2	3.02.03	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 14.486,00	0,00	$ -	556,00	$ 8.054.216,00
Subtotal						$ -		$ 8.054.216,00
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES								
6	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3	$ 91.500,00	189,00	$ 17.293.500,00	1.143,00	$ 104.584.500,00
7	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	$ 123.000,00	33,00	$ 4.059.000,00	123,00	$ 15.129.000,00
9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	670,00	$ 1.340.000,00	35.160,00	$ 70.320.000,00
Subtotal						**$ 22.692.500,00**		**$ 190.033.500,00**
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL								
14	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	$ 123.000,00	0,00	$ -	110,00	$ 13.530.000,00
16	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	500,00	$ 1.000.000,00	1.484,00	$ 2.968.000,00
18	1.11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	M2	$ 63.000,00	30,00	$ 1.890.000,00	95,00	$ 5.985.000,00
21	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	$ 90.000,00	10,00	$ 900.000,00	42,00	$ 3.780.000,00
22	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	$ 90.000,00	10,00	$ 900.000,00	47,00	$ 4.230.000,00
24	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	$ 54.616,00	20,00	$ 1.092.320,00	215,00	$ 11.742.440,00
Subtotal						**$ 5.782.320,00**		**$ 42.235.440,00**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-4_01	**REF 3.13.19**	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	ML	$ 39.106,00	0,00	$ -	321,00	$ 12.553.026,00
NP-5_01	3.02.10	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	$ 155.207,00	9,00	$ 1.396.863,00	276,00	$ 42.837.132,00
NP-10_01	3.02.07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)	M3	$ 21.358,00	0,00	$ -	89,50	$ 1.911.541,00
103	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 82.976,00	10,00	$ 829.760,00	20,60	$ 1.709.305,60
NP-25_01	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	$ 1.344.598,00	0,00	$ -	2,40	$ 3.227.035,20
NP-29_01	3.13.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=45.2 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	$ 12.380,19	0,00	$ -	225,00	$ 2.785.541,85
NP-32_01	1.01.33	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	$ 17.718,00	0,00	$ -	8,00	$ 141.744,00
NP-34_01	**REF 2.06.12 COT**	RENIVELACIÓN POZO DE INSPECCIÓN D= 1.20 MH 1,00 1,50 M (ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	$ 2.446.749,00	0,00	$ -	0,40	$ 978.699,60
NP-35_01	**REF 2.06.16 1.03.05 COT**	RENIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN D=1.50 M, H<1 (ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	$ 3.181.958,00	0,00	$ -	0,50	$ 1.590.979,00
Subtotal						**$ 2.226.623,00**		**$ 67.735.004,25**
SECCIÓN 02 - CONSTRUCCION PUENTES						**$ 69.947.468,01**		**$ 3.995.860.889,00**
CONCRETOS								
31	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	$ 47.941,00	64,61	$ 3.097.468,01	71,00	$ 3.403.811,00
33	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 8.120,00	5.000,00	$ 40.600.000,00	7.200,00	$ 58.464.000,00
35	3.10.02	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M (PARA SILLA DE APOYOS SUPERESTRUCTURA PLACA APROXIMACIÓN Y VIGA CIMENTACION ALETAS)	M3	$ 1.250.000,00	21,00	$ 26.250.000,00	32,00	$ 40.000.000,00
Subtotal						**$ 69.947.468,01**		**$ 101.867.811,00**
SUPERESTRUCTURA								
38	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 8.120,00	0,00	$ -	15.000,00	$ 121.800.000,00
		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN,						

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	1	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

39	3.13.22	ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	$ 29.000,00	0,00	$ -	117.000,00	$	3.393.000.000,00
Subtotal						$ -		$	3.514.800.000,00
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS									
NP-48_02	**REF 3.13.43 3.12.06 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTÓMEROS DE NEOPRENO 40CM*40CM*6.9CM DUREZA 60 - 5 LAMINAS DE 4mm	UND	$ 1.516.178,00	0,00	$ -	4,00	$	6.064.712,00
NP-49_02	**REF 1.03.20 COT**	ESTAMPADO PARA CONCRETO DE ANDENES (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). NO INCLUYE CONCRETO	M2	$ 78.832,00	0,00	$ -	169,00	$	13.322.608,00
NP-50_02	**REF 3.13.13 1.03.19 3.08.18 COT**	MORTERO TIPO GROUTING PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN	LT	$ 31.111,00	0,00	$ -	65,00	$	2.022.215,00
NP-63_02	**REF 3.10.09 2.05.09**	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=4"	ML	$ 60.957,00	0,00	$ -	22,80	$	1.389.819,60
NP-70_02	**REF 1.03.20 3.10.02**	PLACA EN CONCRETO DE 28 MPA -(4000 PSI) LONGITUD MAYOR A 14 M, E=24 CM	M2	$ 275.223,00	0,00	$ -	415,80	$	114.437.723,40
VAR. 1	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE LUZ 30M	KG	$ 2.068,00	0,00	$ -	117.000,00	$	241.956.000,00
Subtotal						$ -		$	379.193.078,00
			SUBTOTAL OBRAS			$ 100.648.911,01		$	4.304.793.374,25

ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (OBRA)	$ 100.648.911,01	90% $ 4.060.267.695,65
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (INTERVENTORIA)		90% $ 284.178.194,72
TOTAL ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025		90% $ 4.344.445.890,37
TOTAL RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2025		$ 4.835.148.229,44
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (OBRA)		$ 4.518.872.292,37
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (INTERVENTORIA)		$ 316.275.937,07
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA ADICION N°3	$ -	$ 244.525.678,60
TOTAL RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3		$ 273.222.972,56
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (OBRA) ADICION N°3		$ 255.306.400,63
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3		$ 17.916.571,93
TOTAL ADICION N°3 (OBRA)		$ 4.774.178.693,00
TOTAL ADICION N°3 (INTERVENTORIA)		$ 334.192.509,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA		$ 14.128.947.810,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		$ 1.129.645.458,00

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Lunes 01/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, losetas prefabricadas y adoquín en el espacio público del Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuar las labores de amarre de acero de refuerzo para los New jerseys del puente. Continuar las labores de conformación de la estructura de la vía en el sector de Hayuelos, eje 1. Continuar las labores de conformacion de la estructura del espacio publico en la zona intermedia del Eje 1 (cruce ferreo al puente).

Martes 02/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, losetas prefabricadas y adoquín en el espacio público del Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuar las labores de amarre de acero de refuerzo para los New jerseys del puente. Continuar las labores de conformación de la estructura de la vía en el sector de Hayuelos, eje 1. Continuar las labores de conformacion de la estructura del espacio publico en la zona intermedia del Eje 1 (cruce ferreo al puente).

Miércoles 03/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, losetas prefabricadas y adoquín en el espacio público del Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Realizar el vaciado de concreto de New jerseys del puente. Continuar las labores de conformación de la estructura de la vía en el sector de Hayuelos, eje 1. Continuar las labores de conformacion de la estructura del espacio publico en la zona intermedia del Eje 1 (cruce ferreo al puente).

Jueves 04/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos, losetas prefabricadas y adoquín en el espacio público del Eje 1, costado derecho, desde el K0+000 al cruce férreo. Continuar las labores de amarre de acero de refuerzo para los New jerseys del puente. Realizar la instalacion de la carpeta asfaltica de la cicloruta en el espacio publico del Eje 1, entre el K0+010 al K0+065. Continuar las labores de conformacion de la estructura del espacio publico en la zona intermedia del Eje 1 (cruce ferreo al puente).

Viernes 05/09/2025: Inicar las actividades de instalación de bordillos en el espacio público del Eje 1, costado derecho, en el sector intermedio y en el sector de hayuelos. Continuar las labores de amarre de acero de refuerzo para los New jerseys del puente. Continuar las labores de conformación de la estructura de la vía en el sector de Hayuelos, eje 1. Continuar labores de amarre del acero de refuerzo de las placa de aproximación.

Sábado 06/09/2025: Continuar las actividades de instalación de bordillos en el espacio público del Eje 1, costado derecho, en el sector intermedio y en el sector de hayuelos. Continuar las labores de amarre de acero de refuerzo para los New jerseys del puente. Continuar las labores de conformación de la estructura de la vía en el sector de Hayuelos, eje 1. Continuar labores de amarre del acero de refuerzo de las placa de aproximación.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	1	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA N° 90

VACIADO DE CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) PARA LAS PLACAS DE APROXIMACION DEL PUENTE

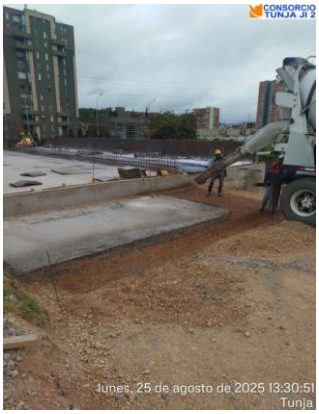





AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA LAS PLACAS DE APROXIMACION DEL PUENTE







VACIADO DE CONCRETO DE LAS PLACAS DE APROXIMACION DEL PUENTE







ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	1	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME


CONFORMACION ESTRUCTURA DE LA VIA EJE 1 - SECTOR INTERMEDIO







CONFORMACION ESTRUCTURA DE LA VIA EJE 1 - SECTOR HAYUELOS

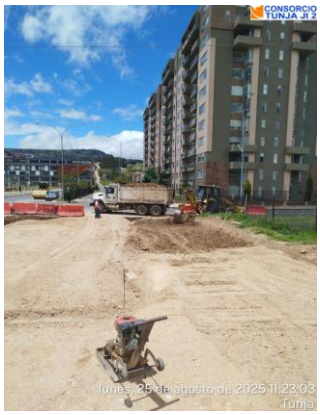





INSTALACION BORDILLO, LOSETA Y ADOQUIN ESPACIO PUBLICO







ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	1	9	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA


CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

AMARRE DE ACERO DE REFUERZO E INSTALACION DE FORMALETAS PARA NEW JERSEYS DEL PUENTE





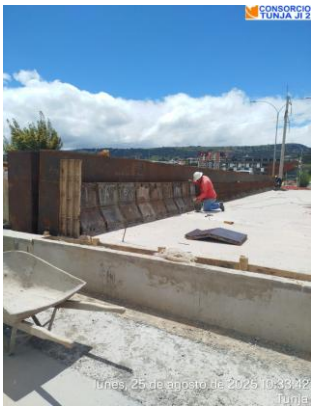

Elaboró ING RICHARD A. ACOSTA T.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Nombre: ING CESAR A. PALACIOS W.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
