FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	21/07/2025
Semana No	**11**	**Del :**	14/07/2025	AL:	20/07/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		75	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		31,25%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,50%	12,4466%	**(%) Ejecutado**	4,92%	13,99%
Valor programado ($)	$ 19.496.252,65	$ 161.663.768,56	**Valor ejecutado ($)**	$ 63.881.840,00	$ 181.729.486,00
			Evaluación	**Porcentaje positivo**	1,54%
				Valor positivo	$ 20.065.717,44

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1.298.856.408	**Valor actualizado 2:**	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	06-may-25	**Fecha de iniciación:**	06-may-25
Fecha de vencimiento:	06-ene-26	**Fecha de vencimiento:**	06-ene-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.298.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

* se realizo reunion electrica el dia marte 15 de 205 ,para revisar las observaciones presentadas por la entidad.
* El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envía informe semanal No. 10
* el Contratsita envia acta parcail No. 2 para revision
* se Recibe por parte de contratista ficha tecnica del sellado del Ranurado
* se Realiza comite No. 11 el dia jueves 17 de julio 2025

OBRAS LADO AIRE

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

Actividades de la semana No. 11 comprendida entre el 14 de juLio de 2025 y el 20 de juLio de 2025:

* Se realizó excavación mecánica para canalizacion eléctrica de la caja 13 a la 8
* tramo de banco de ductos de 4-4"
* Se rellena con el material provniente de excavación
* Se instala cinta de señalización, capa de arena y se compacta material para nivelación de canalización.

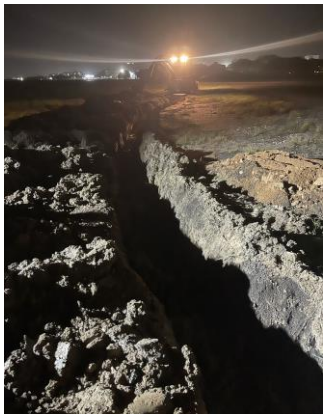

OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Canalizaciones y Ductos

FINANCIERO:

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Aun se encuentra en definición Se revisan informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

Pendiente desembolso de anticipo de obra

AMBIENTAL :

Durante el periodo entre el 14 al 20 julio se dio permiso por parte del Concesionario OINAC para reactivar actividades nocturnas en la cabecera 19 de la pista del aeropuerto internacional Rafel Núñez

Durante el periodo entre el 14 al 20 de julio. se realizaron las siguientes actividades:

Se participo en el comité de obra número 11 realizado el día 17 de julio a las 11 am virtual.

Se realizaron las siguientes cajas 5,4,3,2 y se instaló tubería




FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :

HIDRATACION:

Durante el periodo comprendido entre el 14 al 20 de julio, se dispuso en obra con un termo para hielo y agua, además de vasos plásticos, esto con el fin de mantener al personal hidratado en obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

Durante el periodo entre el 14 al 20 de julio el contratista sigue ejecutando las actividades en obra utilizando maquinaria ,se entregó la documentación de la pajarita JCB y el vehículo, se realizó la entrega de los documentos preoperacionales para su diligenciamiento semanal

CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante este periodo del 14 al 20 El contratista realiza charlas diarias de seguridad , con el fin de concientizar a los trabajadores sobre los riesgos laborales y promover practicas seguras en el lugar de trabajo y a si minimizar el riesgo de accidentes.

EMERGENCIA:

Durante el periodo comprendido entre el 14 al 20 de julio se contó con los siguientes elementos para respuestas a emergencias

1 Botiquín de primero auxilios
1 Camilla rígida para traslado de heridos
1 Extintor de 10 L, tipo C








PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**5**
Personal del Contratista	**11**
Total Personal en Obra	**16**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	En Sitio de obra, pendiente aprobacion de OINAC para ingreso
Total Maquinaría		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 17.633.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 17.633.000,00	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.298.856.408,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 17.633.000,00
% Avance facturado Acumulado
1,36%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoria No.		
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 21.323.772,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 21.323.772,00	

Valor Total Contrato interventoría
$ 319.683.453,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 21.323.772,00
% Avance facturado Acumulado
6,67%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga
