INFORME MENSUAL No. 3

CONTRATO SDM 2024 – 3651

OBJETO DE CONTRATO

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5

CONTRATISTA

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24 – 27

PERIODO DE EJECUCIÓN

MARZO 22 DE 2025 AL 21 DE ABRIL 2025

CONTROL DE LA REVISIÓN

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	NUMERALES QUE CAMBIAN DE LA ANTERIOR REVISIÓN	FECHA
1	Documento Original	N/A	-

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ

Firma			
Nombre	Omar Enrique Duarte Mora	Jordana Francisca Camargo	John Jairo Martínez
Cargo	Director de Proyecto	Ingeniera Residente	Ingeniero Residente
	Elaboró	Elaboró	Elaboró

Firma				
Nombre	Adriana M. Gordillo	Andrea Viviana Niño	Giovanni A. Caicedo	Angie Y. Barbosa
Cargo	Profesional SST	Profesional Trabajo Social	Georreferenciador	Secretaria
	Elaboró	Elaboró	Elaboró	Elaboró

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7

2.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 8

3. PERIODO DE REPORTE 10

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE / EN ACTUALIZACIÓN) 10

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 11

5.1. ACTA DE RECIBO PARCIAL Y PLANILLAS DE OBRA 11

5.2. AVANCE DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 11

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 17

7. GESTIÓN, AVANCES Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO DEL CONTRATO DE OBRA. 29

8. ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS. 38

9. REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS A PARTIR DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON OBJETO DE LA VERIFICACIÓN DE CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN. 42

10. REPORTE DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD IMPLEMENTADO. 43

11. REPORTE DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS. 44

12. REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR O CORREDORES ASIGNADOS 45

13. REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LOCALIDAD E INSTITUCIONES BENEFICIADAS. 47

14. REPORTE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y FORMATOS DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CONTROL DE OBRA MÍNIMO. 49

15. REPORTES DE LA ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA AL ALMACÉN DE LA ENTIDAD. 49

16. REPORTE DE LA SEÑALIZACIÓN RETIRADA DE VÍA Y ENTREGADA AL ALMACÉN DE LA ENTIDAD. 49

17. ASPECTOS VARIOS 49

18. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATO DE OBRA. 50

18.1. PERSONAL 50

18.2. EQUIPOS DE APLICACIÓN, CONTROL, MATERIALES E INSUMOS 53

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 56

20. VINCULACIÓN POR PORCENTAJE DE MUJERES 56

21. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 56

22. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 57

23. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES 58

24. SOPORTE DE IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD APROBADO. 58

25. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS (Entre las cuales se destaca el estado de las pólizas del contrato de obra (vigente / en Actualización)). 58

26. REPORTE DE PLANILLAS DE PAGO DE SALARIOS Y HONORARIOS AL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO. 59

27. REPORTE DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO (SALUD, PENSIÓN, ARL) Y DEMÁS APORTES LEGALES 59

28. CERTIFICACIÓN HECHA POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR O REVISOR FISCAL, EN EL QUE DECLARE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS POR CONCEPTOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA. 60

29. LISTADO DE PROVEEDORES 60

30. CERTIFICACIÓN HECHA POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR O REVISOR FISCAL, EN EL QUE DECLARE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS A PROVEEDORES DE ACUERDO CON EL PLAN DE PAGOS ACORDADO CON CADA UNO. 61

31. ESTADO PRESUPUESTAL. 61

31.1. INFORME ECONÓMICO TRIMESTRAL 64

32. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO A FACTORES DE SELECCIÓN EN LOS QUE SE OBTUVO PUNTAJE ADICIONAL EN LA OFERTA. 64

33. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 65

33.1. COMENTARIOS 65

33.2. CONCLUSIONES 65

33.3. RECOMENDACIONES 66

34. ANEXOS 67

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Datos generales del Contrato 8
Tabla 2 Pólizas del Contrato CSVB 10
Tabla 3 ID ejecutado en el Mes 1 en Señalización Horizontal 11
Tabla 4 CIVs Ejecutados en el mes 1 en señalización horizontal 11
Tabla 5 CIVs ejecutados en el mes 1 en señalización vertical 11
Tabla 6 Adelanto en inspección e implementación 12
Tabla 7 Planes de Manejo de Tránsito (PMT) 16
Tabla 8 Registro de Lluvias 17
Tabla 9 CIVs con Reservas en el ID MV_AV_CALI_941_09_T3 18
Tabla 10 Actividades Realizadas en el Corredor o Corredores 19
Tabla 11 Instituciones Beneficiadas 20
Tabla 12 Personal del contrato de Obra 22
Tabla 13 Equipos empleados para la ejecución de las Actividades 23
Tabla 14 Instrumentos usados para el control de calidad 24
Tabla 15 Relación de materiales utilizados 25
Tabla 16 Pólizas 27
Tabla 17 Proveedores 28
Tabla 18 Balance Presupuestal 29

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Asignada a la Zona Sur Occidente Lote No. 5 9
Ilustración 2 Ejecución vs Programado 30

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), requirió contratar las actividades de suministro e instalación de señalización (Vertical y Horizontal) y dispositivos de seguridad vial, para la ciudad de Bogotá D.C. en los espacios que se encuentren a su cargo y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieren de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del Sistema de Movilidad.

Las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial para el presente proyecto corresponden a la señalización vertical de pedestal, señalización horizontal y dispositivos de señalización.

En marco de este programa la SDM celebró el contrato SDM 2024-3651 con la firma **CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ**, el cual tiene por objeto “REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA OCCIDENTE-SUR”, por valor de $18.771.473.428.350¨ y adjudicado por la SDM mediante Resolución No. 757351 del 10 de diciembre de 2024, para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical, aplicación de señalización horizontal y el suministro e instalación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidades de Bosa y Kennedy; dentro de estas zonas de alcance contractual se encuentran diferentes corredores principales de la ciudad, los cuales serán asignados por la SDM e intervenidos por el contrato en mención.

El presente informe el cual tiene como objetivo presentar la información recolectada durante el tercer mes de ejecución, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 22 de marzo y el 21 de abril de 2025, razón por la que este informe es de avance parcial de obra del periodo anteriormente mencionado y tiene como base la información solicitada en el Anexo Técnico y la Minuta del proceso licitaría SDM-LP-95_2024 y el Contrato 3651-2024.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A fin de cumplir la atención integral en temas de señalización en la ciudad de Bogotá D.C., la Secretaría Distrital de Movilidad, entidad a cargo de la señalización de la ciudad capital, realizó el proceso licitatorio SDM-LP-95-2024, el cual el CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ fue adjudicatario de la zona 5, que corresponden a las localidades de Kennedy y Bosa.

Para cada una de las zonas adjudicadas, las actividades de implementación de señalización: Suministro, instalación de la señalización vertical de pedestal, aplicación de señalización horizontal e implementación de otros dispositivos de señalización horizontal contemplados en el Capítulo 5 de la Resolución 20243040045005 de 2024 Manual de señalización vial de Colombia, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y Ciclorrutas de Colombia. La implementación de señalización y dispositivos de seguridad vial se realizará sobre el espacio público o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, Ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros) as demás actividades contempladas para las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial.

Es de importancia destacar que la SDM realizó un proceso licitatorio para la contratación de la interventoría para cumplir con la legislación colombiana, el proceso SDM-CMA-116-2024; en el cual el CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27 fue adjudicatario del proceso para la zona 5, con el que luego se suscribió el contrato SDM-3666-2024.

Los datos generales del contrato se muestran en la siguiente tabla, se indica que a la fecha del presente informe no se han realizado modificaciones de adición, suspensión o reinicio al contrato.

Tabla 1 Datos generales del Contrato

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	2024 - 3651
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5
CONTRATANTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	34 MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	22 DE ENERO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE NOVIEMBRE 2027
VALOR TOTAL	$18.771.473.428.350 SUMA QUE SE DISCRIMINA DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA 2024: $2.815.721.000 VIGENCIA 2025: $6.209.487.857 VIGENCIA 2026: $6.423.895.143 VIGENCIA 2027: $3.322.369.248
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BOGOTÁ D.C., LOCALIDAD DE BOSA Y KENNEDY
INTERVENTOR	CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24 -27
NÚMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2024 - 3666

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

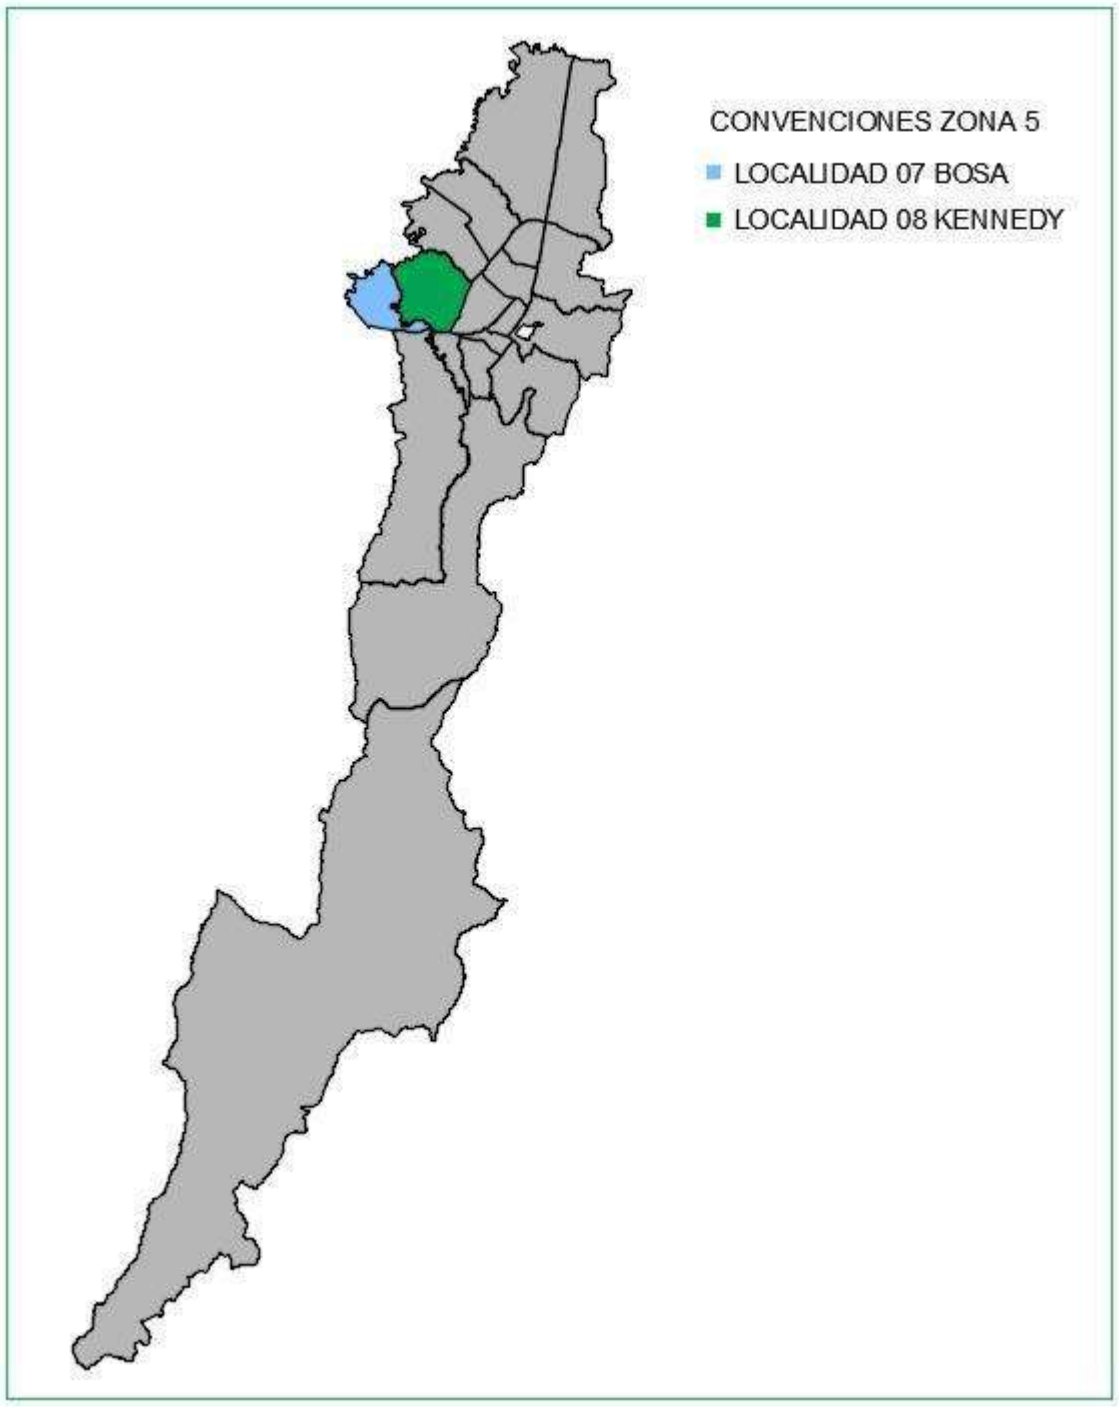
2.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de implementación de señalización horizontal y vertical serán ejecutados en la red vial de la Zona Occidente sur de la ciudad de Bogotá.

La zona occidente sur comprende las localidades de:

- 07. Bosa
- 08. Kennedy

Ilustración 1 Localización Asignada a la Zona Sur Occidente Lote No. 5



Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

3. PERIODO DE REPORTE

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por el Consorcio Segurvial Bogotá y supervisadas por el Consorcio Seguridad Capital 24-27.

Además, presenta información en el cual se muestra el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por el Consorcio Segurvial Bogotá, a través del Anexo Técnico y la Minuta del Contrato 3651-2024.

El presente informe corresponde al periodo No. 3. Comprendido entre el 22 de marzo al 21 de abril de 2025.

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE / EN ACTUALIZACIÓN)

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por la compañía Seguros Mundial S.A. A continuación, se presenta una relación que incluye amparos, vigencia y valor asegurado.

Tabla 2 Pólizas del Contrato 2024-3651 Consorcio Segurvial Bogotá

TIPO DE GARANTÍA	AMPARO	VIGENCIA		VR.	PÓLIZA No.
		DESDE	HASTA		
Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	22/01/25	23/05/28	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
	Pago de salarios	22/01/25	22/11/30	$ 3.754.294.685,60	100363759-3
	Estabilidad y calidad de la obra	22/11/27	22/11/32	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/11/27	23/05/28	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
Responsabilidad civil extracontractual	Amparo básico - predios - labores y operaciones	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Patronal	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Contratistas y subcontratistas	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Vehículos propios y no propios	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Las pólizas anteriormente mencionadas están aprobadas por parte de la entidad contratante.

Ver **Anexo 20.**

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

5.1. ACTA DE RECIBO PARCIAL Y PLANILLAS DE OBRA

Para el periodo comprendido del 22 de marzo al 21 de abril de 2025, se adjunta cuadro de acta de obra del mes 3, de igual manera se adjunta el archivo PDF de las planillas de obra debidamente revisadas, aprobadas y firmadas por los ingenieros residentes tanto de contratista como de interventoría del contrato.

Ver **Anexo 1.**

5.2. AVANCE DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Se presenta un archivo que contiene la Hoja de vida de contrato, donde se especifica la cantidad de ID 's asignados, localización, su correspondiente estado, recursos invertidos en cada, cuenta en que se cobró y datos particulares que permiten tener la trazabilidad completa de cada ID.

Ver **Anexo 2**.

Para el periodo comprendido del 22 de marzo al 21 de abril de 2025, se ejecutaron los siguientes tipos de trabajos de Señalización vial en los siguientes puntos:

Tabla 3 CIVs Ejecutados en el mes 3

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - CP_AV GUAYACANES_TV 71		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8014512	AV GUAYACANES ENTRE TV 71B Y KR 71BBIS	KENNEDY
8012773	AV GUAYACANES ENTRE TV 71B Y TV 69B	KENNEDY
8003091	TV 71B ENTRE CL 9D Y AV GUAYACANES	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 4 CIVs Ejecutados en el mes 3

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - CP_CL 6D_KR 88		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8013704	CL 6D ENTRE KR 87B Y KR 88	KENNEDY
8012727	KR 88 ENTRE CL 6D Y TV 71B	KENNEDY
8000878	CL 6D ENTRE KR 88 Y KR 88D	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 5 CIVs Ejecutados en el mes 3

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - EX_08_041_1556_10		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8001499	CL 5B ENTRE KR 88B Y KR 88BIS	KENNEDY
8001544	CL 2A ENTRE KR 88F Y KR 88FBIS	KENNEDY
8001564	CL 5B ENTRE KR 88BIS Y KR 88	KENNEDY
8001664	CL 2A ENTRE KR 88B Y KR 88F	KENNEDY
8001691	KR 88H ENTRE CL 5A S Y CL 2	KENNEDY
8001744	KR 88FBIS ENTRE CL 2 Y CL 5AS	KENNEDY
8001747	CL 5B ENTRE KR 87I Y KR 87F	KENNEDY
8001797	KR 88D ENTRE CL 5A S Y CL 2	KENNEDY
8001798	CL 5AS ENTRE KR 88DBIS Y KR 88FBIS	KENNEDY
8001815	KR 88H ENTRE CL 5A S Y CL 26 S	KENNEDY
8001816	CL 26S ENTRE AK 89 Y KR 88H	KENNEDY
8001878	KR 88FBIS ENTRE CL 5AS Y CL 26S	KENNEDY
8001895	CL 2 ENTRE KR 87I Y KR 87H	KENNEDY
8001914	KR 88DBIS ENTRE CL 5A S Y CL 26 S	KENNEDY
8001945	KR 88BIS ENTRE CL 5A S Y CL 2	KENNEDY
8001964	KR 88F ENTRE CL 32 S Y CL 33 S	KENNEDY
8001985	KR 87D ENTRE CL 3 Y CL 2A	KENNEDY
8001989	CL 2 ENTRE KR 87H Y KR 87F	KENNEDY
8001992	CL 26S ENTRE KR 88CBIS Y KR 88C	KENNEDY
8002063	KR 86F ENTRE CL 5A Y CL 5B	KENNEDY
8002093	CL 5A S ENTRE KR 87H Y KR 87I	KENNEDY
8002155	KR 86F ENTRE CL 4 Y CL 5	KENNEDY
8002171	KR 87I ENTRE CL 26 S Y CL 5A S	KENNEDY
8002175	CL 5 ENTRE KR 86D Y KR 86F	KENNEDY
8002178	KR 87H ENTRE CL 5B S Y CL 6 S	KENNEDY
8002188	KR 86F ENTRE CL 3 Y CL 4	KENNEDY
8002206	KR 86D ENTRE CL 4 Y CL 5	KENNEDY
8002207	CL 4A ENTRE KR 86D Y KR 86F	KENNEDY
8002217	KR 86F ENTRE CL 2B Y CL 3	KENNEDY
8002229	CL 5 ENTRE KR 86C Y KR 86D	KENNEDY
8002237	CL 5A ENTRE KR 86A Y KR 86F	KENNEDY
8002238	CL 2 ENTRE KR 86G Y KR 86F	KENNEDY
8002279	CL 5 ENTRE KR 86A Y KR 86C	KENNEDY
8002281	KR 86D ENTRE CL 2B Y CL 3	KENNEDY
8002324	KR 86D ENTRE CL 2A Y CL 2B	KENNEDY
8002325	CL 2A ENTRE KR 86G Y KR 86D	KENNEDY
8002374	CL 2 ENTRE KR 86F Y KR 86D	KENNEDY
8002375	KR 86C ENTRE CL 2A Y CL 5	KENNEDY
8002376	CL 2A ENTRE KR 86D Y KR 86C	KENNEDY

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - EX_08_041_1556_10		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8002419	KR 86A ENTRE CL 2A Y CL 5	KENNEDY
8002459	CL 33S ENTRE KR 87G Y KR 87F	KENNEDY
8002473	CL 34S ENTRE KR 87G Y KR 87I	KENNEDY
8002513	CL 33S ENTRE KR 87D Y KR 87F	KENNEDY
8002563	CL 34BIS S ENTRE KR 87FBIS Y KR 87	KENNEDY
8002581	CL 33S ENTRE KR 87C Y KR 87D	KENNEDY
8002592	CL 34BIS S ENTRE KR 87F BIS Y KR 87F	KENNEDY
8002629	CL 33S ENTRE KR 87B Y KR 87C	KENNEDY
8002778	KR 87 ENTRE CL 34S Y CL 33BIS S	KENNEDY
8002779	CL 34 S ENTRE KR 87C Y KR 87	KENNEDY
8002784	CL 34BIS S ENTRE KR 87BIS Y KR 87A	KENNEDY
8002839	KR 87BIS ENTRE VÍA PEATONAL Y CL34BIS S	KENNEDY
8002866	CL 34BIS S ENTRE KR 87BIS Y KR 86G	KENNEDY
8002911	KR 87BIS ENTRE CL 34B S Y CL34ABIS S	KENNEDY
8003071	CL 34B S ENTRE KR 86F Y KR 87BIS	KENNEDY
8003095	CL 34A S ENTRE KR 86D Y KR 86C BIS	KENNEDY
8003155	CL 34A S ENTRE KR 86C BIS Y AK 86	KENNEDY
8003435	CL 37A S ENTRE AK 86 Y KR 86F	KENNEDY
8003477	CL 36S ENTRE AK 86 Y KR 86F	KENNEDY
8003524	CL 37S ENTRE AK 86 Y KR 86F	KENNEDY
8012111	KR 88G ENTRE CL 5 Y CL 4	KENNEDY
8012122	CL 2 ENTRE KR 86G Y KR 86G	KENNEDY
8012126	KR 88B ENTRE CL 26S Y CL 5A S	KENNEDY
8012170	CL 35B S CON KR 87 BIS	KENNEDY
8012171	KR 87A ENTRE CL 38S Y KR 35B S	KENNEDY
8013527	KR 87BIS ENTRE VÍA PEATONAL Y CL 34B S	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 6 CIVs Ejecutados en el mes 3

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - EX_08_348_1897_12		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8003091	TV 71B ENTRE CL 9D Y CL 12	KENNEDY
8003154	CL 9D ENTRE TV 70 Y TV 71B	KENNEDY
8003254	CL 9D ENTRE KR 69DBIS Y TV 70	KENNEDY
8003359	KR 69DBIS ENTRE CL 9C Y CL 9D	KENNEDY
8003439	TV 70 ENTRE KR 9D Y KR 9A	KENNEDY
8003440	CL 9A ENTRE TV 70 Y TV 71B	KENNEDY
8003445	TV 69B ENTRE CL 12 YCL 9D	KENNEDY

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - EX_08_348_1897_12		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8003446	CL 9D ENTRE TV 69B Y KR 69DBIS	KENNEDY
8003466	KR 69DBIS ENTRE CL 9C Y CL 9B	KENNEDY
8003551	KR 69B ENTRE CL 9C Y CL 9D	KENNEDY
8003581	CL 9D ENTRE KR 69 Y KR 69B	KENNEDY
8003661	KR 69B ENTRE CL 9B Y CL 9C	KENNEDY
8003662	CL 9B ENTRE KR 69B Y KR 69D BIS	KENNEDY
8003685	CL 8A ENTRE KR 70 Y TV 71B	KENNEDY
8003721	KR 69D ENTRE CL 9A Y CL 9	KENNEDY
8003817	KR 69D ENTRE CL 8A Y CL 9	KENNEDY
8003843	CL 9 ENTRE KR 69D Y KR 69B	KENNEDY
8003911	CL 7D ENTRE KR 70B Y KR 71	KENNEDY
8004021	KR 70 ENTRE CL 8 Y CL 7C	KENNEDY
8004157	KR 69C ENTRE CL 7B Y CL 8	KENNEDY
8004173	KR 69 ENTRE CL 9 Y CL 8	KENNEDY
8004198	CL 7A ENTRE KR KR 71 Y KR 70B	KENNEDY
8004255	KR 69C ENTRE CL 7A Y CL 7B	KENNEDY
8004303	KR 70B ENTRE CL 7 Y CL 7A	KENNEDY
8004349	KR 69C ENTRE CL 7 Y CL 7A	KENNEDY
8004371	CL 6C ENTRE KR 71 Y KR 71A	KENNEDY
8004390	KR 70B ENTRE CL 6C Y CL 7	KENNEDY
8004391	CL 6C ENTRE KR 71 Y KR 70B	KENNEDY
8004403	KR 69 ENTRE CL 8 Y CL 7	KENNEDY
8004425	KR 69C ENTRE CL 6C Y CL 7	KENNEDY
8004434	KR 69A ENTTRE CL 7 Y CL 6C	KENNEDY
8004488	KR 69C ENTRE CL 6B Y CL 6C	KENNEDY
8004497	KR 69A ENTTRE CL 6B Y CL 6C	KENNEDY
8004498	CL 6B ENTRE KR 69A Y KR 69C	KENNEDY
8004580	KR 69 ENTRE CL 7 Y CL 6A	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 7 CIVs Ejecutados en el mes 3

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - MV_09_024_1249_11		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
9004341	AC 13 ENTRE KR 68D Y TV 71B	KENNEDY
8002603	AC 13 CON KR 68D	KENNEDY
9004044	AC 13 ENTRE KR 68D Y KR 68B	KENNEDY
9004046	AC 13 ENTRE KR 68B Y KR 68A	KENNEDY
8012606	AC 13 ENTRE KR 68A Y AK 68	KENNEDY

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 8 CIVs Ejecutados en el mes 3

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - MV_AUTO_SUR_643_24		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
6000001	AC 45A SUR ENTRE AK 54 Y CL 44BIS S	BOSA
6000002	AC 45A SUR ENTRE CL 44BISA S Y CL 44 BIS B SUR	BOSA
6000003	AC 45A SUR ENTRE CL 44B S Y CL 44C S	BOSA
6000004	AC 45A SUR ENTRE CL 44S Y AK 54	BOSA
6000005	AC 45A SUR ENTRE CL 44C S Y AV BOYACÁ	BOSA
6000006	AC 45A SUR ENTRE KR 52 Y KR 53	BOSA
6000007	AC 45A SUR ENTRE CL 40 SUR Y KR 52	BOSA
6001852	AC 45A SUR ENTRE CL 44 BIS B SUR Y CL 44A S	BOSA
6001870	AC 45A SUR Y AV BOYACÁ	BOSA
6001948	AC 45A SUR ENTRE CL 44BIS S Y KR 54A	BOSA
6001949	AC 45A SUR ENTRE KR 54A Y CL 44BISA S	BOSA
6001950	AC 45A SUR ENTRE KR 56 Y CL 44B S	BOSA
6001952	AC 45A SUR ENTRE AK 58 Y KR 62A	BOSA
6001958	AC 45A SUR ENTRE CL 44A S Y KR 56	BOSA
8011611	KR 62 F ENTRE AC 45A SUR Y CL 57D SUR	BOSA
8011612	AC 45A SUR ENTRE KR 62F Y KR 63	BOSA
8011615	KR 62 C ENTRE AC 45A SUR Y CL 57D SUR	BOSA
8011616	AC 45A SUR ENTRE KR 62D Y KR 62F	BOSA
8011618	AC 45A SUR ENTRE KR 62C Y KR 62D	BOSA
8011621	KR 62 A ENTRE AC 45A SUR Y CL 57D SUR	BOSA
8011622	AC 45A SUR ENTRE KR 62B Y KR 62C	BOSA
8011624	AC 45A SUR ENTRE KR 62A Y KR 62B	BOSA
8011626	CL 44BIS A SUR ENTRE TV 68C Y AC 45A SUR	BOSA
8011628	CL 44 BIS B SUR ENTRE TV 68C Y AC 45A SUR	BOSA
8011633	AC 45A SUR ENTRE KR 60 Y KR 62A	BOSA
8011635	CL 44 A SUR ENTRE TV 68C Y AC 45A SUR	BOSA
8011638	CL 44B SUR ENTRE TV 68C Y AC 45A SUR	BOSA
8011640	CL 44C SUR ENTRE TV 68C Y AC 45A SUR	BOSA
8011648	CL 45 SUR ENTRE AC 45A SUR Y TV 72	BOSA
8011650	AC 45A SUR ENTRE CL 40 SUR	BOSA
8012545	AC 45A SUR ENTRE CL 45S Y KR 57	BOSA
8012846	AC 45A SUR ENTRE AK 68	BOSA
8012847	AC 45ASUR ENTRE CL 40SUR Y AC 45A SUR	BOSA
8013560	AC 45A SUR ENTRE AV BOYACÁ Y CL 45S	BOSA
8013586	AC 45A SUR ENTRE KR 57 Y KR 59A	BOSA
50006076	AC 45A SUR ENTRE KR 59A Y KR 60	BOSA
60011951	AC 45A SUR ENTRE AC 45A SUR Y CL 44S	BOSA

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Tabla 9 CIVs Ejecutados en el mes 3

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - MV_AV_CALI_941_09_T3		
CIV	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
8000034	AK 86 ENTRE CL 15A Y CL 16A S-N	KENNEDY
8000050	CL 15A ENTRE AK 86 Y KR 83	KENNEDY
8000071	AK 86 ENTRE CL 13D Y CL 15A S-N	KENNEDY
8000774	AK 86 ENTRE CL 8C Y CL 8D S-N	KENNEDY
8000832	AK 86 ENTRE CL 8B Y CL 8C S-N	KENNEDY
8000902	AK 86 ENTRE CL 8A Y CL 8B S-N	KENNEDY
8000976	AK 86 ENTRE CL 8BIS C Y CL 8A S-N	KENNEDY
8001013	AK 86 ENTRE CL 8BIS A Y CL 8 BIS C N-S	KENNEDY
8012677	CL 10 ENTRE AK 86 Y KR 82A	KENNEDY
8012683	AK 86 ENTRE CL 6D Y CL 7 N-S	KENNEDY
8012734	AK 86 ENTRE CL 8 Y CL 8 BIS A S-N	KENNEDY
8012857	AK 86 ENTRE CL 16A Y CL 17 S-N	KENNEDY
8012886	AK 86 ENTRE CL 10B Y CL 11A S-N	KENNEDY
8012945	AK 86 ENTRE CL 6D Y CL 6C	KENNEDY
8014167	AK 86 ENTRE CL 8D Y CL 9 S-N	KENNEDY
8014168	AK 86 ENTRE CL 9 Y CL 10 S-N	KENNEDY
8014169	AK 86 ENTRE CL 10 Y CL 10B S-N	KENNEDY
8014877	AK 86 ENTRE CL 7 Y CL 7A S-N	KENNEDY
8014878	AK 86 ENTRE CL 7A Y CL 8 S-N	KENNEDY

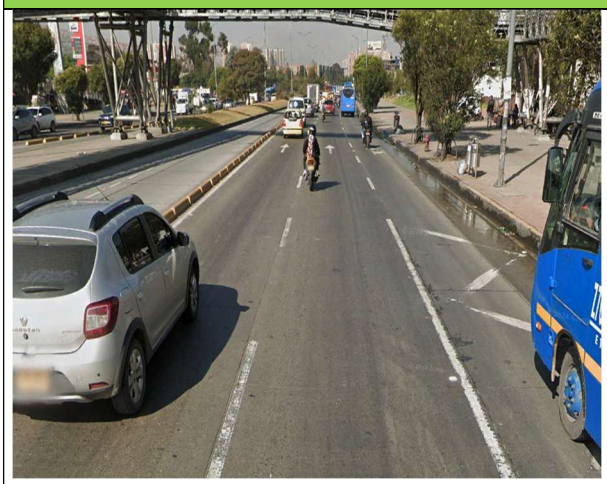
Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

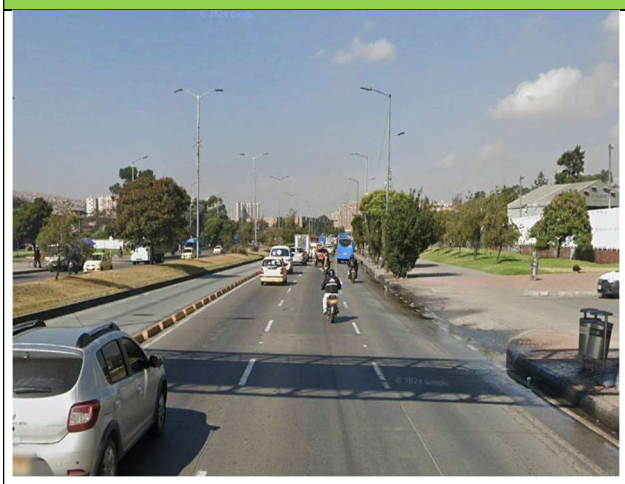
ESPACIO EN BLANCO

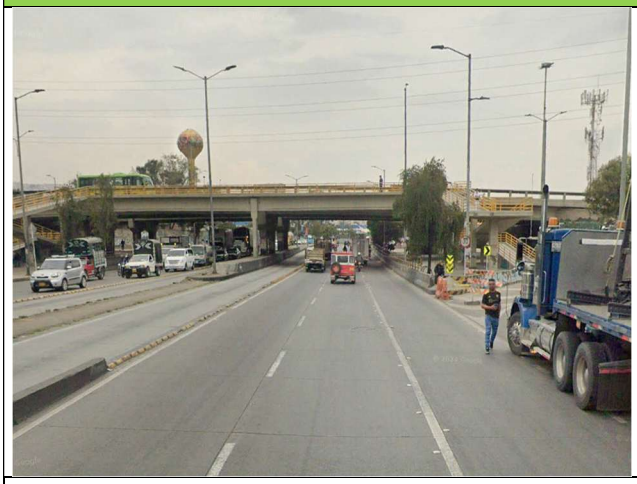
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.1. MV_AUTO_SUR_643_24

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 1: Implementación de calzada.	**Imagen 2:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 3: Implementación de calzada.	**Imagen 4:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 5: Implementación de calzada.	**Imagen 6:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 7: Implementación de calzada.	**Imagen 8:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 9: Implementación de calzada.	**Imagen 10:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 11: Implementación de calzada.	**Imagen 12:** Implementación de calzada.

6.2. EX_08_348_1867_12

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 13: Implementación de calzada.	**Imagen 14:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 15: Implementación de calzada.	**Imagen 16:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 17: Implementación de calzada.	**Imagen 18:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 19: Implementación de calzada.	**Imagen 20:** Implementación de calzada.

VISTA FRONTAL	VISTA POSTERIOR
	
Imagen 21: Implementación de calzada.	**Imagen 22:** Implementación de calzada.

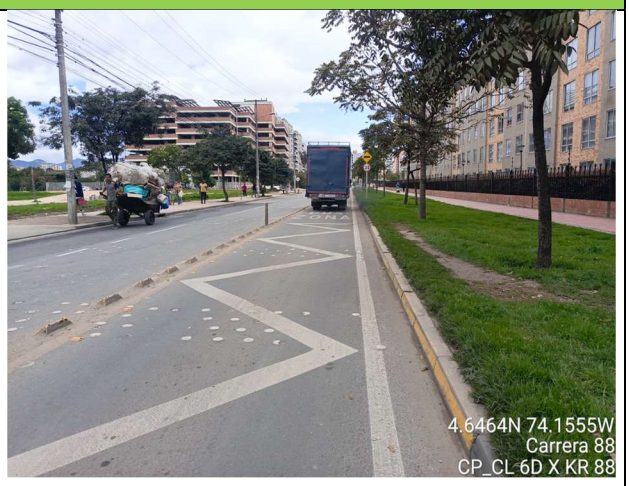
VISTA FRONTAL	VISTA POSTERIOR
	
Imagen 23: Implementación de calzada.	**Imagen 24:** Implementación de calzada.

VISTA FRONTAL	VISTA POSTERIOR
	
Imagen 25: Implementación de calzada.	**Imagen 26:** Implementación de calzada.

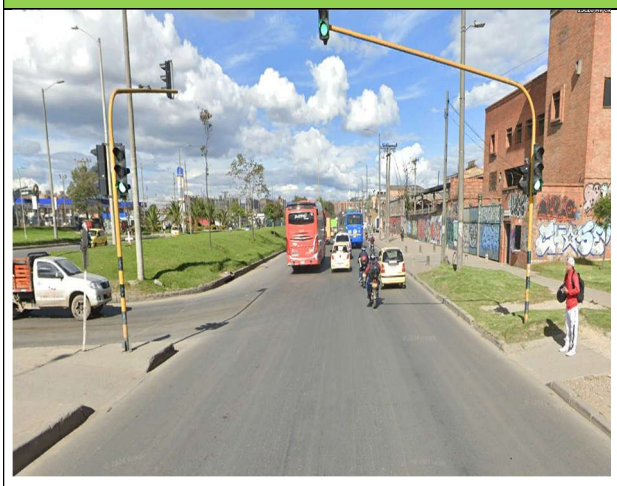
VISTA FRONTAL	VISTA POSTERIOR
	
Imagen 27: Implementación de calzada.	**Imagen 28:** Implementación de calzada.

VISTA FRONTAL	VISTA POSTERIOR
	
Imagen 29: Implementación de calzada.	**Imagen 30:** Implementación de calzada.

6.3. CP_CL 6D_KR 88

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 31: Implementación de calzada.	**Imagen 32:** Implementación de calzada.

6.4. MV_AV_CALI_941_09

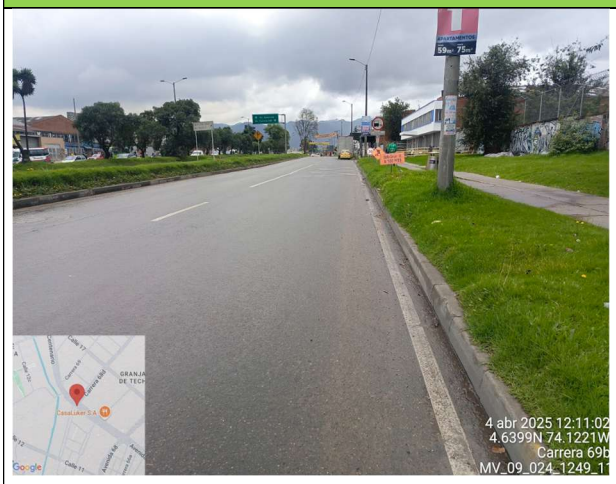
ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 33: Implementación de calzada.	**Imagen 34:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 35: Implementación de calzada.	**Imagen 36:** Implementación de calzada.

6.5. CP_TV 71B - AV. GUAYACANES

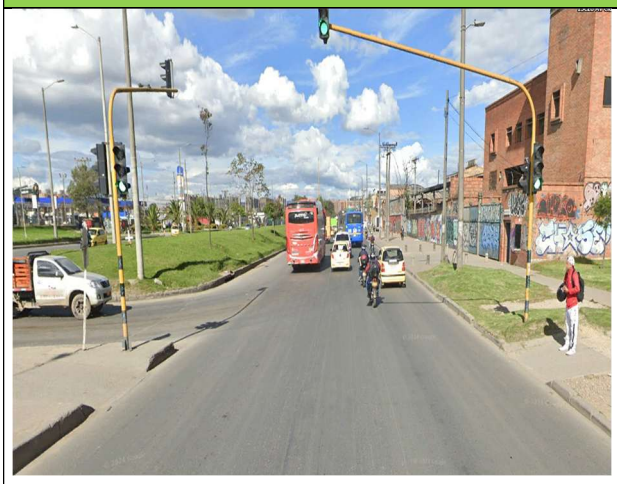
ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 37: Implementación de calzada.	**Imagen 38:** Implementación de calzada.

6.6. MV_09_024_1248_11

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 39: Implementación de calzada.	**Imagen 40:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 41: Implementación de calzada.	**Imagen 42:** Implementación de calzada.

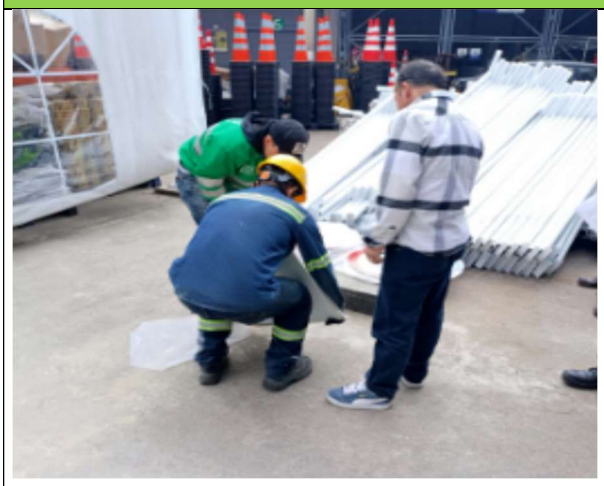
6.7. MV_AV_CALI_941_09

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 43: Implementación de calzada.	**Imagen 44:** Implementación de calzada.

ANTES	DESPUÉS
	
Imagen 45: Implementación de calzada.	**Imagen 46:** Implementación de calzada.

6.8. SUMINISTROS

REGISTRO DE ENTREGA	REGISTRO DE ENTREGA
	
Imagen 47: Entrega de suministros de señalización en el Patio 4 de la Entidad. .	**Imagen 48:** Entrega de suministros de señalización en el Patio 4 de la Entidad. .

REGISTRO DE ENTREGA	REGISTRO DE ENTREGA
	
Imagen 49: Entrega de suministros de señalización en el Patio 4 de la Entidad. .	**Imagen 50:** Entrega de suministros de señalización en el Patio 4 de la Entidad. .

7. GESTIÓN, AVANCES Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO DEL CONTRATO DE OBRA.

Para el periodo del presente informe, a continuación, se presenta un cuadro resumen de los planes de manejo de tránsito del contrato de obra aprobados por la SDM.

Tabla 10 Planes de Manejo de Tránsito (PMT)

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
12	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87I ENTRE 42F SUR Y CL 42A SUR	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	22:00-05:00
12	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	CL 42F SUR ENTRE KR 89A Y KR 86D	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	22:00-05:00
12	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87I ENTRE CL 42A SUR Y CL 40C SUR	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	22:00-05:00
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 33 SUR ENTRE KR 88D Y KR 88A	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	22:00-05:00
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 40C SUR ENTRE KR 88BIS Y KR 86A	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 5 KR ENTRE KR 88B Y 88C	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 5B ENTRE KR 87 Y KR 88B	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 34BISA SUR ENTRE AK 89 Y KR 88D	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	22:00-05:00
12	EX_08_348_1867_12_V4	KENNEDY	KR 69DBIS ENTRE CL 9D Y CL 9B	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 5B ENTRE 86G BIS Y KR 86F	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 5 ENTRE KR 86F Y KR 86A	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 2A ENTRE AK 89 Y KR 88B	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	KR 87D Y CL 5	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 5 ENTRE KR 87A Y KR 87D	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	KR 86G ENTRE CL 2A Y CL 2	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	22:00-05:00
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 5A SUR ENTRE KR 88C Y KR 88CBIS	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	22:00-05:00
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 1 SUR ENTRE KR 87 Y KR 86F	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS
12	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 33A SUR ENTRE KR 88D Y KR88F	21/03/2025	24/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	AV_GUAYACANES_TV_71B	KENNEDY	TV 71B ENTRE CL 12 Y CL 9D	27/03/2025	20/03/25	26/03/25	21:00-05:00
13	AV_GUAYACANES_TV_71B	KENNEDY	AC 12 ENTRE TV 71B Y KR 71B BIS	27/03/2025	20/03/25	26/03/25	21:00-05:00
13	AV_GUAYACANES_TV_71B	KENNEDY	AC 12 ENTRE TV 71B Y TV 69B	27/03/2025	20/03/25	26/03/25	21:00-05:00
13	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	AC 6 ENTRE KR 88G Y KR 88	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	AV_BOYACÁ_AV_GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) Y AV ALSACIA (AC 12)	27/03/2025	23/03/25	4/04/25	21:00-05:00
13	AV_BOYACÁ_AV_GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) ENTRE AC 12 Y CL 15	27/03/2025	23/03/25	4/04/25	21:00-05:00
13	AV_BOYACÁ_AV_GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) ENTRE CL 15 Y 50m AL NORTE	27/03/2025	23/03/25	4/04/25	21:00-05:00
13	AV_BOYACÁ_AV_GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) ENTRE 50m AL NORTE DE LA CL 15 Y CL 16	27/03/2025	23/03/25	4/04/25	21:00-05:00
13	AV. CIUDAD DE CALI	KENNEDY	AK 86 ENTRE CL 6D Y CL 16C	27/03/2025	28/03/25	15/05/25	22:00-05:00
13	AV. CIUDAD DE CALI	KENNEDY	AK 86 ENTRE CL 16C Y CL 6D	27/03/2025	28/03/25	15/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	TV 71B ENTRE TV 69B Y KR 71B	27/03/2025	28/03/25	15/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88A ENTRE AC 43 SUR Y AC 42F SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	CL 42FBIS SUR ENTRE KR 86B Y KR 86BIS	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 86C ENTRE CL 42G SUR Y AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 86CBIS ENTRE CL 42G SUR AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 86G ENTRE CL 42G SUR AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87BIS ENTRE CL 42G SUR AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87BISA ENTRE CL 42G SUR AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87B ENTRE CL 42G SUR AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87C ENTRE CL 42G SUR AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87C ENTRE CL 42G SUR CL 42F SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87D ENTRE CL 42G SUR AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87F ENTRE CL 42G SUR AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 89ENTRE CL 42G SUR AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 89 ENTRE CL 42G SUR AC 42F SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 89BIS ENTRE CL 42G SUR AC 43 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 89BIS ENTRE CL 42G SUR CL 42F SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	CL 42C SUR AV TINTAL (KR 89A)	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	CL 42B SUR ENTRE KR 88H Y AV TINTAL (KR 89A)	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	CL 42D SUR ENTRE KR 88H Y KR 87I	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	CL 42CBIS SUR ENTRE KR 88C BIS Y KR 87I	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	CL 42B SUR ENTRE KR 88C BIS Y KR 87I	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88HBIS ENTRE KR 88C BIS Y CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88G ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88F ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88D ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88C ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88A ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88 ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87H ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87H ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87F ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87D ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87C ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87B ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87BIS A ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87 ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 86G ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 86F ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 86D ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 86CBIS ENTRE CL 42A SUR CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 86F CL 40C SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 86B CL 41 SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 89 CL 40B SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88H CL 40B SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88G CL 40B SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88F CL 40B SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88CBIS CL 40B SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 88BIS CL 40B SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87I CL 40C SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87HBIS CL 40C SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87GBIS CL 40C SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87FBIS CL 40B SUR	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 71C CL 6B	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 6B KR 71A	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 7 KR 71B	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 6C KR 70	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 6C KR 69C	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 71B CL 6A	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 69A CL 7	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 7A KR 69C	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 7 KR 69	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	TV 69B CL 9D	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 68G KR 68G	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	TV 70 CL 9A	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 9A KR 69	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 9 KR 69	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 70 CL 7B	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 7A AV BOYACÁ (AK 72)	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 71G CL 6B	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 71D CL 6B	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 70 CL 6B	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 69F CL 8	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 69F CL 6B	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 69A CL 8	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 8 KR 69	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	22:00-05:00
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 71 CL 7B	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 7D KR 70B	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
13	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	CL 7C KR 70B	27/03/2025	28/03/25	22/05/25	24 HORAS
14	EX_08_348_1867_12_V4_CAMBIOS SENTIDO VIAL	KENNEDY	KR 71F CL 7A	3/04/2025	4/04/25	22/05/25	24 HORAS
14	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	KR 88D CL37A SUR	3/04/2025	4/04/25	26/06/25	22:00-05:00
14	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	CL 42G SUR KR 87H	3/04/2025	4/04/25	26/06/25	24 HORAS
14	EX_08_039_1556_10_V7	KENNEDY	KR 87D CL 42A SUR	3/04/2025	4/04/25	26/06/25	22:00-05:00
14	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	KR 86F CL 5B	3/04/2025	4/04/25	26/06/25	24 HORAS
14	EX_08_041_1556_10_V10	KENNEDY	CL 33BIS SUR KR 88F	3/04/2025	4/04/25	26/06/25	24 HORAS
15	CP_AV.CENTENARIO.(CL13)	KENNEDY	AC 13 TV 71B	10/04/2025	4/04/25	15/04/25	L-V 22:00-05:00 S-D 22:00-08:00
15	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	KENNEDY	AUTO SUR (CL 45A SUR) TV 62G	10/04/2025	16/04/25	10/07/25	23:00-04:00
15	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	KENNEDY	AUTO SUR (AC 57R SUR) KR 75B	10/04/2025	16/04/25	10/07/25	23:00-04:00

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
15	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	KENNEDY	AUTO SUR (KR 77G) KR 77H	10/04/2025	16/04/25	10/07/25	23:00-04:00
15	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	KENNEDY	AUTO SUR (CL 45A SUR) TV 62G	10/04/2025	2/04/25	15/04/25	L-V 22:00-05:00 S-D 22:00-08:00
15	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	KENNEDY	AUTO SUR (AC 57R SUR) KR 75B	10/04/2025	2/04/25	15/04/25	L-V 22:00-05:00 S-D 22:00-08:00
15	MV_AUTO_SUR_643_24_V0	KENNEDY	AUTO SUR (KR 77G) KR 77H	10/04/2025	2/04/25	18/04/25	L-V 22:00-05:00 S-D 22:00-08:00
15	CP_CL 6D X KR 88	KENNEDY	CL 6D KR 87B	10/04/2025	6/04/25	18/04/25	22:00-05:00
15	CP_CL 6D X KR 88	KENNEDY	CL 6D KR 88D	10/04/2025	6/04/25	18/04/25	22:00-05:00
15	CP_CL 6D X KR 88	KENNEDY	KR 88 TV 71B	10/04/2025	6/04/25	18/04/25	22:00-05:00
15	CP_AV_GUAYACANES_TV_71B	KENNEDY	TV 71B TV 78C	10/04/2025	7/04/25	18/04/25	22:00-04:30
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 69 CL 8	16/04/2025	17/04/25	12/06/25	22:00-05:00
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 85 CL 47B SUR	16/04/2025	18/04/2025	3/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 84 CL 47A SUR	16/04/2025	1/06/25	28/08/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 82 CL 44 SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 83 CL 46 SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	22:00-05:00
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 82 CL 47B SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 82 AC 43 SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 82D CL 48 SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 81J AC 43 SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 82 AC 43 SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 82D CL 46 SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 81H AC 43 SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 81C CL 45 SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 81B CL 45BIS SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 80I CL 45 SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 80I AV CIUDAD DE VILLAVICENCIO (AC 43 SUR)	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 80H AV CIUDAD DE VILLAVICENCIO (AC 43 SUR)	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 80D CL 45BIS SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 80C CL 45BIS SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	KR 80B CL 45BIS SUR	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	CL 48A SUR KR 82	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	CL 47B SUR KR 81H	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	CL 47B SUR KR 85	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	CL 47A SUR KR 84	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
16	EX_08_309_1867_12_V4	KENNEDY	CL 46B SUR KR 84	16/04/2025	21/04/25	17/07/25	24 HORAS
EM	EX_08_348_1867_12_V4 CAMBIOS SENTIDO VIAL MARSELLA	KENNEDY	CL 6B CL 6B	11/03/2025	10/03/25	25/03/25	24 HORAS
EM	EX_08_348_1867_12_V4 CAMBIOS SENTIDO VIAL MARSELLA	KENNEDY	CL 6B CL 6C	11/03/2025	10/03/25	25/03/25	24 HORAS
EM	EX_08_348_1867_12_V4 CAMBIOS SENTIDO VIAL MARSELLA	KENNEDY	CL 9B KR 69	11/03/2025	10/03/25	25/03/25	24 HORAS
EM	CP AV. GUAYACANES CON TV71B	KENNEDY	TV 71B CL 9D	20/03/2025	20/03/25	26/03/25	22:00-05:00
EM	CP AV. GUAYACANES CON TV71B	KENNEDY	AC 12 KR 71BBIS	20/03/2025	20/03/25	26/03/25	22:00-05:00
EM	CP AV. GUAYACANES CON TV71B	KENNEDY	AC 12 TV 69B	20/03/2025	20/03/25	26/03/25	22:00-05:00

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
EM	CP GUAYACANES CON TV 71B	KENNEDY	TV 71B CL 9D	20/03/2025	20/03/25	26/03/25	22:00-05:00
EM	CP GUAYACANES CON TV 71B	KENNEDY	AC 12 KR 71BBIS	20/03/2025	20/03/25	26/03/25	22:00-05:00
EM	CP GUAYACANES CON TV 71B	KENNEDY	AC 12 TV 69B	20/03/2025	20/03/25	26/03/25	22:00-05:00
EM	CP AVBOYACA CON GUAYACANES	KENNEDY	N/A	23/03/2025	23/03/25	4/04/25	21:00-05:00
EM	CP AVBOYACA CON GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) CL 15	23/03/2025	23/03/25	4/04/25	21:00-05:00
EM	CP AVBOYACA CON GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) 50m AL NORTE	23/03/2025	23/03/25	4/04/25	21:00-05:00
EM	CP AVBOYACA CON GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) CL 16	23/03/2025	23/03/25	4/04/25	21:00-05:00
EM	CP_CL 6D X KR 88	KENNEDY	CL 6D KR 87B	6/04/2025	6/04/25	18/04/25	22:00-05:00
EM	CP_CL 6D X KR 88	KENNEDY	CL 6D KR 88D	6/04/2025	6/04/25	18/04/25	22:00-05:00
EM	CP_CL 6D X KR 88	KENNEDY	KR 88 TV 71B	6/04/2025	6/04/25	18/04/25	22:00-05:00
EM	COI_AUTO SUR_EMERGENCI_ABRIL_MV_AUTO_SUR_643_24_V0;CP_Cam79XTS (Autopista Sur X KR 62A)	CORREDOR	AUTO SUR (CL 45A SUR) TV 62G	3/04/2025	3/04/25	15/04/25	L-V 22:00-05:00 S-D 22:00-08:00
EM	COI_AUTO SUR_EMERGENCI_ABRIL_MV_AUTO_SUR_643_24_V0;CP_Cam79XTS (Autopista Sur X KR 62A)	CORREDOR	AUTO SUR (AC 57R SUR) KR 75B	3/04/2025	3/04/25	15/04/25	L-V 22:00-05:00 S-D 22:00-08:00
EM	COI_AUTO SUR_EMERGENCI_ABRIL_MV_AUTO_SUR_643_24_V0;CP_Cam79XTS (Autopista Sur X KR 62A)	CORREDOR	AUTO SUR (KR 77G) KR 77H	3/04/2025	3/04/25	15/04/25	L-V 22:00-05:00 S-D 22:00-08:00
EM	CP-SDM-202461204475812 - TV 71B CON DG 2.v2	CORREDOR	AC 13 TV 71B	4/04/2025	4/04/25	15/04/25	L-V 22:00-05:00 S-D 22:00-08:00
EM	CP-SDM-202461204475812 - TV 71B CON DG 2.v2	KENNEDY	TV 71B TV 78C	7/04/2025	7/04/25	18/04/25	22:00-04:30
EM	CP_AV.CENTENARIO.(CL13)	KENNEDY	AC 13 TV 71B	15/04/2025	16/04/25	30/04/25	L-V 22:00-05:00

PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)							
COI	IDENTIFICADOR ASIGNADO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	COI APROBACIÓN	VIGENCIA		FINAL
					INICIO	FINAL	
							S-D 22:00-08:00
EM	CP_AV.CENTENARIO.(CL13)	KENNEDY	AC 13 TV 71B	15/04/2025	16/04/25	30/04/25	L-V 22:00-05:00 S-D 22:00-08:00
EM	CP_AV. BOYACA CON AV. GUAYACANES	KENNEDY	N/A	15/04/2025	15/0425	28/04/25	21:00-05:00
EM	CP_AV. BOYACA CON AV. GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) CL 15	15/04/2025	15/04/25	28/04/25	21:00-05:00
EM	CP_AV. BOYACA CON AV. GUAYACANES	KENNEDY	N/A	15/04/2025	15/04/25	28/04/25	21:00-05:00
EM	CP_AV. BOYACA CON AV. GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) CL 15	15/04/2025	15/04/25	28/04/25	21:00-05:00
EM	CP_AV. BOYACA CON AV. GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) 50m AL NORTE	15/04/2025	15/04/25	28/04/25	21:00-05:00
EM	CP_AV. BOYACA CON AV. GUAYACANES	KENNEDY	AV BOYACÁ (AK 72) 50m AL NORTE	15/04/2025	15/04/25	28/04/25	21:00-05:00
EM	CP_CL 6D X KR 88	KENNEDY	CL 6D KR 87B	15/04/2025	19/04/25	3/05/25	22:00-05:00
EM	CP_CL 6D X KR 88	KENNEDY	CL 6D KR 88D	15/04/2025	19/04/25	3/05/25	22:00-05:00
EM	CP_CL 6D X KR 88	KENNEDY	KR 88 TV 71B	15/04/2025	19/04/25	3/05/25	22:00-05:00

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Ver **Anexo 4**

8. ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS.

La principal situación que ha afectado el normal desarrollo del contrato ha sido la presencia recurrente de lluvias en los puntos de intervención. Aunque se ha contado con la programación necesaria para cumplir las metas establecidas en el mes de ejecución, estas condiciones climáticas han impedido mantener un ritmo constante de avance. No obstante, en coordinación con la Interventoría, se han implementado

estrategias y planes de contingencia orientados a mitigar estos impactos y asegurar el cumplimiento de las metas económicas del contrato, con el objetivo de alcanzar un nivel óptimo de ejecución.

Ver la siguiente tabla de registro de lluvias.

Tabla 11 Registro de Lluvias

MES 3		
FECHA	**REGISTRO DE LLUVIAS**	**REGISTRO DE NOVEDAD**
22/03/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades: EX_08_348_1866
23/03/2025	No se presentan lluvias	No se realizan actividades
24/03/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades: CP_AV_GUAYACANES_TV_71B EX_08_348_1867
25/03/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades: EX_08_348_1867 MV_AV_CALI_941_09
26/03/2025	Lluvia en la noche	Se realizan actividades: EX_08_348_1867 MV_AV_CALI_941_09_T3
27/03/2025	Lluvia en la noche	Se realizan actividades: EX_08_348_1867 MV_AV_CALI_941_09_T3
28/03/2025	Lluvia en la tarde	Se realizan actividades: MV_AV_CALI_941_09_T3
29/03/2025	Lluvia en la noche	Se suspenden actividades: ID EX_08_041_1556_10
30/03/2025	No se presentan lluvias	Se suspenden actividades: MV_AV_CALI_941_09_T3
31/03/2025	Lluvia en el día	Se realizan actividades en el día: ID EX_08_041_1556_10
		Se suspenden actividades en la noche: ID MV_AV_CALI_941_09_T3
1/04/2025	Lluvia en la noche	Se suspenden actividades: ID MV_AV_CALI_941_09_T3 ID EX_08_041_1556_10
2/04/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades: ID EX_08_041_1556_10
3/04/2025	Lluvia en el día	Se suspenden actividades en la noche: ID MV_AV_CALI_941_09_T3

MES 3		
FECHA	**REGISTRO DE LLUVIAS**	**REGISTRO DE NOVEDAD**
		ID EX_08_041_1556_10 MV_AUTO_SUR_643_24
4/04/2025	Lluvia en el día	Se suspenden actividades en el día: EX_08_041_1556_10 MV_AUTO_SUR_643_24 MV_AV_CALI_941_09_T3
5/04/2025	Lluvia en la tarde	No se realizan actividades
6/04/2025	No se presentan lluvias	Se suspenden actividades en la noche: CP_CALLE_6D CON KR 88 ID EX_08_041_1556_10 MV_AV_CALI_941_09_T3 MV_AUTO_SUR_643_24
7/04/2025	Lluvia en la noche	Se realizan actividades en el día: MV_AUTO_SUR_643_24 Se suspenden actividades en la noche: ID EX_08_041_1556_10
8/04/2025	Lluvia en la tarde	Se realizan actividades ID EX_08_041_1556_10 ID MV_09_024_1249_11
9/04/2025	Lluvia en la noche	Se realizan actividades en el día: MV_AUTO_SUR_643_24 Se suspenden actividades en la noche: ID EX_08_041_1556_10 CP_CAM79XTS (AUTOSUR X KR64A)
10/04/2025	Lluvia en la noche	Se realizan actividades en la noche: ID EX_08_041_1556_10 CP_CAM79XTS (AUTOSUR X KR64A)
11/04/2025	Lluvia en el día	Se realizan actividades en el día: ID EX_08_041_1556_10 Se realizan actividades en la noche: ID MV_09_024_1249_11 Se suspenden actividades en la noche: ID MV_AUTO_SUR_643_24
12/04/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades: ID EX_08_041_1556_10 ID MV_AUTO_SUR_643_24
13/04/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades en el día: ID MV_AUTO_SUR_643_24 Se realizan actividades en la noche ID EX_08_041_1556_10 ID MV_AUTO_SUR_643_24 CP_CL6 con KR 88

MES 3		
FECHA	**REGISTRO DE LLUVIAS**	**REGISTRO DE NOVEDAD**
14/04/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades: ID EX_08_041_1556_10 ID MV_09_024_1249_11 CP_CL6 con KR 88
15/04/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades: ID EX_08_041_1556_10 ID MV_09_024_1249_11 CP_CL6 con KR 88 MV_AV_CALI_941_09_T3
16/04/2025	Lluvia en la noche	Se realizan actividades en el día: ID EX_08_041_1556_10 Se realizan actividades en la noche: ID EX_08_041_1556_10 CP_CL6D_CON_KR88 Se suspenden actividades en la noche: ID MV_AUTO_SUR_643_24 ID MV_09_024_1249_11 ID MV_AV_CALI_941_09_T3
17/04/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades: ID EX_08_041_1556_10 ID MV_AV_CALI_941_09_T3
18/04/2025	Lluvia en la noche	Se suspenden actividades en la noche: ID MV_09_024_1249_11 ID EX_08_041_1556_10 ID MV_AUTO_SUR_643_24 CP_CL6D_CON_KR88 ID MV_AV_CALI_941_09_T3
19/04/2025	Lluvia en la noche	Se suspenden actividades en la noche: ID EX_08_041_1556_10 CP_CL6D_CON_KR88 ID MV_09_024_1249_11 ID MV_AUTO_SUR_643_24 ID MV_AV_CALI_941_09_T3
20/04/2025	No se presentan lluvias	Se realizan actividades en el día: ID MV_AV_CALI_941_09_T3 ID MV_AUTO_SUR_643_24 CP_CL6D_CON_KR88 Se realizan actividades en la noche: ID MV_09_024_1249_11 ID EX_08_041_1556_10
21/04/2025	Lluvia en la noche	Se suspenden actividades en la noche: ID MV_09_024_1249_11

MES 3		
FECHA	**REGISTRO DE LLUVIAS**	**REGISTRO DE NOVEDAD**
		ID EX_08_041_1556_10 CP_CL6D_CON_KR88 ID MV_AUTO_SUR_643_24 ID MV_AV_CALI_941_09_T3

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Ver **Anexo 5**

9. REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS A PARTIR DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON OBJETO DE LA VERIFICACIÓN DE CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN.

En el período que abarca el presente informe, se llevaron a cabo inspecciones a los diseños asignados por la Secretaría Distrital de Movilidad. Durante esta gestión, se verificó si los diseños asignados y los CIVs estaban reservados por diferentes entidades, tales como la Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial -UAERMV, la Alcaldía Local de Kennedy, Enel Colombia S.A. E.S.P. – ENEL, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB; y finalmente al Instituto de Desarrollo Urbano - (IDU).

Como resultado de la verificación, se identificaron reservas y posteriormente, se envió un comunicado a dichas entidades para informar sobre las intervenciones a realizar por parte del Consorcio Segurvial Bogotá, o para consultar el estado de las reservas.

Se relaciona en la siguiente Tabla, los CIVs que se hallaron reservados para los ID MV_09_024_1249_11 y EX_08_039_1556_10, así como las entidades a las que se les dirigió la comunicación.

Tabla 12 CIVs con Reservas en los ID MV_09_024_1249_11 y EX_08_039_1556_10.

COMUNICACIONES A OTRAS ENTIDADES – CONSULTAS SOBRE RESERVAS.			
N	**ENTIDAD**	**CIV RESERVADOS**	**OFICIO**
1	UAERMV	9004044 – 9004046 - 9004391	CE-CSVB-119-2025

COMUNICACIONES A OTRAS ENTIDADES – CONSULTAS SOBRE RESERVAS.			
N	**ENTIDAD**	**CIV RESERVADOS**	**OFICIO**
2	ENEL E.S.P.	9004044 – 9004046 - 9004391	CE-CSVB-120-2025
3	ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	9004044 – 9004046 - 9004391	CE-CSVB-121-2025
4	EAAB E.S.P.	9004044 – 9004046 - 9004391	CE-CSVB-122-2025
5	IDU	9004044 – 9004046 - 9004391	CE-CSVB-123-2025
6	IDU	8003135 – 8003159 – 8003160 – 8003178 – 8003188 – 8003198 – 8003201 – 8003204 – 8003213 – 8003218 – 8003218 – 8003219 – 8003261 – 8003267 – 8003270 – 8003274 –	CE-CSVB-132-2025
7	UAERMV	8003135 – 8003159 – 8003160 – 8003178 – 8003188 – 8003198 – 8003201 – 8003204 – 8003213 – 8003218 – 8003218 – 8003219 – 8003261 – 8003267 – 8003270 – 8003274 –	CE-CSVB-133-2025
8	ENEL	8003135 – 8003159 – 8003160 – 8003178 – 8003188 – 8003198 – 8003201 – 8003204 – 8003213 – 8003218 – 8003218 – 8003219 – 8003261 – 8003267 – 8003270 – 8003274 –	CE-CSVB-134-2025
9	ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	8003135 – 8003159 – 8003160 – 8003178 – 8003188 – 8003198 – 8003201 – 8003204 – 8003213 – 8003218 – 8003218 – 8003219 – 8003261 – 8003267 – 8003270 – 8003274 –	CE-CSVB-135-2025
10	EAAB	8003135 – 8003159 – 8003160 – 8003178 – 8003188 – 8003198 – 8003201 – 8003204 – 8003213 – 8003218 – 8003218 – 8003219 – 8003261 – 8003267 – 8003270 – 8003274 –	CE-CSVB-136-2025

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Ver **Anexo 6**

10. REPORTE DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD IMPLEMENTADO.

En cumplimiento con el Plan de Calidad aprobado por la interventoría y el Plan de Inspección de Ensayos, se ha llevado a cabo la supervisión y verificación correspondiente durante el desarrollo de la obra. Este informe tiene como objetivo documentar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, garantizando que las actividades realizadas se ajusten a los estándares de calidad y seguridad

requeridos, y que los ensayos realizados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los planes de inspección y control de calidad.

Ver **Anexo 7**

11. REPORTE DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS.

Conforme a lo establecido en el Protocolo de Manejo de Residuos, durante el periodo del presente informe se mantuvo el mismo comportamiento en relación con la disposición final de los residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables, la cual fue realizada a través del subcontratista Señalización Nuevo Milenio S.A.S., cumpliendo con las disposiciones y normativas establecidas en dicho protocolo, obligación a cargo del Consorcio Segurvial Bogotá.

Respecto a los demás residuos generados por los demás subcontratistas, estos fueron recibidos en bodega y se encuentran debidamente almacenados, identificados y aislados conforme a lo suscrito en el Programa de Manejo de Residuos. Su disposición final está programada para realizarse durante el próximo mes de mayo de 2025.

ESPACIO EN BLANCO

ALMACENAMIENTO RESIDUOS DE OBRA PARA DISPOSICIÓN FINAL





Como respaldo de este proceso, se anexan los documentos de verificación correspondientes.

Ver **Anexo 8**

12. REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORREDOR O CORREDORES ASIGNADOS

Tabla 13 Actividades Realizadas en el Corredor o Corredores

ACTIVIDADES REALIZADAS		
ID DISEÑO	**LOCALIDAD**	**ACTIVIDAD**
CP_AV GUAYACANES_ TV71	Kennedy	Se realizó la implementación del compromiso prioritario. Se borraron marcas si se implementaron nuevas marcas realizando un cambio de sentido. No obstante, se instalaron dos señales verticales para el cierre del Compromiso
CP_CL 6D_KR 88	Kennedy	Se realizó la implementación durante el mes del corte 3. Donde fue necesario realizar el retiro de señales verticales y Borrado de marcas para implementar según el compromiso enviado por urgencia.

ACTIVIDADES REALIZADAS		
ID DISEÑO	**LOCALIDAD**	**ACTIVIDAD**
EX_08_041_1556_10	Kennedy	Se iniciaron actividades en el mes de borrado, imprimación de marcas de metro cuadro y metro lineal. Se culmino gran parte del ID por falta de entre de un plano. Plano que será entregado en la cuenta siguiente. Durante el mes se evidenció que en la inspección los dos Ingenieros Residentes tanto como de obra e Interventoría. Cometieron el error de ingresar las Señales verticales sin tener en cuenta los Ancho del Anden y sobre todo el desplazamiento de los niveles de las viviendas en el lugar de la implementación. Para dar rápida solución se tomó la medida de realizar una nueva inspección y retirar gran parte de las señales verticales SP dado que estas no son de gran importancia como lo es la SR-01 (Pare).
EX_08_348_1897_12	Kennedy	Durante este periodo se ejecutaron actividades orientadas al cierre de los CIV pendientes, que incluyeron la instalación de señales verticales, demarcación e instalación de dispositivos de seguridad vial.
MV_09_024_1249_11(CALLE 13)	Fontibón	La SDM realizo en envió del Corredor para la implementación según la sectorización por ZONAS. Se llevo a cabo la Inspección del corredor y durante el mes se realizó su implementación. Para está implementación se llevó a cabo la instalación de señales Verticales. Sin embargo, una de las señales fue hurta o retirada. Esta señal es la SP-75 Chevron.
MV_AUTO_SUR_643_24 (1° TRAMO)	Kennedy	Durante el periodo del mes se llevaron a cabo dentro del Corredor de la Autosur la Implementación de metro lineal y la adición de un compromiso prioritario de señales de Cámaras en el Corredor. Este corredor está dividido en tres tramos. Para esta cuenta Ingreso el primer tramo.

ACTIVIDADES REALIZADAS		
ID DISEÑO	**LOCALIDAD**	**ACTIVIDAD**
MV_AV_CALI_941_09_T3	Kennedy	Para al mes de la cuenta, se llevaron a cabo la subsanación del metro lineal porque estas no pasaron las pruebas de Retro reflectividad. Para dar alcance, se implementaron estas líneas con Acrílico para solucionar el tema de Reflectividad. También se realizaron las actividades de Subsanación de algunas marcas que presentaban Desprendimiento e instalación de Tachas reflectivas.
EX_08_039_1556_10	Kennedy	Para este mes se realizó la inspección del Id en mención. Se hallaron varios CIVs implementados por lo tanto tienen garantías por otro contrato. Por otro lado, existen cambios en sentido vial por las obras llevadas a cabo por el Contrato de Transmilenio en la AK 86.
EX_08_309_1867_12	Kennedy	Se iniciaron Actividades de Inspección en el ID mencionado. Gran parte de los planos inspeccionados durante el periodo del mes se hallan implementados por otro contrato. Está Inspección se culminará en la siguiente cuenta o mes
SUMINISTROS SDM	SDM	Se realiza entrega parcial de Suministros en el Patio 4 de la Entidad, bajo acompañamiento y supervisión de la interventoría. La entrega de suministros corresponde a la cuenta 2.

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

13. REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LOCALIDAD E INSTITUCIONES BENEFICIADAS.

Para el presente Informe, se llevaron a cabo diversas implementaciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad vial. Estas acciones hacen parte del cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto y fueron desarrolladas siguiendo los lineamientos técnicos y de calidad bajo la supervisión de la Interventoría.

A continuación, se detallan las instituciones educativas y de formación, su ubicación y cantidad de población beneficiada.

Tabla 14 Instituciones Beneficiadas

INSTITUCIONES BENEFICIADAS ID EX_08_041_1556_10		
INSTITUCIONES	**DIRECCIÓN**	**POBLACIÓN BENEFICIADA**
Colegio Distrital Colegio Darío Echandía.	CALLE 5ª SUR #88B-08	1200
Hogar Comunitario Bienestar Familiar	CARRERA 88G SUR # 2B-67	16
Instituto Pedagógico Federico Balart.	CARRERA 88G # 0-97	80
Liceo Moderno León Báez.	CALLE 33 BIS SUR # 86-72	480
Hogar Infantil Osito Panda.	CARRERA 86C SUR #26-16	14
Hogar Comunitario El Honguito	CARRERA 86 C SUR #26-15	17
Hogar Comunitario Mafalda	CALLE 34 BI SUR #87C-71	16
IED Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana	CALLE 35B #88D-15 SUR	1200
Hogar Comunitario Carrusel de la Alegría.	CALLE 37 SUR # 86C-40	16
Centro Educativo Indira Gandhi	CARRERA 87C 32B-31 SUR	160
IED Campo Hermoso	CALLE 35B SUR #88D-19	1100
Hogar Infantil Caritas Felices	CALLE 38B SUR # 87I-21	16
IED Manuel Zapata Olivella	CALLE 1BIS # 87C-07	1200
Liceo Cristiano mi Refugio Perfecto	KRA 87 #33-09 SUR	160
Liceo Jefferson	KRA 81 #33-06	180
Liceo Infantil San Juan Gabriel Perboyre	KRA 87 # 37-06 SUR	60
Centro Fe y Alegría Patio Bonito	CARRERA 86F # 33-16 SUR	800
Hogar Infantil Mis Marcianitos	CALLE 34 # 86F	17
Hogar Comunitario Tornasol	KRA 88 #33 SUR	15
Hogar Infantil Babys Disney	CALLE 34B #86F-53	14

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Ver **Anexo 16.**

14. REPORTE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y FORMATOS DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CONTROL DE OBRA MÍNIMO.

Se adjunta los certificados de calibración de los equipos que menciona el Anexo Técnico por cuadrilla y el Retrorreflectómetro, que garantizan el cumplimiento por parte del Consorcio Segurvial Bogotá a las condiciones contractuales.

Ver **Anexo 9.**

15. REPORTES DE LA ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA AL ALMACÉN DE LA ENTIDAD.

En el periodo de ejecución el presente informe, se adjunta el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 03.

Ver **Anexo 10**

16. REPORTE DE LA SEÑALIZACIÓN RETIRADA DE VÍA Y ENTREGADA AL ALMACÉN DE LA ENTIDAD.

En el presente Informe No. 3 se reporta la realización de 142 retiros de señales verticales. Así mismo, se ha gestionado, a través de la Interventoría, la documentación correspondiente para efectuar la entrega de dichos elementos al Patio 4 de la Secretaría Distrital de Movilidad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta satisfactoria respecto a este trámite. Una vez se obtenga una respuesta positiva, se coordinará la entrega en el menor tiempo posible, de acuerdo con los horarios establecidos por la administración del Almacén.

Ver **Anexo 11**

17. ASPECTOS VARIOS

Se adjunta las Actas de Reunión Semanal, realizadas en el periodo de ejecución del presente informe No. 3, para el Contrato de Obra SDM-2024-3651 y el Contrato de Interventoría SDM-2024-3666.

Ver **Anexo 12**

18. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATO DE OBRA.

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del programa de trabajo y como resultado de las actividades ejecutadas se dispuso de los siguientes recursos durante el periodo del presente informe.

18.1. PERSONAL

A continuación, se relaciona el equipo de trabajo profesional, tecnólogo y administrativo para el desarrollo del proyecto durante el periodo del presente informe:

Tabla 15 Personal del contrato de Obra

LISTA DE PERSONAL VINCULADO CONTRATO SDM 2024-3651				
	FUNCIONARIO	**DOCTO IDENTIDAD**	**NACIONALIDAD**	**EMPRESA**
1	ADRIANA MARGARITA GORDILLO CAMARGO	52146766	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
2	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRIÓN	1030526438	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
3	ANGIE YAMILE BARBOSA JIMÉNEZ	1016036144	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
4	MAYERLY LISETH JAIMES RANGEL	1095799846	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
5	JORDANA FRANCISCA CAMARGO FRANCO	1052382916	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
6	JOHN MARTÍNEZ	1030596454	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
7	GIOVANNI ARMANDO CAICEDO RINCÓN	81717588	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
8	OMAR ENRIQUE DUARTE MORA	1032412594	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
9	WILLIAM FERNANDO DUARTE	19487283	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
10	WILMER ARGEY ALONSO ÁVILA	1016036145	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
11	MOISÉS RODRÍGUEZ SALAZAR	17414788	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
12	LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ	19226795	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
13	ÁNGELA LUCÍA HORTUA CASTRO	52202151	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
14	KAREN FAIZULLY PEÑUELA PARRA	1012432338	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
15	JESSICA LORENA VANEGAS JIMÉNEZ	1000984578	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL

LISTA DE PERSONAL VINCULADO CONTRATO SDM 2024-3651				
	FUNCIONARIO	DOCTO IDENTIDAD	NACIONALIDAD	EMPRESA
16	DAVID STIVEN DÍAZ JIMÉNEZ	1233512599	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
17	KIMBERLY RÍOS	1012319874	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
18	MANUEL FERNANDO IBAGUÉ COCA	1033722011	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
19	BODDY ANDRÉS GRAJALES VERA	80810885	COLOMBIANA	CON. SEGURVIAL
20	SANTIAGO RAMÍREZ GÁMEZ	1192915707	COLOMBIANA	NSP
21	ANGIE CAMILA CARREÑO MURCIA	1019902718	COLOMBIANA	NSP
22	ANA CARELY CÁRDENAS MEDINA	33435673	COLOMBIANA	NSP
23	CARIN DIBETH CÁRDENAS MEDINA	1026558055	COLOMBIANA	NSP
24	HENROL ALBERTI PINTO MORALES	733911	VENEZUELA	PINTO VÍAS
25	MOISÉS GABRIEL VELÁSQUEZ UTRERA	6114082	VENEZUELA	PINTO VÍAS
26	JOSUÉ LEVI TERÁN MACHADO	6856054	VENEZUELA	PINTO VÍAS
27	NATALY YEPES PIÑATE	2759004	VENEZUELA	PINTO VÍAS
28	JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ	7327870	VENEZUELA	PINTO VÍAS
29	LEONARDO JESÚS HERRERA	5524863	VENEZUELA	PINTO VÍAS
30	AGUSTÍN GONZÁLEZ MORA	1019014977	COLOMBIANA	COLTESA
31	SERGIO LUIS SEGURA ESGUERRA	1019110694	COLOMBIANA	COLTESA
32	HENRY GARCÉS CALDERÓN	17446447	COLOMBIANA	COLTESA
33	FEDERMAN OLAYA	3078251	COLOMBIANA	COLTESA
34	FÉLIX HERNANDO SEGURA MESA	7214158	COLOMBIANA	COLTESA
35	WILSON ANTONIO GARCÉS GONZÁLEZ	17423745	COLOMBIANA	COLTESA
36	ÁLVARO VARGAS GAMBA	79561846	COLOMBIANA	C&S SEÑALES
37	ADOLFO GALVIS LOZANO	79979115	COLOMBIANA	C&S SEÑALES
38	HAROL WILSON DURAN RIVERA	1072427701	COLOMBIANA	C&S SEÑALES
39	YANNY GILBERTO MENA MENA	1004011889	COLOMBIANA	C&S SEÑALES
40	SAMUEL DAVID GÓMEZ CARABALLO	1002276309	COLOMBIANA	C&S SEÑALES
41	ALVARINO ROMERO MORALES	1022346321	COLOMBIANA	N. MILENIO
42	LUIS ALBERTO GALINDO ACOSTA	1006658291	COLOMBIANA	N. MILENIO
43	WILMER ESMIT LÓPEZ CAJAMARCA	1007627467	COLOMBIANA	N. MILENIO
44	JORGE LEONARDO RAMÍREZ RINCÓN	1010206503	COLOMBIANA	N. MILENIO
45	JUAN DAVID MORALES GUARACA	1030552191	COLOMBIANA	N. MILENIO
46	LUIS MIGUEL IGUARÁN RUBIO	1030567873	COLOMBIANA	N. MILENIO
47	CARLOS MARIO QUIROZ VILLAQUIRAN	1030596605	COLOMBIANA	N. MILENIO
48	CARLOS ANDRÉS VALBUENA GAITÁN	1030619342	COLOMBIANA	N. MILENIO
49	KEVIN ARTURO SEDAS CAVIEDES	1030688961	COLOMBIANA	N. MILENIO
50	CAMILO ANDRÉS BARACALDO MARTÍNEZ	1030697477	COLOMBIANA	N. MILENIO
51	JOHN BAYRÓN AMADOR BOHÓRQUEZ	1066721248	COLOMBIANA	N. MILENIO
52	JOSÉ ARISTÓBULO CETINA JIMÉNEZ	1071914424	COLOMBIANA	N. MILENIO
53	JOSÉ ARNULFO CETINA JIMÉNEZ	1071914651	COLOMBIANA	N. MILENIO

LISTA DE PERSONAL VINCULADO CONTRATO SDM 2024-3651				
	FUNCIONARIO	DOCTO IDENTIDAD	NACIONALIDAD	EMPRESA
54	JAROL MEDARDO ÁNGEL CALDERÓN	1030536869	COLOMBIANA	N. MILENIO
55	SEBASTIÁN MACHADO IBARGUEN	1056783077	COLOMBIANA	N. MILENIO
56	JOHN ALEJANDRO BERRIO MOYA	1072427701	COLOMBIANA	N. MILENIO
57	BRANDON ALIRIO CASTELLANOS HERNÁNDEZ	1233502735	COLOMBIANA	N. MILENIO
58	JUNIOR JOSÉ CAMACARO SALÓN	5168801	VENEZUELA	N. MILENIO
59	RICARDO CAVIEDES RIAÑO	79559267	COLOMBIANA	N. MILENIO
60	NIXON ALBERTO CAVIEDES RIAÑO	79707414	COLOMBIANA	N. MILENIO
61	DILAN CAMILO RUIZ	1000125125	COLOMBIANA	N. MILENIO
62	SANTIAGO MARTÍNEZ FORERO	1000161253	COLOMBIANA	N. MILENIO
63	HAROL ANDRÉS CASTELLANOS HERNÁNDEZ	1012359949	COLOMBIANA	N. MILENIO
64	JOHAN STIVEN URREA MENDOZA	1022347447	COLOMBIANA	N. MILENIO
65	FELIPE ANCHICO ARROYO	1030559782	COLOMBIANA	N. MILENIO
66	JHON ANDRÉS GÓMEZ BELTRÁN	1030597494	COLOMBIANA	N. MILENIO
67	ANDRÉS FELIPE IBÁÑEZ ACEVEDO	1032482997	COLOMBIANA	N. MILENIO
68	JORGE ANDRÉS CÁRDENAS RAMÍREZ	1233891172	COLOMBIANA	N. MILENIO
69	YEIVER CAMILO IBAGUÉ GARAVITO	1233502528	COLOMBIANA	N. MILENIO
70	BLANCA SÁNCHEZ XAVIER OSWALDO	5978619	VENEZUELA	N. MILENIO
71	JESÚS MANUEL VELÁSQUEZ RAMOS	3811303	COLOMBIANA	N. MILENIO
72	ORLANDO FABIAN CÁRDENAS OLIVERO	80919445	COLOMBIANA	N. MILENIO
73	BEATRIZ YORLADYS GAMBA BUITRAGO	1123561993	COLOMBIANA	N. MILENIO
74	CRISTIAN SANTIAGO MORENO BELTRÁN	1001066544	COLOMBIANA	N. MILENIO
75	SONIA ROMERO MORALES	52989063	COLOMBIANA	N. MILENIO
76	JULIÁN ANDRÉS CÁCERES PINTO	80734904	COLOMBIANA	N. MILENIO
77	NICOLAS ENRIQUE RUIZ CASTAÑEDA	1030625173	COLOMBIANA	N. MILENIO
78	NELSON ENRIQUE MAZO CAMPO	1083553217	COLOMBIANA	N. MILENIO
79	CRISTHIAN DAVID CÁRDENAS ESCOBAR	1012369197	COLOMBIANA	N. MILENIO
80	DE LA ROSA PAULO ANDRÉS	1046812286	COLOMBIANA	N. MILENIO

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Igualmente, en el **Anexo 17** Informe Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se detalla el personal Operativo que conforma las cuadrillas que trabajaron en la implementación de la Señalización durante el periodo del presente informe.

18.2. EQUIPOS DE APLICACIÓN, CONTROL, MATERIALES E INSUMOS

A continuación, se relaciona los siguientes equipos que se emplearon para la ejecución de los trabajos del periodo desarrollados en el periodo del presente informe y que fueron presentados y probados por parte de la Interventoría:

Tabla 16 Equipos empleados para la ejecución de las Actividades

EQUIPOS DE APLICACIÓN EMPLEADOS		
ÍTEM	**MAQUINARIA EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN**
1	Equipo Montado Placa: **WHO 475** **PORTWIN 8900** Serial: **1939400128** Factura: **00015239**	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura líquida que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado
2	Equipo **PINTA RAYAS TERMO PLÁSTICO PROMELT SIN SMART DIE** Factura: **0364**	Vehículo autopropulsado para aplicación de resina termoplástica que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer dos (2) boquillas para la aplicación de resina por extrusión o pulverización o spray y dos (2) dispensadores o boquillas para la aplicación de microesfera tipo drop on o sembrado a presión. Incluye caldera.
3	Equipo Montado Placa: **WHO 475** **PORTWIN 8900** Serial: **1939400096** Factura: **00015239**	Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frío por el método de spray, el cual deberá poseer, como mínimo, cuatro (4) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on. Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frío por el método de extrusión, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on
4	**POWERLINER 8900XLT 2 GUN** Serial: **1223400024** Factura: **00005596**	Máquina manual para pintura líquida.
	POWERLINER 8900XLT 2 GUN Serial: **1223400015** Factura: **00005568**	
	PORTWIN 4900 Serial: **19392001** Factura: **00015167**	
5	**TERMO PERFILADO MARCA TATU** Serial: **026P18O16** **Factura: PT-05-337**	Máquina manual para aplicación de termoplástico, incluye caldera.
6	Equipo **LINE LAZER 200 HS 2 PISTOLAS** Factura: **0326**	Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método Spray. Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método extrusión.

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

A continuación, se listan los instrumentos usados por cada cuadrilla en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

Tabla 17 Instrumentos usados para el control de calidad

EQUIPOS DE CONTROL	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1
Lupa con Aumento	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir Temperatura ambiente y de la Superficie por demarcar	1
Equipo para medir Velocidad del viento	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Así mismo, en el **Anexo 9.** Equipos mínimos, se adjuntan los certificados de calibración y formatos de seguimiento al estado de los equipos y elementos de control de obra mínimos.

Tabla 18 Relación de materiales utilizados

RELACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS			
DESCRIPCIÓN	**COLOR**	**MARCA**	**LOTE**
Pintura bicomponente spray	Blanco	Pintuflex	P9197 P9201
Pintura bicomponente spray	Amarillo	Pintuflex	P9072 P8741
Microesfera de vidrio	N/A	Echostar 5 - Sovitec	K104297

RELACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS			
DESCRIPCIÓN	**COLOR**	**MARCA**	**LOTE**
Imprimante	Negro	Pintuflex	P9175
Pintura llana blanca	Blanco	Pintuflex	P9196
Pintura llana Amarilla	Amarillo	Pintuflex	P9046
Antigraffiti	Transparente	Avery Dennison	LR480437 LR480925 LR480926 LR480927 LR480928
Reflectivo	Blanco	Avery Dennison	LR480361 LR480367 LR480369 LR480353 LR480370 LR480371 LR475407
	Amarillo		LR467116 LR480946
	Amarillo Limón		LR479770 LR480312 LR480311 LR473132 LR473456
Estoperol metálico	N.A.	Industrias Astro	N.A.
Tachas	Amarilla	Smart Traffic Devices	N.A.
Tachas	Blanco / Rojo	Smart Traffic Devices	N.A.

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Los certificados de calidad de los materiales y productos empleados en las actividades de señalización y dispositivos de seguridad vial, como parte del

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico y el Plan de Calidad del contrato. Estos documentos garantizan que los insumos utilizados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas, asegurando la conformidad con los estándares normativos y el desempeño esperado en condiciones operativas reales.

Ver **Anexo 7**

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE

Para la ejecución del mes 3, y en cumplimiento de garantizar la provisión del 5% servicios de sujetos de especial protección constitucional, ver **Anexo 14** donde se relaciona el personal vinculado al contrato 2024-3651.

20. VINCULACIÓN POR PORCENTAJE DE MUJERES

En búsqueda del compromiso de la vinculación del 13.8% de mujeres y para ello se relacionan los nombres de las mujeres que han estado vinculadas al contrato para el corte No. 3; además del 5% de total de mano de obra no calificada de mejores para este mismo periodo.

Ver **Anexo 15**

21. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Con base en el componente social descrito en el anexo técnico y en búsqueda de su adecuado cumplimiento, se coordinaron y se ejecutaron las actividades en articulación con el área técnica y bajo el seguimiento de la interventoría, garantizando la socialización, atención a la comunidad y cumplimiento del cronograma establecido en las localidades de Bosa y Kennedy, así como de las zonas de intervención directa del proyecto.

Por lo anterior, se presenta en el documento **Informe de Gestión Social**, adjunto en el **Anexo 16.**

22. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El soporte de cumplimiento de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es fundamental para garantizar que todas las actividades del contrato se desarrollen de manera segura, responsable y conforme a la normatividad vigente. Este conjunto de evidencias demuestra el cumplimiento con los estándares, procedimientos y disposiciones legales orientadas a proteger la integridad física y la salud de los trabajadores, así como del entorno en el que se ejecuta la obra.

En el **Anexo 17** se incluyen, entre otros, los siguientes elementos:

- Soportes de pago y cumplimiento de aportes parafiscales.
- Registros y certificados de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.
- Registros fotográficos del desarrollo de actividades en campo.
- Informes y evidencias de inspecciones de seguridad realizadas en los frentes de trabajo.
- Formatos de preoperacionales de maquinaria y equipos.
- Reportes de inducciones y reinducciones al personal.
- Planillas de seguimiento a la dotación de elementos de protección personal (EPP).
- Evidencias de implementación de elementos de emergencia por cada vehículo y dependencia administrativa.

Además de prevenir accidentes, reducir riesgos y optimizar la continuidad operativa, este soporte contribuye a que la obra se ejecute de manera eficiente y sin interrupciones derivadas de incidentes de seguridad. En conjunto con el seguimiento y acompañamiento de la Interventoría, constituye una herramienta clave para cumplir con las obligaciones contractuales, minimizar riesgos y garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los involucrados.

23. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

El registro de la correspondencia oficial, tanto física como digital, que ingresa o se emite desde el Consorcio Segurvial Bogotá, incluyendo comunicaciones con SDM, Interventoría y otras fuentes externas como proveedores e incluso entidades distritales o gubernamentales, se incluye en el **Anexo 18.**

24. SOPORTE DE IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD APROBADO.

La importancia del soporte de implementación, ejecución de las actividades y cumplimiento del plan de calidad aprobado radica en asegurar que el proyecto se realice de acuerdo con los estándares y requisitos establecidos. Este soporte demuestra que las actividades se llevan a cabo de manera planificada, controlada y eficiente, garantizando la calidad en cada etapa del proceso. Además, ayuda a identificar y corregir posibles desviaciones a tiempo, minimizando riesgos y asegurando que los resultados finales cumplan con las expectativas y especificaciones acordadas.

En definitiva, es clave para mantener la coherencia, la eficiencia y la satisfacción del cliente, asegurando que el trabajo realizado sea de alta calidad y cumpla con los objetivos del contrato. Ver **Anexo 7, Anexo 9 y Anexo 19.**

25. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS (Entre las cuales se destaca el estado de las pólizas del contrato de obra (vigente / en Actualización)).

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por la compañía Seguros Mundial S.A. A continuación, se presenta una relación que incluye amparos, vigencia y valor asegurado.

Tabla 19 Pólizas del Contrato 2024-3651 Consorcio Segurvial Bogotá

TIPO DE GARANTÍA	AMPARO	VIGENCIA		VR.	PÓLIZA No.
		DESDE	HASTA		
Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	22/01/25	23/05/28	$ 5.631.442.028,40	100363759-3

	Pago de salarios	22/01/25	22/11/30	$ 3.754.294.685,60	100363759-3
	Estabilidad y calidad de la obra	22/11/27	22/11/32	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/11/27	23/05/28	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
Responsabilidad civil extracontractual	Amparo básico - predios - labores y operaciones	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Patronal	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Contratistas y subcontratistas	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Vehículos propios y no propios	22/01/25	22/11/27	$ 938.573.671,00	100093818-2

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Las pólizas anteriormente mencionadas están aprobadas por parte de la entidad contratante.

Ver **Anexo 20.**

26. REPORTE DE PLANILLAS DE PAGO DE SALARIOS Y HONORARIOS AL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO.

Este documento asegura que el pago a los trabajadores y honorarios se realiza de manera puntual, precisa y en cumplimiento con las obligaciones laborales y legales. Además, ayuda a mantener un control claro sobre los costos del proyecto.

Ver **Anexo 21.**

27. REPORTE DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO (SALUD, PENSIÓN, ARL) Y DEMÁS APORTES LEGALES

Este reporte es fundamental para garantizar que se cumplan todas las obligaciones sociales y legales correspondientes. Este control asegura que las contribuciones a la seguridad social, riesgos laborales y otros aportes legales se realicen de manera oportuna y correcta, protegiendo a los trabajadores y, en definitiva, no solo refleja una gestión transparente y responsable, sino que también protege los derechos del personal y contribuye a la sostenibilidad y legalidad del proyecto.

Ver **Anexo 22.**

28. CERTIFICACIÓN HECHA POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR O REVISOR FISCAL, EN EL QUE DECLARE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS POR CONCEPTOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA.

Ver **Anexo 23.**

29. LISTADO DE PROVEEDORES

Se adjunta una tabla de los Proveedores

Tabla 20 Proveedores

PROVEEDORES		
PROVEEDOR	**ACTIVIDAD COMERCIAL**	**CORREO**
Avery Dennison	Papel Reflectivo	alexandra.castillo@averydennison.com
Pintuflex	Pintura	zona08@pintuflexltda.com
Grupo Efexport ZF	Fabricante de dispositivos	almacen.efexport@gmail.com
Smart Traffic Devices	Fabricante de dispositivos	comercial@std.com.co
Etra Interandina	Grupo Empresarial	echavez.interandina@grupoetra.com
G&J Ferreterías	Fabricante de Perfilería Metálica	viviana.romero@gyj.com.co
Octágono	Fabricante de Perfilería Metálica	octagono1@gmail.com
Mundial de Tornillos	Herramientas de ferretería	ventas@mundialdetornillos.com
CYS Señales	Instalación de señales verticales	alvg71@gmail.com
Q y R	Aplicación e instalación de señalización vial	qyrsenalizaciones@gmail.com
Pinto Vías	Aplicación e instalación de señalización vial	pintoviassas@gmail.com

PROVEEDORES		
PROVEEDOR	**ACTIVIDAD COMERCIAL**	**CORREO**
Señalización Nuevo milenio	Aplicación e instalación de señalización vial	asistenteadminitrativa@snuevomilenio.com
Cefe Vial	Aplicación e instalación de señalización vial	Ceferino martinez66@gmail.com

Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

30. CERTIFICACIÓN HECHA POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR O REVISOR FISCAL, EN EL QUE DECLARE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS A PROVEEDORES DE ACUERDO CON EL PLAN DE PAGOS ACORDADO CON CADA UNO.

Conforme a las obligaciones contractuales y las disposiciones establecidas en la minuta y el Anexo Técnico del contrato SDM 2024–3651, el contratista presenta a continuación la certificación expedida por el representante legal, contador o revisor fiscal, en la que declara encontrarse al día en los pagos a proveedores, según los acuerdos pactados y los términos de ejecución de cada suministro o servicio contratado.

Ver **Anexo 23.**

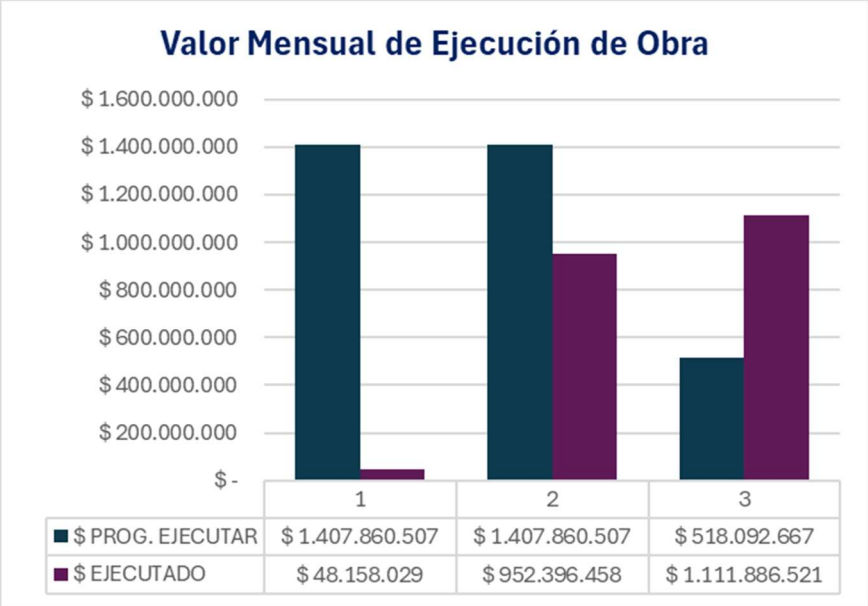
31. ESTADO PRESUPUESTAL.

Tabla 21 Balance Presupuestal

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 18.771.473.428¨**
VALOR POR EJECUTAR	$ 16.659.032.420¨
VALOR A EJECUTAR (MES 3) ACUMULADO	$ 3.333.813.681¨
VALOR TOTAL EJECUTADO (MES 3) ACUMULADO	$ 2.112.441.008¨
VALOR EJECUTADO MES 3	**$ 1.111.886.521¨**
PORCENTAJE A EJECUTAR (MES 3) ACUMULADO	17.76%
PORCENTAJE EJECUTADO (MES 3) ACUMULADO	11.25%

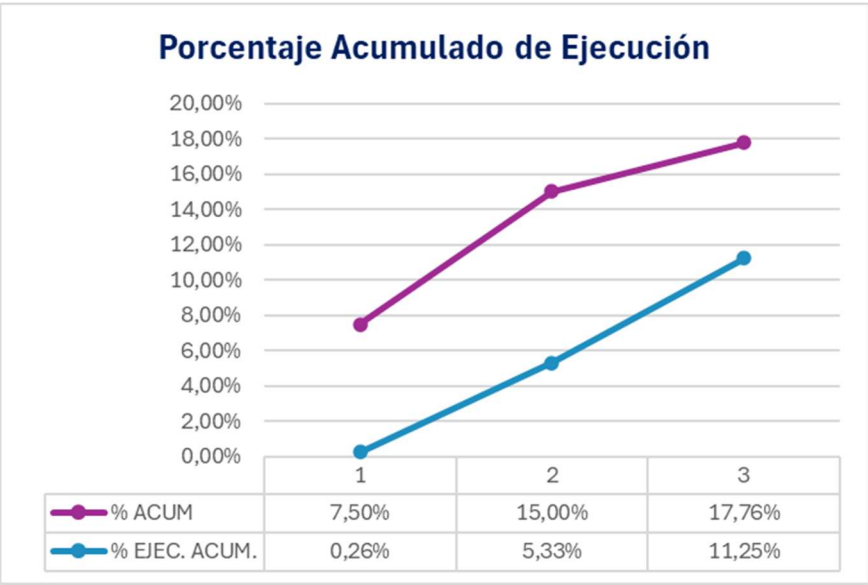
Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Ilustración 2 Valor Ejecución Mensual vs Valor Programado Mensual



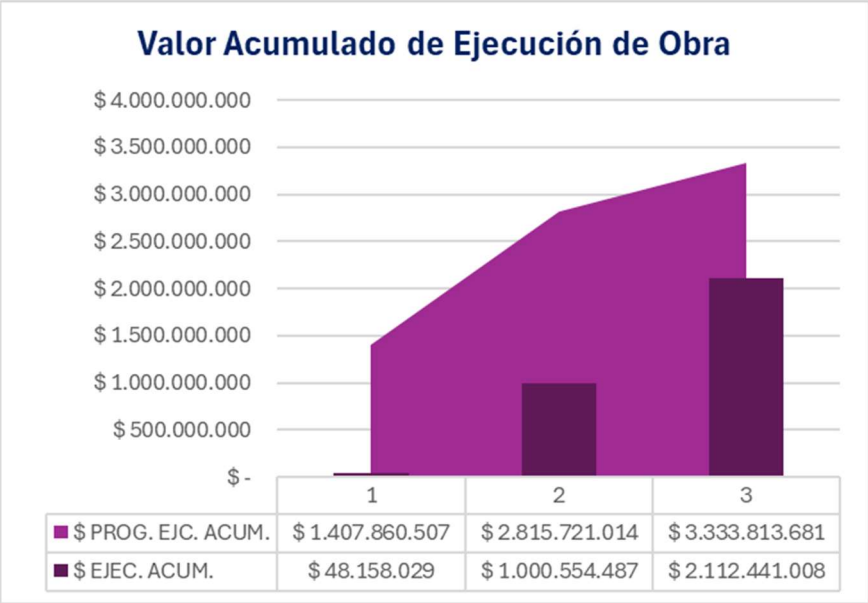
Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Ilustración 3 Porcentaje Ejecución Mensual vs Porcentaje Programado Mensual



Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

Ilustración 4 Valor Acumulado de Ejecución vs Valor Programado Acumulado



Fuente: Elaboración Consorcio Segurvial Bogotá

En el tercer mes de ejecución del contrato, se evidencia un desfase entre lo programado y lo efectivamente ejecutado. Mientras el valor acumulado previsto al corte de este periodo es de $3.333.813.691 COP, equivalente al 17,76% del total contractual, el valor ejecutado y facturado asciende a $2.112.441.008 COP, correspondiente a un 11,25%, lo que genera una brecha de 6,51 puntos porcentuales respecto a la meta programada.

Si bien persiste un rezago, la brecha se ha reducido en términos porcentuales en comparación con el mes anterior, lo cual refleja una tendencia de mejora progresiva en la ejecución del proyecto. Esta situación ha estado determinada, principalmente, por condiciones climáticas adversas, que durante varios días obligaron a la suspensión temporal de actividades en campo, en atención a criterios de seguridad del personal y preservación de la calidad técnica de las intervenciones.

Para mitigar los efectos del atraso y acelerar la recuperación del cronograma, se han definido las siguientes acciones correctivas:

- **Optimización ante los impedimentos de tipo climáticos**: se implementarán estrategias que permitan maximizar el rendimiento durante

las ventanas de clima favorable, incluyendo ajustes logísticos y refuerzo de recursos cuando las condiciones lo permitan.

- **Planificación ajustada:** se revisarán las actividades críticas del cronograma para priorizar aquellas que permitan mayor avance físico y financiero en menor tiempo.

Con estas medidas, se espera continuar cerrando la brecha de ejecución y alcanzar en los próximos meses niveles óptimos de cumplimiento, garantizando en todo momento la calidad de las obras y el respeto por los estándares técnicos establecidos en el contrato.

31.1. INFORME ECONÓMICO TRIMESTRAL

El Informe Económico Trimestral es una herramienta esencial para evaluar la ejecución financiera del contrato, al contrastar los recursos programados con los efectivamente ejecutados. Este análisis permite detectar de manera oportuna brechas, definir ajustes y aplicar acciones correctivas que aseguren el cumplimiento de las metas, garantizando transparencia en el manejo de los recursos públicos.

En este sentido, se presenta la ejecución presupuestal del primer trimestre comprendido entre 22 de enero al 21 de abril de 2025, donde se incluyen los valores programados, ejecutados y pendientes por ejecutar, así como su respectiva representación gráfica para una comprensión integral del estado económico del contrato.

Ver **Anexo 13.**

32. SOPORTE DE CUMPLIMIENTO A FACTORES DE SELECCIÓN EN LOS QUE SE OBTUVO PUNTAJE ADICIONAL EN LA OFERTA.

En esta sección se presenta el soporte documental que acredita el cumplimiento de los factores diferenciales ofrecidos por el contratista durante el proceso de selección, los cuales otorgaron puntaje adicional en la etapa de evaluación. La evidencia adjunta respalda el cumplimiento real y verificable de dichos

compromisos, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones y a lo estipulado contractualmente.

Ver **Anexo 24** y **Anexo 25.**

33. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

33.1. COMENTARIOS

Durante el tercer mes de ejecución del contrato, el proyecto evidenció un avance inferior al programado, aunque al mismo tiempo se observa una mejora significativa en los indicadores de desempeño presupuestal y de ejecución técnica. Esta evolución favorable es resultado directo del ajuste operativo implementado a nivel de planificación, priorización de ID estratégicos, optimización de recursos, y una articulación más eficiente con la interventoría y la entidad contratante.

El comportamiento ascendente en la ejecución respecto a lo programado refleja un mejor aprovechamiento de los frentes de trabajo disponibles, la ejecución simultánea en distintas zonas, validaciones técnicas y aprobaciones de PMT.

En conclusión, las estrategias correctivas adoptadas han permitido acercarse al punto de equilibrio contractual sin comprometer la calidad y cumpliendo con todos los estándares establecidos bajo el acompañamiento y supervisión de la interventoría.

33.2. CONCLUSIONES

- Las condiciones climáticas adversas, como las precipitaciones frecuentes, representaron un factor determinante en la suspensión de actividades operativas, impactando negativamente el cumplimiento del cronograma.
- La necesidad de ajustar los recursos humanos y operativos se identificó como una acción clave para mitigar los retrasos acumulados y garantizar la recuperación del plan de trabajo en los próximos meses.

- Se ha logrado un repunte sostenido en la curva de ejecución presupuestal gracias a la implementación de medidas operativas que permitieron mayor continuidad y rendimiento en obra.
- La articulación efectiva entre los equipos técnicos del contratista e interventoría, sumado al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y control, ha sido clave para lograr un mejor desempeño frente a los meses anteriores.
- El análisis presupuestal evidencia que se ha logrado acortar significativamente la brecha entre lo ejecutado y lo programado, recuperando terreno frente al rezago inicial sin comprometer la calidad ni los tiempos contractuales.
- La maduración de la curva de aprendizaje del equipo operativo en campo ha repercutido directamente en una mayor eficiencia y mejor cumplimiento de especificaciones técnicas.

33.3. RECOMENDACIONES

- **Refuerzo de la capacidad operativa:** Incrementar la cantidad de personal especializado y maquinaria disponible para intensificar las actividades pendientes, priorizando las labores críticas dentro del cronograma.

- **Gestión de riesgos climáticos:** Implementar estrategias de planificación que consideren contingencias frente a condiciones climáticas adversas, como la programación de actividades bajo condiciones óptimas y el uso de técnicas que permitan trabajar en escenarios húmedos.

- **Monitoreo constante del avance:** Establecer reuniones semanales de seguimiento y ajuste del cronograma para evaluar el impacto de las acciones correctivas implementadas y garantizar el cumplimiento de los objetivos mensuales.

- **Comunicación efectiva:** Mantener una coordinación fluida entre el Consorcio, la Interventoría y las partes interesadas para anticipar posibles problemas y agilizar la toma de decisiones.

- **Evaluación de alternativas técnicas:** Explorar soluciones técnicas innovadoras que puedan optimizar los procesos constructivos y minimizar el impacto de factores externos como el clima.

34. ANEXOS

Anexo 1 (Acta Parcial y Planillas)
Anexo 2 (Avance de actividades de Inspección e Implementación)
Anexo 3 (Registro fotográfico)
Anexo 4 (Planes de Manejo de Tránsito - PMT)
Anexo 5 (Aspectos técnicos)
Anexo 6 (Reporte de acciones realizadas por cruce de información con Otras Entidades)
Anexo 7 (Registro de Control de Calidad)
Anexo 8 (Protocolo de manejo de Residuos Peligrosos)
Anexo 9 (Certificado de calidad de los materiales y Equipos)
Anexo 10 (Reporte de Entrega de señalización Implementada al almacén de la entidad)
Anexo 11 (Reporte de Señalización retirada de vía y entregada al almacén de la Entidad)
Anexo 12 (Aspectos varios - Actas de Comités)
Anexo 13 (Recursos Utilizados por el contrato de obra)
Anexo 14 (Vinculación de Población Vulnerable)
Anexo 15 (Vinculación por Porcentaje de Mujeres)
Anexo 16 (Informe de gestión social)
Anexo 17 (Informe de seguridad y salud en el trabajo SST)
Anexo 18 (Correspondencia de comunicados)
Anexo 19 (Soporte de implementación, ejecución de las actividades y cumplimiento del plan de calidad Aprobado - Toma de Reflectividad)
Anexo 20 (Pólizas del Contrato de Obra)
Anexo 21 (Reporte de Planillas de Pago de salarios y Honorarios vinculado al contrato.)
Anexo 22 (Reporte de Planillas de Pago del personal (EPS, AFP, ARL) y demás aportes legales)
Anexo 23 (Certificación hecha por representante legal, contador o revisor fiscal, en el que declare encontrarse al día en pagos por conceptos de salarios y honorarios y aportes de seguridad social y parafiscales, de conformidad con la oferta económica presentada.)

Anexo 24 (Certificación hecha por representante legal, contador o revisor fiscal, en el que declare encontrarse al día en pagos a proveedores de acuerdo con el plan de pagos acordado con cada uno)

Anexo 25 (Soporte de cumplimiento a factores de selección en los que se obtuvo puntaje adicional en la oferta)
