Yopal, 02 de Septiembre del 2024

RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 2-Septiembre-24
HORA 4:00Pm NUMERO DE FOLIOS 881
RECIBIDO Fabian Parra
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de obra N° 032 DE 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ENTREGA DEL INFORME DE OBRA N°9 DEL PERIODO 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega del informe de obra N°9 del proyecto de referencia que se llevó a cabo en el periodo del 01 de JUNIO del 2024 al 30 de JUNIO del 2024, en donde se encuentra el avance físico y financiero de las diferentes actividades ejecutadas en el desarrollo de la obra objeto del contrato en mención y en general todos los datos necesarios para tener una información actualizada a la fecha de entrega de este informe.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Anexos:
4 CARPETAS 880 FOLIOS
1 CD

INFORME DE OBRA N°9

PERIODO:

01 DE JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CONTRATO DE OBRA N° 032 DE 2023

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S
R.L. MARÍA DIOMY BARRERA ALFONSO
TILODIRÁN, JUNIO 2024
ORIGINAL

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

CONTRATO N° 032 DE 2023		
OBJETO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
INFORME DE OBRA N°9 / 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024		
REVISIÓN N°1		
APROBACIÓN		
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN POR PARTE CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA	
	NOMBRE	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
RESPONSABLE DE REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	FIRMA	
	NOMBRE	LUIS ANDRES LÓPEZ MESA
RESPONSABLE DE APROBACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA	
	NOMBRE	JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN QUE SE PLASMA EN EL INFORME DE OBRA N°9	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8
OBJETIVOS 9
OBJETIVO GENERAL 9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 10
1.1 FICHA TÉCNICA 10
1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA 11
1.3 RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES 11
1.4 ANEXOS 11
1.4.1 ACTA DE REPROGRAMACIÓN DE ANTICIPO 11
2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 12
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 12
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 13
3. ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA DE OBRA 16
4. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO 17
4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 17
4.2 VALOR DEL PROYECTO 17
4.3 ANÁLISIS DE A.I.U 17
4.4 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 18
4.5 AVANCE DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 19
4.5.1 ORDEN DE OPERACIÓN N°22 20
4.5.2 ORDEN DE OPERACIÓN N°23 21
4.5.3 ORDEN DE OPERACIÓN N°24 22
4.5.4 ORDEN DE OPERACIÓN N°25 23
4.5.5 ORDEN DE OPERACIÓN N°27 25
4.5.6 ORDEN DE OPERACIÓN N°29 26
4.5.7 ORDEN DE OPERACIÓN N°30 26
4.5.8 ORDEN DE OPERACIÓN N°31 27
4.6 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL ANTICIPO 31
4.7 CUADRO DEL AVANCE DE OBRA 32
4.8 ANEXOS 32
4.8.1 CERTIFICACIÓN BANCARIA 32
4.8.2 EXTRACTO BANCARIO 32

4.8.3 ÓRDENES DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO 32

5. AVANCE DEL PROYECTO 33

5.1.1 GRÁFICO DE CONTROL DE LA INVERSIÓN 44

5.1.2 GRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA 45

5.2 PROYECCIONES DE OBRA PARA EL SIGUIENTE PERIODO 46

5.3 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 46

5.4 EQUIPOS UTILIZADOS 47

5.5 MATERIALES UTILIZADOS 48

5.6 DIFICULTADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO 48

5.7 ESTADO DEL TIEMPO 49

5.8 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA 50

5.9 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 54

5.10 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 55

5.11 BITÁCORAS 58

5.12 ANEXOS 58

5.12.1 CANTIDADES EJECUTADAS 58

5.12.2 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL Y PAGO FIC 58

5.12.3 NÓMINA DEL PERSONAL EMPLEADO DURANTE ESTE PERIODO 58

5.12.4 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN 58

5.12.5 FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 58

5.12.6 ACTAS DE REUNION DE OBRA 58

5.12.7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 58

5.12.8 CORRESPONDENCIA ENVIADA 58

5.12.9 BITÁCORAS 58

5.12.10 ACTAS DE VECINDAD 58

5.12.11 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 58

6. ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 59

6.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE SALUD OCUPACIONAL 60

6.1.1. Deben darse charlas antes, durante y después de la ejecución de la obra a todo el personal, el cual debe ser evidenciado mediante registro de asistencia 60

6.1.2. Realizar Charlas, capacitaciones al personal de la obra sobre temas de seguridad y salud ocupacional 62

6.1.3. Relación en un cuadro de las afiliaciones a salud, pensión y ARL de todo el personal que labora en la obra 62

6.2. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 66
6.2.1. Registro de accidentes presentados durante la ejecución de la obra 66
6.2.2. Medidas de Prevención para accidentes 66
6.2.3. Las oficinas e instalaciones deben contar con la señalización adecuada y bien dotada con los elementos de seguridad industrial 71
6.2.4. La obra debe estar bien señalizada, el cual deben colocar señales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra 73
6.2.5. Implementación de elementos de protección, seguridad al personal de la obra 76
6.2.6. Registro fotográfico del buen uso e implementación de los elementos de seguridad. 76
6.2.7. Dotación suministrada al personal de obra (formatos de recibido y registro fotográfico). 78
6.3 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL 79
6.3.1. Adopción de las medidas necesarias para impedir las emisiones accidentales de sustancias químicas. 79
6.3.2. Manejo de residuos peligrosos, basuras, etc. 81
6.3.3. Kit ambiental: manejo de grasas, aceites, etc. 84
6.3.4. Mantenimiento de la maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de la obra. 84
6.3.5. Establecer lugar, depósito para los materiales, productos, aceites y grasa (tener en cuenta el registro fotográfico) 85
6.3.6. La maquinaria debe tener su tecno-mecánica actualizada y en vigencia. 85
6.3.7. Señalización vertical 86
6.3.8. Colaboración con las autoridades locales en el establecimiento de procedimientos para respuesta ante emergencias. 86
GRUPO GAULA CASANARE 88
6.3.9. Permisos y Licencias Ambientales necesarias para la ejecución de la obra (Anexarlas) 88
6.3.10. El contratista de construcción debe tener como política al realizar sus actividades implementar prácticas y medidas de manejo ambiental y seguridad industrial, con el fin de minimizar los impactos ambientales, prevenir la contaminación, preservar el medio ambiente, brindar protección y seguridad a los trabajadores y conservar relaciones estrechas con la comunidad, autoridades locales y la entidad ambiental competente 92
6.3.11. Disponer en obra de un profesional en el área de seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos profesionales según como se establece en la minuta 96
6.3.12. Para todo esto se debe anexar sus soportes y registro fotográfico a color. 96
6.4. DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES IMPACTOS EN EL PERIODO 96
6.5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 97
7. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 105
7.1 JUSTIFICACIÓN 105

7.2 ALCANCE 105
7.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 105
7.4 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 106
7.4.1 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA 107
7.4.1.1 OBJETIVO 107
7.4.1.2. ALCANCE 107
7.4.1.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 107
7.4.1.4 DEFINICIONES 108
7.4.1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 108
7.4.1.6 RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 110
7.5 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 110
7.5.1 OBJETIVO 110
7.5.2 ALCANCE 110
7.5.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 110
7.5.4 DEFINICIONES 111
7.5.5 ANEXOS 111
7.5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 111
7.6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO 112
7.7 RECURSOS 113
7.7.1 CANTIDAD Y TIPO DE RECURSO DURANTE EL PROYECTO 113
7.7.2 NORMAS CON LOS CUALES LOS MATERIALES DEBEN SER CONFORMES 113
7.8 ANEXOS 114
7.8.1 REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS 114
7.8.2 SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 114
7.8.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 114
8. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 115
8.1 REUNION DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD, VEREDAS Y MUNICIPIOS ETC. 115
8.1.1 Reunión inicial de obra 115
8.1.2 Reunión con la Comunidad 116
8.1.3 Reunión de Avance de la Obra 118
8.2 OBLIGACIONES DE GESTIÓN SOCIAL 118
8.2.1 Elaborar y ejecutar un plan de gestión social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras. 118
8.2.2 Reuniones con la comunidad 118

8.2.3 Medios de difusión 119
8.2.4 Diseños de la valla del proyecto (registro fotográfico) 119
8.2.5 Conformación de la veeduría ciudadana (se debe realizar mediante una junta con los representantes de cada acción comunal o cada vereda) 120
8.2.6 Buzón de sugerencias (implementarlos, registro fotográfico, lugar visible, formato para las sugerencias, quejas y reclamos). 120
8.2.7 Como suministran la información a la comunidad, atención al usuario 121
8.2.9 Brigadas de orden, aseo y limpieza. 121
8.2.10 Tener plan de emergencias 122
8.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 124
8.4 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRÁMITE 125
8.5 INDICADORES 125
8.5.1 Interferencias presentadas durante el desarrollo de la obra 125
8.6 ANEXOS 127
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 128
9. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 129
9.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 129
9.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO 129
✓ INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS 130
9.2.2 CAPACITACIONES DE SST 132
9.2.3 CONTROL DEL TRANSITO 133
9.2.4 INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA 134
9.3.1 RELACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS 136
9.3.2 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS 136
9.3.3 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS 136
9.3.4 PLANILLA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES. 136

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene la descripción de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

A continuación, se presenta el informe mensual de obra N°9, correspondiente al periodo del 01 de junio del 2024 al 30 de junio del 2024, el cual contiene el consolidado del avance fisico y financiero de las diferentes actividades ejecutadas en el desarrollo de la obra objeto del contrato en mención y en general todos los datos necesarios para tener una información actualizada a la fecha de entrega de este informe.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- ✓ Entregar informe mensual N°9 del avance y ejecución de la obra durante el periodo del 01 junio del 2024 al 30 de junio del 2024.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Informar el estado financiero del proyecto actual.
- ✓ Remitir la documentación administrativa y contable soporte de acuerdo a requerimientos del contrato.
- ✓ Describir las actividades técnicas ejecutadas, dificultades o inconvenientes presentados, comités, estado del tiempo, materiales y equipos utilizados, correspondencia emitida y recibida durante este periodo.
- ✓ Describir las actividades del plan integral de salud ocupacional, ambiental, social y seguridad industrial desarrolladas durante este periodo.
- ✓ Describir la implementación del plan de calidad.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 FICHA TÉCNICA

CONTRATO N°	032 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE - ACUATODOS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR DESIGNADO POR ACUATODOS S.A. E.S.P.	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS
CONTRATISTA DE OBRA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S / R.L MARÍA DIOMY BARRERA ALFONSO
DIRECTOR DE OBRA	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA	DIEGO OLNEY PÉREZ PACHÓN
VALOR DEL CONTRATO	$ 38.919.603.368,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 19.459.801.684,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	MARTES, 10 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	VIERNES, 09 DE AGOSTO DEL 2024
DATOS DE LA EMPRESA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	
DIRECCIÓN	Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan

TELÉFONOS	(608) 632 7178
CORREO ELECTRÓNICO	synergiaconstrucciones@gmail.com

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZAS INICIALES

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
57-45-101001919	CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	$ 7.783.920.673,60	25/08/2023	24/02/2025
57-45-101001919	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	50%	$ 19.459.801.684,00	25/08/2023	24/02/2025
57-45-101001919	SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	$ 1.945.980.168,40	25/08/2023	05/07/2027
57-45-101001919	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	$ 7.783.920.673,60	25/06/2024	25/06/2029
57-40-101001902	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	$ 1.945.980.168,40	25/08/2023	05/07/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
57-45-101001919	CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	$ 7.783.920.673,60	10/10/2023	11/04/2025
57-45-101001919	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	50%	$ 19.459.801.684,00	10/10/2023	11/04/2025
57-45-101001919	SALARIOS Y PRESTACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	20/08/2027
57-45-101001919	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%	$ 7.783.920.673,60	10/08/2024	10/08/2029
57-40-101001902	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%	$ 1.945.980.168,40	10/10/2023	20/08/2024

1.3 RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO	10/10/2023		
2	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	10/10/2023	$ 19.459.801.684,00	
3	ACTA DE REPROGRAMACIÓN DE ANTICIPO.	20/06/2024	$ 19.459.801.684,00	

1.4 ANEXOS

1.4.1 ACTA DE REPROGRAMACIÓN DE ANTICIPO

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento: Casanare
Municipio: Yopal
Centro Poblado: Tilodirán
Latitud Norte: 5°07'58" Longitud Oeste: 72°11'51"

Tilodirán es un poblado colombiano ubicado en el departamento de Casanare y constituye un corregimiento del municipio de Yopal, la capital departamental. Tilodirán se encuentra ubicado en la zona central del municipio de Yopal, en territorios correspondientes a los Llanos Orientales de Colombia y en medio de la cuenca hidrográfica del rio Cravo Sur. En su territorio presenta paisaje de sabana.

El presente proyecto se desarrolla en el Centro Poblado de Tilodirán, Departamento de Casanare y se encuentra a 08 horas de la capital Bogotá. En el Centro Poblado de Tilodirán su temperatura media es de 28°C, con una humedad del 74%.

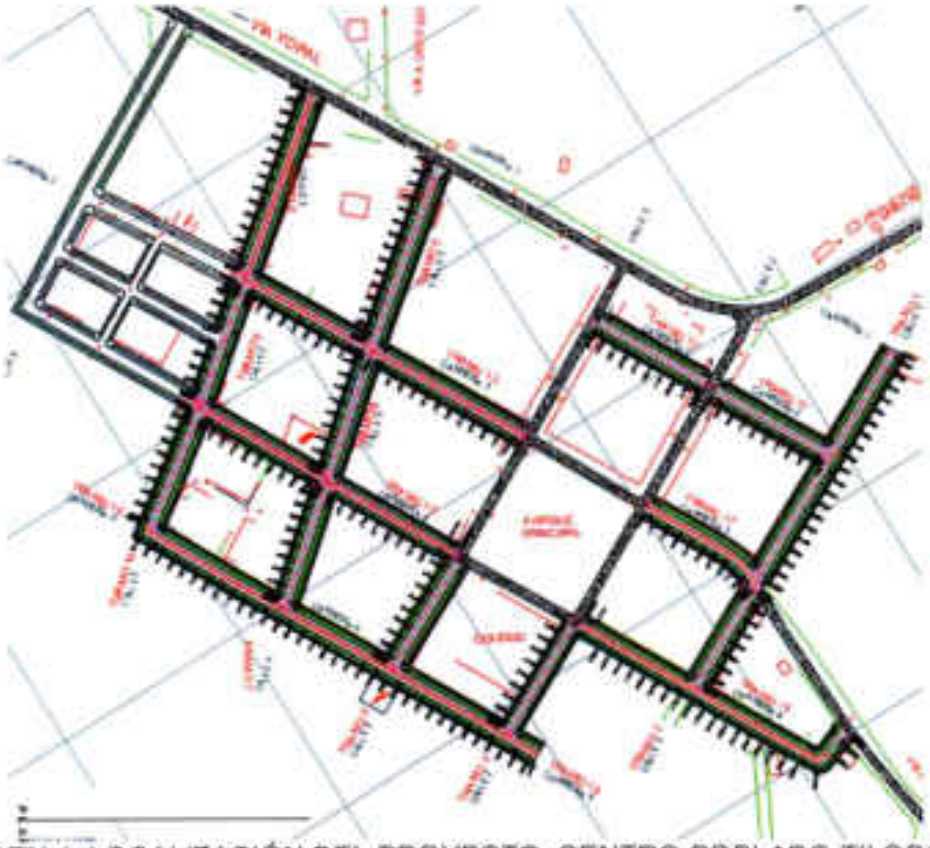


IMAGEN 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, CENTRO POBLADO TILODIRÁN.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objeto la construcción del alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, redes eléctricas y obras complementarias en el Centro Poblado de Tilodirán departamento de Casanare, en el cual se ejecutarán las actividades de instalación de tubería de policloruro de vinilo (PVC) alcantarillado desde 12" hasta 60" como colectores pluviales. Además de obras complementarias como construcción de pozos y cajas de inspección, sumideros laterales y transversales, mejoramiento de la subrasante, instalación de subbase granular, pavimento en concreto rigido de 4000 PSI, redes de acueducto, entre otras.

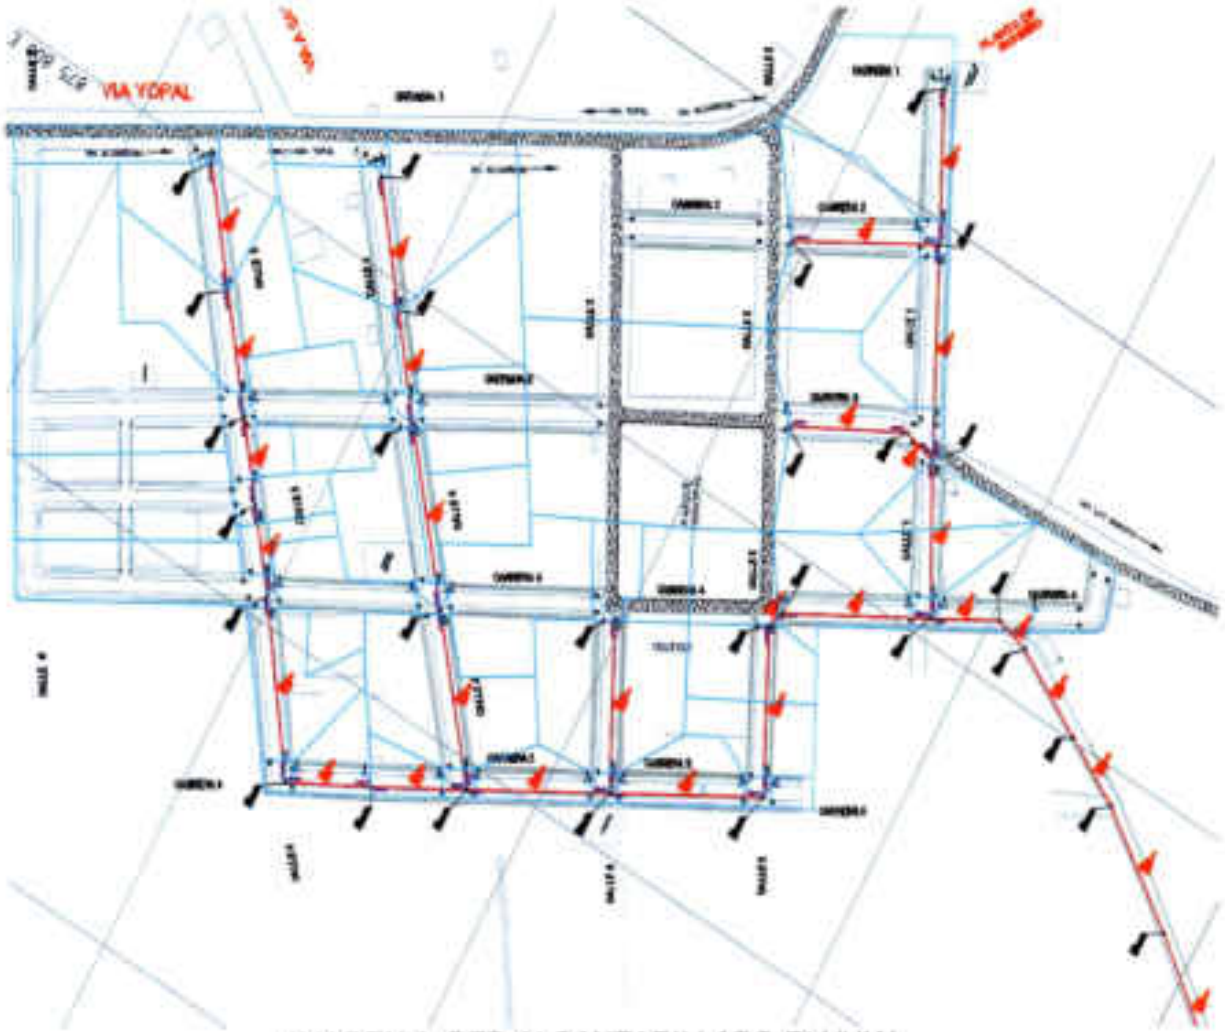


IMAGEN 2. RED ALCANTARILLADO PLUVIAL.



IMAGEN 3. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.



IMAGEN 4. PAVIMENTO RÍGIDO.


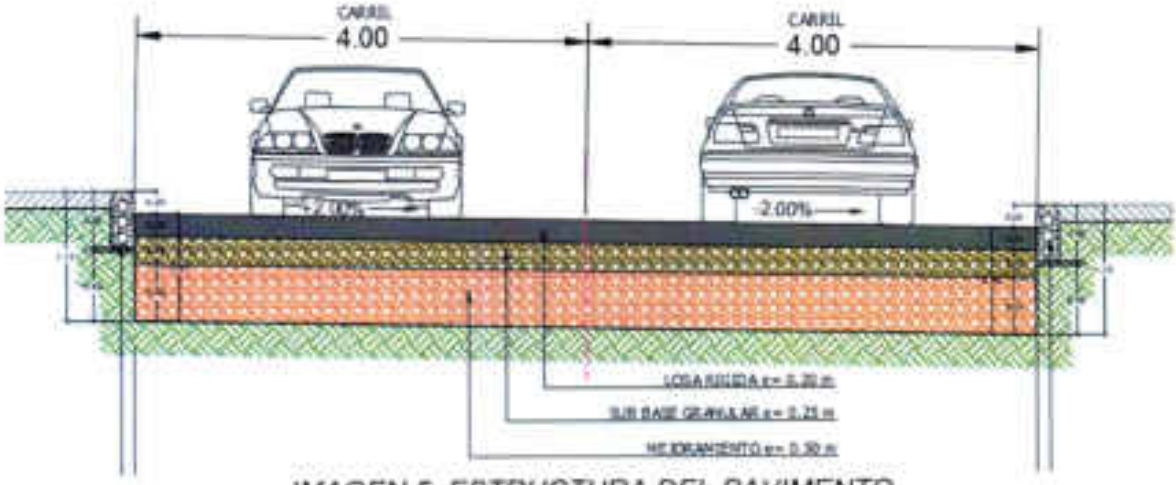


IMAGEN 5. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

Durante este periodo, las actividades que se ejecutarán se llevarán a cabo de acuerdo a las especificaciones técnicas y recomendaciones hechas por la interventoría, además se evidenció la implementación de las fichas ambientales descritas en el plan de manejo ambiental.

Para la ejecución del proyecto se trabajará en las actividades relacionadas con la instalación de la tubería desde Ø12" hasta Ø60" de la red de alcantarillado pluvial y las actividades para la construcción de pozos de inspección, sumideros laterales y transversales que conectan el colector de la red de alcantarillado pluvial, donde existen excavaciones profundas. Se tiene en cuenta los diferentes tipos de suelos encontrados y el estado del tiempo para el avance de las excavaciones y de esta forma dar aviso y recomendaciones a la comunidad, para evitar accidentes en las áreas intervenidas para la ejecución del proyecto. De igual manera, se realizan actividades de conformación de las vías (excavación mecánica, reparación de acometidas domiciliarias de gas, acueducto, sanitarias, conformación de la subrasante, instalación de crudo de rio, subbase granular, instalación sardinel, céreo y losa de pavimento en concreto rígido de 4000 PSI para las vías; se desarrollan las actividades de construcción de sumideros laterales y trasversales, además de sello de juntas de dilatación.

3. ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA DE OBRA

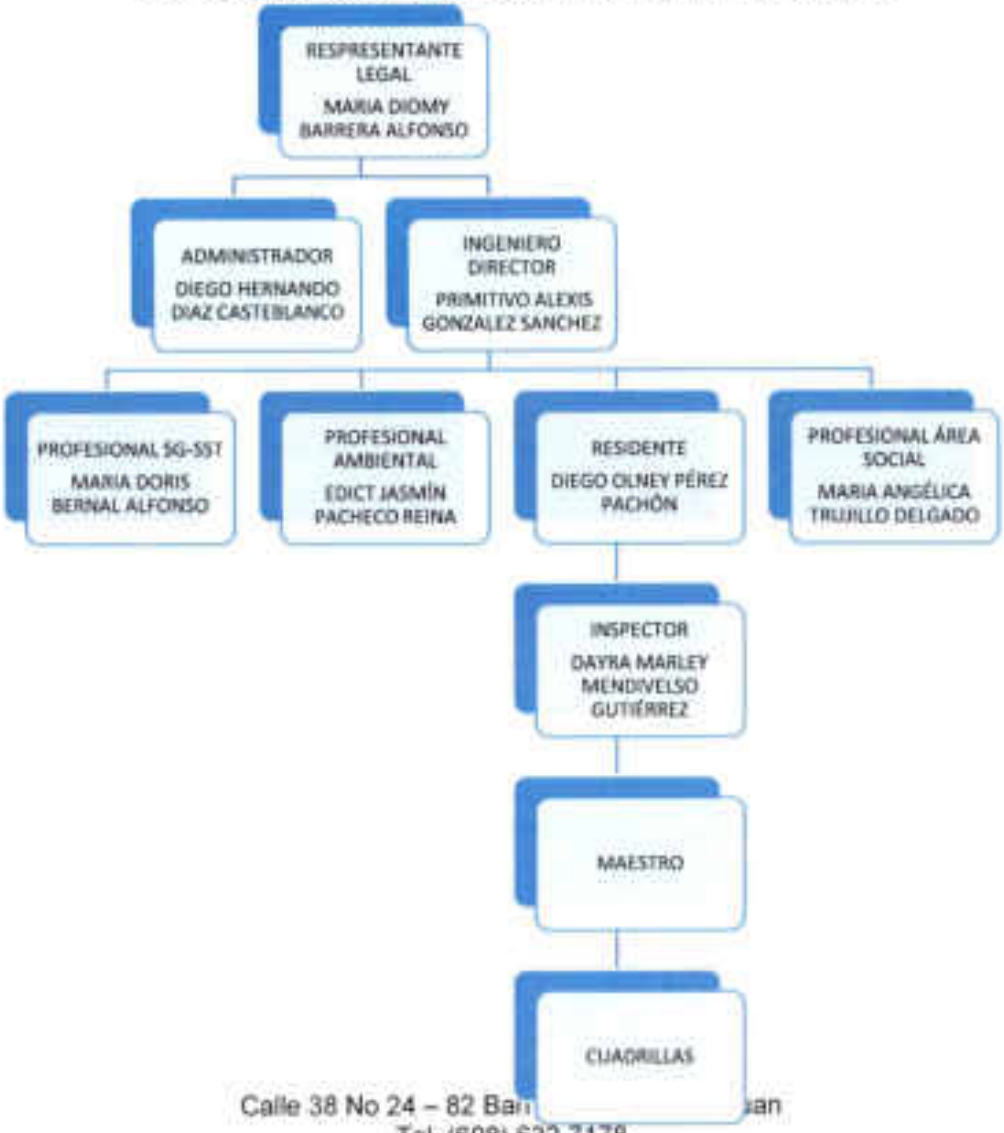

4. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FECHA	VALOR
CDP: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3623	07/07/2023	$ 38.919.603.368,00

TABLA 1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

4.2 VALOR DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 25.686.938.223,00**
27% ADMINISTRACIÓN	$ 10.508.292.909,00
2% IMPREVISTOS	$ 778.392.067,00
5% UTILIDADES	$ 1.945.980.168,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 13.232.665.145,00**
PRESUPUESTO OBRA FÍSICA	$ 38.702.693.199,00
Programa de Adaptación de la Guia Ambiental PAGA	$ 63.633.447,00
Plan de Manejo de Tráfico PMT	$ 153.276.722,00
TOTAL, PRESUPUESTO	**$ 38.919.603.368,00**

TABLA 2. VALOR DEL PROYECTO.

4.3 ANÁLISIS DE A.I.U

ANALISIS DEL A.I.U					
DESCRIPCION				% PARCIAL	% SUBTOTAL
1	ADMINISTRACION				
	A.	ADMINISTRACIÓN. CENTRAL		1,33%	
		1	Sueldos y prestaciones de la dirección (profesionales, administrativos y técnicos)	1,21%	
		2	Gastos de Oficina (arriendos, dotación, papeleria, copias, servicios públicos, comunicaciones)	0,02%	
		3	Transporte	0,10%	
	B.	ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA		4,38%	
		1	Sueldos y prestaciones del personal vinculado directamente a la obra. (Residente, administración, técnico, inspectores, oficinistas, conductores, contador, almacenista, conserje, otros.)	2,86%	
		2	Instalaciones para empleados y obreros (Oficinas, laboratorios, talleres, servicios médicos, comedores, dormitorios, otros.)	0,10%	
		3	Gastos de Oficina y Campamentos (Valla, dotaciones, servicios públicos, comunicaciones, papeleria, copias, otros)	0,01%	

		4	Equipo completo de Topografia (Incluye tránsito, nivel, y elementos complementarios) y Comisión de Topografia (Topógrafo y 2 Cadeneros)	1,11%	
		5	Equipo de laboratorios (Incluye laboratorista - Inspector	0,15%	
		6	Transporte	0,15%	
	C.		GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS	21,29%	
			TOTAL ADMINISTRACION (A)		27,00%
2	IMPREVISTOS				
			TOTAL IMPREVISTOS (I)		2,00%
3	UTILIDAD				
			TOTAL UTILIDAD (U)		5,00%
			TOTAL A.I.U.		34,00%

TABLA 3. ANÁLISIS DE A.I.U.

4.4 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

A continuación, se observa el valor a girar de acuerdo al plan de inversión del anticipo para la ejecución del contrato N° 032 DE 2023, modificado por medio de la reprogramación del día 20 de junio del año 2024.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
1	Pago de salarios	$ 945.980.168,40	4,86%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 8.070.157.242,20	41,47%
3	Transporte de materiales	$ 5.664.950.421,00	29,11%
4	Maquinaria y equipos	$ 1.945.980.168,60	10,00%
5	Contratos de mano de obra	$ 1.859.743.599,80	9,56%
6	Contribución seguridad 5% democrática	$ 972.990.084,00	5,00%
		$ 19.459.801.684,00	**100%**

TABLA 4. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

4.5 AVANCE DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

A continuación, se presenta el cuadro que refleja en resumen la inversión del anticipo desde el informe N°1 hasta la fecha del presente informe, según la reprogramación del día 20 de junio del año 2024.

FLUJO DE CAJA GENERADO HASTA EL PERIODO ACTUAL											
N°	DESCRIPCIÓN	VALOR DEL ANTICIPO	PERIODO N°01 (OCTUBRE 2023)	PERIODO N°02 (NOVIEMBRE 2023)	PERIODO N°03 (DICIEMBRE 2023)	PERIODO N°04 (ENERO 2024)	PERIODO N°05 (FEBRERO 2024)	PERIODO N°06 (MARZO 2024)	PERIODO N°07 (ABRIL 2024)	PERIODO N°08 (MAYO 2024)	PERIODO N°09 (JUNIO 2024)
1	Pago de salarios	$ 945.980.168,40	$ 0	$ 2.228.500,00	$ 96.646.512,00	$ 123.890.476,00	$ 67.177.935,00	$ 0	$ 98.460.895	$ 220.162.890	$ 129.464.405
2	Compra de materiales y accesorios	$ 8.070.157.242,20	$ 3.055.163.406,00	$ 6.152.513,00	$ 802.992.006,00	$ 0	$ 1.525.901.809,00	$ 0	$ 1.447.730.969	$ 651.768.192,76	$186.838.448,00
3	Transporte de materiales	$ 5.664.950.421,00	$ 2.220.841.350,00	$ 569.732.933,00	$ 525.868.338,00	$ 0	$ 833.866.425,00	$ 0	$ 16.831.000	$ 138.975.684	$165.771.100,00
4	Maquinaria y equipos	$ 1.945.980.168,60	$ 930.508.800,00	$ 232.500.000,00	$ 0	$ 0	$ 11.904.420,00	$ 0	$ 771.086.948,00	$ 0	
5	Contratos de mano de obra	$ 1.859.743.599,80	$ 0	$ 929.871.800,00	$ 0	$ 0	$ 4.500.000,00	$ 0	$ 24.700.316	$ 444.796.949	$ 108.741.096
6	Contribución seguridad 5% democrática	$ 972.990.084,00	$0	$0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total, anticipo		$ 19.459.801.684,00	$ 6.206.513.556,00	$ 1.740.485.746,00	$ 1.425.504.858,00	$ 123.890.476,00	$ 2.443.358.389,00	$ 0	$ 2.358.790.128,00	$ 1.455.703.715,76	$ 590.815.049,00

TABLA 5. FLUJO DE CAJA DEL CONTRATO DE OBRA HASTA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

A continuación, se presenta el gráfico correspondiente al flujo de caja acumulado del periodo actual:

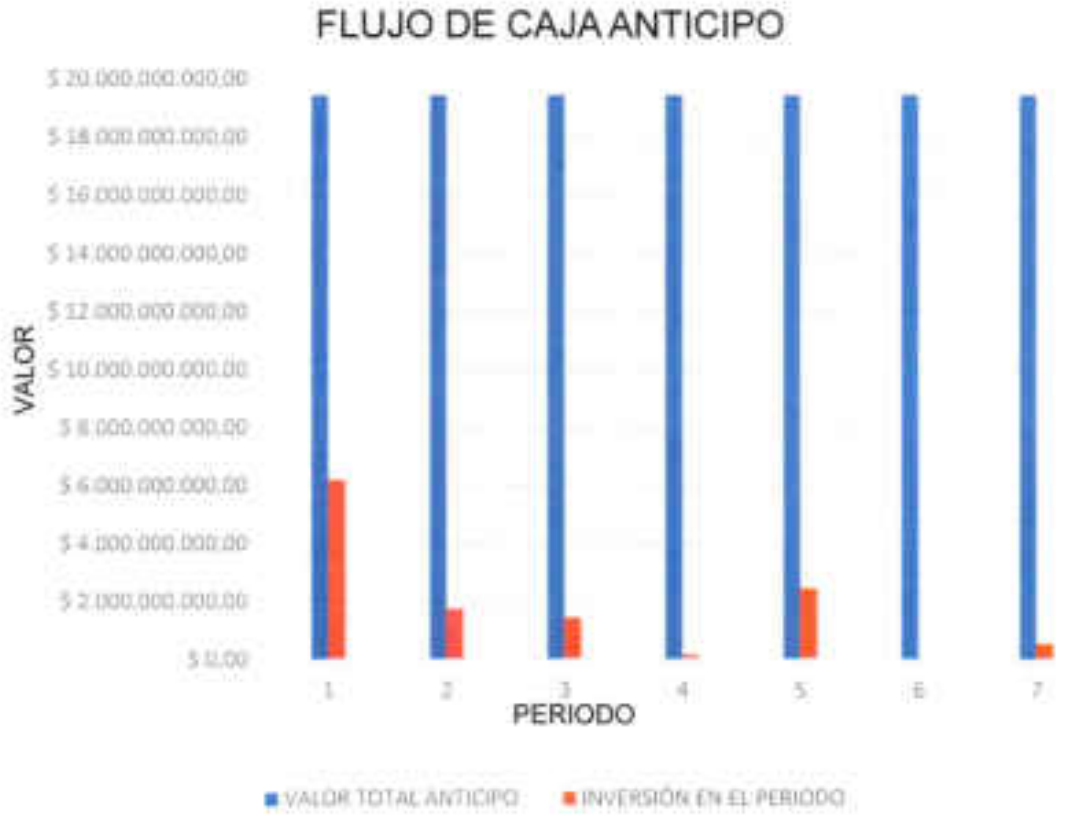


GRÁFICO 1. FLUJO DE CAJA ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA.

En el presente periodo fueron aprobadas las órdenes de operación de anticipo N°22, N°23, N°24, N°25, N°27, N°29, N°30 y N°31.

4.5.1 ORDEN DE OPERACIÓN N°22

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°22 – COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**TOTAL**
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD 36	2/04/2024	$ 1.447.730.969,00

TOTAL	**$ 1.447.730.969,00**

TABLA 6. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS.

A continuación, se observa el resumen de los movimientos generados en la orden de operación del anticipo N°22.

RESUMEN MOVIMIENTOS EN LA ORDEN N°22	
DESCRIPCIÓN	**SALIDAS**
Pago de salarios	$ 0
Compra de materiales y accesorios	$ 1.447.730.969,00
Transporte de materiales	$ 0
Maquinaria y equipos	$ 0
Contratos de mano de obra	$ 0
	$ 1.447.730.969,00

TABLA 7. RESUMEN MOVIMIENTOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO RESPECTO A LA ORDEN DE OPERACIÓN N°22.

4.5.2 ORDEN DE OPERACIÓN N°23

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°23 – ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**TOTAL**
MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 360	2/04/2024	$ 251.126.948,00
TOTAL				**$ 251.126.948,00**

TABLA 8. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO MAQUINARIA Y EQUIPOS.

A continuación, se observa el resumen de los movimientos generados en la orden de operación del anticipo N°23.

RESUMEN MOVIMIENTOS EN LA ORDEN N°23	
DESCRIPCIÓN	**SALIDAS**
Pago de salarios	$ 0
Compra de materiales y accesorios	$ 0
Transporte de materiales	$ 0
Maquinaria y equipos	$ 251.126.948,00

Contratos de mano de obra	$ 0
	$ 251.126.948,00

TABLA 9. RESUMEN MOVIMIENTOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO RESPECTO A LA ORDEN DE OPERACIÓN N°23.

4.5.3 ORDEN DE OPERACIÓN N°24

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°24 – PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**TOTAL**
PAGO DE SALARIOS	NÓMINA MES FEBRERO 2024	NOM FEB 2024	29/02/2024	$ 63.291.495,00
PAGO DE SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2024	9464082040	29/02/2024	$ 35.169.400,00
TOTAL				**$ 98.460.895,00**

TABLA 10. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO PAGO DE SALARIOS

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°24 – TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
TRANSPORTE DE MATERIALES	LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA	FERR 3502	26/03/2024	$ 10.000.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	JAIME ALEXANDER MARIÑO CHAPARRO	CCOBRO JAIME	31/03/2024	$ 6.831.000,00
TOTAL				**$ 16.831.000,00**

TABLA 11. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO TRANSPORTE DE MATERIALES

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°24 – CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	PÉTREOS Y OBRAS KAFOR S.A.S	FEPK 151	4/04/2024	$ 24.700.316,00
TOTAL				**$ 24.700.316,00**

TABLA 12. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO CONTRATOS DE MANO DE OBRA

A continuación, se observa el resumen de los movimientos generados en la orden de operación del anticipo N°24.

RESUMEN MOVIMIENTOS EN LA ORDEN N°24	
DESCRIPCIÓN	**SALIDAS**
Pago de salarios	$ 98.460.895,00
Compra de materiales y accesorios	$ 0
Transporte de materiales	$ 16.831.000,00
Maquinaria y equipos	$ 0
Contratos de mano de obra	$ 24.700.316,00
	$ 139.992.211,00

TABLA 13. RESUMEN MOVIMIENTOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO RESPECTO A LA ORDEN DE OPERACIÓN N°24.

4.5.4 ORDEN DE OPERACIÓN N°25

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°25 – PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**TOTAL**
PAGO DE SALARIOS	NÓMINA MES MARZO 2024	NOM MAR 2024	30/03/2024	$ 68.296.933,00
PAGO DE SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2024	9465478986	15/04/2024	$ 34.241.100,00
PAGO DE SALARIOS	NÓMINA MES ABRIL 2024	NOM ABR 2024	29/02/2024	$ 78.039.857,00
TOTAL				**$ 220.162.890,00**

TABLA 14. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO *PAGO DE SALARIOS*

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°25 – TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES LOGÍSTICOS & SERVICIOS HERNANDES S.A.S	FEH 450	2/04/2024	$ 5.045.040,00

TRANSPORTE DE MATERIALES	CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ	FE 15	3/04/2024	$ 20.740.500,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES VALUARTE ANDINA S.A.S	FEVA 1008	4/04/2024	$ 5.742.464,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	H&S GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 348	4/04/2024	$ 36.608.208,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MATERIALES Y CARGAS S.A.S	FE 411	5/04/2024	$ 3.589.040,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	SATT CARGA S.A.S	FE 254	8/04/2024	$ 3.589.040,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSUNICARGA S.A.S	FEV 27	8/04/2024	$ 4.665.752,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSCARGA EXPRESS S.A.S	TREX 212	9/04/2024	$ 2.512.328,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES COTRANSERVIS S.A.S	CTSA 2042	9/04/2024	$ 2.153.424,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	INTERVOLCARGAS GR S.A.S	JGMR 731	9/04/2024	$ 2.153.424,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	VANETRANS S.A.S	PY 1447	9/04/2024	$ 3.589.040,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO S.A.S	FEV 1962	16/04/2024	$ 30.000.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSMIGUEL S.A.S	FE 3739	15/04/2024	$ 2.153.424,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ	FE 16	16/04/2024	$ 16.434.000,00
TOTAL				**$ 138.975.684,00**

TABLA 15. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO TRANSPORTE DE MATERIALES

A continuación, se observa el resumen de los movimientos generados en la orden de operación del anticipo N°25.

RESUMEN MOVIMIENTOS EN LA ORDEN N°25	
DESCRIPCIÓN	**SALIDAS**
Pago de salarios	$ 220.162.890,00
Compra de materiales y accesorios	$ 0
Transporte de materiales	$ 138.975.684,00
Maquinaria y equipos	$ 0
Contratos de mano de obra	$ 0
	$ 359.138.574,00

TABLA 16. RESUMEN MOVIMIENTOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO RESPECTO A LA ORDEN DE OPERACIÓN N°25.

4.5.5 ORDEN DE OPERACIÓN N°27

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°27 – COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**TOTAL**
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD39	22/05/2024	$ 651.768.192,76
TOTAL				**$ 651.768.192,76**

TABLA 17. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS

A continuación, se observa el resumen de los movimientos generados en la orden de operación del anticipo N°27.

RESUMEN MOVIMIENTOS EN LA ORDEN N°27	
DESCRIPCIÓN	**SALIDAS**
Pago de salarios	$ 0
Compra de materiales y accesorios	$ 651.768.192,76
Transporte de materiales	$ 0
Maquinaria y equipos	$ 0

Contratos de mano de obra	$ 0
	$ 651.768.192,76

TABLA 18. RESUMEN MOVIMIENTOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO RESPECTO A LA ORDEN DE OPERACIÓN N°27.

4.5.6 ORDEN DE OPERACIÓN N°29

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°29 – CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**TOTAL**
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD SAS	FE3	27/05/2024	$ 444.796.949,00
TOTAL				**$ 444.796.949,00**

TABLA 19. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO CONTRATOS DE MANO DE OBRA

A continuación, se observa el resumen de los movimientos generados en la orden de operación del anticipo N°29.

RESUMEN MOVIMIENTOS EN LA ORDEN N°29	
DESCRIPCIÓN	**SALIDAS**
Pago de salarios	$ 0
Compra de materiales y accesorios	$ 0
Transporte de materiales	$ 0
Maquinaria y equipos	$ 0
Contratos de mano de obra	$ 444.796.949,00
	$ 444.796.949,00

TABLA 20. RESUMEN MOVIMIENTOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO RESPECTO A LA ORDEN DE OPERACIÓN N°29.

4.5.7 ORDEN DE OPERACIÓN N°30

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°30 – CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**TOTAL**

CONTRATOS DE MANO DE OBRA	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S	FEP1182	28/05/2024	$ 72.725.521,00
TOTAL				**$ 72.725.521,00**

TABLA 21. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO CONTRATOS DE MANO DE OBRA

A continuación, se observa el resumen de los movimientos generados en la orden de operación del anticipo N°30.

RESUMEN MOVIMIENTOS EN LA ORDEN N°30	
DESCRIPCIÓN	**SALIDAS**
Pago de salarios	$ 0
Compra de materiales y accesorios	$ 0
Transporte de materiales	$ 0
Maquinaria y equipos	$ 0
Contratos de mano de obra	$ 72.725.521,00
	$ 72.725.521,00

TABLA 22. RESUMEN MOVIMIENTOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO RESPECTO A LA ORDEN DE OPERACIÓN N°30.

4.5.8 ORDEN DE OPERACIÓN N°31

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°31 – PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**TOTAL**
PAGO DE SALARIOS	NÓMINA MES MAYO 2024	NOM MAY 2024	30/05/2024	$ 84.886.205,00
PAGO DE SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2024	9468574159	13/06/2024	$ 44.578.200,00
TOTAL				**$ 129.464.405,00**

TABLA 23. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO PAGO DE SALARIOS

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°31 – COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FERRONIPLES DEL ORIENTE S.A.S	FNO 4934	6/05/2024	$ 18.363.149,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S	Y - 4345	10/05/2024	$ 165.041.600,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	WILLIAN BARRERA GUTIERREZ	DSE 134	20/05/2024	$ 1.043.700,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	MADERAS MADERA'RQ	176	24/08/2024	$ 660.000,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 29470	25/05/2024	$ 1.079.999,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TIRSO GERMAN PEREZ	TGPC - 986	28/05/2024	$ 650.000,00
TOTAL				**$ 186.838.448,00**

TABLA 24. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°31 – TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
TRANSPORTE DE MATERIALES	LUIS FERNANDO MORENO	3597	26/04/2024	$ 9.959.896,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	JAIME ALEXANDER MARIÑO	CCOBR JAIME	30/04/2024	$ 7.573.500,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	CLAUDIA PATRICIA CRUZ	FV 18	3/05/2024	$ 14.949.000,00

TRANSPORTE DE MATERIALES	RAFAEL DEL LLANO S.A.S	FV 2009	8/05/2024	$ 12.818.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S	Y - 43548	10/05/2024	$ 30.238.560,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 379	11/06/2024	$ 3.589.040,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 380	11/06/2024	$ 57.065.736,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 378	11/06/2024	$ 6.101.368,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	CLAUDIA PATRICIA CRUZ	FE 19	16/05/2024	$ 15.642.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	DEYSI LORENA AVILA MESA	DSE 146	24/05/2024	$ 1.300.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	ALEXANDER MARIÑO	CCOBR ALEX	30/05/2024	$ 6.534.000,00
TOTAL				**$ 165.771.100,00**

TABLA 25. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO TRANSPORTE DE MATERIALES

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°31 – CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**TOTAL**
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	INVERSORA FURATENA	FE 5546	12/04/2024	$ 30.819.999,99
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	INVERSORA FURATENA	FE 5582	17/04/2024	$ 5.195.575,01
TOTAL				**$ 36.015.575,00**

TABLA 26. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO CONTRATOS DE MANO DE OBRA

A continuación, se observa el resumen de los movimientos generados en la orden de operación del anticipo N°31.

RESUMEN MOVIMIENTOS EN LA ORDEN N°31	
DESCRIPCIÓN	**SALIDAS**
Pago de salarios	$ 129.464.405,00
Compra de materiales y accesorios	$ 186.838.448,00
Transporte de materiales	$ 165.771.100,00
Maquinaria y equipos	$ 0
Contratos de mano de obra	$ 36.015.575,00
	$ 518.089.528,00

TABLA 27. RESUMEN MOVIMIENTOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO RESPECTO A LA ORDEN DE OPERACIÓN N°31.

En el anexo **4.8.2 ÓRDENES DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO** se puede observar los documentos soportes de la inversión según la orden de operación aprobada.

En la siguiente gráfica se puede evidenciar el análisis respectivo de la inversión del anticipo desde el inicio del contrato hasta la fecha del presente informe.



GRÁFICO 2. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

4.6 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL ANTICIPO

ESTADO FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	**DEBITO**	**HABER**	**SALDO**
ANTICIPO	$ 19.459.801.684,00		
DESCUENTOS IMPUESTOS		$ 972.990.084,00	
GASTO MES 01 (OCTUBRE)		$ 6.206.513.556,00	
GASTO MES 02 (NOVIEMBRE)		$ 1.740.485.746,00	
GASTO MES 03 (DICIEMBRE)		$ 1.425.504.858,00	
GASTO MES 04 (ENERO)		$ 123.890.476,00	
GASTO MES 05 (FEBRERO)		$ 2.443.350.389,00	
GASTO MES 06 (MARZO)		$ 0,00	
GASTO MES 07 (ABRIL)		$ 2.358.790.128,00	
GASTO MES 08 (MAYO)		$ 1.455.703.715,76	
GASTO MES 09 (JUNIO)		$ 590.815.049,00	
SALDO ANTICIPO		**$16.345.053.917,76**	**$ 2.141.757.682,24**

TABLA 30. ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL ANTICIPO.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	**VALOR GENERADO**
PERIODO N°01 (OCTUBRE)	$ 7.063.395,29
PERIODO N°02 (NOVIEMBRE)	$ 7.086.846,14
PERIODO N°03 (DICIEMBRE)	$ 6.368.603,96
PERIODO N°04 (ENERO)	$ 5.779.521,57

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	**VALOR GENERADO**
PERIODO N°05 (FEBRERO)	$ 4.421.884,41
PERIODO N°06 (MARZO)	$ 2.775.521,75
PERIODO N°07 (ABRIL)	$ 1.771.357,18
PERIODO N°08 (MAYO)	$ 1.517.751,00
PERIODO N°09 (JUNIO)	$ 883.914,67
SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**$ 37.668.795,97**

TABLA 31. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS HASTA EL PERIODO ACTUAL.

4.7 CUADRO DEL AVANCE DE OBRA

Esta información es de acuerdo al porcentaje ejecutado con respecto al porcentaje programado. Donde el ejecutado está por debajo (46,61%), con respecto a este informe y de acuerdo a la programación actual:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**PORCENTAJE RESPECTO DEL VALOR DEL CONTRATO**
PROGRAMADO	$ 36.276.290.225,54	93,21%
EJECUTADO	$ 18.138.190.917,98	46,60%
DIFERENCIA	$ 18.138.099.307,56	46,61 %
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	265	

TABLA 32. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

4.8 ANEXOS

4.8.1 CERTIFICACIÓN BANCARIA

4.8.2 EXTRACTO BANCARIO

4.8.3 ÓRDENES DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO

5. AVANCE DEL PROYECTO

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el presente periodo comprendido entre el día 01 de Junio del 2024 y el 30 de Junio del 2024, se llevaron a cabo la ejecución de las siguientes actividades contractuales:

CAPÍTULO 2. REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBCAPÍTULO 2.1. COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO

ÍTEM 2.1.1. Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado.

DESCRIPCIÓN
Consiste en la localización, nivelación, control y medición de las obras por ejecutar, realizadas por medio de una comisión de topografía, siguiendo las referencias del proyecto y con la previa aprobación del interventor, de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a las edificaciones existentes y a los accidentes topográficos. Se entiende por comisión de topografía aquel grupo humano que, con el apoyo del equipo topográfico convencional de precisión, esté en capacidad técnica de realizar las labores de que trata esta especificación.

MATERIALES Y EQUIPOS
- ✓ Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar.
- ✓ Vara de clavo 3M-1.
- ✓ Estación total.

MEDIDA
La medida de los trabajos ejecutados bajo el alcance atrás anotado se hará por metro (m). El replanteo, control y medición de la obra se pagará al contratista, al precio consignado en el formulario de precios para el ítem correspondiente. Dicho precio deberá incluir la mano de obra, los materiales, los equipos, y los costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecución de las actividades, durante todo el plazo del Contrato.

OBSERVACIONES
Esta actividad se realizó en los siguientes tramos:

- ✓ Tramo – 52N.
- ✓ Tramo – 26N.



REGISTRO FOTOGRÁFICO: *REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO*

ÍTEM 2.1.2. Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida).

DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en realizar excavaciones mecánicas en material común en sectores donde se encuentran profundidades de excavación entre 0 a 6 metros y con presencia de nivel freático alto que dificulta el desarrollo de la excavación mecánica común, adicionalmente se hace necesario la extracción de agua con motobombas.

EQUIPOS Y MATERIALES

- ✓ Retroexcavadora de orugas.
- ✓ Herramienta menor.

MEDIDA

Por metro cubico (m3).

OBSERVACIONES

Esta actividad se realizó en los siguientes tramos:

- ✓ Tramo – 52N.
- ✓ Tramo – 26N.



REGISTRO FOTOGRÁFICO: *EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 0 - 6 M (ÁREA RESTRINGIDA).*

ÍTEM 2.1.3. Excavación a mano en material común.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en realizar la excavación, remoción y corte del material, hasta el nivel requerido y realizará replanteo manual en donde se ubicará la red de alcantarillado sanitario; actividad que esta ceñida a las secciones, niveles y paramentos estipulado en los documentos contractuales; este material es cargado y transportado hasta su disposición final.

MATERIALES Y EQUIPOS

- ✓ Herramienta menor.

MEDIDA

Los trabajos se medirán en metros cúbicos (m^3) ejecutados y aceptados.

OBSERVACIONES

Esta actividad se realizó en los siguientes tramos:

- ✓ Tramo – 52N.
- ✓ Tramo – 26N.




REGISTRO FOTOGRÁFICO: *EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN.*

ÍTEM 2.1.4. Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturada (tamaño máximo 1 1/2").

DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al material base granular con el cual se instala un atraque de la tubería a mitad de la misma con lonas rellenas con el mismo material en las puntas y en el centro del tubo para evitar que se corra, este relleno se riega y compacta con un vibro compactador tipo canguro, para lograr la compactación exigida, esta compactación se realiza en una o varias capas sobre una superficie de relleno parte superior de acuerdo a las especificaciones y aceptada por el Interventor.

MATERIALES Y EQUIPOS

- ✓ Base triturada Tmax 1 1/2.
- ✓ Herramienta menor.

MEDIDA

El atraque y relleno parte superior de tubería con base apisonada, se medirá por m^3 instalado, recibido a entera satisfacción del INTERVENTOR.

OBSERVACIONES

Esta actividad se realizó en los siguientes tramos:

- ✓ Tramo – 52N.
- ✓ Tramo – 26N.




REGISTRO FOTOGRÁFICO: *RELLENO ZONA DE ATRAQUE DE TUBERÍA CON MATERIAL BASE GRANULAR TRITURADA (TAMAÑO MÁXIMO 1 1/2").*

ÍTEM 2.1.7. Tuberia PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.

DESCRIPCIÓN

Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado sanitario de diámetro 12", incluyendo los respectivos accesorios necesarios para la conformación y construcción de todos y cada uno de los tramos que constituyen las redes de alcantarillado sanitario, presentadas en los planos de diseño; deberán cumplir con las Normas Técnicas, para tubos y accesorios de Pared Estructural para Sistemas de Drenaje Subterráneo y Alcantarillado. Especificaciones para PVC.

MATERIALES Y EQUIPOS

- ✓ Lubricante 500 gr.
- ✓ Tubería alcantarillado PVC 12".

MEDIDA

La unidad de medida será el metro (m), con aproximación a dos decimales, de Suministro e instalación de tubería alcantarillado diámetro 12", debidamente instalada y en correcto funcionamiento, que haya sido conformada de acuerdo con los diseños y especificaciones de obra y aprobada por la Interventoría.

OBSERVACIONES

Esta actividad se realizó en los siguientes tramos:

- ✓ Tramo – 52N.
- ✓ Tramo – 26N.



REGISTRO FOTOGRÁFICO: *SUMINISTRO E INSTALALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12".*

ÍTEM 2.1.8. Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.

DESCRIPCIÓN

En zonas distintas a vías y en los sitios mostrados en los planos u ordenados por LA ENTIDAD CONTRATANTE, las zanjas de la red de alcantarillado sanitario podrán rellenarse con material proveniente de las excavaciones, siempre que éste no sea limo orgánico, sobrantes de construcción o cualquier material inconveniente.

MATERIALES Y EQUIPOS

- ✓ Herramienta menor.
- ✓ Vibrocompactador tipo rana.

MEDIDA

El valor unitario del ítem medido según el parágrafo anterior se pagará a los precios por metro cubico (m^3) especificados en el formulario de precios del Contrato, e incluirán el suministro todos los costos de mano de obra, transporte equipos y demás costos directos e indirectos que se originen para la compactación del material.

OBSERVACIONES

Esta actividad se realizó en los siguientes tramos:

- ✓ Tramo – 52N.
- ✓ Tramo – 26N.
- ✓



***REGISTRO FOTOGRÁFICO**: RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO.*

ÍTEM 2.1.9. Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms.

DESCRIPCIÓN

Este trabajo comprende el suministro de toda la mano de obra, equipo y vehículos necesarios para ejecutar la operación de retiro de material sobrante de la excavación, así como escombros existentes en el área de construcción y su disposición en el sitio aprobado a juicio del INTERVENTOR, y/o se especifique su retiro en los planos o en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios del Contrato.

MATERIALES Y EQUIPOS

- ✓ Retroexcavadora 4 x 4 (llanta).
- ✓ Volqueta ($6m^3$).

MEDIDA

El valor unitario del ítem medidos según el parágrafo anterior se pagará a los precios por metro cubico (m^3) especificados en el formulario de precios del Contrato, e incluirán el suministro todos los costos de mano de obra, transporte equipos y demás costos directos e indirectos que se originen para la construcción.

OBSERVACIONES

Esta actividad se realizó en los siguientes tramos:

- ✓ Tramo – 52N.
- ✓ Tramo – 26N.





***REGISTRO FOTOGRÁFICO**: CARGUE Y RETIRO MECÁNICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KMS.*

ÍTEM 2.1.11. Entibado tipo 3: apuntalamiento metálico tipo tablestacado.

DESCRIPCIÓN

Será responsabilidad del Contratista el diseño, fabricación e instalación del entibado metálico, para lo cual deberá efectuar estudio de suelos, que le permitan calcular las cargas sobre las láminas y en general sobre todos los elementos que hacen parte del entibado metálico.

MATERIALES Y EQUIPOS

- ✓ Tubería en A.C. Ø= 3 1/2" Dril Pipe Usd.
- ✓ Lamina HR de 5/8".
- ✓ Retroexcavadora de orugas.
- ✓ Herramienta menor.

MEDIDA

La unidad de medida para el pago de cada uno de los entibados será el metro cuadrado (m^2).

OBSERVACIONES

Esta actividad se realizó en los siguientes tramos:

- ✓ Tramo – 52N.
- ✓ Tramo – 26N.





REGISTRO FOTOGRÁFICO: *ENTIBADO TIPO 3: APUNTALAMIENTO METÁLICO TIPO TABLESTACADO.*

ÍTEM 2.1.12. Manejo, Control y Extracción de agua.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende los requisitos relacionados con el suministro de los equipos de bombeo, combustibles, materiales, mano de obra, tuberías para drenajes y todos los elementos necesarios para el manejo del agua superficial o de infiltración, el drenaje de las áreas de trabajo en todas las excavaciones y el mantenimiento de las mismas libres de agua durante la construcción, de acuerdo con las instrucciones de la entidad contratante.

MATERIALES Y EQUIPOS

- ✓ Motobomba a Diésel o Gasolina con descarga en 4" o 6".
- ✓ Herramienta menor.

MEDIDA

Los trabajos de manejo de agua en la obra se pagarán por hora (h) trabajada y aceptada por la interventoría.

OBSERVACIONES

Esta actividad se realizó en los siguientes tramos:

- ✓ Tramo – 52N.
- ✓ Tramo – 26N.




REGISTRO FOTOGRÁFICO: *MANEJO, CONTROL Y EXTRACCIÓN DE AGUA.*

3. PROYECCIONES DE OBRA PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Las actividades programadas para el siguiente periodo comprenden:

Construcción del Alcantarillado Sanitario:

Continuar con:

- La optimización del alcantarillado sanitario: tramo TS 52 ubicado en la calle 1 entre carreras 3 y 4; TS 26 ubicado en la calle 2 entre carrera 4 y 5; ambos tramos en tubería de 12".
- Las actividades de excavación manual en material común para el encamado de la red de alcantarillado sanitario tramo TS 52 y TS 26 en tubería de 12".
- El relleno en zona de atraque de la tubería con material base granular triturado (Tamaño máximo 1 ½").
- La Instalación de Tubería PVC Alcantarillado sanitario 12".
- La instalación de domiciliarias del alcantarillado sanitario en 6".

Realizar:

- Relleno en material seleccionado de la excavación compactado, de los tramos ya ejecutados.
- Cargue y retiro mecánico de material sobrante de la excavación.
- Construcción Pozo Sanitario **44N** localizado en el tramo TS-52.
- Tramo TS-17 ubicado por Carrera 5 entre Calles 5 y 4 en Tubería PVC alcantarillado 10".

4. DIFICULTADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERÍODO

A la fecha se han presentado aspectos negativos ajenos al contratista de obra como es la presencia de alta pluviosidad en el área del proyecto lo que ha ocasionado la saturación del terreno existente, afectando de forma directa el desarrollo de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto encontrándose entre estas actividades: excavaciones mecánicas y manuales, instalación de tuberías, rellenos y construcción de pozos, entre otras, siendo éstas actividades prioritarias en la ejecución del contrato. Así mismo, es importante anotar que las lluvias impiden el desarrollo normal de actividades durante el evento natural de las lluvias, pero adicional a ello, retrasan el inicio de cualquier actividad en obra hasta que se baje el nivel freático en el terreno generando así un atraso en la ejecución de las actividades.

Como estrategia de trabajo, se ha implementado de una cuadrilla que labora desde tempranas horas del día, con el fin de achicar o bombear el agua, y en el momento que se inicie la jornada normal con el resto de personal se tengan condiciones para trabajar.

Para la construcción del alcantarillado pluvial y la optimización del alcantarillado sanitario otro de los inconvenientes, adicional a las lluvias, es la existencia de suelos arenosos (sueltos); evidenciadas en las excavaciones realizadas y que presentan una elevada permeabilidad al agua y, por ende, una escasa retención de agua.

Continúan los problemas en el alcantarillado sanitario por la presencia de terreno arenoso totalmente saturado con nivel freático alto lo que obliga a hacer doble entibado y trabajar con trajes de escalafandra para protección de infecciones del personal, ya que las aguas presentan alto grado de contaminación, se avanza muy lento en los tramos intervenidos, se debe hacer permanente bombeo a veces hasta

con dos o tres motobombas. Se debe tener total coordinación con la estación de bombeo para lograr eficiencia en el retiro de las aguas de forma permanente en horas de trabajo y horas previas al inicio de la jornada.

Se llevo a cabo la implementación de las fichas técnicas ambientales descritas en el PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) y del PMT (Plan de Manejo de Transito); Así mismo, se dio cumplimiento a los procesos y procedimientos establecidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y HSEQ en cada una de las actividades de obra ejecutadas.

5.1.1 GRÁFICO DE CONTROL DE LA INVERSIÓN

PERIODO		COSTO INICIAL	INVERSIÓN	
INICIO	FIN		ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO
01-Jun-24	30-Jun-24	$ 38.919.603.368,00	$ 36.276.290.225,54	$ 18.138.190.917,98

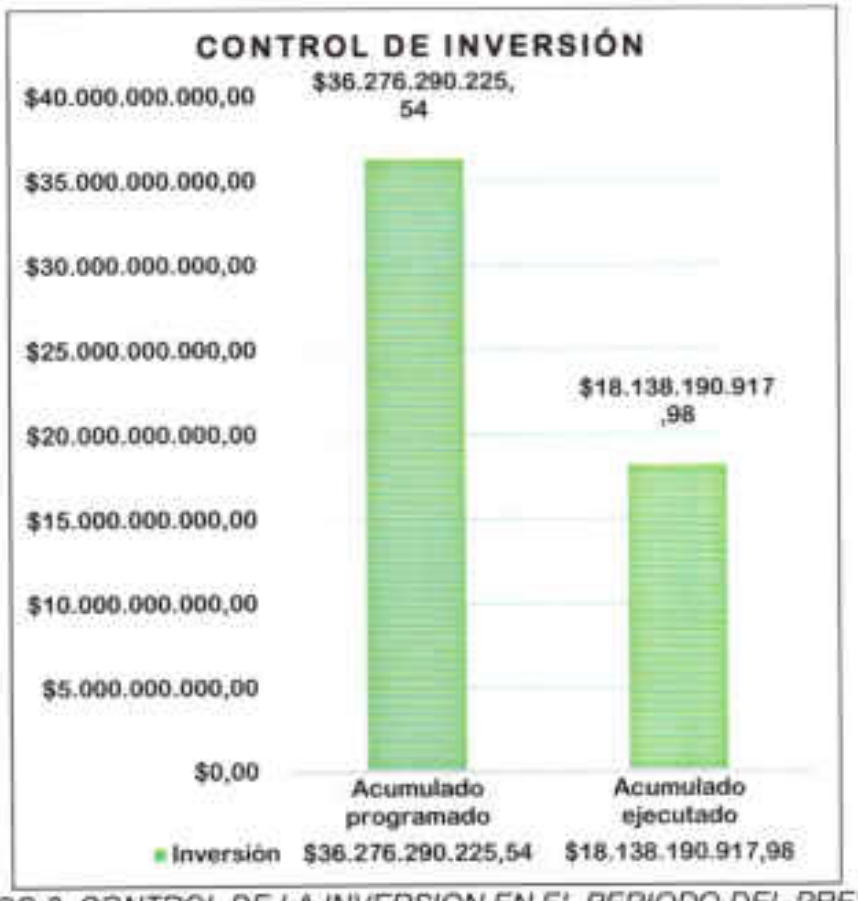


GRÁFICO 3. CONTROL DE LA INVERSION EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

5.1.2 GRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA

PERIODO		TOTAL CONTRATADO	EJECUTADO	
INICIO	FIN		ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO
01-Jun-24	30-Jun-24	100%	93,21%	46,60%

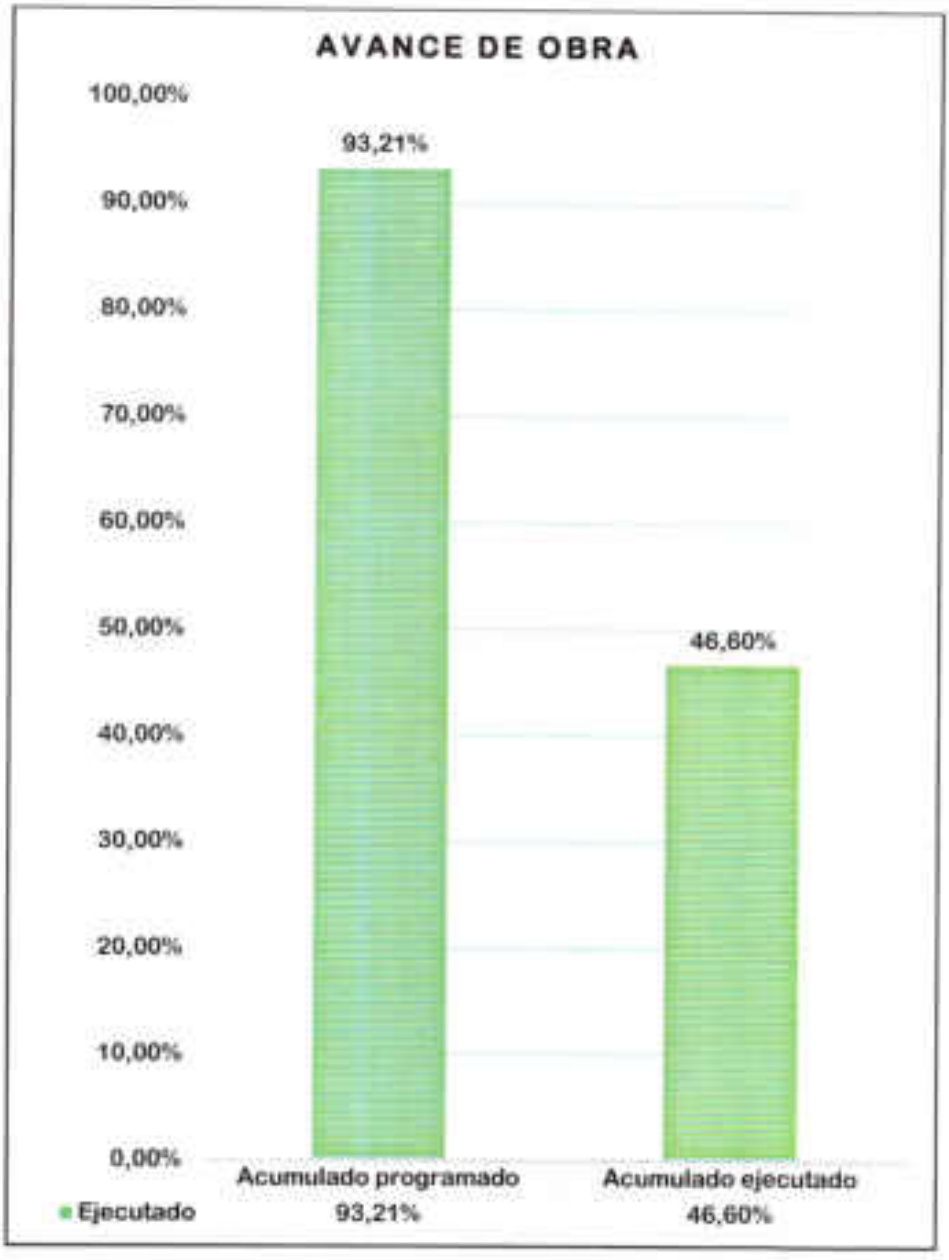


GRÁFICO 4. AVANCE DE OBRA EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

5.2 PROYECCIONES DE OBRA PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Las actividades programadas para el siguiente período comprenden:

Construcción del Alcantarillado Pluvial:

- Continuar con las actividades de Excavación mecánica en material común 0-6 m (Área restringida), en los tramos, TP – 43, TP – 44, TP – 45, TP 37, TP – 36, TP - 35.
- Iniciar las actividades de excavación manual en material común para el encamado de la red de alcantarillado pluvial, en los tramos TP – 43, TP – 44, TP – 45, TP 37, TP – 36, TP - 35.
- Continuar con el relleno en zona de atraque de la tubería con material base granular triturado (Tamaño máximo 1 ½").
- Continuar con la Instalación de Tubería PVC Alcantarillado 60".
- Realizar relleno en material seleccionado de la excavación compactado, de los tramos ya ejecutados.
- Realizar Cargue y retiro mecánico de material sobrante de la excavación.
- Continuar los trabajos en la estructura en concreto reforzado de la descarga del Alcantarillado Pluvial.

Construcción del Alcantarillado Sanitario:

- Continuar el alcantarillado sanitario en la calle 1 entre carreras 1 y 3, tramo 38 y 36 en tubería de 12".
- Continuar las actividades de excavación manual en material común para el encamado de la red de alcantarillado sanitario tramo 38 y 36.
- Continuar con el relleno en zona de atraque de la tubería con material base granular triturado (Tamaño máximo 1 ½").
- Continuar con la Instalación de Tubería PVC Alcantarillado sanitario 12".
- Continuar con la instalación de domiciliarias del alcantarillado sanitario en 6".
- Realizar relleno en material seleccionado de la excavación compactado, de los tramos ya ejecutados.
- Realizar Cargue y retiro mecánico de material sobrante de la excavación.

5.3 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

N°	NOMBRE	CARGO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN
1	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	DIRECTOR DE OBRA	1	50%
2	DIEGO OLNEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA	1	100%

3	JOSE MAURICIO GUERRERO FAGUA	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	1	20%
4	EDICT JASMIN PACHECO REINA	PROFESIONAL AMBIENTAL	1	30%
5	MARIA DORIS BERNAL ALFONSO	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	1	20%
6	MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	1	20%
7	DAYRA MARLEY MENDIVELSO GUTIERREZ	INSPECTOR DE OBRA	1	100%
8	WILSON ALEXANDER GONZALEZ RIVEROS	ESPECIALISTA ADICIONAL A COSTO Y RIESGO PROPIO	1	20%

TABLA 33. PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO.

Como se explica en el capítulo **3. ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA DE OBRA.** A la fecha del presente informe no se han presentado homologaciones de profesionales.

En el **ANEXO 5.12.2** se relacionan las **PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL Y PAGO FIC** y en el **ANEXO 5.12.3 NÓMINA DEL PERSONAL EMPLEADO DURANTE ESTE PERIODO**.

5.4 EQUIPOS UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	SE DEBE AJUSTAR	CANTIDAD
Estación total electrónica Modelo GM-55, Serie 1Y004084	13 de junio del 2024	1
Nivel de precisión Automático Modelo AT-B4A, Serie WP072634	11 de junio del 2024	1
Benitin apisonador de dos rodillos		2
Motobomba		7
Planta eléctrica		1
Canguro apisonador		3
Motosierra		1
Vibrador para concreto		1
Mezcladora de concreto		2
Cortadora de concreto		1
Regla vibratoria tipo cercha		1
VEHÍCULOS		
Camión planchón JAC		Ver anexo 9.3.2 DOCUMENTACIÓN DE
Cama baja		
Camión		

DESCRIPCIÓN	SE DEBE AJUSTAR	CANTIDAD
Volquetas dobles, con una capacidad mínima de metros cúbicos (12 m^3)	VOLQUETAS Y VEHÍCULOS	

TABLA 34. EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

En este cuadro se relacionan los equipos utilizados de acuerdo a las actividades que se realizaron durante este periodo, se adjuntan los **CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN** de los equipos de topografía. **VER ANEXO 5.12.4.**

En el **ANEXO 5.12.5** se adjuntan las **FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS** utilizados este mes. En los anexos del **CAPÍTULO 9. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO** se relacionan los documentos vigentes de los vehículos operados durante el periodo del presente informe que acrediten su buen funcionamiento, igualmente en el anexo **9.3.2** se adjunta **DOCUMENTACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS.**

5.5 MATERIALES UTILIZADOS

La ejecución de las obras correspondientes al objeto del presente contrato realizadas en este periodo, se hicieron de acuerdo a las especificaciones de diseño dadas por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A E.S.P" y siguiendo las normas en general requeridas, dependiendo del tipo de actividad realizada.

5.6 DIFICULTADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO

Continúan los problemas en el alcantarillado sanitario por la presencia de terreno arenoso totalmente saturado con nivel freático alto lo que obliga a hacer doble entibado y trabajar con trajes de escalafandra para protección de infecciones del personal, ya que las aguas presentan alto grado de contaminación, se avanzar muy lento en este tramo, se instala solo un tubo de 12" diario y a veces no alcanza su instalación, se debe hacer permanente bombeo a veces hasta con dos o tres motobombas. Se debe tener total coordinación con la estación de bombeo para lograr eficiencia en el retiro de las aguas de forma permanente en horas de trabajo y horas previas al inicio de la jornada.

Se llevo a cabo la implementación de las fichas técnicas ambientales descritas en el PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) y del PMT (Plan de Manejo de Transito); Así mismo, se dio cumplimiento a los procesos y procedimientos establecidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y HSEQ en cada una de las actividades de obra ejecutadas.

5.7 ESTADO DEL TIEMPO

Se presentaron lluvias en algunos días, por dicho evento se presentan detenciones en la ejecución de las actividades del proyecto. A continuación, se observa el estado del clima que se registró durante el periodo del presente informe:

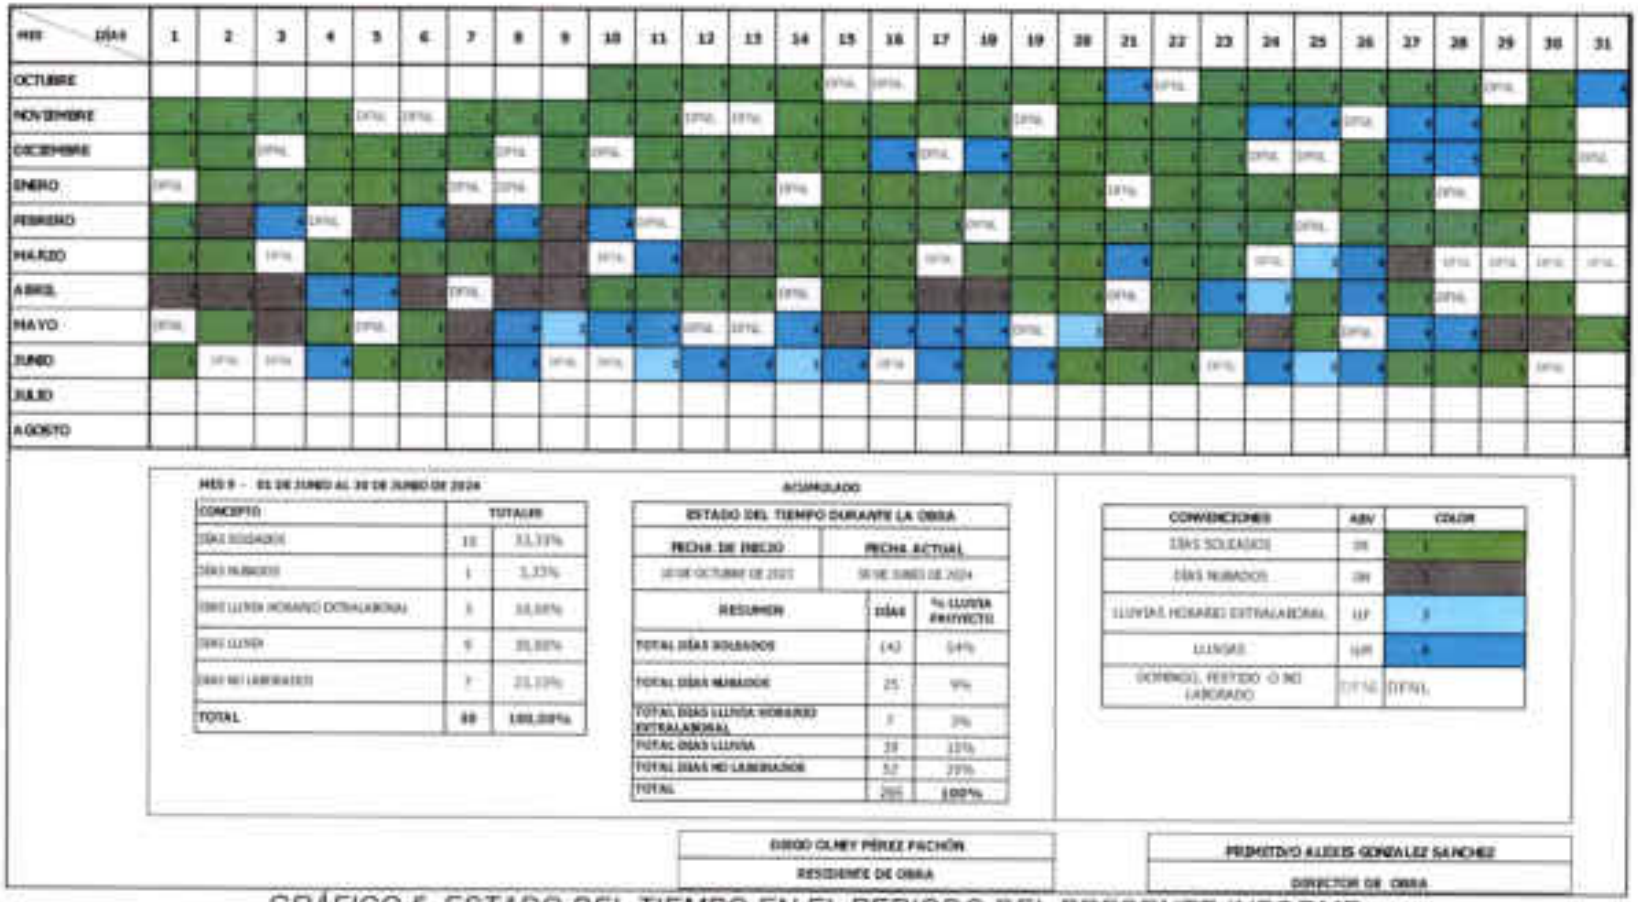


GRÁFICO 5. ESTADO DEL TIEMPO EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME.

5.8 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA

N°	FECHA	OBJETO	CONCLUSIONES
OCTUBRE 2023			
1	13-10-2023	DETERMINAR LOS LINEAMIENTOS PARA TEMAS SOCIO AMBIENTALES Y FIJAR PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA Y DEL PGS DEL PROYECTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 032 DE 2023.	OFICIAR AL MUNICIPIO DE YOPAL SOLICITANDO UNA MESA DE TRABAJO / *AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA.* ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL INFORME AMBIENTAL RESPECTIVO / *AMBIENTAL DE LA OBRA.*
2	20-10-2023	REVISAR LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y EL PROYECTO EN MARCO DEL CONTRATO N° 032 DE 2023.	LOS INTEGRANTES DE LA UT BUENAVISTA MANIFIESTAN QUE VAN A REALIZAR LOS AJUSTES Y ENTREGAR EL PLANO DEL DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN EN OCHO (08) DÍAS.
3	27-10-2023	REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	
NOVIEMBRE 2023			
4	01-11-2023	REALIZAR LA PRESENTACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO Y SALARIOS.	
5	15-11-2023	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE LA RED DE IMPULSIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA EBAR A LA PTAR, SE INICIE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DEL EMISARIO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PROYECTO.
DICIEMBRE 2023			
6	11-12-2023	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CON LA OPERACIÓN DE CEDCO.	IMÁGENES PRESENTACIÓN INTERVENTORÍA, CRONOGRAMA O FECHAS MÁS RELEVANTES DE LA

N°	FECHA	OBJETO	CONCLUSIONES
			EJECUCIÓN, COORDINAR LA MESA DE TRABAJO CON EL MUNICIPIO.
7	13-12-2023	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE OBRA AL GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA SE INICIARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, ENTRE EL POZO DE INSPECCIÓN PP-56 A LA ESTRUCTURA DE DESCARGA.
ENERO 2024			
8	10-01-2024	REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS DOS PROYECTOS.	MOVER EL POSTE DE LA CALLE 5 CON VÍA A YOPAL – UT BUENA VISTA. COLABORAR CON LAS COMISIONES DE TOPOGRAFÍA – SYNERGIA Y CONSINTER.
9	17-01-2024	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE, PARA INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE OBRA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS VA A DISPONER DE OTRO FRENTE DE OBRA Y LUEGO INCREMENTARÁ A TRES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, ENTRE EL POZO DE INSPECCIÓN PP-56 A LA ESTRUCTURA DE DESCARGA.
10	19-01-2024	REVISIÓN FINAL TRASADOS REDES DE ILUMINACIÓN CENTRO POBLADO TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL.	DE ACUERDO A LOS DIFERENTES COMITÉS REALIZADOS SE EVIDENCIA QUE SE PUEDEN ADELANTAR LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS PROGRAMADAS Y EXPUESTAS EN LOS PLANOS SUMINISTRADOS POR LA UT BUENA VISTA.
FEBRERO 2024			
11	23-02-2024	SOCIALIZAR A LA EMPRESA CEDCO EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PROPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N°03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024, PERMISO PARA CIERRES TOTALES Y PARCIALES DE VÍAS URBANAS.	

N°	FECHA	OBJETO	CONCLUSIONES
12	28-02-2024	VERIFICAR LAS POSIBLES RUTAS PARA EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	AL DEFINIR LAS OPCIONES DE DESVÍO DE LOS VEHÍCULOS PESADOS SE DEBE CONTAR CON CONTROLADORES DE TRÁNSITO DEBIDO A LOS RADIOS DE CURVA Y EL TRÁNSITO SOBRE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 3 Y VÍA AL ALGARROBO. ANTES DE INICIAR LA OPERACIÓN SE DEBEN REALIZAR LAS ACTAS E VECINDAD DE LAS VÍAS Y LAS VIVIENDAS PARA TENER LAS EVIDENCIAS DEL RECONOCIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS. SE DEBE SOCIALIZAR ANTE LA COMUNIDAD LAS OPCIONES DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADOS QUE SE DEFINA. SE DEBE REALIZAR UNA REUNIÓN CON LOS DEMÁS ACTORES VIALES QUE UTILIZAN ESTA VÍA TALES COMO EMERALD, FRONTERA, LAS PALMERAS, ARROCEROS, ENTRE OTROS.
MARZO 2024			
13	04-03-2024	INFORMAR A LA EMPRESA EMERALD EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PROPUESTO EN LA RESLUCIÓN N° 03047 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024, PERMISO PARA CIERRES TOTALES Y PARCIALES DE VÍAS URBANAS.	REALIZAR ACTAS DE VECINDAD, REALIZAR SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL CEDNTRO POBLADO.
14	20-03-2024	REVISIÓN POSTES QUE FUERON NECESARIOS DESINSTALARLOS POR EL DESARROLLO DE LA OBRA.	VOLVER A INSTALAR LOS 3 POSTES DESINSTALADOS A LA FECHA CON SU DEBIDO CIMIENTO Y GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS POSTES Y REDES INSTALADOS EN EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN.
ABRIL 2024			
15	15-04-2024	ACLARACIONES A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD.	
16	24-04-2024	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE VAN A TOMAR MEDIDAS PARA MEJORAR EL AVANCE DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS A LA FECHA NO ERAN PREVISIBLES

N°	FECHA	OBJETO	CONCLUSIONES
			DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PROYECTO
17	25-04-2024	SOCIALIZAR RESOLUCIÓN N° 03047 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y ACTUACIONES POSTERIORES.	REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS AUTORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA LAS VÍAS ALTERNAS DEL TRÁFICO PESADO. REALIZAR EL ACTA PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL PAVIMENTO ANTES DE REALIZAR EL DESVÍO DE LOS VEHÍCULOS PESADOS. INSTALAR LAS VALLAS O PASACALLES CON LA INFORMACIÓN DE LOS HORARIOS Y LOS DESVÍOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.
MAYO 2024			
18	03/05/2024	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL ACTA ANTERIOR.
19	10/05/2024	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE REALIZÓ EL CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS TANTO DE OBRA Y CON LA COMUNIDAD.
JUNIO 2024			
20	07/06/2024	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LA OBRA EN EJECUCIÓN.
21	14/06/2024	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL ACTA ANTERIOR.
22	20/06/2024	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE SOCIALIZÓ EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FRENTES DE TRABAJO.
23	28/06/2024	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL ACTA ANTERIOR Y SE SOCIALIZA EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA EN EJECUCIÓN.

TABLA 35. RELACIÓN ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA.

Se relaciona en el **ANEXO 5.12.6** las **ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA** efectuadas durante de este periodo.

5.9 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

N° OFICIO	FECHA DE RECIBIDO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
OCTUBRE 2023				
1	31/10/2023	CAMILO RAMIREZ MORALES - ACUATODOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	SOLICITUD INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA.
NOVIEMBRE 2023				
2	01/11/2023	ORLANDO CRUZ – SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	RESPUESTA A RADICADO 2023151402.
3	20/11/2023	VEEDURÍA TILODIRÁN	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	PRESENTACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA PLAN MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN – YOPAL.
DICIEMBRE 2023				
4	13/12/2023	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	SOLICITUD RELLENO INICIAL CON BASE GRANULAR TRITURADA Y RELLENO FINAL CON MATERIAL SLECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN.
5	14/12/2023	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	INICIAR LA CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
6	18/12/2023	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	RELLENOS COMPACTADOS.
7	19/12/2023	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	RECOMENDACIONES.
ENERO 2024				
8	24/01/2024	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	SOLICITUD DE MEJORA DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS COMO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA.
FEBRERO 2024				
9	16/02/2024	EDWIN BARRERA RODRIGUEZ – GERENTE ESE SALUD YOPAL	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	ACTA DE VECINDAD ESE SALUD YOPAL.
10	16/02/2024	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	SOLICITUD MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACIÓN RESOLUCIÓN N°03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024, PERMISO PARA CIERRES TOTALES Y PARCIALES DE VÍAS URBANAS.
11	22/02/2024	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	BAJO SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC).

N° OFICIO	FECHA DE RECIBIDO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
ABRIL 2024				
12	04/04/2024	JOSE D MALDONADO – EDIL CTO TILODIRÁN	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	ANÁLISIS Y CONCEPTO TÉCNICO PARA DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA.
13	22/04/2024	YOLANDA CHAPARRO DE VALDERRAMA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONEXIÓN ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.
14	25/04/2024	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	SOLICITUD CONEXIONES ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO.
15	29/04/2024	NELSON RICARDO CAMARGO PÉREZ – SECRETARIO DE MOVILIDAD	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	RESPUESTA A RADICADO 2024117782.
MAYO 2024				
16	30/05/2024	COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO (CEDCO)	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	RESPUESTA 0513-24 SOLICITUD AUTORIZACIÓN PERMISO PARA LA UTILIZACIÓN DE VÍA PRIVADA DE LA EMPRESA CEDCO.
JUNIO 2024				
17	06/06/2024	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN Y RELLENO FINAL DE LAS ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO.

TABLA 36. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

Se relaciona en el **ANEXO 5.12.7** la **CORRESPONDENCIA RECIBIDA** efectuada durante de este periodo.

5.10 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

N° OFICIO	FECHA DE ENVIO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
AGOSTO 2023				
1	31/08/2023	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	ÁNGELA JOHANA ESTUPIÑAN - ACUATODOS	APROBACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN MINUTA AL CONTRATO DE OBRA N° 032 DE 2023.
OCTUBRE 2023				
2	09/10/2023	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	OVED QUIROGA FLOREZ - ACUATODOS	ENTREGA CERTIFICACIÓN DE FIDUCIA Y CERTIFICACIÓN GIRO DE PARCIALES.

N° OFICIO	FECHA DE ENVIO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
3	10/10/2023	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SOLICITUD DESEMBOLSO DEL ANTICIPO.
4	11/10/2023	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	APROBACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO EN REFERENCIA.
5	30/10/2023	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	SOLICITUD VIABILIDAD TÉCNICA PMT.
ENERO 2024				
6	26/01/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	ADRIANA HERNANDEZ – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO – DISPOSICIÓN DE RCD.
7	26/01/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	DIEGO PARRA LEGUIZAMÓN – INTENDENTE INSPECCIÓN DE POLICIA	ACTA DE VECINDAD ESTACIÓN DE POLICIA.
8	31/01/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	NELSON RICARDO CAMARGO PÉREZ – SECRETARIO DE MOVILIDAD	RESPUESTA A OFICIO ALCALDÍA DE YOPAL 2023262170.
FEBRERO 2024				
9	12/02/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	NELSON RICARDO CAMARGO PÉREZ – SECRETARIO DE MOVILIDAD	AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN CIERRE VIAL TILODIRÁN.
10	13/02/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	EDWIN JESÚS BARRERA RODRIGUEZ – GERENTE ESE SALUD YOPAL	ACTA DE VECINDAD ESE SALUD YOPAL.
11	14/02/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	MEJORA DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS COMO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA.
12	16/02/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	MARINA VALDERRAMA – PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	ACTA DE VECINDAD CANCHA DEPORTIVA.
13	16/02/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	KEVIN JAIR GELVEZ GALVIS - RECTOR	ACTA DE VECINDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA LA INMACULADA.
14	27/02/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	DEMORAS EN ENVÍO DE TUBERÍA PVC 60".
MARZO 2024				

N° OFICIO	FECHA DE ENVIO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
15	18/03/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	UNIÓN TEMPORAL BUENA VISTA	SOLICITUD APROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE POSTERÍA.
ABRIL 2024				
16	08/04/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SOLICITUD DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA VÍA LA GLORIA.
17	11/04/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	MARINA VALDERRAMA – PRESIDENTA JAC TILODIRÁN	ACTAS DE VECINDAD, VIVIENDAS SIN ACCESO.
18	22/04/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	NELSON RICARDO CAMARGO PÉREZ – SECRETARIO DE MOVILIDAD	AJUSTE RESOLUCIÓN N° 03047 DEL 09 FEBRERO DE 2024.
19	22/04/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SOLICITUD CONEXIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO SANITARIO.
MAYO 2024				
20	07/05/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	NELSON RICARDO CAMARGO PÉREZ – SECRETARIO DE MOVILIDAD	RESPUESTA A OFICIO ALCALDÍA DE YOPAL 2024214021
JUNIO 2024				
21	05/06/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SOLICITUD REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO.
22	07/06/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	ENTREGA DEL INFORME DE OBRA N°7 DEL PERIODO 01 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.
23	17/06/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	HECTOR MIGUEL GONZÁLEZ LOZANO – CORPORINOQUIA	ENTREGA DEL PRIMER REPORTE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD PARA EL CONTRATO 032 DE 2023.
24	20/06/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENTREGA INFORME DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LOS DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD.
25	20/06/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	MARINA VALDERRAMA - PRESIDENTA JAC TILODIRÁN	ACTA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA ALTERNA TRÁFICO PESADO.
26	20/06/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	ABSALÓN LEGUIZAMON – COORDINADOR VEEDURÍA / TILODIRÁN	ACTA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA ALTERNA TRÁFICO PESADO.

N° OFICIO	FECHA DE ENVIO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
27	25/06/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SOLICITUD DE PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO EN REFERENCIA
28	28/06/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CONSINTER DEL ORIENTE E.U	SOLICITUD ACTA PARCIAL N°1 DEL PERIODO 10 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 12 DE MAYO DEL 2024.

TABLA 37. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA.

Se relaciona en el **ANEXO 5.12.8** la **CORRESPONDENCIA ENVIADA** efectuada durante de este periodo.

5.11 BITÁCORAS

Se adjunta copia de cada bitácora diligenciada en cada frente de trabajo en el **ANEXO 5.12.9 BITÁCORAS** del periodo del presente informe, debidamente firmada y donde se relaciona también el estado del clima.

5.12 ANEXOS

5.12.1 CANTIDADES EJECUTADAS.

5.12.2 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL Y PAGO FIC.

5.12.3 NÓMINA DEL PERSONAL EMPLEADO DURANTE ESTE PERIODO.

5.12.4 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN.

5.12.5 FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

5.12.6 ACTAS DE REUNION DE OBRA.

5.12.7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

5.12.8 CORRESPONDENCIA ENVIADA.

5.12.9 BITÁCORAS.

5.12.10 ACTAS DE VECINDAD

5.12.11 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

6. ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2023, cuenta con el documento ambiental denominado "**PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA**", formulado durante la etapa precontractual del proyecto.

El PAGA es una herramienta de planificación que contempla una serie de programas y proyectos o fichas de manejo ambiental, que a su vez contiene los lineamientos relacionados con el tema ambiental, social, de salud ocupacional y seguridad industrial.

De acuerdo con el documento PAGA, la estructura del "Programa de Manejo Ambiental", está contenida en siete (7) programas y dieciocho (18) proyectos o fichas que marcan las directrices para el manejo en obra de los temas ambiental, social, salud ocupacional y seguridad industrial, tal como se muestra en la siguiente tabla.

TABLA 6.18. PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRMA	FICHA	PROYECTO	CODIGO
1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	1	Conformación del grupo de gestión ambiental	DAGA-1.1-01
	2	Capacitación Concienciación para el Personal de Obra	DAGA-1.1-02
	3	Cumplimiento de requerimientos legales	DAGA-1.1-03
2. Programa Actividades Constructivas	4	Manejo integral de materiales de construcción	PAC-2.1-04
	5	Señalización frentes de obra y sitios temporales	PAC-2.1-06
	6	Manejo y disposición final de RCD	PAC-2.1-07
	7	Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales	PAC-2.1-08
3. Programa de Gestión hídrica	8	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	PGH-3.2-10
4. Programa de Biodiversidad y servicios eco-sistémicos	9	Recuperación de Áreas Afectadas	PBSE-4.2-12
	10	Manejo de protección de la fauna	PBSE-4.3-13
5. Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipos	11	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	PMIT-5.1-15
	12	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	PMIT-5.1-17
	13	Proyecto de Atención a la Comunidad	PGS-6.1-18

6. Programa de Gestión Social	14	Proyecto de Información y Divulgación	PGS-6.1-19
	15	Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Pùblicos	PGS-6.1-20
	16	Proyecto de contratación mano de obra	PGS-6.1-23
	17	Proyecto de protección al patrimonio arqueológico	PGS-6.7-25
7. Otros	18	Capacitación e Inducción de Seguridad Industrial al Personal de Obra	

FUENTE: PAGA DEL CONTRATO 032 DE 2023

El presente capitulo corresponde al reporte de las actividades implementadas en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, mientras que el tema social, es abordado en el **CAPITULO 7. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL** y el de señalización en obra y vehículos al servicio del proyecto (volquetas, carrotanques y camionetas) se reporta en el **CAPÍTULO 9. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO - PMT.**

6.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE SALUD OCUPACIONAL

6.1.1. Deben darse charlas antes, durante y después de la ejecución de la obra a todo el personal, el cual debe ser evidenciado mediante registro de asistencia.

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. en materia de salud en el trabajo, realizó durante el periodo en reporte una serie de charlas al personal de obra, teniendo en cuenta las actividades proyectadas, las cuales fueron dictadas por la Profesional de SST del proyecto.

La asistencia del personal que recibe la charla y/o capacitación se evidencia mediante una planilla diseñada por la empresa para tal fin, la cual debe ser firmada por cada uno de los trabajadores que asisten a la charla; igualmente, las charlas son registradas fotográficamente, indicando además que en muchas ocasiones la interventoría hace presencia en estas jornadas.

Como evidencia de las charlas en materia de SST se adjuntan las respectivas planillas de asistencia y se presenta el siguiente registro fotográfico. **ANEXO 6.6.1. PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS DE SST**.





Fotografías 6.1 y 6.2. Capacitación de SST dictada al personal de obra del profesional en SST



Fotografía 6.3. Capacitación de SST dictada al personal de obra del profesional en SST





Fotografías 6.4 y 6.5. Charlas dictadas al personal de obra por parte del profesional en SST

6.1.2. Realizar Charlas, capacitaciones al personal de la obra sobre temas de seguridad y salud ocupacional.

Las charlas en materia de SST realizadas para el periodo en reporte, corresponden a las que se relacionan en la siguiente tabla.

TABLA 6.2. CHARLAS EN SST

FECHA	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	NUMERO DE ASISTENTES
01-06-2024	DIVULGACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO Y ATS	46
04-06-2024	RIESGOS Y PELIGROS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO	51
05-06-2024	TRABAJO EN EQUIPO	49
06-06-2024	POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL ES PARA TODOS	43
07-06-2024	INTRODUCCIÓN POR ALIMENTOS	37
08-06-2024	POLÍTICA DE ALCOHOL – DROGAS – TABACOS Y DEMÁS ESTUPEFACIENTES	40
11-06-2024	LAS SEÑALES DE TRÁNSITO SE DEBEN RESPETAR	35
12-06-2024	TODOS LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBEN SER OPERADOS POR PERSONAS CAPACITADAS	41
13-06-2024	EL USO DEL CELULAR EN HORARIOS LABORALES	43
14-06-2024	LOS ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	41
15-06-2024	TRABAJO EN EQUIPO	38
17-06-2024	CONSECUENCIAS DE ADELANTAR EN CURVAS	51
18-06-2024	NO EXCEDER LOS LÍMITES DE VELOCIDAD	44
19-06-2024	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	42
20-06-2024	MISIÓN Y VISIÓN DE SYNERGIA	44
21-06-2024	INSPECCIONES E INSTRUCTIVOS DE VECHÍCULOS LIVIANOS	43
22-06-2024	RESPETO EN EL ÁREA LABORAL	42
24-06-2024	PREVENCIÓN EN LAS EXCAVACIONES	42
25-06-2024	LOS RIESGOS NO ESCOGEN A SUS VICTIMAS	41
26-06-2024	TRABAJO EN EQUIPO Y EQUIPO DE TRABAJO	44
27-06-2024	USO OBLIGATORIO DEL CINTURON DE SEGURIDAD	47
28-06-2024	NO USAR EL CELULAR MIENTRAS CONDUCE	47
29-06-2024	RESPETO	48

FUENTE: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

6.1.3. Relación en un cuadro de las afiliaciones a salud, pensión y ARL de todo el personal que labora en la obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal vinculado al proyecto para el periodo en reporte, el cual se encuentra debidamente afiliado y pagada su seguridad social,

tal como se demuestra con la respectiva planilla del mes de mayo de 2024. **ANEXO 6.6.2. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

TABLA 6.39. RELACIÓN DE PERSONAL

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES	CARGO	DIRECCION	EPS	AFP	ARL	CCF
1/159	23.914.357	MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	TRABAJADORA SOCIAL	CARRERA 18 No 12 - 03	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
2/79	1116536782	CARLOS ANDRES HERRERA	TOPOGRAFO	CARRERA 12b 35ª 27	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
3/114	68285674	EDICT JASMIN PACHECO REINA	AMBIENTAL	Calle 24a, 7a-15 Palmeras	SANITAS	N/A	POSITIVA	COMFACASANARE
4/62	6761218	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	DIRECTOR DE OBRA	CARRERA 23, 7-86	SANITAS	N/A	POSITIVA	COMFACASANARE
5/86	1118581713	DAYRA MARLEY MENDIVELSO G	INSPECTOR DE OBRA	CARRRERA 11, 44A-30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
6/63	86066292	WILSON ALEXANDER GONZALEZ RIVEROS	ESPECIALISTA ADICIONAL	CALLE 32, 41A-50	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	COMFACASANARE
7/70	7161696	JOSE MAURICIO GUERRERO	ESPECIALISTA GEOLOGIA	CARRERA 27, 17-28	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
8/17	47.440.878	MARIA DORIS BERNAL	PROFESIONAL SST	CALLE 9ª No. 18 -09 B. EL CENTRO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
9/120	79.941.038	DIEGO ONLEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA	CALLE 38A 24 49 - YOPAL	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	COMFACASANARE
10/127	4.245.556	FRANCISCO ANDRES QUINTERO QUINTERO	MAESTRO DE OBRA	CARRERA 8A No 40 - 75	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
11/162	1.116.545.788	JOSE ANTONIO VARGAS AGUDELO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
12/61	4284848	EULICER GONZALEZ CARRAMAN	OFICIAL DE OBRA	CENTRO TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
13/34	5415197	MIGUEL ANGEL CRUZ MONOGA	BODEGUERO DE MAQUINAS	CALLE 28, 31B- 57	FOSYGA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
14/44	1082851829	ALBERTO ANTONIO ESCALANTE ALTAMAR	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
15/163	1118562072	WILMER FERNANDO VARGAS PENAGOS	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	PROTECCION	POSITIVA	COMFACASANARE
16/112	74857511	LUIS REY ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
17/134	1122922193	JUAN DAVID RINCON MORA	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE
18/101	9657771	JORGE NIÑO MOLINA	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
19/85	9398191	RAFAEL ALBERTO LEMUZ PATARROYO	ALMACENISTA	CALLE 37, 43A-23	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE
20/16	1007387019	BARRERA PAULA VALENTINA	CONTROLADOR VIAL	CRA 12 34-29	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
21/18	1007767067	BERNAL GODOY YILVER	CONTROLADOR VIAL	CARRERA 24a N° 16 - 21 B. Villa Rocio	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
22/24	1007954262	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	CONTROLADOR VIAL	CALLE 32 06 109	CAPRESOCA	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE
23/116	74811942	PALACIOS JOSE VICENTE	CONTROLADOR VIAL	CALLE 18 F 18 31	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
24/119	1118545768	PEDRAZA JAMES ALEXIS	CONTROLADOR VIAL	CASA 21 B/ LA PEDRERA – YOPAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
25/142	47.436.638	RODRIGUEZ GUTIERREZ MADELEINE	SUPERVISOR SST	calle 42 # 15-03	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
26/148	1.115852.538	SOGAMOSO RIOS RAMON ANTONIO	OFICIAL DE OBRA	MANZANA 1 LOTE 33 LA PRADERA	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
27/160	13486960	VARGAS DIDIMO	CONTROLADOR VIAL	TILODIRAN	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
28/71	74770319	GUINA MALDONADO DENIS	OFICIAL DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	COMFACASANARE

29/81	1007747536	LEGUIZAMON BRAYAN STEVEN	CADENERO DE TOPOGRAFIA	TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
30/59	1029642224	JHOJAN DAVID GOMEZ CATAÑO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE
31/84	1057602737	LUIS FERNANDO LEMUS	CADENERO I	TILODIRAN	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	COMFACASANRE
32/72	74862019	LUIS FERNANDO GUINA MALDONADO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA	COMFACASANARE
33/154	1118569918	ELVER ANDRES TARACHE	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
34/100	1066727172	DIEGO ANDRES NARVAEZ VERTEL	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE
35/12	11202787	DAGOBERTO ARIZA MURCIA	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
36/151	1118530260	ADRIAN DAVID SOLORZANO ARTAHONA	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
37/42	9653348	JOSE DEL CARMEN DURAN	BODEGUERO DE MAQUINARIA	TILODIRAN	CAPRESOCA	N/A	POSITIVA	COMFACASANARE
38/41	1118531038	NELSON ALEJANDRO DUQUE ACEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
39/110	1.006.557.607	ALDAIR ORTIZ TABACO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
40/35	9.517.517	JAIRO LUIS OMAR CUBIDES BOTIA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CARRERA 22 5-68	REGIMEN ESPECIAL	N/A	POSITIVA	COMFACASANARE
41/116	74.860.237	WILSON PADILLA	CADENERO DE TOPOGRAFIA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	COMFACASANARE
42/121	33.480.635	NAIDU PEREZ CARREÑO	CONTROLADOR VIAL	CORREGIMIENTO TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
43/165	1.118.577.085	ISMAEL VASQUEZ TABACO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE
44/93	1.118.529.643	NILSON ANDRES MILLAN GUANARO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
45/96	1.118.547.182	ALEXANDER MORENO MALDONADO	OFICIAL DE OBRA	CARRERA 27 21 65	CAPRESOCA	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE
46/29	7.364.974	HELMAR FREDY CHAPARRO SOGAMOSO	BODEGUERO	TILODIRAN	FOSYGA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
47/10	47.440.746	ELSY MERCEDES ALARCON	CONTROLADOR VIAL	CORREGIMIENTO TILODIRAN	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
48/53	9.659.199	ROILSO GALAN CAMARGO	AYUDANTE DE OBRA	CORREGIMIENTO TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
49/129	1.118.576.962	IVAN FABIAN REINA CAÑIZARES	AYUDANTE DE OBRA	FINCA EL TROMPILLO - TILO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
50/123	1.006.406.024	JOSE DE JESUS PIRABAN PIRABAN	OFICIAL DE OBRA	CALLE 26 27 62	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
51/115	1.116.809.321	JOSE MANUEL PACHECO DIAZ	OFICIAL DE OBRA	MZ 26 CASA 32	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
52/68	1.002.645.527	PABLO ALBERTO GUATIBONZA TORRES	AYUDANTE DE OBRA	CORREGIMIENTO TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
53/45	1.118.559.074	RUBEN DARIO ESTUPIÑAN CUELLAR	TECNICO ELECTRICISTA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
54/144	9.656.888	JOSE MARIA SALCEDO CERON	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
55/4	74811206	JOSE LEISEN VARGAS	BODEGUERO DE MAQUINAS	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
56/90	1.074.012.418	SAMIR DAVID MENDOZA JARAMILLO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
57/135	86.049.750	TIRZO MISAEL RINCON RAMIREZ	OFICIAL DE OBRA	LOTE 11 MZ D TILODIRAN	CAJACOPI	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
58/137	4.150.771	RAUL ANTONIO ROA LOPEZ	OFICIAL DE OBRA	CARRERA 42A 35 32	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
59/27	9432512	ARMANDO CEPEDA AFRICANO	OFICIAL DE OBRA	TRANS 6 No 37 11	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	COMFACASANARE
60/92	1116492926	YENNY CAROLINA MIJARES LEAL	CONTROLADOR VIAL	VEREDA GUACHARACAL	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE

61/186	13475370	OMAR ENRIQUE VILLAMIZAR NOVA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CALLE 5A 9 35	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
62/23	1118531825	FREDY CACHAY CACHAY	OFICIAL DE OBRA	CALLE 55 35 08	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
63/145	1118533958	JOSE MAURCIO SANCHEZ TORRES	AYUDANTE DE OBRA	CRA 29A No 29 - 68	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
64/33	1007540088	CRISTIAN LEONARDO COTE FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	CORREGIMIENTO TILODIRAN	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
65/9	74858382	JAVIER ANTONIO AGUIRRE DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	CORREGIMIENTO TILODIRAN	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE
66/95	1006944750	FAUDER AURELIO MORALES CALDERON	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
67/49	1006533490	JINETH KARINA FONTECHA CIFUENTES	AUXILIAR DE PROYECTOS	CALLE 30 27 46 T16 APTO 202	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE
68/30	1118550230	JORGE OSWALDO CHAPARRO URRUTIA	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
69/26	1029841095	YOJAN ALVEIRO CASIULU CATAÑO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE

FUENTE: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

Nota: El primer número que aparece en tabla hace referencia al consecutivo del personal en la nómina para el periodo en reporte, mientras que el segundo hace referencia al que le corresponde en la planilla de pago de seguridad social.

Personal que se retiró en el periodo

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES	CARGO	DIRECCION	EPS	AFP	ARL	CCF
33	1118569918	ELVER ANDRES TARACHE	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
40	9.517.517	JAIRO LUIS OMAR CUBIDES BOTIA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CARRERA 22 5-66	REGIMEN ESPECIAL	N/A	POSITIVA	COMFACASANARE
49	1.118.576.962	IVAN FABIAN REINA CAÑIZARES	AYUDANTE DE OBRA	FINCA EL TROMPILLO - TILO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
52	1.002.645.527	PABLO ALBERTO GUATIBONZA TORRES	AYUDANTE DE OBRA	CORREGIMIENTO TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
56	1.074.012.418	SAMIR DAVID MENDOZA JARAMILLO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
57	86.049.750	TIRZO MISAEL RINCON RAMIREZ	OFICIAL DE OBRA	LOTE 11 MZ D TILODIRAN	CAJACOPI	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE

FUENTE: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

Personal que ingresó en el periodo

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES	CARGO	DIRECCION	EPS	AFP	ARL	CCF
59	9432512	ARMANDO CEPEDA AFRICANO	OFICIAL DE OBRA	TRANS 6 No 37 11	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	COMFACASANARE
60	1116492926	YENNY CAROLINA MIJARES LEAL	CONTROLADOR VIAL	VEREDA GUACHARACAL	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
61	13475370	OMAR ENRIQUE VILLAMIZAR NOVA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CALLE 5A 9 35	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
62	1118531825	FREDY CACHAY CACHAY	OFICIAL DE OBRA	CALLE 55 35 08	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
63	1118533958	JOSE MAURCIO SANCHEZ TORRES	AYUDANTE DE OBRA	CRA 29A No 29 - 68	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
64	1007540088	CRISTIAN LEONARDO COTE FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	CORREGIMIENTO TILODIRAN	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
65	74858382	JAVIER ANTONIO AGUIRRE DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	CORREGIMIENTO TILODIRAN	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE

66	1006944750	FAUDER AURELIO MORALES CALDERON	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
67	1006533490	JINETH KARINA FONTECHA CIFUENTES	AUXILIAR DE PROYECTOS	CALLE 30 27 48 T16 APTO 202	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFACASANARE
68	1118550230	JORGE OSWALDO CHAPARRO URRUTIA	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE
69	1029641095	YOJAN ALVEIRO CASULU CATAÑO	AYUDANTE DE OBRA	TILODIRAN	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	COMFACASANARE

FUENTE: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

ANEXO 6.6.2. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

6.2. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.2.1. Registro de accidentes presentados durante la ejecución de la obra

Durante el periodo en reporte no se presentaron accidentes de trabajo.

6.2.2. Medidas de Prevención para accidentes.

Como medidas para la protección de accidentes, la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S., cuenta con una serie de herramientas de planificación y prevención relacionadas con el tema de SST, las cuales se han venido efectuando y se continuará con su implementación durante todo el tiempo de la ejecución del Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2023, correspondiente a las siguientes:

- ✓ POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
- ✓ POLÍTICAS DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS, TABAQUISMO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
- ✓ POLITICA DE SEGURIDAD VIAL
- ✓ POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
- ✓ REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Las anteriores políticas se encuentran consignadas en documentos que fueron adjuntados en el Primer Informe Ambiental de Obra, copia de los mismos reposa en la oficina principal del contratista, las cuales han sido socializadas con el personal a través de las charlas en SST, pero también es de indicar que se encuentran a la vista, en cartelera en el campamento.

De otra parte, como medida de prevención para accidentes, también se tienen las inducciones realizadas a cada persona que ingresa a laborar a SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

Adicionalmente, en el marco de la política del SG - SST se realizan inspecciones al botiquín, extintores, puestos de trabajo, orden y aseo, herramientas menores, tal como se evidencia con los respectivos soportes, como también se realizan pruebas de alcoholimetría de manera aleatoria.

El profesional en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de minimizar los accidentes laborales, realiza un Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), de acuerdo a las actividades a realizar durante el mes, soporte que se adjunta junto con los respectivos Permisos de Trabajos (PT) para los trabajadores que estuvieron presentes en la actividad de excavaciones, con el fin de llevar un control de los riesgos y peligros.

ANEXO 6.6.3. INDUCCIONES
ANEXO 6.6.4. INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y EXTINTORES
ANEXO 6.6.5. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
ANEXO 6.6.6. INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS MENORES
ANEXO 6.6.7. INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO
ANEXO 6.6.8. PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA
ANEXO 6.6.9. AST Y PT
ANEXO 6.6.10. INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS
ANEXO 6.6.11. LISTA DE CHEQUEO DE EXCAVACIONES

Las pruebas de alcoholimetría fueron realizadas los días 4, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28 y 29 de junio de 2024.






Fotografías 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9. Registro de la prueba de alcoholimetría al personal de obra, la cual es realizada antes de iniciar la jornada laboral en días aleatorios.






Fotografías 6.10, 6.11, 6.12 y 6.13. Registro de la prueba de alcoholimetría al personal de obra, la cual es realizada antes de iniciar la jornada laboral en días aleatorios.




Fotografías 6.14 y 6.15. Registro de calistenia





Fotografías 6.16 y 6.17. Registro de calistenia

De otra parte, es de indicar que en el campamento se cuenta con un Kit de primeros auxilios, el cual está conformado por una serie de elementos, información que fue reportada en el tercer informe ambiental de obra y que se mantendrá en lo sucesivo por su importancia, señalando además que su evidencia se mostró mediante registro fotográfico también en el informe nro. 3 y 4, resaltando que estos elementos permanecen en obra y que se pueden corroborar en cualquier momento.

Relación de elementos que conforman el Kit de Primeros Auxilios:

- Camilla tipo Junkin o Winer adulto
- Cuello ortopédico adulto ajustable
- Arnés multipropósito en X de 4 p
- Juego de férulas cartonplast adulto
- Cords Ref: 0826 Cordino 8 mm x MT
- Cuerda semi estática 7/16 0 11 mm x mt
- Dryad poleas dobles con placa late
- Rescunceder bloqueador de leva RA
- Arnés multipropósito en X de 4 P
- Morral tipo tula para Kit de rescate
- Guantes
- Tapabocas
- Eslinga en banda de 2"
- Compresas estéril
- Vendas elásticas 5" y 6"
- Mascarilla RCP
- Curitas
- Jeringas 20 ml
- Vendas triangular

- Esparadrapo 4"
- Jabón Yodado
- Supragel
- Gasas estéril 7.5 x 7.5
- Botiquin bordado
- Morral tipo tula para Kit de rescate

También es de indicar, que SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. resalta con frecuencia en su equipo de trabajo, las normas básicas que se deben tener presente para desarrollar las actividades, propendiendo con ello por la seguridad de las personas, tales como las que se enuncian a continuación:

1. Sigue las Instrucciones de Seguridad en todo momento.
Antes de iniciar cualquier trabajo, evalúa los riesgos y adopta las medidas preventivas establecidas para el desempeño de tus tareas. ¡No corras riesgos, si no sabes, pregunta!

2. Comunica cualquier condición insegura
Recuerda que en prevención actuamos todos. Eres responsable de tu propia seguridad y la de tus compañeros por lo que debes comunicar cualquier incidencia detectada en tu lugar de trabajo.

3. La información y formación son claves en tu Seguridad
Si no estás capacitado para una tarea específica es mejor que lo comuniques a tu superior antes de correr el riesgo. Fórmate y solicita la información necesaria para desempeñar tus tareas de forma segura.

4. Usa equipos de protección individual
Los EPI's son equipos destinados a protegerte cuando las medidas técnicas, organizativas y colectivas establecidas en la empresa no son suficientes para minimizar el riesgo.

5. Utiliza herramientas y equipos adecuados
El uso correcto de herramientas y equipos es fundamental para evitar accidentes y enfermedades profesionales. Sigue el manual de instrucciones en todo momento y respecta los dispositivos de seguridad.

6. Mantén limpio y ordenado tu lugar de trabajo
Un espacio limpio y ordenado evita muchos accidentes. Presta también atención a la iluminación.

7. Evita las prisas y excesos de confianza
Son las dos causas más frecuentes en los accidentes de trabajo. No anules dispositivos de seguridad y respeta los tiempos.

8. Vigila tu salud
Las condiciones de tu puesto de trabajo afectan a tu salud. El reconocimiento médico es la herramienta que utilizamos para valorarlo y establecer las medidas oportunas.

9. Ante una emergencia mejor estar preparado
Familiarízate con las medidas de emergencia y evacuación, infórmate de quien es tu MUTUA y colabora en los simulacros.

6.2.3. Las oficinas e instalaciones deben contar con la señalización adecuada y bien dotada con los elementos de seguridad industrial

Como se indicó desde el primer informe ambiental, la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S., cuenta en calidad de arrendatario con un predio ubicado dentro del mismo Centro Poblado de Tilodiran, propiedad del señor JAVIER MOLINA, el cual tiene una superficie de 2 hectáreas, donde funciona el campamento.

El predio destinado como campamento se ha venido adecuando para el funcionamiento de las diferentes zonas que se requieren para la operación adecuada y organizada del proyecto, las cuales cuentan con señalización instalada en debida forma, tanto para el paso peatonal como vehicular interno y de la ubicación de cada una de las zonas.

Se mantiene la señalización instalada y evidenciada en informes anteriores, indicando que se encuentran en buen estado. A continuación, con el siguiente registro fotográfico se ilustra el estado del campamento, la señalización instalada y la organización del mismo para el periodo en reporte.



Fotografías 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21. Señalización del punto de encuentro y de las rutas de evacuación.



Fotografía 6.22. Zona adecuada para la fabricación de elementos de concreto, tales como tapas de pozos de inspección, para lo cual se hizo una placa en concreto y se está construyendo la estructura para colocar techo, a fin de proteger a los trabajadores de la lluvia y el sol. A la derecha se aprecia una zona utilizada para el almacenamiento temporal de tubería.



Fotografías 6.23 y 6.24. Zona de acopio crudo de río y triturado.



Fotografia 6.25. Panorámica campamento zona de acopio de materiales pétreos





Fotografia 6.26 y 6.27. Panorámica de diferentes zonas del campamento – Almacenamiento de ladrillos, tuberia y zona de oficinas, bodegas y acceso al campamento.

6.2.4. La obra debe estar bien señalizada, el cual deben colocar señales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra.

El proyecto cuenta con un Plan de Manejo de Tráfico - PMT, que contiene una serie de acciones que permitirán una óptima señalización en toda el Área de Influencia Directa del proyecto, igualmente sobre las vías circundantes a la obra cuando esté en ejecución, de lo cual se rinde informe de manera independiente. **VER CAPÍTULO 9. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT).**

Para el periodo en reporte se ejecutan actividades relacionadas con la construcción de la estructura de descarga e instalación de la tuberia pluvial y sanitaria en las calles del Centro Poblado de Tilodiran, señalizando cada uno de los frentes de trabajo en debida forma, tal y como se ilustra en el siguiente registro fotográfico.



Fotografías 6.28. Señalización instalada en cierres de vías





Fotografías 6.29 y 6.30. Señalización instalada en frentes de obra para el cierre de vías.





Fotografías 6.31 y 6.32. Controladoras viales ejerciendo el tráfico





Fotografías 6.33 y 6.34. Aislamiento con lona verde en zonas de trabajo y sendero peatonal implementados en frentes de obra para permitir la circulación de las personas en el sector en intervención





Fotografías 6.35 y 6.36. Aislamiento de zonas de trabajo con lona verde y sendero de acceso para el ingreso a predios en el sector de intervención





Fotografías 6.37 y 6.38. Cierre de vías con lona verde y maletines plásticos

6.2.5. Implementación de elementos de protección, seguridad al personal de la obra.

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. atendiendo la normatividad en materia laboral y seguridad y salud en el trabajo, implementó las siguientes medidas de protección al personal de obra.

- El personal que ha ingresado a laborar a la empresa bajo el Contrato de Obra Pública 032 de 2023, fue debidamente afiliado al sistema de seguridad social, para lo cual se pagaron los respectivos aportes a salud, pensión y ARL.
- Se realizaron actividades de prevención de enfermedades, accidentes de trabajo y educación en salud a los trabajadores, a través de las diferentes charlas de SST impartidas al personal.
- Se hizo entrega de los respectivos elementos de seguridad personal a los trabajadores de la obra. **ANEXO 6.6.12. ENTREGA DE EPP.**
- A través del profesional encargado del SST, SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. se ha estado pendiente que el personal permanezca con los EPP cuando se encuentra en el área de trabajo.

6.2.6. Registro fotográfico del buen uso e implementación de los elementos de seguridad.

A continuación, se evidencia el buen uso de los elementos de seguridad por parte del personal de obra.





Fotografías 6.39 y 6.40. Evidencias del personal técnico - directivo en inspecciones, haciendo uso de sus epp, en la derecha el personal con su dotación para eventos de lluvia.





Fotografías 6.41 y 6.42. Evidencias del personal haciendo uso de los elementos de seguridad para evitar los riesgos biológicos al ingresar a pozos de inspección sanitarios.





Fotografías 6.43 y 6.44. Evidencias del personal haciendo uso de sus respectivos EPP en excavaciones, cascos, arnés y uso de escales.





Fotografías 6.45, 6.46 y 6.47. Evidencias de trabajo seguro, mediante la instalación de entibados metálicos en sectores requeridos por la inestabilidad del terreno

6.2.7. Dotación suministrada al personal de obra (formatos de recibido y registro fotográfico).

Para el periodo en reporte se entregó la respectiva dotación al personal que ingresó a laborar, tal como se evidencia con los respectivos soportes firmados por el trabajador que las recibió. **ANEXO 6.6.13. ENTREGA DE DOTACIÓN.**




Fotografías 6.48 y 6.49. Evidencias de entrega de dotación y EPP al personal de obra





Fotografías 6.50 y 6.51. Evidencias de entrega de dotación y EPP al personal de obra

6.3 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL

6.3.1. Adopción de las medidas necesarias para impedir las emisiones accidentales de sustancias químicas.

Para el tanqueo de la maquinaria durante el periodo en reporte se hizo mediante un proceso denominado trasiego, consistente en una bomba eléctrica, con medidor, que extrae el combustible a través de una manguera que es conectada a un tanque en acero inoxidable ubicado sobre una camioneta, luego desde el tanque la manguera se conecta directamente a la máquina, tal como se ilustra en la siguiente fotografía.





Fotografías 6.52 y 6.53. Tanqueo seguro de la maquinaria

A continuación, se ilustran las medidas de manejo ambiental implementadas cuando se hace uso de cemento.





Fotografías 6.54, 6.55 y 6.56. El concreto utilizado para la fabricación de elementos como las tapas para los pozos de inspección se hacen en su sitio adecuado para tal fin, sobre una placa de concreto, sobre la cual se coloca un plástico grueso, evitando de esta manera el contacto directo con el suelo



Fotografía 6.57. En los frentes de obra el cemento para preparar la mezcla para pañete de pozos de inspección, se realiza dentro de un recipiente, evitando de esta manera el contacto directo con el suelo

6.3.2. Manejo de residuos peligrosos, basuras, etc…

Bajo este ítem se reportará el manejo que SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. está dando tanto a los residuos sólidos como residuos líquidos

Residuos sólidos:

Uno de los compartimientos de la caseta o infraestructura construida en el campamento fue adecuado para el almacenamiento temporal de residuos sólidos y líquidos, teniendo en cuenta su clasificación de acuerdo con el código de colores y los residuos previstos a generarse en el proyecto, incluyendo los residuos peligrosos, así:

Residuos NO aprovechables – Color Negro
Residuos Aprovechables – Color Blanco
Residuos Peligrosos – Color Rojo

Si bien No se proyecta la generación de Residuos Orgánicos en grandes cantidades, se cuenta con una caneca para la recolección de este tipo de residuo, correspondiente al color Verde, aunque es de aclarar que la generación de estos residuos será en muy baja cantidad, toda vez que no se tiene casino, pues el personal del área de influencia ingiere sus alimentos directamente en sus casas, mientras que el resto de personal en los restaurantes ubicados en el Centro Poblado de Tilodiran.

Para el periodo en reporte los residuos generados se han venido almacenando para su posterior entrega a la empresa SIMA INGENIEROS S.A.S. Sigue pendiente adjuntar el acta de la disposición final de los residuos sólidos entregados en el mes de abril de 2024.



Fotografía 6.58. Caseta de Residuos Sólidos



Fotografía 6.59. Punto Ecológico instalado en la oficina del campamento







Fotografías 6.60, 6.61 y 6.62. Puntos ecológicos en frentes de obra

Residuos Liquidos

Los residuos liquidos peligrosos, aceite quemado, están siento recolectados para reutilizarlo posteriormente en obra, una vez se inicie la fabricación de sardineles para engrasar la formaleta.

Los residuos liquidos provenientes de la unidad sanitaria, son retirados después de hacer el mantenimiento por la empresa J&M, quienes lo transportan a la planta de SIMA INGENIEROS S.A.S., encargados de hacer la respectiva disposición final.

Se adjuntan los manifiestos o comprobantes del servicio de limpieza de las unidades sanitarios portátiles y su respectiva recolección de las aguas residuales generadas

en el mes de junio de 2024. Se adjuntan las certificaciones de disposición final de las aguas residuales del mes de abril y mayo del 2024, quedando pendiente de entrega la certificación del mes de junio de 2024.

VER ANEXO 6.6.14. SOPORTES DE RESIDUOS LÍQUIDOS





Fotografías 6.63 y 6.64. Mantenimiento de baños durante el periodo en reporte

El agua para el uso de la unidad sanitaria durante el periodo en reporte, siguió siendo captada desde los pozos de inspección en construcción, donde aflora el agua debido al nivel freático encontrado teniendo en cuenta la profundidad de excavación, tal como se aprecia en el siguiente registro fotográfico, luego es llevada al campamento a través de un carrotanque y se descarga sobre un tanque plástico con capacidad de 2.000 litros y otro tanque de 1.000 litros que se encuentra elevado.





Fotografías 6.65, 6.66 y 6.67. Agua que aflora a raíz de las excavaciones en diferentes puntos del proyecto, de donde se extrae para llenar tanques de 1.000 y 2.000 litros para diferentes usos del proyecto, incluyendo las unidades sanitarias.

6.3.3. Kit ambiental: manejo de grasas, aceites, etc.

Se adquirió un Kit ambiental el cual está conformado por los siguientes elementos:

- Estopas
- Aserrín
- Guantes de vinilo
- Mascarilla con cartucho
- Chaleco
- Un martillo
- Bolsa roja
- Un cordón absorbente para contener derrames sobre agua
- Linterna
- Cinta de señalización
- Desengrasante
- Una cuerda de 10 metros
- Paños absorbentes

En informes anteriores se registró la evidencia de los elementos que conforman el Kit ambiental.

6.3.4. Mantenimiento de la maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

Lo primero sea relacionar que la maquinaria que se encuentra al servicio del Contrato nro. 032 de 2023 para el periodo en reporte, correspondiente a la que se relaciona a continuación:

TABLA 6.4. RELACIÓN DE MAQUINARIA

EQUIPO	MARCA	No. DE MOTOR	No. SERIE	LINEA	MODELO	NRO. DE REGISTRO	RODAJE	*TRM
RETROEXCAVADORA	KOMATSU	568063	88668	PC130-8	2017	MC086076	ORUGAS	50637
RETROEXCAVADORA	KOMATSU	26705057	600112	PC210-10M0	2019	MC105912	ORUGAS	63040
RETROEXCAVADORA	KOMATSU	576916	88978	PC130-8	2020	MC196970	ORUGAS	78059
RETROEXCAVADORA	KOMATSU	543512	86133	PC130-8	2013	MC052500	ORUGAS	27119
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	G4D13720	CAT0420EPKVVD1656	420E	2007	MC052642	NEUMATICOS	27185
VIBRACOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	68074874	192683	SD45D	2007	MC089266	NEUMATICOS Y CILINDROS	51614

FUENTE: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

* Tarjeta de Registro de Maquinaria

Los documentos de la maquinaria se ha entregado a medida que van ingresando, estos documentos se adjuntaron en el Informe Ambiental de Obra nro. 1, 3, 4, 5 y 6. En el presente informe ambiental NO se hace entrega de documentos, por cuanto la maquinaria corresponde a la misma relacionada en el mes anterior.

Para el periodo en reporte se realizó mantenimiento a maquinaria, generando el cambio de doce (12) galones de aceite de motor, tarea que es registrada en el respectivo formato de ficha de mantenimiento establecido para cada máquina.

VER ANEXO 6.6.15. FICHAS DE MANTENIMIENTO

6.3.5. Establecer lugar, depósito para los materiales, productos, aceites y grasa (tener en cuenta el registro fotográfico)

En el almacén se cuenta con un estante donde se ubican los productos o sustancias químicas que ingresan a la obra, tales como aceites, grasas, pegamentos, entre otros.

Para cada tipo de producto se cuenta con la respectiva hoja de vida, la cual se tiene en el campamento y se ha socializado con el personal.

6.3.6. La maquinaria debe tener su tecno-mecánica actualizada y en vigencia.

La maquinaria no requiere de tecno-mecánica, por cuanto esta información está dirigida a vehículos automotores tales como volquetas, carrotanques y camionetas, información que es reportada en el **CAPÍTULO 9. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT).**

En relación con la maquinaria al servicio del proyecto en el periodo en reporte, corresponde a la que se relaciona en la tabla 6.4., a la cual diariamente se le hace su revisión técnica que es consignada en los respectivos soportes denominados preoperacionales.

VER. ANEXO 6.6.16. PREOPERACIONALES

6.3.7. Señalización vertical.

Según el MTC, se denomina señal vertical a toda señal instalada al costado o sobre el camino. Estas se utilizan para prevenir o informar a los usuarios (conductores o peatones) sobre cualquier eventualidad que pueda encontrarse en el camino.

Las señales verticales fueron creadas para reglamentar, prevenir e informar al usuario de la vía. Su uso es fundamental principalmente en lugares donde existen regulaciones especiales, permanentes o temporales, y en aquellos donde los peligros no siempre son evidentes.

Las señales verticales se clasifican en 3 tipos:

1. **Señales Reguladoras**: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías, las prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes, en el uso de las vías. Su incumplimiento constituye una falta que puede acarrear un delito.
2. **Señales de Prevención**: Su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal.
3. **Señales de Información**: Tienen como propósito guiar a los usuarios y proporcionarles información para que puedan llegar a sus destinos en la forma más simple y directa posible. Además, proporcionan información relativa a distancias a centros poblados y de servicios al usuario, kilometrajes de rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, y otros.

Bajo el contexto anterior, se tiene que el contrato de obra pública 032 de 2023 tiene contemplado bajo el ítem 5.4.1. "Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm", las cuales serán instaladas al final del proyecto de acuerdo con el cronograma de obra, aclarando que, para la ejecución del proyecto, a la fecha, no ha sido necesaria su implementación, toda vez que se cuentan con controladoras viales, además se han implementado señales móviles, de acuerdo con el PMT.

6.3.8. Colaboración con las autoridades locales en el establecimiento de procedimientos para respuesta ante emergencias.

Durante el periodo reportado en este informe, no se presentó ningún tipo de emergencia, la cual haya habido necesidad de acudir a las autoridades definidas para la atención de emergencias.

A continuación, se relacionan los datos de contacto de las entidades u organismos a las cuales se puede acudir ante una emergencia, con ocasión de un accidente laboral, incluyendo la ARL, o ante cualquier otro evento de emergencia.

TABLA 6.5. CONTACTOS ANTE EVENTOS DE EMERGENCIAS

ENTIDAD	NÚMERO DE CONTACTO
HOSPITAL DE LA ORINOQUIA – HORO	Calle 15 nro. 22 - 52 - Vía Marginal de la Selva, Yopal, Casanare Teléfono: 634 46 99 / 634 46 50 Celular: 310 213 5350 ventanillaunica@horo.gov.co
CRUZ ROJA	Celular: 310 695 07 60 / 310 341 76 86 Dirección: Carrera 18 nro. 15 10
DEFENSA CIVIL	Teléfono fijo: (8) 6358273 Celular: 3232090552 Dirección: Carrera 29 # 18 - 36 Barrio Juan Pablo - Yopal Emergencias: 144
BOMBEROS	Tv. 19 #242 a 24-74, Yopal, Casanare 320 8532940
ARL POSITIVA	Línea de reporte de accidentes: 018000111170 y 601 3307000 Desde Celular: #533
AMBULANCIAS	AMBULANCIAS CRUZ ROJA 311 862 47 57 FUNDACIÓN PROMOVER Cel: 350 870 94 59 AMBULANCIAS URGENCIA VITAL DEL CASANARE Cel: 313 210 08 92 SERVI S.O.S & HSEQ Cel: 312 397 19 22 URMEDICAS Cel: 312 523 38 52
POLICIA NACIONAL	Estación de Policía Yopal Celular: 320 3316578 Correo electrónico: decas.esyop@hotmail.com Dirección: Calle 14 nro. 34 - 180 Vía Sirivana
	Subestación de Policía Tilodiran Celular: 313 4458125

	Correo electrónico: decas.etiodiran@policia.gov.co Dirección: Barrio Tilocentro Frente al parque principal
EJERCITO NACIONAL	GRUPO GAULA CASANARE Líneas de atención: Prevención de extorsión y secuestro 312 504 2289 comandante GAULA MILITAR CASANARE 3118767757 Unidad Inteligencia GAULA MILITAR CASANARE 3118767753 Unidad Operativa GAULA MILITAR CASANARE 3105676145 Unidad Prevención Gaula MILITAR CASANARE 3118767756 Línea gratuita nacional 147
URMEDICAS 24 HORAS LTDA	Teléfono: 633 39 99 Dirección: Carrera 27 nro. 14 - 57, Yopal, Casanare
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA EN PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRASMITIDA POR INSECTOS VECTORES	Teléfono: 635 92 53 Calle 20 A 13 - 16, Yopal, Casanare

FUENTE: ENTIDADES CONSULTADAS

Es de resaltar que, sobre la pared del pasillo, frente al almacén, ubicado en el campamento, se tiene visible la relación de las entidades, con sus respectivos nûmeros de contacto, para que cualquier personal lo tenga presente ante cualquier emergencia. Tal como se ilustró mediante registro fotográfico en el informe no. 5.

6.3.9. Permisos y Licencias Ambientales necesarias para la ejecución de la obra (Anexarlas)

De acuerdo como se estructuró el proyecto; igualmente, de acuerdo como el contratista ha venido abordando la ejecución de cada una de las actividades contractuales, no se ha requerido tramitar permiso, concesión o autorización ambiental ante CORPORINOQUIA, tal como lo contempló también el PAGA.

Sin embargo, el documento PAGA dejó en claro que los recursos naturales que se lleguen a requerir, usar o afectar en el marco del proyecto, deben contar con los respectivos permisos, concesiones, autorizaciones, inscripciones o licencias ante la

autoridad ambiental competente, ya sea de manera directa; esto es, a través del contratista o del Municipio de Yopal, o ya sea de manera indirecta; esto es, a través de un prestador de bienes o servicios.

A continuación, se hace un análisis de los bienes y servicios requeridos por el proyecto, o permisos, concesiones, autorizaciones, inscripciones o licencias, señalando los aspectos legales para cada uno de ellos.

TABLA 6.6. PERMISOS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES, INSCRIPCIONES O LICENCIAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO

PERMISOS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES, INSCRIPCIONES O LICENCIAS	OBSERVACIÓN
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	A LA FECHA CORTE DEL PRESENTE INFORME NO SE HA REQUERIDO
PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	**Etapa de construcción:** No requiere Permiso de Vertimientos ya que se contarán con unidades sanitarias portátiles. Una vez las unidades sanitarias sean instaladas se adjuntará en el informe correspondiente la documentación del respectivo prestador del servicio de disponibilidad final de las aguas residuales. **Etapa de Operación:** El PAGA señala: El Centro Poblado de Tilodiran cuenta con Permiso de Vertimientos otorgado por CORPORINOQUIA mediante la Resolución nro. 500.41.12.1258 del 14 de septiembre de 2012, dentro del Expediente nro. 500.33.6.11.034. Es importante indicar que la vigencia del Permiso de Vertimiento estaba definida hasta el día 14 de septiembre del 2022, el Municipio de Yopal estando en términos legales, presentó vía correo electrónico la respectiva solicitud de prórroga, mediante el oficio nro. 2022255807 del 09 de septiembre del 2022, también presentó en físico la solicitud de prórroga ante CORPORINOQUIA el día 14 de septiembre del 2022, quedando radicado bajo el nro. YO-2022-13042. El Centro Poblado de Tilodiran cuenta con PSMV aprobado por CORPORINOQUIA mediante Resolución nro. 500.36.22.2063 del 30 de diciembre de 2022. Es importante indicar que, tanto el Permiso de Vertimiento de Aguas Residuales del Centro Poblado de Tilodiran como el PSMV son responsabilidad directa del Municipio de Yopal, ante lo cual SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. está atenta para colaborar en cualquier requerimiento que la Autoridad Ambiental haga al respecto, siempre y cuando esté dentro del marco del proyecto en ejecución.

CONCESION DE AGUAS:	La empresa GESAMCOLL S.A.S. ESP cuenta con Concesión de Aguas Subterráneas para prestar el servicio de agua en bloque y uso comercial, otorgada por CORPORINOQUIA mediante la Resolución nro. 500.36.19.2243 del 5 de diciembre de 2019. La anterior resolución fue adjuntada en el primer informe ambiental. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. solicitó a GESAMCOLL S.A.S. ESP el servicio de disponibilidad de venta del recurso hídrico, oficio que fue remitido vía correo electrónico el día 24 de noviembre de 2023. Para el periodo en reporte el uso de agua se continuó captando de los pozos de inspección en construcción, los cuales debido al proceso de infiltración mantienen agua en su interior, de donde se extrae a través de una motobomba a un carrotanque, por lo que aún no ha sido necesaria la compra de agua.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Los residuos sólidos que se generaron para el periodo en reporte han sido almacenados de manera temporal para su posterior disposición final. En el primer informe ambiental se hizo entrega de los documentos ambientales del prestador del servicio que se encargará de la disposición final de residuos sólidos peligrosos.
DISPOSICIÓN FINAL DE RCD:	La empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. inició gestiones para la inscripción de un sitio para la disposición final de RCD, el cual fue radicado en CORPORINOQUIA el 11 de diciembre bajo el nro. 2023-19857, a nombre de la señora Luz Marina Valderrama de Álvarez como gestora de RCD, pero mediante oficio nro. Oficio 500-29-1-24-02089 del 23 de abril de 2024, CORPORINOQUIA hizo requerimientos los cuales a la fecha están pendientes de respuesta. Es importante resaltar que este trámite se trata de una alternativa que tiene el contratista para la disposición de RCD. Igualmente, se presentó a CORPORINOQUIA bajo el radicado nro. 2024-01132, de fecha 30 de enero de 2024, el respectivo Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – RCD. También se radicó en la Alcaldía de Yopal, bajo el nro. 2024105130 el día 30 de enero de 2024, solicitud de disponibilidad de servicio para disposición de RCD en la escombrera municipal. Los soportes de la gestión realizada se adjuntaron en el informe ambiental de obra nro. 4. En la siguiente tabla se consigna la relación de los RCD que se han generado a la fecha y la disposición de los mismos. **RCD GENERADOS Y SU MANEJO AMBIENTAL**

MES	VOLUMEN DE EXCAVACIÓN (M3)	VOLUMEN DISPUESTO (M^3)		
		RELLENO	RETIRADO	VIA ALTERNA Y OTROS
OCT-23	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV-23	1.080,00	621,00	0,00	459,00
DIC-23	6.941,00	1.107,60	5.833,40	0,00
ENE-24	2.773,40	1.536,73	1.236,67	0,00
FEB-24	6.849,96	3.097,34	1.831,67	1.920,95
MAR-24	3.503,50	2.325,17	1.178,33	0,00
ABR-24	4.113,22	1.688,57	1.189,93	1.234,72
MAYO	2.419,65	2221,49	198,16	-
JUNIO	912,65	850,91	61.74	0,00
TOTAL	28.593,38	13.448,81	11.529,90	3.614,67

FUENTES DE MATERIALES:

En la siguiente tabla se relacionan los volúmenes de material pétreo ingresado al acopio del campamento, de donde se distribuye a los frentes de obra

MATERIAL PÉTREO

Mes	Arena (m3)	Triturado (m3)	Crudo de rio (m3)	Sub base (m3)	Base Granular (m3)
Oct-23	0	0	0	0	0
Nov-23	742	13	7.000	0	7.266
Dic-23	156	0	108	0	0
Ene-24	168	0	0	52	1.134
Feb-24	0	52	0	26	0
Mar-24	126	221	3.010	0	494
Abr-24	0	0	196	0	1.599
May-24	2.318	130	126	1.521	0
Jun-24	18	0	240	0	57.25

El proveedor de los materiales pétreos sigue siendo el mismo para el periodo en reporte. Los documentos del proveedor de los materiales pétreos fueron adjuntados en el primer informe ambiental.

OCUPACIÓN DE CAUCE:

De acuerdo como está contemplado el diseño y la ubicación de la estructura de descarga NO SE REQUIERE.

Durante el periodo en reporte se está construyendo la estructura de descarga, ateniendo el diseño y la ubicación prevista.

6.3.10. El contratista de construcción debe tener como política al realizar sus actividades implementar prácticas y medidas de manejo ambiental y seguridad industrial, con el fin de minimizar los impactos ambientales, prevenir la contaminación, preservar el medio ambiente, brindar protección y seguridad a los trabajadores y conservar relaciones estrechas con la comunidad, autoridades locales y la entidad ambiental competente.

Además de las acciones de manejo ambiental y de seguridad industrial y salud en el trabajo, realizadas en el periodo en reporte, las cuales fueron descritas con antelación en el presente documento, atendiendo este requerimiento o instrucción contemplada por ACUATODOS; igualmente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el PAGA, SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S. acata las fichas de manejo ambiental nro. DAGA-1.1-01 y DAGA-1.1-02, denominadas "Conformación del grupo de gestión ambiental" y "Capacitación Concienciación para el Personal de Obra DAGA-1.1-02", respectivamente, para su implementación durante todo el periodo contractual, con lo cual se busca crear consciencia en cada una de las personas adscritas al contrato nro. 032 del 2023, de tal forma que los impactos negativos propios del proyecto a generarse durante su ejecución, sean minimizados al máximo, corregidos o evitados, tratando de esta manera afectar en la menor proporción al medio ambiente y a la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

DAGA-1.1-01: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se relacionan las acciones implementadas para el cumplimiento de esta ficha de manejo.
Se conformó el grupo de gestión ambiental, con el personal contratado y los perfiles propuestos en la etapa precontractual, desde el inicio del contrato, quedando conformado tal como se indica a continuación, grupo que se mantiene para el periodo en reporte.

TABLA 6.7. INTEGRANTES DEL GRUPO DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

PROFESIONAL	CARGO
PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	DIRECTOR DE OBRA
DIEGO ONLEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA
EDICT JASMIN PACHECO REINA	ESPECIALISTA AMBIENTAL
MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	TRABAJADORA SOCIAL

FUENTE: SYMERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

Dentro de las acciones desarrolladas por el grupo de gestión ambiental para el presente periodo, se tienen las siguientes:

- Se ha tenido presente el presupuesto y cronograma para la implementación del PAGA, lo cual a medida que avance y se ejecute se reportará. El valor del presupuesto PAGA corresponde a $63.633.447.
- Tal como se propuso en este proyecto o ficha de manejo, el Grupo de Gestión Socio-Ambiental, está siendo liderado por el Director de Obra con el apoyo constante de la ingeniera ambiental especialista de la empresa y demás integrantes del grupo, de manera tal que sean los interlocutores entre la Interventoría y la empresa ACUATODOS S.A. ESP, quienes serán los que asistan a las reuniones y comités que sean convocados en torno a la gestión ambiental del proyecto, incluyendo el tema social, para lo cual también hará presencia.
- Se ha mantenido una coordinación integral entre la ejecución de las actividades técnicas, administrativas y ambientales del proyecto, de tal forma que se pueda garantizar un adecuado desarrollo de la obra y la implementación del PAGA.
- Se ha propendido por el cumplimiento y la eficacia de las medidas y actividades en materia ambiental, conforme a los diseños de manejo establecidos, por lo que siempre el grupo de gestión ambiental enmarca la ejecución de cada una de las actividades en un buen manejo ambiental del proyecto, mediante charlas y directrices a todo el personal que hace parte del contrato de obra nro. 032 de 2023.
- El grupo de gestión ambiental inicialmente hizo el reconocimiento integro del proyecto, especialmente sobre los espacios de ejecución en donde se involucra el componente ambiental, situación que se mantiene, de tal forma que la implementación de las medidas sea acorde con las necesidades requeridas que permitan evitar, minimizar y/o prevenir cualquier impacto
- El grupo de gestión ambiental participa de los programas de entrenamiento y capacitación, liderando los procesos de empoderamiento y toma de conciencia ambiental.
- Se ha dado cumplimiento a la presentación de informes periódicos con una periodicidad mensual, donde se detalla el avance en el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental.
- El grupo de gestión ambiental mediante recorridos constantes en campo, identifica los requerimientos de orden ambiental al interior del proyecto.

CONCLUSIONES:

- Esta ficha de manejo ambiental se mantendrá a lo largo del periodo de ejecución y continuará atendiendo los lineamientos contenidos en la misma.
- Es de conocimiento para la Empresa que a través del grupo de gestión ambiental y en cabeza del director de obra, es responsable de todas las políticas y lineamientos contemplados en el documento PAGA; es decir, de la gestión ambiental del Contrato 032 de 2023, por lo que se deben liderar todos y cada uno de los proyectos formulados en el PAGA, tendientes al cumplimiento de la normatividad ambiental, los lineamientos indicados por la empresa ACUATODOS S.A. ESP y la interventoría en el manejo ambiental, incluyendo naturalmente el respeto por las comunidades y el medio ambiente, de tal forma que se minimicen, eviten, prevengan o en últimas compensen los impactos ambientales que por el desarrollo del Contrato se puedan generar.
- La empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. ha estado atenta para atender e interactuar con el Municipio de Yopal, teniendo en cuenta que al final del proyecto, la obra debe ser entregada a este Ente Territorial, como también con las demás entidades que soliciten información al respecto.

VER ANEXO 6.6.17. ACTAS AMBIENTALES

DAGA-1.1-02: CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

A continuación, se relacionan las acciones implementadas para el cumplimiento de esta ficha de manejo.

Siguiendo los lineamientos establecidos en esta ficha de manejo ambiental, además teniendo en cuenta que los trabajadores son de gran importancia para SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S., se tiene presente la necesidad de invertir en el equipo humano, proporcionándole continuamente oportunidades para mejorar sus habilidades.

Las capacitaciones o las charlas constituye el desarrollo del personal, que incluyen aquellas actividades designadas a capacitar, adiestrar y dar a conocer al empleado todos los riesgos y peligros a los que se está expuesto continuamente en el desarrollo de sus labores, asimismo como de crear un mayor compromiso con su trabajo, en materia de seguridad ambiental, en relación con temas ambientales el

programa está dirigido a la concientización del personal para la conservación del medio ambiente a través del respeto y aprecio por nuestros recursos naturales.

Tema Ambiental

Durante el periodo reportado, objeto del presente informe se llevaron a cabo una serie de charlas ambientales, lo cual se soporta con las planillas de asistencia y registro fotográfico.

VER ANEXO 6.6.18. PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS AMBIENTALES.

TABLA 6.8. RELACION DE CAPACITACIONES Y/O CHARLAS AMBIENTALES

FECHA	NOMBRE DE LA CAPACITACION	NUMERO DE ASISTENTES
12-06-2024	LOS PARAMOS: CONSERVACIÓN DEL AGUA	43
25-06-2024	CARTA AL 2070: UN LLAMADO PARA CUIDAR EL PLANETA	40

FUENTE: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S





Fotografías 6.68 y 6.69. Charlas ambientales dictadas al personal





Fotografías 6.70 y 6.71. Charlas ambientales dictadas al personal

Se adjunta el contenido de cada una de las charlas ambientales dictadas para el periodo en reporte.

VER ANEXO 6.6.19. CONTENIDO DE CHARLAS AMBIENTALES

6.3.11. Disponer en obra de un profesional en el área de seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos profesionales según como se establece en la minuta.

El Contrato de Obra Pùblica cuenta con la Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo, MARIA DORIS BERNAL ALONSO, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 47.440.878 de Yopal, Casanare, con Licencia Profesional nro. 0706del 06 de junio 2014, hoja de vida que se encuentra en la propuesta, documentos que forman parte integral del Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2023.

6.3.12. Para todo esto se debe anexar sus soportes y registro fotográfico a color.

Ver registro fotográfico incluido en diferentes partes del presente documento

6.4. DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES IMPACTOS EN EL PERIODO

Las fichas contempladas en el PAGA contienen los siguientes impactos ambientales, previstos a generarse durante la ejecución del proyecto, así:

- ✓ Afectación a la movilidad peatonal y vehicular
- ✓ Alteración paisajística
- ✓ Falsas expectativas
- ✓ Cambio en la calidad del aire
- ✓ Cambio en los niveles de ruido
- ✓ Afectación a la salud de los trabajadores
- ✓ Generación de conflictos con la comunidad
- ✓ Afectación en la continuidad de la prestación de servicios públicos
- ✓ Desplazamiento o afectación de la fauna
- ✓ Cambios en la calidad del suelo
- ✓ Cambio en la calidad del agua
- ✓ Afectación a las actividades económicas
- ✓ Generación de empleo

- ✓ Incremento en la demanda de bienes y servicios
- ✓ Recuperación de la cobertura vegetal
- ✓ Susceptibilidad a la erosión
- ✓ Cambio del uso actual del suelo

Ahora bien, teniendo en cuenta las actividades ejecutadas para el periodo en reporte, las cuales se relacionan y describen en detalle en el capítulo 1 "Descripción técnica de las actividades ejecutadas", se tiene que los impactos generados corresponden a los siguientes.

IMPORTANCIA AMBIENTAL	IMPACTOS NEGATIVOS	IMPACTOS POSITIVOS
MUY ALTA		
ALTA	✓ Cambios en la calidad del suelo ✓ Alteración paisajística ✓ Cambio en la calidad del aire ✓ Cambio en los niveles de ruido ✓ Afectación a la salud de los trabajadores	✓ Generación de empleo ✓ Incremento en la demanda de bienes y servicios
MEDIA	✓ Desplazamiento o afectación de la fauna ✓ Falsas expectativas ✓ Afectación a la movilidad peatonal y vehicular	
BAJA	✓ Generación de conflictos con la comunidad	
MUY BAJA	✓ Afectación a la movilidad peatonal y vehicular ✓ Afectación arqueológica	

6.5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con los impactos relacionados en el ítem anterior, a continuación, se hace una descripción para cada uno de los impactos y se relacionan las acciones o medidas implementadas.

IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
Afectación a la movilidad peatonal y vehicular	Hace referencia a la obstaculización temporal de las vías, al impedimento para el acceso al servicio de transporte público, a la movilidad peatonal, a la disminución del área de rodamiento mientras se realizan las obras, entre otros, alterando la dinámica propia de los usuarios de las vías en intervención.
	a. Medida de Prevención
	✓ Se contrató personal con funciones exclusivo para el manejo de tránsito bajo el cargo de "controladora vial" ✓ Las vías en intervención durante el periodo en reporte fueron totalmente delimitadas y encerradas mediante cinta que indica peligro, además con señales de tránsito donde se indica el cierre de cada vía, resaltando que su uso se restringió por intervalos cortos.

	permitiendo el paso vehicular contando siempre con la controladora vial que dirigió el tráfico. ✓ Se desvió el tráfico vehicular para el periodo en reporte en lo que corresponde a la vía que conduce a la vereda Agualinda, razón por la que se puso en uso la vía alterna adecuada para tal fin. ✓ Se instaló un pasacalle indicando el desvío ✓ Se ha delimitado y señalizado adecuadamente el área de trabajo. ✓ Se instruyó al personal de mano de obra que realice su labor dentro del sector correspondiente. ✓ Se adecuó un sendero peatonal en el sector de la vía Agualinda en intervención.
	b. Medidas de Mitigación ✓ Las personas o vehículos que transiten cerca de la obra deberán acatar cada una de la señalización instalada en los frentes de obra.
	c. Medidas de Corrección ✓ Se han implementado las acciones contenidas en el Plan de Manejo de Tráfico, a fin de afectar en lo menos posible la movilidad peatonal y vehicular.
	d. Medidas de Compensación NO APLICA
	e. Contingencia Durante el periodo en reporte no se presentó ninguna contingencia en relación con la movilidad.
Alteración paisajística	**DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO** Corresponde a la alteración del paisaje causado por las actividades realizadas en el periodo, como excavaciones, campamento, presencia de la maquinaria, el uso de las señales de tránsito; es decir, por la presencia de elementos que antes no estaban en el paisaje.
	a. Medida de Prevención ✓ En los frentes de obra se ha mantenido exclusivamente la maquinaria, equipos, herramientas y materiales que se han utilizado en cada jornada laboral. ✓ Las áreas de trabajo permanecen aseadas y ordenadas
	b. Medidas de Mitigación ✓ Se han señalizado y aislado exclusivamente las áreas de trabajo.
	c. Medidas de Corrección ✓ Retirar la maquinaria, equipos y herramientas cuando ya no se utilicen, igualmente disponer adecuadamente los materiales sobrantes o RCD, como también cualquier otro elemento.
	d. Medidas de Compensación NO APLICA
	e. Contingencia No fue necesario
	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

Falsas expectativas	Hace referencia a las falsas expectativas que se generan en la comunidad por falta de información veraz y oportuna sobre el alcance del proyecto y los bienes, servicios y mano de obra requerida por el contratista para le ejecución del contrato de obra 032 de 2023.
	a. Medida de Prevención
	✓ Se socializó con la comunidad del Centro Poblado de Tilodiran el día 17 de octubre del 2023, todo lo relacionado con la ejecución del contrato 032 de 2023, tales como el alcance del proyecto, actividades a realizar, bienes y servicios requeridos, mano de obra, forma de ingreso, vacantes, contratista, interventoria, supervisión, etc., de tal forma que a través de reuniones se le brindó a la comunidad toda esta información de manera veraz y oportuna, con el objeto de no crear falsas expectativas por la ejecución de la obra.
	b. Medidas de Mitigación
	✓ Se priorizó la contratación de pobladores locales que residen en la zona de influencia del proyecto ✓ Se realizó una labor informativa veraz y oportuna para difundir la política de contratación de mano de obra, así como la demanda del personal requerido (requisitos y condiciones laborales), con el fin de evitar crear falsas expectativas en la población. ✓ Se han llegado acuerdos con la comunidad en el tema salarial ✓ Se han contratado servicios, tales como la alimentación con las personas de la comunidad, también se arrendó una vivienda para el personal que pernocta en el Tilodiran.
	c. Medidas de Corrección
	A través del profesional social del proyecto estar en contacto con la comunidad, entidades públicas con el objeto de brindar información y aclarar inquietudes.
	d. Medidas de Compensación
	NO APLICA
	e. Contingencia
	No fue necesario
Cambios en la calidad del aire	**DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO**
	Hace referencia al aumento de las concentraciones de compuestos como el CO_2 y material particulado.
	a. Medida de Prevención
	✓ Se deberá llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar la mala combustión. Para todas las medidas de control y mitigación propuestas en el PAGA se deberá solicitar la evidencia del mantenimiento de toda maquinaria y/o equipo a través de los pre-operacionales y/o certificados de gas o tecno mecánica otorgada por la entidad respectiva.
	b. Medidas de Mitigación
	✓ Las volquetas que transportan materiales cubren totalmente el volco. ✓ Se ha dado la directriz que el tránsito de volquetas en el área del proyecto; es decir, dentro del Centro Poblado de Tilodiran, no debe sobrepasar los 20 km/hora. ✓ El material pétreo es acopiado solo dentro del predio destinado como campamento. ✓ El campamento fue encerrado con lona verde por el frente, cortando así la influencia del viento.
	c. Medidas de Corrección

	✓ Llamado de atención a los conductores de volqueta que no cubran el volco de las volquetas para evitar la dispersión de material particulado y/o no cumplan con la velocidad estipulada.
	d. Medidas de Compensación
	NO APLICA
	e. Contingencia
	No ha sido necesario.
Cambios en los niveles de ruido	**DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO**
	Es el aumento o disminución de los decibeles de acuerdo con el valor de permisible, para el proyecto causado por causado por los motores, compresoras, maquinaria, etc. Se considera como ruido todo sonido con una intensidad alta que pueda afectar la salud de las personas.
	a. Medida de Prevención
	✓ Evitar el uso de los equipos durante más de 4 horas al día seguido y los equipos y unidades vehiculares deben tener mantenimiento oportuno y adecuado. ✓ Asegurar que la maquinaria, equipos y vehículos estén en excelentes condiciones mecánicas, por tal motivo se ha verificado el mantenimiento o revisiones técnicas periódicas y mantenimiento mensual. ✓ No programar trabajos en horario nocturno.
	b. Medidas de Mitigación
	✓ El personal que labora en la obra cuenta con protectores acústicos como, por ejemplo orejeras y tapones. ✓ Uso de silenciadores en óptimo funcionamiento, para aminorar la emisión de ruidos como consecuencia del empleo y movimiento de las maquinarias pesadas. ✓ Para evitar el congestionamiento vehicular por tránsito de maquinarias y volquetas a medida que avance la obra, es necesario implementar señales informativas de rutas alternas y desvíos; así como determinar horarios apropiados para el avance de obra donde el tránsito vehicular sea de menor flujo.
	c. Medidas de Corrección
	✓ Revisión mecánica de la maquinaria, equipos y vehículos.
	d. Medidas de Compensación
	NO APLICA
	e. Contingencia
	No ha sido necesario.
Afectación en la salud de los trabajadores	**DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO**
	Se presenta por la exposición al ruido, emisiones, malos olores y riesgos de accidente por sus actividades.
	a. Medida de Prevención
	✓ Se deberá proporcionar a los empleados los EPP necesarios y verificar su uso correcto, a fin de evitar afectaciones a su salud. ✓ Cumplir con las normas indicadas en el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional. ✓ Para el caso de aislamiento de zonas de trabajo se deberán colocar señales y/o carteles indicativos de seguridad y/u otro medio, a fin prevenir cualquier incidente sobre la población.

	✓ Capacitación de los profesionales y técnicos de la empresa contratista respecto a ejecución de actividades constructivas especiales, así como capacitación orientada a los fundamentos de salud y seguridad ocupacional. ✓ Tener en cuenta todas las normas y reglamentos vigentes sobre seguridad del personal, además de proporcionar toda la indumentaria necesaria. ✓ Brindar las condiciones adecuada de trabajo, a efectos de evitar desenlaces desagradables, así cuando se trate de uso de grandes maquinarias pesadas y/o actividades que generen, se deberá dotar al personal de protectores de oídos y otros equipos necesarios para su protección, dado al riesgo a que se expone el trabajador. ✓ Contar con un botiquín de primeros auxilios. ✓ Dar a conocer a los trabajadores sobre las normas de seguridad del Reglamento del trabajo ✓ Supervisar constantemente sobre las condiciones de trabajo y Seguridad Ocupacional.
	b. Medidas de Mitigación
	✓ Realizar charlas constantes de seguridad industrial y salud ocupacional para evitar malas prácticas y crear consciencia en el personal sobre el cuidado de la integridad física personal de cada uno de los trabajadores.
	c. Medidas de Corrección
	✓ Cercar el área de trabajo y no permitir el acceso a personas no autorizadas
	d. Medidas de Compensación
	NO APLICA
	e. Contingencia
	Solicitar a la ARL implementar las medidas que estén a su alcance en materia preventiva sobre la ocurrencia de accidentes.
Generación de conflictos en la comunidad	**DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO**
	Hace referencia al ruido, cierre de vías, tráfico de maquinaria, entre otros, que puedan ocasionar algún tipo de molestia a la comunidad
	a. Medida de Prevención
	Para evitar generar molestias a la comunidad solo se debe trabajar en un horario comprendido entre las 7 a.m. hasta las 5:30 p.m.
	b. Medidas de Mitigación
	✓ Comunicar oportunamente el inicio y término de la obra ✓ Efectuar la ejecución de las actividades por tramos, a fin de disminuir los impactos. ✓ Implementar una correcta delimitación de la seguridad y señales informativas para el tránsito vehicular y peatonal de la obra. ✓ Garantizar la fluidez del tránsito en la vía pública mediante el uso de señalizaciones: lámparas intermitentes, cintas de señalización, cerco de mallas, tranqueras, letreros metálicos y conos fosforescentes, entre otros. ✓ Se deberá contar con un sitio para la disposición final de RCD, toda vez que los mismos no deben ser dispuestos de manera inadecuada en cualquier lugar, afectando la movilidad de peatones y vehículos o afectando visualmente el entorno.
	c. Medidas de Corrección
	✓ Los ruidos molestos hacia la comunidad disminuyen evitando concentrar los equipos en un mismo lugar, además se debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a fin de reducir el ruido.

	✓ Evitar el uso de equipos durante más de 4 horas al día seguido.
	d. Medidas de Compensación
	NO APLICA
	e. Contingencia
	No ha sido necesario.
Afectación en la continuidad de la prestación de servicios públicos	**DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO**
	Se refiere a la suspensión de los servicios públicos de acueducto, energía o de gas por un periodo de tiempo con ocasión de la ejecución del proyecto.
	a. Medida de Prevención
	✓ Se suspenderán los servicios públicos únicamente en los tramos intervenidos y por la jornada laboral, procurando restablecer el servicio en el menor tiempo posible, a fin de que las molestias en la comunidad sean mínimas, aunque para el periodo no fue necesario.
	b. Medidas de Mitigación
	✓ Coordinar con las entidades prestadoras de los servicios públicos las fechas de corte para cada sector, avisando previamente a la comunidad sobre la respectiva suspensión.
	c. Medidas de Corrección
	✓ Contar con los planos de todas las redes de servicio público, con el objeto de evitar la ruptura de los mismos, a medida que avance la obra.
	d. Medidas de Compensación
	NO APLICA
	e. Contingencia
	No ha sido necesaria
Desplazamiento o afectación de la fauna	**DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO**
	Corresponde al desplazamiento forzado de algunas especies propias de la zona cuando su hábitat es alterado.
	a. Medida de Prevención
	✓ Delimitar y señalar adecuadamente el área de trabajo. ✓ Informar e instruir al personal de mano de obra que realice su labor dentro del sector correspondiente sobre cómo proteger la fauna silvestre. ✓ Las maquinarias de trabajo deberán usar silenciadores para apaciguar el ruido, además de contar con su mantenimiento respectivo. ✓ Informar a los trabajadores mediante charlas de duración de 5 minutos sobre la importancia de valorar los recursos naturales (fauna, etc.) y el medio ambiente.
	b. Medidas de Mitigación
	✓ Prohibir la caza de animales silvestres, no permitir bajo ninguna circunstancia que los trabajadores afecten la fauna presente en el área de influencia del proyecto.
	c. Medidas de Corrección
	✓ Identificar nidos de aves en los árboles localizados en el área del proyecto y velar por su cuidado y protección.
	d. Medidas de Compensación
	✓ No aplica
	e. Contingencia

	No ha sido necesario.
Cambios en la calidad del suelo	**DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO**
	Se refiere a la posible contaminación que se puedan generar por el almacenamiento temporal de residuos sólidos (latas de pintura, bolsas, envases y/o depósitos vacíos) y/o Derrame de lubricantes y/o Derrame de combustibles
	a. Medida de Prevención
	✓ Acumular los residuos sólidos en contenedores o canecas, debidamente identificados (rotulados), para su posterior entrega al prestador del servicio. ✓ Contar con un ambiente exclusivo (techado) dentro del campamento debidamente identificado, para almacenamiento de envases con lubricantes o cualquier otra sustancia química. Los envases deben ser apropiados para el almacenamiento de aceites, con tapa hermética, y deben estar identificados. ✓ El abastecimiento de combustible y aceite se debe hacer mediante un método seguro que genere riego sobre el suelo. ✓ El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares y la maquinaria para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes, se evidenciará el mantenimiento mediante los respectivos preoperacionales.
	b. Medidas de Mitigación
	Construcción de una caseta de almacenamiento temporal de residuos que permita un manejo adecuado de los mismos, hasta cuando sean entregados al proveedor del servicio para su disposición final.
	c. Medidas de Corrección
	✓ Se colocarán debajo de los equipos y envases (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los mismos que serán entregados al prestador del servicio. Aplica también para la caseta de almacenamiento temporal de residuos sólidos y líquidos una vez se inicie su funcionamiento.
	d. Medidas de Compensación
	NO APLICA
	e. Contingencia
	No ha sido necesario

Los impactos positivos generados a la fecha de corte del presente informe, por ser de carácter social, son abordados en el ítem 7 "ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL"

6.6. ANEXOS

ANEXO 6.6.1. PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS DE SST.
ANEXO 6.6.2. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 6.6.3. INDUCCIONES.
ANEXO 6.6.4. INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y EXTINTORES
ANEXO 6.6.5. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
ANEXO 6.6.6. INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS MENORES

ANEXO 6.6.7. INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO
ANEXO 6.6.8. PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA
ANEXO 6.6.9. AST Y PT
ANEXO 6.6.10. INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS
ANEXO 6.6.11. LISTA DE CHEQUEO DE EXCAVACIONES
ANEXO 6.6.12. ENTREGA DE EPP
ANEXO 6.6.13. ENTREGA DE DOTACIÓN
ANEXO 6.6.14. SOPORTE DE RESIDUOS LÍQUIDOS
ANEXO 6.6.15. FICHAS DE MANTENIMIENTO
ANEXO 6.6.16. PREOPERACIONALES
ANEXO 6.6.17. ACTAS AMBIENTALES
ANEXO 6.6.18. PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS AMBIENTALES
ANEXO 6.6.19. CONTENIDO DE CHARLAS AMBIENTALES

7. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

7.1 JUSTIFICACIÓN

Para SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S es importante estructurar un plan de mejoramiento que le permita crecer ordenadamente a través del control eficiente de materiales que cumplan las especificaciones técnicas, aseguramiento y mejoramiento continuo en la gestión de mantenimiento de equipo y maquinaria para que sea óptimo en el desarrollo de nuestras actividades.

7.2 ALCANCE

El presente plan aplica para el proceso de aseguramiento y control del material, equipo y maquinaria de la organización.

7.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La implementación del plan requiere el respaldo y el compromiso de los responsables de las áreas de compras, mantenimiento, SST, para ello la empresa cuenta con un presupuesto establecido para la ejecución de las actividades de aseguramiento y control de material, equipo y maquinaria, tanto económico como de capital humano.

Los recursos técnicos y económicos que SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S tendrá disponibles serán acorde los siguientes lineamientos:

- **Recursos técnicos:** Considérese los materiales, equipos, mano de obra y transporte especificados en los análisis de precios unitarios presentados en la oferta económica.

- **Recursos económicos:** Aquellos aprobados mediante plan de inversión del anticipo por la firma de interventoría y los causados proporcionalmente según avance de obra y tramite de actas parciales a la entidad previa revisión y aprobación de la interventoria. Adicionalmente la firma SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S cuenta con el musculo financiero para tener la disponibilidad de recursos económicos en la medida de avance del proyecto.

Se presenta el anexo al presente informe **7.8.1 REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS**.

7.4 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

La organización del mantenimiento en la empresa es primordial para la optimización de nuestro proceso productivo.

- **Aseguramiento del mantenimiento de equipos y maquinaria**

La organización tiene establecido un programa de mantenimiento para ejercer el control y garantizar la disponibilidad de equipos óptimos para las actividades.

Este programa se encuentra relacionado en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo medio ambiente y calidad (PRG-SST-006 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO) matriz que se alimenta mensualmente de acuerdo a las especificaciones de cada equipo, frecuencia de uso, y estado general del mismo, con el fin de:

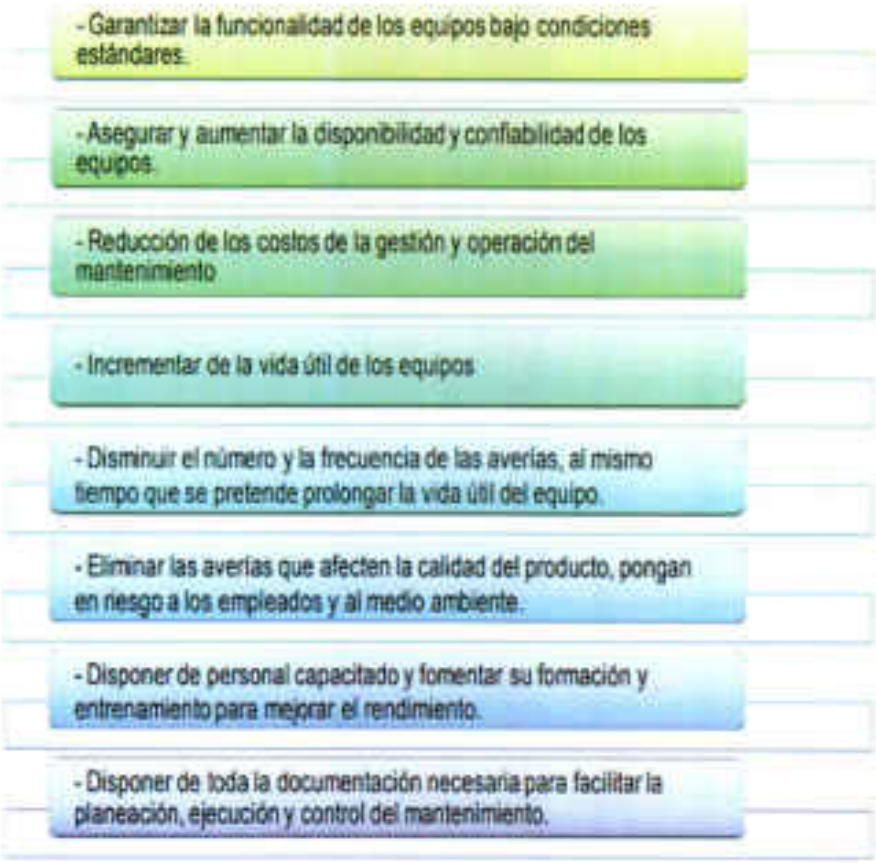


IMAGEN 6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

7.4.1 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

7.4.1.1 OBJETIVO

Contar con un sistema de trabajo que permita administrar, controlar y monitorear el mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria y equipo con el propósito de disminuir los tiempos perdidos y los mantenimientos correctivos ya que estos equipos y máquinas tienen una repercusión importante sobre la calidad de los productos y tiempos de terminación de las actividades (retroexcavadoras, vibrocompatador, motoniveladora, minicargador…) Equipos menores (apisonador, equipo de topografía).

7.4.1.2. ALCANCE

El alcance del mantenimiento preventivo y correctivo comprende a los equipos y maquinarias relacionadas con los procesos definidos dentro del Sistema integrado de Gestión.

7.4.1.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CÓDIGO	NOMBRE
N/A	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
N/A	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos, apartado 8.5.2
N/A	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos, apartado 4.5.3
N/A	Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos, apartado 4.5.3.2

TABLA 10. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA.

7.4.1.4 DEFINICIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Actividades encaminadas a prevenir las fallas de los equipos mediante un mantenimiento programado en tiempo y forma en función de las recomendaciones de los fabricantes.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO: Es una técnica que utiliza herramientas y técnicas de análisis de datos para detectar anomalías en el funcionamiento y posibles defectos en los equipos y procesos, de modo que puedan solucionarse antes de que sobrevenga el fallo.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es la actividad técnica ejecutada cuando sucede una avería y tiene como objetivo, restaurar el activo para dejarlo en condiciones de que pueda funcionar como se pretende ya sea con su reparación o sustitución.

EQUIPO: Dispositivo necesario para el funcionamiento de la maquinaria.

CALIBRACIÓN: Es la acción de comparar la indicación de un equipo o instrumento de medición con un patrón de referencia de valor conocido. La diferencia determinada se reporta en un certificado de calibración para que el usuario del equipo pueda relacionar un valor de indicación del equipo con el valor convencionalmente verdadero dado por el valor de referencia.

7.4.1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ÍTEM	ACTIVIDAD	MECANISMO DE CONTROL	RESPONSABLE
1	Se elabora anualmente el programa de mantenimiento, las rutinas de mantenimiento, así como el inventario de los equipos que se integrarán dentro del SG-SSTAC.	PRG-SST-006	Líderes de los Procesos del Sistema de Gestión.
2	El programa de mantenimiento es revisado por el Gerente, en caso de considerarlo necesario, realizará las modificaciones que considere pertinentes.	PRG-SST-006	Líderes de los Procesos del Sistema de Gestión.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
3	Se ejecuta los mantenimientos según fechas establecidas en el programa de mantenimiento.	PRG-SST-006	Líder de mantenimiento.
4	el encargado de realizar el trabajo dirigirá las actividades de acuerdo con los instructivos de cada maquinaria o equipo. Si la ruta de trabajo indica el reemplazo de algún componente del equipo se genera la requisición de acuerdo con el formato FOR-SST-015 "REQUISICIÓN" Ocurre lo mismo de requerirse servicio externo de mantenimiento.	FOR-SST-015 "REQUISICIÓN"	Líder de mantenimiento /operador.
5	Al concluir el mantenimiento preventivo se solicita la aprobación del responsable de utilizar el equipo, comprobando la buena ejecución del programa.	PRG-SST-006	Líder de mantenimiento /operador.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
6	Cualquier integrante de la organización detecta una falla en maquinaria, e informa al área de mantenimiento.		Todos.
7	El líder de mantenimiento revisa la avería Si se puede solucionar internamente o si se necesita de un servicio externo, se genera la requisición de FOR-SST-015 "REQUISICIÓN".	FOR-SST-015 "REQUISICIÓN"	Líder de mantenimiento /operador.
8	Se realiza orden y aseo al área donde se realizó el mantenimiento.		Líder de mantenimiento /operador.

TABLA 11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA.

7.4.1.6 RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

RELACIÓN DE EQUIPO MENOR	
EQUIPO	**MANTENIMIENTO**
CANGURO (APISONADOR) APGMAX 100 - ENERMAX	ENTRE 50- 80 HORAS DE USO
CANGURO (APISONADOR) MR68H/GCCBT	ENTRE 50- 80 HORAS DE USO

TABLA 12. RELACIÓN DE EQUIPO MENOR.

RELACIÓN MAQUINARIA AMARILLA					
EQUIPO	***MARCA***	***LÍNEA***	***AÑO MODELO***	***MOTOR***	***CUCHARON***
EXCAVADORA	KOMATSU	PC 130-8	2021	93 HP	0.8 M^3
EXCAVADORA	CATERPILLAR	420F2	2016	89 HP	1 M^3
EQUIPO	***MARCA***	***LÍNEA***	***AÑO MODELO***	***MOTOR***	***PESO OP***
VIBROCOMPACATADOR	DYNAPAC	CA 250D	2014	110HP	10.800 KG

TABLA 13. RELACIÓN DE MAQUINARIA.

7.5 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

7.5.1 OBJETIVO

Describir la forma de tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades y evitar que vuelvan a ocurrir en **CM.**

7.5.2 ALCANCE

Aplica para todas las acciones correctivas resultantes de las No Conformidades detectadas en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión en Seguridad y Salud de la organización.

7.5.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CÓDIGO	NOMBRE
N/A	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
N/A	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos, apartado 8.5.2
N/A	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos, apartado 4.5.3
N/A	Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos, apartado 4.5.3.2

TABLA 14. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA.

7.5.4 DEFINICIONES

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada, u otra situación no deseable.

7.5.5 ANEXOS

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD – **A la fecha no se han presentado productos no conformes.**

7.5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ITEM	ACTIVIDAD	MECANISMO DE CONTROL	RESPONSABLE
1	**Revisión de no conformidades:** se utiliza la acción correctiva como una herramienta para la mejora. Una no conformidad se detecta cuando hay incumplimiento de uno de los requisitos o especificaciones del cliente incluyendo las quejas o reclamos, o cuando se incumple con un numeral de la Norma.	Formato "Acciones correctivas y preventivas" R-HSE-40	Líderes de los Procesos del Sistema de Gestión.

	Estas son detectadas cada vez que se realiza una auditoria, cuando se evidencia una queja, o cuando los resultados de una acción no cumplen con los requisitos establecidos con el cliente. Las no conformidades se revisan, se analizan y se les hace seguimiento.		
2	**Determinación y evaluación de acciones:** Las causas se determinan dependiendo del problema y del área donde se evidencien las no conformidades. Se reúne el personal involucrado, se analizan las causas, y si es necesario se usan herramientas de calidad, tales como espina de pescado, ¿o los cinco por qué?, y finalmente se determina la causa raiz y se evalúa mediante el Formato "Acciones correctivas y preventivas" FOR-SST-010.	Formato "Acciones correctivas y preventivas" FOR-SST-010	Líderes de los Procesos del Sistema de Gestión.
3	**Implementación:** Se procede a la implementación de las acciones correctivas necesarias determinadas y se adoptan planes de acción para asegurarse de que éstas no vuelvan a ocurrir.	Formato "Acciones correctivas y preventivas" FOR-SST-010	Líder del Proceso afectado y encargado de la acción.
4	**Registro, revisión y cierre:** En el formato de "Acciones correctivas y preventivas" se registran los resultados de las acciones tomadas en la casilla de acción correctiva, se revisan y se les realiza un seguimiento para su cierre en la casilla de seguimiento y de cierre de la acción.	Formato "Acciones correctivas y preventivas" FOR-SST-010	Líder del Proceso afectado y Coordinador de HSE

TABLA 43. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

7.6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO

Referirse al **ANEXO 7.8.2** de procedimiento de **SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**

7.7 RECURSOS

7.7.1 CANTIDAD Y TIPO DE RECURSO DURANTE EL PROYECTO

En el **ANEXO 7.8.1 REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS** se relacionan los insumos requeridos en obra durante el periodo (materiales, herramientas y equipos); según formato FOR-COM-03 y solicitud de materiales conforme al formato FOR-COM-001.

7.7.2 NORMAS CON LOS CUALES LOS MATERIALES DEBEN SER CONFORMES

Las siguientes son las normas técnicas, tanto expedidas por el ICONTEC, por la AWWA y por la ASTM a las cuales se hace referencia en cuestión de alcantarillados pluviales. En caso de conflicto, prevalecerá lo establecido en las normas técnicas colombianas del presente documento. Así mismo en ausencia de norma colombiana especifica, se recomienda recurrir a las normas expedidas por organismos técnicos de reconocimiento internacional.

NORMAS NTC

- NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico.
- NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm.
- NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland.
- NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat.
- NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.
- NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico.
- NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua.
- NTC 184: Métodos de análisis quimico de los cementos hidráulicos.
- NTC5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.
- NTC3722-3 Tubos y accesorios de pared estructural para drenaje subterráneo y alcantarillado. Especificaciones para PVC rigido.
- NTC 5055 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno.

NORMAS AWWA

- AWWA C 105 American National Standard for polyethylene encasement for ductile-iron pipe systems. (ANSI A 21.5).
- AWWA C 106 American National Standard for cast iron pipe centrifugally cast in metal molds, for water or other liquids. (ANSI A 21.6).
- AWWA C 115 American National Standard for flanged ductile-iron pipe with ductile-iron or gray-iron threaded flanges. (ANSI A 21.15).
- AWWA C 116 Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings for the Interior and Exterior Surfaces of Ductile-Iron and Gray-Iron Fittings for Water Supply Service.
- AWWA C 208 Dimensions for Fabricated Steel Water Pipe Fittings.
- AWWA C 210 Standard for Liquid-Epoxy Coating Systems for the Interior and Exterior of Steel Water Pipelines.

NORMAS ASTM

- A 74 Specification for cast iron soil pipe and fittings.
- A 475 Standard specification for general requirements for delivery of zinc coated
- A 746 Specification for ductile iron gravity sewer pipe.
- A 762 Specification for corrugated steel pipe, polymer precoated for sewers and drains.
- A 796 Structural design of corrugated pipe, pipe-arches, and arches for storm and sanitary sewers and other buried applications.
- A 849 Post applied coatings, pavings, and linings for corrugated steel sewer and drainage pipe.
- A 979 Concrete pavements and linings installed in corrugated steel structures in the field.
- C 12 Installing vitrified clay pipelines.
- C 14 Standard specification for concrete sewer, storm drain, and culvert pipe.

7.8 ANEXOS

7.8.1 REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS

7.8.2 SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

7.8.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

8. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

8.1 REUNION DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD, VEREDAS Y MUNICIPIOS ETC.

8.1.1 Reunión inicial de obra

Como se describe en el presente informe de obra N° 01, correspondiente al periodo al mes de octubre 2023, se realizó reunión de socialización general del proyecto, en el corregimiento de Tilodiran, en el coliseo del centro poblado, el día 27 de octubre de 2023 Proyecto "Construcción alcantarillado Pluvial, optimización redes de acueducto y del alcantarillado sanitario y obras complementarias, reunión liderada por la empresa Synergia Construcciones e Ingenieria S.A.S, quienes realizaran la ejecución del proyecto como representante legal la Doctora Maria Diomy Barrera, Director de la obra Ingeniero Diego Pérez, la empresa Interventora Consinter del Oriente E.U como representante el Ingeniero Andrés López, entidad que se encargara de la supervisión y vigilancia para que se cumplan todas las actividades del proyecto, Gerente General de la empresa Acuatodos S.A E.SP, el señor Oved Quiroga Flórez, Yudith Yajaira Sánchez Riveros Profesional de apoyo a la supervisión de Acuatados, el Diputado el señor Carlos Fredy Mejia, Gobernador encargado y Secretario de Infraestructura el señor Oscar Eduardo Garcia, Secretaria de Infraestructura Municipio de Yopal Álvaro Rivera, La Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Tilodiran la Señora Marina Valderrama.**VER ANEXO ACTA DE REUNIÓN No.001 EN EL INFORME No. 01**.



IMAGEN 8.1 INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA SOCIALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

8.1.2 Reunión con la Comunidad

Durante este periodo del mes junio se envía comunicación a través de oficio para todos los lideres, Presidente de Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Tilodiran, empresas de hidrocarburos que se encuentran en esta zona de influencia, gremio de ganaderos, arroceros, palmeros, ediles, entre otros, con el fin de notificarles que la ruta alterna que se va a utilizar para el acceso a la vía los mangos para los vehículos de tráfico pesado y liviano es por la **carrera cuarta** que comunica con esta vía, y se da a conocer el plano como lo muestra la imagen (1), los horarios establecidos para el tráfico vehicular serán los mismos que se encuentran autorizados según el PMT; de lunes a viernes de 9:00am a 11:00am y de 3:00pm a 5:00pm y sábado de 9:00am a 11:00am, esta será la ruta designada para todas las empresas que requieren utilizar la vía los mangos, esta ruta quedara habitada a partir del día martes 4 de junio hasta el día sábado 8 de junio del presente año. La empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA contará con tres controladoras viales y con la instalación de señalización preventiva e informativa. ***VER ANEXO ITEM 8.6.1 OFICIO 1 DE JUNIO 2024.***





IMAGEN 8.1.2 PLANO CENTRO POBLADO TILODIRAN-NUEVA RUTA ALTERNA SEÑALIZADA EN ROJO.

Teniendo en cuenta que por las condiciones climáticas, los imprevistos, el terreno es muy inestable por ende no se ha logrado culminar con dicha actividad, en la fecha estipulada según el oficio del 1 de junio de 2024, por ende se extiende el plazo por diez más se continua con los mismos horario establecidos para el tráfico vehicular de lunes a viernes de 9:00am a 11:00am y de 3:00pm a 5:00pm y sábado de 9:00am a 11:00am, esta será la ruta designada para todas las empresas que requieren utilizar la vía los mangos. ***SE ANEXA ITEM 8.6.2 OFICIO 18 DE JUNIO 2024***



IMAGEN 8.1.2.1 REUNION CON LA SOCIAL SYNERGIA Y EMERALD AMPLIACION PLAZO PARA TRANSITO DE VEHICULOS PESADOS

8.1.3 Reunión de Avance de la Obra

Aunque se han venido ejecutando las actividades como la elaboración de actas de vecindad y adelantando las actividades relacionadas con la construcción de la red de alcantarillado pluvial, no se realiza en este periodo reunión de avance de obra.

8.2 OBLIGACIONES DE GESTIÓN SOCIAL

8.2.1 Elaborar y ejecutar un plan de gestión social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras.

Se elaboró PLAN DE GESTIÓN SOCIAL para el proyecto "Construcción alcantarillado Pluvial, optimización redes de acueducto y del alcantarillado sanitario y obras complementarias corregimiento Tilodiran del Municipio de Yopal" del informe de obra N°01 correspondiente al periodo del 10 de octubre al 31 de octubre de 2023. ***VER ANEXO PLAN DE GESTION SOCIAL INFORME No. 02***

8.2.2 Reuniones con la comunidad

- ✓ **Ruta Saludable**

Se continúa realizando rutas a cargo de la profesional del área social María Angelica Trujillo por los frentes de trabajo a fin de escuchar a los trabajadores si presentaban quejas, solicitudes entre otros aspectos, identificándose que no existen inconformidades a la fecha.

También se continua realizando la ruta saludable con relación al levantamiento de actas de vecindad, y en cada una de estas visitas se les explica el objetivo y la importancia de permitir revisar como se encuentra la estructura de las viviendas, en caso de presentarse algún daño y que este sea generado por los trabajos de la obra, la empresa contratista responderá por los daños causados, durante las visitas a las viviendas en general la comunidad ha sido receptiva, permitiendo el ingreso del profesional encargado de hacer la revisión, finalmente se les da a conocer las recomendaciones a tener en cuenta. ***VER ANEXO ITEM 8.6.3 ACTAS DE VECINDAD.***



IMAGEN 8.1.3 ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL ÁREA SOCIAL A LA INSPECCIÓN DE VIVIENDAS

8.2.3 Medios de difusión

Los Medios de difusión utilizados para este proyecto han sido los siguientes:

- Socialización del Proyecto "Construcción alcantarillado pluvial, optimización redes de acueducto y del Alcantarillado sanitario y obras complementarias para el centro poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

- Recepción de hojas de vida a través de la Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Tilodiran, permitiendo de esta manera cumplir con la obra de mano local.

Para este periodo no se contempló la necesidad de utilizar medios de difusión como radio, web, emisora, carteleras etc).

8.2.4 Diseños de la valla del proyecto (registro fotográfico)

El diseño que se utilizó como publicidad para el proyecto es la valla que se muestra en la imagen "Construcción alcantarillado Pluvial, optimización redes de acueducto y del alcantarillado sanitario y obras complementarias. Esta valla

contiene toda la información del proyecto, con número de contrato, empresa contratación, duración de la obra etc.



IMAGEN 8.2.4 VALLA DEL PROYECTO

8.2.5 Conformación de la veeduría ciudadana (se debe realizar mediante una junta con los representantes de cada acción comunal o cada vereda).

La conformación de la veeduria ciudadana del corregimiento de Tilodiran se encuentra registrada en el informe de obra N°2 correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre 2023, y haciendo uso del articulo 161 de la ley 1757 del 2015 que se creó la veeduria bajo la resolución No. 122 de 14 de noviembre del presente año, se adjuntó el oficio de la ***CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA VER ANEXO INFORME No. 02.***

8.2.6 Buzón de sugerencias (implementarlos, registro fotográfico, lugar visible, formato para las sugerencias, quejas y reclamos).

Para este periodo ya se cuenta con el buzón de sugerencias, también, se encuentra el formato en fisico de PQRS medio por el cual pueden presentar su solicitud, el cual puede ser solicitado a la profesional social encargada de esta área.

Es importante resaltar que la empresa contratista Synergia Construcciones e Ingenieria S.A.S se da a conocer a la comunidad del área de influencia del proyecto, que la oficina del Contratista de la Obra desde el 1 de noviembre de 2023, se ubica

en el campamento, localizado en el corregimiento de Tilo del municipio de Yopal Casanare, en esta oficina se atenderán sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes- PQRS.

8.2.7 Como suministran la información a la comunidad, atención al usuario

Se hace cuando se realizan recorridos por los frentes de trabajo, la Profesional Social está dispuesta a escuchar a la persona que se acerca a solicitarle información, o también se desplaza hasta la vivienda donde es solicitada, además de que aún se encuentra el equipo de profesionales encargados del levantamiento de actas del sector, se le hace entrega copia del documento del acta de la vía a la Presidenta de la Junta de Acción Comunal y al Director de la Veeduría. ***VER ANEXO ITEM 8.6.4. ACTA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIA ALTERNA TRAFICO PESADO.***



IMAGEN 8.2.7 ENTREGA DE ACTA DE LA VIA RUTA ALTERNA PARA EL TRAFICO PESADO

8.2.9 Brigadas de orden, aseo y limpieza.

La empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S contara con un esquema de orden y aseo, para el manejo de los residuos sólidos convencionales para el manejo mediante la recolección en cada uno de los puntos de generación, tales como: oficina y frentes de obra. Los residuos sólidos ordinarios generados en la oficina son entregados al carro recolector de basuras frente a la misma.

8.2.10 Tener plan de emergencias

Dentro de los procesos de formación y capacitación la empresa contratista SYNERGIA S.A Construcciones e Ingeniería, cuenta con el plan de emergencia el cual se implementará de acuerdo a su necesidad, el plan de emergencia se encuentra registrado en el informe de obra No. 1.

Dentro de los procesos de formación y capacitación la empresa contratista SYNERGIA S.A CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA para el mes de junio realizó dos de las siguientes actividades ***SE ANEXA ÍTEM 8.6.5 PLANILLAS DE ASISTENCIA.***

- **Trabajo en Equipo**

El trabajo en equipo o trabajo cooperativo incluye aquellas **labores que se realizan de manera compartida y organizada,** en las que cada quien asume una parte y todos tienen el mismo objetivo en común. Se trata de **una forma de organización del trabajo basada en el compañerismo**, ya que el equipo debe asumir en conjunto y de manera articulada todas las tareas a realizar, y no simplemente repartirlas para luego juntarlas.

El trabajo en equipo fomenta un sentido de lealtad, seguridad y autoestima que satisface las necesidades individuales de los integrantes, valorando su pertenencia, esforzándose por mantener relaciones positivas dentro y fuera del equipo. Se transforma en un nuevo estilo de vida que involucra a los demás compañeros de trabajo e incluso a la familia.

Ventajas de Trabajar en Equipo

- ✓ Compartir situaciones de convivencia diaria y el desarrollo de las metas propuestas por la organización.
- ✓ Hablar de intereses comunes, aunar estrategias, metodologías, procedimientos y técnicas para el logro de los objetivos que se tienen en conjunto dentro de la empresa.
- ✓ Aumentar el sentido de pertenencia hacia el papel que los colaboradores se comprometen a realizar para lograr los objetivos que ayudan a crear.
- ✓ Contar con personas que se organizan para el logro de uno o varios objetivos en común, siendo factor clave en esta unión que los intereses y metas

personales sean compatibles con los objetivos del equipo y, por ende, de la organización.

- ✓ Con la unión de intereses del equipo se logran comportamientos que lo mantienen como un sistema social que busca evitar enfrentamientos emocionales y conflictos, favoreciendo las relaciones interpersonales y aportes para el trabajo a largo plazo.



IMAGEN 8.2.10 CHARLA SOCIAL TRABAJO EN EQUIPO

Respeto en el área laboral

El respeto en el ámbito laboral **crea un ambiente de seguridad y cordialidad**. Permite aceptar las limitaciones ajenas y reconocer sus virtudes; evita las ofensas y las ironías y no deja que la violencia o el abuso se conviertan en el medio para imponer criterios. **El respeto es un valor fundamental y básico para el desarrollo de relaciones saludables de cualquier tipo. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, respeto es atención, consideración, deferencia, eso quiere decir que se refiere a tomar en cuenta no sólo mis derechos, sino y de manera especial, los derechos del otro.**

El respeto en el ámbito laboral crea un ambiente de seguridad y cordialidad.

- Permite aceptar las limitaciones ajenas y reconocer sus virtudes; evita las ofensas y las ironías y no deja que la violencia o el abuso se conviertan en el medio para imponer criterios.
- Disminuye la tensión en lugares donde predomina la desconfianza, habita el egoísmo, la deslealtad, la arbitrariedad, la división, el chisme, los comentarios malintencionados y la agresión.

- Potencia la confianza, y esta última, es garantía de transparencia y buena comunicación. Aspectos fundamentales para trabajar a gusto y para crecer como persona, como empresa/organización y como sociedad en general.



IMAGEN 8.2.10.1 CHARLA SOCIAL TRABAJO EN EQUIPO

8.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Para el programa de atención al usuario se tendrá en cuenta en formato de PQRS que se utilizará durante todo el proyecto; además es una herramienta que permite conocer las inquietudes y manifestaciones que pueda tener la comunidad permitiendo de esta manera dar respuesta a la comunidad.

Para este periodo no se presentaron PQRS obtenidos durante este mes.

QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	OBSERVACIONES

8.4 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRÁMITE

Para este periodo no se presentaron PQRS por ende no se hace ninguna relación para su debido tramite.

FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVÍA	ASUNTO	SE LE DIO TRAMITE SI O NO	CUAL

8.5 INDICADORES

En este periodo aun no es posible realizar gráficas para medir información, posiblemente en los otros periodos ya que ya se contará con mayor información.

8.5.1 Interferencias presentadas durante el desarrollo de la obra

- ✓ **Accesibilidad a viviendas y negocios**

Durante el recorrido que se encuentra realizando el equipo profesional para el levantamiento de actas, a la fecha no se han presentado dificultades que no permitan avanzar con el proyecto, además de que se cuenta con las precauciones de bioseguridad para el ingreso a cada una de las viviendas, en algunos casos en donde no se ha logrado ingresar a las viviendas es porque el propietario no se encontraba en el corregimiento, también se a realizo recorridos por los frentes de trabajo para conocer si se evidencia o se identifica alguna inconformidad.

- ✓ **Daños a Edificaciones, Mobiliarios y Zonas Verdes**

Durante este periodo no se han presentado ningún daño que afecte a nivel personal.

- ✓ **Suspensión de Servicios Públicos**

Durante este periodo no se han suspendido los servicios públicos.

- ✓ **Trabajos Nocturnos**

No aplica, a la fecha no se han realizado ningún trabajo nocturno.

8.6 ANEXOS

8.6.1 OFICIO 1 DE JUNIO 2024

8.6.2 OFICIO 18 DE JUNIO 2024

8.6.3. OFICIO ENTREGA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIA ALTERNA TRAFICO PESADO

8.6.4 PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLA SOCIAL, TRABAJO EN EQUIPO, Y RESPETO EN EL AREA LABORAL.



MARÍA ANGÉLICA TRUJILLO DELGADO
PROFESIONAL ÁREA SOCIAL

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Es importante resaltar que en este periodo la comunidad de Tilodiran muestra una receptividad y comprende que los diferentes ruidos, maquinaria, polución entre otras son dificultades de paso para ingresar a sus viviendas, reconocen que esto solo es transitorio, y que les permite mejorar su calidad de vida.

- Es importante continuar realizando recomendaciones a la comunidad, en cuanto a: no permitir que los niños, niñas y adolescentes no se acerquen a los sitios donde se encuentran realizando los trabajos de obra, a fin de evitar cualquier accidente.

9. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

9.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de junio del 2024 se desarrollan las siguientes actividades que interfieran con el manejo de tránsito:

✓ Relleno con material seleccionado de la excavación compactado y crudo de rio, el material es transportado por las volquetas en los respectivos tramos que se requiere iniciar con los rellenos a las excavaciones.

✓ Excavación mecánica del cajón de la vía, que consiste en la remoción y corte de material de la rasante existente, para posteriormente compactar la subrasante. Este material es transportado por volquetas para su disposición final en el acopio aprobado por la supervisión.

✓ Se realiza la actividad de instalación de crudo de rio con su respectiva irrigación y compactación, El trasporte de este material pétreo se realiza en volquetas desde el centro de acopio a los diferentes tramos de vías.

✓ Transporte de material pétreo de punto de acopio a la zona de excavación en volquetas.

✓ Cargue de material crudo de rio, de la cantera al punto de acopio de material

✓ Transporte de material pétreo, vía pavimentada y destapada, los materiales pétreos están siendo adquiridos en las fuentes de materiales ubicadas en el corregimiento de morichal (PETREOS Y TRITURADOS) y PETRORIENTE (rio Cravo Sur).

9.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO

- **EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO,**
- **Excavación** mecánica de la vía, que consiste en la remoción y corte de material para posteriormente compactar, instalación de tubería, atraque y encamado de tubería.

para el atraque el material de base granular triturada, es transportado en volquetas del campamento a la obra.

para la ejecución de esta actividad es necesaria una controladora vial para que regule el tránsito en la vía, la llagada de las volquetas y la aproximación de las mismas a las maquinas, el tránsito peatonal de la comunidad.

Para esta actividad se requieren volquetas y retro excavadoras.

Esta actividad se realiza en los tramos del proyecto que se relacionan a continuación:

TRAMOS INTERVENIDOS ALCANTARILLADO SANITARIO

TRAMO	VIA INTERVENIDA	RUTA
TRAMO 52N	CLL 1 ENTRE CR 3 – CR 4	SALEN LAS VOLQUETAS POR CLL 1 HASTA CR 3 HACIA PUNTOS DE ACOPIO
TRAMO 26N	CLL 2 ENTRE CR 4 - CR 5	SALEN POR CR 5 HACIA PUNTOS DE ACOPIO



IMAGEN 71. VÍAS INTERVENIDAS INSTALACION DE SISTEMA SANITARIO

9.2.1 INSPECCIONES A VEHICULOS

- ✓ **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS**

Se realiza inspecciones pre - operacionales de los vehiculos y maquinaria que hacen parte directa del proyecto a diario, las volquetas doble troques, maquinara amarrilla y los

vehículos livianos, con el fin de evidenciar que estén en las mejores condiciones Mecánicas y documentación al dia, los conductores y operarios deben cumplir con el protocolo de bioseguridad, esta se evidencia dentro del preoperacional.

✓ **CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE VEHÍCULOS**

Dentro del procedimiento de inspecciones se diligencian los preoperacionales, se realiza el chequeo de documentación de los vehículos para constatar que estar en orden y como soporte se anexa la siguiente documentación.

Ver anexos
9.3.1 RELACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS
9.3.2 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS
9.3.3 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Cada mes se realiza verificación de la documentación de vehiculos y conductores de esta forma evidenciamos documentos vencidos, esta verificación se realiza en los siguientes documentos

Licencias de conducción

Durante el periodo del mes del 01 de junio al 30 de junio del 2024, las licencias de conducción de todos los conductores se encuentran vigentes.

Soat

para el periodo de del 01 de junio al 30 de junio del 2024, se encuentran vigentes los soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) de los vehículos utilizados en la ejecución del proyecto.

Revisiones técnico-mecánicas

para el periodo del 01 de junio al 30 de junio del 2024, se encuentran las técnico-mecánicas en todos los vehiculos vigentes.

Pólizas de responsabilidad civil

Para el periodo de del 01 de junio al 30 de junio del 2024, se encuentran vigentes las pólizas de responsabilidad civil extracontractual. De igual forma se encuentran vigentes las pólizas de responsabilidad civil de las volquetas deblotroques y demás vehiculos.

9.2.2 CAPACITACIONES DE SST

Durante este periodo, se realiza capacitación en **movilidad vial**, que incluye los temas como; ***(no exceder límites de velocidad, señalización vial visible en caso de presentarse algún evento, concentración en la tarea).*** esta actividad se realiza con todo el personal que presta el servicio para el proyecto.

Adicional en las charlas preoperacionales se les dan respectivas recomendaciones como los límites de velocidad, el uso del carpado, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, revisión de documentación.

se adjuntan planillas de asistencia, FOR-RH-001, ver anexo **9.3.4 PLANILLA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES.**



IMAGEN 73. CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PARA OPERADORES CONDUCTORES Y DEMAS PERSONAL DEL PROYECTO



IMAGEN 74. REGISTRO PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA

9.2.3 CONTROL DEL TRANSITO

Dando cumplimiento a lo establecido y aprobado en el PMT, las controladoras viales regulan el tránsito en los tramos intervenidos en el proyecto, en actividades como el ingreso y salida de las volquetas en las excavaciones en los diferentes frente de obra, centro de acopio y demás, en la movilización de maquinaria, en el descargue del material, los respectivos cierres de vías, la instalación de señales preventivas, con el fin de garantizar la seguridad de conductores, transeúntes y comunidad en general del Centro Poblado Tilodiran - Casanare.

PERMISO DE CIERRE planeación municipal de tilodiran Casanare entrega permiso durante el periodo de la obra para el cierre de vías a intervenir.

Durante el periodo de noviembre, se realizan movimentos internos y traslados de la maquinaria amrarilla,en camabaja y con la controladora vial.



IMAGEN 75. CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR

Los traslados de la maquinaria en la parte interna de la obra se realizan con dos controladoras viales y vehiculo escolta cuando la movilidad es más de 4 cuadras adicional se hace uso de la cama baja si el movimiento de la maquinaria es por vias principales o a larga distancia en las vías internas.




IMAGEN 76. TRANSLADO DE MAQUINARIA AMARILLA

- ***IRRIGACION DE VIAS***
  Debido al tránsito vehicular se debe irrigar las vias en la mañana y en la tarde para evitar y cumplir con los compromisos con la comunidad.




IMAGEN 77. IRRIGACION DE VIAS

9.2.4 INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA

Se instala señalización de aproximación preventiva e informativa, sobre las Calles y Carreras a la variante de acuerdo a las indicaciones dadas en el plan de manejo de tránsito y la ubicación, adicional las vias donde se pueden transitar, en los diferentes cierres se instalan las señales de desvió indicando la ruta a tomar.

Señalización informativa de aproximación: en el proyecto se utilizan señales como; Vía Cerrada, Desvió, a un solo carril, Maquinaria en la Via, Obreros en la vía, Excavaciones Profundas, Barreras Plásticas (Maletines), Delineadores tubulares, cinta plástica y lona de peligro.



78. REGISTRO DE SEÑALIZACIÓN VIAS INTERVENIDAS

9.3 ANEXOS

9.3.1 RELACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS
9.3.2 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS
9.3.3 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS
9.3.4 PLANILLA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES.
9.3.5 PLANILLA PAGO DE NOMINA A CONTROLADORES VIALES.
9.3.6 PERMISO CIERRE TEMPORAL DE VIAS

VER ANEXOS DEL CAPITULO 9 ENTRE LAS PAGINAS _____ - _____

✓ Como empresa seguimos informando a la comunidad sobre los avances y dificultades que se han presentado en la ejecución del proyecto, así como los trabajos que se van realizando en cada tramo con su respectiva socialización, igualmente la empresa siempre está en la disposición de atender cualquier inquietud que la comunidad presente a través de los profesionales que se encuentran en campo.

✓ Todos los días se realiza inspección y verificación del correcto estado en la señalización; se socializa con la comunidad para que tengan en cuenta el riesgo que se tiene al no respetar las señalizaciones que se dejan en los frentes de trabajo y el no hacer uso de los pasos peatonales que se habilitan.

✓ Es importante mencionar, que se cuenta con la señalización respectiva en las vías intervenidas, los respectivos cerramientos en las áreas de excavaciones profundas haciendo uso de la lona, cinta peligro durante el día y la noche, la instalación de señales informativas y preventivas, las cuales evitan de esta manera la generación de accidentes de tránsito y peatones.

✓ Por seguridad para la comunidad se les ha venido haciendo la recomendación o sugerencia del uso de vías alternas que se encuentran en buenas condiciones las cuales son una alternativa, mientras se realizan las actividades en las zonas de ejecución del proyecto.

✓ Los conductores realizan las inspecciones de los vehículos a diario, realizan el carpado mientras realizan el transporte del material del punto donde se carga hasta el punto que lo descargan y se puede evidenciar que respetan el límite de velocidad permitido en el área urbana y rural.

1.4.1 ACTA DE REPROGRAMACIÓN

acuatodos s.a. E.S.P.

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	032 DE 2023
	20	6	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal en los descentralizados)

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 032 DE 2023 **PROGRAMACIÓN INICIAL** ☐ **REPROGRAMACIÓN** ☑

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILCODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
INTERVENTOR	CONSINTER DEL ORIENTE E.U. - RL **JOSE NICOLAS ROSO BERNAL**
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
APOYO A LA SUPERVISION	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS**
CONTRATANTE	GERENTE GENERAL (E) "ACUATODOS S.A. E.S.P" - **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios	$ 945.980.168,40	4,86%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 8.070.157.242,20	41,47%
3	Transporte de materiales	$ 5.664.950.421,00	29,11%
4	Maquinaria y equipos	$ 1.945.980.168,60	10,00%
5	Contratos de Mano de obra	$ 1.859.743.599,80	9,56%
6	Contribución seguridad 5% democratica	$ 972.990.084,00	5,00%
		$ 19.459.801.684,00	**100,00%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Sólo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos
c) El Anticipo a Entregar es equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato

(Firma) _____
(Nombre) MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
(Rl Legal) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

(Firma) Nicolas Roso
(Nombre) JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
(Rl Legal) CONSINTER DEL ORIENTE E.U
Interventor

(Firma) _____
(Nombre) JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
(Rl Legal) Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma) Yudith Sánchez.
(Nombre) YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS
(Rl Legal) Profesional de apoyo a la supervisión

(Firma) _____
(Nombre) N/A
(Rl Legal)

(Firma) _____
(Nombre) JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
(Rl Legal) Gerente General (E) "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Resolución No. 100.6.4.54 16 de mayo de 2024
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1ra copia: Interventor
2da copia: Contratista
3ra copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

Powered by CamScanner

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Obra No. 032 de 2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
20 / 06 / 2024	2:30 pm	3:30pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Sala de juntas ACUATODOS SA ESP.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	María Diomy Barrera Alfonso	Representante Legal Obra	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S
2	José Nicolas Roso Bernal	Representante Legal Interventoría	CONSINTER DEL ORIENTE E.U.
3	Julio Cesar Cuevas	Subgerente técnico y Operativo	ACUATODOS S.A. E.S.P.
4	Yudith Yajaira Sánchez Riveros	Profesional de apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.

Powered by CamScanner

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Aprobación Reprogramación del Plan de inversión de Anticipo

ORDEN DEL DÍA
• Presentación de los participantes. • Análisis solicitud de Reprogramación del Plan de Inversión de Anticipo • Conclusiones

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Yopal – Departamento de Casanare, a los veinte (20) días del mes de junio de 2024, se reunieron JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, identificado con cédula de Ciudadanía No. 86.085.437 expedida en Villavicencio, Gerente General (E) "ACUATODOS S.A. E.S.P.", Resolución No. 100.6.4.64 16 de mayo de 2024 y Subgerente Técnico y Operativo, en calidad de SUPERVISOR, MARÍA DIOMY BARRERA ALFONSO, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, representante legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S, con Nit. 844.004.840-0, quien actúa en calidad de CONTRATISTA, JOSE NICOLAS ROSO BERNAL, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.432.549 expedida en Yopal, representante legal de CONSINTER DEL ORIENTE E.U., con Nit. 900.326.145-4, quien actúa en calidad de INTERVENTOR, YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS, identificada con cédula de ciudadanía 47.437.055 expedida en Yopal, quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión, con el fin de hacer revisión de la solicitud de aprobación de la reprogramación del plan de inversión del anticipo presentada por la interventoría mediante oficio 0623 de fecha 05 de junio de 2024.

La Interventoría inicia la intervención manifestando que de acuerdo a solicitud del contratista de obra de fecha 05 de junio de 2024, donde solicitan la evaluación y aprobación de la reprogramación del plan de inversión del anticipo basada en:

- Incluir en el valor los descuentos de ley realizados al desembolso del anticipo, relacionados como Contribución seguridad 5% democrática, debido a esto, se disminuyen los valores asignados a los ítems de pago de salarios, maquinaria y equipos y contratos de mano de obra.
- Debido a la evolución en la ejecución del proyecto, se hace necesario, la variación en los porcentajes del plan de inversión del anticipo inicial, particularmente en los ítems de compra de materiales y accesorios, y transporte de materiales, ya que de acuerdo a la inversión realizada en el proyecto se ha evidenciado que estos ítems son los más representativos, como es el caso de la tubería para la red de saneamiento básico, es por esto que, se requiere el incremento de estos ítems en el plan de inversión, como consecuencia, se disminuyen los valores asignados a los ítems de pago de salarios, maquinaria y equipos y contratos de mano de obra.

Cabe aclarar que, a la fecha, el anticipo se han autorizado pagos de proveedores y demás hasta el porcentaje de 89%, y este no afecta los ítems del plan de inversión del anticipo en su totalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza por parte de la supervisión la reprogramación del plan de inversión del anticipo avalada por la interventoría y se suscribe la correspondiente acta.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Powered by CamScanner

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yaira Diomy Barrio Alfonso	R/Legal	
Nicolas Rojo	R/Legal.	Nicolas Rojo
Yudelly Pajaro Sanchez	Ref. Apoyo Supervisor Acuatodos SA ESP	Yud. Y Sánchez
Julio Cesar Cuellas S	ACUATODOS GERENTE(E)	

Powered by CamScanner

4.8 ANEXOS
4.8.1 CERTIFICACIÓN BANCARIA

Medellín, 6 de octubre de 2023

Señores
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P
Ciudad

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que **FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** realizó ante Bancolombia S.A. la constitución de la **Cuenta de Ahorros No.62900004849** denominada **P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S 032** identificada con el **NIT 830054539**, el 6 de octubre de 2023.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, DANIELA FIGUEROA LONDOÑO Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida

Cordialmente,

Victor Paul Alvarez Sanchez
Jefe de Sección
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

4.8.2 EXTRACTO BANCARIO CUENTA N° 629-000048-49

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tus ahorros | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

Tilo

SEÑOR (A)

P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/05/31 HASTA 2024/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-49
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,734,245,046.34	***SALDO PROMEDIO***	$	2,482,536,803
TOTAL ABONOS	$	2,956,914.67	***CUENTAS X COBRAR***	$	.00
TOTAL CARGOS	$	594,702,131.19	***VALOR INTERESES***	$	883,914.67
SALDO ACTUAL	$	2,142,499,829.82	***RETEFUENTE***	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			134,542.30	2,734,379,588.64
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			33,617.86	2,734,413,206.50
5/06	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-1,517,751.00	2,732,895,455.50
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,071.00	2,732,889,384.50
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-290,902.08	2,732,599,482.42
6/06	PAGO A PROVE PETREOS Y TRITU			-72,725,521.00	2,659,872,961.42
18/06	ABONO INTERESES AHORROS			425,392.39	2,660,298,353.81
19/06	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		2,073,000.00	2,662,371,353.81
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			32,750.81	2,662,404,104.62
20/06	PAGO A PROV SYNERGIA CONSTRUCC			-518,089,528.00	2,144,314,576.62
20/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,072,358.11	2,142,242,218.51
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			257,611.31	2,142,499,829.82
	FIN ESTADO CUENTA				

4.8.3 ÓRDENES DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)			Nº DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	2	4	2024	22	MIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 1.447.730.969,00	$ 0,00	$ 1.447.730.969,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15690	P.A ART SYNERGIA CONS E INGENIERIA SAS ESP	62900004848	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
900361915-7	NIT	TRANSPORT AMERICAN DIESEL SAS	505844631	Corriente	Banco de Occidente	$ 1.447.730.969,00	$ -	$ 1.447.730.969,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CLL 11 21-78	[redacted]		3142982078	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSION	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
2	N.A.	N.A.	027	MIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERAN
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: (i) que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento, y (ii) que he dado cumplimiento a los disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (las aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas	DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

Consinter del Oriente

NIT 900.326.145-4

Yopal 02 de Abril del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16690 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 032

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°22, asi:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD 36	2/04/2024	$ 1.447.730.969,00
TOTAL ITEM 02					$ 1.447.730.969,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 1.447.730.969,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°2 - compra de materiales y accesorios, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

Nicolas Roso

JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
C.C No. 9.432.549
R.L. CONSINTER DEL ORIENTE
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°22					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 02/04/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 032			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN MINEDI S.A.S	FETD 36	2/04/2024	$ 1.447.730.969,00
TOTAL ITEM 02					$ 1.447.730.969,00
VALOR TOTAL DE ITEMS				$	1.447.730.969,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

Nicolas Rojo

R/L CONSINTER DEL ORIENTE E.U

El interventor certifica que revisó los items/rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversión del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°22 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD 36	2/04/2024	$ 1.447.730.969,00
TOTAL				**$ 1.447.730.969,00**

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

NIT. 844.004.643-0

ORDEN DE COMPRA PROYECTO MUNICIPIO DE YOPAL-TILODIRAN

ORDEN DE COMPRA No 002

FECHA:	2-abr-24
COMPRADOR:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
DIRECCION DESPACHO:	CALLE 30 N 28-46 TEL: XXXXXXX
OBRA:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROVEEDOR:	TRANSPORT AMERICAN DIESEL S.A.S	CORREO ELECTRONICO	
IDENTIFICACION:	900381113-7	ENTREGA	
DIRECCION:	CALLE 39 No 24-02	LUGAR DE ENTREGA	
TELEFONO:	6327178		
CONTACTO VENTAS:			

ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE TUBERIA

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UND	PRECIO UNIT	%/ CON DCTO	VALOR TOTAL
1	TUBERIA NOVALOC DE 60" INCLUYE UNION EN TUBO DD AM	1038	ML	$ 3.814.712,00		$ 3.948.271.056,00
2	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 8"	220	ML	$ 46.101,00		$ 10.212.422,00
3	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 10"	168	ML	$ 67.374,00		$ 11.318.832,00
4	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 12"	812	ML	$ 98.556,00		$ 80.017.488,00
5	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 8"	1280	ML	$ 31.911,00		$ 40.781.160,00
6	SILLA YEE PVC 8"6	28	UND	$ 120.933,00		$ 3.507.057,00
7	SILLA YEE PVC 12"8	100	UND	$ 208.334,00		$ 20.833.400,00
8	SILLA YEE PVC 10"8	30	UND	$ 135.264,00		$ 4.057.920,00
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL					$ -
	DESCUENTO				0	$ 3.809.999.343,0
	IVA	19%				
	TRANSPORTE					$ 723.930.875,17
	RETENCION FUENTE	2,5%				
	VALOR TOTAL					$ 95.202.483,58
						$ 4.428.439.734,60

SON: ——— PESOS M/CTE ———

OBSERVACIONES: LA FORMA DE PAGO SERA EL 50% DE ANTICIPO Y EL OTRO 50 % RESTANTE A CONTRA ENTREGA

MARIA JACKY BARRERA ALFONSO
RS- SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA



TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.
NIT 900.361.915-7
Casanare
Tel: (01) 3175010010
Yopal - Colombia
transportamericandihedi@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FETD 36

Señores	Synergia Construcciones e Ingeniería S.A.S.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(038) 6327178	**Generación**	02/04/2024, 11:21
Dirección	CL 38 N° 24 - 82	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	02/04/2024, 11:22
				Vencimiento	02/04/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Reta.	Impto. Reta.
1	TUBERIA NOVALOC DE 60 INCLUYE UNION DE TUBO ORDEN DE PEDIDO NO. 02	356.00	1,457,691,694.88	31,280,936.80	2.5 %

Total Items: 1

Valor en Letras:
Mil cuatrocientos cincuenta millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos treinta pesos m/cte con cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,450,184,230.05

Total Bruto	1,251,237,472.00
IVA 19%	237,735,119.68
ReteFuente 2.5%	31,280,936.80
ReteICA 6	7,507,424.83
Total a Pagar	1,450,184,230.05

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS No. 409062437 A NOMBRE DE TRANSPOR AMERICAN DIHEDI SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046937174 aprobado en 20230525 prefijo FETD desde el número 11 al 50 Vigencia: 12 Meses.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4663. Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 0.006
CUFE: d601ad885ef0b7a3dba3185ead4d5044d1e13bd5220b0270834575d5f0c1ad8e6f8e7201404bbe8beddb73edd6fcf12

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)	NO DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Ypiel	8 / 4 / 2024	23	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 251.126.948,00	$ 0,00	$ 251.126.948,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16690	P.A ANT SYNERGIA CONS E INGENIERIA SAS ESP	63900004943	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
79793440	NIT	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	409047602	Corriente	Banco de Bogotá	$ 251.126.948,00	$ -	$ 251.126.948,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CLL 30 26 49	[redacted]		3142952078	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSION	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
4	N.A.	N.A.	027	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN, RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: Q ue cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y (i) que los datos cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

ConsinTer del Oriente

NIT 900.326.145-4

Yopal 08 de Abril del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16690 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 032

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°23, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 360	2/04/2024	$ 251.126.948,00
TOTAL ÍTEM 04					$ 251.126.948,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 251.126.948,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°4 - alquiler de maquinaria y equipos, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

Nicolas Roso

JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
C.C No. 9.432.549
R.L. CONSINTER DEL ORIENTE
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°23					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 08/04/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 032			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 360	2/04/2024	$ 251.126.948,00
TOTAL ITEM 04					$ 251.126.948,00
VALOR TOTAL DE ITEMS					$ 251.126.948,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Nicolas Rojo

R/L CONSINTER DEL ORIENTE E.U

El interventor certifica que revisó los items/rubros aquí ordenados que correspondan a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.
Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°23 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 360	2/04/2024	$ 251.126.948,00
TOTAL				**$ 251.126.948,00**

DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
NIT 79.793.440-7
CLL 30 28-48 CASA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Tel: (035) 6343852
Yopal - Colombia
diegodiaz4545@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. D 360

				Fecha y hora Factura	
Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			Generación	02/04/2024, 09:58
NIT	844.004.840-0	Teléfono	(038) 6327178 - Ext. 0	Expedición	02/04/2024, 09:58
Dirección	CALLE 30 28 48	Ciudad	Yopal - Colombia	Vencimiento	02/04/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Reta.
1	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROYECTO DE TILODIRAN	720.00	651,303,298.80	107,140,802.40	19,736,463.60

Total Items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y un millones trescientos tres mil doscientos noventa y ocho pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 651,303,298.80

Total Bruto	563,898,960.00
IVA 19%	107,140,802.40
Retefuente 3.5%	19,736,463.60
Total a Pagar	651,303,298.80

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta corriente No. 409047602 del Banco Bogotá a nombre de Diego Hernando Diaz Castelblanco

FAVOR AMORTIZAR EL VALOR DE $335.520.000 DE ESTA FACTURA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización 18764866877531 aprobado en 20240215 prefija D desde el numero 358 al 592 vigencia 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 0.004
CUFE: e6bddd010e8532188a71c15c1042f50dcc6925d8e81e8b83e53d0f3585f0482b5f642586d44d0f1f0b3aec2120a66534e6282

Autorizo Telefonos y Firmas Electrónicas Yopal SAS - Habilitación DIAN Prestador Software Cajas Radio Transmisión en Frecuencia

SYNERGIA

CONTRATO No. 02 -2023 DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO.

Entre los suscritos a saber: **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS, NIT:844.004.840-0** domiciliado en la ciudad de Yopal, representado legalmente por MARÍA DIOMY BARRERA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado con la cédula de ciudadanía No 47.436.168 expedida en la ciudad de Yopal, actuando conforme a la Ley y en armonía con los estatutos de la misma, por una parte y quien en adelante se denominará el TOMADOR, y DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.793.440 de Bogotá, quien en adelante se denominará EL DADOR, hemos acordado celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EL DADOR, se compromete a suministrar al TOMADOR el alquiler de:

EQUIPO	CANTIDAD EQUIPOS	HR	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
RETROEXCAVADORA	6	1664	$ 233.000	$ 2.326.272.000

SEGUNDA: UBICACIÓN: La maquinaria y/o equipo suministrado por el DADOR será ubicado por el TOMADOR en (el corregimiento de Tilodiran Municipio de Yopal , departamento de Casanare) Para el contrato que tiene por objeto: **CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

TERCERA VALOR: EL valor total del presente contrato es la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M.CTE ($2.326.272.000)** incluido impuestos, tasas y contribuciones. PARAGRAFO: El contrato se pacta por el sistema de: hora trabajada y se tendrá un stambay de 5 horas diarias por cada máquina sino se realiza ninguna actividad, EL TOMADOR no atenderá reclamos de solicitudes de reajuste efectuados por el DADOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueron previsibles al momento de presentación de su oferta. Cualquier actividad que se realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del DADOR de manera que EL TOMADOR estará exento de reconocer valores adicionales por tal concepto. CUARTA RESPONSABILIDAD EL DADOR entregará la maquinaria y/o equipo en condiciones óptimas de mantenimiento y uso haciéndose responsable por cualquier deterioro o daño que se presentará por esta causa. FORMA

SYNERGIA

DE PAGO: EL TOMADOR, pagará al DADOR la suma de **NOVECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M.CTE. ($930.508.800)** de anticipo que equivale al 40% del contrato y el saldo se harán con cortes mensuales y se va amortizando el 40% del anticipo. PARAGRAFO PRIMERO: EL TOMADOR realizará los pagos dentro de los 10 días calendarios siguientes a las fechas de radicación de las cuentas. PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del primer desembolso, el DADOR deberá informar el régimen Tributario en el cual se encuentra inscrito, así como el número de inscripción del REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) anexar copia de esta inscripción, con fecha de expedición no mayor de cuatro (5) meses a la fecha de entrega del documento. QUINTA: PLAZO Y ENTREGA. El alquiler de la maquinaria y equipo descrito en el objeto del presente contrato, será por el término de (5) meses, contados a partir de 19 de Octubre de 2023 SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL DADOR: se compromete a: - 1) cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, suministrando la maquinaria y equipo acordado en óptimas condiciones de funcionamiento. –2) realizar todas las pruebas requeridas, corregirlas si es caso hasta entrega a satisfacción de la maquinaria y equipo – 3) suministrar en excelente estado todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios"– OBLIGACIONES DEL TOMADOR: - 1) pagar al DADOR, en los plazos y términos previstos en el presente contrato. –2) formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato siempre enmarcadas en el termino del mismo. 3). Utilizar personal idóneo para el manejo de la maquinaria y equipos suministrado SEPTIMA: SUSPENSIÓN. Cuando se presenten circunstancias de Fuerza mayor o Caso Fortuito, podrán de común acuerdo entre las partes, suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción del acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. PARAGRAFO. - OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA: Con la suscripción del presente contrato el DADOR autoriza expresamente al TOMADOR para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al DADOR en los siguientes eventos: A) cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo disponga. B). cuando el DADOR, sin aducir causa que lo justifique se abstenga de entregar al TOMADOR la maquinaria y equipo para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello. C) cuando del incumplimiento de las obligaciones del DADOR se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato. D) si supeditadas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL DADOR no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión. E) cuando el DADOR no suministre la maquinaria y equipo descrito, sin acuerdo o autorización previa y escrita del TOMADOR. PARAGRAFO: Así mismo, las partes acuerdan que el contrato se dará anticipadamente por terminado a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita y de ser el caso sin el perjuicio de lo anterior las partes suscribirán un acta de liquidación, en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. 1)En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones el DADOR cancelará al TOMADOR por cada día de retraso, en el suministro de la maquinaria y equipo objeto del presente

159

SYNERGIA

contrato, el 1.0% del valor total del mismo, PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que el DADOR cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que EL TOMADOR lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al contratista dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. PARAGRAFO

SEGUNDO: El DADOR autoriza al TOMADOR para descontar las sumas que le adeude por los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. DECIMA: 2). En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del DADOR, el TOMADOR podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL TOMADOR pueda solicitar al DADOR la totalidad del valor los perjuicios causados en lo que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria. DECIMA: CESION. Este contrato se celebra en consideración a la calidad del DADOR y no podrá cederlo ni en todo ni en parte a ningún titulo sin el consentimiento expreso, previo y escrito del TOMADOR. DECIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: el presente contrato se perfecciona con la firma de la parte.

Razón por la cual no se podrá iniciar ninguna labor sin el perfeccionamiento de este documento En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Yopal a los 19 días del mes de octubre de 2023

EL TOMADOR

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO

C,c No. 47.436.168 Yopal
R/L SYNERGIA SAS

EL DADOR

DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
C.C 79.793.440 de Bogotá.

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	13	4	2024	24	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 139.992.211,00	$ 0,00	$ 139.992.211,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16690	P.A PAT SYNERGIA CONS E INGENIERIA SAS ESP	62900004849	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840-0	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	646486733	Corriente	Banco de Bogotá	$ 139.992.211,00	$	$ 139.992.211,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CLL 30 28 48	[illegible]	6327178	3178560362	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
3	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
5	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: El que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea comprada para los finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y El que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas

DATOS A DILIGENCIAR POR LA PERSONA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°24					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 13/04/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 032			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	NÓMINA MES FEBRERO 2024	NOM FEB 2024	29/02/2024	$ 63.291.495,00
1	PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2024	9464082040	29/02/2024	$ 35.169.400,00
TOTAL ITEM 01					$ 98.460.895,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA	FERR 3502	26/03/2024	$ 10.000.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	JAIME ALEXANDER MARIÑO CHAPARRO	CCOBRO JAIME	31/03/2024	$ 6.831.000,00
TOTAL ITEM 03					$ 16.831.000,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	PÉTREOS Y OBRAS KAFOR S.A.S	FEPK 151	4/04/2024	$ 24.700.316,00
TOTAL ITEM 05					$ 24.700.316,00
VALOR TOTAL DE ITEMS				$	139.992.211,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Nicolas Rozo

R/L CONSINTER DEL ORIENTE E.U

El interventor certifica que revisó los items/rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversión del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

Consinter del Oriente

NIT 900.326.145-4

Yopal 13 de Abril del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16690 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 032

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°24, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
1	PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	NÓMINA MES FEBRERO 2024	NOM FEB 2024	29/02/2024	$ 63.291.495,00
1	PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2024	9464082040	29/02/2024	$ 35.169.400,00
TOTAL ITEM 01					$ 98.460.895,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA	FERR 3502	26/03/2024	$ 10.000.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	JAIME ALEXANDER MARIÑO CHAPARRO	CCOBRO JAIME	31/03/2024	$ 6.831.000,00
TOTAL ITEM 03					$ 16.831.000,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	PÉTREOS Y OBRAS KAFOR S.A.S	FEPK 151	4/04/2024	$ 24.700.316,00
TOTAL ITEM 05					$ 24.700.316,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 139.992.211,00**


Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°1, N°3 y N°5 - Pago de salarios y mano de obra, transporte de materiales pétreos, contratos de mano de obra respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

Nicolas Roso

JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
C.C No. 9.432.549
R.L. CONSINTER DEL ORIENTE
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°24 - PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	NÓMINA MES FEBRERO 2024	NOM FEB 2024	29/02/2024	$ 63.291.495,00
PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2024	9464082040	29/02/2024	$ 35.169.400,00
TOTAL				**$ 98.460.895,00**

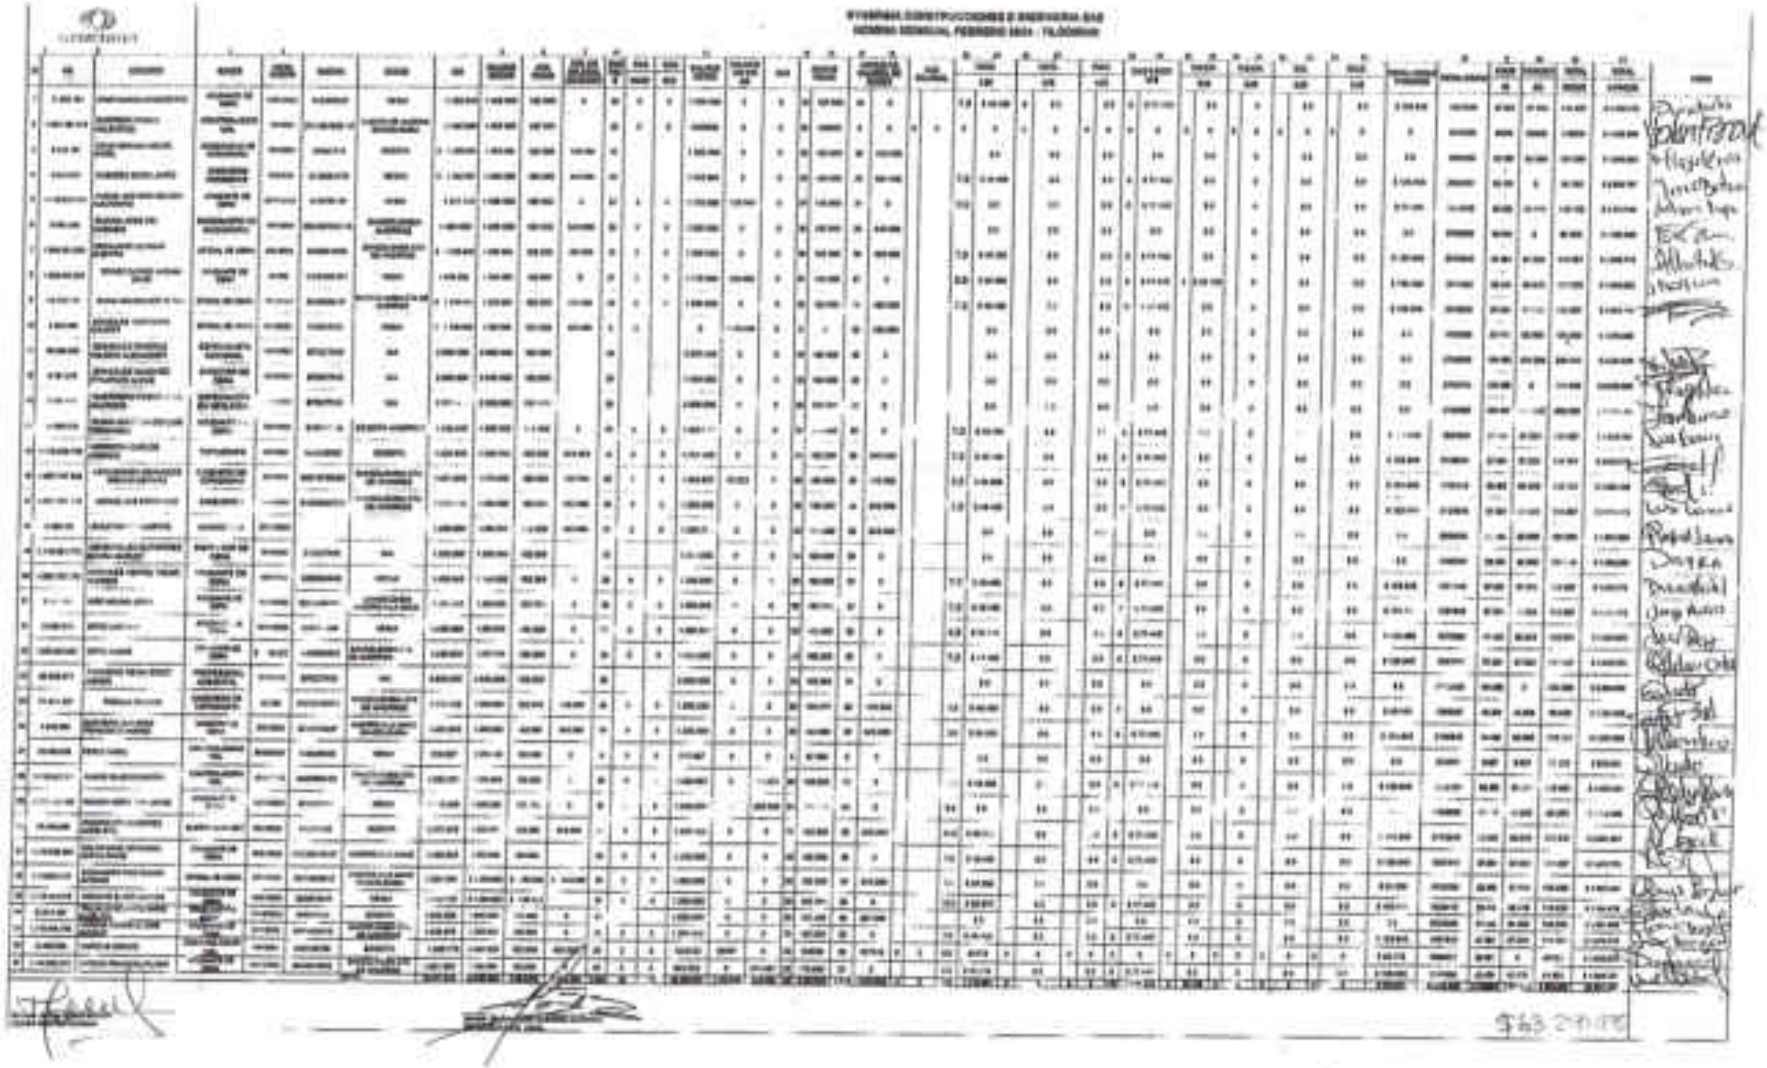

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 845004040	0	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	946408040	946408040	E	2024/03/11	2024/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$35,169,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				HOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL YOPAL (64 Afiliados)							$151,140,171	$18,096,100			$17,373,231	$4,127,100			$17,430,918	$4,127,100			$151,133,171		$17,096,400		$181,167	$17,000		$39,447,900
Centro de Trabajo: GIRICUÍ 6.98 (4 Afiliados)							$4,127,481	$660,600			$1,604,148	$184,400			$4,560,814	$182,600			$4,604,148		$217,600		$0	$0		$1,245,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)							$4,127,481	$660,600			$1,604,148	$184,400			$4,560,814	$182,600			$4,604,148		$217,600		$0	$0		$1,245,200
1	CC	9415787	CRUZ MIGUEL		13030	30	$1,300,000	$208,000	46400	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	4582951829	ESCALANTE ALBERTO	X	13030	30	$1,425,840	$228,100	PS04	30	$1,425,840	$57,100	CCF40	30	$1,425,840	$57,100	14-23	30	$1,425,840	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,700
3	CC	1057147536	LESBYDAMEN SIMIAN	X	13030	1	$43,334	$7,000	PS23	1	$43,334	$1,800	CCF40	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$8,800
4	CC	1057147536	LESBYDAMEN SIMIAN	X	13030	29	$1,256,507	$217,400	PS23	29	$1,256,507	$54,400	CCF40	29	$1,256,507	$54,400	14-23	29	$1,256,507	6.960%	$94,600	29	$0	$0	SI	$420,800
5	CC	23140571	MELO ALEXA	X		0	$0	$0	PS23	11	$476,667	$19,100	CCF40	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	SI	$71,400
Centro de Trabajo: TRINIDAD (1 Afiliados)							$0	$0			$173,334	$7,000			$154,667	$6,200			$173,334		$13,100		$0	$0		$26,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$0	$0			$173,334	$7,000			$154,667	$6,200			$173,334		$13,100		$0	$0		$26,300
6	CC	3167895	MEJIA AYDOLFO	X		0	$0	$0	PS23	4	$173,334	$7,000	CCF40	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$25,300
Centro de Trabajo: YOPAL 0.523 (3 Afiliados)							$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000		$21,000		$0	$0		$993,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)							$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000		$21,000		$0	$0		$993,000
7	CC	4743016	BARRERA Wolfo		13030	30	$1,300,000	$208,000	PS07	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$118,800
8	CC	1118900332	BARRERA WARTIN		13030	30	$1,300,000	$208,000	PS05	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$118,800
9	CC	1007854362	CASTRO CRISTHIAN		23-14	30	$1,450,000	$232,000	PS23	30	$1,450,000	$58,000	CCF40	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$255,600
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (76 Afiliados)							$97,767,890	$15,590,700			$107,505,845	$4,270,800			$105,735,417	$4,176,500			$107,505,845		$7,259,800		$346,667	$17,000		$31,217,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (76 Afiliados)							$97,767,890	$15,590,700			$107,505,845	$4,270,800			$105,735,417	$4,176,500			$107,505,845		$7,259,800		$346,667	$17,000		$31,217,200
10	CC	7484983	AGUDELO PALLARES	X	13030	30	$1,324,200	$211,900	PS07	30	$1,324,200	$53,000	CCF40	30	$1,324,200	$53,000	14-23	30	$1,324,200	6.960%	$92,200	30	$0	$0	SI	$410,100
11	CC	9532958	ALFONSO Hernan	X	13030	30	$1,425,840	$228,100	PS05	30	$1,425,840	$57,100	CCF40	30	$1,425,840	$57,100	14-23	30	$1,425,840	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,700
12	CC	1120327987	AREVA SHIRLEY	X	13030	30	$1,425,840	$228,100	PS23	30	$1,425,840	$57,100	CCF40	30	$1,425,840	$57,100	14-23	30	$1,425,840	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,700
13	CC	1006489561	AVILA CARLOS	X	13030	30	$1,324,200	$211,900	PS23	30	$1,324,200	$53,000	CCF40	30	$1,324,200	$53,000	14-23	30	$1,324,200	6.960%	$92,200	30	$0	$0	SI	$410,100
14	CC	1057187019	BARRERA PAULA		23030	30	$1,450,000	$232,000	PS05	30	$1,450,000	$58,000	CCF40	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
15	CC	4744878	BERNAL Wolfo	X	23030	30	$1,600,000	$256,000	PS05	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
16	CC	1057157567	BERNAL YULIDA		23030	30	$1,450,000	$232,000	PS05	30	$1,450,000	$58,000	CCF40	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
17	CC	7484818	BOHORQUEZ JOSE	X X	13030	18	$2,155,670	$345,800	PS23	18	$2,155,670	$86,300	CCF40	18	$2,136,410	$85,500	14-23	18	$2,155,670	6.960%	$150,100	18	$0	$0	SI	$667,900
18	CC	1006450591	BURGOS RONEY	X	13030	1	$43,334	$5,300	PS23	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
19	CC	1006450591	BURGOS RONEY	X	13030	1	$43,334	$5,300	PS23	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
20	CC	1006450591	BURGOS RONEY	X	13030	2	$86,667	$10,500	PS23	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
21	CC	1006450591	BURGOS RONEY		13030	26	$1,126,667	$180,200	PS23	26	$1,126,667	$45,100	CCF40	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	6.960%	$78,300	26	$0	$0	SI	$349,000
22	CC	1118539193	CASILLO ALEXIS	X	13030	2	$86,667	$10,500	PS23	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
23	CC	1118539193	CASILLO ALEXIS	X	13030	4	$173,334	$21,000	PS23	4	$173,334	$0	CCF40	4	$173,334	$0	14-23	4	$173,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$21,000
24	CC	1118539193	CASILLO ALEXIS	X	13030	24	$1,064,200	$170,300	PS23	24	$1,064,200	$42,600	CCF40	24	$1,064,200	$42,600	14-23	24	$1,064,200	6.960%	$74,100	24	$0	$0	SI	$329,000

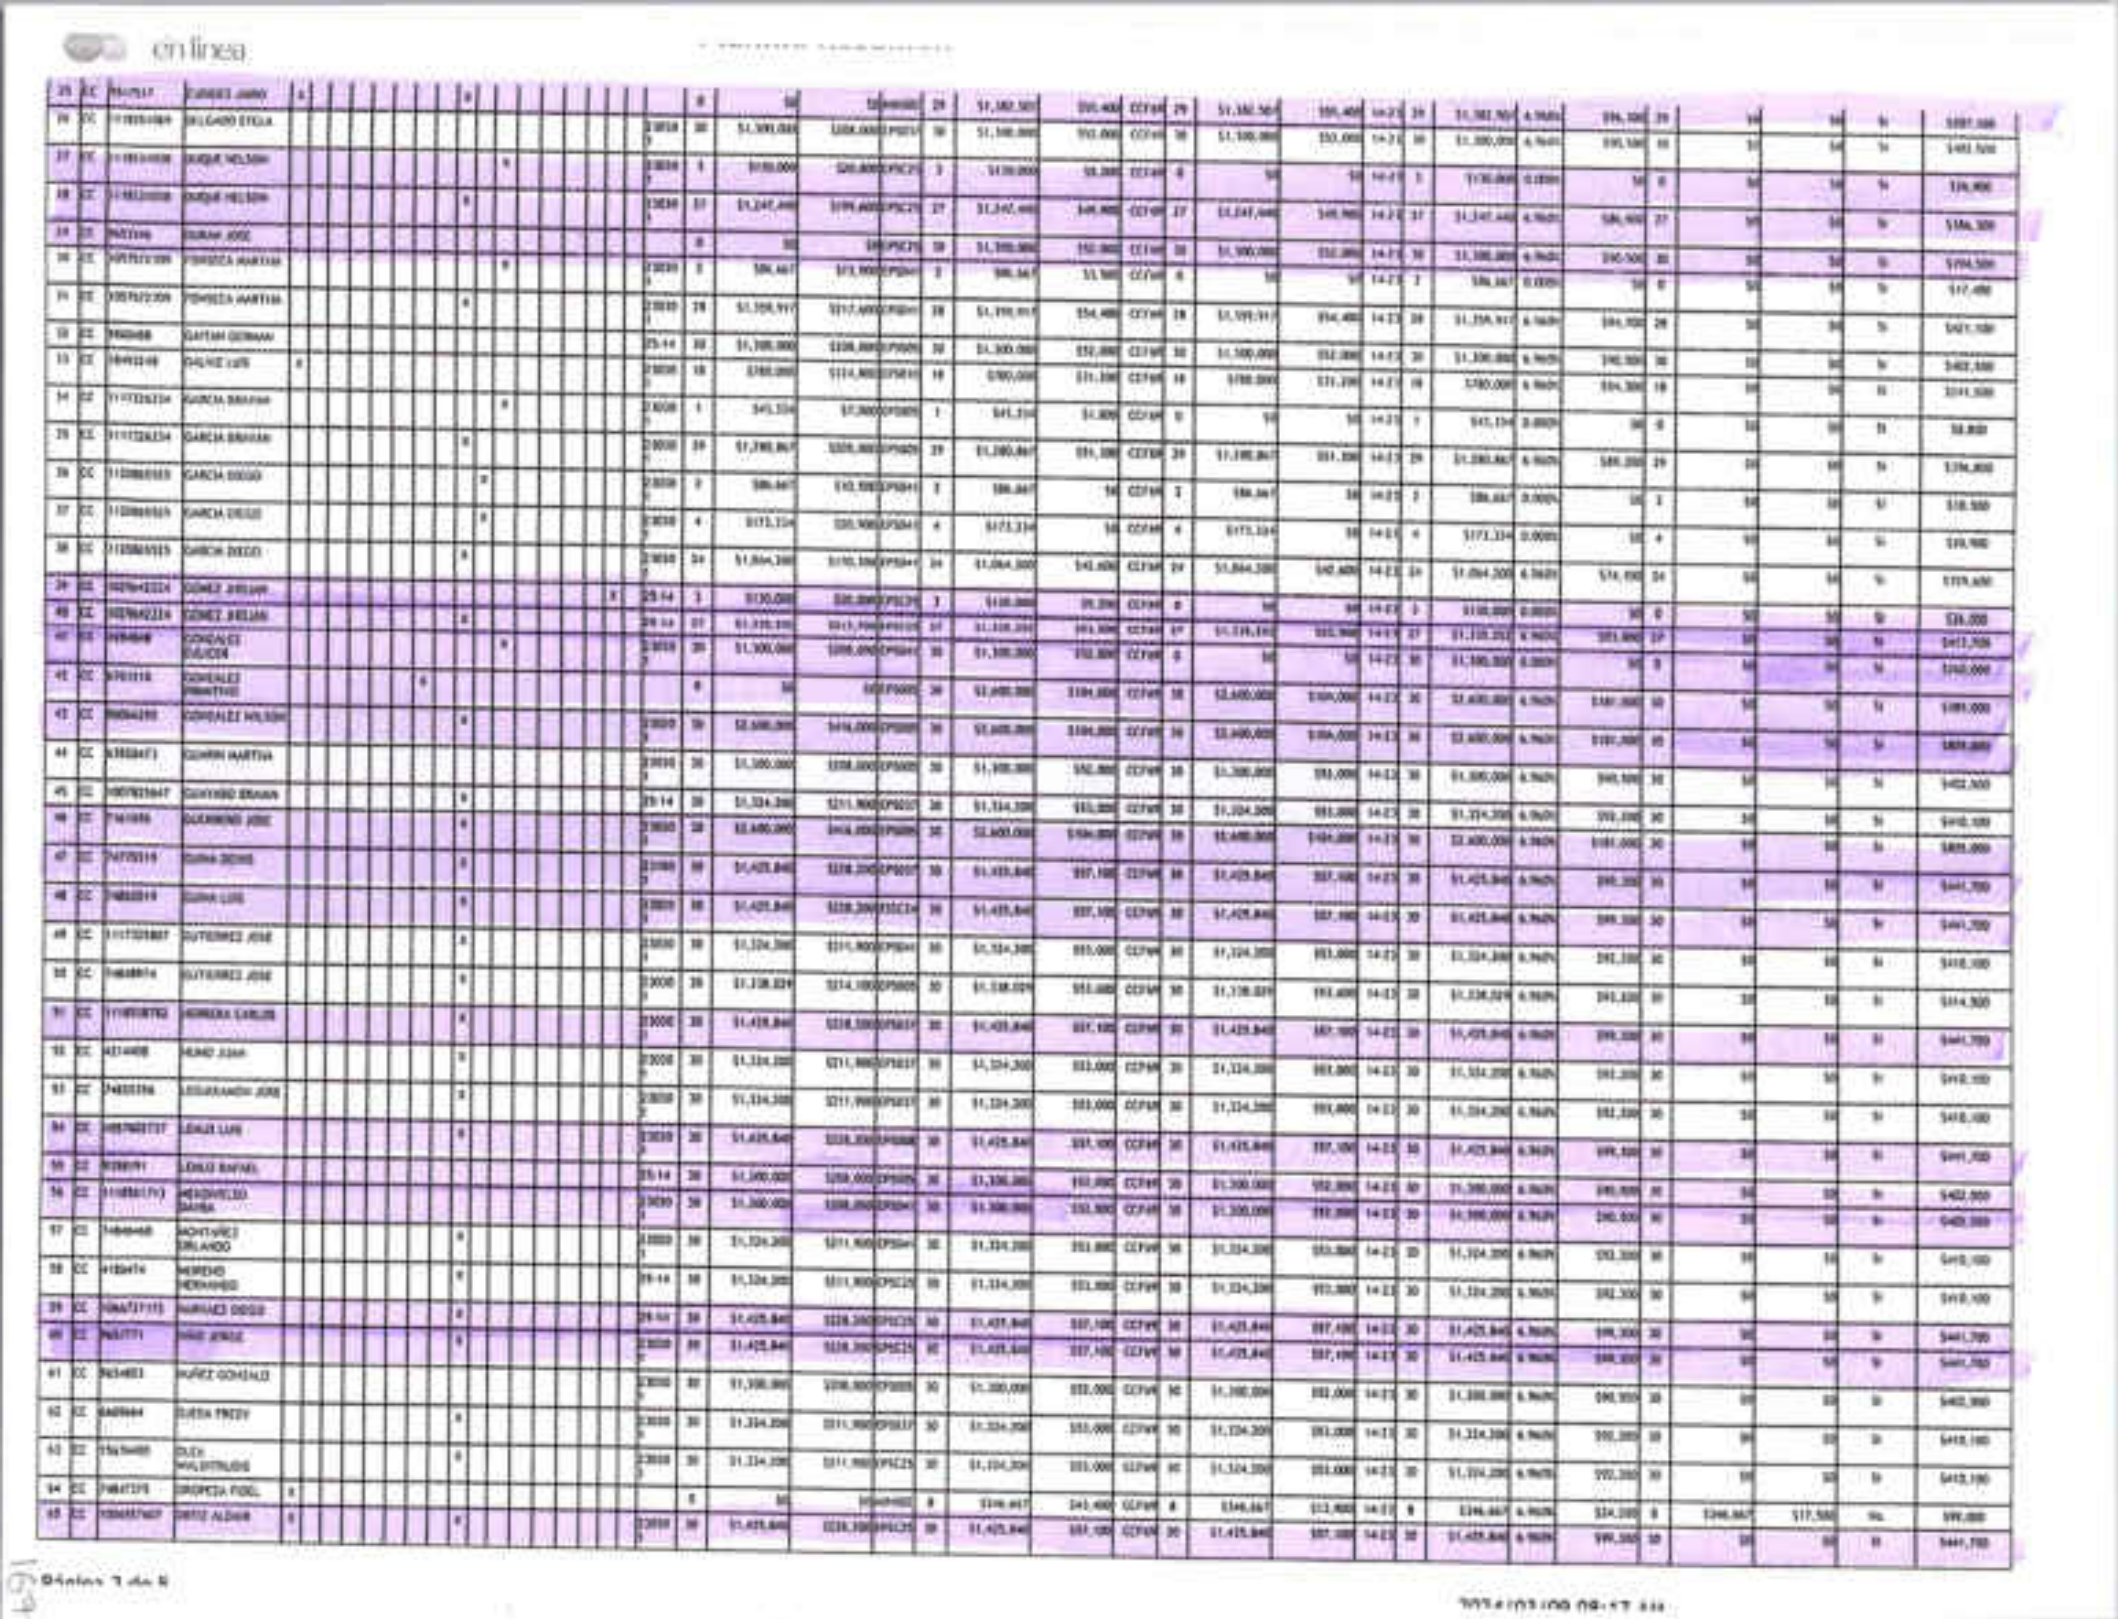

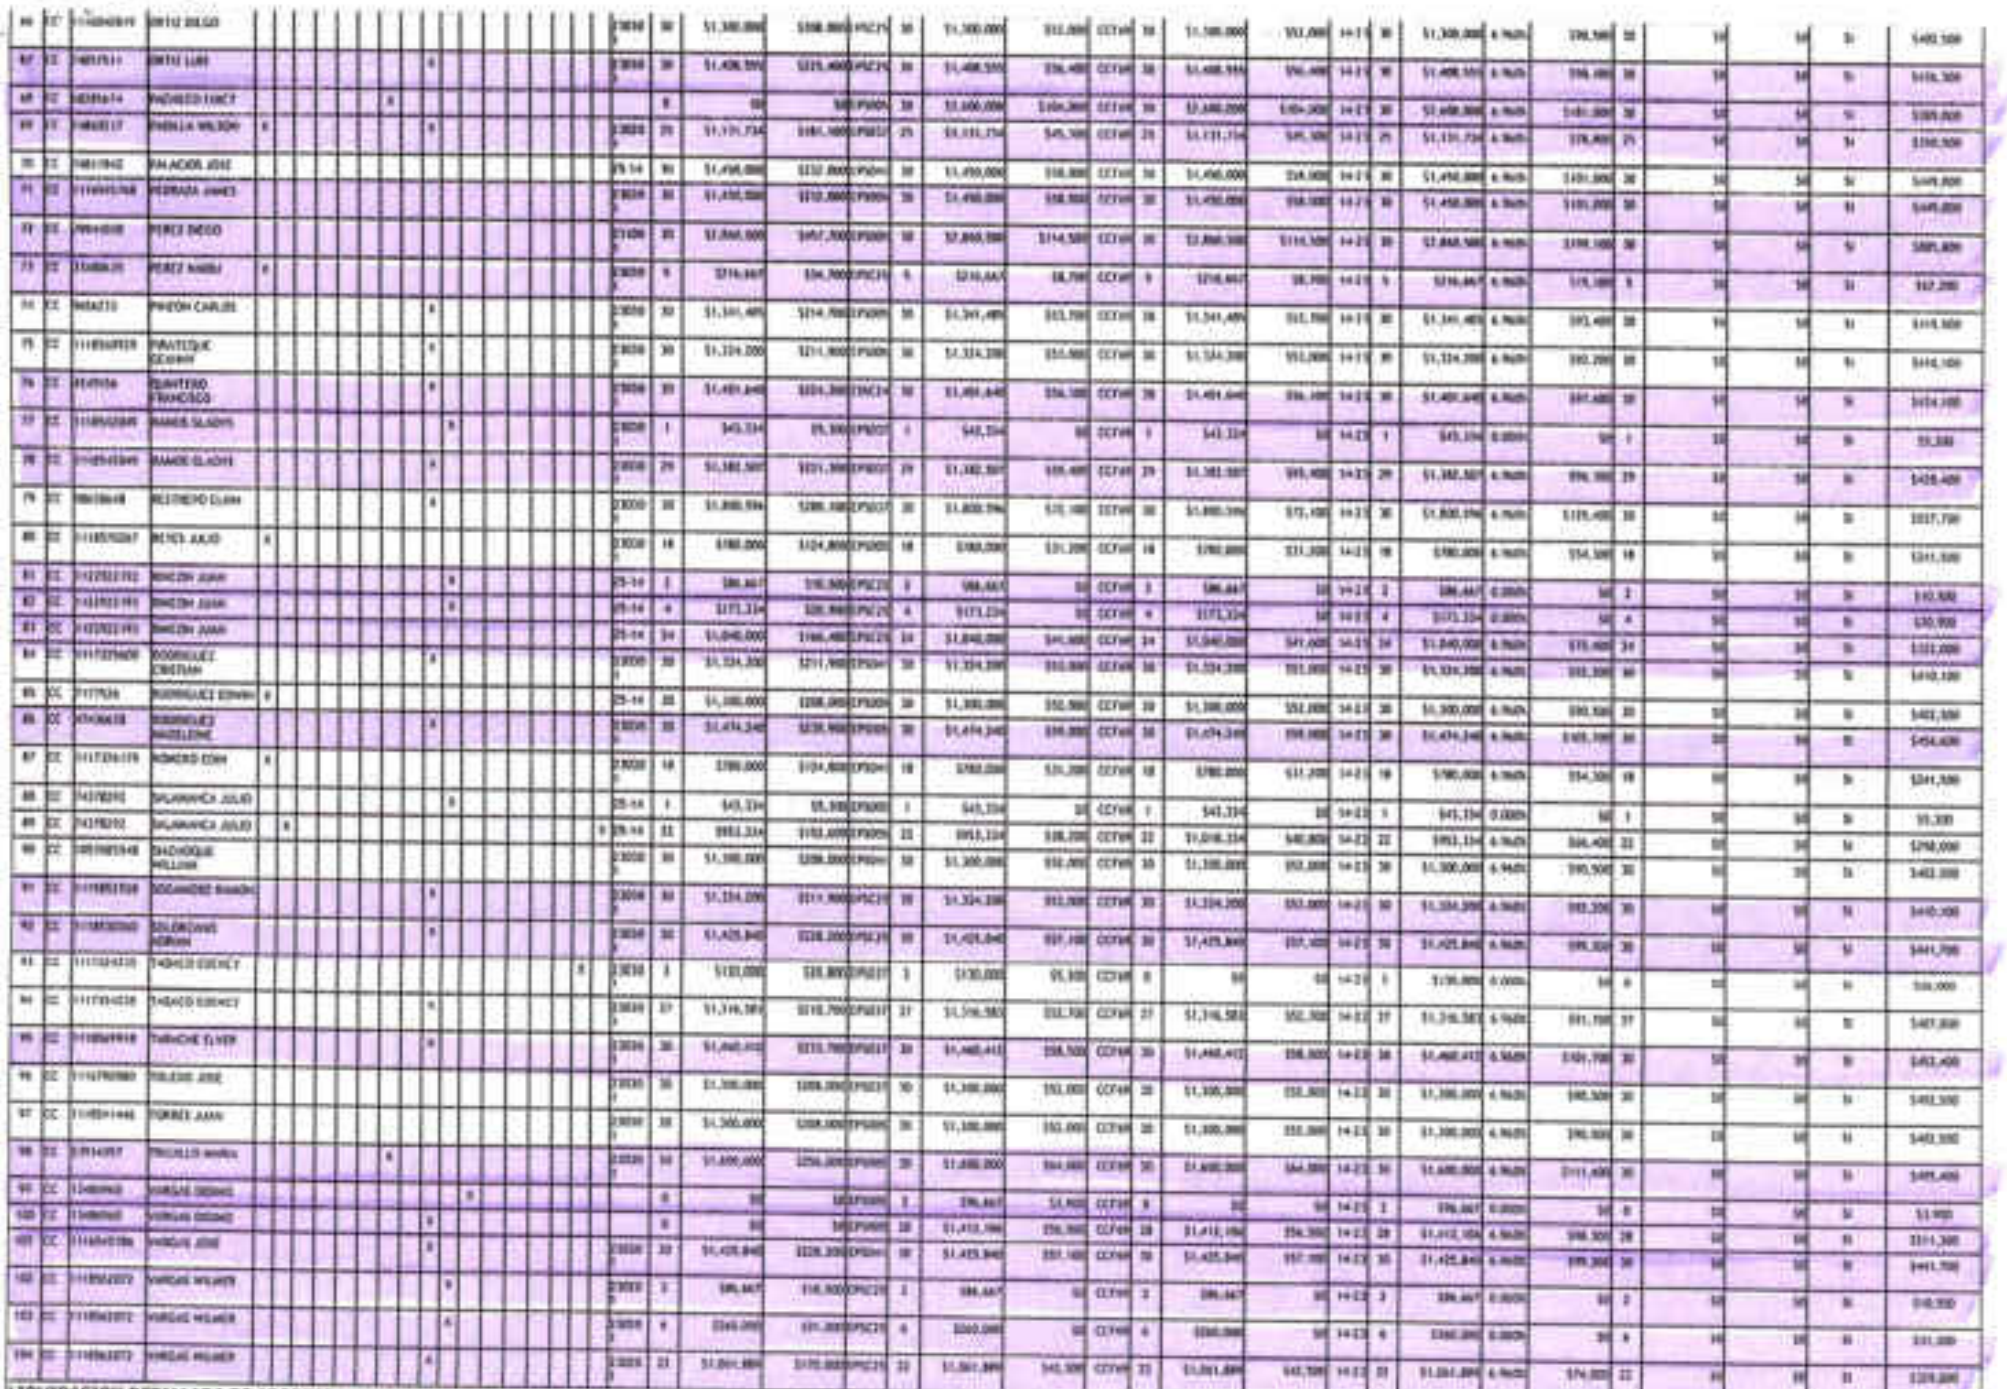

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Cot%	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado ESAP e ICBF	Total Aportes

SUCURSAL: SINERGIA BOCAS DEL PAUTO (4 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (4 Afiliados)																																
Ciudad: TRINIDAD Depto: CASANARE (4 Afiliados)																																
105	CC	1116667058	MASSIEL BRAVO																															
106	CC	1166449	PALACIO Gloria																															
107	CC	1116667091	DELCY MEJIA																															
108	CC	1116667091	EDILCA MEJIA																															
109	CC	1116667990	NURIEL MATOS																															
Total		Afiliados(08)																																

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844000840	0	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 20 - 46	YOPAL-CASANARE	6337178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	946408240	946408240	E	2024/05/11	2024/05/08	BANCO DE BOGOTA	0	$35,169,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				80	$17,672,600	$0	$0	$17,672,600
COLFONDOS	23100?	800,227,940	6	4	$1,126,000	$0	$0	$1,126,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,330,200	$0	$0	$2,330,200
PORVENIR	23030?	800,224,808	8	59	$12,814,900	$0	$0	$12,814,900
PROTECCION	23020?	800,229,739	0	6	$1,401,500	$0	$0	$1,401,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$7,938,700	$0	$0	$7,938,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	88	$7,938,700	$0	$0	$7,938,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$4,719,600	$0	$0	$4,719,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	88	$4,719,600	$0	$0	$4,719,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				88	$4,821,000	$0	$0	$4,821,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,100	$0	$0	$57,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	22	$1,079,100	$0	$0	$1,079,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,100	$0	$0	$57,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$113,200	$0	$0	$113,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$31,200	$0	$0	$31,200
FOSYGA	MINO01	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MINO02	901,037,916	1	2	$98,800	$0	$0	$98,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,057,800	$0	$0	$1,057,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$618,900	$0	$0	$618,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$1,655,800	$0	$0	$1,655,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FAICBF	899,999,239	2	1	$10,500	$0	$0	$10,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$0	$0	$7,000
SENA	FASENA	899,999,034	1	1	$7,000	$0	$0	$7,000
TOTAL				88	$35,169,400	$0	$0	$35,169,400

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°24 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA	FERR 3502	26/03/2024	$ 10.000.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	JAIME ALEXANDER MARIÑO CHAPARRO	CCOBRO JAIME	31/03/2024	$ 6.831.000,00
TOTAL				**$ 16.831.000,00**

LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA
Nit. 74.376.604-1 - Regimen Comun Personas
Cra 21 # 22-24 EL GAVAN YOPAL - CASANARE
6333285

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FERR 3502
Res. DIAN No.18764058888802 Prefijo FERR Rango 3001 a 5000 Vigencia 30/10/2023 a 30/04/2024

Nombre Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	Fecha Emisión :	marzo 26, 2024
C.C. o NIT.:	844.004.840	F. Vencimiento:	marzo 26, 2024
Teléfono:	(608) 632	Forma de Pago:	CAJA INTERNA
Dirección:	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANA , YOPAL	Vendedor:	ALMACEN PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VAL. UNIT	%DCT	IVA %	VAL. IVA	VAL. TOTAL
0100323	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	10.101.010	0	0	0	10.101.010

SON: DIEZ MILLONES DE PESOS

VALOR BRUTO	10.101.010
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	10.101.010
RTEFTE 1%	101.010
TOTAL	10.000.000

Esta factura de venta se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.
Observaciones:
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

Atentamente:	Nombre: _____ C.C.: _____ Teléfono: _____ Fecha: _____ Firma del Cliente





CUFE: f9d8d72554e4290d11e685475a7c3462acfbdc3cd78ab4dfe5bc0282f2622343e23d3841025bc3de23f3835f5e19de436

Impreso: 26/03/2024 2:09:23 p. m. Pag. 1 de 1 en WX MANAGEM BUSINESS SOFTWARE S.A.S NIT. 900764236-2 - Proveedor de Factura Electrónica APG CONSULTING COLOMBIA SAS NIT. 901037391-1

Tilo

YOPAL CASANARE 31 MARZO DE 2024

CUENTA DE COBRO

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT. 844.004.840-0

DEBE A:
JAIME ALEXANDER MARIÑO CHAPARRO
CC. 74.186.976 SOGAMOSO (BOYACÁ)
Cel. 3213300097

LA SUMA DE ($6.900.000=)
SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO DE CARRO TANQUE PLACAS XGB414, RIEGO DE VIAS EN EL PROYECTO DE TILODORAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2024.

POR FAVOR REALIZAR EL PAGO A LA CUENTA AHORROS A LA MANO N° 03213300097, CUALQUIER INQUIETUD SOBRE LA CUENTA POR FAVOR COMUNICARSE AL CELULAR 3213300097.

JAIME ALEXANDER MARIÑO CHAPARRO
CC.74.186.976 SOGAMOSO (BOYACA)
CEL. 3213300097

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 01-04-2024
HORA: 8:24 a.m.
CANTIDAD DE FOLIOS: 26
RECIBIDO POR:
ÓNICA
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°24 - CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	PETREOS Y OBRAS KAFOR S.A.S	FEPK 151	4/04/2024	$ 24.700.316,00
TOTAL				**$ 24.700.316,00**

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 003 CELEBRADO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y PETREOS Y OBRAS KAFOR SAS

CONTRATANTE	**:SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**
REPRESENTANTE LEGAL	**: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
CONTRATISTA	**PETREOS Y OBRAS KAFOR SAS**
REPRESENTANTE LEGAL	**:LUIS GUILLERMO CUBIDES ALJURE**
:	**SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**
REPRESENTANTE LEGAL	**: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
VALOR	**: $ 24.825.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**: 1 MES**

Entre los suscritos a saber: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT: 844.004.840-0 domiciliado en la ciudad de Yopal, representado legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO** , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado con la cédula de ciudadanía No 47.436.168 expedida en la ciudad de Yopal, actuando conforme a la Ley y en armonía con los estatutos de la misma, por una parte y quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, PETREOS Y OBRAS KAFOR, NIT: 901.445.070-4 domiciliado en Bogotá , representado legalmente por LUIS GUILLERMO CUBIDES ALJURE identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.286.619 ubicado en la dirección cl 144 no. 18ª 16 de la Ciudad de Bogotá, y teléfono 6363035 quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, Hemos acordado celebrar el presente contrato de ejecución de MANO DE OBRA CIVIL, el cual se regirá por las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**: El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, en los términos señalados y por el sistema de costo valor unitario, **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA LAGUNAS MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTE DE CASANARE PARAGRAFO**: El CONTRATISTA queda obligado a desarrollar el proyecto descrito en la presente cláusula bajo la dirección administrativa, financiera y técnica del CONTRATANTE, para lo cual podrá emplear el personal idóneo que disponga. **CLAUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES:** El objeto descrito en la cláusula anterior se desarrollará por el CONTRATISTA de acuerdo a los ítems, descripción, cantidades y valores unitarios que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
POZO DE INSPECCION RECTO RECTO (SIN CONO TRUNCADO) H=2.0-3.0m 02.00 m	Und	21.0	$625.000	13.125.000
POZO DE INSPECCION RECTO RECTO (SIN CONO TRUNCADO) H=2.0-3. 4.0m 0 2.00 m	und	13.0	$900.000	11.700.000
TOTAL				**$24.825.000**

PARAGRAFO PRIMERO. Las cantidades consignadas en el presente contrato se podrán disminuir y aumentar, por lo tanto el valor final del contrato cambiara según las cantidades ejecutadas. **PARAGRAFO SEGUNDO.** EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de rechazar cualquier parte o la totalidad de los trabajos que no encuentre plenamente satisfactorios, en calidad, terminado y que no cumpla con las especificaciones por las cuales se contrata, determinada por el ingeniero y/o funcionario del CONTRATANTE designado

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 003 CELEBRADO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y PETREOS Y OBRAS KAFOR SAS para llevar a cabo las labores de supervisión del contrato. **CLAUSULA TERCERA. VALOR:** Para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar, se determina que el valor del presente contrato asciende a la suma de **VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M.CTE ($24.825.000) M/CTE. PARÁGRAFO PRIMERO.** Queda entendido que el valor del contrato de comprende, los gastos operativos, la remuneración del personal empleado para ejecutarla y la remuneración a que tiene derecho el CONTRATISTA por poner a disposición del CONTRATANTE toda su capacidad técnica, profesional y operativa. **CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO:** El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de ejecución de obra civil de la siguiente manera: 1) el contratista instalará ítem contratado sin dar ningún anticipo, 2) se realizará un pago total del contrato en 30 días a partir del fecha de suscripción el cual debe estar instalado la cantidad establecida en el cuadro anteriormente citado. el contratista hará previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura solicitando los recursos. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La cancelación de los recursos descritos en la presente cláusula está supeditado además a la entrega por parte del CONTRATISTA de todos y cada de uno de los documentos que la ley ha establecido para el efecto. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El giro de los recursos queda supeditado a la entrega que de ellos a su vez haga la Fiduciaria Banco de Bogotá. **CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** 1) Ejecutar las actividades propias del objeto del presente contrato de tal manera que ofrezcan las mejores condiciones de calidad y estabilidad y que se ajusten a los requisitos mínimos necesarios previstos en las normas técnicas obligatorias nacionales o extranjeras, según el caso; 2) Acatar las instrucciones y seguir las directrices que le trace el CONTRATANTE para el desarrollo de este contrato; 3) Ejecutar los trabajos motivo de este contrato de acuerdo con el plan de trabajo entregado por el CONTRATANTE, el cual forma parte del presente contrato. 4) Actuar bajo la absoluta y continuada dependencia técnica, económica y jurídica del CONTRATANTE, de tal suerte que todas las actuaciones distintas de las determinadas para el efectivo y normal cumplimiento del contrato, deben estar autorizadas previamente por escrito por ésta, so pena de tenerse por no realizadas. 5) Obrar con buena fe en las distintas etapas del contrato; 6) Poner a disposición del CONTRATANTE la maquinaria y equipo que ésta considere necesarias, para lograr la idónea y oportuna ejecución del proyecto; 7) Abstenerse de actuar o de reputarse ante terceros como contratista independiente en el desarrollo o ejecución de este contrato; 8) Permitir la inspección, vigilancia y control por parte del CONTRATANTE de los trabajos y actividades que ejecute; 9) Pagar el valor de los derechos laborales, o de cualquier naturaleza, así como ARP Y EPS exigidos por la ley que se deriven de la vinculación del personal que emplee o haya empleado para ejecutar este contrato; 10) Cancelar las obligaciones que haya asumido para ejecutar este contrato; 11) Las demás que se deriven de la naturaleza de la presente relación contractual. **CLAUSULA SEXTA. PLAZO:** El CONTRATISTA deberá ejecutar el objeto del contrato indicado en la cláusula primera, en el término de **1.0 MES (30) DIAS CALENDARIO** contados a partir de la suscripción de la correspondiente contrato. **CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION:** El objeto del presente contrato debe ser ejecutado por el CONTRATISTA en el **MUNICIPIO DE YOPAL**, específicamente en las direcciones estipuladas en el objeto del contrato; o en el sitio y/o lugar que le señale el CONTRATANTE. **CLAUSULA OCTAVA. CLAUSULA PENAL:** Si el CONTRATISTA incumpliere una cualquiera de las obligaciones que mediante este contrato asume, pagará al CONTRATANTE, a título de pena, una cantidad de dinero igual al veinte (20%) por ciento del valor establecido en la cláusula tercera de este documento. **CLAUSULA NOVENA. SUPERVISION:** La inspección, vigilancia y control del cumplimiento del presente

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 003 CELEBRADO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y PETREOS Y OBRAS KAFOR SAS

contrato será ejercida por el CONTRATANTE, por intermedio del funcionario que su representante legal delegue para tal fin. **CLAUSULA DECIMA. CESION:** El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente la ejecución de la orden, ni su posición contractual, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Forman parte integral de este documento, el contrato propiamente dicho con sus respectivos anexos, cuentas de cobro y demás documentos que se expidan a lo largo de su vigencia. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. TERMINACION DEL CONTRATO:** El presente contrato de ejecución de obra civil terminará por la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Por incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA; **b)** Por vencimiento del plazo establecido para la ejecución del contrato; **c)** Por la ejecución total y oportuna del contrato;; **d)** Por actuar el CONTRATISTA o reputarse ante terceros como contratista independiente en el desarrollo o ejecución del contrato; y **e)** Por decisión unilateral del CONTRATANTE. **CLAUSULA DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ.** El presente contrato de ejecución de obra civil se entenderá perfeccionado con la suscripción que del mismo efectúen las partes; así como de la entrega de todos y cada uno de los documentos establecidos por la legislación que lo rige y que se derivan de su ejecución.

Para constancia se firma este documento a los 3 días del mes de marzo de 2024

EL CONTRATANTE

MARIA DIOMY BARERA ALFONSO
R/L SYNERGIA SAS
NIT: 844.004.840-0

E

LUIS GUILLERMO CUBIDES ALJURE
R/L PETREOS Y OBRAS KAFOR SAS
NIT:

PETREOS Y OBRAS KAFOR SAS

CALLE 144 No. 18A-16
TELÉFONO: 6363035

FEPK2020
Email: lgcubides@conwyp.com
Teléfono: 6016363035

Departamento	Fecha		
Casanare	04	04	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEPK151

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT:**	844004840-0	**Fecha de firmado:**	04/04/2024 10:59:54
Dirección:	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE	**Departamento:**	Casanare	**Teléfono:**	
Email:	synergiaconstrucciones@gmail.com	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Abril 12 del 2024	**Hora emisión:**	10:59:51	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	12/04/2024				

Total de Líneas: 4

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	012	1,00	OBRAS CIVILES	WSD				$22.712.934,00	$22.712.934,00
2	013	1,00	ADMINISTRACIÓN	WSD				$681.388,00	$681.388,00
3	014	1,00	IMPREVISTOS	WSD				$454.259,00	$454.259,00
4	015	1,00	UTILIDAD	WSD	IVA	19%	215773	$1.135.647,00	$1.135.647,00

Notas:
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PETREOS Y OBRAS KAFOR S.A.S - CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 01100000870

SON: (veinticinco millones doscientos mil un pesos)
CUFE: s6f6e4550fb49bc84de0edfd29abb6a579c9f3ab1c51b96a48c2fe9869cff558e94231ded9578815770920616ff386542a

Subtotal:	$24.984.228,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$215.773,00
Total:	$25.200.001,00
ReteRenta:	$499.684,86
Neto Factura:	$24.700.316,14

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.135.647,00	19,00%	$215.773,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$24.984.228,00	2%	$499.684,86

1.134.025.252 v/lce
Cesar Pardo

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA EMISIÓN ORDEN (DD/MM/AAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Tepal	15	5	2024	25	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 389.138.574,00	$ 0,00	$ 389.138.574,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16690	P.A ANT SYNERGIA CONS E INGENIERIA SAS 033	62900004849	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840-0	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	646498733	Corriente	Banco de Bogotá	$ 389.138.574,00	$ -	$ 389.138.574,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONÓMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Cesenare	Tepal	CLL 30 24 46	[illegible]	6327178	3178660383	4290	Cesenare	Tepal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
3	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: (i) que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea suministrada para las finalidades establecidas previstas en el presente documento; y (ii) que los datos suministrados a las disposiciones que regulan la materia."

2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas	DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°25					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 15/05/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 032			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-6		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS	NÓMINA MES MARZO 2024	NOM MAR 2024	30/03/2024	$ 68.296.933,00
1	PAGO DE SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2024	9455478986	15/04/2024	$ 34.241.100,00
1	PAGO DE SALARIOS	NÓMINA MES ABRIL 2024	NOM ABR 2024	29/02/2024	$ 78.039.857,00
1	PAGO DE SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2024	9466967918	10/05/2024	$ 39.585.000,00
		TOTAL ITEM 01			$ 220.162.890,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES LOGÍSTICOS & SERVICIOS HERNANDES S.A.S	FEH 450	2/04/2024	$ 5.045.040,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ	FE 15	3/04/2024	$ 20.740.500,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES VALUARTE ANDINA S.A.S	FEVA 1008	4/04/2024	$ 5.742.464,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	H&S GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 348	4/04/2024	$ 36.608.208,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MATERIALES Y CARGAS S.A.S	FE 411	5/04/2024	$ 3.589.040,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	SATT CARGA S.A.S	FE 254	8/04/2024	$ 3.589.040,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSUNICARGA S.A.S	FEV 27	8/04/2024	$ 4.665.752,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSCARGA EXPRESS S.A.S	TREX 212	9/04/2024	$ 2.512.328,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES COTRANSERVIS S.A.S	CTSA 2042	9/04/2024	$ 2.153.424,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	INTERVOLCARGAS GR S.A.S	JGMR 731	9/04/2024	$ 2.153.424,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	VANETRANS S.A.S	PY 1447	9/04/2024	$ 3.589.040,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO S.A.S	FEV 1962	16/04/2024	$ 30.000.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSMIGUEL S.A.S	FE 3739	15/04/2024	$ 2.153.424,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ	FE 16	16/04/2024	$ 16.434.000,00
		TOTAL ITEM 03			$ 138.975.684,00
		VALOR TOTAL DE ITEMS			$ 359.138.574,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

Nicolas Rojo

R/L CONSINTER DEL ORIENTE E.U

El interventor certifica que revisó los desembolsos aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversión del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

ConsinTer del Oriente

NIT 900.326.145-4

Yopal 15 de mayo del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16690 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 032

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°25, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
1	PAGO DE SALARIOS	NÓMINA MES MARZO 2024	NOM MAR 2024	30/03/2024	$ 68.296.933,00
1	PAGO DE SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2024	9465478986	15/04/2024	$ 34.241.100,00
1	PAGO DE SALARIOS	NÓMINA MES ABRIL 2024	NOM ABR 2024	29/02/2024	$ 78.039.857,00
1	PAGO DE SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2024	9466967918	10/05/2024	$ 39.585.000,00
TOTAL ITEM 01					$ 220.162.890,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES LOGÍSTICOS & SERVICIOS HERNANDES S.A.S	FEH 450	2/04/2024	$ 5.045.040,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ	FE 15	3/04/2024	$ 20.740.500,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES VALUARTE ANDINA S.A.S	FEVA 1008	4/04/2024	$ 5.742.464,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	H&S GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 348	4/04/2024	$ 36.608.208,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MATERIALES Y CARGAS S.A.S	FE 411	5/04/2024	$ 3.589.040,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	SATT CARGA S.A.S	FE 254	8/04/2024	$ 3.589.040,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSUNICARGA S.A.S	FEV 27	8/04/2024	$ 4.665.752,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSCARGA EXPRESS S.A.S	TREX 212	9/04/2024	$ 2.512.328,00

3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES COTRANSERVIS S.A.S	CTSA 2042	9/04/2024	$ 2.153.424,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	INTERVOLCARGAS GR S.A.S	JGMR 731	9/04/2024	$ 2.153.424,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	VANETRANS S.A.S	PY 1447	9/04/2024	$ 3.589.040,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO S.A.S	FEV 1962	16/04/2024	$ 30.000.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSMIGUEL S.A.S	FE 3739	15/04/2024	$ 2.153.424,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ	FE 16	16/04/2024	$ 16.434.000,00
TOTAL ITEM 03					$ 138.975.684,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 359.138.574,00**


Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°1 y N°3 - Pago de salarios, transporte de materiales, respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

Nicolas Roso

JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
C.C No. 9.432.549
R.L. CONSINTER DEL ORIENTE
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°25 - PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	*NOMBRE DEL PROVEEDOR*	*N° DE FACTURA*	*FECHA DE FACTURA*	*TOTAL*
PAGO DE SALARIOS	NÓMINA MES MARZO 2024	NOM MAR 2024	30/03/2024	$ 68.296.933,00
PAGO DE SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2024	9465478986	15/04/2024	$ 34.241.100,00
PAGO DE SALARIOS	NÓMINA MES ABRIL 2024	NOM ABR 2024	29/02/2024	$ 78.039.857,00
PAGO DE SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2024	9466967918	10/05/2024	$ 39.585.000,00
TOTAL				**$ 220.162.890,00**

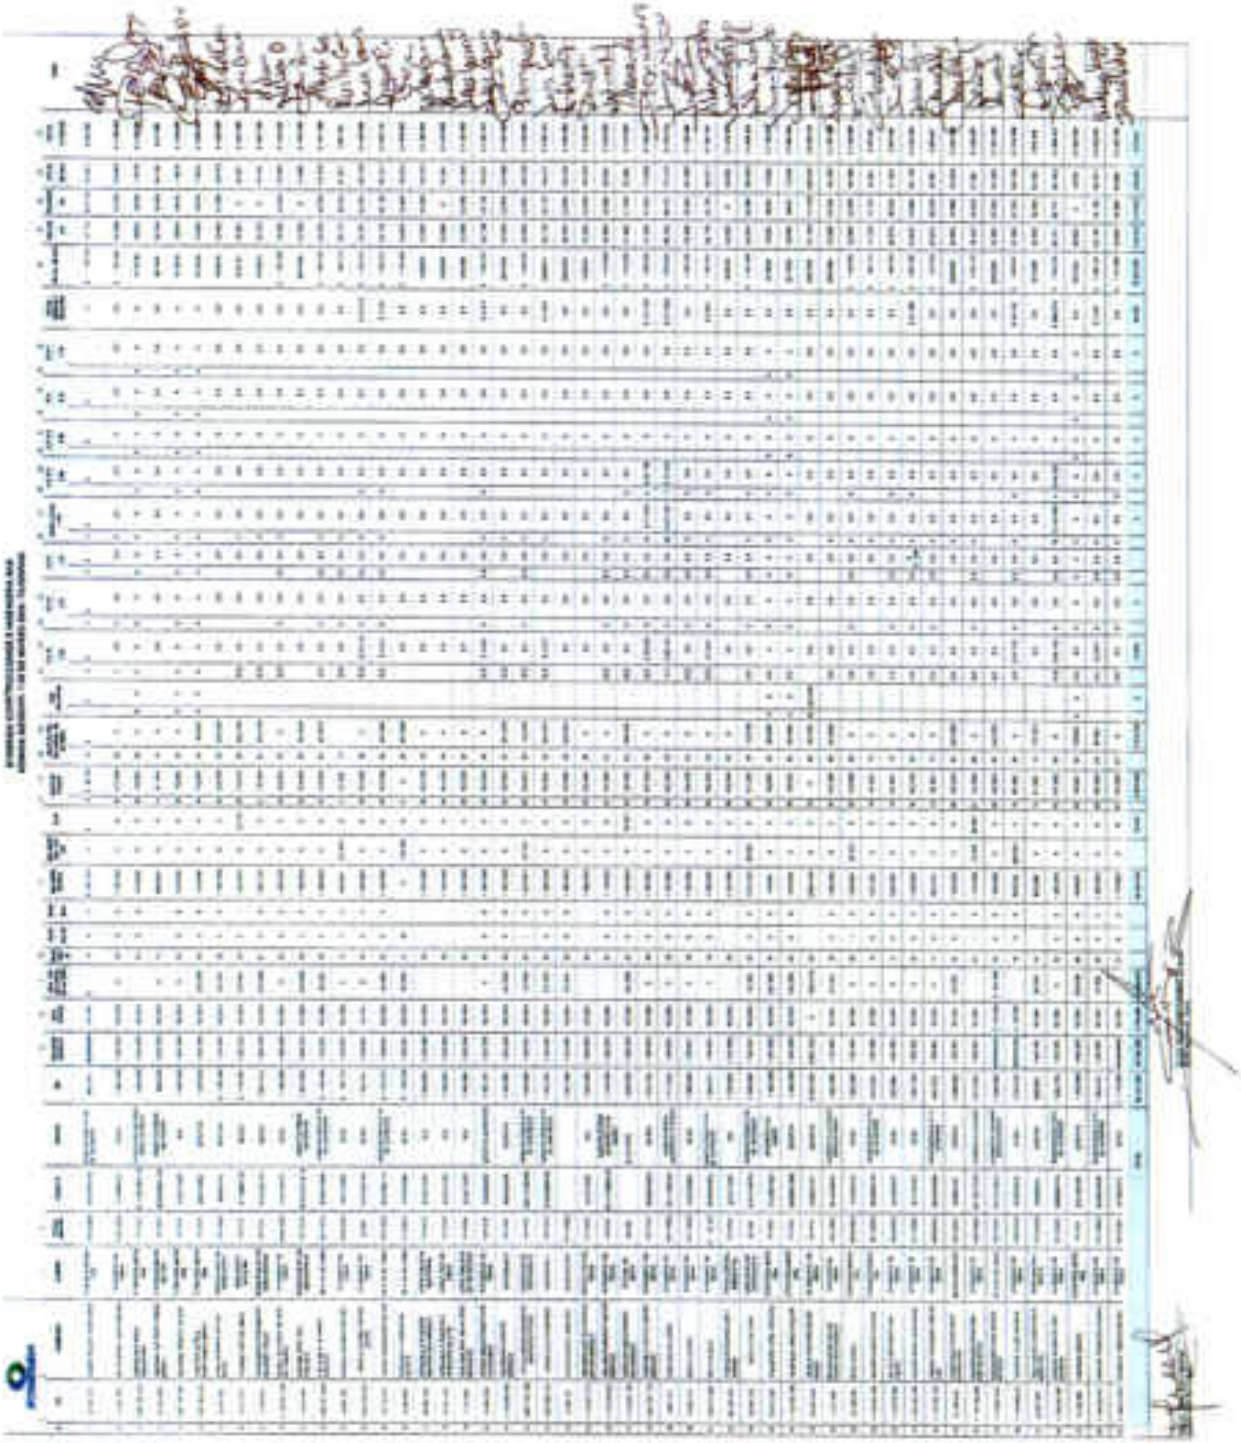

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	0 - AEROS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 29 - 46	YOPAL-CASANARE	6317179	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	725619966	940347996	E	2024/04/09	2024/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	6	138,146,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Aportante: YOPAL (97 Afiliados)					$111,665,419	$19,173,000			$109,823,700	$5,532,000			$111,665,987	$4,902,000			$116,823,700	$6,382,100		$1,200,000	$60,000
Centro de Trabajo: DROGUIÉ 6.96 (4 Afiliados)					$3,906,001	$624,100			$4,747,535	$190,100			$4,758,369	$190,400			$4,747,535	$327,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					$3,906,001	$624,100			$4,747,535	$190,100			$4,758,369	$190,400			$4,747,535	$327,500		$0	$0
1	CC	9411181	CRUZ MENDOZA MIGUEL ANGEL	23091	30	$1,300,000	$208,000	40091	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$65,000	30	$0	$0
2	CC	1082811829	ESCALANTE ALTAMAR ALBERTO ANTONIO	23091	30	$1,300,000	$208,000	SP0401	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$65,000	30	$0	$0
3	CC	1027147516	LOZADA RAMOS CASIMIRO BRAYAN STIVEN	23091	1	$43,334	$7,000	SP0129	1	$43,334	$1,600	CCF01	0	$0	$0	14-13	1	$43,334	$0	0	$0	$0
4	CC	1027147516	LOZADA RAMOS CASIMIRO BRAYAN STIVEN	23091	29	$1,256,667	$201,100	SP0129	29	$1,256,667	$50,300	CCF01	29	$1,256,667	$50,300	14-13	29	$1,256,667	$67,600	29	$0	$0
5	CC	1234567	MELO MARTINEZ ALEX		0	$0	$0	SP0129	19	$847,334	$34,000	CCF01	19	$850,701	$34,100	14-13	19	$847,334	$39,000	19	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (3 Afiliados)					$4,000,000	$648,000			$4,000,000	$162,000			$4,000,000	$162,000			$4,000,000	$31,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)					$4,000,000	$648,000			$4,000,000	$162,000			$4,000,000	$162,000			$4,000,000	$31,200		$0	$0
6	CC	4743610	BARRERA ALFONSO MARIA DIONY	23091	30	$1,300,000	$208,000	SP0201	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1118562333	BARRERA TARACHE MARTIN LUCERO	23091	30	$1,300,000	$208,000	SP0205	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	1027814342	CASTRO LOPEZ CRISTIAN CAMILO	23-13	30	$1,400,000	$232,000	SP0231	30	$1,400,000	$56,000	CCF01	30	$1,400,000	$56,000	14-13	30	$1,400,000	$7,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (90 Afiliados)					$105,759,327	$16,900,900			$117,036,199	$4,769,900			$114,825,219	$4,570,900			$117,036,199	$7,934,400		$1,300,000	$60,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (90 Afiliados)					$105,759,327	$16,900,900			$117,036,199	$4,769,900			$114,825,219	$4,570,900			$117,036,199	$7,934,400		$1,300,000	$60,000
9	CC	1069555	AGUDELO ACEVEDO FALLACY	23091	2	$86,667	$10,000	SP0207	2	$86,667	$0	CCF01	2	$86,667	$0	14-13	2	$86,667	$0	2	$0	$0
10	CC	1069555	AGUDELO ACEVEDO FALLACY	23091	28	$1,120,348	$195,000	SP0207	28	$1,120,348	$48,900	CCF01	28	$1,120,348	$48,900	14-13	28	$1,120,348	$63,000	28	$0	$0
11	CC	4744016	ALARCON ELOY MARCIANO	23091	16	$691,334	$111,000	SP0240	16	$691,334	$27,800	CCF01	16	$691,334	$27,800	14-13	16	$691,334	$48,200	16	$0	$0
12	CC	9430998	ALFONSO GONZALEZ [illegible]	23091	30	$1,300,000	$208,000	SP0205	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$65,000	30	$0	$0
13	CC	1122787	ARIZA MORENO OSCAR BERTO	23091	30	$1,300,000	$208,000	SP0134	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$65,000	30	$0	$0
14	CC	1054489161	AVILA COLINA CARLOS YOVANY	23091	30	$1,356,914	$209,200	SP0129	30	$1,356,914	$52,300	CCF01	30	$1,356,914	$52,300	14-13	30	$1,356,914	$91,000	30	$0	$0
15	CC	1057383519	BARRERA VILLAMIL PAOLA VALENTINA	23091	30	$1,400,000	$232,000	SP0205	30	$1,400,000	$56,000	CCF01	30	$1,400,000	$56,000	14-13	30	$1,400,000	$101,000	30	$0	$0
16	CC	4744016	BERNAL ALFONSO MARIA DIONY	23091	30	$1,300,000	$208,000	SP0205	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$65,000	30	$0	$0
17	CC	1052764367	BERNAL SUAREZ YEIMER FABIAN	23091	30	$1,400,000	$232,000	SP0205	30	$1,400,000	$56,000	CCF01	30	$1,400,000	$56,000	14-13	30	$1,400,000	$101,000	30	$0	$0
18	CC	1006450793	BURGOS HERNANDEZ ROMEY STIVEN	23091	7	$303,334	$48,600	SP0129	7	$303,334	$12,200	CCF01	7	$303,334	$12,200	14-13	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
19	CC	1006450793	BURGOS HERNANDEZ ROMEY STIVEN	23091	1	$130,000	$21,600	SP0129	1	$130,000	$0	CCF01	1	$130,000	$0	14-13	1	$130,000	$0	1	$0	$0
20	CC	1118536153	CADILLO CUMCHI ELISON	23091	30	$1,300,000	$208,000	SP0207	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$65,000	30	$0	$0
21	CC	1066974	CHAPARRO HOCARAVIT HELMAR YESID	23091	23	$1,081,334	$173,400	40091	23	$1,081,334	$43,400	CCF01	23	$1,081,334	$43,400	14-13	23	$1,081,334	$75,500	23	$0	$0
22	CC	1011111	DUBOIS ROTA JAIRO LUIS DAVID		0	$0	$0	40091	19	$1,256,667	$50,300	CCF01	19	$1,256,667	$50,300	14-13	19	$1,256,667	$87,900	19	$0	$0
23	CC	1011111	DUBOIS ROTA JAIRO LUIS DAVID		0	$0	$0	40091	1	$43,334	$0	CCF01	1	$43,334	$0	14-13	1	$43,334	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
24	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
25	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
26	CC	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
27	CC	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	6	0	0
28	CC	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	28	0	0
29	CC	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1	0	0
30	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
31	CC	[illegible]	[illegible]	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15	[illegible]	[illegible]	15	0	0
32	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
33	CC	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	6	0	0
34	CC	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	[illegible]	24	0	0
35	CC	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1	0	0
36	CC	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	0	0	0
37	CC	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	28	0	0
38	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
39	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	0	0	0
40	CC	[illegible]	[illegible]	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
41	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
42	CC	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	29	0	0
43	CC	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	0	0	0
44	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
45	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
46	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
47	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
48	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
49	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
50	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
51	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
52	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
53	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
54	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
55	CC	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	27	0	0
56	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0
57	CC	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	[illegible]	24	0	0
58	CC	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	27	0	0
59	CC	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	0	0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
40	CC	[illegible]	23-14	24	$1,040,000	$166,400	[illegible]	24	$1,040,000	$45,600	[illegible]	24	$1,040,000	$31,200	[illegible]	24	$1,040,000	$15,600	24	$0	$0
41	CC	[illegible]	23-14	1	$43,334	$6,933	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	1	$0	$0
42	CC	[illegible]	23-14	1	$43,334	$7,000	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	1	$0	$0
43	CC	[illegible]	23-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$39,000	[illegible]	30	$1,300,000	$19,500	30	$0	$0
44	CC	[illegible]	23-14	27	$1,170,000	$187,200	[illegible]	27	$1,170,000	$46,800	[illegible]	27	$1,170,000	$35,100	[illegible]	27	$1,170,000	$17,550	27	$0	$0
45	CC	[illegible]	23-14	30	$1,407,595	$225,100	[illegible]	30	$1,407,595	$57,600	[illegible]	30	$1,407,595	$42,300	[illegible]	30	$1,407,595	$21,100	30	$0	$0
46	CC	[illegible]	23-14	30	$1,717,624	$274,900	[illegible]	30	$1,717,624	$68,800	[illegible]	30	$1,717,624	$51,600	[illegible]	30	$1,717,624	$25,800	30	$0	$0
47	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	[illegible]	30	$1,481,921	$22,300	30	$0	$0
48	CC	[illegible]	23-14	30	$1,306,914	$209,100	[illegible]	30	$1,306,914	$52,300	[illegible]	30	$1,306,914	$39,200	[illegible]	30	$1,306,914	$19,600	30	$0	$0
49	CC	[illegible]	23-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$39,000	[illegible]	30	$1,300,000	$19,500	30	$0	$0
50	CC	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	30	$1,300,000	$162,500	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$39,000	30	$1,300,000	$65,000
51	CC	[illegible]	23-14	27	$1,194,238	$191,100	[illegible]	27	$1,194,238	$47,800	[illegible]	27	$1,194,238	$47,800	[illegible]	27	$1,194,238	$23,100	27	$0	$0
52	CC	[illegible]	23-14	30	$1,303,457	$208,600	[illegible]	30	$1,303,457	$52,200	[illegible]	30	$1,303,457	$52,200	[illegible]	30	$1,303,457	$39,100	30	$0	$0
53	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
54	CC	[illegible]	23-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$39,000	30	$0	$0
55	CC	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	30	$1,600,000	$160,000	[illegible]	30	$1,600,000	$64,000	[illegible]	30	$1,600,000	$48,000	30	$0	$0
56	CC	[illegible]	23-14	28	$1,213,334	$194,100	[illegible]	28	$1,213,334	$48,600	[illegible]	28	$1,213,334	$48,600	[illegible]	28	$1,213,334	$24,300	28	$0	$0
57	CC	[illegible]	23-14	1	$86,667	$13,900	[illegible]	1	$86,667	$3,500	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	1	$0	$0
58	CC	[illegible]	23-14	30	$1,400,000	$232,000	[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	[illegible]	30	$1,400,000	$42,000	30	$0	$0
59	CC	[illegible]	23-14	30	$1,400,000	$225,000	[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	[illegible]	30	$1,400,000	$42,000	30	$0	$0
60	CC	[illegible]	23-14	30	$1,860,000	$297,700	[illegible]	30	$1,860,000	$114,500	[illegible]	30	$1,860,000	$114,000	[illegible]	30	$1,860,000	$186,000	30	$0	$0
61	CC	[illegible]	23-14	29	$1,256,667	$201,100	[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	[illegible]	29	$1,256,667	$37,700	29	$0	$0
62	CC	[illegible]	23-14	1	$43,334	$7,000	[illegible]	1	$43,334	$1,800	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	1	$0	$0
63	CC	[illegible]	23-14	1	$43,334	$6,300	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	1	$0	$0
64	CC	[illegible]	23-14	29	$1,256,667	$201,100	[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	[illegible]	29	$1,256,667	$37,700	29	$0	$0
65	CC	[illegible]	23-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$39,000	30	$0	$0
66	CC	[illegible]	23-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$39,000	30	$0	$0
67	CC	[illegible]	23-14	16	$694,000	$111,000	[illegible]	16	$694,000	$27,800	[illegible]	16	$694,000	$22,200	[illegible]	16	$694,000	$10,400	16	$0	$0
68	CC	[illegible]	23-14	12	$520,000	$83,200	[illegible]	12	$520,000	$20,800	[illegible]	12	$520,000	$16,600	[illegible]	12	$520,000	$7,800	12	$0	$0
69	CC	[illegible]	23-14	1	$43,334	$7,000	[illegible]	1	$43,334	$1,800	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	1	$0	$0
70	CC	[illegible]	23-14	29	$1,235,310	$201,900	[illegible]	29	$1,235,310	$49,400	[illegible]	29	$1,235,310	$49,400	[illegible]	29	$1,235,310	$37,100	29	$0	$0
71	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
72	CC	[illegible]	23-14	30	$1,347,396	$215,600	[illegible]	30	$1,347,396	$53,900	[illegible]	30	$1,347,396	$53,900	[illegible]	30	$1,347,396	$40,400	30	$0	$0
73	CC	[illegible]	23-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$39,000	30	$0	$0
74	CC	[illegible]	23-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$39,000	30	$0	$0
75	CC	[illegible]	23-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$39,000	30	$0	$0
76	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
77	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
78	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
79	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
80	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
81	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
82	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
83	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
84	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
85	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
86	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
87	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
88	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
89	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
90	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
91	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
92	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0
93	CC	[illegible]	23-14	30	$1,481,921	$237,100	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$59,400	[illegible]	30	$1,481,921	$44,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
96	CC [illegible]	ROMERO CARVAJAL [illegible]	230301	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$93,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$9,360	30	$0	$0
97	CC [illegible]	[illegible] FERNANDEZ OSCAR IVAN	230301	13	$561,334	$67,360	[illegible]	13	$561,334	$22,400	[illegible]	13	$561,334	$22,440	14-23	13	$561,334	$4,050	13	$0	$0
98	CC [illegible]	GACHOQUE GACHOQUE WILLIAM RICARDO	230301	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$9,360	30	$0	$0
99	CC [illegible]	[illegible] [illegible] ANTONIO	230301	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$9,360	30	$0	$0
100	CC [illegible]	SOLIS TAFUR CARLOS EUSEBIO	230301	27	$1,261,940	$151,400	[illegible]	27	$1,261,940	$50,500	[illegible]	27	$1,261,940	$50,500	14-23	27	$1,261,940	$87,400	27	$0	$0
101	CC [illegible]	SOLORZANO ARTEAGA ADRIAN DAVID	230301	1	$43,334	$5,200	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
102	CC [illegible]	SOLORZANO ARTEAGA ADRIAN DAVID	230301	1	$43,334	$5,200	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
103	CC [illegible]	SOLORZANO ARTEAGA ADRIAN DAVID	230301	1	$43,334	$5,200	[illegible]	1	$43,334	$1,800	[illegible]	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
104	CC [illegible]	SOLORZANO ARTEAGA ADRIAN DAVID	230301	27	$1,170,006	$140,400	[illegible]	27	$1,170,006	$46,800	[illegible]	27	$1,170,006	$46,800	14-23	27	$1,170,006	$81,900	27	$0	$0
105	CC [illegible]	SUAREZ MARTHA LUIS FELIPE	230301	6	$260,000	$31,200	[illegible]	6	$260,000	$10,400	[illegible]	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,200	6	$0	$0
106	CC [illegible]	TABACO PEREZ DIENCY	230301	30	$1,327,657	$159,300	[illegible]	30	$1,327,657	$53,100	[illegible]	30	$1,475,711	$59,100	14-23	30	$1,327,657	$92,900	30	$0	$0
107	CC [illegible]	TANCHE IBICA ELMER ANDRES	230301	16	$808,447	$97,100	[illegible]	16	$808,447	$34,000	[illegible]	0	$0	$0	14-23	16	$808,447	$0	0	$0	$0
108	CC [illegible]	TANCHE IBICA ELVIS ANDRES	230301	14	$707,906	$114,000	[illegible]	14	$707,906	$29,200	[illegible]	14	$707,906	$29,200	14-23	14	$707,906	$49,700	14	$0	$0
109	CC [illegible]	TOLEDO PEREZ JOSE JAIRO	230301	30	$1,482,921	$117,700	[illegible]	30	$1,482,921	$59,400	[illegible]	30	$1,482,921	$59,400	14-23	30	$1,482,921	$103,800	30	$0	$0
110	CC [illegible]	TORRES VARGAS ENRIQUE		0	$0	$0	[illegible]	17	$736,667	$29,500	[illegible]	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$51,500	17	$0	$0
111	CC [illegible]	TORRES BENAVIDES JUAN CARLOS	230301	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
112	CC [illegible]	[illegible] [illegible] MARIA ANGELICA	230301	30	$1,400,000	$156,000	[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$111,400	30	$0	$0
113	CC [illegible]	VARGAS ARENA [illegible]		0	$0	$0	[illegible]	30	$1,450,000	$58,000	[illegible]	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,500	30	$0	$0
114	CC [illegible]	VARGAS AGUDELO JOSE ANTONIO	230301	30	$1,948,371	$233,800	[illegible]	30	$1,948,371	$62,800	[illegible]	30	$1,948,371	$62,800	14-23	30	$1,948,371	$105,200	30	$0	$0
115	CC [illegible]	VARGAS PINANGOS WILMER FERNANDO	230301	30	$1,300,407	$156,000	[illegible]	30	$1,300,407	$52,200	[illegible]	30	$1,300,407	$52,200	14-23	30	$1,300,407	$91,000	30	$0	$0
116	CC [illegible]	VASQUEZ TABACO DANIEL	29-14	27	$1,170,006	$140,400	[illegible]	27	$1,170,006	$46,800	[illegible]	27	$1,170,006	$46,800	14-23	27	$1,170,006	$81,900	27	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: [illegible] BOCAS DEL PAUTO (3 Afiliados)					**$4,534,343**	**$723,900**			**$4,534,343**	**$181,200**			**$4,434,307**	**$180,700**			**$4,534,343**	**$315,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (3 Afiliados)					**$4,534,343**	**$723,900**			**$4,534,343**	**$181,200**			**$4,434,307**	**$180,700**			**$4,534,343**	**$315,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: TERRIGAD Depto: CASANARE (3 Afiliados)					**$4,534,343**	**$723,900**			**$4,534,343**	**$181,200**			**$4,434,307**	**$180,700**			**$4,534,343**	**$315,000**		**$0**	**$0**
117	CC [illegible]	[illegible] [illegible]	230301	30	$1,508,121	$241,300	[illegible]	30	$1,508,121	$60,400	[illegible]	30	$1,650,094	$66,000	14-23	30	$1,508,121	$105,500	30	$0	$0
118	CC [illegible]	PALMERO YERIS [illegible]	230301	30	$1,508,121	$241,300	[illegible]	30	$1,508,121	$60,400	[illegible]	30	$1,508,121	$60,400	14-23	30	$1,508,121	$105,500	30	$0	$0
119	CC [illegible]	VELEZ RODRIGUEZ WILSON ALEXIS	230301	30	$1,508,121	$241,300	[illegible]	30	$1,508,121	$60,400	[illegible]	30	$1,508,121	$60,400	14-23	30	$1,508,121	$105,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(100)**				**$118,213,891**	**$18,996,900**			**$132,348,093**	**$5,303,200**			**$128,260,894**	**$5,109,000**			**$130,348,093**	**$8,390,100**		**$1,300,000**	**$65,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9400[illegible]	0	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	9 - APORTANTES DE [illegible]	YOPAL	CLL 35 H 23 - 46	YOPAL CASANARE	6327179	S


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	7256194	94634[illegible]	S	2024/04/09	2024/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	6	$38,166,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				92	$16,896,900	$96,500	$0	$16,993,400
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$1,083,500	$5,600	$0	$1,089,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,529,200	$12,900	$0	$2,542,100
PORVENIR	23I301	800,224,808	8	70	$14,152,700	$72,200	$0	$14,224,900
PROTECCION	23I201	800,229,739	0	6	$1,131,500	$5,800	$0	$1,137,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				100	$8,598,100	$43,900	$0	$8,642,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	100	$8,598,100	$43,900	$0	$8,642,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				100	$5,109,000	$26,100	$0	$5,135,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,352	8	100	$5,109,000	$26,100	$0	$5,135,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				100	$5,303,200	$27,600	$0	$5,330,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$300	$0	$52,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	23	$1,193,900	$6,100	$0	$1,200,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$98,100	$500	$0	$98,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$27,800	$200	$0	$28,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,200	$600	$0	$104,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
FOSYGA	MINSD1	901,037,916	1	1	$52,000	$300	$0	$52,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MINSD2	901,037,916	1	4	$278,800	$1,500	$0	$280,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,223,200	$6,300	$0	$1,229,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$688,600	$3,600	$0	$692,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$1,532,600	$7,900	$0	$1,540,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$300	$0	$39,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$200	$0	$39,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$200	$0	$26,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$200	$0	$26,200
TOTAL				100	$37,972,200	$194,500	$0	$38,166,700

2024/04/15 05:13 PM

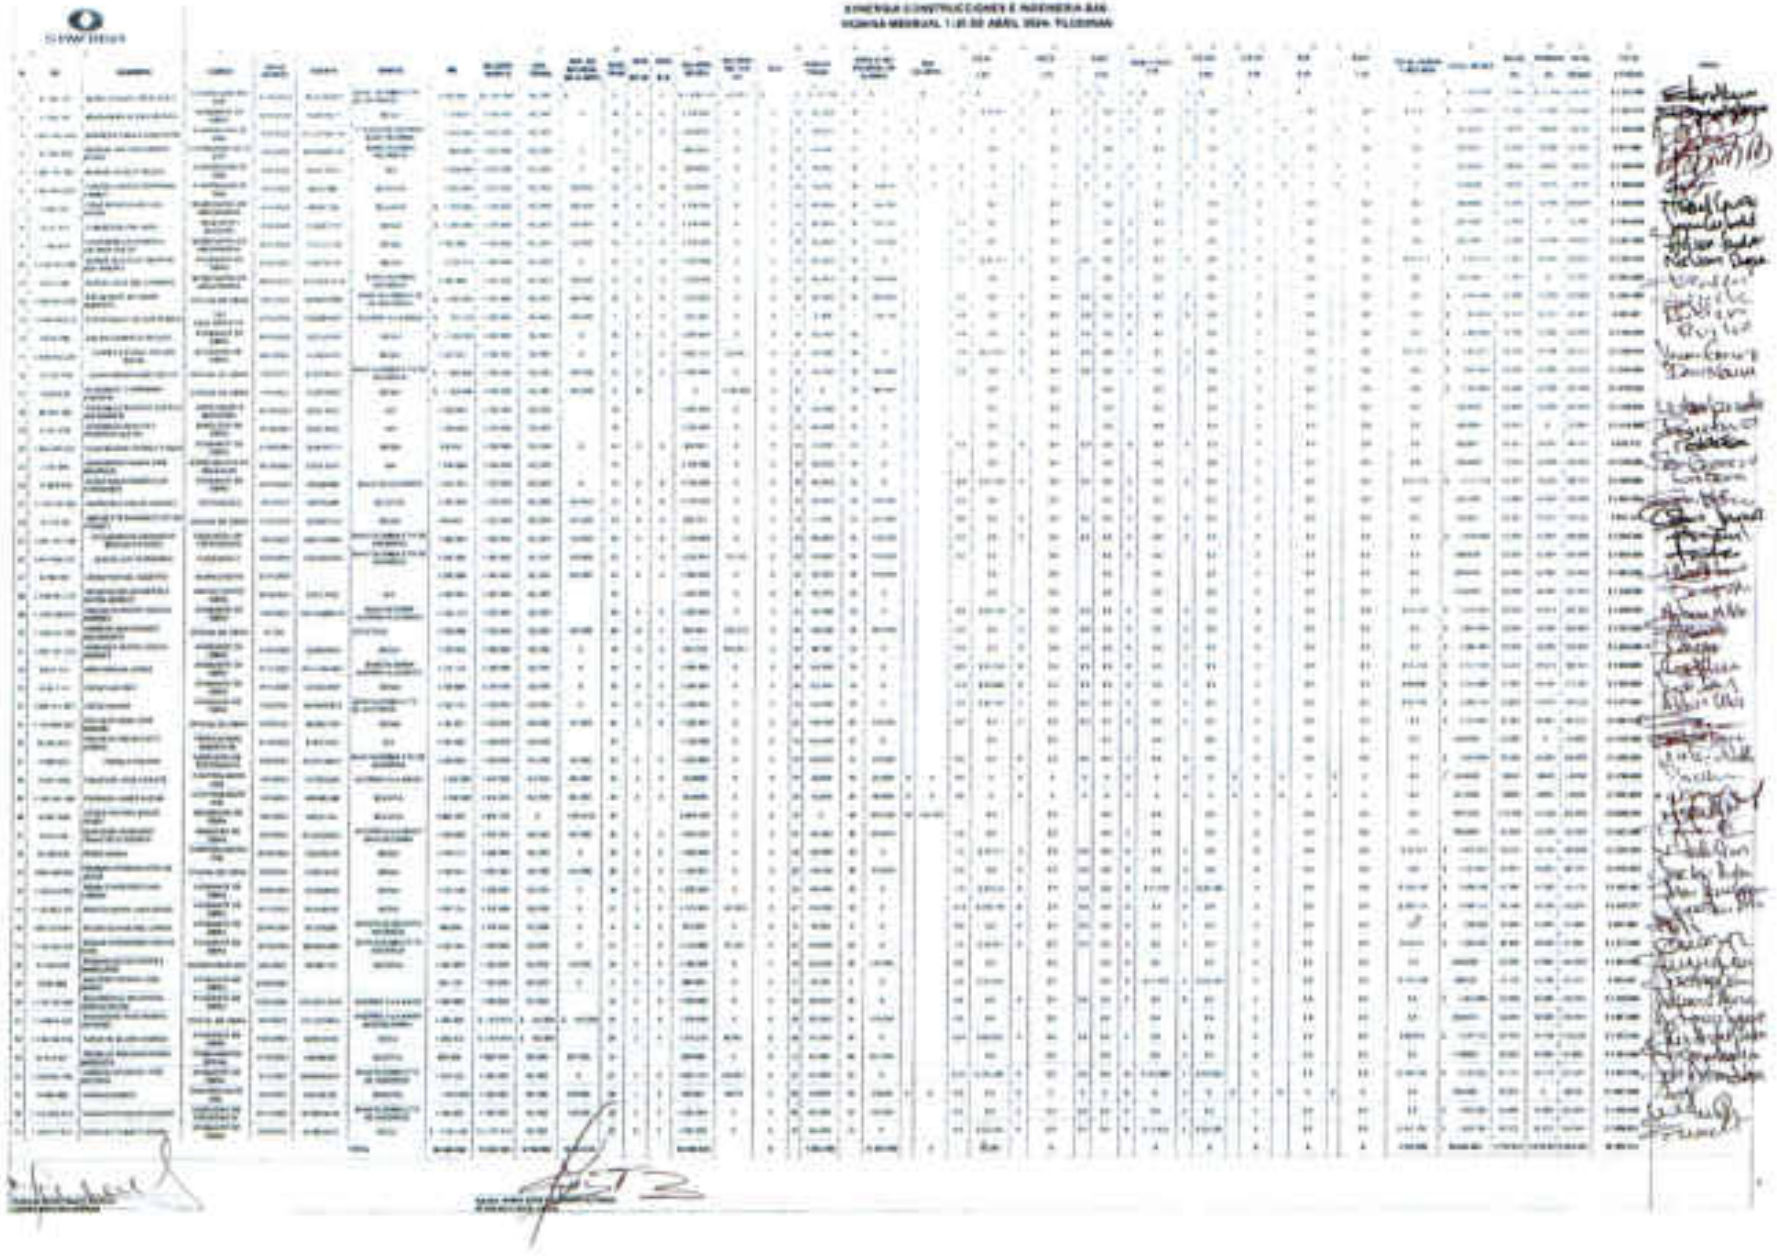

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9440049840	0	SYNERGia CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 26 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	39015797	94694799	E	2024/05/10	2024/05/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$41,822,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


EMPLEADO				NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre																									Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Tarifa	Aportes	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (111 Afiliados)																											$135,865,000	$20,935,000			$133,906,200	$1,721,900			$143,910,000	$9,019,400			$144,596,200		$9,321,100			$41,191,700
Centro de Trabajo: OROCUÉ 0.00 (3 Afiliados)																											$3,900,000	$614,000			$3,900,800	$156,000			$3,900,000	$194,000			$3,900,000		$171,000			$1,207,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																											$3,900,000	$614,000			$3,900,800	$156,000			$3,900,000	$194,000			$3,900,000		$171,000			$1,207,000
1	CC	1015	CRUZ MONROY MIGUEL ANGEL																								23/30	30	$1,300,000	$208,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	23/30	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
2	CC	1082811829	ESCALANTE ALTAMAR ALBERTO SANTIAGO																								23/30	30	$1,300,000	$208,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	24/30	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
3	CC	1085749599	LIZCANO MARIN EDWARDS MATIAS ESTHEH																								23/30	30	$1,300,000	$208,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	19/30	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
Centro de Trabajo: YOPAL 0.022 (3 Afiliados)																											$4,000,000	$640,000			$4,000,800	$162,000			$4,000,000	$162,000			$4,000,000		$21,000			$993,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																											$4,000,000	$640,000			$4,000,800	$162,000			$4,000,000	$162,000			$4,000,000		$21,000			$993,000
4	CC	1074344168	BARRERA ALFONSO MARIA DIGNIT																								23/30	30	$1,300,000	$208,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	24/30	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	N	$319,800
5	CC	1118503533	BARRERA SANCHEZ MARTHA LUCERO																								23/30	30	$1,300,000	$208,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	18/30	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	N	$319,800
6	CC	1007884043	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO																								29/30	30	$1,450,000	$232,000	29/30	30	$1,450,000	$58,000	23/30	30	$1,450,000	$58,000	24/30	30	$1,450,000	0.522%	$7,600	30	$0	$0	N	$355,600
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (103 Afiliados)																											$122,902,800	$19,671,200			$123,016,240	$5,401,900			$122,944,800	$5,251,400			$126,016,240		$9,228,400			$29,885,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (103 Afiliados)																											$122,902,800	$19,671,200			$123,016,240	$5,401,900			$122,944,800	$5,251,400			$126,016,240		$9,228,400			$29,885,000
7	CC	1084455551	AGUDELO MORENO PALLARCY																								23/30	30	$1,300,000	$208,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	14/30	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$404,500
8	CC	1074407581	ALARCON ELOY MERCEDES																								23/30	1	$43,334	$7,000	23/30	1	$43,334	$1,800	23/30	0	$0	$0	14/30	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	N	$8,800
9	CC	1074407581	ALARCON ELOY MERCEDES																								23/30	2	$86,667	$13,900	23/30	2	$86,667	$3,500	23/30	0	$0	$0	14/30	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	N	$17,400
10	CC	1074407581	ALARCON ELOY MERCEDES																								23/30	3	$86,667	$13,900	23/30	3	$86,667	$3,500	23/30	0	$0	$0	14/30	3	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	N	$17,400
11	CC	1074407581	ALARCON ELOY MERCEDES																								23/30	23	$1,083,334	$173,800	23/30	23	$1,083,334	$43,400	23/30	23	$1,083,334	$43,400	14/30	23	$1,083,334	6.960%	$75,500	23	$0	$0	N	$335,700
12	CC	9440999	ALFONSO GONZALEZ MARIO																								1/30	1	$43,334	$6,900	1/30	1	$43,334	$1,800	23/30	1	$43,334	$1,800	14/30	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	N	$10,500
13	CC	9440999	ALFONSO GONZALEZ MARIO																								23/30	29	$1,254,334	$200,700	23/30	29	$1,254,334	$50,200	23/30	29	$1,254,334	$50,200	14/30	29	$1,254,334	6.960%	$87,300	29	$0	$0	N	$387,700
14	CC	1120221787	ARIZA MORENO ENGUEBERTO																								23/30	30	$1,275,001	$204,000	23/30	30	$1,275,001	$51,100	23/30	30	$1,275,001	$51,100	14/30	30	$1,275,001	6.960%	$88,800	30	$0	$0	N	$394,800
15	CC	1006407581	AVILA COLMA CARLOS YINDEY																								23/30	30	$1,300,914	$208,200	23/30	30	$1,300,914	$52,100	23/30	30	$1,300,914	$52,100	14/30	30	$1,300,914	6.960%	$90,600	30	$0	$0	N	$402,900
16	CC	4113373	AVILA HURTADO ALVARO	1	3																						1/30	4	$115,000	$22,000		4	$0	$0	23/30	4	$115,000	$4,600	14/30	4	$1,300,000	6.960%	$90,500	4	$0	$0	No	$135,000
17	CC	1007381014	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																								23/30	30	$1,450,000	$232,000	23/30	30	$1,450,000	$58,000	23/30	30	$1,450,000	$58,000	14/30	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,000
18	CC	9744978	BERNAL ALFONSO MARIA DIGNI																								23/30	30	$1,400,000	$224,000	23/30	30	$1,400,000	$56,000	23/30	30	$1,400,000	$56,000	14/30	30	$1,400,000	6.960%	$97,400	30	$0	$0	N	$433,400
19	CC	1007619967	BERNAL SUSSY YULIVER Subsidi																								23/30	30	$1,450,000	$232,000	23/30	30	$1,450,000	$58,000	23/30	30	$1,450,000	$58,000	14/30	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,000
20	CC	1006481131	CASTILLO ACOSTA JONATAN ALEJANDRA	1																							23/30	29	$1,311,431	$209,800	23/30	29	$1,311,431	$52,500	23/30	29	$1,311,431	$52,500	14/30	29	$1,311,431	6.960%	$91,400	29	$0	$0	N	$406,200
21	CC	1118503110	LIZCANO CUNCUM ALFONSO																								23/30	30	$1,311,429	$210,000	23/30	30	$1,311,429	$52,500	23/30	30	$1,311,429	$52,500	14/30	30	$1,311,429	6.960%	$91,500	30	$0	$0	N	$406,500
22	CC	1117322040	CHALA SERRANO ERNESTO ANTONIO	1																							23/30	23	$866,667	$138,700	23/30	23	$866,667	$34,700	23/30	23	$866,667	$34,700	14/30	23	$866,667	6.960%	$60,400	23	$0	$0	N	$268,500
23	CC	7163979	CHAPARRO VILLAMIZAR WILMAR FREDY																								23/30	30	$1,300,000	$208,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	23/30	30	$1,300,000	$52,000	14/30	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500

aportes en línea

Planilla Resumen

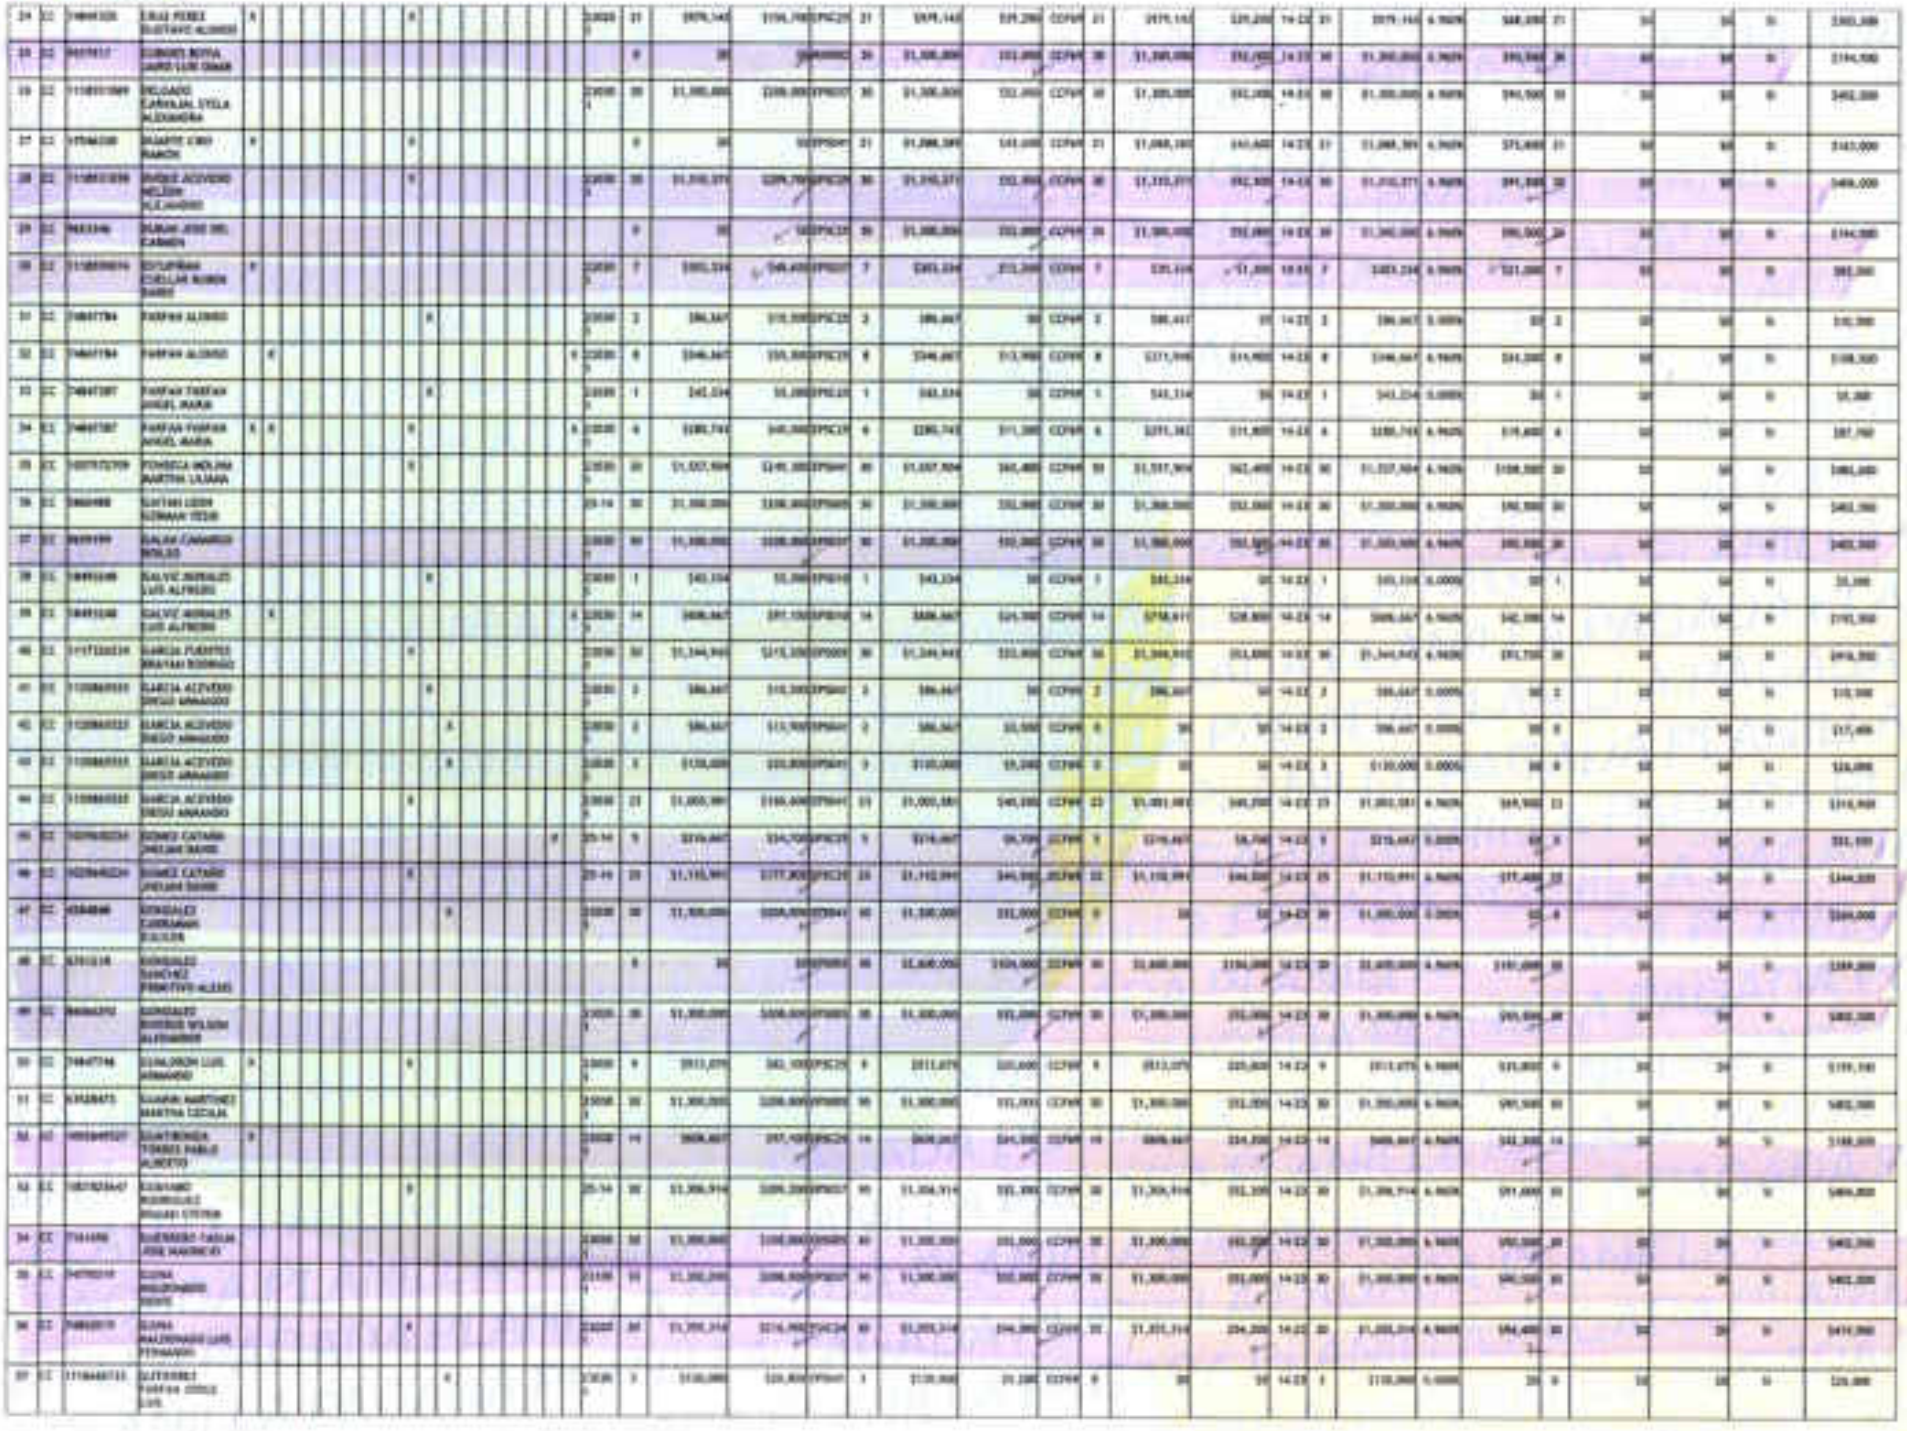


2024/05/14 09:04 AM

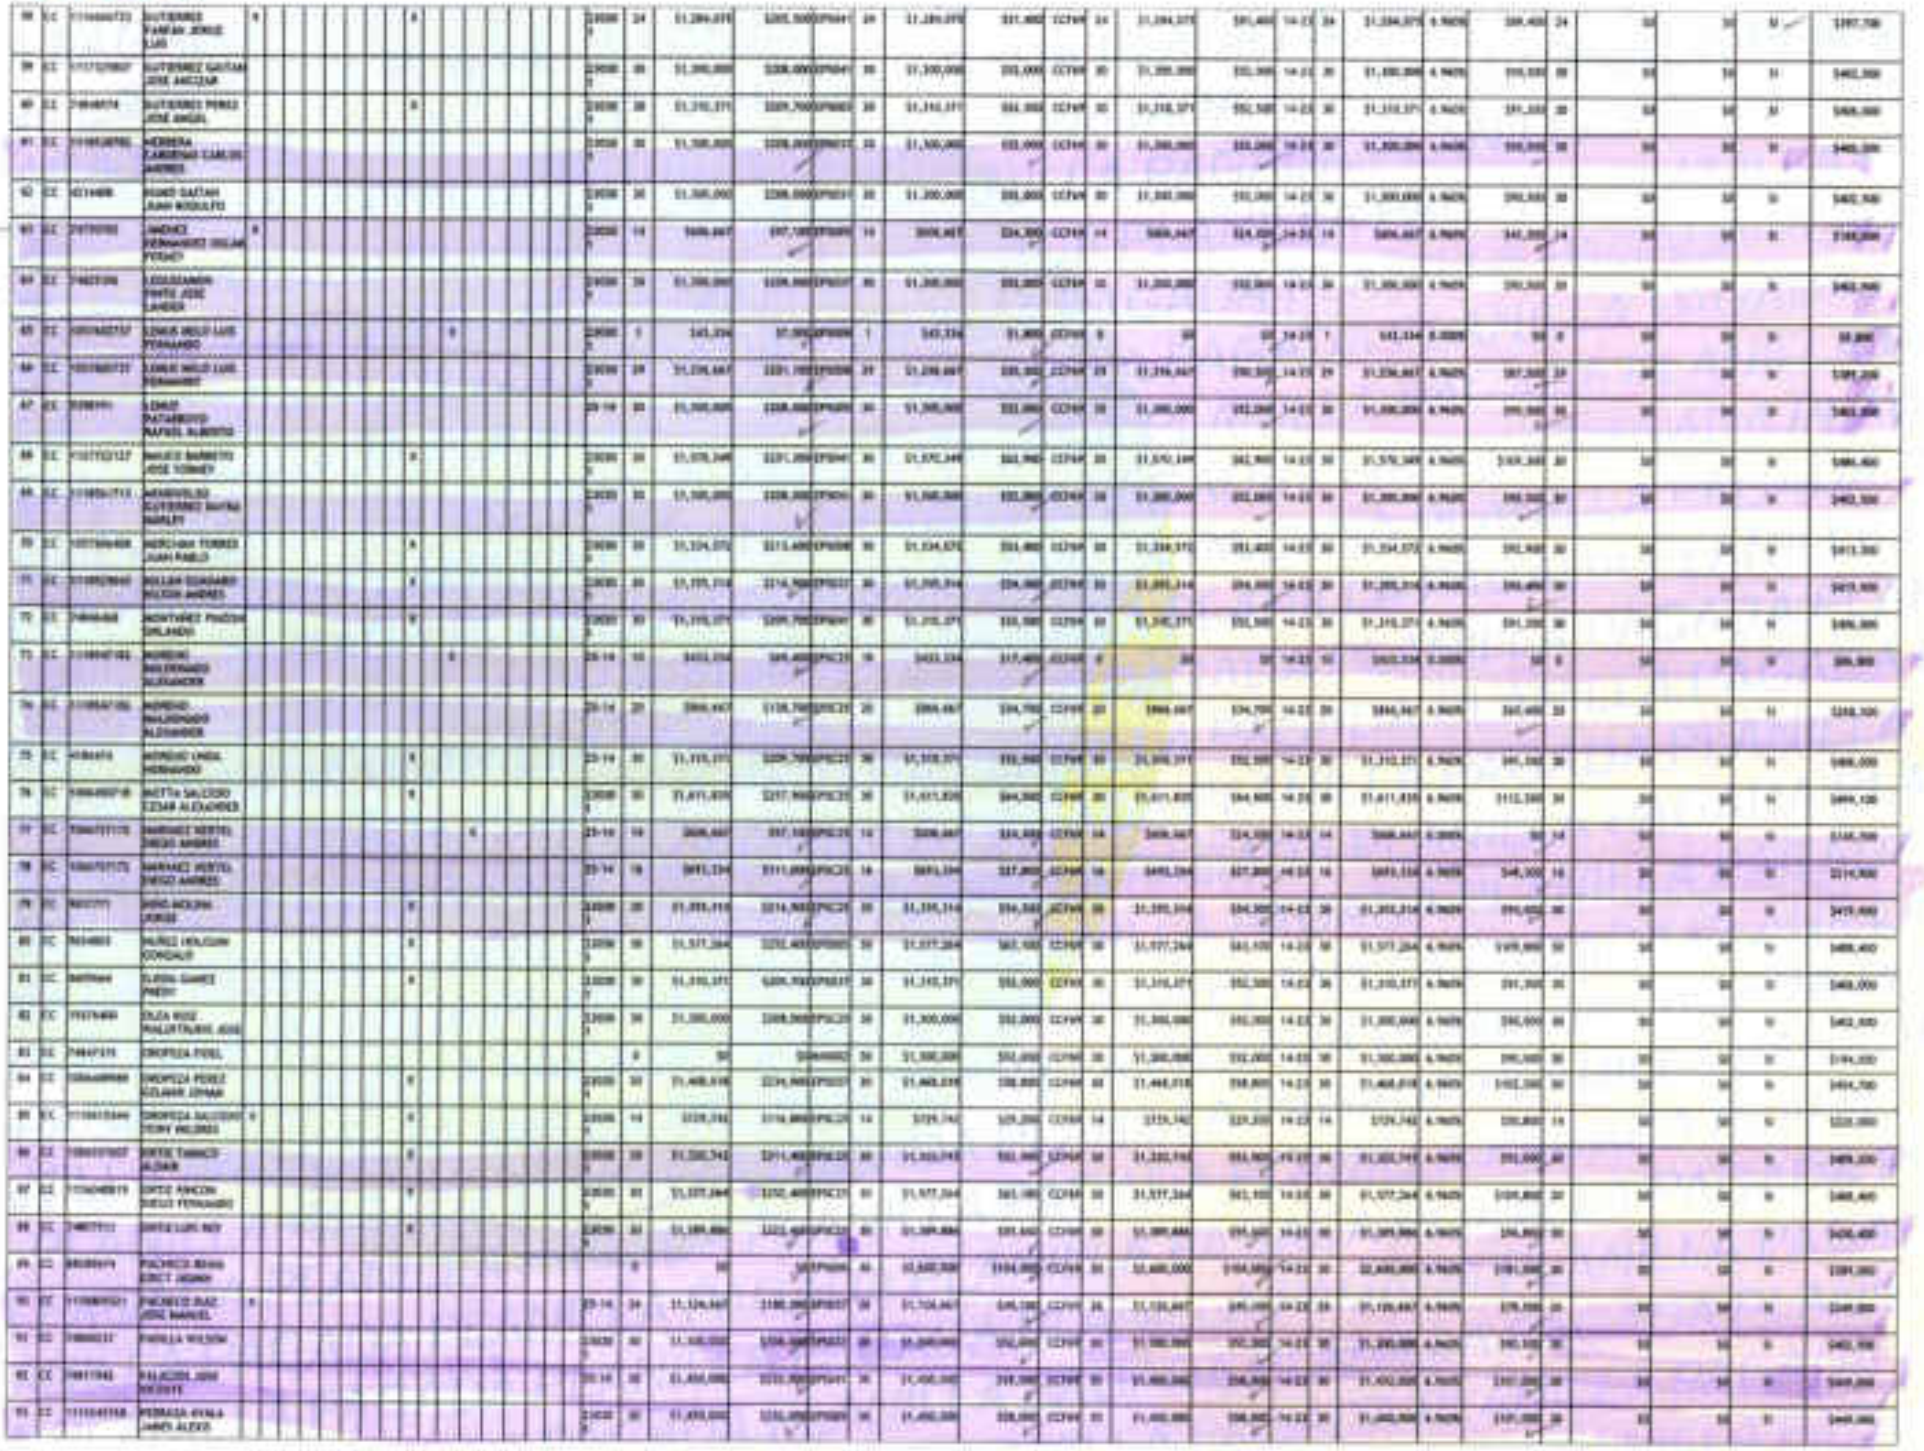

aportes en línea

Planilla Resumen

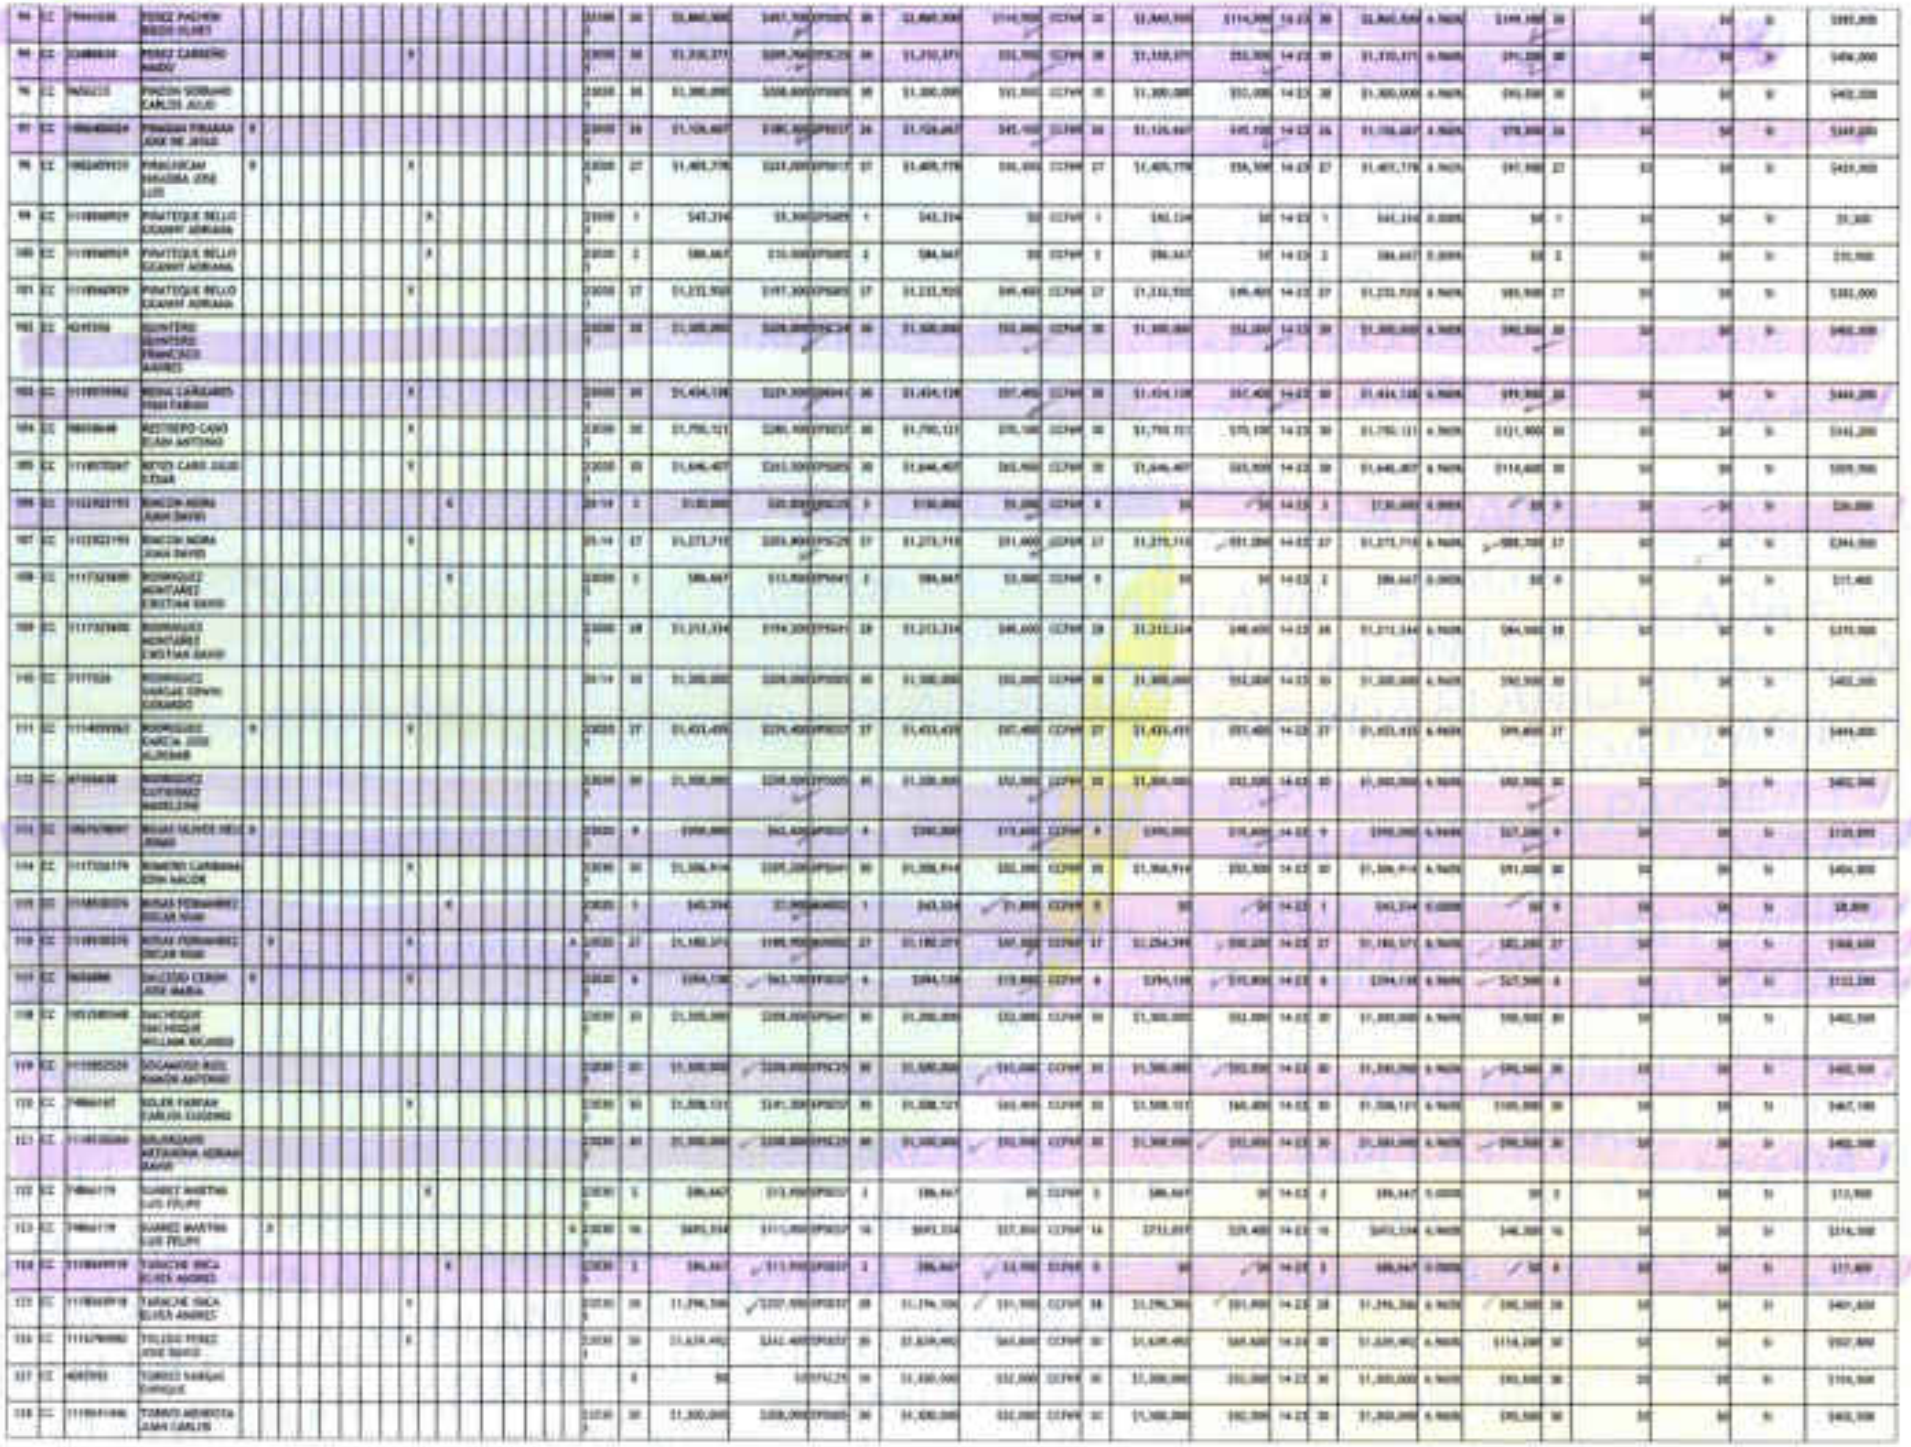

2024/05/14 09:04 AM

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	A - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327170	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	390157797	9466967918	E	2024/05/10	2024/05/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$41,822,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				105	$20,937,300	$0	$0	$20,937,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,137,700	$0	$0	$1,137,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$2,774,400	$0	$0	$2,774,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	78	$15,330,200	$0	$0	$15,330,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,695,000	$0	$0	$1,695,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				113	$9,527,300	$0	$0	$9,527,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	113	$9,527,300	$0	$0	$9,527,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				113	$5,631,900	$0	$0	$5,631,900
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	113	$5,631,900	$0	$0	$5,631,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				112	$5,725,500	$0	$0	$5,725,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$55,100	$0	$0	$55,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	29	$1,385,500	$0	$0	$1,385,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$105,500	$0	$0	$105,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$158,500	$0	$0	$158,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$24,300	$0	$0	$24,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$56,300	$0	$0	$56,300
FOSYGA	4804001	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	4804002	901,037,916	1	4	$205,100	$0	$0	$205,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,312,900	$0	$0	$1,312,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	17	$907,300	$0	$0	$907,300
SANITAS	EPS005	830,251,440	6	26	$1,363,000	$0	$0	$1,363,000
TOTAL				113	$41,822,000	$0	$0	$41,822,000

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°25 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES LOGÍSTICOS & SERVICIOS HERNANDES S.A.S	FEH 450	2/04/2024	$ 5.045.040,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ	FE 15	3/04/2024	$ 20.740.500,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES VALUARTE ANDINA S.A.S	FEVA 1008	4/04/2024	$ 5.742.464,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	H&S GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 348	4/04/2024	$ 36.608.208,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MATERIALES Y CARGAS S.A.S	FE 411	5/04/2024	$ 3.589.040,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	SATT CARGA S.A.S	FE 254	8/04/2024	$ 3.589.040,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSUNICARGA S.A.S	FEV 27	8/04/2024	$ 4.665.752,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSCARGA EXPRESS S.A.S	TREX 212	9/04/2024	$ 2.512.328,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTES COTRANSERVIS S.A.S	CTSA 2042	9/04/2024	$ 2.153.424,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	INTERVOLCARGAS GR S.A.S	JGMR 731	9/04/2024	$ 2.153.424,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	VANETRANS S.A.S	PY 1447	9/04/2024	$ 3.589.040,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO S.A.S	FEV 1962	16/04/2024	$ 30.000.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSMIGUEL S.A.S	FE 3739	15/04/2024	$ 2.153.424,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ	FE 16	16/04/2024	$ 16.434.000,00
TOTAL				**$ 138.975.684,00**

Factura Electrónica De Venta No

FEH No. 450

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065994541 que habilita desde FEH 434 hasta FEH 500. Vence 2025-02-22
No somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención IVA

TRANSPORTES LOGISTICOS & SERVICIOS HERNANDES S.A.S
Nit 901439103

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		Actividad Económica ICA 301 4,00 X 1000
NIT	844004840 0		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS DOBLE TROQUE DURANTE EL MES DE MARZO 2024
CL 30 28 46	Yopal		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR
02/04/2024	02/04/2024		STAVO ADOLFO HERNANDEZ SALAMAN

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0.2 TRA	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS DOBLE TROQUE DURANTE EL MES DE MARZO 2024	1	Und.	5.096.000	0%	0	5.096.000

T1/0

Total lineas o items: 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.096.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.096.000
RETEFUENTE	50.960
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.045.040

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/04/2024 15:01:20

NOTA: Todo se descont
RTF

CR 7B 40 48 Teléfono 3138977123
Correo Electrónico transportesyservicioshernandez@gmail.com

CUFE: e506295c09aec3ee59af9e00a1fa6905f8c8a9283490f234c32ce90c75d0d9698ec299dda375c7cFec7230887b6e08--Expedición:02/04/2024 03:05 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

198

Espacio para
Logo Corporativo

CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ
NIT 46.373.163-1
CR 6 A 40 8 23
Tel: (608) 3134205633
Yopal - Colombia
46claudiacruz@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 15

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(608) 6327178 - Ext. 000
Dirección	CL 30 28 46 BRR ALTOS DE MANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	03/04/2024, 12:22
Expedición	10/04/2024, 11:58
Vencimiento	03/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Tilodiran Casanare. viajes de excavación cargados en las volquetas FSI 858- WZC 406 - OXD 794	419.00	20,950,000.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Veinte millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cheque

Total Bruto	20,950,000.00
Total a Pagar	**20,950,000.00**

$ 20,950,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066301595 aprobado en 20240303 prefijo FE desde el número 13 al 250 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: e6858e8cb89663fae0e42b268f3b764b2db0bf5b3a6231d377df7a263765e2410454748064cd32b391b236a5e9647180

Validado Software y Proyectos Tecnológicos SAS - NIT 830276145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Fecha validación: 01/04/2024

Factura - iSiigo

TRANSPORTES VALUARTE ANOBIA SAS
NIT 900.674.764-5
CR 42 N 2 128
Tel: (608) 3213210498
Yopal - Colombia
transportesvaluarteandinasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVA 1008

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
644.004.840-0
CL 20 28 46 CA 20 BRR ALT DE MANARE

Teléfono (608) 3178560362 - Ext. 000
Ciudad Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 04/04/2024, 15:05
Expedición 04/04/2024, 15:05
Vencimiento 19/05/2024

Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Vr. Unitario
eporte de Carga Yopal - SMK828	1.00	1,001,000.00	1,092,000.00	1,092,000.00
eporte de Carga Yopal - SRM813	1.00	1,441,440.00	1,456,000.00	1,456,000.00
eporte de Carga Yopal - THK820	1.00	1,801,800.00	1,820,000.00	1,820,000.00
eporte de Carga Yopal - UFW715	1.00	1,441,440.00	1,456,000.00	1,456,000.00

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 04-04-2024
HORA: 3:30 P.M.
CANTIDAD DE FOLIOS: 9
RECIBIDO POR:
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

a: 4

otras:
llones setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos

Total Bruto	5,824,000.00
Retefuente 1%	58,240.00
RTE ICA Comportista 4*1000 Yopal	23,296.00
Total a Pagar	5,742,464.00

os de Pago:
Cuota No. 001 vence el 2024-05-19 por $ 5,742,464.00

ones:

Factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los
las o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764063883401 aprobado en 20240111 prefijo FEVA desde el número 995 al 3000
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa YOPAL COD 305 - 4 X MIL
CUFE: da4aa0249844605fd675a72994dbf69b8201944318b3a11c6a2feb019bd0dd67cb838b23a449c467e8f78eb47413ebd

CL 48 5 65, Yopal, Casanare, Colombia, CP 850001
Tel. 3123063487
Email. hsglobalservicessas@yahoo.es
Actividad Económica 4923 ICA 4X1000

900 707 153

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764057719387 válida desde 2023-10-09 hasta 2024-10-09 rango desde FE285 hasta FE1000.

Favor Consignar en Bancolombia Cta Cte 01155486007 a nombre de H&S GLOBAL SERVICES S.A.S.

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT :	844004840-0
Dirección:	CLL 30 N 28- 46, Yopal, Casanare, Colombia, CP 85001
Teléfono:	6359474
Email:	synergiaconstrucciones@gmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	15/04/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE348**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**19:38:30**
FECHA FIRMADO:	**04/04/2024 19:38:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2024	04	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	S001	Servicio de Transporte Carga Transporte Mensual (Proyecto TILO) Marzo 2024	94	1,00	$37.128.000,00				0,00	$37.128.000,00

Notas:

SON: (treinta y siete millones ciento veintiocho mil pesos)
CUFE: a3efe50fbce960a91a4578a850da8eb5da15f718d1382aae4b84f80eccbc140f23618de24f07d6b0154b4f14946f260d

Subtotal:	$37.128.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$37.128.000,00
ReteRenta:	$371.280,00
Neto Factura:	$36.756.720,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	RETENCIONES		
06 ReteRenta	$37.128.000,00	1,00 %	$371.280,00

Firma Digital: MIIHkgYJKoZIhvcNAQcCoIIHgzCCB38CAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADALBgkqhkiG9w0BBwGgggPTMIIDzzCCAregAwIBAgIUVoPSiXRgZApLJ5xaROk1TYB5UkQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCQ08xDzANBgNVBAgMBkNhc2FuYXJlMQ8wDQYDVQQHDAZZb3BhbDEVMBMGA1UECgwMSEEgR0xPQkFMIFNFUlZJQ0VTMRUwEwYDVQQDDAxIQSBHTE9CQUwgQ0EwHhcNMjMxMDA5MTQzMjMyWhcNMjQxMDA4MTQzMjMyWjBtMQswCQYDVQQGEwJDTzEPMA0GA1UECAwGQ2FzYW5hcmUxDzANBgNVBAcMBllvcGFsMRUwEwYDVQQKDAxIQSBHTE9CQUwgU0FTMRUwEwYDVQQDDAxIQSBHTE9CQUwgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDEBJmD+0YenDBkH/RZ3dDOwfUWVn31U9v+H0

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt 830.059.034-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MATERIALES Y CARGAS SAS
NIT 900.649.922-7
CL 21 CR 20 46 BRR EL GAVAN
Tel: (038) 3103348390
Yopal - Colombia
temcarsas@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764059357988 aprobado en 20231104 prefijo FE desde el número 356 al 500 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 411

Fecha y Hora Factura
Generación: 05/04/2024, 16:06
Expedición: 05/04/2024, 16:20

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	844.004.840-0	2024-04-20
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CALLE 30 No 28-46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE	(608) 6327178
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
synergiaconstrucciones@gmail.com	Trinidad Merchan	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o sequro deben hacerse al transportador

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE CRUDO DE RIO DESDE LA CANTERA AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO SAS EN YOPAL CASANARE PARA EL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN, EN EL MES DE MARZO 2024, CON LOS VEHICULOS TIPO VOLQUETA DE PLACAS UVL809 Y UVM533. SEGUN RELACION Y RECIBOS ADJUNTOS. ICA: MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.	1.00	3,640,000.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 01123663054 A NOMBRE DE TEMCAR SAS.

Total Bruto	3,640,000.00
Total a Pagar	3,640,000.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-20 por $ 3,640,000.00

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 06-04-2024
HORA: 10:40 am.
CANTIDAD DE FOLIOS: 26
RECIBIDO POR: MONICA
EL RECIBIDO

VENDEDOR
C.C. O NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. O NIT.:

CUFE: 0568ae6643f7dbeba8db8278a73c9ca4d05d1257c95264e3908cfb0899f92f51a85168ea7cd0013[illegible]

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.018.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vence en el XM.

SATT-CARGA S.A.S.
NIT 900.462.135-2
CL 29 07 46 BRR EL PARAISO
Tel: (8) 6333471 - Ext. undefined
Yopal - Colombia
sattcarga@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 254

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(608) 6327178	**Generación**	08/04/2024, 16:56
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	08/04/2024, 16:57
				Vencimiento	08/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.	Cargo	Vr. Bruto
1	Servicio De Transporte Material Petreo-Proyecto Tibaderan En Vehiculos Varios Mes Marzo 2024.	1.00	3.640.000.00		0.00	3.640.000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cuarenta mil pesos mvcte

Condiciones de Pago:
Consignación

Total Bruto	3.640.000.00
Total a Pagar	**3.640.000.00**

$ 3.640.000.00

Observaciones:
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 11-140659-44

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764053766561 aprobado en 20230815 prefijo FE desde el número 201 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4
CUFE: 257a6eb67fc70c102af8a55c7940467176d4dbf27efa4d91fc1ad00b45b39bbe4980ca97211e9a8a1883c75788a07f1e1

Factura Software y Tecnología SAS - NIT 900.462.135-6 Medio Software Propio - Representación gráfica

202

TRANSUNICARGA S.A.S
Transportadores Unidos De Carga

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 27

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061251392 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 200. Vence 2024-12-04

TRANSPORTADORES UNIDOS DE CARGA S.A.S.

Nit 900868208

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4923 4.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT	844004840 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 30No. 26 - 46	Yopal	3178560362

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
08/04/2024	08/04/2024

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
NIDIA JOHANNA PEREZ HOLGUIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TUC	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	4.732.000	0%	0	4.732.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.732.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.732.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.732.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2024 15:46:18

CALLE 21 No. 9A - 51 Teléfono 3107697457 Yopal
Correo Electrónico transunicargasas@gmail.com

CUFE: 154cfd8837b211b117b84c10bd0693762cc1357956e32e468c4ea8929994d25aa8a7517571d5a6803455b67b2098815--Expedición:08/04/2024 03:50 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ws_2)

TRANSCARGA EXPRESS SAS
NIT: 900863974-6
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 18 34 38, Yopal, Casanare, Colombia, CP 850002
Tel. 3203740843
Email. transcargaexpresssas@gmail.com

NO SOMOS RESPONSABLE DE IVA – NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:4923

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764065860542 válida desde 2024-02-20 hasta 2025-02-20 rango desde TREX-201 hasta TREX-500.

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT :	844004840-0
Dirección:	CALLE 30 # 28-46 BARRIO ALTOS DE MANARE, Yopal, Casanare, Colombia, CP 850002
Teléfono:	3178560362
Email:	synergiaconstrucciones@gmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	09/05/2024
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**TREX - 212**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:35:03**
FECHA FIRMADO:	**09/04/2024 08:35:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
09	04	2024	08	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	001	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Tito	KTM	1,00	$2.548.000,00				0,00	$2.548.000,00

Notas:

SON: (dos millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos)
CUFE: 5b5291d08c208661197ef6289c58d53a7825988859fd178fd27234d9d9e69cc80b1398c0781f8b8b89762c2af584D441

Subtotal:	$2.548.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.548.000,00

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 646628374

Firma Digital: b2c123bfQL8KjfQP3OPv4v8AcaF2B5f2zb8d+Yzb57yPRwpnvMEB9bnfVrqjKLUd2v1T

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt.8[illegible]

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

205



TRANSPORTES COTRANSERVIS S.A.S.
NIT 900.685.304-8
Carrera 18 # 21 - 33
Tel: (608) 3138153080
Yopal - Colombia
cotranservis.operaciones@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CTSA 2042

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
NIT	864.004.840-0	**Teléfono**	(608) 6327178
Dirección	CL 30 28 46	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2024, 11:28
Expedición	09/04/2024, 11:28
Vencimiento	09/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de Carga por Carretera	1.00	2,162,160.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-09 por $ 2,153,424.00

Observaciones:

Total Bruto	2,184,000.00
Retefuente 1%	21,840.00
Reteica 22 pagar 4*mil Yopal Cod 306 - Serv Trans	8,736.00
Total a Pagar	**2,153,424.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061905254 aprobado en 20231214 prefijo CTSA desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4x1000
CUFE: 7c2938669421794298b5464845280b168affab43c3c8932e793b2454fc61bc0ff3ff274ccc248a9bd8b08d32648c3256c3

Factura Software y Procesos tecnológicos SAS - Nit 830.048.113-6 Versión Software: 09gs1Ndn Fecha emisión: 09/04/2024

INTERVOLCARGAS G.R S.A.S.

CARGA SEGURA

NIT 900769646-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764055823466
Fecha 11/09/2023 - 11/09/2024
Autorización de Facturación Electrónica del JGMR-669 al JGMR-1000 RESPONSABLE DE IVA-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES.
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 4923
Email: intervolcargas.grsas@gmail.com
Teléfono: 6331877
Este comprobante corresponde al periodo de: 01/03/2024 hasta: 31/03/2024.

Departamento	Fecha		
Casanare	09	04	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° JGMR - 731

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	**NIT:**	844004840-0	**Fecha de firmado:**	09/04/2024 09:41:25
Dirección:	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE	**Departamento:**	Casanare	**Teléfono:**	6327178
Email:	synergiaconstrucciones@gmail.com	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Mayo 09 del 2024	**Hora emisión:**	09:41:22	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	09/05/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% VAL.	MONTO		
1	60100000-9	1,00	TRANSPORTE DE MATERIAL 01: 503160275 02: RM000074 03: 364000 01: 503160358 02: RM000075 03: 364000 01: 503160378 02: RM000076 03: 364000 01: 503161240 02: RM000079 03: 364000 01: 503161295 02: RM000080 03: 364000 01: 503161323 02: RM000081 03: 364000	KTM				$2.184.000,00	$2.184.000,00

Notas:

SON: (dos millones ciento ochenta y cuatro mil pesos)
CUFE: e5f70555b206a39b14efe0397812ca25536b78bcaa8e60f6e036e8bada5e4b280d50ed5cdf3ed322afd6e99c52151ca77a

Subtotal:	$2.184.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.184.000,00

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 58742448160 DE BANCOLOMBIA.

Firma Digital: [illegible]

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/03/2024 hasta: 31/03/2024.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

VANETRANS S.A.S

TEL.: 099 633 3143 / CEL. : 313 347 3566 - 314 410 0063 /
CALLE 42 No. 5A - 22 YOPAL - CASANARE
E-MAIL: vanetransltda@gmail.com

NIT 805021621-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764060575766
Fecha 24/11/2023 - 24/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del PY-1391 al PY-1500 RETEFUENTE 1%
Email: vanetransltda@gmail.com
Teléfono: 6086333143

Ciudad Emisión	Fecha		
Casanare	09	04	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° PY - 1447

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	**NIT:**	844004840-0	**Fecha de firmado:**	09/04/2024 14:10:35
Dirección:	CALLE 30 # 28 – 46 CASA 20	**Departamento:**	Casanare	**Teléfono:**	3133957779
Email:	synergiaconstrucciones@gmail.com	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Abril 09 del 2024	**Hora emisión:**	14:10:32	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	09/04/2024				
Total de Lineas: 1					

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	% IVA	MONTO		
1	TILODIRAN	1,00	TRANSPORTE DE CARGA **CARGADO EN CANTERA:** SAN RAFAEL (YOPAL) **PARA:** ACOPIO TILODIRAN	WSD				$3.640.000,00	$3.640.000,00

Notas:

SON: (tres millones seiscientos cuarenta mil pesos.)
CUFE: db75d9e8bbe86375e85bc791391c58d8ae0f3a1f6044115a9f6af65de36fb2afdfdde2937d8836c3b49d55eeed9667b49c3a

Subtotal:	$3.640.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.640.000,00
ReteRenta:	$36.400,00
Neto Factura:	$3.603.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$3.640.000,00	1%	$36.400,00

SI SU PAGO ES MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, FAVOR GIRARLO A LA CUENTA CORRIENTE No. 629196052274 DE BANCOLOMBIA, A NOMBRE DE VANETRANS S.A.S

Firma Digital: xsBnb+ub31yhuzRkwbBRYkvQ3XOuyKE8WWgmwaBh4d1UcDvb37WvcfbMbmNy
GeL+9K2VDr+D3NvE06Dg/+pDKbdGMkkaMSwrYEM4+wdk2YMF9D
dW2YPNK2ZNLH jeyhOqvTwuaGmE19e9vEVtTbUzbHHbfYyvJ0xBtwvY1ZXyHEl3vgDBRxxcFWb9t NeV9dJY3cVcpR1ChdNMbqtmmY1wuWgmvhZ/k
YJVbGwTKzmdogZ/DdcdSwvVLgFg21 AWjZGnwxG17w8RbKOKjUO+bKdlvEZJMDxmWdgDDDJDdPWmqgtpYTGvRq 9RCogI+DlvjBRvDYmx2
2Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt Recepción DIAN

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-6

Facturatech

208

AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO S.A.S

NIT: 900875340-9

Impuesto sobre las ventas - IVA

Facturación por computador según Resolución N° 18764043978840 de fecha 2023/02/06. Habilita desde 1534 a la 2000.

KM 3 VIA YOPAL MORICHAL PLANTA
OFICINAS CLL 24 # 12 - 26 PISO 3
Cel: 3124789790 - 3107977504
Yopal - Colombia

ACTIVIDAD ECONOMICA
CIUU 306 Tarifa Ica 4/1000

Responsable de Ica/Yopal

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 1.962

SEÑORES:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT:	844004840-0
DIRECCION:	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALT
TELEFONO:	3178560362
CUIDAD:	YOPAL

FECHA FACTURA	VENDEDOR
16/04/2024 02:35:34p.m.	CASTRO ABRIL TATIANA
FECHA VENCIMIENTO	**FORMA DE PAGO**
16/04/2024 02:35:34p.m.	Credito

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE	250.00	121.704	30.426.000

SON: TREINTA MILLONES TREINTA Y SEIS PESOS Y CERO M/CTE

SUBTOTAL	30.426.000
DESCUENTO	0
TOTAL IVA	0
SUB. ANT. RTE	30.426.000
RETE FUENTE	304.260
RETE IVA	
RETE ICA	121.704
TOTAL A PAGAR	**30.000.036**

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008, QUE MODIFICO EL ARTICULO 774 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO Y POR LO TANTO CONSTITUYE TITULO VALOR.

OBSERVACIONES:

Firma Del Emisor:

FECHA RECIBIDO: D M A

Aceptada:

AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO S.A.S

EL COMPRADOR Y OBLIGADO, FIRMA Y SELLO -C.C O NIT

En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios, AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO SAS como empresa que almacena y recolecta datos de carácter personal, con la única finalidad de desarrollar nuestro objeto social y ajustarse a l as normas del derecho de Habeas Data, requiere obtener su autorización para el tratamiento de sus datos personales. Por lo anterior, firmada o recibida medio electrónico la presente se autoriza a AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO SAS a realizar el tratamiento de los datos personales únicamente para la finalidad anteriormente mencionada.

FE: 22fa8ca1fd1404e7e8c26a35cd19ef5792bb4d804e72ca330e06bfd8dd267921f18a58efe06b1eed5871b2c7eb252e2a

GRUPO LOGISTICO TRANSMIGUEL SAS
NIT : 900,679,543 - 7
CR 20 33 13
YOPAL-CASANARE - COLOMBIA
6334231 3138541504
contabilidad@transmiguel.com
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4923 Tarifa 4,00

Cliente	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		
NIT	844,004,840 - 0	Teléfono	6327178
Dirección	CL 30 28 46 CA 20	Vendedor	GRUPO LOGISTICO
Ciudad	YOPAL-CASANARE - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	synergiaconstrucciones@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 3739

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-15	11:39:45
Expedición	2024-04-15	11:43:14
Vencimiento	2024-05-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200005000001	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA		6.00	364,000.00	2,184,000.00

Total Items 1

Total Bruto	2,184,000.00
RETEFUENTE 1%	21,840.00
Total a Pagar	**$ 2.162.160,00**

CONDICION DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales — Efectivo — Cuota 1 F - 002- 3739 Vence el 2024-05-15 — 2.162.160,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Sesenta Y Dos Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA (CRUDO DE RIO) EN VOLQUETA DT DESDE SAN RAFAEL HASTA ACOPIO SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 18-04-2024
HORA: 2:14Pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 14
RECIBIDO POR: MÓNICA
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Firma Elaborado por : XIOMARA MENDOXA

Firma Recibido

FAVOR APLICAR RETEICA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEL 4/1000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 3 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764057273034 aprobado en 2023-10-01 hasta el 2024-10-01 Vigencia 1 Año, prefijo FE desde el número 3037 al 10000

CUFE 78e51972094eac5381baa7c9e6216f9f41f8e309dd1f84377f84b466e32bda2849a424418f013d32afb9b4dfbdbea7b3

ORIGINAL

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8 Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Espacio para
Logo Corporativo

CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ
NIT 46.373.163-1
CR 6 A 40 B 23
Tel: (608) 3134205633
Yopal - Colombia
46claudiacruz@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 16

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		
NIT	844.004.840-6	**Teléfono**	(608) 6327178 - Ext. 000
Dirección	CL 30 28 46 BRR ALTOS DE MANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	16/04/2024, 20:43
Expedición	19/04/2024, 07:51
Vencimiento	16/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Tilodiran Casanare, Viajes de excavación cargados por las volquetas FSI 858 - WZC 406 - OXD 794	332.00	16,600,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cheque

Total Bruto	16,600,000.00
Total a Pagar	**16,600,000.00**

$ 16,600,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electrónica 18764006301595 aprobado en 20240305 prefijo FE desde el número 13 al 250 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: eeb1b6c68f6353ea57da3a35f8da25034ab1c5462fcf4360ff915d80c488c18dd7d5307bat89e0c699d28ff6b6c3fcdf78

Adquirido Software y Desarrollo tecnológico Siigo SAS - Nit 830114135-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica con el IVA.

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA EXIGIDO ORDEN (DD/MM/AAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	27 / 6 / 2024	27	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 651.768.192,76	$ 0,00	$ 651.768.192,76

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16690	P.A ANT SYNERGIA CONS E INGENIERIA SAS ESP	629000008 49	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
900361915-7	NIT	TRANSPORT AMERICAN OMEGA SAS	505844631	Corriente	Banco de Occidente	$ 651.768.192,76	$ -	$ 651.768.192,76
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CLL 11 21-78	transportamericanadhsa@gmail.com		3142952075	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCIÓN 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
2	N.A.	N.A.	SET	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento contrato: i) que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea suministrada a los fines/datos evolutivos previstos en el presente documento; y ii) que he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos(s) instructivo tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas	DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

012

ConsinTer del Oriente

NIT 900.326.145-4

Yopal 27 de Mayo del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16690 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 032

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°27, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD39	22/05/2024	$ 651.768.192,76
TOTAL ITEM 02					$ 651.768.192,76
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 651.768.192,76**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°2 - compra de materiales y accesorios, respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
C.C No. 9.432.549
R.L. CONSINTER DEL ORIENTE
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°27					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 27/05/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 032			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD39	22/05/2024	$ 651.768.192,76
TOTAL ITEM 02					$ 651.768.192,76
VALOR TOTAL DE ITEMS					$ 651.768.192,76

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Nicolas Roro

R/L CONSINTER DEL ORIENTE E.U

El interventor certifica que revisó los items/rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°27 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD39	22/05/2024	$ 651.768.192,76
TOTAL				**$ 651.768.192,76**



TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.
NIT 900.361.915-7
Casanare
Tel: (01) 3175010010
Yopal - Colombia
transportamericandihedi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETD 39

Señores	Synergia Construcciones e Ingeniería S.A.S.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(038) 6327178	**Generación**	22/05/2024, 17:44
Dirección	CL 38 N° 24 - 82	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	22/05/2024, 17:44
				Vencimiento	22/05/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.
1	TUBERIA NOVALOC DE 60 INCLUYE TUBO DE 6 M , PARA PROYECTO DE TILODIRAN orden pedido 01	320.00	1,310,284,833.60	28,117,696.00	2,5 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil trescientos tres millones quinientos treinta y seis mil trescientos ochenta y seis pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,303,536,386.56

Total Bruto	1,124,707,840.00
IVA 19%	213,694,489.60
ReteFuente 2.5%	28,117,696.00
ReteICA 6	6,746,247.04
Total a Pagar	1,303,536,386.56

Observaciones:
FAVOR AMORTIZAR EL 50% DE LA FACTURA $651.768.193,80

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764040537174 aprobado en 20230525 prefijo FETD desde el número** 1 **al 50 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 0.006
CUFE: e4f6ab6b445c2bb811a97835f1a2736b1a089342055a3d7abe83150b5d4ab4a1f83ea2488425c1901d6ca0961181353213

Factura Electrónica de Venta según Anexo Técnico Versión 1.9 de la Resolución 000042 de 2020

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

NIT. 844.004.840-0

ORDEN DE COMPRA PROYECTO MUNICIPIO DE YOPAL-TILODIRAN

FECHA: 20-oct-23

COMPRADOR: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

ORDEN DE COMPRA No 001

DIRECCIÓN DESPACHO: CALLE 30 N 28-48

TEL: 6359474

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CORREO ELECTRONICO

PROVEEDOR: TRANSPORT AMERICAN DIMEX S.A.S

IDENTIFICACION: 900381815-7

DIRECCION: CALLE 38 No 24-62

CORREO ELECTRONICO

ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

TELEFONO: 6327178

CONTACTO VENTAS:

ACTIVIDAD: SUMINISTRO DE TUBERIA

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UND	PRECIO UNIT	VIU CON DCTO	VALOR TOTAL
1	TUBERIA NOVALOC DE 60" INCLUYE UNION EN TUBO DE 6M	750	ML	$ 3.514.712,00		$ 2.636.034.000,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL					$ 2.636.034.000,0
	DESCUENTO				0	
	IVA	19%				$ 530.946.480,00
	TRANSPORTE					$ 65.900.850,00
	RETENCION FUENTE	2,5%				$ 3.070.979.510,00
	VALOR TOTAL					

SON: ..... PESOS MCTE.....

0

OBSERVACIONES: LA FORMA DE PAGO SERA 50 % DE ANTICIPO Y EL OTRO 50 % RESTANTE A CONTRA ENTREGA

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO

RL SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA

217

Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR			
NOMBRE DEL CLIENTE	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	MONEDA	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	VALOR TOTAL	$651.768.192,76
IDENTIFICACIÓN	900361915	PAGADOR	16690 - P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S 032

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
31/05/2024	27	*******4849	AHO	BANCOLOMBIA	505844621	CTE	BANCO DE OCCIDENTE	$651.768.192,76	Transacción Exitosa**	

Transacción Exitosa

Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Tripoli	28	5	2024	29	ORO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 444.796.949,00	$ 0,00	$ 444.796.949,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16690	P.A ART DYNERGIA CONS E INGENIERIA SAS ESP	62900004840	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
901819985-8	Nit	SERVICIOS Y DISTRIBUCION PLENITUD SAS	62900005548	Ahorros	Bancolombia	$ 444.796.949,00	$ -	$ 444.796.949,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Caleonore	Tripoli	CL 53 19 43	[redacted]		3232261798	4690	Caleonore	Tripoli

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
6	N.A.	N.A.	GET	ORO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN, RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: i) que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida, para las finalidades contenidas previstas en el presente documento; y ii) son los datos cumplimiento a las disposiciones que regulen la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que no hay/hay aquí involucrados tienen relación causal con el presente objeto del contrato fiduciario.

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas	DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA: NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

219

ConsinTer del Oriente

NIT 900.326.145-4

Yopal 28 de Mayo del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16690 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 032

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°29, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD SAS	FE3	27/05/2024	$ 444.796.949,00
TOTAL ÍTEM 05					$ 444.796.949,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 444.796.949,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°5 - Contratos de mano de obra respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

Nicolas Roso

JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
C.C No. 9.432.549
R.L. CONSINTER DEL ORIENTE
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com

210

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°29					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 28/05/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 032			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.540-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD SAS	FE3	27/05/2024	$ 444.796.949,00
TOTAL ITEM 05					$ 444.796.949,00
VALOR TOTAL DE ITEMS					$ 444.796.949,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Nicolas Zuno

R/L CONSINTER DEL ORIENTE E.U

El interventor certifica que revisó los items/rubros aquí ordenados que correspondan a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.
Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°29 - CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD SAS	FE3	27/05/2024	$ 444.796.949,00
TOTAL				**$ 444.796.949,00**

SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD SAS
NIT 901.819.985-4
CL 53 15 43
Tel: (606) 3232261788
Bogotá - Colombia
barreravalentina854@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3

				Fecha y hora Factura	
Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			**Generación**	27/05/2024, 11:44
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(601) 6327178 - Ext. 01	**Expedición**	27/05/2024, 11:44
Dirección	CALLE 30 28 48	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Vencimiento**	27/05/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION SEGUN CONTRATO ANEXO 002	1.00	428,172,143.00	8,738,207.00
2	ADMINISTRACION 2%	1.00	8,738,207.00	0.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	4,368,103.00	0.00
4	UTILIDAD 3%	1.00	10,398,838.80	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y cuatro millones setecientos noventa y seis mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 444,796,949.10

Total Bruto	458,756,180.00
IVA 19%	1,660,318.80
Retefuente 2%	8,738,207.00
ReteICA 15.0	6,881,342.70
Total a Pagar	444,796,949.10

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 629000055-49 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089534921 aprobado en 20240423 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Actividad Economica 4663: Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
Tarifa
CUFE: 01efa693271c6c01ed3d0dd50101536e1ca7ca1a0db23945a4cf5bb523929ca25ad8d79bb843cfa455b207891650e7aa

Autorizo Sinergia Construcciones e Ingeniería S.A.S. NIT 900.915.210-6 a tratar (Usar, Gestionar, Recolectar, Almacenar, Circular, Suprimir, Procesar, Compartir, Actualizar y Transmitir) mis datos personales de acuerdo con la finalidad establecida en la política de tratamiento de datos personales de la empresa, la cual puede ser consultada en la página web www.sinergia.com.co

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 002 CELEBRADO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD SAS

CONTRATANTE : SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL : MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
CONTRATISTA : SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD SAS
VALOR :$ 873.820.700
PLAZO DE EJECUCIÓN : 3 MESES

Entre los suscritos a saber: SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS 844.004.840-0 domiciliado en la ciudad de Yopal, representado legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO** , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado con la cédula de ciudadanía No 47.436.168 expedida en la ciudad de Yopal, actuando conforme a la Ley y en armonía con los estatutos de la misma, por una parte y quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD SAS NIT;. 901.819.985-4 Representada legamente por PAULA VALENTINA BARRERA VILLAMIL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.007.387.019 ubicado en la dirección cll 53 No,. 16-13 de la ciudad de Bogotá, y teléfono 3232261798 quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, Hemos acordado celebrar el presente contrato de ejecución de MANO DE OBRA CIVIL, el cual se regirá por las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**: El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, en los términos señalados y por el sistema de costo valor unitario, **CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN DEL MUNICIPIO DE YOPAL. PARAGRAFO**: El CONTRATISTA queda obligado a desarrollar el proyecto descrito en la presente cláusula bajo la dirección administrativa, financiera y técnica del CONTRATANTE, para lo cual podrá emplear el personal idóneo que disponga. **CLAUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES:** El objeto descrito en la cláusula anterior se desarrollará por el CONTRATISTA de acuerdo a los ítems, descripción, cantidades y valores unitarios que se detallan a continuación:

COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO				
Excavacion a mano en material comun	m^3	231,40	28.000,00	6.479.200,00
tuberia de pvc 8" incluye encamado y atraque en base granaular	m	150,60	14.400,00	2.168.640,00
tuberia de pvc 10" incluye encamado y atraque en base granaular	m	149,10	18.000,00	2.683.800,00
tuberia de pvc 12" incluye encamado y atraque en base granaular	m	585,20	21.600,00	12.640.320,00
Entibado tipo 3: apuntalamiento metalico tipo tablestacado.	m^2	3.588,10	6.500,00	23.322.650,00
Manejo, control y extraccion de agua	h	280,50	3.500,00	981.750,00
POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO				
Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m	und	2,00	370.000,00	740.000,00
Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 3.5 m Ø 1.20 m	und	1,00	550.000,00	550.000,00
Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und	2,00	650.000,00	1.300.000,00
Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.0 - 4.5 m Ø 1.20 m	und	5,00	1.000.000,00	5.000.000,00

Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.20 m	und	2,00	1.000.000,00	2.000.000,00
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO				
Excavacion a mano en material comun	m³	3.336,20	28.000,00	93.413.600,00
tuberia de pvc 6" incluye encamado y atraque en arena lavada	m	1.992,50	10.800,00	21.519.000,00
Kit Silla Yee PVC 8 x 6 (200 x 160 mm), instal.	und	29,00	20.000,00	580.000,00
Kit Silla Yee PVC 10 x 6 (250 x 160 mm), instal.	und	29,00	20.000,00	580.000,00
Kit Silla Yee PVC 12 x 6 (315 x160 mm), instal.	und	125,00	20.000,00	2.500.000,00
Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	2.627,00	15.000,00	39.405.000,00
Caja de inspeccion 60 x 60	und	143,00	90.000,00	12.870.000,00
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO				
Excavacion a mano en material comun	m³	591,81	28.000,00	16.570.680,00
Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m	m	3.205,62	8.000,00	25.644.960,00
Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	m	1.479,62	8.000,00	11.836.960,00
Sardinel prefabricado (0.27 x 0.15 x 0.50) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	m	246,59	8.000,00	1.972.720,00
losa de pavimento en concreto 4000 psi e=0.20 m incluye corte y llenado de juntas, instalacion de dovelas soldada de canastillas y sumnistro de formaleta	m²	19.264,85	20.000,00	385.297.000,00
OBRAS VARIAS				
Excavacion a mano en material comun	m³	1.386,00	28.000,00	38.808.000,00
Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	405,12	18.000,00	7.292.160,00
Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	980,88	15.000,00	14.713.200,00
Reparacion de acometida domiciliaria alcantarillado Ø= 6"	m	1.688,00	10.800,00	18.230.400,00
Reparacion de acometida domiciliaria acueducto PVC Ø=1/2".	m	1.688,00	2.500,00	4.220.000,00
Canalizacion ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	1.688,00	3.500,00	5.908.000,00
Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m³	10,36	155.000,00	1.605.800,00

Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m³	110,56	28.500,00	3.150.960,00
RED DE ACUEDUCTO				
Excavacion manual en material comun de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	1.430,00	28.000,00	40.040.000,00
Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería	m³	973,70	15.000,00	14.605.500,00
Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=90 mm = 3"	m	1.412,30	4.000,00	5.649.200,00
Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4"	m	580,80	4.000,00	2.323.200,00
Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	1.430,00	15.000,00	21.450.000,00
ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO				
Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) Ø=1/2", (incluye micromedidor). Instal.	und	265,00	20.000,00	5.300.000,00
Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	476,00	28.000,00	13.328.000,00
Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería	m³	127,20	15.000,00	1.908.000,00
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	348,80	15.000,00	5.232.000,00
			TOTAL	**873.820.700**

PARAGRAFO PRIMERO. Las cantidades consignadas en el presente contrato se podrán disminuir y aumentar, por lo tanto, el valor final del contrato cambiara según las cantidades ejecutadas. **PARAGRAFO SEGUNDO.** EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de rechazar cualquier parte o la totalidad de los trabajos que no encuentre plenamente satisfactorios, en calidad, terminado y que no cumpla con las especificaciones por las cuales se contrata, determinada por el ingeniero y/o funcionario del CONTRATANTE designado para llevar a cabo las labores de supervisión del contrato. **CLAUSULA TERCERA. VALOR:** Para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar, se determina que el valor del presente contrato asciende a la suma de : **OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS M.CTE ($873.820.700) M/CTE. PARÁGRAFO PRIMERO.** Queda entendido que el valor del contrato de comprende, los gastos operativos, la remuneración del personal empleado para ejecutarla y la remuneración a que tiene derecho el CONTRATISTA por poner a disposición del CONTRATANTE toda su capacidad técnica, profesional y operativa. **CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO:** El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de ejecución de obra civil de la siguiente manera: 1) un anticipo por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS, que será amortizado a medida que el contratista facture, 2). el contratista hará previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura solicitando los recursos. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La cancelación de los recursos descritos en la presente cláusula está supeditado además a la entrega por parte del CONTRATISTA de todos y cada de uno de los documentos que la ley ha establecido para el efecto. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El giro de los recursos se hara a la firma del contrato. **CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1)** Ejecutar las actividades propias del objeto del presente contrato de tal manera que ofrezcan las mejores condiciones de calidad y estabilidad y que se ajusten a los requisitos mínimos necesarios previstos en las normas técnicas obligatorias

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 002 CELEBRADO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD SAS

nacionales o extranjeras, según el caso; **2)** Acatar las instrucciones y seguir las directrices que le trace el CONTRATANTE para el desarrollo de este contrato; **3)** Ejecutar los trabajos motivo de este contrato de acuerdo con el plan de trabajo entregado por el CONTRATANTE, el cual forma parte del presente contrato. **4)** Actuar bajo la absoluta y continuada dependencia técnica, económica y jurídica del CONTRATANTE, de tal suerte que todas las actuaciones distintas de las determinadas para el efectivo y normal cumplimiento del contrato, deben estar autorizadas previamente por escrito por ésta, so pena de tenerse por no realizadas. **5)** Obrar con buena fe en las distintas etapas del contrato; **6)** Poner a disposición del CONTRATANTE la maquinaria y equipo que ésta considere necesarias, para lograr la idónea y oportuna ejecución del proyecto; **7)** Abstenerse de actuar o de reputarse ante terceros como contratista independiente en el desarrollo o ejecución de este contrato; **8)** Permitir la inspección, vigilancia y control por parte del CONTRATANTE de los trabajos y actividades que ejecute; **9)** Pagar el valor de los derechos laborales, o de cualquier naturaleza, así como ARP Y EPS exigidos por la ley que se deriven de la vinculación del personal que emplee o haya empleado para ejecutar este contrato; **10)** Cancelar las obligaciones que haya asumido para ejecutar este contrato; **11)** Las demás que se deriven de la naturaleza de la presente relación contractual. **CLAUSULA SEXTA. PLAZO:** El CONTRATISTA deberá ejecutar el objeto del contrato indicado en la cláusula primera, en el término de **TRES (03) MESES** contados a partir de la suscripción de la correspondiente contrato. **CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION:** El objeto del presente contrato debe ser ejecutado por el CONTRATISTA en el **CORREGIMIENTO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL**, especificamente en las direcciones estipuladas en el objeto del contrato; o en el sitio y/o lugar que le señale el CONTRATANTE. **CLAUSULA OCTAVA. CLAUSULA PENAL:** Si el CONTRATISTA incumpliere una cualquiera de las obligaciones que mediante este contrato asume, pagará al CONTRATANTE, a titulo de pena, una cantidad de dinero igual al veinte (20%) por ciento del valor establecido en la cláusula tercera de este documento. **CLAUSULA NOVENA. SUPERVISION:** La inspección, vigilancia y control del cumplimiento del presente contrato será ejercida por el CONTRATANTE, por intermedio del funcionario que su representante legal delegue para tal fin. **CLAUSULA DECIMA. CESION:** El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente la ejecución de la orden, ni su posición contractual, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO**. Forman parte integral de este documento, el contrato propiamente dicho con sus respectivos anexos, cuentas de cobro y demás documentos que se expidan a lo largo de su vigencia. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. TERMINACION DEL CONTRATO:** El presente contrato de ejecución de obra civil terminará por la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Por incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA; **b)** Por vencimiento del plazo establecido para la ejecución del contrato; **c)** Por la ejecución total y oportuna del contrato;; **d)** Por actuar el CONTRATISTA o reputarse ante terceros como contratista independiente en el desarrollo o ejecución del contrato; y **e)** Por decisión unilateral del CONTRATANTE. **CLAUSULA DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ.** El presente contrato de ejecución de obra civil se entenderá perfeccionado con la suscripción que del mismo efectúen las partes; así como de la entrega de todos y cada uno de los documentos establecidos por la legislación que lo rige y que se derivan de su ejecución.

Para constancia se firma este documento a los 9 días del mes de mayo de 2024

EL CONTRATANTE

MARIA DIOMY BARRERA
R/L SYNERGIA SAS
NIT: 844.004.840-0

EL CONTRATISTA

PAULA VALENTINA BARRERA VILLAMIL
CC No. 1.007.387.019

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.387.019**

BARRERA VILLAMIL

APELLIDOS

PAULA VALENTINA

NOMBRES

Paula Valentina Barrera

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-NOV-2000**

YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA

AB+ G.S. RH

F SEXO

26-DIC-2018 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-4600100-01058167-F-1007387019-20190125 0064337380A 1 51032629

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141007756388

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 8 1 9 9 8 5 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

24. Ítem electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD S.A.S.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 53 16 43

42. Correo electrónico: barreravalentina654@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 3 2 2 6 1 7 9 8

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 4 0 4 0 3	4 2 9 0	2 0 2 4 0 4 0 3	4 9 2 3	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 – Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 | 57. Modo | 58. OPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 5 | 61. Fecha: 2024 - 04 - 09 / 11 : 45: 04

La suscripción suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: Valentina Barrera

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

59A. Nombre: RENDON REYES RENE

59B. Cargo: Analista IV

Fecha generación documento PDF: 09-04-2024 11:45:42AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)			NO DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	4	9	2024	30	SIRO A TERCEROS	COP (Peso)	$ 72.725.521,00	$ 0,00	$ 72.725.521,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16690	FA ANT SYNERGIA CONS E INGENIERIA SAS 010	62900004840	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIOS

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
901403673-6	NIT	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE SAS	36300000985	Corriente	Bancolombia	$ 72.725.521,00	$ -	$ 72.725.521,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CRA 23 No. 7-66 Oficina 202	petroleosytriturados@gmail.com		6347619	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O SUBITO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
5	N.A.	N.A.	027	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN, RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: I) que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades previstas aquellas en el presente documento; y II) que he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato Fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

SOLO A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

230

ConsinTer del Oriente

NIT 900.326.145-4

Yopal 04 de Junio del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16690 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 032

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°30, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S	FEP1182	28/05/2024	$ 72.725.521,00
TOTAL ITEM 05					$ 72.725.521,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 72.725.521,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°5 - contratos de mano de obra respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

Nicolas Roso

JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
C.C No. 9.432.549
R.L. CONSINTER DEL ORIENTE
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com

231

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°30					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 04/06/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 032			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S	FEP1182	28/05/2024	$ 72.725.521,00
TOTAL ITEM 05					$ 72.725.521,00
VALOR TOTAL DE ITEMS				$	72.725.521,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Nicolas Bolo

R/L CONSINTER DEL ORIENTE E.U

El interventor certifica que revisó los items/rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplemos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°30 - CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S	FEP1182	28/05/2024	$ 72.725.521,00
TOTAL				**$ 72.725.521,00**

FIDUCIA TILO ✓

PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S
NIT: 901403873-5
CARRERA 23 N°7-66 OFICINA 202
Yopal - Colombia
PBX: 098 6347619 FAX:

PETRORIENTE

petreosytriturados@gmail.com LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08

[redacted]

FEP1182

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
28/05/2024	28/05/2024

Nombre - Razón social: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Tipo documento: NIT
No.: 844004840-0
Dirección: CL 30 28 46 CA 20 Yopal - Colombia
Municipio: [redacted]
Teléfono: 6327178

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	00004	CONTRATO DE OBRA CIVIL PROYECTO TILO	UND	1	$62,291,667.00	0.00	0.00	$0.00	$62,291,667.00
2	00005	ADMINISTRACION 10%	UND	1	$6,229,167.00	0.00	0.00	$0.00	$6,229,167.00
3	00006	IMPREVISTOS 5%	UND	1	$3,114,583.00	0.00	0.00	$0.00	$3,114,583.00
4	00007	UTILIDAD 5%	UND	1	$3,114,583.00	0.00	19.00	$591,770.77	$3,114,583.00

4 Items

Observacion:

SUBTOTAL	$74,750,000.00
IVA 19%	$591,770.77
TOTAL	$75,341,770.77
Ret.Fuente	$1,495,000.00
NETO CON RETENCIONES	$73,846,770.77

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764067557309 de 19/03/2024 hasta 19/03/2025 Rango Autorizado del FEP1097 al FEP5000

*Responsable IVA
*Actividad Económica DIAN 4290
*Actividad Económica ICA Yopal 0302 Tarifa 9x 1000
*No somos autorretenedores Impuesto renta.

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Firma electrónica: A6BQPWdVSpxoW4N9BUGDWCZ3DMwGCAlR9NH+OiA/wuMV6HTDcfM4HswFs07rx1DIWGym/Lnrqm4GcAduluwAUAEOWIOOWyrqr4Dtr3Tnj1pNUohus7gUuqGX1w6mtOHGPHHTE/p0aW+YA1b89AXE1LvI9H7HL6Q320xK7fUMjO6WRNxBlcsuCDlwO5TpIp0mdp40bbDr38BZCvnPGOBBJHSREHTA5vCCDyX72CWOfgp/0SxQ/gcUffdk/V1dCJgdKmquOnuuIOV4wMfbvxZOC+Fd9OdMQawGHQ55A7GPK1IRQBkaMNH6pK5GCaZhwbG2MefoeWcFpVAo=

ICA 15 x 1000 $ 1121.250

VP $ 72.725 521

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO BANCOLOMBIA No.363-000009-85

Fecha y hora de generación: 5/28/2024 7:24 AM Fecha y hora de expedición: 5/28/2024 7:24 AM

CUFE: d08dce61d006f0895b373b698bee64cca7a55d60f3b41262040fa555d45529e104f8bfed2d91e03e35d2293ff2232e71

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

234

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 004 CELEBRADO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE SAS

CONTRATANTE	:	**SYNEGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**
REPRESENTANTE LEGAL	:	**MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
CONTRATISTA	:	**PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE SAS**
REPRESENTANTE LEGAL	:	**EDUARDO HUMBERTO PAZ HERNANDEZ**
VALOR	:	**$ 73.017.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	**1 MES**

Entre los suscritos a saber: SYNEGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT 844.004.840-0, Representado Legalmente por MARIA DIOMY identificada con la cédula de ciudadanía No 47.436.168 expedida en la ciudad de Yopal, actuando conforme a la Ley y en armonía con los estatutos de la misma, por una parte y quien en adelante se denominará el CONTRATANTE, **PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE SAS** identificado con Nit:901.403.673-5 representada Legalmente por EDUARDO HUMBERTO PAZ HERNANDEZ con la cédula de ciudadanía No. 6.113.911 ubicado en la dirección CR 23 7-66 OF 202 del municipio de Yopal, y teléfono 3106806020 quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, Hemos acordado celebrar el presente contrato de ejecución de MANO DE OBRA CIVIL, el cual se regirá por las cláusulas siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, en los términos señalados y por el sistema de costo valor unitario, A **REALIZAR POZOS DE INSPECCION SIN CONO TRUNCADO PARA LA OBRA DE TILODIRAN**, PARAGRAFO: **El CONTRATISTA** queda obligado a desarrollar el proyecto descrito en la presente cláusula bajo la dirección administrativa, financiera y técnica del CONTRATANTE, para lo cual podrá emplear el personal idóneo que disponga. CLAUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES: El objeto descrito en la cláusula anterior se desarrollará por el CONTRATISTA de acuerdo con los ítems, descripción, cantidades y valores unitarios que se detallan a continuación:

POZO DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

POZO DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

POZO DE INSPECCION RECTO (SIN CONO TRUNCADO) H=2.0-3.0m 0 2.00 m	und	9,00	625.000	$5.625.000
POZO DE INSPECCION RECTO (SIN CONO TRUNCADO) H=3,0 -4.0m 0 2.00m	und	624,00	108.000	$67.392.000
TOTAL				**$73.017.0000**

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 004 CELEBRADO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE SAS

PARAGRAFO PRIMERO. Las cantidades consignadas en el presente contrato se podrán disminuir y aumentar, por lo tanto el valor final del contrato cambiara según las cantidades ejecutadas. **PARAGRAFO SEGUNDO.** EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de rechazar cualquier parte o la totalidad de los trabajos que no encuentre plenamente satisfactorios, en calidad, terminado y que no cumpla con las especificaciones por las cuales se contrata, determinada por el ingeniero y/o funcionario del CONTRATANTE designado para llevar a cabo las labores de supervisión del contrato. **CLAUSULA TERCERA. VALOR:** Para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar, se determina que el valor del presente contrato asciende a la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES DIECISIETE MIL PESOS M.CTE ($73.017.000) PARÁGRAFO PRIMERO.** Queda entendido que el valor del contrato de comprende, los gastos operativos, la remuneración del personal empleado para ejecutarla y la remuneración a que tiene derecho el CONTRATISTA por poner a disposición del CONTRATANTE toda su capacidad técnica, profesional y operativa. **CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO:** El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de ejecución de obra civil de la siguiente manera: 1) el contratista instalará ítem contratado sin dar ningún anticipo, **2)** se realizará un pago total del contrato en 30 días a partir del fecha de suscripción el cual debe estar instalado la cantidad establecida en el cuadro anteriormente citado. el contratista hará previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura solicitando los recursos. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La cancelación de los recursos descritos en la presente cláusula está supeditado además a la entrega por parte del CONTRATISTA de todos y cada de uno de los documentos que la ley ha establecido para el efecto. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El giro de los recursos queda supeditado a la entrega que de ellos a su vez haga la Fiduciaria Banco de Bogotá. **CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** 1) Ejecutar las actividades propias del objeto del presente contrato de tal manera que ofrezcan las mejores condiciones de calidad y estabilidad y que se ajusten a los requisitos mínimos necesarios previstos en las normas técnicas obligatorias nacionales o extranjeras, según el caso; **2)** Acatar las instrucciones y seguir las directrices que le trace el CONTRATANTE para el desarrollo de este contrato; **3)** Ejecutar los trabajos motivo de este contrato de acuerdo con el plan de trabajo entregado por el CONTRATANTE, el cual forma parte del presente contrato. **4)** Actuar bajo la absoluta y continuada dependencia técnica, económica y jurídica del CONTRATANTE, de tal suerte que todas las actuaciones distintas de las determinadas para el efectivo y normal cumplimiento del contrato, deben estar autorizadas previamente por escrito por ésta, so pena de tenerse por no realizadas. **5)** Obrar con buena fe en las distintas etapas del contrato; **6)** Poner a disposición del CONTRATANTE la maquinaria y equipo que ésta considere necesarias, para lograr la idónea y oportuna ejecución del proyecto; **7)** Abstenerse de actuar o de reputarse ante terceros como contratista independiente en el desarrollo o ejecución de este contrato; **8)** Permitir la inspección, vigilancia y control por parte del CONTRATANTE de los trabajos y actividades que ejecute; **9)** Pagar el valor de los derechos laborales, o de cualquier naturaleza, así como ARP Y EPS exigidos por la ley que se deriven de la vinculación del personal que emplee o haya empleado para ejecutar este contrato; **10)** Cancelar las obligaciones que haya asumido para ejecutar este contrato; **11)** Las demás que se deriven de la naturaleza de la presente relación contractual. **CLAUSULA SEXTA. PLAZO:** El CONTRATISTA deberá ejecutar el objeto del contrato indicado en la cláusula primera, en el término de **1.0 MES (30) DIAS CALENDARIO** contados a partir de la suscripción de la correspondiente contrato. **CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION:** El objeto del

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 004 CELEBRADO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE SAS

presente contrato debe ser ejecutado por el CONTRATISTA en el **MUNICIPIO DE YOPAL**, especificamente en las direcciones estipuladas en el objeto del contrato; o en el sitio y/o lugar que le señale el CONTRATANTE. **CLAUSULA OCTAVA. CLAUSULA PENAL:** Si el CONTRATISTA incumpliere una cualquiera de las obligaciones que mediante este contrato asume, pagará al CONTRATANTE, a título de pena, una cantidad de dinero igual al veinte (20%) por ciento del valor establecido en la cláusula tercera de este documento. **CLAUSULA NOVENA. SUPERVISION:** La inspección, vigilancia y control del cumplimiento del presente contrato será ejercida por el CONTRATANTE, por intermedio del funcionario que su representante legal delegue para tal fin. **CLAUSULA DECIMA. CESION:** El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente la ejecución de la orden, ni su posición contractual, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO**. Forman parte integral de este documento, el contrato propiamente dicho con sus respectivos anexos, cuentas de cobro y demás documentos que se expidan a lo largo de su vigencia. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. TERMINACION DEL CONTRATO:** El presente contrato de ejecución de obra civil terminará por la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Por incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA; **b)** Por vencimiento del plazo establecido para la ejecución del contrato; **c)** Por la ejecución total y oportuna del contrato;; **d)** Por actuar el CONTRATISTA o reputarse ante terceros como contratista independiente en el desarrollo o ejecución del contrato; y **e)** Por decisión unilateral del CONTRATANTE. **CLAUSULA DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ.** El presente contrato de ejecución de obra civil se entenderá perfeccionado con la suscripción que del mismo efectúen las partes; así como de la entrega de todos y cada uno de los documentos establecidos por la legislación que lo rige y que se derivan de su ejecución.

Para constancia se firma este documento a los 2 días del mes de agosto de 2022

EL CONTRATANTE

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA SAS
NIT: 844.004.840-0

EL CONTRATISTA

EDUARDO HUMBERTO RAZ HERNANDEZ
R/L PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE SAS
NIT: 901.403.673-5

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Topal	18 / 9 / 2024	31	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 818.089.828,00	$ 0,00	$ 818.089.828,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16890	P.A ANT SYNERGIA CONS E INGENIERIA SAS ESI	62900004649	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIOS

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840-0	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	648488733	Corriente	Banco de Bogotá	$ 818.089.828,00	$ -	$ 818.089.828,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Topal	CLL 30 28 46	[illegible]@gmail.com	6327178	3178560362	4290	Casanare	Topal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
2	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
3	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
5	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACION Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N.A.

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: i) que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación se enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas	DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

228

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°31					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 18/06/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 032			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA SAS		
			N.I.T : 844.004.340-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	NÓMINA MES MAYO 2024	NOM MAY 2024	30/05/2024	$ 84.886.205,00
1	PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2024	9468574159	13/06/2024	$ 44.578.200,00
TOTAL ITEM 01					$ 129.464.405,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FERROMPLES DEL ORIENTE S.A.S	FNO 4934	6/05/2024	$ 10.363.149,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S	Y - 4345	10/05/2024	$ 165.041.600,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	WILLIAN BARRERA GUTIERREZ	DSE 134	30/05/2024	$ 1.043.700,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	MADERAS MADERA'RQ	178	24/05/2024	$ 660.000,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 29470	25/05/2024	$ 1.079.999,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TIRSO GERMAN PEREZ	TGPC - 986	28/05/2024	$ 650.000,00
TOTAL ITEM 02					$ 188.838.448,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	LUIS FERNANDO MORENO	3597	26/04/2024	$ 9.959.896,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	JAIME ALEXANDER MARIÑO	CCOBR JAIME	30/04/2024	$ 7.573.500,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	CLAUDIA PATRICIA CRUZ	FE 18	3/05/2024	$ 14.949.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	RAFAEL DEL LLANO S.A.S	FV 2009	8/05/2024	$ 12.818.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S	Y - 43548	10/05/2024	$ 30.238.560,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 379	11/06/2024	$ 3.589.040,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 380	11/06/2024	$ 57.065.736,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 378	11/06/2024	$ 6.101.368,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	CLAUDIA PATRICIA CRUZ	FE 19	16/05/2024	$ 15.842.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	DEYSI LORENA AVILA MESA	DSE 146	24/05/2024	$ 1.300.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	ALEXANDER MARIÑO	CCOBR ALEX	30/05/2024	$ 6.534.000,00
TOTAL ITEM 03					$ 165.771.100,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	INVERSORA FURATENA	FE 5546	12/04/2024	$ 30.819.999,99
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	INVERSORA FURATENA	FE 5582	17/04/2024	$ 5.195.575,01
TOTAL ITEM 05					$ 36.015.575,00
VALOR TOTAL DE ITEMS					$ 518.089.528,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

Nicolas Rojo

R/L CONSINTER DEL ORIENTE E.U

El interventor certifica que revisó los items/rubros aquí ordenados que correspondan a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

ConsinTer del Oriente

NIT 900.326.145-4

Yopal 15 de Junio del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16690 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 032

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°31, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
1	PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	NÓMINA MES MAYO 2024	NOM MAY 2024	30/05/2024	$ 84.886.205,00
1	PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2024	9468574159	13/06/2024	$ 44.578.200,00
TOTAL ITEM 01					$ 129.464.405,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FERRONIPLES DEL ORIENTE S.A.S	FNO 4934	6/05/2024	$ 18.363.149,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S	Y - 4345	10/05/2024	$ 165.041.600,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	WILLIAN BARRERA GUTIERREZ	DSE 134	20/05/2024	$ 1.043.700,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	MADERAS MADERA'RQ	176	24/08/2024	$ 660.000,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 29470	25/05/2024	$ 1.079.999,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TIRSO GERMAN PEREZ	TGPC - 986	28/05/2024	$ 650.000,00
TOTAL ITEM 02					$ 186.838.448,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	LUIS FERNANDO MORENO	3597	26/04/2024	$ 9.959.896,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	JAIME ALEXANDER MARIÑO	CCOBR	30/04/2024	$ 7.573.500,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	CLAUDIA PATRICIA CRUZ	FV 18	3/05/2024	$ 14.949.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	RAFAEL DEL LLANO S.A.S	FV 2009	8/05/2024	$ 12.818.000,00

3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S	Y - 43548	10/05/2024	$ 30.238.560,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 379	11/06/2024	$ 3.589.040,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 380	11/06/2024	$ 57.065.736,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 378	11/06/2024	$ 6.101.368,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	CLAUDIA PATRICIA CRUZ	FE 19	16/05/2024	$ 15.642.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	DEYSI LORENA AVILA MESA	DSE 146	24/05/2024	$ 1.300.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	ALEXANDER MARIÑO	CCOBR	30/05/2024	$ 6.534.000,00
TOTAL ITEM 03					$ 165.771.100,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	NVERSORA FURATENA	FE 5582	17/04/2024	$ 30.819.999,99
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	NVERSORA FURATENA	FE5582	17/04/2024	$ 5.195.575,01
TOTAL ITEM 05					$ 36.015.575,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 518.089.528,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°1,N°2, N°3 y N°5 - Pago de salarios y mano de obra,compra de materiales y accesorios, transporte de materiales pétreos, contratos de mano de obra respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

Nicolas Roso

JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
C.C No. 9.432.549
R.L. CONSINTER DEL ORIENTE
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com

241

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°31 - PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	NÓMINA MES MAYO 2024	NOM MAY 2024	30/05/2024	$ 84.886.205,00
PAGO DE SALARIOS Y MANO DE OBRA	SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2024	9468574159	13/06/2024	$ 44.578.200,00
TOTAL				**$ 129.464.405,00**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004940	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	A - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6337178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	49423593	94687459	E	2024/06/13	2024/06/17	BANCO DE OCCIDENTE		$44,985,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Seccional: YOPAL (120 Afiliados)					$141,839,233	$22,694,360			$139,311,096	$6,162,000			$140,285,897	$5,445,300			$139,311,096	$10,716,600		$0	$0
Centro de Trabajo: DIOCESE 6.00 (1 Afiliados)					$1,213,334	$194,200			$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$84,900		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,213,334	$194,200			$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$84,900		$0	$0
1	CC	1081[illegible]	[illegible] JOSE LEIDY	30/01	30	$1,213,334	0P30[illegible]	30	$1,213,334	$48,600	037[illegible]	29	$1,213,334	$48,600	14-23	29	$1,213,334	$84,900	29	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 9.522 (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
2	CC	47436[illegible]	BARRERA ALFONSO MARIA ISIDRO	30/01	30	$1,300,000	0P30[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	037[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$0,800	30	$0	$0
3	CC	1119[illegible]	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO	30/01	30	$1,300,000	0P30[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	037[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$0,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 8.00 (117 Afiliados)					$138,013,919	$22,046,160			$2191,197,762	$6,009,400			$138,369,897	$5,489,900			$121,197,762	$10,018,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (117 Afiliados)					$138,013,919	$22,046,160			$2191,197,762	$6,009,400			$138,369,897	$5,489,900			$121,197,762	$10,018,200		$0	$0
4	CC	1055[illegible]	ACUÑA GOMEZ CINDY PATRICIA	30/01	29	$1,344,479	0P30[illegible]	29	$1,344,479	$53,800	037[illegible]	29	$1,276,867	$50,300	14-23	29	$1,344,479	$83,600	29	$0	$0
5	CC	7464[illegible]	AGUDELO ROMERO WILLIAM	30/01	30	$1,317,286	0P30[illegible]	30	$1,317,286	$52,700	037[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,317,286	$81,700	30	$0	$0
6	CC	9748[illegible]	ALARCON DIAZ MERCEDES	30/01	29	$1,256,347	0P30[illegible]	29	$1,256,347	$50,700	037[illegible]	29	$1,259,867	$50,300	14-23	29	$1,256,347	$88,200	29	$0	$0
7	CC	4344[illegible]	ALARCON ELOY MERCEDES	30/01	1	$43,334	0P30[illegible]	1	$43,334	$1,800	037[illegible]	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
8	CC	9[illegible]	ALFONSO GONZALEZ NANCY	30/01	30	$1,313,829	0P30[illegible]	30	$1,313,829	$52,600	037[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,313,829	$91,800	30	$0	$0
9	CC	1102[illegible]	ARIAS MARCIA MARGARITA	30/01	30	$1,328,743	0P30[illegible]	30	$1,328,743	$53,100	037[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,332,743	$92,600	30	$0	$0
10	CC	1054[illegible]	AVILA COLINA CARLOS YOBANY	31/01	30	$1,334,573	0P30[illegible]	30	$1,334,573	$53,400	037[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,334,573	$93,300	30	$0	$0
11	CC	1057[illegible]	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA	30/01	30	$1,400,000	0P30[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	037[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$100,000	30	$0	$0
12	CC	4144[illegible]	BERNAL ALFONSO MARIA SONIA	30/01	30	$1,400,000	0P30[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	037[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$111,400	30	$0	$0
13	CC	1057[illegible]	BERNAL CUEVAS YULIER FABIAN	30/01	30	$1,400,000	0P30[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	037[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$101,000	30	$0	$0
14	CC	1056[illegible]	BURGOS HENDIVELSO RONEY ESTIVEN	31/01	17	$851,622	0P30[illegible]	17	$851,622	$29,800	037[illegible]	17	$730,867	$29,200	14-23	17	$851,622	$62,200	17	$0	$0
15	CC	1056[illegible]	CASTILLO ACOSTA JANPIER ALEJANDRO	30/01	5	$233,953	0P30[illegible]	5	$233,953	$8,400	037[illegible]	5	$295,341	$11,900	14-23	5	$233,953	$16,300	5	$0	$0
16	CC	1057[illegible]	CASTRO LOPEZ CRISTOBAL CAMILO	30-16	30	$1,400,000	0P30[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	037[illegible]	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$101,000	30	$0	$0
17	CC	1118[illegible]	CUELLO CUNCHE ALEXIS	30/01	10	$403,334	0P30[illegible]	10	$403,334	$17,400	037[illegible]	0	$0	$0	14-23	10	$403,334	$0	0	$0	$0
18	CC	1118[illegible]	CUELLO CUNCHE ALEXIS	30/01	28	$880,494	0P30[illegible]	22	$880,494	$35,200	037[illegible]	22	$866,667	$34,700	14-23	22	$880,494	$51,200	22	$0	$0
19	CC	1117[illegible]	CHALA HERRERA ERNESTO ANTONIO	30/01	30	$1,400,000	0P30[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	037[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,000	30	$0	$0
20	CC	1[illegible]	[illegible] EDWARD EDGARDO MOLANO FELIX	30/01	30	$1,300,000	0P30[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	037[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,000	30	$0	$0
21	CC	1117[illegible]	CUMBRES MALDONADO CRUZ EMILIO	30/01	9	$390,000	0P30[illegible]	9	$390,000	$15,600	037[illegible]	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$27,000	9	$0	$0
22	CC	1[illegible]	DIAZ PEREZ GUSTAVO ALONSO	30/01	28	$855,110	0P30[illegible]	28	$855,110	$34,200	037[illegible]	22	$848,699	$33,700	14-23	28	$855,110	$84,000	28	$0	$0
23	CC	1[illegible]	DIAZ PEREZ GUSTAVO ALONSO	31/01	1	$86,667	0P30[illegible]	1	$86,667	$3,500	037[illegible]	1	$86,667	$0	14-23	1	$86,667	$0	1	$0	$0
24	CC	1111[illegible]	DIAZ MENDOZA MIGUEL ANGEL	30/01	30	$1,300,000	0P30[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	037[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,000	30	$0	$0

2024/06/17 04:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
25	CC	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$40,560	30	$0	$0
26	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$40,560	30	$0	$0
27	CC	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$40,560	30	$0	$0
28	CC	[illegible]	[illegible]	17	$891,422	$141,000	[illegible]	17	$891,422	$35,800	[illegible]	17	$734,647	$29,500	[illegible]	17	$891,422	$22,230	17	$0	$0
29	CC	[illegible]	[illegible]	28	$1,275,561	$204,100	[illegible]	28	$1,275,561	$51,100	[illegible]	28	$1,213,224	$48,800	[illegible]	28	$1,275,561	$40,600	28	$0	$0
30	CC	[illegible]	[illegible]	1	$86,667	$13,900	[illegible]	1	$86,667	$3,500	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	0	$0	$0
31	CC	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$40,560	30	$0	$0
32	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,356,914	$203,500	[illegible]	30	$1,356,914	$52,300	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,356,914	$41,000	30	$0	$0
33	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$100,000	$3,000	[illegible]	30	$1,300,000	$40,560	30	$0	$0
34	CC	[illegible]	[illegible]	13	$681,114	$109,000	[illegible]	13	$681,114	$27,300	[illegible]	13	$681,114	$27,300	[illegible]	13	$681,114	$47,920	13	$0	$0
35	CC	[illegible]	[illegible]	16	$727,906	$116,500	[illegible]	16	$727,906	$29,100	[illegible]	16	$818,882	$27,200	[illegible]	16	$727,906	$30,700	16	$0	$0
36	CC	[illegible]	05-14	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$40,560	30	$0	$0
37	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$40,560	30	$0	$0
38	CC	[illegible]	[illegible]	25	$1,322,743	$211,400	[illegible]	25	$1,322,743	$52,900	[illegible]	25	$1,300,000	$52,000	[illegible]	25	$1,322,743	$51,600	25	$0	$0
39	CC	[illegible]	[illegible]	27	$1,218,400	$195,000	[illegible]	27	$1,218,400	$48,800	[illegible]	27	$1,170,000	$46,800	[illegible]	27	$1,218,400	$94,000	27	$0	$0
40	CC	[illegible]	[illegible]	1	$86,667	$13,900	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	1	$0	$0
41	CC	[illegible]	[illegible]	1	$40,334	$5,000	[illegible]	1	$40,334	$0	[illegible]	1	$40,334	$0	[illegible]	1	$40,334	$0	1	$0	$0
42	CC	[illegible]	[illegible]	10	$401,334	$64,400	[illegible]	10	$401,334	$17,400	[illegible]	10	$401,334	$17,400	[illegible]	10	$401,334	$30,200	10	$0	$0
43	CC	[illegible]	05-14	23	$1,478,832	$236,700	[illegible]	23	$1,478,832	$59,300	[illegible]	23	$1,283,334	$42,400	[illegible]	23	$1,478,832	$103,000	23	$0	$0
44	CC	[illegible]	05-14	0	$216,667	$34,700	[illegible]	0	$216,667	$8,700	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	0	$216,667	$0	0	$0	$0
45	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
46	CC	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	30	$2,600,000	$104,000	[illegible]	30	$2,600,000	$104,000	[illegible]	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
47	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$40,560	30	$0	$0
48	CC	[illegible]	[illegible]	17	$907,490	$145,200	[illegible]	17	$907,490	$36,300	[illegible]	17	$734,647	$29,500	[illegible]	17	$907,490	$63,000	17	$0	$0
49	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,426,532	$228,300	[illegible]	30	$1,426,532	$57,100	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,426,532	$99,500	30	$0	$0
50	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
51	CC	[illegible]	[illegible]	23	$1,083,334	$173,400	[illegible]	23	$1,083,334	$43,400	[illegible]	23	$1,083,334	$43,400	[illegible]	23	$1,083,334	$75,500	23	$0	$0
52	CC	[illegible]	[illegible]	5	$216,667	$34,700	[illegible]	5	$216,667	$8,700	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	5	$216,667	$0	0	$0	$0
53	CC	[illegible]	05-14	30	$1,360,194	$217,700	[illegible]	30	$1,360,194	$54,500	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,360,194	$94,700	30	$0	$0
54	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$156,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
55	CC	[illegible]	[illegible]	29	$1,263,981	$202,200	[illegible]	29	$1,263,981	$50,600	[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	[illegible]	29	$1,263,981	$88,000	29	$0	$0
56	CC	[illegible]	[illegible]	1	$43,334	$6,900	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	1	$0	$0
57	CC	[illegible]	[illegible]	29	$1,233,814	$212,100	[illegible]	29	$1,323,810	$53,100	[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	[illegible]	29	$1,233,814	$85,300	29	$0	$0
58	CC	[illegible]	[illegible]	1	$43,334	$6,900	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	[illegible]	1	$43,334	$0	1	$0	$0
59	CC	[illegible]	[illegible]	26	$1,170,934	$186,600	[illegible]	26	$1,170,934	$43,300	[illegible]	26	$1,126,667	$45,100	[illegible]	26	$1,170,934	$82,100	26	$0	$0

2024/06/17 04:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
60	CC	[illegible]	[illegible]	1	$86,667	$10,300	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	1	$0	$0
61	CC	[illegible]	[illegible]	1	$86,667	$10,300	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	1	$0	$0
62	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,366,914	$209,200	[illegible]	30	$1,366,914	$82,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,366,914	$91,000	30	$0	$0
63	CC	[illegible]	[illegible]	23	$1,090,248	$134,900	[illegible]	23	$1,090,248	$43,700	[illegible]	23	$1,035,334	$41,400	[illegible]	23	$1,090,248	$73,900	23	$0	$0
64	CC	[illegible]	[illegible]	1	$216,667	$26,700	[illegible]	1	$216,667	$8,700	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	0	$216,667	$0	0	$0	$0
65	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,366,914	$209,200	[illegible]	30	$1,366,914	$82,000	[illegible]	30	$1,366,914	$52,000	[illegible]	30	$1,366,914	$91,000	30	$0	$0
66	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,311,839	$201,500	[illegible]	30	$1,311,839	$82,600	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,311,839	$91,000	30	$0	$0
67	CC	[illegible]	[illegible]	7	$303,334	$46,600	[illegible]	7	$303,334	$12,200	[illegible]	7	$141,111	$11,700	[illegible]	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
68	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$200,000	[illegible]	30	$1,300,000	$82,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
69	CC	[illegible]	[illegible]	28	$1,213,334	$194,100	[illegible]	28	$1,213,334	$48,600	[illegible]	28	$1,213,334	$48,600	[illegible]	28	$1,213,334	$84,900	28	$0	$0
70	CC	[illegible]	[illegible]	1	$86,667	$10,900	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	1	$0	$0
71	CC	[illegible]	[illegible]	29	$1,213,951	$201,900	[illegible]	29	$1,213,951	$81,200	[illegible]	29	$1,126,667	$50,500	[illegible]	29	$1,213,951	$88,700	29	$0	$0
72	CC	[illegible]	[illegible]	1	$42,334	$7,000	[illegible]	1	$42,334	$1,800	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	1	$42,334	$0	0	$0	$0
73	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,303,667	$200,600	[illegible]	30	$1,303,667	$82,200	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,303,667	$90,800	30	$0	$0
74	CC	[illegible]	[illegible]	10	$403,334	$66,400	[illegible]	10	$403,334	$17,400	[illegible]	10	$403,334	$17,400	[illegible]	10	$403,334	$28,200	10	$0	$0
75	CC	[illegible]	[illegible]	16	$717,906	$116,500	[illegible]	16	$717,906	$29,200	[illegible]	16	$693,334	$27,800	[illegible]	16	$717,906	$50,700	16	$0	$0
76	CC	[illegible]	[illegible]	28	$1,300,278	$240,100	[illegible]	28	$1,300,278	$46,700	[illegible]	28	$1,233,334	$44,400	[illegible]	28	$1,300,278	$104,900	28	$0	$0
77	CC	[illegible]	[illegible]	1	$86,667	$10,300	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	1	$0	$0
78	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$200,000	[illegible]	30	$1,300,000	$82,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
79	CC	[illegible]	[illegible]	29	$1,259,514	$240,600	[illegible]	29	$1,259,514	$62,400	[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	[illegible]	29	$1,259,514	$108,600	29	$0	$0
80	CC	[illegible]	[illegible]	29	$1,315,810	$211,100	[illegible]	29	$1,315,810	$53,100	[illegible]	29	$1,315,810	$52,100	[illegible]	29	$1,315,810	$92,300	29	$0	$0
81	CC	[illegible]	[illegible]	1	$45,334	$5,500	[illegible]	1	$45,334	$0	[illegible]	1	$45,334	$0	[illegible]	1	$45,334	$0	1	$0	$0
82	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,333,314	$214,900	[illegible]	30	$1,333,314	$54,400	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,333,314	$94,400	30	$0	$0
83	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$91,500	30	$0	$0
84	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
85	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,331,114	$213,000	[illegible]	30	$1,331,114	$53,300	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,331,114	$93,700	30	$0	$0
86	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,379,319	$220,600	[illegible]	30	$1,379,319	$55,200	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,379,319	$96,100	30	$0	$0
87	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,827,841	$292,400	[illegible]	30	$1,827,841	$65,700	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,827,839	$111,200	30	$0	$0
88	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,407,172	$225,100	[illegible]	30	$1,407,172	$56,300	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,407,172	$98,500	30	$0	$0
89	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,531,629	$245,100	[illegible]	30	$1,531,629	$61,300	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,531,629	$106,700	30	$0	$0
90	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,331,114	$213,000	[illegible]	30	$1,331,114	$53,300	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,331,114	$93,700	30	$0	$0
91	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,334,571	$213,600	[illegible]	30	$1,334,571	$53,400	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,334,571	$93,900	30	$0	$0
92	CC	[illegible]	[illegible]	6	$0	$0	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
93	CC	[illegible]	[illegible]	28	$1,209,639	$193,600	[illegible]	28	$1,209,639	$48,400	[illegible]	28	$1,209,639	$48,400	[illegible]	28	$1,209,639	$84,200	28	$0	$0
94	CC	[illegible]	[illegible]	1	$86,667	$10,300	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	1	$0	$0
95	CC	[illegible]	[illegible]	1	$86,667	$10,900	[illegible]	1	$86,667	$3,500	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	1	$86,667	$0	0	$0	$0

2024/06/17 04:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
96	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
97	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
98	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
99	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
101	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
103	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
104	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
105	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
106	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
107	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
108	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
109	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
112	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
113	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
114	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
115	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
116	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
117	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
118	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
119	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
121	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
122	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
123	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
124	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
125	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
126	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
127	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
128	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
129	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
130	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
131	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
132	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2024/06/17 04:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
131	CC	7177726	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	23-14	30	$1,300,000	$208,000	0P0005	30	$1,300,000	$52,000	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$42,900	30	$0	$0
134	CC	1114809562	RODRIGUEZ GARCIA JOSE ALDEMAR	23031	30	$1,402,333	$224,409	0P0037	30	$1,402,333	$56,109	03749	30	$1,400,000	$52,000	14-23	30	$1,402,333	$57,700	30	$0	$0
135	CC	40436638	RODRIGUEZ GUTIERREZ MARITZAVE	23031	30	$1,313,829	$210,300	0P0005	30	$1,313,829	$52,600	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,313,829	$54,000	30	$0	$0
136	CC	1085479897	ROJAS OLIVOS HELI JOSUE	23031	30	$866,667	$138,700	0P0037	20	$866,667	$34,700	03749	30	$911,538	$36,800	14-23	20	$866,667	$60,000	20	$0	$0
137	CC	1117226179	ROMERO CARABARE EDIN NICOB	23031	30	$1,306,914	$209,100	0P0041	30	$1,306,914	$52,300	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,306,914	$53,800	30	$0	$0
138	CC	7656888	SALCEDO CORON JOSE MARIA	23031	30	$1,934,733	$309,600	0P0037	30	$1,934,733	$77,400	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,934,733	$104,700	30	$0	$0
139	CC	1052383946	SANCHEZ SANCHEZ WILLIAM RICARDO	23031	30	$1,300,000	$208,000	0P0041	30	$1,300,000	$52,000	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,300	30	$0	$0
140	CC	1116852028	SOLANILLO RUIZ RAMON ANTONIO	23031	30	$1,306,914	$209,100	0P0029	30	$1,306,914	$52,300	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,306,914	$53,800	30	$0	$0
141	CC	74866167	SOLEDI FARFAN CARLOS EUDOMIO	23031	30	$1,447,279	$231,600	0P0037	30	$1,447,279	$57,900	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,447,279	$105,800	30	$0	$0
142	CC	1118020865	SOLORZANO SATANOVA ADRIAN DAVID	23031	30	$1,401,640	$224,300	0P0029	30	$1,401,640	$56,100	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,401,640	$57,600	30	$0	$0
143	CC	1118020910	TARACHE IBICA JEISEL ANDRES	23031	30	$1,438,286	$230,200	0P0037	30	$1,438,286	$57,600	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,438,286	$105,200	30	$0	$0
144	CC	1116795985	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	23031	30	$1,516,618	$242,700	0P0037	30	$1,516,618	$60,700	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,516,618	$110,600	30	$0	$0
145	CC	4067091	TORRES VARGAS ENRIQUE		0	$0	$0	0P0029	30	$1,331,114	$53,300	03749	30	$1,331,114	$53,300	14-23	30	$1,331,114	$55,700	30	$0	$0
146	CC	1118041446	TORRES MENDOZA JUAN CARLOS	23031	30	$1,300,000	$208,000	0P0005	30	$1,300,000	$52,000	03744	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$54,300	30	$0	$0
147	CC	2341027	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	23031	30	$1,600,000	$256,000	0P0005	30	$1,600,000	$64,000	03749	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
148	CC	1148698	VARGAS ARDILA Ednael		0	$0	$0	0P0005	28	$1,253,846	$50,200	03749	28	$1,253,846	$50,200	14-23	28	$1,253,846	$54,300	28	$0	$0
149	CC	7148698	VARGAS ARDILA Ednael		0	$0	$0	0P0005	2	$86,667	$3,500	03749	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$6	0	$0	$0
150	CC	1116340786	VARGAS AGUDELO JOSE ANTONIO	23031	30	$1,386,253	$222,000	0P0041	30	$1,386,253	$55,500	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,386,253	$110,500	30	$0	$0
151	CC	1118362872	VARGAS FRANCO WILMER FERNANDO	23031	30	$1,341,486	$214,700	0P0029	30	$1,341,486	$53,700	03749	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,341,486	$55,400	30	$0	$0
152	CC	1117203219	VARGAS MARZ YAIMAN FERNANDA	23031	25	$1,110,991	$177,800	0P0029	25	$1,110,991	$44,500	03749	25	$1,083,344	$43,400	14-23	25	$1,110,991	$77,400	25	$0	$0
153	CC	1118977689	VARGUES TABACO ISMAEL	23-14	28	$1,247,906	$199,700	0P0029	28	$1,247,906	$50,000	03749	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,247,906	$86,900	28	$0	$0
154	CC	1118977689	VARGUES TABACO ISMAEL	23-14	2	$86,667	$13,900	0P0029	2	$86,667	$3,500	03749	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$6	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Reversal: EFIGRUZA BOCAS DEL PAUTO (3 Afiliados)						**$861,363**	**$137,900**			**$861,363**	**$34,600**			**$838,791**	**$33,200**			**$861,363**	**$60,100**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (3 Afiliados)						$861,363	$137,900			$861,363	$34,600			$838,791	$33,200			$861,363	$60,100		$0	$0
Ciudad: TRINIDAD Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$861,363	$137,900			$861,363	$34,600			$838,791	$33,200			$861,363	$60,100		$0	$0
133	CC	7166449	PALMERO PEREZ EDWAR	23031	11	$688,029	$110,100	0P0037	19	$688,029	$27,600	03749	19	$630,000	$26,300	14-23	11	$688,029	$47,900	19	$0	$0
136	CC	1118447591	SOLIS RODRIGUEZ WILSON ALEXIS	23031	3	$86,667	$13,900	0P0037	3	$86,667	$3,500	03749	3	$93,084	$3,700	14-23	3	$86,667	$6,100	3	$0	$0
137	CC	1116447598	SUAREZ SUBURUCO MATEO MANUEL	23031	3	$86,667	$13,900	0P0037	3	$86,667	$3,500	03749	3	$86,667	$3,500	14-23	3	$86,667	$6,100	3	$0	$0
Total			**Afiliados(123)**			$142,690,614	$22,794,300			$139,872,459	$6,199,660			$140,911,793	$5,679,700			$139,872,459	$10,176,900		$0	$0

2024/06/17 04:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	6	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 28 - 49	YOPAL-CASANARE	6327136	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	49423593	94685174159	E	2024/06/13	2024/06/17	BANCO DE OCCIDENTE		$44,985,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	$22,794,200	$0	$22,866,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,089,100	$0	$1,092,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$2,892,200	$0	$2,901,400
PORVENIR	230301	800,224,808	9	88	$17,145,700	$0	$17,199,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,667,200	$0	$1,672,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$10,176,500	$0	$10,208,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	123	$10,176,500	$0	$10,208,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$5,675,700	$0	$5,693,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	123	$5,675,700	$0	$5,693,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				123	$6,196,600	$0	$6,216,500
CAJACOPI	CCPC55	901,543,211	6	1	$15,600	$0	$15,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,900	$0	$53,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	31	$1,553,400	$0	$1,558,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$105,900	$0	$106,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$157,600	$0	$158,100
FAMISANAR	EPSI17	830,003,564	7	1	$54,300	$0	$54,500
FOSYGA	MH001	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$52,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MH002	901,037,916	1	3	$156,000	$0	$156,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	$1,564,200	$0	$1,569,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	$917,900	$0	$920,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$1,566,800	$0	$1,571,800
TOTAL				123	$44,843,000	$0	$44,985,000

2024/06/17 04:18 PM

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°31 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FERRONIPLES DEL ORIENTE S.A.S	FNO 4934	6/05/2024	$ 18.363.149,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S	Y - 4345	10/05/2024	$ 165.041.600,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	WILLIAN BARRERA GUTIERREZ	DSE 134	20/05/2024	$ 1.043.700,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	MADERAS MADERA'RQ	176	24/08/2024	$ 660.000,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 29470	25/05/2024	$ 1.079.999,00
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TIRSO GERMAN PEREZ	TGPC - 986	28/05/2024	$ 650.000,00
TOTAL				**$ 186.838.448,00**

FERRO NIPLES DEL ORIENTE SAS
900.425.466-8
CL 10 18a 37
3182153775
Yopal - Colombia
comercial@ferroniples.com
www.ferroniples.com

Factura electrónica de venta
N°. FNO 4934

Cliente: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Nit: 844,004,640-0
Teléfono: (608) 3138688597
Dirección: yopal
Ciudad: Yopal - Colombia
Correo: compraslogisticasynergia@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	06/05/2024, 11:09
Expedición	06/05/2024, 11:09
Vencimiento	06/05/2024
Vendedor	OBEIMAR ALEJANDRO CAMARGO
Centro de costo	6
Cotización	C-1-1137

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DIESEL 3*3 CARCASA EN HIERRO	2.00	4,845,378.00	19 %	2,5 %	1,841,243.64	242,268.90	11,289,730.74
2	MANGUERA SUCCION 3 X 6 MTS	2.00	302,521.01	19 %	2,5 %	114,957.98	15,126.05	704,873.96
3	GRANADA SUCCION ALUMINIO 3	2.00	71,428.57	19 %	2,5 %	27,142.86	3,571.43	166,428.57
4	ACOPLE RAPIDO IMPORTADO PARTE C3	4.00	61,344.54	19 %	2,5 %	46,621.85	6,134.45	285,865.55
5	ACOPLE RAPIDO IMPORTADO PARTE F3	4.00	27,731.09	19 %	2,5 %	21,075.63	2,773.11	129,226.89
6	MANGUERA TIPO BOMBERO DE 3	300.00	15,966.39	19 %	2,5 %	910,084.03	119,747.90	5,580,252.10
7	ACEITE PETROBRAS 15W40 DIESEL	4.00	24,000.00	0 %	2,5 %	0.00	2,400.00	93,600.00
8	FILTRO COMBUSTIBLE 186	2.00	8,403.36	19 %	2,5 %	3,193.28	420.17	19,579.83
9	ELEMENTO FILTRO AIRE SAÑO ACEITE 186 JUEGO (ESPUMA-FILTRO-EMPAQUE	2.00	37,815.13	19 %	2,5 %	14,369.75	1,890.76	88,109.24
10	TAPA ARRANQUE COMPLETO 3600 RPM 186	1.00	86,386.55	19 %	2,5 %	16,413.45	2,159.66	100,640.34

Total Items: 10

Valor en Letras:
Dieciocho millones trescientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 18,363,149.03

Total Bruto	15,859,697.17
IVA 19%	2,995,102.47
Retefuente 2.5%	396,492.43
Reteica 8*1000	95,158.18
Total a Pagar	18,363,149.03

Observaciones:
Numero de serie:

Para pagos:
Bancolombia Cuenta Ahorros #62900001362
Titular FERRO NIPLES DEL ORIENTE SAS

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Ferro Niples del Oriente SAS
NIT: 900.425.466-8
CANCELADO

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764064003381 aprobado en 20240130 prefijo FNO desde el número 4600 al 5000 Vigencia: 12

Firma recibido

CONSTRUVARIOS
EL ÉXITO DE LA CONSTRUCCIÓN

NIT 830.060.952-4

COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
NO SOMOS
AUTORRETENEDORES DE ICA
CIIU: 208 TARIFA 6 X 1.000
SOMOS RESPONSABLES DE ICA/YOPAL

DIRECCION
CALLE 24 No 12-26 PBX (038) 6358700
CELULARES 3142993942 - 3124781851

ACERO FIGURADO,CEMENTOS, TUBERIA Y ACCESORIOS
PAVCO,PERFILES,GALVANIZADOS,LAMINA HIERRO Y
CUBIERTAS EN GENERAL MAQUINARIA

Cliente: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
N° Identificacion: 844004840-0
Persona De Contacto: DIEGO FERNANDO DIAZ
Telefono: 3178560362
Celular: 6066327178
Direccion de Facturacion: GL 30 N - 28 - 46 CA 20 BRR ALTOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°Y- 43.545

Fecha de Contabilización:	10/05/2024	11:44:05a.m.
Fecha de Vencimiento:	10/05/2024	11:44:05a.m.
Forma de Pago:	Cre	
Asesor Comercial:	0001	
Cuidad:	YOPAL	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764008888554 DEL 30/05/2024 DEL No. Y-41525 AL No. Y-100000 -VIGENCIA 12M

NO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL
05	CE017	CEMENTO ESPECIAL Tipo ART X 42,5 KG HOLCIM	8.000,00	17.800	142.400.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	142.400.000
DESCUENTO	0
TOTAL IVA	27.056.000
SUB. ANT. RTE	169,456.000
RETE FUENTE	3.560.000
RETE IVA	
RETE ICA	854.400
TOTAL A PAGAR	**165.041.600**

SON:

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS Y CERO M/CTE

TILO

SOMOS RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SI NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO. TARIFA SOBRE TASA BOMBERIL 7% .

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO DE LA LEY 1231 DE 2008, QUE MODIFICO EL ARTICULO 774 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO Y POR LO TANTO CONSTITUYE TITULO VALOR.

RECIBIDA: BIEN, OCCIDENTE, BARCELONESA — 901834007, 900830360, 830059603 — CONSECIVIL, ANDERCOL, ANDERCOL

En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios,COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS SAS como empresa que almacena y recolecta datos de carácter personal, con la única finalidad de desarrollar nuestro objeto social y ajustarse a los temas del derecho de Habeas Data, siguiendo obtener su autorización para el tratamiento de sus datos personales, por lo anterior, firmando la presente se autoriza a COMERCIALIZADORA DE CONSTRUVARIOS SAS a realizar el tratamiento de los datos personales suministrados para la finalidad anteriormente mencionada.

Dirección: Calle 24 # 12 - 26 Yopal - Casanare **TEL:** 6358700 - 3124789790
3142993942 ConstruvariosS.A.S Email:info@construvarios.com

Impreso por SAP Business One - CONSTRUVARIOS
SAS 830.060.952-4 - Proveedor Tecnológico -
FACTURE S.A.S 900385741-7

Holcim · PasdelRio · ACESCO · COLMENA · Platco · PAVCO · TIGRE · Cerámicas Corona · PIECOS

CUFE: ddcd1ea5a5e8bf74be4e375c4c6ea2b22f30f0640ea0490420cef780d8a67b06caf85b9dde31bd8635777c77be60965

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Yopal - Colombia

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

DSE 134

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764055082211 de 31/08/2023 hasta 31/08/2024 Rango Autorizado del DSE59 al DSE1000

Vendedor/Prestador del servicio:
WILLIAM BARRERA GUTIERREZ
NIT: 74754851-6
Teléfono: 3204097443
Dirección: CL 11 26 42
E-mail: MADERAROMADERAS@GMAIL.COM
Generación: 20/05/2024

Adquiriente:
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Teléfono: 6327178
Dirección: CALLE 30 28 46
E-mail: synergiaconstrucciones@gmail.com
Moneda: COP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	CANT	UDM	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	07	SUMINISTRO MATERIALES VARILLONES Y REPISAS	1	UND	$1,050,000.00	0	$0.00	$1,050,000.00

1 Item

Observaciones: VARILLONES Y REPISAS

UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	$1,050,000.00
TOTAL	$1,050,000.00

Firma electrónica: 5/BEGO/OW3H1GGDpWp2SSABfrjejrFen3dJovSCzbvcr+BfQb+jjFD6mFuljMU23xE3F7lUvhvvz9lxOgtb3PwtuPkOg50fLDWD8K+E1lrqiCkc7L0XaAC8m0kfYgGUEpCPYtCpxGiYD8G2b00

Fecha y hora de generación: 5/20/2024 12:05 PM Fecha y hora de expedición: 5/20/2024 12:05 PM

CUDS: baaaa99069bec57ad91ffe9ba8cb67047beeff8616c4bb6933a817c8042a09ab6f0f18cdedbe91c382a3510d33fc73d

Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Software: DOCUMENTEME - Código PT: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

MADERAS MADERA'RQ
William Barrera
Nit. 74.754.851-6
No responsable de Iva
COMPRA Y VENTA DE MADERAS
Maderarqmaderas@gmail.com
320 409 7443 -310 236 8404
Calle 11 No.26-42 /Barrio La Unidad
Yopal - Casanare

FECHA: 29/05/024

FACTURA DE VENTA
No. 176

Cliente: Synergia NIT: 9242008840-0
Dirección: cll 38 # 2A - 81 Tel:
FORMA DE PAGO CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	V.R.UNI	V.R.TOTAL
20	Rollizos 10cm x 6mt	33.000	666.000

CANCELADO

ENTREGADO

SON:

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL $

TOTAL $ 660.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART 774 DE CÓDIGO DE COMERCIO

Recibí mercancía y cumplo con firmar por el producto a mención previsto. Ley 1231 de 2008

Fecha de Recibido

Nombre C.C.

Firma

Firma del emisor de la Factura

Web Empaques Gráficos NIT 79.838.779-4 Cel. 314 452 7518

Redeban

MAY 24 2024 11:05:51 #RRN: 5.VC

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS YOPAL
CR 29 14 47 FRENTE BANC
CUENTA: XXXXXX2134 TIPO: AHORROS

RECIBO: 05407
Productos: XXXX2134
TITULAR: WILLIAM BARRERA
DEPOSITO
APRO: 192726

TU COMPROBANTE DE PAGO ESTA TRANSACCION
MACH ESTA TRANSACCION

Bancolombia no es responsable por los servicios prestados por el COL ES no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento esta correcta.Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

255

DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES
TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: DMCE29470
Fecha Emisión: 2024-05-25 11:49:43
Fecha validación: 2024-05-25 11:49:36-05:00

Nº Resolución: 18764071041181 **Prefijo:** DMCE **Consecutivo:** 29396 hasta 30000 **Fecha:** 2024-05-21 **hasta** 2024-11-21

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: AURA ENID RINCON MORALES
NIT: 24049474-7
Actividad Económica: 4663;4741
Responsabilidad: No aplica -- Otros -
Dirección: CALLE 46 6 07 - YOPAL - - Casanare - CO
Teléfonos: 8633969
Contacto: AURA ENID RINCON MORALES
E-mail: email@domain.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Actividad Económica: 4290
Dirección: CALLE 30 No 28-46 CA 20 B ALTOS DE MANARE - YOPAL -- CASANARE - CO
Teléfonos: 6086327178
E-mail: synergiaconstrucciones@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	AD000019	30.00	WSD	VIUKEM 116 GRIS	30,252.10	IVA 19.00	172,436.97		1,079,999.97
Total Ítem:		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	907,563.00	172,436.97

Totales

SUBTOTAL:	907,563.00
TOTAL Base Imponible:	907,563.00
IVA	172,436.97
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,079,999.97

TOTAL en letras: Un Millon Setenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Siete COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

OD50316

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-05-25	01		0				

Actividad económica ICA 205 6*1000. No practicar retencion del impuesto de avisos y tableros ni sobretasa bomberil, segun acuerdo 020 de 09 de diciembre de 2022, art 34.

CUFE: 39d6a755d9b3f02d1e81cad368135e4682be7c8f5348c8c5eb3d979b41837777a92fea8ed9005a33673c5624fa7f01
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de template: co-default-21-764

256

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f44e68d5596172504037e89d501eba94784c51d58bd55cc29e9775f128a26f0531733af13028448c9947891a85383f9

Número de Factura: TGPC-986
Fecha de Emisión: 28/05/2024
Fecha de Vencimiento: 28/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN
Nombre Comercial: PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN
Nit del Emisor: 4219590
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1630

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 13 35 06 BRR JUAN PABLO II
Teléfono / Móvil: 3144875237
Correo: tirsocarpinteria@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 844004840
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Teléfono / Móvil: 3178560362
Correo: synergiaconstrucciones@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		TABLON DE 30X70CMTRS	ZZ	20,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
2	11121610	LIMATON X 4MTRS	ZZ	6,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-28 09:55:03
Documento generado el 2024-05-28 09:58:02
Generado por: Solución Gratuita DIAN NIT:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			650.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			650.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			650.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	650.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069027981 Rango desde: 911 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-10-15

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°31 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	LUIS FERNANDO MORENO	3597	26/04/2024	$ 9.959.896,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	JAIME ALEXANDER MARIÑO	CCOBR	30/04/2024	$ 7.573.500,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	CLAUDIA PATRICIA CRUZ	FV 18	3/05/2024	$ 14.949.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	RAFAEL DEL LLANO S.A.S	FV 2009	8/05/2024	$ 12.818.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S	Y - 43548	10/05/2024	$ 30.238.560,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 379	11/06/2024	$ 3.589.040,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 380	11/06/2024	$ 57.065.736,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HYS GLOBAL SERVICES S.A.S	FE 378	11/06/2024	$ 6.101.368,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	CLAUDIA PATRICIA CRUZ	FE 19	16/05/2024	$ 15.642.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	DEYSI LORENA AVILA MESA	DSE 146	24/05/2024	$ 1.300.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	ALEXANDER MARIÑO	CCOBR	30/05/2024	$ 6.534.000,00
TOTAL				**$ 165.771.100,00**

LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA
Nit. 74.376.604-1 - Regimen Comun Personas
Cra 21 # 22-24 EL GAVAN YOPAL - CASANARE
6333285

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FERR 3597

Res. DIAN No.18764069568641 Prefijo FERR Rango 3590 a 5000 Vigencia 25/04/2024 a 25/10/2024

Nombre Cliente:	**SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**	Fecha Emisión :	**abril 26, 2024**
C.C. o NIT.:	**844.004.840**	F. Vencimiento:	**abril 26, 2024**
Teléfono:	**(608) 632**	Forma de Pago:	**CAJA INTERNA**
Dirección:	**CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANA , YOPAL**	Vendedor:	**ALMACEN PRINCIPAL**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VAL. UNIT	%DCT	IVA %	VAL. IVA	VAL. TOTAL
0100323	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	10.101.010	0	0	0	10.101.010

SON: DIEZ MILLONES DE PESOS

VALOR BRUTO	10.101.010
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	10.101.010
RTEFTE 1%	101.010
TOTAL	**10.000.000**

Esta factura de venta se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.

Observaciones:
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024

Atentamente:

Nombre:
C.C.:
Teléfono:
Fecha:

Firma del Cliente

CUFE: 3a2ecdc6f97625ccfea63c57b34ca2581a2bc3a7380133f9e8ab122ceaed25c88063cff2deb52ca02a64c3321b338c04

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

0904

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0704

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 05/10/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CRUCE FC0172 TRANSPORTE FV3597 TILO	233545001	74376604	9,959,596.00	
2	CRUCE FC0172 TRANSPORTE FV3597 TILO	110505001	74376604		9,959,596.00
TOTAL GENERAL				9,959,596.00	9,959,596.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

1193533294 0991

YOPAL CASANARE 30 ABRIL DE 2024

CUENTA DE COBRO

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT. 844.004.840-0

DEBE A:
JAIME ALEXANDER MARIÑO CHAPARRO
CC. 74.186.976 SOGAMOSO (BOYACÁ)
Cel. 3213300097

LA SUMA DE ($7.650.000=)
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO DE CARRO TANQUE PLACAS XGB414, EN EL PROYECTO DE TILODIRAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024.

JAIME ALEXANDER MARIÑO CHAPARRO
CC.74.186.976 SOGAMOSO (BOYACA)
CEL. 3213300097

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 03-05-2024
HORA: 9.32 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 28
RECIBIDO POR:
Martha Garcia
OFICINA

262

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0507

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/02/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CH3593019 FC0112 SERVICIO CARROTANQUE -TILO	233545001	74186976	7,623,000.00	
2	CH3593019 FC0112 SERVICIO CARROTANQUE -TILO	111005009	74186976		7,623,000.00
TOTAL GENERAL				7,623,000.00	7,623,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

74.186.976

0507

24, 8:18 Factura - iSigo

Espacio para
Logo Corporativo

CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ
NIT 46.373.163-1
CR 6 A 40 B 23
Tel: (608) 3134205833
Yopal - Colombia
46claudiacruz@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 18

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		
NIT	844.004.840-0	Teléfono	(608) 6327178 - Ext. 000
Dirección	CL 30 28 46 BRR ALTOS DE MANARE	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2024, 08:18
Expedición	03/05/2024, 08:18
Vencimiento	03/05/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Sludiran, viajes de excavación cargados por las volquetas FSI 858 - WZC 406 - CXD 794 - PYB 740.	302.00	15,100,000.00

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 03-05-2024
HORA: 3:21 PM.
CANTIDAD DE FOLIOS: 40.
RECIBIDO:
ÓNICA.
C.C. 90

Total Items: 1

Valor en Letras:
Quince millones cien mil pesos m/cte

Total Bruto	15,100,000.00
Total a Pagar	15,100,000.00

Condiciones de Pago:
Cheque $ 15,100,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización Electrónica 18764065391395 aprobado en 20240303 prefijo FE desde el número 13 al [illegible] Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 913dfe8f5066c3460cb5008e3b8d45d38aae8c87b686dc3a4006d0d5658a30982f200ca786c1cb0e60ba59c0d5aea329

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - NIT 830.048.145-8 Version Software Sigo Hoke. Forma electrónica con el DIAN

264

AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO S.A.S

NIT: 900675340-9

Impuesto sobre las ventas - IVA

Facturación por computador según Resolución N° 18764043978840 de fecha 2023/02/06. Habilita desde 1534 a la 2000.

KM 3 VIA YOPAL MORICHAL PLANTA
OFICINAS CLL 24 # 12 - 26 PISO 3
Cel: 3124789790 - 3107977504
Yopal - Colombia

ACTIVIDAD ECONOMICA
CIUU 306 Tarifa Ica 4/1000

Responsable de Ica/Yopal

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 2.009

SEÑORES:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT:	844004840-0
DIRECCION:	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALT
TELEFONO:	3178560362
CUIDAD:	YOPAL

FECHA FACTURA	VENDEDOR
08/05/2024 10:55:56a.m.	CASTRO ABRIL TATIANA
FECHA VENCIMIENTO	**FORMA DE PAGO**
08/05/2024 10:55:56a.m.	Credito

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	TOTAL
RANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE	100,00	130.000	13.000.000

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS Y CERO MCTE

SUBTOTAL	13.000.000
DESCUENTO	0
TOTAL IVA	0
SUB. ANT. RTE	13.000.000
RETE FUENTE	130.000
RETE IVA	
RETE ICA	52.000
TOTAL A PAGAR	**12.818.000**

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008, QUE MODIFICO EL ARTICULO 774 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO Y POR LO TANTO CONSTITUYE TITULO VALOR.

OBSERVACIONES:

Firma Del Emisor:

FECHA RECIBIDO
D
M
A

Aceptada:

AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO S.A.S

EL COMPRADOR Y OBLIGADO, FIRMA Y SELLO -C.C O NIT

En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios, AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO SAS como empresa que almacena y recolecta datos de carácter personal, con la única finalidad de desarrollar nuestro objeto social y ajustarse a las normas del derecho de Habeas Data, requiere obtener su autorización para el tratamiento de sus datos personales. Por lo anterior, firmada o recibida medio electrónico la presente se autoriza a AGREGADOS SAN RAFAEL DEL LLANO SAS a realizar el tratamiento de los datos personales únicamente para la finalidad anteriormente mencionada.

CUFE: 3c8f7fc2939c310a388bfab8e366429b1def0a0631a54bc5215d803823ecb01a854688db3722dad819cd32c7c8a6faa

CONSTRUVARIOS
EL ÉXITO DE LA CONSTRUCCIÓN

NIT 830.060.952-4
COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
NO SOMOS
AUTORRETENEDORES DE ICA
CIUU 208 TARIFA 6 X 1.000
SOMOS RESPONSABLES DE ICA/YOPAL

DIRECCION
CALLE 24 No 12-26 PBX (038) 6358798
CELULARES 3142993942 - 3124781851

ACERO FIGURADO,CEMENTOS,TUBERIA Y ACCESORIOS
PAVCO,PERFILES,GALVANIZADOS,LAMINA HELCE Y
CUBIERTAS EN GENERAL MAQUINARIA

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Nº Identificacion:	844004840-0
Persona De Contacto:	DIEGO FERNANDO DIAZ
Telefono:	3178560362
Celular:	6066327178
Direccion de Facturacion:	CL 30 N - 28 - 46 CA 20 BRR ALTOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº Y- 43.548

Fecha de Contabilización:	10/05/2024	12:00:55p.m.
Fecha de Vencimiento:	10/05/2024	12:00:55p.m.
Forma de Pago:	Con	
Asesor Comercial:	0001	
Ciudad:	YOPAL	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764065888554 DEL 20/02/2024 DEL No. Y-41939 AL No. Y-100000 VIGENCIA 12M

	DESCRIPCION			
	FLETE NOBSA - YOPAL	0,00	30.544.000	30.544.000

OBSERVACIONES:
FLETE CEMENTO FACTURA 43545 - 8000 BULTOS DE ART

SUBTOTAL	30.544.000
DESCUENTO	0
TOTAL IVA	0
SUB. ANT. RTE	30.544.000
RETE FUENTE	305.440
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	30.238.560

SON:
TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS Y CERO MCTE

El Dinero de otros
105280 10

7110

SOMOS RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SI NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO. TARIFA SOBRE TASA BOMBERIL 7% .

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO DE LA LEY 1231 DE 2008, QUE MODIFICO EL ARTICULO 774 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO Y POR LO TANTO CONSTITUYE TITULO VALOR.

ACEPTADA	FIRMA	RECIBIDO	CONDUCTOR
DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA	PLACAS
FECHA ACEPTACION	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios,COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS SAS como empresa que almacena y maneja datos de carácter personal, con la entre finalidad de desarrollar nuestro objeto social y ajustarse a los temas del derecho de Hábeas Data, requiere obtener su autorización para el tratamiento de sus datos personales, por lo anterior, firmado la presente se autoriza a COMERCIALIZADORA DE CONSTRUVARIOS SAS a realizar el tratamiento de los datos personales únicamente para la finalidad anteriormente mencionada.

CUFE: ec10ec9548acae00adc9f17106e113719769775761f8f43a36ea40de9d56e9cf7e6ad21c735c1c881e04ce8e405c6acc0

26

H&S GLOBAL SERVICES S.A.S
NIT: 900707153-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
CL 48 5 85, Yopal, Casanare, Colombia, CP 850001
Tel. 3123063487
Email. hsglobalservicessas@yahoo.es
Actividad Económica 4923 ICA 4X1000
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764057718387 válida desde 2023-10-09 hasta 2024-10-09 rango desde FE285 hasta FE1000.
Favor Consignar en Bancolombia Cta Cte 01155486007 a nombre de H&S GLOBAL SERVICES S.A.S.

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT :	844004840-0
Dirección:	CLL 30 N 28- 46, Yopal, Casanare, Colombia, CP 85001
Teléfono:	6359474
Email:	synergiaconstrucciones@gmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/06/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	**FE379**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:16:49**
FECHA FIRMADO:	**11/06/2024 17:16:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2024	11	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	S001	Servicio de Transporte Carga (Transporte Material Crudo (San Rafael - Tilo) Mayo 2024	94	1,00	$3.640.000,00				0,00	$3.640.000,00

Notas:

SON: (tres millones seiscientos cuarenta mil pesos)
CUFE: fa7920278b4b6db73bec0124dc8aecfbe2fd15a61084a4e1e0aed2a972a74bd73f7ad5142fba86ad38302b844bec7f3

Subtotal:	$3.640.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$3.640.000,00
ReteRenta:	$36.400,00
ReteICA:	$14.560,00
Neto Factura:	$3.589.040,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$3.640.000,00	1,00 %	$36.400,00
07 ReteICA	$3.640.000,00	0,40 %	$14.560,00

Firma Digital: [illegible]

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt [illegible] PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

H&S GLOBAL SERVICES S.A.S
NIT: 900707103-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
CL 48 5 85, Yopal, Casanare, Colombia, CP 850001
Tel: 3123063487
Email: hsglobalservicessas@yahoo.es
Actividad Económica 4923 ICA 4X1000
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764057719387 valida desde 2023-10-09 hasta 2024-10-09 rango desde FE285 hasta FE1000.
Favor Consignar en Bancolombia Cta Cte 01155486007 a nombre de H&S GLOBAL SERVICES S.A.S.

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT :	844004840-0
Dirección:	CLL 30 N 28- 46, Yopal, Casanare, Colombia, CP 85001
Teléfono:	5359474
Email:	synergiaconstrucciones@gmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/06/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE388
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	17:14:52
FECHA FIRMADO:	11/06/2024 17:14:56

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2024	11	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	S001	Servicio de Transporte Carga Transporte Material Arena de Rio (San Rafael - Tilo) Mayo 2024	94	1,00	$57.876.000,00				0,00	$57.876.000,00

Notas:

SON: (cincuenta y siete millones ochocientos setenta y seis mil pesos)
CUFE: dee1e780c58cd723a80998c8f5a9308897474233479b7888899ef778adb27511097485125d9c94e3851 48b7dbd922ade40731

Subtotal:	$57.876.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$57.876.000,00
ReteRenta:	$578.760,00
ReteICA:	$231.504,00
Neto Factura:	$57.065.736,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$57.876.000,00	1,00 %	$578.760,00
07 ReteICA	$57.876.000,00	0,40 %	$231.504,00

Firma Digital: [illegible]

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C, y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. [illegible]

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

H&S GLOBAL SERVICES S.A.S
NIT: 900707153-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 48 S 65, Yopal, Casanare, Colombia, CP 850001
Tel. 3123063487
Email. hsglobalservicessas@yahoo.es
Actividad Económica 4923 ICA 4X1000
Autorización factura electrÓnica de venta No. 18764057719357 válida desde 2023-10-09 hasta 2024-10-09 rango desde FE285 hasta FE1000.
Favor Consignar en Bancolombia Cta Cte 01155486007 a nombre de H&S GLOBAL SERVICES S.A.S.

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT :	844004840-0
Dirección:	CLL 30 N 28- 46, Yopal, Casanare, Colombia, CP 85001
Teléfono:	6359474
Email:	synergiaconstrucciones@gmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/06/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE378**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:19:14**
FECHA FIRMADO:	**11/06/2024 17:19:17**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	06	2024	11	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						IMPUESTO	% o VAL	MONTO		
1	S001	Servicio de Transporte Carga Transporte Material Crudo (Sen Rafael - Tilo) Marz - Abril 2024	94	1,00	$6.188.000,00				0,00	$6.188.000,00

Notas:

SON: (seis millones ciento ochenta y ocho mil pesos)
CUFE: d04f481cac02e3ca451e404eda356c78e201abad22cd92121b1b8c14a518ba41338ec0612d53a155bf5b33469c8e63d

Subtotal:	$6.188.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$6.188.000,00
ReteRenta:	$61.880,00
ReteICA:	$24.752,00
Neto Factura:	$6.101.368,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$6.188.000,00	1,00 %	$61.880,00
07 ReteICA	$6.188.000,00	0,40 %	$24.752,00

Firma Digital: gXzXtUvHLrDgSP1qOMpfE5HBLnYfJDG9dt7bLABEOuXTby40XfvdE5tGGk2v4TnI
XfYCrKOnbTHvqNtPvRe5mvBbYO+AP9fuXc77AlUJGxjLfypWD
nPJ75vAB0bWvW dLzwfJB+dNbXT5vvBAzSCUvSvFXaYVFwGZbJAkLPDDRhgHKMTEBsxxRvKP3f nRTbtUZh+wdBzyWbrdCawGBJhTqgpHC3J
tgDyPmLaDDvBdEhVMCAdpA6fBE XOwmDgdL1fMJaR1mqMpBCRG7C2l0HwBQ2fRF3C8dKHCSR7j+wLkDeRaedlc | NHgfdzKSbnaAYrrg0S3V
+Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt [illegible] PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

Espacio para
Logo Corporativo

CLAUDIA PATRICIA CRUZ ALVARSZ
NIT 46.373.183-1
CR 6 A 40 B 23
Tel. (606) 3134205033
Ypal - Colombia
dicleuxlacruz@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 19

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.			Fecha y hora Factura	
NIT	944.004.840-0	Teléfono	(606) 6327178 - Ext. 000	Generación	16/05/2024, 12:46
Dirección	CL 30 2E 46 BRR ALTOS DE MANARE	Ciudad	Ypal - Colombia	Expedición	16/05/2024, 12:46
				Vencimiento	16/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	V. Total
1	Transporte 60x5km, viajes de excavación cargados por las volquetas FSI 858 - WZC 408 - COD 794 - PYS 740.	316.00	15,800,000.00

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 16-05-2024
HORA: 2:10
CANTIDAD DE FOLIOS: 41
RECIBIDO POR:
MÓNICA D

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Quince millones ochocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	15,800,000.00
Total a Pagar	15,800,000.00

Condiciones de Pago:
Cheque $ 15,800,000.00

Observaciones:

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS. Nit 830.113.111-5 Medio Software Siigo Nube. Forma distinguida con el #16.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónico 18764080301585 aprobado en 20240303 prefijo FE desde el número 13 al 250 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Economica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: c88cbc1521e013486fc875d6fc2b0446350b4031b81607cc8a377ea93f5031bdd3d7c99ee2aff330647e7cea6f9d1ca6

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Yopal - Colombia

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

DSE 146

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764056082211 de 31/08/2023 hasta 31/08/2024 Rango Autorizado del DSE59 al DSE1000

Vendedor/Prestador del servicio:
DEISY LORENA AVILA MESA
NIT: 1118546628-8
Teléfono: 3138583618
Dirección: CRR SANTA FE DE MORICHAL
E-mail: DEISYAVILA-19@HOTMAIL.COM
Generación: 24/05/2024

Adquiriente:
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Teléfono: 6327178
Dirección: CALLE 30 28 46
E-mail: synergiaconstrucciones@gmail.com
Moneda: COP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	CANT	UDM	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	08	SERVICIO TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE TILO	1	UND	$1,300,000.00	0	$0.00	$1,300,000.00

1 Item

Observaciones: SERVICIO DE TRANSPORTE TILO

UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	$1,300,000.00
TOTAL	$1,300,000.00

Firma electrónica: ug+2s9fwq+fqDHn4geu780dgNoTUU0C8ZnNqYkDMBkm1X+G4bsIGF26LWJTJPjDPfvBMBHWVzGwKa7ICUNdCZYAY
+6RR05mlnqnvPhyTMzBkNfR5+5jGesRCHhnnnxpuZT3qEISUdBqgzD+ecwQMZk7bxYr1KTUkuPT1BdJBBorSqQzbfcUnoXoe8tt
+FWbfTBxYT1+4aBvbWG2ZD8jZ4dtJvPdV1Dn8ykon7e0nogSTYILHcRaltKYjtoDNbtdGLzdwfkdWeTlcLGyuZo3Y3nZ9OyNDZsanSZnyP1uOyWNMVUnpXNZlmfgvzKAPtzNG==

Fecha y hora de generación: 5/31/2024 11:36 AM Fecha y hora de expedición: 5/31/2024 11:36 AM

CUDS: 8ecbe32e4e9262a7e719a32c7f512e8de180e7e9f5f5e0b45228e736cb681b6153710767b1e80ede5d5f825127794d34

Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Software: DOCUMENTEME - Código PT: 010

Generado por: Documéntame by Mentum Group

Yopal, 25 de Mayo de 2024

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT. 844004840-0

DEBE A:

DEISY LORENA AVILA MESA

CC 1.118.546.628-8

La suma de:.....$1.300.000,oo

Por Concepto de: Servicio de transporte de material al corregimiento de Tilodiran- Yopal.

Son: **Un millón trescientos mil pesos moneda corriente.**

DEISY AVILA
DEISY LORENA AVILA MESA
CC 1.118.546.628-8 Sogamoso
Cel. 3134108905
Dir. Corregimiento Santa Fe de Morichal
Yopal- Casanare

Copia. Uno. Archivo

292

YOPAL CASANARE 30 de mayo de 2024

CUENTA DE COBRO

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT. 844.004.840-0

DEBE A:
JAIME ALEXANDER MARIÑO CHAPARRO
CC. 74.186.976 SOGAMOSO (BOYACÁ)
Cel. 3213300097

LA SUMA DE ($ 6.600.000=)
SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO DE CARRO TANQUE PLACAS XGB414, EN EL PROYECTO DE TILODIRAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE MAYO DE 2024.

JAIME ALEXANDER MARIÑO CHAPARRO
CC.74.186.976 SOGAMOSO (BOYACA)
CEL. 3213300097

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 30/05/2024
HORA: 5:50Pm.
CANTIDAD DE FOLIOS: 25
RECIBIDO POR:
MÓNICA
E RECIBIDO NO

SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004640

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0935

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 06/01/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	FC0238 SERVICIO CARROTANQUE TILO 1-30 MAYO	233545001	74186976	6,534,000.00	
2	FC0238 SERVICIO CARROTANQUE TILO 1-30 MAYO	111005009	74186976		6,534,000.00
TOTAL GENERAL				6,534,000.00	6,534,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

C- 74.186.976 Sma

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°31 - CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	INVERSORA FURATENA	FE 5582	17/04/2024	$ 30.819.999,99
CONTRATOS DE MANO DE OBRA	INVERSORA FURATENA	FE5582	17/04/2024	$ 5.195.575,01
TOTAL				**$ 36.015.575,00**

INVERSORA FURATENA S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE5546

INVERSORA FURATENA SAS
Nit : 900030373-5 **Impuesto sobre las ventas - IVA**
Dirección : CRA 46 No. 143 - 70 OF 302 - BOGOTA
Teléfono : 5203262 - 6159683 - 6273061
Mail : info@concreexpress.com

Resolución Dian No. 18764061309209 de 05/12/2023 vigencia 05/12/2024 Habilita del FE5091 al FE6000 Factura Electrónica
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 4774 TARIFA 11.04 x 1000

Datos del Adquiriente

Cliente : SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Nit : 844004840-0
Dirección : CL 30 28 46 CS 20
Ciudad : YOPAL
Teléfono : 3133957779 - 6359474
Mail : synergiaconstrucciones@gmail.com

Fecha factura : 12/04/2024 12:12:04
Fecha vencimiento : 12/04/2024
Forma de pago : Crédito - Contado
Moneda : COP
O. de compra : 280NC-SIN BOMBA
Vendedor : CESAR AUGUSTO PARDO

Referencia	Descripción	% Iva	Cantidad	Und	Vr. Unit.	Vr. Subtotal	Dcto.	Vr. Total
	Obra civil para la construcción de placa de concreto de 4000 Psi, pavimento grava común, remisiones 84097,84100,84101,84103,84105,84108,84112,84152,84155,84157, Despachos realizados el dia 5 y 9 abril del 2024.	0.00	67.00		435,331.23	29,167,192.41	0.00	29,167,192.41
	UTILIDAD 5%	19.00	1.00		1,388,913.93	1,388,913.93	0.00	1,388,913.93
	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CAUSADO Y PAGADO EN LA CIUDAD DE YOPAL							
	INVERSORA FURATENA SAS COMUNICA QUE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL SOMOS REGIMEN COMÚN FAVOR EFECTUAR LAS RETENCIONES DE LEY							

Son : TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE CON 99/CTVS.

Subtotal	:	30,556,106.34
Descuento	:	0.00
Subtotal-Descto	:	30,556,106.34
Base Iva	:	1,388,913.93
Iva	:	263,893.65
VALOR TOTAL	:	30,819,999.99
Total a pagar	:	30,208,877.86

Informe de Retenciones

Retefuente	Reteica	Reteiva
611,122.13	0.00	0.00

Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Firma Digital :

kQhFqZk8OjGWRRAlHjuTZp4WdvxUh3I2upPinEzfBL3RK/o5XpDsTzsahWcSpkSH8PzSu/ZdsNvvhGL0dJ+SXyF3ZO8DYAAErSjTappNV2wu1ERFGP78qSZ
pFC/lGEecjxBg+zoCuqfl9KeHmf59iqzXVstW82ysxmfQx2qoMT+8/RzMGcwLAYcb3dHxYN1NT17rubCOYMpcFYQwmE2MaaNJwl1YX1NWob8kcG+zOC9ED
PCIVH4Bhjtp7frdahtysHncfaWPTYkdamcL6lrrGL4FveJWzsV5sqpIPAFZXz5F55jqzfELhW/0xvOVBsfrgDWfgP3SE2oHEnf6X1pswww

Fecha expedición : 2024-04-12 12:22:31

Cufe : c41141e3c7007c5dd884db3cede7e5d9c36bec1a02ca8e41f1e9b436e977d02153950f5f6e3c898573e2b08e5127f69c

Documento procesado por Numensis SAS 830135885 software propio.

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio y se estima completa en su forma (Art. 774 del Código de Comercio)
Esta factura de venta causará intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley a partir de la fecha de vencimiento.

INVERSORA FURATENA S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE5582

INVERSORA FURATENA SAS
Nit : 900030373-5 **Impuesto sobre las ventas - IVA**
Dirección : CRA 46 No. 143 - 70 OF 302 - BOGOTA
Teléfono : 5203262 - 6159683 - 6273061
Mail : info@concreexpress.com

Resolución Dian No. 18764061309209 de 05/12/2023 vigencia 05/12/2024 Habilita del FE5091 al FE6000 Factura Electrónica
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 4774 TARIFA 11.04 x 1000

Datos del Adquiriente

Cliente : SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Nit : 844004840-0
Dirección : CL 30 28 46 CS 20
Ciudad : YOPAL
Teléfono : 3133957779 - 6359474
Mail : synergiaconstrucciones@gmail.com

Fecha factura : 17/04/2024 13:12:17
Fecha vencimiento : 17/04/2024
Forma de pago : Crédito - Contado
Moneda : COP
O. de compra : 280NC-SIN BOMBA
Vendedor : CESAR AUGUSTO PARDO

Referencia	Descripción	% Iva	Cantidad	Und	Vr. Unit.	Vr. Subtotal	Dcto.	Vr. Total
	Obra civil para la construcción de placa de concreto de 4000 Psi, pavimento grava común, remisiones 84240,84244, Despachos realizados el dia 12 abril del 2024.	0.00	13.00		435,331.23	5,659,305.99	0.00	5,659,305.99
	UTILIDAD 5% IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CAUSADO Y PAGADO EN LA CIUDAD DE YOPAL INVERSORA FURATENA SAS COMUNICA QUE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL SOMOS REGIMEN COMUN FAVOR EFECTUAR LAS RETENCIONES DE LEY	19.00	1.00		269,490.76	269,490.76	0.00	269,490.76

Son : CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE CON 99/CTVS.

Subtotal	:	5,928,796.75
Descuento	:	0.00
Subtotal-Descto	:	5,928,796.75
Base Iva	:	269,490.76
Iva	:	51,203.24
VALOR TOTAL	:	5,979,999.99
Total a pagar	:	5,861,424.05

Informe de Retenciones

Retefuente	Reteica	Reteiva
118,575.94	0.00	0.00

Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Firma Digital :

Dv9f1yeyL3rQdzf/FnII/BEu3bhr1kVE04y160Zq63Xde/GRvzBYA8cI843bNNAf8p591a9OryIf9BU7IwPVCuOtIW71qK2K5bu0Z6ucbQ0ttDUFvAgzJa3@
16TSu0k0QppOBqzFF7J/g0fowlIhjX1401rtQaoWUYg6OJc/fIjWvs+hanBnpQB4pP1Vec5k/mmmknyB0C9Ob3r46lYXycvDnvI8Dm3Po+SufMzY+qChn
GZPbZn3b7aYwOb6fSu4LQhTQydxYF86Dr+AZ37nmu3dZD+73j65nuNVZ1@M7g85+Fq0QLYe8+GDPzm3D+vieqBuFsrgzcI2tR19sEF4eFg==

Fecha expedición : 2024-04-17 13:16:35

Cufe : ae1df7893b7939034c8ccebd7cc13ea01beb403eb1ee7dab08a0fe55bc825310ba5122f8abba12372396d1993ad0db26

Documento procesado por Numensis SAS 830135885 software propio.

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio y se estima completa en su forma (Art. 774 del Código de Comercio)
Esta factura de venta causará intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley a partir de la fecha de vencimiento."

5.12 ANEXOS
5.12.1 CANTIDADES EJECUTADAS

CONSTRUCCIONES TECNICAS	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	SYNERGIA	CONTRATO	002 DE 2023
			SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	
			MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	

INFORME N° 6 DE OBRA — 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES							CANTIDADES EJECUTADAS								
ITEM	SUBCAP.	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDADES CONTRACTUALES	V. UNITARIO	V. TOTAL	EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES	% EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES	VALOR TOTAL PERIODOS ANTERIORES	EJECUTADO PERIODO ACTUAL	% EJECUTADO ACTUAL	VALOR TOTAL PERIODO ACTUAL	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
1		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL													
2		REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO													
	2.1	COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO													
	2.1.1	Suministro y instalación de tuberías de alcantarillado	m	900,00	$ 380.000,00	$ 342.000.000,00	166,80	18,53%	$ 63.384.000,00	18,11	5,40%	$ 6.881.800,00	184,91	$ 70.265.800,00	20,55%
	2.1.2	Excavación mecánica en material común 0 - 4 m (sin entibado)	m³	7.611,7	$ 11.000,00	$ 83.728.700,00	2.021,51	26,56%	$ 22.236.610,00	887,08	11,76%	$ 9.759.880,00	2.908,59	$ 32.016.490,00	38,24%
	2.1.3	Excavación a mano en material común	m³	211,08	$ 43.340,00	$ 9.149.767,20	43,63	21,02%	$ 1.891.096,58	13,15	6,34%	$ 569.946,58	56,78	$ 2.461.043,16	26,89%
	2.1.4	Relleno hasta de alcance de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	8.600,85	$ 156.415,00	$ 1.345.117.352,75	1.553,75	11,68%	$ 38.161.362,50	37,75	6,75%	$ 11.310.967,50	3.191,50	$ 47.349.270,00	26,33%
	2.1.5	Tubería PVC alcantarillado 8" Suministro e instal	m	100,00	$ 85.400,00	$ 10.536.100,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.1.6	Tubería PVC alcantarillado 10" Suministro e instal	m	100,00	$ 170.700,00	$ 19.208.400,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.1.7	Tubería PVC alcantarillado 12" Suministro e instal	m	1.800,00	$ 197.100,00	$ 387.111.000,00	180,00	21,77%	$ 24.497.220,00	28,71	3,97%	$ 10.106.220,00	141,71	$ 42.527.610,00	40,79%
	2.1.8	Relleno en material sobre tubería de la excavac en campamento	m	5.417,08	$ 89.000,00	$ 482.130.348,54	1.211,49	24,63%	$ 76.538.367,71	648,91	19,31%	$ 36.771.126,24	1.860,39	$ 113.319.493,95	47,52%
	2.1.9	Cargue y retiro manual de material sob sobrante a 5 Km	m	1.935,70	$ 17.864,00	$ 10.125.760,80	788,30	10,01%	$ 2.230.930,00	37,21	6,00%	$ 1.193.512,00	705,80	$ 3.424.442,00	33,83%
	2.1.10	Transporte de material Entrec (a una distancia)	m	28.302,00	$ 2.824,00	$ 127.998.864,00	0,00	0,00%	$ -	0,00	0,00%	$ -	0,00	$ -	0,00%
	2.1.11	Estabilización y aprovechamiento material sub rasante	m	7.000,00	$ 24.400,00	$ 170.716.000,00	402,80	22,19%	$ 46.171.000,00	39,00	7,93%	$ 10.446.000,00	1.380,24	$ 64.983.000,00	38,17%
	2.1.12	Manejo control y protección de agua	m	350,00	$ 23.000,00	$ 10.000.000,00	172,00	47,29%	$ 4.914.240,00	0,00	0,00%	$ -	172,00	$ 4.914.240,00	47,29%
		TOTAL COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 606.619.264,13		74,97%	$ 249.310.809,79		6,39%	$ 82.961.173,05		$ 332.716.791,32	23,13%
		TOTAL REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 2.970.483.514,40			$ 831.387.323,46		2,77%	$ 82.961.173,05		$ 613.749.635,53	20,66%
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 30.551.001.782,53			$ 17.084.150.810,32			$ 82.961.173,05		$ 17.167.111.983,37	
		Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA	unid	1,00	$ 63.000.000,00	$ 63.000.000,00		46,34%	$ 29.044.200,00		0,00%	$ 6.300.000,00		$ 35.344.200,00	56,10%
		Plan de Manejo de Tráfico PMT	unid	1,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00		46,34%	$ 46.340.000,00		0,00%	$ 10.000.000,00		$ 56.340.000,00	56,34%
COSTO TOTAL						$ 30.713.001.782,53		46,34%	$ 16.234.136.780,03		0,27%	$ 104.343.126,95		$ 16.138.160.817,38	46,89%
SALDO A FAVOR															
COSTO TOTAL DEL PROYECTO						$ 30.713.001.782,53									

5.12.2 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL Y PAGO FIC

aportes en línea


Planilla Resumen


DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004941	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	A - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 32 N 28 - 46	YOPAL CASANARE	6327178	N


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-06	2024-07	08375655	5469607102	E	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	251.061.640	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tde	tap	tdp	vsp	var	sln	ige	vac	irl	avp	vct	cod	inc	lma	dot	fvl	vst	sue	sup	amp	cue	ipe	ing	ret	tae	tde	tap	tdp	vsp	var	sln	ige	vac	irl	avp	vct	cod	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (139 Afiliados)																																																												
Centro de Trabajo: ORDICUÑ 6.90 (4 Afiliados)																																																											
Ciudad: YOPAL, Depto: CASANARE (4 Afiliados)																																																											
1	CC	[illegible]	PUENTES CACERES RONALDO	X																																																										
2	CC	1118535283	MILLAN CARMONA WILSON ANDRET	X																																																									
3	CC	74846284	ROMERO BARRIO JOSE HACOB	X																																																									
4	CC	74911336	MARQUI JOSE LISSETH																																																										
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (3 Afiliados)																																																												
Ciudad: YOPAL, Depto: CASANARE (3 Afiliados)																																																											
5	CC	80169108	BARRERA ALFONSO MARIA DIONY																																																										
6	CC	1118968225	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO																																																										
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (132 Afiliados)																																																											
Ciudad: YOPAL, Depto: CASANARE (132 Afiliados)																																																											
7	CC	1057117189	ACUÑA GOMEZ CINDY PATRICIA																																																										
8	CC	74845383	AGUDELO MORENO FALLARET																																																										
9	CC	74851582	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO	X																																																									
10	CC	40148748	ALARCON ELIT MERCEDES																																																										
11	CC	9430958	ALFONSO GONZALEZ NADIR																																																										
12	CC	71202187	AREA MURCIA DAGOBERTO																																																										
13	CC	71202187	AREA MURCIA DAGOBERTO																																																										
14	CC	1006489561	AVILA CELENA CARLOS YISBEY																																																										
15	CC	94449107	BARRERA BARRETO JORGE ENRIQUE	X																																																									
16	CC	1007381919	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																																																										
17	CC	9744878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																																																										
18	CC	1007747067	BERNAL GOMEZ YULIER Fabian																																																										
19	CC	74849128	BONORQUEZ RODRIGUEZ JOSE ALBEIRO	X																																																									
20	CC	1006480091	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN																																																										
21	CC	1006480093	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN																																																										
22	CC	1005-480093	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN																																																										
23	CC	1118931923	CACHAY CACHAY FREDY	X																																																										

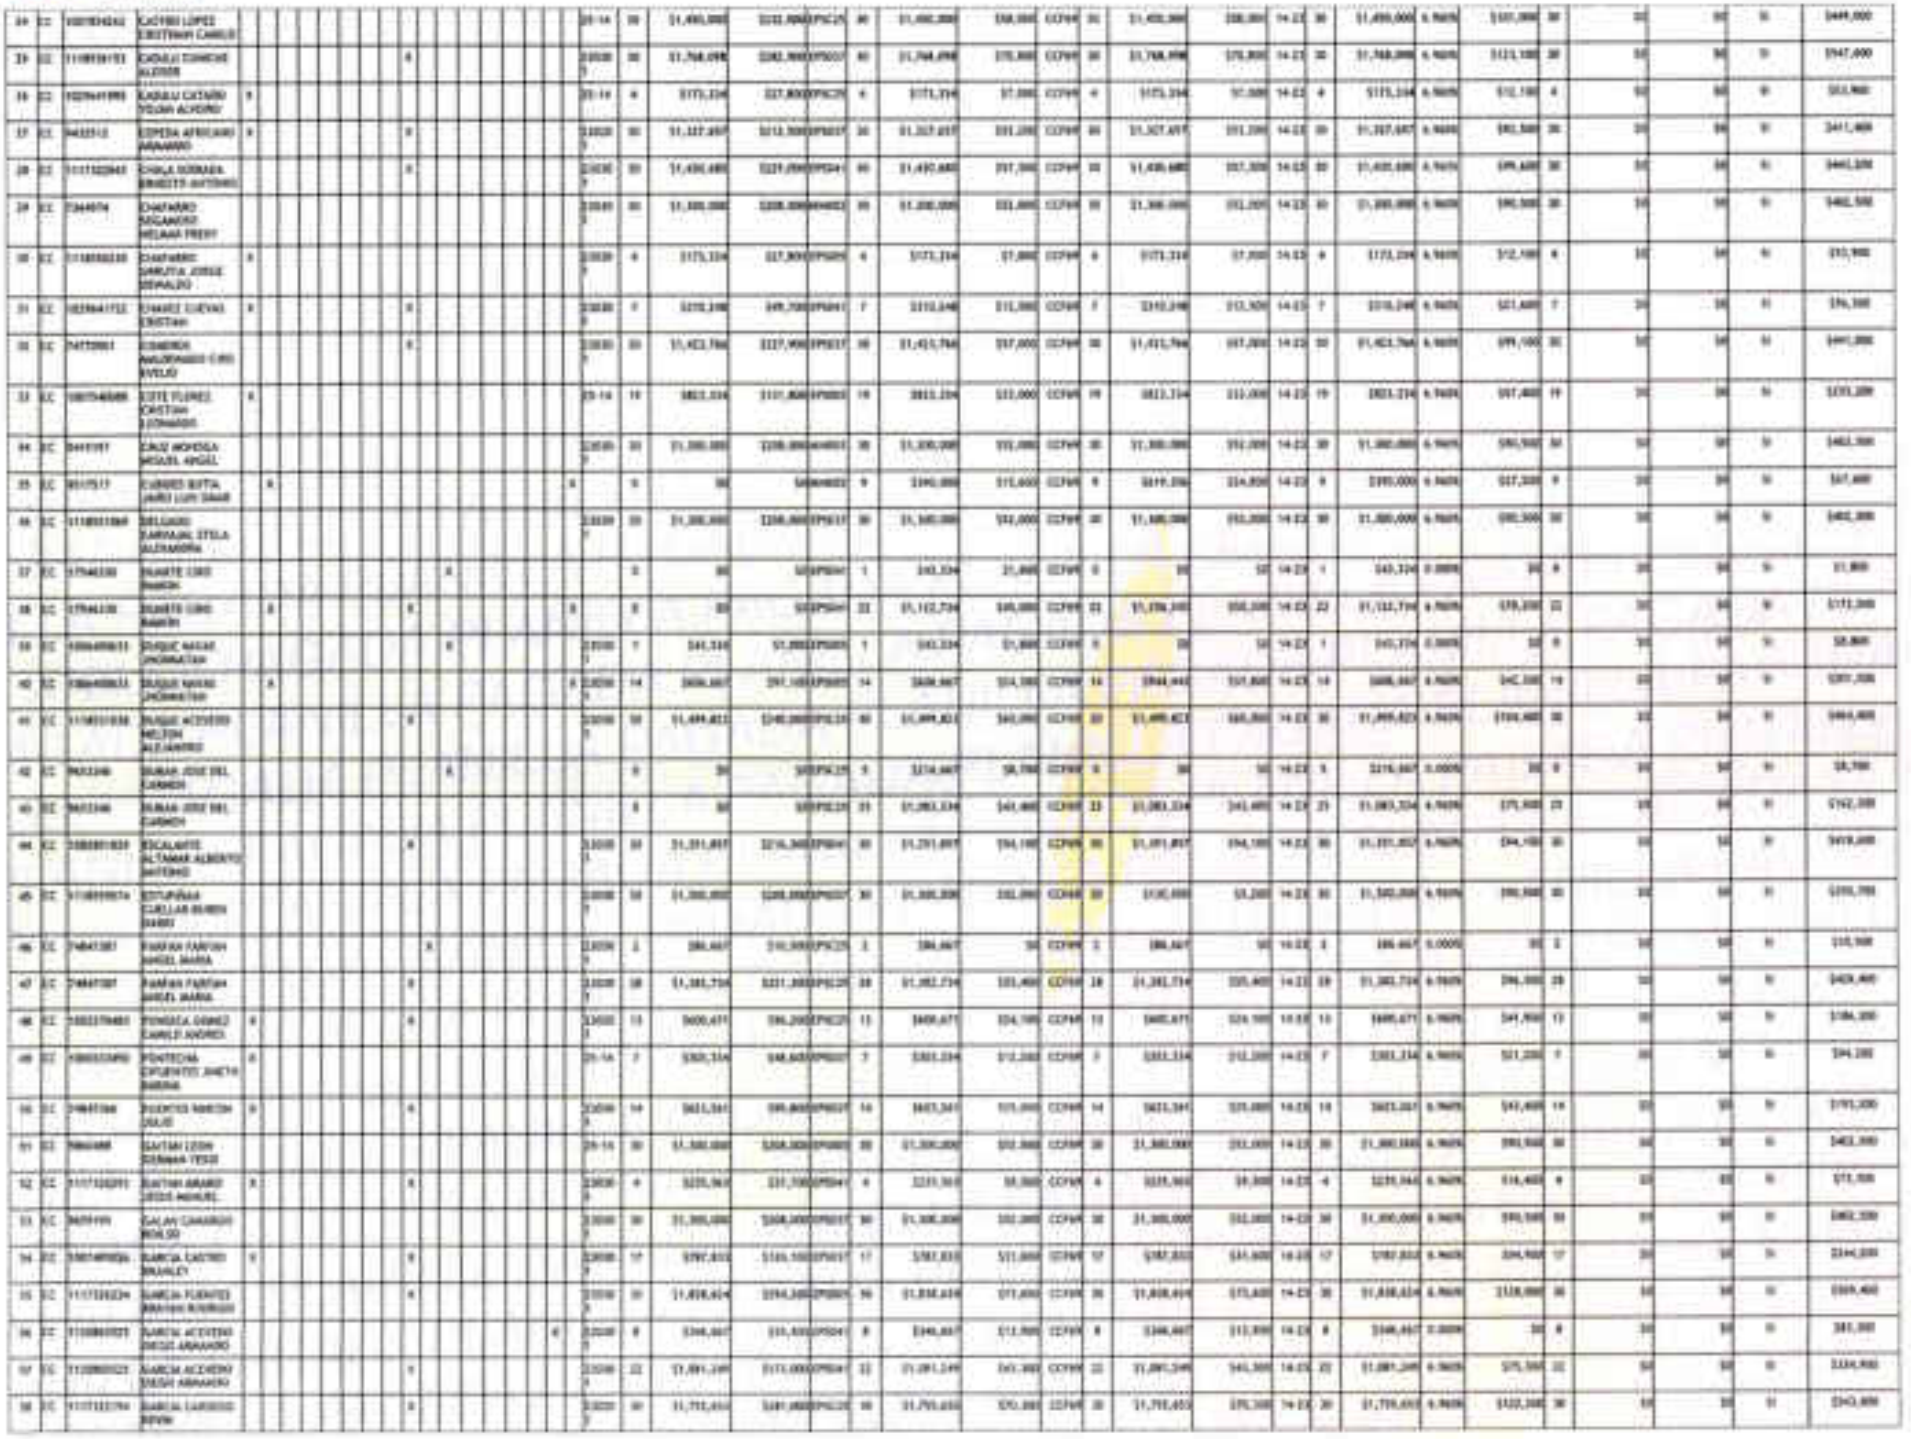

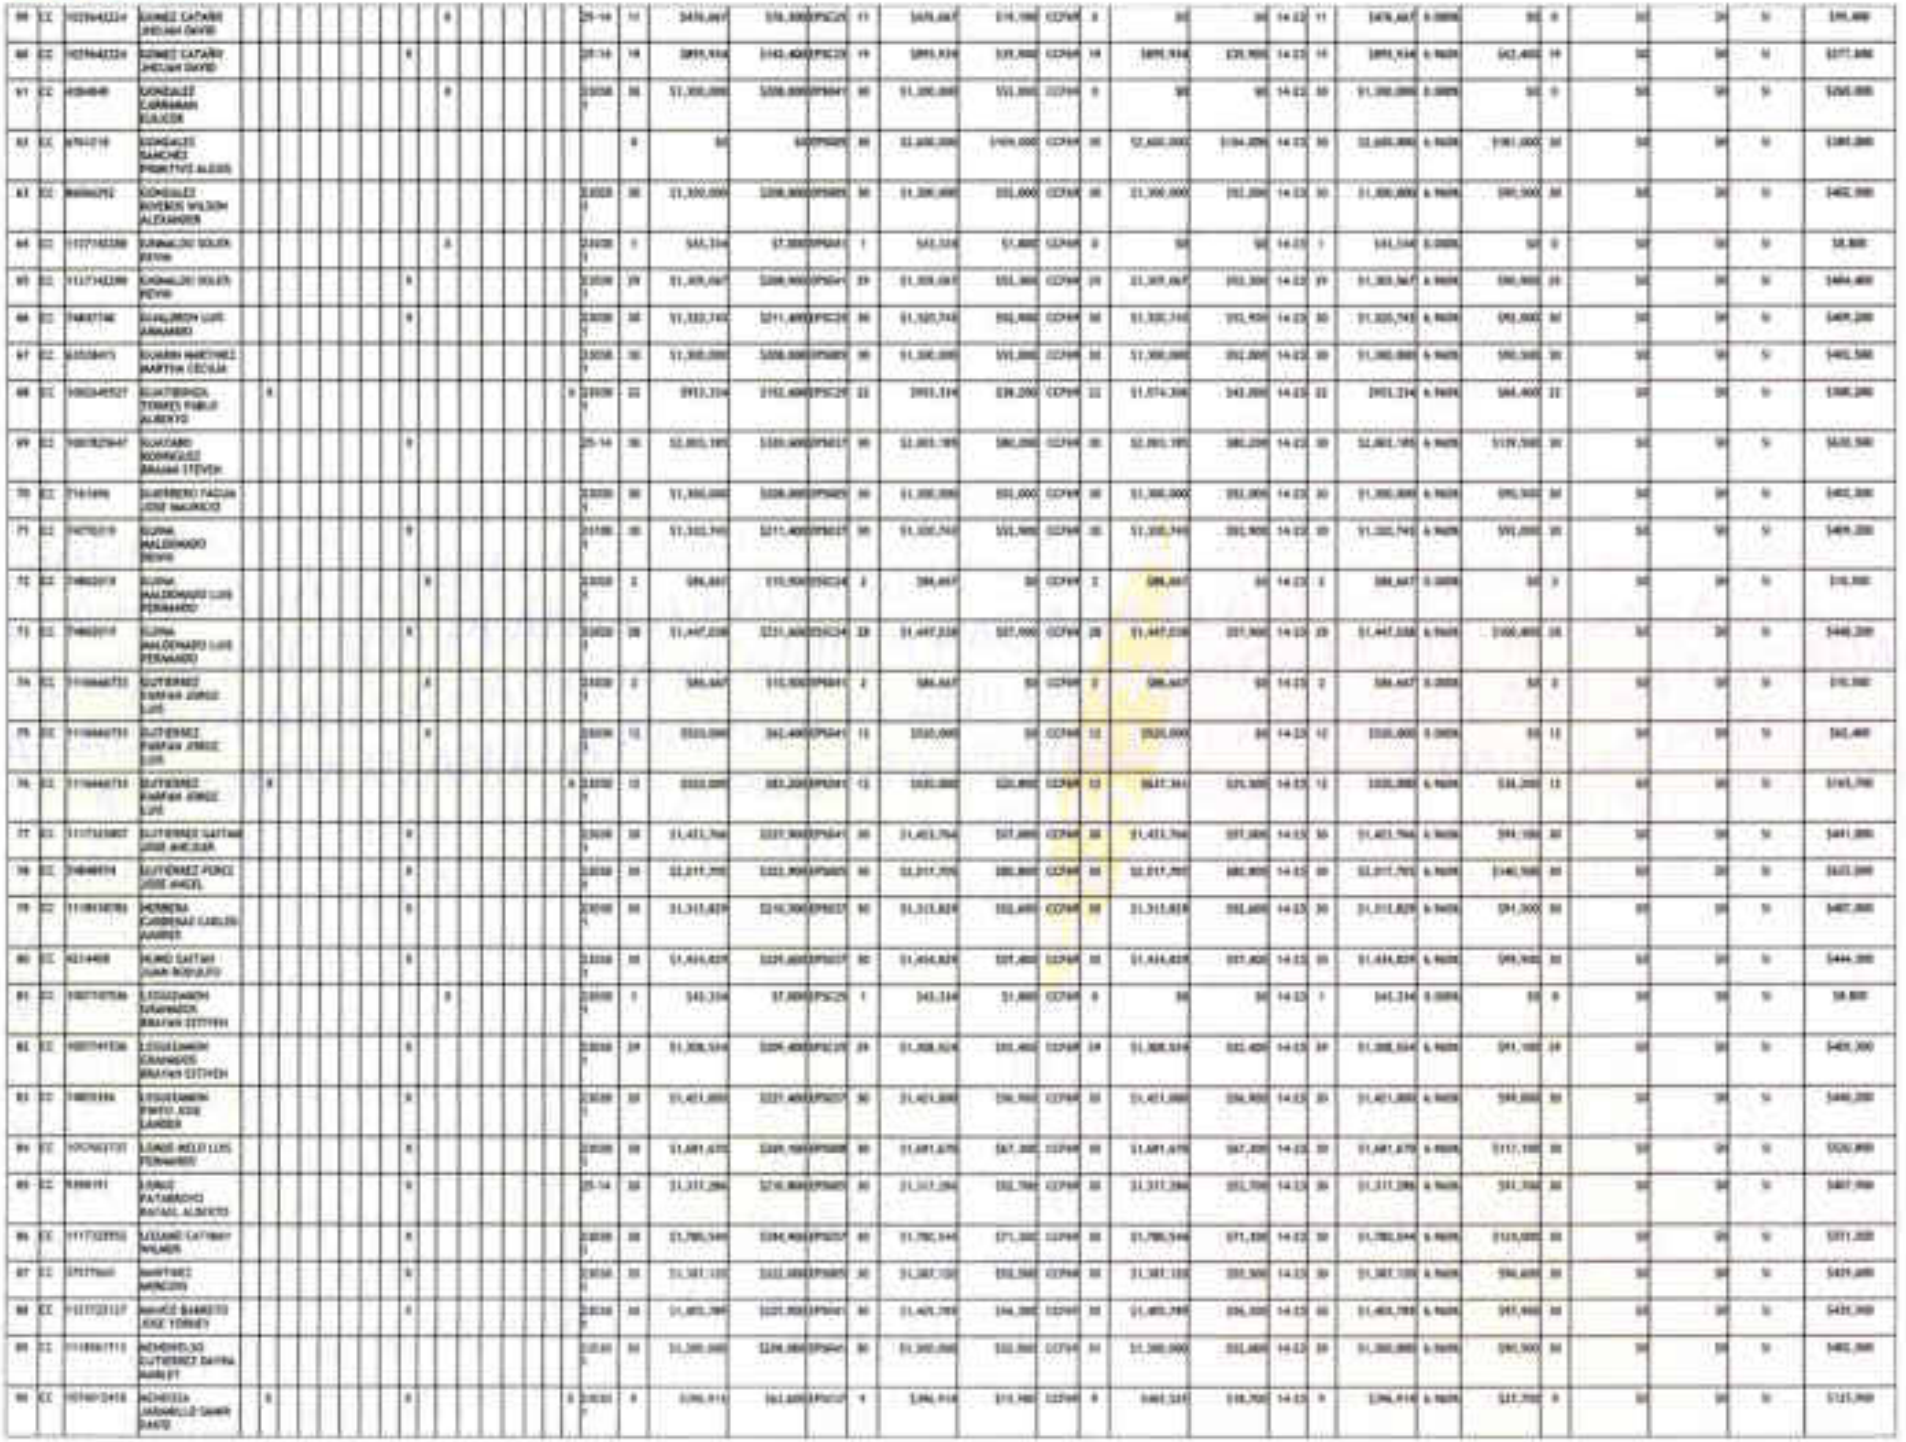

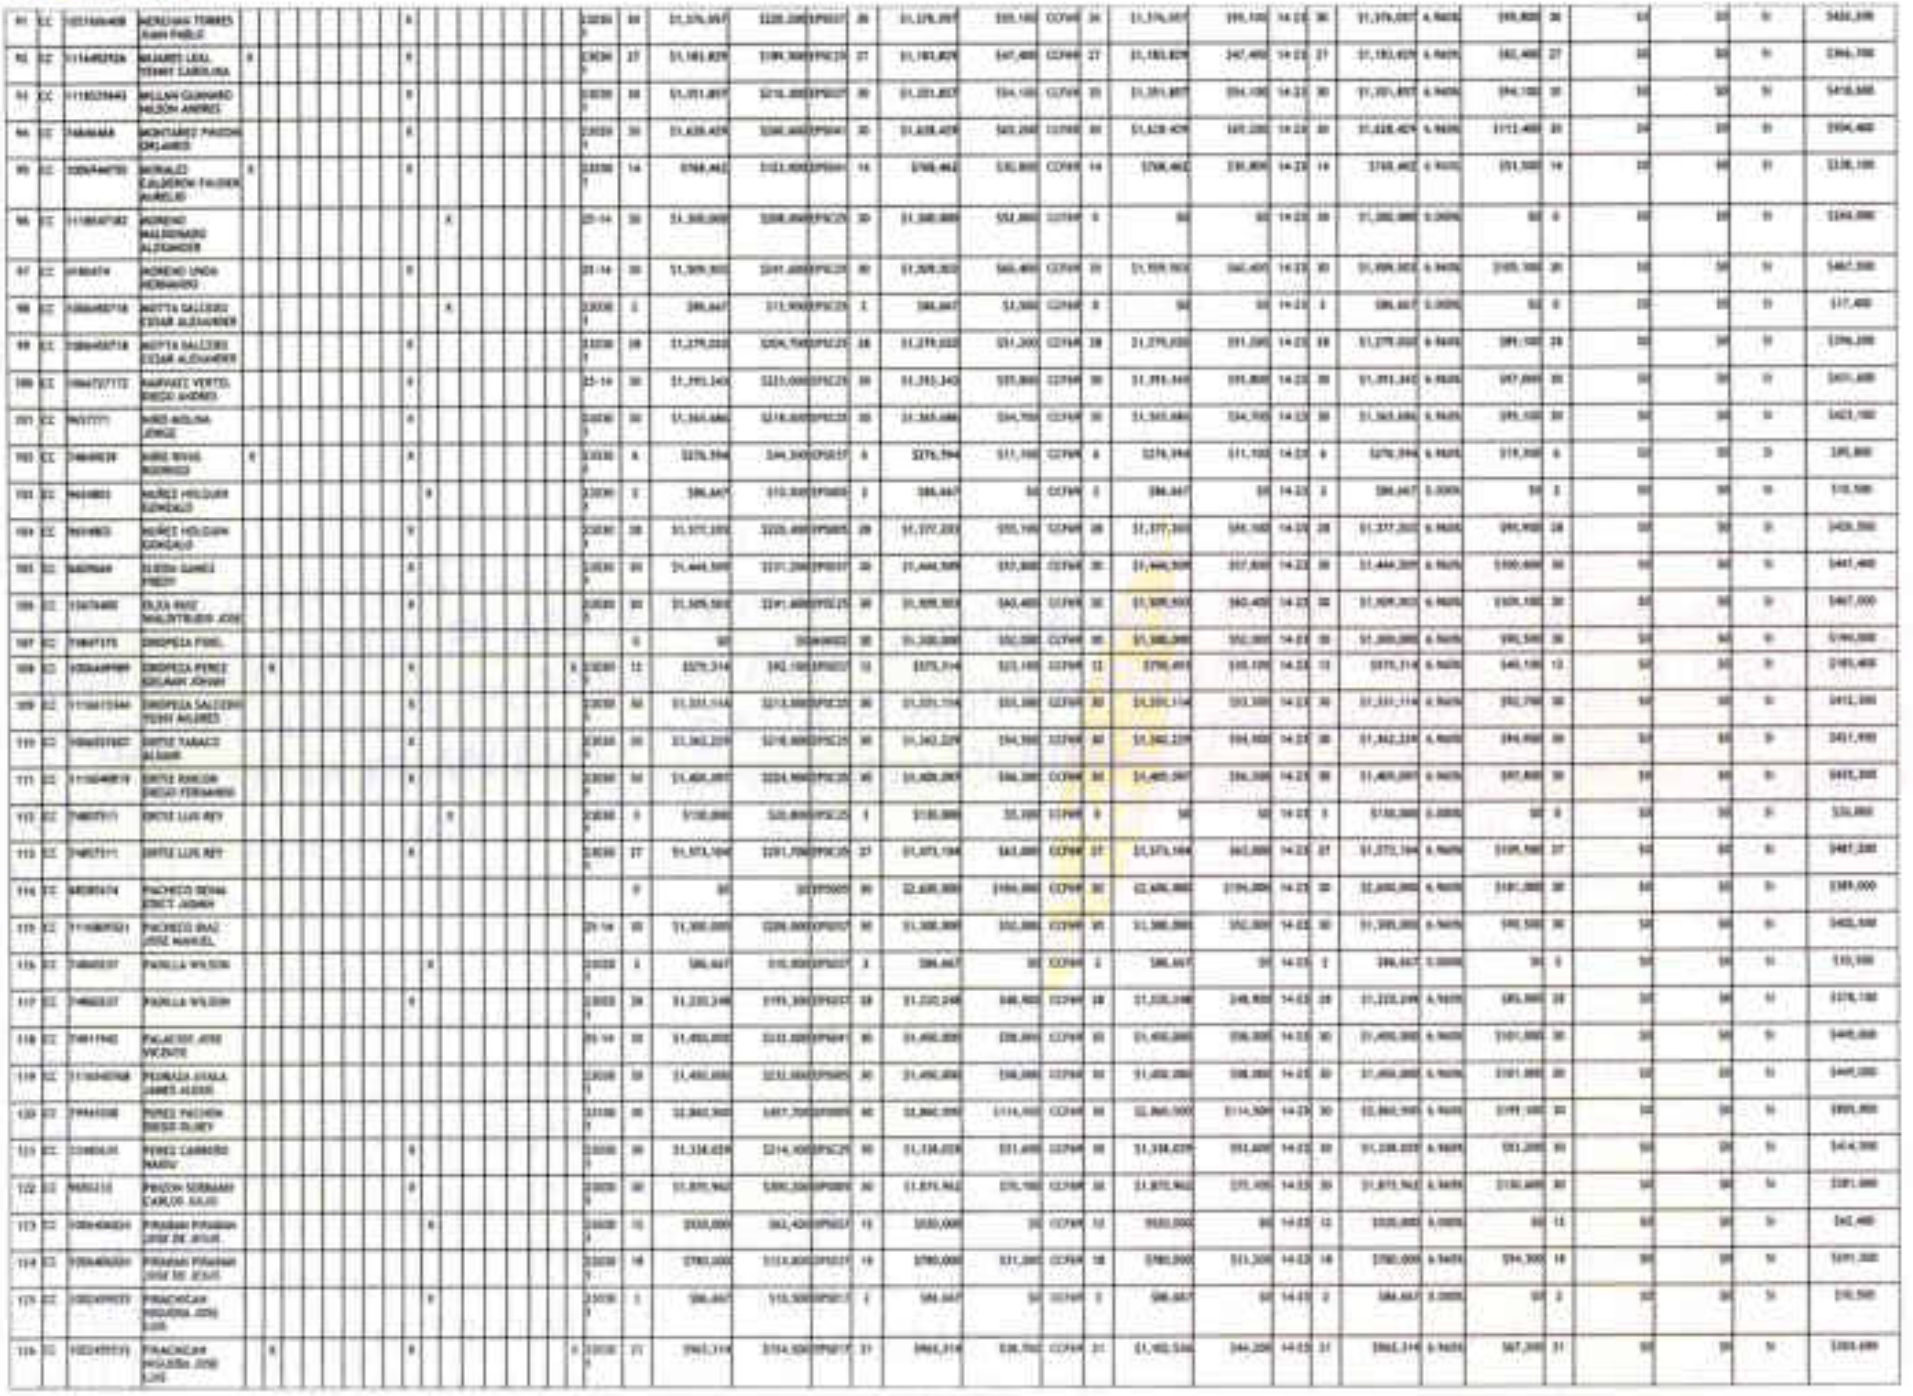

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 840034840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIa S.A.S	0 - AGENTE DE DIR COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 28 - 46	YOPAL CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	08275655	94698710S	E	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$53,061,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$26,853,800	$101,000	$0	$26,954,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,139,200	$4,300	$0	$1,143,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$3,671,200	$13,800	$0	$3,685,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	100	$20,064,500	$75,400	$0	$20,139,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,978,900	$7,500	$0	$1,986,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,382	8	141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				141	$7,130,100	$27,400	$0	$7,157,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$7,000	$100	$0	$7,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$32,400	$200	$0	$32,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	37	$1,833,900	$6,900	$0	$1,840,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$67,300	$300	$0	$67,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$162,300	$700	$0	$163,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$38,700	$200	$0	$38,900
FOSYGA	46N001	901,037,916	1	2	$88,900	$400	$0	$89,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	46N002	901,037,916	1	3	$119,600	$500	$0	$120,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	$1,981,200	$7,500	$0	$1,988,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$1,040,100	$4,000	$0	$1,044,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,738,700	$6,600	$0	$1,745,300
TOTAL				**141**	**$52,862,200**	**$199,400**	**$0**	**$53,061,600**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S identificado con el NIT 844004840, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
032 DE 2023	ALCANTARILLADO PLUVIAL	TILODIRÁN	2,047,500	2024-06	12-JUL-2024	113136900
		Total	2,047,500			

Expedido por el SENA, a los doce (12) días del mes de Julio de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-07-12

Generado por : YORLENY CAROLINA ROCHA PINEDA

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escríbanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 687161125 - 328779

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

www.sena.edu.co

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7564216

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA No.	113136900
FECHA DE EXPEDICION	09 / 07 / 2024
FECHA VENCIMIENTO	14 / 07 / 2024

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador SYNERGIA — **NIT o C.C.** 844004840

Dirección CLL 30 No 28 - — **Teléfono** +57,317

DESCRIPC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Casanare T1b- junio		
DOS MILLONES CUARENTA Y QUINIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 2,047,500.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 2,047,500.00

Redeban

JUL 12 2024 08:52:25 NUMERO 0.96

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO EL OASIS YOPAL
CL 35 25A 92,EL OASIS
C.UNICO 3007256640 TER: A0028EVNZ
RECIBO 142545 AUT: 149295
APRO: 350932

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7564216

VALOR $ 2,047,500.00
EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE SOLICITARLE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CSL. El CSL no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta.Para realizar consultarse al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algun incidente con el cupón ylo la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

SENA

(415)7707012100010(8020)7564216(3900)000002047500(96)20240714

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 — **REFERENCIA No.** 113136900

Ciudad	D	M	A	NIT 844004840	Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: SYNERGIA

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total relacion en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean remedios.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO
CHEQUE
TOTAL


CH x cte 450

AREA PARA SELLO


41532 500

Powered by CamScanner

5.12.3 NÓMINA DEL PERSONAL EMPLEADO DURANTE ESTE PERIODO

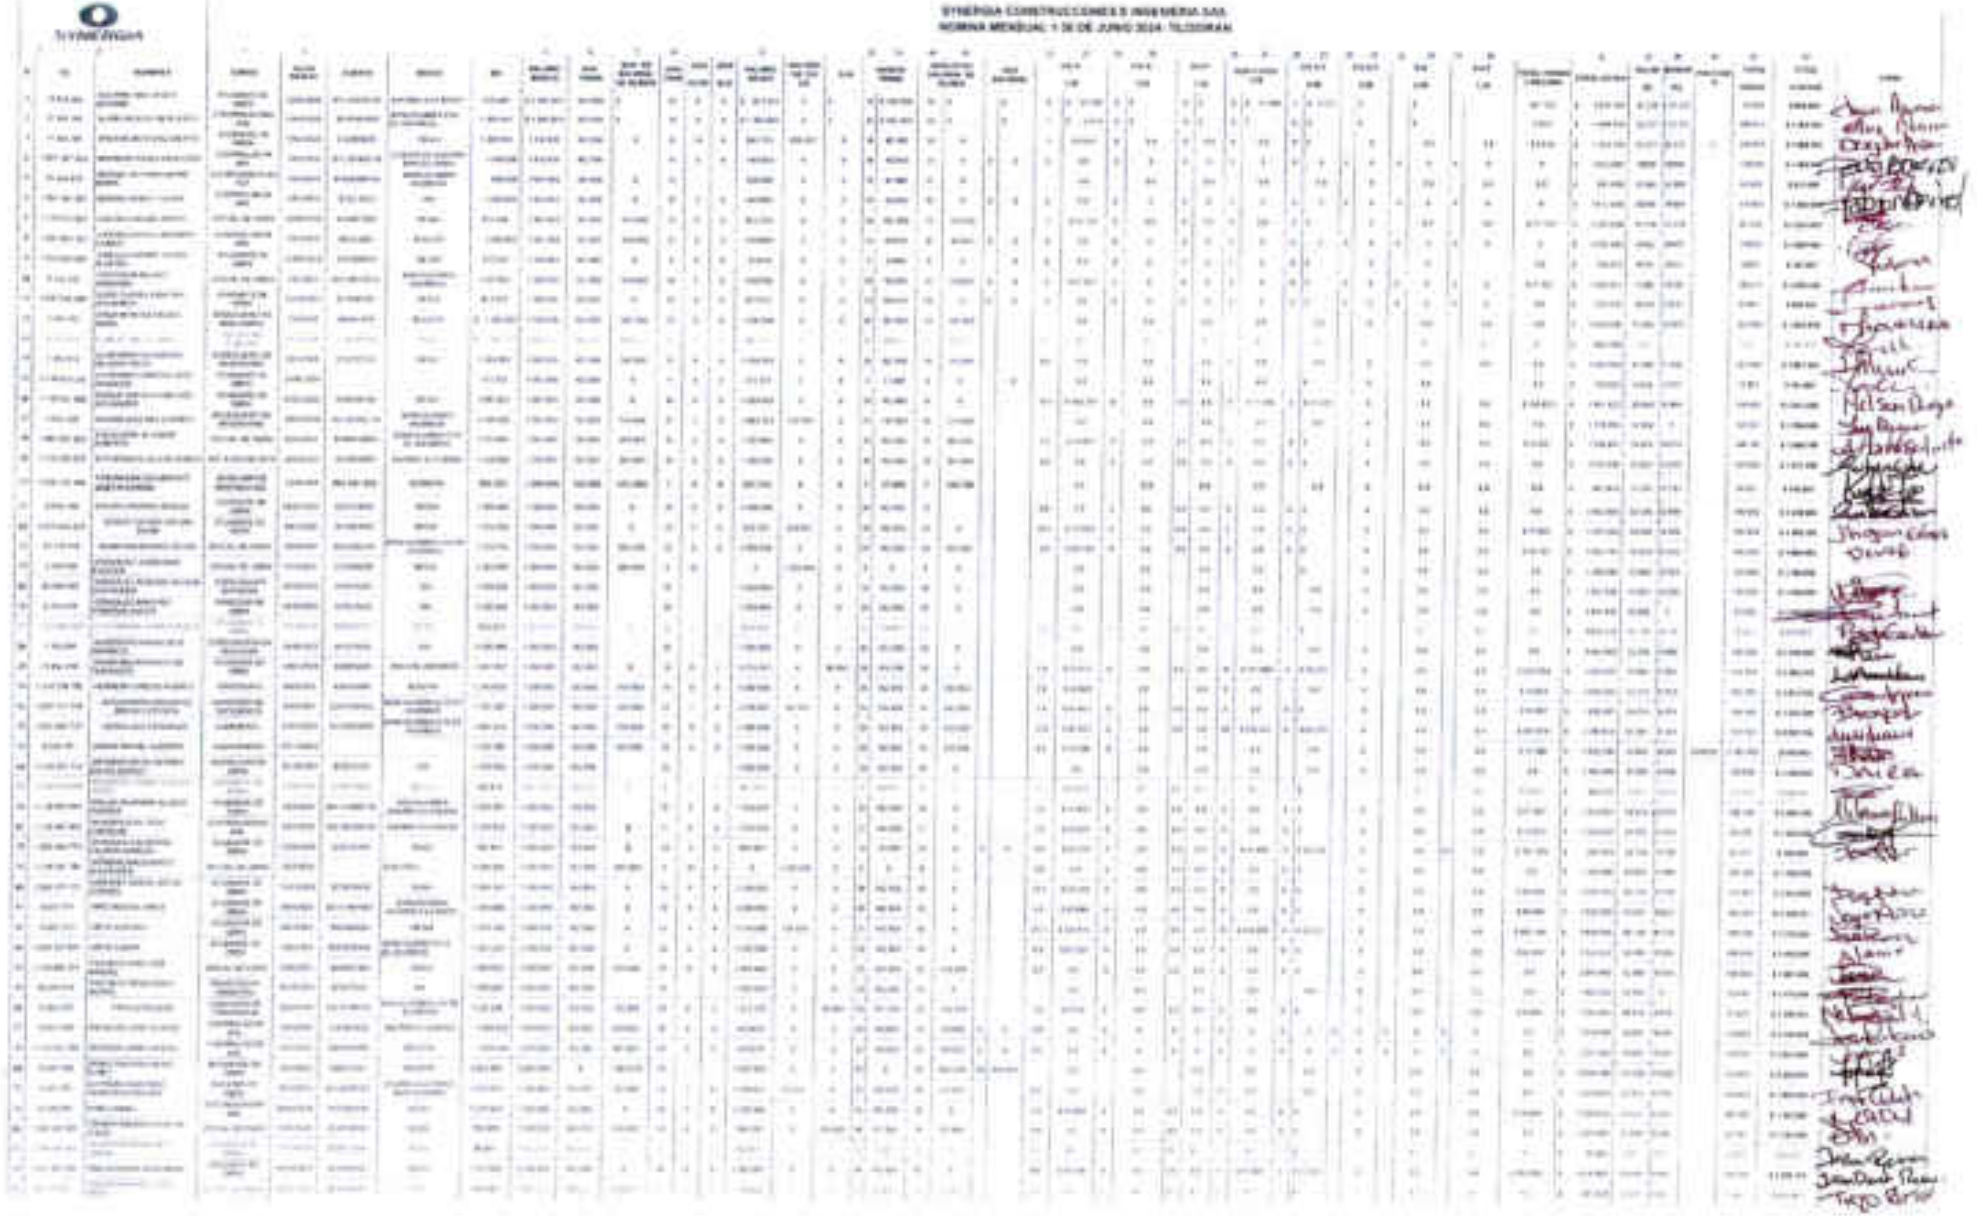

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NOMINA MENSUAL 1 DE JUNIO 2024 - 15 DIGORAN

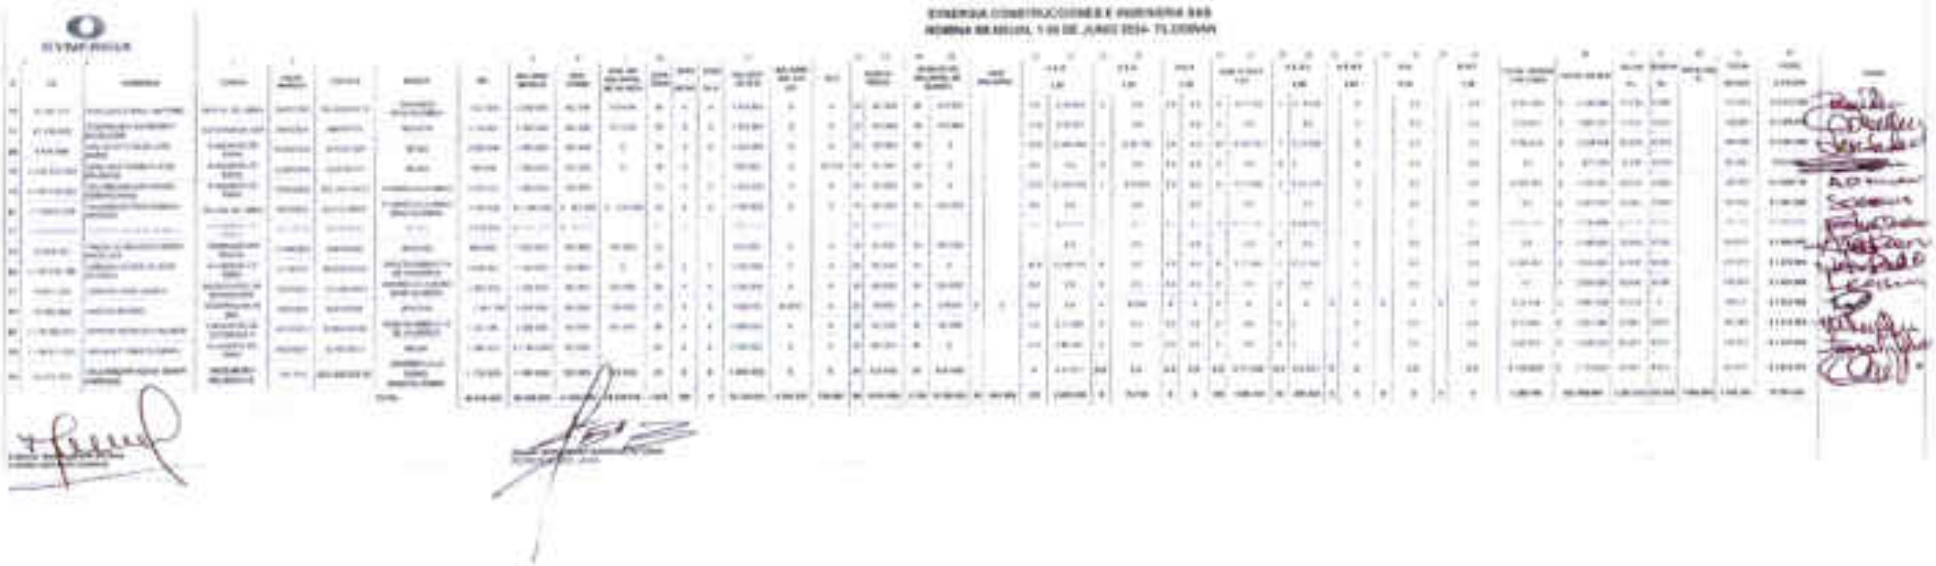

5.12.4 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

CASA DEL TOPÓGRAFO

Casa Del Topógrafo

Venta, Alquiler, Reparación

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 2560

Bogotá D.C **ABRIL 11 de 2024**

Señor(es)
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS
NIT/CC: 900361915-7
CIUDAD: YOPAL

Apreciados señores

La estación total de marca HITARGET modelo ZTS360R con serial No. Z140131, fue revisada en nuestro laboratorio, cumple con los parámetros del fabricante HITARGET y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y está en perfectas condiciones ópticas y mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 2376512076435
DE ALTA PRECISIÓN 0.001 mm
PROCEDIMIENTO BAJO NORMA DIN 18723

PARÁMETROS TÉCNICOS

Resolución angular	1" 5" 10"
Precisión angular directa	2"
Aumento	30x
Medición máxima con un prisma	7500 m
Medición máxima sin prisma	600m
Medición máxima con tarjeta reflectiva	800 m
Campo de visión	1°30'
Sistema compensador	Dos ejes
Sensibilidad del compensador	±3'
Precisión del compensador	1"
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +50°C
Distancia de enfoque minima	1.2 m
Aumentos y campo visual a 100 m	Verificado

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE CALIBRACIÓN

Fecha de verificación de calibración **OCTUBRE** **12 de 2024**

Casa del Topógrafo S.A.S.
BOGOTÁ, D.C.: **Carerra 29 No. 39B - 52 La soledad • PBX: 457 2128**
MEDELLÍN: **C. E. Nutibara Cra. 80 No. 39 - 159 Of 611 • Tel. (4) 2059673 / 350 8417083**
CIUDAD DE PANAMÁ: **Avenida la pulida Calle 10 Rio Abajo • Tel.: 507 - 261 4886**

Home Page: www.casadeltopografo.com/colombia **E-mail:** contactenos@casadeltopografo.com

CASA DEL TOPÓGRAFO

Casa Del Topógrafo

Venta, Alquiler, Reparación

CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN

Se realizan los procesos de pruebas y ajuste de acuerdo a los parámetros técnicos de estaciones totales de topografía según su correspondiente modalidad, se da el presente certificado de verificación calibración por una duración de seis (6) meses, tiempo normal óptimo, en donde al final del periodo se recomienda realizar un nuevo control.

El procedimiento de calibración realizado al equipo tendrá una garantía máxima de un (1) mes, previa evaluación del error obtenido, siempre y cuando este no se deba a desperfectos físicos del equipo no reportados por el cliente; en cuyo caso, se efectuará el diagnóstico y cotización correspondiente de la reparación a la que se dé lugar; la reparación debe ser autorizada por el cliente por escrito.

Para cualquier aclaración, favor comunicarse con nuestro laboratorio, unidad de Ingeniería, al (1) 457 21 28 o visítenos en la Carrera 29 No. 39 B 52 en Bogotá D.C.

Cordialmente,

Departamento de ingeniería
CASA DEL TOPÓGRAFO SAS

Nota Aclaratoria:

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior CASA DEL TOPÓGRAFO SAS, no asume ninguna responsabilidad por mal manejo, transporte o no verificación del instrumento por parte del usuario.

ELABORÓ: Ing. María Paula Pineda P.

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

No. 33933

CERTIFICADO

Equipo: Nivel automático **Marca:** Topcon

Modelo: AT-B4A **Número de Serie:** WP072634

Cliente: Transport American DIHEDI S.A.S.

Fecha de expedición: 7 de febrero de 2024

Recomendamos ajustar: 7 de agosto de 2024

¿Equipo nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El servicio técnico de BB Equipos Topográficos S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del equipo verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del equipo y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0011 , Certificado el 10-11-2023 .

Patrones Utilizados:

Estación Total Sokkia CX-101 S/N: GP1430, Calibrado el 13-10-2023.
Nivel Automático Sokkia B20 S/N: QT6328, Calibrado el 26-10-2023.

Elaboro:

Carlos Herrera
Técnico

EQUIPOS TOPO
07 FEB 2024
SERVICIO TECNICO

Aprobó:

Cristian Ortega
Jefe de Servicio Técnico

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

No 33933

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN FABRICANTE

Desviación Estándar (doble km de nivelación)	2mm	Mínima distancia focal	0.2m
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	24X	Rango del compensador	± 15'
Apertura del objetivo	32mm	Exactitud del compensador	0,5"

AJUSTES EFECTUADOS

CODIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☐	☑	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐	Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☐	☐	☑
Chequeo del teclado	☐	☐	☐	☑	Ajuste de las mirillas de puntería	☐	☐	☐	☑
Ajuste del compensador	☐	☑	☐	☐	Ajuste del distanciometro	☐	☐	☐	☑

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensación	±15'	<30"
Nivel circular	<5'	<5'	Verticalidad de la retícula	<10"	<10"

Fin de este documento.

5.12.5 FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-003
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - MEZCLADORA

REFERENCIA:	N/E 1 1/2"	# DE EQUIPO:	1	FECHA:	25-06-24
MODELO:	2024	LUGAR:	Campamento Uladrao		
MARCA:	MAGNUS COL.	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	5 HP	Odometro inicial:	290	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR	
REVOLUCIONES:	1800 R.P.M.	Odometro final:	340	20w 50	

En la tabla que aparece a continuacion se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO		
M	MOTOR GASOLINA DE 6.5 HP	✓	
M	TAPON LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
M	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
M	CARCAZA FILTRO AIRE MOTOR	✓	
M	TANQUE COMBUSTIBLE Y TAPA	✓	
1	LINEA DE LA OLLA	✓	
2	CHUMACERAS	✓	
3	VOLANTE	✓	
4	TRANSMISION (UBICACION MOTOR)	✓	
5	ESTRUCTURA GENERAL	✓	
6	RINES - LLANTAS Y SISTEMA DE RODAMIENTOS	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Revisar niveles del motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Revisar estado chumaceras (inspección de engrase en los diferentes puntos)	Desgaste por fricción o emparejas	✓					☐
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general						
Verifique tornillo de cebado	control encendido		☐	☐			
Revisar Estado volante	Control por desacoplamiento en puntos de anclaje					☐	
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor		☐ primero	☐			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		☐ primero	☐			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas					☐	
Revisar estado del eje (engrasar cada vez que se utilice equipo)	fabricación por desgaste de piezas generado por fricción	☑			☑		☐
Realizar Estado Poleas y correa accesorios. (cambiar)	control por desgaste de fricciones entre piezas	✓				☐	
Controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor			☐		☐	
Cambio de los aros del piston	potencia motor						☐
Revisar estado de Rines, llantas y rodamientos internos)	Desajuste por vibracion y contaminación por concreto	✓					☐

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operacion, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

OTRAS ESPECIFICACIONES AL EQUIPO

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Rafael NIÑO CARGO: Almacenista

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: James Ayala. FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	REVISIÓN: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	Atacehante	# DE EQUIPO:	3	FECHA:	26-06-24.
MODELO:	2023	LUGAR:	Campamento Tiadicon.		
MARCA:	Bases.	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	6.0 HP	odometro inicial:	1030	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR	
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final:	1100	15W 40	

En la tabla que aparece a continuacion se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificacion, las que estan con los cuadros requieren de traslado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO

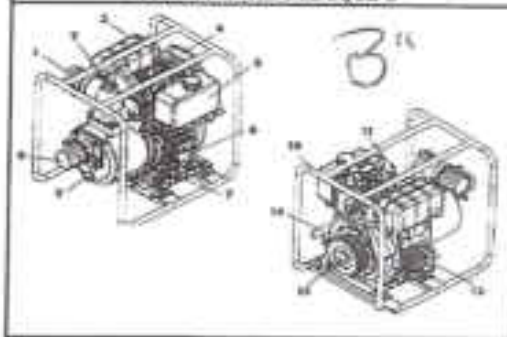

	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
3	SILENCIADOR O ESCAPE	✓	
4	CARTAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
6	ACELERADOR MOTOR	✓	
7	TAPON DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Revisar niveles del motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido		—	—			
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			□			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor		— primero	□			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		— primero	□			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas					□	
Limpieza o reemplazo filtro combustible	limpieza impurezas ACPM	✓			□	□	□
Control del inyector	inyección del combustible					—	
Controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor			□		□	
Cambio de los aros del pistón	potencia motor						□
Ajuste tapas compartimento del motor	desgaste por vibración						□

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

** Cambio mangueras tanque. a inyector

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Niño	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	Jairo Aguila	FIRMA:	


SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: PRO-MANT-003
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	Alfa Gasolina	# DE EQUIPO:	2	FECHA:	25-06-23
MODELO:	2023	LUGAR:	Campamento Medellin		
MARCA:	Barnes	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	13 HP	odometro incial:	450	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR	
REVOLUCIONES:		odometro final:	510	15W 40	

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

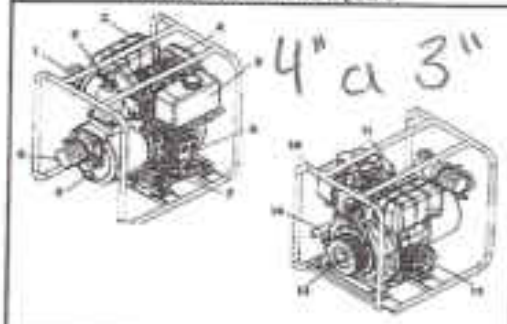COMPONENTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		INSPECCION	INTERVENCION
		1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
		2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
		3	SILENCIADOR O ESCAPE	✓	
		4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
		5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
		6	ACELERADOR MOTOR	✓	
		7	TAPÓN DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
		8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
		9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
		11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
		12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
		13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
		14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Revisar niveles del motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos	compartimento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido	✓	—	—			
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			✓			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor		primero	✓			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		primero	✓			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas					☐	
Limpieza o reemplazo filtro combustible	limpieza impurezas ACPM				☐	☐	☐
Control del inyector	inyección del combustible					—	
Controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor			✓		☐	
Cambio de los aros del pistón.	potencia motor						☐
Ajuste tapas compartimento del motor	desajuste por vibración						☐

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, después cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Nito	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	Jonel Ayala	FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	AD 4130 HP	# DE EQUIPO: 3	FECHA: 23-06-24		
MODELO:	2024	LUGAR: Campamento Tuladero			
MARCA:	BARNES	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	10 HP	Odometro inicial: 350	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR		
REVOLUCIONES:	3600 R.P.M.	Odometro final: 840	15W 40		

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de traslado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO

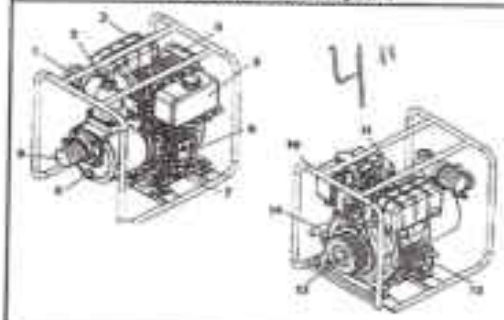

	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
3	SILENCIADOR O ESCAPE	✓	
4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE		✓
6	ACELERADOR MOTOR	✓	
7	TAPÓN DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Revisar niveles del motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos.	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido		—	✓			
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			✓			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor		primero	✓			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		primero	✓			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas	✓				☐	
Limpieza o reemplazo filtro combustible	limpieza impurezas ACPM				☐	☐	☐
Control del inyector	inyección del combustible					☐	
Controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor			☐		☐	
Cambio de los aros del piston	potencia motor						
Ajuste tapas compartimiento del motor	desajuste por vibración	✓					☐

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

Cambio tanque ACPM.

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Rafael Nieto CARGO: Almacenista

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: Jaime Ayala FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	Autocebante	**# DE EQUIPO:** 4	**FECHA:**	27-06-24	
MODELO:	2023	**LUGAR:**	Campamento Tagnan		
MARCA:	MASTER	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**			
POTENCIA:	2 HP	odometro inicial: 640	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**		
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final: 700	**15W 40**		

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de traslado a un taller para intervención por un técnico especializado

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO

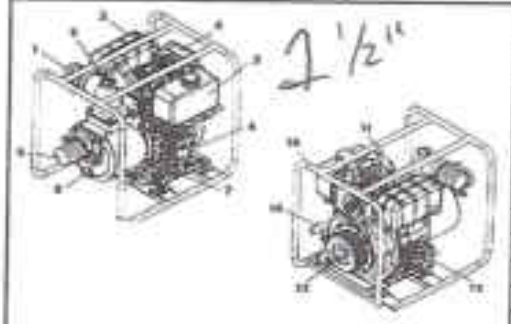

	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
3	SILENCIADOR O ESCAPE	✓	
4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
6	ACELERADOR MOTOR	✓	
7	TAPON DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Revisar niveles del motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	sopoete y estado general						
Verifique tornillo de cebado	control encendido		—	✓			
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			✓			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor		primero	✓			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		primero	✓			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas					✓	
Limpieza o reemplazo filtro combustible	limpieza impurezas ACPM				✓	✓	✓
Control del inyector	inyección del combustible			✓			
Controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor			✓		✓	
Cambio de los aros del pistón	potencia motor						✓
Ajuste tapas compartimento del motor	desajuste por vibración						✓

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

Cambio sello Bomba.

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Bernardo [illegible] CARGO: Almacenista

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: [illegible] FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	Caudal	# DE EQUIPO: 3	FECHA: 26-06-24		
MODELO:	2023	LUGAR: Campamento Tilodiran			
MARCA:	BARNES	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	10 HP	odometro inicial: 150	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR		
REVOLUCIONES:	3600 RPM	odometro final: 170	15W 40		

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de traslado a un taller para intervención por un técnico especializado

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO

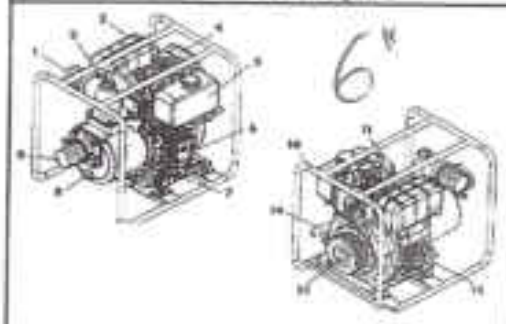

	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
2	TAPON DE CEBADO Ó PURGA SISTEMA	✓	
3	SILENCIADOR O ESCAPE	✓	
4	CARGAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
6	ACELERADOR MOTOR	✓	
7	TAPON DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
13	CARGAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Revisar niveles del motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos	compartimento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido		—	—			
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			/			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor		primero	/			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		primero	/			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas						
Limpieza o reemplazo filtro combustible	limpieza impurezas ACPM						
Control del inyector	inyección del combustible			/			
Controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor	✓					
Cambio de los aros del pistón	potencia motor						
Ajuste tapas compartimento del motor	desajuste por vibracion	/					

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operacion, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

** Cambio aceite

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Rafael Niño CARGO: Almacenista

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: Gio Ayala FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: PRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	Cuadro	# DE EQUIPO:	6	FECHA:	29-06-24
MODELO:	2024	LUGAR:	Campamento Llacima		
MARCA:	Bauker	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	10 HP	odometro inicial:	80	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR	
REVOLUCIONES:	3600 RPM	odometro final:	120	15W 40	

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO

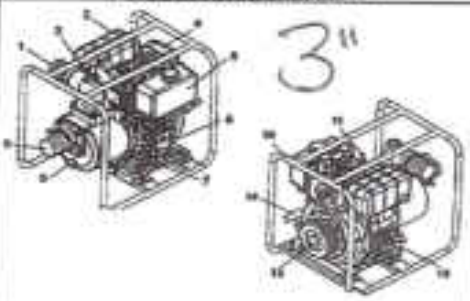

	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
3	SILENCIADOR O ESCAPE	✓	
4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
6	ACELERADOR MOTOR	✓	
7	TAPON DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	-	✓
9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
11	PALANCA DESCOMPRESORA		✓
12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar niveles del motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos.	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general		✓	✓			
Verifique tornillo de cebado	control encendido		☐	☐			
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			☐			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor		☐ primero	☐			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		☐ primero	☐			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas					☐	
Limpieza o reemplazo filtro combustible	limpieza impuresas ACPM				☐	☐	☐
Control del inversor	invección del combustible					☐	
Controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor			☐		☐	
Cambio de los aros del piston	potencia motor						☐
Ajuste tapas compartimiento del motor	desajuste por vibración						☐

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, despues cada 60 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

Ajuste Drenaje y Palanca Compresión

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Leonardo E. CARGO: Almacenista

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: Jean Anjaka FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVESION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	Caudal	# DE EQUIPO: 7	FECHA: 26-06-24.		
MODELO:	2024	LUGAR: Campamento Ubaldo			
MARCA:	BAGRES	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	10 HP.	odometro inicial: 90	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR		
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final: 140	15W 40		

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de traslado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO

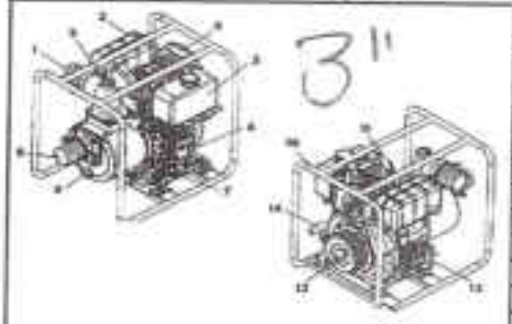

	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
3	SILENCIADOR O ESCAPE	✓	
4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
6	ACELERADOR MOTOR	✓	
7	TAPÓN DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 200 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Revisar niveles del motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido		—	✓			
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			✓			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor		primero	✓			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		primero	✓			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas					☐	
Limpieza o reemplazo filtro combustible	limpieza impurezas ACPM				☐	☐	☐
Control del inyector	inyección del combustible					☐	
Controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor			☐		☐	
Cambio de los aros del pistón	potencia motor						☐
Ajuste tapas compartimento del motor	desajuste por vibración	✓					☐

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario

ob.

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Rafael Niño CARGO: Mantenimiento

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: Jaimes Ayala FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: Fic...
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS	REVISION: 03-02-2021


DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	Autocebante	# DE EQUIPO: 2	FECHA: 26-06-24.
MODELO:	2043.	LUGAR: Campamento Medellin	
MARCA:	Master	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES	
POTENCIA:	7HP	odometro inicial: 480	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final: 560	15W 40

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO

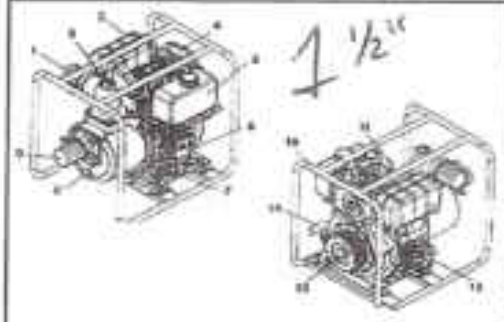

	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
3	SILENCIADOR O ESCAPE	✓	
4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
6	ACELERADOR MOTOR	✓	
7	TAPÓN DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar niveles del motor	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos.	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓		✓			
Verifique tornillo de cebado	control encendido			✓			
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			✓			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor.		primero	✓			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		primero	✓			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas					✓	
Limpieza o reemplazo filtro combustible	limpieza impurezas ACPM				✓	✓	✓
Control del inyector	inyección del combustible					✓	
Controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor			✓		✓	
Cambio de los aros del pistón	potencia motor						✓
Ajuste tapas compartimento del motor	desajuste por vibración	✓					✓

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

lavado carburador

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Leonardo J. J. CARGO: Almacenista

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - BINITIL APISONADOR DE DOS RODILLOS

REFERENCIA:	EC 67DD.	# DE EQUIPO: 1	FECHA: 26-06-24.
MODELO:	2023.	LUGAR: Campamento Tilodiran	
MARCA:	ECOMEC.	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES	
POTENCIA:	20 HP	odometro inicial: 440	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final: 450	15W 40

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de traslado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL MOTOR

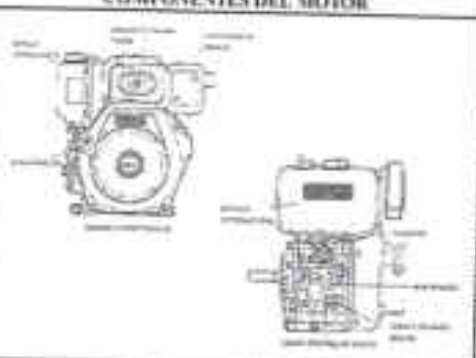

ITEMS A REVISAR	diario	metros
Revisar fugas aceite, combustible control accidentes	✓	
Revisar estado filtros de aire motor y combustible	✓	
Revisar el nivel del aceite motor	✓	cambiar
Limpieza filtro de aire motor o si es necesario cambiar	✓	cambiar
Control del inyector y realizar limpieza		300 hrs
Controle y ajuste la luz de válvulas		500 hrs
Verifique tornillo de cebado		100 hrs
Estado yoyo y empuñadura	✓	
Sellado correcto tapas de aceite motor y tanque combustible	✓	
Ajuste de tornillos, roscas y componentes del motor	✓	
Cambio de los aros del pistón		1000 hrs

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 25 horas de operación, despues cada 100 horas si la presencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

DESCRIPCION A REALIZAR MAQUINA	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	cada 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Revisar operatividad palancas	frenado, aceleración y marchas adelante y atrás	✓					
Revisar nivel sistema hidraulico	nivel debe estar a la ratad del indicador para iniciar operación	✓					
Revisar la banda o correa	estado de tensión adecuada para operación	✓					
Revisar fugas de combustible tanque y tapa del equipo	control de incendios	✓					
Parte del sistema de control y funciones	operatividad del equipo		○				
Revisar fugas del sistema hidráulico	control nivel del sistema			○			
Revisar espatulas del equipo no esten obturadas o dobladas	control de material en los cilindros		○				
Revisar funcionamiento perno bloqueo manubrio	manejo y bloqueo del manubrio						
Revisar interruptor de encendido, palanca de vibración	controles del equipo		○				
Revisar aceite del motor	Control del nivel			○			
Cambio aceite del vibriador	perdida de viscocidad x humedad y calor				○		
Revision del sistema hidraulico	Control del nivel			○			
Cambio aceite hidraulico	perdida de viscocidad x trabajo, humedad y calor						○
Revisión de la banda V (embrague)	Desgaste y desajuste	✓			○		
Revision de la bateria	Deterioro de placas, niveles bajo de electrolitos	✓		○			

lleve acabo el primer cambio del sistema hidraulico a las 250 hrs, luego cada 1000 hrs, es necesario estar revisando los niveles indicados en esta tabla

Nota: Si el equipo no genera encendido o está deficiente, verifique, limpie o pruebe el estado de la BATERIA si es necesario. Aceite cambio cada 100hrs



INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A.

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Rafael Niño CARGO: Almacenista

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: Jaime Ayala FIRMA:

SINERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-03-2022


DATOS DEL EQUIPO - CORTADORA DE CONCRETO

REFERENCIA:	TE-450	# DE EQUIPO: 1	FECHA: 26-06-24.
MODELO:	2023.	LUGAR: Campamento Tucaran	
MARCA:	MAGNITEC	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES	
POTENCIA:	13HP	odometro inicial: 380	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final: 395	20W 50

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un tecnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL MOTOR



ITEMS A REVISAR	10 HRS	100 HRS
Revisar fugas aceite, combustible control accidentes	✓	
Revisar estado filtros de aire motor y combustible	✓	
Revisar el nivel del aceite motor	✓	— cambio
Limpieza filtro de aire motor o si es necesario cambio	✓	— cambio
Control del arrancar y realizar limpieza		— 100 hrs
Controle y ajuste la luz de válvulas		— 500 hrs
Verifique tornillo de culatin		— 100 hrs
Estado yoyo y empuñadura	✓	
Sellado correcto tapas de aceite motor y tanque combustible	✓	
Ajuste de tornillos, tuercas y componentes del motor	✓	
Cambio de los arco del piston		— 1000 hrs

* Hacer acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 25 horas de operación, despues cada 100 horas si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario

DESCRIPCION A REALIZAR MAQUINA	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	cada 25 horas	cada semana o 50 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cambio
revisar nivel de aceite y combustible del motor	control nivel fluidos, cambio aceite 1 (25hrs)	✓			—		
Inspección filtro de aire motor	revisar o remplazar	✓					
Limpieza de las aletas de refrigeración motor	control por suciedad		✓				
Revisar la unidad	retirar barro si hay excesiva adherencia		✓				
Limpieza o verificación la distancia entre los electrodos de la bujia	verificar		✓				
Revisar o remplazar la bujia	inspeccionar	✓			—		
Inspección por desgaste del cable de levantamiento	revisar por desgaste						
Limpie el arrancador, el silenciador y la fanfarrera de escape	mantenimiento sistema escape.					—	
Revisar la tensión de la correa de transmisión.	ne sobre tensionar	✓				—	
Compruebe eje del disco	revisar que el eje y las roscas no presenten desgaste, daños o doblados		✓				
Engrasar los rodamientos del eje de la hoja.	control desgaste por fricción.		✓				
Pasar agua limpia por la bomba y rociar el montaje.	prolonga la vida de la bomba y cuchilla		✓				
Revisar interruptor de encendido, palanca de vibración	controles del equipo		✓				
Revisar los rodamientos del eje de la hoja.	torque adecuado, ninguno se debe mover de lado a lado o arriba a bajo.			—			
Revisar los collares de la hoja (sin desgaste en el diámetro de fuera de forma)	deben estar limpios, libre de muelles o rebabas.				—		
Revisar el pasador de arrastre	No debe estar excesivamente desgastado o doblado, libre de hendeduras	✓			—		

NOTA: estos intervalos de mantenimiento son para el funcionamiento en condiciones normales y estan basados en el numero de horas de uso proveedo del equipo en mención. * Hacer acabo el primer cambio de aceite despues de las primeras 50 horas de operacion** Llevar a cabo despues de las 80 a 100 horas de operación.



INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Rafael NIÑO CARGO: almacenista

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: James Ayala. FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - VIBRODOR PARA CONCRETO

REFERENCIA:	MVDA T4	**# DE EQUIPO:** 1	**FECHA:** 28-06-24
MODELO:	2024	**LUGAR:** Campamento Tiodinaa	
MARCA:	Honda GX 120	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**	
POTENCIA:	5.5 HP	odometro inicial: 80	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**
REVOLUCIONES:	3600 RPM	odometro final: 100	**20W 50**

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL MOTOR

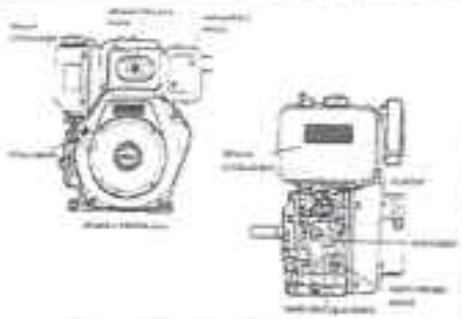

ITEMS A REVISAR	8 HRS	300 HRS
Revisar fugas aceite, combustible control accidentes	✓	
Revisar estado filtros de aire motor y combustible	✓	
Revisar el nivel del aceite motor	✓	___ cambio
Limpieza filtro de aire motor o si es necesario cambiar	✓	___ cambio
Control del inyector y realizar limpieza		___ 500 hrs
Controle y ajuste la luz de valvulas		___ 300 hrs
Verifique tornillo de cebado		___ 100 hrs
Estado yoyo y empuñadura	✓	
Sellado correcto tapas de aceite motor y tanque combustible	✓	
Ajuste de tornillos, roscas y componentes del motor	✓	
Cambio de los aros del pistón		___ 1000 hrs

* Lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 20 horas de operación, despues cada 100 horas si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

DESCRIPCION A REALIZAR MAQUINA	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	cada 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	LIMPIEZA	CAMBIO
verificar nivel aceite y combustible	antes de usar equipo, filtro cada 300hrs.	✓			—		
filtro de aire	verificar, limpiar o reemplazar	✓		—			
cambio aceite del motor y filtro	reemplazar para manejo de particulas	✓		—			
Cabezal: Inspeccion del pendulo x desgaste	si es necesario cambie, reten del cabezal cambiar en cada desarme				—		
cabezal: inpecionar el estado fisico de pista	por desgaste si es necesario cambiar				—		
Cabezal: limpieza piezas	con solvente nada más. Reemplace los O´ring y acetirlos.				—		
Flecha flexible: retirar el chicote. Inspeccionar por desgaste o piezas dañadas	tenga cuidado que no toque el piso o superficies sucias				—		
Flecha flexible: espiga	revisar e inspeccionar el estado espiga por desgaste				—		
Flecha flexible: limpieza o reemplazar (al instalar engrasar)	sopletee con aire comprimido el interior de la manguera				—		
Acoplamiento: remover el niple y los rodaminnos de acople	mantenimiento y revisión x desgaste	✓			—		
Acoplamiento: lavado	limpieza de todas las piezas con solvente	✓			—		
Acoplamiento: inspección rodamientos	si tienen juego sustituir, engrasar en la instalación				—		
Acoplamiento: inspección piezas por desgaste	verificar todas las piezas del desarme				—		

NOTA: Cada vez que desarme las partes principales del conjunto cambie el reten del cabezal. Separé las tres partes principales del conjunto: cabezal, flecha flexible y acoplamiento para evitar ensamblar con cuerda izquierda y otros con derecha. * lleve acabo el primer cambio de aceite despues de las primeras 20 horas de operación** Lleve a cabo despues de las 80 a 100 horas de operación

Nota: Si el equipo no genera encendido o está deficiente, verifique, limpie o pruebe el estado de la BATERIA si es necesario



OTRO(S) ACCION(ES) CORRECTIVA(S) AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Rafael niño CARGO: Almacenista

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - CANGURO APISONADOR

REFERENCIA:	Honda GX100	# DE EQUIPO:	3	FECHA:	28-06-24
MODELO:	GX-100-23	LUGAR:	Campamento Medellin.		
MARCA:	Honda	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	4 HP	odometro inicial	280	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR	
REVOLUCIONES:	3600 Rpm.	odometro final	320	20W 50	

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de traslado a un taller para intervención por un técnico especializado

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO		
1	TANQUE COMBUSTIBLE Y TAPA	✓	
2	PALANCA DEL ACELERADOR		✓
3	VARILLA NIVEL ACEITE MOTOR	✓	
4	FILTRO DE ACEITE MOTOR	✓	
5	TAPON DEL ACEITE MOTOR	✓	
6	VALVULA DE DRENAJE	✓	
7	ZAPATA	✓	
8	SILENCIADOR	✓	
9	FILTRO DEL AIRE MOTOR	✓	
10	PALANCA DE DESCOMPRESION	✓	
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	
12	MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓	
13	MANILLAR Y FUELLE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 5 horas	cada semana o 25 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cada 5 meses o 500 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Revise el indicador del filtro de aire o cambie filtro si es necesario	control de particulas	✓					
Verifique en el indicador el nivel de aceite	indica el nivel de aceite	✓					
Revise grietas o fugas en la manguera de combustible, la tapa del tanque y en las conexiones. Reemplazar si es necesario	control accidentes	✓					
Controle el ajuste y buen estado del fuelle.	compartimento para el aceite						
Ajuste los pernos de la zapata	soporte y estado general						
Verifique las piezas metalicas externas	desajuste or vibracion						
Limpie aletas de enfriamiento del motor	control de temperatura motor						
Cambiar el aceite del motor*	necesidad dependiendo la humedad, calor. Ubicacion			primer 50 hrs			
Limpiar el filtro aire del motor*	control de particulas					✓	
Limpiar el arrancador	control en excesidio						
Cambie el aceite del sistema de aceite**	complete cuando este bajo, sistema apisonador						cambio
Inspeccione el cable de levantamiento por grua por si esta derretiado o roto	para transporte maquina					✓	
controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor						
Cambie el filtro de aceite del motor	control de particulas			primer 50 hrs			
controlar, limpiar o cambiar el filtro de combustible	control del combustible						

* Breve acabo el primer cambio de aceite despues de las primeras 50 horas de operacion** Lleve a cabo despues de las 80 a 100 horas de operacion

Nota: si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

Ajuste acelerador

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Niño	CARGO:	Apoyo SST
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	Isabel Ayala	FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVESION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - CANGURO APISONADOR

REFERENCIA:	6x100	# DE EQUIPO:	2	FECHA:	28-06-24.
MODELO:	2024	LUGAR:	Campamento Tilodiran		
MARCA:	Honda GX35	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	3.5HP	odometro inicial:	650	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR	
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final:	710	20W 50	

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de trasladado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO	OPERACIÓN	INTERVENCIÓN
1	TANQUE COMBUSTIBLE Y TAPA	✓	
2	PALANCA DEL ACELERADOR	✓	
3	VARILLA NIVEL ACEITE MOTOR	✓	
4	FILTRO DE ACEITE MOTOR		
5	TAPÓN DEL ACEITE MOTOR	✓	
6	VALVULA DE DRENAJE	✓	
7	ZAPATA	✓	✓
8	SILENCIADOR	✓	
9	FILTRO DEL AIRE MOTOR	✓	
10	PALANCA DE DESCOMPRESION	✓	
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	
12	MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓	
13	MANILLAR Y PUÑALE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 5 horas	cada semana o 25 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cada 5 meses o 500 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revise el indicador del filtro de aire o cambie filtro si es necesario	control de particulas	✓					
Verifique en el indicador el nivel de aceite	indica el nivel de aceite	✓					
Revise grietas o fugas en la manguera de combustible, la tapa del tanque y en las conexiones Reemplazar si es necesario	control accidentes	✓					
Controle el ajuste y buen estado del fuelle	compartimento para el aceite	✓					
Ajuste los pernos de la zapata	soporte y estado general						
Verifique las piezas metálicas externas	desajuste or vibracion						
Limpie aletas de enfriamento del motor	control de temperatura motor						
Cambiar el aceite del motor*	viscocidad dependiendo la humedad, calor. Ubicación			primer 50 hrs			
Limpiar el filtro aire del motor*	control de particulas						
Limpiar el arrancador.	control en encendido						
Cambie el aceite del sistema de arrie**	complete cuando este bajo, sistema apisonador						cambio
Inspeccione el cable de levantamiento por grúa por si esta deteriorado o roto.	para transporte maquina	✓					
controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor						
Cambie el filtro de aceite del motor	control de particulas	✓		primer 50 hrs			
controlar, limpiar o cambiar el filtro de combustible	control del combustible						

* Lleve acabo el primer cambio de aceite despues de las primeras 50 horas de operacion** Lleve a cabo despues de las 80 a 100 horas de operacion.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

Ajuste zapata.

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Rafael Niño Jones Arjona CARGO: Almacenista.

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	REVISION: 03-03-2022

DATOS DEL EQUIPO - CANGURO APISONADOR

REFERENCIA:	BX 125	# DE EQUIPO: 3	FECHA: 20-06-24
MODELO:	2024	LUGAR: Campamento Tlodiran	
MARCA:	Honda	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES	
POTENCIA:	4HP	odometro inicial: 160	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR
REVOLUCIONES:	3600 Rpm	odometro final: 220	20W 50

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de traslado a un taller para intervención por un técnico especializado

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO		
1	TANQUE COMBUSTIBLE Y TAPA	✓	
2	PALANCA DEL ACELERADOR	✓	
3	VARILLA NIVEL ACEITE MOTOR	✓	
4	FILTRO DE ACEITE MOTOR	✓	
5	TAPÓN DEL ACEITE MOTOR	✓	
6	VALVULA DE DRENAJE	✓	
7	ZAPATA	✓	
8	SILENCIADOR	✓	
9	FILTRO DEL AIRE MOTOR	✓	
10	PALANCA DE DESCOMPRESION	✓	
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	
12	MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓	
13	MANILLAR Y PUSTLE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 5 horas	cada semana o 25 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cada 5 meses o 500 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad	✓					
Revise el indicador del filtro de aire o cambie filtro si es necesario	control de particulas	✓					
Verifique en el indicador el nivel de aceite	indica el nivel de aceite	✓					
Revise grietas o fugas en la manguera de combustible, la tapa del tanque y en las conexiones. Reemplazar si es necesario	control accidentes	✓					
Controle el ajuste y buen estado del fuelle	compartimento para el aceite	✓					
Ajuste los hernajes de la zapata	soporte y estado general						
Verifique las piezas metalicas externas	desajuste or vibración						
Limpie aletas de enfriamiento del motor	control de temperatura motor						
Cambiar el aceite del motor*	viscocidad dependiendo la humedad, calor, Ubicación			primer 30 hrs			
Limpiar el filtro aire del motor*	control de particulas						
Limpiar el arrancador	control en encendido						
Cambie el aceite del sistema de arrete**	complete cuando este bajo, sistema apisonador						cambio
Inspeccione el cable de levantamiento por grúa por si esta deteriorado o roto	para transporte maquina	✓					
controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor						
Cambie el filtro de aceite del motor	control de particulas			primer 30 hrs			
controlar, limpiar o cambiar el filtro de combustible	control del combustible	✓					

* lleve acabo el primer cambio de aceite despues de las primeras 30 horas de operación** Lleve a cabo despues de las 80 a 100 horas de operacion

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Gabriel Niño	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	Jaime Ayala	FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - MOTOSIERRA

REFERENCIA:	260 MS	# DE EQUIPO: 1	FECHA: 23-06-24
MODELO:	2023	LUGAR: Campamento Tuchin.	
MARCA:	STIHL	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES	
POTENCIA:	2,5 HP	odometro inicial: 750	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR
REVOLUCIONES:	3600 RPM	odometro final: 2250	MEZCLA ACEITE 2T - GASOLINA

En la tabla que aparece a continuacion se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervencion por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	TAPA PURIFICADOR DE AIRE	✓	
2	PROTECCION MANO DELANTERA	✓	
3	BLOQUEO DEL ACELERADOR	✓	
5	TAPA DEL EMBRAGUE	✓	
6,7,8	RECOGEDOR DE CADENA, BARRA GUIA Y CADENA	✓	
9	CUBETA DE PURGADO (CEBADOR)	✓	
10	BOTON DE CONTROL DEL ESTRANGULADOR	✓	
4 11	ASIDERO TRASERO Y DELANTERO	✓	
12 14	TAPON DEL DEPOSITO COMBUSTIBLE Y ACEITE	✓	
13	TIRADOR DEL ARRANQUE - GACHO DE IZADO	✓	
17	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	✓	
18	BLOQUEO DEL GATILLO DEL ACELERADOR	✓	
19	GATILLO DEL ACELERADOR	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 5 horas	cada semana o 25 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cada 5 meses o 500 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
filtro de aire	limpiar por obstruccion	✓					
filtro de aceite	inspeccionar y limpiar	✓					
filtro de aceite	cambio x deterioro						
filtro de aire	cambio x deterioro						
bujia motor	inspeccionar y limpiar	✓					
bujia motor	cambio x desgaste						
barra guia	inspeccionar y limpiar	✓					
Cambiar el aceite sistema enfriamiento *	viscosidad dependiendo la humedad, calor. Ubicacion.			primer 50 hrs			
engranaje	inpeccionar			primer 50 hrs			
engranaje	sustituir x desgaste						
carburador	inpeccionar y limpiar	✓					
carburador	ajustar o calibrar						cambio
silenciador	inpeccionar y limpiar	✓					
freno de la cadena	inspeccionar y sustituir	✓		primer 50 hrs			
cuerda de arranque	inspeccionar	✓					

cada 50 horas de operacion se debe ajustar tornillos, pernos y tuercas. Adicional se debe verificar la lubricación y ajuste de la cadena.

Nota: si la potencia de la maquina está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario. Verifique estado de la cadena.

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Niño	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	Jorge Ayala	FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-HANT-003
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - PLANTA ELECTRICA

REFERENCIA:	K 6.5 BTR.	# DE EQUIPO: 1	FECHA: 26/06/24
MODELO:	2020	LUGAR: Campamento Tibirican	
MARCA:	KAMO.	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES	
POTENCIA:	6.6 KVA	odometro inicial: 1120	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR
REVOLUCIONES:	3600 RPM	odometro final: 1230	15W 40

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificacion, las que estan con los cuadros requieren de traslado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL MOTOR

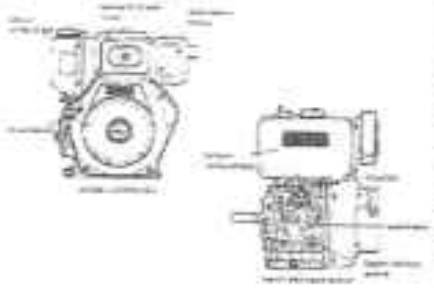

ITEMS A REVISAR	25 HRS	100 HRS
Revisar fugas aceite, combustible control accidentes	✓	
Revisar estado filtros de aire motor y combustible	✓	
Revisar el nivel del aceite motor	✓	cambio
Limpieza filtro de aire motor o si es necesario cambiar	✓	cambio
Control del inyector y realizar limpieza		500 hrs
Controle y ajuste la luz de valvulas		500 hrs
Verifique tornillo de culata		100 hrs
Estado cuyo y empañadura	✓	
Sellado correcto tapas de aceite motor y tanque combustible	✓	
Ajuste de tornillos, roscas y componentes del motor	✓	
Cambio de los aros del piston		1000 hrs

* Tiene acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 25 horas de operación, despues cada 100 horas si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

DESCRIPCION A REALIZAR MAQUINA	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	cada 25 horas	cada semana o 100 horas	cada 3 mes o 500 horas	cada año o cada 1000 horas	CORRECTIVO
Comprobar ACPM, drenar y revisar lineas al tanque.	verificar sedimentos o retencion en lineas o filtro	✓					
revisar nivel aceite motor	nivel debe estar a la mitad del indicador para iniciar operación.	✓					
Ajuste piezas de la base planta electrica.	control desajuste por vibracion			—			
Revisar fugas de combustible tanque y tapa del equipo	control de incendios	✓					
Parte del sistema de control y funciones.	operatividad del equipo	✓					
Revisar filtro combustible.	comprobar estado del filtro: Cambiar si es necesario			—	—		
Comprobar perdidas de aceite o posibles fugas	control nivel aceite motor en el sistema	✓					
Revisar funcionamiento bomba inyeccion.	control por obtruccion de particulas.					—	
Revisar interruptor de encendido, conectores de salida 110V - 220V.	controles del equipo	✓					
revision sistema alternador	control de carga, estado escobillas, cableado y portadiodos					—	
Cambio aceite del MOTOR.	perdida de viscocidad x humedad y calor.		1 Vez	—			
ajuste y limpieza valvulas de admisión y escape.	calibración y limpieza por carbonización.						—
Revisión de la banda V (embrague).	Desgaste y desajuste	✓			—		
Revisión de la bateria.	Deterioro de placas, niveles bajo de electrolito	✓		—			

Neve acabo el primer cambio de ACEITE MOTOR a las 25 hrs, luego cada 1000 hrs, es necesario estar revisando los niveles indicados en esta tabla.

Nota: Si el equipo no genera encendido o está deficiente, verifique, limpie o prueba el estado de la BATERIA o es necesario.





INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Niño	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	James Ayala	FIRMA:	

5.12.6 ACTAS DE REUNION DE OBRA

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
03	06	2024	Inicio	2:00 pm	Fin	4:00 pm	Tiladiran

Tipo de Reunion:

ACTA DE REUNION No. 23

I. OBJETO

Construcción Alcantarillado Tiladiran

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se cumplieron algunos compromisos planteados en el acta anterior

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

En el desarrollo del presente comite se mencionaron los siguientes temas:

- Se informa sobre el avance en la ejecucion de actividades de los frentes de trabajo: el frente N°1 continua en el cruce de la calle 1 con Vía los Mangos se espera que la próxima semana finalicen actividades en este sector para habilitar la circulación del tráfico: el frente N°2 continua con la instalación de tubería pluvial 60" PVC. se espera que para la próxima semana terminen esta actividad: el frente N°3 culmina esta semana la actividad de instalación de tubería PVC 60". se tiene proyectado que la próxima inicien instalacion de tubería sanitaria en la calle 2 entre carrera 4 y 5: el frente N°4 continua con la ED para la próxima semana se tiene previsto fundir el primer anillo.
- Se informa que para la próxima semana se tiene programada la apertura de un 5to frente de trabajo.
- Se informa sobre la circulación del tráfico pesado por el predio de la señora Joaquina, hasta el momento no se han presentado inconvenientes.

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

COMPROMISOS

- ✓ Enviar materiales eléctricos faltantes, para poder instalar el servicio de luz en el campamento → Marcela
- ✓ Enviar barricadas a Tilodirán → Marcela
- ✓ Solicitar cangrejo y motobombas para el nuevo frente de trabajo → Ing Omar, Marcela
- ✓ Cotizar soldadura para la señalización → Madelaine, Marelis Pache
- ✓ Verificar la calidad del sellado del agua potable → Ing Oris
- ✓ Contratar el conductor de la camioneta → Ing Perez, Martha

COMPROMISOS PENDIENTES

- ✓ Enviar radios para las controladoras → Marcela
- ✓ Definir con Interventoría el anarre del resto de la ED → Ing Perez
- ✓ Socialización a usuarios de la calle 2 y calle 3 entre carrera 4 y 5 → Angelica
- ✓ Manual de funciones y copia de los contratos de los trabajadores → Martha
- ✓ Socialización a cargo de Jamas → Jamas
- ✓ Terminar actividad de poda de árboles → Madelaine, Ing Edith
- ✓ Enviar oficio a todas las compañías informando sobre la ampliación del carril del canal vía Los Mangos con calle 1 → Angelica
- ✓ Programar diversidades → Ing Omar, Ing Perez
- ✓ Actas de entrega del material de excavación dado a los usuarios → Angelica
- ✓ Definir forma de drenaje del sitio de disposición de RCD propuesto en el predio de la Señora Marina → Ing Perez

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Ma. Angelica Trujillo Delgado	23914357	Social	
2	Francisco Quintero	9245556	Ayto	
3	Hector Pacheco	68.285.674	Ayto.	
4	Maricel Rodriguez G	47436058	Ayto	
5	JAIRO LUIS CUBIDES	9.517.517	ING. RON	
6	OMAR VILLAMIZAR NOVA	13.474.370	ING. OBRA	
7	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
8	Rafael Jaimez	91398191	Almacen	
9	DIEGO PEREZ	79941038	RESIDENTE	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
14	06	2024	Inicio	3:00 pm	Fin	5:00 pm	Tilodirán

Tipo de Reunion:

ACTA DE REUNION No. 24

I. OBJETO

Construcción Alcantarillado Tilodirán

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se cumplieron algunos compromisos planteados en el acta anterior

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

En el desarrollo del presente comité se mencionaron los siguientes temas:

- Se informa sobre el avance en la ejecución de actividades de los frentes de trabajo: el frente N°1 continua en el cruce de la calle 1 con vía Los Mangos realizando la instalación de alcantarillado sanitario, la próxima semana se tiene proyectado iniciar con la instalación de la manija para así poder habilitar la circulación del tráfico; el frente N°2 continua con la instalación de tubería pluvial, se tiene proyectado que para la próxima semana se finalice la instalación de los 4 tubos faltantes; el frente N°3 inicia actividades de instalación de tubería sanitaria, sin embargo no se ha podido continuar con estas actividades debido a la falta de láminas para entibado; el frente N°4 termina la actividad de amarre de aceros en la ED y prosigue a realizar pozos y tapas para pozos; para la apertura del frente N°3 se requiere de 4 ayudantes (2 con curso de alturas), 1 oficial (con curso de

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

altumas), 1 canguro, 7 láminas de entibado y 2 motobombas, el topógrafo y el cadenero.

✓ Se informa que para la construcción de pozos se abrirán 3 frentes, conformados por 1 oficial y 2 ayudantes cada uno.

✓ Se informa sobre la importancia de cumplir los compromisos que se dejan plasmados en los comités de obra, el incumplimiento de estos compromisos pueden conllevar a descargos.

✓ Se informa que para la instalación de la electricidad en el campamento hace falta algunos materiales.

✓ Se informa sobre la problemática presentada en el predio de la señora Joaquina, en este sector se presentan malos olores debido a que se encuentra destapada una caja de inspección sanitaria en el predio del frente; la usuaria solicita una pronta solución debido a que ha estado presentando malestares respiratorios.

COMPROMISOS

✓ Enviar oficio a todas las compañías informando sobre la ampliación del cierre del cruce vía Los Mangos con calle 1 → Angélica

✓ Enviar láminas para entibado → Marcela, Ing Pérez

✓ Enviar rollos de manguera PEAD 2" y 3" → Marcela

✓ Solicitar en el pedido las camisas de concreto → Ing Omar

✓ Se solicita servicio de carrotanque → Ing Pérez

✓ Colocar batea en el corredor de la PTAR → Ing Pérez, Ing Omar

✓ Realizar una zanja desde el predio del Señor Belarmino hasta la vía Agualinda para dar continuidad al flujo de agua → Ing Pérez, Ing Omar

✓ Destapar el tubo que se encuentra en el predio del señor Carlos para dar continuidad al flujo de agua → Ing Omar

✓ Instalar otro tubo en la vía alterna para incrementar el flujo de agua

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

✓ Arreglar la callejuela del predio de don Carlos → Ing Omar

COMPROMISOS PENDIENTES

✓ Enviar materiales eléctricos para poder instalar el servicio de luz en el campamento → Marcela

✓ Cotizar soldadura para la señalización → Maestro Pacho, Madeleine

✓ Contratar al conductor de la camioneta → Ing Pérez

✓ Enviar radios para las controladoras → Marcela

✓ Definir con Interventoria el anclaje del muro de la ED → Ing Pérez

✓ Manual de funciones de los trabajadores → Martha

✓ Socialización a cargo de James → James

✓ Terminar actividad de poda de árboles → Madeleine, Ing Edith

✓ Programar densidades → Ing Omar, Ing Pérez

✓ Actas de entrega del material de excavación dado a los usuarios → Angélica

✓ Definir tema de drenaje del sitio de disposición de RCD propuesto en el predio de la señora Marina → Ing Pérez

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Ma. Angelica Trujillo	23914357	Social	
2	Omar Villamizar	13475370	Res. Obra	
3	Francisco Quintero	4245536	Hse	
4	Madeleine Rodriguez	44426638	Hseq	
5	Camilo Castro Lopez	1007859262	Aux Ing	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
20	06	2024	Inicio	10:30 am	Fin	12:00 pm	Tilodirán

Tipo de Reunion:

ACTA DE REUNION No. 25

I. OBJETO

Construcción Alcantarillado Tilodirán

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se cumplieron algunos compromisos planteados en el acta anterior

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

En el desarrollo del presente comité se mencionaron los siguientes temas:

✓ Se realiza una intervención por parte de la policía en donde manifiesta que está en toda la disposición de colaborar y ayudar en pro de la seguridad, a su vez, da a conocer sobre el conducto regular que se debe llevar a cabo ante distintas situaciones problemáticas que se generen con la comunidad.

✓ Se informa sobre el avance en la ejecución de actividades de los frentes de trabajo; el frente N°1 continua en el cruce de la calle 4 con vía Los Mangos, están realizando la instalación de tubería sanitaria de la red principal y de la manja, se proyectó que en aproximadamente un mes se puede habilitar la circulación del tráfico por este sector; el frente N°2 continua con la instalación de tubería pluvial PVC 60", se tiene previsto que para la próxima semana se culmine esta actividad, se informa que el tramo 44 se utilizará como alcantarilla para la circulación del tráfico; el frente N°3 continua con la actividad de instalación de tubería sanitaria; el

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Frente N°4 continua con la construcción de pozos en el corredor hacia Aguabinda ; el frente N°5 queda en espera.

✓ Se informa sobre la visita realizada por Corpovinoquia.

✓ Se reitera la importancia de ser claros en los pedidos de materiales

COMPROMISOS

✓ Enviar oficios a todas las compañías informando sobre la ampliación del cierre del cruce vía Los Mangos con calle 1 por un tiempo de 1 mes → Angélica

✓ Construir pozo de inspección del cruce vía los Mangos con calle 1 → Maestro Pacho

✓ Realizar revisión a las motobombas → James

✓ Realizar revisión a la camioneta → James

✓ Contratar conductor → James, Ing Pérez

✓ Entrega de dotación a los trabajadores que cumplen los 4 meses → Martha

✓ Organizar el frente N°5 con los trabajadores que están contratados → Maestro Pacho

COMPROMISOS PENDIENTES

✓ Enviar materiales electricos para poder instalar el servicio de luz en el campamento → Marcela

✓ Cotizar soldadura para señalización → Maestro Pacho, Madeleine

✓ Definir con Interventoria el amarre del muro de la EO → Ing Pérez

✓ Manual de funciones de los trabajadores → Martha

✓ Socialización a cargo de James → James

✓ Terminar actividad de poda de árboles → Ing Edith

✓ Programar brigadas → Ing Omar, Ing Pérez

✓ Actas de entrega del material de excavación dado a los usuarios → Angélica

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Ma. Angelica Trujillo	23914357	Social	
2	Ruben Dario Espinosa	1.148.259.074	Electricista	
3	Francisco Quintero	4245556	Mto	
4	OMAR VILLAMIZAR	13 475 370	Res Ocup	
5	DIEGO PEREZ	79941038	Rotante	
6	Jairo Andres Pinto Izquierdo	949.569	Auxiliar Electrico	
7	Rafael Lemus	9'398191	Almacen	
8	Oscar Amado Nuñez	1102548070	Administrador	
9	DORIS BERNAL	47440878	COORD SST	
10	Camilo Castro Lopez	1007854282	Aux Ing	
11	CARLOS HERRERA	1118538387	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
12	Madelaine Rodriguez G	47486658	HSEQ	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
28	06	2022	Inicio	3:00 pm	Fin	5:00 pm	Tiledirán

Tipo de Reunion:

ACTA DE REUNION No. 26

I. OBJETO

Construcción Alcantarillado Tiladirán

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se cumplieron algunos compromisos planteados en el acta anterior.

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

En el desarrollo del presente comité se mencionaron los siguientes temas:

- Se informa sobre el avance en la ejecución de actividades de los frentes de trabajo; el frente N°1 continua con la instalación del alcantarillado sanitario en el TS 52, se programa para la próxima semana continuar en este tramo e intervenir el PS 44N; el frente N°2 terminó la instalación de tubería PVC 60" en el TP 44, se programa para la próxima semana iniciar la instalación del alcantarillado sanitario en el TS 17; el frente N°3 continua con la instalación del alcantarillado sanitario en el TS 26; el frente N°4 continua con la construcción de pozos, se programa para la próxima semana la instalación de las tapas de los pozos pluviales PP 64 al PP 33.
- Se informa sobre la llegada de tubería proveniente de PAVCO:

63 tubos de 48"	45 tubos de 12"
19 tubos de 39"	20 tubos de 8"
19 tubos de 18"	

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

COMPROMISOS

- Construir pozo sanitario 44 N → Maestro Pacho
- Arreglar motobombas → James
- Hacer ajuste provisional del giro de las motobombas para evitar filtraciones
  ↳ Maestro Pacho
- Enviar fotos de la entrega de dotación a los trabajadores nuevos
  ↳ Martha
- Contratación de conductor → James, Martha

COMPROMISOS PENDIENTES

- Materiales eléctricos para instalar luz en el campamento → Marcela
- Definir con Interventoria el amarre del muro de la ED → Ing Perez
- Manual de funciones de los trabajadores → Martha
- Socialización a cargo de James → James
- Actividad de poda de árboles → Ing Edith
- Programar densidades → Ing Perez

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLANUEVA	13.475.370	RESIDENTE	
2	DIEGO PEREZ	79941034	CABRERA	
3	Edwar Pacheco	68.285.674	Aux	
4	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
5	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H.
6	Mg. Angelica Trujillo D	23.914.357	Social	
7	Camilo Castro López	1007859282	Ing Res	
8	Francisco Quintero	4245870	HSEQ	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

5.12.7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

NIT 900.326.145-4

Yopal, junio 6 de 2024

Doctora
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R.L. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
El Yopal.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Construcción pozos de inspección y relleno final de las zanjas con material seleccionado.

Cordial saludo;

La empresa **CONSINTER DEL ORIENTE E.U**. actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, de acuerdo a las actividades que se están realizando en el emisario final del Alcantarillado Pluvial la presente interventoria evidencian que se pueden mejorar los procesos de construcción, incrementar los rendimientos de obra, disminuir las excavaciones expuestas y garantizar la movilidad en la vía a la vereda Agua Linda, con la construcción de las estructuras de conexión de la tubería en PVC de diámetro 60". Por medio del presente le solicitamos incrementar los frentes de obra (personal) para la ejecución de los pozos de inspección debido a que por la falta de estas estructuras no se puede terminar el relleno final de las zanjas con material seleccionado de la excavación compactado, generando demora para la oportuna habilitación de las vías intervenidas y garantizar la adecuada movilidad a los usuarios.

En espera de una pronta respuesta,

Atentamente,

Nicolas Roso
CONSINTER DEL ORIENTE EU
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201
Ciudad: Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 06-06-2024
HORA: 9:04
CANTIDAD DE FOLIOS: 1
RECIBIDO POR:
MÓNICA
RECIBIDO NO LIGA ACEPTACIÓN

5.12.8 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Yopal, 05 de Junio del 2024

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 05 / Junio / 2024
HORA 8:30am CANTIDAD DE FOLIOS 3
RECIBIDO POR Fabian Parra
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

OF-PROY-TIL

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar que sea evaluada y aprobada la reprogramación del plan de inversión del anticipo debido a que en la ejecución del proyecto se ha evidenciado la necesidad de variar la inversión de los recursos en las diferentes actividades del plan de inversión del anticipo presentado inicialmente y a los descuentos de ley efectuados de acuerdo al desembolso realizado a la Fiduciaria Bancolombia.

- Plan de inversión inicial:

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y mano de obra	$ 1.945.980.168,40	10,00%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 5.837.940.505,20	30,00%
3	Transporte de materiales pétreos	$ 4.864.950.421,00	25,00%
4	Alquiler de maquinaria y equipos	$ 2.918.970.252,60	15,00%
5	Contratos de mano de obra	$ 3.891.960.336,80	20,00%
		$ 19.459.801.684,00	100%

933

Se solicita la evaluación y aprobación de la reprogramación del plan de inversión del anticipo basado en:

- Incluir en el valor los descuentos de ley realizados al desembolso del anticipo, relacionados como Contribución seguridad 5% democrática, debido a esto, se disminuyen los valores asignados a los ítems de pago de salarios, maquinaria y equipos, y contratos de mano de obra.
- Debido a la evolución en la ejecución del proyecto, se hace necesaria la variación en los porcentajes del plan de inversión del anticipo inicial, particularmente en los ítems de compra de materiales y accesorios, y transporte de materiales, ya que de acuerdo a la inversión realizada en el proyecto se ha evidenciado que estos ítems son los más representativos, como es el caso de la tubería para la red de saneamiento básico, es por esto que, se requiere el incremento de estos ítems en el plan de inversión, como consecuencia, se disminuyen los valores asignados a los ítems de pago de salarios, maquinaria y equipos y contratos de mano de obra.

A continuación, se evidencia la reprogramación del plan de inversión del anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
1	Pago de salarios	$ 945.980.168,40	4,86%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 8.070.157.242,20	41,47%
3	Transporte de materiales	$ 5.664.950.421,00	29,11%
4	Maquinaria y equipos	$ 1.945.980.168,60	10,00%
5	Contratos de mano de obra	$ 1.859.743.599,80	9,56%
6	Contribución seguridad 5% democratica	$ 972.990.084,00	5,00%
		$ 19.459.801.684,00	**100%**

Agradezco su atención prestada y respuesta positiva a la solicitud.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Yopal, 07 de Junio del 2024

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 7-JUNIO-2024
HORA 5:00pm CANTIDAD DE FOLIOS 639
RECIBIDO POR Fabian Peña
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de obra N° 032 DE 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ENTREGA DEL INFORME DE OBRA N°7 DEL PERIODO 01 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega del informe de obra N°7 del proyecto de referencia que se llevó a cabo en el periodo del 01 de ABRIL del 2024 al 30 de ABRIL del 2024, en donde se encuentra el avance fisico y financiero de las diferentes actividades ejecutadas en el desarrollo de la obra objeto del contrato en mención y en general todos los datos necesarios para tener una información actualizada a la fecha de entrega de este informe.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Anexos:
3 CARPETAS 636 FOLIOS
1 CD

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISION: 30-06-2023

Yopal, 17 de junio de 2024

Ingeniero
HECTOR MIGUEL GONZALEZ LOZANO
Subdirector de Control y Calidad Ambiental
CORPORINOQUIA

CORPORINOQUIA
FECHA: 02 JUL 2024 4:21
RECIBIDO POR: Carmen Cp
RADICADO: 2024-10661
12 FOLIOS

REFERENCIA: ALCANCE AL RADICADO 2024-01132 DEL 30 DE ENERO DE 2024 – PROGRMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD.

CONTRATO DE OBRA NRO. 032 DE 2023 DE ACUATODOS S.A. ESP – OBJETO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: ENTREGA DEL PRIMER REPORTE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD PARA EL CONTRATO 032 DE 2023

Cordial Saludo Ingeniero Gonzalez,

Atendiendo lo dispuesto en la Resolución nro. 1257 de 2021, por medio de la presente me permito hacer entrega del Primer Reporte de la implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD, del periodo comprendido entre noviembre 1 de 2023 al 30 de abril de 2024.

Sin otro particular.

MARTA DIOMY BARRERA ALFONSO
Representante legal

Anexo lo enunciado

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico [illegible]

Powered by CamScanner

Yopal, 20 de Junio del 2024

OF-PROY-TIL

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Adriana Hernández
Municipio de Yopal

Referencia: Contrato de Obra No. 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Entrega Informe de solicitud de certificado de los residuos de construcción y demolición-RCD

Cordial saludo:

Mediante la presente me permito entregar el informe de disposición final de RCD y a la vez solicitar el certificado de la disponibilidad del recibo de los mismos, para el contrato objeto de la referencia.

Agradezco su atención prestada

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDIA DE YOPAL
RECIBIDO
FECHA 20-06-2024
HORA 3:00 p.m.
RECIBE Angie E.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
Nit 844.004.840-0

CERTIFICACIÓN

700-220-200-047-2024

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

C E R T I F I C A:

Que mediante Resolución No 500.36.18.0325 del 9 de marzo de 2018, Corporinoquia otorgo al Municipio de Yopal, autorización ambiental para la disposición final de los residuos sólidos de construcción y demolición RCD. Que, de acuerdo con la resolución indicada, la escombrera municipal cuenta con capacidad disponible.

Ante la solicitud de autorización para la disposición de residuos de construcción y demolición por parte de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S, identificado con NIT 844.004.840-0, representada legalmente por MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, identificada con cedula de ciudadania No. 47.436.168 de Yopal, la Secretaria de Infraestructura, otorgo autorización mediante comité técnico del 1 de noviembre de 2023, para la disposición de RCD en la escombrera municipal y a la vez, realizo una serie de recomendaciones y observaciones como medidas de mitigación y prevención establecidas en la Resolución 500.36.18.0325 del 9 de marzo de 2018, para la disposición de escombros en los predios autorizados, los cuales se ubican en el área rural del Municipio, en el Centro Poblado del Corregimiento de Morichal.

Que SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S, con NIT: 844.004.840-0, atendiendo el procedimiento indicado y las recomendaciones realizadas por la Secretaría de Infraestructura del Municipio, respecto al material extraído producto de las actividades realizadas en desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 032 de 2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, suscrito con Acuatodos S.A, dispuso en la escombrera municipal en el periodo de enero a mayo 2024, residuos construcción y demolición RCD.

Que, de acuerdo al informe presentado por SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S, con NIT: 844.004.840-0, mediante oficio OF-PROY-TL, del 20 de junio de 2024, se dispuso los siguientes volúmenes de material, en los siguientes periodos:

No.	PERIODO	VOLUMEN DISPUESTO
1	enero a mayo 2024	5.833,40 m3
	TOTAL	**5.833,40 M3**

En total, de acuerdo al informe presentado, se dispuso ***CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO CUARENTA (5.833,40 M3), METROS CÚBICOS*** *de residuos de construcción y demolición, en los lugares indicados y predios autorizados por el Municipio.*

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345813
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

338

CERTIFICACIÓN

700-220-200-047-2024

Las cantidades a certificar respecto a la totalidad de los volúmenes dispuestos, corresponde a las indicadas por la empresa MLAR INGENIERIA E.U, con NIT: 844.004.815-61, en el informe de disposición presentado para tal fin y certificadas por el representante legal de CONSINTER DEL ORIENTE EU, en calidad de Interventor contratado por Acuatodos S.A; en cumplimiento del Contrato de Consultoría No. 037 de 2023, mediante certificación del 20 de junio de 2024; teniendo en cuenta que la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Yopal, no realizo seguimiento y control a los volúmenes indicados por el contratista, simplemente constato la adecuada disposición y reconformación del material dispuesto.

Con base a lo anterior, la Secretaria de Infraestructura, certifica que la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S, con NIT: 844.004.840-0, realizó disposición adecuada de aproximadamente de ***CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO CUARENTA (5.833,40 M3)***, metros cúbicos de residuos de excavación y demolición en los predios de la escombrera municipal

Por la disposición de los residuos de construcción el Municipio de Yopal, no realizó ningún cobro ni genero ningún costo adicional a quienes realizaron esta actividad.

Se expide en Yopal, Casanare, a solicitud del interesado, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Yopal

Proyectó: Rodolfo Ramírez Montaña
Cargo: Profesional Universitario Grado 04

Yopal, 20 de Junio del 2024

OF-PROY-TIL

Señor:
ABSALÓN LEGUIZAMON
COORDINADOR VEEDURÍA - TILODIRÁN

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ACTA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA ALTERNA TRÁFICO PESADO.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega de una copia al acta del estado actual realizada a la vía que será utilizada como ruta alterna del tráfico pesado según Resolución N° 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Anexo: 11 folios

SINERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 3 FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-031-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 031-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-031-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE S.S.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA: DD 25 MM 05 AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VIA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Representante de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario:

Cédula de Ciudadanía:

Dirección:

Teléfono:

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL- TILODIRÁN No. de casa: Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarillado		
3. Energía		
4. Teléfono		
5. Gas		
6. Televisión cable		
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: Cual? RURAL URBANO

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar Obra Gris Terminada

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI NO

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado Escarpado Plana

USO ACTUAL

1. Residencial		6. Recreacional	
2. Comercial		7. Salón	
3. Industrial		8. Solidaridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educativo, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	

ACCIDENTES TOPOGRAFICOS: Quebrada SI NO Uso del suelo

11. Ninguno

12. Otro

3. ESTADO DE LA ESTRUCTURA ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	LOSA DE CONCRETO	BARBACOLES	CUNETAS	POZOS	ALCANTARILLA	BOX COULVERT	OTROS
1 DRENAJE PLUVIAL	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2 TIPO DE FALLA							
3 HUNDIMIENTOS							
4 OTROS							
OBSERVACIONES	Se evidencia levantamiento de los sellos de las juntas de dilatación en todas las placas de concreto, de igual manera, se evidencia desgaste en las placas de concreto	Se evidencia fisuras y desgaste en algunos sardineles	Se evidencia separación en las juntas de dilatación combinada con las placas de concreto	Se evidencia hundimiento en las placas de los pozos	Se evidencia fisuras y deterioro en la alcantarilla existente		Se evidencia desgaste y deterioro en los sumideros longitudinales existentes


FIRMAS

Nombre: Yaneth Martínez
Firma Representante de la comunidad
C.C. DNIT

Representante Interventoría
Nombre: DIEGO ESPEJO

Representante Contratista
Nombre: EDGAR LOPEZ

Nombre: Jairo Alexis Suarez
Cargo: Residente Ambiental

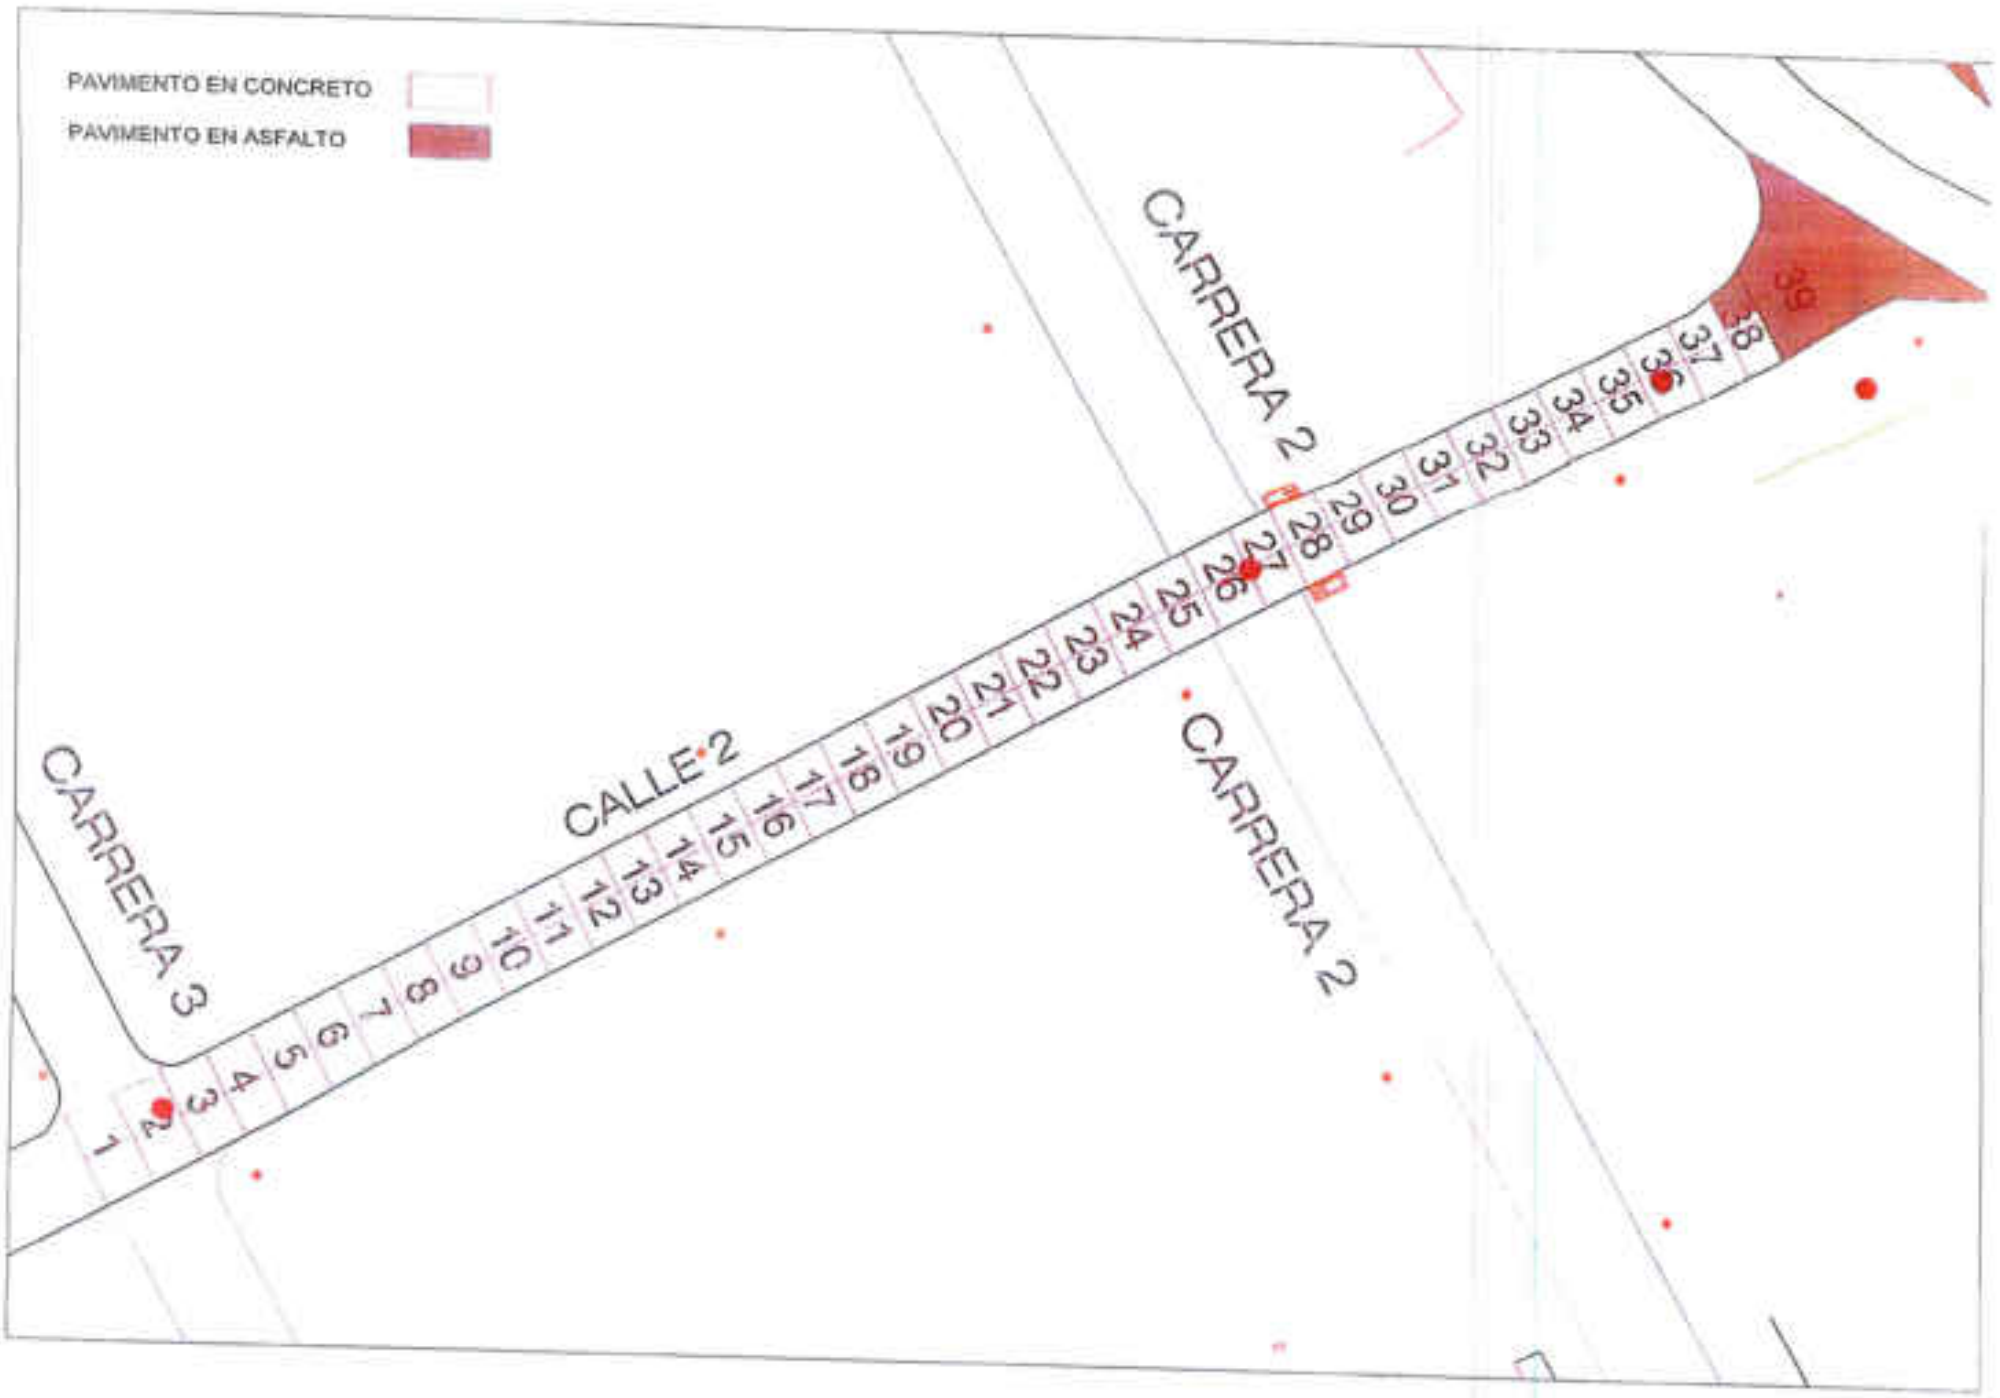
PAVIMENTO EN CONCRETO
PAVIMENTO EN ASFALTO
CARRERA 2
CARRERA 3
CALLE 2
CARRERA 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 1

Pagina	1	de	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	

FECHA: DD 20 MM 07 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 053-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSISTIER DEL ORIENTE S.A.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



ESPECIALES

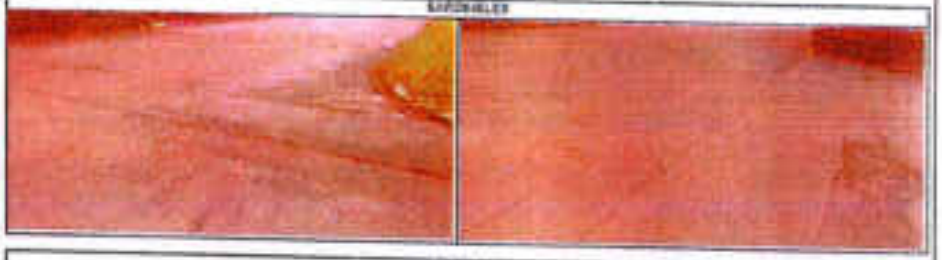

CALZADA DERECHA

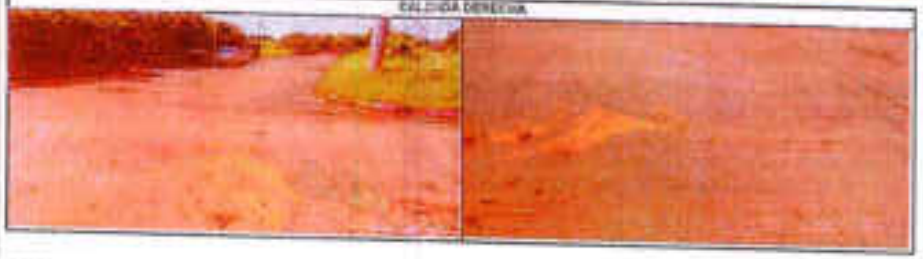

POZOS

OTROS

Se inyectara lavigavia en las placas de concreto, cunetas y sardineles

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad
TESTIGO
C.C. C-427

Representante del Contratista
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Supervisor
Nombre:

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Carpeta Evidencias Fotograficas

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 1

Página	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 20	MM 03	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 010-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 021-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



ANDENES



CALZADA DERECHA



POZOS



OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la novedad, el seguimiento y/o cierre

Se evidencia ubicación en las planas de sectores, cunetas y cordones
Se evidencia la presencia de un pozo, el cual tiene la placa fundida
Se evidencia figura de fondo en la placa fundida

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

FIRMA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

Firma Representante de la Comunidad
Nombre
C.C. O NIT

Representante de la Interventoría
Nombre

Representante del Contratista de Obra
Nombre

Vo.Bo. Jefe de Oficina Asesora Jurídica
Vo.Bo. Contratista Obligaciones Especiales

SINERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-043
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2023

ACTA N°: 6

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 30	MM 05	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 010-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2020 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



BARDINELES

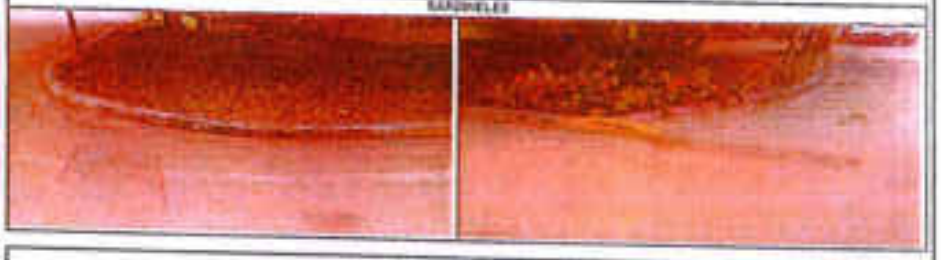

CALZADA DERECHA

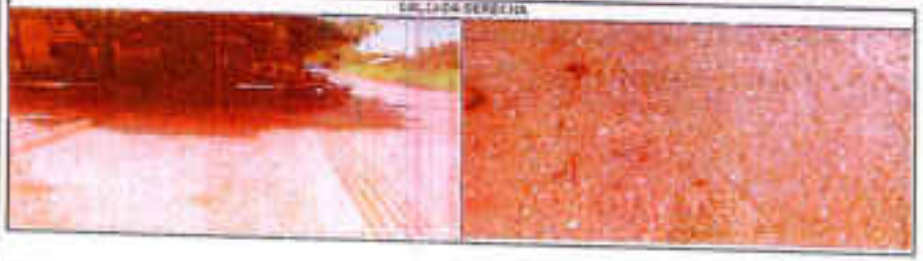

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la novedad en caso presente y/o cierre

De evidencia dejando en las placas de concreto, cunetas y contorno
De evidencia fisura de tercio en ambos placas

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE HACE CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventoría, Propietario

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 9

HOJA No.	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 30 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 533-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 001-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



ESTRIBOS



CALZADA DERECHA

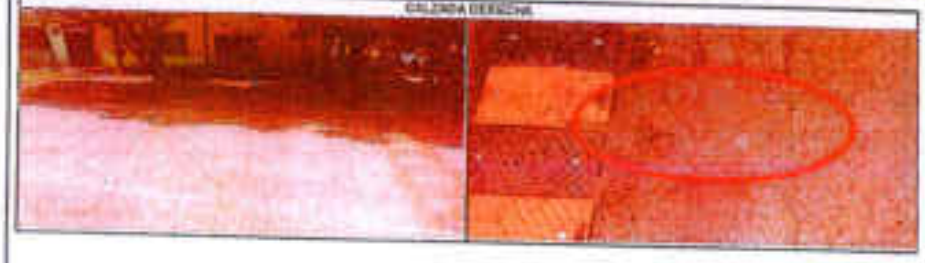

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la informe al seguimiento y/o cierre

Se evidencia disigarte en las placas de concreto, cunetas y cordones
Se evidencia fisura longitudinal en la placa contado derecha

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS COMPROMISOS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la Comunidad
Nombre
C.C O NIT

Firma Representante del Contratista de Obra
Nombre

Firma Representante de la Interventoria
Nombre

Firma Residente Ambiental Contratista
Nombre

976

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAO ACTA DE ESTRUCTURA VIAL SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CODIGO:	FOR-PROY-042
		VERSION:	01
		REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 2

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DIA 20	MES 05	AÑO 2024			

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 012-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2020 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2020

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTAR DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

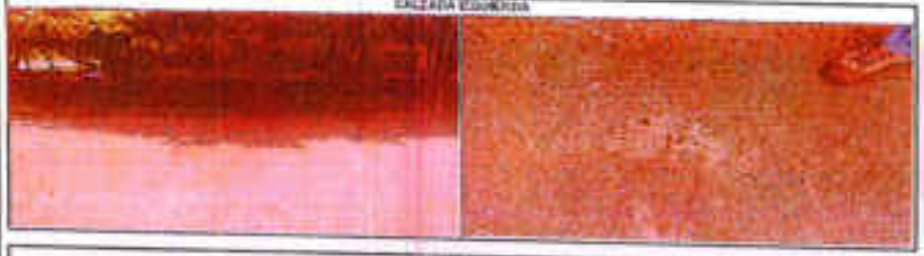

ESPECIALES



CALZADA DERECHA



PUDOS

OTROS

OBSERVACIONES: Anexo lo relacionado en seguimiento y/o cierre

De evidencia dispuesto en las placas de concreto y nuevas

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT

Representante de la Comunidad
Nombre:

Representante Legal Interventoría
Nombre:

Representante Legal Contratista
Nombre:

Imprimir Archivo en Tamaño Oficio
Hacer Contenido Imprimible Rotando

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 1

Página	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	

FECHA: DD 20 MM 03 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 031-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-MPIO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLANO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



BOCAS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir a reverso el seguimiento en caso

Se evidencia ubicación en las placas de concreto, huellas y contenidos
Se evidencia fisura transversal en la placa contenido izquierdo

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: DE CLIC CONSTANCIA SUB I O CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad
Nombre
C.C. D.N.T

Representante Contratista de obra
Nombre DIEGO REY

Representante Interventoría

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Interventoría, Supervisor, Propietario

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAO ACTA DE ESTIIUCTURA VIAL SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CODIGO:	FOR-PROY-042
		VERSION:	01
		REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 1

PAGINA	1	DE	1				
Inicial		Siguiente		Ultima			

FECHA: DD 23 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 002-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 001-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO YID FIJADO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



CARRILES

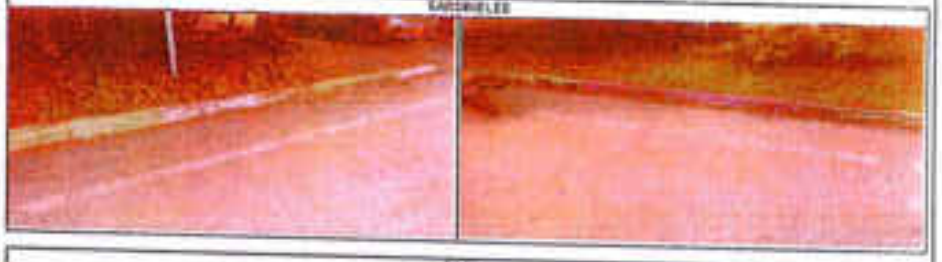

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Durante la verificación de la obra ejecutada ya cumple

En evidencia ubicación en los planos de cuneta, sumidero y bordillos
En evidencia funcionamiento en los planos cortados diariamente

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD.

NOTA: [illegible]

FIRMAS

Firma Representante de la Comunidad
NOMBRE
C.C. O NIT

Representante de la Interventoría
Nombre: [illegible]

Representante de la Contratista
Nombre: [illegible]

Supervisor Acueducto y Alcantarillado
Nombre: [illegible]

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/08/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA Nº: 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 510-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-021-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 517-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-021-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Prelal | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 26 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA PAVIMENTADA EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES

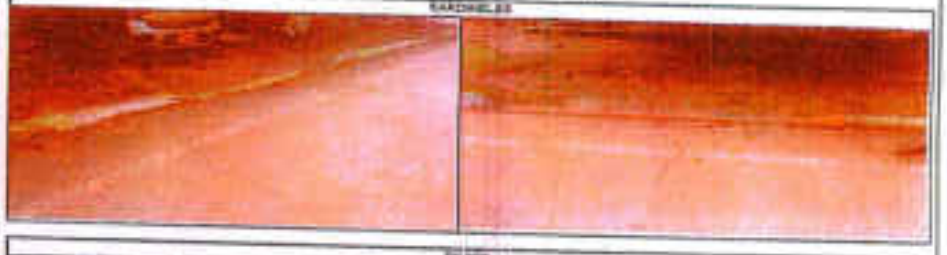

CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente a el seguimiento y/o cierre

Se evidencia ranguera en las placas de concreto, tuberias y cordones
Se evidencia fisura horizontal en ambas placas

OTROS

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS:

Nombre: [illegible]
Cargo: Residente SSTA de la Interventoria
Firma:
C.C. O NIT:

Nombre: [illegible]
Cargo: Residente SSTA del Contratista
Firma:

Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Firma:

Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Firma:

Original Propiedad de Synergia Construcciones
Todos Derechos Reservados

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-043
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 4

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 033-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPO-III-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

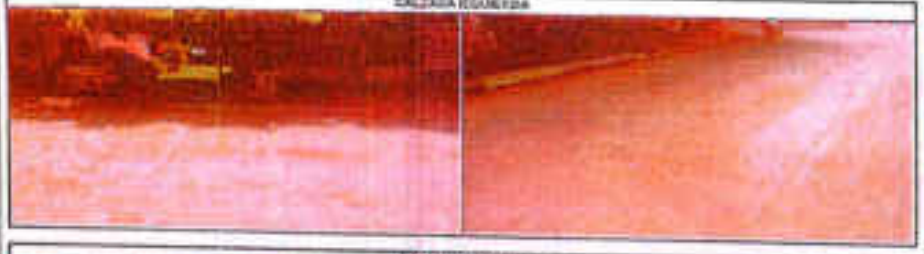

BARRIALES

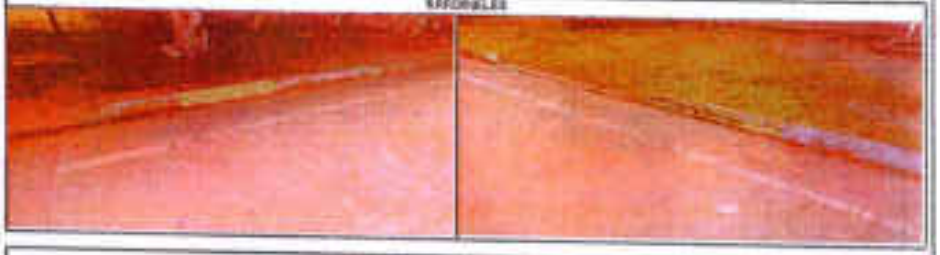

CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES: Escribir lo ocurrido al diligenciar el acta

Se evidencia ubicación en las abras de concreto y cunetas
Se evidencia humectación en placa huellas derecha

SITIOS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: [illegible]

FIRMAS

Nombre: [illegible]
Cargo: Representante de la comunidad
C.C. [illegible]

Nombre: [illegible]

Nombre: [illegible]

Nombre: [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Contratista Interventoría, Propietario

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA Nº: 37

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 002-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº SIT-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-011-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER SIT ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO XIII FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA DERECHA





CALZADA DERECHA





CARRILES





POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la referencia al requerimiento y/o cierre

Se evidencia ubicación en las progs de inicio y cierre
Se evidencia funcionamiento en obra cuando aplica

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT

Nombre

Nombre

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PEG1-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2023

ACTA N°: 33

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Siguiente		Cierre	
FECHA					
DD 20	MM 05	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° XXX-2023 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CARANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRAFICO TIO FILANCO EN REDES MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CARANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES

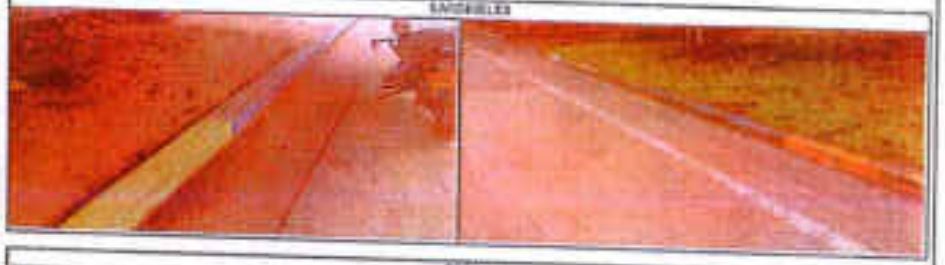

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

Se evidencia ausencia en las obras de sumideros y cunetas

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTATIVO DE LA COMUNIDAD

NOTA: [illegible]

FIRMAS

Henry Valderrama
Firma Representante de la Comunidad
NOMBRE
C.C. O NIT

Firma Representante Interventoría
NOMBRE

Firma Representante Contratista
NOMBRE

Firma Representante Contratista
NOMBRE

Digital Archivo de Obras por Contrato
Open Contratos Interventoría Proyectos

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA: 1 DE 7	

ACTA N°: 07

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA PUBLICA EN VIDEO MAGNETICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



CANALES



CALZADA DERECHA

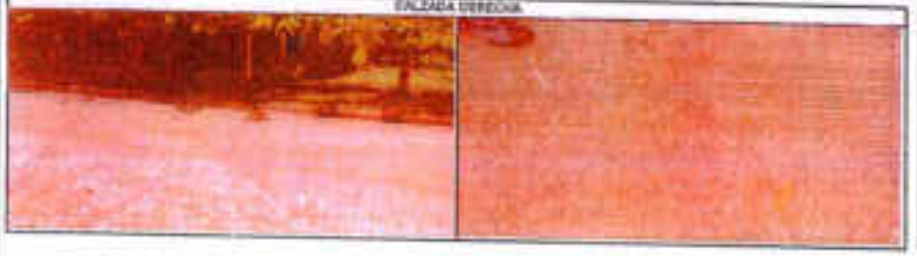

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

No evidencia dumping en las zonas de concreto y cunetas
No evidencia fisura transversal en zona concreto derecha

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD.

Nota: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Entidad Contratante Supervisor

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAO	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 13

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023	PROYECTO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	PAGINA:	1	DE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.		Inicial	Siguientes		Ultima
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		FECHA:			
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD: 10	MM: 03	AA: 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO YIO PLANOS EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



BARRIELES



CALZADA DERECHA

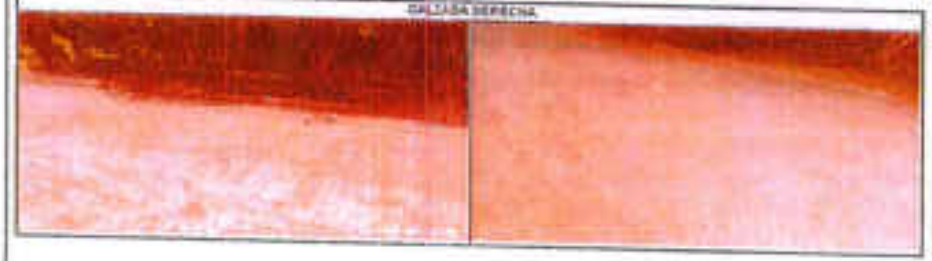

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Durante la ejecución de actividades no se evidencia

No evidencia ocupara en los predios de servicios y aceras

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO REGISTRADO EN LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: [illegible]
C.C. O NIT

Representante de la Comunidad
Nombre: [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Supervisión, Interventoría, Propietario

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 37

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Siguiente		Cierre

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 042 2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 057-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-057-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO DEL ORIENTE S.A.S.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO EN FORMATO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

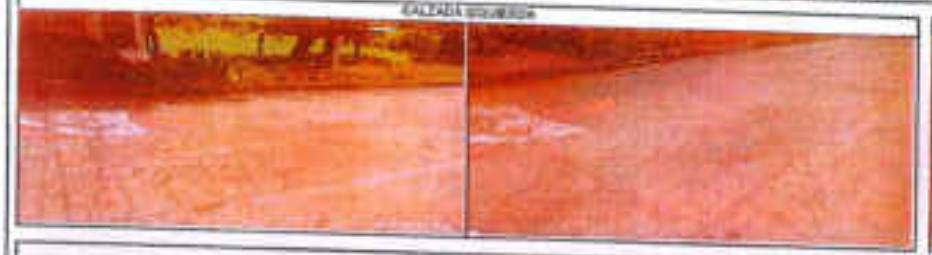

BARRANDILLA

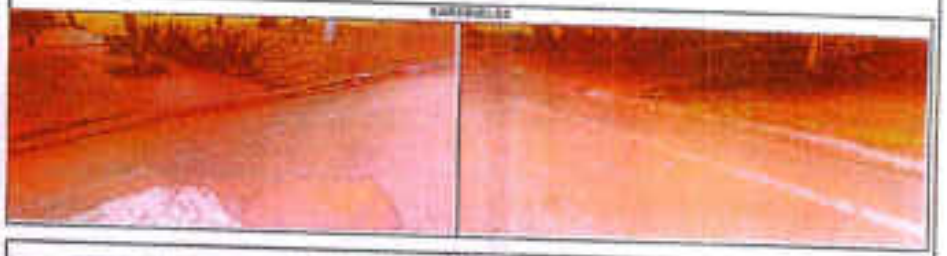

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS



OBSERVACIONES: Dentro la intervenia al siguiente sin novedad

Se evidencia progreso en las obras de cerramiento y cunetas
Se evidencia poste de alumbrado público instalado al costado derecho

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SI TIENE OBSERVACIÓN, SUS LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE NO ES CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad
Nombre
C.C.

Representante de la Interventoría
Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Supervisor, Interventor, Residente

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAG	CODIGO:	FOR-PYDV-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/08/2023

ACTA Nº: 35

PAGINA:	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 22 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 033-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-031-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 017-2020 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROCESO Nº ACUA-SPPD-001-2020

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA PUBLICA EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

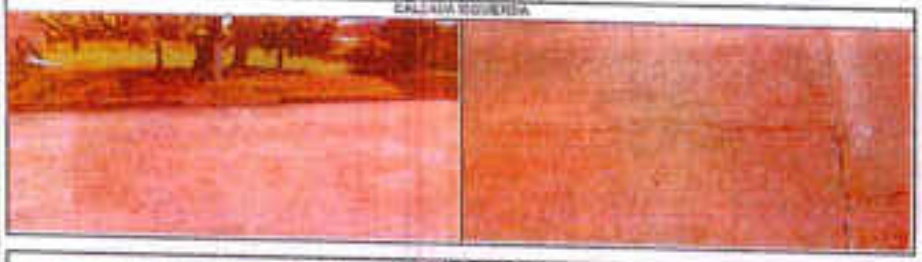

CUNETAS



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante en seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO ESCRITO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad

Nombre:
C.C.

Firma Representante Interventoría

Nombre:

Firma Representante Contratista

Nombre:

Página 1 de 1
Copia Controlada Sinergia Synergia

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 35

# ACTA	1	DE	1		
Inicial		Siguiente		Corte	
FECHA					
DD	20	MM	07	AA	2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° XXX-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° EST-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO DEL ORIENTE S.G.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLANO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



ESTABILIZ



CALZADA DERECHA



POZO

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la referencia al seguimiento y/o corte

En ocasiones ubicamos en los planos de topografia y suministro

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: [illegible]

FIRMAS

Nombre:
C.C.

Nombre: DIEGO PEREZ

Nombre:

Original: Archivo de Gestión de Calidad
Control: Formatos Sistemas Proceso

SINERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST/AQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 14

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Siguiente		Cierre	

FECHA: DD 30 MM 07 AA 24

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 010-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPI-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 017-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRS-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTEN DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO 100 PESEO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

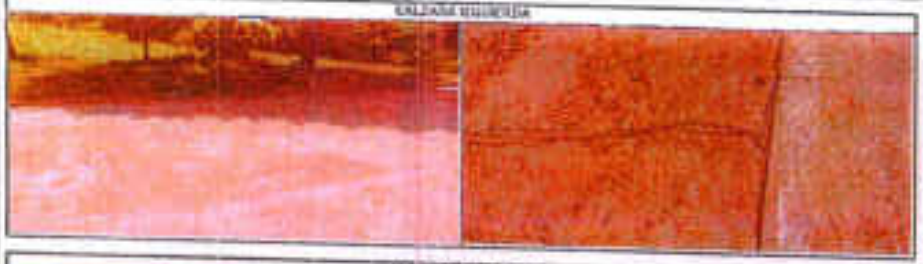

BARDILLES



CALZADA DERECHA



POZOS



OBSERVACIONES: Explicar la relación al requerimiento y/o daño

De manera dosificada en las áreas de concreto y cunetas.
De manera horizontal de 8 cm de ancho en placa existente, capacho y 2 hiladas horizontal en pleno concreto dentro de 1 cm de ancho

TITULO



"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: NO SE LA CONSTRUCCION AUN LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA NO CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Residente de la Interventoria

Nombre:
C.C.

Representante de la comunidad

Nombre:

Representante de la Interventoria

Nombre:

Representante del Contratista

Nombre:

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

354

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 37

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPS-031-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-061-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO FLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJOMAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


Fecha: DD 28 MM 07 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA PLANO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO FLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJOMAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

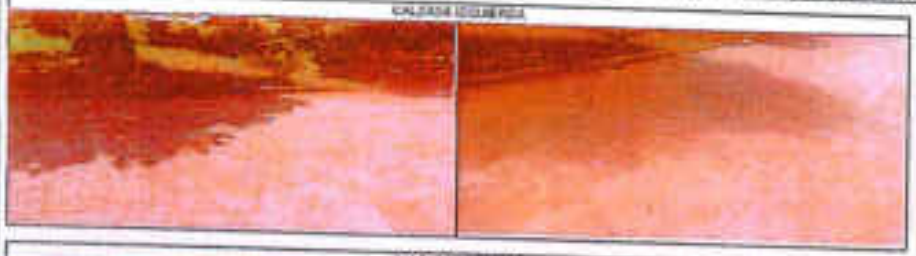

CANALIZACIÓN

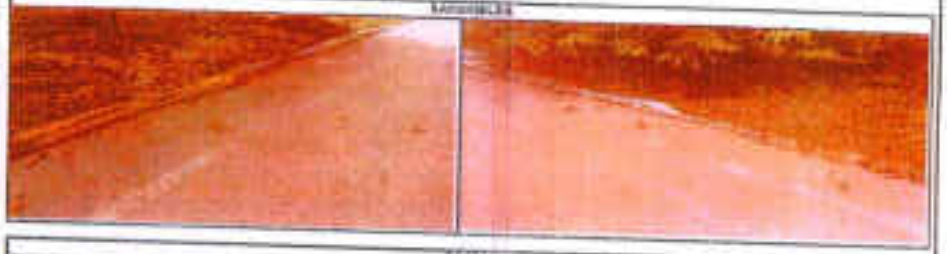

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Describir relevante el mantenimiento y/o obra

Se entrega limpieza en las placas de concreto, cunetas y alrededor

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE HIZA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Yesenia Valbuena
Cargo: Profesional Social de la Interventoria
C.C. o NIT:

Nombre: Diego Perez
Representante de la Comunidad

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Archivo Interventoría Municipal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAO	CODIGO:	FOR-PROY-043
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 019-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2020 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 30 MM 07 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ENTRADA IZQUIERDA



CARRILES



ENTRADA DERECHA

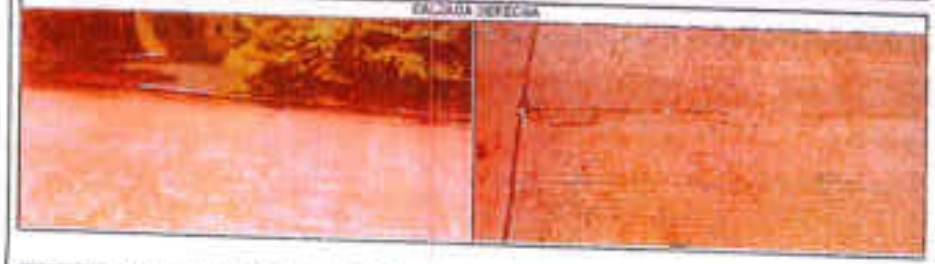

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Brindar la referencia al siguiente de y la vista

En evidencia ubicamos en las obras de concreto y cunetas
En evidencia fisuras longitudinal
Y la evidencia fisuras de cunetas

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: [illegible]

FIRMAS

Nombre:
C.C.

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO [illegible]

Digital: Firma de forma autógrafa
Copia: Controlar Original: Archivo

361

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 12

PAGINA:	1	DE	1
Inicial	Siguiente	Curte	

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 910-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 917-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



CANCHELES



CALZADA DERECHA



PODAS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo ocurrido y el requerimiento y/o causa

Se evidencia ubicación en las obras de concreto y cunetas

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DILIGENCIARÁ [illegible] SE ENCUENTRE EN LA PRIMERA ACTA ANTES DE INICIAR LA OBRA

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad
Nombre:
C.C.

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Residente Obra Interventoría
Nombre:

Residente Obra Contratista
Nombre:

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Propietario

362

ENERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-FTIQY-043
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2023

ACTA N°: 03

PASIVA	X	SE	X		
Rural	Sagamarito	Centro			

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPG-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSATER DEL ORIENTE S.S.

PROYECTO


CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA PUBLICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

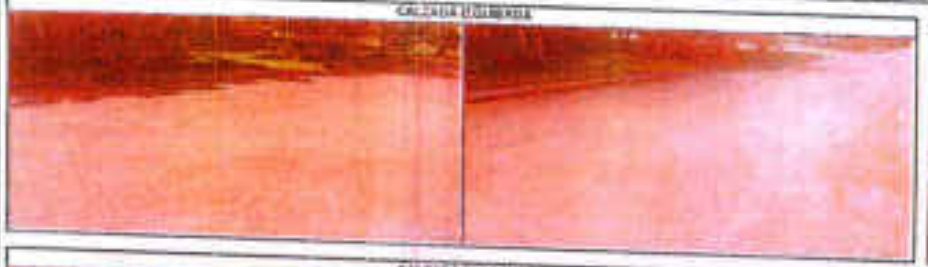

BARANDAS



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la ocurrencia del seguimiento y/o visita

Se evidencia ubicación de las obras de concreto e hierros

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

FIRMAS

Nombre
C.C.

Representante del Contratista
Nombre:

Representante de la Interventoría

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Contratista, Interventor, Supervisor

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR.PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA: 1 DE 1	

ACTA Nº: 20

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 043-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-051-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-051-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSARTER DEL ORIENTE S.A.S.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Corte
X		


FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

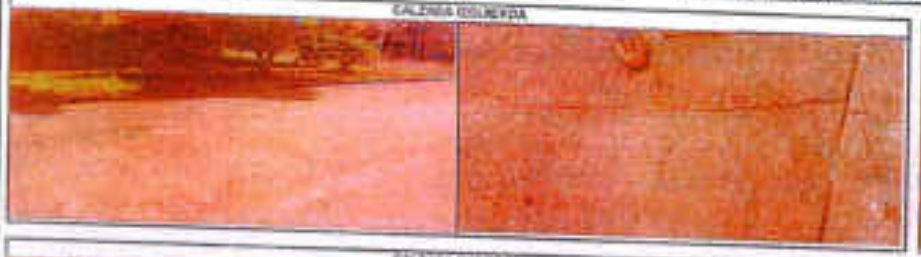

ESPACIALES

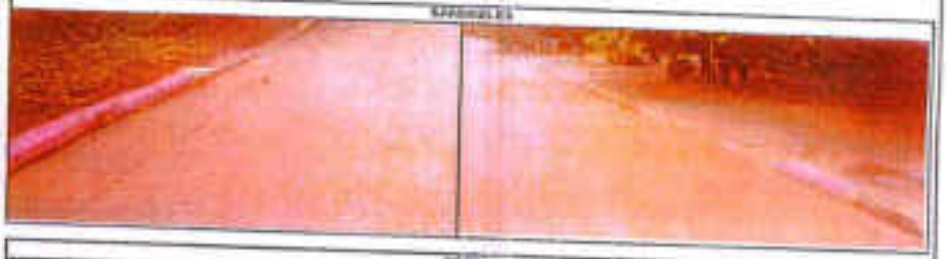

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la referencia del registrado y/o copia

Se evidencia ubicación en las abscisas de inicio y cumbre
Se evidencia Pozos Caracterizados en ambos planos de 2.5 MR de la vía

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ALCANCE GARANTIZO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO EXAMINADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT

Original: Archivo de Gestión en Comas
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 22


CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-031-2023	PROYECTO	Pagina: 1 de 1	
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial: Esporadico: Cierre:	
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 017-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPMO-001-2023		FECHA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE E.U.		DD: 25 MM: 07 AA: 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

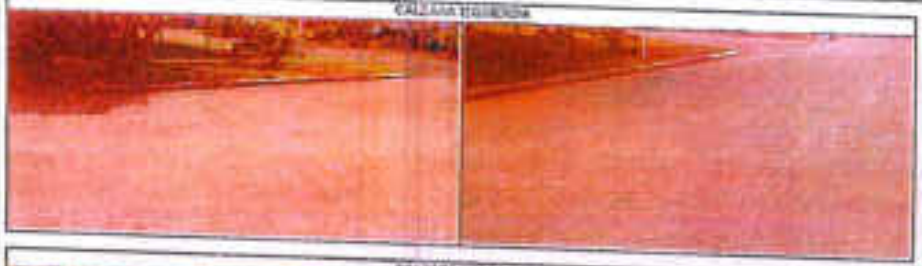

BARRANDILLES



CALZADA DERECHA



PUCOS

OTROS

OBSERVACIONES: Seleccione la opción en el siguiente recuadro con una (X):

En el presente despacho no hay glosas de ejecución y cuentas
En el presente Acta de Visita no se anexa ningún documento

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DA A CONOCER QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA ES EXCLUSIVO PARA LA AUDITORIA

FIRMAS

Firma Representante de la empresa

Nombre:
C.C. O NIT:

Firma:
Nombre: DIEGO PEREZ

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventoría, Planeación

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAG

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO	FOS-PROY-042
VERSION	01
REVISION	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 34

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUEJSPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AGUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA: DD 26 MM 01 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLANO EN MEDIO MAGNÉTICO

META: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES

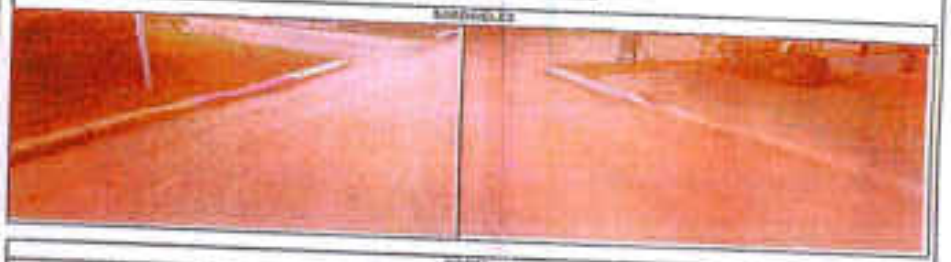

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la relación al siguiente ítem y cierre

Se evidencia ubicación en los planos de diseños, cotidad y coordenadas

EL ACTA SERÁ SUSCRITA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE HACE CONSTANCIA QUE LOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la Comunidad
Nombre:
C.C. o NIT

Representante del Contratista
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Representante de la Comunidad
Nombre:

Digitally signed by Diana Lee Gomez
Date: 2024.01.26 16:39:57 -05'00'

SINERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST/AQ	CODIGO:	FOR-FRDY-642
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 12

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-031-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2020 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2020

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSTRUIR DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Pagina	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA


DD	30	MM	01	AA	24

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA izquierda

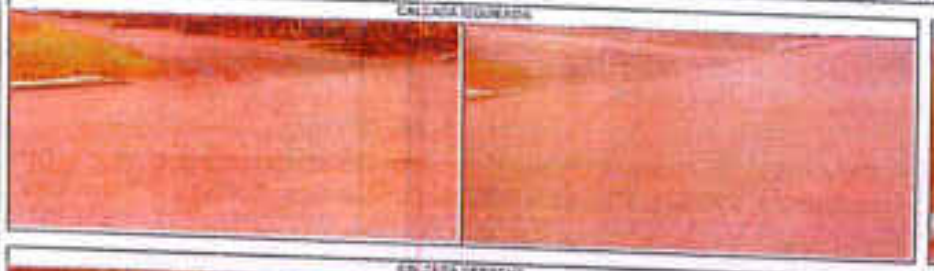

SARDINELES

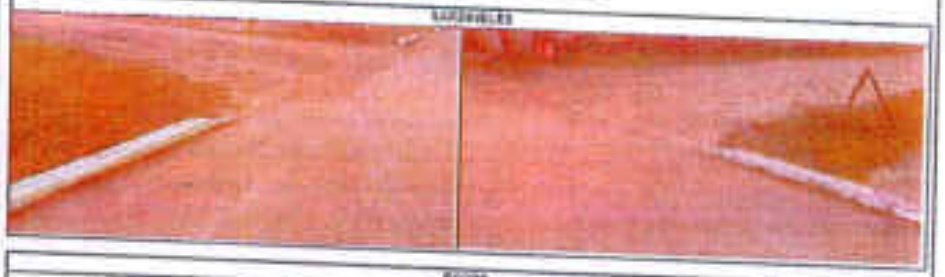

CALZADA derecha



PEDOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la novedad si requiere más de una

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, asfaltico y cerámica
Ausencia de señalización en las curvas de la intersección

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Nota: SE DA LA CONFORMIDAD EN LA PRESENTE FE, NO SE CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Yeiner Yo Nuevo
C.C. 12.345

Representante Interventoría
Nombre: DARES PEREZ

Representante de la comunidad
Nombre: Jorge Eliécer Hernández Lopez

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Propietario

369

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYMERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO	FOR-PEDY-042
VERSION:	03
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 de 1

ACTA Nº: 12

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 310-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-051-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYMERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-051-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ARIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE Casanare

Inicial | Siguiente | Cierre

FECHA: DD 30 MM 01 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO 100 FOLIOS EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS



OBSERVACIONES: Escribir lo faltante si requiere y/o cierre

Se evidencia instalación en los pilotes de concreto, tuberías y cerramiento
Se evidencia fisuras en la losa del pozo existente, a la vez, la placa del pozo está fundida

OTROS:

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD.

FIRMAS:

Nombre:
CC O NIT

Representante de la Comunidad de Obra
Nombre: DIEGO

Residente de Interventoría
Nombre: Fabian Lopez

Residente de Obra
Nombre:

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Propietario

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO	FOR-PROY-042
VERSION	01
REVISION	17/05/2023

ACTA Nº: 13

PAGINA	1	DE	1
Anual	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 30 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 002-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 007-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJORAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO TIPO PLUVIAL EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJORAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA DERECHA





BANQUETAS





CALZADA IZQUIERDA





POZOS





OBSERVACIONES: Escribir la novedad si aplica en el acta anterior

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y cordones
Se evidencia fisura en capa de rodadura en el sentido longitudinal
Se evidencia fisura horizontal de 1 cm de ancho en la placa costado izquierdo
Se evidencia fisura transversal de 2 cm en la placa costado derecha
Se evidencia fisura de borde en la placa costado derecho
Se evidencia fisura longitudinal en la placa costado derecho

OTROS

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde a la realidad

FIRMAS

Nombre
C.C. Nº

Nombre

Nombre

Nombre

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&A

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 12

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA

DIA	MES	AÑO
30	05	2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSERTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FALLAS EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

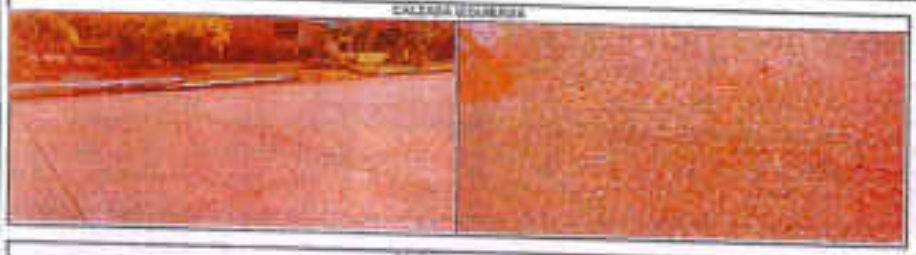

CARRILES

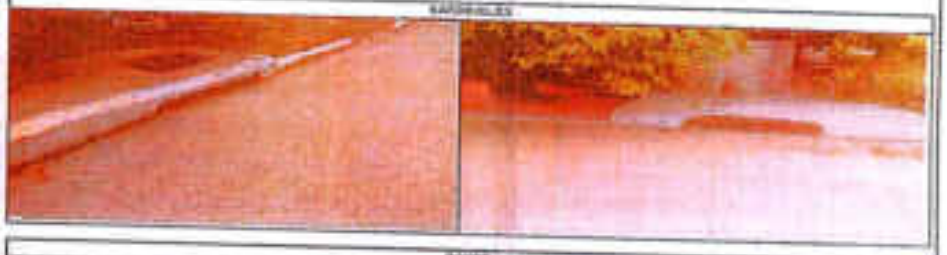

CALZADA DERECHA



ACCESO

BERMA



OBSERVACIONES: Escribir la ubicación de cada fotografía y/o daño

Se evidencia inseguridad en los planos de concreto, sumideros y cunetones
Se evidencia fisura transversal de 2.5 cm de ancho en ambos planos
Se evidencia sumidero longitudinal cercano accidental del acero de refuerzo en la cuneta, adicional, el acero no refuerzo de la losa está expuesto
Se evidencia que el acero de refuerzo en la cercanía del sumidero longitudinal cercano derecho está expuesto y en mutilo corrosivamos
Asentamiento de cemento en los cunetones de la intersección

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD.

NOTA: SE TOMA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA LLEVA IMPLÍCITO LA VERACIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad
Nombre:
C.C.

Representante del Contratista
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Supervisor
Nombre:

Digital: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Supervisor, Interventor, Residente

036

SINERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAD

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PECY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/11/2023

ACTA N°: 4

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 23 MM 05 AA 24

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 010-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPCO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRC-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTOR DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL A..CANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJOBRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO NO PUBLICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJOBRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

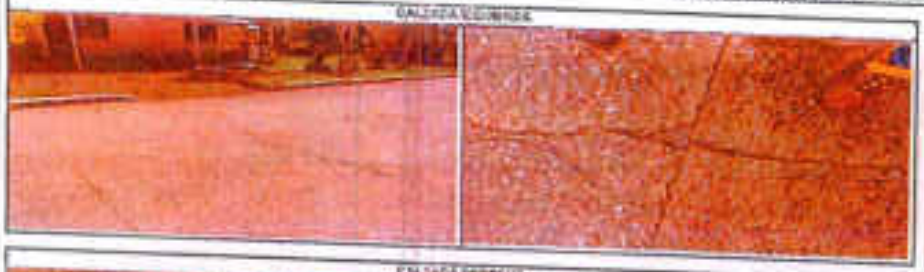

BARRANDILLO

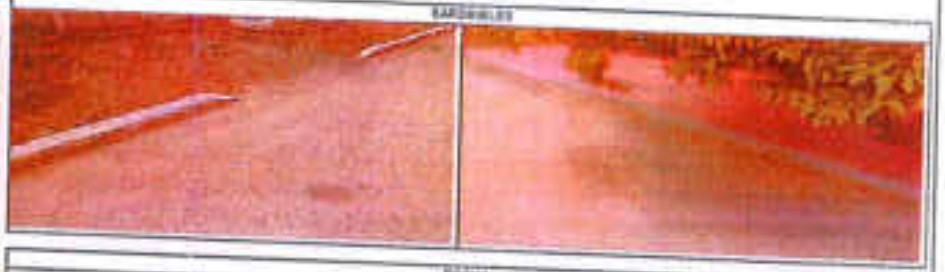

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

CONSIDERACIONES: Escribir las novedades del seguimiento y/o cierre

Se evidencia obstáculo en las zonas de cunetas, sardinel y andenes
Se evidencia fisura transversal de 0.2 cm de ancho en ambas zonas
Se evidencia fisura de borde en la placa costado izquierdo

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: EL ITEM DE CONSTRUCCIÓN QUE SE CONSIGNARA EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REAL EJECUTADA

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad

TESTIGO
C.C.

Firma Representante de la Interventoria
Nombre

Firma Representante del Contratista
Nombre

Firma Representante Entidad Contratante
Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Supervisor

SINERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA Nº 06

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 032-2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 PROCESO Nº ADIA-SPG-031-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO Nº ADIA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSISTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


FECHA					
DD	26	MM	03	AA	2024
Inicial		Seguimiento		Cierre	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO En medio magnético

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

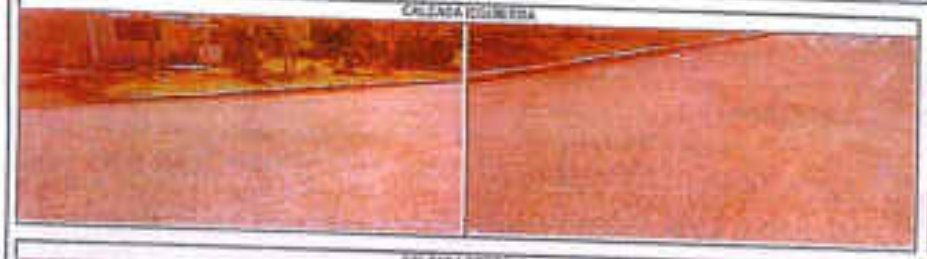

SUMIDEROS



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al cumplimiento y/o cierre

En evidencia adjunto en las planillas de controles mensuales y cotidianos

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Residente de Obra

C.C.

Representante de la Comunidad

Nombre

Interventoría

Supervisor

Representante Legal

Synergia Construcciones e Ingeniería S.A.S.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAO	CODIGO:	FOR-PRGY-043
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 01

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Siguiente		Cierre	
FECHA					
DD 26	MM 05	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 038-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-M1-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 031-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-M1-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO DEL ORIENTE S.M.

PROYECTO


CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

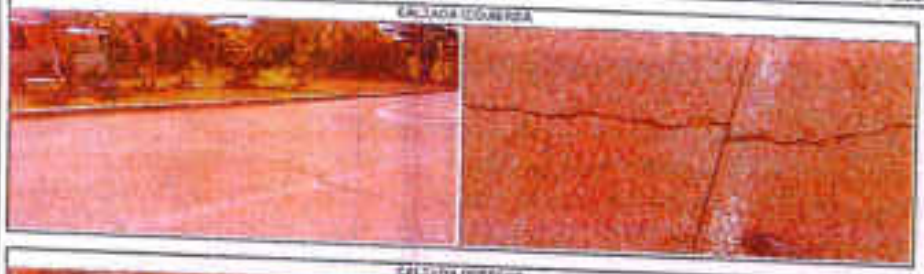

CARCABLES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES: Escribir la observación del registro fotográfico

De evidencia seguirá en las obras de concreto, cunetas y cordones
De evidencia hasta barrios mal de 4 con de pavim en ambas placas

OTROS

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT

Nombre: DIEGO BAEZ

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO	FOR-PROY-043
VERSION	01
REVISION	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA	DD: 30 MM: 01 AA: 2024

ACTA N°: 30

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPG-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNETICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA





ANDENES





CALZADA DERECHA





POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al requerimiento (Si aplica)

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, bordes y sardineles
Se evidencia fisura transversal de 1.5 cm de ancho en placa costado derecho
Se evidencia fisura transversal en placa costado izquierdo

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT

Nombre

Nombre

Nombre

SINERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAD

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	POR-PECY-643
VERSION:	01
REVISION:	17/05/2023

Pagina	1	de	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 20 Mes 05 AA 2024

ACTA Nº: 23

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 031-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-031-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-101-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA PÚBLICA EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA DERECHA



CALZADA IZQUIERDA



ANDENES

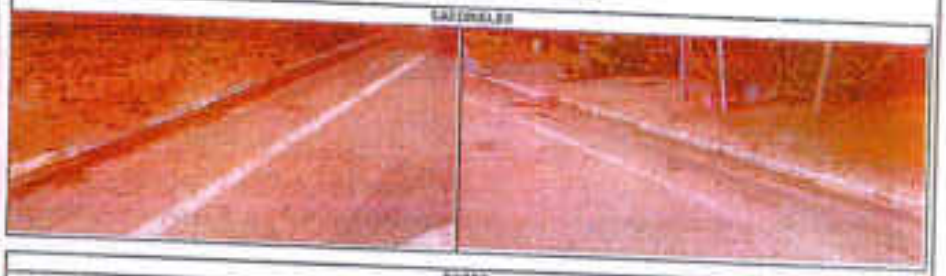

POZOS

OTROS

Se evidencia daño(s) en las placas de concreto, cunetas y sardineles

Se evidencia fisura transversal de 3 cm de ancho en placa costado izquierdo, abertura, se evidencia fisura longitudinal
Se evidencia fisura transversal de 2.5 cm de ancho en placa costado derecho, abertura, se evidencia fisura longitudinal

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE TOMA CONFORMAL CUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT

Firma: Representante de la Comunidad

Nombre: DIEGO PEREZ

Firma: Representante de la Interventoría

Firma: Representante del Contratista

Digital Acting de Gabon del Contrato
Planta Centralizada Integrada Planchón

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2023

ACTA Nº: 04

Página	1	de	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 30 MM 03 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 010-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 017-2022 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO VIO PLANO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

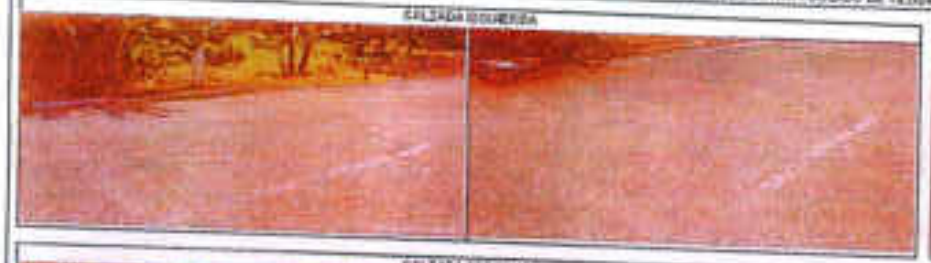

BARRENOS

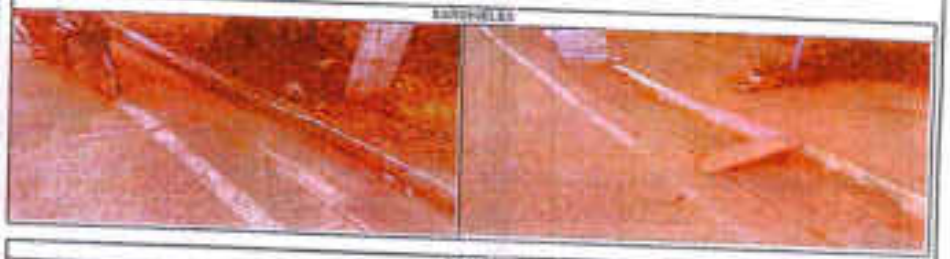

CALZADA DERECHA



AGOS

OBSERVACIONES: Escriba la solución al requerimiento o/o cierre

Se evidencia cargado en las placas de concreto, conatil y cabezotes
Se evidencia fisura inconcluida de 4 cm de ancho en ambas placas
Se evidencia diaclasamiento en la placa contado izquierda

GRIETAS

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Representante de la Comunidad
Identidad
C.C. El Nº

Nombre: Residente de Interventoría
Identidad: 1.098.[illegible]

Nombre: Residente de Obra
Identidad

Nombre: José M.
Identidad

346

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAO

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2023
PAGINA	1 DE 1
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA	DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA Nº: ____

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 033-2023 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPG-MC-2023

CONTRATISTA E OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRD-021-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTOR DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO YO FAMED EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

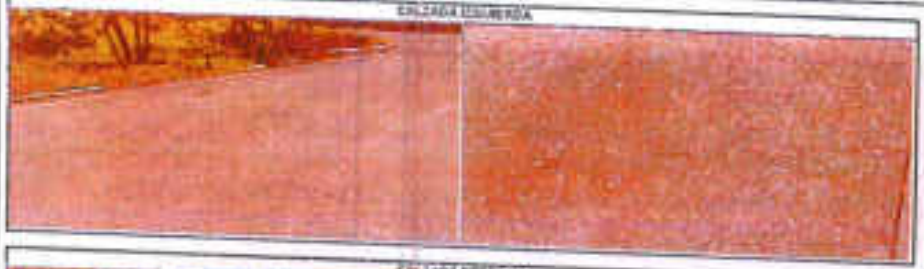


BARDAS





CALZADA DERECHA

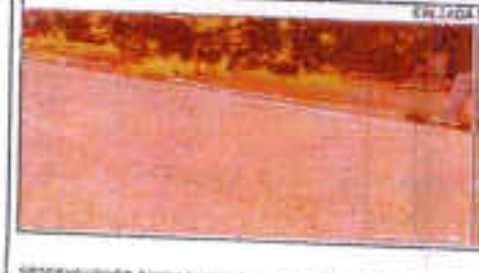



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Basado en lo anterior se registran las siguientes novedades:

En nuestras imágenes se evidencia el cierre de la vía por la construcción de la alcantarilla.

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: ES DE LA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la Comunidad
Nombre
C.C. ó NIT

Original: Archivo de Gestor del Contrato
Copias: Residente, Interventor, Propietario

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
Nombre DIEGO PEREZ

REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 030-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 031-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FASE(S)		DE	
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DIA 26 MES 07 AÑO 2023

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA




SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

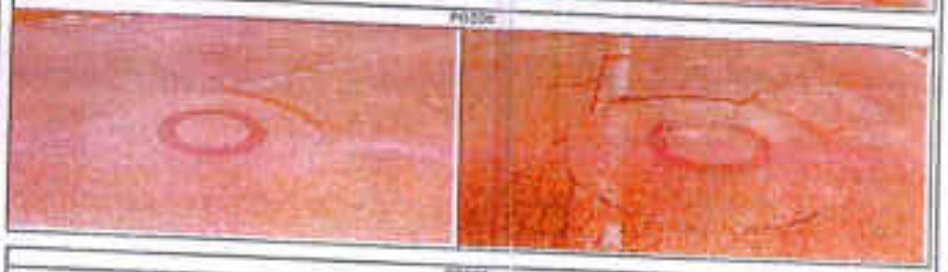

OBSERVACIONES: Escribir lo relacionado al seguimiento y/o cierre

Se evidencia riostra en los pozos de visitas, cunetas y sardineles
Se evidencia fisuramiento en la placa del pozo
Se evidencia fisuras tipo mapeo de 5 cm de espesor en ambas placas

OTROS:

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJAN CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Yasmira Valderrama
Firma Representante de la Comunidad

Nombre:
C.C. O NIT:

Representante Legal o Delegado
Nombre: DIEGO PEREZ

Firma

Nombre

Firma

Nombre

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAO	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/08/2022

ACTA Nº: 004


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 037-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	Folio/Hoja	1 de 102
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TELODRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial	Seguimiento / Cierre
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPRS-001-2023		FECHA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE S.A.		DD 26	MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TELODRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

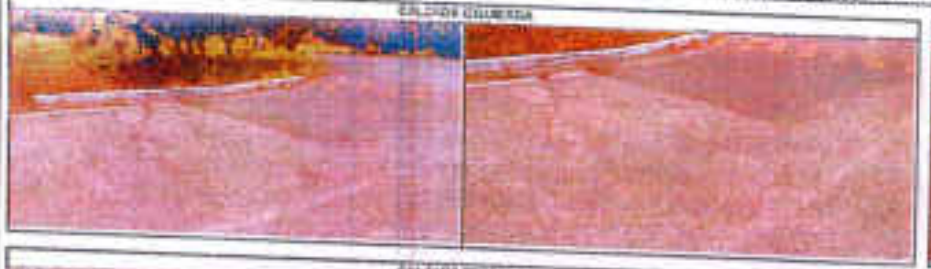


CALZADA DERECHA

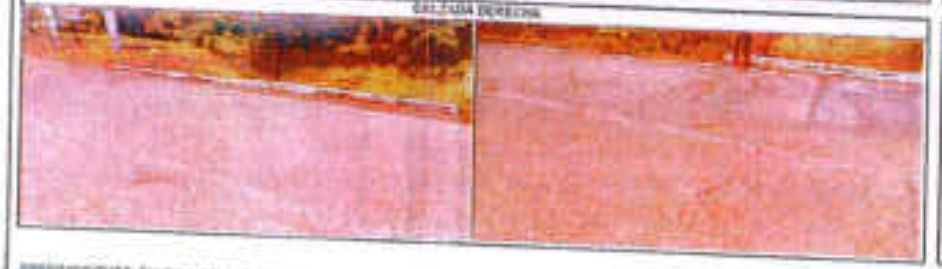

CUNETAS



CAÑUELAS

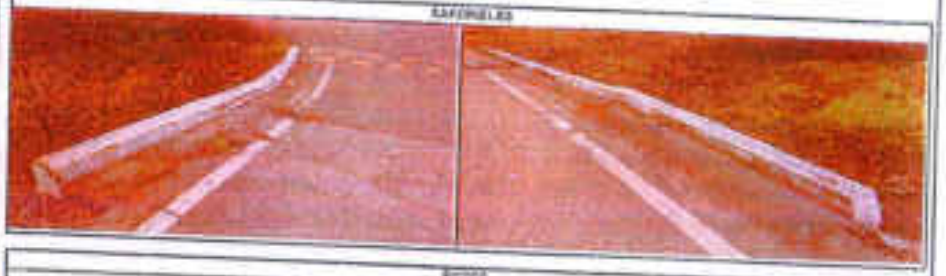

POZOS

OBSERVACIONES: Describir la situación encontrada por cuarto.

Se evidencia desgaste en las orillas de cunetas, cunetas y sumideros
Se evidencia fisura tipo cuarteo en la placa costado izquierdo
Se evidencia fisura longitudinal en la placa costado derecha
Se evidencia hundimiento en la cuneta costado derecho
Se evidencia fisuras en las aletas de la alcantarilla existente
Se evidencia fisuras en el empalme de las rectas de la alcantarilla existente

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SI HUBO CONTAMINACIÓN DE LA CONSIGNADA EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Mauricio Hernandez
Entidad: Residente de la comunidad
C.C. 12 647

Representante Legal Contratista
Nombre: LUIS CARLOS

Representante Legal Interventoria
Nombre: Jaime Rojas Lopez

Supervisor
Nombre: Jaime Rojas Lopez

Original: Sistema de Gestión en Calidad
Copias: Contratista, Interventoria, Supervisor

349

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAO

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/11/2022

ACTA Nº: 32

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 032-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPS-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


FECHA		
DD	MM	AA
30	01	2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA PAVIMENTO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



CALZADA DERECHA







POZOS

OTROS

CALIFICACIÓN: Bueno la calzada el izquierdo en corte

Se evidencia fisuras transversal en la placa costado derecho

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SI ALGO CONTRARIO A LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
CC O NIT

Nombre:

Nombre:

Nombre:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q	CODIGO:	FOR-PROY-043
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº 22

PAGINA	1	DE	1		
Anual		Seguimiento		Cierre	

FECHA: DIA 03 MES [illegible] AÑO 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRED-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTOR DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

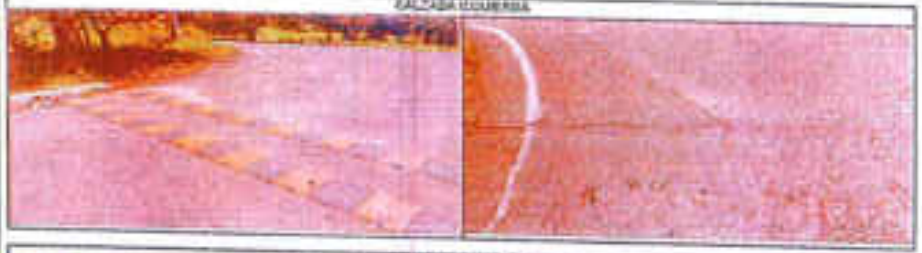

CALZADA DERECHA

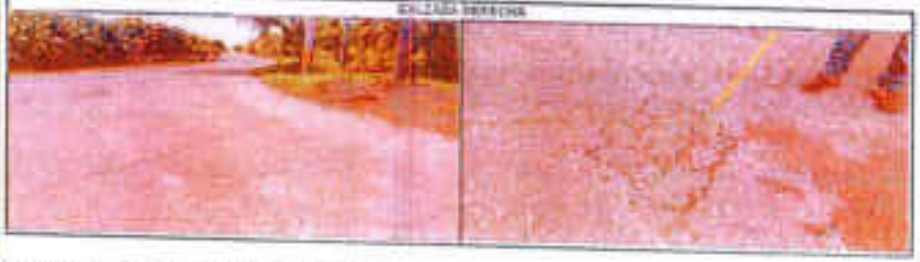

SARDINELES

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escriba lo relevante al seguimiento y/o cierre

Se evidencia fisura transversal y longitudinal en la capa de sellado
Se evidencia fisura piel de cocodrilo en la capa de sellado

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SI DEJA CONSTANCIA QUE LE CORresponde en la presente acta corresponde a la realidad

FIRMAS

Nombre:
C.C.
Rol: Representante de la comunidad

Nombre:
Representante del contratista Obra

Nombre:
Representante de la Interventoria

Original: Archivo en Integral con Carpetas
Copia: Contratista, Interventor, Propietario

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Yopal, 20 de Junio del 2024

OF-PROY-TIL

Señora:
MARINA VALDERRAMA
PRESIDENTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL - TILODIRÁN

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ACTA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA ALTERNA TRÁFICO PESADO.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega de una copia al acta del estado actual realizada a la vía que será utilizada como ruta alterna del tráfico pesado según Resolución N° 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Anexo: 11 folios

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA Nº: 1 (2) FINAL

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
Pagina	1 de 1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 10 MM 05 AA 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 033-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.S.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VIA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario _____

Cédula de Ciudadanía _____

Dirección _____

Teléfono _____

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN No. de piso: _____ Barrio: _____

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Teléfono	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES: _____

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plana ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Minero	☐

ACUEDUCTOS VECINALES: Cerca SI ☐ NO ☐ Uso en el predio

11. Minero ☐

12. Otro

3. ESTADO DE LA ESTRUCTURA ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	LOSA DE CONCRETO	SARDINELES	SIAMESAS	POZOS	ALCANTARILLA	BOX COULVERT	OTROS
1. GRIETAS Y FISURAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. TIPO DE FALLA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
OBSERVACIONES	Se evidencia levantamiento de los sellos de las juntas de dilatación en todas las placas de concreto, de igual manera, se evidencia desgaste en las placas de concreto	Se evidencia fisuras y desgaste en algunos sardinales	Se evidencia separación en las juntas de dilatación combinada con las placas de concreto	Se evidencia hundimiento en las placas de los pozos	Se evidencia fisuras y deterioro en la alcantarilla existente		Se evidencia desgaste y deterioro en los cunetones longitudinales existentes

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

PRESO


Nombre: _____
C.C. Nº _____

Representante de la Interventoría
Nombre: _____

Representante de la Contratista
Nombre: _____

Representante de la Comunidad
Nombre: _____
C.C. Nº _____

283

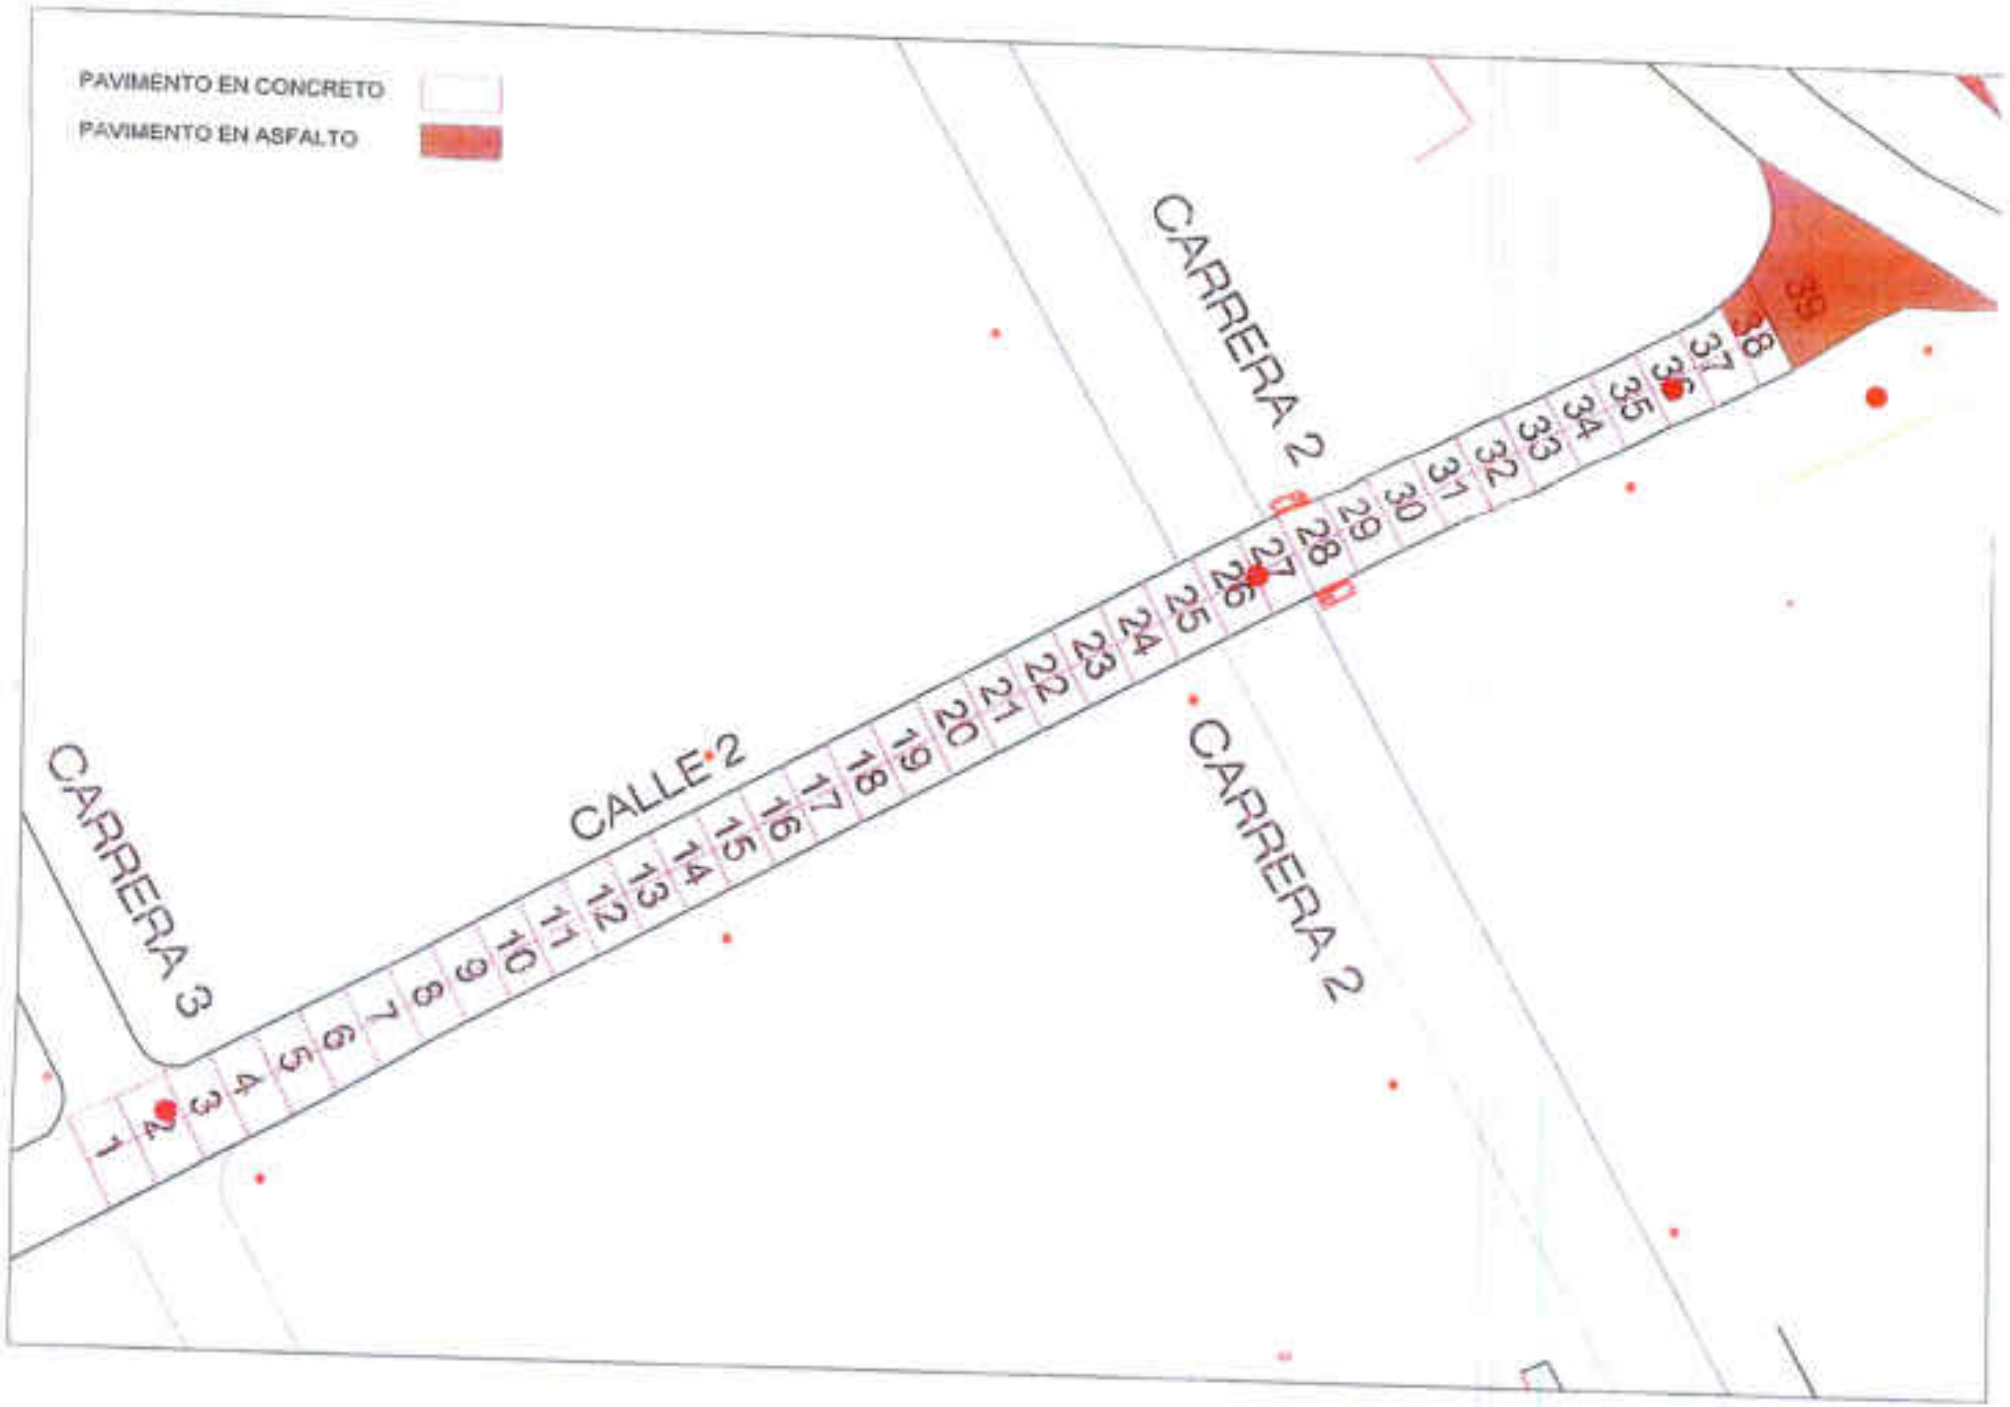
PAVIMENTO EN CONCRETO
PAVIMENTO EN ASFALTO
CARRERA 2
CARRERA 3
CALLE 2
CARRERA 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q	CODIGO:	FOR-FRDY-442
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/NOV/2022

ACTA N°: 1

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DIA 20	MES 05	AÑO 2023			

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



CAÑUELES



CALZADA DERECHA

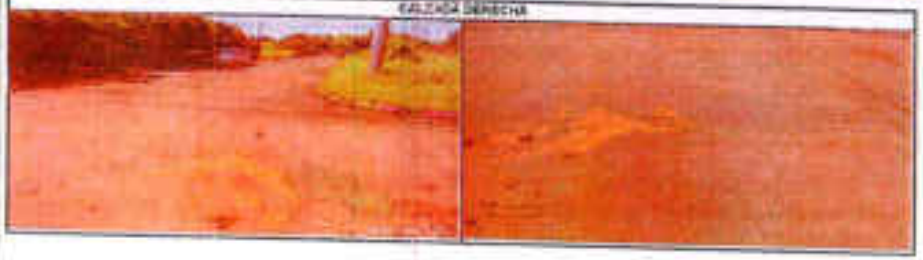

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo que sea necesario de seguimiento y/o cierre

Se evidencia ubicación en las planos de corredor, cunetas y canalizas

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS:

Firma Representante de la comunidad
Nombre:
C.C.

Representante de la Interventoría
Nombre: DIEGO FERRER

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre: José

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Carpeta proyecto Planeta

385

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA Nº 2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-031-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTEK DEL ORIENTE S.C.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHAS

DD 30 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN PLANO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



CUNETAS



CALZADA DERECHA

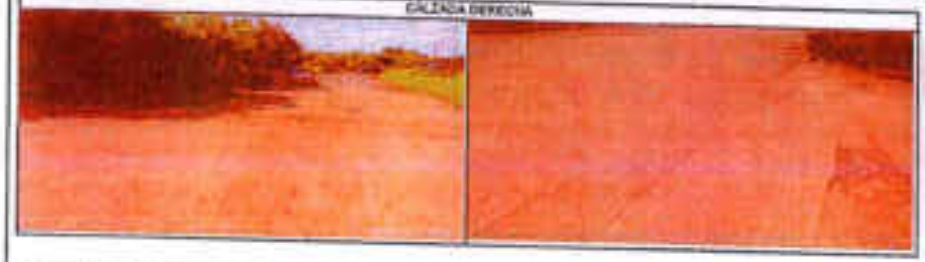

POZOS



OTROS

OBSERVACIONES: Describir la novedad al seguimiento y/o cierre

Se evidencia maleza en las placas de concreto, cunetas y cordilleras
Se evidencia la presencia de un pozo, el cual tiene la tapa fundida
Se evidencia fisura de borde en la placa izquierda

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJAN CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

Firmas

Nombre
C.C.

Representante de la comunidad
Nombre

Representante de la interventoría
Nombre

Representante del contratista
Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Gerencia, Interventor, Supervisor

356

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N° 5

Preliminar	1	DB	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 010-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 017-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: COVINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLANO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante del seguimiento y/o cierre

Se evidencia abogarte en los planes de seguridad durante y concluidos
Se evidencia falta de aseo en ambos planes

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD."

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la Comunidad
Nombre:
C.C.

Representante de la Interventoría
Nombre:

Representante del Contratista
Nombre:

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Contratista, Interventor, Propietario

384

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	07/10/2022
PAGINA	1 de 1

ACTA Nº: 4

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 010-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 017-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSAITER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA

DD	MM	AA
30	05	2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA PUBLICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



BARDINELES



CALZADA DERECHA

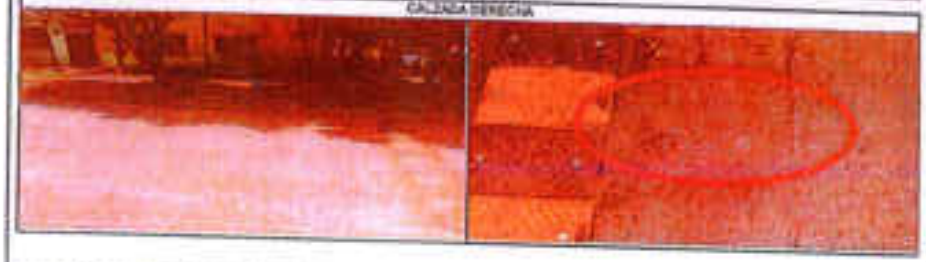

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Describir la ocurrencia al requerimiento y/o cierre

Se evidencia ocupación en los ejidos de concreto, cordón y sardinales
Se evidencia fisura longitudinal en la pleca costado derecho

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: EN CASO CONTRARIO, NO SE CONSIDERARÁ EN LA PRESENTE ACTA LA OBSERVACIÓN A LA REALIZAR

FIRMAS

Firma Representante de la Comunidad	Representante del Contratista de Obra	Representante de la Interventoría	Representante de la Entidad
Nombre:	Nombre:		
CC o NIT:			

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAQ	CODIGO:	FOR-FEO1-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº 2

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 20	MM 05	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 033-2023 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



BARANDILLES



CALZADA DERECHA

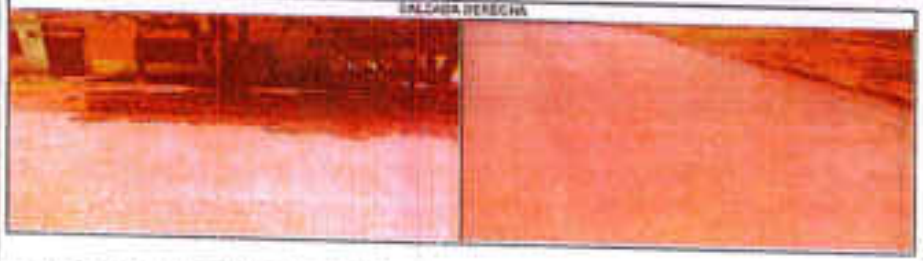

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

No se evidencia ninguna en las placas de concreto o aceras

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del contratista de obra
Nombre:

Representante de la interventoría

Representante Contratista Interventoría

Original: Reposa en Carpeta del Contrato
Copia: Residente, Interventor, Propietario

304

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



BARRERAS



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

Se evidencia cargada en las planas de carretes, cunetas y cordones
De evidencia fotos transversal en la plana contado izquierdo

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. 0 347

Digitally Signed by Gestión del Cambio
Date: 2024.05.20 10:59:40 -05'00'

Nombre: DIEGO

Nombre

Nombre

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO	FOR-PRGY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION	17/10/2023

ACTA Nº 7

Fecha	1	08	1		
Inicial		Siguiente		Cierre	

FECHA: DD 25 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA PUBLICA EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



CUNETAS

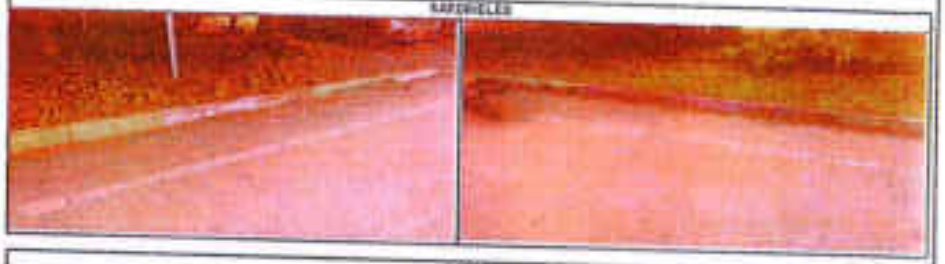

CALZADA DERECHA

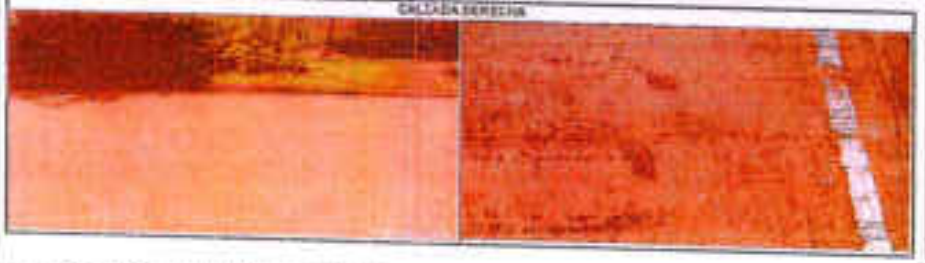

POZOS

OBSERVACIONES: Escribir la novedad del seguimiento y/o cierre

Se evidencia ubicación en las planas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia mantenimiento en la obra retirado desecho

OTROS

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: [illegible]

Firmas:

Nombre: [illegible]
C.C. O NIT

Nombre: DIEGO PEÑA P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 de 1

ACTA N°: 8

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEGORÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial | Seguimiento | Cierre


FECHA: DD 20 | MM 09 | AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO TIPO FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEGORÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

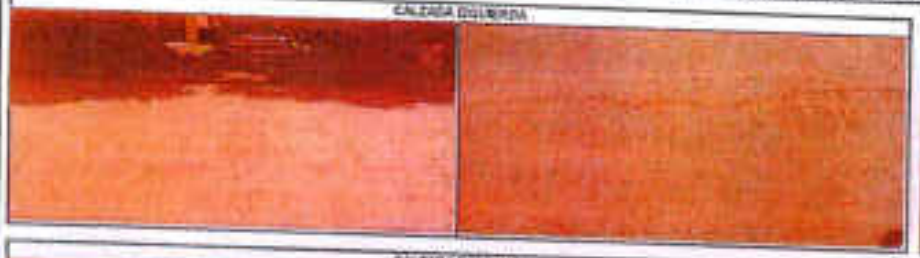

CARRUSELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente a el seguimiento y/o cierre

Se evidencia limpieza en las placas de concreto, cunetas y contenedor
Se evidencia Cinta transversal en ambos lados

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT

Nombre

Nombre

Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista Interventor, Supervisor

392

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAQ	CODIGO:	FOR-FRDY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N° 9

Pagina	1	DE	1		
Inicial		Siguientes		Carta	
FECHA					
DD 26	MM 05	AA 2023			

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRS-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTEX DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



BARRENDEJOS

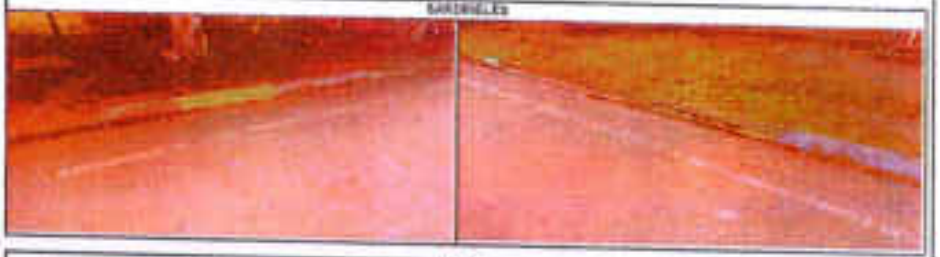

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

En ejecución de obra en las calles de concreto y cunetas
En ejecución de pavimentación en placa huella asfaltica

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD.

NOTA: EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA EXPRESARSE A LA REVISIÓN

FIRMAS

Nombre: Representante de la comunidad
C.C. O NIT

Nombre:

Nombre:

Digital: Acuerdo de Gestión del Contrato
Estado: Contratista Diligenciado - Pendiente

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA:	1 de 1

ACTA Nº: 19

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 010-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 837-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-021-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER SAL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRAFICO EN FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

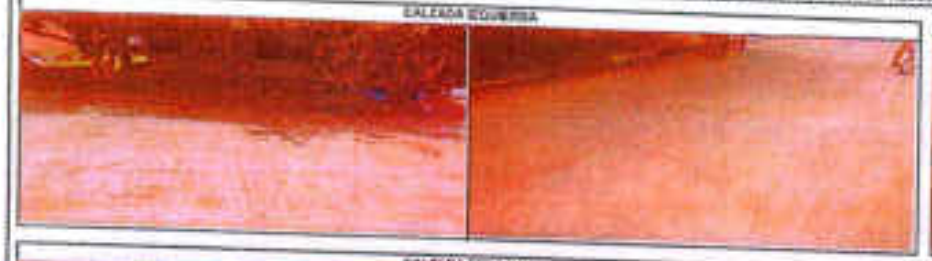

BARANDILLA

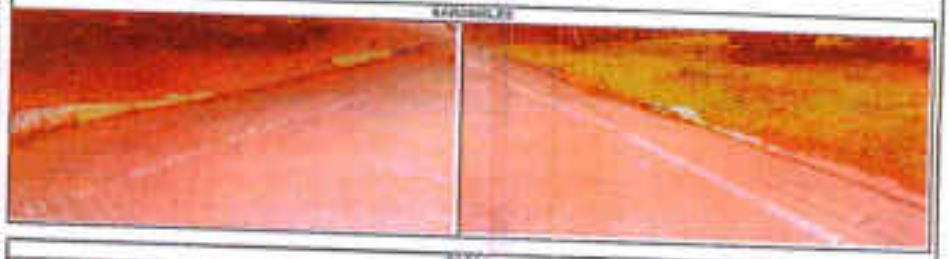

CALZADA DERECHA



ACERA

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la referencia del documento y/o clarificación

Se evidencia ubicación en las abscisas de concreto y cunetas
Se evidencia humectación en placa contra terrazas

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT

Nombre:

Nombre:

Nombre:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2023

ACTA Nº: 31

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Siguientes	Cierre	

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



BARRIELES

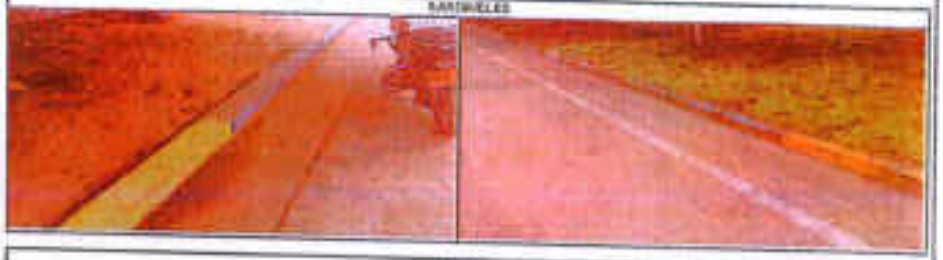

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo ocurrido en el espacio de la casilla

En evidencia ampliada en las planas de cantidad y similar

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: [illegible]

FIRMAS

Nombre:
C.C. El Nº:
Cargo: Residente de Obra
Entidad: Synergia Ingenieria Proyectos

Nombre: [illegible]
Cargo: Residente de Interventoria
Entidad: Consulter del Oriente E.U.

Nombre: [illegible]
Cargo: Representante de la Comunidad
Entidad: Junta de Acción Comunal

Nombre: [illegible]
Cargo: Representante de la Comunidad
Entidad: Junta de Acción Comunal

SINERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
Página 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA: DD 20 MM 05 AA 2023	

ACTA Nº: 17

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 032-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPG-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

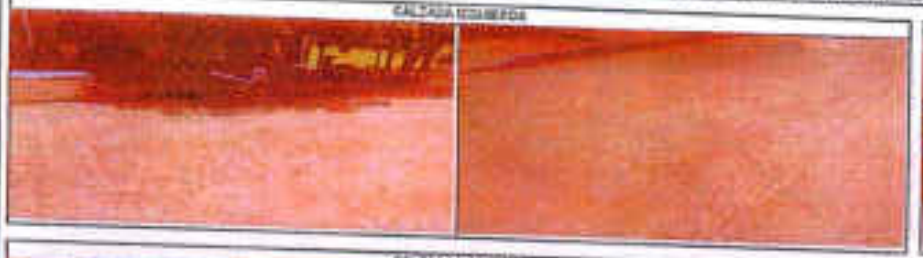

CARRILES

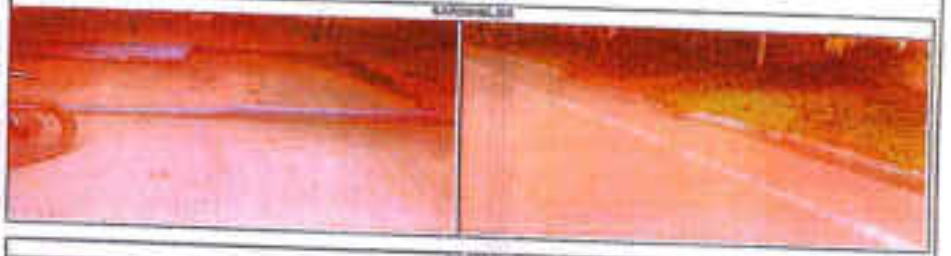

CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES: Escribir la referencia al fotograma y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia falla horizontal en placa contra diferido

OTROS

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LO REALIZADO

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad
Nombre
C.C. O NIT

Representante del contratista de obra
Nombre DIEGO PEREZ

Representante de la interventoría
Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Propietario

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAO	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 13

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 030-2023 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° AGUA-SPO-001-2023	PROYECTO	FASE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial / Seguimiento / Cierre	
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° AGUA-SPRO-001-2023		FECHA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER SAS. CONSORCIO E.U.		DD 26	MM 05

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÁLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, NUMERO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la novedad correspondiente y/o decir No

Se evidencia limpieza en las obras de servicio y aceptar

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Nota: SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS OBSERVACIONES EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. Nº

Representante de la Interventoría
Nombre:

Representante de la Comunidad
Nombre:

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Contratista, Interventor, Propietario

24

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2023
PAGINA	1 DE 1
Inicial	Seguimiento Cierre
FECHA	DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA N°. 37

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 010-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 001-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-MPIO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE PORAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLANOS EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE PORAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



BARANDILLAS

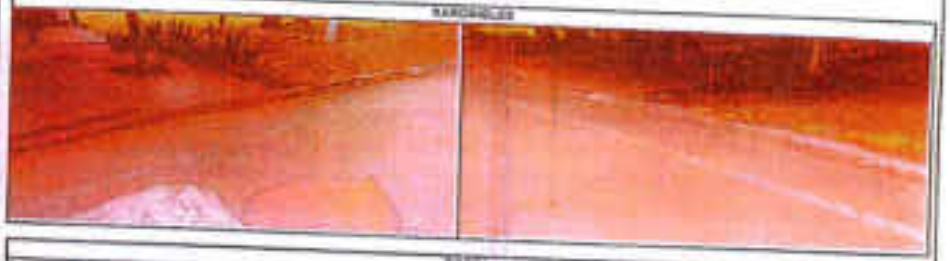

CALZADA DERECHA



POZOS

ESTADO



OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o cierre

Se evidencia ausencia en las placas de concreto y cunetas
No evidencia pasos de alumbrado público instalado al contrato ejecutado

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS DISEÑADOS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C.

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Entregar Interventor, Supervisor

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-FR/DY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2023

ACTA N°: 35

PAGINA:	1	DE	1
Inicial	Siguiente	Cierre	

FECHA: DD 20 MM 07 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 031-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.S.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



KARDEX 2+0

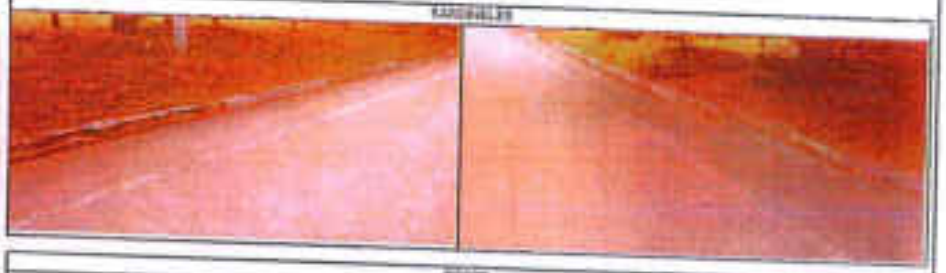

CALZADA DERECHA

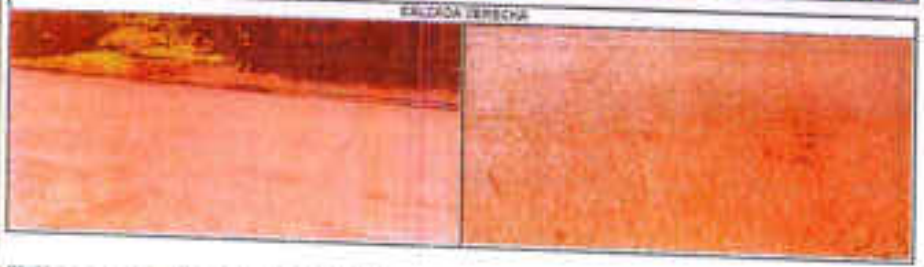

PUNTA

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la evidencia de registro en la casilla

No evidencia denigrante en las tomas de cámara y sonidos
En evidencia fauna nativa del 3 año de vuelo en plena montaña cordillera y fauna nativa en plena cordillera Oriental de Colombia

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Original: Archivo del Gestor del Contrato
Copia: Contratista, Interventoría, Supervisor

6/6

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
FOLIO: 1	DE 1
Inicial	Seguimiento / Cierre
FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024	

ACTA Nº 33

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 012-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 007-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSANTER DEL CARIBE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TAMAL MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CARAMARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TALEGRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CARAMARE

CALZADA IZQUIERDA



BARRANCOS

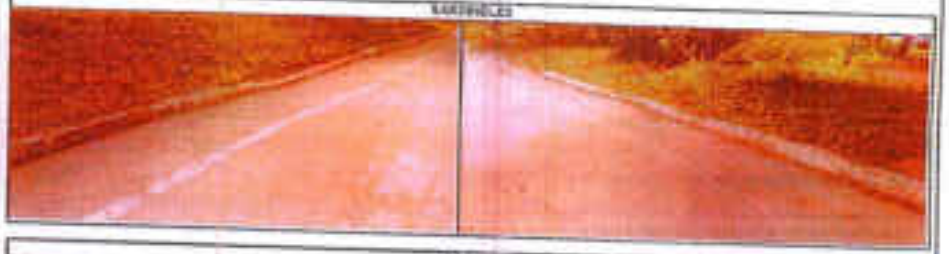

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escriba la relación al requerimiento o/y cierre

Se evidencia ocupación en las placas de cemento y cunetas

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

Firmas

Nombre: [illegible]
C.C. 0 NIT

Nombre: DIEGO [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratante, Interventor, Promotor

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q ACTA DE ESTRUCTURA VIAL SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CODIGO:	PDP-PR-27-043
		VERSION:	01
		REVISION:	17/10/2023

ACTA Nº 13

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 002-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA SPO-001-2023	PAGINA	1	DE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	Inicial		Seguimiento		Cierre
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-APRO-001-2023	FECHA				
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.	DD 20	MM 05	AA 2024		

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



CUNETAS

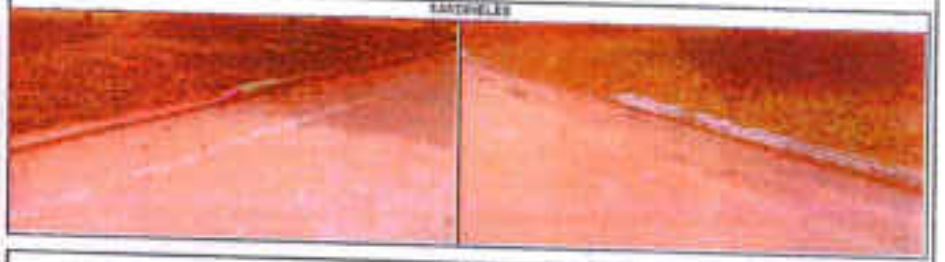

CALZADA DERECHA



POZOS

DIQUES

OBSERVACIONES: Escriba lo solicitado en el siguiente y/o cierre

Se evidencia buzones en las calles de concreto y cunetas

El ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C.

Nombre:

Nombre:

Nombre:

SINERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAO

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

Pagina 1 DE 1

Inicio | Seguimiento | Cierre

ACTA Nº: 12

FECHA: DD 20 MM 01 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 053-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 031-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA FISICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

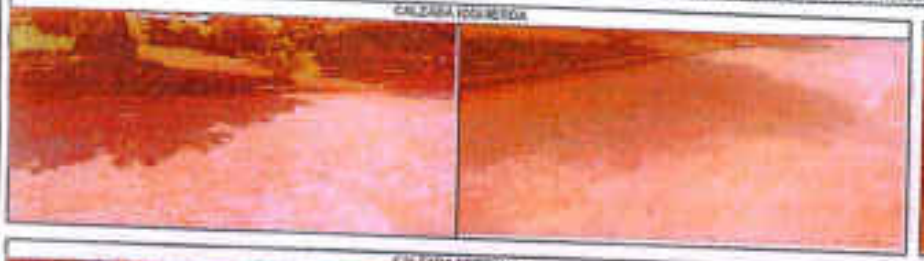

BARRANDILLA



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escriba lo solicitado en el requerimiento y/o visita

De evidencia asegurar en las piezas de concreto, juntas y tuberias

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad

Nombre:

C.C. O NIT

Representante del contratista de obra

Nombre: DIEGO RUIZ

Representante de la Interventoria

Nombre:

Original: Archivo de Gestion del Contrato
Copia: Residente, Inspector, Almacen

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 13

Pagina:	1	DE	1		
Inicial		Siguiente		Cierre	

FECHA: DD 30 MM 07 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 033-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-031-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-031-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTRA DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

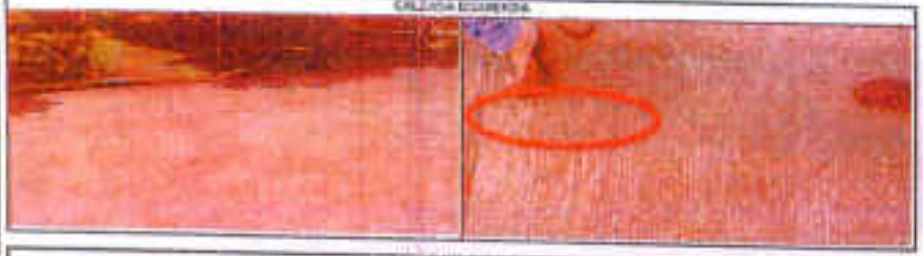

SARDINELES

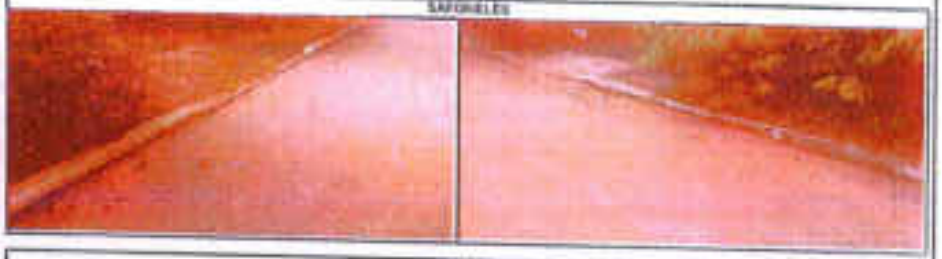

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Durante la ejecución del siguiente día (X) corte

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia fisura longitudinal
Se evidencia falla de borde

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO MUÑOZ

Representante de la Interventoría

Representante de la Comunidad

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-FROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 12

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 032-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA		DE	
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRAFICO VIA FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



CARRILES

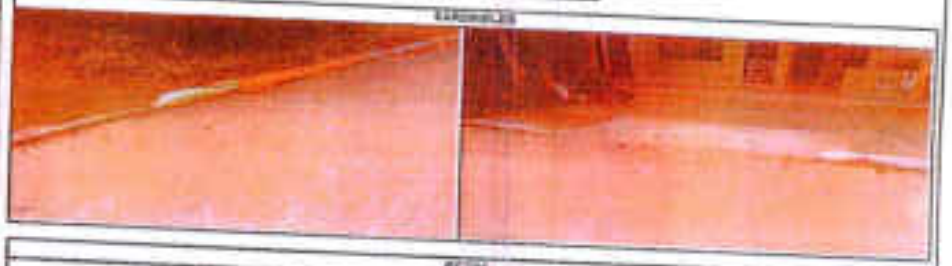

CALZADA DERECHA



PEDES

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo relevante o el texto/frase que desee

Se anexa memoria fotografica en las placas de carreera y carreras

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la Comunidad
Nombre:
C.C. O NIT:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Secretaría Interventor, Residente

404

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-FROY-043
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/08/2023

ACTA Nº 21

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 20		MM 05		AA 2024	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 035-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRA01-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-021-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER ING. OCCIDENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



BARANDILLA



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escriba lo referente al registro(s) fotográfico

Se evidencian imagenes en los planos de cierres y aceras

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT

Nombre

Nombre

Nombre

Original: Archivo de Gestion por Contrato
Copia: Carpeta Interventor Proyecto

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 de 1

ACTA Nº. 2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-PPO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE S.C.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJOBRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial | Seguimiento | Cierre


FECHA: DD 10 MM 05 AA 2023

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA FIJADO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJOBRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

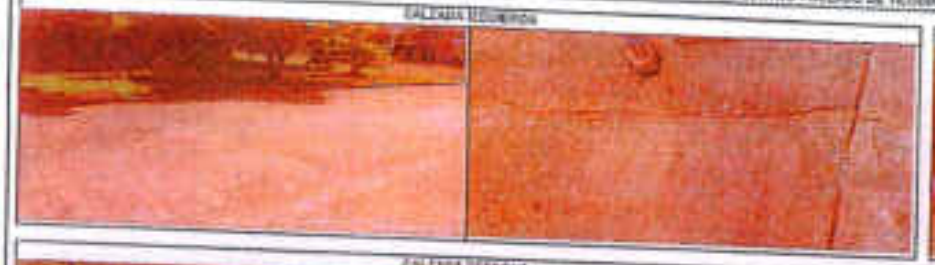

BARRANDILLO



CALZADA DERECHA



PODOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo faltante, el cumplimiento y/o cierre

Se evidencia cangrejo en las placas de concreto y cunetas.
Se evidencia fisura transversal en ambas placas de 2.5 cm de ancho

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT:

Nombre: DIEGO PEREZ

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-FICY-043
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	12/05/2022

ACTA N°: 12

Pagina:	1	DE	1
Inicial	Siguiente	Cierre

FECHA: DD 26 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


SALIDA IZQUIERDA

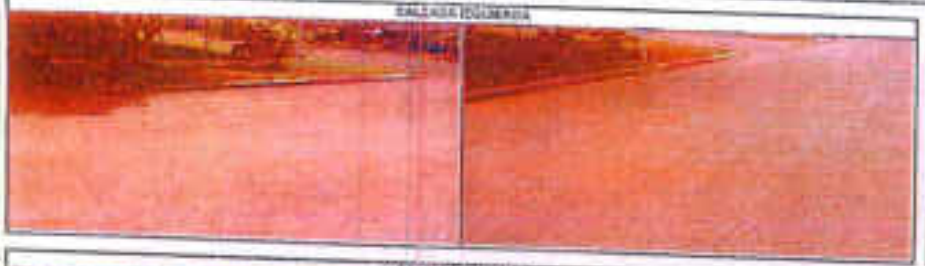

ENTREGABLES



SALIDA DERECHA

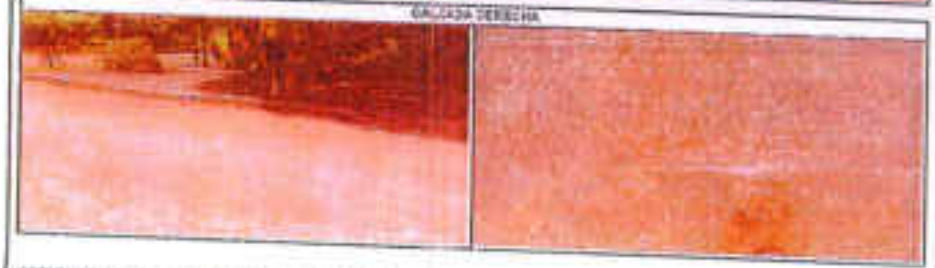

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la referencia del segmento de vía objeto

Se incluyen imágenes en las etapas de entrada y salida
Se adjunta Copia de Actas en la última columna derecha

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: [illegible]

FIRMAS:

Firma Representante de la comunidad
Nombre
C.C. o NIT

Firma Residente de Interventoría
Nombre: DIEGO PEREZ

Firma Residente de Obra
Nombre

Firma Supervisor
Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista Interventor Propietario

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYMERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO	FOR-PRDV-042
VERSION	01
REVISION	17/10/2022
PAGINA	1 de 1

ACTA N°: 24

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYMERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD: 25 MM: 05 AA: 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLANCHA EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



CALZADA DERECHA



ESPACIO



PERFIL

OTROS

DESCRIPCIONES: Escribir lo relevante al seguimiento y/o visita

Se evidencia ubicación en las planas de concreto, cunetas y cordonales

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. 0 NIT

Representante del Contratista o Interventoría
Nombre:

Representante de la Comunidad
Nombre:

Digitally Archive de Sinergia del Carmen
Oficial Archivista Sinergia Yopal

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ESTADO

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO	FOR-FRDY-642
VERSION	01
REVISION	17/10/2022

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Siguiente	Extra	

FECHA: DD 26 MM 05 AA 2023

ACTA Nº 02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 008 2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-011-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 007-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPNO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIDEOGRÁFICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

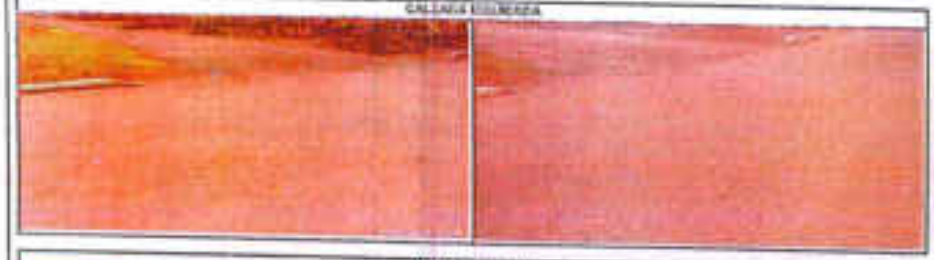

TANGENTES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Anotar la referencia del registro (ej: 03/09)

Se evidencia después en las obras de calzadas, cunetas y andenes
Ausencia de cambios en las curvas de la intersección

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: [illegible]
Cargo: Representante de la comunidad
C.C. [illegible]

Representante Contratista ejecutor
Nombre: DIEGO [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista Interventor, Supervisor

SINERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2023

ACTA Nº 10

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 010-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 001-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


FECHA: DD 20 MM 01 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO NO FEJADO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA




SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

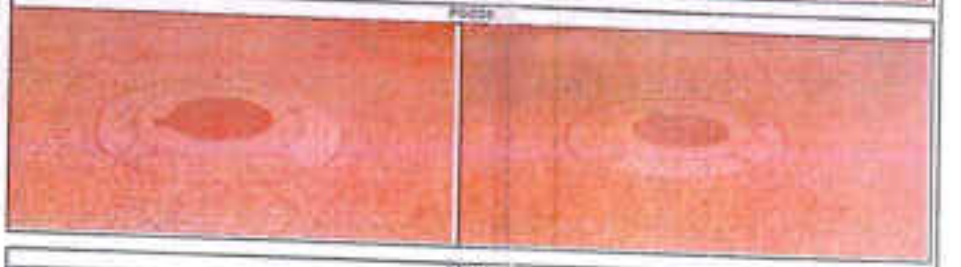

OBSERVACIONES: Escribir la numeración de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo

Se evidencia limpieza en los planos de calzada, cunetas y sardinales
Se evidencia fisuras en la capa del pozo evidencia, a su vez, la placa del pozo esta rustica

OTROS

TOL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SI UNA DISCREPANCIA, SUE LE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA LUNES/SEGUNDA A LA REALIZADO

Firmas

Nombre: Yuleisy Vallenilla
Firma Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Nombre: DIEGO PEREZ
Representante del Contratista de obra

Nombre:
Representante de la Interventoría

Nombre:
Residente de Interventoría

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Archivo de Interventoría Ambiental

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAO	CODIGO:	FOR-FTCV-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA: 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA: DD 20 MM 05 AA 22	

ACTA N°: 2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO YID FILRICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



RAPONCLES



CALZADA DERECHA

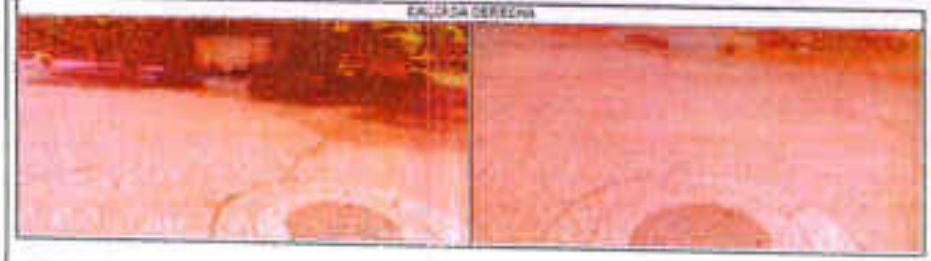

POZOS



OBSERVACIONES: Escribir la referencia del siguiente modo ejemplo:

Se evidencia ahuellamiento en las placas de concreto, sumideros y andenes
Se evidencia rotura en sentido transversal de 1 cm de ancho en la placa costado izquierdo
Se evidencia fisura transversal de 1 cm de ancho en la placa costado derecho
Se evidencia fisura de borde en la placa costado derecho
Se evidencia fisura longitudinal en la placa costado derecho

OTROS

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DA LA CONFORMIDAD SOBRE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A LA REALIZADO

FECHA:

[illegible]
FIRMA RESPONSABLE DE LA CONSULTORIA

Nombre:
C.C. (1) 947

Digital: Acceso de Dibujo en Formato
Digital: Consorcio Alcantarillado Pluvial

[illegible]
Representante de la Comunidad
Nombre: DIEGO PEREZ

[illegible]

[illegible]
Residente de Obra
Nombre: [illegible]

111

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 de 1

ACTA N°: 43

Inicial	Seguimiento	Cierre

Fecha: DD 30 MM 01 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-021-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-021-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJEDERAS, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJEDERAS, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

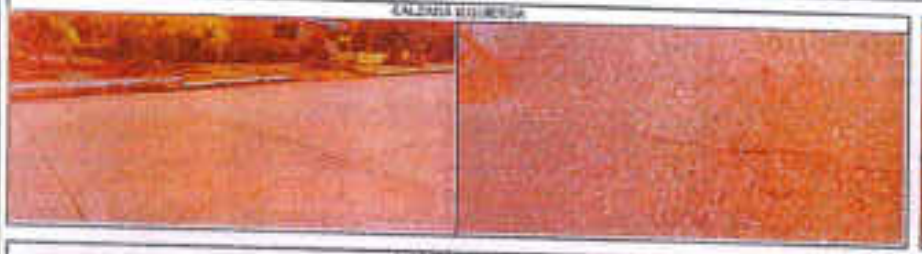

SARDINELES




CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

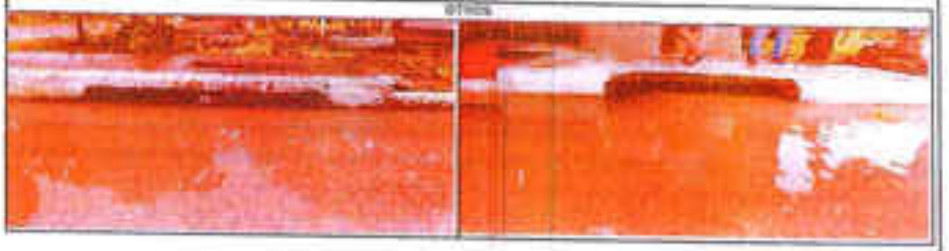

OBSERVACIONES: Escribir la ubicación del requerimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en los planos de concreto, señalar y sanitizar.
Se evidencia fisura transversal de 2.5 cm de ancho en ambos planos.
Se evidencia humedad longitudinal contiguo acumulo en acero de refuerzo en la cuneta, además, el acero de refuerzo de la tapa está expuesto.
Se evidencia que el acero de refuerzo en la cuneta del sumidero longitudinal contiguo derecho está expuesto y en malas condiciones.
Ausencia de cardinal en las curvas de la intersección.

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE NO ES CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS:

Nombre: [illegible]
Firma: Representante de la comunidad
C.C.

Nombre: [illegible]
Representante del contratista de obra

Nombre: [illegible]
Representante de la interventoría

Nombre: [illegible]
Residente Social

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Archivo Interventoría, Supervisor

412

SINERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2023

ACTA N° 01

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 002-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 007-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPNO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL A. CANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


ENLAZADA IZQUIERDA



ENLAZADA DERECHA



ANDENES

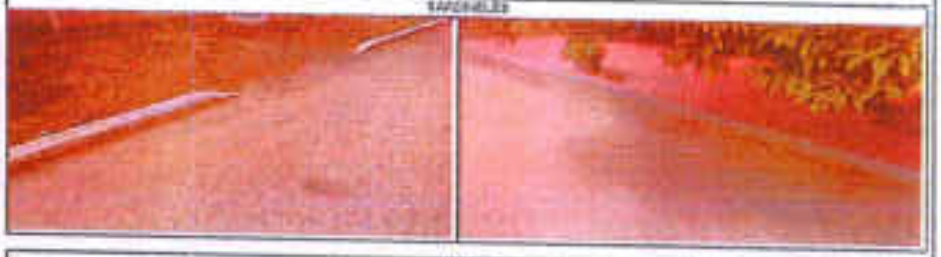

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo relativo al seguimiento y/o cierre.

Se evidencia daños en los pozos de concreto, sardinel y cordilleras
Se evidencia fisura transversal de 0.3 cm en pozo en varias zonas
Se evidencia fisura de corte en la obra tomada anterior

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SI NO ESTÁ CONFORME CON LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA COMUNÍQUESE A LA BREVEDAD

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista e Interventoría - Municipio

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1
Inicial	Seguimiento Cierre
FECHA	
DD 20	MM 12 AA 2023

ACTA Nº 10

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPO-031-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 033-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO Nº ACUA-SPRO-051-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL GARIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA TÉCNICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



CUNETAS



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia ubicación en las placas de concreto numeros y nomenclatura

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT

Representante
Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratante, Interventor, Residente

SINERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ESTAQ ACTA DE ESTRUCTURA VIAL SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CODIGO:	FOR-PLOY-042
		VERSION:	01
		REVISION:	17/10/2022
		PAGINA	1 DE 1

ACTA Nº 33

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 048-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPRC-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTEK DEL CARIBE S.A.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


Inicial	Siguiente	Cierre
FECHA		
DD 26	MM 05	AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

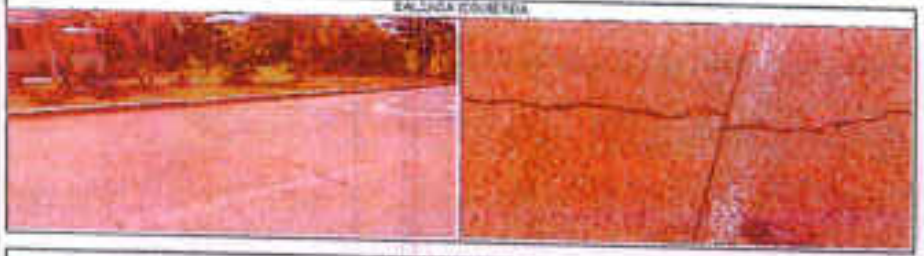

SARDINELES



CALZADA DERECHA



PISOS

OTROS

OBSERVACIONES: Durante la recorrido el siguiente ítem ocurrió

Se evidencia ingreso en las obras de concreto, cuentan a continuación
Se evidencia fisura transversal de 4 cm de ancho en predios aledaños

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

Nota: [illegible]

FIRMAS

Nombre
C.C.

Representante de la comunidad

Nombre: [illegible]

Representante del Contratista

Nombre: [illegible]

Representante de Interventoria

Nombre: [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Archivo General Proyecto

415

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-043
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2023

ACTA Nº 21

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 012-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA	1 de 1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJEDERAS, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 017-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROCESO Nº ACUA-SPRO-017-2022		DD 20	MM 07 AA 2024
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.			


ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO YO FELICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJEDERAS, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



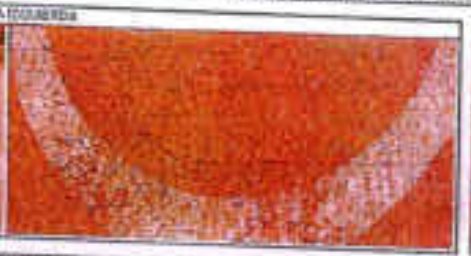

EXCENTRO





CALZADA DERECHA





FONDO

STRIP

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en los pisos de cerceria, cunetas y cerramiento
Se evidencia fisura longitudinal de 1.5 cm de ancho en placa costado derecho
Se evidencia fisuras transversales en placa costado izquierdo

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: EN CASO CONTRARIO, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA NO CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: [illegible]
C.C. El INT

Nombre: [illegible]

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST-AQ	CODIGO:	FOR-PR/21-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	07/09/2022
		PAGINA: 1 DE 1	

ACTA Nº: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 032-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPO-167-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPRO-081-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


Inicial	Seguimiento	Cierre
FECHA		
DD: 30	MM: 08	AA: 2023

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO VIII FÍSICO EN MEDIO MAGNÉTICO


OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

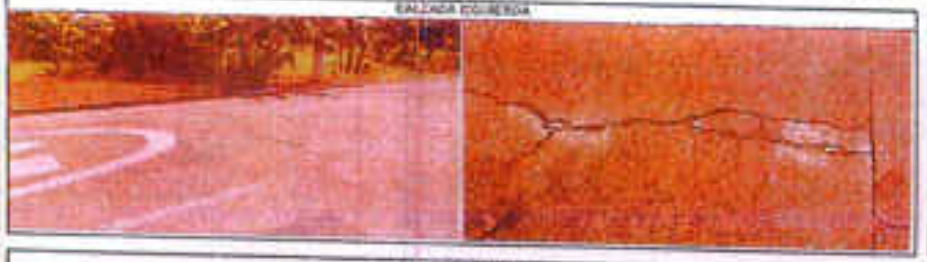

CALZADA DERECHA

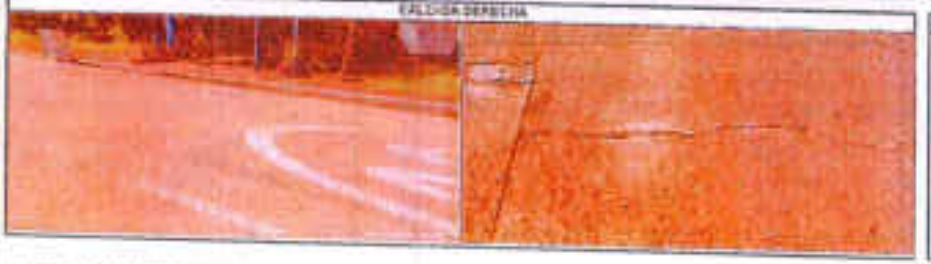

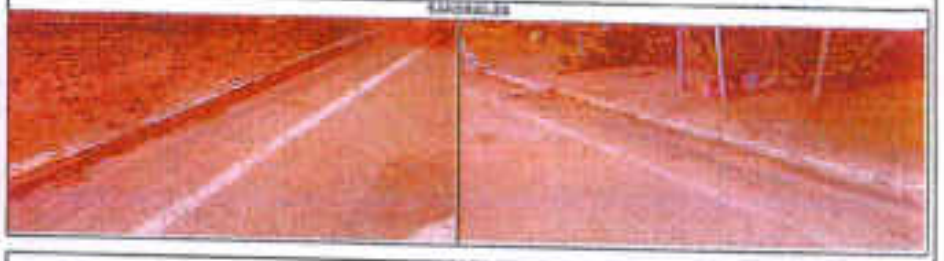

POZOS

OTROS

Observaciones/Cierre: Escriba la novedad en siguiente gris cerrar

Se evidencia deterioro en las placas de concreto, aceras y cordones.
Se evidencia fisura transversal de 3 cm de ancho en placa costado izquierdo, abertida, se evidencia fisura longitudinal.
Se evidencia fisura transversal de 2.5 cm de ancho en placa costado derecho, abertida, se evidencia fisura longitudinal.

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD.

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD.

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. Nº

Firma: Representante de la interventoría
Nombre: DIEGO PEREZ

Firma: Representante del contratista
Nombre:

Firma: Representante de la Alcaldía
Nombre:

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

417

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CÓDIGO	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 014

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023	
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2024 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO DEL ORIENTE E.U.	

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJOSIRAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

		DE			
Inicial		Seguimiento		Cierre	


FECHA: DD 05 MM 01 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA PEJICE EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJOSIRAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA

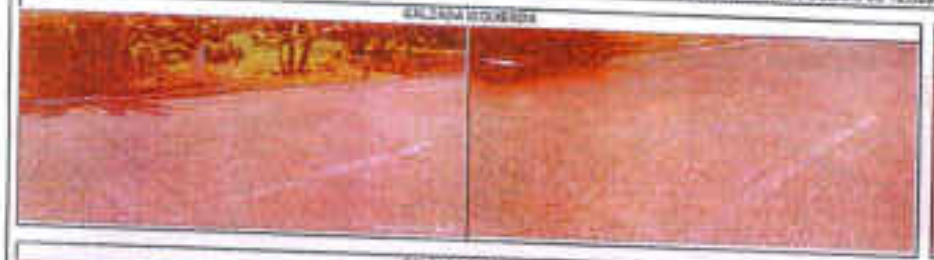

BARANDILLO



CALZADA DERECHA

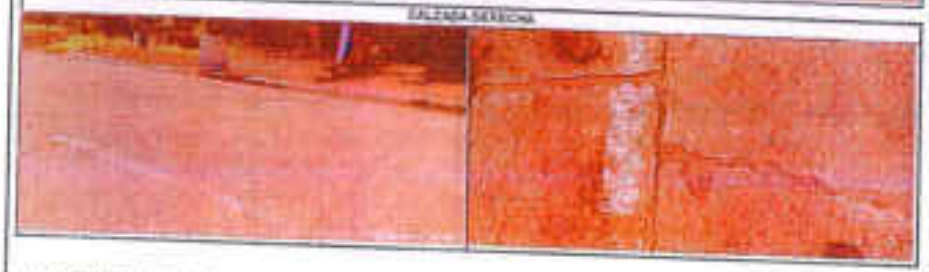

PEGOE

OTROS

OBSERVACIONES: Describir la ocurrencia de incumplimiento y/o cierre.

No existen riesgos en las placas de concreto, cunetas y cerramos
No evidencia fisura transversal de 4 cm de ancho en ambas placas
No evidencia deslizamiento en la placa contigua izquierda

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SI OBRA CONTRATISTA, S.A.S. LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: [illegible]
C.C. O NIT

Nombre: [illegible]

Nombre: [illegible]

Nombre: [illegible]

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST-AQ ACTA DE ESTRUCTURA VIAL SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CODIGO:	FOR-PSOY-042
		VERSION:	01
		REVISION:	17/03/2023

ACTA N°: 1

PAGINA:	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA:					
DD: 30		MM: 05		AA: 2024	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 009-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-051-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-CD-051-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO VIO PUBLICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

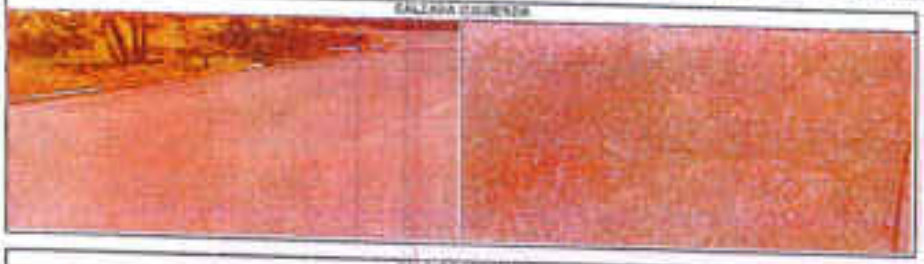

CANDELEJO



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir la referencia del registro en la imagen

Se evidencia ubicación en las placas de concreto y cuentas
Se evidencia fisura transversal de 2 cm en ambas placas

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE HA CONFIRMADO QUE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la COMUNIDAD
Nombre:
C.C. o NIT

Representante de la Interventoría
Nombre:

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Supervisión
Nombre:

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST-AQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-043
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 031-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FASE	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	


FECHA: DD 26 MM 07 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHA EN SELLO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE TOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA DERECHA

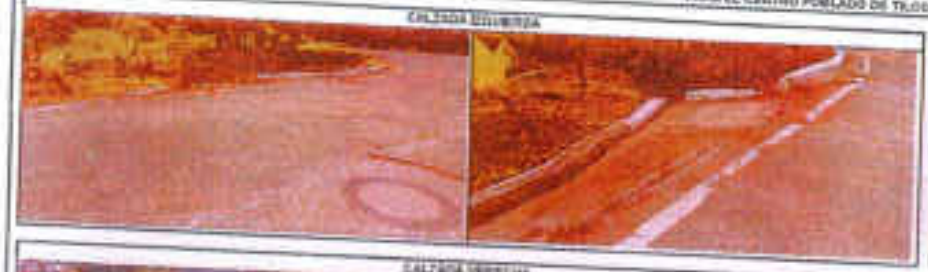

CUNETAS



CALZADA IZQUIERDA



POZOS



OBSERVACIONES: Escribir lo relevante al procedimiento y/o obra.

Se evidencia ubicación en los planos de convenio, cantidad y cantidades
Se evidencia mantenimiento en la obra del acero
Se evidencia Hoja tipo Impresa de 5 mm de espesor en ambas placas

OTROS

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD"

NOTA: SE HACE CONSTANCIA QUE LOS CONCEPTOS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LA REALIDAD

Firmas

Nombre:
C.C. O NIT

Nombre: DIEGO [illegible]

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Contratista, Interventoría, Supervisor

420

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ESTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYMERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
Paginas	1 de 1
Inicial / Siguientes / Cierre	
FECHA: DD 12 Mes 05 AA 2023	

ACTA N°: 02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 009 2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYMERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.A.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO VIA FÁBICO EN VIEJO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA

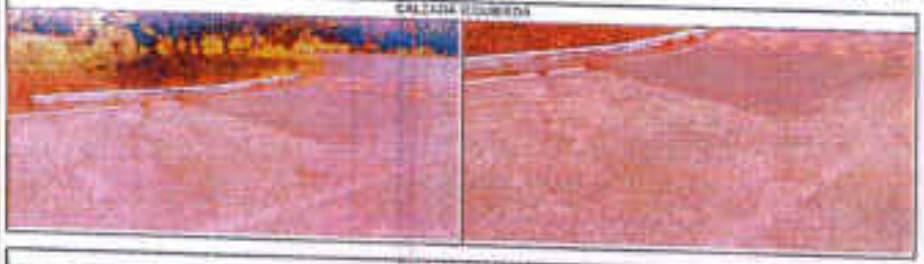

BARANDILES

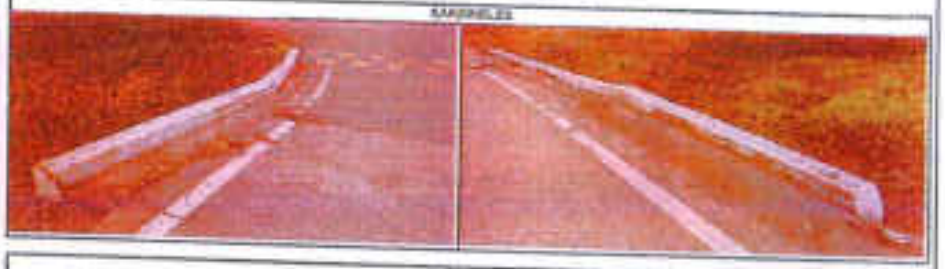

CALZADA DERECHA

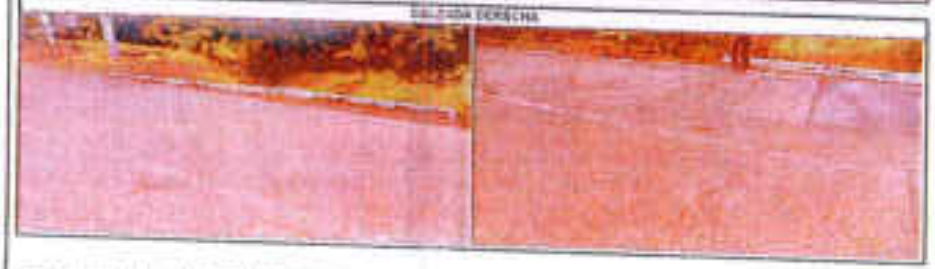

Puzzle

OTROS



Observaciones: Anexar su concepto si requiere en otra hoja

Se evidencia ampolla en mal estado de concreto, humedad y hundimiento
Se evidencia fisura tipo mapeo en la placa entrada izquierda
Se evidencia fisura longitudinal en la placa entrada derecha
Se evidencia hundimiento en la cuneta entrada derecha
Se evidencia fisuras en los alerones de la alcantarilla existente
Se evidencia fisuras en el empalme de los muros de la alcantarilla existente

"EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Nota: SI NO LA COMUNIDAD NO ESTÁ DE ACUERDO CON LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CONSIGNARLO A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la comunidad

Nombre:

Representante de la Interventoría

Nombre:

Representante del Contratista

Nombre:

Residente de Obra

Digitally signed by Edwin Ivan Gonzalez Rincon
Date: 2023.05.12 10:09:01 -05'00'

421

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 2 2

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 010-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 017-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.C.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJODRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA: DD 27 MM 01 AA 2024


Actual | Seguimiento | Cierre

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O PLANO EN MODO ORDENADO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TEJODRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

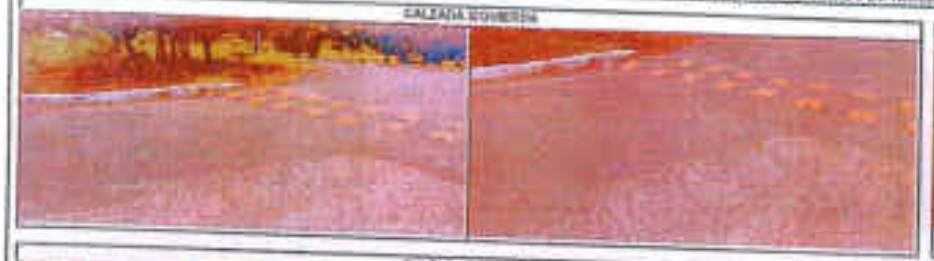

BARANDILLAS

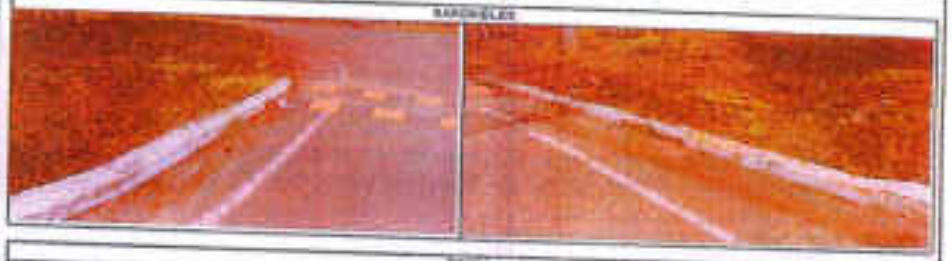

CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Describa lo relevante del seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, rumbias y sumideros
Se evidencia fisura transversal en la placa ubicada derecha

EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la Comunidad
Nombre
C.C. O NIT

Representante de Contratista de Obra
Nombre DIEGO

Representante de la Interventoría

Residente de Obra

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Archivo Gestión Interventoría / Supervisor

1422

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTA.O ACTA DE ESTRUCTURA VIAL SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CODIGO:	FOR.PROY.042
		VERSION:	01
		REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 01


CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 002-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA	1 DE 1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TELODRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial / Seguimiento / Cierre	
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 007-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUE-SPRO-001-2023		FECHA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.		DD: 12	MM: 10 AA: 2023

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TELODRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA

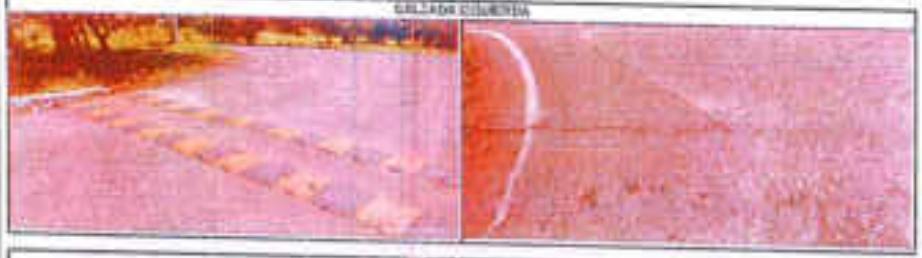

CALZADA DERECHA

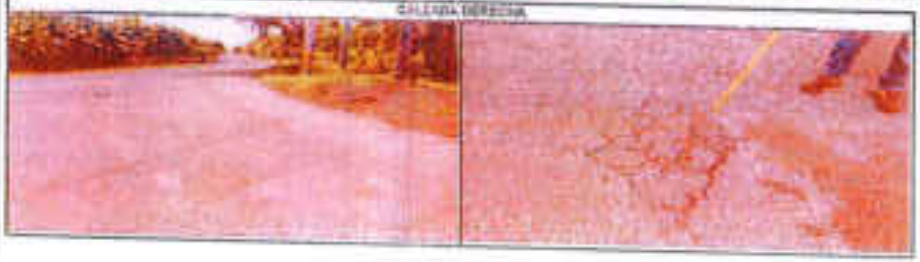

SARDINELES

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escriba lo referente al mejoramiento y/o cierre

Se evidencia fisura longitudinal en la capa de rodadura
Se evidencia fisura por de cocodrilo en la capa de rodadura

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LE CORRESPONDE A LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA SEGUNDA

FIRMAS

Firma: Representante de la Comunidad
Nombre:
C.C. O NIT:

Representante de la Interventoria
Nombre

Representante del Contratista
Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventoria, Supervisor

Yopal, 25 de junio del 2024

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 25-JUNIO-2024 OF-PROY-TIL
HORA 5:00 Pm SANTIDAD DE FOLIOS 11
FIRMA Fabian Perez
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".


Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO EN REFERENCIA.


Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar Prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 032 DE 2023 del 23 de agosto del 2023 que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", por un periodo de tiempo de seis (06) meses; que se requiere debido a los siguientes inconvenientes presentados durante la ejecución del proyecto en mención:

Al realizar la localización y replanteo de los colectores del emisario final del alcantarillado pluvial se evidenció que el eje de la tubería del Alcantarillado Pluvial se encontraba muy cerca de la tubería de descarga del alcantarillado sanitario (red de impulsión) instalada entre la estación de bombeo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; esta situación generó que para garantizar la prestación de dicho servicio público a la comunidad sin interrumpir el bombeo diario de las aguas residuales originadas en el centro poblado de Tilodiran, y teniendo en cuenta los procesos constructivos para no interferir durante la construcción del Alcantarillado Pluvial, fue necesario iniciar la ejecución del proyecto con el el ítem 2.4.16. Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4", junto con todas las actividades necesarias para su instalación de acuerdo a las especificaciones del proyecto, hasta la conexión de esta red a la estación de bombeo (EBAR), una vez se terminó estas actividades se pudo dar inicio a la instalación de la Tubería PVC

alcantarillado de diámetro 60" para el alcantarillado Pluvial. Este inconveniente generó atraso en la programación del proyecto debido al cambio de la priorización de las actividades las cuales no se podían ejecutar de forma simultánea debido al gran diámetro del emisario final del Alcantarillado Pluvial.

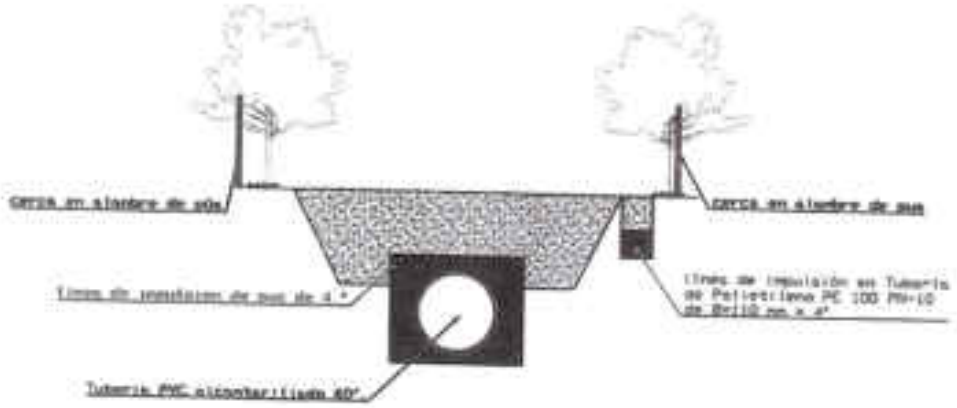

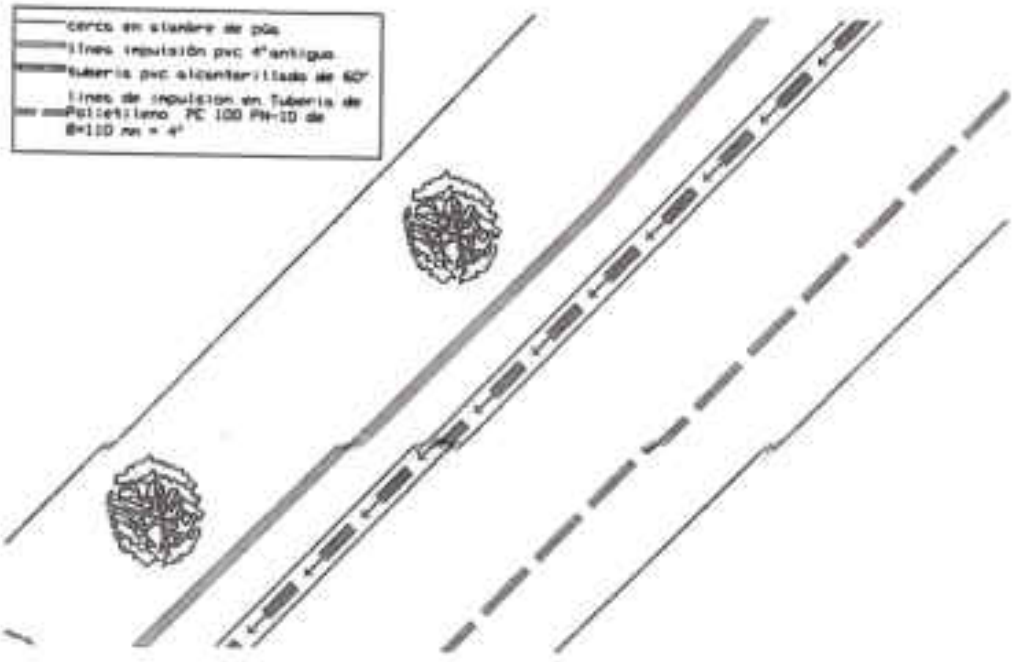

- ✓ El proyecto se inició en el mes de octubre de 2023, aunque se contaba con las servidumbres registradas, se presentaron demoras para ingresar a los predios del emisario final, debido a que los propietarios manifestaban que no podían sacar los semovientes de los potreros y además los pastos perimetrales al área establecida en las escrituras se vería afectado durante la construcción, por lo cual se pospuso el inicio de las actividades en el emisario final hasta el mes de diciembre fecha posterior a la realización de los acercamientos y acuerdos necesarios con los propietarios para permitir el ingreso de la maquinaria y materiales requeridos durante la ejecución del proyecto. En los acuerdos se definió previo al inicio de las actividades de obra la construcción provisional de cercas con alambre de púas paralelas a los colectores para evitar el ingreso de semovientes al área establecida en la servidumbre.





- ✓ Durante los meses de febrero a marzo de 2024 (época de verano) se presentaron lluvias que ocasionaron el depósito de agua en el predio aguas abajo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), este predio presenta en su topografía depresiones que son zonas inundables, este inconveniente demoró la ejecución del proyecto debido a que las zonas bajas se deterioraron con el tránsito de los vehículos y maquinaria la vía de ingreso, lo que dificultó notablemente el suministro de materiales disminuyendo los rendimientos de obra que se evidenció en la afectación de la ruta crítica de la programación del proyecto. Por este inconveniente, fue necesario disponer de una retroexcavadora para garantizar el suministro de materiales hasta los colectores del emisario del alcantarillado pluvial, esta movilización imprevista de la maquinaria disminuyó la ejecución del proyecto debido a que era necesario parar temporalmente los frentes de obra para poder ejecutar esta actividad.





- ✓ El avance de la construcción de la estructura de descarga se ha afectado notablemente por la elevada escorrentía superficial generada por las lluvias que ingresa por las estructuras de conexión (pozos de inspección) del emisario final del alcantarillado pluvial, debido a las pendientes de los colectores es transportada hasta la estructura de descarga y se deposita dentro de la excavación. Este inconveniente ha generado suspender provisionalmente las actividades, realizar trasiego del agua depositada y limpieza de los residuos que se acumulan en la base de la estructura.





- ✓ Debido a la proximidad del emisario final del alcantarillado sanitario a la estructura de descarga del Alcantarillado Pluvial, por las fuertes y continuas lluvias se ha saturado el talud del costado izquierdo aguas abajo lo que ocasiono sobrecargas en el material de relleno de la tubería instalada generando derrumbes y desacople de la tubería del alcantarillado sanitario hacia la excavación de la estructura de descarga del alcantarillado pluvial. Este inconveniente ha generado parar temporalmente la construcción de la estructura de descarga, realizar bombeo de las aguas que se depositan en el fondo de la excavación y realizar limpieza continua del acero de refuerzo instalado. Se ha tomado medidas para adosar la tubería al talud y garantizar la evacuación de las aguas residuales cuando se realiza el trasiego desde la estación de bombeo ubicada en el centro poblado de Tilodirán.



- ✓ Durante la construcción del emisario final del Alcantarillado Pluvia, se presentó bajo suministro de tubería de policloruro de vinilo (PVC) de diámetro 60" por parte del fabricante, lo que repercutió notoriamente en el avance del proyecto durante los primeros meses, aunque se mantuvo continuamente el suministro de base granular, mano de obra y la disponibilidad de la maquinaria y equipo menor, por el bajo suministro de la tubería se generó atraso en la programación de obra

- ✓ La ejecución del proyecto ha sido desarrollada de forma continua, sin embargo, durante la época de fin de año se apreció una baja significativa en los rendimientos de obra debido a los cierres contables del año, se pararon los suministros de algunos proveedores tales como la tubería y materiales pétreos como base granular.


- ✓ Teniendo en cuenta la necesidad de intervenir las rutas de circulación del tráfico en el centro poblado de Tilodirán, se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Secretaría de tránsito del municipio de Yopal y las empresas operadoras, para evaluar y aprobar una ruta alterna en la cual pueda circular el tráfico pesado proveniente de la vía Los Mangos sin afectar la continuidad de las actividades de la comunidad y del contrato de obra, una vez realizado el análisis de movilidad del sector y el impacto del mismo, se realizó la expedición de la Resolución No. 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024, la cual fue modificada por medio de la Resolución No. 05013 DEL 26 DE ABRIL DE 2024, esta fue socializada a la comunidad el 4 de mayo de 2024. La demora en el trámite del proceso de aprobación de la ruta de tráfico pesado por el centro poblado de Tilodirán generó atrasos en la ejecución de actividades ya que hasta no tener aprobada esta alternativa no era posible intervenir las vías urbanas.






- ✓ En la vía que conduce a la vereda Agualinda (Tramo Pluvial 33 al Tramo Pluvial 44) se han presentado atrasos en el proceso constructivo de la instalación de tubería PVC alcantarillado de diámetro 60" debido al espacio reducido de la callejuela entre las cercas perimetrales, dificultando el movimiento de la maquinaria y el transporte del material pétreo requerido para la ejecución de esta actividad, además por la falta de área para

depositar el material de excavación fue necesario el retiro mientras se realizó la instalación de la tuberia y posteriormente volverlo a transportar para realizar el relleno de las zanjas.

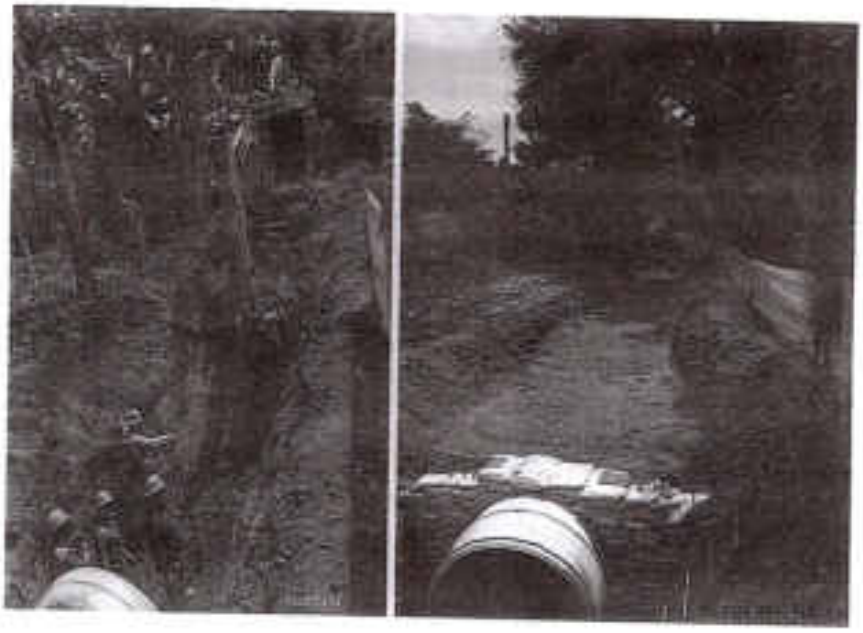

- ✓ Durante la construcción de los colectores del Alcantarillado Sanitario en el sector ubicado en la calle 1 entre carreras 1 y 4 (instalación de tuberia PVC alcantarillado diámetro 12"); y el Alcantarillado Pluvial en la carrera 4 entre calle 1 y vía a la vereda Agua Linda (instalación de tuberia PVC alcantarillado diámetro 60"), se encontró un estrato muy arenosos de muy baja cohesión, el cual es inestable al entrar en contacto con el agua, aunque se está entibando se han presentado incrementos en los anchos de excavación debido a los elevados esfuerzos que induce el material sobre los entibados, en algunos casos para estabilizar los taludes ha sido necesario colocar doble entibado para evitar mayores afectaciones sobre las vías que se están interviniendo y garantizar la seguridad de los trabajadores dentro de las excavaciones. Con el propósito de garantizar la estabilidad de los taludes se ha incrementado la longitud de los soportes de los tableros del entibado para hincarlos más profundos, se está colocando doble apuntalamiento para reforzar los soportes, además para disminuir las cargas sobre los taludes se está retirando el material de la excavación mientras se realiza la instalación de la tubería y posterior mente se vuelve a transportar para realizar el relleno de las zanjas. Estas medidas han requerido la mayor utilización de recursos y los tiempos de ejecución se han incrementado disminuyendo notablemente los rendimientos lo que ha requerido la mayor permanencia en el sector para realizar las actividades establecidas contractualmente.





- ✓ Por último, la falta de personal en el centro poblado de Tilodirán para el cargo de oficial ha sido una causante recurrente y significativa en los atrasos de la ejecución de las actividades de obra programadas, dado que por la insuficiencia del personal no se han podido lograr los rendimientos óptimos en la ejecución de algunas de las actividades de obra. Ante esta problemática se tomó como alternativa para incrementar los rendimientos contratar personal externo.

De esta manera SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S solicita se revise y evalúe la viabilidad de Prorrogar el Contrato de Obra No. 032 DE 2023 por un plazo de seis (06) meses para ejecutar las actividades establecidas contractualmente.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Anexo: 11 folios
- ✓ REPROGRAMACIÓN DE OBRA
- ✓ FLUJO DE CAJA

Yopal, 28 de Junio del 2024

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 28-JUNIO-24
HORA 4:00PM CANTIDAD DE FOLIOS 3022
RECIBIDO POR Fabian Parra
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de obra N° 032 DE 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD ACTA PARCIAL N°1 DEL PERIODO 10 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 12 DE MAYO DEL 2024.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar el acta parcial de obra N°1 del proyecto de referencia, el cual se llevó a cabo en el periodo del 10 de octubre del 2023 al 12 de mayo del 2024, donde se evidencia el cumplimiento del acta, en la cual se hace entrega de las memorias de cálculo, carteras topográficas, soportes Plan de Manejo de Tráfico (PMT), soportes Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y los respectivos planos de las diferentes actividades ejecutadas en el desarrollo de la obra objeto del contrato en mención y en general todos los datos necesarios para tener una información actualizada a la fecha.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Anexos:
16 CARPETAS 3091 FOLIOS
1 CD

5.12.9 BITÁCORA

1 Ingeniero Residente	Cadenas topografía
Residente intervención	Operadores maquinas
Profesional SST	Oficiales de obra
Maestro de obra	Ayudantes de obra
Almacenista	Controladores de obra
Electricista	

ING. RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTOR

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTOR

MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

* FRENTE DE TRABAJO NO1: — Alcantarillado sanitario. Se inicia el tramo PS68 (entre pozo POSEH y PS27) calle 1° entre carreras 3 y 4. Se desvia trafico por la variante cra 4, se hace pavimento y se hace excavación.
* FRENTE DE TRABAJO N°2: - Alcantarillado pluvial tramo PTH3 (PPH3-PPH4). Se instala un tubo 60". Se realiza excavación, entibado, bombeo, instalación de tubo, base, atraque y relleno con material triturado.
* FRENTE DE TRABAJO N°3: - Alcantarillado pluvial, tramo PT36 (PP37-PP36), se instala un tubo de 60". Se trabaja en excavación, bombeo, instalación tubo, base, atraque y relleno con material Triturado

FRENTE DE TRABAJO NO#1:- ESTRUCTURA DE DESCARGA: Se repara tubería de aguas negras (descarga del cantarillado sanitario) que se rompio por desprendimiento del talud de la excavación. Se trabaja en bombeo, remosion de lodo y lavado de solado tramo 3

FRENTE DE TRABAJO OBRAS COMPLEMENTARIAS:- Cargue de material de excavación, Se trabaja en mejoramiento de la via aferra a la bajada los Mangos (Cra H con calle 1°), ampliación de rampa de acceso sobre via pavimentada y arreglo de fallas con bolos de piedra. Esta via se inicio a usar por trafico liviano y pesado.

ING. RESIDENTE DIRECTOR INTERVENT.

Dayro Hanley Jorge Lopez
INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR DE INTERV.

4#) JUEVES 6 JUNIO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

*FRENTE DE TRABAJO NO1:- Alcantarillado sanitario, se continuan trabajos en el tramo TS 52 (PS HH y PS 22) calle 1° cras 3 y 4. Se instala un tubo de 12" longitud 6.28 mts. Se realizan trabajos de excavación, entibado, bombeo, instalacion, base,

lider

desagues y relleno con material
adecuado
* FRENTE DE TRABAJO Nº2 :- No se
trabajo por ausencia del operador
de la maquina.
* FRENTE DE TRABAJO Nº3:- Se cuenta
colocado plurial tramo 36 (PP37-PP
36). Se rompe la excavacion (linea
la excavacion) en el pozo PP36
la tuberia esta totalmente llena de
agua, se trabaja todo el dia en
bombeo con dos bombas de 4" y 8"
* FRENTE DE TRABAJO Nº4:- ESTRUCTURA
DE DESCARGA.- Se aksta tramo 3 para
fundida despues, se instala cinta
PVC de dilatacion de juntas.
* TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:- Relleno
de excavacion con material selec-
cionado en el frente 1. Se recibe tube
ria con la salio del frente 3. Se con-
duce trafico por la via alterna a
los mangos. Se trabaja en turno para
armar paredes (2) para bote de pozos

ING. RESIDENTE DIRECTOR DE INTERV.

Dario Harley Sergio Lopez
INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR INTERV.

VIERNES 7 JUNIO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO y SOLEA
DO.

lider

* FRENTE DE TRABAJO Nº1 :- Alcantarilla de sanitarios, tramo TS 52 (PS44 - PS 27) calle 1ª cda 4. Se instala 1 TUB de 12". Se trabaja en excavación, entibado, bombeo, instalación, base a tope que y sellado con material de Turado

* FRENTE DE TRABAJO Nº2 :- No hay apoyo de maquina, el personal se traslada para la Estructura de descarga para fundir placa de piso 3

* FRENTE DE TRABAJO Nº3 :- Alcantarilla de pluvial. Se instala el ultimo tubo de 60" del tramo PT 36 (PP37-PP36). S instala la pomilla para la placa del pozo PP 36. Se trabaja en excavación, bomb instalación, base, atraque, sellado con material de Turado.

* FRENTE DE TRABAJO Nº4 :- ESTRUCTURA DE DESCARGA :- Se prende el tarea y ultimo tramo de la placa de piso de la Estructura de descarga.

* TRABAJOS COMPLEMENTARIOS :- Cargue de material de excavación. Mantenimiento de via alterna a rueda los mangos. PP43

ING. RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTOR

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

SABADO 8 JUNIO 2024
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO, llovio en todas de la noche anterior.

* FRENTE DE TRABAJO Nº1 :- Alcantarillado sanitario, tramo TS 52 (PS NH - PS 27) calle 1º etas 3 y 4. Se trabaja en relleno del tramo instalado con material seleccionado de la excavación.
* FRENTE DE TRABAJO Nº2 :- Alcantarillado pluvial tramo PT H3 (PP H3 - PP H2) se trabaja en compactación con material granular del ultimo tubo instalado.
* FRENTE DE TRABAJO Nº3 :- Alcantarillado pluvial. Tramo PT 36 (PP 37 - PP 36) Terminado, se trabaja en compactación relleno ultimo tubo, conformación del area para retiro del frente.
* FRENTE DE TRABAJO Nº4 :- Fundida solo todo para fundir paladas de la estructura de descarga.
* TRABAJOS COMPLEMENTARIOS :- Adecuación via de acceso al frente 3, para retiro de maquinaria y personal. Trabajos de señalización en todos los frentes. control a via alterna de acceso a la Vereda Los Mangos.

ING. RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

Lider INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES JUNIO 11 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SE PRESENTARON LLUVIAS INTENSAS EL DOMINGO 09 DE JUNIO 2024 EN HORAS DE LA MADRUGADA Y PARTE DE LA MAÑANA EL LUNES FESTIVO 10 DE JUNIO 2024 TAMBIEN SE REGISTRARON LLUVIAS EN LA MADRUGADA HASTA MEDIA MAÑANA. EL MARTES 11 DE JUNIO DE LA MISMA FORMA DEL DIA ANTERIOR.

ACTIVIDADES: PARA OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

TRAMO TS-52: BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE LA EXCAVACION; RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION DE LOS TRAMOS INSTALADOS; EXCAVACION MECANICA CON CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL.

TRAMO TS-26 DEL PS25N AL PS24N LOCALIZADO EN LA CALLE 2 ENTRE CRAS 5 Y 4 PARA DAR INICIO DE INTERVENCION SE TRASLADA RETROEXCAVADOR DE ORUGAS; EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y DE BOMBEO, HERRAMIENTA Y PERSONAL. SE REALIZA EXCAVACION MECANICA CON CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL.

PLUVIAL VIA AGUALINDA RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EXCAVADO DEL PP.36.

ING RESIDENTE

ADMINISTRADORA - DIRECTOR

INSPECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA - INSPECTOR

líder

MIERCOLES 12 DE JUNIO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SE PRESENTAN LLUVIAS INTENSAS - MODERADAS EN LA TARDE DESDE LA 1:00PM.

ACTIVIDADES: TS-52 y TS-26. BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE LA EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA; CARGUE Y RETIRO. EN EL TS-52 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION Y APUNTALAMIENTO METALICO ENTIBADO. EN EL TS-26 SE REALIZA BOMBEO EN EL POZO SANITARIO EXISTENTE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES POR ENCONTRARSE TOTALMENTE LLENO. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA A OTRO POZO ADJUNTO EXISTENTE. PLUVIAL Y LA AGUALUNA SE VIENE EJECUTANDO CONFORMACION Y ADECUACION DE ESTA VIA.

ING. RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 13 DE JUNIO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS EN LA MAÑANA.

ACTIVIDADES: TS-52 y TS-26 BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE LA EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA CON CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL; APUNTALAMIENTO METALICO ENTIBADO; CHEQUEO

líder

TOPOGRAFICO NIVELES PARA VERIFICAR PROFUNDIDAD EXCAVADA.
EN EL TS-26 SE CONTINUA CON EL BOMBEO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL PS-25N, SE TIENEN INCONVENIENTES EN LA INTERVENCION DE ESTE TRAMO CON EL ENTIBADO; POR EL TIPO DE SUELO ARENOSO Y EL NIVEL FREATICO ALTO EL ENTIBADO SE DESPLAZA DE SU POSICION, SE REALIZA DOBLE ENTIBADO. SE PRESENTAN ESCURRIENTO SUPERFICIAL EN LOS TALUDES DE LA EXCAVACION Y LAS BOMBAS SE LLENAN DE ARENA EN LA SUCCION. ESTO AFECTA EL RENDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE TUBERIA.
PLUVIAL VIA AGUALINDA CONFORMACION Y ADECUACION DE LA VIA.

ING RESIDENTE — DIC INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 14 DE JUNIO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS A MEDIODIA
ACTIVIDADES: TS-52 Y TS-26
BOMBEO PARA EXTRACION DE AGUA DE LA EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA CON CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL.
EN EL TS-52 REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS PARA VERIFICACION PROFUNDIDAD EXCAVACION; EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"

lider

RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR. SE REALIZA PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA INSTALACION SILLA YEE PVC 12"x6"; EXCAVACION A MANO; RELLENO EN ARENA LAVADA PARA ATRAQUE TUBERIA.
EN EL TS-26 SE CONTINUA CON EL BOMBEO PARA EXTRAER LAS AGUAS RESIDUALES DEL PS-25N; SE EMPLEA PARA ENTIBACION SISTEMA TIPO CAJON.
PLUVIAL VIA AGUALINDA CONFORMACION Y ADECUACION DE LA VIA.

ING. RESIDENTE

INSPECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 15 DE JUNIO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS EN LA MAÑANA.

ACTIVIDADES:

TS-32 y TS26.
BOMBEO PARA EXTRACION DE AGUA DE LA EXCAVACIÓN.
EN EL TS-32 SE REALIZA RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION DE LOS TRAMOS INSTALADOS.
EN EL TS-26 SE CONTINUA CON EL BOMBEO PARA BAJAR NIVELES DE AGUAS RESIDUALES DEL POZO SANITARIO PS-25N PARA PODER INSTALAR TUBERIA CUANDO SE INTERVENGA.

PLUVIAL Y/A AGUALINDA NO SE PUEDEN ADELANTAR TRABAJOR POR ENCONTRARSE CL TERRENO SATURADO.

ING. RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dexter Morley
INSPECTO DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 17 DE JUNIO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS A/ MEDIODIA.

ACTIVIDADES: TS-52 Y TS-26.

BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE LA EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA CON CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL.

EN EL TS-52 REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS PARA VERIFICACION PROFUNDIDAD EXCAVACION; EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR. SE REALIZA PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA INSTALACION SILLA YEE PVC 12"x6"; EXCAVACION A MANO; RELLENO EN ARENA LAVADA PARA ATRAQUE TUBERIA. RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACION TRAMOS INSTALADOS. PLUVIAL Y/A AGUALINDA CONFORMACION Y ADECUACION DE LA VIA.

ING. RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dexter Morley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 18 DE JUNIO 2024.

ESTADO DEL TIEMPO : CLIMA SECO

ACTIVIDADES:

TS-S2 y TS-26

BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION DE AGUA DE LA EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA CON CARQUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL.

EN EL TS-26 SE REALIZA VERIFICACION DE PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION MEDIANTE EL REPLANTEO Y LOCALIZACION TUBERIAS; EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE DE TUBERIA CON BASE GRANULAR. EMBOQUILLE DONDE SE DEMOLIO MURO PS-25N PARA INSTALAR TUBO CON CONCRETO PLUVIAL VIA AGUALINDA CONFORMACION Y ADECUACION DE LA VIA.

ING. RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 19 DE JUNIO 2024

ESTADO DEL TIEMPO : PRESENCIA DE LLUVIAS MODERADAS EN LA MAÑANA

ACTIVIDADES: TS-S2 Y TS26

BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION DE AGUA DE LA EXCAVACION; RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TRANSPORTADOS;

EXCAVACION MECANICA CON CARQUE Y RETIRO DEL

	MATERIAL.
	PLUVIAL VIA AGUALINDA CONFORMACION Y ADECUACION
	DE LA VIA.
	ING. RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA
	Deiby Hurley — INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA
JUEVES	20 DE JUNIO 2024
	ESTADO DEL TIEMPO: CIMA SECO Y SOLEADO
	ACTIVIDADES: TS-52 Y TS-26
	BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA
	DE LA EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA; CARGUE
	Y RETIRO DEL MATERIAL.
	PLUVIAL VIA AGUALINDA CONFORMACION Y ADECUACION
	DE LA VIA.
	ING. RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA
	Deiby Hurley — INSPECTOR DE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA
VIERNES	21 DE JUNIO 2024
	ESTADO DEL TIEMPO: CIMA SECO Y SOLEADO
	ACTIVIDADES: TS-52
	BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA
	DE LA EXCAVACION; REPLANTEO Y LOCALIZACION DE
	TUBERIAS VERIFICACION ALINEAMIENTO Y NIVELES
	EXCAVACION MECANICA; EXCAVACION A MANO;
	CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL;

NA

INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8/12"
RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRA-
NULAR. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: INSTALACION
SILLA YEE PVC 12"x6"; EXCAVACION A MANO;
RELLENO ZONA DE ATRAQUE ARENA LAVADA APISONADA.
TS-26:
BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION
AGUA DE LA EXCAVACION.
EXCAVACION MECANICA.
APUNTALAMIENTO METALICO PARA ENTIBACION
CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL.
PLUVIAL VIA AGUALINDA CONFORMACION Y
ADECUACION DE LA VIA.

ING. RESIDENTE

DIRECCION INTERVENTORIA

Dorfo Morlef
INSPECTOR DE OBRA

SERGIO LOPEZ
INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIER

SABADO 22 DE JUNIO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES: TS-52: BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION; RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TRAMOS INSTALADOS.

T3-26: BOMBEO; REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (ALINEAMIENTO Y NIVELES); EXCAVACIÓN MECANICA; EXCAVACION MANUAL; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZANJA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

CONFORMACION Y ADECUACION VIA AGUALINDA TRAMOS DEL PLUVIAL.

ING. RESIDENTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 24 DE JUNIO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: EL DOMINGO 23 DE JUNIO 2024 FUE UN DIA LLUVIOSO CON LLUVIAS INTENSAS Y MODERADAS.

ACTIVADADES: SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO Ø36"; Ø24" y Ø12".

TS-52 y T3-26

BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION EN LOS TRAMOS INSTALADOS; EXCAVACIÓN MECANICA; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL.

EN EL T3-52 SE REALIZA APUNTALAMIENTO METALICO PARA ENTIBACION EMPLEANDOSE EL

4

SISTEMA TIPO CAJON.
EN el TS-26 COMO COMPLEMENTO EN LAS ACTIVIDADES SE HACE REPLANTEO y LOCALIZACION DE TUBERIAS (ALINEAMIENTO) PARA AVANZAR EN LA EXCAVACIÓN.
EN EL PLUVIAL SE EJECUTA el RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION EL POZO PP-44. SE CONTINUA CON LA CONFORMACION Y ADECUACION DE LA VIA AGUALINDA, ACTIVIDAD QUE HA SIDO DISPENDIOSA Y LENTA POR LAS LLUVIAS ACAECIDAS.

ING. RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dario Harley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

MARTES 25 DE JUNIO 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLARA PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA NOCHE Y A/ MEDIODIA.
ACTIVIDADES: TS-52 y TS-26.
BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL y EXTRACCION AGUA; RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACION TRAMOS INSTALADOS; EXCAVACION MECANICA CON CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL.
PLUVIAL CONFORMACION Y ADECUACION VIA AGUALINDA.

ING RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

Dario Harley
INSPECTOR DE OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

NCB

5.12.10 ACTAS DE VECINDAD

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 08 MM 05 AA 2024

ACTA N°: 113

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

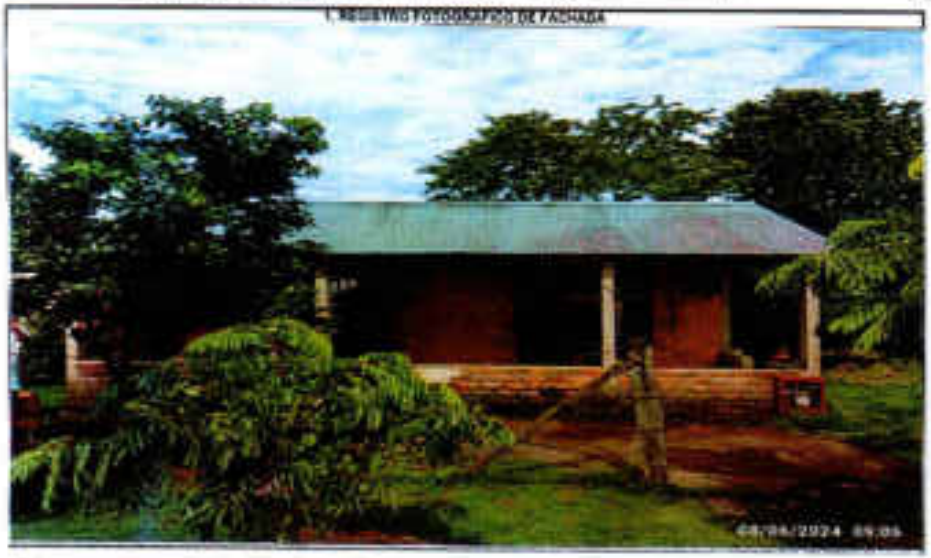

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ovidio Molina

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Ovidio Molina

Cédula de Ciudadanía: 9652988

Dirección: Carrera 11 [illegible]

Teléfono: ___ No. de pisos: ___

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRÁN Barrio: ___

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cual? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Salud	
3. Industrial		8. Seguridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO X

Uso del garaje: ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar material de aguas lluvias y residuales, tapa metálica y de madera en fincas convertidas a fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
	X Fisura en anden	X Fisura en muro	X Fisura en piso habitacion	X Fisura en teja de zinc	X Fisura en columna y viga	X Fisura y humedad en lavadero	
		X Fisura en bloque	X Descascaramiento en piso	X lavadero	X Descascaramiento en columna		
		X Fisura en boldosa cocina					
COMENTARIO	Teja zinc		Piso en boldosa	Teja zinc	Estructura en bloque y ladrillo Acero expuesto en la viga y columna		

ACTA DE VECINDAD FIRMADA POR LOS CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA Y SU EVIDENCIA FOTOGRAFICA

FIRMAS

Ovidio Molina
Firma Propietario Arrendatario Poseedor
Nombre
CC O NIT 9652988

Representante Legal Contratista Obra
Nombre Diego Lopez

Representante Legal Interventoria
Nombre Andrés López

Testigo
Nombre
(Delegado Alcalde, Personero, Junta Accion Comunal)

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 17 3

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 05 MM 06 A. 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Guido Molina
Firma: Propietario-Arrendatario-Poseedor
C C O NIT

Nombre:
Firma:

Nombre:
Firma:

Nombre:
Firma:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 114

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 8 MM 06 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario:
Cedula de Ciudadania:
Direccion:
Telefono:
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN No. de predio: Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Telefonia	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cual? ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	7. Baldio	☐	Via de acceso pavimentada	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar instalaciones de aguas lluvias y residuales, encontrara muebles y del mismo en fincas, cerraderos y barrios)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. GRIETAS Y FISURAS	☑ Fisura en andenes	☑ Fisura en muro	☑ Fisura en piso	☑ Rotura en la teja	☐	☑ Fisura en baldosa del lavadero	☑ Rotura en vidrio
2. HUNDIMIENTOS	☐	☐ Rotura / perforación en muro	☐	☐	☐	☐	☐
3. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS	Teja eternit Baldosa		Baldosa Suelo cemento	Teja eternit Cielo raso Teja Bahc	Separación de acero en el techo Columna en concreto Estructura en Vigas		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
C.C. O NIT 1118.308.919

Representante de la Empresa de Servicios
Nombre LUCERO FONSECA

Representante de la Interventoria
Nombre Andrés López

Cargo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 114	PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA DD 08 MM 06 AA 2024	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
C.C. O Ref. 1115.538.144

Representante del Contratista de Obra
Nombre

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
Delegado Acalde, Personería, Junta Acción Comunal

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista Interventoría, Propietario

053

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA: 1 DE 1	

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 8 MM 06 AA 2024.

ACTA Nº: 125

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 032 2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN. MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Manuel Gutierrez

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?

Nombre del Propietario: Manuel Gutierrez

Cedula de Ciudadanía:

Dirección: Manga Tilodiran barrio centro

Teléfono: 314 245 8498 No. de placa:

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRÁN Barrio: Centro.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Telefonía		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES: Ninguna

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☒ NO ☐ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales. Legislación ambiental y de medio no tocar, necesarios y Sumideros)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. GRIETAS Y FISURAS	☒ Fisura en arañon	☒ Fisura en muro	☐	☒ Fisura en teja de la cocina	☐	☒ Baldosa de lavadero rota	☐
2. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. DESPLAZAMIENTOS	☐ Baldosa roto	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIO	Teja eternit Cercha en madera	Ladrillo	Baldosa Sardinel cemento	Teja rota Teja eternit Drainol Teja zinc	Estructura en ladrillo columnas metalicas Cerchas metalicas	Si tanque subterraneo	Carpintería metálica

FIRMAS

Nombre: Manuel Gutierrez

CC O NIT: 1117498163

Representante de la Interventoría

Nombre: Diego Perez Z

Representante de la Contratista

Nombre: Andres Lopez

Testigo

Nombre:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 115

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA		
DD 8	MM 06	AA 2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS






PAREDES





TECHO





BAÑO





COCINA





OBSERVACIONES: Escribir la referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DA LA CONFORMIDAD QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD.

FIRMAS

Firma Propietario/Tenedor/Poseedor
Nombre: Gonzalo Cardenas
CC O NIT: 4742073

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre:

Cargo:
Nombre:
Delegado Alcaldía Paramento Junta Acción Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 116

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 08 MM 06 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 032-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luz Delia Molina

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Hija

Nombre del Propietario: Salomón Molina Gómez

Cédula de Ciudadanía

Dirección: Cuerpo Virgen

Teléfono: No. de piso

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRÁN Barrio: Centro

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfono	☐	☒
5. Gas	☐	☒
6. Televisión cable	☐	☒
7. Otros	☐	☒

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin enlucir ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Bodega	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☒ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Ventanas, marcos de aguas lluvias y medidores, pergolas metálicas y en madera en frisos, barandales y fundas)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. GRIETAS Y FISURAS	☒ Fisura en anden	☒ Fisura en muro	☒ Fisura en el suelo	☐	☒ Fisura en viga	☐	☒ Ventana de puerta y ventana rota
2. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Baldosa de la cocina con fisuras
3. DESPLOMAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CONSTANTES	Teja de eternit Teja Zinc	Muros en bloque	Baldosa y suelo cemento	Teja eternit	Cercha en guadua Cercha metálica Columna metálica y en madera	Sin tanques subterraneos	Carpintería metálica

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA VERDAD

FIRMAS

Luz Delia Molina
Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
CC O NIT 47.229.526

Representante del Consorcio o Unión Temporal
Nombre DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre Andres Lopez

Cargo
Nombre
Delegado Medio Ambiente, Juliet Kevin Gonzalez

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 116	PAGINA: 1 DE 1	
		Inicial	Seguimiento	Cierre
		FECHA: DD 08 MM 06 AA 2024		

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES




TECHO



BAÑO



COCINA

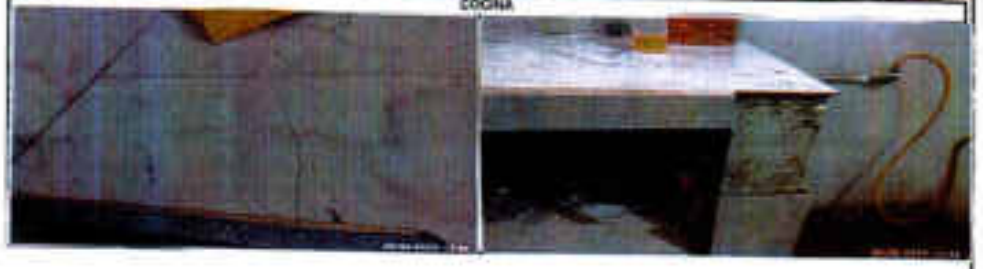

OBSERVACIONES: Escribir la referencia al seguimiento y/o cierre

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS FOTOGRAFIAS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA PK 0+000

FIRMAS

Luz Adela Molina

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: LUZ ADELA MOLINA

C.C. 0 N.I.T. 1118543586

Firma: Representante de la Interventoria

Nombre: DIEGO FELIPE

Firma: Representante de la Contratista

Nombre: Andrés López

Firma: Testigo

Nombre:

Original: Archivo de Gestion del Contratista

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Delegación Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal

ASS

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 013

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	INICIAL	SEGUIMIENTO	CIERRE
FECHA	DD 13	MM 06	AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Oliva Contratista
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Oliva Contratista
Cédula de Ciudadanía: 52064254
Dirección: Departamento Tilo
Teléfono: 3202763115
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRÁN No. de pisos: 1 Barrio: Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Telefonía		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar X Obra Gris ___ Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ___ NO ___ Uso del garaje ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, caracteristicas estéticas y sin medidas de bienes vecindarios y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS			Fisura en placa de concreto				
2 HUMEDADES							
3 HUNDIMIENTOS							
4 DESPLOMAMIENTOS							
5 OTROS							
OBSERVACIONES							

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
C.C. O NIT 52064254

Representante del Contratista de Obra
Nombre Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre Andres Lopez

Testigo
Nombre
Cargo/No Predio: Personería Junta Acción Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 12

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	


FECHA		
DD 13	MM 06	AA 2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS

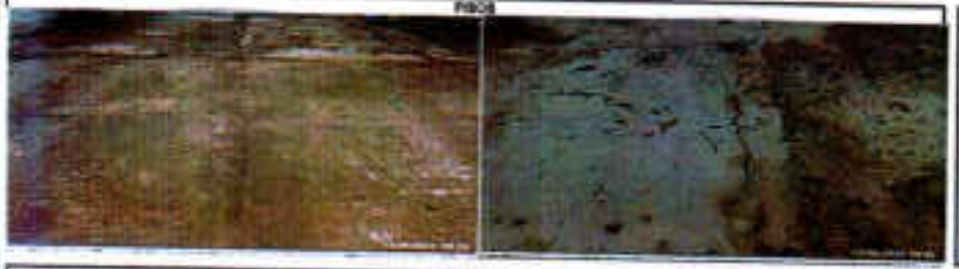

PAREDES

TECHO

BAÑO

COCINA

OBSERVACIONES: Escribir si referencia al seguimiento y/o cierre

El predio cuenta solamente con la placa piso

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

PERITOS

320625

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre

C.C O NIT

Representante Legal Contratista

Nombre DIEGO PEREZ

Interventoria

Nombre Nicolas López

Testigo

Nombre

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 124

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 13 MM 06 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Berta Cano 47473258
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual: Cuidadora
Nombre del Propietario: Iglesia María Auxiliadora
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: Corregimiento Tilodiran
Teléfono: 3214126885 No. de casa ___
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN Barrio: Centro

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ___ URBANO X
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI X NO ___
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escalonado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial		6. Recreacional		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial		7. Baldío		Clínica	SI ___ NO X
3. Industrial		8. Salubridad		Uso del garaje	
4. Institucional o de Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	X	11. Mixto	
5. Agropecuario		10. Mixto		12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar material de aguas lluvias y residuales, especificar metálicos y de madera en ventanas, cerraduras y bisagras)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. GRIETAS Y FISURAS	X Fisura en arriba y baldosa	X Fisura en medio de fachada	X Baldosas rotas		Desgaste y deterioramiento en viga	X Fisura en lavadero	
2. HUMEDADES			X Fisura en piso		Exposición de acero en la viga	X Presenta humedad	
3. HUNDIMIENTOS							
4. DESPLAZAMIENTOS							
5. OTROS							
COMENTARIOS		Muro en ladrillo	Piso en baldosa	Diablo! Teja de eternit	Estructura en ladrillo Vigas de confinamiento Techo metalico		Carpintería metálica

ACTA DE IDENTIFICACION QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Berta Cano
CC O Nit: 47473258

Representante Consorcio
Nombre: Diego Perez

Representante Interventoría
Nombre: Andrea López

Testigo
Nombre

Delegado Alcaldía, Personería, Juntas de Acción Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 019

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	
FECHA			
DD	MM	AA	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES. Escribir la referente al seguimiento y/o cierre

COCINA

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
CC O Nit 4443725

Representante de la Empresa
Nombre

Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
Cargo: Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Contratista, Interventor, Supervisor

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA	DD 13 MM 06 AA 2024

ACTA N°: 120

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVIDENCIA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jorge Anibal Niño
Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?
Nombre del Propietario: Jorge Anibal Niño
Cédula de Ciudadanía:
Dirección: Carrera Tilodirán
Teléfono:
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN No. de predio Barrio: Centro

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? X URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar Obra Gris Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado Escarpado Plano X

USO ACTUAL

1 Residencial	X	8 Recreacional	
2 Comercial		7 Salud	
3 Industrial		8 Salubridad	
4 Institucional o del Estado		9 Cultural (Educación, culto religioso)	
5 Agropecuario		10 Mixto	
		11 Minero	
		12 Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Darsa SI NO X
Uso del predio:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en frisos, revestimientos y barreras)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X	X	X	X		X	
2 HUMEDADES					X		
3 HUNDIMIENTOS							
4 DESPLAZAMIENTOS							
5 OTROS							
CONSTANCIA	Teja zinc	Muro en bloque y ladrillo	Suelo cemento Baldosa	Teja eternit Teja zinc	Columnas y viga en concreto reforzado Estructura en bloque	Sin tanque subterraneo	Carpintería metálica

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA TIENE CARACTER INFORMATIVO

FIRMAS

Nombre: Jorge Anibal Niño
Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
C.C. 0 NIT

Representante del Consorcio o Unión
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA: DD 13 MM 06 AA 2024	

ACTA N°: 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS

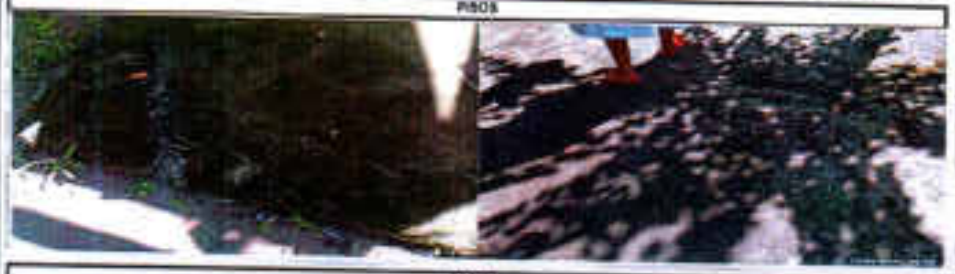

PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir la referencia al seguimiento y/o cierre

CODINA



"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jorge Estrella Cristo

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Jorge Estrella Cristo
CC: 9.167

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEÑA

Representante de la Interventoria
Nombre:

Testigo
Nombre:

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

H63

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 123

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA		
DD 13	MM 06	AA 2024

1. DESCRIPCION FOTOGRAFICA DE LA VIVIENDA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Magdalena Perez

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Hija

Nombre del Propietario: Carmen Elvira Perez Velandia

Cédula de Ciudadanía: 23459011

Dirección: Carrera 7 Calle 5

Teléfono: 3143868578

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN No. de piso: ___ Barrio: Centro

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminado X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X Estrenado ___ Plano ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Minero	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ___ NO X

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Anotar si hay daños en aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera en ventanas, mesoneros o similares)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. PAREDES Y MUROS	X Fisura en anden	X Fisuras en los muros	X Fisuras en el piso	X Teja rota			Baldosa rota en la cocina
2. CIELOS	Fisura en muro de la fachada						
3. MOBILIARIO							
4. DESPLAZAMIENTOS							
5. OTROS							
COMENTARIOS		Muros en bloque	Suelo cemento con mineral	Teja eternit Teja tinc	Cerchas metalicas Estructura en bloque	Sin tanque Subterraneo	Carpinteria metalica

NOTA: DE NO SER CONSTATADA NINGUNA DE LAS CONDICIONES EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Magdalena Perez
Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
C.C. o NIT 23459958

Representante de la Interventoría encargado
Nombre: [illegible]

Representante de la Empresa encargado
Nombre: [illegible]

Testigo
Nombre
Delegado Alcalde Parroquia Junta Acción Comunal

1/1

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 127

Pág/Pág.	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA: DD 13 MM 06 AA 2029

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Yesid Valencia Pérez
Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
C.C. O NIT: 23439958

Nombre: DIEGO TORO
Profesional de Interventoría

Nombre:
Profesional de Obra

Nombre:
Delegado Alcalde, Presidente Junta Acción Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 122

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 14 MM 06 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Alexis Betancourt

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Ana Lucia Monguira

Cédula de Ciudadanía: 1121[illegible]

Dirección: Cra 4A # 4A-20

Teléfono: 3214[illegible]

No. de piso: ___

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL TILODIRAN Barrio: ___

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Telefonía	X		
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminado X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X Ejecutado ___ Plano X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ___ NO X; Uso del garaje ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verifica roturas de aguas lluvias y residuales, corrosión metálica y de madera, en losas, escaleras y barandas)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1 FACHADAS Y FIGURAS	X Fisuras en enlace	X Fisura en muro	X Fisura en piso	X Fisura en la teja	X Fisura en viga		X Baldosa rota en la cocina y en el baño
2 MUROS							
3 CIMENTACIONES							
4 DESPLAZAMIENTOS							
5 OTROS							
OBSERVACION	Teja Bvc. Cerramiento en lona verde	Muros en bloque		Teja Bvc	Columnas y vigas en concreto reforzado Cerchas metalicas y en madera		

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario o Poseedor: Alexis
Nombre: [illegible]
C.C. O NIT: 1094[illegible]

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]

Firma: ___
Nombre: ___

4964

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2023
PAGINA 1 DE 1	
Inicial	Seguimiento / Cierre
FECHA: DD 14 MM 06 AA 2024	

ACTA Nº: 122

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 032-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPO-091-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO Nº ACUA-SPRO-091-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre: Alonzo

CC Nº 1.974.855

Representante del Contratista de Obra

Nombre: DIEGO [illegible]

Interventoría de la Obra

Nombre: [illegible]

Nombre

Cargo

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 122

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Visita: Inicio | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 14 MM 06 AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Maria Omaira Guanaro

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Maria Omaira Guanaro

Cédula de Ciudadanía: 41913264

Dirección: Cra 48 # 28-30

Teléfono: 3115613865 No de casa ___

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN Barrio: Las Villas

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ CUAL? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X Parcial ___

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional		11. Minero	
2. Comercial		7. Baldío		12. Otro	
3. Industrial		8. Salubridad			
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación culto religioso)			
5. Agropecuario		10. Mixto			

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ___ NO X; Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Describir manejo de aguas lluvias y residuales, saneamiento básico y de residuos, en áreas rurales y barrios)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. GRIETAS Y FISURAS	X Fisura en andar	X Fisura en muro	X Fisura en piso		X Fisura en viga		X Baldosa rota en la cocina
2. HUNDIMIENTOS							X Se observa rotura de vidrio de ventana
3. ASENTAMIENTOS							
4. DESPLAZAMIENTOS							
5. OTROS							
OBSERVACIONES	Teja zinc	Muros en bloque	Baldosa Suelo concreto	Teja zinc	Columnas y vigas en concreto reforzado Cerchos metalicos	Sin tanque subterraneo	

HOJA 1 DE 2 CERTIFICA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Omaira Guanaro
C.C. o NIT: 41913264

Representante Legal Empresa Contratista
Nombre: DIEGO PEREZ

Interventoría obra Planificación
Nombre:

Testigo
Nombre:
Cargo: Delegado Alcalde, Presidente Junta Acción Comunal

4690

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 234

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre


FECHA: DD 14 MM 06 AA 2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS

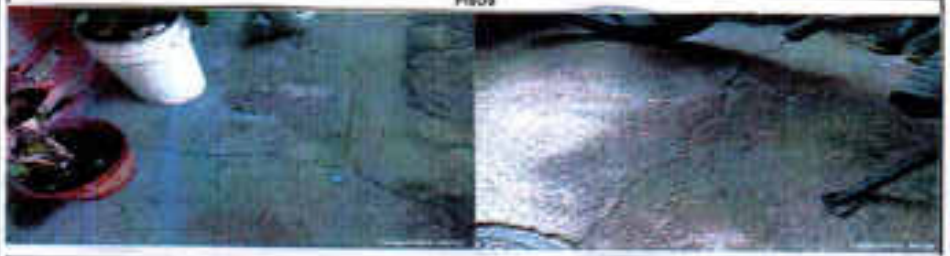

PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir la referencia al seguimiento y/o cierre

No fue posible el ingreso a una habitación

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO"

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
Cargo: Propietario, Poseedor, Arrendatario, Junta Acción Comunal

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA: 1 DE 1	

ACTA N°: 124

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 030 2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-EPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA

DD 14 MM 06 AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Lidia Esneyda Guanaco

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Lidia Esneyda Guanaco

Cédula de Ciudadanía: 23491 049

Dirección: Cra 4A # 5A - 14

Teléfono: 3139123924

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN No. de piso: ___ Barrio: Los Villas

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ] Escarpado [ ] Plano [X]

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Salud	
3. Industrial		8. Seguridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI [ ] NO [X] Uso de garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENTOR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera en fincas residenciales y turísticas)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. GRIETAS Y FISURAS	X Fisura en anden	X Fisura en muro	X Fisura en piso	X Teja zinc	Exposicion de acero en viga	X Fisura y humedad en el lavadero	X Baldosa rota en la cocina y en el baño
2. HUMEDADES	Fisura en muro de la fachada			Fisurada	Fisura en viga		
3. HUNDIMIENTOS							
4. DESPLAZAMIENTOS							
5. OTROS							
OBSERVACIONES	Teja eternit	Muros en bloque	Baldosa. Suelo cemento	Teja eternit Deteriorada	Columnas metalicas Columnas y vigas en concreto reforzado		Carpintería metalica

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

LIDIA ESNEYDI GUANACO
Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
C.C. N° 23491049

Representante de la Consultoría de Obra
Nombre DIEGO BEJARANO

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Designado Notaría Personería Junta Acción Comunal)

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA Nº: 124

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 14 MM 06 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 033-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SI DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

LIDA ESNEYDI GUAMARO
Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
CC O NIT 33481929

Representante de Consinter Ltda
Nombre

Supervisor de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 125

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 14 MM 06 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTEK DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Victor Martinez 3115533403
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario
Cédula de Ciudadanía
Dirección: Carrera 19 Vía Tilodirán
Teléfono
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRÁN No. de piso: Barrio: Las Villas

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Minero	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO X
Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Describir material de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fachada, ventanería y cubierta)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
* GRIETAS Y FISURAS	X Fisura en anden	X Fisura en muro		Teja rota		Fisura en lavadero	Baldosa rota en el caño
* HUNDIMIENTOS		Perforación en muro					
* DESPLAZAMIENTOS							
* OTROS							
COMENTARIOS	Teja eternit	Muro en bloque	Baldosa	Teja eternit	Cerchas metálicas Columnas en concreto reforzado	Sin tanque subterraneo	Carpinteria metalica

ACTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
C.C. O NIT No. 1.116.533.403

Representante de la Comunidad
Nombre DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre Andrés Lopez

Cargo
Nombre
Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA: 1 DE 1	

ACTA N°: 125

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 031-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 14 MM 06 AA 2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir la referencia al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre:
C.C. ó NIT 1.115.726.743.

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante Legal Interventoría
Nombre: Fredis Lopez

Testigo
Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Contratista, Interventor, Poseedor

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA: 1	DE 1

ACTA N°: 12

CONTRATO DE OBRa PUBLICA N° 932-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA		
DD 17	MM 06	AA 2024

Inicial	Seguimiento	Cierre

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Nubia Rodriguez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Nubia Rodriguez

Cédula de Ciudadanía: 23741769

Dirección: Carrera 11 #28-

Teléfono: 3143137558 No. de predio: ___

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN Barrio: Centro

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

TIPO DE PREDIO: RURAL ___ Cual? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial		6. Recreacional		ACUERDOS VECINALES	
2. Comercial		7. Bodega		Cierre	SI ___ NO X
3. Industrial	X	8. Seguridad		Uso del cierre	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)		11. Mixto	
5. Agropecuario		10. Mudo		12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, disposición sanitaria y de residuos en fincas rezagadas y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	X Fisura en anden		X Fisura en suelo	X Fisura en teja	Cerchas de guadua en regular estado		
2 HUMEDADES			Desmoronamiento de placa base				
3 HUNDIMIENTOS							
4 DESPLAZAMIENTOS							
5 OTROS							
OBSERVACIONES		Caseta metálica	Suelo cemento	Teja zinc	Cerchas en guadua Columnas en madera		

FIRMAS

Nubia Rodriguez
23.741.769

Firma Propietario Arrendatario Poseedor

Nombre
C.C. O NIT

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

Representante del Contratista de Obra
Nombre DIEGO PEREZ

Representante del Contratista de Interventoría
Nombre

Cargo
Nombre
Entregado: Vivienda, Peatonal, Zona Común, Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 126	PAGINA: 1 DE 1	Inicial / Seguimiento / Cierre
		FECHA: DD 17 MM 06 AA 2024	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PARROS



TECHO



BAÑO

COCINA

OBSERVACIONES: Escribir la referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nubia Rodriguez
Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
CC C.N° 23741769

Representante del Consorcio
Nombre DIEGO

Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-061
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 123

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial ☐ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA: DD 17 MM 06 AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Pedro Cachero 74814108

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario: Julio Forero

Cédula de Ciudadanía:

Dirección: Carrera Tilodiran

Teléfono:

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN No. de piso: Barrio: Centro

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐	Garaje SI ☐ NO ☒	
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Minero	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENCIÓN

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Incluir manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fibras naturales y humos)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ Fisura en suelo cemento con mineral	☒ Fisuras en muros	☒ Fisuras en piso	☐	☒ Fisura en columna y viga	☒ Fisura en lavadero	☒ Fisura en baldosa de baño y cocina
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐ Exposición de acero en columna	☐ Presencia de humedad en el lavadero	☐
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CONSTANTES	Teja zinc	Adobe en bloque	Suelo cemento Suelo cemento con mineral	Teja zinc	Columnas y vigas en concreto reforzado Cerchas metálicas		Cerchas en guadua en regular estado

HOJA 10 DE 10 CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Pedro Cachero 74814108
Propietario/Arrendatario/Poseedor
CC o NIT

Nombre: Representante de Consinter del Oriente
Interventoría

Nombre: Representante de la Interventoría

Testigo
Nombre
Delegado Atención Personería Junta Acción Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	

ACTA N°: 127

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	Inicial / Seguimiento / Cierre
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA: DD 19 MM 06 AA 2024
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SI DEJA CONSTANCIA SUS LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
C.C.

Representante de la Empresa encargado
Nombre

Firma
Nombre
Cargo

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista, Interventor, Propietario

474

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial	Seguimiento — Cierre
FECHA	
DD 19	MM 06 AA 2024

ACTA N°: 128

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 550-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 537-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Juliana Ubidia Garces

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Juliana Ubidia Garces

Cédula de Ciudadanía: 1.430.290

Dirección: Corregimiento Tilodiran

Teléfono: 3117462578 No. de piso ___

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN Barrio: Pueblo - Centro

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL Casa X URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Casa Sola ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial		7. Bares		Carrera	SI ___ NO X
3. Industrial		8. Salubridad		Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)		11. Minero	
5. Agropecuario		10. Mixto		12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas, cocederos y beneficiaderos)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1 GRIETAS Y FISURAS	X Fisuras en andén	X Fisuras en muros	X Fisuras en piso	X Teja rota		X Baldosa rota en el lavadero	Baldosa despegada en la cocina
2 HUNDIMIENTOS		X Perforación en muro					
3 DESPLAZAMIENTOS							
4 OTROS							
COMENTARIOS	Teja eternit	Muros en bloque	Suelo cemento Baldosa	Teja eternit	Conchas metalicas Columnas en acero		Carpintería metálica

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Sofia Propietario/Arrendatario/Poseedor
C.C. O NIT 1052345716

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego [illegible]

Representante de la Interventoría
Nombre: [illegible]

Testigo
Nombre
(Delegado Acueducto, Alcantarillado y Junta Acción Comunal)

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA: 1	DE: 1

ACTA N°: 127

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 17 MM 06 AA 2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS




PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escriba la referente al seguimiento y/o cierre

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
C.C. O NIT 1031457[illegible]

Representante de la Constructora
Nombre

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 17 MM 06 AA 2024

ACTA N°: 129

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Gregorio Fernandez 16661816

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Angel Lopez

Cédula de Ciudadanía: 72225196

Dirección: Carrera 1 N° 1a-81 Barrio

Teléfono: 3115831169 No. de pisos: 1

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN Barrio

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X Ampliación ___

PRESENTE DEL TERRENO: Ondulado ___ Escarpado ___ Plano X

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Salud	
3. Industrial		8. Seguridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ___ NO X Uso del garaje ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar: Instalación de agua fuentes y canalizaciones, carpintería metálica y de madera, en fincas, cementerios y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1-GRIETAS Y FISURAS		X Fisura en muro	X Fisura en el piso	X Teja rota	Exposición de acero en columna	X Fisura en lavadero	X Fisura en mesón de la cocina
2-HUMEDADES							
3-HUNDIMIENTOS							
4-DESPLAZAMIENTOS							
5-OTROS							
COMENTARIOS	Teja ZINC Cercha en guadua	Muros en bloque	Balldosa Suelo cemento	Teja ZINC Teja eternit	Columnas y vigas en concreto reforzado Cerchas metálicas		Carpintería metálica

NOTA: SI HAY DISCREPANCIA CON LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA COMUNICARSE A LA RESIDENTE

FIRMAS

Nombre: Jose Gregorio Fernandez Fuentes
C.C. O NIT: 3052 16612816

Representante de la Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoria
Nombre: Andrés Gómez

Testigo
Nombre
Cargo: Residente Residente Junta Acción Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 19

Pagina:	1	De:	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA		
DD	MM	AA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° ESS-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° SST-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSULTEN DEL ORIENTE S.U.


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS




PAREDES



TECHO



BAÑO

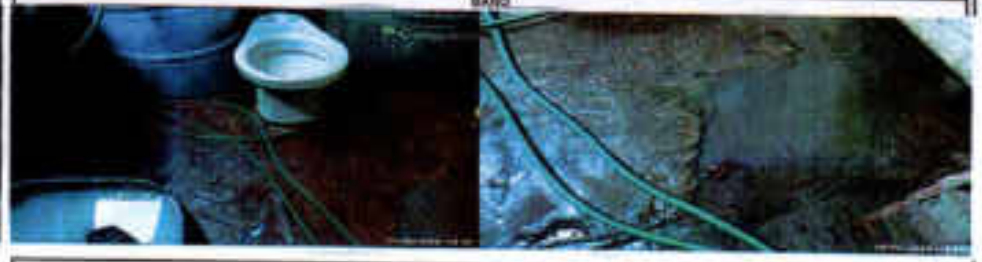

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

COCINA



"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Poseedor/Ocupante
Nombre: JOSE ALEJANDRO
C.C. O NIT 7055216602816

Representante de Contratista de obra
Nombre DIEGO RUIZ

Representante de la Interventoria
Nombre Andrés López

Testigo
Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 de 1

ACTA N°: 220

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 17 MM 06 AA 2024



1. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Heiver Yesid Neme

Tenencia: Propietario [X] Arrendatario [ ] Poseedor [ ] Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Heiver Yesid Neme

Cédula de Ciudadanía: 1.047.385.317

Dirección: Carrera 4 Tilodiran

Teléfono: 3133076288

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN No. de pers. 4 Barrio: Hernando Pulido

SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[ ]	[X]	
6. Televisión cable	[ ]	[X]	
7. Otros	[ ]	[X]	

TIPO DE PREDIO: RURAL [ ] Cual? URBANO [X]

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar [ ] Obra Gris [ ] Terminada [X]

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI [ ] NO [X] Estrenado [ ] Plena [X]

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado [ ]

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Recreacional	[ ]	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	[ ]	7. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ] NO [X]
3. Industrial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado	[ ]	9. Cultural (Educacion, culto religioso)	[ ]	11. Minero	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	10. Mixto	[ ]	12. Otro	

2. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar riesgos de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas vecindarios y talleres)
1 GRIETAS Y FISURAS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2 HUMEDADES	[X] Fisura en anden	[X] Fisura en los muros	[X] Fisura en piso	[X] Teja rota	[X] Fisura en la estructura del tanque aereo, a su vez se observa exposición de acero	[X] Baldosa rota en lavadero	[X] Fisura en baldosa de la cocina
3 HUNDIMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4 DESPLAZAMIENTOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5 OTROS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
COMENTARIOS	Teja eternit Suelo cemento	Muros en ladrillo	Baldosa	Teja eternit	Columnas y vigas en concreto reforzado Cerchas metalicas		Carpinteria metalica

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre
C.C. O NIT 1047385317

Representante de Consultoría de Obra
Nombre DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre Jhon Fredy Cortés Cruz

Fecha
Nombre
Delegado Acalde, Presidente Junta Acción Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA: 1	DE: 1

ACTA N°: 130

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSIMTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA

DD	MM	AA
17	05	2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


PISOS




PAREDES



TECHO

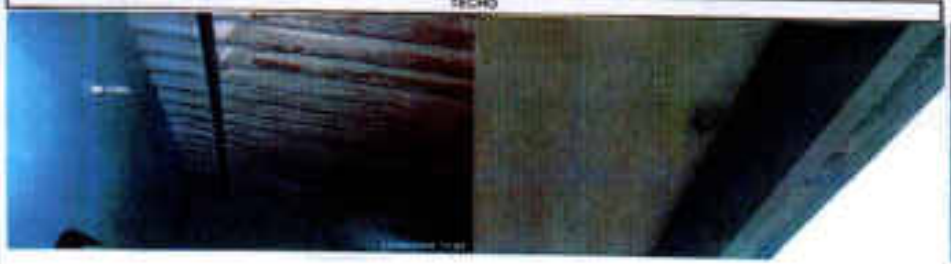

MAÑO

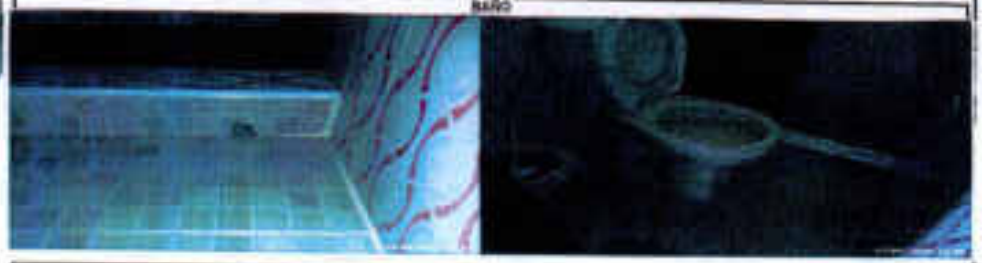

COCINA



OBSERVACIONES: Escribir la referente al seguimiento y/o cierre

No fue posible el ingreso a una habitacion

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C C O NIT 74795218

Representante [illegible]
Nombre DIEGO IBEZ

Testigo
Nombre

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA: 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA: DD 17 MM 06 AÑO 2024	

ACTA N°: 131

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jhon Alfaro 1006932X

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario

Cédula de Ciudadanía

Dirección: Conjunto Tinajitas

Teléfono: No. de piso:

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN Barrio

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar Obra Gris Terminada X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI NO X Enlucido Plano

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado Escalado

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Salud	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X

Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera en techos, ventanería y fachada)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1 GRIETAS Y FISURAS	X	X				X	X
2 HUNDIMIENTOS	Fisura en anden	Fisura en muro				Fisura en lavadero	Fisura en baldosa de cocina
3 DESPLAZAMIENTOS	Socavación en andén						
4 OTROS							
COMENTARIOS	Teja eternit	Muros en bloque	Suelo cemento Baldosa	Teja zinc	Columnas y vigas en concreto reforzado Cerchas metálicas	Sin tanque subterraneo	Carpintería metálica

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORresponde A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Jhon Alfaro C.C. O NIT 13.919.342

Representante de Contratista de Obra Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Comunidad Cargo: Nombre:

Cargo Nombre

Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	
		Inicial	Seguimiento	Cierre
		FECHA	
		DD 12	MM 06	AA 2024

ACTA N°: 131

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSAITER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

No se dio autorización para el ingreso a la habitación

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Thay Alzate

Nombre
C.C. 0 MT

Representante del Contratista de Obra
Nombre DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Firma
Nombre
Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO	FOR-PROY-041
VERSION	01
REVISIÓN	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA	DD 29 MM 06 AA 2024

ACTA N°: 732

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.

PROYECTO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Marily Olarte Gutman
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Marily Olarte Gutman
Cédula de Ciudadanía: 1.116.[illegible]
Dirección: Carrera [illegible]
Teléfono: 3[illegible]
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN No. de casa ___ Barrio: Las Villas

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfono		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL Cual? ___ URBANO X

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminado X

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO X Ocupado X Piano X

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ___

USO ACTUAL

1. Residencial	X	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Salud	
3. Industrial		8. Seguridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO X
Uso del garaje ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENCIÓN

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Describir manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en techos, ventanerías y fachadas)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. GRIETAS Y FISURAS	X Fisura en andén	X Fisura en muro	X Fisura en piso	X Pintura en teja zinc	Exposición de acero en vigas	X Fisura en lavadero	X Bajada rota en la cocina
2. HUNDIMIENTOS				Tejas con esmalte			
3. AGRIETAMIENTOS							
4. DESPLAZAMIENTOS							
5. OTROS							
COMENTARIOS		Muros en bloque	Suelo concreto	Teja zinc Teja eternit	Columnas y vigas en concreto reforzado		Carpintería metálica

NOTA: LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Marily Olarte
Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
C.C. 0 1[illegible]

Representante del Consorcio/Unión
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: [illegible]

Testigo
Nombre
Cargo

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: 132	PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA DD 29 MM 05 AA 2024	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir la referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE HACE CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Maribel Alegre
Firma Propietario-Arrendatario-Poseedor
Nombre
CC O NIT 47036487

Representante de Contratista de Obra
Nombre DIEGO BAEZ

Representante de Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copia: Contratista Interventoría Propietario

484

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 29 MM 06 AA 2024

ACTA Nº: 133

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032 2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Asistencia Comunitaria
Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?
Nombre del Propietario: Asmeidy Tamara
Cedula de Ciudadanía:
Dirección: Hernando Rondón Tilodiran
Teléfono: 3115[illegible]
No. de pisos: 1
Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL-TILODIRAN Barrio: Hernando Rondón

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		X
5. Gas		X
6. Televisión cable		X
7. Otros		X

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO: RURAL CuaT ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☒ Uso del garaje

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENCIÓN

DESCRIPCION	FACHADA Y ANEXOS	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	Describir manejo de aguas lluvias y residuales, cerrajeria metalica o en madera en frisos, ventanerias y barandas
1 GRIETAS Y FISURAS	☒ Fisura en arden	☒ Fisura en muro	☒ Fisura en pisos	☒ Retiro en teja Zinc	☒ Exposición de acero en columna	☒ Fisura en lavadero	☒ Baldosa rota en el baño
2 HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐ Fisura en columna y viga	☐	☐
3 HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CONSTANCIA	Teja Zinc	Muro en bloque	Sobre concreto	Teja Zinc	Columnas y vigas en concreto reforzado Cerchas metálicas		Carpintería metálica

NOTA: SE HACE CONSTANCIA QUE LOS CONCEPTOS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Asmeidy Tamara
C.C. 23 467 [illegible] Yopal

Representante de la Interventoría
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Empresa
Nombre: [illegible]

Testigo
Nombre

Delegado Hombre Femenino Junta Acción Comunal

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-041
	ACTA DE VECINDAD	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		Página 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA DD 29 MM 06 AA 2024	

ACTA N°: 133

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSINTER DEL ORIENTE S.U.


PROYECTO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS

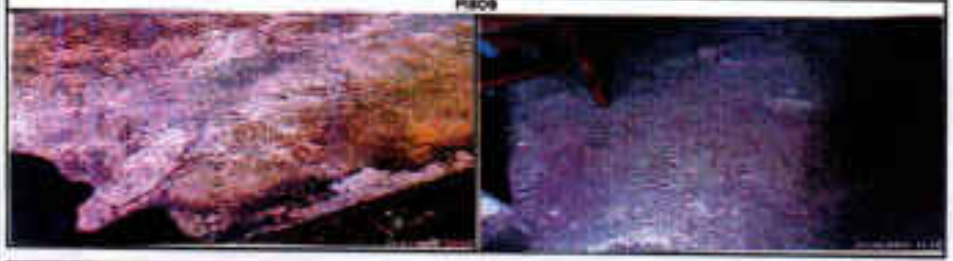

PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir la referencia al seguimiento y/o cierre

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre
CC O NIT 91459774 YOPAL

Representante del Contratista de Obra
Nombre DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Obligación Predios Particulares, Juntas Acción Comunal)

5.12.11 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO identificada con cedula de ciudadanía No. **47.436.168** en mi condición de representante legal de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S** identificada con **NIT 844004840**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

MES	No. PLANILLA	VR PAGADO
OCTUBRE 2023	9458950720	$5.332.000
NOVIEMBRE 2023	9460207629	$10.369.400
DICIEMBRE 2023	9460626216	$11.085.500
ENERO 2024	9462804873	$13.631.000
FEBRERO 2024	9464082040	$15.859.000
MARZO 2024	9465478986	$18.398.700,00
ABRIL 2024	9466967918	$ 21.639.000,00
MAYO 2024	9468574159	$ 22.898.300,00

LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA identificado con cedula de ciudadanía No. **74.376.604**, y con tarjeta profesional **No 126649-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de la empresa

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S identificada con **NIT 844004840**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) , pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. *Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.*

La presente se firma en Yopal Casanare a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2024.

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
C.C 47.436.168

LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA
C.C. 74.376.604
Revisor fiscal T.P No. 126649-T

4992

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.376.604
MORENO PEDRAZA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1960
SANTA ROSA DE VITERBO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-ABR-1999 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300100-00209512-M-0074376604-20010119 0020010025A 1 7300607714

VALIDO PARA. SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT: 844.004.840-0

VALIDA SOLO EN FIRMA ORIGINAL EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A.E.S.P NIT. 900.307.208-9

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

B F E A 5 F 8 5 1 E 4 5 1 2 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Q... tador publico **LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA** identificado con CÉDUL... C... IA No 74376604 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 126649-T S... inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

E... ...DOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZA... R...

D... ...OGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, conta... ...echa de su expedicion.

DIRECTOR GENERAL

...L CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ...TABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO ...ENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2...

...firmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina w... www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado.



JUNT... ...DE CONTADORES
...ROFESIONAL
...OR PUBLICO
126649-T
LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA
C.C. 74376604
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/08/2007
LUIS ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ 13693

Esta tarjeta es el unico documento que l... CONTADOR PUBLICO de acuerdo con l... la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta ta... al Ministerio de Educación Nacional - J... Contadores.

4964

ANEXO 6.6.1.
PLANILLAS DE CHARLAS DE SST

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	01 de ivo 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Divulgacion de Permisos de trabajo y ATS		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
2	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
3	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
4	ALBERTO ESCALANTE	1062851829	OFICIAL	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	BRAYAN LEGUIZAMON	1.007.747.536	CADENERO	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
11	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
12	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
13	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
14	NUIDU PEREZ	3348O635	CONTROLADORA	
15	WILMER ROA	943O674	OPERADOR	
16	DEIVID GUINA	74.770.319	OFICIAL	
17	LUIS BARRERO GONZAGA	17586O36	OPERADOR	
18	ELVER TARACHE	1118569118	AUXILIAR DE OBRA	
19	NELSON ALEJANDRO DUQUE	1118531O38	AUXILIAR DE OBRA	
20	LUIS FERNANDO GUINA	74862O19	AUXILIAR DE OBRA	
21	JHOHAN DAVID GOMEZ	1O29642224	AUXILIAR DE OBRA	
22	ALDAIR ORTIZ TABACO	1OO6557607	AUXILIAR DE OBRA	
23	ADRIAN DAVID SOLORZANO	111853O26O	AUXILIAR DE OBRA	
24	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1O66727172	AUXILIAR DE OBRA	
25	DAGOBERTO ARIZA	1122787	AUXILIAR DE OBRA	
26	WILSON PADILLA	7486O237	CADENERO	
27	JOSE MERCHAN	4282129	OPERADOR	
28	LUIS FERNANDO LEMUS	1O576O2737	CADENERO 1	
29	DIDIMO VARGAS	1348696O	OERADOR	
30	ELSY ALARCON	4744O746	CONTROLADORA	

Observaciones	Riesgos y Peligros e Obra	V.B. Responsable
		Madeleine Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	01-08-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Divulgacion de permisos de trabajos y ATS		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Lozano	Duracion: (Mi	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAIRO CUBIDES	9517517	ING RESIDENTE	
2	OSCAR ROSAS FERNANDEZ	1118530376	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
6	Jose Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar Obra	
7	Jose Jesus Orozco	1006.108.024	Oficial	
8	IVAN FABIAN REINA C.	1118 576 962	AUXILIAR O-	
9	Raul Raa	4150771	oficial	
10	Jorge Rincón	96.049.750	Oficial	
11	Fabio Gutierrez	1002645523	Auxiliar	
12	Sara Mendoza F	1074 012 413	Auxiliar	
13	Josep Checa	Y1128-9281	OFIAL	
14	Nestor Ortiz	1118774798	Ayudante	
15	ANDRES Torres	1118854144	Conductor	
16	Angelica Trujillo	23914357	Social	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	

FECHA:	04-06-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Riesgos y peligros en los puestos de trabajo		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
2	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
3	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
4	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	BRAYAN LEGUIZAMON	1.007.747.536	CADENERO	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
11	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
12	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
13	MADELEINE RODRIGUEZ	47436636	HSEQ	
14	NUIDU PEREZ	3348O635	CONTROLADORA	
15	WILMER ROA	943O674	OPERADOR	
16	DEIVID GUINA	74.770.319	OFICIAL	
17	LUIS BARRERO GONZAGA	17586O36	OPERADOR	
18	ELVER TARACHE	1118569118	AUXILIAR DE OBRA	
19	NELSON ALEJANDRO DUQUE	1118531O38	AUXILIAR DE OBRA	
20	LUIS FERNANDO GUINA	74862O19	AUXILIAR DE OBRA	
21	JHOHAN DAVID GOMEZ	1O29642224	AUXILIAR DE OBRA	
22	ALDAIR ORTIZ TABACO	1OO65576O7	AUXILIAR DE OBRA	
23	ADRIAN DAVID SOLORZANO	111853O26O	AUXILIAR DE OBRA	
24	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1O66727172	AUXILIAR DE OBRA	
25	DAGOBERTO ARIZA	1122787	AUXILIAR DE OBRA	
26	WILSON PADILLA	7486O237	CADENERO	
27	JOSE MERCHAN	4282129	OPERADOR	
28	LUIS FERNANDO LEMUS	1O576O2737	CADENERO 1	
29	DIDIMO VARGAS	13486960	OERADOR	
30	ELSY ALARCON	4744O746	CONTROLADORA	

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	04-06-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAIRO CUBIDES	9517517	ING RESIDENTE	
2	OSCAR ROSAS FERNANDEZ	1118530376	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
6	José María Salcedo	9.656.888	auxiliar obra	
7	Raul Ros			
8	[illegible]	4156771	oficial	
9	Tirzo Rincón	86049750	oficia	
10	Pablo Bustamante	[illegible]	[illegible]	
11	Ruben Dario Estupiñan	1.114.554.074	electrico	
12	Yenny carolina [illegible]	[illegible]	Coordinadora	
13	Jose Jesus Rincon	1006406024	oficial	
14	Raul Ros	4156771	oficial	
15	Jose Pedro	1116804321	oficial	
16	Sahir Hurtado T	1074012418	ayuda	
17	Armando Cepeda	9432512	oficial	
18	Nelson Ortiz	1118744793	ayuda	
19	Jose Gustavo Chaparro	1002226973	Conductor	
20	Oswaldo Rojas	7020 616 369	conductor	
21	ANDRES TORRES	1115854144	conductor	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	Mie 5 Junio 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Trabajo en equipo		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
2	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
3	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
4	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	BRAYAN LEGUIZAMON	1.007.747.536	CADENERO	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
11	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
12	RAFAEL LEMUZ	9366191	ALMACENISTA	
13	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
14	NAIDU PEREZ	3348O635	CONTROLADORA	
15	WILMER ROA	943O674	OPERADOR	
16	DEIVID GUINA	74.770.319	OFICIAL	
17	LUIS BARRERO GONZAGA	17586O36	OPERADOR	
18	ELVER TARACHE	1118569118	AUXILIAR DE OBRA	
19	NELSON ALEJANDRO DUQUE	1118531O38	AUXILIAR DE OBRA	
20	LUIS FERNANDO GUINA	74862O19	AUXILIAR DE OBRA	
21	JHOHAN DAVID GOMEZ	1O29642224	AUXILIAR DE OBRA	
22	ALDAIR ORTIZ TABACO	1OO6557GO7	AUXILIAR DE OBRA	
23	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
24	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	AUXILIAR DE OBRA	
25	DAGOBERTO ARIZA	1122787	AUXILIAR DE OBRA	
26	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
27	JOSE MERCHAN	4282129	OPERADOR	
28	LUIS FERNANDO LEMUS	1057802737	CADENERO 1	
29	DIDIMO VARGAS	1346960	OERADOR	
30	ELSY ALARCON	47440746	CONTROLADORA	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	05-06-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Mi	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAIRO CUBIDES	9517517	ING RESIDENTE	
2	OSCAR ROSAS FERNANDEZ	1118530376	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
6	Jose Maria Salcedo	9-656-888	Auxiliar obra	
7	Pablo Arboleda	1007645527	Auxiliar	
8	Victor Ortiz	1118744918	Oficial P.	
9	TIRZO RINCON	8640756	OFICIA	
10	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
11	Edwin Dario Echeverria	1.118.889074	electricista	
12	Yuddy carolina villamil	1116492926	contadora	
13	ANDRES TORRES	1115547149	conductor	
14	Jose Gustavo Chaparro	1002226973	Conductor	
15	Jhonatan ojeda	1006600360	Cargador	
16	Alfonso Cardenas	95122574	Conductor	
17	Samir Mendoza T	1074012413	Auxiliar	
18	Jose Jesus Pinchao	1006406029	OFICIAL	
19	JOSE PINCHAO	1116809329	OFICIAL	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	lue 6 Junio	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Politica de seguridad vial es para todos		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Mi	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José María Salcedo	9.656.888	Auxiliar obra	
2	Luis Fernando Guiza	74862019	Auxiliar	
3	Luis Fernando Leiva	1057602737	Cadenero 1	
4	DEWIS GUIZA	7977037	OFICIAL	
5	Adrian David Solorzano	1118530260	Auxiliar	
6	Ismael Valverde Tarazona	1118577086	Auxiliar	
7	Elver Andres Torrado	1118569918	Auxiliar	
8	Pablo Bautibonza	1002645527	Auxiliar	
9	Victor Vera	1118744748	Op. Jagueta	
10	Francisco Quintero	4245556	Oficial	
11	Raul Roa	4150771	oficial	
12	Deivis Vargas	1348[illegible]	Of	
13	Alberto Bermudez	1098 151 921	Oficial	
14	Julian Ortiz Tarazona	1006657603	Auxiliar	
15	Luis Ricardo Ortiz	74857511	aux	
16	Estiben Aguirre Jaramillo	1007747536	Cadenero	
17	Jorge Mendez M	9'657-771	Oficio	
18	Alejandro Duque Acuña	1118531038	Auxiliar	
19	Andres Torres	1118541114	conductor	
20	Yenny Carolina Mitoro	1116492926	Controladora	
21	Jhonatan Paipa	7.020.060.360	conductor	
22	Ramon Ospino	1115861522	Oficial	
23	Wilmer Roa	9870674	OP.	
24	Rolso Galan	9'659199	Aux	
25	Diogenes Anza	74202787	Aux	
26	Jose Gustavo Chaparro	1002286923	Conductor	
27	Diego Andres Novoa V.	1066727172	Auxiliar	
28	Elkin Mercado Alonso	1124407476	Aux	
29	Nando Perez Carreño	3548065	Auxiliar	
30	Victor Padilla	74860237	Cadenero	

Observaciones

Firma Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	08-06-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Mi	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOSE JESUS Pastran	1006406094	oficial	
2	Armando Ospino	9432512	oficial	
3	Wilson Andres Millan G	1118529643	Auxiliar	
4	Wilmer Fernando Vargas P.	1118562092	cadenero	
5	JOSE PALACIO	1116909361	OFICIAL	
6	[illegible]	9570574	conductor	
7	CARLOS HERRERA	1118538787	TOPOGRAFO	
8	Ruben Dario Espinosa Quiroz	1.118.538.079	electricista	
9	Pablo Cordoba	1006665573	Ayudante	
10	Samir mendoza T	1076012418	Auxiliar	
11	LAUDO LUIS CARDENAS	9.514.567	ING RESIDENTE	
12	Andres Rodriguez	1065915878	Topografo	
13	Jonathan Rincon mora	1122922193	Auxiliar	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Empresarial

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	Vie 7 Jun 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Intoxicacion por alimentos		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodrigu	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar OR	
2	Luis Fernando Arias	74462.019	Auxiliar	
3	Luis Fernando Leon Mejia	1057602737	Cat. 1	
4	Ismael Vasquez Tordoya	1118577085	Auxiliar	
5	Yeison Carabali [illegible]	1116447926	contratadera	
6	Alexis Ortiz Tejada	1006557607	auxiliar	
7	Luis Rey Ortiz	74857511	aseo	
8	Sonia Mendoza C	1074012412	auxiliar	
9	Pablo Grafiana	1002645227	Auxiliar	
10	Elvis Andres Tapias	1119567719	Auxiliar	
11	Adriana David Solarzano	1118530260	Auxiliar	
12	Yerly Vela	[illegible]	Operador I.	
13	Wilmer Rosa	9400674	Operador	
14	Dewis Grima	24470319	OFICIAL	
15	Alberto Escalante	1078 951 879	OFICIAL	
16	Raiso Golan	9'657.999	AUX.	
17	Raul Roa	4150771	Oficial	
18	Wilmer Vargas	1306196	Of	
19	Jorge Hugo M	9'653.771	oficio	
20	Eliud Arlid Espinosa C	1.118.589074	Electricista	
21	Segundo Arizal	11202187	AUX	
22	Naidu Kent Carrillo	33480631	Auxiliar Vial	
23	Wilson Padilla	74860237	Cocinero	
24	Jose Jesus Pacheco	1006.826.024	Oficial	
25	Jose Pinedo	(1116.793)	OFICIO.	
26	Miguel Fernando Vargas	1118.582077	cadenero	
27	Yeraldy Goigo	1006.160.264	conductor	
28	Armando Cepeda	9432582	oficial	
29	Alvaro de Arco	9530574	Contratista	
30	Jose Gustavo Chaparro	1002220173	Conductor	

Observaciones

Vo.Bo Responsable: Madeleine Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Viernes 07-06-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Palacios	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ANDRES TORRES	1115854144	conductor	
2	Esteban Izquierdo	1007747536	Cadenero	
3	JAIRO LUIS CUADROS	9.517.517	ING. RESIDENTE	
4	CARLOS HURTADO	1118539782	TOPOGRAFO	
5	Nilson Andres Cullan Canar	1118726647	Ayudante	
6	Diego Andres Narvaez	1066729772	Ayudante	
7	Francisco Quenza	4245558	ING	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	Sab 8 de Jun	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Política Alcohol – Drogas – Tabaco y de-		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rodrigues	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Luis Fernando Gómez	74867.014	AUXILIAR	
2	Luis Fernando Lemos Mejia	1059107737	Cad. 1	
3	Yenny Carolina [illegible]	1116492926	controladora	
4	Alvaro David Solarte [illegible]	1118630260	Auxiliar	
5	Ismael Vaciano Tabalo	1118577095	Auxiliar	Ismael V.
6	Samir Mendoza T	1076012418	Auxiliar	Samir
7	Elver Andres Taborda	1118569918	Auxiliar	Andres T.
8	Estiben Izquierdo Ramón	1007747536	Cadenero	
9	Dewis Gil	7770314	OFICIAL	
10	Francisco Quintero	4245576	Ayte	
11	Mario Escobar	1092891929	OFICIAL	Alberto
12	Jorge Niño M	9'657.771	oficio	Jorge
13	Wilmer Chaverra	9432674	Operador	
14	Diego Andres Narvaez V.	1066727772	Auxiliar	
15	Aldair Ortiz Taborda	1006552607	Auxiliar	
16	Raul Rga	4150771	OFICIAL	Raul R.
17	Nestor Ojeda	1118774778	Operador	
18	Jhonatan Ariza	1120487	AUX	
19	Alfonso Vargas	1346960	OP	
20	Yubeni Ruiz Espinosa	1118534071	electricista	
21	Raiko Galon	9'659199	AUX	
22	Jose Portacio	1116809321	OFICIAL	
23	Armando Capello	9432512	oficial	
24	Wilson Patiño	74860237	Cadenero	
25	Luis Ortiz	74857511	auxi	
26	Jose Jesus Arroyo	1006106024	oficial	
27	Andres Torres	1115854144	conductor	
28	Gerardo Mejia	1022660350	Conductor	
29	Alfonso Gordon	9530574	Conductor	
30	Pablo Castañeda	1002145527	auxiliar	

Observaciones: mas estufeficientes

Vo.Bo. Responsable SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Sab - 8 - 6 - 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Cabrera	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Wilmer Cera	9170614	operador	
2	PABLO LUIS CUBILLOS	85175517	[illegible]	
3	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
4	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	ING. OBRA	
5	Naidu Feliz Carreño	33480695	Aux Vial	
6	Angelica Rodriguez	1069154029	Topografo	
7	Wilmer Fernanda Vargas	1118562072	cadenero	
8	Jose Gustavo Mesa	1004126423	Conductor	
9	Nilson andres millan	1118529643	Auxiliar	
10	Maria Angelica Trujillo D.	23.914.357	Social	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	Mde 11 junio 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Las señales de transito se deben respetar.		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodrigu	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	CARGO	FIRMA
1	José María Salcedo	9.656.880	Auxiliar obr	
2	Luis Fernando Coina	74862014	Auxiliar	
3	Luis Fernando Lemus Mejia	1057602737	cad. 2	
4	DEIVIS GOMEZ	7770319	OFICIAL	
5	Jaime Quintero	4245556	M/O	
6	Yenny carolina Mitchell Lal	1116492926	Controladora	
7	Adrian David Salazar Jaramillo	1118630260	Auxiliar	
8	Jhonny Vasquez Tabares	1118577085	Auxiliar	
9	Alejandro Duque	1118531038	Auxiliar	
10	Nestor Ortiz	1118744792	Ayudante f.	
11	Raul Roa	11507771	Oficial	
12	Albeiro Arias Tabares	1006557607	auxiliar	
13	Luis Yy ort	74857511	aux.	
14	Rocko Galan	9'659.199	Aux.	
15	Diego Andres Narvaez Vivas	1068723772	Auxiliar	
16	Alberto Restrepo	1032 851 824	oficio	
17	Sagrario Arias	71202784	Aux	
18	Angelica Rodriguez	1089154723	Topografo	
19	Pablo Gutierrez	1088565567	Ayudante	
20	Elver Andres Tamayo	1185699118	Auxiliar	
21	Elsy M Arboleda	42614074 6	Auxiliar	
22	Jorge Pino	9'637.771	Oficio	
23	ONAR VILLAMIZAR	13.475.370	RESIDENTE OBRA	
24	Jose Jesus Pinedo	1006406024	Oficial	
25	Wilmer Rosero	94304	OP	
26	Esteban Legarda Zamora	1007747536	Cadenero	
27	Jose Pacheco	1116809321	Oficial	
28	Nilson Andres Millan C	1118529643	Auxiliar	
29	Juan David Rincon	1152922793	Auxiliar	
30	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	

Observaciones

Firma Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros

FECHA:	11 - Junio 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Las señales de transito se deben respetar		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Wilmer Rodriguez	Duración: (Min	30 minuto

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Wilmer Fernando Vargas	1118562677	cadenero	
2	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538787	TOPOGRAFO	
3	Armando Cepeda	9432512	oficial	
4	Eduardo Ospina	7029660369	conductor	
5	Jose Gustavo Chaparro	1002726973	Conductor	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	INGENIERIA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RSI-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: 12-08-2024

TEMA(S): Todos los equipos y maquinaria deben ser operados

PROYECTO: Tilatiran

INSTRUCTOR: Madeleine Patiño | Duracion: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Yeimy Cardinas Mateus	1116492926	Controladora	
2	DELVIS BELLO	79720314	OFICIAL	
3	Luis Fernando Guiza	74862019	AUXILIAR	
4	Alejandro Ospina	1118931038	Auxiliar	
5	Mauricio Sanchez	1118533957	Aux. Civil	
6	Cristian Cote	1007540088	Aux. Inst	
7	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	RES. OBRA	
8	Luis Fernando Lemus	1057602737	Cod. 2	
9	Adrian David Soriano	1148590260	Auxiliar	
10	JAIME NIÑO	9657.771	Obrero	
11	Ismael Vargas Tapias	1118577095	Auxiliar	
12	Wilmer Perez	4930674.	Operador	
13	Francisco Pinzon	4245556	H/a	
14	Jaime Lopez Ospina	10177329	Op.	
15	Nairdy Lemus Carreño	33480655	Cargo Bdo	
16	Nestor Ortiz	1118444918	Operador P.	
17	Elver Andres Tarache	1118569919	Auxiliar	
18	ALBEIRO ESCOBAR TE	1089 951 929	OFICIAL	
19	Frady Pachon	1118531825	oficial	
20	JOSE PACO	1116609321	OFICIO	
21	Edilson Izquierdo	1007747536	Cadenero	
22	Raiso Rubio	91659179	AUX	
23	Pablo Gutierrez	1002645527	Aux	
24	RAUL ROD	4170741	OFICIAL	
25	Armando Cepeda	9432512	oficial	
26	Alberto Julio Tabares	1006552607	Auxiliar	
27	Oliver Verga	1148856[illegible]	OP	
28	Luis Eduardo Ortiz	74857581	Oper	
29	Diego Andres Hernandez	1066727732	Auxiliar	
30	Juan David Rincon	1122922793	Auxiliar	

Observaciones: por personal capacitado

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Mie 12 Junio

TEMA(S):

PROYECTO: Filodiran

INSTRUCTOR: Madeleine Lobo Duración: (Min) 20 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Nilson Andres Mulan G.	1118729643	Auxiliar	
2	Wilson Padilla.	74860237	Cadenero	Wilson Padilla.
3	Oxy mercedes Alonso	47440746	Ayudante	
4	Donato Rojo	7020 660 389	conductor	
5	Jose Gustavo duplano	1007226773	Conductor	
6	Ruben Dario Echeverri C	T.1118589071	Electricista	
7	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	cadenero	Wilmer Vargas
8	CARLOS HOBBGRD	1118539782	TOPOGRAFO	CARLOS HOBBGRD
9	Angelica Rodriguez	1069150038	Topografo	
10	Jovic Antonio Aquilino Diaz	74854382	Ayudante	
11	Rafael Lemos	9398191	Almacen	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	1 Jue 13 Jun	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	El uso del Celular en horarios laborales		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar ARL	
2	Luis Fernando Gómez	74862-014	Auxiliar	
3	Yenny Carolina Mesa	1116492926	control de ac	
4	Ruben Dario Espinosa	1.118.289.074	Electricista	
5	DEWIS [illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	Adrian David Idarraga	1118530260	Auxiliar	
7	ONAR VILLAMIZAR	13.475.370	Lego. obra	
8	Aldair Ortiz Tobalu	1006507603	auxiliar	
9	Isaac Vasquez Tapiero	1118577085	Auxiliar	
10	Elver Andres Tapias	1118569919	Auxiliar	
11	Jorge Antonio Aguirre Diaz	7.178.592.387	Auxiliar	
12	Estiven Izquierdo	1007747536	Cadenero	
13	Jorge Nieto	9'657.771	obrero	
14	Cristian Cote	700754008	Auxiliar	
15	Wilmer Pesca	9930674	OP	
16	Joseph Chaco	1116809321	oficial	
17	Luis Fernando Lemo Melo	1037602737	cad. 1	
18	[illegible]	1098 851 321	oficial	
19	Alejandro Duque	1116531038	Auxiliar	
20	Diego Andres Ramirez V.	1066727772	Auxiliar	
21	Jeiner Lopez Oyola	10177529	OP.	
22	Yeiler Ospina	1118774466	Ofa.	
23	Armando Rueda	9'937.512	oficial	
24	Ricardo Ramirez	9.134.869	OP	
25	Mauricio Sanchez	1.118.533.958	AUX	
26	Fredy Cubillos	1118.531.825	oficial	
27	Raiso Golon	9'659.199.	aux	
28	Jesus David Giron	1.122.922.793	aux	
29	Andres Rodriguez	1.059.154.826	topografo	
30	Pablo Bustamante	1.007.615.529	Ayudante	

Observaciones

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros ☐

FECHA:	13-06-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	El uso del celular en horarios laborales		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Katerine Ramos HSM	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
2	CARLOS HERRERA	1119538787	TOPOGRAFO	
3	Naida Perez Carreño	33480635	Auxiliar vial	
4	Oberdan Rojas	7029666369	conductor	
5	Cindy Alarcon	1144407546	Auxiliar vial	
6	Wilmer Fernando Vargas	1118562077	Cadenero	
7	Raul Roa	4150721	oficial	
8	Ma. Angelica Trujillo D	23914357	Social	
9	Alfonso Cadena	9530374	Conductor	
10	FLORES TOLES	1115854144	conductor	
11	Jose Gustavo chaparro	1002296923	Conductor	
12	Nilson Andres millan Guevara	1118020648	Auxiliar	
13	Cristhian Camilo Castro Lopez	1007854762	Aux Ing	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

FXP-86 Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	Mie 14 Junio 2024	LUGAR	
TEMA(S):	Los actos y condiciones inseguras		
PROYECTO:	Milodinan		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez G	Duracion: (Min)	30

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Luis Fernando Galvis	7488614	Auxiliar	
2	José María Salcedo	9656888	Mayordomo	
3	Yeraldy Carolina Mitchell	1116492926	controladora	
4	Ismael Vasquez Tapias	1114574085	Auxiliar	
5	Rafael Lemus	9'598141	Almacen	
6	Alberto Escalante	1082 851 921	OFICIAL	
7	Reyes Rojas	79770314	OFICIAL	
8	Edwin Rojo Estupiñan Cuellar	1.118.559.074	electricista	
9	Edwar Andres Tarache	1118569916	Auxiliar	
10	Alejandro Ayala Rondon	1118531638	Auxiliar	
11	Jorge Mindo	9'657.721	oficio	
12	Miguel Orfil Zuleta	1006557601	auxiliar	
13	Luis Rey Ortiz	1.748.57511	auxi	
14	Dinaberto Ariza	77202787	AUX	
15	Victor Ortiz	1118434798	Ayu.	
16	Fabian Morales	1006940780	Auxiliar	
17	Jose Tapias	74858192	OP.	
18	Angelica Rodriguez	1065154028	Ingeniera	
19	Antonio Vargas A.	1116545786	Auxiliar	
20	Juandavid Rincon	1123 922 793	Auxiliar	
21	OMAR YILLANEZ	13.475.370	Cos. Obra	
22	Diego Andres Narvaez	1066727797	Auxiliar	
23	Esteven Leguizamón	1007747536	Cadenero	
24	Jairo Lopez Zapata	1044572a	Operario	
25	Raiso Galan	9'659199	Auxiliar	
26	Raul Rea	4150771	oficial	
27	Jose Pacheco	1116809361	OFICIAL	
28	Wilmer Rosa	9420674	OP	
29	Jayne Antonio Aguirre Da	74854782	auxiliar	
30	Fredy Cuchay	1118531875	oficial	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	14-06-2024	LUGAR	
TEMA(S):	los actos y condiciones inseguras		
PROYECTO:	Tiburon		
INSTRUCTOR:	Madelaine Rodriguez	Duracion: (Min)	30

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Armando Cepeda	9432512	oficial	
2	Jose Jesus Pineda	1006406024	oficial	
3	Eisy Mercedes Alcocer	1143407116	AUXILIAR	
4	Richard Vargas	1SUAC960	OP	
5	Wilson andres millan G	1118529643	Aux.	
6	Jose Gustavo Mesquera	1002726973	Conductor	
7	Thojan David Gomez	1079642224	Aux	
8	Cristian Cote	1007340098	Auxiliar	
9	Mauricio Sucher	1118533957	ACA	
10	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	radiorero	
11	Jaime Martinez	74.186.976	Conductor	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: Sab 15 de Junio 2024 | LUGAR:

TEMA(S): Trabajo en Equipo

PROYECTO: Tiledrag.

INSTRUCTOR: Angelica Trujillo | Duracion: (Min) 1 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOSÉ María Salcedo	9.656.888	Auxiliar obra	
2	Aubar Ortiz Tabaco	100 655 7603	auxiliar	
3	Luis Fernando Ceiro	74962019	Auxiliar	
4	Francisco Quintero	4245536	Mro	
5	Adrian David Adarzano	1118530200	Auxiliar	
6	Yenny carolina [illegible]	1116492926	Cadenero	
7	[illegible]	1007747536	Cadenero	
8	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	RES. OBRA	
9	DEIVIS Galvis	24770519	OFICIAL	
10	Ismael Vargas Tabuco	1098577085	Auxiliar	
11	Wilmer Rosa	91.674	Operador	
12	Javier Antonio Aguirre Diaz	74859382	auxiliar	
13	Jaime Lopez Ospina	10177529	Op.	
14	Mauricio Sanchez	1.117533958	AUX	
15	Diego Andres Narvaez	1066727772	Auxiliar	
16	Oliver Arley Tabuche	1116.[illegible]918	Auxiliar	
17	Luis Fernando Lemus	1057602737	Cad	
18	Jorge [illegible]	9'657.771	Oficio	
19	Boilso Galon	7'659.199	AUX	
20	Armando Cepeda	9.432.512	oficial	
21	Randy Rey	4150771	Oficial	
22	[illegible]	1118714748	Oficial	
23	Freddy Cadena	1.118.531.823	Oficial	
24	Pablo Guatibonza	1002[illegible]7	Aux	
25	Alberto Escalante	1082 951 829	Oficial	
26	Thomas David Gomez	1082[illegible]724	Auxiliar	
27	[illegible] Padilla	74360237	Cadenero	
28	[illegible]	1146809324	OFICIAL	
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
30	[illegible]	33.[illegible]	[illegible]	

Observaciones:

Vo.Bo Responsable
Angelica Trujillo

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros

FECHA: Sab 15 Junio LUGAR: Tilodiran

TEMA(S): Trabajo en Equipo

PROYECTO: Tilodiran

INSTRUCTOR: Angelica Tapia Duracion: (Min) 1 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Nilson Andres Millan G	1118529645	Auxiliar	
2	CARLOS HERRERA	1118538487	TOPOGRAFO	
3	Cristian Cote	1004540088	Auxiliar	
4	Elsy M Alonso	47446726	Asistente	
5	Wilson Fernando Vargas	1118562072	Cabrera	
6	ANDRES TORRES	1005854144	Conductor	
7	Jose Gustavo chaparro	1002726973	conductor	
8	Jhonata paipa	7029660360	conductor	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones | Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	Lun 17 Jun 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Consecuencias de adelantar en curvas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar obra	
2	Adnan David Solorzano	1118530260	Auxiliar	
3	Francisco Quintero	4295556	obra	
4	Luis Fernando Gilvar	7648704	AUXILIAR	
5	DENIS GUIVE	79770319	OFICIAL	
6	Yenit carolina [illegible]	1116492926	Contratadora	
7	Diego Andres Ventura V.	1066727192	Auxiliar	
8	Pablo Bautista	1002645223	Ayudante	
9	[illegible]	1118577095	Auxiliar	
10	Fredy Cardona	1118531823	oficial	
11	Victor Ortiz	1118177778	op. p.	
12	Armando Cepeda	9932572	oficial	
13	Alejandro Ovalle	1145531030	Auxiliar	
14	CARLOS ANDRES HERRERA	1118337992	TOPOGRAFO	
15	Alberto Escorcia	1012 851 824	OFICIAL	
16	Angelica Rodriguez	1065915402	Topografa	
17	Jaime lopez ayala	10177526	Operador	
18	Jose Choco	1116809328	OFICIAL	
19	Jorge MIÑO M	9657.771	oficial	
20	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
21	Estiven Laguizamón	1007747536	Cadenero	
22	Luis rey ortiz.	7485758	aux	
23	Aldair Ortiz Tabares	1065527607	auxiliar	
24	Jhondavid Rincon	1122922795	auxiliar	
25	Jaime Antonio Aguirre Diaz	74859382	auxiliar	
26	Raelso Galan	9'659149.	pyx	
27	Mauricio Sanchez	1118533758	AUX	
28	Jhojan David Gomez	1029693224	Aux	
29	Elver Andres Tamayo	1115569713	Auxiliar	
30	Pastor Morales	1006944750	Auxiliar	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	17-06-2024	LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Consecuencias de Celentar en curva		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Elsy M. A.	47444076 G	Axiliar Vial	Elsy A.
2	Omar Villanueva	13.475.370	Ceo. Obra	
3	Raul Roa	1150771	oficial	
4	William Rueda	9430674	Operador	
5	Naidu Perez Carrillo	33480635	Auxiliar Vial	
6	Cristian Cote	1007540088	Auxiliar	
7	Luis Fernando Lemus	1057602737	Cad. 1	
8	Rafael Lemus	91398191	Almacen	
9	Jaime Mariño	74.1Sc.976	Conductor	
10	Camilo Castro Lopez	1009859262	Aux Ing	
11	wilmer fernando Vargas	1118562072	cadenero	wilmer Vargas
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	Mar 18 Junio 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	NO Exceder los limites de velocidad		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOSE Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar OBC	
2	Luis Fernando Guiza	74862.019	Auxiliar	
3	Yuly Carolina Mateus	1116692926	Controladora	
4	Alvaro David Serrano	1118530260	Auxiliar	
5	Mario Escalante	1032 851 924	Oficial	
6	Ismael Miguel Tarbay	1118577085	Auxiliar	
7	Jorge NIÑO	9'657.771	Oficio	
8	Nestor Ortiz	1118774918	Op. P.	
9	Francisco Quintero	4455561	Ayte	
10	Diego Andres Novoa V.	1046373172	Auxilio.	
11	Alejandro Rojas A.	1118531038	Auxiliar	
12	Raiso Golon	9'659199.	Auxi	
13	Faiver Lopez Ayala	10177576	Operador	
14	DENIS GUNE	74770319	OFICIAL	
15	Freddy Cachay	1118531823	oficial	
16	Armando Cepeda	94325R	Oficial	
17	Elver Andres Tarache	1118569918	Auxiliar	
18	ONAR VILLAMIZAR	13.475.370	Ope. Ocu	
19	Luis Hernando Pinto	79309963	conductor	
20	Alicia Ortiz Tobaco	1006557607	auxiliar	
21	Edwin Mauricio Echeverria	1.118.551.074	electricista	
22	Joseph Chacon	1116809321	OFICIAL	
23	Mauricio Sanchez	1117533958	Ay Xi	
24	Jhojan David Gomez	1029642224	Aux	
25	Javier Antonio Aguirre Diaz	74855382	auxiliar	
26	Luis rey ortiz	74857511	aux	
27	Raul Fca	4150771	oficial	
28	Naido Perez Carreño	35980635	Controlador Vial	
29	William Rojas	94306741	operador.	
30	Fayder Morales	1006944750	Ayudante	

Observaciones

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	13-06-2024	LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	No excesos los limites de velocidad		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Magdalene Rodriguez	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Wilson Andres Millan G	1118529643	1118529643	
2	Estiven Izquizamón	1007747536	Cadenero	
3	Pablo Gonzalez	1002165567	Auxiliar	
4	Luis Fernando Lemus Mejia	1057602737	Cad. 1	
5	Cristian Cote	1007540088	Auxiliar	
6	Eisy mercedes	47440746	Auxiliar vial	
7	Rafael Lemus	9'398191	Almacen	
8	Jhonderd Rincon	1172922793	Auxiliar	
9	Jose Antonio Largo SA	1116519786	Auxiliar	
10	Wilmer Fernando Vargas	1118562077	cadenero	
11	Jose Gustavo chaparro	1002726973	Conductor	
12	Jhonatan cairo	7020660360	conductor	
13	ANDRES TORRES	1115854144	conductor	
14	CARLOS HERRERA	1118538787	TOPOGRAFO	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Firma Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diana | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Mie 19 Junio | LUGAR:

TEMA(S): Reglamento Interno de trabajo

PROYECTO: Hidrion

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez | Duracion (Min):

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar	
2	Yenny carolina mitares	1118492926	contratista	
3	Luis Fernando Guiza	74367619	Auxiliar	
4	Adrian David salazar	1118530260	Auxiliar	
5	Nestor Oily	1118744798	Op.	
6	Alberto Escorcia	1082 951 824	OFICIO	
7	Delvis Garcia	79770319	Oficial	
8	Alejandro Duque	1110531038	Auxiliar	
9	Jaime Lopez Ospina	16177529	Operador	
10	Jorge Nino	9'657.771	Oficio	
11	Ismael Vasquez Tarazo	1118677085	Auxiliar	
12	Raul Roa	415-771	oficial	
13	Elvis Andres Ibañez	1118569918	Auxiliar	
14	Aolso Galán	9'659199	Aux	
15	Andres Tarazo	1.058341144	conductor	
16	Luis Fernando Lamus Melo	1057602737	Cad I.	
17	Jose Gustavo chaparro	1002726973	Conductor	
18	Fredy Pachon	1118531825	Oficial	
19	Diego Andres Narvaez V.	1066127177	Auxiliar	
20	Alcher ortiz Tabaco	1006057607	Auxilio	
21	Luis Eduardo	74857511	Aux	
22	Armando Cepeda	9432517	Oficial	
23	Oscar Villarreal	13.475.370	Res. Obra	
24	Francisco Rueda	4245553	Mto	
25	Wilson Rozo	9430674.	Obra	
26	Nilson Andres Mullan Guevara	1118529643	Auxiliar	
27	Jeiver Antonio Aguirre Diaz	74859382	Auxiliar	
28	Mauricio Sanchez	1118533458	Aux	
29	Oscar Lopez	1116604321	Oficial	
30	Thomas Rojas	1020 660 369	Conductor	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diana		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mie 19 Junio	LUGAR	
TEMA(S):	Reglamento Interno de Trabajo		
PROYECTO:	Cadiran		
INSTRUCTOR:	Madeleine Pabon	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Fauder Morales	1006944750	Auxiliar	
2	Nadi Peter Carreño	38AB0630	Contratista Vial	
3	Cristian Cole	1007540888	Auxiliar	
4	Wilson Padilla	74260237	Cadenero	
5	Estiven Legrizamón	1007747536	Cadenero	
6	Elsy [illegible]	47111074 6	Ayudante	
7	[illegible]	1.118389074	Electricista	
8	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	Ingeniero	
9	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538789	TOPOGRAFO	
10	Yhojan David Gomez	1024642274	Aux Cb	
11	Jhonlyd Arcos	1122922193	Auxiliar	
12	Pedro Pelico	1002645527	Auxiliar	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	Jue 20 Junio 2024	LUGAR	
TEMA(S):	Mision y Vision de Synergia.		
PROYECTO:	Filadiran		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose Maria Salcedo	9.656.008	AUX OBRA	
2	Yeimy Carolina Velarde	1116497926	contratista	
3	Ismael Vasquez Tabera	1118577615	Auxiliar	
4	Adrian Gerardo Solorzano	1148530260	Auxiliar	
5	Nestor Ortiz	1116774746	Op. M.	
6	Estibeth Legarda	1007747536	Cadenero	
7	Luis Fernando Guiza	74862019	Auxiliar	
8	Luis Ortiz	74857511	auli°	
9	Alberto Escorcia	1082 851 824	OFICIAL	
10	Angie Jorley Tobaco	1006352603	auxiliar	
11	Alejandro Angel	1118531038	Ayudante	
12	Jorge Niño	9'637-771	oficial	
13	OMAR VILLANUEVA	13.475.370	CES. OBRA	
14	Wilson Padilla	84540237	Cadenero	
15	Jairo Lopez Ortiz	10177529	Operador	
16	CARLOS HERRERA	1118538789	TAPOSADO	
17	ALISON [illegible]	9659199	AUXI	
18	Pablo Granados	1002655527	Aux.	
19	DENIS [illegible]	9970314	OFICIAL	
20	Fander Morales	1006944750	Auxiliar	
21	Diego Andres Navarro V.	1066227192	Auxiliar	
22	ENRY Andres Tranchi	1118569918	Auxiliar	
23	Wilmer Rojas	9430174	Operador	
24	Mauricio Sanchez	1118333958	Aux	
25	Nardi Hoyos Carrillo	33180635	Contratista vial	
26	Jairo Antonio Aguilar Diaz	74855382	Auxiliar	
27	Armando Caparda	9432512	oficial	
28	Raul Rojas	4150771	oficial	
29	Jacob Cabo	1116894321	Oficial	
30	Freddy Cachay	1118551825	OFICIAL	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: Jue 20 junio 2024 | LUGAR:

TEMA(S): Mision y Vision de Synergia.

PROYECTO: Filadiran

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez | Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose Maria Salcedo	9.656.888	Aux Obra	
2	Yeraly Carolina Mejia	1116497926	Contratista	
3	Ismael Vasquez Tabares	1118577615	Auxiliar	
4	Adrian David Solorzano	1118530260	Auxiliar	
5	Nestor Ortiz	1116774746	Op. M.	
6	Entidad Legalizamos	1007747536	Cadenero	
7	Luis Fernando Guisa	74862019	Auxiliar	
8	Luis Orlando Ortiz	74857511	Auxiliar	
9	Alberto Escalante	1082 951 824	Oficial	
10	Anibal Mateo Tobaco	1006557607	Auxiliar	
11	Alejandro Angel A.	1116531038	Aprendiz	
12	Jorge Niño	9'657.771	Oficial	
13	Omar Villanizar	13.475.370	Cos. Obra	
14	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
15	Jaime Lopez Ayala	10177529	Operador	
16	Carlos Herrera	1118538789	Topografo	
17	Edison Galvis	9659199	Auxi	
18	Pablo Gutierrez	1002655523	Aux.	
19	Dennis Guisa	9972319	Oficial	
20	Fauder Morales	1006944750	Auxiliar	
21	Diego Andres Navarro V.	1066727192	Auxiliar	
22	Eny Andrea Tamayo	1118569918	Auxiliar	
23	Wilmer Rojas	9430754	Operador	
24	Mauricio Sanchez	7718333958	Aux	
25	Nadir Hoyos Carreño	33480635	Contratista Vial	
26	Jose Antonio Aguilar Diaz	74859382	Auxiliar	
27	Alejandro Cabrera	9432572	Oficial	
28	Raul Rodriguez	4150774	Oficial	
29	Jose Cleto	1116809321	Oficial	
30	Fredy Cachay	1118551825	Oficial	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	28-06-2024	LUGAR	
TEMA(S):	Misión y Visión de Synergia		
PROYECTO:	Administrativo		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Rafael Gomez	9739819	Almacen	
2	Jholan David Pinel	1079642274	Aux Ob	
3	Antonio Vargas TA	1116545786	Auxiliar	
4	Jhonatan Rincon	1122427793	Auxiliar	
5	Luz Fernanda Gomez	1057602737	Cad. 1	
6	[illegible]	7145536	Alfa	
7	Elsy [illegible]	[illegible]	A + 1	
8	Cristian Cote	1001540088	Auxiliar	
9	Jhonata caipa	7020 660 359	conductor	
10	ANDRES [illegible]	1058541144	conductor	
11	Jose Gustavo chaparro	1002726973	Conductor	
12	Ruben Dario [illegible]	1.118389074	Conductor	
13	Didier Vargas	1140876	OP	
14	Nelson Andres [illegible]	1118729643	Auxiliar	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: Vier 23 feb 2024 | LUGAR:

TEMA(S): Inspecciones e instructivos de vehiculos livianos

PROYECTO:

INSTRUCTOR: | Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José María Salcedo	9.656.888	Auxiliar	
2	Aldair Ortiz Tobaco	1006557607	Auxiliar	
3	Adrian David Zabaleta A.	1118530260	Auxiliar	
4	Luis Fernando Galan	7498769	Auxiliar	
5	Isaac Vargas Tapias	1118577095	Auxiliar	
6	Jorge Niño	9'657.771	Auxiliar	
7	Yesenia Ospina A.	1118553038	Auxiliar	
8	Yeraly Carolina Arizmendi	1116492976	Controladora	
9	Nestor Ortiz	1118744716	Op.	
10	Francisco Quintero	4265556	Mto	
11	Elver Andres Tarache	1118569918	Auxiliar	
12	Naido Perez Carreño	38980635	Controlador Vial	
13	Alberto Escalante	1092 991 829	OFICIAL	
14	Fander Morales	1006944350	Auxiliar	
15	Diego Andres Nuñez V.	1066777797	Auxiliar	
16	Raiso Galan	9'659199	Auxiliar	
17	Jaime Lopez Oyola	1017529	Operador	
18	Didier Vargas	13488960	OP	
19	Javier Antonio Aguirre Diaz	74859382	Auxiliar	
20	Nilson Andres Millan Granado	1118529643	Auxiliar	
21	Jonathan Rincon	77'7 922 193	Auxiliar	
22	Ravi Ruiz	4150774	oficial	
23	Mauricio Sanchez	1118353958	Aux	
24	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	Ces. Obra	
25	José Antonio Vargas A.	1116545786	Auxiliar	
26	Jhojan David Gomez	1029042224	Aux. Obs	
27	Wilson Padilla	74860237	cadenero	
28	Eiby Mercado	4744407246	A + A R	
29	Armando Ospina	9937517	Oficial	
30	Cristian Coll	1001640088	Auxiliar	

Observaciones

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diana | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	21-06-2024	LUGAR	
TEMA(S):	Inspecciones e instructivos vehiculos livianos		
PROYECTO:	Filadiran		
INSTRUCTOR:	Hadwin Rodriguez	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Freddy Cachay	1118531825	Oficial	
2	Kefrick Ramirez	9598191	Almacen	
3	Luis Fernando Ramos	1057602737	Cad 1	
4	Estiven Lagarzamón	1007747536	Cadenero	
5	Wilmer Perez	94306754	Operador	
6	Wilmer Fernando Vargas P.	1118562077	cadenero	
7	Jose Pacheco	1116809321	OFICIAL	
8	Pablo Bautista	1002645527	AUXILIAR	
9	Jose Gustavo Chaparro	1007226773	Conductor	
10	Oswaldo Rojas	7.174.620.360	conductor	
11	ANDRES TORRES	1115854144	conductor	
12	Raul Mario Bohorquez C	1.118.559.074	Electricista	
13	Jaime Mariño	74.186.996	Conductor	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	Sab 22 junio 2024	LUGAR	Trodiran
TEMA(S):	Respeto en el area laboral		
PROYECTO:	Trodiran		
INSTRUCTOR:	Angelica Murillo	Duracion: (Min)	1 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José Maria Salcedo	9.656.882	Medidor	
2	Luis Fernando Cortes	74862019	auxiliar	
3	DEIVIS GIJINA	79770319	OFICIAL	
4	Aidan Ortiz Tobias	1006557607	auxiliar	
5	Luis Rey ortiz	74857511	auxi	
6	Alberto Hernandez	1037 851 879	oficial	
7	Fabian David Espinosa Cuello	1.118.539.074	electricista	
8	Ismael Vasquez Garcia	1118577095	auxiliar	
9	Yonny cardona mijares	1116492926	controlador	
10	Adrian David Solorzano	1118530260	Auxiliar	
11	Jorge NIÑO M	9'657.471	oficio	
12	Jairo Antonio Aguilar Diaz	7418547382	auxiliar	
13	Elvis Andres Tuchez	1118569918	Auxiliar	
14	Esc Antonio Vargas M	1116545786	Auxiliar	
15	Diego Andres Narvaez V.	1066722772	Auxilio	
16	OMAR VILLANIZAR	13.475.370	RES. OBRA	
17	RAUL ROA	1156171	oficial	
18	Fredy Cachay	1118531825	oficial	
19	Humberto Parada	9432512	oficial	
20	Nardi Perez Moreno	33480631	Controlador Vial	
21	Rolso Galan	9'659 199	AUX.	
22	Jaime Lopez Ayala	10177529	Operador	
23	PABLO GAMBOA	1002615527	Aux 1	
24	Deivis Vargas	1104676960	o p	
25	Jose Jose	74858137	op	
26	Victor Ortiz	7119744746	op.	
27	Josep Melo	1118809320	oficial	
28	Francisco Pinilla	4295556	Mto	
29	Fredy Morales	1006944750	Auxiliar	
30	Wilmer Roa	9430674	OP	

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	
CONTROL DE ASISTENCIA	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Sabado 22 / Junio / 24 LUGAR: Tibacuy

TEMA(S): Reflexión en el area laboral

PROYECTO: Tibacuy

INSTRUCTOR: Angelica Tapiro Duracion: (Min) 1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Nilson Andres Millan L.	1118579643	Auxiliar	
2	Wilson Padilla	74860237	Colocado	
3	Cristian Cole	1007540088	Auxiliar	
4	Jhojan David Gaona	1019622254	Aux	
5	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	colocado	
6	Gisy [illegible]	[illegible]	Ax A B	
7	No. Angelica Tapiro D.	23914387	Sqa	
8	Luis Fernando Lemus	1057602787	cad 1	
9	Carlos Herrera	1118558782	Topografo	
10	Jose Gustavo Chaparro	1007796973	Conductor	
11	Franklin Torres	1115854174	conductor	
12	Jhonatan garcia	7029660369	cadenero	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable
Angelica Tapiro

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: Lun 24 Junio | LUGAR:

TEMA(S): Prevencion en las excavaciones

PROYECTO: Filadiran

INSTRUCTOR: Nadeleine Rodriguez | Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	Yeny Caridad Mijares	1116492926	Cadenalero	
3	José Maria Salcedo	9.656.8[illegible]	Ayu obra	
4	Adrian Anuel Saavedra	1126530240	Ayudante	
5	[illegible]	1118547095	Auxiliar	
6	[illegible]	1110236585	Revisor	
7	Jhoyer [illegible]	1029647224	Ayu DL	
8	Estiven Izquierdo	1007711536	Cadenero	
9	Raul Ruiz	4150271	OFICIAL	
10	Alberto Escorcia	1039 851 524	OFICIAL	
11	Elver Andres Tarache	1118561913	Auxiliar	
12	Jorge Niño M	9'657.771	oficio	
13	Javier Antonio Aguilera	7u8593[illegible]	auxiliar	
14	Aldair Ortiz Tobar	1006557607	Ayuda	
15	Luis Fernando Lemus Melo	1057602737	Cad 1	
16	Armando Cepeda	9432512	oficial	
17	Jose Jesus Arevalo	1006106 024	OFICIAL	
18	Raulo Eslan	9'659199	AUX	
19	[illegible]	1[illegible]	OFICIAL	
20	Diego Andres Navarro Verdi	1066327777	Auxiliar	
21	Wendy Perez Cervera	33980635	Cumplimiento Vial	
22	Nerta Ortiz	[illegible]	Operario	
23	[illegible]	1118539[illegible]	AUX	
24	Rafael Lemus	91378191	Almac	
25	Freddy Pacheco	1118531825	oficial	
26	Cristian Cole	1001540080	Auxiliar	
27	Fanler Morales	1006911850	Auxiliar	
28	Nilson Andres Mora G	1116329643	Auxiliar	
29	Jaime Lopez Cepeda	1017752[illegible]	Operador	
30	Elsy Marcela [illegible]	1[illegible]	Auxiliar	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	24-06-2024	LUGAR:	
TEMA(S):			
PROYECTO:	Hidrem		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jesus Rodriguez	1059154039	Topografo	
2	JOSE Antonio Langes A.	1116515786	Ayudador	
3	Juan David Pinto	1122721193	Ayudador	
4	Fabian Dario Espinosa	1.118.559.074	Electricista	
5	Didier Vargas	1142C000	OP	
6	Jose Tapia	74858152	OP	
7	Wilmer Rios	9430674.	Operador	
8	Wilmer Fernando Vargas	1118562077	Cadenero	
9	Jose Gustavo Chaparro	1002726933	Conductor	
10	ANDRES TORRES	1115858144	Conductor	
11	Alfonso Cardenas	2530574	Conductor	
12	Jaime Mariño	74.18C.976	Conductor	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	Mar 25 de Junio 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Los Riesgos no escogen a sus victimas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rodriguez	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José María Salcedo	9.656888	Aux. obra	
2	Yenny Cardona Milano	1126412926	Controladora	
3	Daniel Mauricio Tabares	1118577085	Auxiliar	
4	Omar Villamizar	13.876.370	Res. Obra	
5	Nardi Perez Carreño	83480635	Controlador Vial	
6	Jorge Mino M	9'657.971	Oficio	
7	Dewis Goins	1118	Oficial	
8	Alejandro Ospina	1118533058	Auxiliar	
9	Alberto Escalante	1082 951 921	Oficial	
10	Nestor Ortiz	1118744748	Operador	
11	Raul Ros	4507771	Oficial	
12	Elver Andres Tarache	1118569718	Auxiliar	
13	Diego Andres Nuñez	1067727777	Auxiliar	
14	Jaime Lopez Oyola	10177529	Operador	
15	Fander Morales	1006944750	Auxiliar	
16	Estiven Izquierdamón	1007747536	Cadenero	
17	Jonie Antonio Romero	1148593882	Auxiliar	
18	Fredy Cadena	1118581825	oficial	
19	Willy Rosa	9420674	Operador	
20	Jose Mauricio Vargas A.	1116545786	Auxiliar	
21	Juan David Rincon	1122 922 793	Auxiliar	
22	Jhojan David Cama	1029642224	Aux Obra	
23	[illegible]	74858182	Op.	
24	Armando Cogollo	9432512	oficial	
25	Jose Geiver Escobar	1064806 C/A	Oficial	
26	Dilmer Vargas	1310866803	Op	
27	Nilson Andres Molina G	1118524613	Auxiliar	
28	Raulso Galon	9'659 199	Auxi -	
29	Mauricio Sanchez	1118533938	Aux	
30	Cristina Cole	1007540088	Aux	

Observaciones

Firma Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	23-06-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Los Riesgos no escogen a sus Victimas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Angelica Rodriguez	1067154078	TOPOGRAFO	
2	Oscar Manrique	4744074	Auxiliar Vial	
3	Rafael Lenaz	9'598191	Almacen	
4	Francisco Quintero	8245552	H/O	
5	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	cadenero	
6	Ruben Dario Espinosa	1.114.389.074	Electricista	
7	ANDRES TORRES	1118541144	CONDUCTOR	
8	Jose Gustavo Chaparro	1002726973	Conductor	
9	Sargento Chaco	1116809321	OFICIAL	Jose
10	Luis Rey Ortiz.	7485751	aux	
11	Alfonso Cardona	2830574	Conductor	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	26-06-2024	LUGAR	
TEMA(S):	Trabajo en equipo y equipo de trabajo		
PROYECTO:	Alquiran		
INSTRUCTOR:	Katherine Rodriguez	Duracion: (Min)	30

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Luis Fernando Cortes	9458620A	Auxiliar	
2	JOSE Maria Salcedo	9.656.888	OFICIAL	
3	Yenny carolina [illegible]	1116492926	Enfermera	
4	[illegible] TABORDA	1116577095	AUXILIAR	
5	ALBEIRO ESCOBEDO	1092 [illegible]	OFICIAL	
6	DENIS GUINA	79770319	OFICIAL	
7	Ruben Dario Bayona Cuello	1.118.359.074	Electricista	
8	Elvis Andres Tarache	1118569718	Auxiliar	
9	Alejandro Ayala	1118533030	Ayudante	
10	JORGE NIÑO	9'657.771	OFICIO	
11	[illegible] Tabaco	1067557607	Auxiliar	
12	Rolso Galan	9'659.199	Auxiliar	
13	Luis [illegible]	7185751	Aux.	
14	Hugoberto Ariza	77202787	Aux	
15	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
16	Victor Ariza	1118774798	Ay.	
17	Pedro Morales	1006914750	Auxiliar	
18	[illegible]	74858152	OP.	
19	[illegible]	1122972793	Auxiliar	
20	Diego Andres Narvaez	1068927737	Auxiliar	
21	Jose Antonio Vargas A.	1116545786	Mexicano	
22	Estiven Leguizamon	1007747536	Cadenero	
23	[illegible]	10177129	Operador	
24	Wilmer Perez	9430674.	OP.	
25	Wilder Perez Cantor	7548065	Contratista	
26	Jose Pacheco	1116809721	OFICIAL	
27	Raul Roa	4120771	Oficial	
28	Javier Antonio Vasquez D	74854382	Auxiliar	
29	Wilder Perez Cantor	3242635	Contratista	
30	Jose Tejeda Pinzon	1006406894	OFICIAL	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:		LUGAR	
TEMA(S):			
PROYECTO:			
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Dibeyer Vargas	1134267602	Of	
2	Alfaro Rodriguez	9530374	Conduct	
3	Freddy Cachay	1118.531825	oficial	
4	Andres Torres	1105851144	conductor	
5	Elsy M Alzate	43744026	Axiar V	
6	Armando Cepeda	9432517	oficial	
7	Nilson Andres Milan G	1118529643	Aux	
8	Jose Gustavo Chamorro	1007296477	Conductor	
9	Thejan David Bonilla	1026462724	Aux	
10	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	Ben. Obra	
11	Cristian Cote	1007540088	Auxiliar	
12	Wilmer Fernando Vargas	1118562077	Ayudante	
13	Mauricio Sanchez	1118533938	Aux	
14	Jaime Mariño	74.186976	conductor	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	
TEMA(S):			
PROYECTO:			
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Didier Vargas	13426960	OP	
2	Alfonso Cardenal	9530574	Conductor	
3	Fredy Cachay	1118531825	Oficial	
4	Andres Torres	1115851144	Conductor	
5	Elsy M Alzate	42444076	Auxiliar V	
6	Arsenio Cepeda	9437512	Oficial	
7	Nilson Andres Mejia G	1118529643	Aux	
8	Jose Cardona Chaparro	1007296477	Conductor	
9	Jhojan David Gomez	1029692224	Aux	
10	OMAR VILLAMIZAR	B 476.370	Bac. Obra	
11	Cristian Cote	1001540088	Auxiliar	
12	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	Cafetero	
13	Mauricio Gomez	1118533958	Aux	
14	Jaime Mariño	74.186976	Conductor	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-R01-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	lue 27 / 2024	LUGAR	
TEMA(S):	Uso obligatorio del cinturon de seguridad		
PROYECTO:	Floriran		
INSTRUCTOR:	Madeleine Vasquez	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José Maria Salcedo	9.656.888	AUX OBRA	
2	Yesenia Carolina Mitares	1116452926	controladora	
3	Francisco Quiñonez	4245556	Obra	
4	Samuel Vasquez Tapia	1118577085	Auxiliar	
5	Luis Fernando Cubillos	74.862.067	Auxiliar	
6	Juan Alberto Cortes	1072671895	Ayudante	
7	Estiven Legarda	1007747536	Cadenero	
8	William Cuesta	94320674	Operario	
9	Ruben Dario Salazar C	1.118.389.074	electricista	
10	DENIS GRUPO	79770519	OFICINA	
11	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	RESIDENTE	
12	Jorge Mino M	5'657.771	oficio	
13	Alejandro Ayala Alvarado	1118531038	Auxiliar	
14	Freddy Cuchidy	1118531825	oficial	
15	Armando Cepeda	94325172	oficial	
16	Jorge Herrera	1118550270	obrero	
17	Aldair Ortiz Tabares	1006557607	auxiliar	
18	Jose Jesus Arrieta	1006150024	ofi	
19	Luis Ruiz Ortiz	74857511	aux.	
20	Josefo Chaco	1118809321	OFICIAL	
21	Jaiberth Ariza	1102487	AUX	
22	Elian Andres Tarache	1118509918	Auxiliar	
23	Jhon Tapia	74858132	OP.	
24	Fredier Morales	1006944710	Aux.	
25	Javier Antonio Aguirre D	7485943 82	Auxiliar	
26	Didimo Vargas	13826962		
27	Jonatan David Rincon	1122922799	Auxiliar	
28	Alberto Estupiñan	1083 951 894	OFICIAL	
29	Raul Koa	1130771	oficial	
30	Diego Andres Ibarra	1066727727	Auxiliar	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: | LUGAR:

TEMA(S):

PROYECTO:

INSTRUCTOR: | Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Nardi Perez Carreño	33180635	Contratista Vial	
2	Wilma fernanda Vargas	1118562072	Cadenero	
3	Mauricio Sanchez	1102533458	Aux	
4	Nilson andres Millan G	1118529647	Aux	
5	Barlso Galan	9'659 199	Aux	
6	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
7	Nestor Soto	1107747218	Ayuda	
8	Jadin lopez ayala	1017752	Excavador	
9	CARLOS HERRERA	1118538790	TOPOGRAFO	
10	Angelica Rodriguez	1069154028	TOPOGRAFA	
11	Elsy mercedes Alva	47745a7c6	Ayuda	
12	Cristian Cote	1007540088	Auxiliar	
13	Jose Gustavo chaparro	1002726973	Conductor	
14	Alfonso cardona	95105714	Conductor	
15	Jhojan David Cano	1026421724	Aux Op	
16	Rafael Ramos	91398191	Almacen	
17	Andres Torres	1115851144	Conductor	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones | Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	Vier 28 -2024	LUGAR	
TEMA(S):	No usar el Celular mientras conduce		
PROYECTO:	Hadrian		
INSTRUCTOR:	Katerine Rodriguez	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José María Salcedo	9.656.888	Ay. obra	
2	Estiben Legarda Moñino	1007747536	Cadenero	
3	Yina Catalina Mijares	1116492926	calculadora	
4	Luis Fernando Gulloso	74862019	AUX Rig	
5	Jhonny Vasquez Tabla	1118577085	AUXILIAR	
6	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	Rec. Omar	
7	ALBERTO ESCALANTE	1082 851 824	OFICIAL	
8	Nestor Pita			
9	DENIS GUINA	20770319	OFICIAL	
10	Francisco Quintero	12445558	Mto	
11	Jairo Jose Ospino	10177529	Operador	
12	Wilmer Rosa	9430674	operador	
13	Claudia Perez Cantero	35480535	Cartógrafo Social	
14	Cecilia Vargas	36.866.960	QC	
15	Alejandro Ospino	1118532035	Auxiliar	
16	Edwin Andres Ramirez	1118569718	AUXILIAR	
17	Jose Tapia	94856132	OP.	
18	Juan David Pinzon	1122 922 793	Auxiliar	
19	Dagoberto ARIZA	77 202 487	AUX	
20	Jose Jesus Durban	1006 606 099	OF	
21	Fernando Cepeda	9432512	oficial	
22	Jaime Antonio Aguirre	1118543782	auxiliar	
23	Rolso Galan	9'659 199	AUX	
24	Jose Pacheco	1'168093211	OFICIAL	
25	JORGE CHAPARRO U.	1118550230	AUX	
26	Yhon Alberto Castillo	1029611095	Auxiliar	
27	Fredy Pachay	1118531825	oficial	
28	Jairo NIÑO	965.771	oficial	
29	Jinojun david Gomez	1029542224	Aux Obr	
30	Cristian Cote	1007540088	AUX	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: | LUGAR:

TEMA(S):

PROYECTO:

INSTRUCTOR: | Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Diego Andres Narvaez	1066737732	Auxiliar	
2	Aldair Ortiz Tabaco	1006557607	Auxiliar	
3	Andres Torres	1158044144	conductor	
4	Alfonso Cardenas	9530574.	conductor	
5	Rafael Hernandez	9'398191	Almacen	
6	Angelica Rodriguez	1065154928	Tapeyarero	
7	Raul Rodriguez	4150771	oficial	
8	Eisy Yaneth Alonso	47440716	Electricista	
9	Jose Gustavo Chipuno	1002726923	conductor	
10	Wilson Padilla	74860237	Cantarero	
11	Fandor Montes	1006944750	Aux.	
12	Wilmar Fernando Vargas	1118562077	cadenero	
13	Luis Rey Ortiz	74857511	oficial	
14	Mauricio Sanchez	1118533958	Aux	
15	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
16	Jaime Herrino	74.186976	Conductor	
17	Nilson andres Mena G	1118529643	Aux	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Sab 29 Junio 2024 LUGAR: Campamento

TEMA(S): Covid

PROYECTO: Inducción

INSTRUCTOR: Mr. Angelica Torrijo Pacheco Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José Maria Salcedo	9.656.888	AUX OBRA	
2	[illegible]	1006557603	Auxiliar	
3	Luis Fernando Guiza	74462019	auxiliar	
4	[illegible]	1114577085	Auxiliar	
5	Estiven Izquierdo	1007747536	Soldador	
6	OMAR VILLAMIZAR	13 475 370	AUX OBRA	
7	DENIS GUNA	74770319	OFICIAL	
8	Alberto Escobar	1082 851 829	OFICIAL	
9	Jhoan [illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	Fredy Pachas	1118 531 825	oficial	
11	Jose Jesus [illegible]	1006 406 074	OFICIAL	
12	JOSE [illegible]	1116 880 721	OFICIAL	
13	[illegible]	1116 [illegible]	soldador	
14	Armando Ojeda	9432512	oficial	
15	[illegible]	1119561918	Auxiliar	
16	Ruben [illegible]	1118 559 074	electricista	
17	Willian [illegible]	91 676	OP	
18	Jair [illegible]	74859782	AUXILIAR	
19	[illegible]	[illegible]	operario	
20	Jon [illegible]	74978152	OP	
21	[illegible]	33183635	[illegible]	
22	[illegible]	91537771	OFICIO	
23	[illegible]	13468	OP	
24	Diego [illegible]	1068263727	AUX	
25	[illegible]	85037[illegible]	conductor	
26	[illegible]	4150771	oficial	
27	Andres [illegible]	1015854144	[illegible]	
28	[illegible]	1006841095	A-X	
29	[illegible]	1003208928	[illegible]	
30	[illegible]	77[illegible]787	AUX	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: | LUGAR:

TEMA(S):

PROYECTO:

INSTRUCTOR: | Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Luis Rey Ortiz	1148571511	Aux	
2	Francesco Quinta	4.245556	Mto	
3	Jorge Mendoza V.	1118536230	AUX	
4	Wilson Andres Millan G	1118529643	Aux	
5	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
6	Wilmer Fernanda Vargas	1118562072	Cadenero	
7	Cristian Cote	1007540088	Auxiliar	
8	Roilso Galan	9'659 199	Auxiliar	
9	Elsy M. Alcocer	1124407476	A + AR	
10	Fabier Hoyos	1006944750	Aux	
11	Yhonata Mora	1020 606 164	conductor	
12	CARLOS HERRERA	1118538787	TOPOGRAFO	
13	Rafael Lemus	91398191	Almacen	
14	Maria Angelica Trujillo D	23914357	Socia	
15	Camilo Castro Lopez	1007854267	Ing	
16	Jaime Mahia-	74.18c.976	Conductor	
17	Adrian David Salcedo R	1178530260	Auxiliar	
18	Luis Fernando Lemus	1057602937	Cad. 1	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.1.9
CONTENIDO DE CHARLAS AMBIENTALES

Ley 1930 de 2018
La Ley de Páramos

Esta norma plantea que los páramos son ecosistemas estratégicos y fija las directrices para su preservación, restauración, uso sostenible, integralidad y generación de conocimiento. La ley comprende a los páramos como territorios de protección especial compuestos por elementos biológicos, geográficos, hidrográficos, sociales y culturales, con un especial énfasis en su carácter determinante para la provisión del recurso hídrico.

De ahí el mandato para la conservación de estos ecosistemas y el principio de que el ordenamiento del uso del suelo debe estar enmarcado en la sostenibilidad de los mismos. Objetivo principal. Además, se hace mención de la importancia del cumplimiento a las garantías de participación de las comunidades locales en la protección y manejo sostenible de los páramos, así como la consulta a las comunidades étnicas conforme a la Ley 21 de 1991. Lo anterior, según dictamina el artículo 2 de la ley de páramos, a partir de un enfoque ecosistémico e intercultural que reconozca las relaciones socioculturales y procesos ecológicos, con especial énfasis, en la conservación de la diversidad biológica alrededor de la regulación hídrica que garantiza los servicios ecosistémicos de los páramos.



ConsinTer del Oriente

acuatodos S.A. E.S.P

SYNERGIA
Construcciones e Ingeniería

SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2019

"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Dra. María Diomy Barrera

Representante Legal

Los Páramos

Son ecosistema de alta montaña que se ubica entre el Bosque Alto Andino y los glaciares (entre los 2.900 y los 5.000 msnm), los cuales se integran por componentes biológicos, geográficos, geológicos, hidrográficos, sociales y culturales.

Los páramos son considerados ecosistemas estratégicos, en especial, por su papel en la regulación del ciclo hidrológico.

Sustenta el suministro del recurso hídrico para consumo humano y desarrollo de actividades económicas de más del 70% de la población Colombiana.

Estos territorios se caracterizan además por su alta riqueza biótica y sociocultural, estas circunstancias y su vulnerabilidad ante el cambio climático, han suscitado, en distintos ámbitos, un especial interés por su conservación y manejo sostenible.

Colombia posee un 49 % del total de los páramos del mundo en una proporción del 1.7 % de su área territorial. Sus 34 páramos, que abarcan cerca dos millones de hectáreas, se encuentran ubicados entre los 3.100 y los 4.000 msnm. dentro de temperaturas muy bajas en ambientes húmedos con frecuentes lluvias y neblinas. Además, el páramo es una zona de gran radiación solar porque es propicio para que ésta impacte con más fuerza en los valles (Cabrera y Ramírez , 2014).



Los páramos colombianos están agrupados en 36 complejos, la mitad de ellos en la Cordillera Oriental, y el resto distribuidos entre la Cordillera Central, la Cordillera Occidental, el Nudo de los Pastos y la Sierra Nevada de Santa Marta

Entre los páramos más destacados en Colombia, se tienen: Sumapaz, Chingaza, Iguaque, Puracé, El Cocuy, Almorzadero y la Sierra Nevada de Santa Marta. También existen páramos en Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Panamá. Se caracterizan por ser zonas muy húmedas.



El **río Cravo Sur** nace en la cordillera Oriental, en territorio Boyacense al oriente del municipio Tasco, sobre los 3800 m.s.n.m. entre la Serranía de Peña Negra y el **Páramo de Cadilla.**

El **río Cusiana** nace en la laguna **Siscunsí,** localizada en el **páramo** del mismo nombre, aproximadamente a los 3.800 msnm, en jurisdicción del municipio de Sogamoso .

El **río Casanare** tiene su fuente en la Sierra Nevada del Cocuy, en el extremo oeste del departamento de Arauca.

El **río Pauto** nace en la zona de paramo compartida por los municipios de Chita y Socotá, específicamente en el **páramo de Romeral** o alto de los Romeros a 3.700 MSNM en Socotá, Boyacá.

PROHIBICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE PÁRAMOS

- Exploración y explotación minera
- Exploración y explotación de hidrocarburos
- Expansiones urbanas y suburbanas
- Nuevas vías
- Maquinaria pesada. Solo sujeta a garantizar el mínimo vital
- Disposición final, manejo y quema de residuos sólidos y/o peligrosos
- Introducción o manejo de organismos genéticamente modificados o especies invasoras
- Juegos pirotécnicos, sustancias inflamables, explosivas o químicas
- Quemas
- Talas, salvo que sean para conservar páramos
- Fumigación o aspersión de químicos
- Degradación de la cobertura vegetal nativa
- Usos incompatibles

Un mundo sin agua

Carta escrita en el año 2070

- **UTILIZA EL MATERIAL DE ESTUDIO / REPASO QUE ADJUNTO PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. ES EL MISMO QUE DEBÍAS FOTOCOPIAR FRENTE AL LICEO. AGREGUÉ MATERIAL DE TEXTO NARRATIVO**

Querido amigo:

Estamos en el año 2070. Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es la de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me resta poco tiempo de vida. Hoy soy una de las personas más longevas en esta sociedad, por eso quise enviarte esta carta.

Recuerdo cuando tenía 5 años: todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques, las casas tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha por una hora. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua. Antes mi padre lavaba el auto con el agua que salía de una manguera. Hoy los niños no creen que el agua se utilizara de esa manera.

Recuerdo que había muchos anuncios que decían «CUIDA EL AGUA», solo que nadie le hacía caso; pensábamos que el agua jamás se podría terminar. Ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias, son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de salario. La comida es 80% sintética. Los asaltos por un vaso de agua son comunes en las calles desoladas.

Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran ocho vasos al día para una persona adulta. Hoy solo podemos beber medio vaso. La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura; tuvimos que volver a los pozos ciegos –cámaras sépticas- como en el siglo pasado porque las redes de cloacas no se pueden usar por la falta de agua.

La apariencia de la población es horrorosa; cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas que no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera. Por la resequedad de la piel, un joven de 20 años luce como si tuviera 40.

Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua, el oxígeno también se ha degradado por falta de árboles lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se alteró la morfología del espermatozoide de muchos individuos, como consecuencia hay muchos niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones.

El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos: 137 m3 por día por habitante adulto. La gente que no puede pagar es retirada de las "zonas ventiladas", que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar, no son de buena calidad pero se puede respirar. La edad promedio es de 35 años.

En algunos países quedaron manchas de vegetación con su respectivo río que es fuertemente custodiado por el ejército. El agua se volvió un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y las industrias contaminantes del siglo XX. Se advirtió entonces que había que cuidar el medio ambiente, nadie hizo caso.

Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, describo lo hermoso que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño y poder pescar en los ríos y embalses, beber toda el agua que quisiera, lo saludable que era la gente. Ella me pregunta: -¡Papá! ¿Por qué se acabó el agua? Entonces, siento un nudo en la garganta; no puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó de destruir el medio ambiente o simplemente no tomamos en cuenta tantas advertencias. Ahora nuestros hijos pagan un alto precio y sinceramente creo que la vida en la tierra ya no será posible dentro de muy poco porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible.

¡Como quisiera regresar el tiempo y hacer que toda la humanidad comprendiera esto… cuando aún podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra!

Documento extraído de la revista biografía "Crónica de los Tiempos" de abril de 2002.

ANEXO 6.6.2.
PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea


Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844034840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 32 N 28 - 46	YOPAL CASANARE	4327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	98375605	94698071101	I	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	3	$53,081,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (139 Afiliados)							$168,822,200	$20,259,264			$140,685,200	$16,882,224			$134,396,200	$16,127,544			$135,133,200		$11,260,760		$0	$0		$63,529,792
Centro de Trabajo: OBOCHÉ 0.00 (4 Afiliados)							$2,278,101	$324,648			$2,278,101	$324,288			$2,278,101	$151,380			$2,278,101		$228,336		$0	$0		$1,015,248
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)							$2,278,101	$324,648			$2,278,101	$324,288			$2,278,101	$151,380			$2,278,101		$228,336		$0	$0		$1,015,248
1	CC	9430766	PUENTES CACERES ROMULDO	X	20030	30	$921,991	$147,680	40403	30	$921,991	$26,640	03799	30	$921,991	$26,640	14-03	30	$921,991	6.960%	$64,200	30	$0	$0	N	$265,000
2	CC	1118833283	MILLAN CARDENAS WILSON ANDRET	X	20030	7	$319,918	$51,200	03238	7	$319,918	$12,800	03799	7	$319,918	$12,800	14-03	7	$319,918	6.960%	$22,300	7	$0	$0	N	$99,100
3	CC	7166284	ROMERO BARRIO JOSE NACOR	X	20030	13	$736,192	$117,800	03005	13	$736,192	$29,500	03799	13	$736,192	$29,500	14-03	13	$736,192	6.960%	$51,200	13	$0	$0	N	$228,100
4	CC	1081236	MARIAS JOSE EDWIN		20030	30	$1,300,000	$208,000	03037	30	$1,300,000	$52,000	03799	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,000		$0	$0		$637,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,000		$0	$0		$637,000
5	CC	4700108	BARRERA ALFONSO MARIA DIOSY		20030	30	$1,300,000	$208,000	03037	30	$1,300,000	$52,000	03799	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	N	$318,800
6	CC	1118466329	BARRERA YANNOHE MARTHA LUCERO		20030	30	$1,300,000	$208,000	03005	30	$1,300,000	$52,000	03799	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	N	$318,800
Centro de Trabajo: YOPAL 0.96 (133 Afiliados)							$159,945,100	$20,033,168			$137,233,993	$5,818,200			$168,908,672	$16,683,900			$137,233,993		$11,907,200		$0	$0		$90,833,968
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (133 Afiliados)							$159,945,100	$20,033,168			$137,233,993	$5,818,200			$168,908,672	$16,683,900			$137,233,993		$11,907,200		$0	$0		$90,833,968
7	CC	9456754	ACUÑA GOMEZ JONDY PATRICIA		20030	30	$1,821,339	$291,500	03037	30	$1,821,339	$72,900	03799	30	$1,821,339	$72,900	14-03	30	$1,821,339	6.960%	$126,800	30	$0	$0	N	$564,100
8	CC	7669102	ARGUELLO MORENO FALLANEY		20030	30	$1,468,918	$234,900	03037	30	$1,468,918	$58,800	03799	30	$1,468,918	$58,800	14-03	30	$1,468,918	6.960%	$102,300	30	$0	$0	N	$454,700
9	CC	7669282	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO	X	20-14	19	$930,506	$148,900	03005	19	$930,506	$37,300	03799	19	$930,506	$37,300	14-03	19	$930,506	6.960%	$64,800	19	$0	$0	N	$288,300
10	CC	6748796	ALGREEN ELSY MERCEDES		20030	30	$1,306,914	$209,100	03024	30	$1,306,914	$52,300	03799	30	$1,306,914	$52,300	14-03	30	$1,306,914	6.960%	$91,000	30	$0	$0	N	$404,700
11	CC	9430996	ALTOHO GONZALEZ NARDY		21100	30	$1,407,172	$225,100	03005	30	$1,407,172	$56,300	03799	30	$1,407,172	$56,300	14-03	30	$1,407,172	6.960%	$98,000	30	$0	$0	N	$435,800
12	CC	1122197	ARIZA MURCIA DAGOBERTO		20030	14	$606,667	$97,100	03024	14	$606,667	$24,300	03799	14	$606,667	$24,300	14-03	14	$606,667	0.000%	$0	14	$0	$0	N	$145,700
13	CC	1122787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO		20030	16	$700,248	$112,000	03024	16	$700,248	$28,000	03799	16	$700,248	$28,000	14-03	16	$700,248	6.960%	$48,800	16	$0	$0	N	$217,100
14	CC	1006489061	AVILA COLINA CARLOS YOBANY		21100	30	$1,330,344	$244,900	03024	30	$1,330,240	$61,300	03799	30	$1,330,240	$61,300	14-03	30	$1,330,344	6.960%	$106,600	30	$0	$0	N	$474,100
15	CC	9444927	BARRERA BARRETO JORGE ENRIQUE	X	20030	4	$171,334	$27,400	03037	4	$171,334	$7,000	03799	4	$171,334	$7,000	14-03	4	$171,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	N	$53,900
16	CC	1007383014	BARRETO VILLAMIL PAULA VALENTINA		20030	30	$1,400,000	$232,000	03005	30	$1,400,000	$56,000	03799	30	$1,400,000	$56,000	14-03	30	$1,400,000	6.960%	$101,500	30	$0	$0	N	$449,500
17	CC	6744878	BERNAL ALFONSO MARIA LEONI		21030	30	$1,400,000	$224,000	03005	30	$1,400,000	$56,000	03799	30	$1,400,000	$56,000	14-03	30	$1,400,000	6.960%	$101,400	30	$0	$0	N	$449,400
18	CC	1007767047	BERNAL GOMEZ YULIER FABIAN		21030	30	$1,400,000	$232,000	03005	30	$1,400,000	$56,000	03799	30	$1,400,000	$56,000	14-03	30	$1,400,000	6.960%	$101,500	30	$0	$0	N	$449,500
19	CC	7668919	BOHORQUEZ RODRIGUEZ JOSE ELIECER	X	20030	17	$794,667	$117,900	03024	17	$794,667	$31,800	03799	17	$794,667	$31,800	14-03	17	$794,667	6.960%	$57,500	17	$0	$0	N	$238,200
20	CC	1006480991	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN		20030	1	$43,334	$7,000	03024	1	$43,334	$0	03799	1	$43,334	$0	14-03	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	N	$7,000
21	CC	1006480991	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN		20030	1	$43,334	$7,000	03024	1	$43,334	$0	03799	1	$43,334	$0	14-03	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	N	$7,000
22	CC	1006480991	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN		20030	28	$1,208,277	$201,400	03024	28	$1,208,277	$48,400	03799	28	$1,208,277	$48,400	14-03	28	$1,208,277	6.960%	$87,600	28	$0	$0	N	$389,800
23	CC	1118521420	CACHAY CACHAY FREDY	X	20030	19	$854,448	$136,800	03024	19	$854,448	$34,200	03799	19	$854,448	$34,200	14-03	19	$854,448	6.960%	$59,500	19	$0	$0	N	$264,700

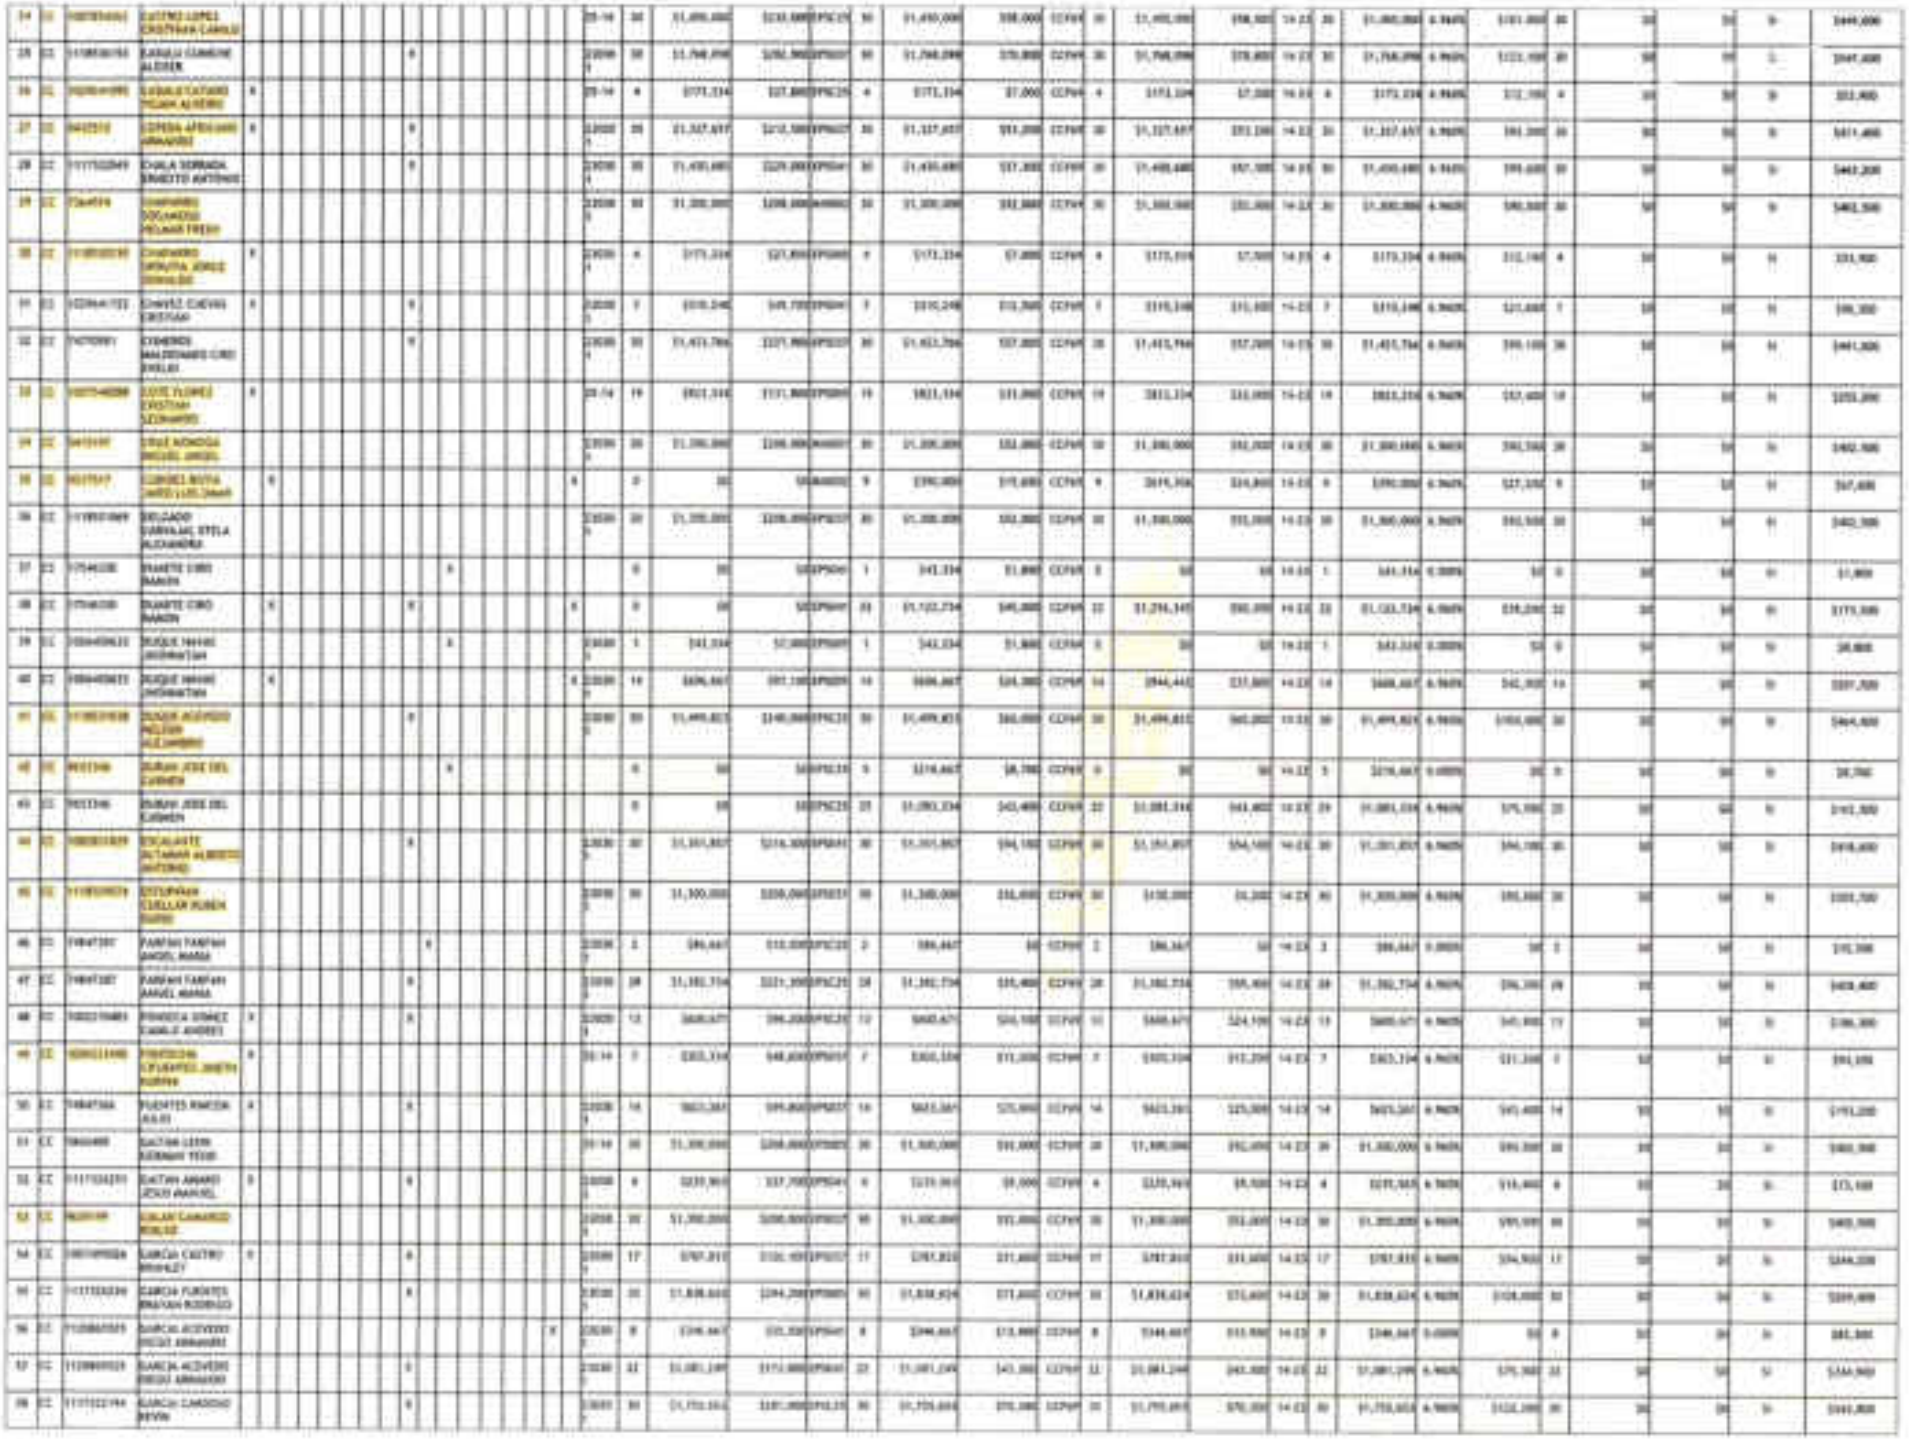

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. Longitudinal y/o de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardin **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** _____ **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACIÓN DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Olaya Alberto C. CEDULA 1029641095 CARGO Auxiliar

PROYECTO Hidroran LUGAR Hidroran

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

10

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X. Todas las anteriores

10

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X Todas las anteriores

10

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

10

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b. Para organizar las fiestas a fin de año

c. Para evitar el uso de memorandos

10

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-083
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**

X a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

10

7. **¿las clases de excavación son?**

X a. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

10

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
X d. cualquier persona que observe el riesgo

10

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
X b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

X **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

0,0

X b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Yoan Alberto **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 90% **EVALUADO POR** Madelene **CARGO** HSE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Cristian Cote CEDULA 1007540088 CARGO Auxiliar

PROYECTO Tildirua LUGAR Tildirua

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

10

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(D) Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

(d) Todas las anteriores

10

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

(a) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

10

4. Para que se crea el comité de convivencia

(a) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

10

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

10

7. ¿las clases de excavación son?

(a) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

10

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d.) cualquier persona que observe el riesgo

10

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

10

(a.) **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Madeleine Rodriguez **CARGO** HSEC

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
SYNERGIA	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jaider Alexander Aguirre CEDULA 74859382 CARGO Auxiliar

PROYECTO Tibaduiza LUGAR Tibaduiza

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

10

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC 10

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

X a. Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos 10

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

X a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo 10

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos


5.. Funciones del COPASST


a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa 10


X b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

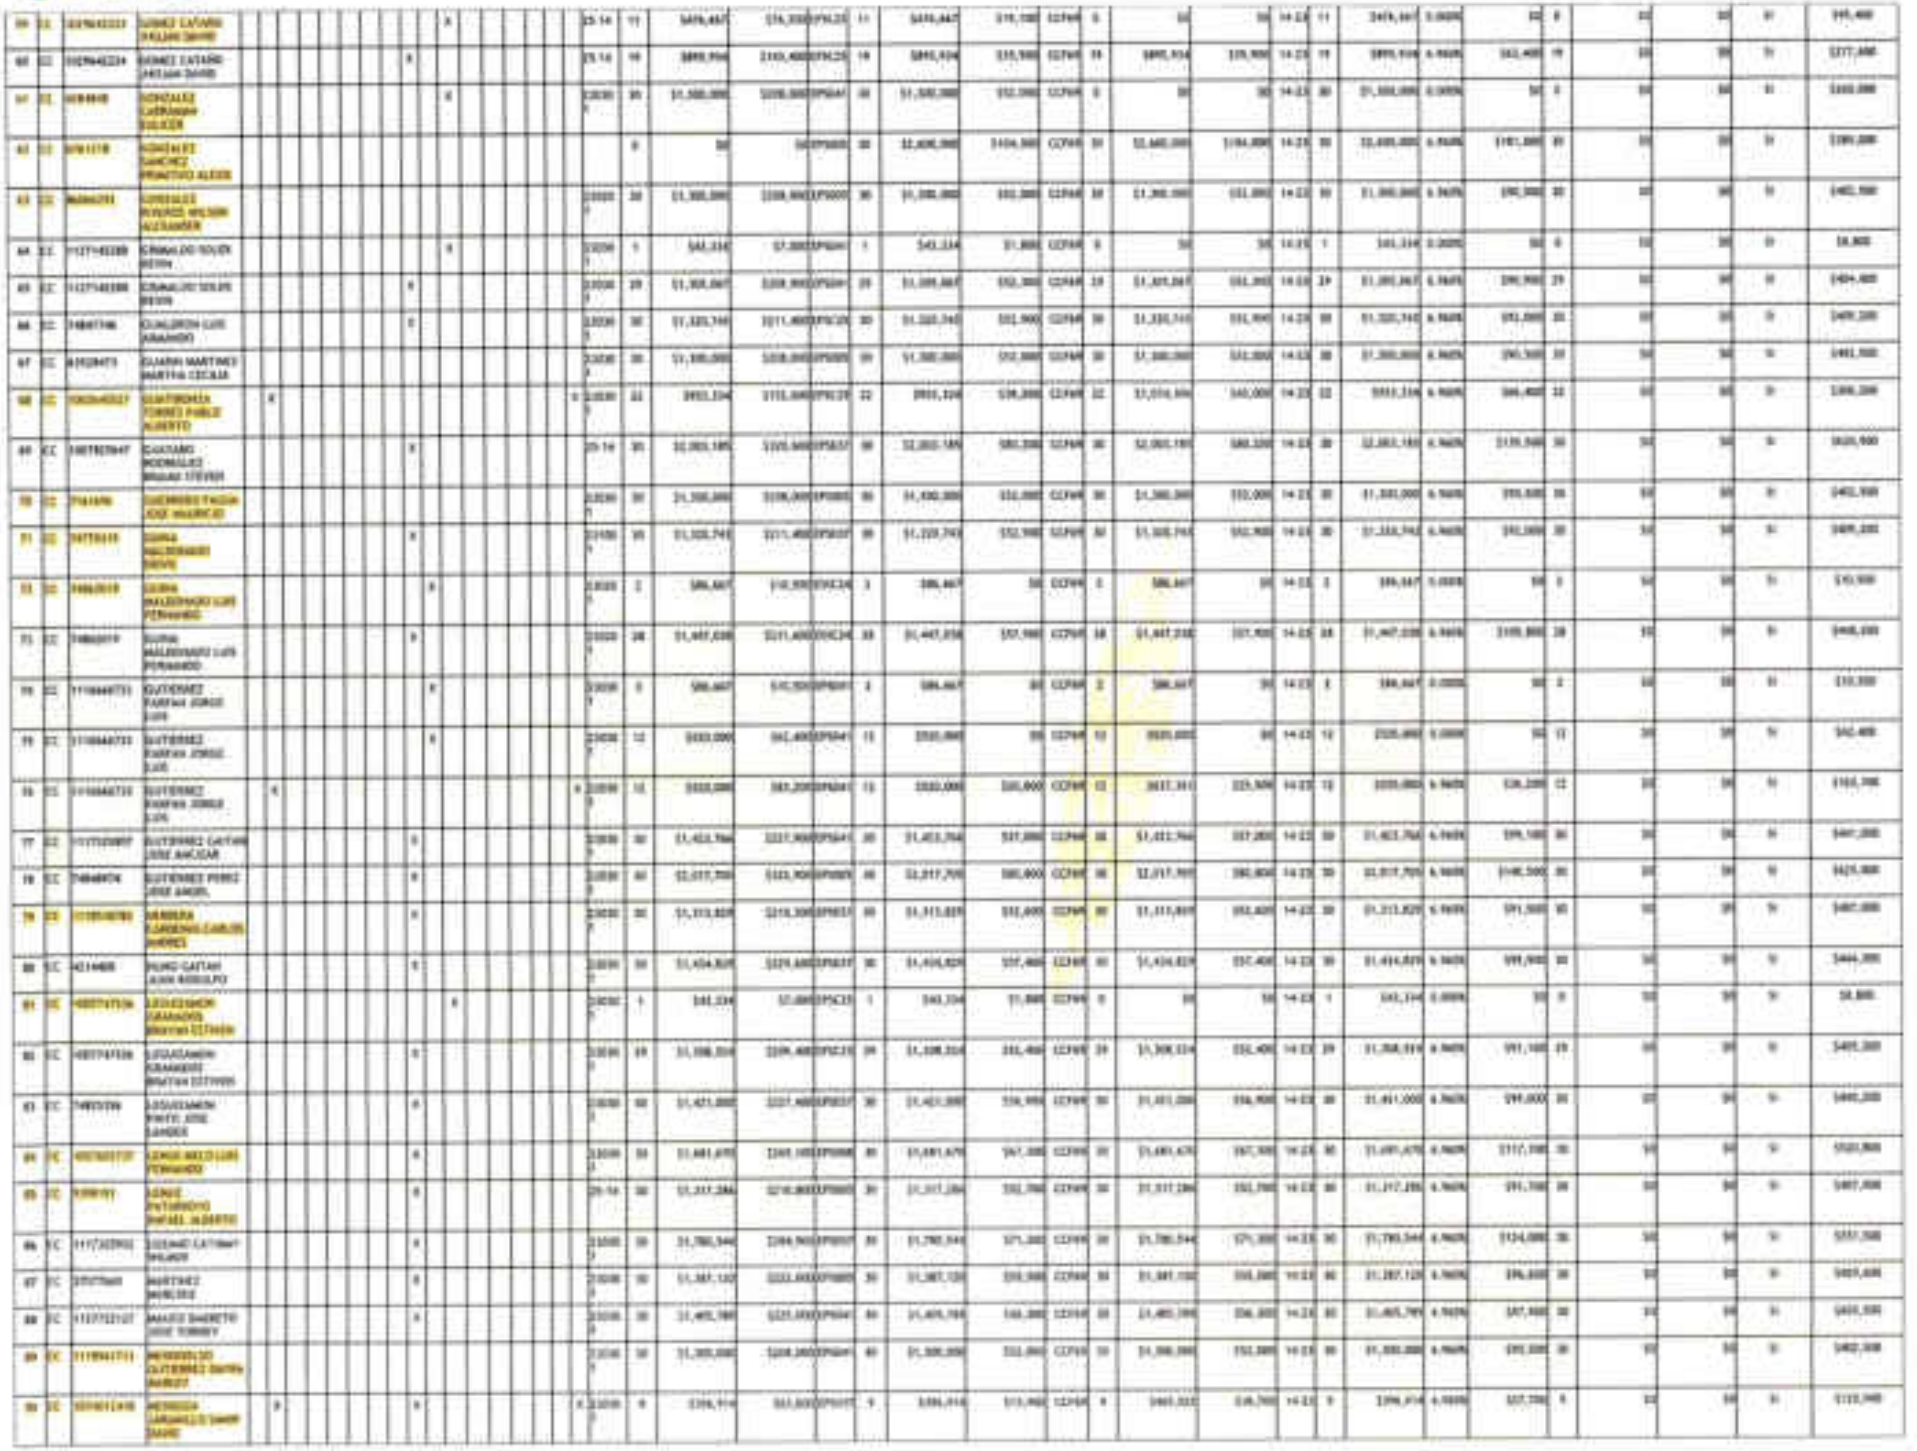

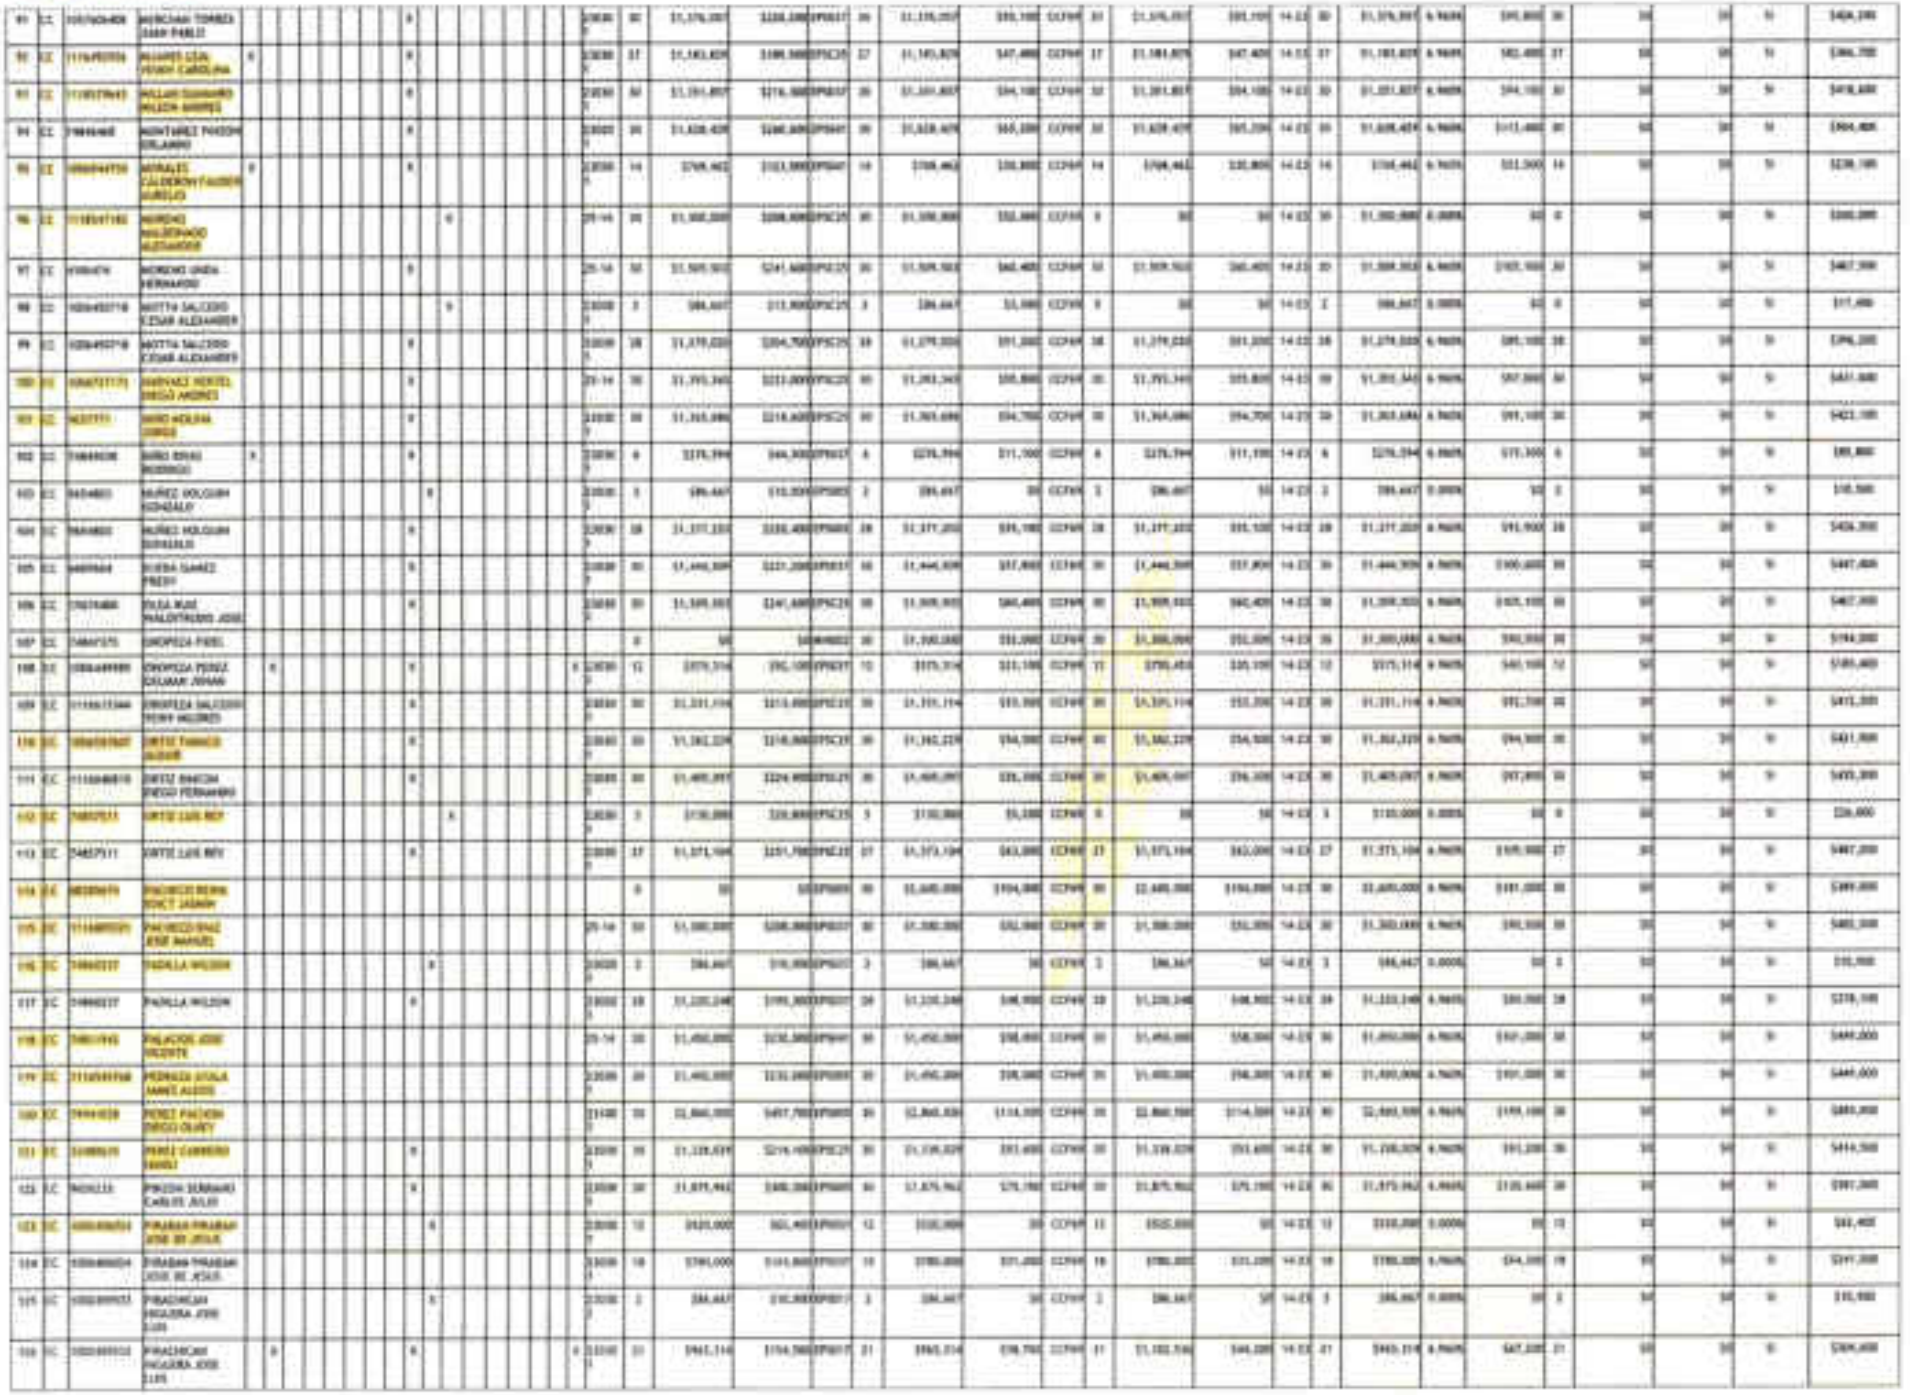

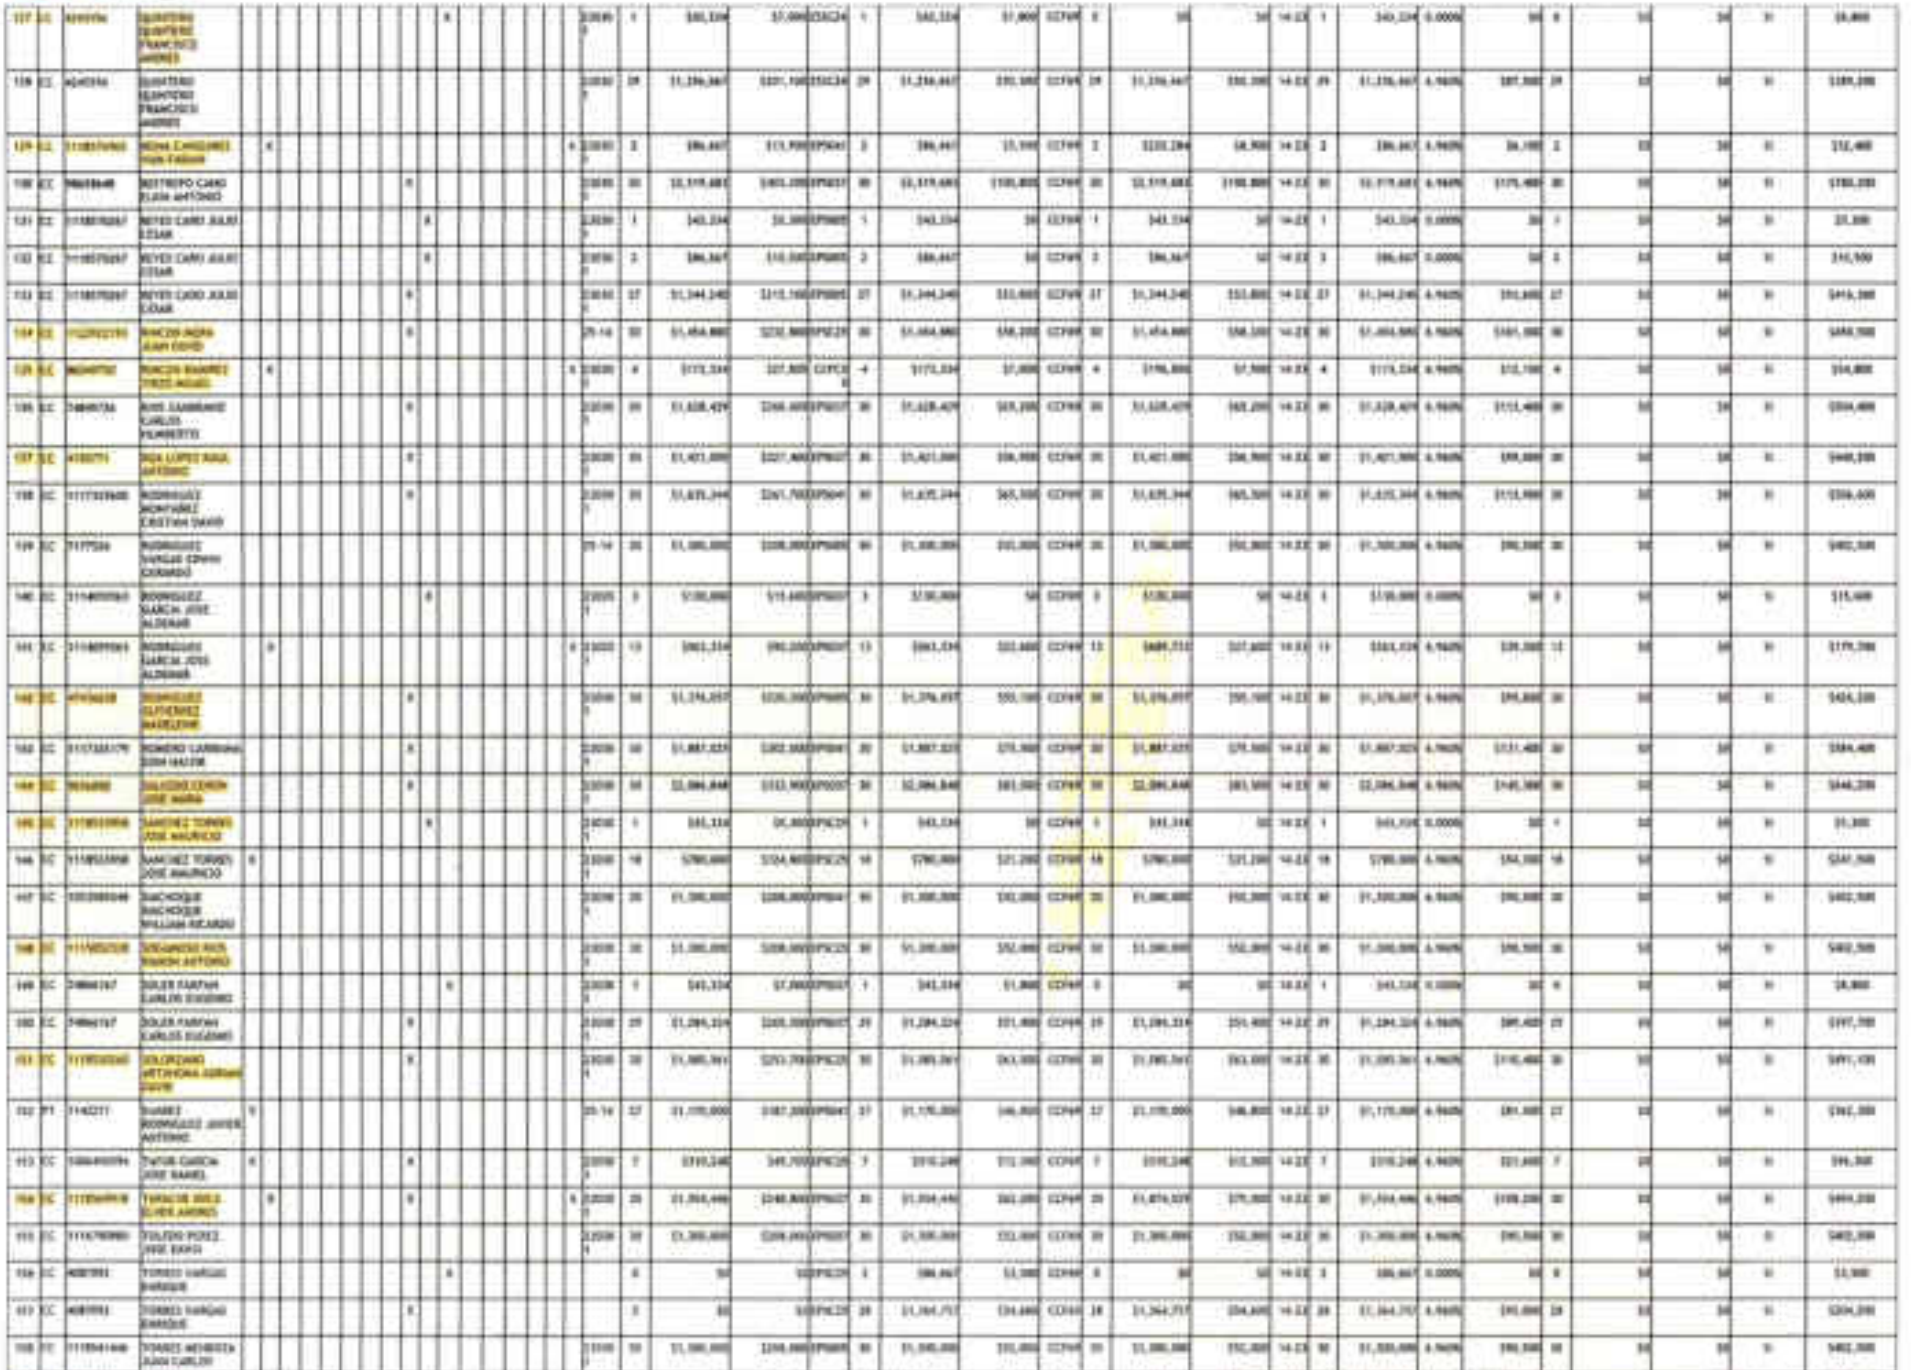

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844003392	8	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	9 - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 # 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	0827569351	5469807105	E	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	253,061,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$26,853,800	$101,000	$0	$26,954,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,139,200	$4,300	$0	$1,143,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$3,671,200	$13,800	$0	$3,685,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	100	$20,064,500	$75,400	$0	$20,139,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,978,900	$7,500	$0	$1,986,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
COMFACASANARE	CCF99	844,003,392	8	141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				141	$7,130,100	$27,400	$0	$7,157,500
CAJACOPI	CCPC55	901,543,211	6	1	$7,000	$100	$0	$7,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,400	$200	$0	$52,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	37	$1,833,900	$6,900	$0	$1,840,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$67,300	$300	$0	$67,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$162,300	$700	$0	$163,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$38,700	$200	$0	$38,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$88,900	$400	$0	$89,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$119,600	$500	$0	$120,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	$1,981,200	$7,500	$0	$1,988,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$1,040,100	$4,000	$0	$1,044,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,738,700	$6,600	$0	$1,745,300
TOTAL				141	$52,862,200	$199,400	$0	$53,061,600

2024/07/15 03:11 PM

ANEXO 6.6.3.
INDUCCIONES

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Camilo Castro López CEDULA 1007854262 CARGO Ing Res.

PROYECTO Construcción Alcantarillado Tito LUGAR Tibasosa

29/06/2024

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b. Para organizar las fiestas a fin de año

c. Para evitar el uso de memorandos

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST. Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
SYNERGIA	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

10

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

10

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

d. cualquier persona que observe el riesgo

10

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

10

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Madeleine R **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Freddy Cachay CEDULA 1118551825 CARGO Oficial

PROYECTO Tiladiron LUGAR Tiladiron

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted: 10

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
(D.) Todas las anteriores

2. Es política de la empresa: 10

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
(d.) Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son: 10

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
(c.) Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia 10

(a.) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST 10

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
(b.) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 08-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales 10

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son? 10

(a) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos. 10

c. Al jefe directo.

(d) cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son 10

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es: 10

(a.) **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico: servilletas, papeles, tapabocas, guantes). **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Freddy Cachay **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Roberto Ramirez **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Fayder Morales CEDULA 1006944750 CARGO Auxiliar

PROYECTO Tibodiran LUGAR Tibodiran - Campamento

17-06-24

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted: 10

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
(D.) Todas las anteriores

2. Es política de la empresa: 10

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
(d) Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son: 10

(a) Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia 10

(a) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST 10

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
(b) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales 10

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

(a) Mecánica y manual 10

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos. 10

c. Al jefe directo.

(d) cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son 10

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es: 10

(a) **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR [signature] **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** [signature] **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jose Mauricio Sánchez CEDULA 1118533958 CARGO Auxiliar

PROYECTO Tibudiran LUGAR Yopal – Casanare

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
X Todas las anteriores

10

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
X Todas las anteriores

10

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

10

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b. Para organizar las fiestas a fin de año
c. Para evitar el uso de memorandos

10

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

10

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

10

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

10

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

10

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)
b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

10

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Madelene P.G **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jorge O CHAPARRO CEDULA 1119550230 CARGO AUXILIAR

PROYECTO T/lo LUGAR T/lo

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

10

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X Todas las anteriores

10

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

X Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

X Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b. Para organizar las fiestas a fin de año

c. Para evitar el uso de memorandos

5. Funciones del COPASST

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 08-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

X Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

X Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

X cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

X Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

X **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Madelane R **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Omar Enrique Villamizar CEDULA 13.425.370 CARGO Residente Obra

PROYECTO TILODIRAN LUGAR TILODIRAN.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(D) Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

(d.) Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

(a.) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b. Para organizar las fiestas a fin de año

c. Para evitar el uso de memorandos

5. Funciones del COPASST

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b.) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

(a) Mecánica y manual

b. Longitudinal y/o de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d.) cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

(a.) Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Nicolas Correa **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.3.
INDUCCIONES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Camilo Castro López CEDULA 1007854262 CARGO Ing Pcl

PROYECTO Construcción Mcantarillado Tito LUGAR Tibatira

29/01/2024

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(X) Todas las anteriores

2. **Es politica de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Politica integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, politica de seguridad vial

X Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b. Para organizar las fiestas a fin de año

c. Para evitar el uso de memorandos

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST. Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. Longitudinal y/o de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** _____ **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Olaya Alberto C. CEDULA 1029641095 CARGO Auxiliar

PROYECTO Hidroan LUGAR Hidroan

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

10

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X. Todas las anteriores

10

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X Todas las anteriores

10

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

10

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

10

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

X. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

10

7. ¿las clases de excavación son?

X. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

10

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
X. cualquier persona que observe el riesgo

10

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
X. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

X. **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes). **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)
X Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

0,5

FIRMA DEL TRABAJADOR Yoger Alberto **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 90% **EVALUADO POR** Madeleine **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Cristian Cote CEDULA 100454008 CARGO Auxiliar

PROYECTO Tilodiran LUGAR Tilodiran

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

10

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(D) Todas las anteriores

10

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

(d) Todas las anteriores

10

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

(a) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

10

4. Para que se crea el comité de convivencia

(a) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b. Para organizar las fiestas a fin de año

c. Para evitar el uso de memorandos

10

5. Funciones del COPASST

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

10

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

10

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

10

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

10

a. **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)
b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR_____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Madeleine Rodriguez **CARGO** HSEC

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jaider Alberto Aguirre CEDULA 74859382 CARGO Auxiliar

PROYECTO Tilodiran LUGAR Tilodiran

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

10

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X d. Todas las anteriores

10

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

X a. Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

10

4. Para que se crea el comité de convivencia

X a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

10

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

10

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

10

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

10

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

10

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)
b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

10

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Madeleine R **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Fredy Lachay CEDULA 1118551825 CARGO Oficial

PROYECTO Tiladiran LUGAR Tiladiran

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

10

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(D.) Todas las anteriores

10

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

(d.) Todas las anteriores

10

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

(c.) Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

10

4. Para que se crea el comité de convivencia

(a.) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

10

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b.) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales 10

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son? 10

(a.) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos. 10

c. Al jefe directo.

(d.) cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son 10

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es: 10

(a.) **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Fredy Cachay **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** [illegible] **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Fabeler Morales CEDULA 1006944750 CARGO Auxiliar

PROYECTO Tibodiran LUGAR Tibodiran - Campamento

17-06-24

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

10

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(D) Todas las anteriores

10

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

(d) Todas las anteriores

10

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

(a) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

10

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

(a) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b. Para organizar las fiestas a fin de año

c. Para evitar el uso de memorandos

10

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

10

7. ¿las clases de excavación son?

(a) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

10

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d) cualquier persona que observe el riesgo

10

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

(a.) **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR [signature] **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** [signature] **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jose Mauricio Sanchez CEDULA 1118533958 CARGO Auxiliar

PROYECTO Tibadiran LUGAR Yopal - Casanare

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
D. Todas las anteriores

10

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
d. Todas las anteriores

10

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

a. Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

10

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b. Para organizar las fiestas a fin de año
c. Para evitar el uso de memorandos

10

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

10

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

10

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

10

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

10

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. **Blanco:** residuos aprovechables (plàstico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes). **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)
b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

10

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Madelene R.G **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
SYNERGIA	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jorge O CHAPARRO CEDULA 1119550230 CARGO AUXILIAR

PROYECTO T1&0 LUGAR T1&0

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

10

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X Todas las anteriores

10

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

X Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

X Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
SYNERGIA	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

X a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

X a. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

X cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

X Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

X **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Madelane R **CARGO** HSEQ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Oscar Enrique Villamizar CEDULA 13.475.370 CARGO Residente Obra

PROYECTO TILODIRAN LUGAR TILODIRAN.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(D) Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

(d.) Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

(a.) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b. Para organizar las fiestas a fin de año

c. Para evitar el uso de memorandos

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b.) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

(a) Mecánica y manual

b. Longitudinal y/o de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d.) cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

(a.) Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** _____ **CARGO** _____

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.4.
INSPECCIÓN A BOTIQUIN Y EXTINTORES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 08-01-2021

BOTIQUIN Nº 01 VEHICULO —/—/— FECHA Junio

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓			1 caja x 50 uni.
ISODINE SOLUCION	1	✓			
SUERO FISIOLOGICO	1	✓			Julio 2029
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓			07-2027 - 0-1-2"
CURITAS UND	5	✓			10 uni
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		1 paq-20uni	20-04-2024
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		03-01-2027	
APOSITOS OCULARES	1	✓			
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓			Tijera de trauma
TIJERAS	1	✓			1 caja x 50 und
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓			
JABON BACTERICIDA	1	✓			8 und
GASAS	5	✓			
CINTA MICROPORE	1	✓			
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓			
LINTERNA	1	✓			

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: 1 venda de Algodon - 2 toallas higienicas + 1 jeringa
Lt 1 venda triangular blanca de tela + 4 und sales hidratantes

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Paciente Portacua

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-55
SYNERGIA	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-03-

MES DE INSPECCION: Junio LOCACION Tilodiran RESPONSABLE Madeleine Rodriguez

No	Ubicación	Clase	Capacidad	Presencia de oxido	Presencia de golpes	Cuenta con señalizacion	Recarga	Proxima recarga	Observaciones
# 1	Obra	Abc	20LB	NO	NO	SI	11-2023	11-2024	
# 3	MOVIL	Abc	20LB	NO	NO	SI	01-2024	01-2025	
# 2	Campamento	Abc	20LB	NO	NO	SI	11-2024	11-2025	
# 4	Frente 4	Abc	20LB	NO	NO	SI	10-2023	10-2024	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.5.
INPECCIÓN ORDEN Y ASEO

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-02-2022

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Excavacion Mecanica e Instalacion de tuberia R		
CIUDAD	Tibasosa	FECHA	11-06-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Madeleine Rodriguez	Firma	
CARGO	HSEQ		

Alberto Escalante 25-2024

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.			✓	
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.			✓	
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.			✓	
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza externo.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa — Alberto Escalante.

Desviaciones detectadas:

Los estrechos locativos se encuentra en condiciones Optimas: SI | NO

FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION: 11-07-2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-02-2022

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Excavacion para Instalacion de Viga Sanitaria		
CIUDAD	Floridablanca	FECHA	16-06-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Madeleine Castaneda	FIRMA	
CARGO	Asta		
Armando Cepeda / Oficial			

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			Pasos peatonal
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.			✓	
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.	✓			
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa — Armando Cepeda

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas: SI NO — FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION: 12-09-2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-02-2022

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Excavacion Mecanica, manual e instalacion de tub		
CIUDAD	Floridablanca	FECHA	07-06-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Madeleine Restrepo.		
CARGO	HSEQ		

Deivis Guina / Oficial / 23-2024

DESCRIPCIÓN	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			paso peatonal
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado. Todo - mezcla	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.			✓	
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.	✓			
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Deivid Guina

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION	7-07-2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-02-2022

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Construccion de pozos #39-40		
CIUDAD	Tiadiran	FECHA	11-06-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Magdeleine Rodriguez	Firma	
CARGO	HSEQ		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Jose Pacheco / Oficial / 7.7-2024				
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos Paso peatonal y bordes de pozos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.			✓	
Están demarcadas las zonas de seguridad.			✓	
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite. / Barro, concreto.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	No se tienen
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	lockers en sitio
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.			✓	Se labora cielo abi
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.	✓			
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa: Jose Pacheco Jose Pacheco Oficial

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas: SI NO

FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION: 11-07-2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-02-2022

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Construccion de portal 44-45		
CIUDAD	Medellin	FECHA	22-06-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Madeleine Rodriguez Gutierrez		
CARGO	HSEQ		

Raul Roa / oficial No. 21-2024

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.			✓	
Están demarcadas las zonas de seguridad.			✓	
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	NO se tiene lokers
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	en los sitios
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.			✓	se labora a cielo abierto.
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.	✓			
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa — Raul Roa / Raul Roa oficial

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION:	22-07-2024

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.6.
INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS MENORES

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Javier Aguirre — FRENTE DE TRABAJO: POZO

SEMANA Del (día): 17 al 23-06-2024 — PROYECTO: Tildiran

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUS. B	LUS. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUE. B	JUE. M	VIE. B	VIE. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, límite de elevación														
Barra	estado general														
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maseta	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general 500L 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanes	hoja rectangular de acero, mango 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Cepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general 1,2mt 1mt	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Tarros para agua	estado general														
Carretilla	estado general 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Media Cuneca	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ve.Bo. Quien Supervisa:															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: SQS-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Mauricio Sanchez
SEMANA Del (día): 24 al 30-06-24
FRENTE DE TRABAJO: ROLOS
PROYECTO: Nuevo

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIV.		SAB.		DOM.	
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatilla de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elongacio														
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mazetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paleta con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Pulustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Cepillo de acero	mango, cabras														
Boquilleras	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Sombra	estado general														
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapuln	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Terrazo para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Media caneca	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Mauricio Mauricio Mauricio													
OBSERVACIONES:		Mauricio Mauricio Mauricio													

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: SOB-SST-034
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Dagoberto Arcia — FRENTE DE TRABAJO: Pozos
SEMANA Del (día): 10 = 16-06-2024 — PROYECTO:

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacio														
Sierra	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maceta	mango, estado general														
Pisonete con lanza	mango, estado general														
Tanques	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango			✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon			✓		✓		✓		✓		✓			
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Segilla de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de seguetas	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de seguetas	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Linas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Tarros para agua	estado general														
Carretilla	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Media cameca			✓		✓		✓		✓		✓			

Vo.Bo. Quien Supervisa: Jhon Jairo Lopez Lopez

OBSERVACIONES: Jhon Jairo Lopez Lopez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-034
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Rontson Galan — FRENTE DE TRABAJO: POZO 36
SEMANA Del (día): 17 al 23-06-2024 — PROYECTO: Hidrocol

HERRAMIENTA	REVISION		LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas															
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacion															
Barra	estado general															
Picas con cabo	mango estado general															
Plomadas	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Macetas	mango, estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paleta con funda	mango, estado general															
Tanquen	estado general															
Baldes	estado general	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango								✓							
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon															
Palustres	mango, estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte															
Sepillo de acero	mango, cerbras															
Boquilleras	estado general															
Decametro	estado general															
Escuadra	mango, estado general															
Espatula	mango, estado general															
Sierra	estado general															
Martillo	mango, estado general															
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta															
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja															
Hojas de segueta	estado general															
Chapulin	mango, estado general															
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta															
Decametro	estado general															
Limas	estado general															
Pala draga	mangos, cortes, ejes															
Porras	estado general															
Prensas	estado general															
Serruchos	mango, dientes, trabado															
Tensos para agua	estado general															
Carretilla	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general															
otros	Inspeccion carnea	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motobomba	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	aminas para bajar pozo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: SOR-SST-034
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Luis Fernando Gomez — FRENTE DE TRABAJO / PROYECTO: Frente 3 Alcatraz

SEMANA Del (día) 3 al 9-06-2024

HERRAMIENTA	REVISIÓN		LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas															
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacion															
Barra	estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picos con cabo	,mango estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pisonadas	estado general															
Maceta	mango, estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pelnilla con lueda	mango, estado general															
Tanques	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango															
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon															
Paluatrive	mango, estado general															
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte (topo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cepillo de acero	mango, cabras															
Boquillera	estado general															
Decametro	estado general															
Escuadra	mango, estado general															
Espatula	mango, estado general															
Sierra	estado general															
Martillo	mango, estado general															
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta															
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja															
Hojas de segueta	estado general															
Chapulin	mango, estado general															
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta															
Decametro	estado general															
Limas	estado general															
Pala draga	mangos, cortes, ejes															
Ponas	estado general															
Prensas	estado general															
Serruchos	mango, dientes, trabado															
Tarros para agua	estado general															
Carretilla	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general															
otros	Pizon metalico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	motobomba 3"	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Generador Metalico	3 MIS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Ve.Bo. Quien Supervisa:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Adrian Solorzano — FRENTE DE TRABAJO: Frente 3
SEMANA Del (dia): 10 al 16-06-2024 — PROYECTO: Tibaquira

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Pisinga	Soldadura de la cuchara, filo, mango, tornillos, ajustes de seguridad														
Barra	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Plomadas	estado general														
Maceta	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Paletines	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte (Topo)			✓		✓		✓		✓		✓			
Segillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Nimbra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Portas	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Pizon metalico			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pulitabomba de 3"			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera Metalica 3mts			✓		✓		✓		✓		✓			
Ve.Bo. Quien Supervisa:				Adrian Orlando Solorzano											

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SST-SAQ	CODIGO: FOR-SST-J24
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Aldair Ortiz
SEMANA Del (día) 17 al 06-23-2024
FRENTE DE TRABAJO: Torre #3
PROYECTO: Illoshtam

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacio														
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Plomadas	estado general														
Maestras	mango, estado general														
Peinilla con lunde	mango, estado general														
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Paleustras	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Sombra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Linas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prunas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Pisón Metalico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motobomba 3"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera Metalica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quién Supervisa:		Aldair Ortiz		Aldair Ortiz		Aldair Ortiz		Aldair Ortiz		Aldair Ortiz		Aldair Ortiz			

OBSERVACIONES: Pedro Hernandez Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Deivid Soria
SEMANA Del (día): 24 30-06-2024
FRENTE DE TRABAJO: frente # 3
PROYECTO: Modulan

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maseta	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Cepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Zambra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, topo de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, topo de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros: Disco metalico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motobomba 3H		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Deivid		Deivid		Deivid		Deivid		Deivid		Deivid			

OBSERVACIONES: Mantener Ramillera.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Juan David Rincon — FRENTE DE TRABAJO: Frente 2

SEMANA Del (dia): 10 al 16-06-2024 — PROYECTO: Alejandria

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, tensor, tornillo, ámbito de elevación														
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general														
Picahadas	estado general														
Macetas	mango, estado general														
Palinilla con fuelle	mango, estado general														
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Cepillo de acero	mango, cabras														
Boguilleras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Sierra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Tarros para agua	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Rizon metalico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bisagra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cerradura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Antonio Vargas — FRENTE DE TRABAJO: Frente 1.
SEMANA Del (día): 03 al 08-09-6-24 — PROYECTO: Tilamuca

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, límite de elevación									✓					
Barra	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Plomadas	estado general														
Macetas	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Cepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala drage	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretilla	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general Para cinta bandi					✓		✓		✓		✓			
otros	Pizon metalico			✓		✓		✓							
	Slingas			✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:				Antonio Vargas											

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.7.
INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☐ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo	Fecha de inspección: 12-06-2024
Nombre del trabajo o proyecto: Instalacion de tuberia de 12" sanitaria y excavacion Mecanica	
Área / localización: Frente 2	Supervisor del trabajo: Francisco Quintero

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los . trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo			✓	
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☐ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo 25-2024 | Fecha de inspección: 12-06-2024

Nombre del trabajo o proyecto: Instalacion de tuberia de 12" sanitaria y excavacion Mecanica

Area / localización: Frente 2 | Supervisor del trabajo: Francisco Quintero

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo			✓	
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
SYNERGIA	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

5	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
6	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	/			
7	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
8	Se tiene un plan de emergencias	✓			
9	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
0	Se cumple el paso a paso del procedimiento	/			
1	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	/			
	MEDIO AMBIENTE				
2	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
3	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	/			
4	Los productos químicos están etiquetados	/			
5	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	/			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
6	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
7	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
8	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
9	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

ESPONSABLE DEL TRABAJO: Alberto E.	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
ARGO: Oficial	CARGO: HSEQ
IRMA: FECHA: 12-06-24	FIRMA: FECHA: 12-06-24
bservaciones :	

laboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo 24-2024 | Fecha de inspección: 13-08-2024

Nombre del trabajo o proyecto: Excavacion mecanica para Instalacion de tuberia sanitaria de 12"

Área / localización: Frente 1 | Supervisor del trabajo: Francisco Quintero

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo		✓		No se requiere extintor aqui.
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE	✓			
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados		✓		
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Antonio Cepeda	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: Oficial	CARGO: HSEQ / Madeleine R.
FIRMA: FECHA: 13-06-2024	FIRMA: FECHA: 13-06-24
Observaciones :	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo 23-2024	Fecha de Inspección: 07-06-2024
Nombre del trabajo o proyecto: Excavacion Mecanica e Instalacion de tuberia sanitaria 12"	
Área / localización: Frente #3 cll 2 entre 4 y 5	Supervisor del trabajo: Francisco Quintero

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquin, camilla, radio de comunicaciones)	✓ ✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo			✓	No aplica la retro tiene 1 20L
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados			✓	
24	Los productos químicos están etiquetados			✓	
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Deivid Guinda	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: Oficial	CARGO: HSEQ / Madeleine
FIRMA: FECHA: 07-06-2024	FIRMA: FECHA: 07-06-24
Observaciones :	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☑ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo 22-2024 | Fecha de inspección: 06-06-2024

Nombre del trabajo o proyecto: Construcion de pozos

Area / localización: pozo 39 via aguadinda | Supervisor del trabajo: Franxco Quintero

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	-	+		NO SE REQUIERE
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			Compamento
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados		✓		se divulga la hoja de seguridad del cemento
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Francisco Cuadro	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: Maestro General	CARGO: HSEQ Madeleine R.
FIRMA: FECHA: 06-06-2024	FIRMA: FECHA: 06-06-2024
Observaciones: Las hojas de seguridad se divulgan en la charla del permiso pero no se dejan en sitio por las condiciones climaticas	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo 21-2024 | Fecha de inspección: 16-06-2024

Nombre del trabajo o proyecto: Construccion de pozos

Área / localización: Pozos 44-45 Agua linda | Supervisor del trabajo: Francisco Quintero

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO	✓			
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo		+		No se requiere en obra
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			compumento
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados		✓		se divulgara la hoja de seguridad del cemento
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Raul Roa		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	
CARGO: OFICIAL		CARGO: ASEO / Madeleine K	
FIRMA: Raul R	FECHA: 16-06-2024	FIRMA: Madeleine K	FECHA: 16-06-24
Observaciones :	por condiciones climaticas no se dejan los documentos en sitio.		

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.8.
PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 10 de Junio de 2022
PROYECTO: Mamonal
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeline			0,0	7:08				
2	Alejandro Duque			0,0	7:08				Alejandro
3	Diego Navarrete			0,0	7:09				
4	Adrian Salazar			0,0	7:09				
5	Aldair Ortiz			0,0	7:09				
6	Luis Barrero			0,0	7:09				
7	Wilmer Roa			0,0	7:09				
8	Dadimo Vargas			0,0	7:09				
9	Jorge Niña			0,0	7:10				
10	Dewis Garcia			0,0	7:10				
11	Ismael Vasquez			0,0	7:11				
12	Raldo Galan			0,0	7:11				
13	Alberto Escalante			0,0	7:11				
14	Luis Lemos			0,0	7:11				
15	Angelica Rodriguez			0,0	7:12				
16	Luis F. Garcia			0,0	7:12				
17	Wilmer Vargas			0,0	7:12				
18	Raul Roa			0,0	7:12				
19	Andres Guerrero			0,0	7:13				
20	Jesus Mujares			0,0	7:13				
21	Jose Pabloza			0,0	7:13				
22	Jonas Pinedo			0,0	7:14				
23	Ruben Estupiñan			0,0	7:14				
24	Pablo Gastelvenza			0,0	7:14				
25	Jesus Mendoza			0,0	7:14				
26	Juan D. Rincon			0,0	7:15				
27	Elver Tarache			0,0	7:15				
28	Bagoberto Meza			0,0	7:15				
29	Raul Roa			0,0	7:16				
30	Francisco Quintero			0,0	7:15				
31	Jairo Rincon			0,0	7:17				
32	Wilson Padilla			0,0	7:18				
33	Armando Cepeda			0,0	7:18				
34	Ramon Salcedo			0,0	7:18				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-037 VERSION: 03 FECHA: 09-12-2021

FECHA: 04-06-2024
PROYECTO: Tilgivers
REALIZADAS POR: Mackleire Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Nestor Ortiz			0,0	7:12				
2	Estiven Izquierdo			0,0	7:13				
3	Carlos Herrera			0,0	7:14				
4	Jairo Ciudad			0,0	7:14				
5	Elsy Marroc			0,0	7:22				
6	Naidu Perez			0,0	7:22				
7	Brenda Ariza			0,0	7:48				
8	Jose Gustavo Chaparro			0,0	7:48				
9	Rafael Feruz			0,0	7:49				
10	Jose Antonio Vanegas			0,0	7:49				
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 07-05-2024
PROYECTO: Villavicencio
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madelein Rodriguez			0,0	7:07				
2	Diego Nonaq			0,0	7:08				
3	Elver Tarache			0,0	7:08				
4	Alberto Escalante			0,0	7:08				
5	Ismael Vasquez			0,0	7:08				
6	Ivan Reina.			0,0	7:09				
7	Jesus Piraban			0,05	7:09		0,0	7:21	
8	Keilyo Galan.			0,0	7:10				
9	Andres Guarnaro.			0,0	7:10				
10	Wilmer Rios.			0,0	7:10				
11	Wilmer.			0,0	7:11				
12	Jose Pacheco.			0,0	7:11				
13	Paulo Cuatibanic			0,0	7:11				
14	Steven Izquierdo.			0,0	7:11				
15	Nestor Ortiz			0,0	7:12				
16	Raul Rios			0,0	7:12				
17	Samuel Alcantara			0,0	7:12				
18	Wilson Padilla			0,0	7:12				
19	Luis Rey			0,0	7:13				
20	Didima Vargas			0,0	7:13				
21	Francisco Quintero			0,0	7:13				
22	Fernando Parra			0,0	7:14				
23	Denis Parra.			0,0	7:14				
24	Wilmer Vargas			0,0	7:14				
25	Adrian Sabogal			0,0	7:14				
26	Diogenes Anza			0,0	7:14				
27	Aldair Ortiz			0,0	7:15				
28	Jason Rincon			0,0	7:15				
29	Ramon Sogamoso			0,0	7:15				
30	Nardo Perez			0,0	7:15				
31	Carlos Herrera			0,0	7:15				
32	Ruben Dario Guzman			0,04	7:17		0,0	7:21	
33	Angelica Rodriguez			0,05	7:17		7:20	0,0	
34	Gustavo Chaparro			0,04	7:17		0,0	7:22	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007. VERSION: 03 FECHA: 09-12-2021

FECHA: 07-06-2024
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Alcrofan Paipa			0,0	7:17				
2	Andres Torres			0,0	7:18				
3	Jairo Cabrales			0,0	7:18				
4	Elsy Alarcon			0,0	7:18				
5	Angelica Trujillo			0,0	7:19				
6	Rafael Temus			0,0	7:22				
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 09-12-2021

FECHA: 08-06-2024
PROYECTO: Alcoholemia
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez.			0,0	7:01				
2	Wilson Omar Estupiñan			0,0	7:02				
3	Jaime Mendoza.			0,0	7:02				
4	Cristo Balon			0,0	7:02				
5	Didimo Quiroga			0,0	7:03				
6	Wilmer Rea			0,0	7:03				
7	Francisco Guantivo			0,0	7:03				
8	Jose Rincon			0,0	7:03				
9	Jesus Piratoa			0,0	7:04				
10	Pablo Cantillana.			0,0	7:04				
11	Nestor Ortiz			0,0	7:04				
12	Yenny Miguez			0,0	7:04				
13	Diego Bertel			0,0	7:05				
14	Armando Cepeda			0,0	7:05				
15	Luis Temus			0,0	7:05				
16	Adrian Solorzano			0,0	7:05				
17	Luis Fernando Gelvez			0,0	7:06				
18	Brandon Vaipe			0,0	7:06				
19	Alfonso Cardenas			0,0	7:06				
20	Aldair Ortiz			0,0	7:07				
21	Jaime Herrera.			0,0	7:07				
22	Leidis Sabino			0,0	7:07				
23	Abel Rea			0,0	7:08				
24	Norberto Anzo			0,0	7:08				
25	Wilmer Vargas			0,0	7:08				
26	Gustavo Oropeza			0,0	7:08				
27	Eyer Parraga			0,0	7:08				
28	Nestor Escamon			0,0	7:09				
29	Willy Alcazar			0,0	7:09				
30	Alberto Gallardo			0,0	7:09				
31	Jorge Nino M			0,0	7:09				
32	Jaimel Vasquez			0,0	7:10				
33	Andrea Rodriguez			0,0	7:10				
34	Raul Ortiz			0,0	7:10				

Firma Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 03-06-2024
PROYECTO: Floridablanca
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Nardy Leal			0,0	7:10				
2	Wilson Padilla			0,0	7:11				
3	Omar Villamizar			0,0	7:11				
4	Stiven Leguizamon			0,0	7:11				
5	Andres Torres			0,0	7:12				
6	Angelica Trujillo			0,0	7:12				
7	Maria Alvernard.			0,0	7:17				
8	Antonio Vargas			0,0	7:17				
9	Jose Maria Saltedo			0,0	7:17				
10	Camilo Castro Lopez			0,0	8:20				
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 11-06-2021
PROYECTO: Modirim
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	7:02				
2	Oliver Lascano			0,0	7:3				
3	Francisco Quintero			0,0	7:3				
4	Paubla Wichivonta			0,0	7:3				
5	alejandro Oque			0,0	7:4				
6	anclair ortiz			0,0	7:4				
7	Diego narvaez			0,0	7:5				
8	adrian Solorzano			0,0	7:5				
9	Juan david Pinson			0,0	7:5				
10	Nestor ortiz			0,0	7:5				
11	Raiza galan			0,0	7:5				
12	Ismael Vazquez			0,0	7:6				
13	Jaffe molina			0,0	7:6				
14	Delvis wing			0,0	7:6				
15	alberto escalante			0,0	7:6				
16	Raul Roa			0,0	7:6				
17	Luis Lemos			0,0	7:7				
18	wilmer Roa			0,0	7:7				
19	Edwin Izquierdo			0,0	7:8				
20	Jesus pirabon			0,0	7:8				
21	Jose Pacheco			0,0	7:8				
22	Andres Romero			0,0	7:8				
23	wilmer vargas			0,0	7:8				
24	Arfelis Rodriguez			0,0	7:9				
25	Armando Cepeda			0,0	7:10				
26	Pagalberto Ariza			0,0	7:10				
27	Rafael Lemuz			0,0	7:11				
28	Luis fernando Wine			0,0	7:11				
29	Jenny arteaga			0,0	7:14				
30	Luis Reyes ortiz			0,0	7:14				
31	Ruben Chupiñan			0,0	7:14				
32	Carlos Herrera			0,0	7:14				
33	Omar Villamizar			0,0	7:19				
34	Elbey alvarez			0,0	7:14				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 11-06-2024
PROYECTO: Arabian
REALIZADAS POR: Madeleine Rodm
CARGO Hotel

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Duvimar Vargas				9:14				
2	Wilson Padilla				7:14				
3	Jose angel Salcedo				7:15				
4	Jose antonio Vargas				7:17				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST. VERSION: 03 FECHA: 08-12-2021

FECHA: 15-06-2024
PROYECTO: Alqueria
REALIZADAS POR: Madelerme Rodriguez
CARGO Hsetq

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madelin Rodriguez			0,0	7.04				
2	Wilson Padilla			0,0	7.04				
3	Adrian Soberano			0,0	7.05				
4	Diego Vertel			0,0	7.05				
5	Aldair Ortiz			0,0	7.05				
6	Nestor Ortiz			0,0	7.06				
7	Johan Gomez			0,0	7.06				
8	Andres Millan			0,0	7.06				
9	Raiko Galan			0,0	7.06				
10	Jaime Lopez			0,0	7.07				
11	Luis Leaos			0,0	7.07				
12	Jose pacheco			0,0	7.07				
13	Jorge Niño			0,0	7.07				
14	Ismael Vasquez			0,0	7.08				
15	Elvis M Arenas			0,0	7:8				
16	Yeimy Bilarey			0,0	7:8				
17	Gustavo Cote			0,0	7:8				
18	Dixie Mina			0,0	7:08				
19	Armando Sepeda			0,0	7:09				
20	Wilmer Roa			0,0	7:09				
21	Wilmer Vargas			0,0	7:10				
22	Cindy cachay			0,0	7:10				
23	Javier aguirre			0,0	7:10				
24	Carlos Herrera			0,0	7:10				
25	Elver Jaraché			0,0	7:10				
26	Angelica Rodriguez			0,0	7:11				
27	Luis fernando wing			0,0	7:11				
28	Francisco Quintero			0,0	7:12				
29	Paulo Justiniano			0,0	7:12				
30	Thaylan Pinto			0,0	7:12				
31	Alberto Chaparro			0,0	7:12				
32	Gustavo Chaparro			0,0	7:13				
33	Raul Roa			0,0	7:13				
34	Andres Jaraca			0,0	7:15				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 15-06-2022
PROYECTO: Tilapia
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Edwin Lopez			0,0	7:13				
2	Mauricio Sanchez			0,0	7:14				
3	Diomedes Vargas			0,0	7:14				
4	Ruben Olivella			0,0	7:14				
5	Maidy Perez			0,0	7:14				
6	Rafael Lemus			0,0	7:15				
7	Omar Villamizar			0,0	7:15				
8	Selima Pinto			0,0	7:30				
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-0 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 12-06-2024
PROYECTO: Duplomen
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: Hse

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	7:05				
2	Jaime Lopez			0,0	7:06				
3	Nestor Diaz			0,0	7:06				
4	Ruben Estupiñan			0,0	7:06				
5	Adrian Sabarcas			0,0	7:07				
6	Elver Tarache			0,0	7:07				
7	Estiven Izquierdo			0,0	7:07				
8	Jose pacheco			0,0	7:07				
9	Raiza Falla			0,0	7:08				
10	Jorge Niño			0,0	7:08				
11	Wilmer Roa			0,0	7:08				
12	Luis Jesus			0,0	7:08				
13	Johan Gomez			0,0	7:09				
14	Aldair Ortiz			0,0	7:09				
15	Diego Abarca			0,0	7:09				
16	Andres Guevara			0,0	7:09				
17	Cristian Cote			0,0	7:10				
18	Jenny Mujarro			0,0	7:10				
19	Deivis Gruna			0,0	7:10				
20	Wilson Padilla			0,0	7:10				
21	Alejandro Duque			0,0	7:10				
22	Luis Rey			0,0	7:11				
23	Alberto Escalante			0,0	7:11				
24	Juan F. Gruna			0,0	7:11				
25	Pablo Guativenza			0,0	7:12				
26	Raul Rey			0,0	7:12				
27	Jesus Aguirre			0,0	7:13				
28	Ismael Vargas			0,0	7:13				
29	Fauder Montales			0,0	7:13				
30	Dina D. Linero			0,0	7:14				
31	Rafael Jesus			0,0	7:15				
32	Wilmer Vargas			0,0	7:15				
33	Armando Poveda			0,0	7:15				
34	Freddy Carbal			0,0	7:15				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 17-06-2021
PROYECTO: Villavicencio
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Carlos Herrera			0,0	7:16				
2	Angelica Rodriguez			0,0	7:16				
3	Francisco Quintero			0,0	7:17				
4	Mauricio Sanchez			0,0	7:17				
5	Omar Villamizar			0,0	7:15				
6	Jonatan Reyes			0,0	7:17				
7	Gustavo Chaparro			0,0	7:18				
8	Luis Hernando Pinto			0,0	7:19				
9	Cristian C. Castro			0,0	7:18				
10	Jaime Manrique			0,0	7:20				
11	Elsy Alarcon			0,0	7:11				
12	Maicol Perez C.			0,0	7:21				
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 21 de Junio de 2024
PROYECTO: Mantarum
REALIZADAS POR: Madeline Rodriguez
CARGO Auxiliar

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeline Rodriguez			0,0	7:10				
2	Adrian Salazitha			0,0	7:11				
3	Wilmer Vargas			0,0	7:12				
4	Diego Narvaez			0,0	7:12				
5	Pablo Granbonza			0,0	7:13				
6	Wilson Padilla			0,0	7:13				
7	Alejandro Vargas			0,0	7:13				
8	Faider Matales			0,0	7:14				
9	Alcides Ortiz			0,0	7:14				
10	Andres Guevara			0,0	7:14				
11	Jaime Lopez			0,0	7:14				
12	Nestor Ortiz			0,0	7:15				
13	Elver Torache			0,0	7:16				
14	Fredy cochay			0,0	7:16				
15	Jaime Aguirre			0,0	7:16				
16	Jorge Nito			0,0	7:16				
17	Cristian Cote			0,0	7:17				
18	Wilmer Roa			0,0	7:17				
19	Jose Vargas			0,0	7:18				
20	Nelson Gelon			0,0	7:18				
21	Johan Gomez			0,0	7:19				
22	Armando Cepeda			0,0	7:19				
23	Luis Torres			0,0	7:19				
24	Alberto Escalante			0,0	7:20				
25	Ismael Vargas			0,0	7:20				
26	Jose Pacheco			0,0	7:21				
27	Gustavo Chaparro			0,0	7:21				
28	Donaldo Parra			0,0	7:22				
29	Omar Villamizar			0,0	7:22				
30	Andres Torres			0,0	7:23				
31	Carlos Herrera			0,0	7:23				
32	Dairo Vargas			0,0	7:25				
33	Francisco Quintero			0,0	7:26				
34	Rafael Torres			0,0	7:27				

Madeline Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 09-12-2021

FECHA: 21-06-2024
PROYECTO: Tiquisio
REALIZADAS POR: Madeleine Pastrana
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Jenny Mujares			0,0	7:24				
2	Raul Pena			0,0	7:25				
3	Ruben Estupiñan			0,0	7:25				
4	Mauricio Sancho.			0,0	7:25				
5	Jhon D. Rincon			0,0	7:25				
6	Luis F. Guevara			0,0	7:26				
7	Estiven Lagarejo			0,0	7:26				
8	Hey Alarcon			0,0	7:27				
9	Yonder Arez C.			0,0	7:27				
10	Jaime Manrique			0,0	7:40				
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

O DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-007
E PRUEBAS DE LIMETRIAS	VERSION: 03
CCIONES E INGENIERIA	FECHA: 06-12-2021

Jose Pacheco 1007747536
1116809321 Estiven Legrisamón
Asesorado

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

5	Jamar							
6	Stiven Restrepo							
7	Luis Fernando Lemus							
8	Andres millan							
9	Jorge Niño							
10	Jaime Lopez							
11	Nestor Ortiz							
12	Naidy peret							
13	Elver Tocache							
14	Adrian Sotolongo							
15	Edair Ortiz.							
16	Johan Leon							
17	Yaldo Enrriquez							
18	Jhonder Morales							
19	Wilmer Vargas.							
20	Luis Ebrea.							
21	Amando Cepeda.							
22	Freddy Cochay							
23	Luis Fernando Ebrea							
24	Cristian Jose							
25	Antonio Vargas							
26	Wilmer Roa.							
27	Javier Agudelo							
28	Yeiri Roa.							
29	Jordan Chaparro							
30	Jose Vargas							
31	Kaiser Leon							
32	Omar Quitiaquez							
33	Jose Pacheco							
34	Wilson Pardo							

RGO	Lec. 1	Hora	Firma	Lec. 2	Hora	Firma
	0,0	7:14				
	0,0	7:14				
	0,0	7:15				
	0,0	7:15				
	0,0	7:15				
	0,0	7:16		0,0	7:40	
	0,0	7:17				
	0,0	7:18				
	0,0	7:18				
	0,0	7:18				
	0,0	7:19				
	0,0	7:19				
	0,0	7:20				
	0,0	7:20				
	0,0	7:21				
	0,0	7:21				
	0,0	7:21				
	0,0	7:21				
	0,0	7:22				
	0,0	7:22				
	0,0	7:22				
	0,0	7:23				
	0,0	7:23				
	0,0	7:24				
	0,0	7:24				
	0,0	7:25				
	0,0	7:25				
	0,0	7:25				
	0,0	7:26				
	0,0	7:26				
	0,0	7:26				
	0,0	7:27				
	0,0	7:27		0,0	7:40	
	0,0	7:28				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIÁ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-13-2021

FECHA: 22-06-2024
PROYECTO: Alcatraz
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO Hseq

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	7:14				
2	Alberto Escalante			0,0	7:14				
3	Francisco Quintero			0,0	7:15				
4	Diego Verjel			0,0	7:15				
5	Ismael Vasquez			0,0	7:15				
6	Stiven Izquierdo			0,0	7:16		0,0	7:40	
7	Luis Fernando Lemus			0,0	7:17				
8	Andres millan			0,0	7:18				
9	Jorge niño			0,0	7:18				
10	Jaime lopez			0,0	7:18				
11	Nestor Ortiz			0,0	7:19				
12	Naido Peret			0,0	7:19				
13	Elver Terrache			0,0	7:20				
14	Adrian Solorzano			0,0	7:20				
15	Albair Ortiz			0,0	7:21				
16	Johan Gomez			0,0	7:21				
17	Carlos Castellanos			0,0	7:21				
18	Jhounder Morales			0,0	7:21				
19	Wilmer Vargas			0,0	7:22				
20	Nelvis Ochoa			0,0	7:22				
21	Armando Tejeda			0,0	7:22				
22	Freddy Cochay			0,0	7:23				
23	Luis Fernando Ochoa			0,0	7:23				
24	Cristian Sole			0,0	7:24				
25	Antonio Vargas			0,0	7:24				
26	Wilmer Roa			0,0	7:25				
27	Javier Aguilar			0,0	7:25				
28	Raul Roa			0,0	7:25				
29	Gerson Chaparro			0,0	7:26				
30	Jose Vargas			0,0	7:26				
31	Ronald Cohen			0,0	7:26				
32	Omar Villamizar			0,0	7:27				
33	Jose Pacheco			0,0	7:27		0,0	7:40	
34	Wilson Padilla			0,0	7:28				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 22-06-2024
PROYECTO: Hospital
REALIZADAS POR: Madeleine Rodrigue
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Ruben Echenique			0,0	7:26				
2	Luis Rey Ortiz			0,0	7:29				
3	Mauricio Sanchez			0,0	7:29				
4	Jonny Millares			0,0	7:30				
5	Eloy Alarcon			0,0	7:30				
6	Angelica Trujillo			0,0	7:31				
7	Maria Avendaño			0,0	7:32				
8	Rafael Tenorio			0,0	7:34				
9	Andres Torres			0,0	7:51				
10	Jhonaton Palpa			0,0	7:54				
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSIÓN: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 24 de Junio 2024
PROYECTO: Soladisan
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeline Rodriguez		0,0	0,0	7:04				
2	Aldair Ortiz		0,0	0,0	7:05				
3	Eliel Tarache		0,0	0,0	7:06				
4	Alejandro Duque		0,0	0,0	7:06				
5	Adrian Ramos Sebastian		0,0	0,0	7:06				
6	Diego Nuñez		0,0	0,0	7:07				
7	Orlando Gomez		0,0	0,0	7:07				
8	Jaime Lopez		0,0	0,0	7:07				
9	Nestor Ortiz		0,0	0,0	7:08				
10	Estiven Izquierdo		0,0	0,0	7:08				
11	Andres Guevara		0,0	0,0	7:08				
12	Jon D. Pinzon		0,0	0,0	7:09				
13	Angelica Rodriguez		0,0	0,0	7:09				
14	Julio Pinzon		0,0	0,0	7:10				
15	Jose Vargas		0,0	0,0	7:10				
16	Dennis Guitia		0,0	0,0	7:10				
17	Jorge Niño		0,0	0,0	7:10				
18	Ismael Vasquez		0,0	0,0	7:11				
19	Carlos Galan		0,0	0,0	7:11				
20	Elsy Alarcon		0,0	0,0	7:12				
21	Jair Tapias		0,0	0,0	7:13				
22	Jose M. Salcedo		0,0	0,0	7:13				
23	Javier Aguirre		0,0	0,0	7:13				
24	Cristian Cote		0,0	0,0	7:14				
25	Jose Pacheco		0,0	0,0	7:14				
26	Luis Rey		0,0	0,0	7:14				
27	Raul Rey		0,0	0,0	7:15				
28	Firdy Chaparro Cachay		0,0	0,0	7:15				
29	Fander Morales		0,0	0,0	7:16				
30	Francisco Quintero		0,0	0,0	7:16				
31	Alberto Escalante		0,0	0,0	7:17				
32	Armando Caceda		0,0	0,0	7:17				
33	Wilmer Vargas		0,0	0,0	7:17				
34	Carlos Herrera		0,0	0,0	7:18				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 24-06-2024
PROYECTO: Filadelfia
REALIZADAS POR: Madeleine Restrepo
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Oscar Villamizar			0,0	7:18				
2	Ruben Estupiñan			0,0	7:18				
3	Delimo Vargas			0,0	7:18				
4	Rafael Lemus			0,0	7:19				
5	Wilmer Roa			0,0	7:20				
6	Mauricio Sanchez			0,0	7:21				
7	Luis Lemus			0,0	7:22				
8	Naudi Perez			0,0	7:23				
9	Jenny Mijares			0,0	7:22				
10	Andres Tejeda			0,0	7:42				
11	Alfonso Cardenas			0,0	7:42				
12	Gustavo Chacon			0,0	7:43				
13	Jaime Manna			0,0	7:43				
14	Yesmel Sanchez			0,0	8:1				
15	Jose Garcia			0,0	8.1				
16	Juan Gonzalez			0,0	8.2				
17	Edgar Ortiz			0,0	8.1				
18	Jose Gomez			0,0	8.3				
19	Freddy Moreno			0,0	7.2				
20	Jam Garcia			0,0	8.3				
21	Luis Neiza			0,0	8.3				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Madeleine Restrepo
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 22 de Junio de 2022
PROYECTO: Huellenes Refinería
REALIZADAS POR: Alcoholimetría
CARGO: HSE

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madelene Rodriguez			0,0	7:05				
2	Oscar Villamizar			0,0	7:05				
3	Jorge Nieto			0,0	7:05				
4	Aldair Ortiz			0,0	7:05				
5	Jaime Lopez			0,0	7:06				
6	Wilson Padilla			0,0	7:06				
7	Raison Galan			0,0	7:06				
8	Adrian Silvestre			0,0	7:07				
9	Elver Torrado			0,0	7:07				
10	Wilmer Rios			0,0	7:07				
11	Fredy cochay			0,0	7:08				
12	Jose Pacheco			0,0	7:08				
13	Neiber Ortiz			0,0	7:08				
14	Jehoe Gomez			0,0	7:08				
15	Jose L Rincon			0,0	7:08				
16	Luis F Leones			0,0	7:09				
17	Alberto Escalante			0,0	7:09				
18	Denis Gomez			0,0	7:09				
19	Andres Gamarra			0,0	7:10				
20	Cristian Cote			0,0	7:10				
21	Ismael Vasquez			0,0	7:10				
22	Fauder Morales			0,0	7:10				
23	Wilmer Vargas			0,0	7:10				
24	Jose Vargas			0,0	7:11				
25	Javier Aguirre			0,0	7:11				
26	Luis Rey			0,0	7:12				
27	Elsy Alarcon			0,0	7:13				
28	Dishiro Vargas			0,0	7:14				
29	Esteve Higuerasmo			0,0	7:15				
30	Alejandro Duque			0,0	7:15				
31	Pablo Castellanos			0,0	7:15				
32	Diego Moreno			0,0	7:16				
33	Carlos Herrera			0,0	7:16				
34	Angelo Cepeda			0,0	7:17				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 20-06-2024
PROYECTO: Tipiura
REALIZADAS POR: Hamilton Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Francisco Quintero			0,0	7:16				
2	Andres Teires			0,0	7:18				
3	Raul Rea			0,0	7:18				
4	Ibasatos Paipa			0,0	7:19				
5	Gustavo Chaparro			0,0	7:19				
6	Mauricio Sarmiento			0,0	7:19				
7	Jose E Garcia			0,0	7:20				
8	Rubeo Estupiñan			0,0	7:10				
9	Nelido			0,0	7:21				
10	Rafael Alonso			0,0	7:21				
11	Jhony Nuarez			0,0	7:22				
12	Jaime Moñino			0,0	7:23				
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 28 de Junio de 2024
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodrigues
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeline Roguez			0,0	7:03				
2	Diego Vertel			0,0	7:04				
3	Aldair Ortiz			0,0	7:04				
4	Alfonso Cardenas			0,0	7:04				
5	Dhaian Gomez			0,0	7:05				
6	Ismael Vasquez			0,0	7:05				
7	Jorge chaparro			0,0	7:05				
8	Elver Taracha			0,0	7:06				
9	Johan Casulu			0,0	7:07				
10	Jose Pacheco			0,0	7:07				
11	Wilmer Faca			0,0	7:07				
12	Jesus Pirabon			0,0	7:07				
13	Dalmo Vargas			0,0	7:07				
14	Nestor Ortiz			0,0	7:07				
15	Estivin Arguzamon			0,0	7:08				
16	Ruber Estupiñan			0,0	7:08				
17	Luis F. Gama			0,0	7:08				
18	Fredy Sachica			0,0	7:08				
19	Denis Gaica			0,0	7:09				
20	Jose Tapia			0,0	7:09				
21	Armando Cepeda			0,0	7:09				
22	Daghberto Anaya			0,0	7:10				
23	Alberto Escalante			0,0	7:10				
24	Javier Aguirre			0,0	7:10				
25	Luis Rey			0,0	7:11				
26	Raul Fad			0,0	7:13				
27	Carlos Gasparo			0,0	7:13				
28	Wilson Padilla			0,0	7:13				
29	Wilmer Vargas			0,0	7:13				
30	Cristian Cote			0,0	7:13				
31	Pablo Galeo			0,0	7:13				
32	Elsy Aparicio			0,0	7:14				
33	Horacio Rojas			0,0	7:14				
34	Andres Torres			0,0	7:14				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIÁ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSIÓN: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 28-06-2024
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Maquelin Rodriguez
CARGO: Aseo

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Gustavo Chaparro			0,0	7:14				
2	Francisco Quintero			0,0	7:15				
3	Omar Villamizar			0,0	7:15				
4	Rafael Lemus			0,0	7:15				
5	CARLOS HERRERA			0,0	7:16				
6	FAUDER MORENO			0,0	7:16				
7	Angelica Trujillo			0,0	7:17				
8	Jorge Niño			0,0	7:17				
9	Nasly Perez C.			0,0	7:17				
10	Camilo Castro			0,0	7:17				
11	Adara solorzano			0,0	7:23				
12	Luis Fernando Lemus			0,0	7:23				
13	Jaime Monroy			0,0	7:55				
14	Brayan Moreno			0,0	7:58				
15	Jose Ricardo Sulbaran			0,0	7:55				
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Maquelin Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 29-06-2024
PROYECTO: Riohacha
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeline Rodriguez			0,0	7:03				
2	Javier Aguirre			0,0	7:04				
3	Juan D. Rincon			0,0	7:04				
4	Diego Vertel			0,0	7:05				
5	Elver Tarache			0,0	7:06				
6	Jhohan Gomez			0,0	7:06				
7	Jesus Pinedo			0,0	7:07				
8	Angelica Rodriguez			0,0	7:07				
9	Jose Pacheco			0,0	7:08				
10	Fredy Sachey			0,0	7:07				
11	Jorge Niño			0,0	7:08				
12	Jhohan Casure			0,0	7:08				
13	Armando Cepeda			0,0	7:10				
14	Jorge chaparro			0,0	7:10				
15	Alejandra Degue			0,0	7:11				
16	Luis F. Guiza			0,0	7:11				
17	Degoberto Arroyo			0,0	7:11				
18	Wilmer Poa			0,0	7:11				
19	Carlos Herrera			0,0	7:12				
20	Alberto Escalante			0,0	7:12				
21	Ismael Vargas			0,0	7:12				
22	Denis Guiza			0,0	7:12				
23	Wilson Padilla			0,0	7:13				
24	Luis Rey			0,0	7:13				
25	Jonatan Pareja			0,0	7:13				
26	Andres Gonzalez			0,0	7:13				
27	Wilmer Vargas			0,0	7:14				
28	Elsy Alarcon			0,0	7:14				
29	Gustavo chaparro			0,0	7:15				
30	Jaime Lopez			0,0	7:15				
31	Jose Tapias			0,0	7:15				
32	Nestor Ortiz			0,0	7:15				
33	Fredier Morales			0,0	7:16				
34	Cristian Cote			0,0	7:16				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 29-06-2021
PROYECTO: Tilquian
REALIZADAS POR: Madeleine Pastrana
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Esteven Izquierdo			0,0	7:16				
2	Andres Tafur			0,0	7:16				
3	Francisco Cifuentes			0,0	7:17				
4	Didimo Vargas			0,0	7:17				
5	Alfonso Cardenas			0,0	7:18				
6	Alvaro Ortiz Tafur			0,0	7:18				
7	Raul Rea			0,0	7:18				
8	Omar Villamizar			0,0	7:19				
9	Ruben Estupiñan			0,0	7:19				
10	Mauricio Sanchez			0,0	7:20				
11	Pablo Gaba			0,0	7:20				
12	Rafael Jemus			0,0	7:21				
13	Jeany Nuñez			0,0	7:21				
14	David Perez C.			0,0	7:21				
15	Jaime Mariño			0,0	7:48				
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 21-05-2022
PROYECTO: Alboran
REALIZADAS POR: Madeleine Restrepo
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Magdelin Rodriguez			0,0	7:10				
2	Wilson padilla			0,0	7:11				
3	Jaime Cabadez			0,0	7:11				
4	Jaime Niño			0,0	7:11				
5	Wilmer Rojas			0,0	7:12				
6	Luis Herrera			0,0	7:12				
7	Luis ortiz			0,0	7:13				
8	Luis Lemus			0,0	7:13				
9	Estiven Leguizamon			0,0	7:13				
10	Diego Vertel			0,0	7:13				
11	Alejandro Duque			0,0	7:13				
12	Andres Millan			0,0	7:13				
13	Alcides ortiz			0,0	7:14				
14	Adrian Salazar			0,0	7:14				
15	Norgalberto Arroyo			0,0	7:14				
16	Deivis Garcia			0,0	7:15				
17	Raulso Salas			0,0	7:15				
18	Sener Mendoza			0,0	7:15				
19	Luis Cuina			0,0	7:16				
20	Jose Salcedo			0,0	7:17				
21	Pablo Santibanez			0,0	7:17				
22	Jesus Pinzon			0,0	7:18				
23	Alberto Escalante			0,0	7:17				
24	Ismael Vasquez			0,0	7:18				
25	Didier Vargas			0,0	7:18				
26	Tirzo Rincon			0,0	7:18				
27	Wilmer Vargas			0,0	7:19				
28	Elber Tarache			0,0	7:19				
29	Juan David Rincon			0,0	7:19				
30	Nestor ortiz			0,0	7:19				
31	Ivan Reina			0,0	7:19				
32	Carlos Herrera			0,0	7:20				
33	Elsi Alonso			0,0	7:20				
34	Rafael Lopez			0,0	7:21				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 23-05-2024
PROYECTO: Tilapuica
REALIZADAS POR: Yadigna Ramirez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Francisco Quintero			0,0	9:21				
2	Angelica Rodriguez			0,0	9:21				
3	Jhonatan Ramirez			0,0	7:56				
4	Hugo Cardona			0,0	7:56				
5	Andres Torres			0,0	7:56				
6	Jose bustillo dangelo			0,0	7:57				
7	Jaime Medina			0,0	8:00				
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.9.
AST Y PT

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 85 VERSION:1 REVISION 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar: Filadelfian Cabecera		Permiso N°: 24-2024	
Fecha de expedición Día / Mes / Año: 01/06/24	Válido: Desde: [illegible] 7 min 00	Hasta: hora 5 min 00	
Ejecutante: Armando Cepeda		N° de Personas	
Frente de trabajo: Frente #1		% de Avance	
Area de Trabajo: Instalacion de tubera Sanitaria			
Descripción del Trabajo: Excavacion mecanica e instalacion de tubera 12" Sanitaria			

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T.	X			Hojas de Seguridad			X
Procedimiento Escrito	X			Listas de Chequeo	X			Planos/Esquemas/Fotos			X

TAREAS CRITICAS

Trabajo en Caliente			X	Manejo de cargas	X			Excavación	X		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico		X		Trabajo en Alturas	X			Espacios Confinados			X

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		X	IZAJE DE CARGAS	X		AHOGAMIENTO		X
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	X		ELECTRICIDAD		X	PRESENCIA DE LLUVIA	X	
EXCAVACION	X		RADIACION NO IONIZANTE	X		BIOLOGICOS	X	
PRESIÓN		X	ELECTRICIDAD		X	RUIDO	X	
TRABAJO EN ALTURAS	X		SUPERFICIES IRREGULARES	X		COMUNICACIÓN DEFICIENTE		X
CAIDA DE OBJETOS	X		GASES TOXICOS		X			
VISIVILIDAD DEFICIENTE		X	AMBIENTALES	X				

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	X		ENTIBADO	X		MSDS		X
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	X		ILUMINACIÓN		X	PROTECCIÓN AUDITIVA	X	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		X	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	X		VENTILACION MECANICA		X
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		X	MONITOR DE ADMOSFERAS		X	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	X	

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	X			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	X		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	X			BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			X
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	X			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	X		
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	X			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	X		
OTROS				CUAL?	Botiquin 4-1		

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad para asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura: X

AUTORIDAD EJECUTANTE: Armando Cepeda — CARGO: Oficial — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso: X

ING. RESIDENTE: Omar Villamizar — CC 13 475 370 — FIRMA:

SUP. SST: Madeleine Valverde — CC 47 436 658 — FIRMA:

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones: X

AUTORIDAD EJECUTANTE: Armando Cepeda — CC 9.433.512 — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre: X

ING. RESIDENTE: Omar Villamizar — CC 13 475 370 — FIRMA:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-06-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 30-06-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO A PASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING. RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SSTAC-014 VERSION : 01 REVISION : 08-04- 2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICION Y JOSE EUSTACIO RIVERO
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Aplicación
Desde: 01-06-24
Hasta: 30-06-24

4	DESCARGUE DE TUBERIA	MECANICO: EQUIPOS EN MOVIMIENTO (CAIDA DE CARGAS) BIOMECANICO SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CAIDA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DE LOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ADECUAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS, ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACION DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LECIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 05-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-06-22
PROYECTO		hasta 30-06-22
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO APASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR ALACANTARILLADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	INSPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
9	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
10	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ATS			
INGENIERO RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC	MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros ☐

FECHA: 01-06-2024 LUGAR: Campamento

TEMA(S): Divulgación de permiso de trabajo y ATS

PROYECTO: Tilo Jiron

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min) 1 Hora.

TEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Armando Cepeda	9432512	Oficial	
2	angelica [illegible]	1069154028	Topografa	
3	Victor Ortiz	[illegible]	Maestro	
4	Wilmer Rico	94326744	Oficial	
5	Jhojan David Gomez	1098642224	Aux Obr	
6	Edwin Antonio Vargas A.	1116595786	Auxiliar	
7	Luis Yoy Ortiz	74857511	oficial	
8	Edwin Andres Turche	1105677718	Auxiliar	
9	Jhonatan Rincon	1127 922 793	Auxiliar	
10	Omar Villamizar	13 475 370	Ing. Residente	
11	Francisco Quintero	425554	Maestro General	
12	Madeleine Rodriguez	47436634	HSEQ	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ

PERMISO DE TRABAJO

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST- 01
VERSION: 1
REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar: Tilodiran Casanare
Permiso N°: 23-2014
Fecha de expedicion Dia / Mes / Año: 16/06/24 Valido: Desde: hora 4 min 00 Hasta: hora 5 min 00
Ejecutante: David Guinca
Nº de Personas:
Frente de trabajo: Frente #3
% de Avance:
Area de Trabajo: Instalacion de tuberia sanitaria 8" 12"
Descripcion del Trabajo: Excavacion mecanica e instalacion de tuberia 12"

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	✓			A.S.T.	✓			Hojas de Seguridad			✓
Procedimiento Escrito	✓			Listas de Chequeo	✓			Planos/Esquemas/Fotos			✓

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			✓	Manejo de cargas	✓			Excavación	✓		
Alistamiento Mecánico / Eléctrico			✓	Trabajo en Alturas	✓			Espacios Confinados			✓

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		✓	IZAJE DE CARGAS	✓		AHOGAMIENTO		✓
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	✓		ELECTRICIDAD		✓	PRESENCIA DE LLUVIA	✓	
EXCAVACION	✓		RADIACION NO IONIZANTE	✓		BIOLOGICOS	✓	
PRESIÓN		✓	ELECTRICIDAD		✓	RUIDO	✓	
TRABAJO EN ALTURAS	✓		SUPERFICIES IRREGULARES	✓		COMUNICACIÓN DEFICIENTE		✓
CAIDA DE OBJETOS	✓		GASES TOXICOS		✓			
VISIVILIDAD DEFICIENTE		✓	AMBIENTALES	✓				

NOTAS: Se realiza la actividad a cielo abierto a 3,50 mts de profundidad temperatura normal

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	✓		ENTIBADO	✓		MSDS		✓
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES		✓	ILUMINACIÓN		✓	PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		✓	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	✓		VENTILACION MECANICA		✓
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		✓	MONITOR DE ADMOSFERAS		✓	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	✓	

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	✓			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	✓		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	✓			BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA	✓		
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	✓			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	✓		
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	✓			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	✓		
OTROS			CUAL? Botiquin 4-1				

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad para asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura ✓

AUTORIDAD EJECUTANTE: David Guinca CARGO: OFICIAL FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso ✓

ING. RESIDENTE: Omar Villamizar DE 13.476.370 FIRMA:
SUP. SST: Guillermo Rodriguez DE 4.274.655 FIRMA:

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Este sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han establecido completamente sus funciones ✓

AUTORIDAD EJECUTANTE: DENIS Guinca DE FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre ✓

ING. RESIDENTE: Omar Villamizar DE 13.476.370 FIRMA:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-06-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 30-06-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	REALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING- RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST/AC	FOR-SST/AC-014
	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 08-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN	
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO	Desde: 01-06-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR	Hasta: 30-06-24
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	

4	DESCARGUE DE TUBERIA	MECANICO: EQUIPO EN MOVIMIENTO (RUE DE CARGAS) BIOMECANICO SOBRE ESFUERZOS MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CAIDA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES DIETOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DE LOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECCION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACION DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO) NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CAIDA DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LESIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECCION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-06-24
PROYECTO		Hasta 30-06-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
6	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR ALACANTARILLADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	INSPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
9	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
19	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ATS

ING- RESIDENTE | SUPERVISOR SSTAC | MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: 04-06-2024 | LUGAR: Campamento

TEMA(S): Divulgación de Permisos de Trabajo, ATS Riesgos y

PROYECTO: Tibasica

INSTRUCTOR: Madeleine Lamuguet | Duracion: (Min) 1 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Oscar Goiva	74770314	Oficial	
2	Miguel Ojeda Tabares	1006547647	Auxiliar	
3	Alejandro Ortiz Acosta	1116531038	Ayudante	
4	Didier Vargas	1124BC6ba	Ac	
5	Luis Fernando Loiza	74X67079	Auxiliar	
6	Omar Villanueva	13.495.370	Res. Obra	
7	Alberto Jerangelo Vasquez	7718562072	cadenero	
8	Kevin Neira	1128344714	ayuda	
9	Luis Fernando Lemus	1057602737	Cad. 1	
10	Adrian David Salazar A.	1118530260	auxiliar	
11	Francisco Quintero	4295556	Ppal. Geral	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones: Peligros en el desarrollo de la actividad

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ

PERMISO DE TRABAJO

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST-55
VERSION:1
REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar: Tilodiran Cajamarca

Permiso N°: 77-2024

Fecha de expedición Día / Mes / Año: 01 06 24 Válida: Desde hora 7 min 00 Hasta hora 8 min 00

Ejecutante: Jose pacheco

N° de Personas:

Frente de trabajo: patio

% de Avance:

Área de Trabajo: Vicaguaranda (Tiladiran)

Descripción del Trabajo: Limpieza de patio - Construccion de patio y cambio de techo

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T.	X			Hojas de Seguridad			X
Procedimiento Escrito	X			Listas de Chequeo	X			Planos/Esquemas/Fotos			X

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente		X		Manejo de cargas	X			Excavación	X		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico		X		Trabajo en Alturas	X			Espacios Confinados		X	

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		X	IZAJE DE CARGAS	X		AHOGAMIENTO		X
EQUIPOS EN MOVIMIENTO		X	ELECTRICIDAD		X	PRESENCIA DE LLUVIA	X	
EXCAVACION	X		RADIACION NO IONIZANTE	X		BIOLOGICOS	X	
PRESIÓN		X	ELECTRICIDAD		X	RUIDO	X	
TRABAJO EN ALTURAS	X		SUPERFICIES IRREGULARES	X		COMUNICACIÓN DEFICIENTE		X
CAIDA DE OBJETOS	X		GASES TOXICOS		X			
VISIVILIDAD DEFICIENTE		X	AMBIENTALES	X				

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarias en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	X		ENTIBADO	X		MSDS		X
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	X		ILUMINACIÓN		X	PROTECCIÓN AUDITIVA	X	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		X	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	X		VENTILACION MECANICA		X
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		X	MONITOR DE ADMOSFERAS		X	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	X	

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	X			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	X		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO			X	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			X
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	X			VERSIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	X		
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	X			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	X		
OTROS				CUAL? polipasto 4 a 1			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar, Acepto la responsabilidad para asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura

AUTORIDAD EJECUTANTE: Jose pacheco CARGO: Oficial FIRMA: Josepacheco — X

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso

ING. RESIDENTE: Omar villamizar CC 13.472.370 FIRMA — X

SUP. SST: Madeleine Rodriguez CC 1.118.561.658 FIRMA — X

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a Ing. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — X

AUTORIDAD EJECUTANTE: Jose pacheco CC 1116760761 FIRMA: Josepacheco

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — X

ING. RESIDENTE: Omar villamizar CC 13.472.370 FIRMA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-06-2024
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 30-6-2024
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANICO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	FIGURADO / AMARRE E INSTALACION DE HIERRO REFORZADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING- RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Dare Psche

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-06-2023
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 30-06-2023
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
4	APLICACIÓN DE SOLADO/FUNDICION PLACA DE FONDO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO DESHIDRATACION ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
5	PEGUE DE LADRILLOS A POZOS	MECANICO, QUIMICO, FISICO MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS, INTOXICASION POR QUIMICO TOXEMENT, ALTAS TEMPERATURAS	USO ADECUADO DE LOS EPP HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
6	PAÑETES Y PEGUE DE LADRILLO	MECANICO, FISICO, QUIMICO, SICOSOCIAL TRABAJO EN ALTURAS	LESIONES EN MANOS, SOBRE ESFUERZO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL, CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS, ALTAS TEMPERATURAS, INTOXICASION POR QUIMICO ALERGIAS,	USO ADECUADO DE LOS EPP, USO DE EQUIPO TSA MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES EN CASO DE INTOXICASION Y ALERGIAS PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS	SUP HSEQ PERSONAL D OBRA Y EJECUTANTES

ING. RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 06-06-2022
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 30-06-2022
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
7	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO; MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO, CEFALEA	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
8	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO; SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, QUIMICOS , FISICOS, NATURALES	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS, ALTAS TEPERATURAS, ALERGIAS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
9					

ING- RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS — VERSION:1

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: 02-06-2024 | LUGAR:

TEMA(S): Divulgacion de Riesgos y Peligros existentes

PROYECTO: Villavivan

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez | Duracion: (Min) 1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JoséPacheco			
2	Nicolas Ortiz	1418944716	Oficial	
3	DIANA VILLANUEVA	1047573770	Ces. Obra	
4	Raiso Galeón	9'657 199	Auxiliar	
5	Francisco Quintero	4243334	Maestro Gen	
6	Madeleine Rodriguez	42434639	HSEQ	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones: En la construccion de vias y trabajos conjuntos

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST- 05
VERSION: 1
REVISION: 10-03-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar: Tilodiran Consincave — Permiso N°: Z - 7054

Fecha de expedición Día / Mes / Año: 10/8/2024 — Válido: Desde: [illegible] — hora: 7 min 03 — Hasta: hora 5 min 03

Ejecutante: Raul Roca — N° de Personas:

frente de trabajo: Pozos — % de Avance:

Area de Trabajo: Via agua linda pozo 24-45

Descripción del Trabajo: Excavacion Plac. Vaque de Rodillo en cimaye de tierra

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	P			A.S.T.	P			Hojas de Seguridad			P
Procedimiento Escrito	P			Listas de Chequeo	P			Planos/Esquemas/Fotos			P

TAREAS CRITICAS

Trabajo en Caliente		P		Manejo de cargas	P			Excavación	P		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico		P		Trabajo en Alturas	P			Espacios Confinados		P	

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		P		IZAJE DE CARGAS	P			AHOGAMIENTO			P
EQUIPOS EN MOVIMIENTO		P		ELECTRICIDAD		P		PRESENCIA DE LLUVIA	P		
EXCAVACION	P			RADIACION NO IONIZANTE	P			BIOLOGICOS	P		
PRESIÓN		P		ELECTRICIDAD		P		RUIDO	P		
TRABAJO EN ALTURAS	P			SUPERFICIES IRREGULARES	P			COMUNICACIÓN DEFICIENTE		P	
CAIDA DE OBJETOS	P			GASES TOXICOS		P					
VISIVILIDAD DEFICIENTE		P		AMBIENTALES	P						

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarias en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	P			ENTIBADO	P			MSDS			P
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	P			ILUMINACIÓN		P		PROTECCIÓN AUDITIVA	P		
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO			P	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	P			VENTILACION MECANICA			P
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO			P	MONITOR DE ADMOSFERAS			P	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	P		

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	P			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	P		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO			P	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			P
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	P			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	P		
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	P			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	P		
OTROS				CUAL?	Polipasto 4-1		

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad para asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — P

AUTORIDAD EJECUTANTE: Raul Roca — CARGO: Oficial — FIRMA: [signature]

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — P

ING. RESIDENTE: Omar villamizar — CC 13.925.370 — FIRMA: [signature]

SUP. SST: [illegible] — CC 44436638 — FIRMA: [signature]

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — P

AUTORIDAD EJECUTANTE: Raul Roca — CC 415[illegible] — FIRMA: [signature]

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — P

ING. RESIDENTE: Omar Villamizar — CC 13.925.370 — FIRMA: [signature]

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-06-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 30-06-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	FIGURADO / AMARRE E INSTALACION DE HIERRO REFORZADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING- RESIDENTE | SUPERVISOR SSTAC | MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-06-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 30-06-24
HERRAMENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
4	APLICACIÓN DE SOLADO/FUNDICION PLACA DE FONDO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO DESHIDRATACION ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
5	PEGUE DE LADRILLOS A POZOS	MECANICO, QUIMICO,.FISICO MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMENTAS LESIONES LUMBARES ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS, INTOXICASION POR QUIMICO TOXEMENT, ALTAS TEMPERATURAS	USO ADECUADO DE LOS EPP HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
6	PAÑETES Y PEGUE DE LADRILLO	MECANICO, FISICO, QUIMICO, SICOSOCIAL TRABAJO EN ALTURAS	LESIONES EN MANOS, SOBRE ESFUERZO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL, CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS, ,ALTAS TEMPERATURAS, INTOXICASION POR QUIMICO ALERGIAS,	USO ADECUADO DE LOS EPP, USO DE EQUIPO TSA MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES EN CASO DE INTOXICASION Y ALERGIAS PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES

ING. RESIDENTE | SUPERVISOR SSTAC | MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-06-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 30-06-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEM	PASO APASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
7	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO, CEFALEA	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
8	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, QUIMICOS, FISICOS, NATURALES	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS, ALTAS TEPERATURAS, ALERGIAS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS EINPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
9					

ING. RESIDENTE | SUPERVISOR SSTAC | MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	03-06-2024	LUGAR	Campamento
TEMA(S):	Divulgacion de permisos de trabajo		
PROYECTO:	Mastrum		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez G	Duracion: (Min)	1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Raul Roa	4150741	oficial	
2	Javier Antonio Aguirre Diaz	24859387	auxiliar	
3	Cristian Cote	1091540088	Auxiliar	
4	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	Ayu. Obra	
5	[illegible]	1118744398	Oficial	
6	Francisco Quintero	4205554	Op General	
7	Madeleine Rodriguez	47436638	HSEQ	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST- 05
VERSION 1
REVISION: 13-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar: Tibabuyan (Cajamarca) — Permiso N°: 25-2024
Fecha de expedición: Dia / Mes / Año: 31/06/24 — Válido: Desde: --- hora -- min 00 — Hasta: hora 12 min 00
Ejecutante: Alberto Escalante — N° de Personas:
Frente de trabajo: Frente #2 — % de Avance:
Area de Trabajo: Via agua linda
Descripción del Trabajo: Instalacion de tuberia de alcantarillado pluvial y excavacion.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T	X			Hojas de Seguridad	X		
Procedimiento Escrito				Listas de Chequeo	N			Planos/Esquemas/Fotos			N

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			N	Manejo de cargas	X			Excavación	X		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			N	Trabajo en Alturas	N			Espacios Confinados			X

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		N	IZAJE DE CARGAS	N		AHOGAMIENTO		N
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	N		ELECTRICIDAD		N	PRESENCIA DE LLUVIA	N	
EXCAVACION	N		RADIACION NO IONIZANTE	N		BIOLOGICOS	N	
PRESIÓN		N	ELECTRICIDAD		N	RUIDO	N	
TRABAJO EN ALTURAS	N		SUPERFICIES IRREGULARES	N		COMUNICACIÓN DEFICIENTE		N
CAIDA DE OBJETOS	N		GASES TOXICOS		N			
VISIVILIDAD DEFICIENTE		X	AMBIENTALES	N				

NOTAS: Las excavaciones tienen entivado metalico y un talud de 45°

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	N		ENTIBADO	N		MSDS	N	
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	N		ILUMINACIÓN		N	PROTECCIÓN AUDITIVA	N	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		N	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	N		VENTILACION MECANICA		N
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		N	MONITOR DE ADMOSFERAS		N	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	N	

NOTAS: No usan autocontenidos ya que no son espacios confinados

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea.)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	N			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	N		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO			N	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			N
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	N			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	N		
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	N			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	X		
OTROS				CUAL?			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad para asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — N

AUTORIDAD EJECUTANTE: Alberto Escalante — CARGO: OFICIAL — FIRMA: Alberto Escalante

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — N

ING. RESIDENTE: Omar Villamizar — CC: 13.835.370 — FIRMA:
SUP. SST: Hasperine Pabon — CC: 42.136.65X — FIRMA:

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — N

AUTORIDAD EJECUTANTE: Alberto Escalante — CC: — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — N

ING. RESIDENTE: Omar Villamizar — CC: 13.835.370 — FIRMA:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-06-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 30-06-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETRODEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING. RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Alberto

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SSTAC-014 VERSION : 01 REVISION : 08-04-2022
LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación: Desde: Hasta:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN	
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	

6	DESCARGUE DE TUBERIA	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO (GUIE DE CARGAS) ERGONOMICO SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CAIDA DE OBJETOS, MAGULLONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DE LOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6	EXCAVACION MECANICA	MECANICO EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA - INSTACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACION DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO) NATURAL Y FISICO)AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LECIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS, Y LANCHA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ALCALDIA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde 01-06-24
PROYECTO		Hasta 30-6-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR ALACANTARILLADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS. TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	ISNPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
9	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO. SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ATS			
ING RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC	MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

	...AD DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
HGIA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Inducción Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros

FECHA: 01-06-2024 LUGAR

TEMA(S): Divulgacion de permiso de trabajo y ATS Riesgos y Peligros

PROYECTO:

INSTRUCTOR: Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Estiben Izquierdo Jaramillo	1007747536	Cadenero	
2	Angelica Perlinguez	1067154078	Topografa	
3	Alberto Escorcia	1082851924	OFICIAL	
4	Jaime Lopez Ayala	10177525	Operador	
5	Nelson Andres Millan G	1118529693	Aux	
6	Diego Andres Narvaez Verdel	1066727772	Auxiliar	
7	Ismael Vasquez Tapias	1118577095	AUXILIAR	Ismael V.
8	Jorge NIÑO	9'637.721	oficio	
9	Oscar Villamizar	13.475.370	Cad. Oscar	
10	Francisco Quintero	4248578	M/O	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones: en las actividades Diarias

VoBo Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.10.
INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Frente #1

Actividad a Realizar: Instalacion de tuberia plubial y sanitaria

Responsable del Area de Trabajo: Armando Cepeda — Cargo: oficial

Marca Arnes: — Serie: 0114627045H

Marca Eslinga: — Serie: 538441300818

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO_____Nota: Diligencie el día y mes en número de 2 dígitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	25-6			26-6			27-6			28-6			29-6			02-7			03-7		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: Luis Rey Ortiz		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: TILODIRAN — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: FRENTE 1

Actividad a Realizar: INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL Y SANITARIA

Responsable del Area de Trabajo: ARMANDO CEPEDA — Cargo: OFICIAL

Marca Arnes: 3M — Serie: 0114 6250454

Marca Eslinga: 3M — Serie: 538446130018

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Personal)		

AÑO: 2024 Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 dígitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	17-06			18-06			19-06			20-06			21-06			22-06			24-06		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pretillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lengüetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: LUIS REY ORTIZ																						

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Frente #2

Actividad a Realizar: Instalacion de tubería de agua residual de 10" y excavacion mecanica y manual

Responsable del Area de Trabajo: Alberto Escalante — Cargo: Oficial

Marca Arnes: First Line — (020) Serie: 1170239

Marca Eslinga: First Line — (020) Serie: 5203439 0052

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO_____Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 dígitos Ej. Dec de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	04-6			06-6			07-6			08-6			09-6			11-6			12-6		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: Diego Narvaez Veliz		Diego			Diego			Diego			Diego			Diego			Diego			Diego		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego. Vandalismo Comodato

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FORMST-020 VERSION 01 REVISION 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Frente #2

Actividad a Realizar: Instalacion de tubena de agua residual

Responsable del Area de Trabajo: — Cargo:

Marca Arnes: First line 3M (021) Serie: 0279

Marca Eslinga: First line 3M (021) Serie: 385764103 66

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificacion para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

Año 2024 Nota: Diligencie el día y mes en número de 2 dígitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A: NO APLICA

ITEM	ARNES	21-6			22-6			24-6			25-6			26-6			27-6			28-6		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

INSPECCIONADO POR: ANDRES MILLAN

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Frente #2

Actividad a Realizar: Instalacion de tubena de agua residual

Responsable del Area de Trabajo: — Cargo:

Marca Arnes: First line 3M (021) Serie: 0279

Marca Eslinga: First line 3M (021) Serie: 385764103 66

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

Año 2024 Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	21-6			22-6			24-6			25-6			26-6			27-6			28-6		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Ramaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

INSPECCIONADO POR: ANDRES Millan

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Frente #2

Actividad a Realizar: Instalacion de tuberia de agua residual de 10" y excavacion mecanica y manual

Responsable del Area de Trabajo: Francisco Quintero — Cargo: HSA General

Marca Arnes: Link Tech (14) — Serie: 410122050003

Marca Eslinga: Link Tech (19) — Serie: 352422030130

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Personal)		

AÑo 2023 Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A NO APLICA

ITEM	ARNES	13-6			14-6			15-6			17-6			18-6			19-6			20-6		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: SUPERVISOR ESCUELANTE		Alberto			Alberto			Alberto			Alberto			Alberto			Alberto			Alberto		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES: MADELEINE RODRIGUEZ

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION 01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Fiente #2

Actividad a Realizar: Instalacion de tubeno agua residual de 10" y excavacion mecanica y manual

Responsable del Area de Trabajo: Alberto Escalante (Jorge Niño) — Cargo: Oficial

Marca Arnes: First line — Serie: 462197113

Marca Eslinga: First line — Serie: 29840270096

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO_____Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A: NO APLICA

ITEM	ARNES	04-6			03-6			06-6			07-6			08-6			11-6			12-6		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: x Jorge niño		Jorge			Jorge			Jorge			Jorge			Jorge			Jurge			Jorge		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego. Nadeline Rodriguez

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.11.
LISTA DE CHEQUEO DE EXCAVACIONES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Tilotlican. FECHA 12-6-24 PTW N° 25-2024
ACTIVIDAD Instalacion de tubera sanitaria 12"
RESPONSABLE Alberto Escalante

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarilla para polvo.	✓		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	✓		
Hay plano de interferencia.			
Se identifican las interferencias.			
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.	✓		
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.			✓
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se han implantado medidas correctivas.	✓		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigía.			✓
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	✓		
Se escoge la medida de protección apropiada.	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.			✓
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.	✓		
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	✓		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	✓		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	✓		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	✓		

RESPONSABLE DE AREA Alberto Escalante.
SUPER. SST Madeleine Ratinqui Ghome Hse
OBSERVACIONES Organizacion en el puesto de trabajo

Powered by CamScanner

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
SYNERGIA	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Tiladiran FECHA 07-06-24 PTW N° 23-2024
ACTIVIDAD Excavacion Mecanica e instalacion de fibra Sanitario
RESPONSABLE Deivid Guina

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarillapara polvo.	✓		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	✓		
Hay plano de interferencia.			
Se identifican las interferencias.			
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.	✓		
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.			✓
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se hanimplantado medidas correctivas.	✓		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigia.			✓
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	✓		
Se escoge la medida de protección apropiada.	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.			✓
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.			
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	✓		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	✓		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	✓		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	✓		

RESPONSABLE DE AREA Deivid Guina
SUPER. SST Madeleine Rodriguez G
OBSERVACIONES
permiso 23-2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Tilodiran FECHA 13-06-24 PTW N° 24-2024
ACTIVIDAD Excavacion mecanica e instalacion de tuberia sanitaria 12"
RESPONSABLE Armando Cepeda

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarilla para polvo.	✓		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	✓		
Hay plano de interferencia.			
Se identifican las interferencias.			
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.	✓		
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.			✓
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se han implantado medidas correctivas.	✓		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigía.			✓
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	✓		
Se escoge la medida de protección apropiada.	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.	✓		
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	✓		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	✓		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	✓		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	✓		

RESPONSABLE DE AREA Armando Cepeda
SUPER. SST Maddeine Rodriguez HSEQ
OBSERVACIONES se debe reforzar el entivado y uso de motobombas para evitar el deslizamiento de material dentro de la

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.12.
ENTREGA DE EPP

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-03-22

PROYECTO : Tilodiran — LUGAR: Campamento

FRENTE DE TRABAJO: Frente 1-2-3- Descarga Postes — MES: Junio

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				Insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Jesus Pirabam	04-06-24	Vaqueta	P	+		Mascarilla negra			
Nelson Golan	04-06-24	Vaqueta							
Pablo Guatibonza	04-6-24	Vaqueta							
Diego Narvaez	4-6-24	Vaqueta							
Jose Marc Salcedo	6-6-24	Vaqueta							
Armando Cepeda	6.6.24	Nitrilo				Mascarilla negra			
Raul Roa	7-6-24	Vaqueta		P					
Armando Cepeda	7-6-24							Traje TYVEK	
Andres Millan	11-6-24	Vaqueta		P					
Alberto Escalante	11-6-24	Vaqueta				Mascarilla Negra		Traje TYVECK	
Jesus pirabam	11-6-24	Vaqueta							
Pablo Guatibonza	11-6-24	Vaqueta							
Adrian Solorzano	12-6-24	Vaqueta							
Andres Millan	12-6-24	Vaqueta				Mascarilla Negra			
Luis Rey Uhz	12-6-24	Vaqueta						Traje TYVICK	
Diego Narvaez	12-6-24	Vaqueta				Mascarilla Negra			
Jorge Nino	12-6-24	Vaqueta		P					

OBSERVACIONES:

Primo Vargas 1348669bo

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 01 REVISION: 10-03-22

PROYECTO: Tlalpican LUGAR: Campamento

FRENTE DE TRABAJO: 1-2-3-4 - Descarga - polvo MES: Junio

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Johan Gamez	13-6-24	Vaqueta				Mascarilla Negra			
Antonio Vargas	13-6-24	Vaqueta							Antonio
Cristian Cote	14-6-24	Vaqueta							
Elver Torache	14-6-24	vaqueta							Torache
Juan David Rincon	14-6-24	vaqueta							
Adrian Solorzano	14-6-24	nitrilo verde							Adrian
Deivid Guna	14-06-24		mona gafas				3m - medio Face- Filtros	Traje excl. Naranja	
Railson Galan	17-6-24	Vaqueta							Galan.
Adrian Solorzano	17-6-24	vaqueta							Adrian
Luis Fernando Guna	18-6-24	vaqueta				Mascarilla Negra			
Javier Aquino	19-6-24	vaqueta							
Cristian Cote	19-6-24	Vaqueta							
Deivid Guna	20-6-24	vaqueta							Deivid
Elver torache	20-6-24	Vaqueta				Mascarilla Negra			
Pablo Guatibonza	21-6-24	Vaqueta							
Cristian Cote	21-6-24	Vaqueta							
Freddy Cachay	24-6-24	Vaqueta							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-03-22

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Campamento

FRENTE DE TRABAJO: 1-2-3-4- pozos - Descarga MES: Junio

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Alberto Escalante	24-6-24	Vaquete							Alberto
Jorge Niño	24-6-24	Vaquete							
Mauricio Sanchez	25-6-24	Vaquete							
Luis Rey Ortiz	25-6-24	Vaquete							
Juan David Rincon	25-6-24	Vaquete							
Alejandro Duque	25-6-24	Vaquete				Mascarilla negra			
Adrian Solorzano	25-6-24	Vaquete							
Jose pacheco	25-6-24	Vaquete				Mascarilla negra			
Jesus piraban	25-6-24	Vaquete							
Nagoberto Arias	26-6-24	Vaquete							
Jose Maria Salcedo	26-6-24	Vaquete				Mascarilla negra		Peto Carnaza	
Roilson Solano	26-6-24	Vaquete							
Angelica Rodriguez	27-6-24	Prescon							
Wilson Padilla	27-6-24	Prescon							
Luis Lemus	27-6-24	Prescon							
Wilmer Vargas	27-6-24	Prescon							
Stiven Izquierdo	27-6-24	Prescon				Mascarilla Azul			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-03-22

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Campamento

FRENTE DE TRABAJO: 1-2-3-4 - Descargo - puros MES: Junio

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				Insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M / RESPIRADOR)		
Carlos Herera	27-6-24	prexcor							CARLOS H
Fauder Morales	27-6-24	Roquelle							
Cristian Cote	28-6-24	vaquete							
Deivid Guima	28-6-24		x						
Francisco Quintero	28-6-24	prexcor	x						
Omar villamizar	28-6-24	prexcor							
Camilo castro	28-6-24	prexcor							Camilo C
Alberto escalante	29-6-24	vaquete							Alberto
JEAN Pirabán	29-6-24	vaquete							
Andres Millan	29-6-24	vaquete							Andres M

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Frente #1

Actividad a Realizar:
Instalacion de tuberia plubial y Sanitaria

Responsable del Area de Trabajo: Armando Cepeda — Cargo: oficial

Marca Arnes: — Serie: 0114627045454

Marca Eslinga: — Serie: 53844138818

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO_____ Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 dígitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	25-6			26-6			27-6			28-6			29-6			02-7			03-7		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: Luis Rey Ortiz																						

NOTA: Evita que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: TILODIRAN — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: FRENTE 1

Actividad a Realizar: INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL Y SANITARIA

Responsable del Area de Trabajo: ARMANDO CEPEDA — Cargo: OFICIAL

Marca Arnes: 3M — Serie: 0114 6250454

Marca Eslinga: 3M — Serie: 538441300 18

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO 2024 Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A: NO APLICA

ITEM	ARNES	17-06			18-06			19-06			20-06			21-06			22-06			24-06		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: LUIS REY ORTIZ																						

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiron — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Frente #2

Actividad a Realizar: Instalacion de tuberia de agua residual de 10" y excavacion mecanica y manual

Responsable del Area de Trabajo: Alberto Escalante — Cargo: Oficial

Marca Arnes: First line (020) Serie: 1170239

Marca Eslinga: First line (020) Serie: 52034390052

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO_____Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	04-6			06-6			07-6			08-6			09-6			11-6			12-6		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: Diego Narvaez Yerki		Diego			Diego			Diego			Diego			Diego			Diego			Diego		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, sometertos al fuego. Yonkelix Contreras

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Frente #2

Actividad a Realizar: Instalacion de tubera de aqua residual

Responsable del Area de Trabajo: — Cargo:

Marca Arnes: First line 3M (021) Serie: 0279

Marca Eslinga: First line 3M (021) Serie: 385764410366

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

Año 2024 Nota: Diligencie el día y mes en número de 2 dígitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	21-6			22-6			24-6			25-6			26-6			27-6			28-6		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR:		ANDRES Millan																				

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Frente #2

Actividad a Realizar: Instalacion de tuberia de agua residual de 10" y excavacion mecanica y manual

Responsable del Area de Trabajo: Francisco Quintero — Cargo: A/A General

Marca Arnes: Link Tech (14) — Serie: 410122050003

Marca Eslinga: Link Tech (14) — Serie: 352422030130

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO 2023 Nota: Diligencie el día y mes en número de 2 dígitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	13-6			14-6			15.6			17-6			18-6			19-6			20-6		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: Alberto Escalante		Alberto			Alberto			Alberto			Alberto			Alberto			Alberto			Alberto		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego. MADELEINE RODRIGUEZ

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Fiente # 2

Actividad a Realizar: Instalacion de tubería agua residual de 10" y excavacion mecanica y manual

Responsable del Area de Trabajo: Alberto Escalante (Jorge Niño) — Cargo: Oficial

Marca Arnes: First line — Serie: 462197113

Marca Eslinga: First line — Serie: 298902700976

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO_____ Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Dias de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A NO APLICA

ITEM	ARNES	04-6			05-6			06-6			07-6			08-6			11-6			12-6		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Ramaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lengueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: x Jorge Niño		Jorge			Jorge			Jorge			Jorge			Jorge			Jorge			Jorge		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego. Nombre Responsable

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 08-01-2021

BOTIQUIN Nº 01 VEHICULO —/—/— FECHA Junio

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓			1 caja x 50 uni
ISODINE SOLUCION	1	✓			
SUERO FISIOLOGICO	1	✓			Julio 2029
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓			07-2027 - 0-1-2"
CURITAS UND	5	✓			10 uni
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		1 paq - 20 uni	20-04-2024
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		03-01-2027	
APOSITOS OCULARES	1	✓			
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓			Tijera de trauma
TIJERAS	1	✓			1 caja x 50 und
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓			
JABON BACTERICIDA	1	✓			8 und
GASAS	5	✓			
CINTA MICROPORE	1	✓			
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓			
LINTERNA	1	✓			

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: 1 venda de Algodon - 2 toallas higienicas + 1 jeringa lt + 1 venda triangular blanca de tela + 4 und sales hidratantes

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: [illegible]

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SS
	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-03-

MES DE INSPECCION: Junio LOCACION Tiladiran RESPONSABLE Madeleine Rodriguez

No	Ubicación	Clase	Capacidad	Presencia de oxido	Presencia de golpes	Cuenta con señalizacion	Recarga	Proxima recarga	Observaciones
# 1	Obra	Abc	2015	NO	NO	SI	11-2023	11-2024	
# 3	Movil	Abc	2015	NO	NO	SI	01-2024	01-2025	
# 2	Campamento	Abc	2015	NO	NO	SI	11-2024	11-2025	
# 4	Frente 4	Abc	2015	NO	NO	SI	10-2023	10-2024	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-034
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Javier Arguello — FRENTE DE TRABAJO: POZO
SEMANA Del (día): 17 al 23-06-2024 — PROYECTO: TIBURON

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacion														
Serrucho	estado general														
Pico con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general														
Macetas	mango, estado general														
Palmilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general 500L 1/4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Paletines	mango, estado general 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Cepillo de acero	mango, cobras														
Boquilleras	estado general 1,2mt 1mt.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Sombra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porrat	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Medio Cortes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-034
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Mauricio Sanchez
SEMANA Del (día): 24 al 30-06-24

FRENTE DE TRABAJO: PATIOS
PROYECTO: [illegible]

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, límite de elevación														
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Maestras	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paleta con lunda	mango, estado general														
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sopilla de acero	mango, cabras														
Boquilleras	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Serbra	estado general														
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, lopa de la cinta														
Marcos de seguetu	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de seguetu	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, lopa de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Tarros para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Media Careca	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Mauricio Sanchez													

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SST-AQ	CODIGO: SOB-SST-034
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Dagoberto Arroyo FRENTE DE TRABAJO: Pozos
SEMANA Del (día): 10 al 16-06-2021 PROYECTO:

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	Empalme de la cizalla, filo, brazo, tornillo, límite de elevación														
Serrucho	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general														
Picoretas	estado general														
Machetes	mango, estado general														
Paleta con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves	hoja rectangular de acero, mango			✓		✓		✓		✓		✓			
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon			✓		✓		✓		✓		✓			
Paletines	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Segillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Sierra	estado general														
Martillo	mango, estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Portas	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Terrazo para aguas	estado general														
Carretilla	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Regla cameca			✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Juan Angel Cardenas Ospina													
OBSERVACIONES:		Nota: Herramienta en buen estado													

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAO	CODIGO: SOG-SST-034
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Rentson Galon
SEMANA Del (día): 17 al 23-06-2024
FRENTE DE TRABAJO: POZO 36
PROYECTO: Ayacucho

HERRAMIENTA	REVISIÓN		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, anillos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, anillos															
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, lámina de elevación															
Barra	estado general															
Picas con cabo	mango estado general															
Picmadas	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Maseta	mango, estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paleta con funda	mango, estado general															
Tanques	estado general															
Baldes	estado general	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanes	hoja rectangular de acero, mango															
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon															
Palustres	mango, estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte															
Cepillo de acero	mango, cebras															
Boquilleras	estado general															
Decametro	estado general															
Escuadra	mango, estado general															
Espatula	mango, estado general															
Serbra	estado general															
Martillo	mango, estado general															
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta															
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja															
Hojas de segueta	estado general															
Chapulin	mango, estado general															
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta															
Decametro	estado general															
Linas	estado general															
Pala draga	mangos, cortes, ejes															
Porras	estado general															
Prensas	estado general															
Serruchos	mango, dientes, trabado															
Tarros para agua	estado general															
Carretilla	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general															
cintas	Metrica camera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Metrahumlar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	aminal para tapar pozo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SST-SAO	CODIGO: SOG-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Luis Fernando Goma — FRENTE DE TRABAJO: Frente 3
SEMANA Del (día): 3 al 9-06-2024 — PROYECTO: Hatillo

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacion														
Barra	estado general 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Plomadas	estado general														
Macetas	mango, estado general 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paleta con fuete	mango, estado general														
Tanques	estado general 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanes	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte (1000) 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cepillo de acero	mango, cabras														
Boquilleras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Sierra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Pizon metalico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motobomba 3" 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Generador Electrico 3 mts	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: SGI-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Adrian Soterano — SEMANA Del (día): 10 # 16-06-2024

FRENTE DE TRABAJO: Frente 3

PROYECTO: Tibaitata

HERRAMIENTA	REVISION	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUE. B	JUE. M	VIE. B	VIE. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, límite de elevación														
Barra	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Plomadas	estado general														
Maseras	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte (Topo)			✓		✓		✓		✓		✓			
Cepillo de acero	mango, cerdas														
Boquilleras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Sierra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Nivel metalico			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motobomba de 3"			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera Metalica 3mts			✓		✓		✓		✓		✓			

Vo.Bo. Quien Supervisa: Adrian Daniel Soterano

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-324
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Aldair Ortiz
SEMANA DEL (día): 17 a 06-23-2024
FRENTE DE TRABAJO: Frente #3
PROYECTO: Ilaoterm

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevación														
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Plomadas	estado general														
Maceta	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segilo de acero	mango, cebras														
Boguilleras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Serrucho	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Pisón Metalico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Martillomboca 3"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera Metalica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Miguel Alber		Alb.		Mal Alb.		Alb.		Mal					

OBSERVACIONES: Pedro Hernandez Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: David Sana
SEMANA Del (día): 24 al 30-06-2024
FRENTE DE TRABAJO: Frente # 3
PROYECTO: Alpujarra

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, límite de elevación														
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maseta	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Balde	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustre	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Cepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Sierbra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Azon metalico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motobomba 3H	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quién Supervisa:		Dav		Dav		Dav		Dav		Dav		Dav			

OBSERVACIONES: Ninguna

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-324
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Juan David Rincon — FRENTE DE TRABAJO: Frente 2
SEMANA DEL (DIA): 10 # 10-06-2024 — PROYECTO: Aeropuerto

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacio														
Barreta	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Planadas	estado general														
Maseta	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Cepillo de acero	mango, cebras														
Boguilleras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Sombra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Tensos para agua	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Pisón metalico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bimaca	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cortadora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-J24
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Antonio Borges
SEMANA Del (dia): 03 al 06-09-6-24
FRENTE DE TRABAJO: Frente 1
PROYECTO: Montería

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevación			✓		✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Plomadas	estado general														
Macetas	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Paustras	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Cepillo de acero	mango, cebras														
Aloquileras	estado general														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Bimbra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretilla	estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general Para cinta bandi					✓		✓		✓		✓			
otros	Pizon metalico			✓		✓		✓							
	Slingas			✓		✓		✓		✓		✓			
Va.Bo. Quien Supervisa:				Antonio Antonio Antonio Antonio Antonio											

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.13.
ENTREGA DE DOTACIÓN

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Jose del Carmen Doson CARGO: Bodeguero

CEDULA: FECHA: PROYECTO: Tilo

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	XL	
2	PANTALÓN	1	32	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	X	41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 9653346
CARGO Vigilante

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 47436657
CARGO Bodeguero HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Adrian David Solorzano Arboleda CARGO: Auxiliar.

CEDULA: FECHA: PROYECTO: Tilo.

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	32.	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	X	40.	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Adrian David Solorzano

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 1118530260
CARGO Auxiliar

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 42 436 635
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Luis Fernando Guiza Maldonado CARGO:

CEDULA: FECHA: PROYECTO: TILO

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	L	
2	PANTALÓN	1	34	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	X	41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Luis Fernando Guiza

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 74862.019
CARGO AUXILIAR

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 27436658
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA		VERSION:	3
		REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Luis Fernando Ferrús CARGO:

CEDULA: FECHA: PROYECTO: T, LO.

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	L	
2	PANTALÓN	1	34	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD			
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 1057602737
CARGO Cabrero 1

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 47436658
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Wilson Padilla CARGO:

CEDULA: FECHA: PROYECTO: TILO.

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	32	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	X	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Wilson Padilla.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 74860237
CARGO Cadenero

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 47436 638
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA		VERSION:	3
		REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Aldair Ortiz Tobaco. CARGO: Auxiliar

CEDULA: FECHA: PROYECTO:

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	L	
2	PANTALÓN	1	34	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO	X		
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	X		
10	IMPERMEABLE (CAPA)	X		
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 1006557607
CARGO auxiliar.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 47436638
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: POR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Hidroan LUGAR: Frente 1

OPERADOR: Wilmer Reen

SERIE: 209 MODELO _____ MARCA Komatsu

SEMANA DEL 10 DE junio AL 16 DE junio DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	2				✓		✓			✓		✓			
	De trabajo traseras	2				✓		✓			✓		✓			
CABINA	Espejos					✓		✓			✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1				✓		✓			✓		✓			
	Extintor de incendio	1				✓		✓			✓		✓			
	Asiento en buen estado	1				✓		✓			✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1				✓		✓			✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos				✓		✓			✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1				✓		✓			✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1				✓		✓			✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos				✓		✓			✓		✓			
	Baterias y cables	Completos				✓		✓			✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos				✓		✓			✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos				✓		✓			✓		✓			
	Orugas tensionadas	2				✓		✓			✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1				✓		✓			✓		✓			
	estado	1				✓		✓			✓		✓			
	Mandos de avance	Completos				✓		✓			✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1				✓		✓			✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1				✓		✓			✓		✓			
	Mandos de levante del brazo					✓		✓			✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos				✓		✓			✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1				✓		✓			✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1				✓		✓			✓		✓			
	Zapatas	Completas				✓		✓			✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos				✓		✓			✓		✓			
	Estado general rallones, golpes					✓		✓			✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN				Wilmer Reen		Wilmer Reen		Wilmer Reen		Wilmer Reen		Wilmer Reen			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Hidrurán LUGAR: Frente 1

OPERADOR: Wilmer Roa

SERIE: 210 MODELO _____ MARCA COMATSU.

SEMANA DEL 03 DE Junio AL 09 DE Junio DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes				✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-03-2022

PROYECTO: Fitodivan LUGAR: Frente 1

OPERADOR: Wilmer Pava

SERIE: 200 MODELO _____ MARCA COMATSU

SEMANA DEL 17 DE junio AL 23 DE junio DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/baldé)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		Wilmer Pava		Wilmer Pava		Wilmer Pava		Wilmer Pava		Wilmer Pava		Wilmer Pava			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Nelson Alejandro Duque Acevedo CARGO:

CEDULA: FECHA: PROYECTO: T1 LO.

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	Alejandro Duque
2	PANTALÓN	1	30	Alejandro Duque
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			Alejandro Duque
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	P		Alejandro Duque
10	IMPERMEABLE (CAPA)	P		Alejandro Duque
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Alejandro Duque

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 1118531038
CARGO Auxiliar de obra

Yorslave Romero

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 42436638
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Elver Andres Tarache CARGO:

CEDULA: FECHA: PROYECTO: TILO

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	X	M	
2	PANTALÓN	X	30	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	X	41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Elver Andres Tarache

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 1118569918
CARGO Auxiliar de obra

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 47436638
CARGO Jefe

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Diego Andres Monroy Ventel CARGO:

CEDULA: FECHA: PROYECTO: TILO

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	S	
2	PANTALÓN	1	30	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	X	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 1066729732
CARGO Auxiliar

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 24366311
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Jhojan David Gomez C. CARGO:

CEDULA: FECHA: PROYECTO: Tilo.

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	S	
2	PANTALÓN	1	30	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	X	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA
CARGO

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 47 436 658
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Dagoberto Arias Marcia CARGO:

CEDULA: FECHA: PROYECTO: TLO

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	S	
2	PANTALÓN	1	32	
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	X	41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 71202787
CARGO AUX

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 42436638
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

	**SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA** **ENTREGA DE DOTACION** **DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO**	**CODIGO:**	**FOR-RH-008**
		VERSION:	**2**
		REVISION:	**4/01/2023**

NOMBRE: Jose Merchan **CARGO:** operador

CEDULA: **FECHA:** **PROYECTO:** Tlodiom

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA			
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD			
10	CAPA IMPERMEABLE/ 2 PIESAS	1	Capa	
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Jose Merchan

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA
CARGO OP.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 47.136.638
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO:	FOR-RH-008
		VERSION:	2
		REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Didimo vargas CARGO: operador

CEDULA: FECHA: PROYECTO: Tlodiran

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA			
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO			
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD			
10	CAPA IMPERMEABLE/ 2 PIESAS	1	capa	
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA
CARGO op

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 97436038
CARGO HSEQ

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.14.
SOPORTE DE RESIDUOS LÍQUIDOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SIMA INGENIEROS S.A.S.

"Generamos huella verde"

ACTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
No. 345-2024

La empresa **SIMA INGENIEROS S.A.S.** identificada con NIT 844.000.147-6 sociedad legalmente constituida en Colombia, titular de la Licencia Ambiental No. 200.41-11 -1523 de septiembre del 2011 expedida por CORPORINOQUIA para el desarrollo de sus actividades, se permite certificar que, durante el mes de abril de 2024, se realizó la recepción de los residuos relacionados en el cuadro.

Los residuos fueron entregados por la empresa **J&M INGENIERÍA S.A.S** identificada con el número de **Nit. 900.103.645-8.**

A continuación, se hace referencia al tipo y peso a cada uno de los residuos:

Mes / generación	Empresa	Nit	Tipo de Residuo	Origen	Gestor Final	Aprovechamiento / Comercialización / Disposición final	Cantidad	Unidad
ABRIL	SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	844.004.840-0	AltoD (Aguas residuales no domesticas provenientes de baños portatiles)	TEODORO	Sima Ingenieros S.A.S	Lechos Filtrantes	17,75	Galones

En constancia se firma en Yopal a los 25 días de junio del 2024.

Atentamente,

SEBASTIAN HOLGUIN CONTRERAS
Gestor Operativo y de Proyectos

SIMA INGENIEROS S.A.S.
NIT. 844.000.147-6

"Generamos huella verde"

ACTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
No. 428-2024

La empresa **SIMA INGENIEROS S.A.S.** identificada con NIT 844.000.147-6 sociedad legalmente constituida en Colombia, titular de la Licencia Ambiental No. 200.41-11 -1523 de septiembre del 2011 expedida por CORPORINOQUIA para el desarrollo de sus actividades, se permite certificar que, durante el mes de mayo de 2024, se realizó la recepción de los residuos relacionados en el cuadro.

Los residuos fueron entregados por la empresa **J&M INGENIERÍA S.A.S** identificada con el número de **Nit. 900.103.645-8.**

A continuación, se hace referencia al tipo y peso a cada uno de los residuos:

Mes/ generación	Empresa	Nit	Tipo de Residuo	Origen	Gestor Final	Aprovechamiento / Comercializador/ Disposición final	Cant	Und
MAYO	SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	901184800	A026 Aguas residuales no domésticas provenientes de baños portatiles	TILODIRAN	Sima Ingenieros SAS	Disposición final	12,42	Gal

En constancia se firma en Yopal a los 12 días de julio del 2024.

Atentamente,

MAURICIO HOLGUIN
Líder Comercial

JUAN FERNANDO VEGA
Líder Administrativo y Financiero

Oficina: Calle 38 No. 19 – 68,
Barrio Aerocivil - Yopal, Casanare
contacto@simaingenieros.com.co
313 262 2971
(57+608) 635 3697 / 635 7694

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC Registro Unificado para Contratistas



J&M INGENIERIA S.A.S

3581

SERVICIO

CANTIDAD

CARACTERISTICAS

SE ENTREGA (O APLICA)

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

ANEXO 6.6.15.
FICHAS DE MANTENIMIENTO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 7 PC - 210

FECHA: 07-Jun-24 PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO ACTUAL: 5441

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 5691

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	2#5-979-1551	250	OK
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	OK
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-5100	250	OK
4	F- ACEITE MOTOR	6742-01-4540	250	OK
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-3610-60C3113620	250	OK
6	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3750	250	OK
7	FILTRO REFRIGERANTE	600-411-5110	4000	/
8	ACEITE DE MOTOR 6 GALONES	SYZZ-15 W 40 MN	250	6 gal
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	OK
2	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	OK
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-ACEITE HIDRAULICOS	20Y-60-56280	2500	/
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS 36 GALONES	HO46-HM ISO VG46	5000	/
3	REFRIGERANTE 6 GALONES	SYZZ-AFNACMN50	5000	/
4	ACEITE DEL DAMPER, MOTOR DEGIRO, Y MANDOS FINALES (5 Galones)	TO30		/
5	DIENTES 5 UNIDADES	K20RC		/
6	PINES 5 UNIDADES	KP20C		
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Wilber Roa. — **NOMBRES**

Operador — **CARGO**

FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE NEOMATICOS	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO - PAJARITA N 1

FECHA: 14-junio-24 PROYECTO Tilodirán LUGAR: Campamento

HOROMETRO ACTUAL: 132278 HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 250

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	2112660	250	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	2112661	250	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	7W2326	250	/
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	2277449	250	/
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2934053	250	/
6	F- COMBUSTIBLE	1561200	250	/
7	F- COMBUSTIBLE -TRAMPA	2289130	250	/
8	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x galon	CAT-SAE 15 W 40	250	/
	CAMBIO HIDRAULICO			
1	F- HIDRAULICO	4656505	1000	
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	AD 10 / ADVANCE 10	3000	/
	TRANSMISION			
1	F- TRANSMISION	4717003	1000	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

D/M Alternador Para Cambio por corto elec-trico

Arreglo aines hora que va para el alternador

ELABORO EL MANTENIMIENTO

James A. — NOMBRES

Técnico — CARGO

FIRMA

238



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión: 14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 7 PC - 210

FECHA: 19 Junio-24 PROYECTO Tilodirán LUGAR: frente obra.

HOROMETRO ACTUAL: 5481

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	2#5-979-1551	250	/
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-5100	250	
4	F- ACEITE MOTOR	6742-01-4540	250	
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-3610-6003113620	250	
6	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3750	250	/
7	FILTRO REFRIGERANTE	600-411-5110	4000	
8	ACEITE DE MOTOR 6 GALONES	SYZZ-15 W 40 MN	250	/
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	
2	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-ACEITE HIDRAULICOS	20Y-60-56280	2500	/
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS 35 GALONES	HD46-HM ISO VG46	5000	/
3	REFRIGERANTE 6 GALONES	SYZZ-AFNACMN50	5000	/
4	ACEITE DEL DAMPER, MOTOR DEGIRO, Y MANDOS FINALES (5 Galones)	TO30		/
5	DIENTES 5 UNIDADES	K20RC		
6	PINES 5 UNIDADES	KP20C		
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio correas del motor

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Wilmer Roa.	operador.	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 6 PC - 210

FECHA: 15-06-24 PROYECTO Tiladiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO ACTUAL: 1149

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	2#5-979-1551	250	
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-5100	250	
4	F- ACEITE MOTOR	6742-01-4540	250	
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-3610-6003113620	250	
6	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3750	250	
7	FILTRO REFRIGERANTE	600-411-5110	4000	
8	ACEITE DE MOTOR 6 GALONES	SYZZ-15 W 40 MN	250	
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	
2	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-ACEITE HIDRAULICOS	20Y-60-56280	2500	
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS 36 GALONES	HO46-HM ISO VG46	5000	
3	REFRIGERANTE 6 GALONES	SYZZ-AFNACMN50	5000	
4	ACEITE DEL DAMPER, MOTOR DEGIRO, Y MANDOS FINALES (5 Galones)	TO30		
5	DIENTES 5 UNIDADES	K20RC		OK
6	PINES 5 UNIDADES	KP20C		OK
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Dientes 5 und.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Didimo	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE NEOMATICOS	Versión: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO - PAJARITA N 1

FECHA: 19-Junio-24 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO ACTUAL: 13285.6 HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: —o—

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	2112660	250	
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	2112661	250	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	7W2326	250	/
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	2277449	250	/
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2934053	250	/
6	F- COMBUSTIBLE	1561200	250	/
7	F- COMBUSTIBLE -TRAMPA	2289130	250	/
8	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x galon	CAT-SAE 15 W 40	250	/
	CAMBIO HIDRAULICO			
1	F- HIDRAULICO	4656505	1000	—
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	AD 10 / ADVANCE 10	3000	3gal
	TRANSMISION			
1	F- TRANSMISION	4717003	1000	—o—

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio manguera delantera lado izq del equipo delantera completa nivel hidraulico.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Nestor.	operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 5

FECHA: 28-Jan-24 PROYECTO Tilodiran LUGAR: frente obra

HOROMETRO ACTUAL: 3713

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 3963

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	OK
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	OK
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	OK
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	OK
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	OK
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	OK
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	3601
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	OK
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	OK
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	1
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	1
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	1

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Jaime Lopez — NOMBRES

Operador — CARGO

FIRMA

ANEXO 6.6.16.
PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

OYECTO: Tilodiran LUGAR: Tilodiran

ERADOR: Tom Tapia

RIE: 130 MODELO PC 130 MARCA Komatsu

MANA DEL 24 DE junio AL 30 DE junio DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LLANTAS	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓	X		X	✓	X		X		X		✓		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general ralliones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Hidurán LUGAR: Frente 1

OPERADOR: Wilmer Roa

SERIE: 210. MODELO _____ MARCA COMATSU.

SEMANA DEL 03 DE junio AL 09 DE junio DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes				✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Filipichan LUGAR: frente #3

OPERADOR: Didimo Vargas

SERIE: _____ MODELO _____ MARCA Komatsu

SEMANA DEL 03 DE 06 AL 09 DE 06 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor asado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		JDD													

Mantenimiento Rodillos Guzmán

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SS VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: frente-43

OPERADOR: Didimo Vargas

SERIE: _____ MODELO _____ MARCA Komatzu

SEMANA DEL 10 DE 06 AL 16 DE 06 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes				✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-03-2022

PROYECTO: Modiram LUGAR: Frente 3

OPERADOR: Didimo vargas

SERIE: _____ MODELO _____ MARCA Komatsu

SEMANA DEL 17 DE 06 AL 23 DE 06 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	S	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Frente #3

OPERADOR: Didimo Vargas

MARCA: _____ MODELO: _____ SERIE: _____

SEMANA DEL 24 DE 06 AL 30 DE 06 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Hidrican LUGAR: Frente #2

OPERADOR: Jaime Lopez Oyola

SERIE: BB410 MODELO PC130-8 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 03 DE Junio AL 09 DE Junio DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras N/A	2														
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes				✓		✓		✓		✓					
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN				Jaime L.		Jaime L.		Jaime L.		Jaime L.		Jaime L.			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-GST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-03-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Frente # 2

OPERADOR: Jaime Lopez Ovalle

SERIE: 68410 MODELO PC120-8 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 10 DE junio AL 16 DE junio DEL 2023

	ITEM	CANT	LUNES D	LUNES M	MARTES D	MARTES M	MIERCOLES D	MIERCOLES M	JUEVES D	JUEVES M	VIERNES D	VIERNES M	SABADO D	SABADO M	DOMINGO D	DOMINGO M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras N/A	2														
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes												✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN				Jaime L. O.		Jaime L. O.		Jaime L. O.		Jaime L. O.		Jaime L. O.			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: _____ LUGAR: Frente # 2

OPERADOR: Jaime Lopez Ayala

SERIE: 88410 MODELO PC130-8 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 17 DE junio AL 23 DE junio DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras N/A	2														
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		Jaime Lopez		Jaime Lopez		Jaime Lopez		Jaime Lopez		Jaime Lopez		Jaime Lopez			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: filodiran LUGAR: Puente # 2

OPERADOR: Jaime lopez Oyola

UNIDAD: 88410 MODELO PC130-8 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
CABINA	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras N/A	2														
	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráuticos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: Alvarado LUGAR: Alvarado SERIE

OPERADOR: Nestor Ortiz SEMANA DEL 09 DE junio AL 09 DE junio DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (Hidraulico-Refrigerante-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	1		X		X		✓		✓		X		X		
	Palancas de mando en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio en buen estado	4 Ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del brazo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTA	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	huella en buen estado- labrado	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	OTROS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Proceso de desinfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR		✓		✓		✓		✓				✓			
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-1
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 02-03-2022

PROYECTO: TIBASOSA LUGAR: _____ SERIE _____

OPERADOR: NOLBERTO ORTIZ SEMANA DEL 10 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturon de Seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	X	X	X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidraulico-Refrigerante-Horametro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	1		X		X		X		X		X		X		
	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando en buen estado	3	X		X		X		X		X		X			
	Pedales en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (Bastidor, Deganrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Freno de sevicio en buen estado	4 Ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mando de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	X		X		X		X		X		X			
	huella en buen estado- labrado	4	X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	X		X		X		X		X		X			
	OTROS		X		X		X		X		X		X			
	Proceso de desinfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 02-02-2023

PROYECTO: Maderas LUGAR: _____ SERIE _____

OPERADOR: Nestor Ortiz SEMANA DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturon de Seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidraulico-Refrigerante-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	4		X		X		X		X		X		X		
	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio en buen estado	4 Ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mando de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	X		X		X		X		X		X			
	huella en buen estado- labrado	4	X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	X		X		X		X		X		X			
	OTROS		X		X		X		X		X		X			
	Proceso de desinfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Mantenimiento.

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 03-01-2023

PROYECTO: _____ LUGAR: _____ SERIE _____

OPERADOR: _____ SEMANA DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturon de Seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidraulico-Refrigerante-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2		X		X		X	1	X		X		X		
	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio en buen estado	4 Ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mando de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	X		X		X		X		X		X			
	huella en buen estado- labrado	4	X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	X		X		X		X		X		X			
	OTROS		X		X		X		X		X		X			
	Proceso de desonfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.17.
ACTAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	ACTA DE COMITÉ SOCIO AMBIENTAL	
		FECHA: 29 DE JUNIO DE 2024	No: 09
CONTRATO No.:	032 DE 2023	VALOR:	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO	10 MESES
INTERVENTOR:	**CONSITER DEL ORIENTE E.U.**		
ASUNTO:	IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA Y PGS		

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	Firma
1	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	REPRESENTANTE LEGAL DE SYNERGIA	
2	DIEGO ONLEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA	
3	EDICT JASMIN PACHECO REINA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
4	MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	RESIDENTE SOCIAL	

DESARROLLO

Hoy 29 de junio del 2024, siendo las 8:30 a.m., se reunió el Grupo de Gestión Socio Ambiental en las instalaciones del campamento, con el objeto de tratar el tema relacionado con los avances y requerimientos que tiene el proyecto en relación con la implementación del PAGA y el PSG, para lo cual el ing. Diego Pérez como es costrumbre, da lectura al acta anterior, como también a la copia del acta del comité que se sostuvo en el día anterior con la Interventoría para analizar los temas tratados y compromisos adquiridos. Acto seguido le otorga la palabra a la ing. Edict para que manifieste tanto las actividades ejecutadas, como inconvenientes si se han presentado, al igual que la proyecciones para el próximo mes.

La ing. Edict manifiesta que para el punto ecológico de la entrada se realizó un piso con gravilla, quedando en condiciones aceptables, también señala que se adquirió un punto ecológico con cuatro (4) canecas plásticas y tapas, soportado en estructura metálica, cada caneca corresponde a los colores prestablecidos en la normatividad colombiana. También se ha venido colocando bolsas de basuras con los códigos de colores en todos los frentes de obras. Se ha venido promulgando con los trabajadores el orden y el aseo en los puestos de trabajo.

La ing. Edict informa que la empresa prestadora del servicio de la limpieza de los baños ya entregó las certificaciones de los meses de abril y mayo que estaban pendientes.

La ing. Edict manifiesta que el informe de los RCD para radicar en CORPORINOQUIA se encuentra listo para entregar a la Corporación, aunque señala que de acuerdo con lo indicado por la interventoría ya no es necesario hacer entrega de ese informe.

Atendiendo lo dispuesto por la interventoría se realizará un formato de acta para la entrega de RCD, para lo cual se incluirán los aspectos ambientales a tener presente. El área social será la encargada de definir la entrega de RCD que sean solicitados por la comunidad y llevar el respectivo control.

Luego continua la reunión con la intervención de la social del proyecto, quien manifiesta lo siguiente, tal como lo manifesté en el día de ayer en la reunión que se sostuvo con la interventoría, durante el mes de junio en el tema social se han adelantado las siguientes acciones:

1.Se realizan todos los sábados mantenimiento a las vías en operación del proyecto, como es la vía altera, terraplén y lote del señor Carlos Rodriguez.

2.Se realiza acompañamiento al ingeniero auxiliar encargado de realizar actas de vecindad en el Centro Poblado de Tilodiran.

3.Se coordinó con el comandante de la Estación de Policía de Tilodiran la realización de charlas con los líderes de procesos, para que conozcan que deben hacer en el caso que se presente una emergencia, accidente o problemática social, indicando además cuáles son los números telefónicos a los cuales pueden llamar y hasta donde es el alcance de la policía.

4.Se realizó reunión con la interventoría, supervisión de ACUATODOS, ingenieros residentes y profesional social y con el señor Benjamin Rodriguez, quien es propietario de un lote cerca de la PTAR, quien refiere que sus predios se están inundando, ya que la aguas se están reposando generando daños.

La Dra. Maria Diomy manifiesta que por parte de la gerencia, como siempre pueden contar con el apoyo para que se implemente el PAGA y el PSG de acuerdo con los requerimientos que cada uno de los profesionales ha manifestado, de manera tal que se de cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales que la empresa ha adquirido en el marco del Contrato de Obra Pública 032 de 2023.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Continuar con la implementación del PAGA	Ing. Edict Pachecho
Continuar con la implementación del PGS	Dra. María Angélica Trujillo

ANEXO 6.6.18.
PLANILLAS DE CHARLAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RSI-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIONES
	SYMBIOSIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 08-03-2022

Charla diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Lunes 12 de 2024 | LUGAR: (illegible)

TEMA: Los riesgos - Cuidando el Agua

PROYECTO: Alcantarillado pluvial y pavimentación vía Medias

INSTRUCTOR: Reniz Reyes | Duración: (Min) 20 minutos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Adrian David Sierrano	1118570260	Auxiliar	
2	DENIS GIRINA	74770819	OFICIAL	
3	LUIS REY ORTIZ	74185711	OFICIAL	
4	Erika Andrea Tarache	1118569118	AUXILIAR	
5	Edwin Alberto Vargas R.	1116545786	Auxiliar	
6	Alvaro Ortiz Tobaco	1118655601	Auxiliar	
7	Ismael Vasquez Tabuco	1118577088	Auxiliar	
8	Jorge NIÑO	9'657.771	Oficio	
9	Raúl Roa	4158771	oficial	
10	Freddy Cachay	1118531825	Oficial	
11	Armando Cepeda	9432512	oficial	
12	Boilso Galan	9'659.199	AUXIL.	
13	Jaime Yepez Ovalle	10177525	Operador	
14	Jose Ruiz	74858152	OPR.	
15	Jose Bonilla	1118893 21	OFICIAL	
16	Francisco Quintero	4245556	Obrero	
17	Wilson Andres Millan G	1118574643	Auxiliar	
18	Wilson Pedro	74460237	Cabrero	
19	Florencio Sanchez	1117533957	AUXILIAR	
20	Luis Fernando Lemos	1057602737	Cad. I	
21	Johann David Gomez	1029609724		
22	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	Cadenero	
23	Elkin Alonso	4744074 6	A+P2	
24	Ma. Angelica Trujillo D	23914.357	Social	
25	CARLOS HERRERA	1118538782	MAQUINAS	
26	Jaime Marino	94.18C 976	Conductor	
27	HARLEM ROMERO	42476638	H&H	
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable: Reniz Reyes

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
SINERGIA	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	Jueves 12 de 2024	LUGAR	Campamento
TEMA(S):	Los Riesgos - Consecuencias del agua		
PROYECTO:	Alcantarillado Sanit y Pavimento de Vías - Filadelfia		
INSTRUCTOR:	Ronny Cruz	Duracion: (Min)	20 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Alberto Escalante	1082 851 529	OFICIAL	
2	Luis Fernando Ortiz	74 807 014	AUXILIAR	
3	Yenny Carolina Mojano	1196492926	CONTADORA	
4	Kevin Mateo Echeverri C	1-1183892734	AUXILIAR	
5	Diego Andres Nuñez	1066377772	AUXILIAR	
6	Jaime Antonio Ayala Diaz	74859282	AUXILIAR	
7	Omar Villamil	13.475.370	RES. OBRA	
8	Nando Perez Carreño	33480635	Fontanero Vial	
9	Pablo Castellanos	1002640574	AUXILIAR	
10	Didier Vargas	1348[illegible]62	OP	
11	Nestor Ortiz	1116774786	OP.	
12	Junior Montes	1006944750	Auxiliar	
13	Rafael Deluz	91398191	Almac	
14	Wilson Ruiz	9430674	Operador	
15	Estiven Izquierdo	1007747536	Cadenero	
16	Cristian Ortiz	1007540088	Auxiliar	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Ronny Cruz

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RSI-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2023

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	enero 25 de 2024	LUGAR:	Cartagena
TEMA:	Carta al 2070 - Un llamado para cuidar el planeta		
PROYECTO:	Alcantarillado pluvial y pavimentación de U.S. - Tiestos		
INSTRUCTOR:	Yenis Ruiz	Duracion: (Min)	20 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Alvaro David Solorzano	1118530260	Ayudante	
2	ANDRES TORRES	1118854174	conductor	
3	MARCO BERMUDEZ	1082 961 824	OFICIAL	
4	JOSE NIÑO	9'657.771	OFICIAL	
5	Ismael VARGAS TAPIA	1118577095	AYUDANTE	
6	Nilson Andres Millan Guevara	1118524645	Ayudante	
7	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
8	Eduardo Baez	7020660266	conductor	
9	Jose Gabriel Monterrosa	1007426727	Conductor	
10	Arnaldo Rodriguez	1065915028	TOPOGRAFO	
11	Sonia Mendoza S	1074012418	AYUDANTE	
12	Dahiana Vargas	1118698861	CD	
13	Yenis [illegible]	1116492926	Ingeniera	
14	Mario Ortiz	1118774748	Ingeniero	
15	Diego Andres Narvaez V.	1066927272	Auxiliar	
16	Francisco Quintero	92.555	Hijo	
17	Luis Fernando Gulva	74967.919	AUXILIAR	
18	Luis Fernando Lemus	1057602737	Cad. I	
19	Estibiven Laguna Monroy	1007747532	Cadenero	
20	Ruben Dario Echeverri C	1.118.554.074	electricista	
21	Wilmer Mora	9430674	Operador	
22	DAIRO LUIS CUBIDES	9.527.517	INGENIERO	
23	Hancuk Londoño	47436638	HSEQ	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable
Yenis Ruiz

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-004-001
SINERGIA	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Junio 25 de 2024 LUGAR: Cajamarca

TEMA(S): Carta 31 2370: un llamado para cuidar el planeta

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial y Pavimentación de vías - Tibdian

INSTRUCTOR: Kenia Daza Duración: (Min) 20 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALFONSO Cayetano	9520574	Conductor	
2	Jose Gustavo Chupano	1007296973	Conductor	
3	Wilmer Eduardo Vargas	1116562072	cadenero	
4	Pablo Antonio [illegible]	1002649537	Aux	
5	Elsy M Alcocer	1124402706	Aux	
6	Elvis Andres Tenches	1118569918	AUXILIAR	
7	Rogelberto AVILA	1.118.810.787	AUX	
8	Raul Roa	11507771	oficial	
9	Kevin Guiza	1077079	OFICIAL	
10	Carlos Galan	9'659199	AUX	
11	Wilson Portilla	74760737	Cadenero	
12	Jose Jesus Pinzon	1006406094	oficial	
13	Jose Pacheco	1116608321	OFICIAL	
14	Armando Conde	9437517	oficial	
15	Maikol Perez Cuervo	3348053	AUX	
16	Adan Orlando Tobalo	1006557607	Auxiliar	
17	OMAR VILLAMIZAR	13.875.370	ING. CIVIL	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable
Kenia Daza

Powered by CamScanner

7.8 ANEXOS

7.8.1 REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Marfrean
QUIEN ENTREGA: Marcela Ospina
CONDUCTOR: Jhe Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 04 - Enero 2024
LUGAR: Cali
VEHICULO PLACA: HXW-302
LUGAR: Campamento - Marfrean

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Rollo de cinta PVC V-15 x 30mts	1	✓			35	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROY. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 04 - JUNIO - 2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO PLACA: MXW-82
LUGAR: Cumplimiento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Metros de cable 3x6+6 aluminio	30	✓			Impreso	entregado ✓
2	Tubos PVC conduit de 1"	5	✓			Impreso	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tibaitirán
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: José Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lamus

FECHA: 05 junio 2024
LUGAR: Bodega
VEHICULO PLACA: TYK-653
LUGAR Campamento-Tibaitirán

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Camisa para Cabayo descompresión	6	✓				
2	Navaja lisa 5/8 x 40cm	8	✓			impev.	Prestador de Almacenamiento
3						impev.	Tibaitirán
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Medirán
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Rafael Lemus
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 06 Junio 2024
LUGAR: Cajal
VEHICULO PLACA:
LUGAR Campamento - Medirán

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Hebra fibra polietileno 63mm	2	✓			23	
2	Uniones Rapidas polietileno 63mm	7	✓			23	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Madrian
QUIEN ENTREGA: Marcela Espino
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 13 Junio 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO PLACA:
LUGAR Campamento Madrian

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN Nº	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Conos o cortadores blancos	5.000	✓			33	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Daniel Ayala
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 14 Junio 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO PLACA:
LUGAR Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Curvas conduit 1"	10	✓			33	
2	Tubos conduit 1"	10	✓			33	
3	Tubos conduit 3/4"	10	✓			33	
4	Conectores de retencion para	6	✓			33	cable flamado
5	Conectores de expansion	7	✓			33	
6	Hilos de cable flamado trifasico	250	✓			33	3x2 + 1/0
7	Antiduer trifasico	1			✓	33	
8	Uniones de 3/4 EMT	4	✓			33	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tiadiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espinio
CONDUCTOR: Diego Perez
QUIEN RECIBE: Rafael Lamus

FECHA: 15 Mayo 2024
LUGAR: Cupa
VEHICULO/PLACA: fuw 074
LUGAR Campamento-Tiadiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Metros manguera tipo bombero 4"	50	✓				Con acople ✓
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lamus

FECHA: 17 Junio 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO PLACA: TYX653
LUGAR Campamento Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Conectores doble perno aluminio	4	✓			33	
2	Tubos de 3/4 EMT	2	✓			33	
3	Tubos de 1" EMT	2	✓			33	
4	Uniones de 1" EMT	4	✓			33	
5	Tejas de zinc x 3mts	36	✓			33	
6	Unidad PVC 1" agua potable	20	✓			33	
7	Tapones PVC 1" agua potable	20	✓			33	
8	Tubos PVC 1" agua potable	10	✓			33	
9	Tanque 500 L75 cebracabildo	2			✓	33	
10	Tarot de madera 4x4x15cm	100	✓			33	
11	Tapas tipo eventa 4x4 completas	2			✓	33	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROY. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tiladiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 17 Junio 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO PLACA: JYX-653
LUGAR Campamento - Tiladiran

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Tabla de madera 4x4x15cm	100	✓			34	
2	Caja: Pitilla alcoholimetria	1	✓			34	
3	Radios	4			✓	34	
4	Quintales alcatraz de pvc	2	✓			34	
5	Postes de concreto 2mts	30				34	Para cerca
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tiadiran

QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia

CONDUCTOR: Gerardo Quevedo

QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 19 junio 2024

LUGAR: Capital

VEHICULO PLACA: WFE-973

LUGAR Campamento Tiadiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Botellas plasticas pequeñas	2	✓			34	✓
2	Botellas plasticas medianas	3	✓			34	✓
3	Bomba para fumigar 2Lts	1	✓			34	✓
4	Pistola industrial para silicona	2	✓			34	✓
5	Empaques en caucho 2" para acople	10	✓			34	✓
6	Empaques en caucho 3" para acople	10	✓			34	✓
7	Empaques en caucho 4" para acople	10	✓			34	✓
8	Empaques en caucho 6" para acople	5	✓			34	✓
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROC. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Modiran

QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia

CONDUCTOR: Gerardo Quevedo

QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 19 Junio 2024

LUGAR: Yopal

VEHICULO PLACA: WF6-973

LUGAR Campamento Modiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Estuche pequeño reparable	1	✓			33	✓
2	Cact galvanizados 3"	4	✓			33	✓
3	Niples galvanizados 10cm x 3"	4	✓			33	✓
4	Abrazaderas T-526	2	✓			33	✓
5	Abrazaderas presión 5/16"	10	✓			33	✓
6	Carteras de topografia	3	✓			33	✓
7	Carteras de nivel	3	✓			33	✓
8	Llave expansiva dielectrica 6"	1			✓	33	✓
9	Arrames para teja de 20cm	100	✓			33	✓
10	Impermeables conjunto	7	✓			33	XL-L-XXL-S-L-M-L
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Gerardo Quevedo
QUIEN RECIBE: Rafael Lamz

FECHA: 19 JUNIO 2024
LUGAR: Cira
VEHICULO/PLACA: WFC-973
LUGAR: Campamento - Tilodiran

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Bultos de cemento	400	✓			37	✓
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12				3			
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19		/					
20							
21			-				
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Diego Perez
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 20 junio 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: FWH-979
LUGAR Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Tomas de 4"	2			✓	33	
2	Capa impermeable	1	✓			33	
3	Silla T. 12 x 6"	20	✓			33	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Diego Perez
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 20 Junio 2024
LUGAR: Ampal
VEHICULO PLACA: FWY-994
LUGAR Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Motobombas succion 3"	2			✓	36	con 2 galones de
2	Completas con manguera de					36	aceite x 1/4 c/u
3	Succion x 6mts con accesorios,					36	15W40
4	50 metros de manguera tipo					36	
5	bombeo cada una, armada					36	
6	con acoples y abrazaderas					36	
7	Rollo de tanal de señalizacion.	1	✓			36	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tibaitatá
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 26 Junio 2024
LUGAR: Oficina
VEHICULO PLACA:
LUGAR Campamento Tibaitatá

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Kit de carpa	1	✓			36	
2	Carpa fronter de precisión	1	✓			36	
3	Carpa fronter vaqueta sencillo	2	✓			36	
4	Estacas 9x9x7,5cmts	100	✓			36	
5	Pistolas de calafateo industrial	3			✓	36	
6	Rollo de cubaya x 2,50mts	1	✓			36	
7	Kafar detergente x5Lts	20	✓			36	
8	Par de botas dieléctricas con punta	8	✓			36	T40(5) T42(1) T41(2)
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES: * Se devuelve un par de botas talla 41
* Faltan 50 Estacas.

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PRSE RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

230

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jhe Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 26 Junio 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO PLACA:
LUGAR Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Alicate 3 pulgadas 1/2 x 2mt c/u	1	✓			37	
2	con ganchos						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 27 junio 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA:
LUGAR Campamento - Tilodiran.

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Tarro de cicatrizante - cirboles	1	✓			35	✓
2	(conectores).	4	✓			35	✓
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC

REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

CODIGO: FOR-PROY-007
VERSION: 02
REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran

QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia

CONDUCTOR: Diego Perez

QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 28 junio 2022

LUGAR: Usiacuri

VEHICULO PLACA: EUV 078

LUGAR: Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Taladro pare y siga	3			✓	35	✓
2	Broca Juveko 7/8"	4	✓			35	✓
3	Zuncho "de 2"	1	✓			35	✓
4	Cortafrio de 5 mts	3			✓	35	✓
5	Broca para taladro percutor	1			✓	35	✓
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: José Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lamus

FECHA: 27 junio 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO PLACA:
LUGAR: Campamento - Tilodiran.

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Limas triangulares grandes	3			✓	36	✓
2	Hojas de segueta para cortar acero	10	✓			36	✓
3	Frascos Plastico sakercb transp.	3	✓			36	✓
4	Sobres de sales de hidratación	50	✓			36	✓
5	Brocas de 3/8" para madera	3			✓	36	✓
6	Brocas de 1/2" para madera	3			✓	36	✓
7	Rollo de cinta de señalización	1	✓			36	✓
8	Galones de aceite 2tpo 50	2	✓			36	Para motores gasolina ✓
9	Paquete de cuchillos para bisturi	1	✓			36	
10	Lapiz negro	4	✓			36	✓
11	Marcador permanente (2) Negro	6	✓			36	(2) Azul (2) roja ✓
12	(correctore)	2	✓			36	✓
13	Tabla legislaciones tipo cajon	1	✓			36	✓
14	Metros de madera 3/8" americano	4			✓	36	con ganchos (2) ✓
15	Galon de aceite 2 tiempos	1	✓			36	para motosierra ✓
16	Disco diamantado 12" para concreto	1			✓	36	corte concreto ✓
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROFESIONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tladiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Iván Pérez
QUIEN RECIBE: Rafael Tomas

FECHA: 29 Junio 2021
LUGAR: Chinú
VEHICULO/PLACA: AJU-979
LUGAR Campamento Tladiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Cuchilla metálica STANLEY	1			✓	36	N°250 ✓
2	Limas triangulares pequeñas	2			✓	36	para semillas ✓
3	Discos 3" para Dividora	15	✓			36	con E acero ✓
4	Cinta de medida x 15 Mts	1	✓			36	
5	Marcadores topográficos de 7ml	3			✓	36	✓
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

7.8.2 SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISIÓN: 15-03-2022

FECHA: 5 JUNIO 2024	NUMERO DE PEDIDO: 035
QUIEN SOLICITA: Ing. Residente Tilo	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	UNO	BROCA DE PALA PARA TALADRO PERCUTOR		
1	GALON	ECICATRIZANTE	PARA LA PODA DE ARBOLES	
1	UNO	BROCHA 2"		
30	MTS	CINTA PVC PARA JUNTAS		
3	UNO	PALETAS PARE SIGA		
4	UNO	TRAJES TIVECK		
1	PAQUETE	PITILLOS PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		
4	UNO	CORRECTORES		
4	UNO	PERNOS DE RETENCION DE OJO CERRADO	ELECTRICO	
10	UNO	PERNOS DE RETENCION DE OJO ABIERTO	ELECTRICO	
3	UNO	METROS DE 5 MTS		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

ING RESIDENTE JAIRO LUIS CUBIDES
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 18-03-2022

FECHA: 12 JUNIO 2024 | NUMERO DE PEDIDO: 035

QUIEN SOLICITA: Ing. Residente Tito | AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	1	UNE	PETO DE CARNAZA		
2	1	UNE	CADENILLA MOTOSIERRA	STIHL MS 250	
3	1	UNE	GANGUIRO	NUEVO	
4	2	UNE	MOTOBOMBAS DE 3" DE CAUDAL	NUEVO	
5	6	UNE	PENDONES PASOS PEATONALES		
6	3	ROLLO	CINTA PARA SEÑALIZACION		
7	1	SET	HOJAS DE CUCHILLAS PARA REPUESTO BISTURI INDUSTRIAL	10 HOJAS	
8	4	UNE	LAPIZ		
9	6	UNE	MARCADOR PERMANENTE	NEGRO (2) , AZUL (2) , ROJO (2)	
10	2	UNE	CORBATAS		
11	100	UNE	ESTACAS DE MADERA 4x4	LONG. = 1.50 ML	
12	15	UNE	DISCOS 7" PARA PULIDORA	CORTE ACERO	
13	1	UNE	DISCO DIAMANTADO 12" PARA CORTADORA	CORTE CONCRETO	
14	3	UNE	LIMAS TRIANGULARES GRANDES		
15	2	UNE	LIMAS TRIANGULARES PEQUEÑAS	PARA CERRUCHOS	
16	1	UNE	MARTILLO 20 OZ LISA x 6 ML	PARA SOMBROQUES	
17	1	GALA	MANTECA GALA MARCA BUGARO x 15 KG	LUBRICANTE TUBERIA	
18	1	CUÑETE	GRASA Palka RETRO		
19	3	UNE	BROCA Ø 3/8"	PARA MADERA	
20	3	UNE	BROCA Ø 1/2"	PARA MADERA	
21	2	UNE	PISTOLA DE CALAFATEO INDUSTRIAL	BUENA CALIDAD	
22	2	GALON	ACEITE 20W - 50 PARA MOTOR DE GASOLINA	MOTOBOMBAS, MEZCLADORA, GANGUIRO	
23	3	UNE	PANOS PLASTICOS SALSEROS TRANSPARENTE	TOPOGRAFIA	
24	4	UNE	CARRETILLA	QUE NO SEA BOOBY	
25	20	UNE	GAFAS LENTE OSCURO		
26	10	PAR	GUANTE PRECISION NEGRO		
27	50	UNE	SAL HEMATINITE		
28	4	ML	CADENA 3/8" AMERICANA DOS GANCHOS	PARA ALZAR LAMINAS ENTRADO	
29	1	UNE	MIRA TOPOGRAFICA DE 7 ML		
30	1	UNE	TABLA LEGAJADORA A4 CON TAPA	COLOR AZUL	
31	100	ML	MANGUERA Ø 3/8" CON ACOPLES MACHO Y HEMBRA	SE REQUIERRE URGENTE DADAS LAS LLUVIAS	JUNIO 13 DEL 2024
32	10	UNE	HOJAS DE SEGUETA	PARA CORTE ACERO DE REFUERZO	
33	5	DOCENA	GUANTE VAQUETA SIN REFORZAR		
34	8	PAR	BOTA DE CAUCHO	TALLA 40 (5) TALLA 42 (1) Y TALLA 44 (2)	
35	4	UNE	IMPERMEABLES	TALLA M (2) Y TALLA L (2)	
36	1	GALON	ACEITE 2DOS TIEMPOS	MOTOSIERRA	
37	1	ROLLO	CINTA DE SEÑALIZACION		
38	1	ROLLO	CORDEL HILO #8	ROLLO DE 2.500 M COLOR VERDE	
39	2	PAQUETE	TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 2" Y 1 1/2"		
40	2	PAQUETE	TORNILLOS GOLOSOS DE 2" Y 1 1/2"		
41	1	PAQUETE	AMARRES PLASTICOS DE 40 CMS		
42	4	UNE	TOMAS INTEMPERIE BICACHAGAS		
43	2	UNE	TOMAS x 220 v NORMAL		
44	1	UNE	MAQUILLADORA		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor sugerido, Marca existente, Norma Tecnica que le aplica, catalogo, referencias de catalogo, etc.	Ing. Residente Oscar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE


SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: JUNIO 19 DEL 2024 | NUMERO DE PEDIDO: 037

QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA | AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE FLOQUEN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	5	UNID	FILTROS		
2	10	PARES	GUANTES DE NITRILO VERDES No. 9		
3	5	UNID	PATICABRAS		
4	3	UNID	MARTILLOS CON CABO DE HIERRO		
5	1	UNID	LLAVE 9 mm MIXTA		
6	1	UNID	LLAVE 9 mm MIXTA		
7	8	UNID	TUBOS @ 4" PVC SANITARIA		
8	2	UNID	SUNCHADORAS PARA INSTALACION SILLA YEE PVC		
9	2	UNID	ROMAS DE GUIBO @ 3"		
10	2	UNID	ROMAS DE GUIBO @ 4"		
11	2	UNID	ROMAS DE GUIBO @ 1 1/2"		
12	8	UNID	CAMBIAS O MOLDES TOMA MUESTRAS DE CONCRETO		
13	1	UNID	VARILLA @ 5/8" TOMA MUESTRAS DE CONCRETO		
14	1	UNID	CONO PARA ENSAYO ASENTAMIENTO CONCRETO		
15	1	CAJA	ESFEROS COLOR NEGRO - 12 UND		
16	20	UNID	UNIONES RAPIDAS @ 2" DE POLIETILENO		
17	1	UNID	POLIFOCE TIRES CADENAS 1.5" LONG = 2.00 ML CADA UNA	PARA IZAJE TAPAS DE CONCRETO POZOS	SE REQUIERE URGENTE
18	2	UNID	ESCOBONES		
19	1	UNID	CINCEL O PUNTERO GRANDE		
20	3	UNID	CABEZAS VACIAS DE DUMPER DE LA OBRA CON TAPA	Para bajada de Kit anexo instalación tubería sanitaria	
21	2	UNID	ESCALERAS METALICAS LIVIANAS LONG = 3.00 ML	PARA POZOS	
22	6	ROLLO	LINA PARA DEMARCACION		
23	8	UNID	TAPONES @ 2" Para TUBERIA POLIETILENO		
24	4	UNID	SARANDOS CON SUS MARCOS	CONSTRUIDOS LISTOS PARA SARANDEAR	SE REQUIERE URGENTE
25	20	ML	MANGUERA @ 1 1/2" CON SUS ACCESORIOS		SE REQUIERE URGENTE
26	30	UNID	CAUCHOS @ 6"	PARA INSTALAR TUBERIA PVC NOVAFORT	SE REQUIERE URGENTE



No 17.- Pulso tres cimaras (Cadena 1.5" Long = 2.00 ML Cada una)

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor sugerido, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, entre referencias de catalogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

789

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: JUNIO 26 DEL 2024	NUMERO DE PEDIDO: 028
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	1	UNI	CASCO SAFARI BLANCO	MAESTRO FRANCISCO	
2	10	PAR	TAPA OIDOS DE INSERCION		
3	2	UNI	ROLLO CINTA BANDIT	ROLLO 10" x 30 MIL	
4	1	UNI	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	MADELYN	
5	6	UNI	TRAJES TYVEK		
6	1	UNI	BOLSA JABON EN POLVO x 9 Kg		
7	1	PAR	BOTAS TALLA 40	ROBINSON GALAN	
8	1	UNI	GUANTE DESENGRASANTE		
9	1	UNI	BOOCILLERA		
10	1	UNI	ACOPLE HEMBRA 4" PARA SOLDAR		
11	2	GALON	ACEITE 20W - 50 PARA MOTOR DE GASOLINA		
12	1	UNI	FLEXOMETRO x 5 ML	TOPOGRAFIA	
13	10	UNI	TUBO Ø 1/2"	ELECTRICO	URGENTE
14	10	UNI	CURVAS Ø 1/2"	ELECTRICO	URGENTE
15	5	UNI	CAJAS PARA TOMA CORRIENTE	ELECTRICO	URGENTE
16	1	UNI	BROCA Ø 5/8" PARA MADERA	ELECTRICO	URGENTE

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Tecnica que le aplique, color, referencias no catalogo, etc.	Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

7.8.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia
Teléfonos
+57(1) 782 5000 Ext.1101 01 8000 912396
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS **Fecha: 30.07.2024**
Producto: TB ALC NOVAFORT S8 200MM(8) 6M **Nro: 3964-24**
Trazabilidad: 3240114071
Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	198.80	200.60	200.20
Diámetro Interior Promedio	mm	172.00	185.40	182.79
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.10	7.00	1.39
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min.30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia
Teléfonos
+57(1) 742 0000 Ext.1101 01 8000 913098
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS **Fecha: 30.07.2024**
Producto: TB ALC NOVAFORT S8 250MM(10) 6M **Nro: 3965-24**
Trazabilidad: 3240129031
Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	248.50	250.80	249.97
Diámetro Interior Promedio	mm	216.00	232.25	227.62
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.40	7.00	2.15
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min:30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia
Teléfonos
+57(1) 792 9900 Ext.1101 01 8000 912268
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS
Producto: TB ALC NOVAFORT S8 160MM(6) 6M
Trazabilidad: 3240118071
Fecha: 30.07.2024
Nro: 3963-24
Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	159.10	160.50	159.87
Diámetro Interior Promedio	mm	135.00	147.05	146.46
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.00	6.00	1.40
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min:30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

8.6.1 OFICIO 1 DE JUNIO 2024

Yopal, 1 de junio del 2024

OF-PROY-TIL

Señores
EMPRESA EMERALD ENERGY
La Ciudad

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: NOTIFICACION SOBRE LA RUTA ALTERNA PARA EL CRUCE INTERSECCION VIA LOS MANGOS

Cordial saludo, por parte de la empresa Synergia Construcciones e Ingeniería.

Por medio del presente me permito notificarles que la ruta alterna que se va a utilizar para el acceso a la vía los mangos para los vehículos de tráfico pesado y liviano es por la **carrera cuarta** que comunica con esta vía, y damos a conocer el plano como lo muestra la imagen (1) y los horarios establecidos para el tráfico vehicular serán los mismos que se encuentran autorizados según el PMT; de lunes a viernes de 9:00am a 11:00am y de 3:00pm a 5:00pm y sábado de 9:00am a 11:00am, esta será la ruta designada para todas las empresas que requieren utilizar la vía los mangos, esta ruta quedara habitada a partir del día martes 4 de junio hasta el día sábado 8 de junio del presente año. La empresa Synergia Construcciones e Ingeniería contará con tres controladoras viales y con la instalación de señalización preventiva e informativa.

Los canales de comunicación para atender cualquier información, aclaración, inquietud es a través del correo angyrit@hotmail.com, celular 3204773522 profesional social.

Agradecemos su colaboración

Atentamente

MA. ANGELICA TRUJILLO DELGADO
PROFESIONAL SOCIAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S





IMAGEN 1. CRUCE CALLE 1 CON VÍA LOS MANGOS.

8.6.2 OFICIO 18 DE JUNIO 2024

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Yopal, 18 de junio del 2024

OF-PROY-TIL

Señores
RESPONSABILIDAD SOCIAL FRONTERA ENERGY
Atn: Señor IVAN RODRIGUEZ
Profesional Social

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: NOTIFICACION SOBRE LA RUTA ALTERNA DURANTE LA CONSTRUCCION DEL CRUCE INTERSECCION VIA A LA VEREDA LOS MANGOS.

Cordial saludo, por parte de la empresa Synergia Construcciones e Ingeniería.

Por medio de la presente me permito notificarles que la ruta alterna que se está utilizando para el acceso provisional a la vía de la vereda los mangos para los vehículos de tráfico pesado y liviano en la **carrera cuarta** dirigiendo el flujo hacia la carrera quinta de acuerdo a la ruta de tráfico existente, se extenderá por diez (10) días más ya que las condiciones climáticas y el terreno es muy inestable por ende no se ha logrado culminar con dicha actividad al igual se continua con los mismos horario establecidos para el tráfico pesado de lunes a viernes de 9:00am a 11:00am y de 3:00pm a 5:00pm y sábado de 9:00am a 11:00am, esta será la ruta designada para todas las empresas que requieren utilizar la vía a la vereda los mangos.

Los canales de comunicación para atender cualquier información, aclaración, inquietud es a través del nuevo correo socialsynergia2024@gmail.com, celular 3204773522 profesional social.

Agradecemos su colaboración

Atentamente

MA. ANGELICA TRUJILLO DELGADO
PROFESIONAL SOCIAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

329

8.6.3. OFICIO ENTREGA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VIA ALTERNA TRAFICO PESADO.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Yopal, 20 de Junio del 2024

OF-PROY-TIL

Señor:
ABSALÓN LEGUIZAMON
COORDINADOR VEEDURÍA - TILODIRÁN

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ACTA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA ALTERNA TRÁFICO PESADO.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega de una copia al acta del estado actual realizada a la vía que será utilizada como ruta alterna del tráfico pesado según Resolución N° 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Anexo: 11 folios

R. 2-07-2024

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Powered by CamScanner

Yopal, 20 de Junio del 2024

OF-PROY-TIL

Señora:
MARINA VALDERRAMA
PRESIDENTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL - TILODIRÁN

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ACTA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA ALTERNA TRÁFICO PESADO.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega de una copia al acta del estado actual realizada a la vía que será utilizada como ruta alterna del tráfico pesado según Resolución N° 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024.

Atentamente,

Recibí Julio-2-2024 Marina Valderrama

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Anexo: 11 folios

Powered by CamScanner

8.6.4 PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLA SOCIAL, TRABAJO EN EQUIPO, Y RESPETO EN EL AREA LABORAL.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: Sab 15 de Junio 2024 | LUGAR:

TEMA(S): Trabajo en Equipo

PROYECTO: Medrano.

INSTRUCTOR: Angelica Trujillo | Duracion: (Min) 1 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José María Salcedo	9.656.888	Auxilio obra	
2	Nubar Ortiz Tabaco	100 655 7607	auxiliar	
3	Luis Fernando Cerón	74962019	Auxiliar	
4	Francisco Quinto	4245336	Mro	
5	Adrian David Adarzano	1178630260	Auxiliar	
6	Yenny carolina Mileva Leal	1116492926	Cadenero	
7	Estiben Legarda Ramón	1007747536	Cadenero	
8	Omar Villanueva	13.475.370	Ayu. Obra	
9	DEIVIS GUEVA	24770519	OFICIAL	
10	Isaayi Vargas Tabuo	1118577085	Auxiliar	
11	Wilson Rios	9[illegible]674	Op-cadenero	
12	Javier Antonio Aguilar Diaz	74854382	auxiliar	
13	Jairo Lopez Ospina	10177529	Op.	
14	Mauricio Sanchez	1.117533958	AUX	
15	Diego Andres Narvaez	1066279772	Auxiliar	
16	Elver Anays Tatache	1116[illegible]918	Auxiliar	
17	Luis Fernando Lemus	1057602737	Cad 2	
18	Jorge Mario M	9'657.771	Oficio	
19	Roilso Colon	7'659.144	AUX	
20	Armando Cejuela	9.432.512	oficial	
21	Randy Rog[illegible]	4150771	OFICIAL	
22	Victor O.tiz	1118714790	Ayudante	
23	Freddy Cardona	1.118.531.823	oficial	
24	Pablo Guadalupe Cano	1062645527	Aux	
25	Alberto Restrepo	1082 951 929	OFICIAL	
26	Thomas David Gomez	1088042724	Auxiliar	
27	Juan Pablo Rodriguez	1.456.023.7	Cadenero	
28	Oscar Mauricio Cerón	1146809321	OFICIAL	
29	[illegible]	[illegible]	Aux Vial	
30	Yandersen Ramirez	32.880.657		

Observaciones

Vo.Bo Responsable
Angelica Trujillo

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diana ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros

FECHA: Sab 19 Junio

TEMA(S): Trabajo en Equipo

LUGAR: Medellin

PROYECTO: Medellin

INSTRUCTOR: Angelica Trujillo

Duracion: (Min) 1 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Nilson Andres Millan G	1118529643	Auxiliar	
2	CARLOS HERRERA	1118538987	TOPOGRAFO	
3	Cristian Cote	7004540088	Auxiliar	
4	Elsy M Alomia	47446746	Asistente	Elsy
5	Wilson Fernando Vargas	1118562072	Cadenero	
6	ANDRES TORRES	1115854144	Conductor	
7	Jose Gustavo Chaparro	1002726973	Conductor	
8	Jhonata paipa	7029660360	conductor	Jhonata
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable: Angelica Trujillo

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Sab 22 Junio 2024 | LUGAR: Tibodinan

TEMA(S): Reporte en el area laboral

PROYECTO: Tibodinan

INSTRUCTOR: Angelica Trillo | Duracion: (Min) 1 HORA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar	
2	Luis Fernando Cotera	74869019	auxiliar	
3	DEIVIS GUIJA	79770819	OFICIAL	
4	Aldya Orta Tebaw	1006557607	Auxiliar	
5	Luis Rey Ortiz	74857511	auli	
6	Alberto Bacamonte	1087 851 879	Oficial	
7	Raul David Echeverria Cuello	1.118.537.074	Electricista	
8	Ismael Vergara Flores	1154377095	Auxiliar	Ismael V.
9	Yonel cardoso viñares	1116497926	controlador	
10	Adrian David Solarzano	1148530260	Auxiliar	Adrian
11	JOSE NIÑO M	9'657.471	OFICIO	
12	Jaime Antonio Aguilar Diaz	72185473 86	auxiliar	
13	Elver Andres Tenorio	1118569918	Auxiliar	Andres T.
14	José Antonio Largo M.	1116545786	Auxiliar	
15	Diego Andres Navarro V.	1066927732	Auxilio.	
16	OMAR VILLANIZAR	13.475.370	Les. OBRA	
17	RAUL ROA	1150771	oficial	
18	Fredy Cachay	1118531825	oficial	
19	Aurelio Pereda	9432512	oficial	
20	Nardi Perez Cabrera	33480637	Calderador Vial	
21	Rolso Galan	9'659.199	Aux.	
22	Jaime Lopez Ovalle	10127529	Operador	
23	Pablo GAMBOA	1002645523	Aux 1	
24	Deivis Vargas	1064666960	O.P	
25	Yon Jose	74858117	O.P	
26	Victor Ortiz	1184744781	O.P.	
27	Josef Mello	1118809321	Oficial	
28	Francisco Pacheco	12695336	Ayte	
29	Fredys Hernandez	1006944750	Auxiliar	
30	Wilmer Pico	9430674	OP	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	
SYNERGIA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 08-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Sabado 22 junio 24 | LUGAR: Tradicional

TEMA(S): Revision de cargue cabeza

PROYECTO: Tradicional

INSTRUCTOR: Angelica Tapiro | Duracion: (Min) 1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Nelson Andres Millan L.	1118529643	Auxiliar	
2	Nelson Padilla	7488160237	Coloncero	
3	Cristian Cote	1007540088	Auxiliar	
4	Jhojan David Cano	7029672124	Aux.	
5	Wilmer Fernando Vargas	1118562077	volquetero	
6	Cesar [illegible]	[illegible]	Ay. A.B.	
7	Ma. Angelica Tapiro D.	23914357	Dual	
8	Luis Fernando Lemus	1057602787	cad 1	
9	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
10	Jose Gustavo Chaparro	1077276973	Conductor	
11	Franklin Torres	1115854174	conductor	
12	Jhonatan garcia	7029660308	operador	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo Bo Responsable
Angelica Tapiro

Powered by CamScanner

9.3 ANEXOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

9.3.1 RELACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

RELACION DE VEHICULOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS

PERIODO DEL 01 JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO 2024

CANT	VEHICULO	CONDUCTOR	PLACA	MARCA	MODELO
1	JAC	LIBARDO GALAN	DSO 873	JAC	2018
2	CAMION	FRANSISCO QUINTERO	XGC 034	INTERNATIONAL	1996
3	CARROTANQUE	TULIO CUBIDES	WCU105	FREIGHTLINER	2015
4	CAMA BAJA	GERARDO QUEVEDO	SKH924	CHEVROLET	1997

RELACION DE VOLQUETAS DOBLETROQUES

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

PERIODO DEL 01 JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO 2024

CANT	VEHICULO	CONDUCTOR	PLACA	MARCA	MODELO
1	DOBLETROQUE	GERARDO QUEVEDO	SOS 273	KENWORTH	2013
2	DOBLETROQUE	ALVARO QUEVEDO	WFG 973	KENWORTH	2015
3	DOBLETROQUE	HORACIO PEREZ	SZZ 873	KENWORTH	2018

9.3.2 DOCUMENTACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014978629

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
DSO873	JAC	HFC1042KND	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.771	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	PLANCHON -	DIESEL	2400

NÚMERO DE MOTOR
H4013562

REG N

VIN
LJ11PCBC3J9000107

NÚMERO DE SERIE
LJ11PCBC3J9000107

REG N

NÚMERO DE CHASIS
LJ11PCBC3J9000107

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 79783440

REGISTRO NACIONAL DE MOVILIDAD

BLINDAJE
******

CIFRA IVP
* 114

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352017000236510

NE
I

FECHA IMPORT
15/06/2017

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
07/11/2017	07/11/2017	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL YOPAL

LT01007431534

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2023-10-24	2023-11-14	2024-11-13

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TONS.	MODELO
360800418449700O	DSD873	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	2771	2018

MARCA	LÍNEA/MODELO
JAC	PLANCHON PLATAFORMA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD Ton.
H4013563	LJ11PCBC3J6000107	LJ11PCBC3J6000107	2.46

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3183539638	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN	CÓD. ENTIDAD EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FUNCIONARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDOS	TASA RUNT
310	$ 537000	$ 279200	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 818300

IMPUESTOS ACTIVOS

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

VALOR	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

TIPO AUTORIZADO

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2544 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- El ciudadano puede adquirir su SOAT en cualquier vigilado ante La Previsora S.A.
- La duración de tarjeta podrá variar al pólza en cualquier momento. usted podrá presentarse en los siguientes medios: imprimir Tous en color de seguridad, imprimir Tous en blanco y negro (sin color de seguridad), en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico en el momento en haya sido en la página virtual de La Previsora S.A.
- En caso de otros inconvenientes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil #245, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe exigir la póliza, que se envíe a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito no se pueden exentar en cualquier momento.
- Recuerde revisar que su placa este registrada en el RUNT.
- Evite, antes el momento en que debe renovar su seguro. Si tiene SOAT vigente además multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los gastos de la atención de las víctimas del accidente.
- Compare su SOAT en vigilados autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente aunque sea tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud (IPS) puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 192 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, no haga ante la aseguradora o de Fosyga la deba realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no es requerir ayuda a terceros.

Circular de Cumplimiento de Pólizas

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. puede de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se consideren que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia en su fecha de inicio, tomará como referente la fecha de consultando en la página que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que al forma libre, de manera de la emisión de esta póliza he suministrado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, toda la información personal suficiente, fidedigna e información personal autorizando llenarla el diligenciamiento de esta póliza, directamente o por medio de terceros o medios informáticos, para registrarla en sus bases de datos, información por medios escritos, como electrónicos, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o cualquier aplicación de mensajería instantánea, todo lo relacionado con el envío, modificación o revisión de este producto que he adquirido. Todo lo manifestado por este contrato para recibir publicidad diferente de la compañía de seguros, productos conjuntos de mercadeo y/o comerciales relacionados con este producto que adquiero, de igual de otras marcas de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. actualiza información derivada de todas las funciones que ejecute o mantenimiento en las bases derivadas a las compañías o en los consignen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza a demás servicios que evalúen del presente contrato y demás asuntos conexos en todos sus partes.

Declaro que en los ya diligenciado que mano Titular de información tengo derecho a conocer actualizar y corregir mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la autorización y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá consultar en la web SIC y RUT en la ciudad de Bogotá con medio del teléfono 3447000 y fijar una mas información sobre el tratamiento de mis datos en puedes acceder a la Política de Tratamiento de Datos con en la página de internet www.previsora.gov.co.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170687938

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2023/12/29

Fecha de vencimiento: 2024/12/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: DSO873

CLASE: CAMION

MARCA: JAC

MODELO: 2018

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2771

NRO. MOTOR: H4013562

NRO. CHASIS: LJ11PCBC3J9000107

VIN: LJ11PCBC3J9000107

LÍNEA: HFC1042KND

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031234718

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XGC034	INTERNATIONAL	4700	1996

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.700	AZUL PERLADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	PLANCHON -	DIESEL	10000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
466TM2UO934487	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	TH265382	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES — IDENTIFICACIÓN

DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO — C.C. 7978448

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

KILOMETRAJE: ****** — POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 01204018554421 — SE: I — FECHA IMPORT.: 07/12/1995 — PUREZA: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/01/1996	29/02/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST TTOYTTE MCPAL SOGAMOSO



LT02007788240

SOAT

PREVISORA SEGUROS

2023-10-24 — 2023-10-25 — 2024-10-24

26060041544096000	XGC034	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6700	1996

2	INTERNATIONAL 4700		ESTACAS

469TMZUO96448?	TH2653382		10:00

TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3183539638	NI	900361915?	YOPAL

AT1324	28	999926	0	YOPAL

320	$ 776000	$ 403900	$ 2100

$ 1181600

263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)	
701,68 [2]		
8,77		
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	
750		

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

El tomador puede ir a pólizas SOAT en internet o medio de entrega autorizado ante La Previsora S.A.
La autoridad de tránsito podrá exigirle la póliza en cualquier momento. Usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel común tamaño carta con código QR en formato PDF con código QR o cual se puede descargar del correo electrónico o la consulta de texto con el fin de verificar emitido por La Previsora S.A.
En caso de tener inconvenientes sobre el proceso, contacte desde su teléfono móvil al #567, para recibir la asistencia necesaria.

Le sean impuestas la póliza que se anexa o los costos adicionales sobre impuesto a la información guardada en su sistema hasta que con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Tenga usted en cuenta los siguientes recomendaciones:
Recuerde portar siempre su SOAT de acompañado de tarjeta de la cédula vehículo en cualquier momento.
Recuerde usted que su póliza está registrado en el RUNT.
Este dentro de tratamiento de sus datos acorde su póliza. No entre RUNT registre cualquier medio suministrado la elaboración del contrato y en caso de accidente de tránsito el cobro con fines no inicio de la atención de las víctimas del accidente.
Adquiera su SOAT en lugares autorizados.
En caso de no contener de tránsito:
Si desea hacer uso de la póliza en el exterior de territorio de país, tenga en cuenta el lugar del accidente tomará que ningún beneficio para brinde la atención requerida por las víctimas.
Ningún beneficio de cobertura de salud no será posible negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito ocurridos [illegible] en el territorio nacional, debiendo ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Para los países miembros a cuyo ente se denominado [illegible] Europa o este hubiera de exigirse presentación de tarjetas de salud.
Para protección de documentos ante la consulta asegúrelo [illegible] no consulte a usted a terceros.

Conozca de Transparencia de Precios:
En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto Decreto 2555 de 2017, emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. puede de manera unilateral y discrecionalmente a favor del consumidor modificar la vigencia de la póliza contra el momento de registro de tránsito en el RUNT de conformidad con lo cual cada vigencia. En caso cobro LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia en la fecha de inicio [illegible] como referencia la fecha de nacimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. a través de medios

Tenga en cuenta que en forma previa al momento en el cobro de una póliza no autorizada a LA PREVISORA S.A. Consulte en seguida para que conozca diferentes garantías. Identifica la información personal suministrada durante el proceso de emisión de este paso inmediatamente y por medio de llamada o medios comunicados para registrarse en que tiene de datos diligencia del trámite realizar como electrónico. Detalles [illegible] envío de mensaje de texto en usuarios adicionales. Se mencionará inmediatamente [illegible] o relacionado con el tercero modificación. Y posición de otro peligro que se detuvieron esto se relacionado con este contrato para entidades establecidas internas de la compañía de medios generar cantidades de mercados en consumidores relacionados con otros tercero que adquiere en cuyo de otros casos de seguros que manejo LA PREVISORA S.A. encuentra información solicitada de estas en tomadores que tienen o relacionados en los casos cargado y no adquiridos y en los obligados en el futuro en otros funcionales. Obtenga y frente de la póliza y tercer servicio que tengan de presente contrato el cual consiste y deberán acceder en todos los partes.

Declara que no ha informado que como Titular de información tenga derecho a conocer actualizar y rectificar los datos personales solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes que contra declarante en el caso LA PREVISORA S.A. cuales se [illegible] en medio del artículo 2º [illegible] y que sobre mis información claro y exigiendo en mis casos no pueden acceder a la Política de Tratamiento de información de la página de internet www.previsora.gov.co.

BG

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169841657

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2023/11/26

Fecha de vencimiento: 2024/11/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XGC034

CLASE: CAMION

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 1996

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6700

NRO. MOTOR: 469TM2UO964487

NRO. CHASIS: TH265382

VIN:

LÍNEA: 4700

COLOR: AZUL PERLADO

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015822547

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
WCU106	FREIGHTLINER	M2 106	2015

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
6.370	AMARILLO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD kg/Pas
CAMION	EQUIPO DE	DIESEL	15500

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
[illegible]	N	3ALHCYCS6FDGN7981

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
[illegible]	N	3ALHCYCS6FDGN7981	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE — IDENTIFICACIÓN

DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO — C.C. 79793440

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
[illegible]	280

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	RE	FECHA IMPORT	PUERTAS
152014000135374	I	05/12/2014	2

ANOTACIONES LA PROPIEDAD

[illegible]

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
15/01/2015	02/04/2018	[illegible]

ORGANISMO DE TRANSITO

INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL





LT0300291318

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-11-28	2023-11-30	2024-11-29

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
26080041672390000	WCU105	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6370	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FREIGHTLINER	EQUIPO DE RIEGO

LÍNEA VEHÍCULO	
M2 106	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
906980C1081930	3ALHCYCS6FDGN7981	3ALHCYCS6FDGN7981	15.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIAZ CASTELLANOS, DIEGO HERNANDEZ	3138858819	CC	797934407	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TOMPA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

FIRMA AUTORIZADO

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.

-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato .PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.

-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito no le pueden solicitar en cualquier momento.

-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

-Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, restituir la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a sus aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que violen del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 37 # 8-67 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487500, y que para mas información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169618506

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2023/11/15

Fecha de vencimiento: 2024/11/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WCU105	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	FREIGHTLINER	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	6370	**NRO. MOTOR:**	906980C1081930
NRO. CHASIS:	3ALHCYCS6FDGN7981	**VIN:**	3ALHCYCS6FDGN7981
LÍNEA:	M2 106		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

820

mundial



Ramo
DE RESPONSABILIDAD Civil EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
05/03/2023-1313-P-63-RPS1013980000003033-ORO

Código único de Autorización
09-63-1313-1317-4-63-AS1013980000003033-ORO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N 6B – 24 Piso 1,2 y 3
Teléfono (601) 2603660

No. Póliza BY 2000346178 | No. de Certificado 1802915493 | No. Anexo 1

NEGOCIO NUEVO | 2023-11-23 | AGENCIA BOYACA CASANARE

Desde las 23 : 11 : 2023 | Hasta las 23 : 11 : 2023 | 366 | Hasta las 23 : 11 : 2024

TOMADOR
Tomador DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
Dirección CALLE 30 N 28 46
Nº Doc. Identidad 79793440
Ciudad YOPAL CASANARE Teléfono 3133957778

ASEGURADO
DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
CALLE 30 N 28 46
79793440
YOPAL CASANARE 3133957778

BENEFICIARIO
Beneficiario TERCEROS AFECTADOS
CC/NIT
CC/NIT

DATOS DEL VEHÍCULO

02910085 | 2015 | PUBLICO | AMARILLO
WCU105 | FREIGHTLINER CARROTANQUE – MZ 106 [LARGO] [239HP] MT | CARROTANQUE
15 | 906980C1081930 | 3ALHCYCS6PDGN7981
YOPAL CASANARI | $197,600,000.00 | $0.00 | $197,600,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$200,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$200,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	$400,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS DE GRUA	$60,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible

Contado | 2022-12-23

Prima $ 756,179.00 | Descuento $ 0.00 | Prima Neta $ 756,179.00
Derechos $ 5,000.00 | IVA $ 144,624.00 | TOTAL A PAGAR $ 905,803.00

Intermediarios | % Participación | Coaseguradores | Tipo | % Participación
CAS CASANARE SEGUROS | 100.0

OBSERVACIONES

Línea asistencia: Nacional, 018000111935 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, Bogotá (601)3274712-13 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, #935 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

EL DC OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE AL IGUAL QUE REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE MIS DATOS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990 LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRIMERA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS Y ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE EXIGIR PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA ESTIPULADA Y DE LOS GASTOS DE EXPEDICIÓN, LA EJECUCIÓN EN LA FORMA PRESCRITA EN LA PÓLIZA.

AUTORIZO A ESTUDIAR, ACTUALIZAR, RECTIFICAR Y GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, EJECUCIÓN DE CONTRATO, DE CUMPLIR LOS EJERCICIOS DE DERECHO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, SEA DIRECTO O A TRAVÉS DE SUS INTERMEDIARIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1581 DE 2012 Y PARA ESTOS EFECTOS DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES AUTORIZADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS ACCEDA A WWW.MUNDIALSEGUROS.COM.CO/DOCUMENTOS/ EL CUAL USTED PUEDE CONSULTAR, SOLICITAR, ACTUALIZAR, RECTIFICAR O SUPRIMIR SUS DATOS, ASÍ COMO REVOCAR LA AUTORIZACIÓN DE LA PÓLIZA EL PADRE O TUTOR PUEDE VER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS EN EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://WWW.MUNDIALSEGUROS.COM.CO/DOCUMENTOS/POLITICA-DE-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.PDF

CONOZCA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA EN EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://WWW.MUNDIALSEGUROS.COM.CO/DOCUMENTOS/CONDICIONES-GENERALES-POLIZA-RESPONSABILIDAD-CIVIL-EXTRACONTRACTUAL-AUTOMOVILES.PDF

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.

Tomador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023350026

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SKH924	CHEVROLET	SUPER BRIGADIER	1997

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
14.011	ROJO PERLADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
TRACTOCAMION	SRS	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
79155320	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDSDBJX7VB973109	N	9GDSDBJX7VB973109	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S. — NIT 900361915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08014D1070899

DE: I

FECHA IMPORT.: 26/06/1997

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/08/1997	09/07/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA



LT07000801358

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2023-12-12		2023-12-22		2024-12-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KILATAJE	MODELO
2608004188464000	SKH924	CARGA O MIXTO	PUBLICO	14011	1997

PASAJEROS	MARCA	
2	CHEVROLET	
	LINEA VEHÍCULO	SUPER BRIGADIER

CARROCERIA: SRS

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
79155320	9GDSDBJX7VB973109		3.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3175737308	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 537000	$ 279200	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 818300

Paola Hernandez

FIRMA AUTORIDAD

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo o la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Está atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 155 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la Institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a los aseguradores o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, al cual suscribo y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3497555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

825

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172043611

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/02/26

Fecha de vencimiento: 2025/02/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SKH924

CLASE: TRACTOCAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1997

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 14011

NRO. MOTOR: 79155320

NRO. CHASIS: 9GDSDBJX7VB973109

VIN:

LÍNEA: SUPER BRIGADIER

COLOR: ROJO PERLADO

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

924

Seguros mundial
tu compañía siempre



Póliza de
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
20/05/2023-1317-P-03-PPSUS10R000000002-08CI

Código Anexo de Asistencia
20-05-2023-1317-A-03-ASUS10R000000033-08CI

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33#.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono (601)2855600

No. Póliza **BY 2000375962** No. de Certificado **1803143708** No. Riesgo **1**

Tipo de Documento **NEGOCIO NUEVO** Fecha de Expedición **2024-02-26** Suc. Expedidora **AGENCIA BOYACA CASANARE**

Vigencia Desde 00:00 Horas del 26/ 02/ 2024 Vigencia Hasta 00:00 Horas del 26/ 02/ 2025 Días **366**

Vigencia del Certificado Desde 00:00 Horas del 26/ 02/ 2024 Vigencia del Certificado Hasta 00:00 Horas del 26/ 02/ 2025

Tomador **TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.** Nº. Doc. Identidad **900361915**
Dirección **CALLE 11 21 78** Ciudad Teléfono **3208545525**
Asegurado **TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.** Nº. Doc. Identidad **900361915**
Dirección **CALLE 11 21 78** Ciudad Teléfono **3208545525**
Beneficiario **TERCEROS AFECTADOS** CC/NIT
Beneficiario CC/NIT

DESCRIPCIÓN DEL BIEN ASEGURADO

Cód. Fasecolda **01622010** Modelo **1997** Servicio **PUBLICO** Color **ROJO PERLADO**
Placa **SBH924** Marca y clase **CHEVROLET REMOLCADOR – SUPER BRIGADIER ACL-64 188 IN** Tipo de Vehículo **REMOLCADOR**
Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros **35** No. Motor **79155320** No. Chasis / Serie **9GDSDBJX7V8973109**
Dpto/Municipio **YOPAL CASANARE** Valor Comercial **$68,500,000.00** Valor Accesorios **$0.00** Valor Comercial Total **$68,500,000.00**

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	Deducibles %	Deducibles SMMLV (Pesos COP)
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$200,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$200,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	$400,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS DE GRUA	$50,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible

Convenio de Pago **Contado** Fecha Límite de Pago **2024-03-27**

PRIMA NETA	$ 1,003,050.00	IVA	$ 0.00	PRIMA TOTAL	$ 1,003,050.00
DERECHOS	$ 5,000.00	FASECOLDA	$ 191,530.00	VALOR A PAGAR	$ 1,199,580.00

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
CAS CASANARE SEGUROS	100.0			

OBSERVACIONES

Línea asistencia: Nacional, 018000111515 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, Bogotá (601)3274712-13 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, #515 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE AL IGUAL QUE REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO (CIRCULAR 029 DE 2014 SUPERFINANCIERA).

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1060 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA FALTA DE PAGO DE LA PRIMA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA FACULTA A LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

AUTORIZO A SEGUROS MUNDIAL PARA ALMACENAR, RECOLECTAR Y GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, OFRECIMIENTO COMERCIAL, ASÍ COMO LOS SERVICIOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y FINES ESTADÍSTICOS. DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE SE ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS INGRESE A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/LEGAL/ EN CASO QUE NO DESEE OTORGAR ESTA AUTORIZACIÓN, FAVOR COMUNICARSE A LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE APARECEN EN LA PÓLIZA O ENVÍE A NUESTRA PÁGINA WEB HTTP://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SERVICIO-AL-CLIENTE/ FORMULARIO DE CONTACTO.

CONOZCA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA Y EL ALCANCE DE ASISTENCIA EN HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/CONDICIONES-POLIZAS/CONDICIONES-DE-HOGAR.PDF

Póliza Autorizada
Compañía Mundial
de Seguros S.A.

Tomador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027573450

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SOS273	KENWORTH	T800	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	17450

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35305518	N	3BKDL00X3DF714322

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
714322	N	714322	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES

TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

IDENTIFICACIÓN

NIT 901542009

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 335

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192013000003439

LIC: I

FECHA IMPORT.: 18/01/2013

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/01/2013	28/10/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE



LT0700205043 9

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-11-22	2023-11-30	2024-11-29

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004186826000	SOS273	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: T800

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35305518	714322	3BKDL00X3DF714322	17.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRASNPORTESCELESTEHARUE SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDICIÓN	CLAVE PRODUCTO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68[2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil el #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cubrir por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere actuar a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe otra póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de fidelización y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado o les sean otorgadas a su los otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170401907

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2023/12/19

Fecha de vencimiento: 2024/12/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SOS273

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35305518

NRO. CHASIS: 714322

VIN: 3BKDL00X3DF714322

LÍNEA: T800

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ



Tu compañía de seguros

Póliza de
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
20/03/2023-1317-P-03-PPSUS108000000033-DRCI

Código Anexo de Asistencia
20-03-2023-1317-4-03-ASIS108000000033-DRCI

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N 6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono (601)2853605

No. Póliza BY 2000345882 | No. de Certificado 1802913131 | No. Anexo 1

Plan de Beneficios NEGOCIO NUEVO | Fecha de Expedición 2023-11-22 | Sucursal AGENCIA BOYACA CASANARE

Vigencia desde (DD/MM/AA) 22/11/2023 | Vigencia hasta 22/11/2024 | Días 366

Vigencia del Certificado desde 22/11/2023 | Vigencia del Certificado hasta 22/11/2024

Tomador TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS | Nº Doc. Identidad 901542009

Dirección CALLE 38 N 24-82 | Ciudad YOPAL CASANARE | Teléfono 6086327178

Asegurado TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS | Nº Doc. Identidad 901542009

Dirección CALLE 38 N 24-82 | Ciudad YOPAL CASANARE | Teléfono 6086327178

Beneficiario TERCEROS AFECTADOS | CC/NIT

Beneficiario | CC/NIT

RIESGO ASEGURADO

Clase 04426007 | Modelo 2013 | Servicio PUBLICO | Color VERDE

Placa SOS273 | Marca y Línea KENWORTH VOLQUETA - T800 FULL FILTROS MT TD 6X4 | Tipo Vehículo VOLQUETA

Pasajeros/Capacidad Pasajeros 17 | No. Motor 3530551R | No. Chasis / Serie 3BKDL00X3DF7114322

Zona Circulación YOPAL CASANAR | Valor Asegurado $252,400,000.00 | Valor Accesorios $0.00 | Valor Comercial Total $252,400,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite Asegurado	Deducible	Deducible Pérdida Total
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$400,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$400,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	$800,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,339,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS DE GRUA	$50,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA EN VIAJE	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible

Forma de Pago Contado | Fecha Expedición 2023-12-22

Prima Anual $ 1,459,662.00 | Descuento $ 0.00 | Prima Neta $ 1,459,662.00

Derechos $ 5,000.00 | IVA $ 278,286.00 | TOTAL A PAGAR $ 1,742,948.00

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
CAS CASANARE SEGUROS	100.0			

OBSERVACIONES

Línea asistencia: Nacional, 018000111935 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, Bogotá (601)3274712-13 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, #915 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y ACTUALIZADA AL CUAL SUS ADMINISTRADORES, ACCIONISTAS O SOCIOS DE MANERA ANUAL, DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR EXTERNA 055 DE 2008 EXPEDIDA POR FASECOLDA.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1060 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

AUTORIZO A SEGUROS MUNDIAL PARA SUMINISTRAR, RECTIFICAR Y CONFIRMAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, EN CONTACTO COMERCIAL, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS NECESARIOS A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, INCLUYENDO EL ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO, CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS, ENTRE OTROS. INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE EL ASISTE COMO TITULAR DE LOS MISMOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS INGRESE A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/LEGAL/ EN CASO QUE NO DESEE OTORGAR ESTA AUTORIZACIÓN, FAVOR COMUNICARSE A LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE APARECEN EN LA PÓLIZA O PUEDE ESCRIBIR A NUESTRA TERCERA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ AL CORREO ELECTRÓNICO ATENCIONALCLIENTE@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

CONSULTA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA EN EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/WP-CONTENT/UPLOADS/2023/03/CONDICIONES-GENERALES-DRCI.PDF

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.

Tomador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019561181

PLACA WFG973	MARCA KENWORTH	LÍNEA T800		MODELO 2015
CILINDRADA CC 10.800	COLOR NARANJA			SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL		CAPACIDAD Kg/PSJ 16980
NÚMERO DE MOTOR 35328902		REG N	VIN 3BKDL00X7FF721180	
NÚMERO DE SERIE ****		REG - NÚMERO DE CHASIS N 721180		REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TEKNIKJ&D E U

IDENTIFICACIÓN
NIT 900361915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 192014000121446		REGRAJE ****	POTENCIA HP 0
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD		MT I	FECHA IMPORT. 06/11/2014
****			PUERTAS 2
FECHA MATRÍCULA 21/11/2014	FECHA EXP. LIC. TTO. 01/11/2019	FECHA VENCIMIENTO ****	

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYNOV CUNDINAMOSQUERA

LT07000093932

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-11-22	2023-11-30	2024-11-29

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TC	MODELO
2608004186829000	WFG973	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
T800	36328802	721180	3BKDL00X7FF721180	16.98

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRASPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3183539636	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

Paola Hernandez

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.

•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.

•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.

•Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a los aseguradores o se les otorguen en el futuro, así como novedades, renovación y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, así cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487505, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170854649

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/01/04

Fecha de vencimiento: 2025/01/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFG973	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	KENWORTH	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	**NRO. MOTOR:**	35328802
NRO. CHASIS:	721180	**VIN:**	3BKDL00X7FF721180
LÍNEA:	T800		
COLOR:	NARANJA		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

mundial
la compañía cercana



PÓLIZA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
20/01/2023-1317-A-03-RESPONSABILIDAD-DRCI

Código Anexo de Vigencia
2045-2023-1317-A-03-AUTO1000000003-DRCI

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N 6B – 24 Piezas 1,2 y 3
Teléfono 3601234567

No. Póliza BY 2000345324 | No. de Certificado 1802911825 | No. Riesgo 1

NEGOCIO NUEVO | 2023-11-20 | AGENCIA BOYACA CASANARE

20/ 11/ 2023 | 20/ 11/ 2024 | 366

20/ 11/ 2023 | 20/ 11/ 2024

Tomador TRANSPORT AMERICAN DINEDI S.A.S. | NIT. Doc. Identidad 900361915
Dirección CALLE 11 21 78 | Ciudad | Teléfono 3208545525

TRANSPORT AMERICAN DINEDI S.A.S. | 900361915
CALLE 11 21 78 | 3208545525

Beneficiario TERCEROS AFECTADOS | CC/NIT
CC/NIT

RIESGO ASEGURADO

04426001 | 2015 | PUBLICO | NARANJA
WFG973 | KENWORTH VOLQUETA - T800 T800 M7 TD 6X4 | VOLQUETA
17 | 35328802 | 721180
YOPAL CASANARE | $295,200,000.00 | $0.00 | $295,200,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$400,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$400,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	$800,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS DE GRUA	$50,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA EN VIAJE	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible

Contado | 2023-12-20

Prima $ 1,459,662.00 | Descuento $ 0.00 | Prima Neta $ 1,459,662.00
Gastos $ 5,000.00 | IVA $ 278,286.00 | Total a Pagar $ 1,742,948.00

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
CAS CASANARE SEGUROS	100.0			

OBSERVACIONES

Línea asistencia: Nacional, 018000111935 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, Bogotá (601)3274712–13 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, #555 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

AL DAR CUMPLIMIENTO CUALQUIERA CLAUSULAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE AL CUAL ESTÁ OBLIGADO...

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1.046 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 45 DE 1990, LA VIGENCIA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE SUS CERTIFICADOS Y ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD EN ELLA, EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL SIGUIENTE Y PAGO EFECTIVO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EFECTO EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA.

AUTORIZO A SEGUROS MUNDIAL PARA ALMACENAR, RECOLECTAR Y CENTRALIZAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, ESTADÍSTICA, ESPECIAL, DE CRUCE CON LA CENTRAL DE RIESGOS FINANCIEROS DE LA LEY Y DEMÁS ANEXOS, ADJUNTO EL FORMULARIO DE DATOS PERSONALES DE CLIENTES Y PAGO ESTABLECIDOS. DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN CONFORME LO ESTABLECE LA LEY 1266 DE 2008.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS VISITE A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO O AL CORREO QUE NO ESTÉ OTORGADO ESTA AUTORIZACIÓN. CUALQUIER CONSULTA O LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE SON: BOGOTÁ 601 3274712 EN LA OPCIÓN 3, RESTO PAÍS 018000111935 OPCIÓN 3 Y CORREO ELECTRÓNICO SERVICIOCLIENTE@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

CONSULTA LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA PÓLIZA EN LA PÁGINA WEB WWW.SUPERFINANCIERA.GOV.CO/CONSUMIDOR/CONSULTAPOLIZAS.HTML

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.

Tomador

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10000966451

PLACA SZZ778	MARCA KENWORTH	LINEA T800	MODELO 2013
CILINDRADA CC 10.900	COLOR ROJO		SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD PASAJ 17450
NÚMERO DE MOTOR 95300357		NRO VIN X 3BKDL00X3DF713171	
NÚMERO DE SERIE		NRO CHASIS O SERIE X 713171	NRO N


PROPIETARIO ACTUAL(ES) Y NACIONALIDAD(ES)
DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 79734415

RESTRICCIONES MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP 0	
DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN 19201200042927	No 1	FECHA EXPORT. 06/05/2012	Página 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD			
GRAVAMEN			
FECHA MATRÍCULA 19/07/2012	FECHA EXP. LIC. TTO. 19/07/2012	FECHA VENCIMIENTO PRÓRROGA	

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMOSQUERA





LTO1002993635

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-12-12	2023-12-14	2024-12-13

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/KW	MODELO
2608004188463000	SZZ773	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	KENWORTH	PLATON

LINEA VEHICULO			
T800			

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35300357	713171	3BKDL00X3DF713171	17.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIAZ CASTEBLANCO, DIEGO HERNANDO	3175737308	CC	79793440	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. NACIONAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDITRA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68[2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #245, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Corresponsabilidad de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o inclusión de bien(es) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con bien(es) adquirido con anterioridad, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que ofrezca o intermediando se las haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, a cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que esto proceda y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la calle 57 # 5-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3497000, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170852968

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/01/04

Fecha de vencimiento: 2025/01/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SZZ773

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35300357

NRO. CHASIS: 713171

VIN: 3BKDL00X3DF713171

LÍNEA: T800

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

seguros mundial
tu compañía siempre



Póliza de
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
19/05/2023-1317-A-03-PPAUS108000000112-DIAC

Código Anexo de Asistencia
20-05-2023-1317-A-03-ASIS108000000112-DIAC

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General: Calle 33N 6B – 24 Piso 1,2 y 3
Teléfono: (57) 7855600

No. Póliza: SY 2000361681 | No. de Certificado: 1002976869 | No. Riesgo: 1
Tipo de Documento: NEGOCIO NUEVO | Fecha de Expedición: 2023-12-21 | Suc. Expedidora: AGENCIA BOYACA CASANARE
Vigencia Desde: 00:00 horas del: D 21/ M 12/ A 2023 | Vigencia Hasta: 00:00 horas del: D 21/ M 12/ A 2024 | Días: 366
Vigencia del Certificado Desde: 00:00 horas del: D 21/ M 12/ A 2023 | Vigencia del Certificado Hasta: 00:00 horas del: D 21/ M 12/ A 2024

Tomador: DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO | Nº. Doc. Identidad: 79793440
Dirección: CALLE 30 N 28 46 | Ciudad: YOPAL CASANARE | Teléfono: 3133857778
Asegurado: DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO | Nº. Doc. Identidad: 79793440
Dirección: CALLE 30 N 28 46 | Ciudad: YOPAL CASANARE | Teléfono: 3133857778
Beneficiario: TERCEROS AFECTADOS | CC/NIT:
Beneficiario: | CC/NIT:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Cód. Fasecolda: 04426001 | Modelo: 2013 | Servicio: PUBLICO | Color: ROJO
Placa: SZZ773 | Marca y clase: KENWORTH VOLQUETA – T800 T300 AUT TD 6X4 | Tipo de Vehículo: VOLQUETA
Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros: 17 | No. Motor: 35300357 | No. Chasis / Serie: 713171
Ciudad/Municipio: YOPAL CASANARE | Valor Comercial: $249,900,000.00 | Valor Accesorios: $0.00 | Valor Comercial Total: $249,900,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

Coberturas	Límite asegurado (Valor Asegurado)	Deducibles %	Deducibles $ (SMLV / Pesos COP)
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$400,000,000.00	10.0%	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$400,000,000.00	10.0%	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MAS PERSONAS	$800,000,000.00	10.0%	4.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS DE GRUA	$50,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA EN VIAJE	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible

Convenio de Pago: Contado | Fecha Inicio de Pago: 2024-01-20

Prima Neta	$ 1,459,662.00	Descuento	$ 0.00	Prima Total	$ 1,459,662.00
Gastos Exp.	$ 5,000.00	IVA	$ 278,286.00	Total a Pagar	$ 1,742,948.00

Intermediarios	% Participación	Coaseguradoras	Tipo	% Participación
CAS CASANARE SEGUROS	100.0			

OBSERVACIONES

Línea asistencia Nacional: 018000111955 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, Bogotá (601)327-4712–03 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, #933 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE AL CUAL QUE REALICEN ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, ESPECIALMENTE CUANDO SE DE CAMBIO EN SU NACIONALIDAD.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 2 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS RECIBOS, CUOTAS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD, EN CUALQUIER FRACCIONAMIENTO, LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

AUTORIZO A SEGUROS MUNDIAL PARA ALMACENAR, RECOLECTAR Y CEDER/NO MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, OFRECIMIENTO COMERCIAL, AS COMO LOS SERVICIOS derivados A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y FINES ESTADÍSTICOS. DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, AS COMO LOS DERECHOS QUE SE ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PODRÁ CONSULTARLA A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/POLITICA DE EN CASO QUE NO DESEE OTORGAR ESTA AUTORIZACIÓN, FAVOR COMUNICARSE A LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE APARECEN EN LA PÁGINA O PUEDE A MEDIDA PAGINA WEB HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SERVICIO-AL-CLIENTE/ Y DILIGENCIE EL FORMULARIO O ENVIE UN CORREO ELECTRÓNICO A CONTACTO@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO.

CONSULTA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SITE/ASSETS/DOCUMENTOS-PERSONAS/POLIZAS/CLAUSULADO-DE-AUTOMOVILES.PDF

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.

Tomador

9.3.3 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAO INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-049 VERSION: 01 REVISION: 15-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tibasosa Boyacá 14/12/2023
CLASE VEHICULO: Carro Tanque MARCA: _____ MODELO: 1993
CONDUCTOR: Francisco Quinteo TELÉFONO: _____ AGUA ☑ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHICULO	SI	MO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓			07-12-2024	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓			08-12-2024	
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	MO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA, FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	MO	NA	TIPO INSPECCION		OBSERVACIONES
					PREV	CORRET	
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACION	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUNAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO							✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS							✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO							✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?							✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO							✓		✓		✓			
4.6	PITO							✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA							✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS							✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS							✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS							✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS							✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS							✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACION INTERNA							✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS							✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES							✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO							✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA							✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS							✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCION							✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO							✓		✓		✓			
4.21	[illegible] combustible (ESO)							✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE ABRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO							✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO							✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ADOPLES PARA MOTOBOMBA							✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR															

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio 13 de enero del 2023
CLASE VEHÍCULO: Chevrolet MARCA: _____ MODELO: 1993
CONDUCTOR: Francisco Quintero TELÉFONO: _____ AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISIÓN TECNOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓			03-12-2024	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓			-	
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓			08-12-2024	
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				
	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	**SI**	**NO**	**N/A**	**VIGENCIA**	**OBSERVACIONES**
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				
	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**TIPO ACCION** PREV. / CORRECT.	**OBSERVACIONES**
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓				
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓				
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓				
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓				
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓				
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓				
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓				
3.8	LINEA DE VIDA	✓				
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓				
3.10	LINTERNA	✓				
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓				
3.12	CUNAS O TACOS	✓				
3.13	GATO Y CRUCETA	✓				

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACION INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	EXTINTORES OPERADORES (RECARGADOS Y TIPO CANTIDAD) COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCION Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR															

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio Casanare

CLASE VEHÍCULO: Carro tanque MARCA: International MODELO: 1993

CONDUCTOR: Francisco Quintero TELÉFONO: _____ AGUA [x] COMBUSTIBLE [ ]

	1. DOCUMENTOS VEHICULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓			03-12-2021	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓			08-012-2021	
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION PREV.	TIPO ACCION CORRECT.	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACION	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUNAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACION INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	[illegible] COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCION Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLE PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	N		N		N		N		N		N		N	
	FIRMA DEL CONDUCTOR	Firma		Firma		Firma		Firma		Firma		Firma			

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Montería Cascarero

CLASE VEHÍCULO: Camión tanque MARCA: International

CONDUCTOR: Francisco Quiñero TELÉFONO: AGUA ☑ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓			07-11-2024	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓			08-12-2024	
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION PREV.	TIPO ACCION CORRECT.	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACION	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	[illegible] CONDUCTOR E ITC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR	Firma	Firma	Firma				Firma	Firma	Firma					

988 tb

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

Horacio Perea — 322-873

PERIODO: SEMANA DEL 03 AL 09 DE 06 AÑO: 2024 — KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Freno de servicio	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
ALARI	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	[illegible]				Horacio	Horacio	Horacio	Horacio								
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: [illegible]

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Horacio Perez CARGO: _____ PLACA: SZZ-993

PERIODO: SEMANA DEL 10 AL 16 DE 06 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	-			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
ALARM	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	[illegible]				Horac		Horac		Horac		Horac		Horac			
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: NADIENE A ORDEQUE

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Horacio Perez FIRMA: _____ PLACA: 572-873

PERIODO: SEMANA DEL 17 AL 23 DE 06 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL: _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigarante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio			
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: Adelante Exitosos

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Horacio Perez FIRMA: 522-873

PERIODO: SEMANA DEL 24 AL 30 DE 06 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces de trabajo (delantera)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR VIGENTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigarante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas y cabina	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	NOMBRE DEL CONDUCTOR		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio			
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: ___

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Eduardo Mezquera PLACA: WFG-913

PERIODO: SEMANA DEL 03 AL 09 DE 06 AÑO 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL: ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Freno de servicio	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA UCENCIA CONDUCCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: Madeleine Ramirez

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Eduardo Marquez FIRMA: _____ PLACA: WF697

PERIODO: SEMANA DEL 10 AL 16 DE 06 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL: _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
CHASIS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: Madeleine Rodriguez

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

OPERADOR(A): Gerardo Acevedo FIRMA: _____ PLACA: WTG-977

PERIODO: SEMANA DEL 17 AL 23 DE 06 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ALARET	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	[illegible]															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

OPERADOR(A): Gerardo Quevedo FIRMA: PLACA: WF6-97

PERIODO: SEMANA DEL 24 AL 30 DE 06 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigarante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	[illegible]		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan					
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: Madeleine (Asinaya)

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Julio Cobides LUGAR: _____ PLACA: SRZ-773

PERIODO: SEMANA DEL 03 AL 09 DE 06 AÑO 2021 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Pito	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DEL SOAT				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina y cabina	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabeza del cardan	Completo			✓		✓		✓				✓			
	Acoples rapidos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabeza de cardan	Completo			✓		✓		✓				✓			
	Guarda Polvos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR				Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio						
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

NOMBRE CONDUCTOR: Julio Cabrales PLACA: SZZ-773

PERIODO: SEMANA DEL 10 AL 16 DE 06 AÑO 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	-	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M T		M T		M T		M T		M T		M T		M T	
	[illegible]		Julio		Julio		Julio		Julio		Julio		Julio			
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

PERIODO: SEMANA DEL 17 AL 23 DE 06 AÑO: 2014 KM INICIAL: ___ KM FINAL: ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LLANTES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	[illegible]		[illegible]													
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: ___

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Luis Caballero HORA: PLACA: 577-778

PERIODO: SEMANA DEL 24 AL 30 DE 06 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUTES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, Isodine espuma, Isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA SOAT		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-barometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cintura y cuello	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena de cargue	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		TULIO	TULIO	TULIO	TULIO	TULIO	TULIO	TULIO	TULIO	TULIO	TULIO	TULIO	TULIO		
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: MADELEINE RODRIGUEZ G

Powered by CamScanner

9.3.4 PLANILLA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Jue 6 Junio | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Politica de Seguridad y Vig es para todos

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelaine Rodriguez | Duracion: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José María Salcedo	9.656.888	Auxiliar obra	
2	Luis Fernando Guiza	74862019	Auxiliar	
3	Luis Fernando Leno	1057602737	Cadenero 1	
4	DENIS Guia	79770519	OPICIAL	
5	Adrian David Salazar	1118530260	Auxiliar	
6	Ismael Vasquez Tarazo	1118577095	Auxiliar	
7	Elver Andres Torres	1118569918	Auxiliar	
8	Pablo Bogotá	1002645527	Auxiliar	
9	Victor Vitra	1118 744748	Op. Jagueta	
10	Francisco Quiñez	4245556	Mixto	
11	Raul Roa	4150771	oficial	
12	Dairo Vargas	13485	Of	
13	Alberto Bocanegra	1098 851 924	oficial	
14	Aidan Ortiz Tobaco	1006657607	ayudador	
15	Luis Ruiz Ortiz	74857511	auxiliar	
16	Estiben Aguirre	1007747536	Cadenero	
17	Jorge Reyes M	9'657-771	oficial	
18	Alejandro Duque Arado	1118531038	Auxiliar	
19	Andres Tokes	1118541414	conductor	
20	Yenny Carolina Mitoma	1116492926	controladora	
21	Sharon paipa	7020 660 360	conductor	
22	Ramon Orozco	1115862922	oficial	
23	Wilmer Roa	9670674	OP	
24	Raiso Salas	9'659199	Aux	
25	Diego Mateo Anza	71202787	Aux	
26	Jose Gustavo Chaparro	1002286923	Conductor	
27	Diego Andres Navarro V.	1066720772	Auxiliar	
28	Eisy Mercedes Alvarez	47444746	Ax	
29	Nardo Perez Carreño	3848655	Ayudante	
30	Wilson Padilla	74850237	Cadenero	

Observaciones

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	08-06-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Ma	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOSE JESUS Pinchon	1006406024	Oficial	
2	[illegible]	9432512	oficial	
3	Wilson Andres Cullan G	1118529645	Auxiliar	
4	Wilmer Fernando Vargas P.	1118562092	cabrero	
5	JOSE PINEDO	1116909361	OFICIAL	
6	[illegible]	9530574	conductor	
7	CARLOS HERRERA	1118538787	TOPOGRAFO	
8	Ruben Dario Estupiñan Ortiz	1.118.558074	electricista	
9	Pablo Goldonna	1002645527	Ayudante	
10	SONIA MENDOZA T	1074012418	Auxiliar	
11	LAUDO LUIS CUBILLOS	9.514.047	ING. RESIDENTE	
12	Angelica Rodriguez	1052915878	Topografa	
13	Juan David Rincon mora	1122922193	Auxiliar	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		(Vo.Bo Responsable)

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA	Mar 11 junio 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S)	Los señales de transito se deben respetar.		
PROYECTO	TILODIRAN		
INSTRUCTOR	Heriberto Restrepo	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José María Salcedo	9.656.886	Auxiliar obr	
2	Luis Fernando Cano	7418620 19	Auxiliar	
3	Luis Fernando Ivens Mejía	1057602737	cad. 1	
4	DEIVIS Cano	7770319	oficina	
5	Jaime Quintero	4245556	M/M	
6	Yenifer cardona villegas	1116452926	coordinadora	
7	Adnan David Salazar	1118830260	Auxiliar	
8	Jhonny Vasquez TABORDA	1114577085	Auxiliar	
9	Alejandro Duque	1118531030	Auxiliar	
10	Victor Ortiz	1128714782	Aprendiz SENA	
11	Raul Roa	11507771	oficial	
12	Alban Arin Tobasco	1006857607	auxiliar	
13	LUIS YY ORT.	74857511	AUX	
14	Raiko Galán	9'659.199	AUX	
15	Diego Andres Noriega Ulloa	1060727772	Auxiliar	
16	Alberto Restrepo	1032 851 824	OFICIO	
17	Sargento HUZA	77202787	AUX	
18	Andres Rodriguez	1069154623	TOPOGRAFO	
19	Pablo Gutierrez	1026855574	Dr Hab	
20	Elver Andres Tamayo	1185679178	Auxiliar	
21	Elsy M Arango	42161024 6	Auxiliar	
22	Jorge Mejía	9'637.271	oficio	
23	ONAR VILLAMIZAR	13.425.370	RESIDENTE OBRA	
24	Jose Jesus Bustos	1006406024	Oficial	
25	Wilson Rose	94304.71	OP	
26	Esteban Lozano Ramón	1007747536	Cadenero	
27	Jose pacheco	1116809321	Oficial	
28	Nilson Andres Millan C	1118529643	Auxiliar	
29	Juanfrancisco Arcon	1122922793	Auxiliar	
30	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	

Observaciones

Firma Persona Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	11 - JUNIO 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Los señales de tránsito se deben respetar		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodel	Duración: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Wilmer Fernando Vargas	1118562077	conductor	Wilmer Vargas
2	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538987	TOPOGRAFO	CARLOS H
3	Armando Borda	9432512	oficial	
4	Ricardo pinzon	7029660368	conductor	
5	José Gustavo chaparro	1002726977	Conductor	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-SH-22
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 12-08-2024 | LUGAR:

TEMA(S): Todos los equipos y maquinaria deben ser operados

PROYECTO: Tilodiran

INSTRUCTOR: Madelcine Patiño | Duración: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	CARGO	FIRMA
1	Yeon Karolina Mitchell	1116492926	Controladora	
2	DELVIS BELLO	79770314	OFICIAL	
3	Leiby Fernando Cubillos	74867019	AYUDANTE	
4	Alejandro Ospina	1118531038	Auxiliar	
5	Mauricio Sanchez	1118533957	Aux. Ing.	
6	Cristian Cote	1007540088	Aux. Ing	
7	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	RES. OBRA	
8	Luis Fernando Lemus	1057602737	Cad. 2	
9	Adrian david adarmano	1149530260	Auxiliar	Adriana
10	Jorge Niño	9657.771	Oficio	Jorge
11	ISMAEL VARGAS TAPIERO	1118577095	AUXILIAR	
12	Wilmer Perez	9430674.	operador	
13	Francisco Pinzon	4245550	M/a	
14	Jaime Lopez Ospina	10177529	Op.	
15	Naidy Perez Carreño	33480655	Cadete Edo1	
16	Nestor Ortiz	1118444948	Operador P.	
17	Elver Andres Tarache	1185699719	AUXILIAR	Andres
18	ALBEIRO ESCALANTE	1089 951 829	OFICIAL	
19	Freddy Pacheco	1118531825	oficial	
20	JOSE PACHECO	1116809221	OFICIO	
21	Edilson Izquierdo	1007747536	Cadenero	
22	Rolso Gelvis	91659179	AUX	
23	Pablo Gallardo	1002645527	AUX	
24	Raul Rodriguez	4150721	OFICIAL	
25	Armando Espitia	9432512	oficial	
26	ALDAIR OLIVO TARACHE	1006557607	AUXILIAR	
27	Didier Verga	1214[illegible]	OP	
28	Luis Carlos ortiz	74857591	OPER	
29	Diego Andres Navarro	1066727712	Auxiliar	
30	Jhonatan Rincon	1122922793	auxiliar	

Observaciones: por personal capacitado

Vo.Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR RH 001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Mie 12 Junio HORA:

TEMA(S):

PROYECTO: Arlodinam

INSTRUCTOR: Madeleine Lodoño Duración: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Nilson Andres Millan G	1118729643	Auxiliar	
2	Wilson Padilla.	74860237	Cadenero	Wilson Padilla.
3	Eisy mercedes Alcala	47440746	Auxiliar	Eisy
4	Ignacio Pinto	7020660389	conductor	
5	Jose Gustavo Quintero	1007726773	Conductor	
6	Fabian Mauricio Espinosa C	1.118589071	Electricista	
7	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	Cadenero	Wilmer Vargas
8	CARLOS HERRERA	1118539782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
9	Angelica Rodriguez	1067150730	Topografa	Angelica
10	Jorge Antonio AGUILAR DIAZ	74854382	Ayudante	
11	Rafael Lemos	9139891	Almacen	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	Lun 17 Jun 2024	LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Consecuencias de adelantar en curvas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeline Lounges	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar obra	
2	Adrian David Solorzano	1118530260	Auxiliar	
3	Francisco Quintero	4245546	Alb	
4	Luis Fernando Gilvar	74467014	Ayudar	
5	DEWIS GUIVE	79770319	OFICIAL	
6	Yenit cardona Tobares	1116492926	Contratadora	
7	Diego Andres Ventura V.	1066772192	Auxiliar	
8	Pablo Gaviria	1002645227	Ayudar	
9	Ismael Vasquez Tabares	1118577095	auxiliar	
10	Freddy Cadrey	1118531823	oficial	
11	Nestor Ortiz	1118174778	Op. P.	
12	Armando Cepeda	9932512	oficial	
13	Alejandro Ospina	1118530350	Ayudar	
14	CARLOS ANDRES HERRERA	1118537792	TOPOGRAFO	
15	Alberto Escorcia	1078 851 824	OFICIAL	
16	Angelica Rodriguez	1059154025	TOPOGRAFA	
17	Jaime lopez ayala	10177529	Operador	
18	Jose Pacheco	1116809321	OFICIAL	
19	JORGE MIMO M	9657-771	OBRERO	
20	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
21	Esteven Laguizamon	1007747536	Cadenero	
22	Luis rey oliz.	748575A	Ayud	
23	Aldair Ortega Tabares	1006552607	auxiliar	
24	Jhondavid Rincon	1122922795	auxiliar	
25	James Antonio Aguirre Diaz	74859282	auxiliar	
26	Raelso Galan	9'659199.	AUX	
27	Mauricio Sanchez	1.118533758	AUX	
28	Jhojan David Gomez	1029692224	Aux	
29	Elvis Andres Tamara	1115569913	AUXILIAR	
30	Fabian Morales	1004944750	Auxiliar	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	17-06-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Consecuencias de Adelantar en Curva		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Elsy M. A.	47444074 6	Axial Vial	Elsy A.
2	OMAR VILLANUEVA	13.475.370	RES. OBRA	
3	Rowl Roa	1150771	oficial	
4	Willer Roa	9430674	Operador	
5	Naidu Perez Cayrac	33480631	Auxiliar Vial	
6	Cristian Cote	1007540088	Auxiliar	
7	Luis Fernando lemus	1057602737	Cad. 1	
8	Rafael lemus	91398191	Almacen	
9	Jaime Mariño	74 loc. 97c	Conductor	
10	Camilo Castro Lopez	1094854262	Aux Ing	
11	wilmer fernando Vargas	1118562072	cadenero	wilmer Vargas
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	-	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	Mar 18 Junio 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	NO exceder los limites de velocidad		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar OBC	
2	Luis Fernando Guiza	74862.019	Auxiliar	
3	Yuri Carolina Mikarez	1116451926	Controladora	
4	Adriana David Echeverria	1118530260	Auxiliar	
5	Alberto Escalante	1052 951 924	Oficial	
6	Ismael Vasquez Tabares	1118577085	Auxiliar	
7	Jorge Niño	9'657.771	Oficio	
8	Nestor Ochoa	1118774718	Op. P.	
9	Francisco Quintero	4245554	Hlp	
10	Diego Andres Narvaez V.	1066273772	Auxiliar	
11	Alejandro Rojas A.	1118531038	Auxiliar	
12	Raiso Golon	9'659199	Auxi	
13	Jaime Lopez Oyola	10177576	Operador	
14	De Luis Guna	74770319	Oficial	
15	Freddy Cuchay	1118581825	Oficio	
16	Armando Cepeda	9'432.512	Oficial	
17	Elver Andres Tarache	1118569918	Auxiliar	
18	Omar Villamizar	13.475.370	Ayu. Obra	
19	Luis Hernando Pinto	7730996	conductor	
20	Alicia Ortiz Tabaco	1006567607	auxiliar	
21	Edwin Mario Echeverria	1.118.554.074	electricista	
22	Joseph Chacon	1118809327	OFICIAL	
23	Mauricio Sanchez	1117533958	Aux	
24	Jhayan David Gomez	1020642224	Aux	
25	Javier Antonio Aguirre Diaz	74854382	auxiliar	
26	Luis Rey Ortiz	74857511	aux	
27	Raul Roa	4150771	oficial	
28	Naidu Perez Castaño	33980635	Controlador Vial	
29	William Rojas	94306744	operador	
30	Fayder Morales	1006944750	Auxiliar	

Observaciones

V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	19-06-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	No exceder los limites de velocidad		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Magdaleine Rodriguez	Duracion: (Mi	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Wilson Andres Millan G	1118829643	1118529643	
2	Estiven Izquizamón	1007747536	Cadenero	
3	PABLO GUATIBANZA	1002665 C7	AUXILIAR	
4	Luis Fernando Lemus Mejia	1057602 737	Cod. 1	
5	Cristian Cote	1007540088	Auxiliar	
6	Eloy mercedes Ruiz	4744074 6	Auxiliar civil	
7	Rafael Lemus	9'399191	Almacen	
8	Jhonderd Rincon	1119 922793	Auxiliar	
9	JOSE ANTONIO LARGO SA	1116545986	AUXILIAR	
10	wilmer Fernando Vargas	1118562072	cadenero	
11	Jose Gustavo Moreno	1002726873	Conductor	
12	Jhonatan mejia	7020660360	conductor	
13	ANDRES TORRES	1115854144	conductor	
14	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Firma Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	Viar 21 jun 2024	LUGAR	
TEMA(S):	Inspecciones e instrucciones de vehiculos livianos		
PROYECTO:	Aeropuerto		
INSTRUCTOR:	Facilitador Cedrys	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JOSE Maria Salcedo	9.656.886	Auxiliar	
2	Aidan Ortiz Tobaco	1006557607	Auxiliar	
3	Adan david zabaleta A.	1118530260	Auxiliar	
4	Luis Fernando Galan	7486709	Auxiliar	
5	Ismael Vargas Tapias	1114617005	Auxiliar	
6	Joyce Niño M	9'657.971	Auxiliar	
7	Eduardo Ortiz A	1114531038	Auxiliar	
8	Yeraldy Carolina Quintero	1114492976	Controladora	
9	Nestor Ortiz	1118754776	Aux	
10	Francisco Quintero	4265556	Aux	
11	Elver Andres Tinoco	1118569918	Auxiliar	
12	Naida Perez Carreño	39980635	Controladora Vial	
13	Alberto Escalante	1082 991 829	OFICIAL	
14	Fauder Morales	1006944350	Auxiliar	
15	Diego Andres Narvaez V.	1066777792	Auxiliar	
16	Raiso Galan	9'659199	Auxiliar	
17	Jaime Lopez Ayala	1017 7529	Operador	
18	Didier Vargas	13486960	OP	
19	Javier Antonio Aguirre Diaz	74859382	Auxiliar	
20	Nilson Andres Millan Granado	1118529643	Auxiliar	
21	Jhonatan Rincon	77/2 922 193	Auxiliar	
22	Ravi Roa	4150774	Oficial	
23	Mauricio Sanchez	1118335958	Aux	
24	OMAR VILLAMIZAR	13 475 370	CEO OBRA	
25	José Antonio Vargas A.	1196545756	Auxiliar	
26	Jhojan David Gomez	1024042224	Aux	
27	Wilson Pedrilla	74860231	cadenero	
28	Eiby Mercado	4744402746	A + A	
29	Armando Garcia	94-37517	Oficial	
30	Cristian Cote	1001640088	Auxiliar	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	21-06-2024	LUGAR:	
TEMA(S):	Inspecciones e instructivos vehiculos livianos		
PROYECTO:	Modulacion		
INSTRUCTOR:	Madelaine Rodriguez	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Freddy Cachay	1118531825	Oficial	
2	Rafael Lopez	9398191	Almacen	
3	Luis Fernando Lemus	1059602737	Cad 1	
4	Esteiver Legarda Moreno	1007747536	Cadenero	
5	Wilder Perez	94306774	Operador	
6	Wilmer Fernando Vargas P.	1118562072	cadenero	
7	Jose Pacheco	1116893121	OFICIN	
8	Pablo Gualtero	1002645527	AUXILIA	
9	Jose Esteiva Chaparro	1002226773	Conductor	
10	Yhonata Rojas	1.124.620.260	Conductor	
11	WILDER TORRES	1115854144	conductor	
12	Raul Mario Echeverria C	1.118.559.074	electricista	
13	Jaime Mariño	74.186.976	conductor	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: jue 27 / 2024 LUGAR:

TEMA(S): Uso obligatorio del cinturon de seguridad

PROYECTO: Olivam

INSTRUCTOR: Marlene Pabon Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José Maria Salcedo	9.656.888	Mst OBra	
2	Ivan Carolina Mateus	1116497926	controladora	
3	Francisco Peñaloza	4245558	Albañil	
4	Ismael Vasquez Tarazona	1118577085	Auxiliar	
5	Luis Fernando Galvis	74.869.017	Aux Obra	
6	[illegible]	102964695	Ayudante	
7	Estiven Izquierdo	1007747536	Cadenero	
8	Wilmer Mora	91306744	Operador	
9	Ruben Dario Sotopinca	1.118.554.074	Electricista	
10	Deivis Grimp	79770519	Oficial	
11	Oscar Villamizar	13.475.370	Rep. Obra	
12	Jorge Mino M	9'657.771	oficial	
13	Alexander Ortega Alvarado	1118591038	Auxiliar	
14	Freddy Cuchaya	1118581825	oficial	
15	Armando Cepeda	9.432.512	oficial	
16	Jhoan Mendoza	1118550220	Obrero	
17	Alvaro Ortiz Tarazona	1006557607	Auxiliar	
18	Jose Jesus Arenas	1006110824	Cof	
19	Luis Rey Ot	74857511	Aux.	
20	Josafat Checo	1118809724	Oficial	
21	Diogenes Ariza	1102487	Aux	
22	Elkin Andres Tarazona	1118509118	Auxiliar	
23	Jhon Tapia	74956132	Op.	
24	Fredes Morales	1069447210	Aux.	
25	Jairo Antonio Aguirre	7a854382	Auxiliar	
26	Didimo Vargas	13485962	Aux	
27	Jonathan Rincon	1122 922 797	Auxiliar	
28	Alfonso Estupiñan	1088 951 824	Oficial	
29	Raul Koa	1130741	Oficial	
30	Jhon Andres Ibarra	1066727727	Auxiliar	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros ☐

FECHA:		LUGAR:	
TEMA(S):			
PROYECTO:			
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Nardi Perez Carreño	33180635	Conductor Vial	
2	Wilmer Fernanda Vargas	1118562072	Cadenero	
3	Mauricio Jaramillo	1007533958	Aux	
4	Nilson andres Millan G	1118574647	Aux	
5	Rolso Golon	9'659 199	Aux	
6	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
7	Nestor Soto	[illegible]	Operador	
8	Jaime lopez ayala	10197528	Excavador	
9	CARLOS HERRERA	1118538790	TOPOGRAFO	
10	Angelica Rodriguez	1069152028	Topografa	
11	Eisy mercedes Alarcon	1124640746	Auxiliar	
12	Cristian Gil	1007540888	Auxiliar	
13	Jose Gustavo chaparro	1002226973	Conductor	
14	Alfonso cardozo	95310574	Cadenero	
15	Jhojan David Gomez	1024642729	Aux Gb	
16	Rafael Lemus	91398191	Almacen	
17	Andres Torres	1115851144	Conductor	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	Vier 28 - 2024	LUGAR	
TEMA(S):	No usar el celular mientras conduce		
PROYECTO:	Talanian		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	José María Salcedo	9.656.888	Dir. Obra	
2	Estiben Izquierdo	1007747536	Conductor	
3	Yenny carolina mojarro	1126492926	Contratista	
4	Luis Fernando Guiza	74862619	Auxiliar	
5	Jeniel Vasquez Tarazo	1118577085	Auxiliar	
6	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	Res. Obra	
7	Alberto Escalante	1092 851 821	OFICIAL	
8	Nestor Ortiz	[illegible]	Operador	
9	DENIS GAINA	76770319	OFICIAL	
10	Francisco Quintero	[illegible]	Alm	
11	Jaime Lopez Ovalle	10177529	Operador	
12	Wilmer Rojas	9430674	Operador	
13	Alexander Perez Carrero	35480535	Controlador Vial	
14	Dicijen Vargas	1.7.86960	OP	
15	Alejandro Ospino	1118531036	Auxiliar	
16	Eladio Andres Ramirez	1118569918	Auxiliar	
17	Jose Tapia	74858132	OP.	
18	Jhonatan Pinzon	1122 922 793	Auxiliar	
19	Dagoberto ARIZA	77 201 487	Aux	
20	Jose Jesus Pinzon	1006 106 099	OF	
21	Fernando Cepeda	9432512	oficial	
22	Juan Antonio Aguirre	1085943 82	Auxiliar	
23	Rolso Galan	9'659 199	Aux	
24	Jose Pacheco	1168093 21	OFICINISTA	
25	Jorge Alberto U.	1118550230	Aux	
26	Yhon Alberto Castillo	1029611095	Auxiliar	
27	Fredy Pachay	1118531825	Oficial	
28	Jairo NIÑO	9657.771	oficina	
29	Cinojun david Gomez	1029542214	Aux Obra	
30	Cristian Cote	1007510088	Auxi	

Observaciones	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	
TEMA(S):			
PROYECTO:			
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Diego Andres [illegible]	1066[illegible]	Auxiliar	
2	Aldair Ortiz Tabaco	1006557607	Ayudia	
3	[illegible]	71[illegible]	conductor	
4	Alfonso Cardona	9530574.	conductor	
5	Rafael Jemez	9'398191	Almacen	
6	Andrea Rodriguez	1 G C9 [illegible]	Topografa	
7	Raul Rodr	4150271	OFICIAL	
8	Eisy Alexandra Alonso	47440746	Ejecutiva	
9	Jose Gustavo Chupuno	1002726923	conductor	
10	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
11	Fredy Montes	1006944750	Aux.	
12	Wilmar Fernando Vargas	1118562077	Cadenero	
13	Luis Rey Ortiz	74857511	Ocl	
14	Mauricio Sanchez	1118537988	Aux	
15	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
16	Jaime Marino	71.186976	Conductor	
17	Nilson andres mesa G	1118529643	Aux	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

9.3.5 PLANILLA NOMINA CONTROLADORES VIALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com



SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-30 DE JUNIO DE 2024 - TILODIRAN

9.3.6 PERMISO CIERRE TEMPORAL DE VIAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synerg@aconstrucciones@gmail.com

RESOLUCIÓN

1160.173.

RESOLUCIÓN No. 05013 DEL 26 DE ABRIL DE 2024

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024, y se dictan otras disposiciones"

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3, Modificado por el Artículo 2º de la Ley 1383 de 2010. **Autoridades de tránsito.** Para los efectos de la presente Ley entiéndase autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, **los organismos de tránsito de carácter** Departamental, **Municipal** o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5ºde este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Que el título III, capítulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades. Expresa: sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos, así mismo, en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones son de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010, determina que en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, sin embargo, están sujetos a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes; igualmente le otorga al Ministerio de Transporte por ser la autoridad suprema de tránsito, la facultad de definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Título III, **NORMAS DE COMPORTAMIENTO** - Capítulo VIII Trabajos eventuales en la vía Pública, **Artículo 101.** Normas para realizar trabajos en vía pública. Enuncia: Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de

tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de transito competente. Asi mismo en el **Artículo 102. Manejo de escombros.** Establece: Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Que, para el cierre temporal de las vías urbanas del municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el **"MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA"**, que reglamenta los dispositivos temporales para el control en calles y carreteras, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015.

Que le corresponde a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución, que se deban otorgar por las demás autoridades competentes, toda vez que la competencia de la Secretaria de Movilidad para otorgar el permiso de ocupación comprende única y exclusivamente a los tramos de vías descritas y a las obras descritas.

Que la Secretaria de Movilidad de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento del tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad de las demás personas que circulen por el Municipio, asi como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en el Departamento

Que el Código Nacional de Policía y Convivencia, Titulo XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA. Establece en el Artículo 135, (corregido por el art. 10 del Decreto Nacional 555 de 2017): **Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.** "Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.

23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

Que la Secretaría de Movilidad de Yopal expidió el acto administrativo No. **03047 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024, "Por la cual se concede permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

Que, el día 23 de Abril de 2024, mediante radicado No. 2024117782, la Señora **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, en calidad de representante legal de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, contratista de la **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P**, con contrato de Obra No. 032 de 2023, allega a la secretaria de Movilidad de Yopal, un oficio en donde se realiza un ajuste a las direcciones de intervenciones faltantes del contrato de Obra, donde se relacionan y describen en las siguientes Condiciones.

ACTIVIDAD	FECHAS	HORARIOS
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"	26 de Abril de 2024 hasta 20 de Agosto de 2024	**Horarios Diurnos** Lunes a Sábado: 06:00 am a las 18:00 pm **Horarios Nocturnos** Dependiendo del cronograma de Obra, que está variando de acuerdo a las condiciones climáticas y avances de obra, desde las 08:00 pm a las 02:00 am del siguiente día
CIERRES TOTALES Y TEMPORALES DE VIAS		

No TRAMO	SUBTRAMO	VIAS A INTERVENIR	FECHA DE INTERVENCION	TIPO DE CIERRE
1	1	CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	20 FEBRERO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
2	2	CALLE 1 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	20 FEBRERO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
3	3	CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	01 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
4	4	CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	20 JUNIO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
5	5	CALLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	30 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
6	6	CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	15 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
7	7	CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	01 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
8	8	CALLE 5 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	30 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
9	9	CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	30 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
10	10	CALLE 5 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	20 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
11	11	CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	20 JULIO AL 20 SEPTIEMBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
12	12	CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3	20 JULIO AL 20 SEPTIEMBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
13	13	CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	20 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE	PARCIAL - TOTAL
14	14	CARRERA 4 ENTRE VIA LOS MANGOS Y CALLE 2	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
15	15	CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
16	16	CARRERA 5 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
17	17	CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
18	18	VIA AGUALINDA DESDE LA ENTRADA PLANTA DE TRATAMIENTO A CARRERA 4	20 FEBRERO AL 20 ABRIL 2024	PARCIAL - TOTAL

CIERRES DE ACCESOS DE VÍAS VEREDALES

Ruta de Acceso hacia la Vereda Los Mangos, correspondiente a: Calle 2 entre la Via Yopal – Algarrobo Carrera 3 entre Calle 2 y Calle 1 y se toma la Via a los Mangos	HORARIOS DE TRAFICO PESADO **Lunes a Viernes** 09:00 am a 11:00 am y 03:00 pm a 5:00 pm **Sabados** 09:00 am a 11:00 am

Nota 1: Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vias quedaran habilitadas para su circulación normal.

Nota 2: Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios que estén relacionados dentro del centro educativo.

Nota 3: Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la Secretaría de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

Nota 4: El suministro de materiales para una obra y el transporte de escombros, se deberá programar durante horas no pico del día y preferiblemente en horas nocturnas, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito.

Nota 5: Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la Secretaria de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

Nota 6: El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizará los ingresos y salidas de los vehículos.

Nota 7: Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, telefonía, alcantarillado y otros; en las zonas a intervenir y aledaña a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario modificar la resolución No. **03047 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024**, tanto de la parte considerativa como la parte resolutiva en lo que respecta a las direcciones establecidas para los Cierres de Vías del Centro Poblado de Tilodiran y los Cierres de Accesos de Vías Rurales del Municipio de Yopal a intervenir, según soporte del Plan de Manejo de Transito, allegado por el contratista **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, con sus respectivos ajustes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFIQUESE el Articulo 1 de la Resolución No. 03047 del 09 de Febrero de 2024, el cual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, para que establezca medidas de regulación del tránsito para los cierres de Vías del Centro Poblado de Tilodiran y Cierre de accesos de Vías Veredal hacia Los Mangos, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución desde el 26 de Abril de 2024 hasta el 20 de Agosto de 2024, para que realice las actividades de **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dentro de las direcciones, fechas y horarios mencionadas anteriormente, tendientes a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de los usuarios, como se indica a continuación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la Secretaría de Movilidad de Yopal, ejercerá visitas técnicas a través de un funcionario para la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo los términos del presente acto administrativo. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, y los funcionarios supervisores de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga el presente acto administrativo.

PARARAFO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

849

PARAGRAFO CUARTO: La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, deberá informar a la secretaria de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 03047 del 09 de Febrero de 2024, continúan vigentes.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los Veintiséis (26) días del mes de Abril de 2024.

NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ
Secretario de Movilidad de Yopal

Elaboro: JUAN MANUEL HOLGUIN
Cargo: Profesional Contratado

Reviso: ANDREA ESTEFANIA JIMENEZ VARGAS
Cargo: Profesional Universitario

SECRE... TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
NOTIFICACIÓN PERSONAL
El señor MARIA O. BARRERA A. Se Hizo Presente
En Este Despacho El Dia 22 Del Mes MAY Del Año 2024
Quien se Identifico Con La C.C. No. 47.436.168
Expedida En Yopal
Quien Se Notifica De La Resolución No. 05013
De Fecha 26 ABR 2024
EL NOTIFICADO
LA SECRETARIA

TELEFONO CONMUTADOR (98 + 8) 6346913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co
