26	AGOSTO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL

NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ADICIÓN N°1
PRESUPUESTO VERSION 1
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES							
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	1869,00	$ 1.502.676	0,00	1869,00	$ 1.502.676
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	119,00	$ 4.597.922	0,00	119,00	$ 4.597.922
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	1139,00	$ 5.762.201	0,00	1139,00	$ 5.762.201
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	819,00	$ 42.406.182	0,00	819,00	$ 42.406.182
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	129,00	$ 5.103.498	0,00	129,00	$ 5.103.498
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES			0				0
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	1869,00	$ 2.919.378	0,00	1869,00	$ 2.919.378
3	PAVIMENTOS			0				0
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	230,00	$ 25.853.840	0,00	230,00	$ 25.853.840
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	158,00	$ 368.772	0,00	158,00	$ 368.772
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	1869,00	$ 6.033.132	0,00	1869,00	$ 6.033.132
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	1869,00	$ 15.536.997	0,00	1869,00	$ 15.536.997
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	1869,00	$ 126.155.631	0,00	1869,00	$ 126.155.631
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	450,00	$ 2.418.750	0,00	450,00	$ 2.418.750
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	433,00	$ 31.887.419	0,00	433,00	$ 31.887.419
8	ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS			0				0
8.2	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	$ 780.494	2,00	$ 1.560.988	0,00	2,00	$ 1.560.988
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 658.872	5,00	$ 3.294.360	0,00	5,00	$ 3.294.360
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	6,00	$ 10.356.174	0,00	6,00	$ 10.356.174
8.6	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	$ 118.166	6,00	$ 708.996	0,00	6,00	$ 708.996
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	136,00	$ 6.613.136	0,00	136,00	$ 6.613.136
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	213,00	$ 20.260.986	0,00	213,00	$ 20.260.986
8.13	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	$ 89.486	4,00	$ 357.944	0,00	4,00	$ 357.944
9,1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36"	ML	$ 12.043	263,00	$ 3.167.309	0,00	263,00	$ 3.167.309
9,2	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 18.589	263,00	$ 4.888.907	0,00	263,00	$ 4.888.907
9,3	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 19.995	93,00	$ 1.859.535	0,00	93,00	$ 1.859.535
9,5	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	17,00	$ 831.793	0,00	17,00	$ 831.793

26	AGOSTO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL

NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ADICIÓN N°1
PRESUPUESTO VERSION 1
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	467,00	$ 88.522.652	0,00	467,00	$ 88.522.652
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforacion y accesorios suministro e inyeccion de cal comercial al 6%)	ML	$ 161.190	630,00	$ 101.549.700	0,00	630,00	$ 101.549.700
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	411,00	$ 226.044.657	0,00	411,00	$ 226.044.657
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	93,00	$ 98.666.211	0,00	93,00	$ 98.666.211
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	112,00	$ 125.844.096	0,00	112,00	$ 125.844.096
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	279,00	$ 30.749.427	0,00	279,00	$ 30.749.427
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	1501,00	$ 5.224.981	0,00	1501,00	$ 5.224.981
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	22,00	$ 1.735.228	0,00	22,00	$ 1.735.228
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	UN	$ 200.188	4,00	$ 800.752	0,00	4,00	$ 800.752
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	3,00	$ 10.335.000	0,00	3,00	$ 10.335.000
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	65,00	$ 4.227.860	0,00	65,00	$ 4.227.860
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	115,00	$ 19.345.990	0,00	115,00	$ 19.345.990
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	50,00	$ 8.086.150	0,00	50,00	$ 8.086.150
NP-27	DEMOLICIÓN DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	$ 596.585	2,00	$ 1.193.170	0,00	2,00	$ 1.193.170
NP-28	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 53.743	431,00	$ 23.163.233	0,00	431,00	$ 23.163.233
NP-29	INSTALACIÓN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	115,00	$ 2.752.985	0,00	115,00	$ 2.752.985
NP-32	CONEXIONES KIT SILLA YEE 10" x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 277.922	22,00	$ 6.114.284	0,00	22,00	$ 6.114.284
NP-33	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	$ 189.054	3,00	$ 567.162	0,00	3,00	$ 567.162
NP-34	SUMIDERO PREFABRICADO RL-83	UN	$ 940.001	2,00	$ 1.880.002	0,00	2,00	$ 1.880.002
NP-35	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:3 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	$ 528.200	8,00	$ 4.225.600	0,00	8,00	$ 4.225.600

26	AGOSTO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL

NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ADICIÓN N°1
PRESUPUESTO VERSION 1
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
NP-36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 A 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	UN	$ 1.400.000	17,00	$ 23.800.000	0,00	17,00	$ 23.800.000
NP-37	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL SECO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 63.275	773,00	$ 48.911.575	0,00	773,00	$ 48.911.575
NP-38	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL CON ALTO GRADO DE HUMEDAD, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 79.141	863,00	$ 68.298.683	0,00	863,00	$ 68.298.683
					$ 1.226.485.924			**$ 1.226.485.924,00**
OTROS					**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694		$ 34.411.347,22	$ 0,00	$ 34.411.347,22	$ 34.411.347,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 91.763.592,38	$ 0,00	$ 91.763.592,38	$ 91.763.592,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00469229838386%	$ 12.322.409,62	$ 0,00	$ 12.322.409,62	$ 12.322.410,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 24.644.819,56	$ 0,00	$ 24.644.819,56	$ 24.644.820,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 24.644.819,56	$ 0,00	$ 24.644.819,56	$ 24.644.820,00
	SUBTOTAL OTROS				**$ 187.786.988,00**			**$ 187.786.989,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 301.838.186	$ 0,00	$ 301.838.186,00	$ 301.838.186,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 12.264.859	$ 0,00	$ 12.264.859,00	$ 12.264.859,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 61.324.296	$ 0,00	$ 61.324.296,00	$ 61.324.296,00
	SUBTOTAL AIU	30,61%			**$ 375.427.341,00**			**$ 375.427.341,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 1.789.700.253,00**			**$ 1.789.700.254,00**
	TOTAL A FACTURAR				**$ 1.789.700.253,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**$ 1.789.700.253,00**			

BALANCE DEL CONTRATO				%EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL	%EJECUTADO RESPECTO AL VALOR ADICIÓN N°1	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 5.457.427.612,00**					
ADICIÓN N°1	$ 2.673.333.000,00		$ 1.789.700.253,00	66,95%		
VALOR TOTAL	**$ 8.130.760.612,00**			0,00%		
				0,00%		
				0,00%		
				0,00%		
				0,00%		
				0,00%		
				0,00%		
VALOR POR EJECUTAR		**$ 883.632.747,00**	**$ 1.789.700.253,00**	**66,95%**	**33,05%**	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de

VALOR TOTAL: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE.

VEINTISEIS (Día en letras) | (26) (Día en números) | días del mes de | AGOSTO de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

26	AGOSTO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
DD	MM	AA			

CONTRA1 552-2024

CIV 13000744
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 551,28 m2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES						-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	551,28	$ 443.229	0,00	551,28	$ 443.229
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	45,30	$ 1.750.301	0,00	45,30	$ 1.750.301
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	340,11	$ 1.720.616	0,00	340,11	$ 1.720.616
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES					0	-	
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	551,28	$ 861.099	0,00	551,28	$ 861.099
3	PAVIMENTOS					0	-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	71,67	$ 8.056.281	0,00	71,67	$ 8.056.281
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	551,28	$ 1.779.532	0,00	551,28	$ 1.779.532
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	551,28	$ 4.582.791	0,00	551,28	$ 4.582.791
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	551,28	$ 37.210.849	0,00	551,28	$ 37.210.849
4	ESPACIO PUBLICO				0	0	-	
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	146,00	$ 784.750	0,00	146,00	$ 784.750
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	146,00	$ 10.751.878	0,00	146,00	$ 10.751.878
8	ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS				0	0	-	
8.1	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 190.598		$ 0	0,00		$ 0
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	2,00	$ 3.452.058	0,00	2,00	$ 3.452.058
8.6	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	$ 118.166	2,00	$ 236.332	0,00	2,00	$ 236.332
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	35,00	$ 1.701.910	0,00	35,00	$ 1.701.910
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	76,34	$ 7.261.613	0,00	76,34	$ 7.261.613
9	VARIOS				0	0	-	
9,1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36"	ML	$ 12.043	76,34	$ 919.363	0,00	76,34	$ 919.363
9,2	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE	ML	$ 18.589	76,34	$ 1.419.084	0,00	76,34	$ 1.419.084
9,5	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	6,00	$ 293.574	0,00	6,00	$ 293.574
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	-	
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	137,82	$ 26.124.608	0,00	137,82	$ 26.124.608
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	99,23	$ 54.575.210	0,00	99,23	$ 54.575.210
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	27,56	$ 29.239.148	0,00	27,56	$ 29.239.148

26	AGOSTO	2025	**CONSORCIO TEUSAVIAL**	
DD	MM	AA	**NIT: 901.902.101-5**	

CONTRATO 552-2024

CIV 13000744
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 551,28 m2

NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	33,08	$ 37.168.953	0,00	33,08	$ 37.168.953
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	68,71	$ 7.572.735	0,00	68,71	$ 7.572.735
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	551,28	$ 1.919.006	0,00	551,28	$ 1.919.006
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	10,00	$ 788.740	0,00	10,00	$ 788.740
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	3,00	$ 10.335.000	0,00	3,00	$ 10.335.000
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	14,40	$ 936.634	0,00	14,40	$ 936.634
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	35,84	$ 6.029.220	0,00	35,84	$ 6.029.220
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	16,00	$ 2.587.568	0,00	16,00	$ 2.587.568
NP-29	INSTALACIÓN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	35,84	$ 857.974	0,00	35,84	$ 857.974
NP-32	CONEXIONES KIT SILLA YEE 10" x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 277.922	10,00	$ 2.779.220	0,00	10,00	$ 2.779.220
NP-33	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	$ 189.054	3,00	$ 567.162	0,00	3,00	$ 567.162
NP-34	SUMIDERO PREFABRICADO RL-83	UN	$ 940.001	2,00	$ 1.880.002	0,00	2,00	$ 1.880.002
NP-35	CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:3 con arena de río y triturado de 3/4")	M3	$ 528.200	8,00	$ 4.225.600	0,00	8,00	$ 4.225.600
NP-36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 A 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	UN	$ 1.400.000	6,00	$ 8.400.000	0,00	6,00	$ 8.400.000
NP-37	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL SECO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 63.275	265,29	$ 16.786.225	0,00	265,29	$ 16.786.225
					$ 316.695.377			**$ 316.695.377,00**

OTROS					**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**$ 15.909.070,00**			**$ 15.909.070,00**
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**$ 96.940.455,00**			**$ 96.940.455,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 429.544.902,00**			**$ 429.544.902,00**
	TOTAL A FACTURAR				**$ 429.544.902,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**$ 429.544.902,00**			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo

VEINTISEIS (Día en letras) (26) (Día en números) días del mes de AGOSTO de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

26	AGOSTO	2025	**CONSORCIO TEUSAVIAL**	
DD	MM	AA	**NIT: 901.902.101-5**	

CONTRATO 552-2024

CIV 13000744
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024


OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 551,28 m2

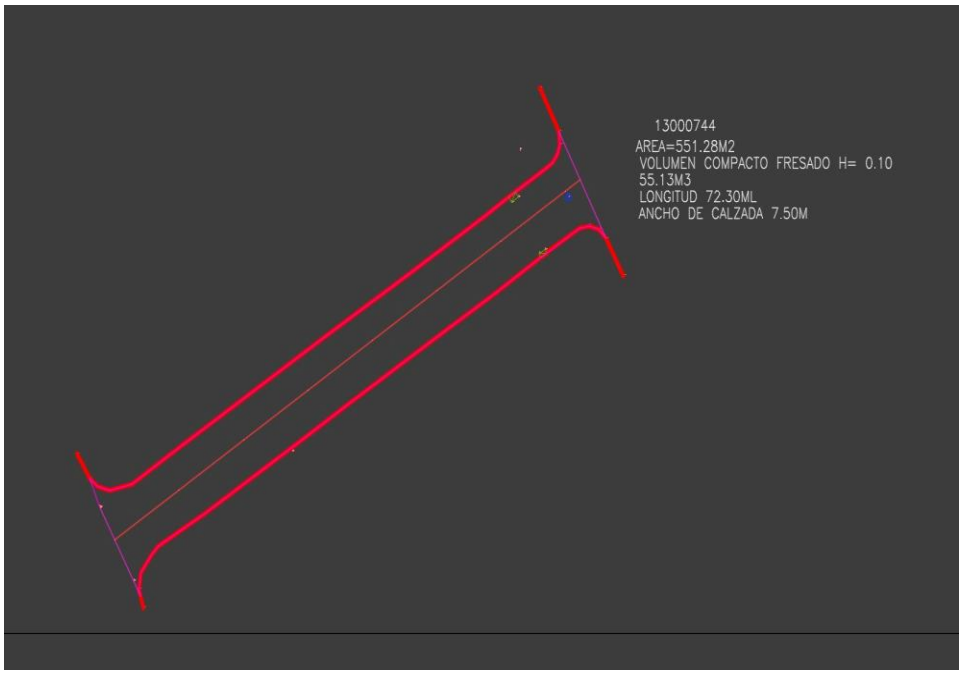

72,30	0,25	0,10	3,62	SARDINEL AMBOS COSTADOS
3,75	0,80	0,90	27,00	DOMICILIARIAS-10 APROX
1,20	0,90	0,80	1,73	SUMIDERO 2 UND
7,20	1,00	0,90	12,96	TUBERIA SUMIDERO X 2 UND
			45,303	**TOTAL**

26	AGOSTO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
DD	MM	AA		

CONTRATO 552-2024

CIV 13000744
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 551,28 m2

Ilustración 11. Estructura de pavimento recomendada para intervención

Especificación IDU	Capa	Espesor
620-18	Concreto asfáltico MD19, asfalto CA-14	5 cm
611-18	Riego de liga, emulsión CRR-1	-
620-18	Concreto asfáltico MD25, asfalto CA-14	6 cm
610-18	Imprimación, emulsión CRL-1	-
520-18	Base granular AR_BG38 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo liquido iónico (1,0 l/m^3)	18 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18	Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-

Fuente: Elaboración propia

26	AGOSTO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL

NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

CIV 13001489
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 460,72 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES						-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	460,72	$ 370.419	0,00	460,72	$ 370.419
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	37,36	$ 1.443.516	0,00	37,36	$ 1.443.516
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	276,43	$ 1.398.459	0,00	276,43	$ 1.398.459
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	407,93	$ 21.121.800	0,00	407,93	$ 21.121.800
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	27,64	$ 1.093.494	0,00	27,64	$ 1.093.494
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES						-	
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	460,72	$ 719.645	0,00	460,72	$ 719.645
3	PAVIMENTOS						-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	55,29	$ 6.215.038	0,00	55,29	$ 6.215.038
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	14,30	$ 33.376	0,00	14,30	$ 33.376
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	460,72	$ 1.487.204	0,00	460,72	$ 1.487.204
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	460,72	$ 3.829.965	0,00	460,72	$ 3.829.965
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	460,72	$ 31.098.139	0,00	460,72	$ 31.098.139
4	ESPACIO PUBLICO				0,00	0,00	-	
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	129,80	$ 697.675	0,00	129,80	$ 697.675
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	129,80	$ 9.558.861	0,00	129,80	$ 9.558.861
8	ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS					0	-	
8.2	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	$ 780.494	2,00	$ 1.560.988	0,00	2,00	$ 1.560.988
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 658.872	2,30	$ 1.515.406	0,00	2,30	$ 1.515.406
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	1,00	$ 1.726.029	0,00	1,00	$ 1.726.029
8.6	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	$ 118.166	1,00	$ 118.166	0,00	1,00	$ 118.166
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	44,00	$ 2.139.544	0,00	44,00	$ 2.139.544
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	64,90	$ 6.173.418	0,00	64,90	$ 6.173.418
8.13	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	$ 89.486	1,00	$ 89.486	0,00	1,00	$ 89.486
9	VARIOS				0,00	0,00	-	
9,1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36"	ML	$ 12.043	69,00	$ 830.967	0,00	69,00	$ 830.967
9,2	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 18.589	69,00	$ 1.282.641	0,00	69,00	$ 1.282.641
9,5	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	5,00	$ 244.645	0,00	5,00	$ 244.645
	ITEMS NO PREVISTOS						-	
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	115,18	$ 21.833.060		115,18	$ 21.833.060

26	AGOSTO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL

NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

CIV 13001489
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 460,72 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforacion y accesorios suministro e inyeccion de cal comercial al 6%)	ML	$ 161.190	350,00	$ 56.416.500		350,00	$ 56.416.500
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	110,57	$ 60.812.063		110,57	$ 60.812.063
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	23,04	$ 24.443.758		23,04	$ 24.443.758
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	27,64	$ 31.056.525		27,64	$ 31.056.525
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	79,80	$ 8.794.997		79,80	$ 8.794.997
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	460,72	$ 1.603.766		460,72	$ 1.603.766
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	un	$ 200.188	4,00	$ 800.752		4,00	$ 800.752
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	16,00	$ 1.040.704		16,00	$ 1.040.704
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	27,65	$ 4.651.449		27,65	$ 4.651.449
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	16,80	$ 2.716.946		16,80	$ 2.716.946
NP-27	DEMOLICIÓN DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	$ 596.585	2,00	$ 1.193.170		2,00	$ 1.193.170
NP-28	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 53.743	227,00	$ 12.199.661		227,00	$ 12.199.661
NP-29	INSTALACIÓN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	27,65	$ 661.913		27,65	$ 661.913
NP-36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 A 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	UN	$ 1.400.000	5,00	$ 7.000.000		5,00	$ 7.000.000
NP-37	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL SECO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 63.275	192,31	$ 12.168.415		192,31	$ 12.168.415
NP-38	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL CON ALTO GRADO DE HUMEDAD, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 79.141	215,62	$ 17.064.382		215,62	$ 17.064.382
					$ 359.206.942			**$ 359.206.942,00**

OTROS					VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00469229838386%	$ 3.608.924,00	$ 0,00	$ 3.608.924,00	$ 3.608.924,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 7.217.849,00	$ 0,00	$ 7.217.849,00	$ 7.217.849,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 7.217.849,00	$ 0,00	$ 7.217.849,00	$ 7.217.849,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**$ 18.044.622,00**			**$ 18.044.622,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 88.400.828	$ 0,00	$ 88.400.828,00	$ 88.400.828,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 3.592.069	$ 0,00	$ 3.592.069,00	$ 3.592.069,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 17.960.347	$ 0,00	$ 17.960.347,00	$ 17.960.347,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**$ 109.953.244,00**		**$ 109.953.244,00**	**$ 109.953.244,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 487.204.808,00**		**$ 487.204.808,00**	**$ 487.204.808,00**
	TOTAL A FACTURAR				**$ 487.204.808,00**		**$ 487.204.808,00**	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo

VEINTISEIS (Día en letras) (26) (Día en números) días del mes de AGOSTO de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

26	AGOSTO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
DD	MM	AA	**NIT: 901.902.101-5**	

CONTRATO 552-2024

CIV 13001489
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 460,72 M2



EXCAVACIÓN MEDIDAS APROXIMADAS

71,35	0,25	0,10	3,57 SARDINEL AMBOS COSTADOS
3,58	0,80	1,10	25,17 DOMICILIARIAS-6 APROX
			28,74 TOTAL

26	AGOSTO	2025	**CONSORCIO TEUSAVIAL**	
DD	MM	AA	**NIT: 901.902.101-5**	

CONTRATO 552-2024

CIV 13001489
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 460,72 M2

Ilustración 13. Estructura de pavimento recomendada para intervención

Especificación IDU	Capa	Espesor
620-18	Concreto asfáltico MD19, asfalto CA-14	5 cm
611-18	Riego de liga, emulsión CRR-1	-
620-18	Concreto asfáltico MD25, asfalto CA-14	6 cm
610-18	Imprimación, emulsión CRL-1	-
520-18	Base granular AR_BG38 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo liquido iónico (1,0 l/m^3)	24 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18	Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-
231-18	Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m	100 cm

Fuente: Elaboración propia

ENTIBADO				
LARGO	ANCHO			
1489	71,00	1,6	227,2	AMBOS COSTADOS

26	AGOSTO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL

NIT: 901.902.101-5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

CONTRAT 552-2024

CIV 13001461
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 368,1 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**						-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	368,10	$ 295.952	0,00	368,10	$ 295.952
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	28,59	$ 1.104.660	0,00	28,59	$ 1.104.660
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	287,67	$ 1.455.323	0,00	287,67	$ 1.455.323
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	411,14	$ 21.288.007	0,00	411,14	$ 21.288.007
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	22,08	$ 873.529	0,00	22,08	$ 873.529
2	**RELLENOS CAPAS GRANULARES**						-	
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	368,10	$ 574.972	0,00	368,10	$ 574.972
3	**PAVIMENTOS**						-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	44,17	$ 4.965.061	0,00	44,17	$ 4.965.061
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	14,20	$ 33.143	0,00	14,20	$ 33.143
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	368,10	$ 1.188.227	0,00	368,10	$ 1.188.227
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	368,10	$ 3.060.015	0,00	368,10	$ 3.060.015
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	368,10	$ 24.846.382	0,00	368,10	$ 24.846.382
4	**ESPACIO PUBLICO**				0	0	-	
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	81,80	$ 439.675	0,00	81,80	$ 439.675
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	81,80	$ 6.023.997	0,00	81,80	$ 6.023.997
8	**ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS**						-	
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 658.872	3,00	$ 1.976.616	0,00	3,00	$ 1.976.616
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	2,00	$ 3.452.058	0,00	2,00	$ 3.452.058
8.6	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	$ 118.166	2,00	$ 236.332	0,00	2,00	$ 236.332
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	57,00	$ 2.771.682	0,00	57,00	$ 2.771.682
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	71,38	$ 6.789.808	0,00	71,38	$ 6.789.808
8.13	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	$ 89.486	2,00	$ 178.972	0,00	2,00	$ 178.972
9,1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36"	ML	$ 12.043	71,38	$ 859.629	0,00	71,38	$ 859.629
9,2	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 18.589	71,38	$ 1.326.883	0,00	71,38	$ 1.326.883
	ITEMS NO PREVISTOS					0	-	
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	92,03	$ 17.444.839		92,03	$ 17.444.839
NP-03	PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforacion y accesorios suministro e inyeccion de cal comercial al 6%)	ML	$ 161.190	280,00	$ 45.133.200		280,00	$ 45.133.200

26	AGOSTO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL

NIT: 901.902.101-5

CONTRAT 552-2024

CIV 13001461
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 368,1 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	88,34	$ 48.585.852		88,34	$ 48.585.852
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	18,41	$ 19.531.666		18,41	$ 19.531.666
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	22,09	$ 24.820.501		22,09	$ 24.820.501
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	130,35	$ 14.366.265		130,35	$ 14.366.265
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	12,00	$ 946.488		12,00	$ 946.488
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	18,00	$ 1.170.792		18,00	$ 1.170.792
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	22,09	$ 3.716.112		22,09	$ 3.716.112
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1- 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	17,00	$ 2.749.291		17,00	$ 2.749.291
NP-28	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 53.743	204,00	$ 10.963.572		204,00	$ 10.963.572
NP-29	INSTALACIÓN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	22,09	$ 528.813		22,09	$ 528.813
NP-32	CONEXIONES KIT SILLA YEE 10" x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 277.922	12,00	$ 3.335.064		12,00	$ 3.335.064
NP-38	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL CON ALTO GRADO DE HUMEDAD, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 79.141	411,14	$ 32.538.031		411,14	$ 32.538.031
					$ 309.571.409			**$ 309.571.409,00**
OTROS					**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00469229838386%	$ 3.110.240,00	$ 0,00	$ 3.110.240,00	$ 3.110.240,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 6.220.480,00	$ 0,00	$ 6.220.480,00	$ 6.220.480,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 6.220.480,00	$ 0,00	$ 6.220.480,00	$ 6.220.480,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**$ 15.551.200,00**			**$ 15.551.200,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 76.185.524	$ 0,00	$ 76.185.524,00	$ 76.185.524,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 3.095.714	$ 0,00	$ 3.095.714,00	$ 3.095.714,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 15.478.570	$ 0,00	$ 15.478.570,00	$ 15.478.570,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**$ 94.759.808,00**			**$ 94.759.808,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 419.882.417,00**			**$ 419.882.417,00**
	TOTAL A FACTURAR				**$ 419.882.417,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**$ 419.882.417,00**			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo

VEINTISEIS (Día en letras) (26) (Día en números) días del mes de AGOSTO de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

26	AGOSTO	2025	**CONSORCIO TEUSAVIAL**	
DD	MM	AA	**NIT: 901.902.101-5**	

CONTRATO 552-2024

CIV 13001461
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024


OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 368,1 M2

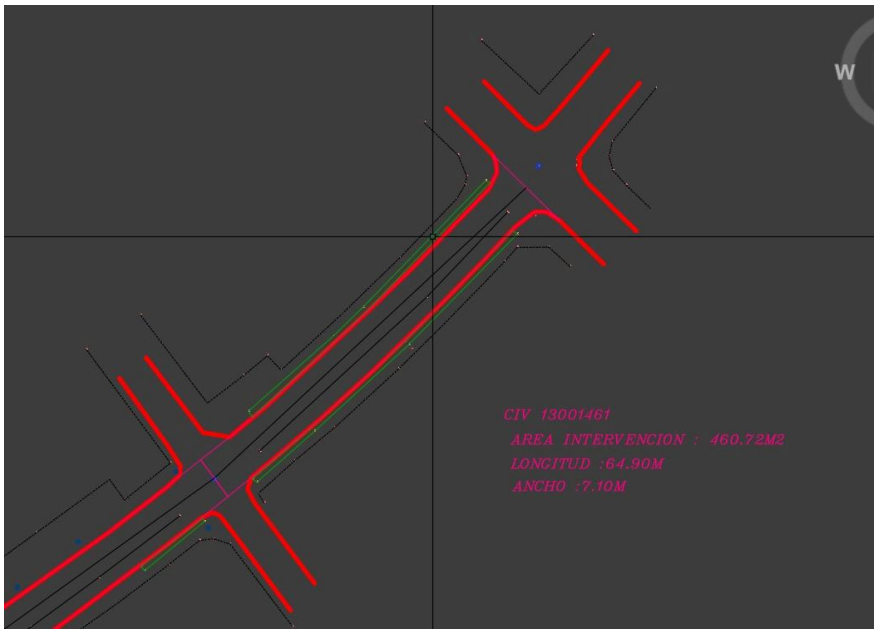

EXCAVACIÓN MANL MEDIDAS APROXIMADAS

64,90	0,25	0,10	3,25 SARDINEL AMBOS COSTADOS
3,55	0,80	1,10	18,74 DOMICILIARIAS-6 APROX
			21,99 TOTAL

26	AGOSTO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	**CONSORCIO TEUSAVIAL**
DD	MM	AA		**NIT: 901.902.101-5**

CONTRATO 552-2024

CIV 13001461
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 368,1 M2

Ilustración 13. Estructura de pavimento recomendada para intervención

Especificación IDU	Capa	Espesor
620-18	Concreto asfáltico MD19, asfalto CA-14	5 cm
611-18	Riego de liga, emulsión CRR-1	-
620-18	Concreto asfáltico MD25, asfalto CA-14	6 cm
610-18	Imprimación, emulsión CRL-1	-
520-18	Base granular AR_BG38 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo liquido iónico (1,0 l/m^3)	24 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18	Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-
231-18	Barrenos de cal en tresbolillo cada 1m	100 cm

Fuente: Elaboración propia

ENTIBADO

LARGO	ALTO	AREA
64	1,6	204,8

LARGO ANCHO

26	AGOSTO	2025	CONSORCIO TEUSAVIAL	CONSORCIO TEUSAVIAL NIT: 901.902.101-5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
DD	MM	AA			

CONTRAT 552-2024

CIV 13001365
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 489,08 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES						-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	489,08	$ 393.220	0,00	489,08	$ 393.220
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	8,21	$ 317.218	0,00	8,21	$ 317.218
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	234,76	$ 1.187.651	0,00	234,76	$ 1.187.651
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	29,34	$ 1.160.749	0,00	29,34	$ 1.160.749
2	RELLENOS CAPAS GRANULARES						-	
2.3	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.562	489,08	$ 763.943	0,00	489,08	$ 763.943
3	PAVIMENTOS						-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	58,69	$ 6.597.226	0,00	58,69	$ 6.597.226
3.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.334	114,00	$ 266.076	0,00	114,00	$ 266.076
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	489,08	$ 1.578.750	0,00	489,08	$ 1.578.750
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	489,08	$ 4.065.722	0,00	489,08	$ 4.065.722
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	489,08	$ 33.012.411	0,00	489,08	$ 33.012.411
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	92,00	$ 494.500	0,00	92,00	$ 494.500
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	75,80	$ 5.582.139	0,00	75,80	$ 5.582.139
8	ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS				0	0	-	
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	1,00	$ 1.726.029	0,00	1,00	$ 1.726.029
8.6	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	$ 118.166	1,00	$ 118.166	0,00	1,00	$ 118.166
8.13	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	$ 89.486	1,00	$ 89.486	0,00	1,00	$ 89.486
9	VARIOS				0	0	-	
9,1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36"	ML	$ 12.043	46,64	$ 561.686	0,00	46,64	$ 561.686
9,2	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 18.589	46,64	$ 866.991	0,00	46,64	$ 866.991
9,3	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 19.995	93,28	$ 1.865.134	0,00	93,28	$ 1.865.134
9,5	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VJ	$ 48.929	6,00	$ 293.574	0,00	6,00	$ 293.574
	ITEMS NO PREVISTOS						-	
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	122,27	$ 23.177.012		122,27	$ 23.177.012
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	112,49	$ 61.868.038		112,49	$ 61.868.038

26	AGOSTO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL

NIT: 901.902.101-5

CONTRAT 552-2024

CIV 13001365
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 489,08 M2

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	24,45	$ 25.939.665		24,45	$ 25.939.665
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	29,34	$ 32.966.659		29,34	$ 32.966.659
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	489,08	$ 1.702.487		489,08	$ 1.702.487
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	16,20	$ 1.053.713		16,20	$ 1.053.713
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	29,35	$ 4.937.433		29,35	$ 4.937.433
NP-29	INSTALACIÒN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÒN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	29,35	$ 702.610		29,35	$ 702.610
NP-36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 A 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	UN	$ 1.400.000	6,00	$ 8.400.000		6,00	$ 8.400.000
NP-37	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL SECO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 63.275	315,86	$ 19.986.042		315,86	$ 19.986.042
					$ 241.674.330			**$ 241.674.330**
OTROS					**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00469229838386%	$ 2.428.083,00	$ 0,00	$ 2.428.083,00	$ 2.428.083,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 4.856.167,00	$ 0,00	$ 4.856.167,00	$ 4.856.167,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,00938462282563%	$ 4.856.167,00	$ 0,00	$ 4.856.167,00	$ 4.856.167,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**$ 12.140.417,00**			**$ 12.140.417,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 59.476.053	$ 0,00	$ 59.476.053,00	$ 59.476.053,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 2.416.743	$ 0,00	$ 2.416.743,00	$ 2.416.743,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 12.083.717	$ 0,00	$ 12.083.717,00	$ 12.083.717,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**$ 73.976.513,00**			**$ 73.976.513,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 327.791.260,00**			**$ 327.791.260,00**
	TOTAL A FACTURAR				**$ 327.791.260,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**$ 327.791.260,00**			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta

VEINTISEIS (Día en letras) (26) (Día en números) días del mes de AGOSTO de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

26	AGOSTO	2025	**CONSORCIO TEUSAVIAL**	
DD	MM	AA	**NIT: 901.902.101-5**	

CONTRATO 552-2024

CIV 13001365
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 489,08 M2



26	AGOSTO	2025	**CONSORCIO TEUSAVIAL**	
DD	MM	AA	**NIT: 901.902.101-5**	

CONTRATO 552-2024

CIV 13001365
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

AREA 489,08 M2

Ilustración 11. Estructura de pavimento recomendada para intervención

Especificación IDU	Capa	Espesor
620-18	Concreto asfáltico MD19, asfalto CA-14	5 cm
611-18	Riego de liga, emulsión CRR-1	-
620-18	Concreto asfáltico MD25, asfalto CA-14	6 cm
610-18	Imprimación, emulsión CRL-1	-
520-18	Base granular AR_BG38 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo liquido iónico (1,0 l/m^3)	23 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18	Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-

Fuente: Elaboración propia
