Bogotá D.C., 18 de octubre de 2024

Doctor.
Rodrigo Angulo Rincón
Asesor III E. T. Infraestructura Resiliente
Sector Transporte y Macroproyecto Rio Fonce
Fondo Adaptación
Av Calle 26 # 57 – 83, Torre 8 Piso 8
Bogotá D.C.

Doctor.
Alvaro Eduardo Ruiz Morales.
Instituto Nacional de Vías – Subdirección de Gestión integral de Carreteras.

REFERENCIA: **CONTRATO 285 DE 2013 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES PARA ATENDER LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA MÁLAGA (PR0+000) – LOS CUROS (PR113+000) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER: 1). PUENTE VEHICULAR LA JUDÍA (ABSCISA K79+630 Y K79+758); 2) PUENTE VEHICULAR SITIO CRITICO 43 (ABSCISA K29+720 Y K30+090) -3) PUENTE VEHICULAR HISGAURA (ABSCISA K45+630 Y K47+110).**

Asunto: **Finalización de actividades en Puente Hisgaura de acuerdo al cronograma remitido mediante comunicado FA 24-1-003-BOG de fecha 25 de abril de 2024.**

Respetado Dr. Angulo, Dr. Ruiz.

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades en el Puente Hisgaura remitido mediante comunicado FA 24-1-003-BOG de fecha 25 de abril de 2024, informamos que las siguientes actividades han finalizado, y se han recibido a satisfacción por parte del Administrador vial – INVIAS Territorial Santander, de acuerdo con las actas de recorrido suscritas entre las partes, las cuales adjuntamos a la presente.

Las actividades realizadas y recibidas las describimos a continuación:

- Suministro e Instalación de Banda Hypalon para Imposta Metálica.
- Construccion de juntas zona peatonal (I- D), con sello de fisuras presentes.
- Hormigueo de esquina con mortero estructural, galería amortiguadores.
- Suministro e Instalación de Banda Hypalon para reparación de filtración en capuchón de tirante.
- Corte y recubrimiento con mortero estructural del sistema anti-levantamiento, topes sísmicos en galería de amortiguadores.
- Reparación de fisura en muro, galería de amortiguadores.
- Limpieza y destaponamiento de Lloraderos obstruidos con Asfalto/ Concreto.
- Oxidación puntual en Barandas peatonales y vehiculares, zona de uniones, fijaciones y soldaduras.
- Instalación de tubería en baranda peatonal, zona acceso estribo San Andrés.

Registro Fotográfico.



Suministro e Instalación de Banda Hypalon para Imposta Metálica.



Construccion de juntas zona peatonal (I- D) , con sello de fisuras presentes.



Hormigueo de esquina con mortero estructural, galería amortiguadores.



Suministro e Instalación de Banda Hypalon para reparación de filtración en capuchón de tirante.



Corte y recubrimiento con mortero estructural del sistema anti-levantamiento, topes sísmicos en galería de amortiguadores. (I, D).



Reparación de fisura en muro, galería de amortiguadores.






Limpieza y destaponamiento de Lloraderos obstruidos con Asfalto.
No se encontró asfalto o concreto , estaban obstruidos por residuos solidos como botellas , piedras , arena entre otros.





Oxidación puntual en Barandas Peatonales y Vehiculares, zona de uniones, fijaciones y soldaduras.

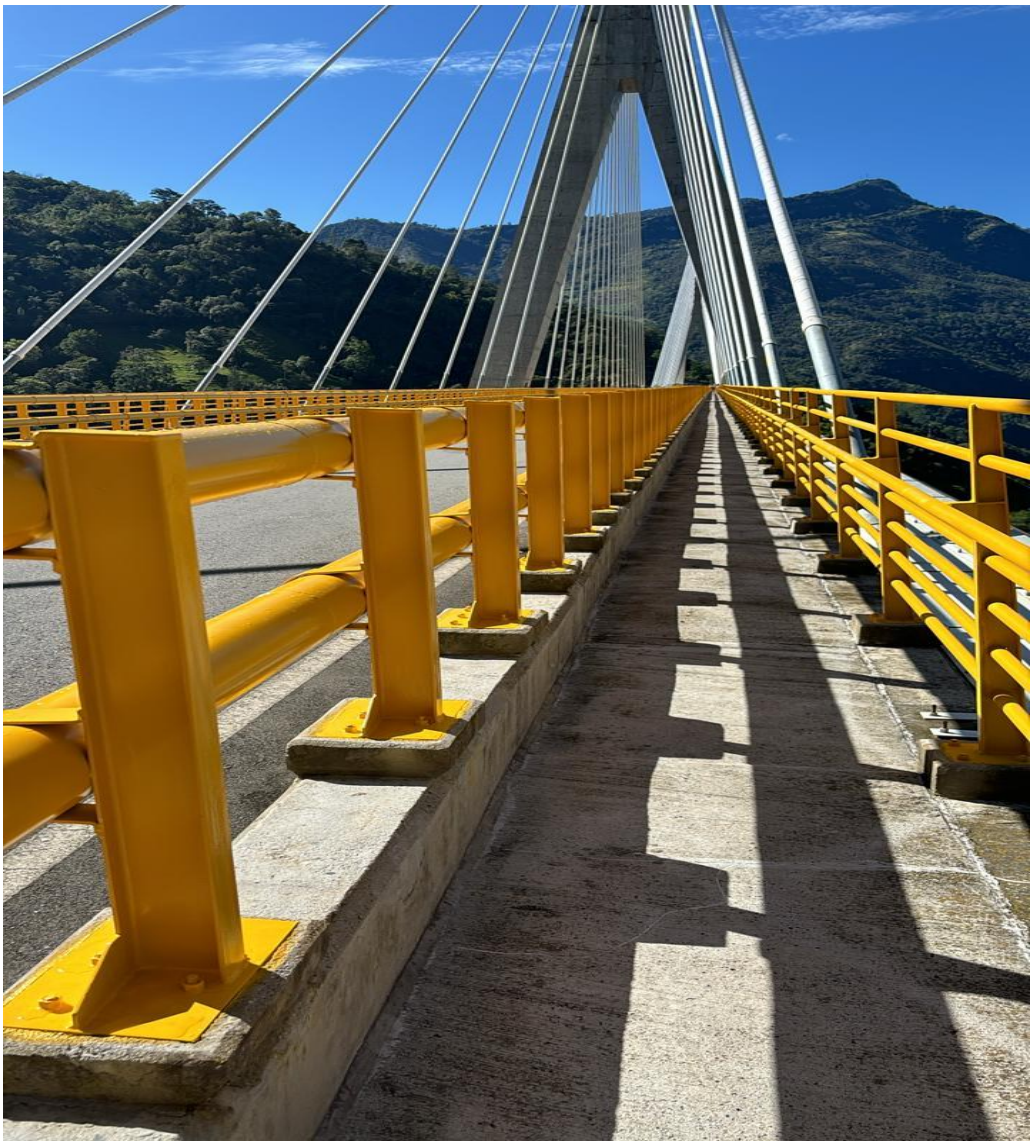

Oxidación puntual en Barandas Peatonales y Vehiculares, zona de uniones, fijaciones y soldaduras.



Instalación de tubería en Baranda Peatonal, zona acceso estribo San Andrés.

No siendo más el motivo de la presente, agradecemos de antemano su atención.

Sin otro en Particular.

Santiago Erans Piqueras
Representante Legal
Sacyr Construcción S.A. Sucursal Colombia

C. C.: **Instituto Nacional de Vías – INVIAS.**
Ing. Oscar Patiño – Dirección Territorial Santander.

C. C.: **Doctor**
Julián Ricardo Cadena B
Director de Riesgos Técnicos
Seguros Mundial
Calle 33 No. 6B - 24
Bogotá D.C.
