INFORME MENSUAL No. 2

ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG".

OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES."



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-006-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023

PERIODO: 1 ABRIL DE 2025 HASTA 30 DE ABRIL DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 5
2.1 DESCRIPCION GENERAL 5
2.2 LOCALIZACIÓN 6
2.2.1 Localización Especifica del Proyecto 7
2.2.2 Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras 8
2.3 ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 9
3 ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS 16
3.1 CONTRATO DE OBRA 16
3.1.1 INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA Nº LP-006-2023. 16
4 ACTIVIDADES DE OBRA 16
4.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO 16
4.1.1 INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO 17
4.1.2 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO. 17
4.1.3 PERSONAL DE OBRA 18
4.1.4 EQUIPO DE OBRA 18
4.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS 18
4.1.6 SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION .. 19
4.1.7 BITÁCORA DE OBRA. 20
4.1.8 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO 20
4.1.9 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA 21
4.1.10 CONTROL DE PERSONAL 21
4.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 21
4.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS 21
4.2.2 CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES 22
4.2.3 CORRESPONDENCIA 22
4.2.4 ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS 22
4.2.5 REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 22
4.3 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 22
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2025. 16
Tabla 2. Informes Semanales. 17
Tabla 3. Personal de Obra. 18
Tabla 4. Relación Maquinara de Obra. 18
Tabla 5. Relación de Equipos de Topografía. 18
Tabla 6. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo. 19
Tabla 7. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023. 22
Tabla 8. Relación de correspondencia durante el periodo. 22

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia. 6
Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia. 7
Ilustración 3. Recorrido de campo en Quebrada Bureche. Fuente: Propia. 8
Ilustración 4. Estado de Box en Quebrada Bureche. Fuente Propia. 9
Ilustración 5. Localización de la Cuenca del Rio Gaira. Fuente: Propia. 12
Ilustración 6. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia. 13
Ilustración 7 Presupuesto de obra correspondiente al periodo 2025. 15
Ilustración 8. Jornadas de socialización y recolección de actas de vecindad. Fuente: Propia. 17

LISTA DE GRÁFICO

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en las semanas del mes. Fuente: Propia. 19
Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia. 19
Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia. 20
Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia. 20

1 INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) dentro de sus funciones propone y articula las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos de tipo ambiental, por lo anterior le adjudicó el contrato de obra al CONSORCIO ICASM2023, cuyo objeto es "**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**".

El presente documento corresponde al informe mensual no. 2, este contiene las actividades desarrolladas en la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato de obra en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de abril de 2025 y 30 de abril de 2025 de la vigencia 2025, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dentro de las funciones de obra se tienen en cuenta la ejecución de las actividades del contrato, con el fin de dar el cumplimiento eficaz de las mismas, acorde a las especificaciones técnicas, diseños estipulados y recomendaciones de Interventoría.

El informe mensual está conformado, por un resumen ejecutivo del mes, en el cual se presenta la descripción general del proyecto, el control de la programación, las actividades ejecutadas en el periodo y finalmente un registro fotográfico de las actividades realizadas.

De esta manera, con el presente informe se pretende proporcionar una visión global de las ejecuciones del contrato, dentro del periodo mencionado, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los rendimientos o avance de la obra.

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

Los cuerpos de agua proveen servicios ambientales que garantizan la disponibilidad del recurso hídrico, la diversidad de la flora y la fauna, la sostenibilidad de los territorios y la calidad de vida de sus habitantes, lo que significa que de su cuidado depende el correcto funcionamiento de cada uno de los ecosistemas terrestres.

En tal sentido, la ejecución de este proyecto es importante no solo para la ciudad, si no para el país en general, debido a que el distrito de Santa Marta representa un turístico, que genera fuentes de empleo a la región y divisas a la ciudad, pero debido a los graves problemas de socavación e inundación no se ha podido desarrollar todo el potencial que tiene. La desembocadura de estos ríos con el mar caribe representa un atractivo sin igual, que atrae casi que naturalmente al turista, que ven en estos parajes un sitio agradable, apacible y donde la calidez del nativo los hace regresar.

Con la ejecución de este proyecto no sólo se está contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad Santa Marta, sino que también contribuye con los procesos de restauración y recuperación de hábitats presentes en los cauces de estos ríos y en la zona costera del Mar Caribe donde la mayoría de ellos desembocan.
Además, con estas obras de mantenimiento en los ríos propuestos en la zona rural y urbana del Distrito de Santa Marta se contribuye que en temporadas de fuertes precipitaciones se mitiguen los riesgos por inundación a las que se encuentran expuestas las comunidades que colindan con las rondas hídricas de estos, así mismo, contribuye a la perduración en el tiempo del proyecto que actualmente se está ejecutando denominado: “**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALE**S”.
El proyecto busca mantener estos cuerpos de agua en un escenario integral-colectivo sostenible de la ciudad, que resalte a Santa Marta y su carácter transversal. Por consiguiente, este escenario abrirá espacio a todas las personas y los invitará a participar de él y a usarlo permanentemente de manera sostenible.
Además de lo anteriormente expuesto, el presente proyecto se encuentra enmarcado en el enfoque hacia los 500 años buscando la preservación y valorización de la biodiversidad del distrito, con los mantenimientos permanentes en sus cuerpos de agua prestar servicios turísticos de calidad, además con este proyecto se contribuye al desarrollo urbano, social, económico sostenible y adaptado al cambio climático.

2.2 LOCALIZACIÓN

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.
Limita Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste. Dista de Bogotá 992 Km; de Riohacha 166 Km y de Barranquilla 93 Km. Cuenta con una extensión total de 2,393.35 Km2, de los cuales 55.10 Km2 pertenecen a zona urbana y 2,338.25 km2 a zona rural. La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta (PDD Santa Marta, 2023).

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia.



2.2.1 Localización Especifica del Proyecto

Los cuerpos de agua a intervenir serán definidos año a año por la entidad (CORPAMAG), soportado en los informes técnicos, así como en el concepto expedido por la INTERVENTORIA.

El mantenimiento se realizará en los siguientes cuerpos de agua:

- RIO MANZANARES
- RIO GAIRA
- RIO PIEDRAS
- RIO GUACHACA
- RIO MENDIGUACA
- RIO BURITACA
- RIO DON DIEGO

Y otros cuerpos de agua que puedan ser priorizados dentro del Distrito de Santa Marta.

Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia.



Para la vigencia **2025** se realiza recorrido de los distintos cuerpos de agua para identificar cual requiere mayor prioridad y realizar los respectivos estudios y diseño. De igual forma a principio de año se realizó recorrido con personal de Corpamag

para la intervención de **Quebrada Bureche** el cual la corporación le hace mantenimiento con frecuencia.

2.2.2 Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras

QUEBRADA BURECHE

El cuerpo se encuentra desembocando en el Río Gaira, en el tramo 3 de geocontenedores, esta obra fue planteada con el fin de buscar que las aguas de la quebrada viertan sin formar ningún cambio de margen en el rio. Este fue planteado para traer todas las aguas desde la calzada troncal del caribe y después verter de forma segura y se le tiene que hacer mantenimiento periódico para que siga funcionando.

Normalmente los mantenimientos recibidos por la quebrada se limitaban mayormente a limpieza manual y retiro de residuos, pero esta vez se decidió darle un mayor trabajo con el uso de maquinaria amarilla para además de lo anteriormente mencionado retirar el sedimento que ha ido acumulando por años.

Ilustración 3. Recorrido de campo en Quebrada Bureche. Fuente: Propia.



Ilustración 4. Estado de Box en Quebrada Bureche. Fuente Propia.



2.3 ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto tiene como alcance, las "**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**" para mitigar los fenómenos de inundación debido a las fuertes lluvias recurrentes en el Distrito de Santa Marta, y además del mantenimiento de los cuerpos hídricos, cumpliendo los estándares ambientales de la corporación.

Con motivo de la recuperación de la capacidad hidráulica y la limpieza del cauce, se tienen programadas actividades de: Remoción de sedimentos a máquina, Que busca el retiro de todo material depositado en el cauce, junto con esta actividad se tiene el retiro en volquetas del material removido; Limpieza de vegetación dentro del cauce, este es un trabajo manual y tiene como propósito el despeje del cuerpo de agua de todo tipo de maleza que genere obstrucciones.

Así mismo se construirán obras de protección (Muros en Geocontenedores) en la margen donde se requiera protección, el material proveniente de la excavación será dispuesto como material de relleno de los geocontenedores.

Las estructuras estarán constituidas con Geobolsas relleno con material de sitio con cuatro niveles, cada nivel de 1.25 metros (Altura inicial 1.45m) para una altura total de 5,75 metros. Estos Geocontenedores tendrán en su parte inferior un geomanto antisocavante para evitar la erosión en su base. Adicionalmente, en la parte de contacto con el agua tendrá un geomanto protector generar vegetación a lo largo

del tiempo. En la parte posterior del relleno se proveerá de un geotextil no tejido para evitar migración de finos.
Las obras de protección consistirán en un Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil de poliéster; Manto Antisocavación ensamblado en geotextil de poliéster de 89 KN/m; Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50; Geotextil Tejido de Poliéster, resistencia método tira ancha de 40 KN/m y Relleno con Material del Sitio.
Estas obras serán complementadas con la implementación de la Revisión y Ajustes a Estudios y/o Diseños y la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica.
Para lo cual, se ejecutarán las siguientes actividades:

- Remoción Mecánica De Sedimentos Mediante El Uso De Excavadora Sobre Orugas.
- Dragado Mecánico De Sedimentos Mediante Uso De Excavadora.
- Cargue, Retiro Y Disposición Final De Material Proveniente De La Remoción Y Excavaciones.
- Limpieza Manual De Vegetación.
- Muro En Geocontenedores Ensamblado Con Tensores Internos En Geotextil. Incluye: Relleno Con Material Proveniente De La Excavación, Formaletería Y Costuras.
- Manto Antisocavación Ensamblado En Geotextil. Incluye: Inyección De Arena Proveniente De La Excavación En Lastre Inferior.
- Manto Para El Control De Erosión Permanente, Tipo Trm 50.
- Geotextil Tejido De Poliéster.
- Protocolo De Ahuyentamiento Y Rescate Fauna En El Marco De La Ejecución Del Proyecto.
- Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto.
- Diseño De Sistema De Alerta Temprana.
- Implementación De Sistema De Alerta Temprana.

A continuación, se describen los componentes analizados para la ejecución del contrato en mención.

- COMPONENTE TOPOGRÁFICO

En el informe topográfico contiene los criterios desarrollados en los levantamientos que se realizaron en el distrito de Santa Marta. El estudio topográfico, consta con la descripción topográfica y batimétrica del área propuesta para el proyecto, brindando información a nivel de detalle debidamente geo-referenciada a partir de la colección de datos de la red local geodésica de proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:
El máximo error de cierre para las poligonales de los levantamientos de replanteo del eje del canal y estructuras será mínimo de 1:2500 en distancia y e=10N, en ángulo, expresado en segundos, siendo “N” el número de vértices de la poligonal. El máximo error de cierre en las nivelaciones para el control de las excavaciones expresado en milímetros será de 50K, siendo “K” la longitud en kilómetros de las líneas de nivelación. En ninguna circunstancia se permitirá utilizar equipo con sistema de posicionamiento global como instrumento de nivel. En la localización de los puntos para sondeos el error máximo admisible es de ±0.80 m.

- COMPONENTE ESTUDIO DE SUELO, GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

Se presenta el informe de Estudio de suelos, geológico y geotécnico donde se relaciona la evaluación geotécnica inicial y la investigación del subsuelo para identificar la estratigrafía y determinar los parámetros geotécnicos de la zona, además se incluyen registros de la exploración en campo con la información de las muestras de material tomadas.
De igual manera se observa que no se evidencio en ninguno de los sondeos realizados la presencia del nivel freático, así como la examinación de la sismicidad de la zona ante posibles amenazas, además incluye las recomendaciones que deben seguirse durante la ejecución de las obras, teniendo en cuenta la posibilidad de cambio de las condiciones del proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:

1. Debido a la homogeneidad de los materiales encontrados en la exploración, no fue necesario hacer zonificaciones geotécnicas, sino que se consideró realizar una sola caracterización geotécnica para todo el lote.

2. Se realizó diseño geotécnico de una estructura de contención para el control de inundaciones generados por una creciente del río. Para todos los casos se encontraron factores de seguridad superiores a los mínimos exigidos en la normatividad colombiana tanto en condiciones estáticas como pseudo estáticas.

3. Los materiales producto de las excavaciones a realizar para construir la cimentación podrán ser empleados como material de relleno en razón a su buena capacidad mecánica y su estabilidad volumétrica.

Es importante tener en cuenta la posible variabilidad del perfil estratigráfico en otros sectores del río, lo que genera por ende otras propiedades geomecánicas de los materiales. Lo anterior no indica cambios en los diseños, ya que el trabajo de campo, los resultados de laboratorio y el análisis de éstos, permitieron concluir teniendo en cuenta condiciones desfavorables. De todas formas, se deberá tener presente que, si durante la ejecución de los trabajos se encuentran en la zona condiciones del subsuelo muy diferentes a las descritas como típicas en el informe, o se generan variaciones sustanciales del proyecto que afecten de una u otra manera las recomendaciones emitidas, se deberá informar oportunamente para complementar las conclusiones y recomendaciones consignadas en el informe.

- COMPONENTE ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO

La Quebrada Bureche pertenece a la cuenca del Río Gaira, pero debido a que lo que se va a realizar es un mantenimiento rutinario y este tiene una sección definida debido al recubrimiento que posee no se hace necesario una estimación de caudal.

Caracterización de la Cuenca.

Ilustración 5. Localización de la Cuenca del Rio Gaira. Fuente: Propia.




La cuenca cuenta con aproximadamente 10.875 hectáreas. La longitud del río Gaira es de 33,95 kilómetros y tiene un caudal promedio anual de 2,7 m³/s a la altura de la estación MINCA ubicada en el centro poblado del mismo nombre.

Los principales afluentes del río Gaira son: quebrada El Palmar, quebrada Las Mercedes, quebrada Agua Dulce, quebrada La Macanilla, entre otras. Sus principales centros poblados son Minca, Gaira y el Rodadero.

- COMPONENTE ESTUDIO ESTRUCTURAL

En el estudio estructural fue necesario para determinar el dimensionamiento y el refuerzo necesario para resistir las acciones de las cargas producidos por las acciones de las fuerzas externas. En este orden de ideas, este estudio contiene el diseño de las estructuras de contención con Geobolsas, con el fin de proteger la orilla ante las crecientes que se vienen presentando.

Ilustración 6. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia.

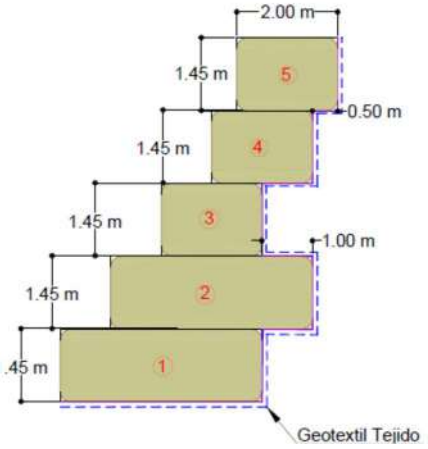

Según el estudio se concluye que:

- El análisis de estabilidad de geobolsas se hace basado con el peso unitario saturado, la cual sería el caso para la condición más crítica.

- Se deben respetar los materiales, las dimensiones, ángulo de inclinación de la estructura, con el fin de garantizar la estabilidad estructural para el cual fue chequeado los geocontenedores,

- Se verificó que la configuración de los Geocontenedores cumple con las condiciones de estabilidad exigidos en la normativa vigente colombiana NSR 2010.

- Las cargas actuantes sobre las estructuras se basaron del estudio de suelos, hipótesis de niveles de agua de acuerdo con el flujo de agua en el rio, para lo cual, si existe alguna condición diferente en el sitio, se debe consultar con

el ingeniero estructural con el fin de revisar cualquier cambio que se pueda presentar.

- Los Geocontenedores se deben llenar mecánicamente, de manera que cuando el primer nivel está semi-sumergido, la medida que se llena con arena y se desplaza el agua, no depende del flujo a través del geotextil, ya que es muy pequeño.

- El sistema de anclaje de cualquier tipo de recubrimiento o geotextil de control de erosión se debe realizar con el mismo peso del elemento, pues ello significa evitar la perforación del geotextil. Son actividades previas para considerar durante la conformación del geocontenedor pues este último es el sistema de anclaje del geotextil o manto de recubrimiento.

CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES PERIODO VIGENCIA 2025

Ilustración 7 Presupuesto de obra correspondiente al periodo 2025.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

FORMATO OFERTA ECONOMICA

LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP 006 DE 2023
"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

AÑO 2025

ITEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						$ 31,513,384.00
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	8.0	$ 3,939,173.00	$ 31,513,384.00
II. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						$ 7,480,285,719.18
2.1	P - 2.1	Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	m3	92,648.54	$ 16,507.00	$ 1,529,349,449.78
2.3	P - 2.3	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada	m3	92,648.54	$ 42,500.00	$ 3,937,562,950.00
2.4	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	12.0	$ 49,385,635.00	$ 592,627,620.00
2.5	P - 2.5	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	6,000.0	$ 160,377.00	$ 962,262,000.00
2.6	P - 2.6	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior	m2	2,250.0	$ 33,138.00	$ 74,560,500.00
2.7	P - 2.7	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50	m2	7,031.30	$ 45,978.00	$ 323,285,111.40
2.8	P - 2.8	Geotextil Tejido de Poliéster	m2	5,156.30	$ 11,760.00	$ 60,638,088.00
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 7,511,799,103.18
					Aministración (23%)	$ 1,727,713,794.00
					Imprevistos (2%)	$ 150,235,982.00
					Utilidad (5%)	$ 375,589,955.00
					IVA (19%) sobre la Utilidad	$ 71,362,091.00
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 2,324,901,822.00
					VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL	$ 9,836,700,925.18
III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						$ 1,134,038,192.00
3.1	P - 3.1	Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre	und	1.0	$ 237,598,855.00	$ 237,598,855.00
3.3	P - 3.3	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	8.0	$ 37,443,694.00	$ 299,549,552.00
3.4	P - 3.4	Diseño de sistema de alerta temprana Río Gaira.	und	1.0	$ 225,174,735.00	$ 225,174,735.00
3.4.1	P - 3.4	Implementación del sistema de alerta temprana Río Guachaca.	Glb	1.0	$ 371,715,050.00	$ 371,715,050.00
					IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA	$ 215,467,256.48
					VALOR TOTAL OBRA AÑO 2025	$ 11,186,206,374.00

3 ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

3.1 CONTRATO DE OBRA

3.1.1 INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA Nº LP-006-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICASM2023
REPRESENTANTE LEGAL:	DIXON ENRIQUE VALVERDE MARTINEZ
OBJETO:	INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 330.530.495.016,00
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	147 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 DE JUNIO DE 2036
PERIODO ACTUAL:	**2025**
CUERPO DE AGUA A INTERVENIR:	**QUEBRADA BURECHE**
VALOR DEL PERIODO:	$ 11.186.206.374,00
FECHA DE INICIO DE PERIODO:	20 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PERIODO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2025.

4 ACTIVIDADES DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO

No se realizaron actividades de obra

Semana No. 3 (31/03/2025 - 06/04/2025)

1. No se registraron actividades de obra.

Semana No. 4 (07/04/2025 - 13/04/2025)

1. Se realizan jornadas de socialización y recolección de actas de vecindad.

Semana No. 5 (14/04/2025 - 20/04/2025)

1. No se registraron actividades de obra.

Semana No. 6 (21/04/2025 - 27/04/2025)

1. Se realizan jornadas de recolección de actas de vecindad y socialización en la zona de influencia de la Quebrada Bureche.

Ilustración 8. Jornadas de socialización y recolección de actas de vecindad. Fuente: Propia.



4.1.1 INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO.

No se realizaron actividades de obra en este periodo.

4.1.2 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

- Informe Semanal de Obra.

Los informes semanales de obras correspondiente al periodo de ejecución son los siguientes:

SEMANA	ARCHIVO
SEMANA 3	INFORME SEMANAL N°3 (31MAR-6ABR)
SEMANA 4	INFORME SEMANAL N°4 (7ABR-13ABR)
SEMANA 5	INFORME SEMANAL N°5 (14ABR-20ABR)
SEMANA 6	INFORME SEMANAL N°6 (21ABR-27ABR)

Tabla 2. Informes Semanales.

Los informes se encuentran plasmados en el ***"Anexo No.1 Informes Semanales"*** del presente Informe.

4.1.3 PERSONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal de obra en el proyecto.

CARGO	NOMBRES
Director de Obra	Luis Fernando Ochoa Marulanda
Especialista Ambiental	Rosa Elvira Villamizar Sierra
Especialista Hidráulico	Danilo Gregorio Rodríguez Correa
Ingeniero Topógrafo	Angela María Fernández Fajardo
Trabajador Social	Andrés Felipe Giraldo Pérez
Profesional SST	Ana Milagro Marenco Caballero
Ingeniero Residente	Jonathan Antonio Caro Escobar
Gerente del Proyecto	Eugenio José Prada Daza

Tabla 3. Personal de Obra.

(Ver Anexo N.o.3 Personal de Obra)

4.1.4 EQUIPO DE OBRA

A continuación, se presenta el equipo y maquinaria de obra mínimo para la ejecución del contrato.

MAQUINARIA:

MAQUINA	MARCA	MODELO	POTENCIA
Excavadora	HYUNDAI	R220LC-9S	143HP
Excavadora	HYUNDAI	R220LC-9S	143HP
Excavadora	HYUNDAI	HX220S	148HP

Tabla 4. Relación Maquinara de Obra.

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	MARCA
Receptor GNSS Y Rover	REF GALAXY G7	SOUTH
GPS: GNSS RTK	S900A	STONEX

Tabla 5. Relación de Equipos de Topografía.

(Ver Anexo N.o.5 Maquinaria y Equipo de Obra)

4.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizaron actividades de obra en este periodo.

4.1.5.1 MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

No se realizaron actividades de obra en este periodo.

4.1.6 SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION

SEMANA	FECHA		% PROGRAMADO EN LA SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO EN LA SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO	ADELANTO (+) Ó ATRASO (-)
	DEL	AL					
3	31 DE MARZO DE 2025	06 DE ABRIL DE 2025	0.02	0.05	0.00	0.00	-0.05
4	07 DE ABRIL DE 2025	13 DE ABRIL DE 2025	0.02	0.06	0.00	0.00	-0.06
5	14 DE ABRIL DE 2025	20 DE ABRIL DE 2025	0.02	0.08	0.00	0.00	-0.08
6	21 DE ABRIL DE 2025	27 DE ABRIL DE 2025	0.02	0.09	0.00	0.00	-0.09

Tabla 6. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo.

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en las semanas del mes. Fuente: Propia.

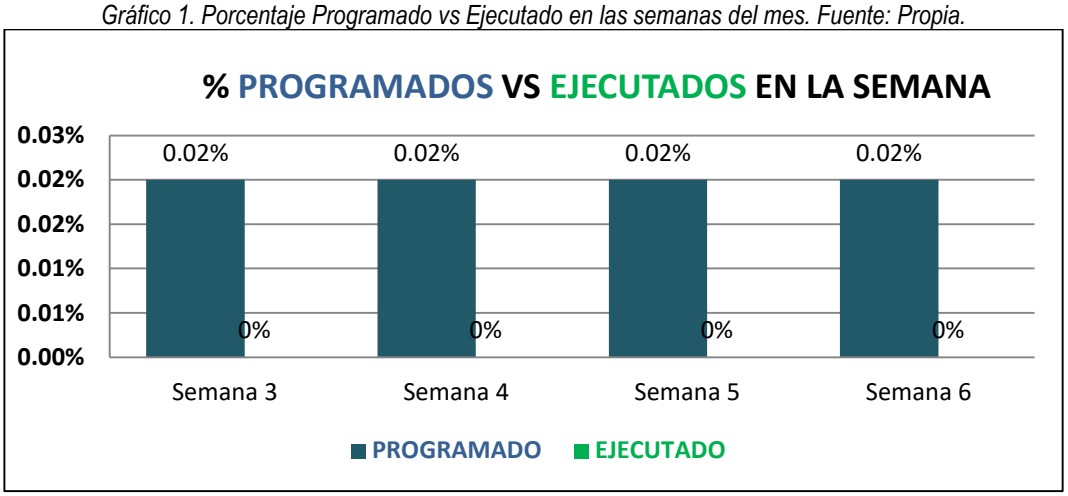


Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia.


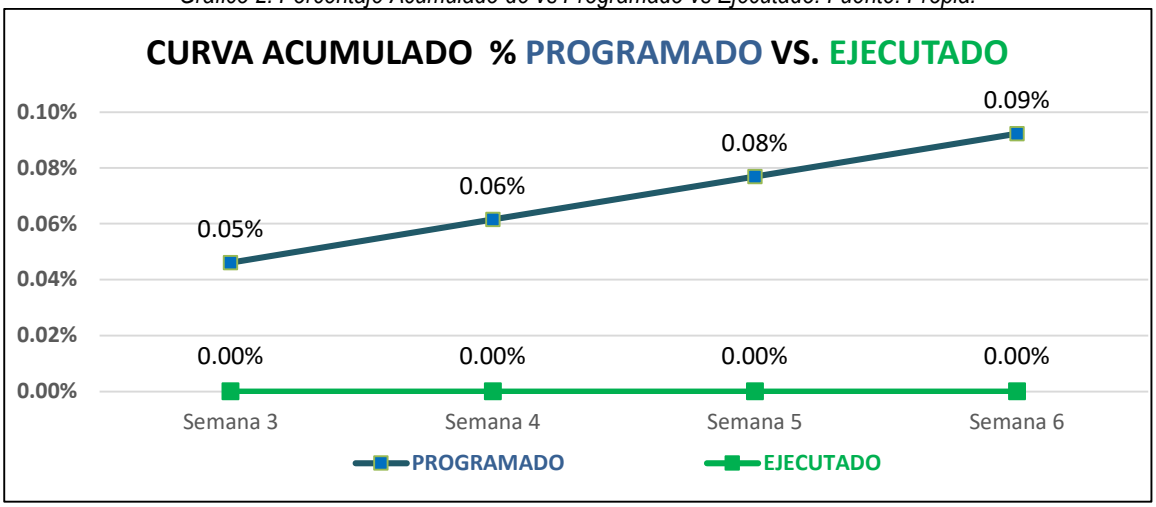


Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia.

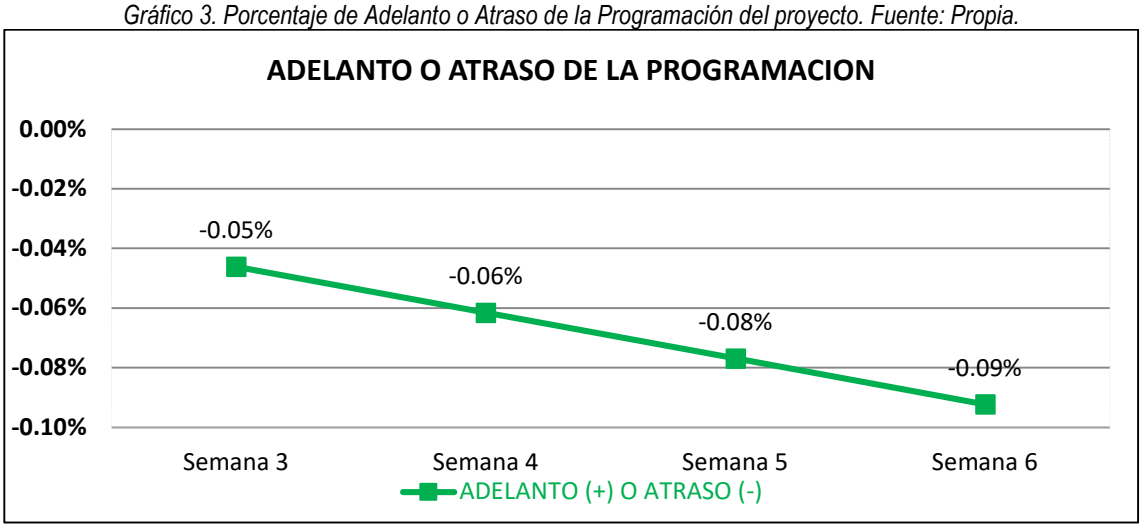

4.1.7 BITÁCORA DE OBRA.

Durante el periodo correspondiente al mes de abril se realizaron actividades de obra y complementarios. La Bitácora se relaciona en el ***"Anexo No.2 Bitácora de Obra"***.

4.1.8 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El registro del estado del tiempo del periodo comprendido entre el 1 de abril de 2025 hasta el 30 de abril de 2025. Se relaciona la información registrada en el ***"Anexo No.4 Estado General del Tiempo"***

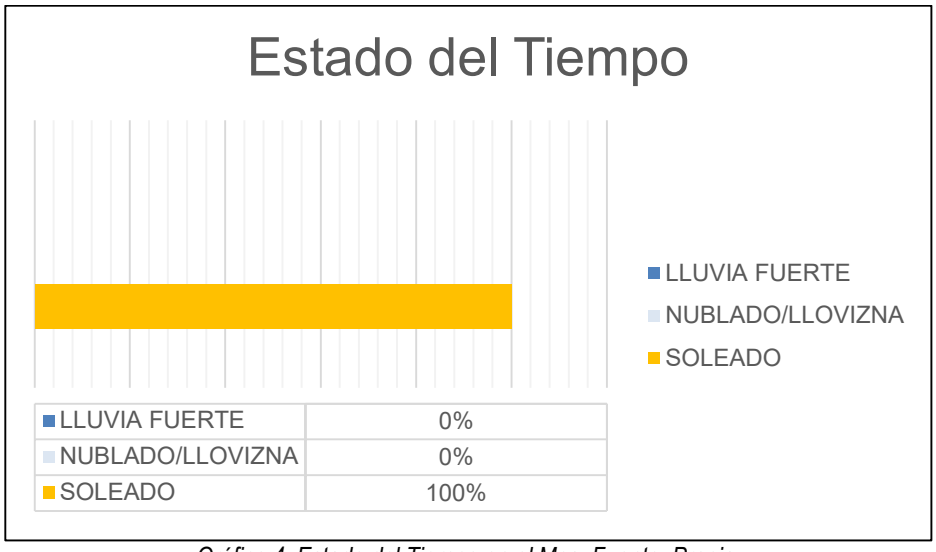


Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia.

4.1.9 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

El control de los equipos utilizados en obra se relaciona en el ***"Anexo No.5 Maquinaria y Equipo de Obra"***, adjunto en los anexos del presente informe.

4.1.10 CONTROL DE PERSONAL

El control del personal en obra se relaciona en el ***"Anexo No.6 Seguridad social del personal"*** adjunto en los anexos del presente informe.

4.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

4.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS

4.2.1.1 Control de Pólizas Contrato de Obra No. LP-006-2023

A continuación, se relaciona la información de las pólizas vigentes que amparan el contrato de obra de acuerdo con el acta de inicio.

Garantía de cumplimiento según acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. DE POLIZA	CG-1051454		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**01/04/2024**		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
CUMPLIMIENTO	19/03/2024	30/06/2025	$ 887.347.736,60
PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2024	13/03/2028	$ 443.673.868,30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/03/2025	13/03/2027	$ 175.177.646,00

Garantía de responsabilidad civil extracontractual según acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADOS S.A		
No. DE POLIZA	75-40-101050575		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**01/04/2024**		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/03/2024	25/03/2025	$ 650.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	19/03/2024	25/03/2025	$ 650.000.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	19/03/2024	25/03/2025	$ 650.000.000,00

Tabla 7. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023.

4.2.2 CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES

4.2.2.1 CONTRATO DE OBRA

Se relaciona la seguridad social del personal durante el periodo **Anexo No.6**.

4.2.3 CORRESPONDENCIA

OFICIOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A INTERVENTORIA PERIODO: 1 DE ABRIL DE 2025 HASTA 30 DE ABRIL DE 2025			
FECHA	**REFERENCIA**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**

Tabla 8. Relación de correspondencia durante el periodo.

4.2.4 ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS

No se han transmitido permisos en este periodo.

4.2.5 REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado reuniones transcendentales en este periodo.


4.3 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

No se han realizaron pagos de la vigencia 2025 en este periodo.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el abril mes de ejecución del contrato No. LP 006 DE 2023 que tiene como objeto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”. se concluye: El presente informe comprende el periodo desde el 1 de abril del 2025 al 30 de abril de 2025, no se han realizado actividades de obra. Se espera el inicio de las actividades.

Responsable:



LUIS FERNANDO OCHOA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ICASM2023
TP. 13202-33067 BLV

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

CONTRATISTA DE OBRA: **CONSORCIO ICASM2023** CONTRATO No: **LP 006 DE 2023**

INTERVENTORIA: **INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S** CONTRATO No: **CM 007 DE 2023**

Semana Número: 3 Del: 1 de abril de 2024 Al: 7 de abril de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 20 Días

Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

OBJETO: “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.15%	0.68%
Valor básico de la	$ 13,656,110.59	$ 60,396,352.17

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	0.00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 0.00	$ 0.00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	330,530,495.016
Valor Actualizado:	$	330,530,495.016
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	23,163,036,792.00
Valor Actualizado:	$	23,163,036,792.00
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	8,873,477,366.00
Valor Actualizado:	$	8,873,477,366.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	620,485,992.00
Valor Actualizado:	$	620,485,992.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana No.3 se continua labores de oficina que resultan en los estudios y diseños para el balance de este año e información del parque lineal.
Se continua con la gestion para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.
Se sigue trabajando en el procesamiento de la información de los levantamientos topograficos.
El dia 4 de abril se realizo visita de campo con el supervisor del contrato, personal de obra e interventoria.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se hará Seguimiento a la topobatimetría
Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría
Se hará Seguimiento al Estudio de suelos
Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico
Se dara inicio a la recolecta de actas de vecindad

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

-Se continua con el trabajo de ajustes a estudios y diseños
- Se realizó el recorrido del proyecto en donde participaron Obra, Interventoria y el Supervisor.

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	0.15%	0.00%
Avance Acumulado	0.68%	0.00%

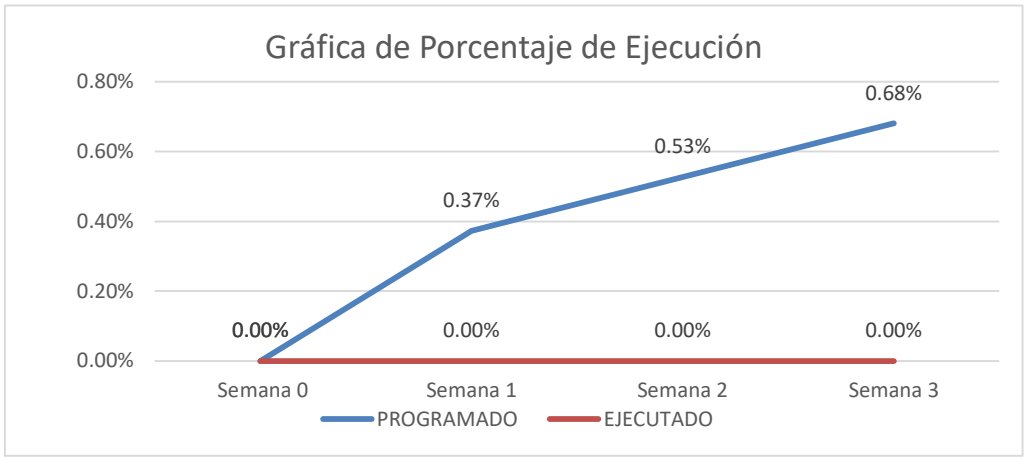

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	**CONSORCIO ICASM2023.** **NIT: 901.782.970-2**

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE OBRA**
El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños para tener claro como se va a trabajar en las intervenciones. En esta semana se avanzó en los ajustes y diseños del proyecto.	Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción:

Recorrido con Supervisor e interventoria Rio Gaira - 4 de abril 2024



Descripción:

Recorrido con Supervisor e interventoria Rio Gaira - 4 de abril 2024

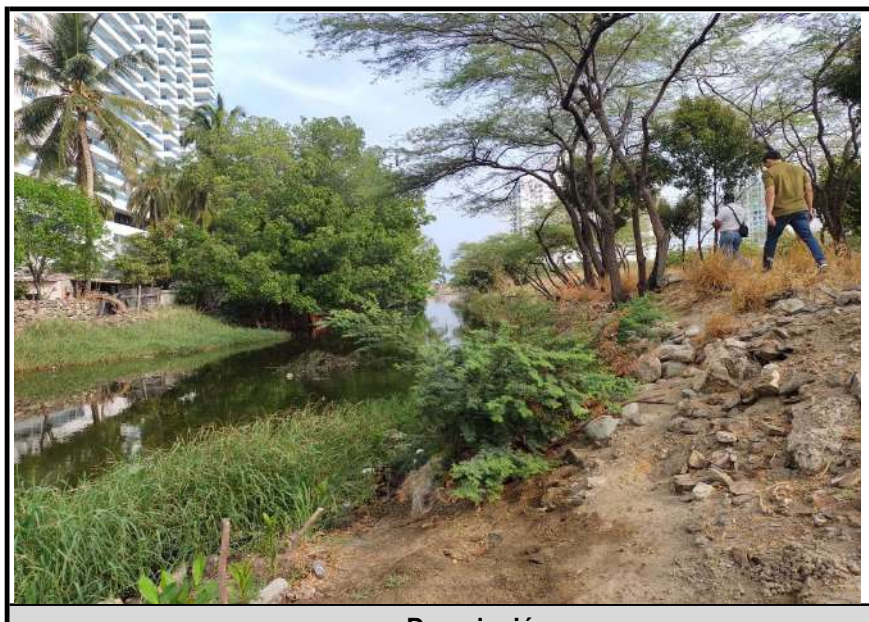

Descripción:

Recorrido con Supervisor e interventoria Rio Gaira - 4 de abril 2024



Descripción:

Desembocadura Rio Gaira - 4 de abril 2024

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

CONTRATISTA DE OBRA: **CONSORCIO ICASM2023** CONTRATO No: **LP 006 DE 2023**

INTERVENTORIA: **INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S** CONTRATO No: **CM 007 DE 2023**

Semana Número: 4 Del: 8 de abril de 2024 Al: 14 de abril de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 27 Días

Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

OBJETO: “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.15%	0.83%
Valor básico de la	$ 13,656,110.59	$ 74,052,462.76

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	0.00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 0.00	$ 0.00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	330,530,495.016
Valor Actualizado:	$	330,530,495.016
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	23,163,036,792.00
Valor Actualizado:	$	23,163,036,792.00
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	8,873,477,366.00
Valor Actualizado:	$	8,873,477,366.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	620,485,992.00
Valor Actualizado:	$	620,485,992.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana No.4 se continua labores de oficina que resultan en los estudios y diseños para el balance de este año e información del parque lineal.
Se continua con la gestion para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.
Se sigue trabajando en el procesamiento de la información de los levantamientos topograficos.
Se inicio la recolecta de actas de vecindad a lo largo del area de intervencion del Rio Gaira

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se hará Seguimiento a la topobatimetría
Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría
Se hará Seguimiento al Estudio de suelos
Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

-Se continua con el trabajo de ajustes a estudios y diseños
- Se realizó el recorrido del proyecto en donde participaron Obra, Interventoria y el Supervisor.

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	0.15%	0.00%
Avance Acumulado	0.83%	0.00%

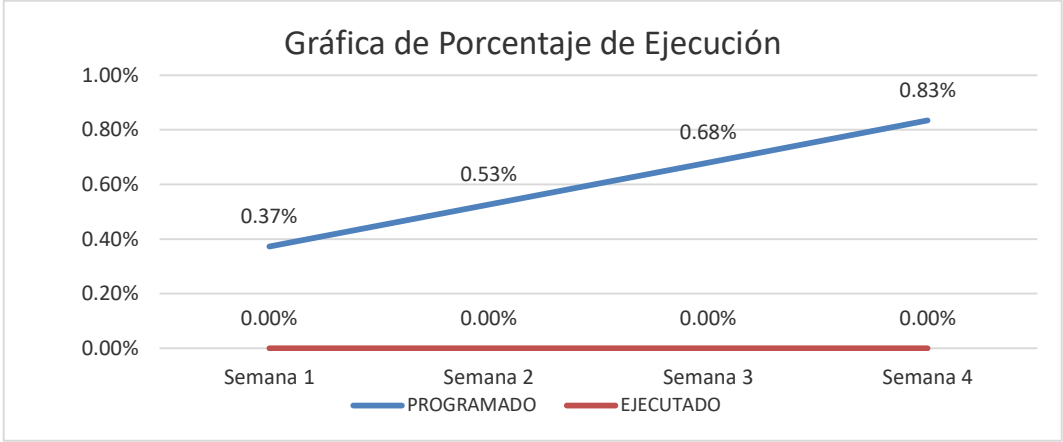

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	**CONSORCIO ICASM2023.** **NIT: 901.782.970-2**

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE OBRA**
El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños para tener claro como se va a trabajar en las intervenciones. En esta semana se avanzó en los ajustes y diseños del proyecto.	Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira



Descripción:

Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

CONTRATISTA DE OBRA: **CONSORCIO ICASM2023** CONTRATO No: **LP 006 DE 2023**

INTERVENTORIA: **INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S** CONTRATO No: **CM 007 DE 2023**

Semana Número: 5 Del: 15 de abril de 2024 Al: 21 de abril de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 34 Días

Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

OBJETO: “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.38%	1.21%
Valor básico de la	$ 33,417,425.41	$ 107,469,888.17

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	0.00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 0.00	$ 0.00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	330,530,495.016
Valor Actualizado:	$	330,530,495.016
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	23,163,036,792.00
Valor Actualizado:	$	23,163,036,792.00
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	8,873,477,366.00
Valor Actualizado:	$	8,873,477,366.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	620,485,992.00
Valor Actualizado:	$	620,485,992.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana No.5 se continua labores de oficina que resultan en los estudios y diseños para el balance de este año
Se continua con la gestion para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.
Se sigue trabajando en el procesamiento de la información de los levantamientos topograficos.
Se continua recolecta de actas de vecindad a lo largo del area de intervencion del Rio Gaira

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Se hará Seguimiento a la topobatimetría
Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría
Se hará Seguimiento al Estudio de suelos
Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico
Se continuará con la recolecta de actas de vecindad

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

-Se continua con el trabajo de ajustes a estudios y diseños
-Se continua con el levantamiento de actas de vecindad

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	0.38%	0.00%
Avance Acumulado	1.21%	0.00%

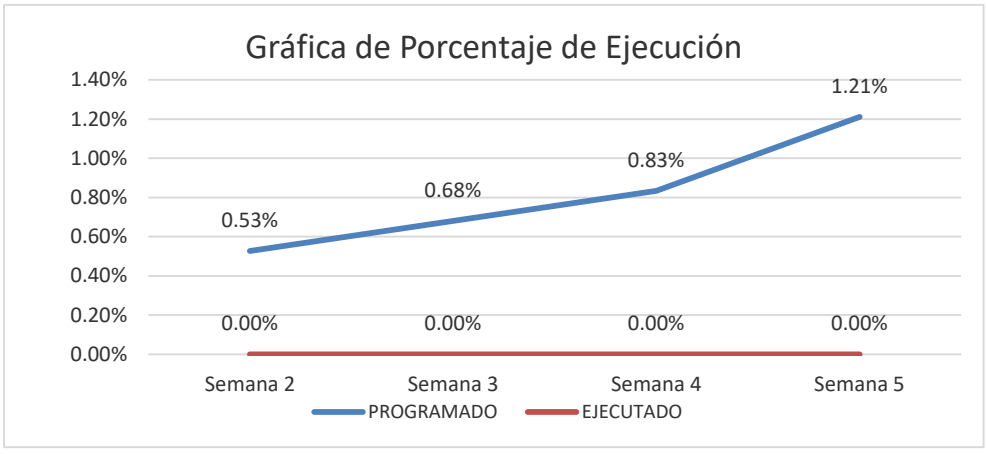

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	**CONSORCIO ICASM2023.** **NIT: 901.782.970-2**

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE OBRA**
El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños para tener claro como se va a trabajar en las intervenciones.	Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira



Descripción:

Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023.
NIT: 901.782.970-2

CONTRATISTA DE OBRA: **CONSORCIO ICASM2023** CONTRATO No: **LP 006 DE 2023**

INTERVENTORIA: **INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S** CONTRATO No: **CM 007 DE 2023**

Semana Número: 6 Del: 22 de abril de 2024 Al: 28 de abril de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 41 Días

Supervisor Contrato: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

OBJETO: “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.38%	1.59%
Valor básico de la	$ 33,417,425.41	$ 140,887,313.58

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	0.00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 0.00	$ 0.00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	330,530,495.016
Valor Actualizado:	$	330,530,495.016
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	23,163,036,792.00
Valor Actualizado:	$	23,163,036,792.00
Plazo Inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		19 de junio 2036

CONTRATO DE OBRA (Periodo 2024)

Contratista:		CONSORCIO ICASM2023
Contrato No.		LP 006 DE 2023
Valor Inicial:	$	8,873,477,366.00
Valor Actualizado:	$	8,873,477,366.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA (Periodo 2024)

Interventor:		INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
Contrato No.		CM 007 DE 2023
Valor Inicial:	$	620,485,992.00
Valor Actualizado:	$	620,485,992.00
Plazo Inicial:		Un (1) año
Fecha de Iniciación:		19 de marzo 2024
Fecha de Vencimiento:		31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana No.6 se continua labores de oficina que resultan en los estudios y diseños para el balance de este año.
Se continua con la gestion para la elaboracion de los estudios Hidraulicos.
Se sigue trabajando en el procesamiento de la información de los levantamientos topograficos.
Se continua recolecta de actas de vecindad a lo largo del area de intervencion del Rio Gaira.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se hará Seguimiento a la topobatimetría.
Se Digitalizarán los datos recopilados del levantamiento de la topobatimetría.
Se hará Seguimiento al Estudio de suelos.
Se hará Seguimiento al Estudio y diseño hidráulico.


ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

Se continuará con la recolecta de actas de vecindad.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

-Se continua con el trabajo de ajustes a estudios y diseños.
-Se continua con el levantamiento de actas de vecindad.

	%Programado	% Ejecutado
Avance semanal	0.38%	0.00%
Avance Acumulado	1.59%	0.00%

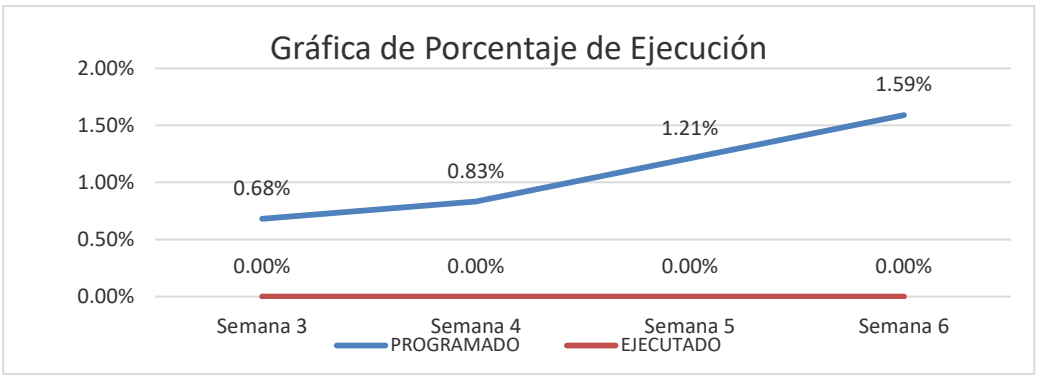

CORPAMAG	**INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA**	**CONSORCIO ICASM2023.** **NIT: 901.782.970-2**

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE OBRA**
El avance que se evidencia en esta semana es del 0% tal se está trabajando en los ajustes a estudios y diseños para tener claro como se va a trabajar en las intervenciones.	Firma Nombre: Luis Fernando Ochoa Cedula: 73.113.864 de Cartagena

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira



Descripción:

Registro de Actas de vecindad - Rio Gaira

Domingo, 30 de marzo 2025: No realizaron actividades.
Efrudo

Jonathan A. Cano E.

Semana No. 3 (31 de marzo 2025- 6 de abril 2025).
Lunes, 31 de marzo 2025: Clima: Se inició el día Soleado-seco, Sin precipitaciones. **Actividades**: Se realizaron actividades de Topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo Seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de Suelos. **Personal**: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo**: Computador Portatil, Vehiculo.

Efrudo
Edilberto Oliveros.
Res. Interventoría.

Jonathan A. Cano E.
Res. contratista

Martes, 1 de abril 2025: Clima: Se inició el día Soleado-seco, Sin precipitacions. **Actividades**: Se realizaron actividades de Topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo Seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal**: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoria, **Equipo**: Computador portatil, Vehiculo.

Edilberto Olivero
Res. Interventoría

Jonathan J. Cano E
Res. contratista

Miercoles, 2 de abril 2025: clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** se realizaron actividades de Topo-batimétricos, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de Suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Dircator de Interventoría (1) Residente de Interventoria, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computador portatil, Vehículo.

Edilberto Olivero
Res Interventoría

Jonathan J. Cano E
Res. Contratista

Jueves, 3 de abril 2025: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones, **Actividades:** se realizaron actividades de topo-batimétricos, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente Hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computador portatil, Vehículo.

Edilberto Olivero
Res Interventoría

Jonathan J. Cano E
Res. contratista

Viernes, 4 de abril 2025: Clima: Se inició el día Soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. Se realizó recorrido en río Buritaca y río Don Diego en el marco de las visitas de reconocimiento de los cuerpos de agua para provisión durante la vigencia 2025. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computador Portátil, Vehículo.

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Edilberto Olivero.
Res. Interventoría.

Sábado, 5 de abril 2025: clima: Se inició el día Soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de Topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, **Equipo:** Computador portátil, vehículo.

Jonathan A. Cano E
Res. Contratista

Edilberto Olivero
Res. Interventoría.

Domingo, 6 de abril 2025: No se realizaron actividades.

Ejecutado

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Semana No. 4 (7 de abril 2025 - 13 de abril 2025).

Lunes, 7 de abril 2025: clima: Se inició el día soleado-seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil, Vehículo.

Ejecutado

Edilberto Olivero
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Martes, 8 de abril 2025: clima: Se inició el día soleado-seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computadores portátil, vehículo.

Efraín
Edilberto Oliveros
Res. Interventoría

Jonathan J. Cano E
Res. contratista

Miércoles, 9 de abril 2025: clima: se inició el día soleado-seco, sin precipitaciones. **Actividades**: se realizaron actividades de topo-batimétricos, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal**: (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo**: Computador portátil, Vehículo.

Efraín

Jonathan J. Cano E
Res. contratista

Edilberto Oliveros
Res. Interventoría

Jueves, 10 de abril 2025: clima: Se inició el día soleado-seco, sin precipitaciones. **Actividades**: Se realizaron actividades de topo-batimétricos, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal**: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo**: computador portátil, Vehículo.

Efraín

Jonathan J. Cano E.
Res. contratista

Edilberto Oliveros.
Res. Interventoría

Viernes, 11 de abril 2025: Clima: Se inició el día Soleado - Seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, Se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil, Vehículo.

Jonathan A. Lara E.
Res. contratista

Edilberto Olivenos.
Res. Interventoría

Sábado, 12 de abril 2025: Clima: Se inició el día Soleado - Seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, Se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría **Equipo:** Computador portátil, Vehículo.

Jonathan A. Lara E.
Res. contratista

Edilberto Olivenos.
Res Interventoría

Domingo, 13 de abril 2025: No se realizaron actividades.

Jonathan A. Lara E

Semana No.5 (14 de abril 2025- 20 de abril 2025).
Lunes, 14 de abril 2025: clima: El inició el día Soleado- seco, sin precipitacion. **Actividades:** se realizaron actividade de topo- batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) comisión topografica, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computadora portatil, Vehículo.

Jonathan A. Cuao E
Res. contratista

Ejecutado
Edilberto Oliveros.
Rs. Interventoría

Martes, 15 de abril 2025: clima: Se inició el día Soleado- seco, sin precipitacion. **Actividades:** se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, **Equipo:** Computador portátil, vehículo.

Jonathan A. Cuao E
Res. contratista

Ejecutado
Edilberto Oliveros
Rs. Interventoría

Miércoles, 16 de abril 2025: clima: Se inició el día Soleado- seco, sin precipitaciones. **Actividados:** se realizaron actividades de topo-batimétricos, trámites ad-

ministrativos de Obra, Interventoria y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoria, (1) Residente de Interventoria, (1) Conductor de Interventoria, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoria, (1) Especialista Hidráulico de Interventoria. **Equipo:** Computador portatil, vehículo.

Jonathon D. Cano E
Res. contratista

Edilberto Olivero.
Res. Interventoria.

Jueves, 17 de abril 2025: clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricos, trámites administrativos de Obra, Interventoria y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Comisión de Topografía. (1) Director de Interventoria, (1) Residente de Interventoria, (1) Conductor de Interventoria, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoria, (1) Especialista Hidráulico de Interventoria. **Equipo:** computador portátil, vehiculo.

Jonathon D. Cano E
Res. contratista

Edilberto Olivero.
Res. Interventoria

Viernes, 18 de abril 2025: clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades topo-batimétricos, trámites, administrativos de Obra, Interventoria y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residen-

te de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, **Equipo:** computador portátil, Vehículo.

Ejecutó
Edilberto Olivos.
Res Interventoría.

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Sábado, 19 de abril 2025: clima: Se inició el día soleado-seco, Sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, Se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil, Vehículo.

Ejecutó
Edilberto Olivos.
Res. Interventoría.

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Domingo, 20 de abril 2025: No se realizaron actividades

Ejecutó.

Jonathan A. Cano E

Semana No. 6 (21 de abril 2025- 27 de abril 2025).

Lunes, 21 de abril 2025: clima: Se inició el día Soleado - Seco, Sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricos, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, Se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) conductor, (1) Coordinador

de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría. **Equipo:** computador portátil, vehículo.

Edilberto Oliveros
Res. Interventoría.

Jonathan A. Cano E
Ing. contratista

Martes, 22 de abril 2025: Clima: Se inició el día Soleado - Seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimetrías, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, Se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) conductor, (1) coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil, vehículo.

Edilberto Oliveros
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Miércoles, 23 de abril 2025: Clima: Se inició el día Soleado - Seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, Se hizo seguimiento a los estudios y diseños del Componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, **Equipo:** Computador portátil, vehículo.

Edilberto Olivos
Res. Interventoría.

Jonathan D. Cayo E.
Res. contratista

Jueves, 24 de abril 2025: Clima: se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. Personal: (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) comisión de topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: computador portátil, Vehículo.

Edilberto Olivos
Res. Interventoría.

Jonathan D. Cayo E.
Res. contratista

Viernes, 25 de abril 2025: clima: se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: se realizaron: actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, Se hizo seguimientos a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. Personal: (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, Equipo: computador portátil y Vehículo.

Edilberto Olivos
Res Interventoría

Jonathan D. Cayo E.
Res. contratista

Sábado, 26 de abril 2025: clima: se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricos, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo Seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Andráulico, (1) comisión de Topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil, Vehículo.

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Edilberto Olivero.
Ge. Interventoría.

Domingo, 27 de abril 2025: No se realizaron Actividades.

Jonathan A. Cano E

Semana No. 7 (28 de abril 2025 - 4 de mayo 2025).

Lunes, 28 de abril 2025: clima: se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Activiolades:** Se realizaron actividades de topo-batimetricos, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. Se realizó visita al sector de la licorera en Rio Gaira acompañado del personal de Interventoría y Supervisión técnica. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** computador portátil, Vehículo.

Edilberto Oliveros
Res Interventoría

Jonathan D. Cano E.
Res. contratista

Martes, 29 de abril 2025: clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. **Equipo:** Computador portátil, Vehículo.

Edilberto Oliveros
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Miércoles, 30 de abril 2025: clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. **Personal:** (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía. (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, **Equipo:** computador portátil, vehículo.

Edilberto Oliveros
Res. Interventoría

Jonathan D. Cano E
Res. contratista

Jueves, 1 de mayo 2025: clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** No se realizaron actividades.

Edilberto Oliveros
Res. Interventoría

Jonathan D. Cano E
Res. contratista

ANEXO No. 3
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

MES DEL INFORME: 2 **CONTRATO DE OBRA No.** LP 006 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICASM2023

PROYECTO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 007 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

NOMBRE	CARGO	abr-25																														
		M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO	Profesional SST	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	
LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA	Director de obra	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	
JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR	Residente de Obra	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	
ROSA ELVIRA VILLAMIZAR	Especialista Ambiental	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	
DANILO GREGORIO ROGRIGUEZ CORREA	Especialista Hidraulico	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	
ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ	Trabajador Social	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	
ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO	Ing. Topografo	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	
SANTIAGO JOSE OSPINO URUEÑA	Coordinador de Obra	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	
DAYANA MARCELA CERVANTES GIRALDO	Técnico SST																															
ANDRES FELIPE PONTON ALBOR	Biologo																															
ABDON SEGUNDO PERALTA ATENCIO	Veterinario																															
LEONARDO RAFAEL NOGUERA CONSUEGRA	Topografo																															
JOSE FELIPE VENECIA MONTENEGRO	Ayudante de topografia																															
RAFAEL EDUARDO PACHECO DE LEON	Inspector de Obra																															
YEISON ATENCIO BARRIOS	Oficial de Obra																															
JOSE FERNANDO PADILLA GUTIERREZ	Oficial de Obra																															
EDGAR ENRIQUE RIVERA JULIO	Ayudante																															
ANUAR ANTONIO GAVIRIA LEGUIA	Ayudante																															
RICARDO JOSE GUAL ALMARALES	Ayudante																															
DARIO ROGRIGUEZ HOYOS	Ayudante																															
YEXON ANTONIO DE LA ROSA GUTIERREZ	Ayudante																															
UBALDO ANTONIO GAVIRIA LEGUIA	Ayudante																															
OLIVER JOSE BARRIOS CONTRERA	Operador de Maquinaria																															
JOSUE ELI SAN JUAN REYES	Operador de Maquinaria																															
HAIDER URIELES CARRILLO	Operador de Maquinaria																															
GUSTAVO ERNESTO COTES RODRIGUEZ	Conductor																															

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR
Residente de Obra
T.P. 08202-242612 ATL

Firma
Nomb EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula N 08202-181155 ATL

ANEXO No4.
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSORCIO ICASM2023

FECHA: 30 (Día) ABRIL (Mes) 2025 (Año)

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

CONTRATO DE OBRA No: LP 006 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICASM2023 **VIGENCIA:** 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CM 007 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S **INFORME MENSUAL No.** 2

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	abr-25																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720
Nublado / Llovizna																															0
Lluvia Fuerte																															0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR
Residente de Obra
Matrícula No.: 08202-242612 ATL

Firma
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL

ANEXO No. 5
MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

MES DEL INFORME 2 **CONTRATO DE OBRA No.** LP 006 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICASM2023

PROYECTO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 007 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO	abr-25																														
	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
EXCAVADORA R220LC-9S	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I					I	I	I	I	I	I		I	I	I	
EXCAVADORA HYNDAI HX220S 1	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I					I	I	I	I	I	I		I	I	I	
EXCAVADORA HYNDAI HX220S 2	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I					I	I	I	I	I	I		I	I	I	
GPS GNSS RTK	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I					I	I	I	I	I	I		I	I	I	
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I					I	I	I	I	I	I		I	I	I	

OBSERVACIONES: **NINGUNA**

CONVENCIONES: **ACTIVO=A, EN REPARACIÓN=R, INACTIVO=I.**

Firma:
Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR
Residente de Obra
T.P. 08202-242612 ATL

Firma
Noml EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782970	2	CONSORCIO ICASM 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1497219701	9485790850	E	2025/05/19	2025/05/21	BANCO DE BOGOTA	2	$7,402,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																							$23,122,800	$3,700,200			$24,622,800	$985,600			$24,777,013	$991,800			$24,622,800		$1,714,200		$0	$0		$7,391,800
Centro de Trabajo: Principal (17 Afiliados)																							$23,122,800	$3,700,200			$24,622,800	$985,600			$24,777,013	$991,800			$24,622,800		$1,714,200		$0	$0		$7,391,800
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (17 Afiliados)																							$23,122,800	$3,700,200			$24,622,800	$985,600			$24,777,013	$991,800			$24,622,800		$1,714,200		$0	$0		$7,391,800
1	CC	1192808247	ATENCIO YEISON																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1129567184	CARO JONATHAN																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF33	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
3	CC	1004424744	CERVANTES DAYANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1065126284	DE LA ROSA YEXON	X																	23100 1	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF33	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	6.960%	$56,200	17	$0	$0	Si	$249,900
5	CC	1083460126	GAVIRIA ANUAR	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1083452974	GAVIRIA UBALDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1082968730	GIRALDO ANDRES																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	12618745	GUAL RICARDO		X															X	23020 1	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF33	7	$486,363	$19,500	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	Si	$109,200
9	CC	12626312	NOGUERA LEONARDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1083019606	OSPINO SANTIAGO																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF33	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
11	CC	12542537	PACHECO RAFAEL																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF33	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$224,400
12	CC	19597805	PADILLA JOSE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	72247345	PERALTA ABDON																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1083003795	PONTON ANDRES																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF33	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
15	CC	7593881	RIVERA EDGAR																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	9120486	RODRIGUEZ DARIO	X																	25-14	20	$949,000	$151,900	ESSC24	20	$949,000	$38,000	CCF33	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
17	CC	1082986414	VENECIA JOSE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(17)**																				$23,122,800	$3,700,200			$24,622,800	$985,600			$24,777,013	$991,800			$24,622,800		$1,714,200		$0	$0		$7,391,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782970	2	CONSORCIO ICASM 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1497219701	9485790850	E	2025/05/19	2025/05/21	BANCO DE BOGOTA	2	$7,402,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$3,700,200	$5,000	$0	$3,705,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$356,900	$500	$0	$357,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$379,700	$500	$0	$380,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,454,800	$3,300	$0	$2,458,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$508,800	$700	$0	$509,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,714,200	$2,300	$0	$1,716,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,714,200	$2,300	$0	$1,716,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$991,800	$1,300	$0	$993,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	17	$991,800	$1,300	$0	$993,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$985,600	$1,600	$0	$987,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$209,000	$300	$0	$209,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$92,000	$200	$0	$92,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$234,000	$400	$0	$234,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$146,300	$200	$0	$146,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$190,300	$300	$0	$190,600
TOTAL				**17**	**$7,391,800**	**$10,200**	**$0**	**$7,402,000**

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSUE ELI SANJUAN REYES identificado(a) con CC 1082947445 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1475057578	9485889204	E	2025-05-12									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,925,500	$308,100
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,925,500	$134,100
CCF	CAJAMAG	30	4%	$1,925,500	$77,100
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,925,500	$77,100

Este certificado se expide el día 2025-05-30 a las 04:20.

Certificado de Aportes

Se certifica que HAIDER FARID URIELES CARRILLO identificado(a) con CC 85372107 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1475057578	9485889204	E	2025-05-12									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,977,277	$316,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,977,277	$137,700
CCF	CAJAMAG	30	4%	$1,977,277	$79,100
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,977,277	$79,100

Este certificado se expide el día 2025-05-30 a las 04:21.

Certificado de Aportes

Se certifica que OLIVER JOSE BARRIOS CONTRERAS identificado(a) con CC 1065574822 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1475057578	9485889204	E	2025-05-12									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,874,777	$300,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,874,777	$130,500
CCF	CAJAMAG	30	4%	$1,874,777	$75,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,874,777	$75,000

Este certificado se expide el día 2025-05-30 a las 04:19.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12552112		COTES RODRIGUEZ GUSTAVO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 nO 2a-06 oficina 301	SANTA MARTA-MAGDALENA	4378806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	25752628	9483489028	I	2025/05/06	2025/04/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$178,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	12552112 COTES GUSTAVO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12552112		COTES RODRIGUEZ GUSTAVO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 nO 2a-06 oficina 301	SANTA MARTA-MAGDALENA	4378806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	25752628	9483489028	I	2025/05/06	2025/04/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$178,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$178,000**	**$0**	**$0**	**$178,000**

Certificado de Aportes

Se certifica que ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO identificado(a) con CC 1083009348 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

B&P CONSTRUCCIONES SAS NI 900481955

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1500116516	9486046430	E	2025-05-22		X															X

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	12	16%	$1,040,000	$166,400
ARL	ARL SURA	12	6.96%	$1,040,000	$72,400
CCF	CAJAMAG	12	4%	$2,480,833	$99,300
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	12	4%	$1,040,000	$41,600

Este certificado se expide el día 2025-05-22 a las 03:28.

Certificado de Aportes

Se certifica que ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ identificado(a) con CC 1082968730 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ICASM 2023 NI 901782970

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1497219701	9485790850	E	2025-05-21																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAJAMAG	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	COOSALUD MOVILIDAD	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-05-22 a las 03:34.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO**, identificada con **CC** número **52934912**, aportó por **ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO** identificado(a) con **CC** número **52934912** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2025-4 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Abril - 2025	85925738	22/04/2025	No
231001	Colfondos	59															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Abril - 2025	85925738	22/04/2025	No
14-11	ARL SURA	59															0		30	$1,423,500	0.00522	$7,500	$0	$0	Abril - 2025	85925738	22/04/2025	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **April** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

icontec ISO 9001 CO-SC5852-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

Certificado de Aportes

Se certifica que JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR identificado(a) con CC 1129567184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ICASM 2023 NI 901782970

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1497219701	9485790850	E	2025-05-21																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,300,000	$368,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,300,000	$160,100
CCF	CAJAMAG	30	4%	$2,300,000	$92,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$2,300,000	$92,000

Este certificado se expide el día 2025-05-30 a las 04:16.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA identificado(a) con CC 73113864

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9485992622	1480343739	E	2025-05-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	$7,194,000	4%	$287,800
9485992622	1480343739	E	2025-05-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	$7,194,000	16%	$1,151,100
9485992622	1480343739	E	2025-05-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																	$7,194,000		$36,000
9485992622	1480343739	E	2025-05-14	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																	$7,194,000		$36,000
9485992622	1480343739	E	2025-05-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																	$0	0%	$0
9485992622	1480343739	E	2025-05-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																	$0	0%	$0
9485992622	1480343739	E	2025-05-14	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	$7,194,000	4.35%	$313,000
9485992622	1480343739	E	2025-05-14	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	$7,194,000	4%	$287,800

Este certificado se expide el día 2025-05-30 a las 04:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que ROSA ELVIRA VILLAMIZAR SIERRA identificado(a) con CC 1082980516 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

B&P CONSTRUCCIONES SAS NI 900481955

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1500116516	9486046430	E	2025-05-22																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,000,000	$320,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,000,000	$139,200
CCF	CAJAMAG	30	4%	$2,000,000	$80,000
EPS	SANITAS	30	4%	$2,000,000	$80,000

Este certificado se expide el día 2025-05-22 a las 03:30.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-27, 02:32:44 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1072210923

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 02/05/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANILO GREGORIO RODRIGUEZ CORREA		
Documento	CC85474247	**Dirección**	CL 20 #30 - 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4203020
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,CULTURAL HISTORICO	**Departamento**	MAGDALENA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 85474247	DANILO GREGORIO RODRIGUEZ CORREA	03	00	X	X															0	16	16	0	0	(230301) PORVENIR	$ 3.520.000	$ 563.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.520.000	$ 440.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.520.000	$ 3.520.000	$ 0	$ 0	$ 563.200	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.200	$ 0	$ 1.003.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-01, 08:52:42 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076041331

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 01/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EUGENIO JOSE PRADA DAZA		
Documento	CC19145528	**Dirección**	CL 76 #54 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6692364
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19145528	EUGENIO JOSE PRADA DAZA	57	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400	$ 21.800	$ 256.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP 006 de 2023

OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES".

CONTRATISTA
CONSORCIO ICASM2023
NIT. 901.782.970-2

INFORME SOCIAL

DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 ABRIL DE 2025

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. 4

2. Componente No.1 LECTURA TERRITORIAL

2.1 IDENTIFICACION AREA DE INFLUENCIA 8

2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE CONTROL DE RIESGO. 11

2.1.3 DIRECTORIO DE ACTORES. **¡Error! Marcador no definido.**

3.2 10

3.2.1 PIEZAS DE DIVULGACIÓN 12

3.2.2 REUNIONES DE PARTICIPACIÓN 13

3.2.3 ATENCIÓN DE PQRSF 27

3.2.4 ACTAS DE VECINDAD 28

4.3 Componente No.3 CAPACIDAD DE MANO DE OBRA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 29

5.4 Componente No.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN **30**

Índice de tablas.

Tabla 1. Identificación de los Impactos Sociales.

Tabla 2. Directorio de actores.

Tabla 3. Componente Comunicación, Divulgación, Acompañamiento Social.

Tabla 4. Componente Mano de Obra en la Zona.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene el propósito de dar a conocer las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 01 de abril hasta el 30 de abril de 2025, estas actividades son contempladas en el marco del Proyecto **"**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**"**.
Por medio del componente social se lleva a cabo constantemente el desarrollo de estrategias que contribuyan a mitigar el impacto social negativo que pudieran ocasionar las actividades de remoción en las comunidades próximas al área de influencia del presente proyecto.

A continuación, se detallan cada una de las actividades realizadas este mes con sus respectivos productos.

CONTRATO DE OBRA:	**No. LP 006 de 2023**
OBJETO:	**“**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”.
LOCALIZACIÓN:	Santa Marta
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATISTA:	Consorcio ICASM2023
INTERVENTORÍA:	Interventores e Ingeniería S.A.S
NIT CONSORCIO ICASM2023:	901.782.970-2
VALOR INICIAL:	7303.05 SMMLV
PLAZO INICIAL:	Vigencia 2025
FIRMA DEL CONTRATO:	26 de diciembre de 2023
ACTA DE INICIO:	19 de marzo de 2024
PRORROGA:	NINGUNA

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Localización general

DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA.

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.
Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14' 50" de latitud norte y 74º 12' 06" de latitud oeste.
El municipio se encuentra limitado por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur con los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar.

La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta.

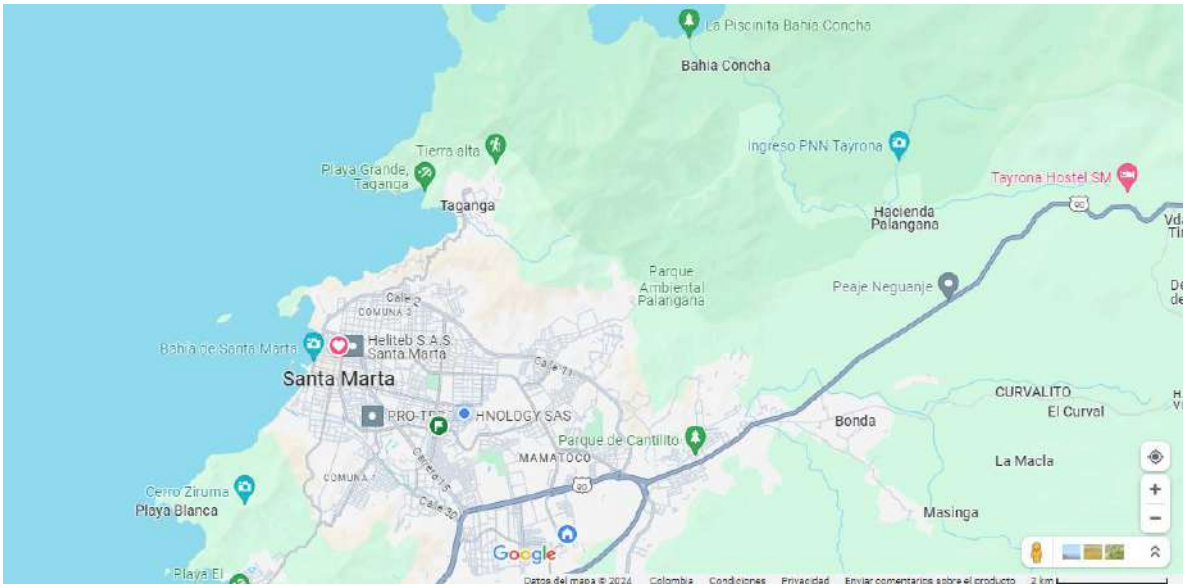


Ilustración 1 Localización general Santa Marta D.T.C.H.

Localización general del cuerpo de agua a intervenir

El cuerpo de agua que está siendo intervenido durante la vigencia del año 2025, es la Quebrada Bureche, localizado en el municipio de Santa Marta (Magdalena).
Tiene una longitud 2, 8 kms desde la entrada del barrio La Quemada hasta la desembocadura al mar y un área de protección de 4, 1 hectáreas la cual corresponde al 48,7 % del total de su recorrido dentro del casco urbano.
El cauce principal
-Río Gaira- nace en la Cuchilla de San Lorenzo a una altitud de 2301 msnm y desemboca en el Mar Caribe en Bahía de Gaira en la ciudad de Santa Marta, después de 34 km de recorrido. El cauce del Río Gaira inicia en el extremo oriental del área rural del corregimiento de Minca, se nutre a partir de una intrincada red de drenaje dendrítica y comienza a serpentear con un alineamiento meándrico irregular, mientras suma las aguas de la quebrada El Jabalí, La Macanilla, Animaca y Las Mercedes.

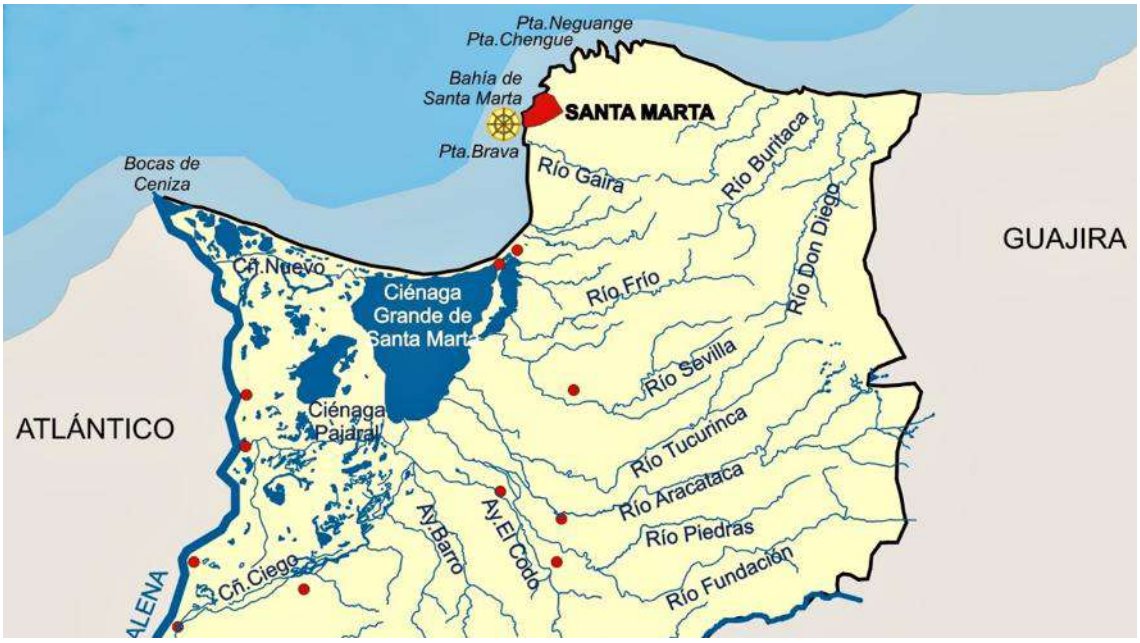


Ilustración 2 Localización cuerpo de agua - Publicado por la Universidad Externado de Colombia abril 2019

2. COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL

2.1. IDENTIFICACION ÁREA DE INFLUENCIA

Quebrada Bureche (Santa Marta – Magdalena).

QUEBRADA BURECHE: El cuerpo de agua que está siendo intervenido durante la vigencia del año 2025, es la Quebrada Bureche, el cual desemboca en el Río Gaira, localizado en el municipio de Santa Marta (Magdalena). Aunque es una quebrada menor, su cuenca hidrográfica es relevante para el drenaje natural de la zona. Posee una longitud aproximada de 5 a 7 km (dependiendo de la temporada). Su caudal es estacional: mayor en épocas de lluvias, reducido en verano.

Ilustración 2 Localización cuerpo de agua



Fuente: Adoptada de Google Earth por ICASM2023, 2025.

2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE CONTROL DE RIESGO

La identificación de los riesgos socioeconómicos, culturales, ambientales que pueden ser causados por la ejecución de actividades de remoción nos permite identificar los impactos ya sean positivos o negativos y su efecto en las comunidades. Por tanto, es importante identificar las situaciones que puedan afectar el desarrollo y la sostenibilidad del proyecto durante su ejecución.

RIESGO	EVENTO	NIVEL DE IMPACTO
1	Conflictos con comunidades conflictivas o que muestren desinterés por el proyecto y entidades ubicadas en el área conflictivas – No dejan realizar actividades.	Muy Alto – Negativo
2	Presencia y/o aumento de reasentamientos.	Muy Alto – Negativo
3	Atención de PQRSF por impactos generados de las actividades de dragado por parte de la comunidad y/o partes interesadas.	Muy Alto – Negativo
4	Contratación de Mano de Obra Local	Muy Alto – Positivo
5	Cambios en el tránsito de embarcaciones menores que transitan realizando su faena de pesca.	Muy Alto – Negativo
6	Afectación en caminos o vías destapadas por el paso de los equipos transportadores.	Muy Alto – Negativo
7	Ubicación y/o tránsito de equipos en áreas donde afecten cultivos.	Muy Alto – Negativo

Tabla 1. Identificación de los Impactos Sociales

2.1.3 DIRECTORIO DE ACTORES

El directorio de actores se convierte en una herramienta práctica, donde se recopila información como los datos personales, contactos y ubicación de cada uno de los actores o de las partes interesadas, el cual es verificado y actualizado periódicamente en el desarrollo del Proyecto **"**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**"**. CONTRATO NO. LP-006-2023.

DIRECTORIO DE ACTORES COMUNITARIOS

CONTRATO DE OBRA PÚBICA No. LP 006 DE 2023

INTERVERCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES


No	Nombre Completo	Doc. Identidad	Cargo/Entidad	Teléfono	Correo electrónico	Dirección
1	Gloria Gómez Requena		Presidenta JAC Villa Leidy	3014976899 – 3176845133	gg6077925@gmail.com	Cll 23 No. 2c-05, Villa Leidy
2	Claudia Carrera		Presidenta JAC El Paraíso – Rodadero	3014505401	carretams@gmail.com	Cra 2 No. 24-20, El Paraíso Rodadero
3	Harold Estrada		Director – Fundación Salva Tu Río	3006931996	fundacionsalvaturio@gmail.com	Santa Marta
4	Alex Manjarrez Acosta		Ingeniero ambiental - Fundación Patrulleritos Ambientales	No registra	fascupam@gmail.com	Santa Marta
5	Brigadier General Royer Gómez Herrera		Comandante de la Primera División ejército nacional de Alta Montaña	3163217717	DIV01@buzonejercito.mil.co	Santa Marta
6	Luis Alberto Vanegas Cotes		Alcalde Localidad 3 Gaira	3007659699	localidadtres@santamarta.gov.co	Santa Marta
7	Efraín Morales Jiménez		Edil y presidente de la comisión de recursos naturales y turismo Localidad 3 – Gaira	3124627222	moralesjimenezefrain@gmail.com	Santa Marta
8	Edward Fernando Orozco Oñate		Personero Distrital	3113848829	despacho@personeriadesantamarta.gov.co	Cll 11 D No. 17-130, Riascos
9	Sandra Manjarrez Córdoba		Lideresa COBASA La Coquera – Gaira	3106153754	manjarressandra7@gmail.com	calle 24c 5e18 Gaira
10	Gloria Córdoba Herrera		Presidenta JAC La Coquera – Gaira	3217710535	glorialuzcordobaherrera@gmail.com	La Coquera – Gaira
11	Neil Tapia Manjarez		Presidente JAC Las Flores – Gaira	3025780007	neilgaira57@gmail.com	Cll 16 # 11-63 Gaira
12	Nataniel Gómez Ríos		Miembro de la comisión de conciliación	3170938176	natanielg6@yahoo.es	Cl 17 carrera 10 esquina, Gaira
13	Mayerly Fernández		Presidenta JAC Villa Berlín – Gaira	3205760255	delamanoconvillaberlin@gmail.com - mayerlisfernandez3@gmail.com	Cl 23 F # 5 B 52
14	Blas Tapia Nieves		Líder social Gaira Centro	3105325885	blapia44@hotmail.com	Cll 15 12a-07 gaira
15	Luis Frías Guillen		Rector I.E D. Simón Bolívar de Gaira	3016622240	edsimonbolivargaira@yahoo.com	Cra 10 # 18 – 83 Gaira

3.2 Componente No.2 COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

Se realizan actividades para propiciar la interacción continua y permanente con las comunidades del área de influencia del proyecto y servir de enlace con estas no solo para brindar información sino además vincularlos a los diferentes procesos acompañamiento y participación social; y así mismo, recibir y atender sus inquietudes derivadas de la intervención en el marco del presente proyecto.

3.2.1 PIEZAS DE DIVULGACIÓN

Cartelera informativa: Se deberá establecer dentro del P.A.C un punto de fácil visualización, para las acciones de información y difusión donde se instalará una cartelera en la que se exponga información que contenga los aspectos más relevantes del proyecto, como avances de la obra, notas informativas, mecanismos de recepción de PQRSF y cualquier aspecto que se considere relevante. Dicha información deberá ser actualizada semanalmente.

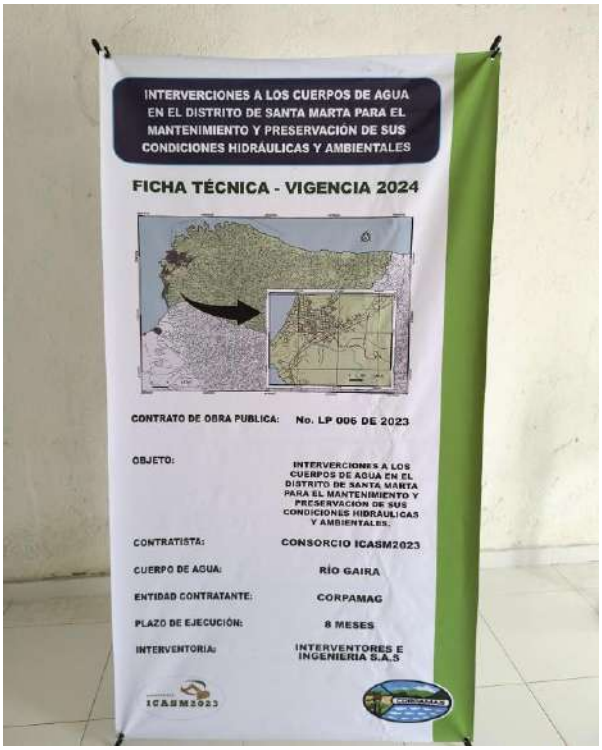

Valla informativa del proyecto: Se realiza la instalación de la valla informativa con información del contrato tal como objeto y número del contrato, Contratista, Interventoría y plazo de ejecución. La valla informativa de la vigencia 2024 se encontraba ubicada en un lugar estratégico en el barrio Paraíso Rodadero sobre el puente de la carrera 4 con calle 24, pero de acuerdo con el testimonio del líder social de la comunidad, la valla fue retirada por personas en situación de calle que desarmaron la estructura que la soportaba para venderla como chatarra.

3.2.2 REUNIONES DE PARTICIPACIÓN

Se realizaron las siguientes actividades:

- El 08 de abril se realizó un reconocimiento de contexto en el área de influencia de la Quebrada Bureche a fin de identificar posibles puntos de acceso para maquinaria y volquetas, en compañía de la profesional de la interventoría.




- El 28 de abril se realizó un recorrido por el punto de Geos No. 1 en el sector de la Av. Licorera de Gaira, en compañía de supervisión técnica, el representante del predio Fundación Grupo Integra y la interventoría.




3.2.3 ATENCIÓN DE PQRSF

Durante la ejecución del presente mes del Proyecto **"**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**"** CONTRATO NO. LP-006-2023, no se presentaron para este periodo ninguna PQRSF por parte de la comunidad o las entidades ubicadas en el área de influencia del proyecto.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

3.2.4 ACTAS DE VECINDAD

Se levantará una información teniendo en cuenta que el área directa de la intervención es el mismo cuerpo de agua Quebrada Bureche, se considerara área de relacionamiento las estructuras que se encuentren a lado y lado del río, esta información se consignará en un documento llamado Acta de Vecindad la cual será aprobada por la interventoría, a su vez funcionara ante alguna situación de manifestación por parte de la comunidad y/o estructuras encontradas en el río que puedan poner en riesgo el libre desarrollo del proyecto. Al finalizar el proyecto se levantará las actas de vecindad de cierre la cual contará con la firma a satisfacción del propietario de las estructuras encontradas.

Para este período, no se realizaron levantamiento de actas de vecindad en el área de influencia del proyecto para esta vigencia.

ACTAS DE INICIO MES DE ABRIL

No.	PROPIETARIO/ENCARGADO	DIRECCIÓN DEL PREDIO	TIPO DE PREDIO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Componente No.3 CAPACIDAD DE MANO DE OBRA LOCAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

Para este periodo se tuvo en cuenta la contratación de mano de obra local calificada y no calificada que cumpla con los requisitos técnicos establecidos por el proyecto, así como los servicios locales que se requieran. A la fecha se cuenta seis (6) personas contratadas para los siguientes cargos:

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

No.	NOMBRE	CARGO	RESIDENCIA
1	Ronald Alberto Mendoza Rivera	Ayudante de obra	CALLE 13 # 16 - 85 BARRIO GAIRA
2	Edgar Rivera Julio	Ayudante de obra	VILLA LEIDY
3	Andres Pontón Albor	Biólogo	LIBANO
4	Juan José Cervantes Romero	Ayudante de obra	VILLA LEIDY
5	Yeison Atencio Barrios	Ayudante de obra	
6	Ubaldo Gaviria Legía	Ayudante de obra	AV LICORERA – GAIRA

También se tiene en cuenta la contratación de bienes y servicios donde se promueve la economía local mediante compra de insumos en ferreterías, estación de servicios, alquiler de viviendas, locales y compra de alimentos.

5.4 Componente No.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Durante este periodo se realizaron y se presentaron informes semanales y cronograma de actividades los cuales fueron entregados a la interventoría. A su vez, la profesional social de interventoría brinda acompañamiento en las actividades sociales realizadas durante este periodo.

Como se señala en los términos de referencia del presente contrato, de acuerdo con el cronograma de actividades y el avance del proyecto se deben entregar informes de avance de la gestión social y las novedades que se presenten. Se entregarán informes semanales, mensual y/o de finalización de la implementación del PGS en los cuales se detalle del cumplimiento de cada una de las actividades previstas y se presenten los respectivos soportes de cada una.
