Id	Modo de tarea	ítem de Pago	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras	Sucesoras
1			**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO, GARANTIZANDO SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL**	**vie 2/05/25**	**mié 1/10/25**	**138,38 días**		
2			**FIRMA ACTA DE INICIO**	**vie 2/05/25**	**vie 2/05/25**	**0 días**		**17**
3								
4			**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS**	**vie 2/05/25**	**mié 1/10/25**	**138,38 días**		
5		**1**	**ACTIVIDADES GENERALES**	**vie 2/05/25**	**mié 1/10/25**	**138,38 dia**		
6		1	Limpieza y mantenimiento general de cunetas, incluye botada y disposicion adecuada del material sobrante, y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento.	lun 5/05/25	jue 15/05/25	10 días		8;10;14;19
7		~~2~~	~~Cerramiento en malla eslabonada a doble altura calibre 10, ojo 5*5 con una altura de la malla de 3,00 m, tubería galvanizada de 1 1/2" calibre 16 cada 2,0 m con pie amigos en diagonal en rombo cada 8,0 m, en tubería galvanizada de 1 1/2" calibre 16; horiz~~	~~sáb 31/05/25~~	~~vie 6/06/25~~	~~5 días~~	~~8~~	
8		~~3~~	~~Desmonte de malla eslabonada de doble de altura, incluye retiro de tubería galvanizada de soporte.~~	~~jue 15/05/25~~	~~sáb 31/05/25~~	~~15 días~~	~~6~~	~~7~~
9		4	Suministro e instalación de malla eslabonada para mantenimiento de integrados (porterías)	lun 23/06/25	mié 1/10/25	30 días	18	15
10		5	Desmonte de tablero viejo, S.T.I de Tablero de baloncesto de madera laminada encolada con resinas fenólicas, resistente a la intemperie, de 180x105x2 cm, para usuarios de más de 8 años, con aro de varilla maciza de 20 mm de espesor y 45 cm de diámetro.	jue 15/05/25	sáb 19/07/25	60 días	6;17	16;18
11		6	Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño	vie 22/08/25	mar 30/09/25	36 días	20;13	
12		7	Suministro transporte e instalación de reflector 200w tipo sylvania o similar.	jue 31/07/25	mar 2/09/25	30 días	18;20;13CC+10 días	
13		8	Suministro, transporte e instalación de grama sintética, uso multideportivo,tipo: tufting pelo cortado; hilado 100% polietileno 12000 dtex; fibrilado, o fibrilada (según requerimiento), bicolor; FIFA 2 estabilizado con protección UV, altura del pelo 50 mm	lun 21/07/25	jue 21/08/25	30 días	15;20	11;12CC+10 días
14		9	Desinstalación de grama sintetica y disposición del material existente para su reutilización en relleno	jue 15/05/25	sáb 31/05/25	15 días	6	
15		10	Reparcheo de grama sintetica reutilizada para reparcheo en canchas alternas varias zonas.	jue 3/07/25	sáb 19/07/25	15 días	9	13
16		11	Suministro, transporte y colocación de malla de protección en nylon ojo Nº 3. Incluye cable tensor trenzado de acero galvanizado de 1/4". Incluye tensor y perros galvanizados y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	jue 3/07/25	mar 30/09/25	18 días	10;18FC+10 días	
17		12	Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utiliz	vie 2/05/25	mar 13/05/25	10 días	2	10
18		13	S.T.I de Cancha múltiple fija Para baloncesto y microfútbol, en tubería agua negra de 1 ½, 2 y 3 pulgadas. 2 tableros en acrílico cristal 10mm. 2 aros metálicos. 2 mallas para baloncesto y 1 juego de 2 mallas para microfútbol	vie 6/06/25	mar 9/09/25	60 días	10	12;9;16FC+1 días
19		~~14~~	~~Demolición de losa en concreto, incluye el cargue, transporte y botada de escombros, herramienta manual o mecánicamente. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques), instalaciones embebidas, con martillo neumatico con compresor~~	~~jue 15/05/25~~	~~sáb 31/05/25~~	~~15 días~~	~~6~~	~~20~~
20		15	Suministro, transporte y colocacion de Concreto de 21 Mpa, para losas (E=10), y otros elementos, Incluye mano de obra, vibrado, formaletas, juntas, fajas, ranuras. Incluye acero de refuerzo (malla electrosoldada)	jue 15/05/25	vie 6/06/25	20 días	19	11;13;12
21								
22			**ENTREGA DE OBRA**	**mié 1/10/25**	**mié 1/10/25**	**0 días**		

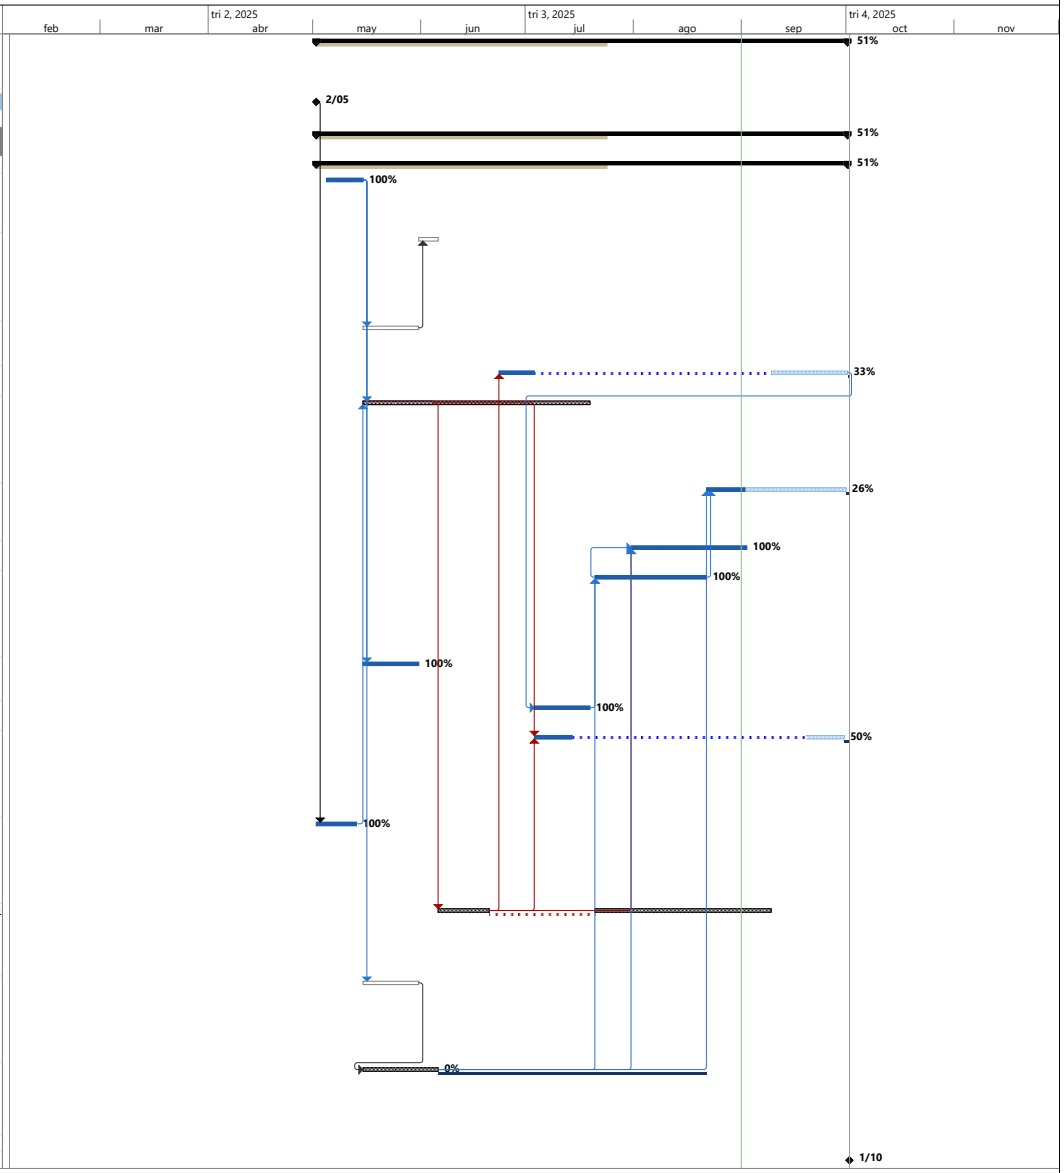

Mantenimiento Canchas Constructora
Master Oriente S.A.S.
lun 1/09/25

Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Tareas críticas	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Retrasada	
Tarea	Sólo el comienzo	División crítica	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo		
División	Sólo fin	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite		
Progreso de tarea	Sólo duración	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva	Margen de demora		
