	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 21 de abril de 2025	**SEMANA No.**	**3**	DEL	**14-abr-25**	AL	**20-abr-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	19 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	19 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**SUPERVISOR:**	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El contratista inicia con actividades de obra en la provincia del SUMAPAZ "Municipio de Cabrera", con actividades de levantamiento topográfico que corresponden a la fase 1 de caracterización, *se realiza la materialización de los puntos de referencias topográficos deltas y cambios.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	1-mar-26	251			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	1-mar-26	251			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 334 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	1,24%	0,00%	-1,24%
Durante el periodo	0,47%	0,00%	-0,47%
Acumulado Actual	1,71%	0,00%	-1,71%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

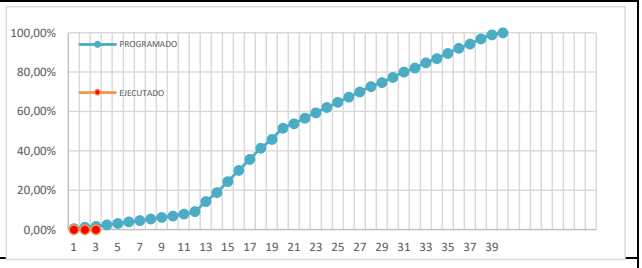

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	19,00	255,00	-4,68

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 400.372.382	$ -	0%
Durante el periodo	$ 150.139.643	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 550.512.025	$ -	0%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 550.512.025

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

A fecha de corte del presente informe, el contratista no cuenta con gestor social.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Se dio inicio a las actividades de levantamiento topográfico, el contratista no ha entregado los certificados de calibración de los equipos que se están utilizando para la ejecución de estas actividades.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

No se esta dando cumplimiento a las actividades de obra programadas, para la semana dos se debió haber iniciado con actividades correspondientes a la fase 1 "Caracterización" con actividades de topografía y con el procesamiento de información. Fase 2 " Apiques y muestras de suelo - Laboratorio de suelos y ensayos de suelos estabilizantes"

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No se evidencia disponibilidad de recursos económicos en el desarrollo de las actividades, esto teniendo en cuenta que no se están realizando actividades de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El contrato presenta un atraso financiero según programación de obra para la semana 3 con un atraso del 1,71%

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista realiza actividades de topografía para la fase 1 del proyecto "Caracterización", se solicito la entrega de los certificados de calibración de los equipos topográficos.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Dar cumplimiento a las actividades según programación, aumentar frentes de trabajo " cinco como mínimo según lo estipulado en el contrato de obra"	CONSORCIO VICGER 2021	28/04/2025
Solicitar entrega de los certificados de calibración de los equipos a utilizar.	ECG INGENIERIA SAS	28/04/2025

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contratista no esta dando cumplimiento a las actividades programadas para la fase 1 de caracterización y la fase 2 de laboratorios correspondientes al contrato de obra No 140 del 2025

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Levantamiento topográfico vía existente



Punto de amarre topográfico. "delta"



Obras de arte existente



Levantamiento topográfico sección vial existente



Punto de amarre topográfico "Mojón de concreto"

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Luis Alejandro Rodríguez Rojas
