ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 5 de mayo de 2025	**SEMANA No.**	**5**	DEL	**28-abr-25**	AL	**4-may-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	26 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	26 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**SUPERVISOR:**	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El contratista no realiza actividades de obra correspondientes a las fases 1 y 2 para la presente semana.
*Se realizan los recorridos de los tramos a intervenir correspondientes a la provincia del ALTO MAGDALENA en el Municipio de N**ariño** y en la provincia del TEQUENDAMA en el Municipios de **El Colegio**.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	2,48%	0,00%	-2,48%
Durante el periodo	0,62%	0,00%	-0,62%
Acumulado Actual	3,10%	0,00%	-3,10%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

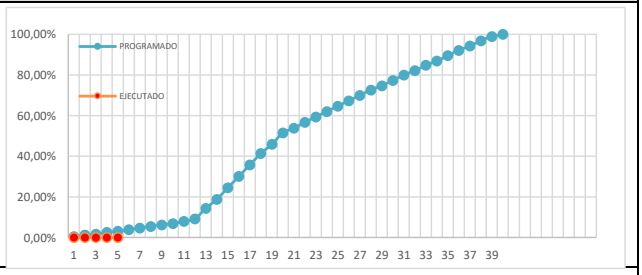

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	33,00	241,00	-8,50

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 800.744.764	$ -	0%
Durante el periodo	$ 200.186.191	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 1.000.930.955	$ -	0%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.000.930.955

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido en el presente informe, la interventoría realizó visita técnica en el municipio de El Colegio, con el objetivo de atender la reunión citada por la administración municipal, socializar generalidades del proyecto a ejecutar y realizar la verificación de las coordenadas del punto de inicio y final del tramo a intervenir en el marco del contrato de obra NO. ICCU140 DE 2025.
La actividad contó con la participación de presidentes de juntas de acción comunal (veredales y barriales), alcalde municipal, concejales, comunidad en general y Personería Municipal, en este escenario se socializó con los asistentes aspectos generales del proyecto e indicó que en este momento se adelanta la fase de caracterización que comprende el diagnóstico y evaluación del tramo a intervenir. La personería municipal, solicitó que una vez concluya dicha fase, sea nuevamente socializado con la comunidad el alcance del contrato, actividades a ejecutar y valor del contrato, además de solicitar que se garantice la atención a la comunidad.
En el área de intervención hay presencia de una planta de gas, planta de acueducto, ENEL y depósitos de ferreterías, haciendo que el corredor sea de alto tráfico, además, en los dos costados de la vía desde el punto cero hay presencia de viviendas, por lo que la interventoría solicita al contratista de obra adelantar las actividades correspondiente para el levantamiento de actas de vecindad, y del mismo modo, identificar y consolidar un mapa de los actores sociales que tienen presencia en el área de influencia del proyecto.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

*Para la presente semana el contratista no realiza actividades de obra, a la fecha no se ha entregado los certificados de calibración de los equipos topográficos para las actividades de levantamiento topográfico de la fase 1.
*El contratista no cuenta con el personal profesional mínimo ni con el equipo mínimo ofertado.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

No se esta dando cumplimiento a las actividades de obra programadas, para la semana cinco se debió haber iniciado con actividades correspondientes a la fase 1 "Caracterización" con actividades de topografía y con el procesamiento de información e informes . Fase 2 " Apiques y muestras de suelo - Laboratorio de suelos y ensayos de suelos estabilizantes e informes"

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No se evidencia disponibilidad de recursos económicos en el desarrollo de las actividades, esto teniendo en cuenta que no se están realizando actividades de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El contrato presenta un atraso financiero de $1,000,930,955 que corresponde a un 3,10% según programación de obra para la semana 4.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista realiza actividades de topografía para la fase 1 del proyecto "Caracterización". No se han entregado los certificados de calibración de los equipos topográficos.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Dar cumplimiento a las actividades según programación, aumentar frentes de trabajo " cinco como mínimo según lo estipulado en el contrato de obra"	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Contar en obra con los profesionales ofertados para la fase 1 y fase 2.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Contar con el equipo mínimo para la ejecución de las Fases 1 y 2.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Instalar Valla informativa en los frentes de trabajo.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contratista no esta dando cumplimiento a las actividades programadas para la fase 1 de caracterización y la fase 2 de laboratorios correspondientes al contrato de obra No 140 del 2025. *El contratista no cuenta con los profesionales propuestos para la fase 1 y 2 del proyecto. *El contratista no cuenta con el equipo mínimo requerido para las fases 1 y 2 del proyecto.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




VISITA INICIAL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA




VISITA INICIAL MUNICIPIO DE NARIÑO, CUNDINAMARCA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre:
