ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering, Consulting, Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 12 de mayo de 2025	**SEMANA No.**	**6**	DEL	**5-may-25**	AL	**11-may-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	26 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	26 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**SUPERVISOR:**	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El contratista da inicio a las actividades correspondientes al capitulo de CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS que corresponde a la fase 1 y fase 2 del proyecto
Municipios de Cabrera y Pandi : Se realizo actividades de levantamiento topográfico para identificar las características del corredor vial a intervenir como es longitudes, perfiles, secciones, obras de arte existentes, tramos de placa huella, colegios y demás elementos los cuales serán georreferenciados.
También se realizó actividades de laboratorio "apiques", estos se realizaron dando cumplimiento según las especificaciones generales de construcción de carreteras y las normas de ensayos de materiales en carretera " cada 250m y a 1.50m de profundidad".

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	3,10%	0,00%	-3,10%
Durante el periodo	0,78%	0,12%	-0,66%
Acumulado Actual	3,88%	0,12%	-3,76%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

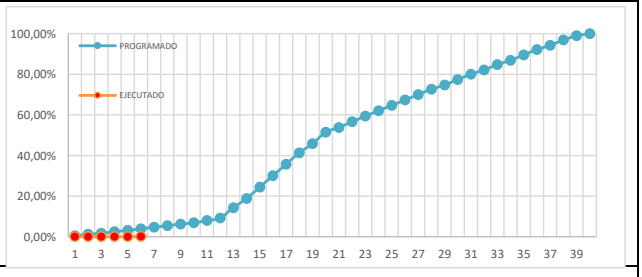

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	40,00	234,00	-10,30

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.000.930.955	$ -	0%
Durante el periodo	$ 250.232.739	$ 41.316.800	17%
Acumulado Actual	$ 1.251.163.694	$ 41.316.800	3%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.209.846.894

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo en mención el contratista no reportó el desarrollo de actividades de tipo social, por otro lado, la interventoría se encuentra en revisión para aprobación de las tres hojas de vida de los gestores sociales.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El contratista no esta dando cumplimiento al factor de calidad teniendo en cuenta lo siguiente:
1.No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.
2.No cuenta con el personal mínimo requerido para esta fase "residente de obra, topógrafo, cadenero, profesional SISO entre otros"
3. No cuenta con el equipo mínimo para ensayos, esto teniendo en cuenta que no se están realizando CBR IN-SITU.
4. El personal en obra no cuenta con los elementos mínimos de seguridad " Epps"
5. No se cuenta con los 5 frentes mínimos para las actividades de obra.
6. No se cuenta con la instalación de la valla en ninguno de los frentes.
8. Certificado de calibración de los equipos topográficos.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se esta dando cumplimiento parcial a las actividades según programación. Es importante que el contratista demuestre que se están adelantando actividades como " procesamiento de información topográfica, ensayos de laboratorio, procesamiento de ensayos de suelos estabilizantes, entre otras actividades contempladas para la semana 6" *

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se esta dando cumplimiento parcial a la disponibilidad de recursos una vez que ya se iniciaron actividades correspondientes a la fase 1 y 2 del proyecto, es importante reforzar esta disponibilidad de recurso teniendo en cuenta que se presenta un atraso en la ejecución de las actividades .

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El contrato presenta un atraso financiero de $1,209,846,894 que corresponde a un 3,76% según programación de obra para la semana 6.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista realiza actividades de topografía para la fase 1 del proyecto "Caracterización". No se han entregado los certificados de calibración de los equipos topográficos.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No se evidencian problemáticas en el componente social para la presente semana.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Dar cumplimiento a las actividades según programación, aumentar frentes de trabajo " cinco como mínimo según lo estipulado en el contrato de obra"	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Contar en obra con los profesionales ofertados para la fase 1 y fase 2.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Contar con el equipo mínimo para la ejecución de las Fases 1 y 2.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Instalar Valla informativa en los frentes de trabajo.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Cumplir con el componente de salud y seguridad en el trabajo	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se dio inicio a las actividades del contrato de obra para las fases1 y fase 2, es importante que el contratista incorporemos frentes de trabajo para dar cumplimiento a los tiempos establecidos para la fase 1 y 2. También es importante que se inicie con el procesamiento de la información de las actividades de topografía y laboratorio realizadas en los municipios de Cabrera y Pandi del departamento de Cundinamarca.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Actividades de Caracterización fase 1 " Levantamiento topográfico". Cabrera Cundinamarca.



Actividades de Caracterización fase 1 " Levantamiento topográfico". Pandi Cundinamarca.



Actividades de laboratorios fase 2 " Apiques ". Cabrera Cundinamarca.



Actividades de laboratorios fase 2 " Apiques ". Pandi, Cundinamarca.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS
