	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering, Consulting, Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 26 de mayo de 2025	**SEMANA No.**	**8**	DEL	**19-may-25**	AL	**25-may-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	54 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	54 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**SUPERVISOR:**	E.C.G. INGENIERÍA S.A.S.

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* No se realizan actividades de obra para la presente semana No 8 correspondientes a la fase de Caracterizacion y de Laboratorios. *Se realizo visita por parte de la interventoria y del contratista al Laboratorio " E.I.E. Echeverry" el pasado jueves 22 de mayo del 2025,se evidencio que el contratista no ha iniciado a realizar los ensayos de caracterizacion del material obtenido a travez de apiques en la provincia del Sumapaz (Cabrera,Pandi y Tibacuy). *Se realizo visita de reconocimiento del tramo vial correspondiente al Municipio de Anolaima, Cundinamarca.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	4,66%	0,22%	-4,44%
Durante el periodo	0,78%	0,00%	-0,78%
Acumulado Actual	5,43%	0,22%	-5,21%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

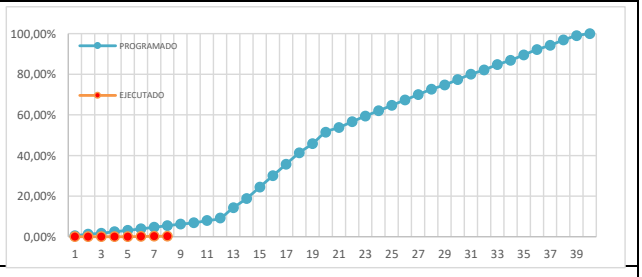

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	54,00	220,00	-14,28

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.501.396.433	$ 76.731.200	5,11%
Durante el periodo	$ 250.232.739	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 1.751.629.172	$ 76.731.200	4,38%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.674.897.972

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo en mención, la interventoría acompañó la visita técnica al municipio de Anolaima, el recorrido contó con la participación del secretario de planeación, representante del concejo municipal, presidente de JAC, áreas técnica y social tanto del contratista de obra como de la interventoría; se identificó a lo largo del tramo de intervención la presencia de viviendas en los dos costados de la vía, además de galpones avícolas que tienen un alto tránsito de insumos y productos.
También se evidenció en el corredor la presencia de tres escuelas rurales, la zona cuenta con servicio público de acueducto. La interventoría recomendó a la profesional social del contratista adelantar la identificación de los actores sociales del área de influencia, revisar los formatos de levantamiento de actas de vecindad para que con antelación puedan ser verificados y aprobados por la interventoría y el ICCU.
Se recomendó a la profesional social del contratista, verificar el trámite correspondiente a las vallas de comunicación e informar a la interventoría el estado. Del mismo modo, se agendará reunión del equipo social con el objetivo de fijar la ruta de trabajo.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El contratista no esta dando cumplimiento al factor de calidad teniendo en cuenta lo siguiente:
1.No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.
2.No cuenta con el personal mínimo requerido para esta fase "residente de obra, topógrafo, cadenero, profesional SISO entre otros"
3. No cuenta con el equipo mínimo para ensayos, esto teniendo en cuenta que no se están realizando CBR INSITU. para la presente semana no se conto con laboratorio en ninguna de las provincias.
4. El personal en obra no cuenta con los elementos mínimos de seguridad " Epps"
5. No se cuenta con los 5 frentes mínimos para las actividades de obra.
6. No se cuenta con la instalación de la valla en ninguno de los frentes.
8. No se han entregado los certificado de calibración de los equipos topográficos.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana No 8 el contratista no realizo actividades correspondientes a las fases de caracterizacion ni de laboratorios, lo que indica que no esta dando cumplimiento a las actividades según programacion, Para semana No 8 presente un atraso del 5,21%, es importante presentar un PLAN DE CONTINGENCIA por parte del contratista.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No se esta dando cumplimiento a la disponibilidad de recursos economicos en el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que no se vienen realizando actividades de caracterizacion ni de laboratorio en ninguno de los frentes, tampoco se a realizado entrega por parte del contratista de los avances de procesamiento de informacion de las actividades realizadas en los municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El contrato presenta un atraso financiero de $1.674,897,972 que corresponde a un -5,21% según programación de obra para la semana 8.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se realizaron actividades de obra en la presente semana. No se realizado la entrega de certificado de calibracion de los equipos de topografia.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

No se esta dando cumplimiento a la implementacion de los Epps en la ejecucion de las actividades.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se solicita al contratista entregar las planillas de afiliacion y pagos de aportes parafiscale del personal que se encuentra en obra durante los periodos de abril y mayo del 2025.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Durante el periodo del presente informe, no se identifican situaciones potenciales de riesgo que afecten a la comunidad o el desarrollo del proyecto.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Dar cumplimiento a las actividades según programación, aumentar frentes de trabajo " cinco como mínimo según lo estipulado en el contrato de obra"	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Contar en obra con los profesionales ofertados para la fase 1 y fase 2.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Contar con el equipo mínimo para la ejecución de las Fases 1 y 2.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Instalar Valla informativa en los frentes de trabajo.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Cumplir con el componente de salud y seguridad en el trabajo	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Entrega de planillas de afiliacion a seguridad social y parafiscales del personal, correspondiente a los meses de abril y mayo del 2025.	CONSORCIO VICGER 2021	28/05/2025
Entregar un PLAN DE CONTINGENCIA que permita nivelarse para la semana 13 el avance de obra según la programacion.	CONSORCIO VICGER 2021	28/05/2025

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*En la presente semana no se realizaron actividades en ninguno de los frente de obra.
*En laboratorio no se han iniciado ensayos de caracterizacion de las muestras tomadas mediante Apiques en los municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy.
*No se evidencia actividades de Caracterizacion vial con levantamiento topografico
* No se ha entregado por parte del contratista avance del procesamiento de informacion de los levantamientos topograficos realizados en los municipios de Caprera y Pandi.
*A la fecha se han realizado un total de 95 apiques en el Municipio de Cabrera, 31 apiques en el Municipio de Pandi y 82 Apiques en el Municipio de Tibacuy.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

















DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS
