	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering, Consulting, Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 9 de junio de 2025	**SEMANA No.**	**10**	DEL	**2-jun-25**	AL	**8-jun-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	61 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	61 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizan actividades de laboratorio con la toma de muestra de suelo "apiques" en el tramo vial correspondiente al Municipio de Viotá, Cundinamarca.
* Se realizan actividades de caracterización vial " Levantamiento topográficos" en los Municipios de Jerusalén, Nariño y Tibacuy.
* Se realizan actividades de procesamiento de información topográfica.
* Se realizan actividades correspondientes a ensayos de laboratorio a la toma de muestras de suelo de los Municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	6,21%	0,62%	-5,59%
Durante el periodo	0,62%	0,39%	-0,23%
Acumulado Actual	6,83%	1,01%	-5,82%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	68,00	206,00	-15,96

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

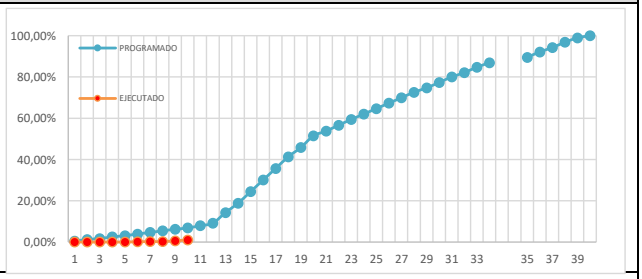


3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2.001.861.911	$ 205.281.942	10,25%
Durante el periodo	$ 200.186.191	$ 124.770.746	62,33%
Acumulado Actual	$ 2.202.048.102,00	$ 330.052.688,00	14,99%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	1.871.995.414

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Para el reporte del informe de la semana del 2 al 8 de junio de 2025, se realizó mesa de trabajo en compañía de las profesionales sociales del ICCU, contratista de obra e interventoría, el apoyo a la supervisión social del ICCU manifestó su preocupación por que a la fecha no ha recibido la programación de las socializaciones por provincias y los demás lotes ya han presentado esta actividad.
Las profesionales sociales del contratista mencionan, que han realizado tareas de reconocimiento de campo y han logrado establecer contacto con las alcaldías municipales para la identificación y consolidación del directorio de actores, además de adelantar el trámite ante la ARN.
La interventoría informa que se dieron los lineamientos de trabajo y que el contratista avanza en la elaboración del documento del plan de gestión social de acuerdo con lo establecido en la PAGA. También, informa que en este momento el contratista de obra adelanta el desarrollo de las actividades de la fase de caracterización y de los 10 municipios que se van a intervenir solo 4 han terminado las actividades, y teniendo en cuenta esto, desde el componente se han iniciado actividades de reconocimiento del territorio para adelantar la logística que se requiere para la realización de las reuniones de inicio.
La supervisión social, solicitó atender el requerimiento de la entidad y la Gobernación de realizar de manera inmediata las reuniones de inicio y posteriormente, cuando la fase de caracterización termine convocar nuevamente a la comunidad para una nueva reunión de inicio con los resultados de los estudios y diseños.
El apoyo a la supervisión social solicitó sea compartida la programación de las socializaciones y presentación de inicio para su revisión y aval, esto con antelación para agendar las fechas y que la entidad acompañe estas jornadas.
La próxima semana (del 9 al 13 de junio de 2025) el contratista remitirá una programación preliminar de la agenda con las fechas de realización y la logística de la actividad.

Del mismo modo, la interventoría realizó la entrega del informe social mensual N°2 correspondiente al 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El contratista no esta dando cumplimiento al factor de calidad teniendo en cuenta lo siguiente:
1.No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.
2.No cuenta con el personal mínimo requerido para esta fase "residente de obra, topógrafo, cadenero, profesional SISO entre otros"
3. No cuenta con el equipo mínimo para ensayos, esto teniendo en cuenta que no se están realizando CBR INSITU, se realiza ensayo de PDC
5. No se cuenta con los 5 frentes mínimos para las actividades de obra.
6. No se cuenta con la instalación de la valla en ninguno de los frentes.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para semana No 10 presenta un ejecutado del 1,01% vs un programado del 6,83% por lo que el contratista presenta un atraso del 5.82%.
Ha la fecha el contratista no ha entregado informes correspondientes al procesamiento de la información de los levantamientos topográficos y de los laboratorios.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos parcial para el desarrollo del objeto contractual, teniendo en cuenta que para la presente semana 10 se conto con personal y equipos de laboratorio y topografía.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El contrato presenta un atraso financiero de $1.871,995,414 que corresponde a un 5,82% según programación de obra para la semana 10.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Las actividades de topografía y de laboratorio se realizan con los estándares de calidad teniendo en cuenta que la empresa de laboratorio cuenta con los certificados de calidad al igual que los equipos utilizados en la topografía.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se cuenta con los elementos mínimos de protección "Epps" en las actividades realizadas durante la presente semana No 10.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se solicita al contratista entregar las planillas de afiliación y pagos de aportes parafiscales del personal que se encuentra en obra durante los periodos de abril y mayo del 2025.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

N/A

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Dar cumplimiento a las actividades según programación, aumentar frentes de trabajo " cinco como mínimo según lo estipulado en el contrato de obra"	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Contar en obra con los profesionales ofertados para la fase 1 y fase 2.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Contar con el equipo mínimo para la ejecución de las Fases 1 y 2.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Instalar Valla informativa en los frentes de trabajo.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Cumplir con el componente de salud y seguridad en el trabajo	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Entrega de planillas de afiliación a seguridad social y parafiscales del personal, correspondiente a los meses de abril y mayo del 2025.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Entregar un PLAN DE CONTINGENCIA que permita nivelarse para la semana 13 el avance de obra según la programación.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato.
Revisión Modificatorio No 1 contrato de obra.	INTERVENTORIA ECG	Inmediato.

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contratista mediante oficio CVG – ICCU –OF-0030-2025 Solicitud aprobación de Modificación No 1 - CONTRATO DE OBRA No. ICCU140.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS
