| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | **FECHA** | lunes, 7 de julio de 2025 | **SEMANA No.** | **14** | DEL | **30-jun-25** | AL | **6-jul-25** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA. |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de diciembre de 2025 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de diciembre de 2025 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 274 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 274 días |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 96 días | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 96 días |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL :** | $ 32.246.753.687 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 32.246.753.687 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 32.246.753.687 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizan actividades de laboratorio con la toma de muestra de suelo "apiques" en el tramo vial correspondiente al Municipio de Nilo y Nariño.
* Se realizan actividades de caracterización vial " Levantamiento topográficos" en los Municipios de Nilo.
* Se realizan actividades de procesamiento de información topográfica.
* Se realizan actividades correspondientes a ensayos de laboratorio a la toma de muestras de suelo de los Municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | Caracterización vial y ensayos | 2-abr-25 | 22-jun-25 | 82 | 14-abr-25 | | ejecución | -12 | ejecución |
| 2 | Explanación y excavaciones, replanteo vial | 24-jun-25 | 31-dic-25 | 191 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 3 | Mantenimiento Rasante | 24-jun-25 | 31-dic-25 | 191 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | | | | | | | | | |


**Plazo del proyecto:** 274 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 14,29% | 1,69% | -12,61% |
| Durante el periodo | 4,50% | 0,06% | -4,44% |
| Acumulado Actual | 18,80% | 1,75% | -17,05% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

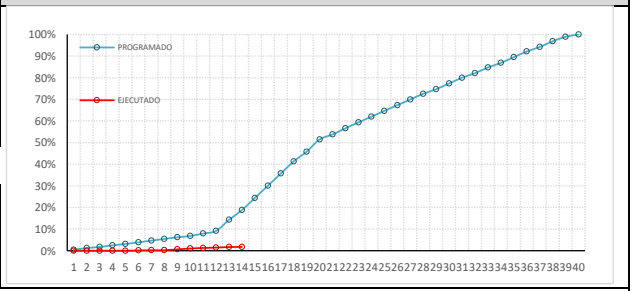


**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**


| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 274 días | 96,00 | 178,00 | -46,72 |

### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 4.609.036.183 | $ 549.525.142 | 11,92% |
| Durante el periodo | $ 1.452.701.781 | $ 19.675.612 | 1,35% |
| Acumulado Actual | $ 6.061.737.964,00 | $ 569.200.753,33 | 9,39% |

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**

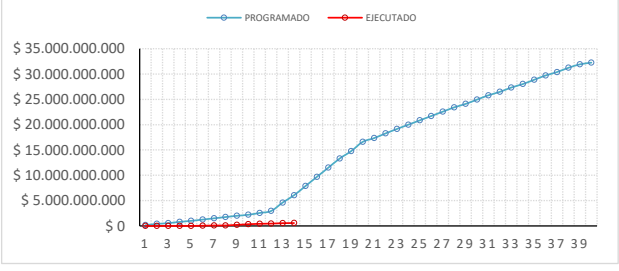



**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

| | |
|---|---|
| -$ | 5.492.537.211 |

| AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( %) |
| Acumulado anterior | | | 0% |
| Durante el periodo | | | 0% |
| Acumulado Actual | $ - | $ - | 0% |

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana evaluada se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión del documento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental versión 3, presentado por el Contratista
2. Generación de observaciones al PAGA, teniendo en cuenta que los ajustes presentados no cumplieron con lo solicitado por Interventoría
3. Se realizó acompañamiento a la socialización del proyecto en el municipio de Nilo Cundinamarca de la provincia del Alto Magdalena, donde asistió la comunidad, la Interventoría, la Entidad y el Contratista.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Para el presente informe semanal, la interventoría reporta que remitió observaciones al documento PAGA y a fecha de corte de este informe el contratista se encuentra en atención de observaciones, así mismo fue entregado el informe mensual social de interventoría ante la entidad.
Luego de coordinar y planificar con el área social del contratista la interventoría realizó recomendaciones para la logística de la reunión de inicio, posteriormente se realizó acompañamiento y apoyo a la reunión correspondiente a la socialización de inicio de obra en la provincia de Sumapaz, en el municipio de Nilo.

Durante la jornada, se contó con la participación de la comunidad en general, alcaldesa de Nariño y secretario de Planeación de Jerusalén, los asistentes participaron activamente y con actitud de escucha. Como compromiso de la actividad, la entidad acordó revisar los puntos de intervención del municipio de Nilo para atender las solicitudes de la comunidad de las veredas San Jerónimo, San Bartolo y Bella Vista.

Por otro lado, la interventoría espera que, para el próximo comité de seguimiento, sean socializados por parte de la entidad al contratista de obra el procedimiento correspondiente a las vallas informativas, se espera concertar especificaciones de diseño, dimensión y cantidad.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

1. Durante la semana se sigue reiterando la solicitud de entrega de las planillas de pago de seguridad social al contratista de obra.
2. El contratista manifiesta que el día 30 de Julio para la etapa de obra estaría ingresando el Profesional SST de campo.
3. Se recibe respuesta al oficio 25C02 DTO 018 a las observaciones realizadas del SG-SST del contratista para verificación y aprobación
4. Se realiza reporte semana y informe semanal de Interventoria mes Junio.
5. Se solicita al contratista realizar la entrega de la documentación (SOAT, tarjeta, licencia etc) de los vehículos que se encuentran realizando actividades de transporte de personal o materiales en el proyecto.

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El contratista no esta dando cumplimiento al factor de calidad teniendo en cuenta lo siguiente:
1.No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.
2.No cuenta con el personal mínimo requerido para esta fase "residente de obra, topógrafo, cadenero, profesional SISO entre otros"
3. No cuenta con el equipo mínimo para ensayos, esto teniendo en cuenta que no se están realizando CBR INSITU, se realiza ensayo de PDC
5. No se cuenta con los 5 frentes mínimos para las actividades de obra.
6. No se cuenta con la instalación de la valla en ninguno de los frentes.

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la semana No 14 se presenta un ejecutado del 1.75% vs un programado del 19,80% por lo que el contratista presenta un atraso del 17,05%.
Ha la fecha el contratista no ha entregado informes correspondientes al procesamiento de la información de los levantamientos topográficos y de los laboratorios.

### 8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

### 8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El contrato presenta un atraso financiero de $5.492.537.211 que corresponde a un 9,39% según programación de obra para la semana 14.

### 8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Las actividades de topografía y de laboratorio se realizan con los estándares de calidad teniendo en cuenta que la empresa de laboratorio cuenta con los certificados de calidad al igual que los equipos utilizados en la topografía.
Durante la presente semana el contratista cuenta con camioneta para las actividades de obra, pero esta no corresponde según la descripción según presupuesto el cual indica la siguientes características "Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)

### 8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

### 8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

### 8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

### 8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

| 9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA PROGRAMADA** |
| Dar cumplimiento a las actividades según programación, aumentar frentes de trabajo " cinco como mínimo según lo estipulado en el contrato de obra" | CONSORCIO VICGER 2021 | Inmediato. |
| Contar en obra con los profesionales ofertados para la fase 1 y fase 2. | CONSORCIO VICGER 2021 | Inmediato. |
| Contar con el equipo mínimo para la ejecución de las Fases 1 y 2. | CONSORCIO VICGER 2021 | Inmediato. |
| Instalar Valla informativa en los frentes de trabajo. | CONSORCIO VICGER 2021 | Inmediato. |
| Cumplir con el componente de salud y seguridad en el trabajo | CONSORCIO VICGER 2021 | Inmediato. |
| Entrega de planillas de afiliación a seguridad social y parafiscales del personal, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2025. | CONSORCIO VICGER 2021 | Inmediato. |
| | | |
| | | |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**

























**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS
