	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 14 de julio de 2025	**SEMANA No.**	**15**	DEL	**7-jul-25**	AL	**13-jul-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	103 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	103 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* El contratista realiza actividades correspondientes al componente SIG, con la toma de foto ejes en los municipios de Cabrera y Pandi.
* Se realizan actividades de procesamiento de información topográfica.
* Se realizan actividades correspondientes a ensayos de laboratorio de las muestras tomadas en las provincias de Alto Magdalena y de Tequendama.
* El contratista entrega resultados de ensayos de granulometría, contenido de humedad, limites e índice de plasticidad y determinación del contenido de materia orgánica a las muestras de suelo tomadas en la provincia del Sumapaz.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	Reprogramacion.		
Durante el periodo	0,70%	0,39%	-0,31%
Acumulado Actual	5,77%	2,14%	3,63%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

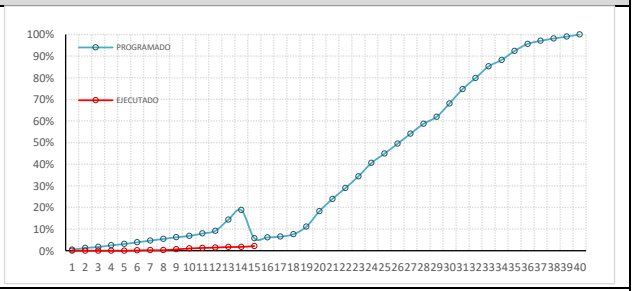

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	103,00	171,00	9,95

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0,00%
Durante el periodo	$ 225.209.145	$ 126.845.000	56,32%
Acumulado Actual	$ 1.861.004.277	$ 690.257.411,44	37,09%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

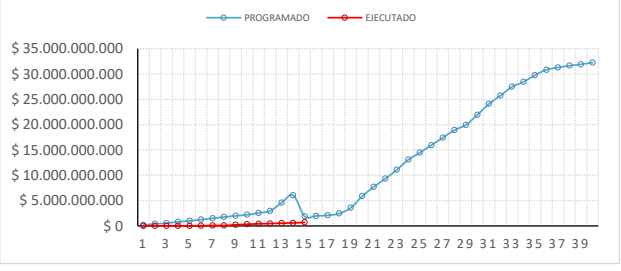


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.170.746.866

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana evaluada se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisión del documento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental
2. Generación de observaciones del PAGA
3.Revision y generación de observaciones de la Presentación de la reunión de inicio desde el componente ambiental
4. Reunión por parte de la Interventoría, ICCU y el Contratista con el fin de evaluar la gestión ambiental realizada hasta el momento.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Para el reporte de la gestión social del 7 al 13 de julio de 2025, la interventoría se permite informar que el contratista de obra realizó la reunión de inicio en la provincia de Sumapaz agendada el 10 de julio de 2025, para la actividad fue convocada la comunidad de los municipios de Pandi, Cabrera y Tibacuy, sin embargo, solo asistieron residentes de Pandi.
Dentro de las recomendaciones hechas por la comunidad se encuentra la solicitud del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenos Aires de tener en cuenta que, la vía es el principal corredor para transportar y comercializar la producción agrícola de fruta y verduras, por esa razón solicita que los cierres que puedan realizarse sean informados con anterioridad a toda la comunidad e incluir a la administración municipal de San Bernardo en el proceso de socializaciones y de esta manera evitar afectaciones pues este municipio también tiene tránsito por esta zona.
También, la comunidad recomendó que para el proceso de contratación tuvieran en cuenta que una vez finalicen las obras el personal contratado sea retirado del régimen contributivo y sea trasladado al régimen subsidiado.
En cuanto al documento PAGA, la interventoría se permite informar que en compañía de las profesiones sociales se realizó mesa de trabajo con el objetivo de revisar las observaciones realizadas y avanzar en la construcción de documento, el avance o resultado de la gestión será reportado en el siguiente informe.
Por otro lado, se solicitó al contratista dar inicio a las actividades requeridas para la identificación y elaboración del inventario de predios necesario para el levantamiento de las actas de vecindad, teniendo en cuenta que esta obligación debe realizarse previo al inicio de obras.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

1.No se cuenta con el Profesional SST requerido en campo
2.No se tiene el vehículo apropiado para el transporte del personal a obra de acuerdo a las características específicas y las condiciones del terreno poniendo en riesgo al personal
3. Se debe contar con el personal adecuado y capacitado para cada actividad, ningún profesional debe realizar una actividad diferente para la cual no fueron contratados. Esto con el fin de evitar incidentes o accidentes en el proyecto.
4. Se solicita la entrega de reporte de personal de obra y seguridad social del personal.
5. Se solicita empezar a implementar el programa de SG-SST y realizar las correcciones del mismo enviadas por esta Interventoría.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Una vez revisado el plan de calidad remitido por el contratista de obra CONSORCIO VICGER 2021 se evidencia que el mismo no se encuentra conforme a lo requerido en los numerales de la norma NTC ISO 9001:2015, como se indica en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN PLAN DE CALIDAD del Pliego de Condiciones. En este sentido, el contratista debe ajustar el plan de calidad e incluir los requisitos de la Norma como lo son:
- Contexto de la organización - Liderazgo y compromiso, enfoque al cliente - Política de calidad (comunicación de la política) - Roles, responsabilidades y autoridad del consorcio - Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Planificación de lo cambios - Recursos - Trazabilidad de las mediciones - Competencia - Toma de conciencia - Comunicación - Control documental - Planificación y control operacional - Requisitos para cumplir con la obra - Todo lo relacionado con diseño (entradas, control, salidas, cambio) - Control de proveedores - Salidas no conformes - Entrega a satisfacción de lo realizado - Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Auditorías - Revisión por la dirección - Mejora continua, Se precisa, que estos son los requisitos generales, el contratista debe revisar cada numeral y subnumeral de la norma para ajustar el plan de calidad. Se remite la lista de chequeo de todos los requisitos de la NORMA ISO 9001:2015

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

* Para la caracterización de los suelos de fundación y materiales sobre los cuales se va a llevar a cabo el proceso de estabilización, se deben de realizar como mínimo los ensayos descritos en la norma invias articulo 237-22 tabla 237-3, pero el proyecto solo tiene contemplado en su presupuesto realizar ensayos de " granulometría, contenido de humedad, limites e índice de plasticidad, pH de suelos, contenido de materia orgánica, relación de humedad y peso unitario y resistencia a la compresión en Mpa". Por lo anterior es importante que el contratista realice un ajuste en su plan de ensayos garantizando el cumplimiento de la norma.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
* Para la semana 15 el contratista presenta un acumulado ejecutado del 2,14% vs un acumulado programado del 5,77%.
* Para la presente semana el contratista según reprogramación tenia contemplado realizar actividades correspondientes al procesamiento de la información topográfica y a la entrega de resultados de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas de suelo en las provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

* Se ha evidenciado que el contratista tiene disponibilidad y aplicación de recursos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que se han realizado las actividades de apiques, se han entregado resultados de ensayos de laboratorio, cuneta con personal profesional y de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 15 el contratista presenta un acumulado ejecutado de $ 690.257.411,44 vs un acumulado programado de $1,861.004.277 por lo que el avance financiero presenta un atraso de $1,170.746.866

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se han realizado actividades en campo correspondientes a la toma de muestra de suelo " apiques" los cuales el contratista a dado cumplimiento en la calidad de la ejecución de las actividades dando cumplimiento a las especificaciones técnicas componentes SST y componente ambiental.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se evidencia un vehículo inapropiado para el transporte de personal en obra

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se solicita la entrega oportuna de las correcciones del programa para empezar su aplicación

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Realizar entrega de procesamiento de información correspondiente a la caracterización vial " Levantamiento topográfico"	CONSORCIO VICGER 2021	18/07/2025
Realizar entrega de procesamiento de información correspondiente a laboratorio	CONSORCIO VICGER 2021	18/07/2025
		Inmediato.

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se presentan mayores cantidades en las actividades correspondientes al Ítem Apiques (incluye por unidad: elaboración, transporte, CBR in situ, CBR laboratorio), esto debido a que se dio cumplimiento a las especificaciones Invias las cuales indican que se deben realizar apiques cada 250m

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA













DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS
